| Document nummer | Bestandsnaam export | Weigeringsgrond | Tags |
|---|---|---|---|
| 00001 | ROBA-IN-KWT-00-RAP-0004.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00002 | ROBA-IN-KWT-00-RAP-0006.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00003 | ROBA-IN-KWT-RAP-0004 DEF versie2.0.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00004 | ROBA-IN-KWT-RAP-0005.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00005 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-0055.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00006 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-RAP-0090.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00007 | ROBA-RAP-004236.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00008 | ROBA-RAP-004314.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00009 | ROBA-RAP-004325.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00010 | ROBA-RAP-004345.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00011 | ROBA-RAP-004356.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00012 | ROBA-RAP-004365.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00013 | ROBA-RAP-004373.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00014 | ROBA-RAP-004389.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00015 | ROBA-RAP-004400.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00016 | ROBA-RAP-004415.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00017 | ROBA-RAP-004428.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00018 | ROBA-RAP-004440.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00019 | ROBA-RAP-004456.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00020 | ROBA-RAP-004469.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00021 | ROBA-RAP-004479.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00022 | ROBA-RAP-004493.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00023 | ROBA-RAP-004511.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00024 | ROBA-RAP-004521.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00025 | ROBA-RAP-004534.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00026 | ROBA-RAP-004554.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00027 | ROBA-RAP-004569.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00028 | ROBA-RAP-005013.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00029 | ROBA-RAP-005028.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00030 | ROBA-RAP-005036.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00031 | ROBA-RAP-005048.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00032 | ROBA-RAP-005055.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00033 | ROBA-RAP-005064.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00034 | ROBA-RAP-005069.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |

Docnr1

Gemeente Den Haag

# Rapportage 2e kwartaal 2013: Rotterdamsebaan

Datum 18 oktober 2013
Intern
Concept
Versie 1.0

DE ROTTERDAMSEBAAN

Docnr1

Docnr1

Kwartaalrapportage Rotterdamsebaan
Intern, Gemeente Den Haag (vertrouwelijk)

| Versie | |
|---|---|
| Concept 0.1 | 20 augustus 2013 vastgesteld in MT-Rotterdamsebaan |
| Concept 0.2 | 18 oktober 2103 vastgesteld in OGON-Rotterdamsebaan |
| Definitief 1.0 | 29 oktober 2013 t.k.n. naar Stuurgroep-Rotterdamsebaan |
| | |
| | |

| | Naam |
|---|---|
| Opgesteld door | 5.1.2.e |

# Inhoudsopgave

**INLEIDING** **5**

**1 ONTWERP** **7**
1.1 Afgelopen kwartaal 7
1.2 Komend kwartaal 8

**2 VERKEER** **10**
2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2 Komend kwartaal 10

**3 OMGEVINGSMANAGEMENT** **11**
3.1 Afgelopen kwartaal 11
3.2 Komend kwartaal 11

**4 PLANSTUDIES** **12**
4.1 Afgelopen kwartaal 12
4.2 Komend kwartaal 12

**5 VERLENGDE REGULUSWEG, SPOORBOOGWEG EN VERLENGDE MELKWEGSTRAAT** **13**
5.1 Afgelopen kwartaal 13
5.2 Komend kwartaal 13

**6 VERWERVING** **14**
6.1 Afgelopen kwartaal 14
6.2 Komend kwartaal 14

**7 CONDITIONERING** **15**
7.1 Afgelopen kwartaal 15
7.2 Komend kwartaal 15

**8 TUNNELVEILIGHEID** **16**
8.1 Afgelopen kwartaal 16
8.2 Komend kwartaal 16

**9 AANBESTEDEN EN CONTRACTERING** **17**
9.1 Afgelopen kwartaal 17
9.2 Komend kwartaal 17

**10 COMMUNICATIE** **18**
10.1 Afgelopen kwartaal 18
10.2 Komend kwartaal 18

**11 FINANCIËN** **19**
11.1 Kostenstructuur 19
11.2 Dekkingen 20

**12 RISICOBEHEER** **21**
12.1 Afgelopen kwartaal 21
12.2 Komend kwartaal 21

12.3 Financiële Toprisico's 21
12.4 Toprisico's planning 22

**13 PLANNING 24**
13.1 Afgelopen kwartaal 24
3.2 Komend kwartaal 24

**14 CONTRACTBEHEER 25**
14.1 Afgelopen kwartaal 25
14.2 Komend kwartaal 25

**15 INFORMATIEBEHEER 26**
15.1 Afgelopen kwartaal 26
15.2 Komend kwartaal 26

**16 KWALITEIT 27**
16.1 Afgelopen kwartaal 27
16.2 Komend kwartaal 27

**17 ORGANISATIE 28**
17.1 Afgelopen kwartaal 28
17.2 Komend kwartaal 28

**18 GERELATEERDE PROJECTEN 29**
18.1 Trekfietstracé 29
18.1.1 Afgelopen kwartaal 29
18.1.2 Komende kwartaal 29

**BIJLAGE 1 : FORMAT GRIP OP GROTE PROJECTEN 30**

# INLEIDING

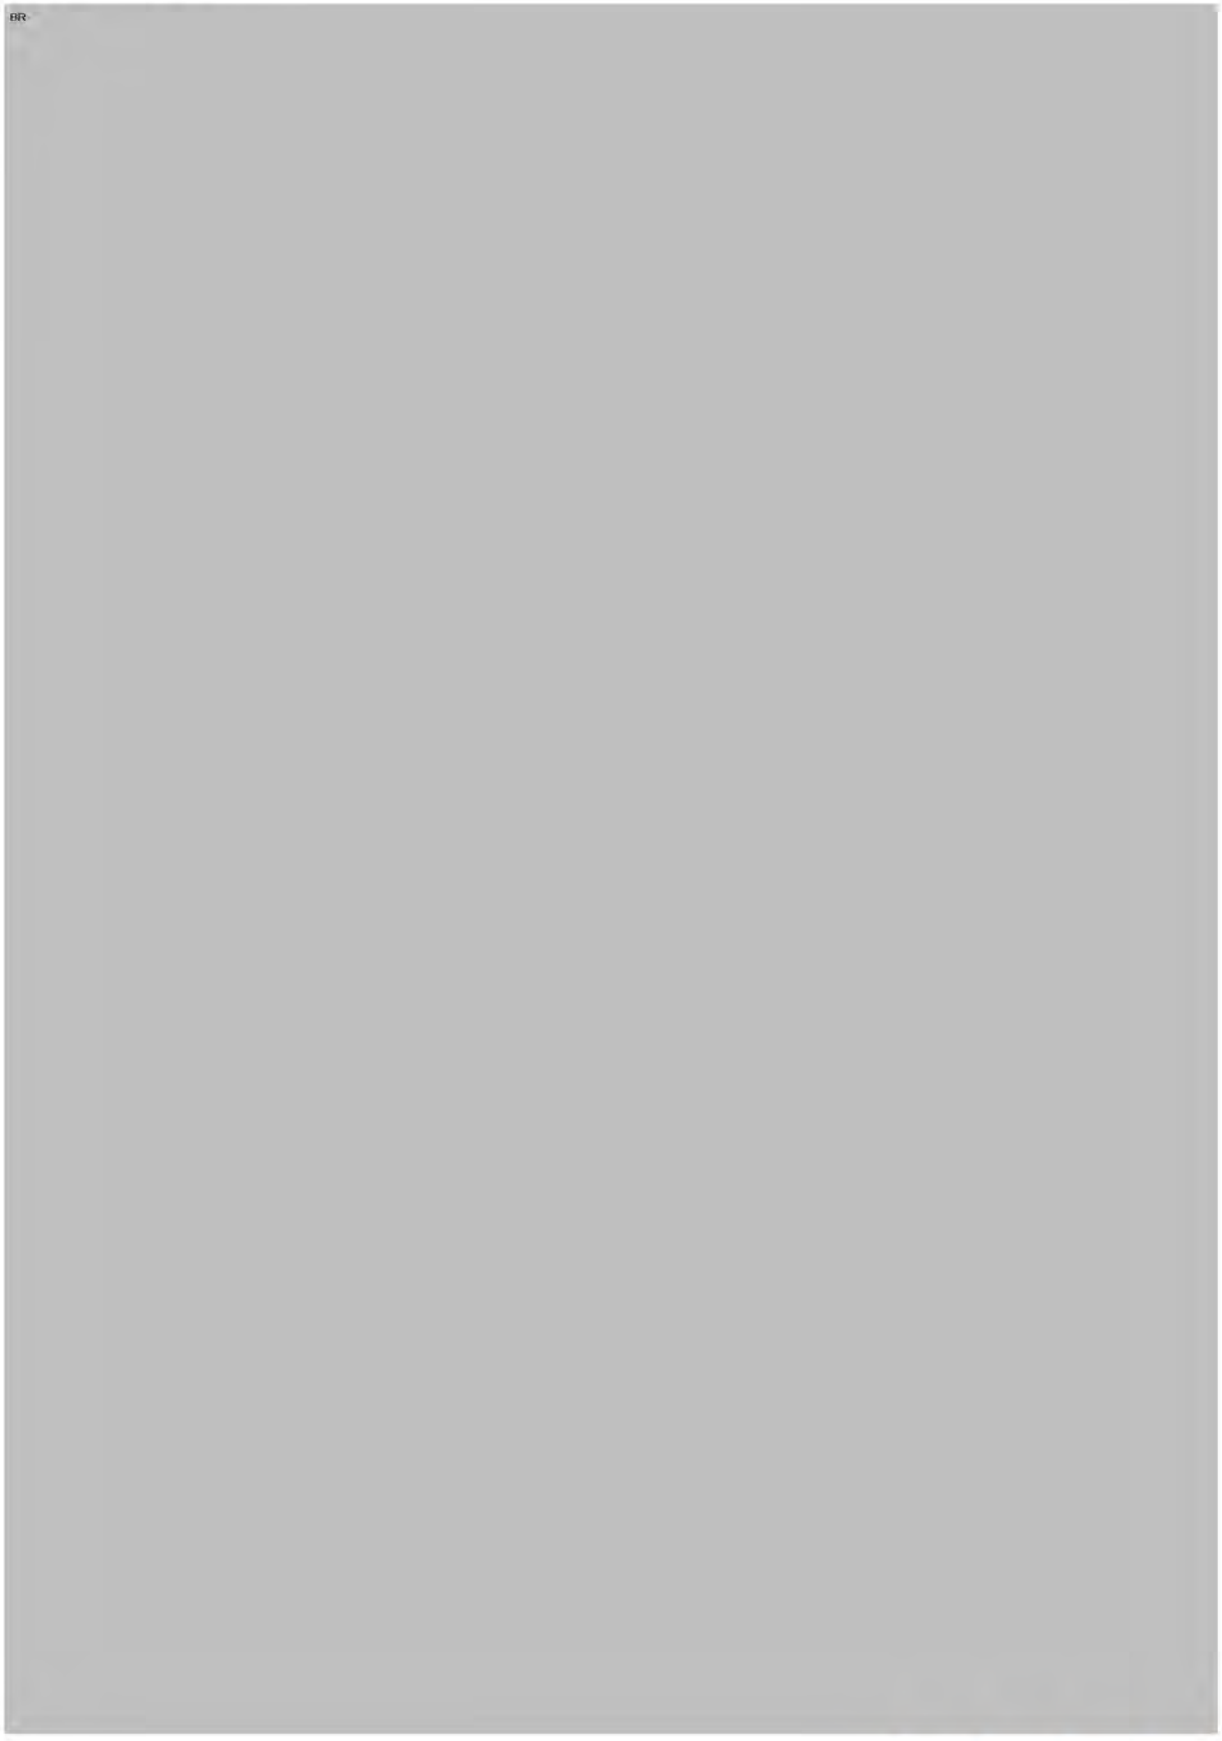

# 1 ONTWERP

## 1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige kwartaalrapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |

| | |
|---|---|
| BR | |
| Definitieve afspraken maken met Hoogheemraadschap Delfland over het toepassen van een persleiding voor Molensloot. Dit is onderdeel van totale waterhuishoudkundig plan is o.a. afhankelijk van overeenstemming met Drievliet over locatie van het parkeerterrein. | Er is nog geen overeenstemming met Drievliet. Met HH Delfland worden definitieve afspraken gemaakt als er een inrichtingsvoorstel ligt voor Drievliet e.o., waar ook de waterhuishouding deel van uit maakt. |
| BR | |

| |
|---|
| BR |

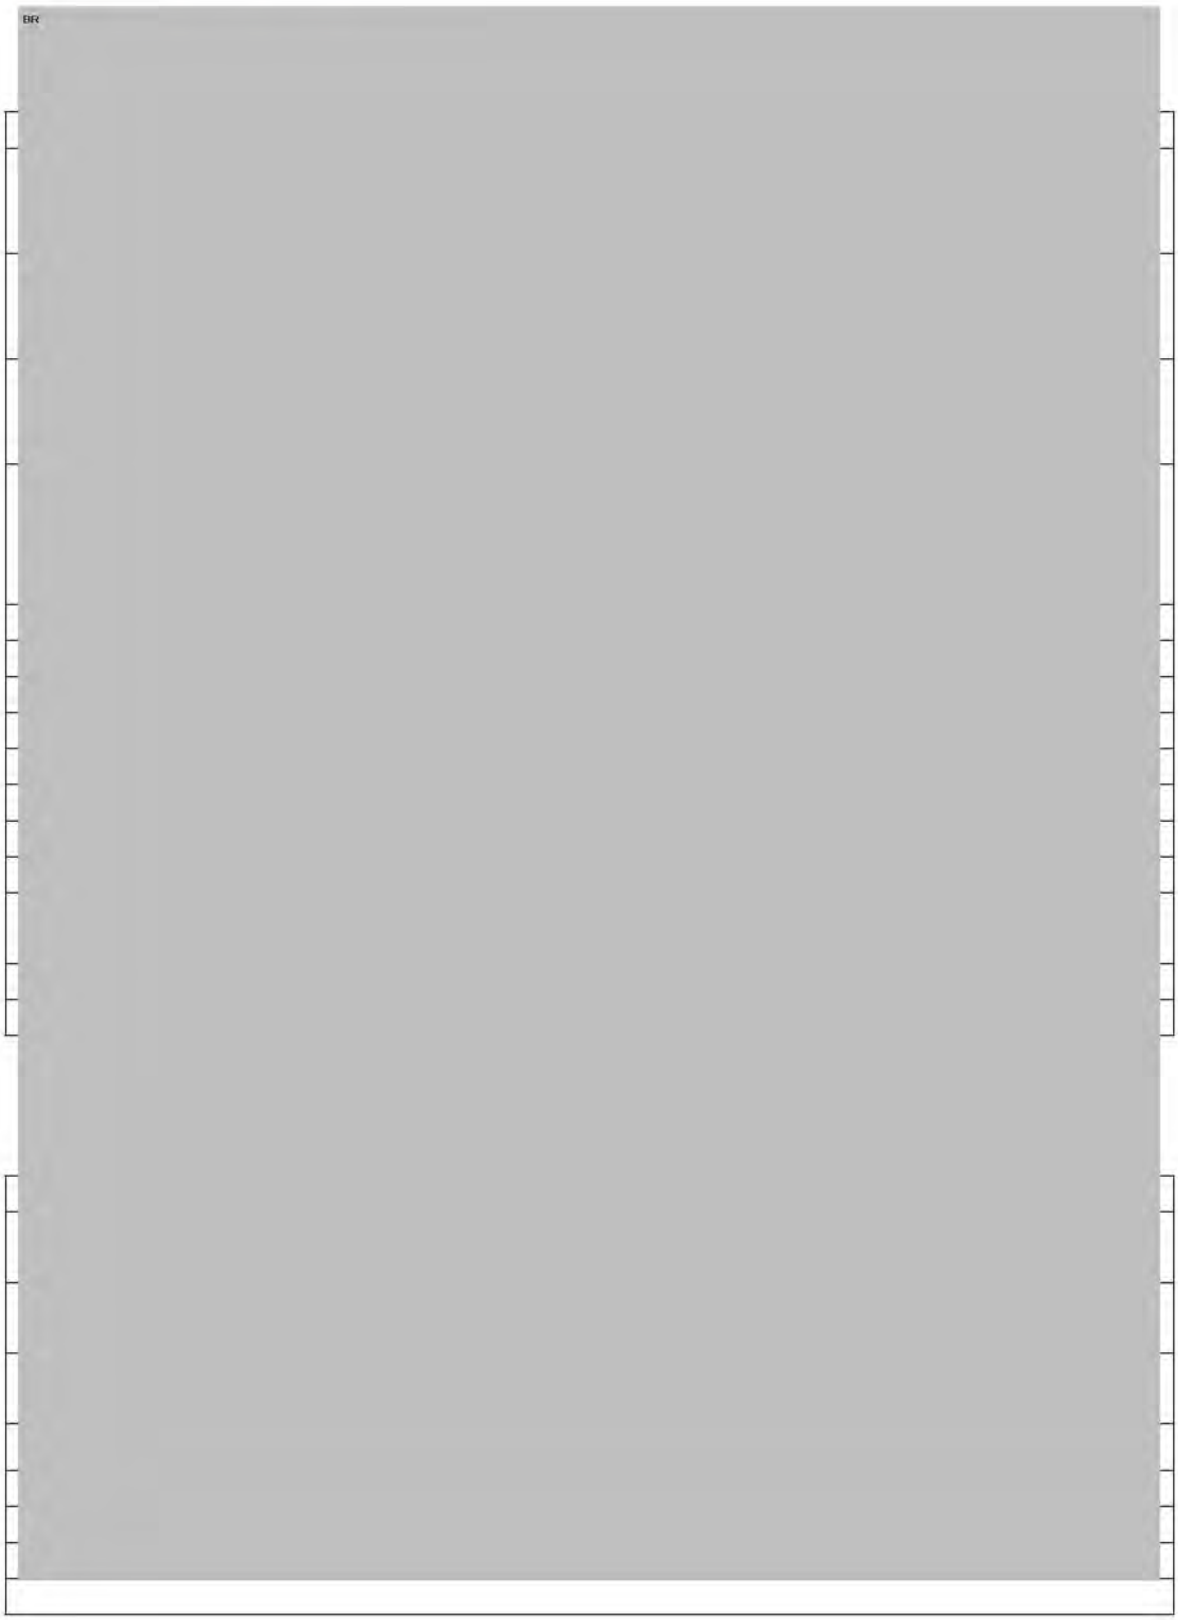
BR

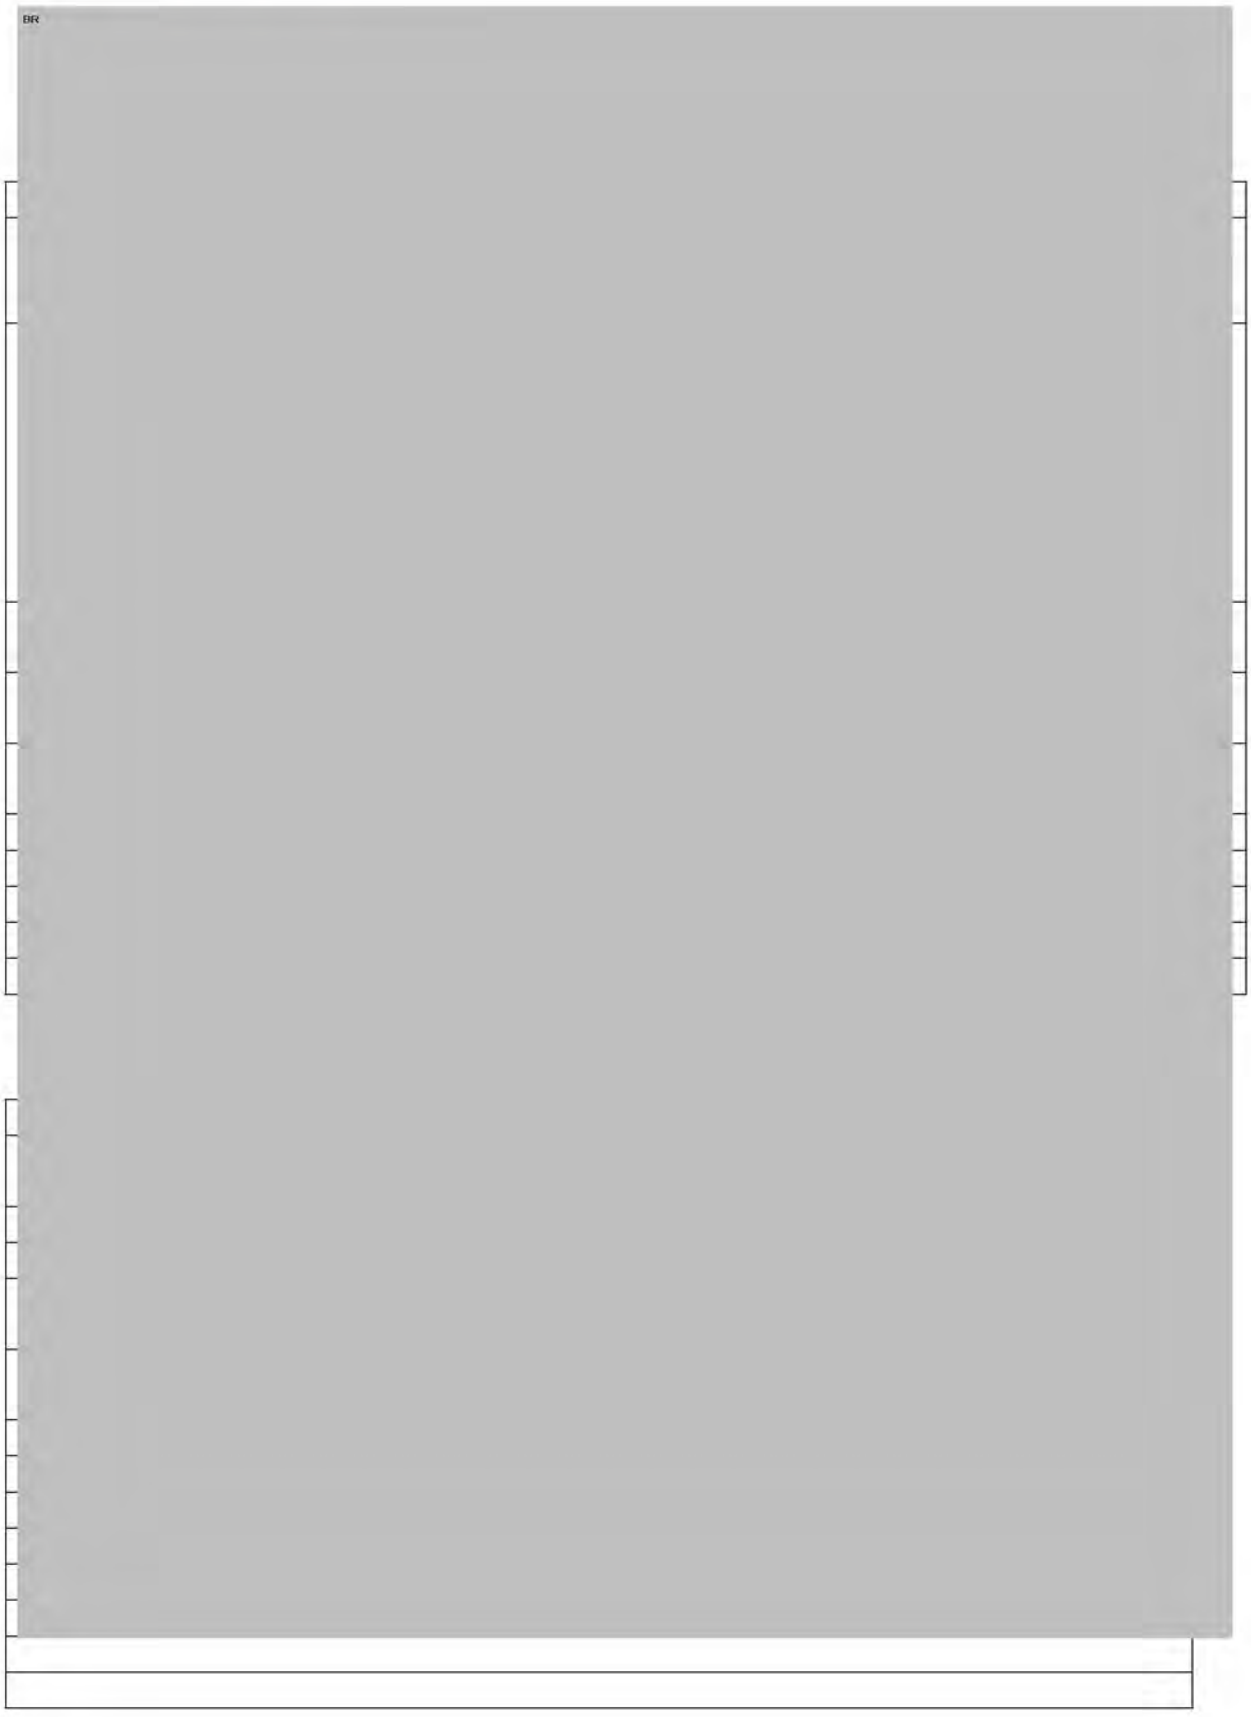
BR

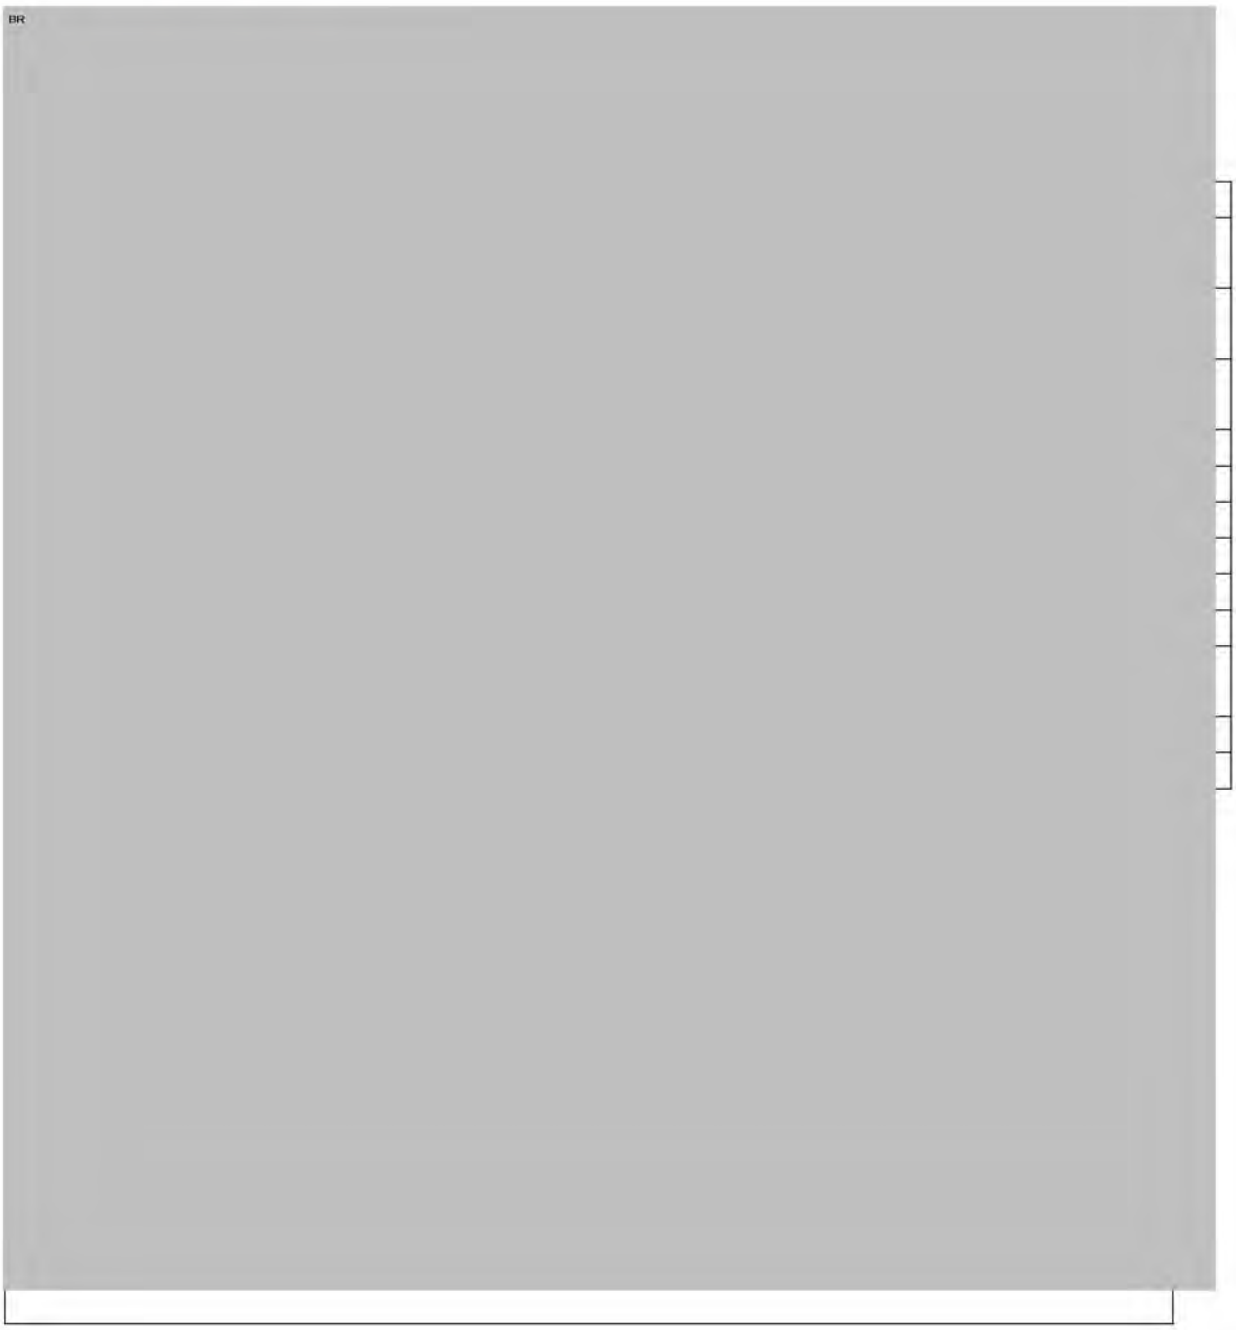
BR

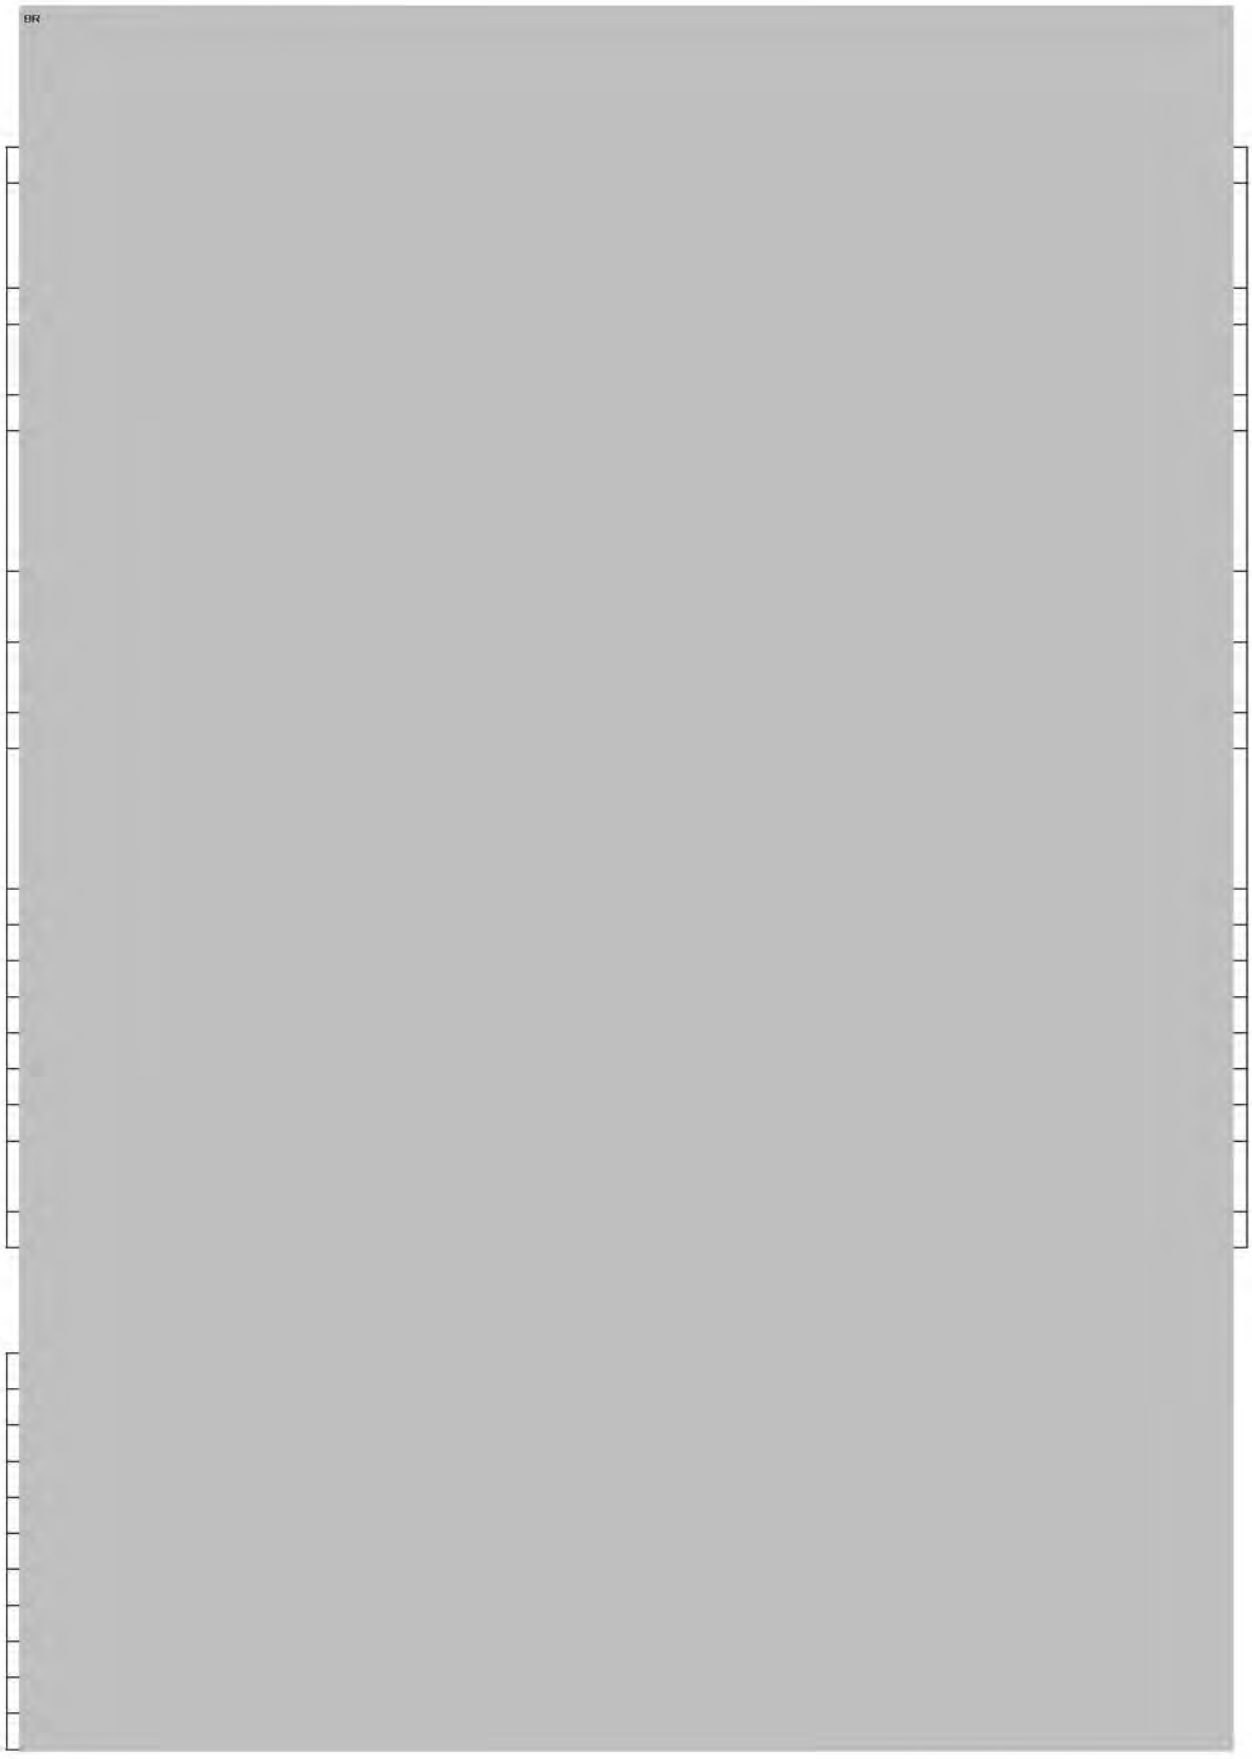
BR

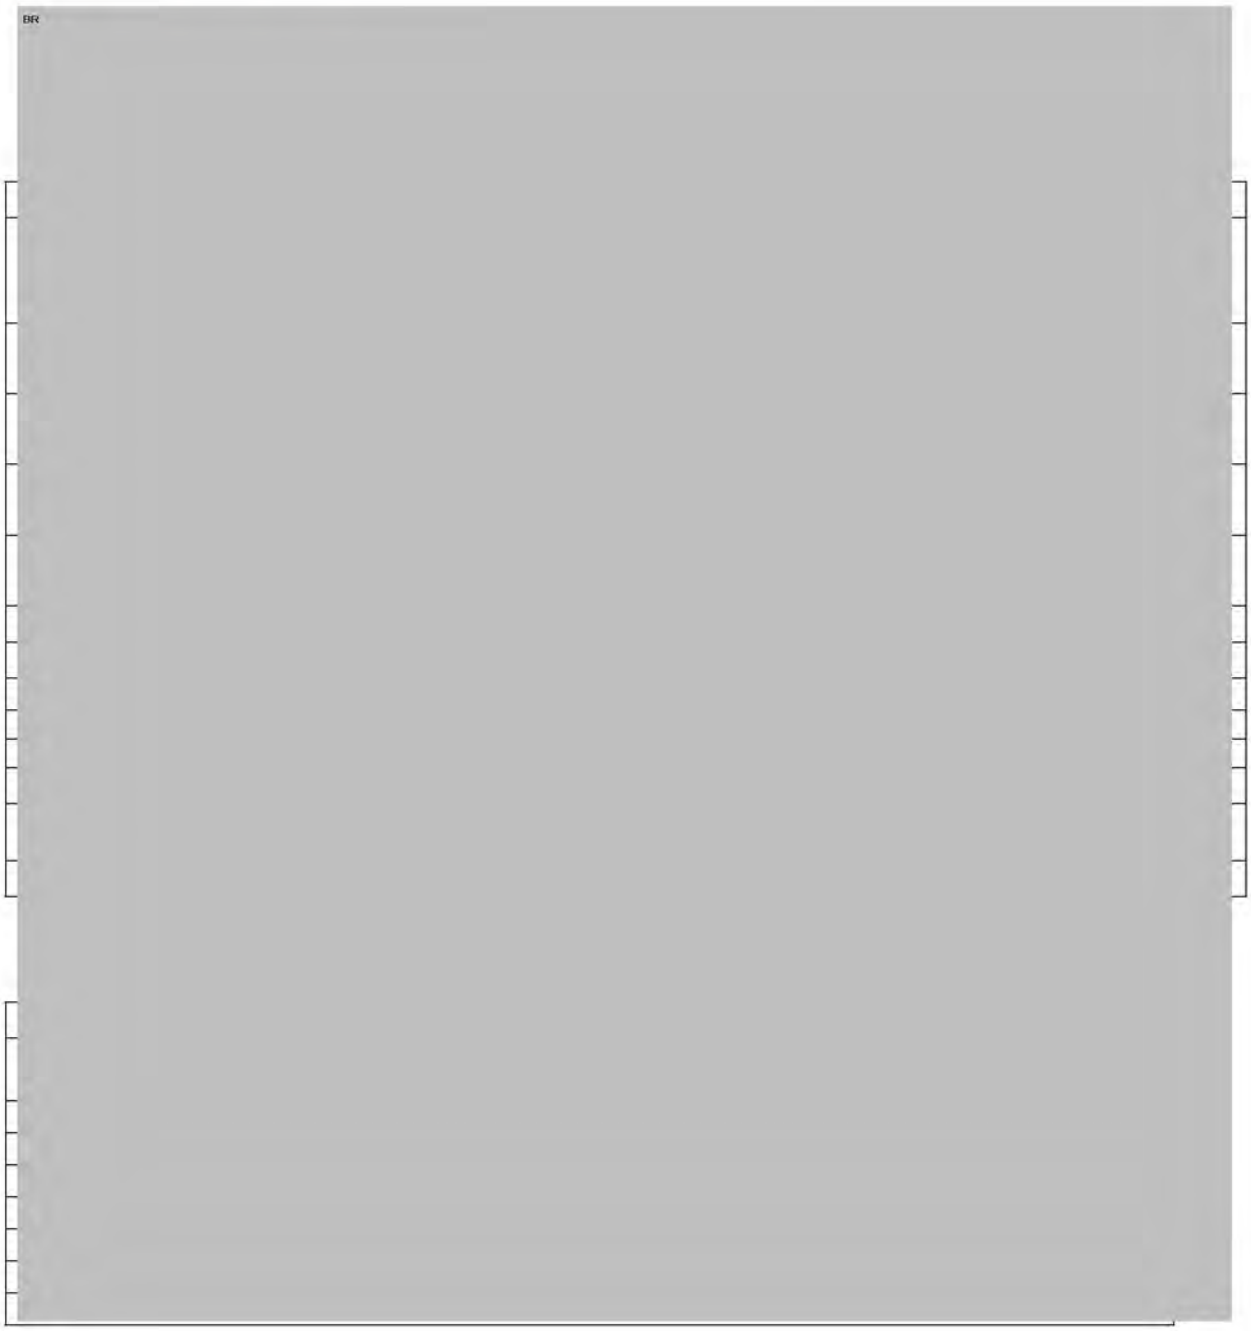
BR

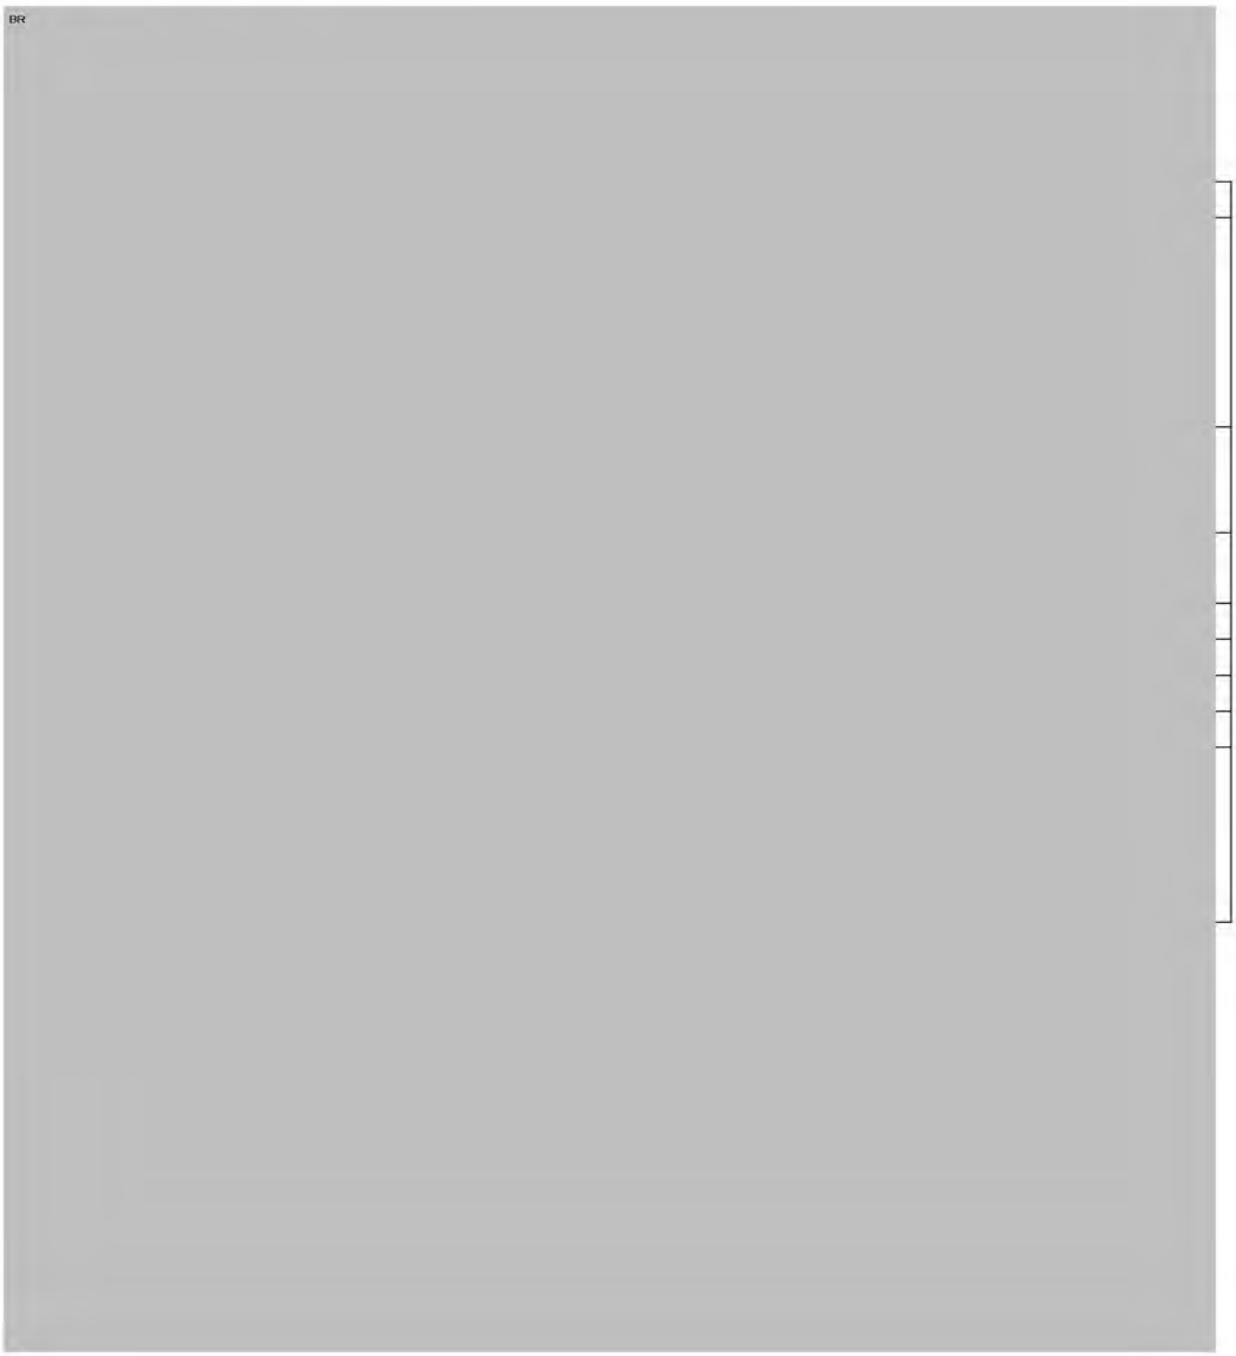
BR

BR

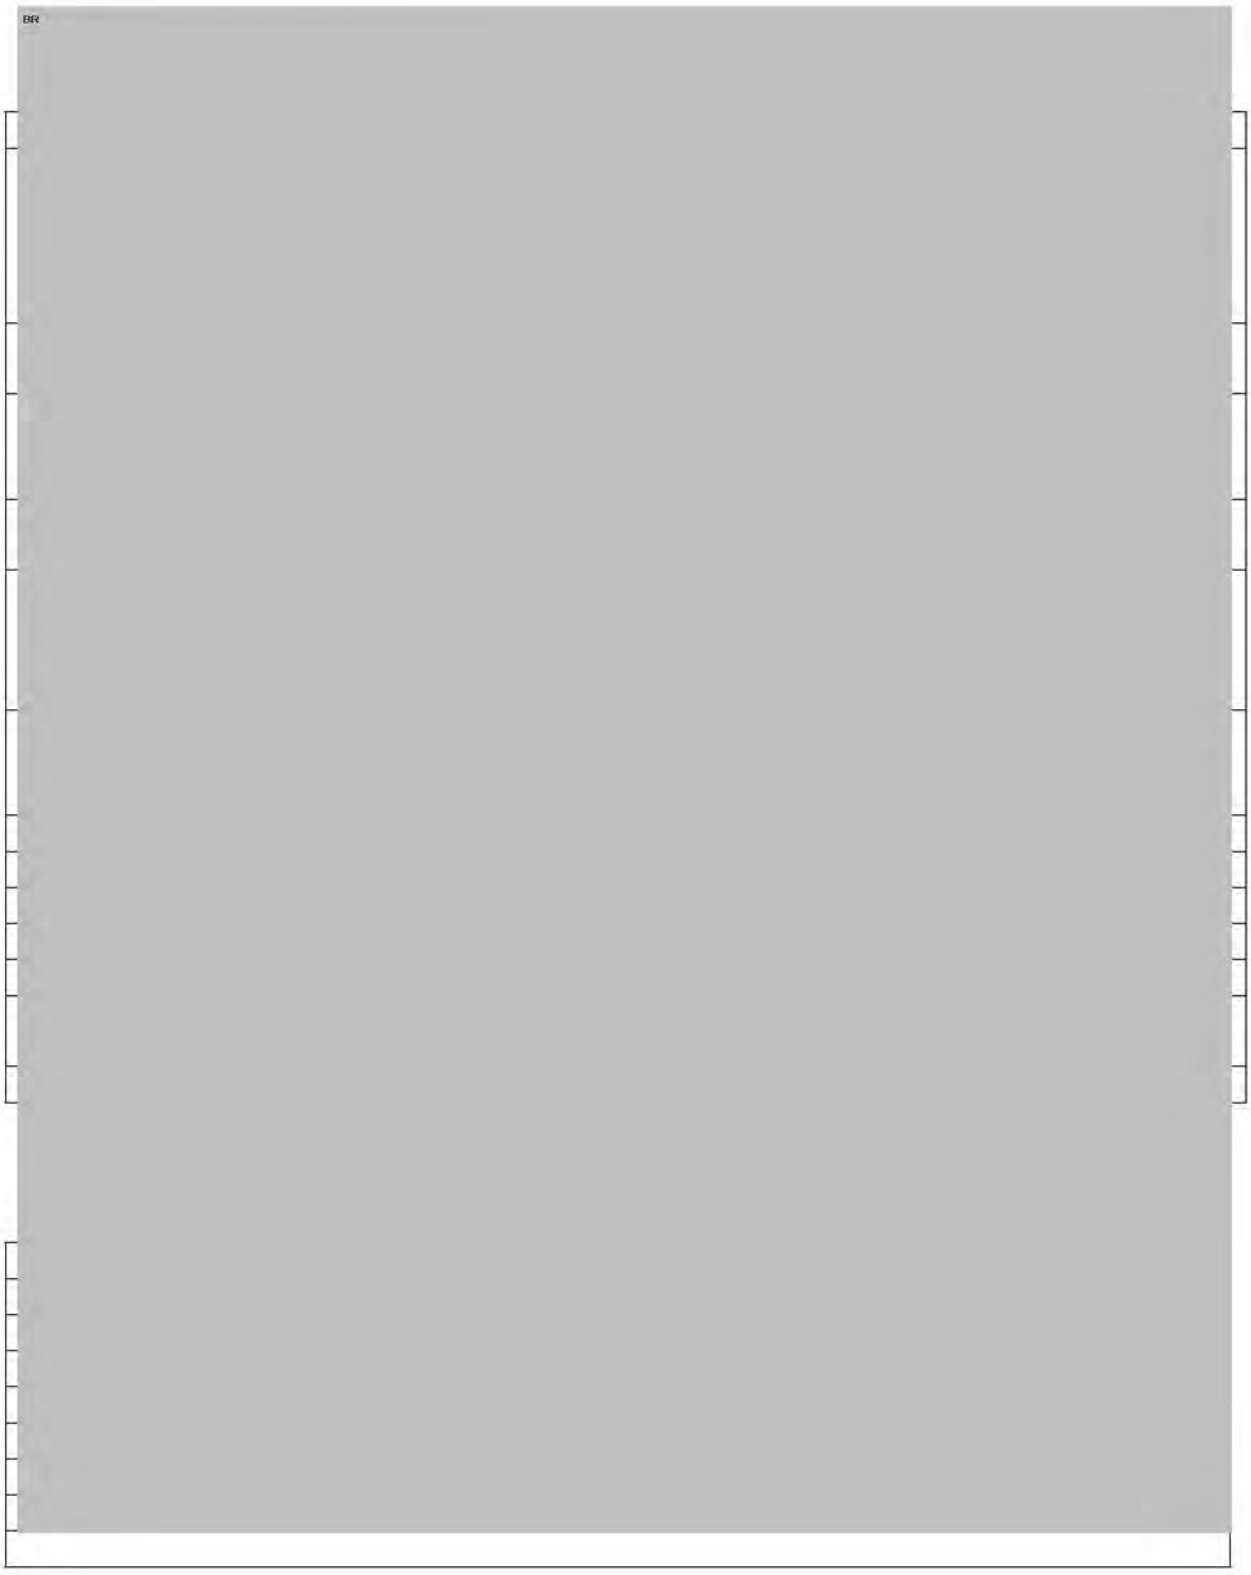
BR

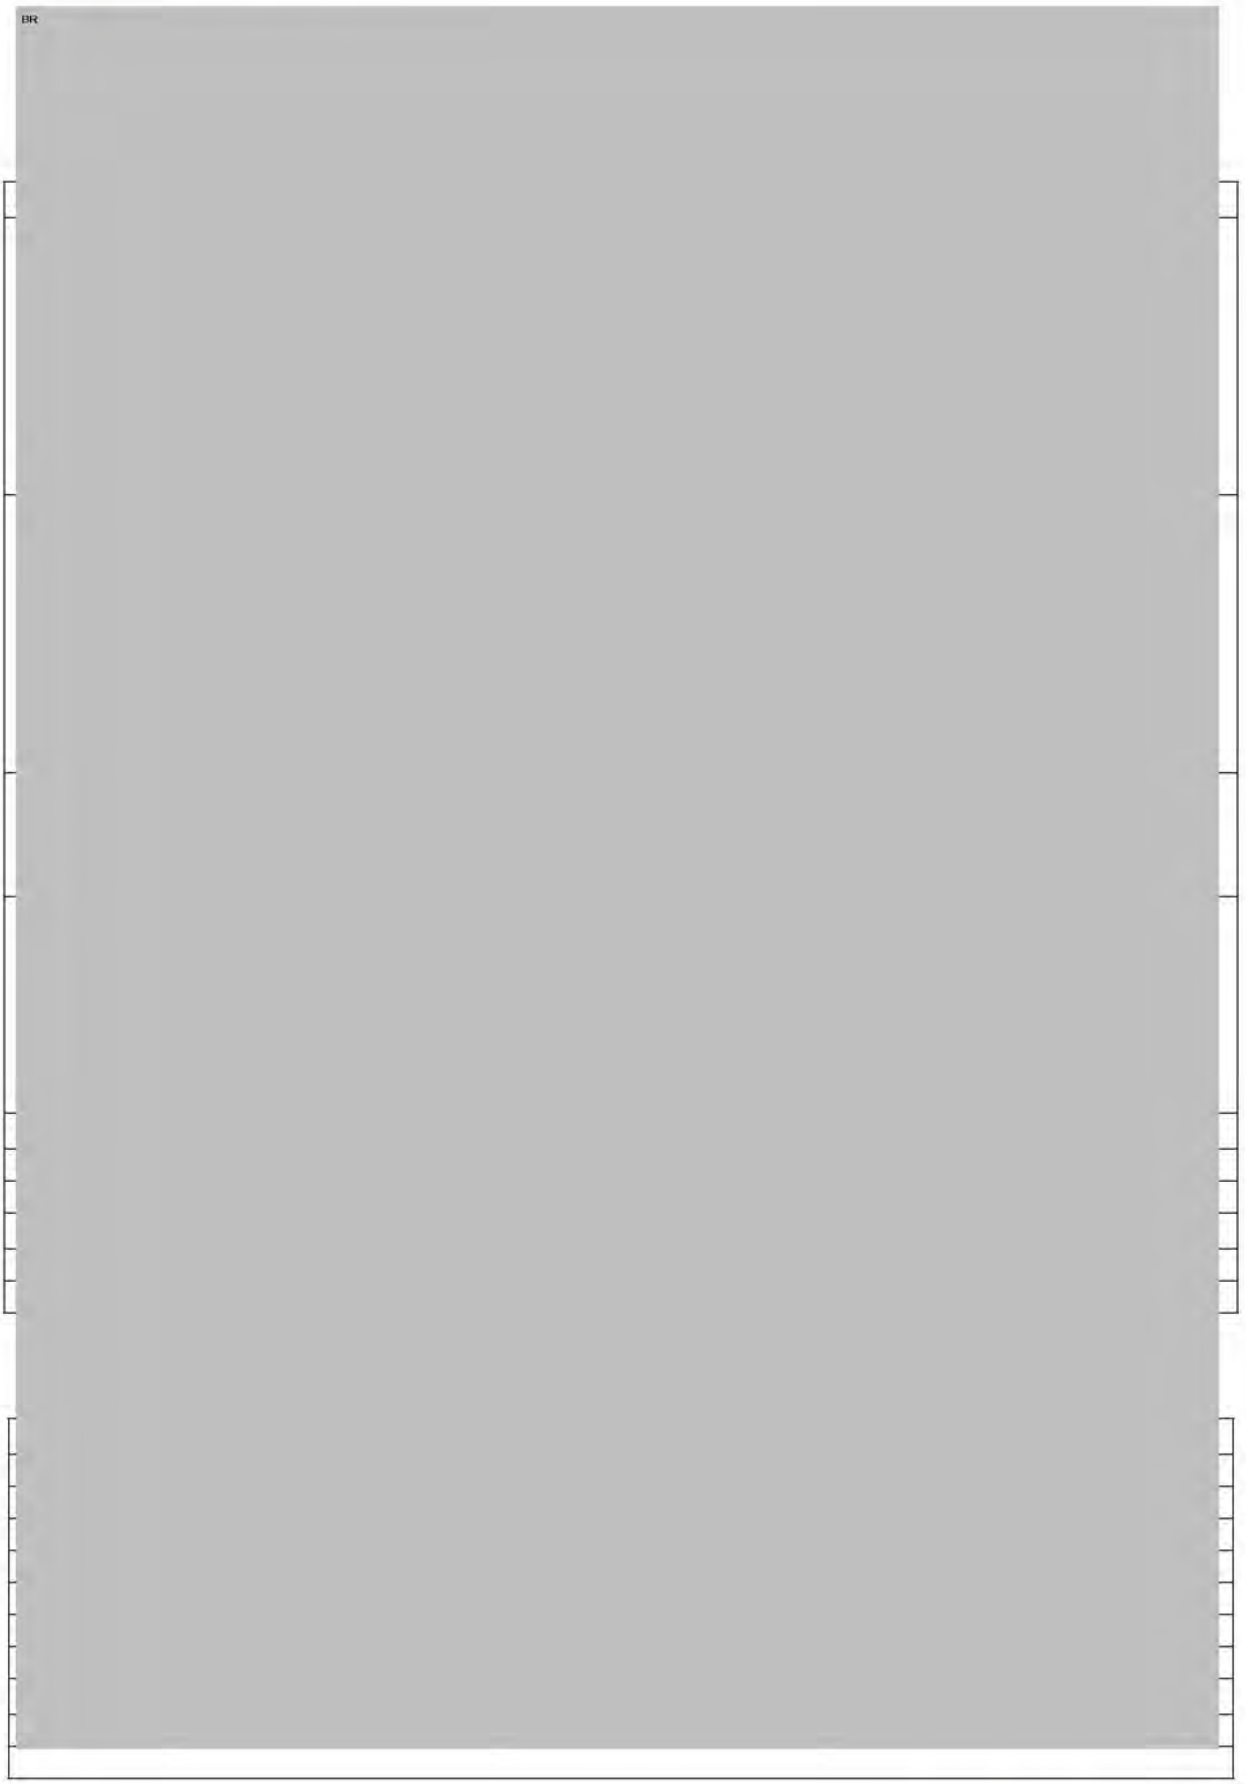
BR

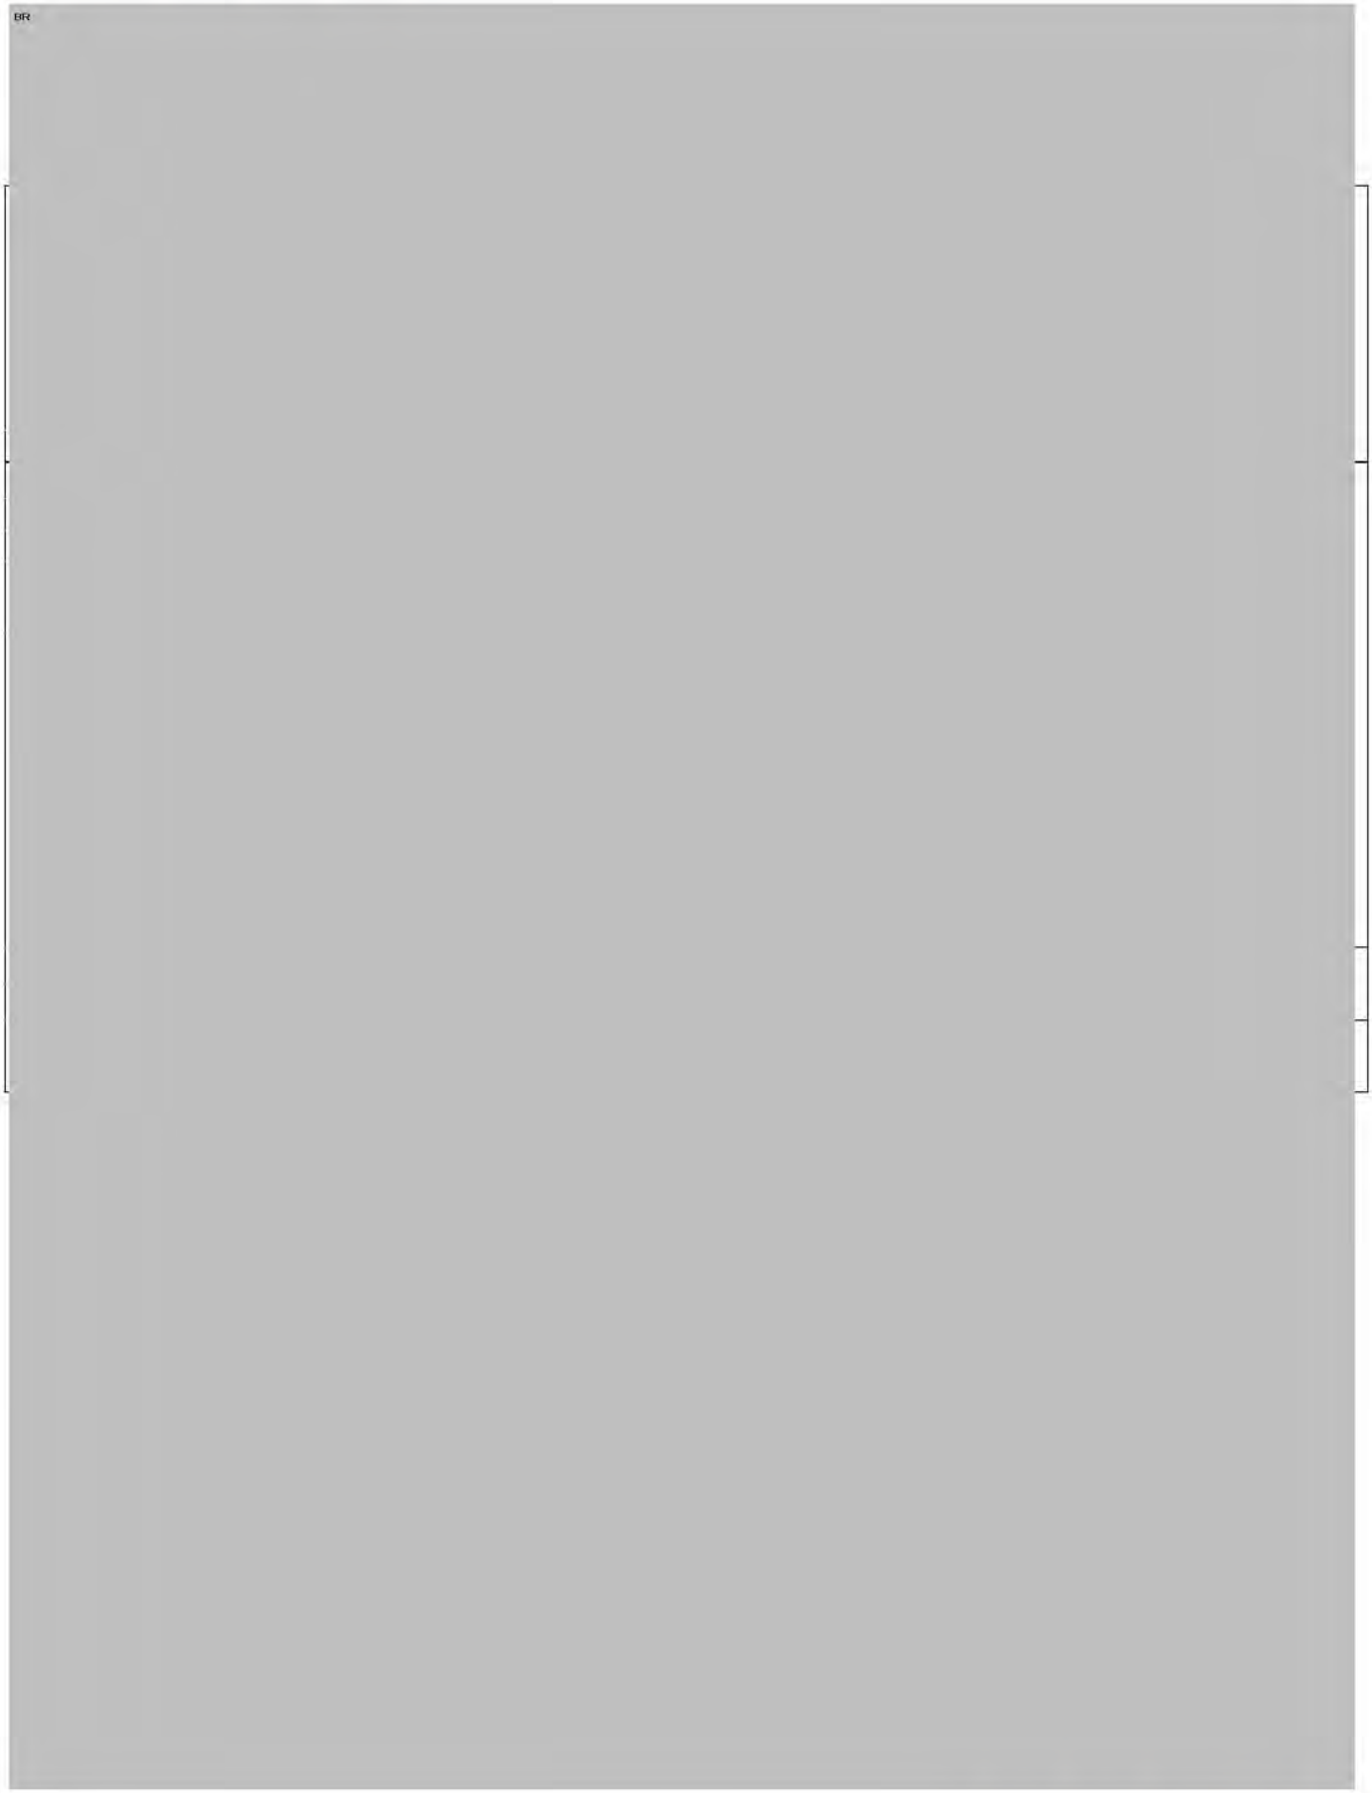
BR

BR

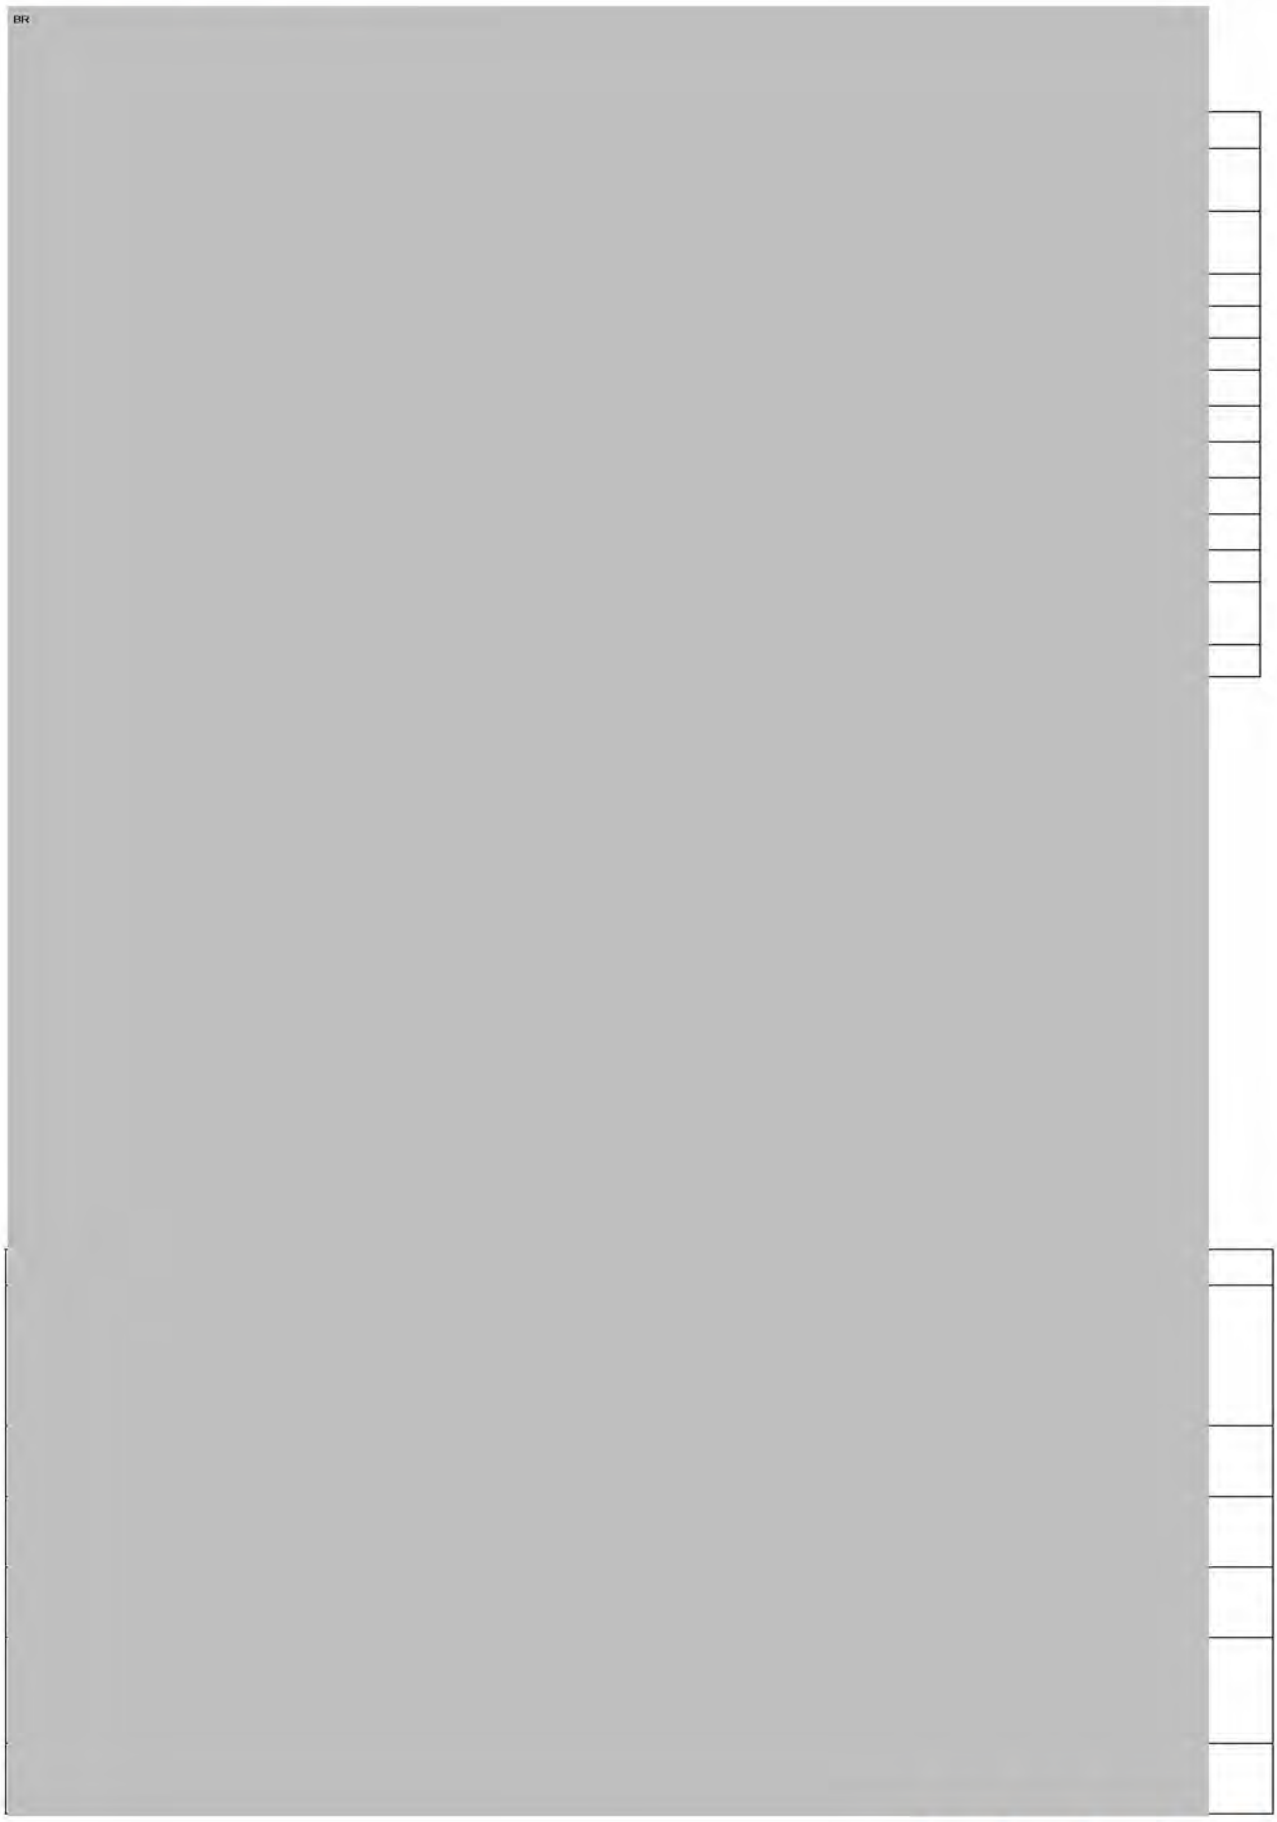
BR

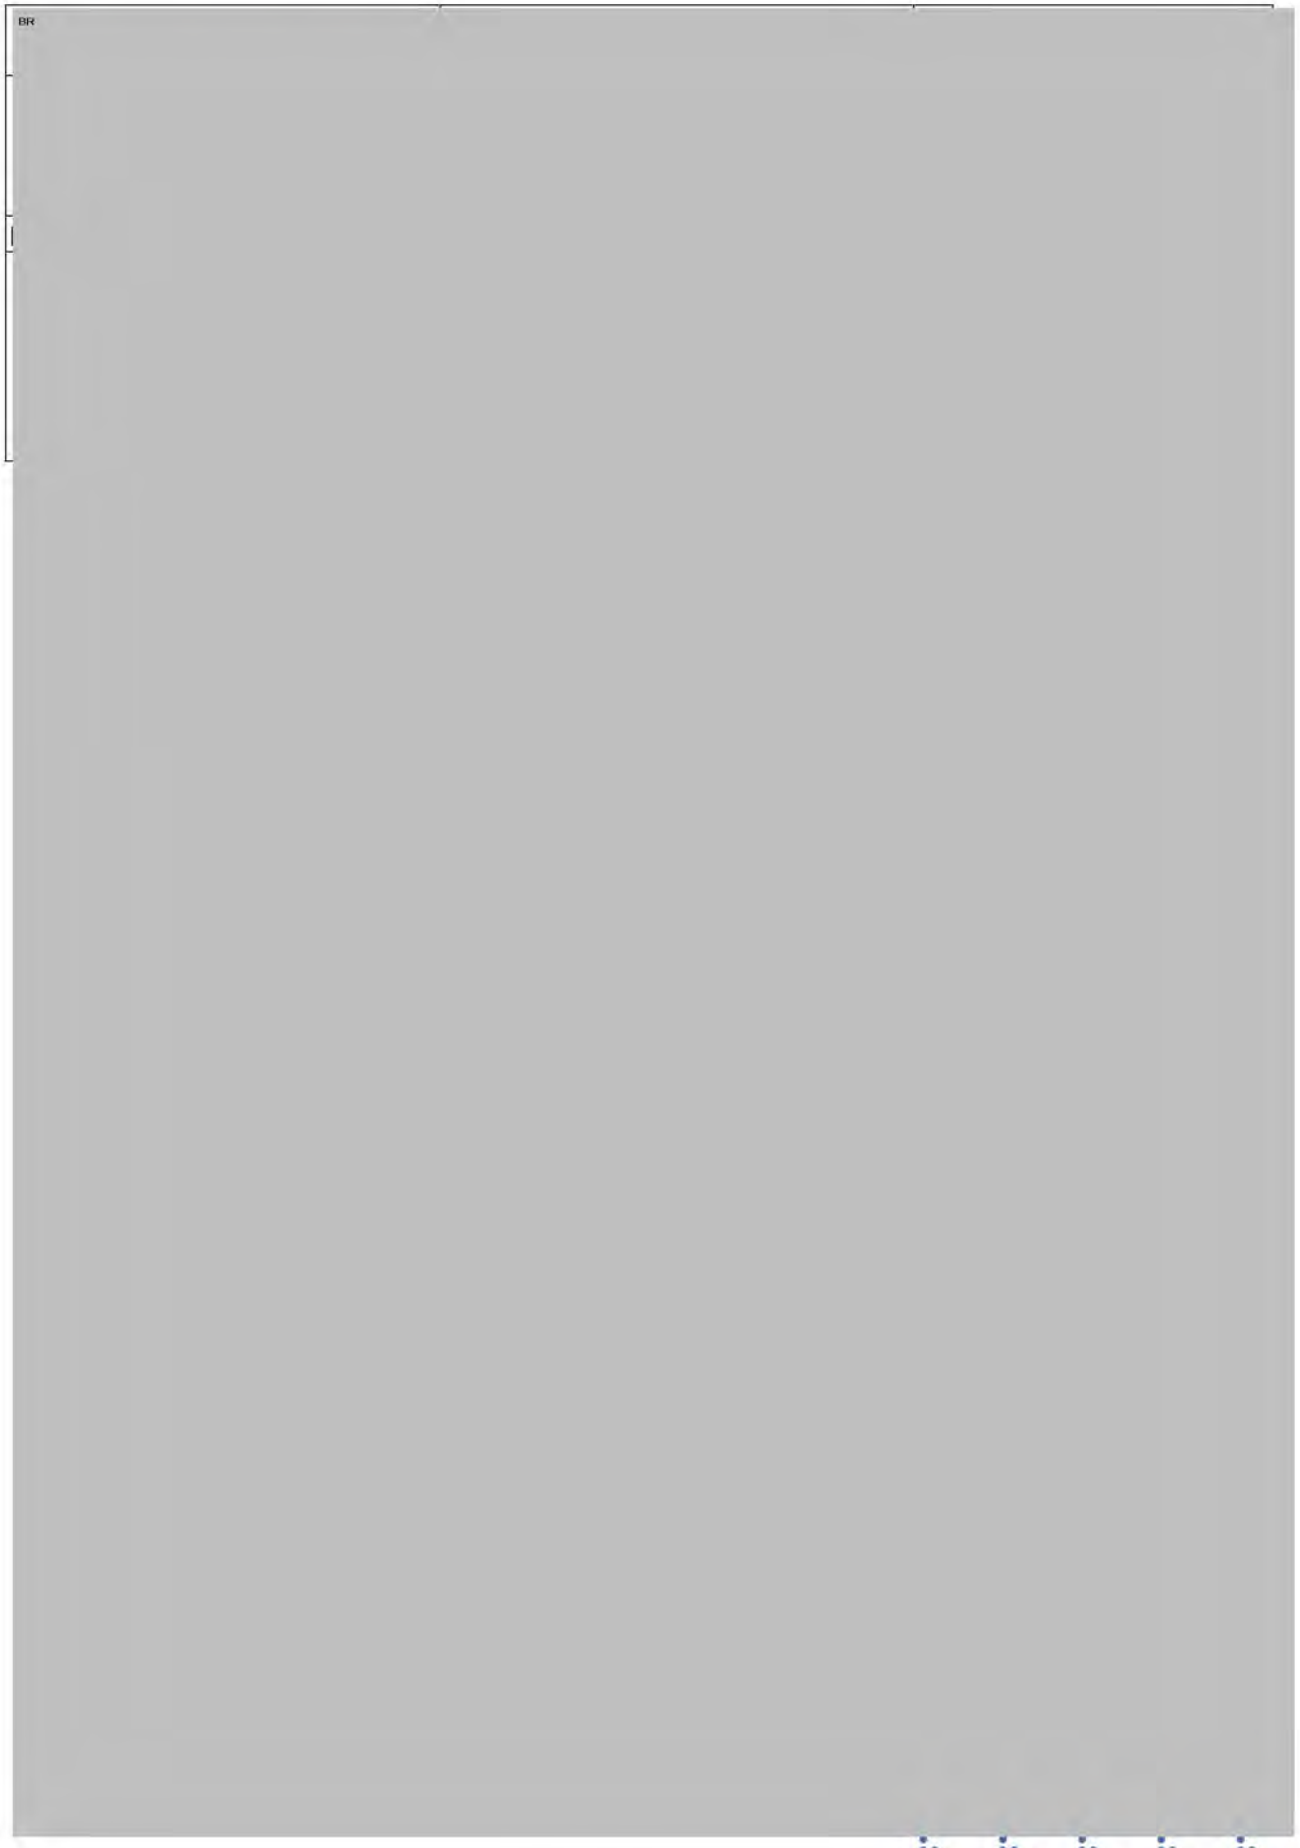
BR

BR

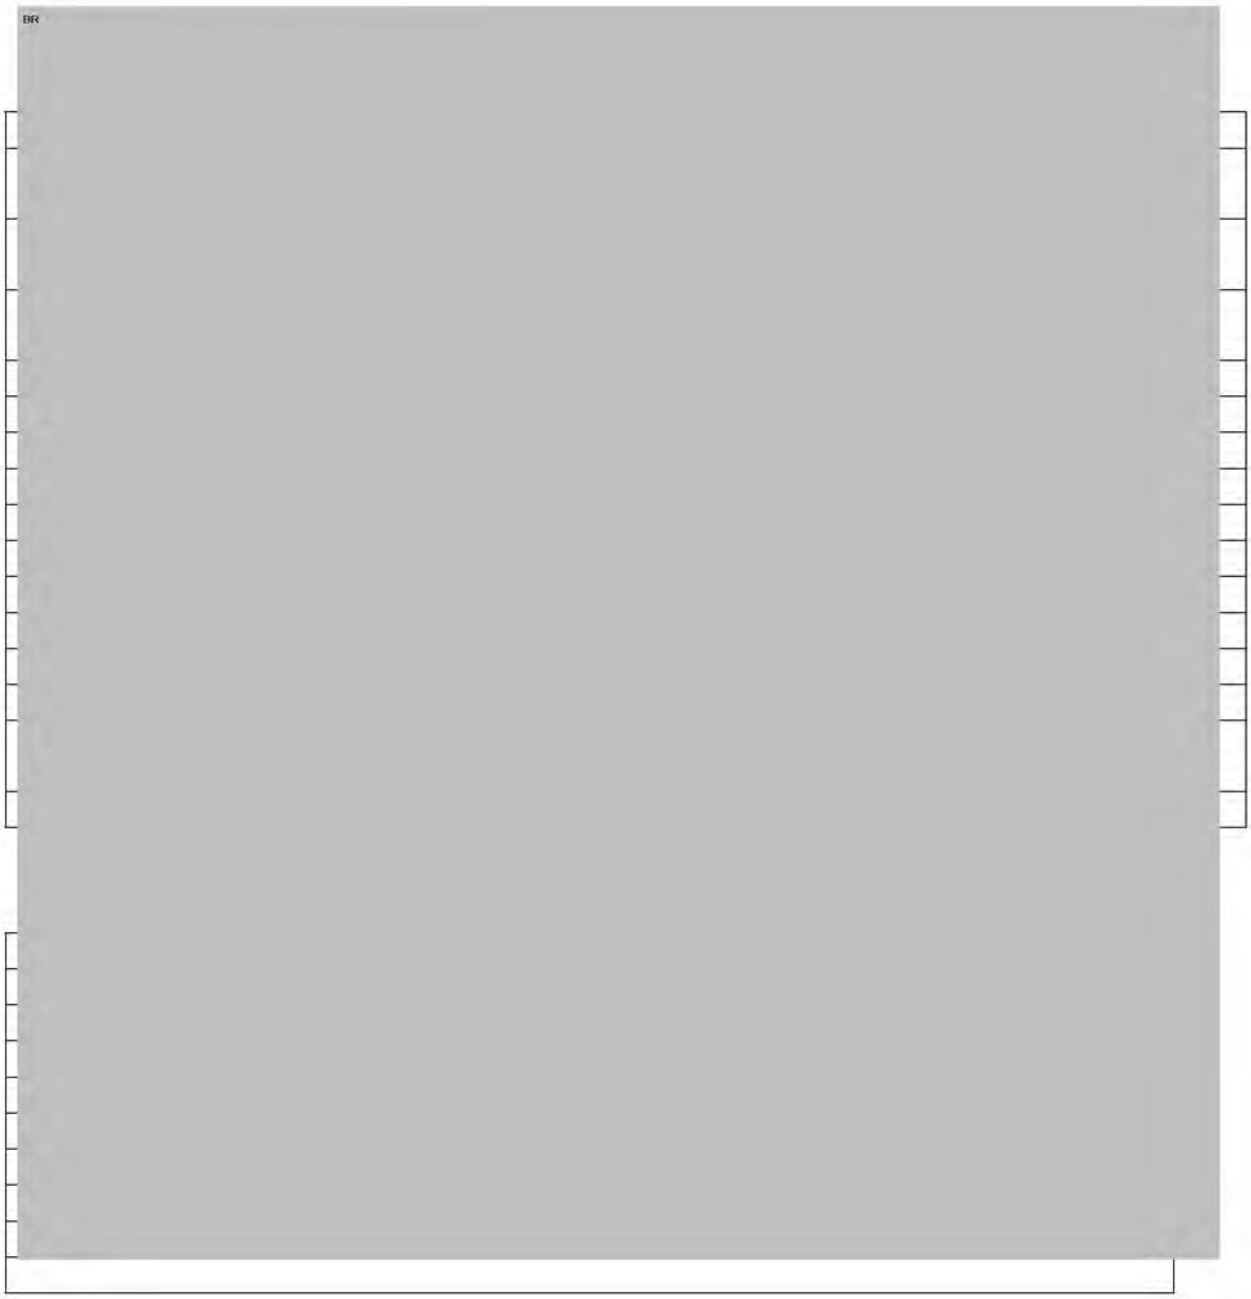
BR

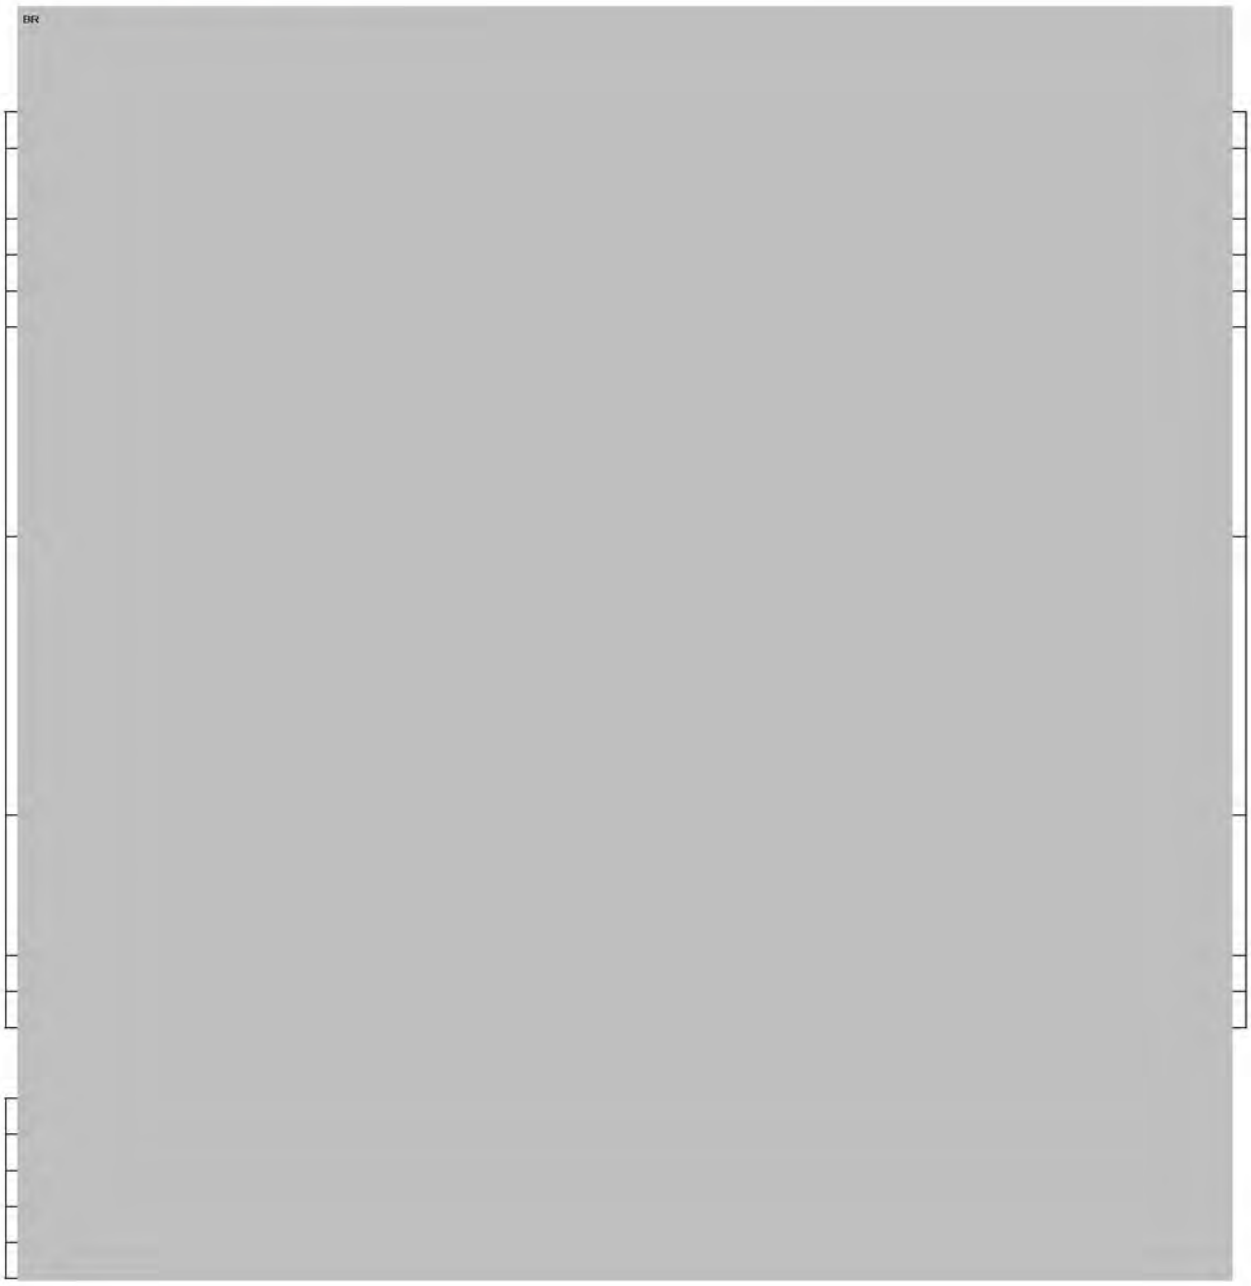
BR

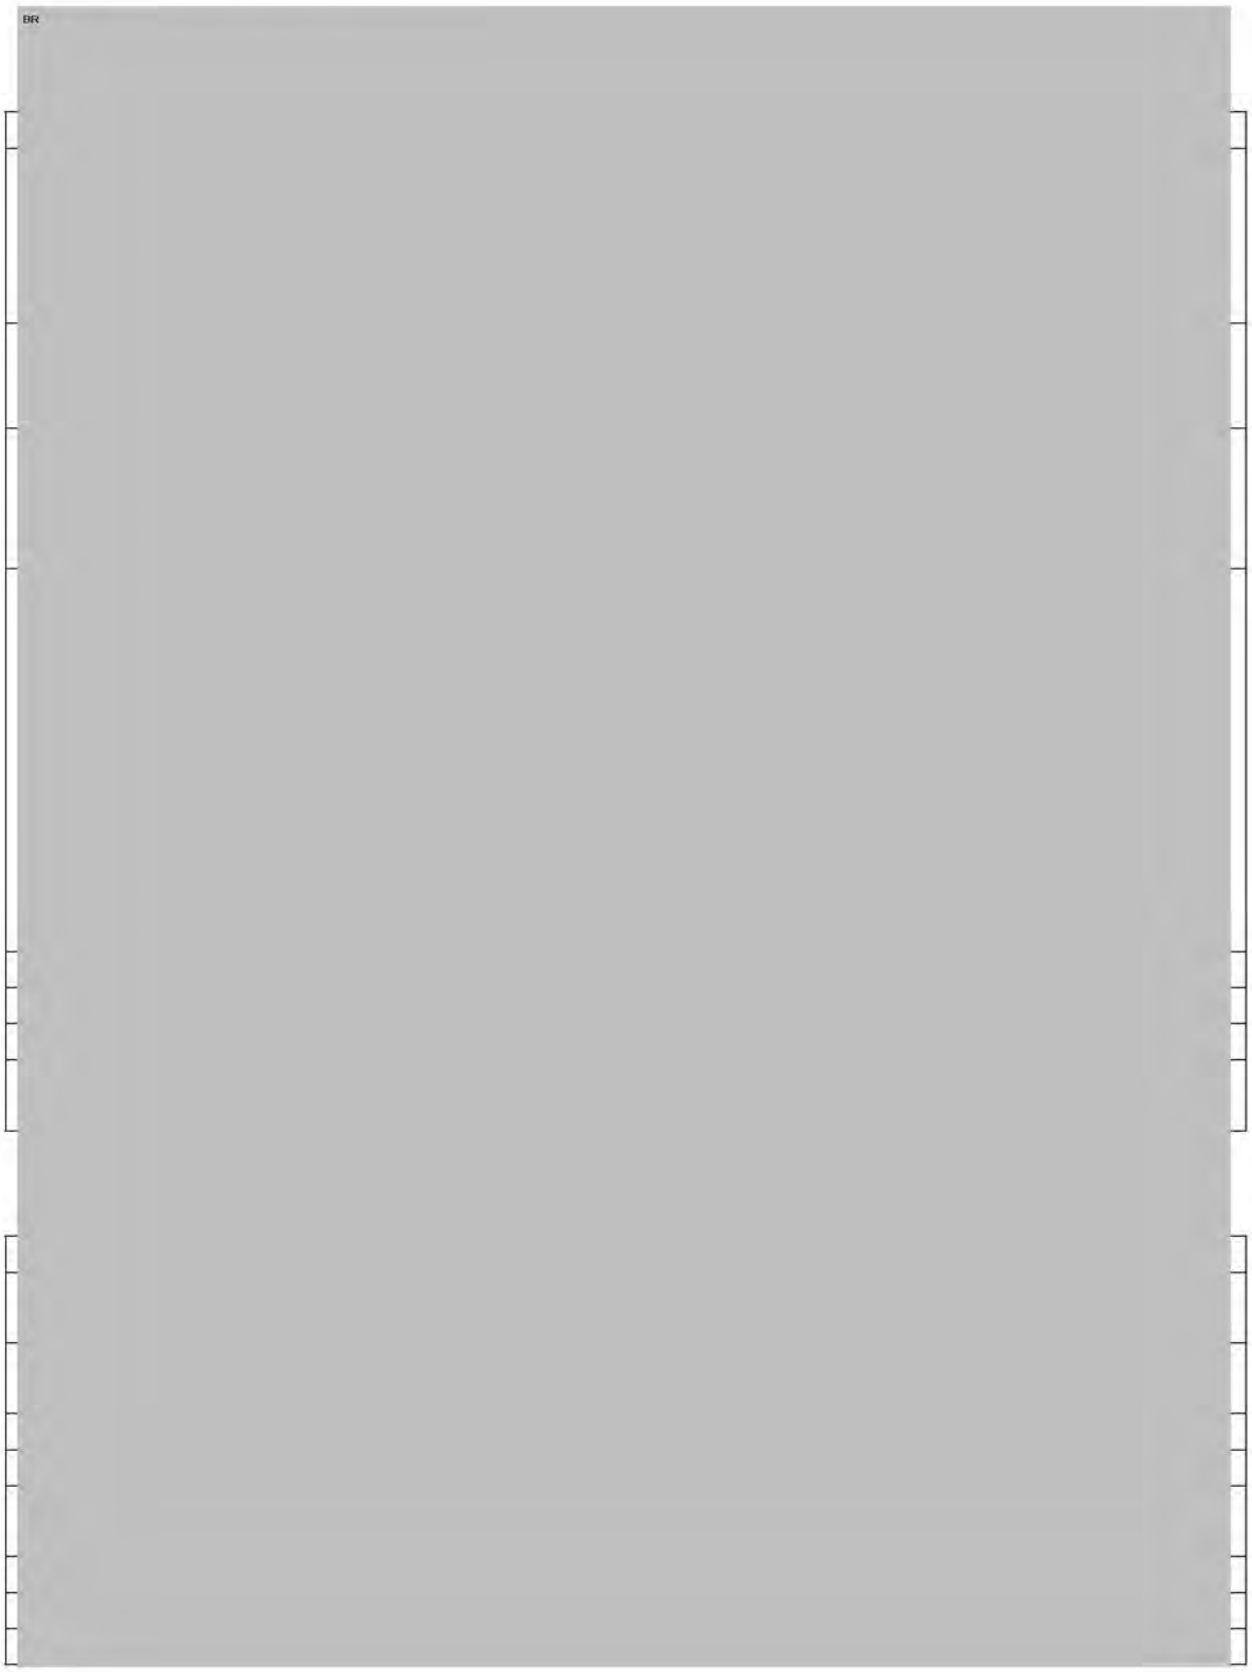
BR

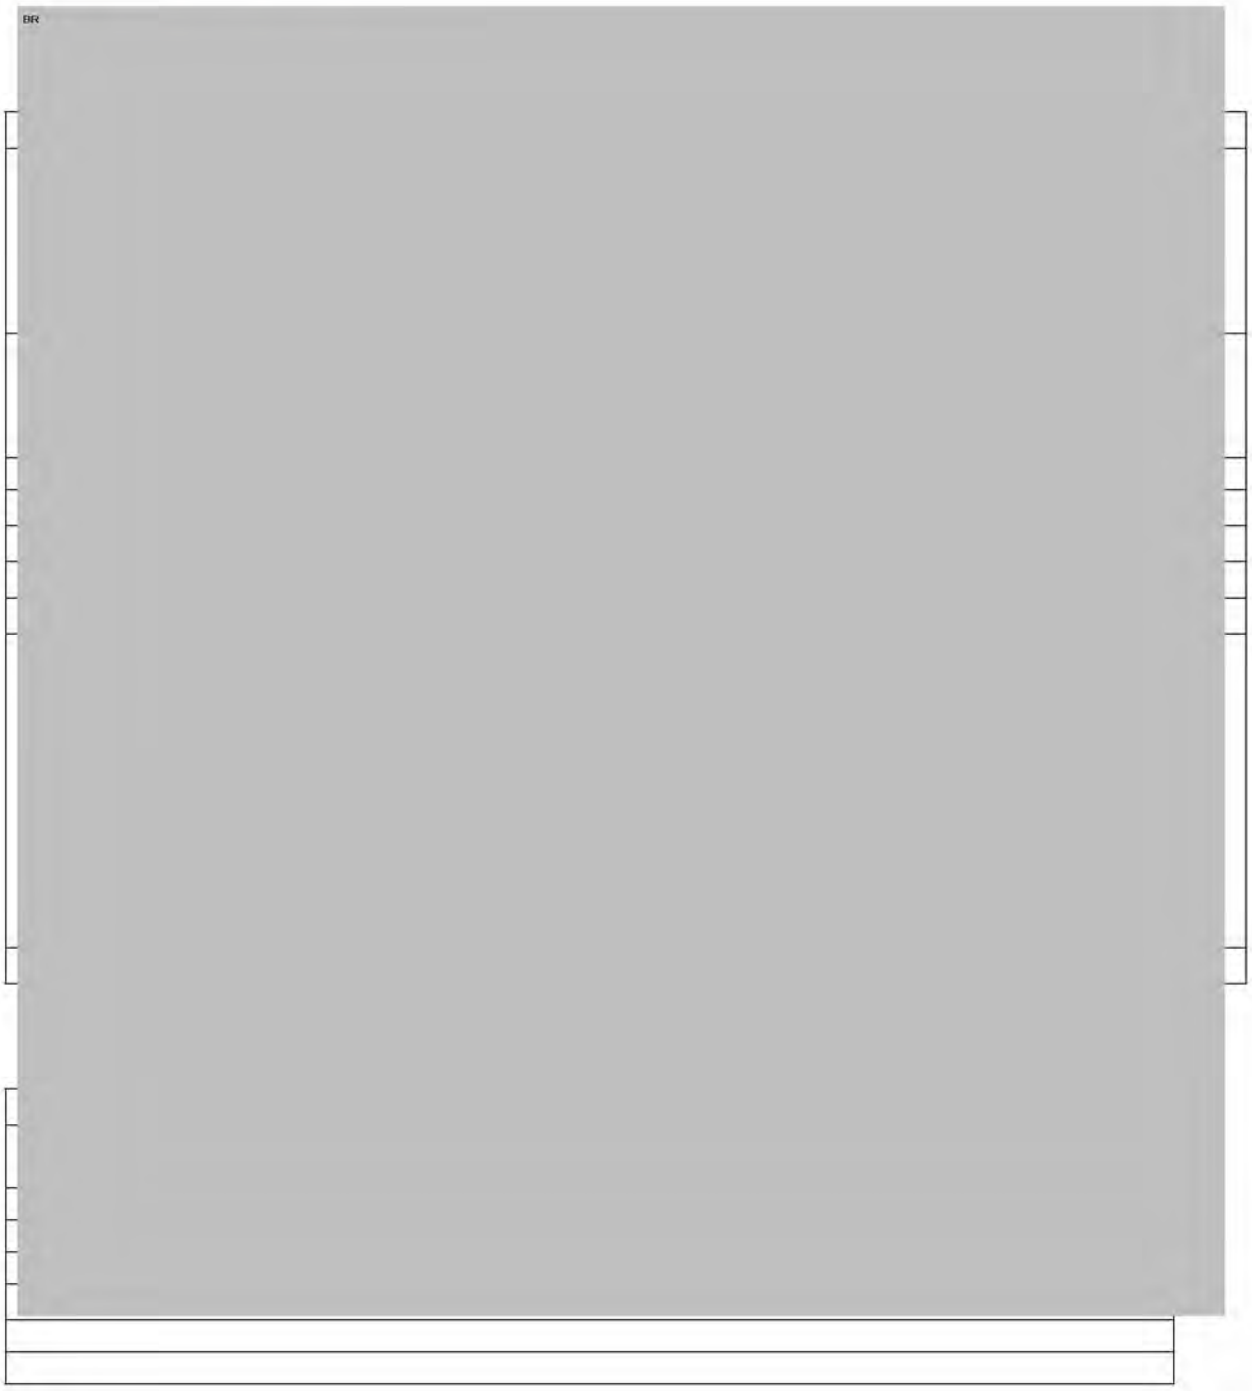
BR

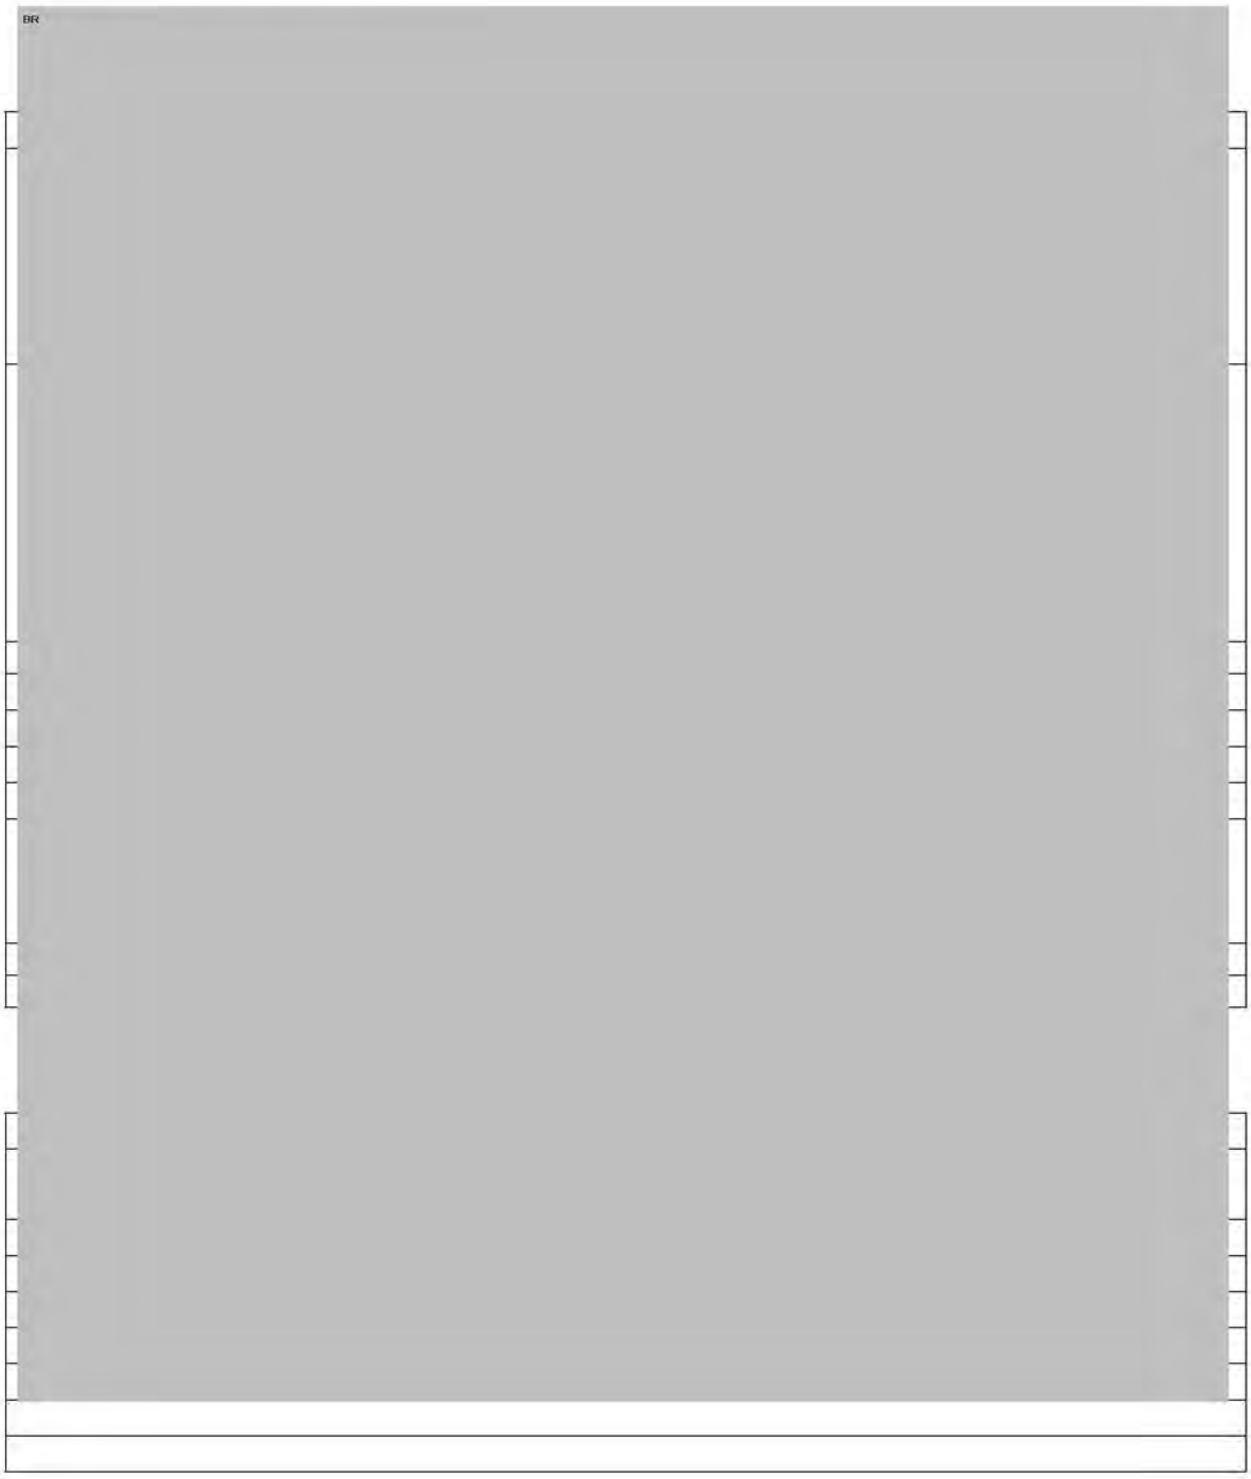
BR

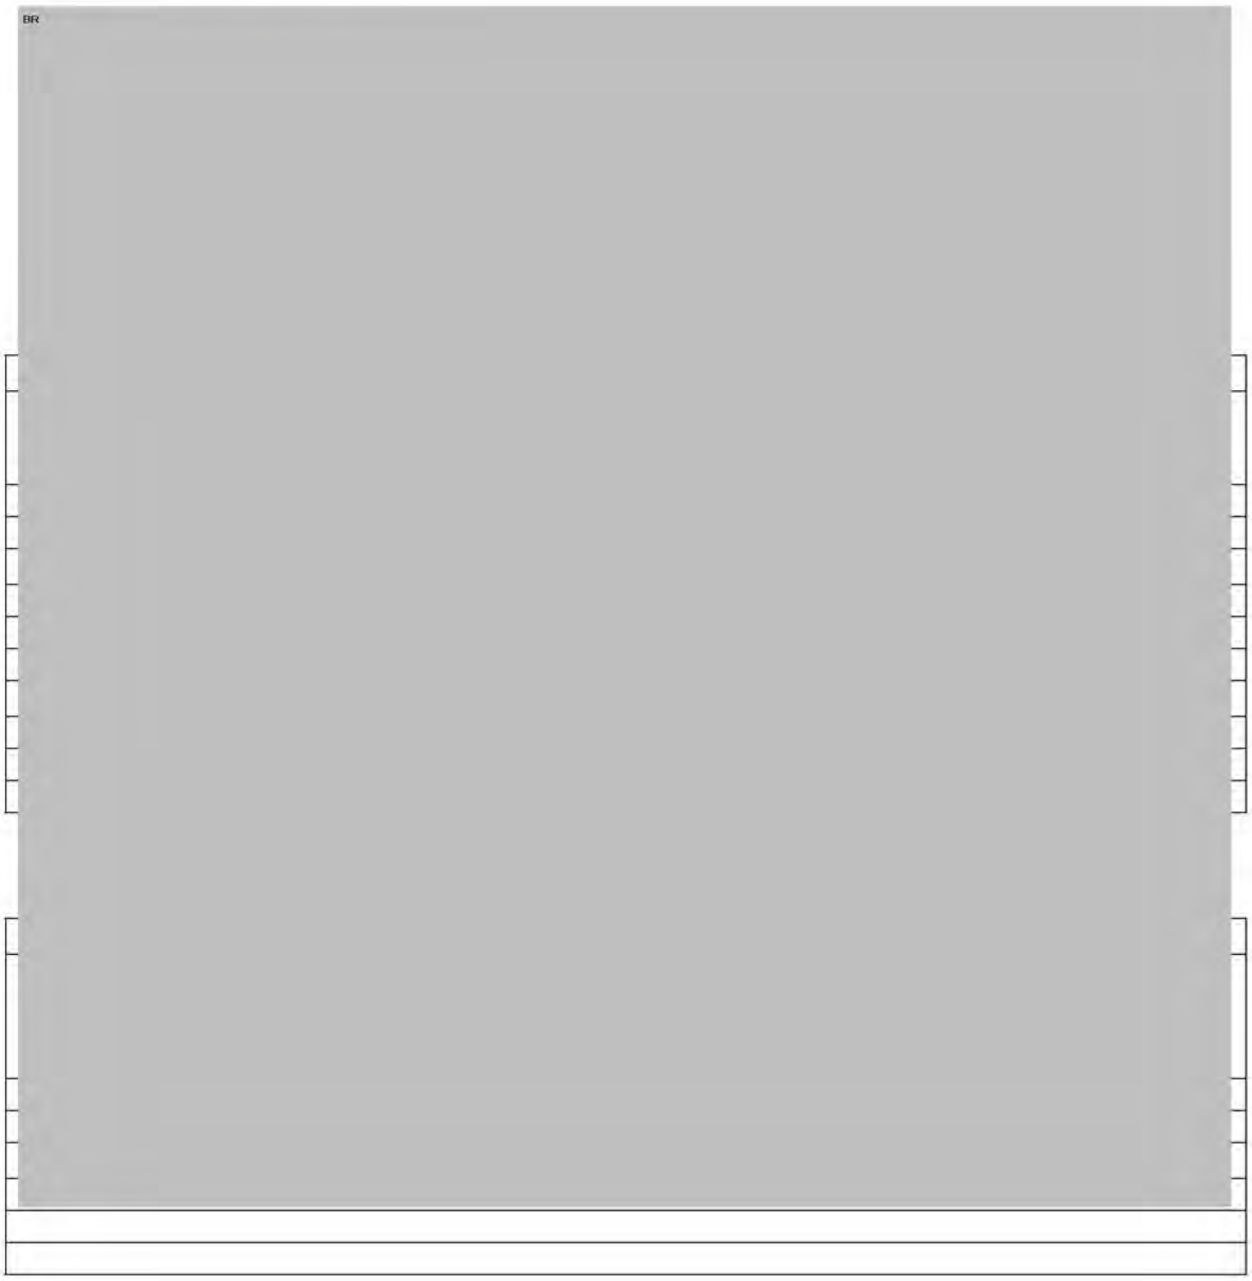
BR

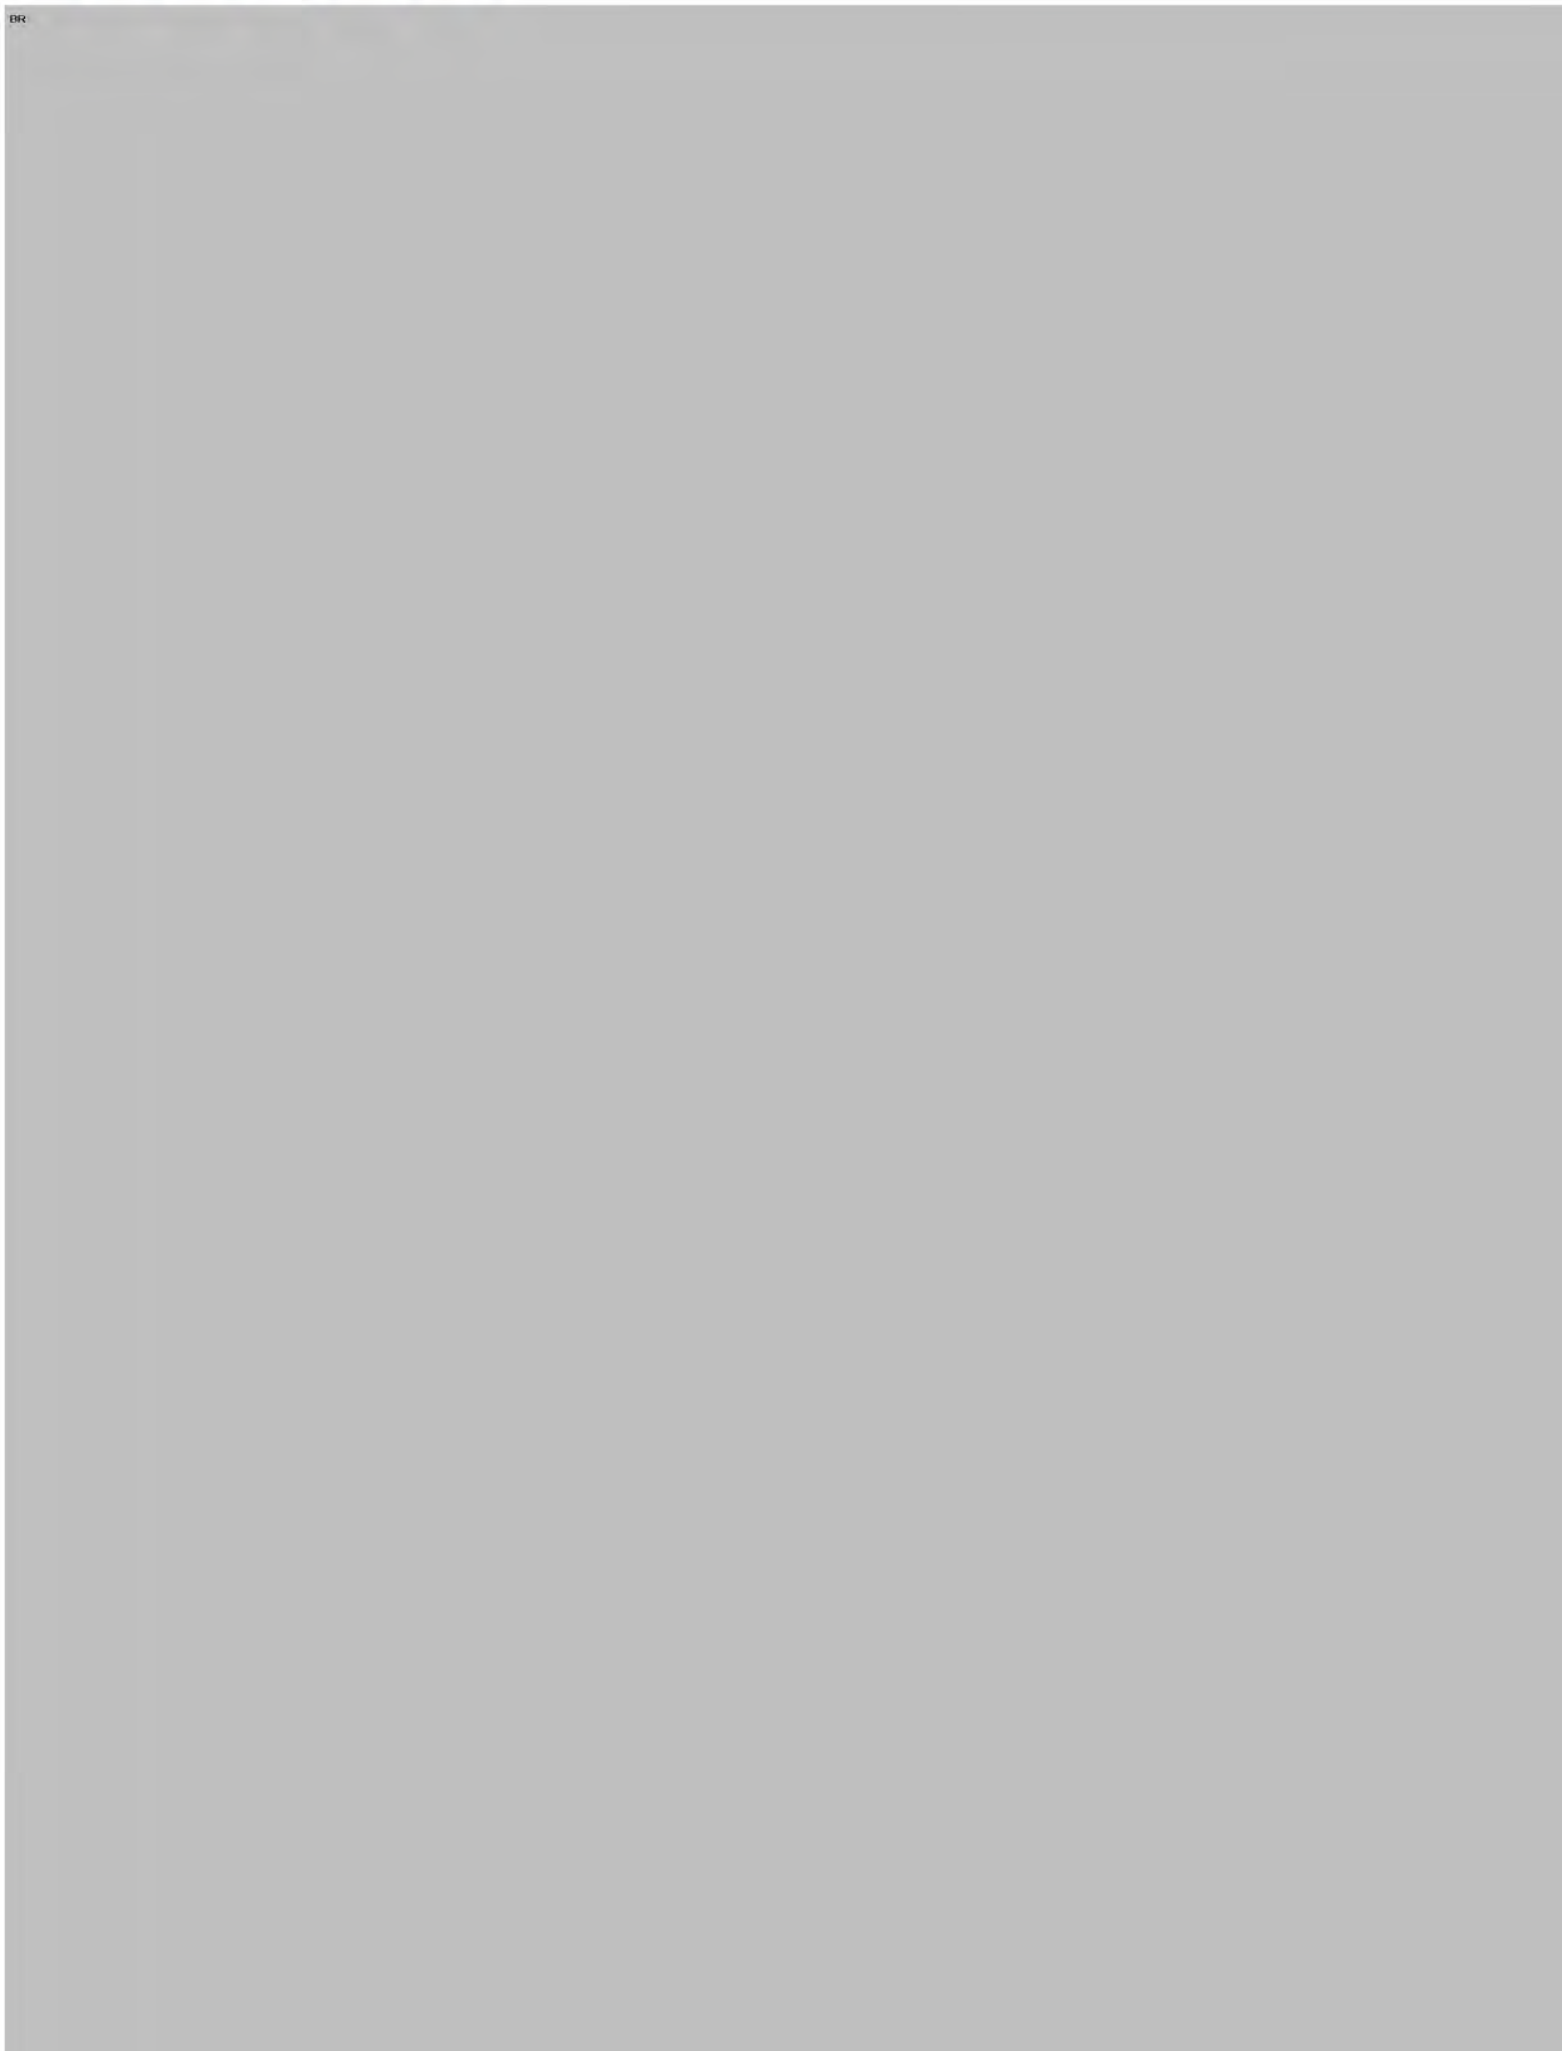
BR

Docnr1

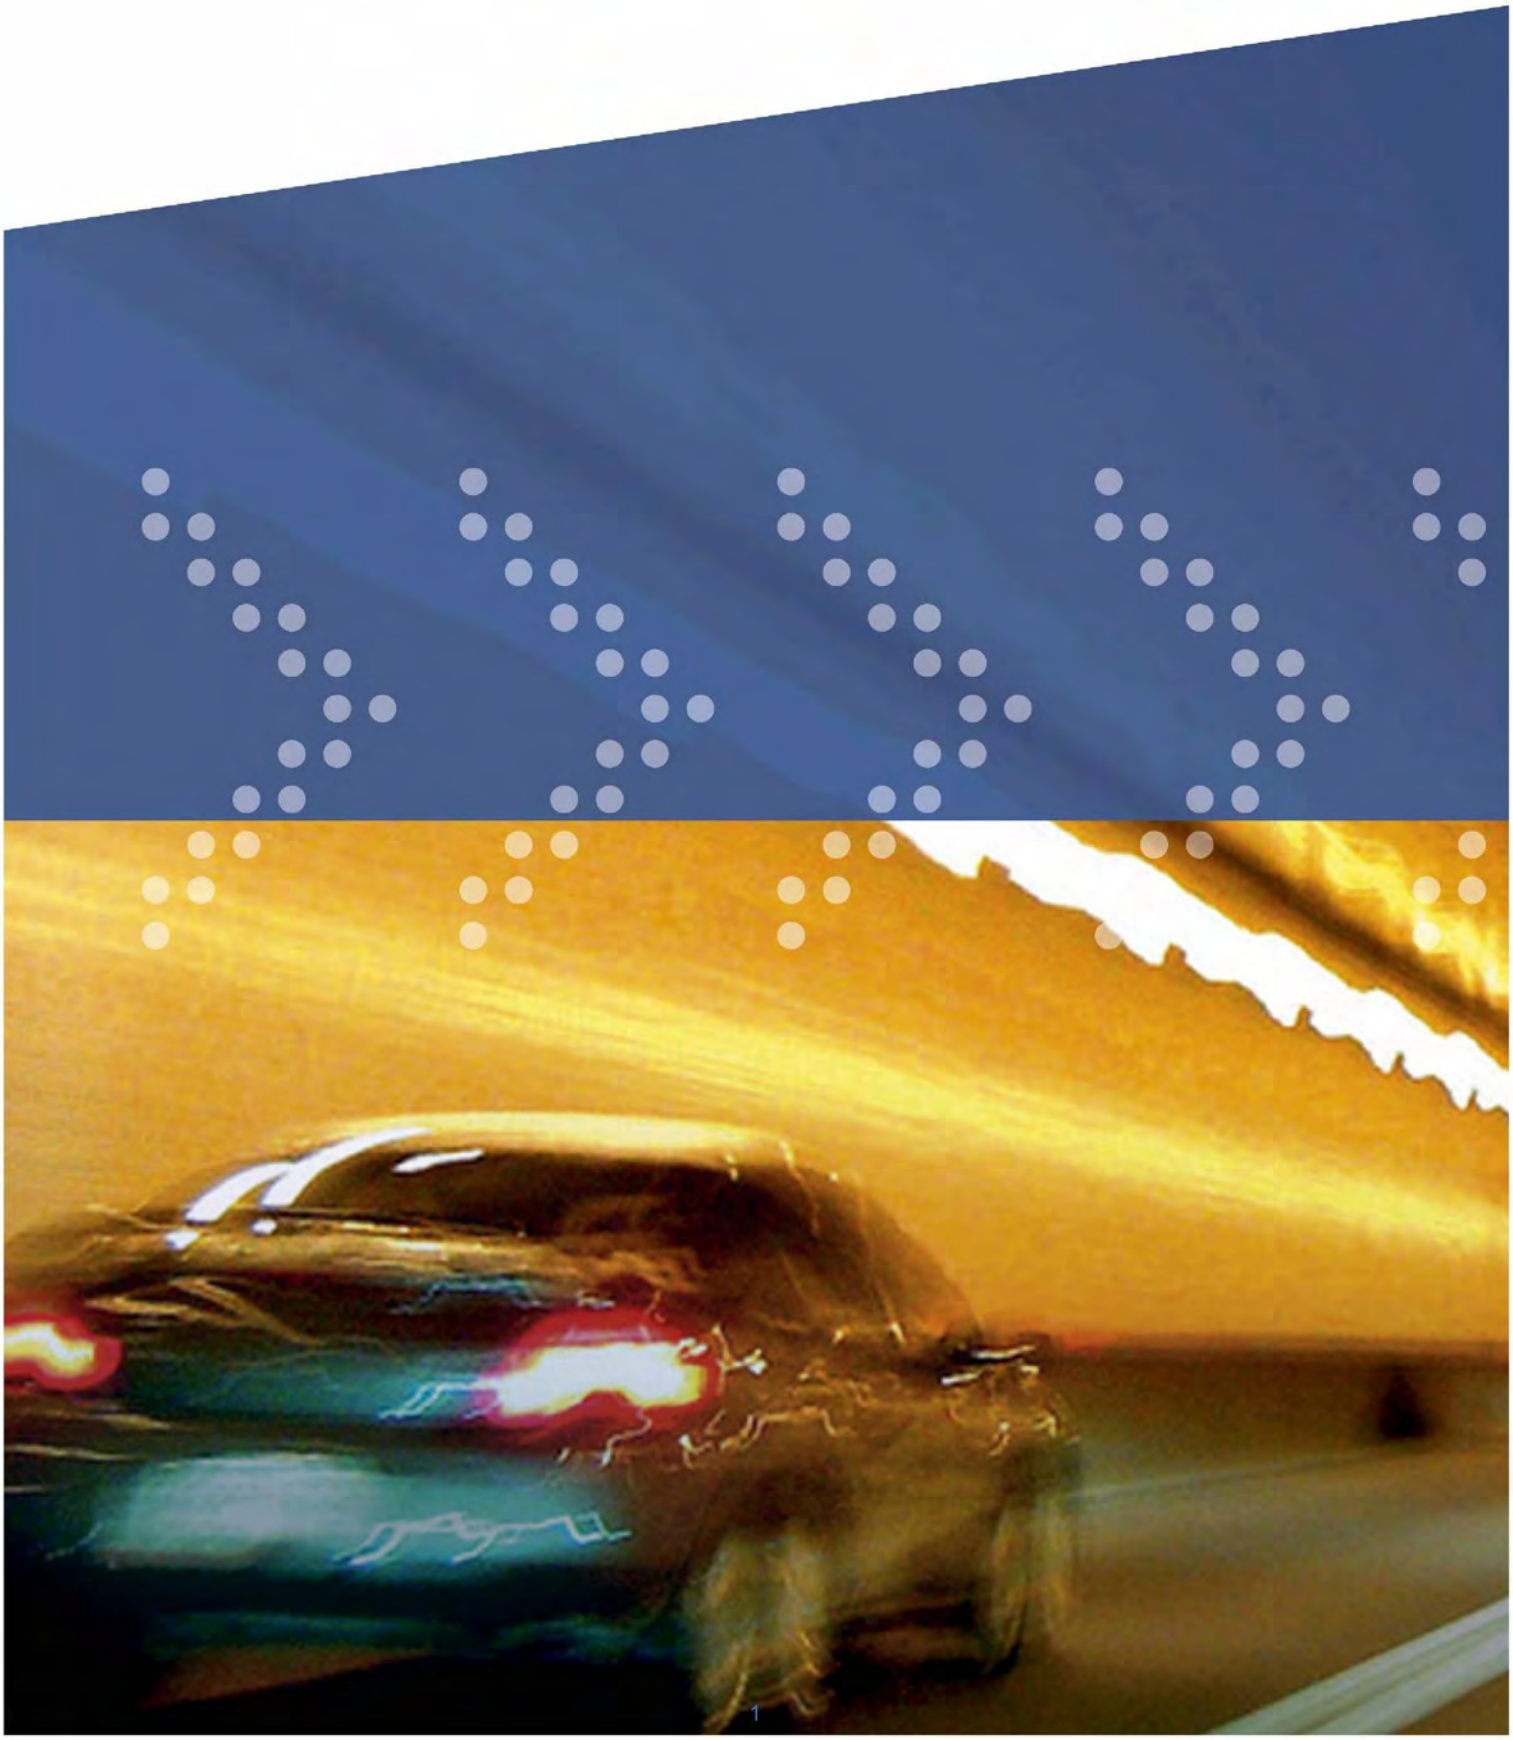

Docnr2

Gemeente Den Haag

# Rapportage 1e kwartaal 2013: Rotterdamsebaan

Datum 26 april 2013
Intern
Concept
Versie 1.0

DE ROTTERDAMSEBAAN

Docnr2

Docnr2

Kwartaalrapportage Rotterdamsebaan
Intern, Gemeente Den Haag (vertrouwelijk)

| Versie | |
|---|---|
| Concept 0.1 | 23 april 2013. vastgesteld in MT-Rotterdamsebaan |
| Concept 0.2 | 6 mei 2013 vastgesteld in OGON-Rotterdamsebaan |
| Definitief 1.0 | 13 mei 2013. t.k.n. besproken in Stuurgroep-Rotterdamsebaan/Neherkade |
| | |
| | |

| | Naam |
|---|---|
| Opgesteld door | 5.1.2.e |

# Inhoudsopgave

**INLEIDING** **5**

**1 ONTWERP** **7**
1.1 Afgelopen kwartaal 7
1.2 Komend kwartaal 7

**2 VERKEER** **8**
2.1 Afgelopen kwartaal 8
2.2 Komend kwartaal 8

**3 OMGEVINGSMANAGEMENT** **9**
3.1 Afgelopen kwartaal 9
3.2 Komend kwartaal 9

**4 PLANSTUDIES** **10**
4.1 Afgelopen kwartaal 10
4.2 Komend kwartaal 10

**5 VERLENGDE REGULUSWEG, SPOORBOOGWEG EN VERLENGDE MELKWEGSTRAAT** **11**
5.1 Afgelopen kwartaal 11
5.2 Komend kwartaal 11

**6 VERWERVING** **13**
6.1 Afgelopen kwartaal 13
6.2 Komend kwartaal 13

**7 CONDITIONERING** **14**
7.1 Afgelopen kwartaal 14
7.2 Komend kwartaal 14

**8 TUNNELVEILIGHEID** **15**
8.1 Afgelopen kwartaal 15
8.2 Komend kwartaal 15

**9 AANBESTEDEN EN CONTRACTERING** **16**
9.1 Afgelopen kwartaal 16
9.2 Komend kwartaal 16

**10 COMMUNICATIE** **18**
10.1 Afgelopen kwartaal 18
10.2 Komend kwartaal 18

**11 FINANCIËN** **19**
11.1 Kostenstructuur 19

**12 RISICOBEHEER** **21**
12.1 Afgelopen kwartaal 21
12.2 Komend kwartaal 21
12.3 Top 10 financiële risico's 21

12.4 Top 10 planningsrisico's 22

**13 PLANNING 25**
13.1 Afgelopen kwartaal 25
13.2 Komend kwartaal 25

**14 INFORMATIEBEHEER 26**
14.1 Afgelopen kwartaal 26
14.2 Komend kwartaal 26

**15 CONTRACTBEHEER 27**
15.1 Afgelopen kwartaal 27
15.2 Komend kwartaal 27

**16 KWALITEIT 28**
16.1 Afgelopen kwartaal 28
16.2 Komend kwartaal 28

**17 ORGANISATIE 29**
17.1 Afgelopen kwartaal 29
17.2 Komend kwartaal 29

**18 GERELATEERDE PROJECTEN 30**
18.1 Trekfietstracé 30
18.1.1 Afgelopen kwartaal 30
18.1.2 Komende kwartaal 30
18.1.3 Toprisico's 30

**BIJLAGE 1 : FORMAT GRIP OP GROTE PROJECTEN 32**

BR

# 1 ONTWERP

## 1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige kwartaalrapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Overeenstemming bereiken met Delfland over het toepassen van een persleiding voor Molensloot | Delfland is in principe akkoord met toepassing van persleiding. Definitieve afspraken worden gemaakt obv totale waterhuishoudkundig plan, dat is afhankelijk van overeenstemming met Drievliet over locatie van het parkeerterrein. |
| BR | |

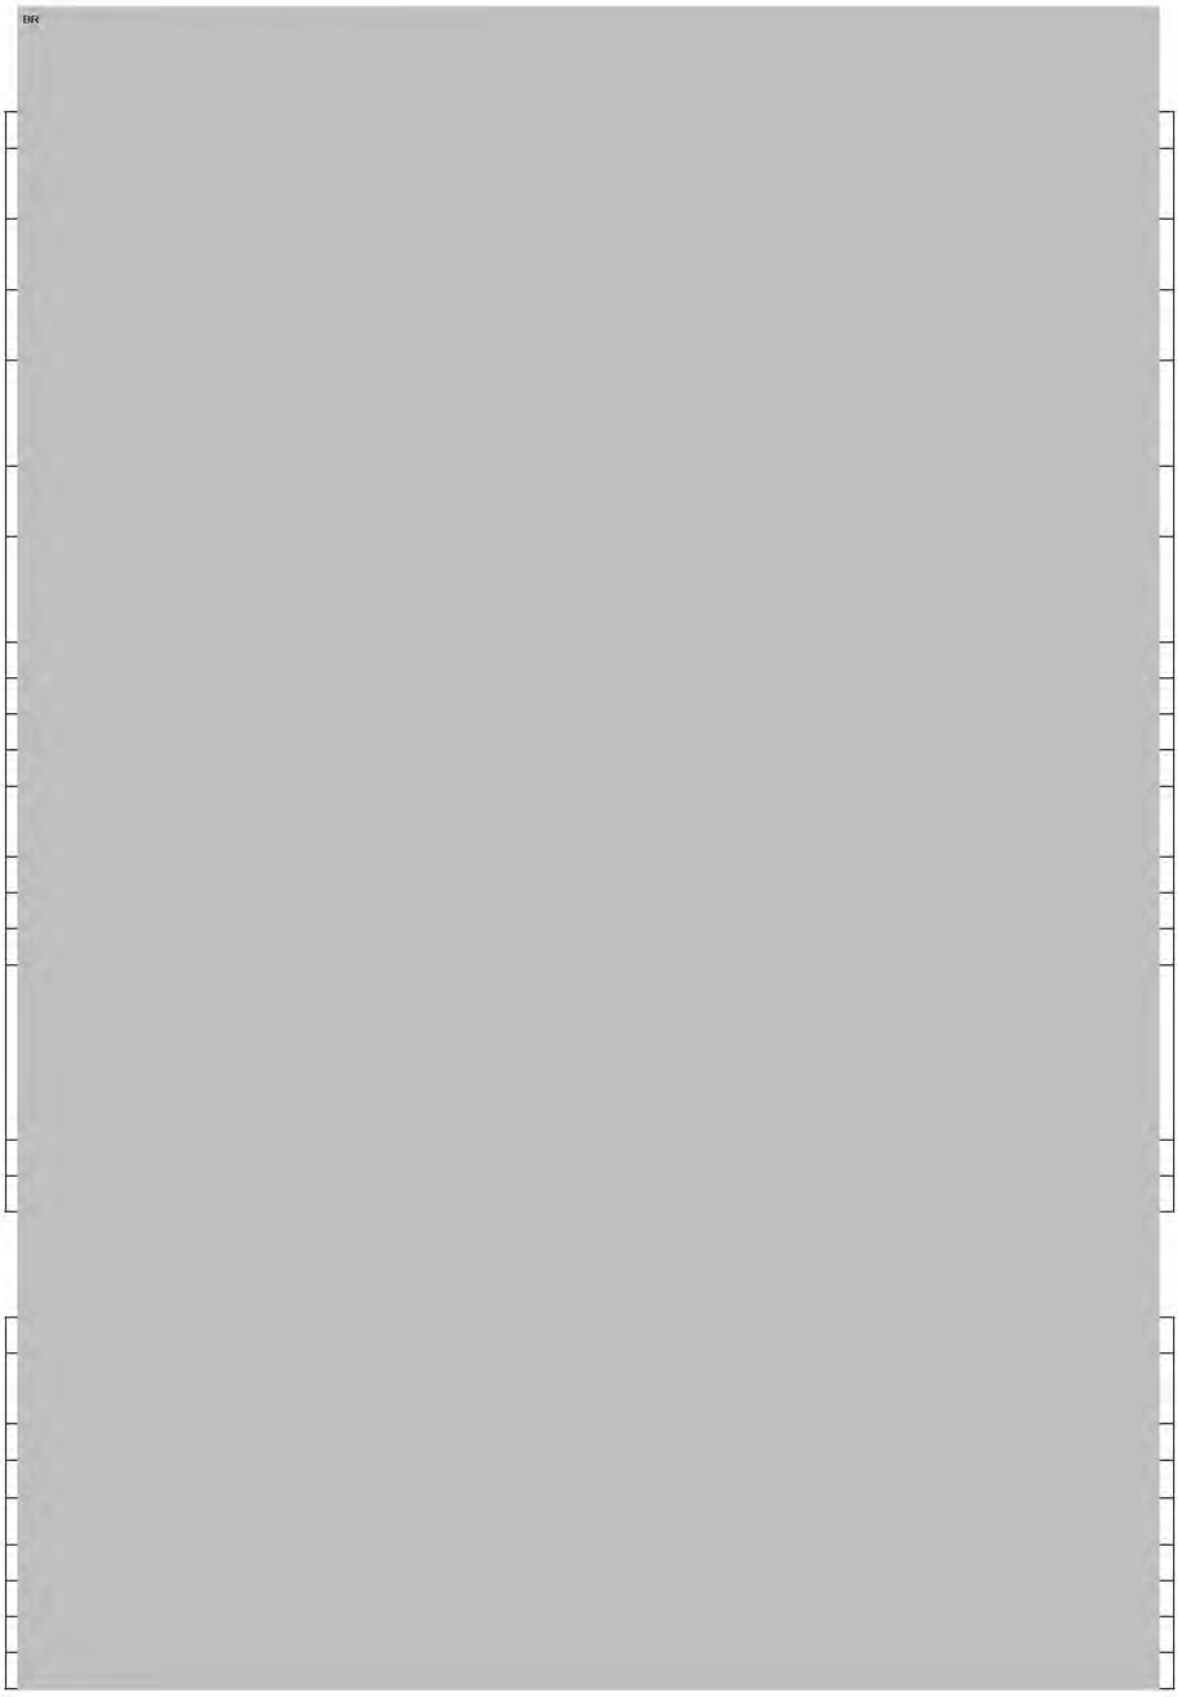

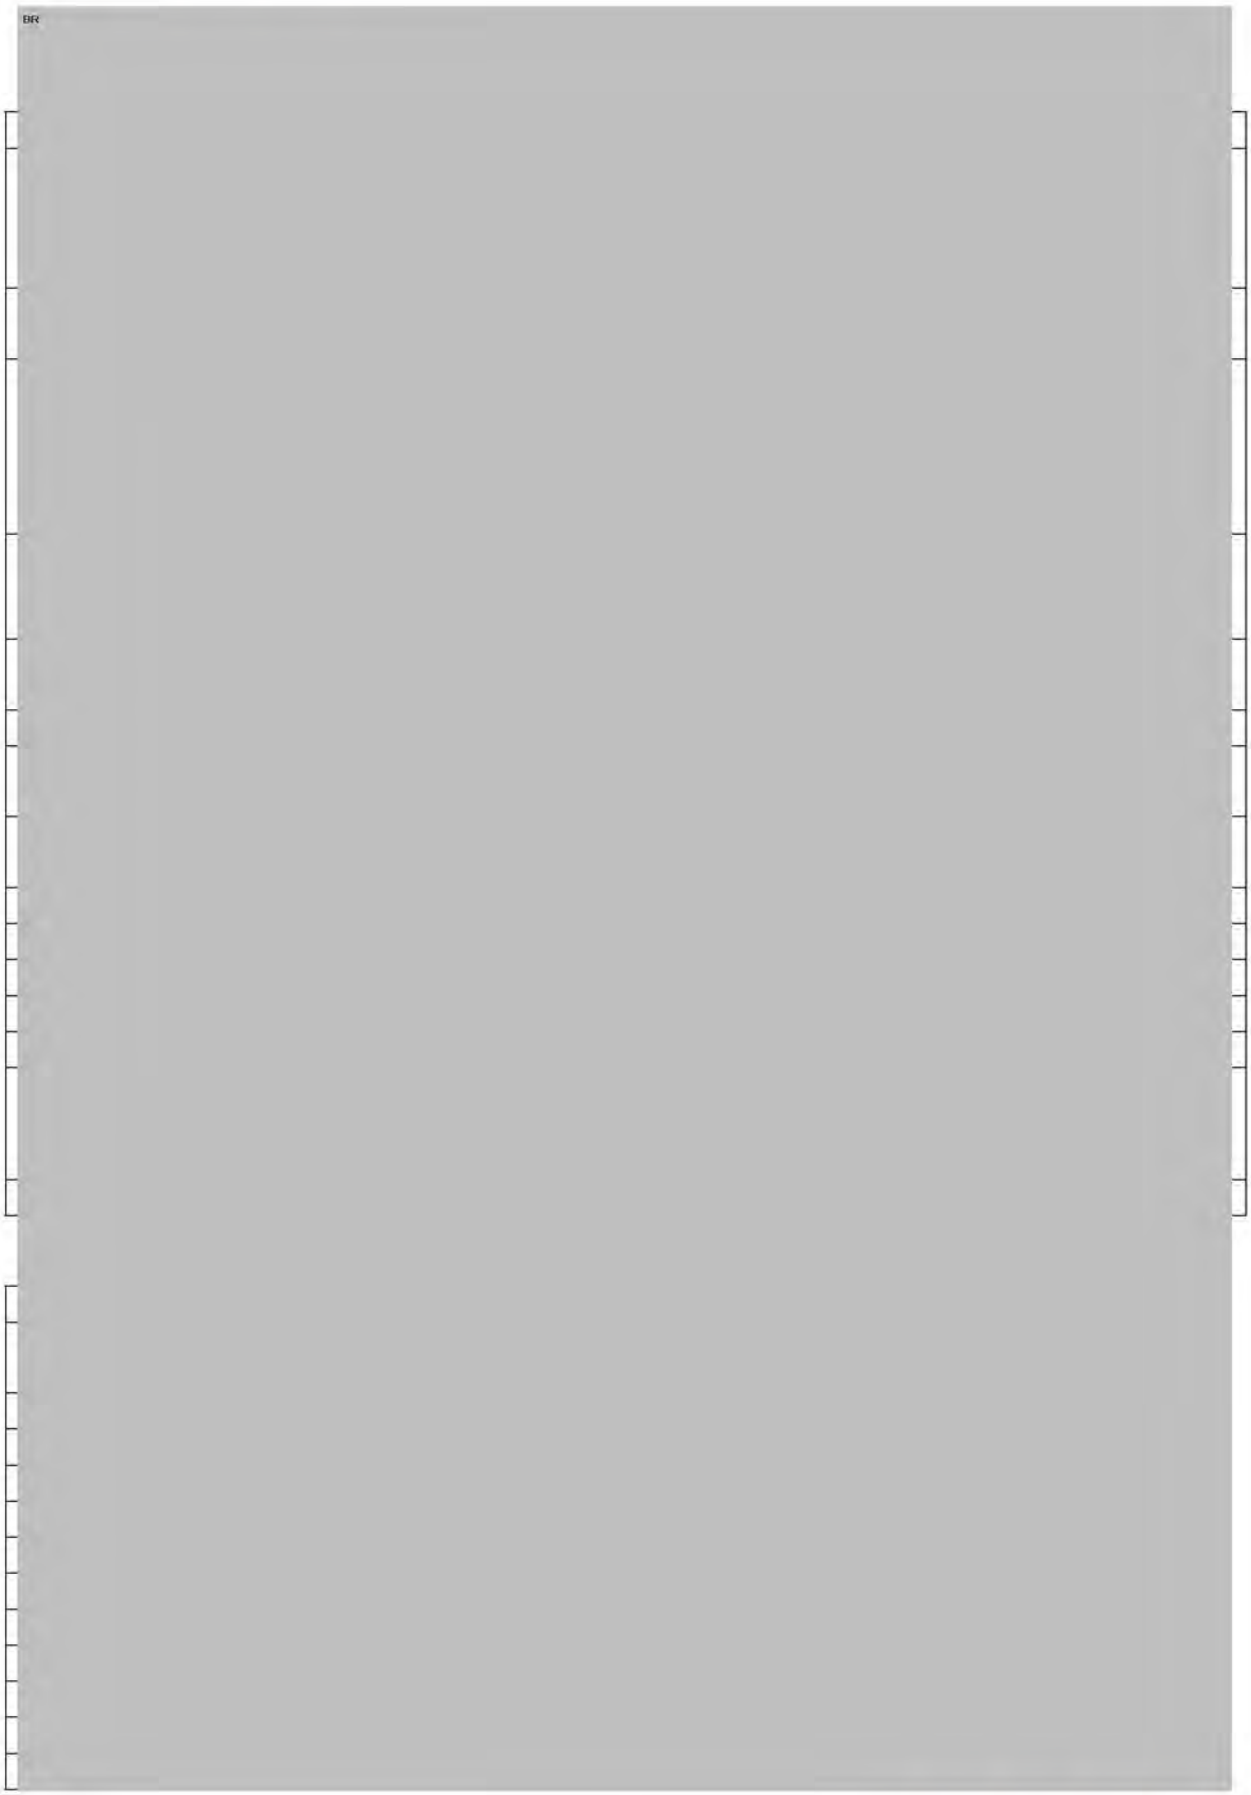

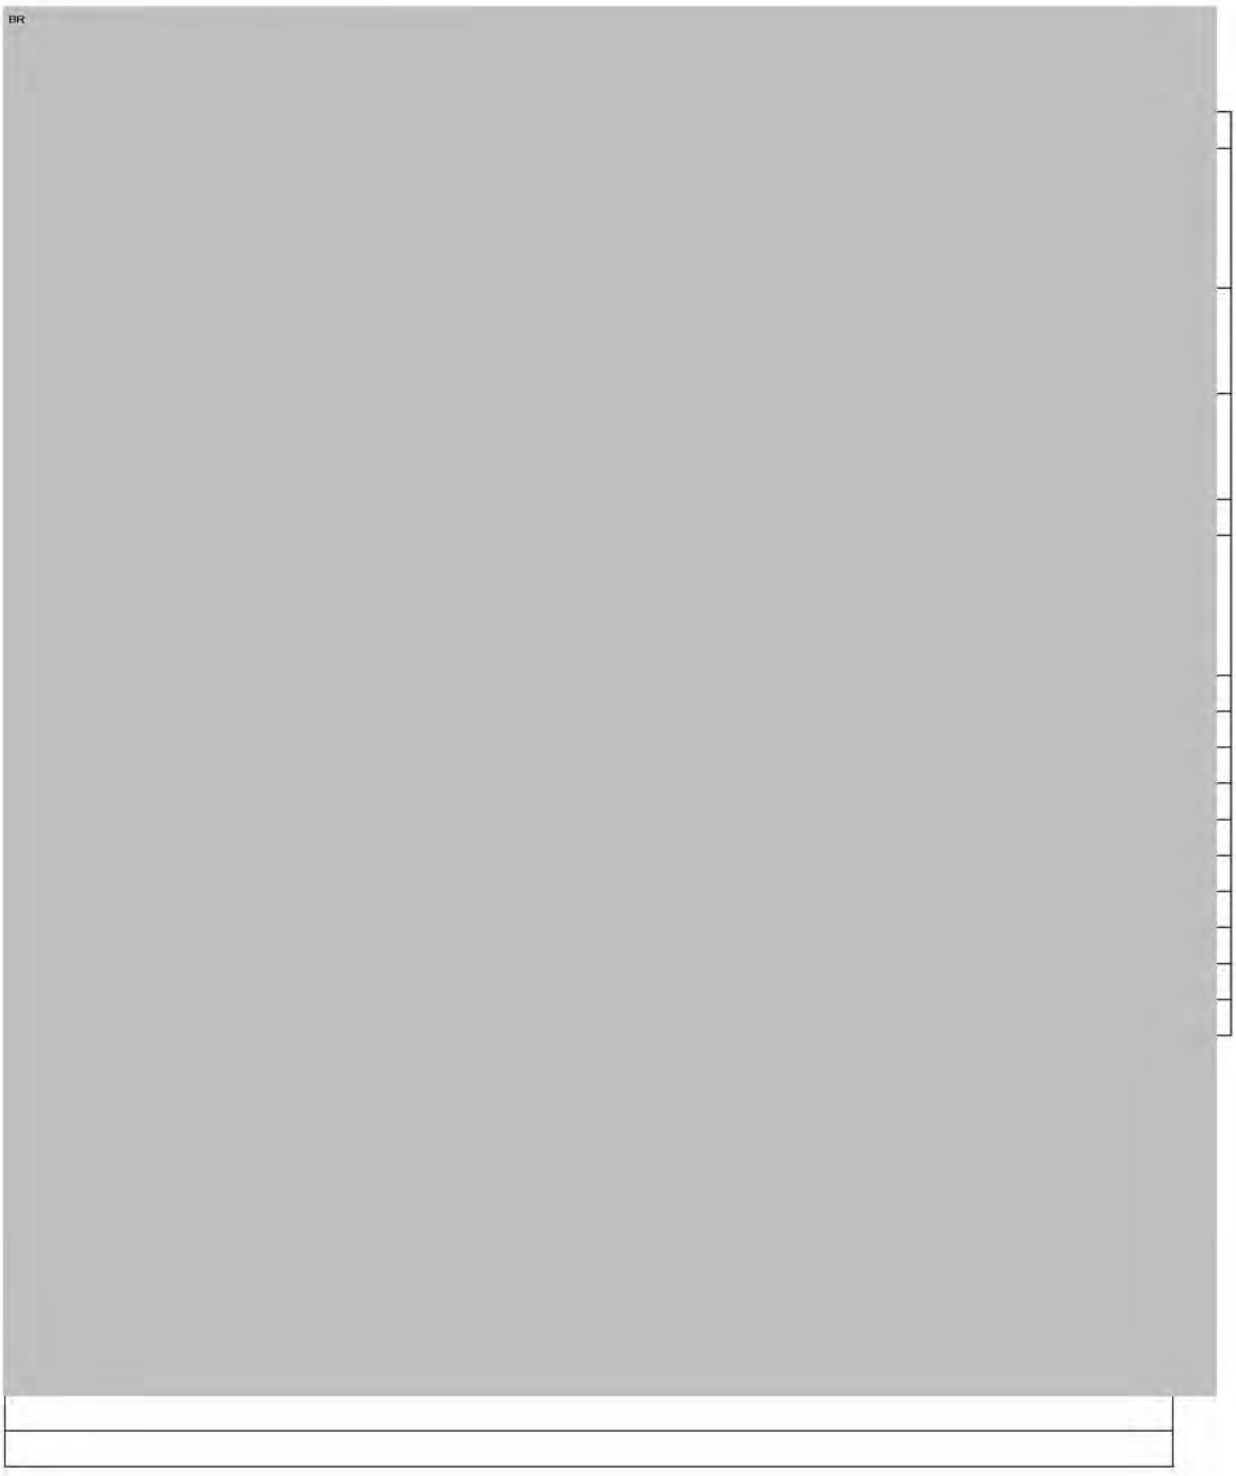
BR

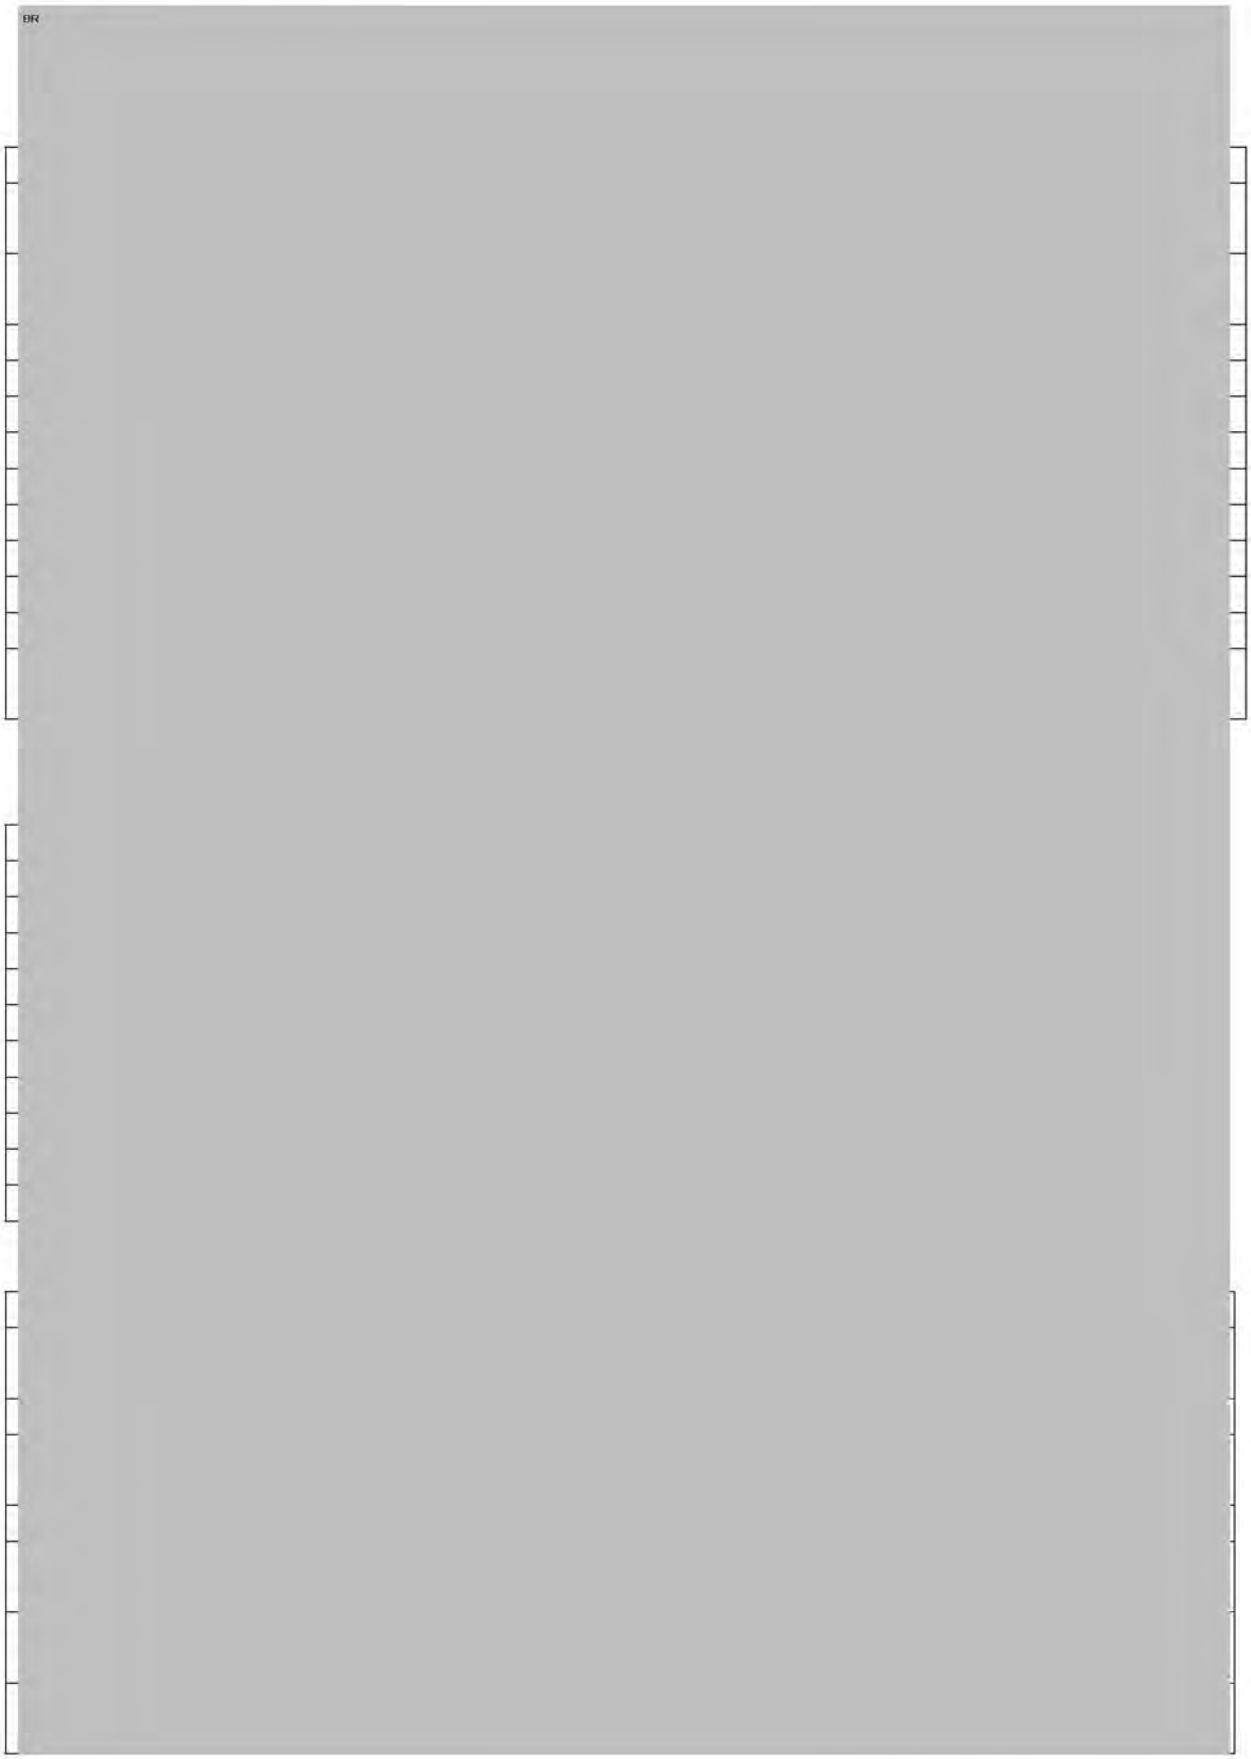
BR

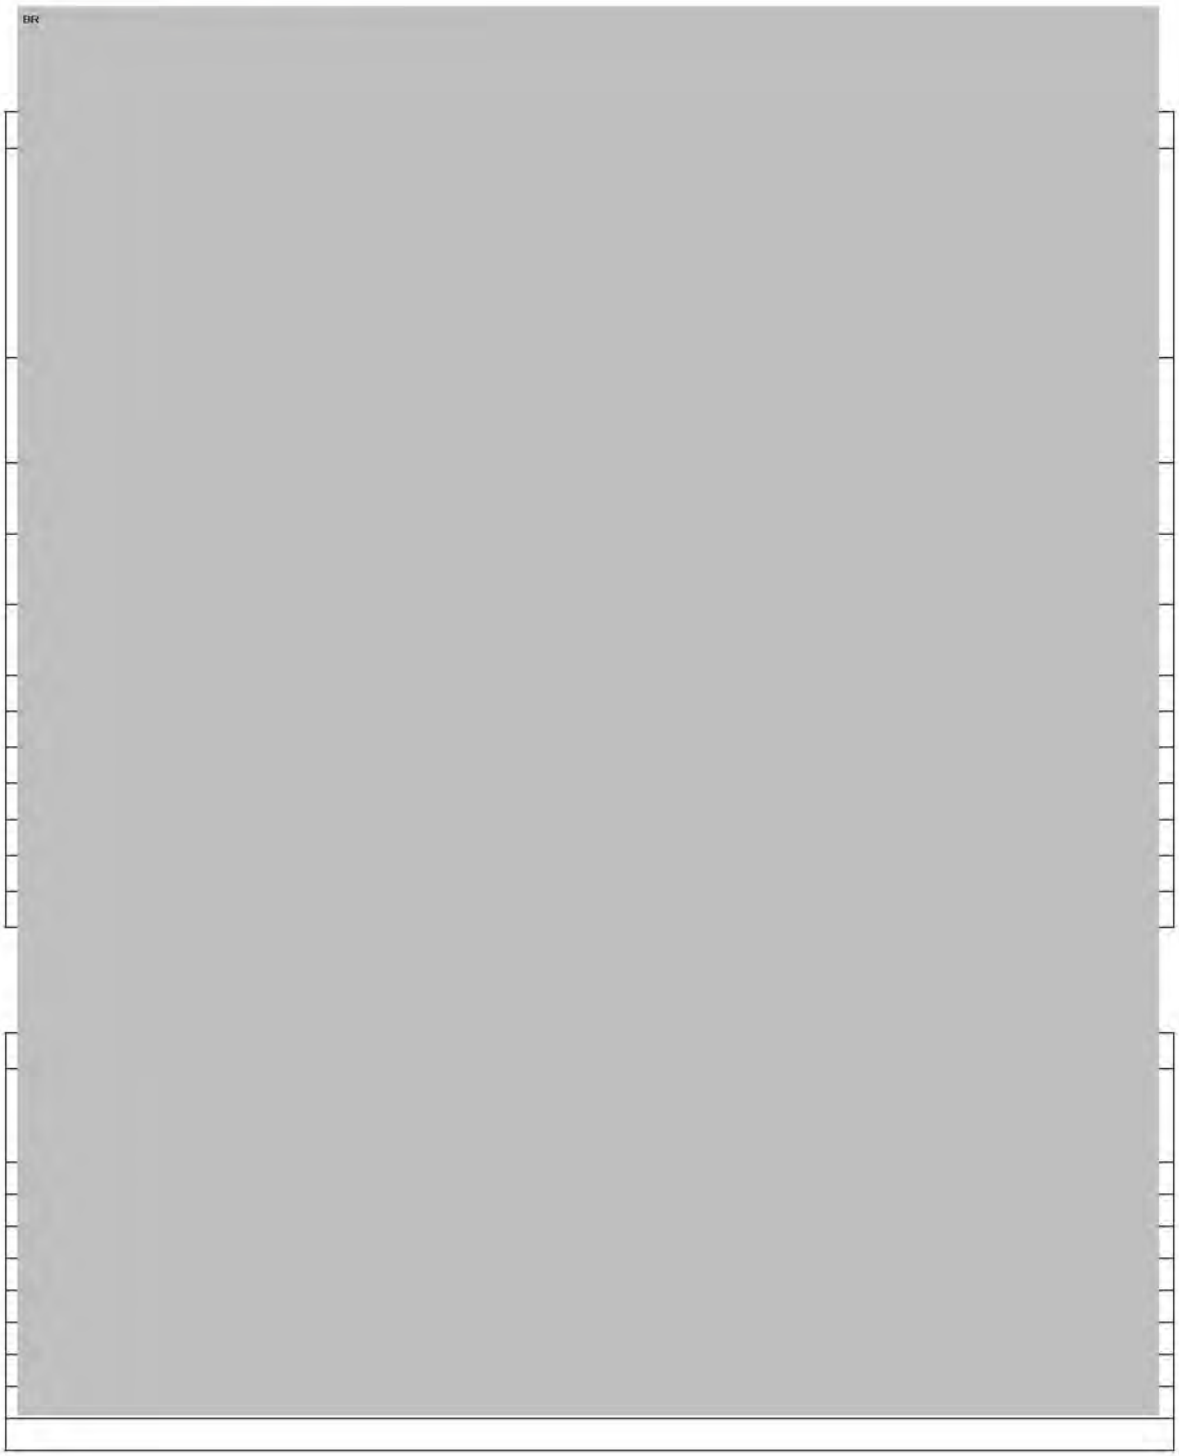
BR

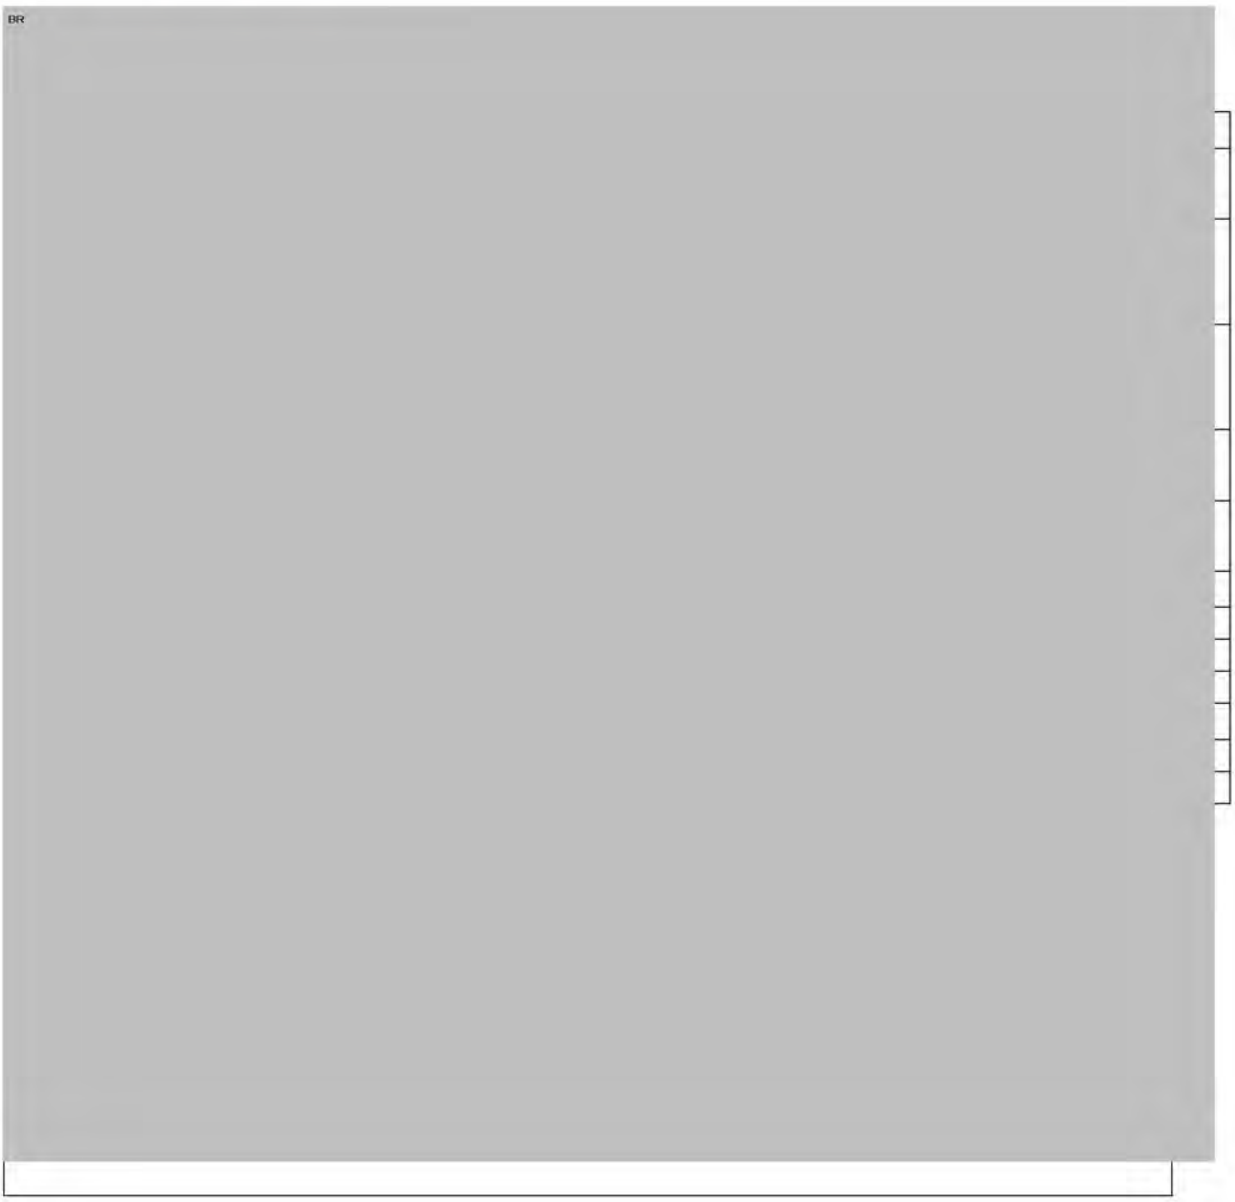
BR

BR

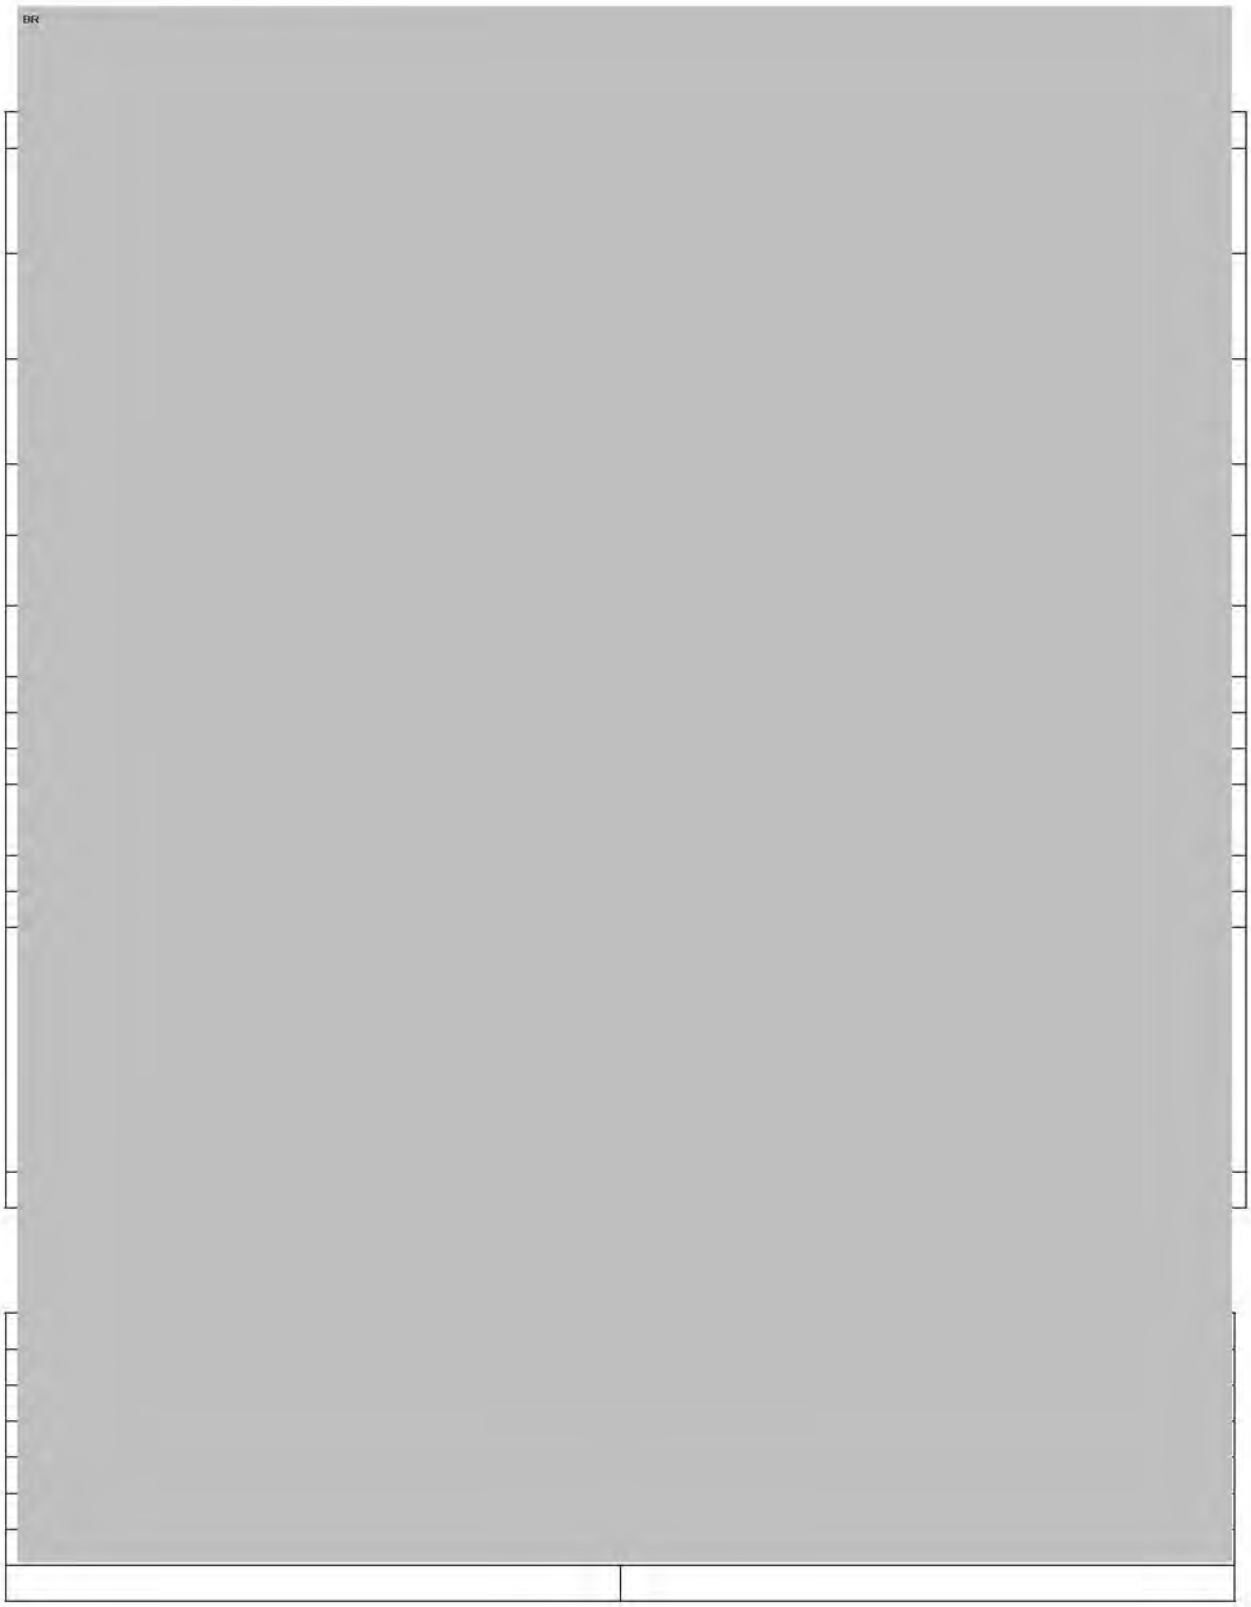

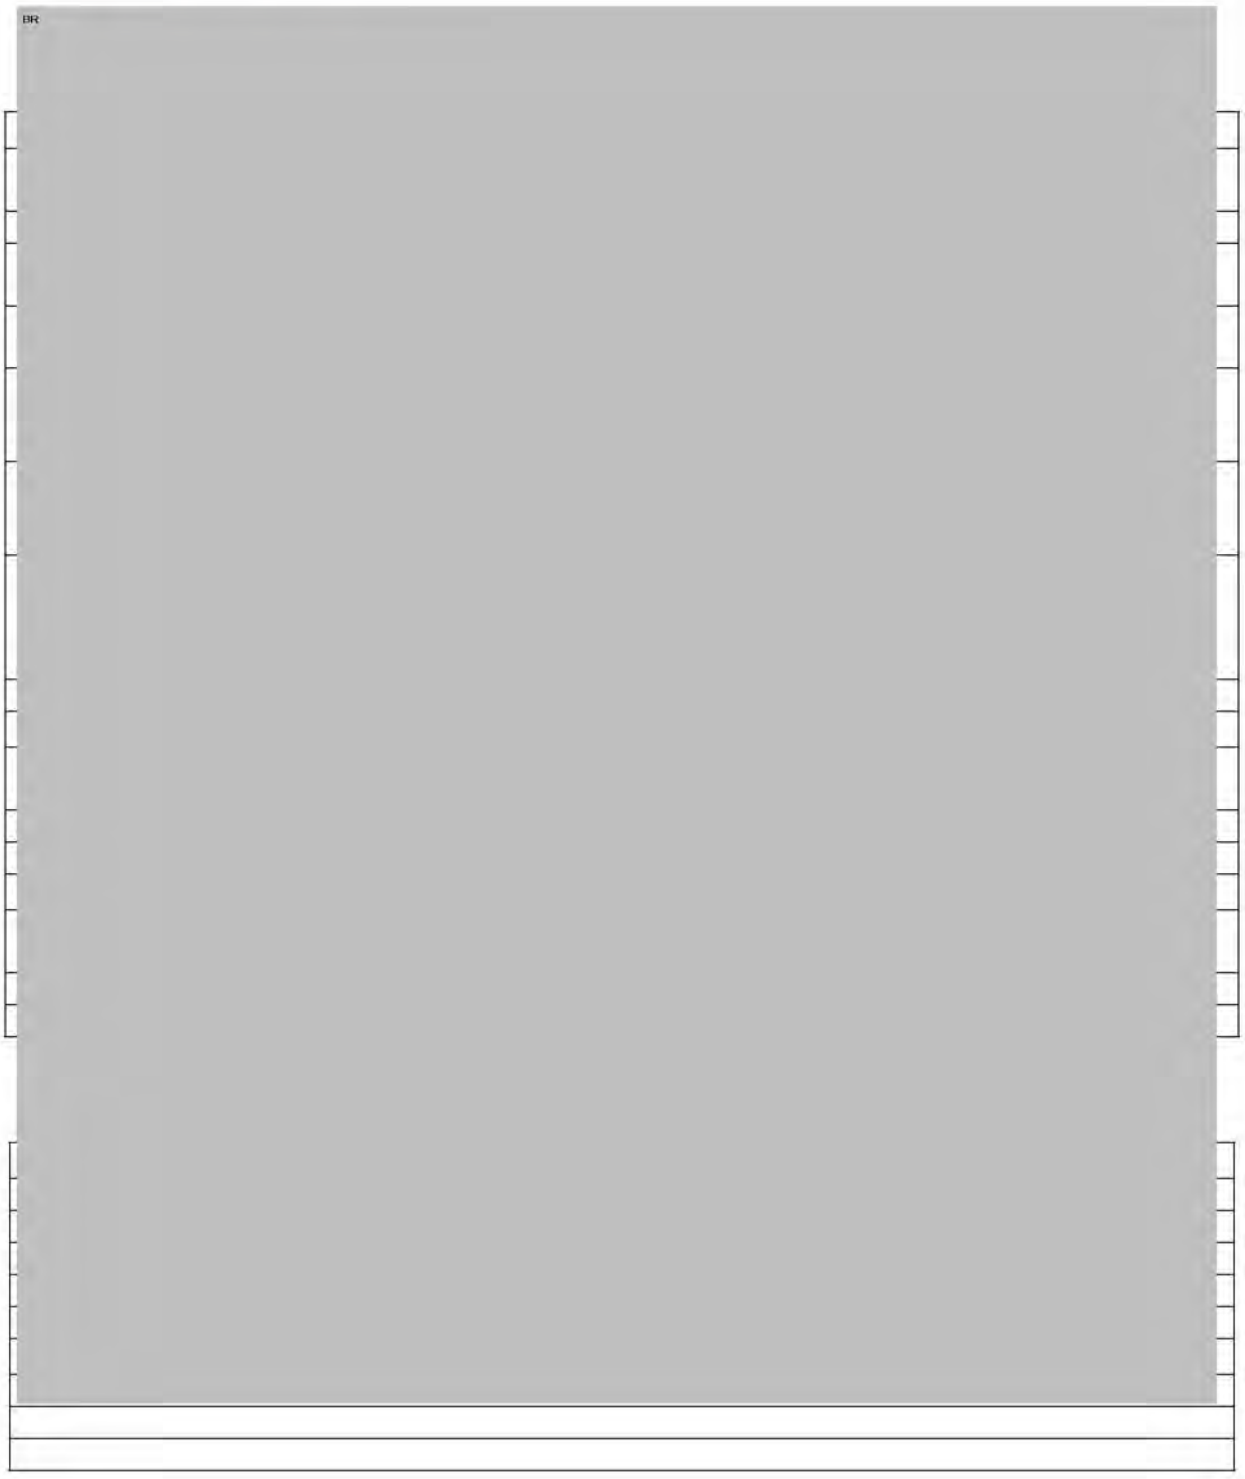
BR

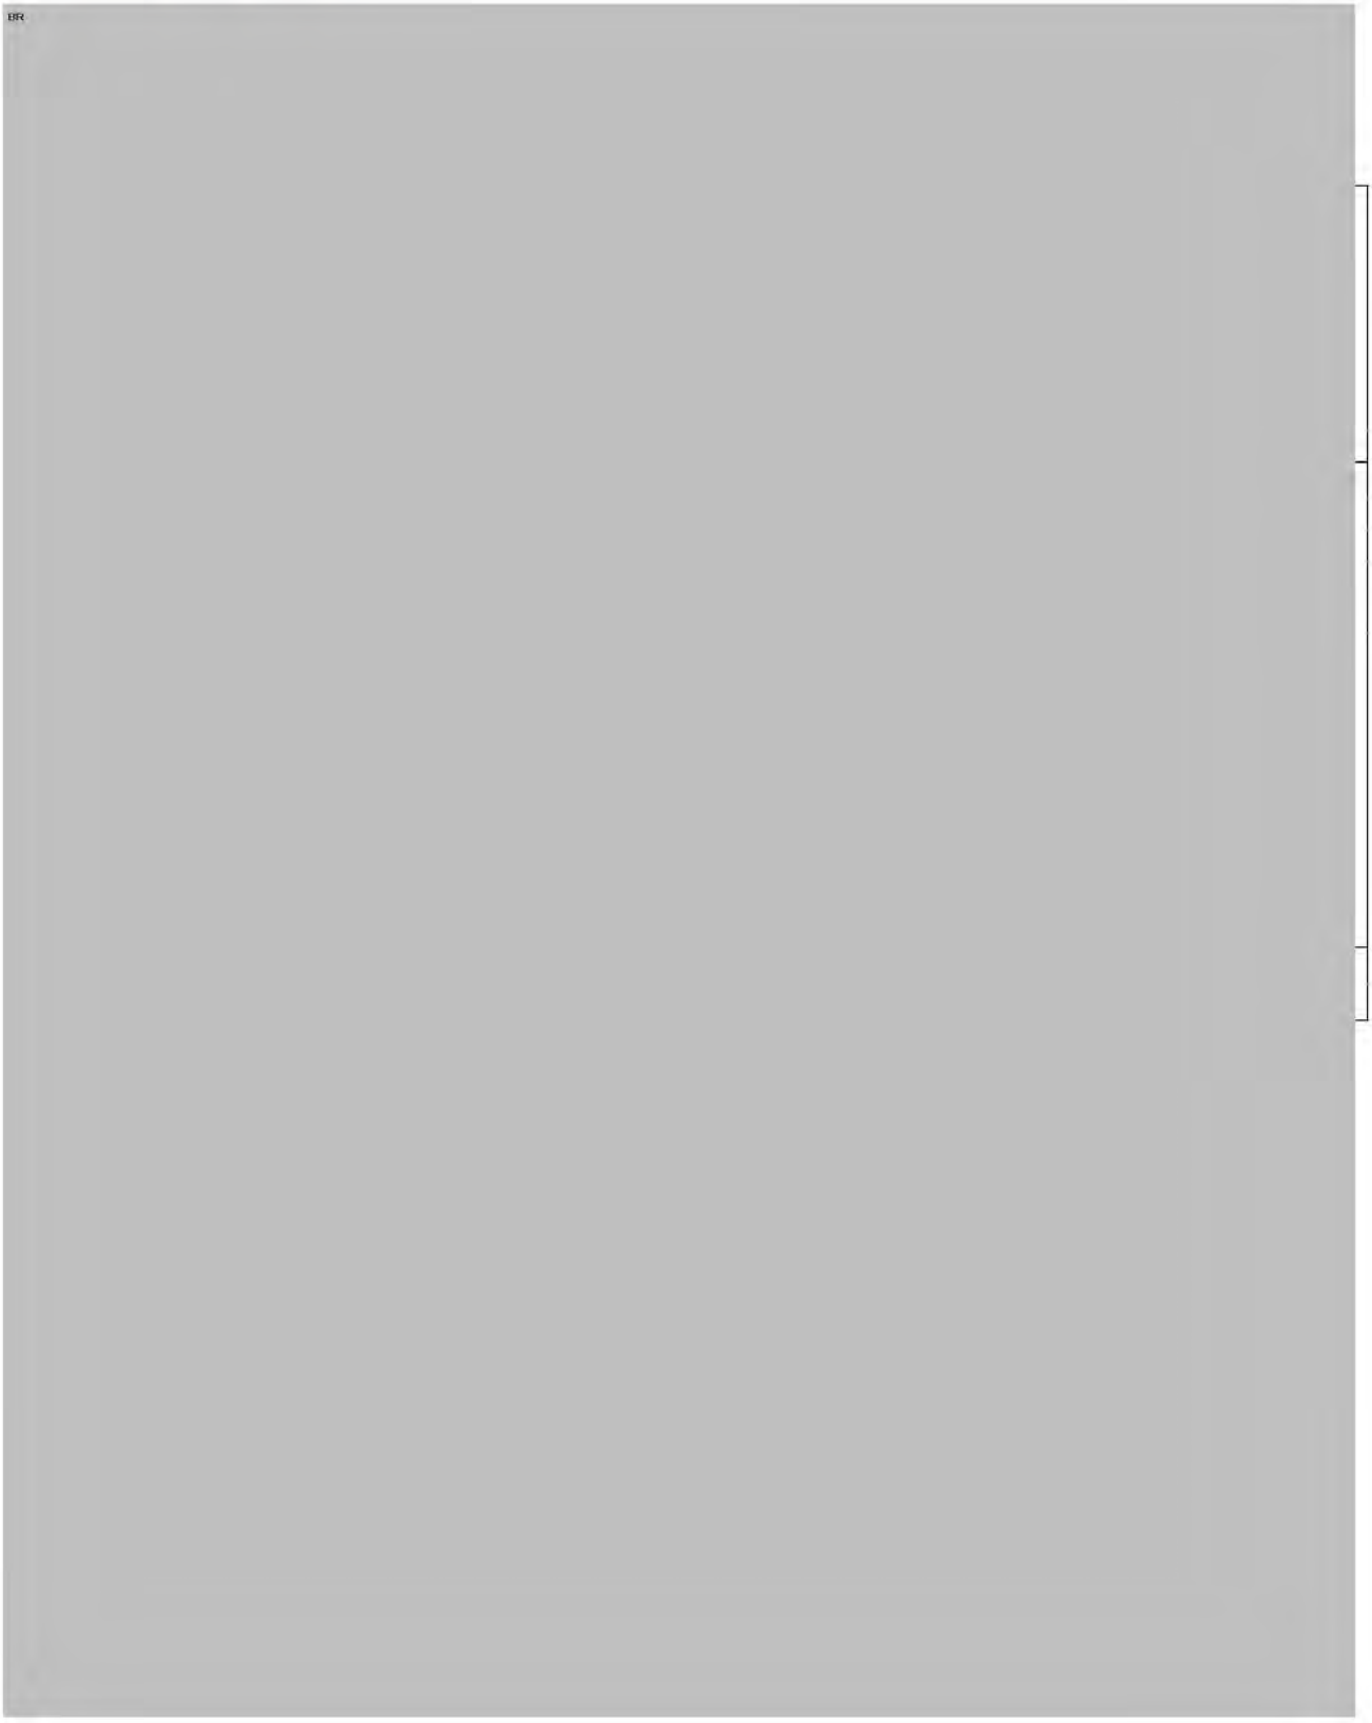

BR

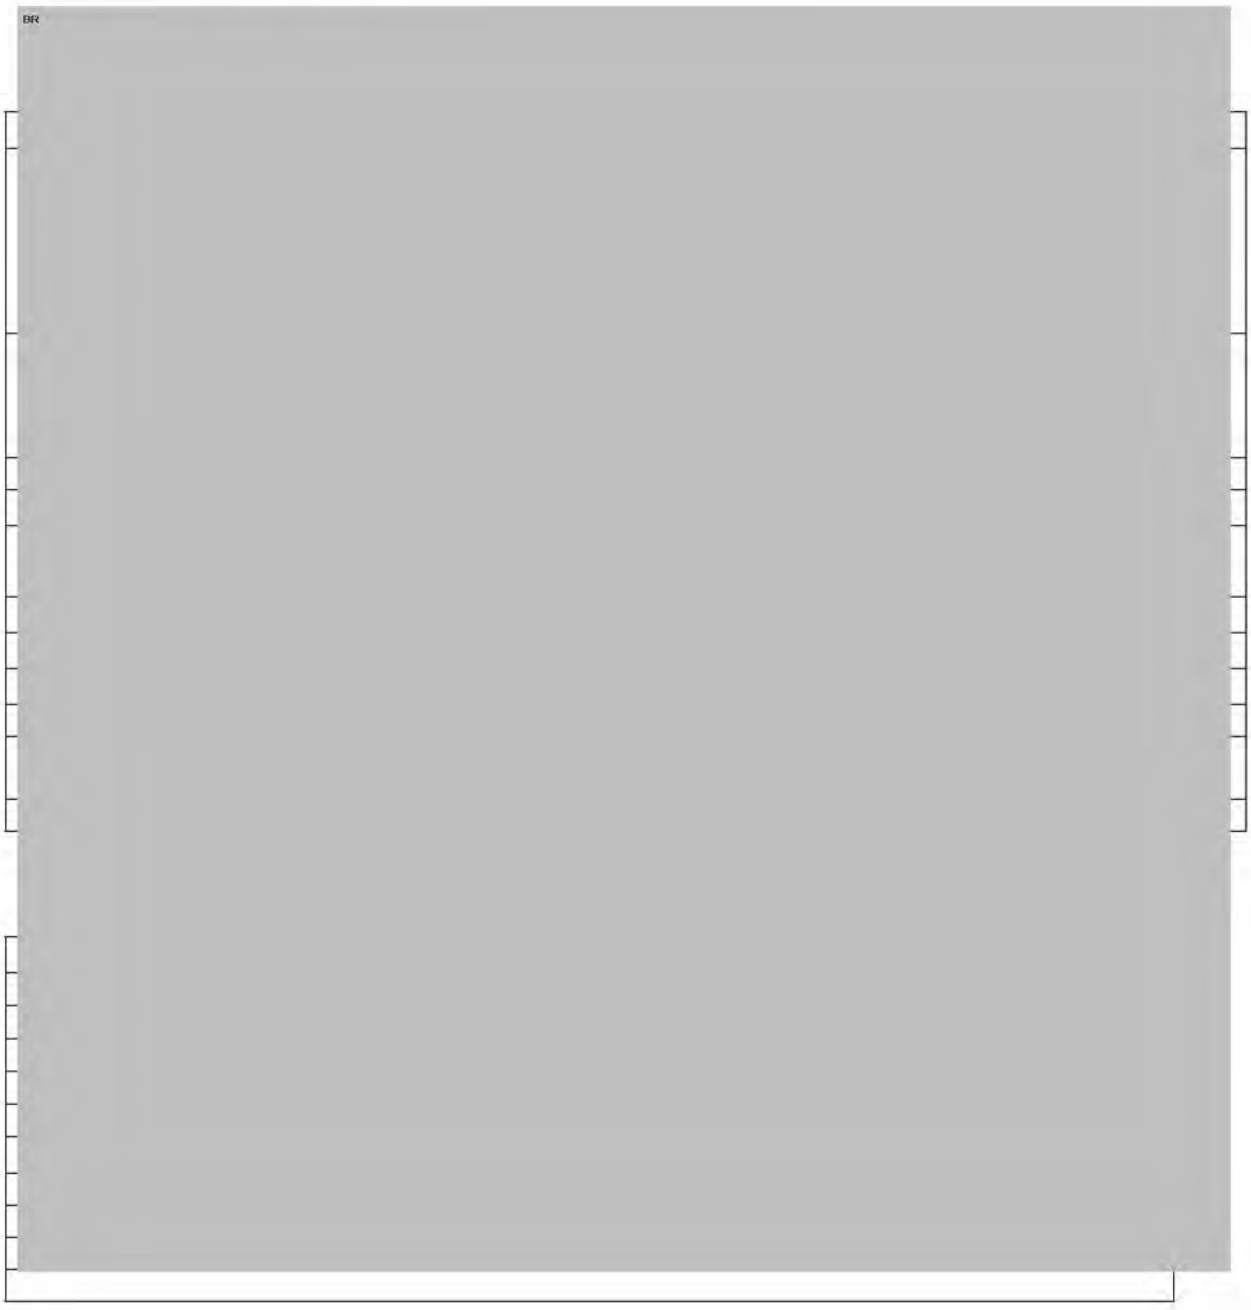
BR

BR

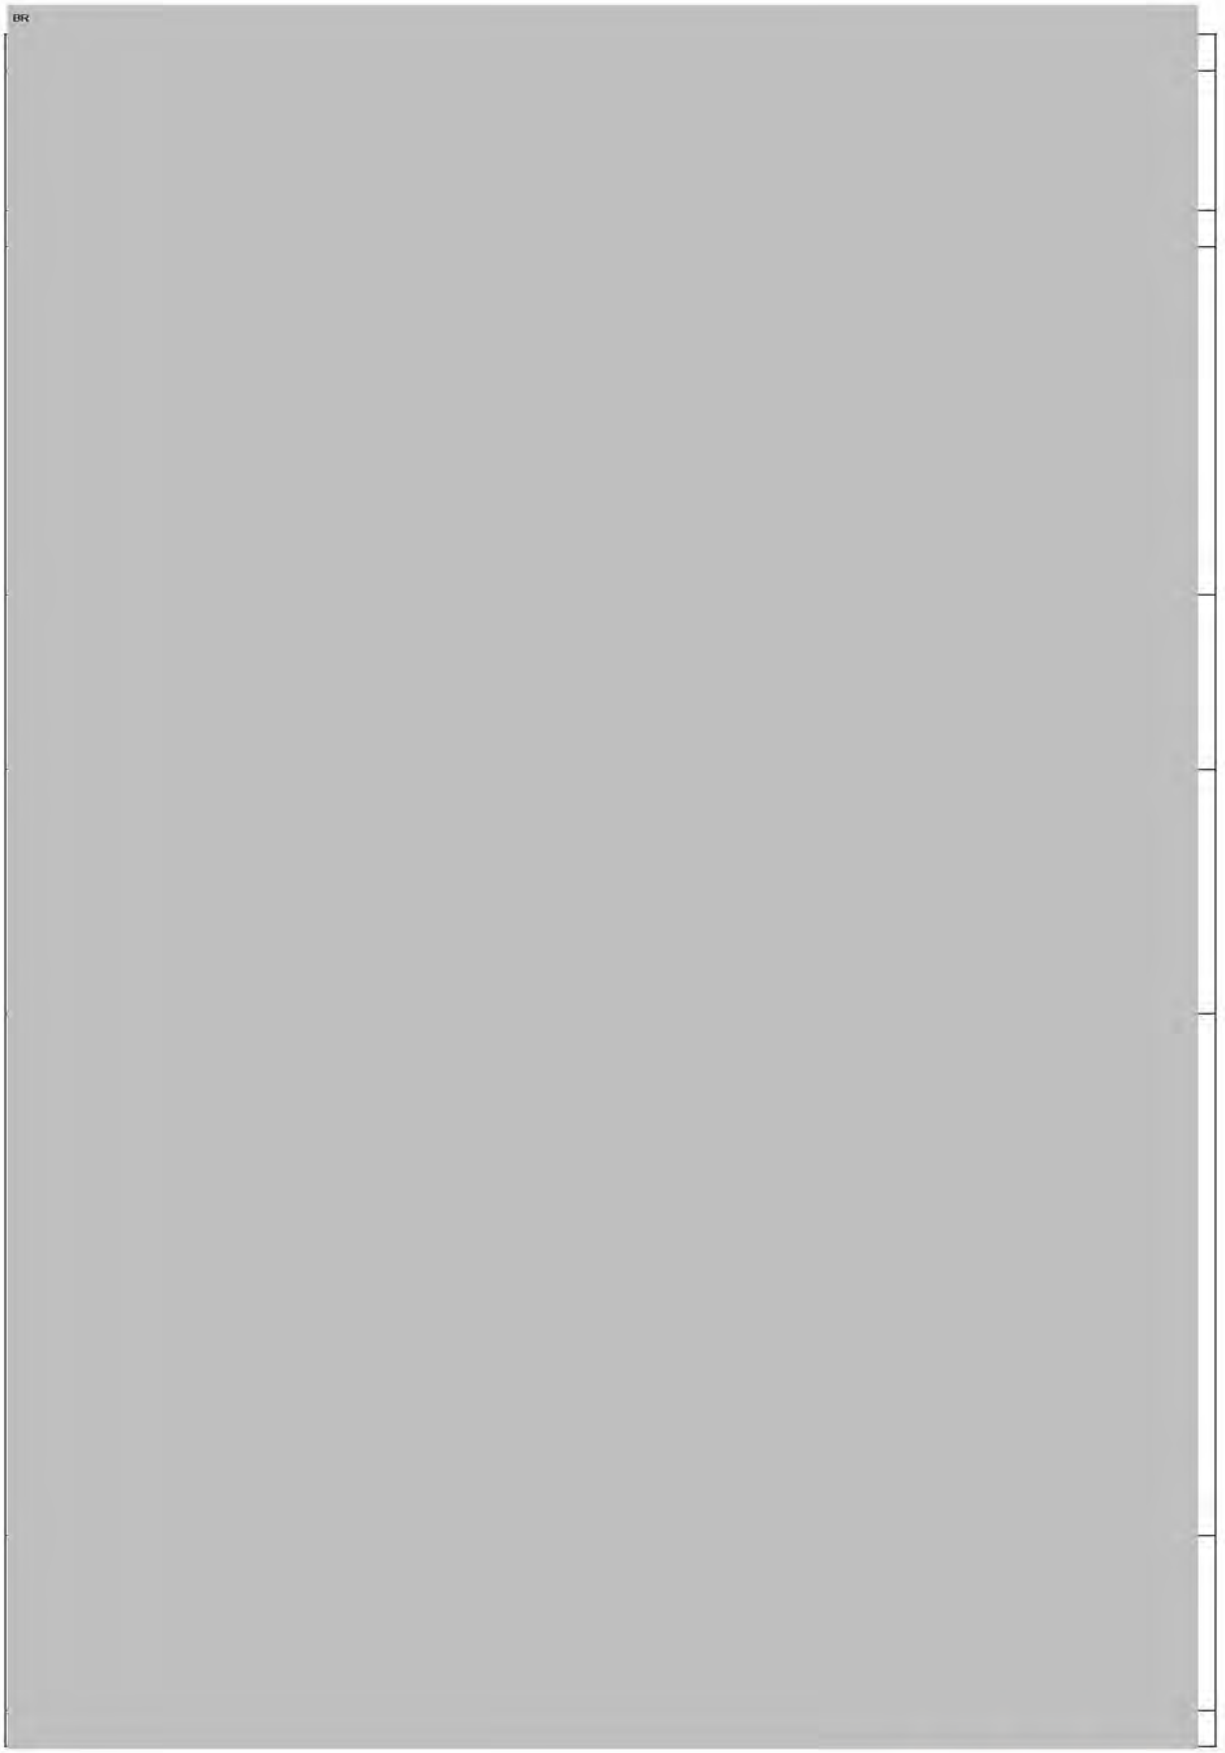

| | | |
|---|---|---|
| BR | | |
| 9. Duikers Molensloot mogen niet verplaatst van HHR (risico 143) | • In onderhandeling met HHR Delfland (Wordt genomen)<br>• Plan geschreven voor integraal waterhuishoudingsbeheer (Wordt genomen)<br>• Nagaan eisen HHR Delfland (Wordt genomen) | |
| BR | | |

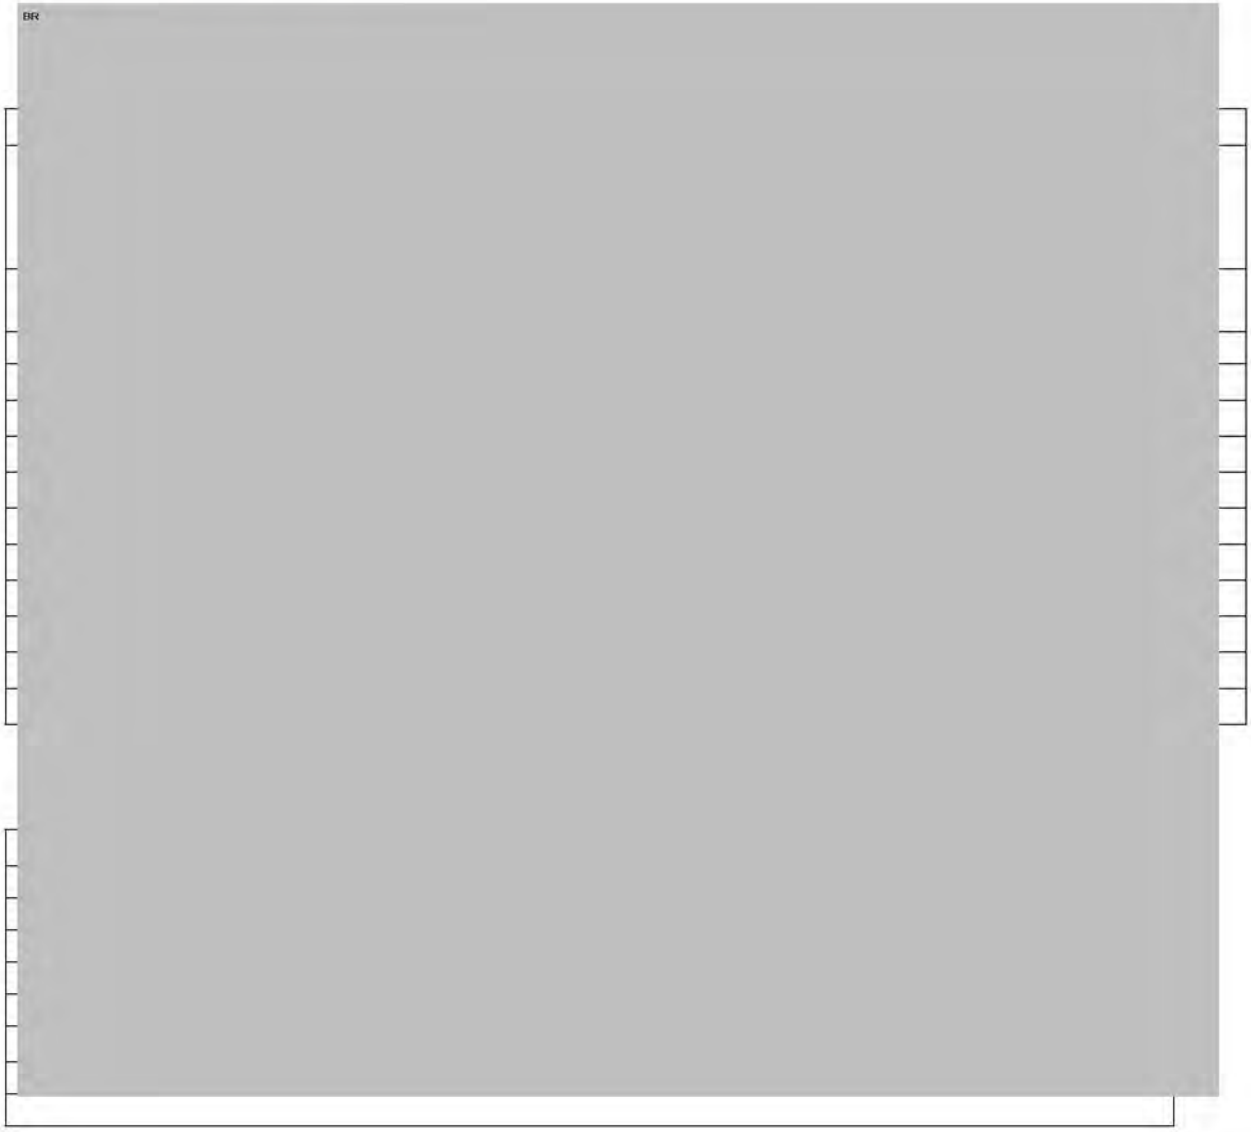
BR

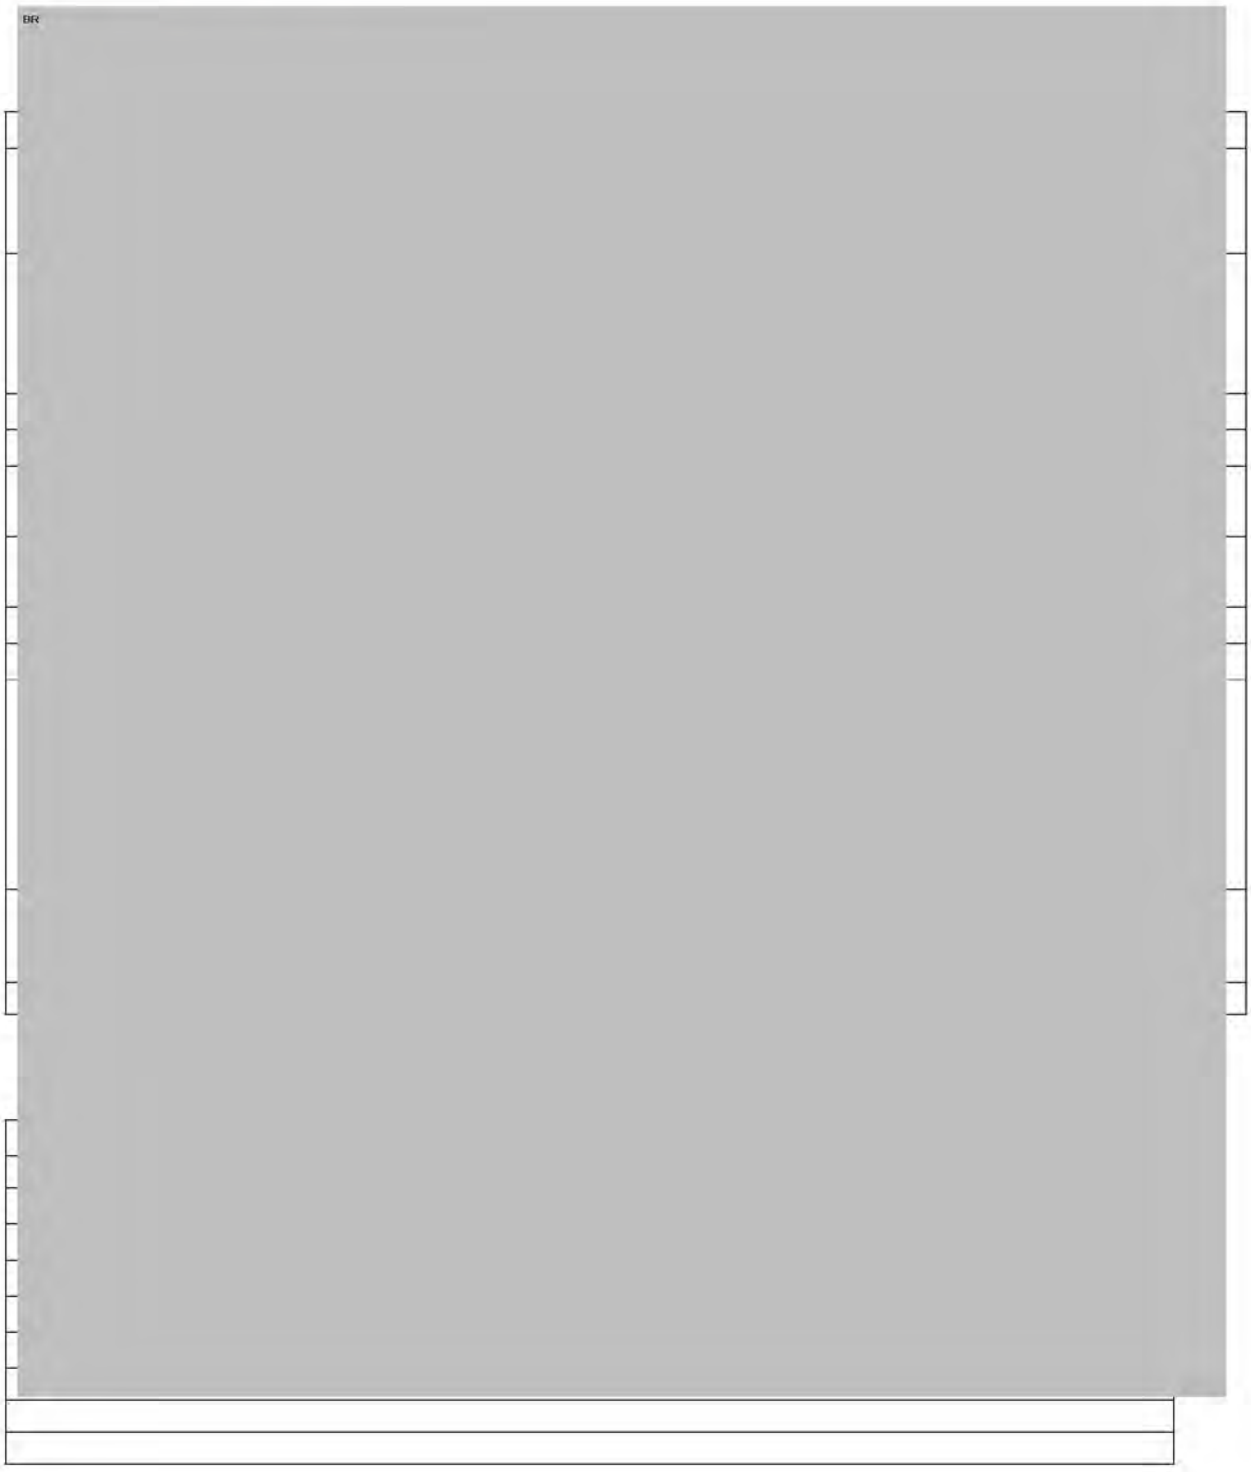

BR

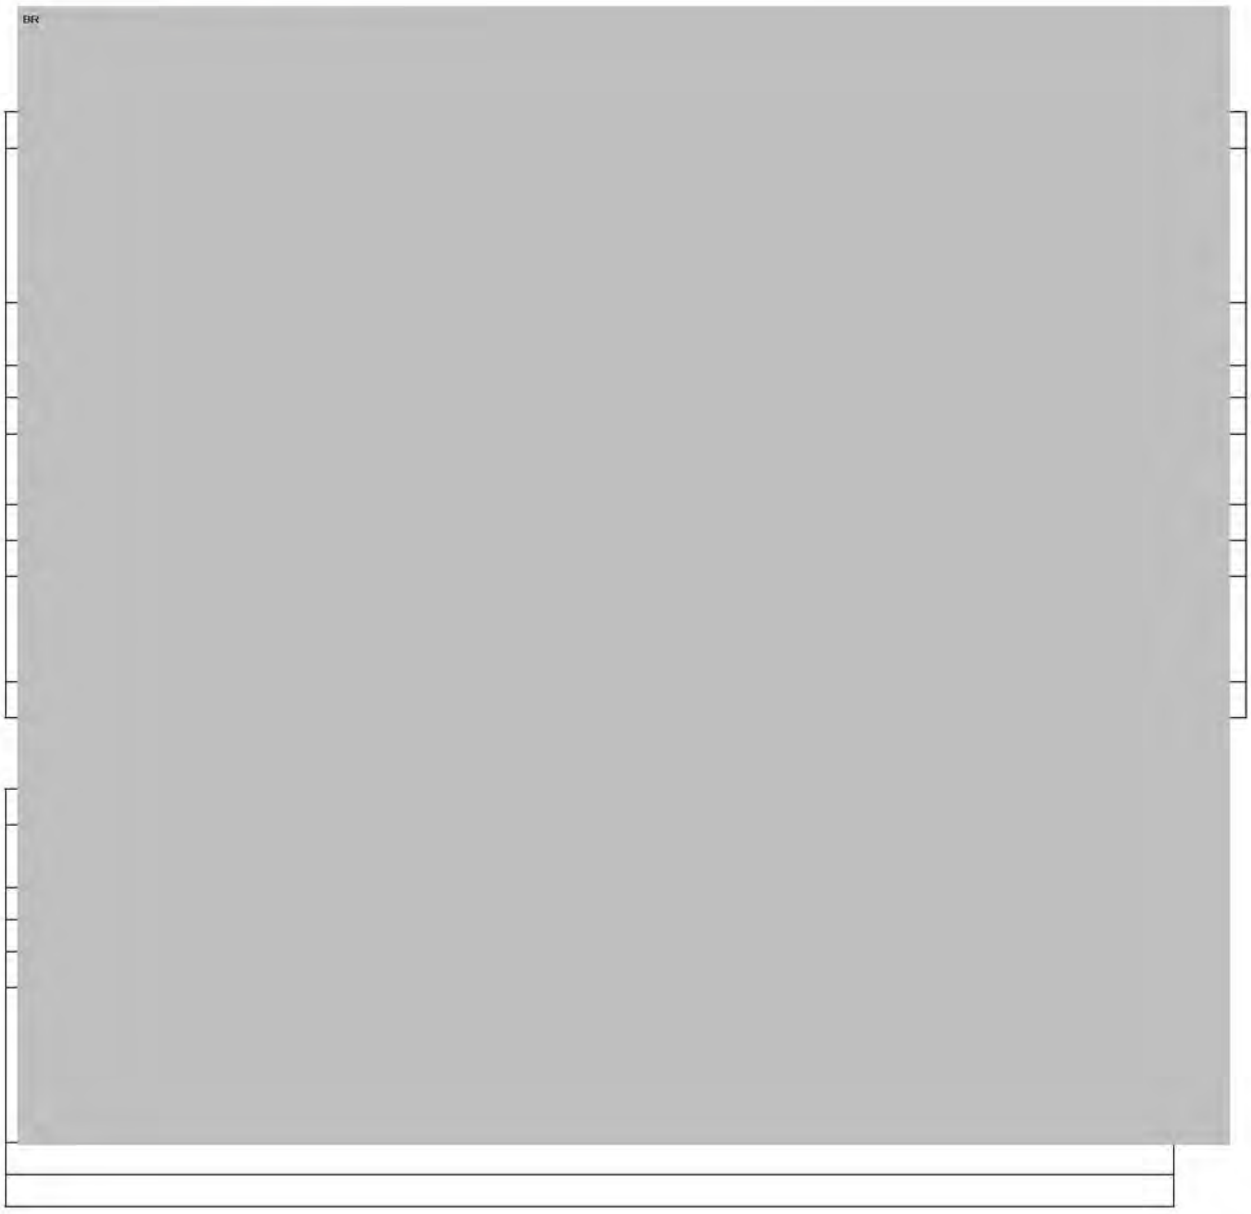

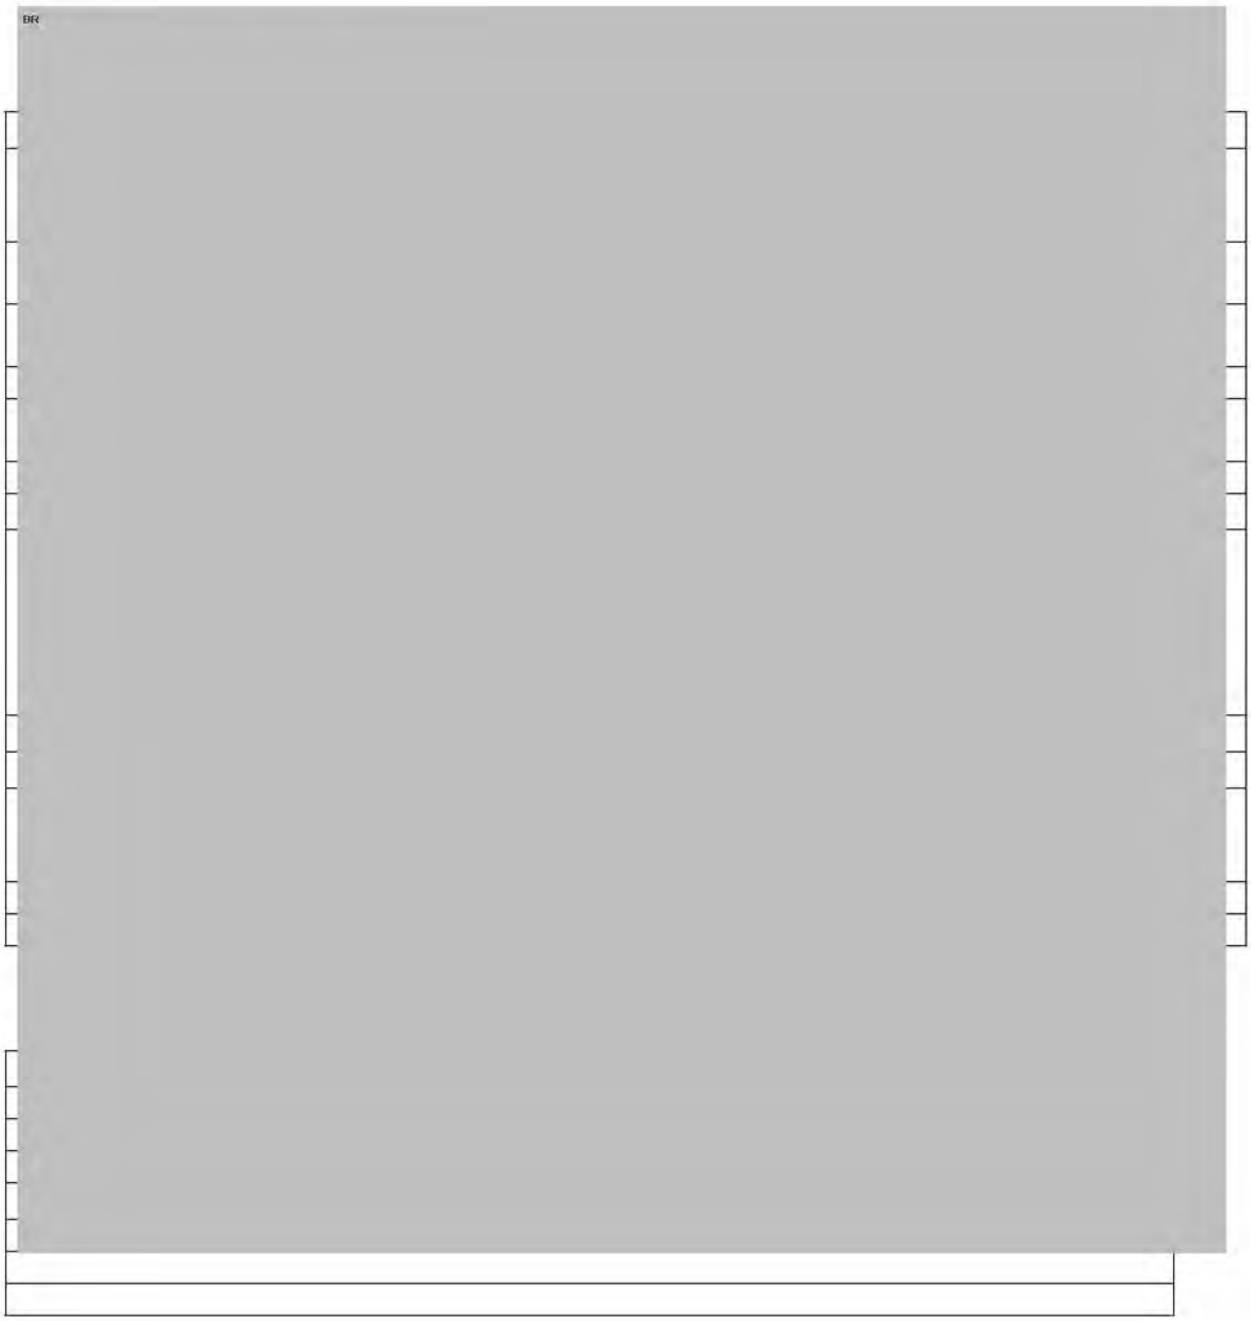
BR

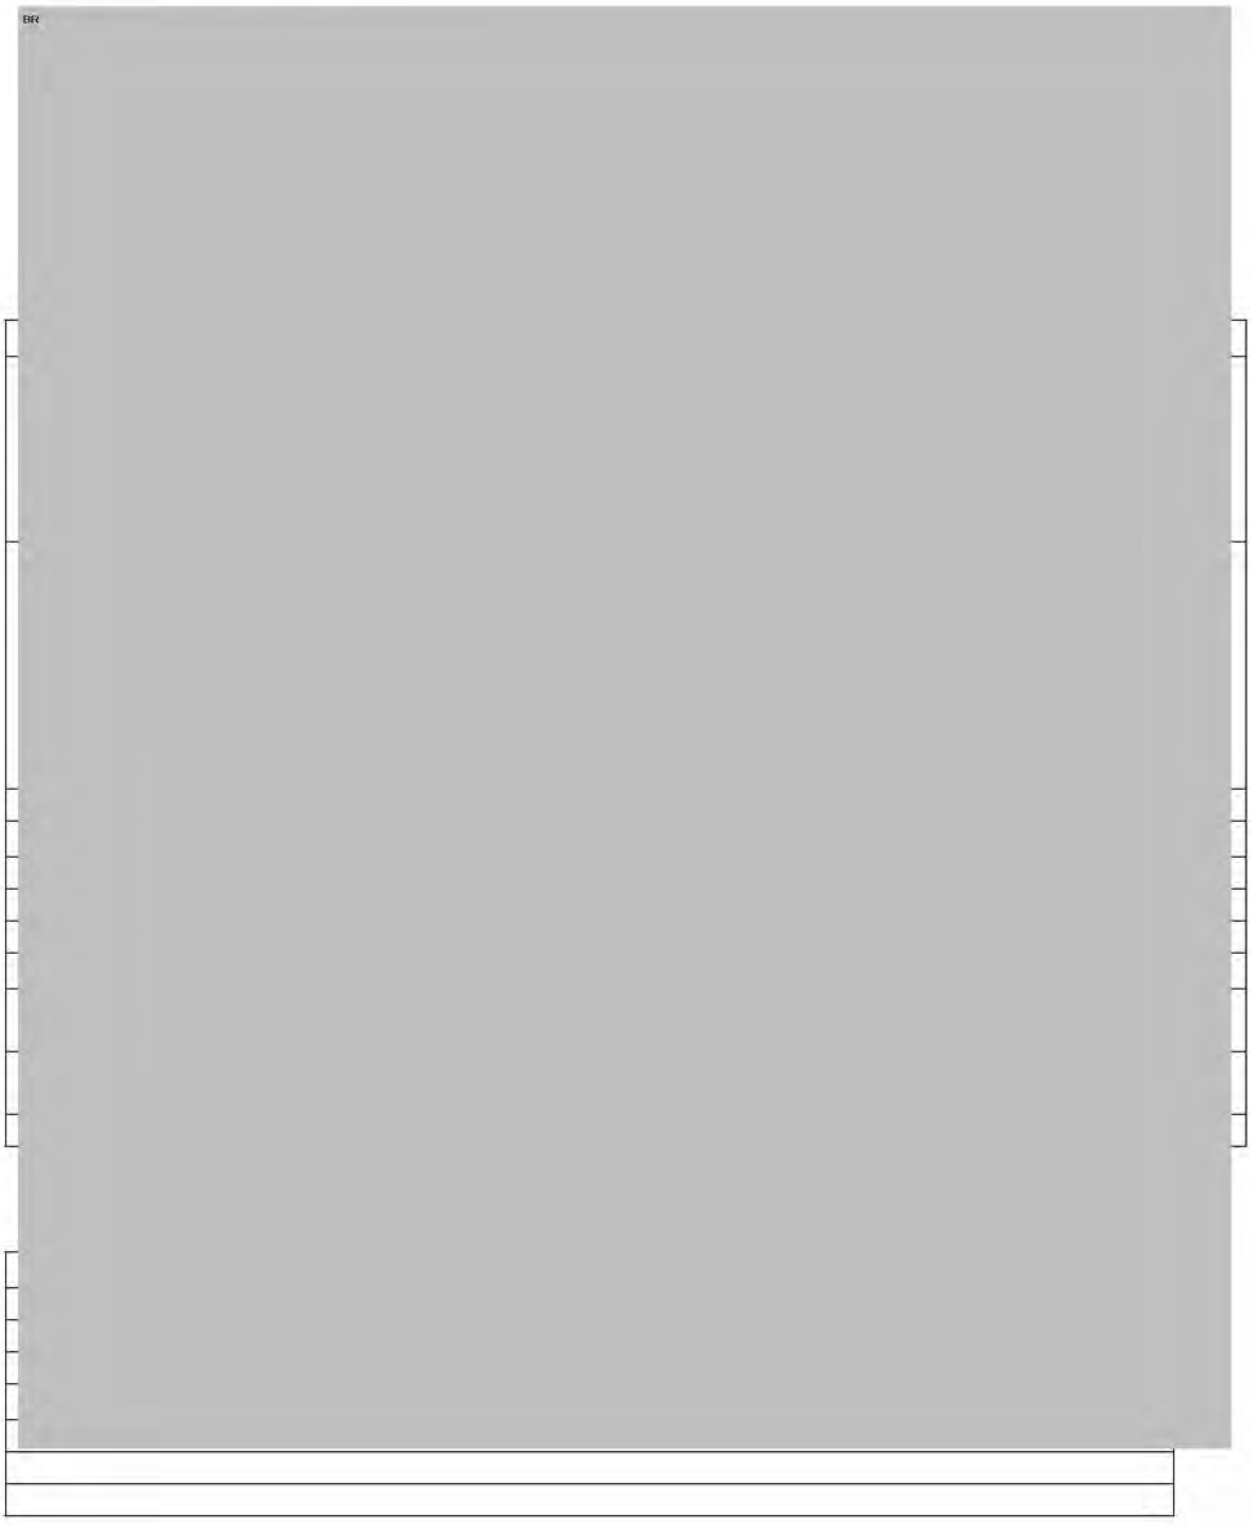

BR

5.1.2.e

Docnr2

Docnr2

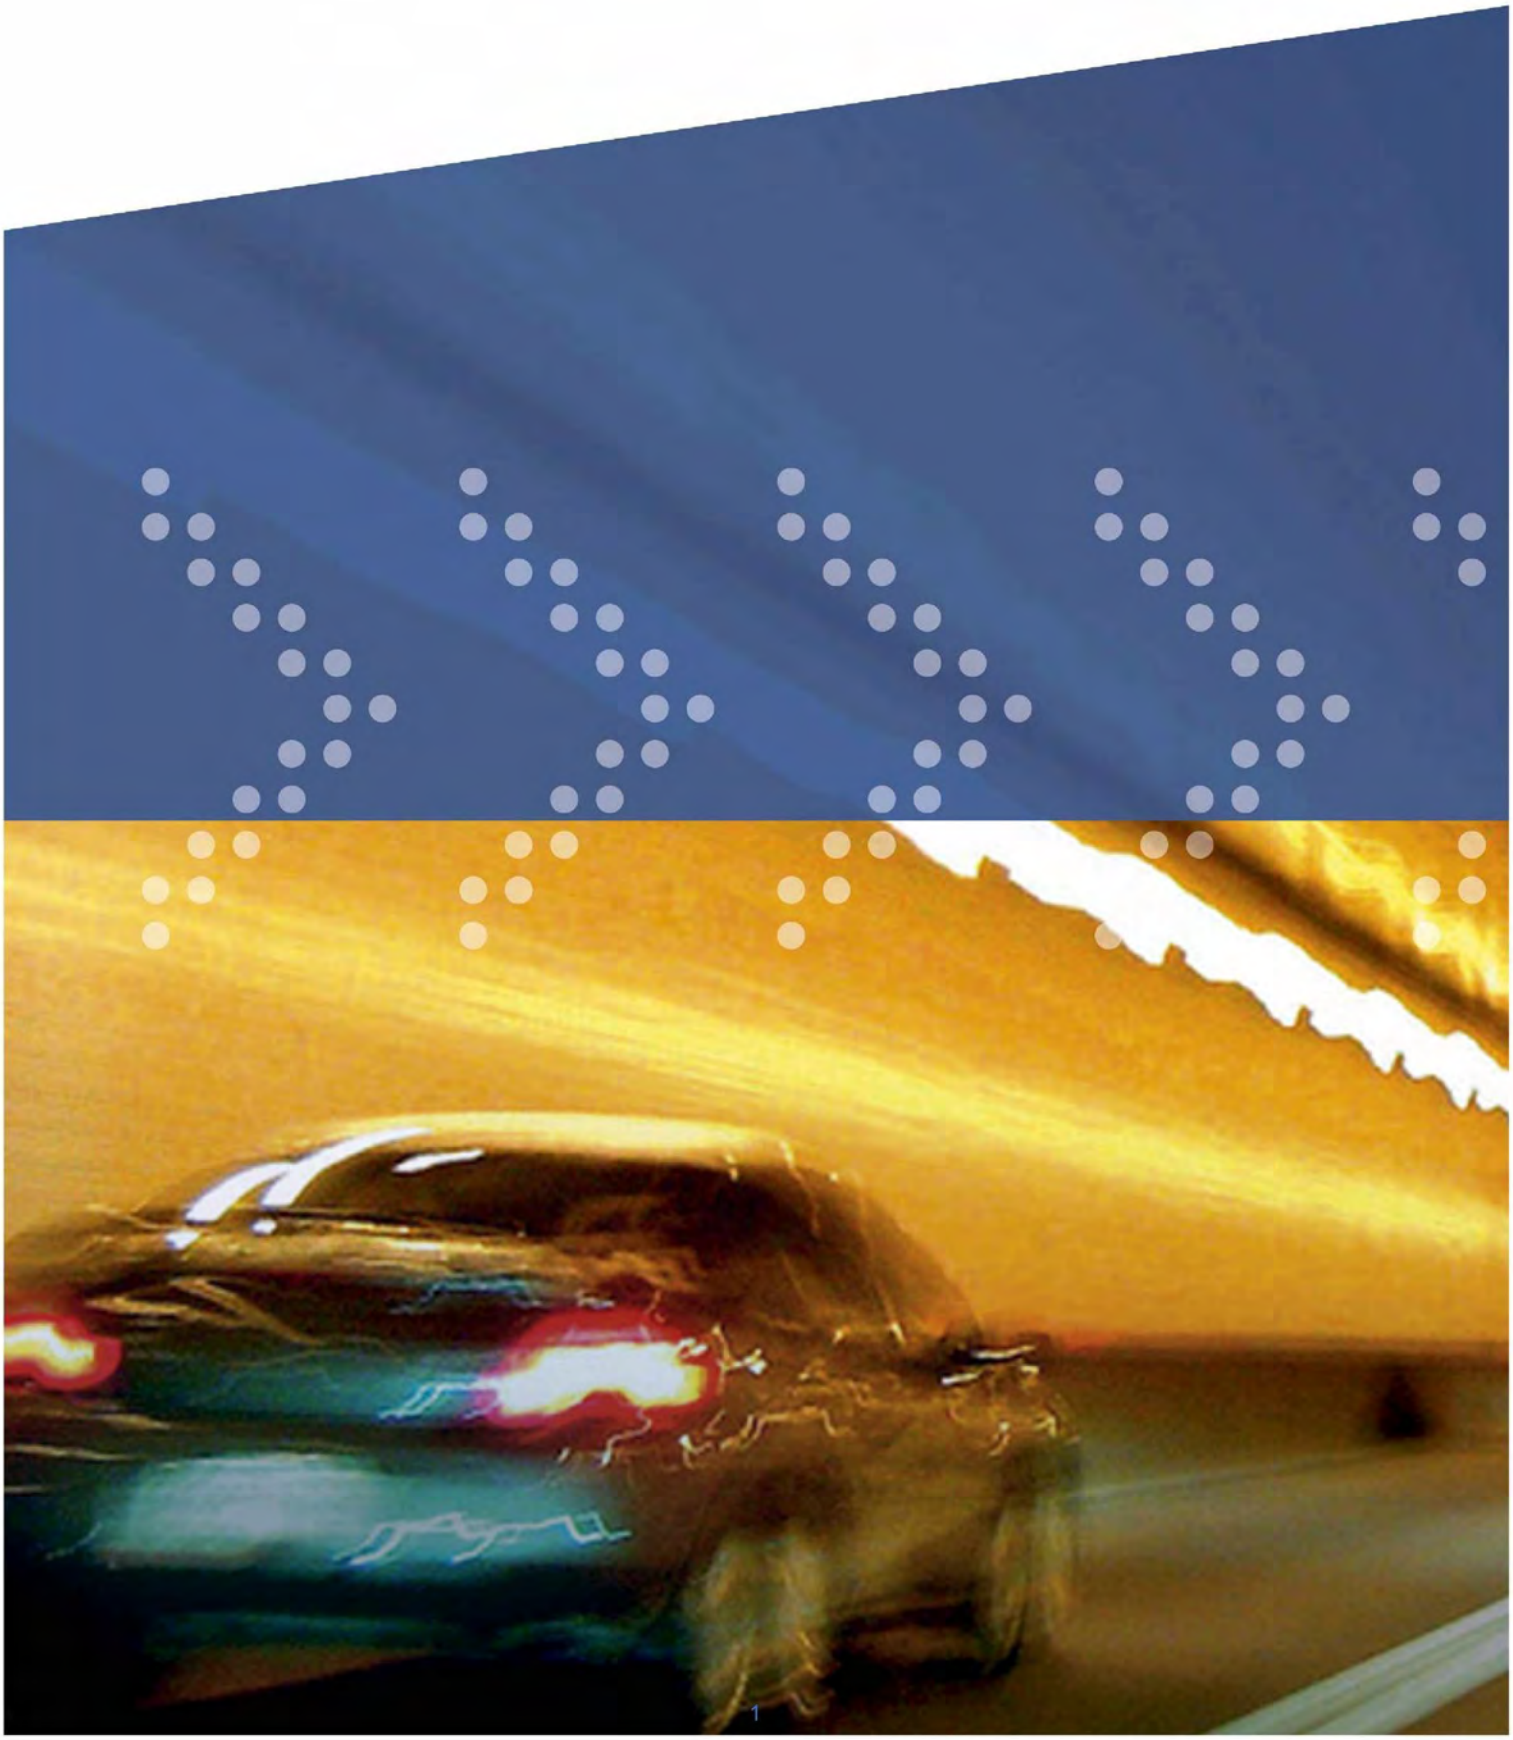

Docnr3

Dienst Stadsbeheer

Afdeling Opdrachtgeving

# Rotterdamsebaan

## Voortgangsrapportage

## 2e kwartaal 2014

**Datum: 31 juli 2014**

**Intern/vertrouwelijk**

**Versie: 2.0**

| **Opgesteld:** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Ter kennisgeving:** |
|---|---|---|---|
| d.d.: 17 juli 2014 | d.d.: 21 juli 2014 | d.d.: 31 juli 2014 | d.d.: ..... |
| 5.12e<br>5.12e<br>Rotterdamsebaan | 5.12e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan | 5.12e<br>Directeur Dienst Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever Rotterdamsebaan | Dhr. B. Revis, wethouder Verkeer, Binckhorst en Vlietzone / Portefeuillehouder Rotterdamsebaan |

# Inhoudsopgave

**1. Inleiding ..... 5**
1.1 Aandachtspunten ..... 5
1.2 Algemeen ..... 5
1.3 Terugblik afgelopen kwartaal ..... 5
1.4 Stand van zaken KPI ..... 6
1.5 Verwachting / ontwikkeling ..... 6
1.6 Risico's ..... 6
1.7 Bestuurlijke besluitvorming ..... 6
1.8 Financiën ..... 7
1.9 Voortuitblik komende kwartaal ..... 7
**2 Planstudies ..... 8**
2.1 Afgelopen kwartaal ..... 8
2.2 Komende kwartaal ..... 8
**3 Omgevingsmanagement ..... 9**
3.1 Afgelopen kwartaal ..... 9
3.2 Komend kwartaal ..... 10
**4 Verwerving ..... 11**
4.1 Afgelopen kwartaal ..... 11
4.2 Komende kwartaal ..... 11
**5 Vergunningen en overeenkomsten ..... 12**
5.1 Afgelopen kwartaal ..... 12
5.2 Komende kwartaal ..... 12
**6 Conditionering Binckhorstlaan ..... 13**
6.1 Afgelopen kwartaal ..... 13
6.2 Komende kwartaal ..... 13
**7 Conditionering Vlietzone ..... 14**
7.1 Afgelopen kwartaal ..... 14
7.2 Komende kwartaal ..... 14
**8 Voorbereiding t.b.v. hoofdcontract ..... 15**
8.1 Afgelopen kwartaal ..... 15
8.2 Komende kwartaal ..... 16
**9 Spoorboogweg, Regulusweg en Verlengde-Melkwegstraat ..... 18**
9.1 Afgelopen kwartaal ..... 18
9.2 Komende kwartaal ..... 18
**10 Tunnelveiligheid ..... 19**
10.1 Afgelopen kwartaal ..... 19
10.2 Komend kwartaal ..... 19
**11 Aanbesteding hoofdcontract ..... 20**
11.1 Afgelopen kwartaal ..... 20
11.2 Komende kwartaal ..... 20
**12 Aanbesteding deelcontracten ..... 21**
12.1 Afgelopen kwartaal ..... 21
12.2 Komende kwartaal ..... 21
**13 Communicatie ..... 22**
13.1 Afgelopen kwartaal ..... 22
13.2 Komende kwartaal ..... 23
**14 Beheer en overdracht ..... 24**

14.1 Afgelopen kwartaal ..... 24
14.2 Komend kwartaal ..... 24
**15 Organisatie ..... 25**
15.1 Afgelopen kwartaal ..... 25
15.2 Komend kwartaal ..... 25
**16 Financien ..... 26**
16.1 Kostenstructuur ..... 26
16.2 Dekkingen ..... 27
**17 Risicobeheer ..... 29**
17.1 Afgelopen kwartaal ..... 29
17.2 Komende kwartaal ..... 29
17.3 Financiële toprisico's ..... 29
17.4 Toprisico's planning ..... 31
**18 Planning ..... 33**
18.1 Afgelopen kwartaal ..... 33
18.2 Komende kwartaal ..... 34
**19 Scopemanagement ..... 35**
19.1 Afgelopen kwartaal ..... 35
19.2 Komende kwartaal ..... 35
**20 Kwaliteitsbeheer ..... 36**
20.1 Afgelopen kwartaal ..... 36
20.2 Komende kwartaal ..... 36
**21 Informatiebeheer ..... 37**
21.1 Afgelopen kwartaal ..... 37
21.2 Komend kwartaal ..... 37
**Bijlage 1: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan ..... 38**
**Bijlage 2: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer ..... 40**

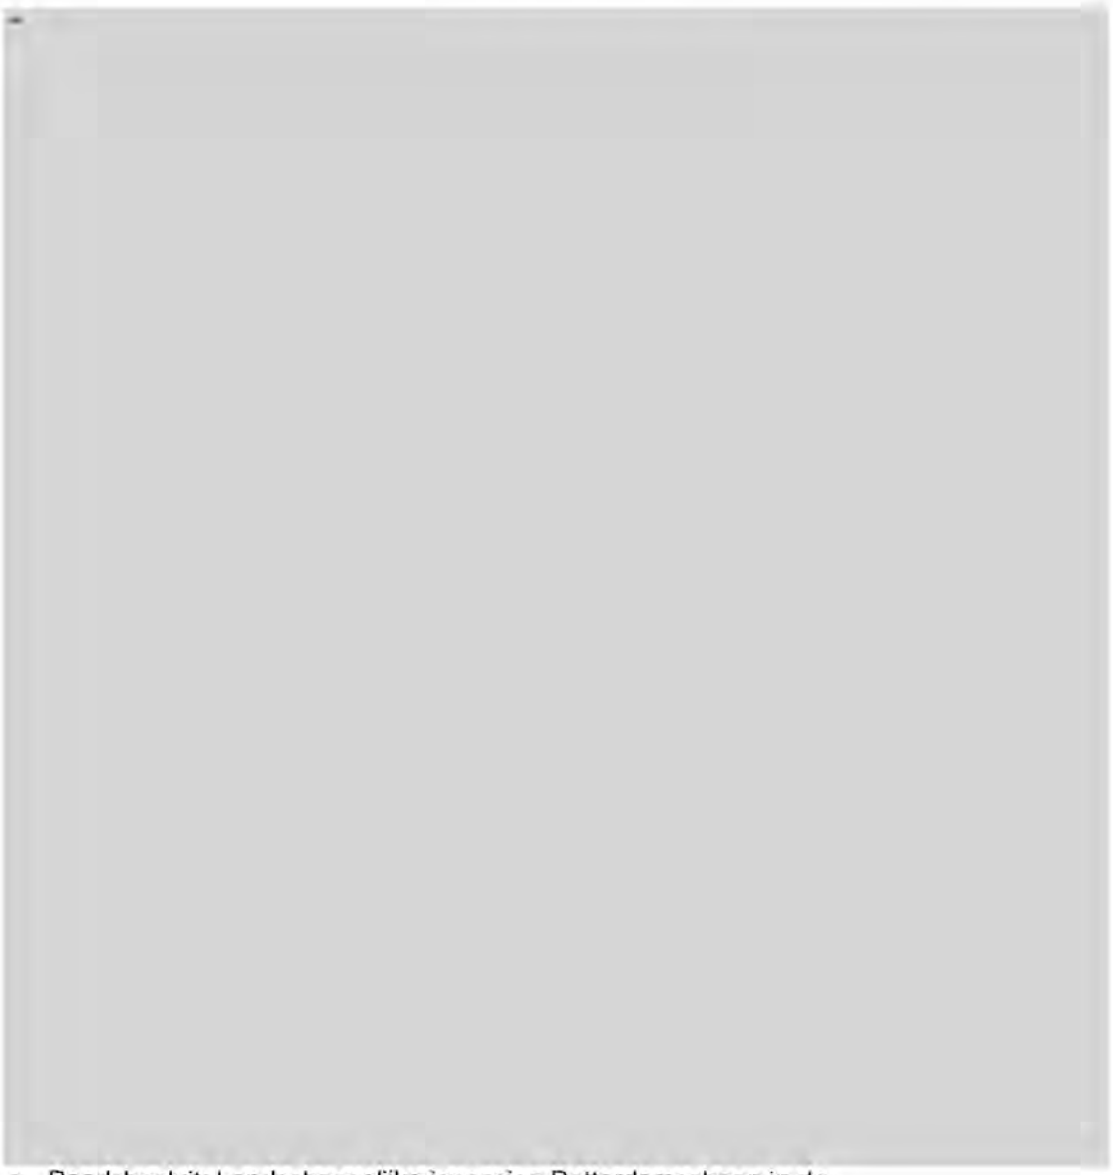

- Raadsbesluit: Landschappelijke inpassing Rotterdamsebaan in de Vlietzone/Molenvlietpark (september 2014);

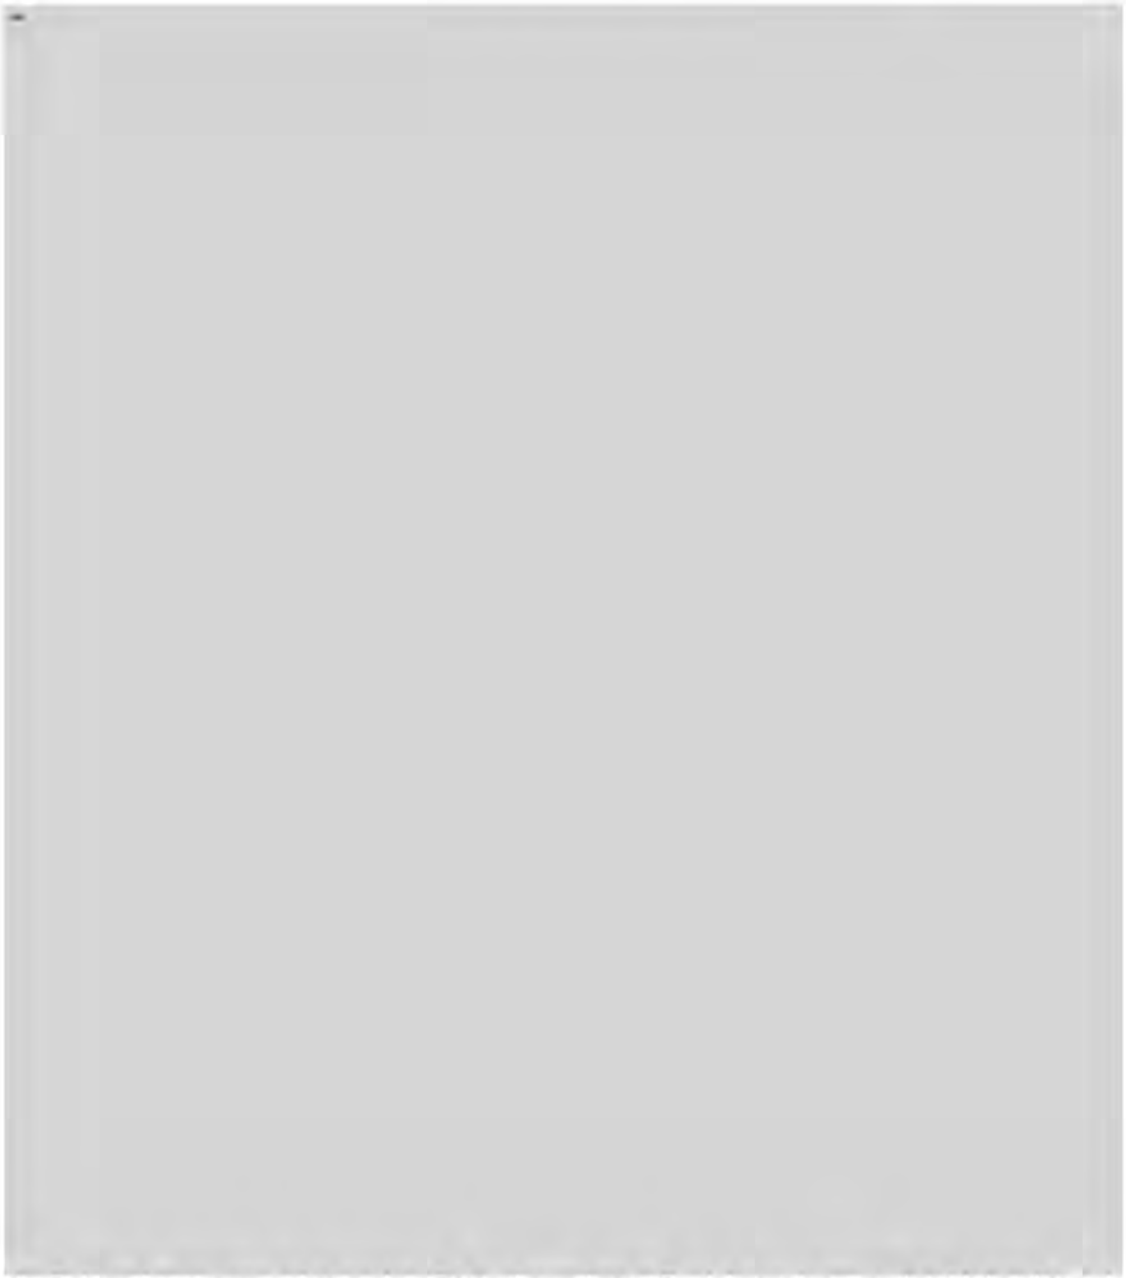

8. Buiten de scope van het project Rotterdamsebaan: Besluitvorming over het Molenvlietpark n.a.v. het ter inzage leggen van het concept-Voorlopig Ontwerp, het dekkingsvoorstel en het besluit van Hoogheemraadschap Delfland over wel/niet calamiteitenberging in het plan betrekken;

# 2 Planstudies

## 2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Behandeling van de 26 ingestelde beroepen tegen de Rotterdamsebaan bij de Raad van State. Daarop vooruitlopend worden op 4 april de twee verzoeken voor een Voorlopige Voorziening behandeld door de Raad van State. | Behandeling van de twee Voorlopige Voorzieningen heeft niet tot schorsing van de reeds gestarte werkzaamheden geleid.<br>Op 26 en 27 juni 2014 zijn de beroepszaken ter zitting bij de Afdeling van de Raad van State behandeld. Ter verdediging zijn hiervoor door de proj.org. nog aanvullende documenten verstrekt. In goed overleg hebben twee 'indieners' nog voor de zitting hun beroep ingetrokken. Die geschillen worden nog in onderling overleg buiten de RvS beslecht. Uitspraak is niet binnen 6 weken te verwachten. |
| Opstellen plan van aanpak voor monitoringsprogramma. Dit is gevraagd door de raad van Leidschendam-Voorburg. Door Den Haag wordt dit gebruikt voor de wettelijk verplichte m.e.r.-evaluatie. | Intergemeentelijke werkgroep is bijeen gekomen om de opzet van het plan te bespreken. Het PvA voor het monitoringsprogramma zal in het 3e kwartaal gemaakt worden. |
| | |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Geen | |
| | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen | Geen |
| | |

## 2.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Afwachten van de uitspraak van de Raad van State t.a.v. bestemmingsplan Rotterdamsebaan |
| |
| **Besluiten** |
| Plan van Aanpak monitoringsprogramma aanbieden aan colleges Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Waarschijnlijk tegelijk met het collegebesluit aangaande de Uitvoerings-&Beheerovereenkomst. |
| |

# 3 Omgevingsmanagement

## 3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Het voortzetten van het onderzoek naar de landschappelijke inpassing van: de Rotterdamsebaan, de hal van Drievliet en het nieuw aan te leggen parkeerterrein voor Drievliet. Parallel hieraan worden gezamenlijk met Delfland de mogelijkheden/gevolgen van hun wens om een boezemberging onderzocht. Gelet op de nauwe samenhang moet daarbij goede afstemming met de procedures i.k.v. de omgevingsvergunningen tijdelijk parkeerterrein en indoorhal plaatsvinden. | Het ontwerp voor de landschappelijke inpassing van de Rotterdamsebaan, indoorhal Drievliet, parkeerterrein Drievliet is verder uitgewerkt en gecommuniceerd met de omgeving ter voorbereiding op bestuurlijke besluitvorming (vooral onder de werknaam 'Molenvlietpark'). Het ontwerp kent twee varianten (met en zonder extra calamiteitenberging afhankelijk van met hoogheemraadschap te bereiken overeenstemming). Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben op 10 juni 2014 besloten en in een brief aan het college van B&W Den Haag vastgelegd o.m. de calamiteitenberging verder met Den Haag te willen uitwerken. Op 25 september zal verder uitgewerkt voorstel aan Verenigde Vergadering van Delfand incl. de financiële bijdrage aan gemeente ter besluitvorming worden voorgelegd. Bestuurlijke besluitvormingen binnen Den Haag en HH Delfland zullen zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. |

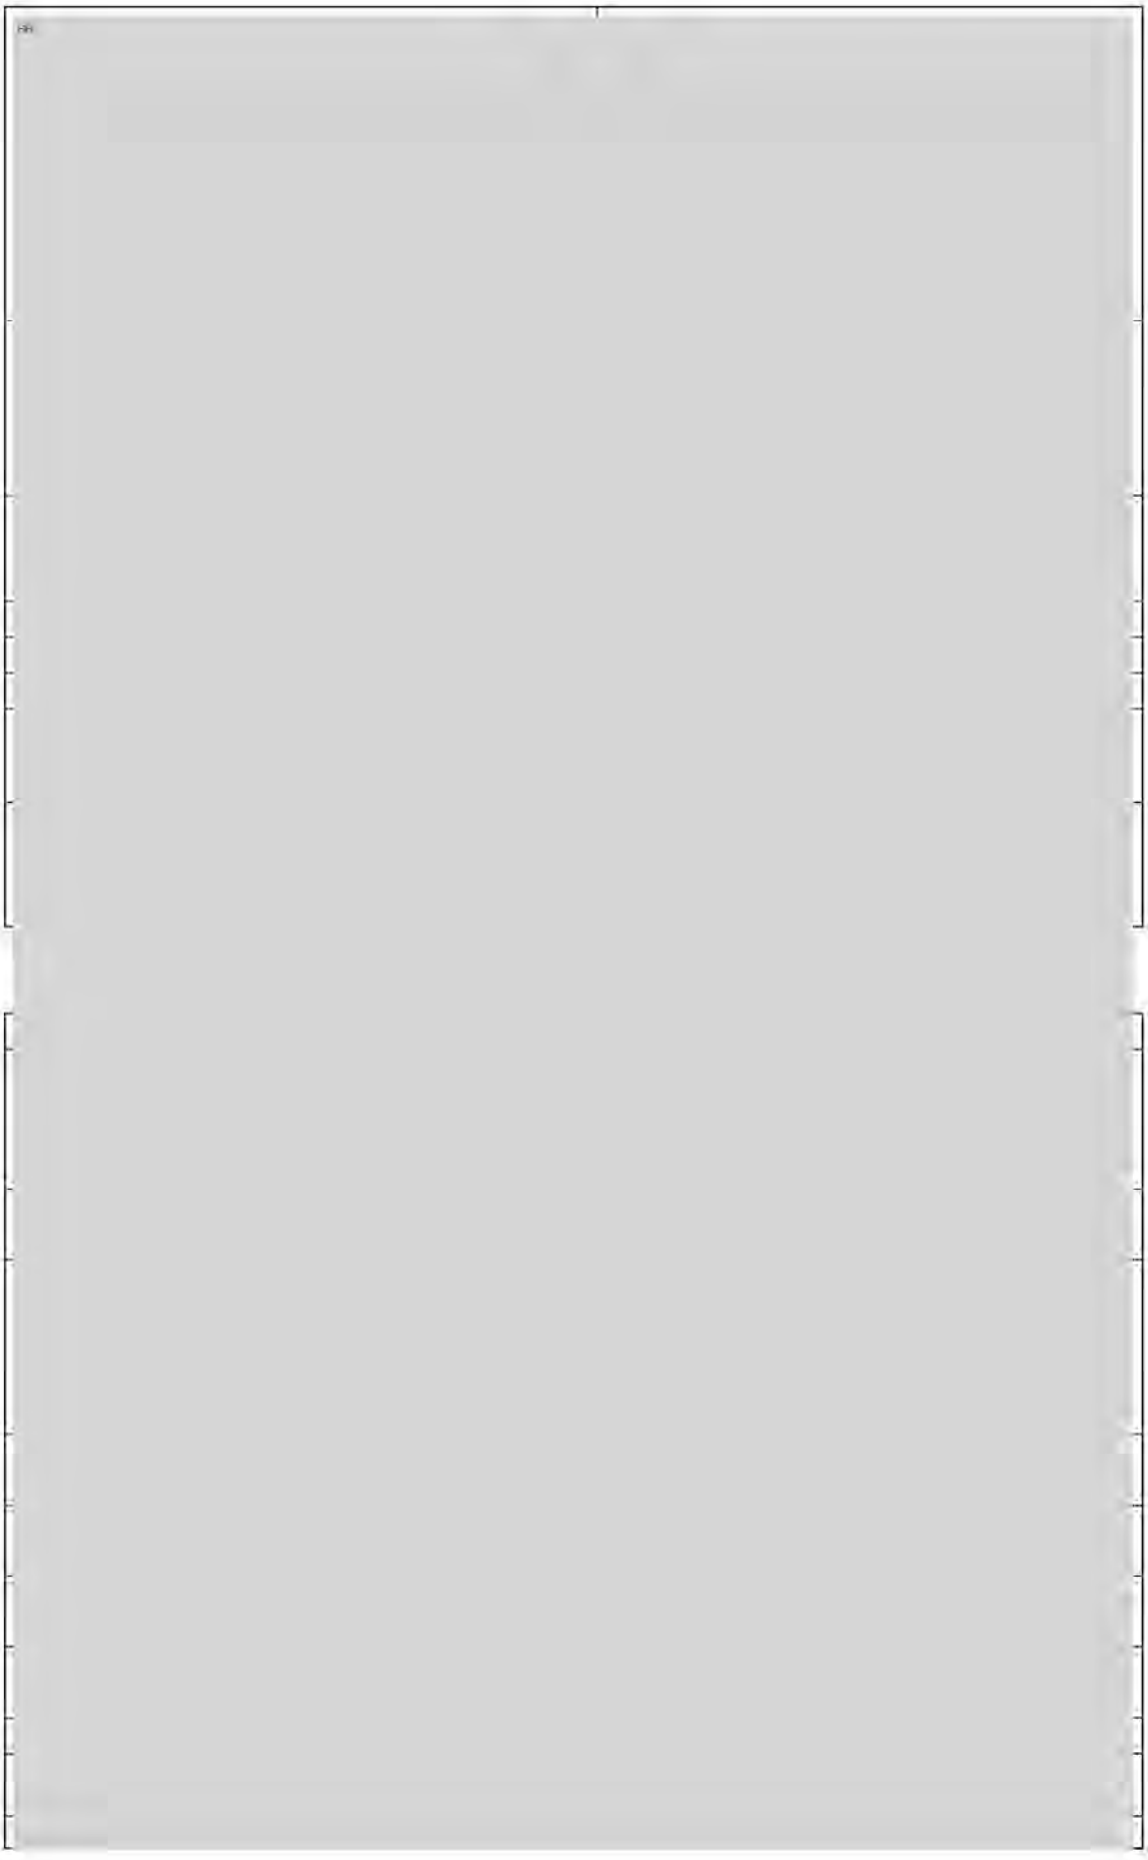

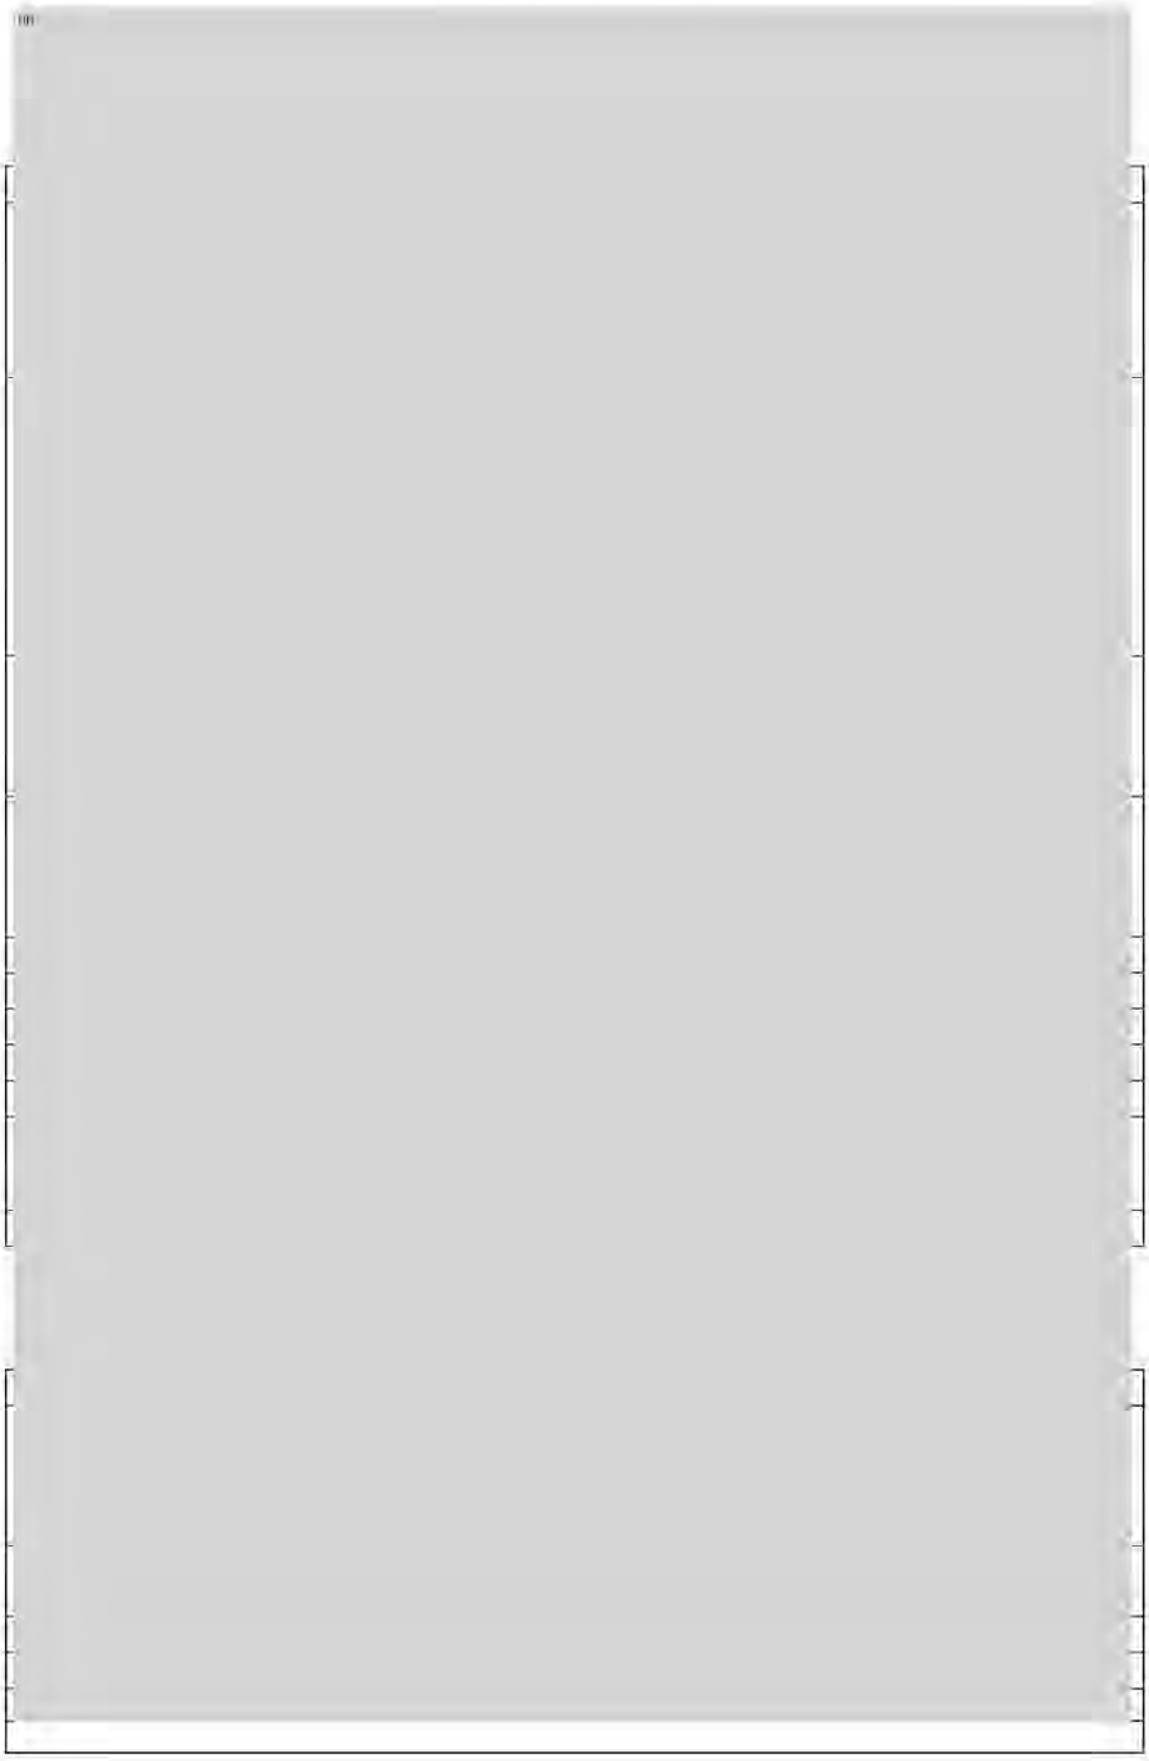

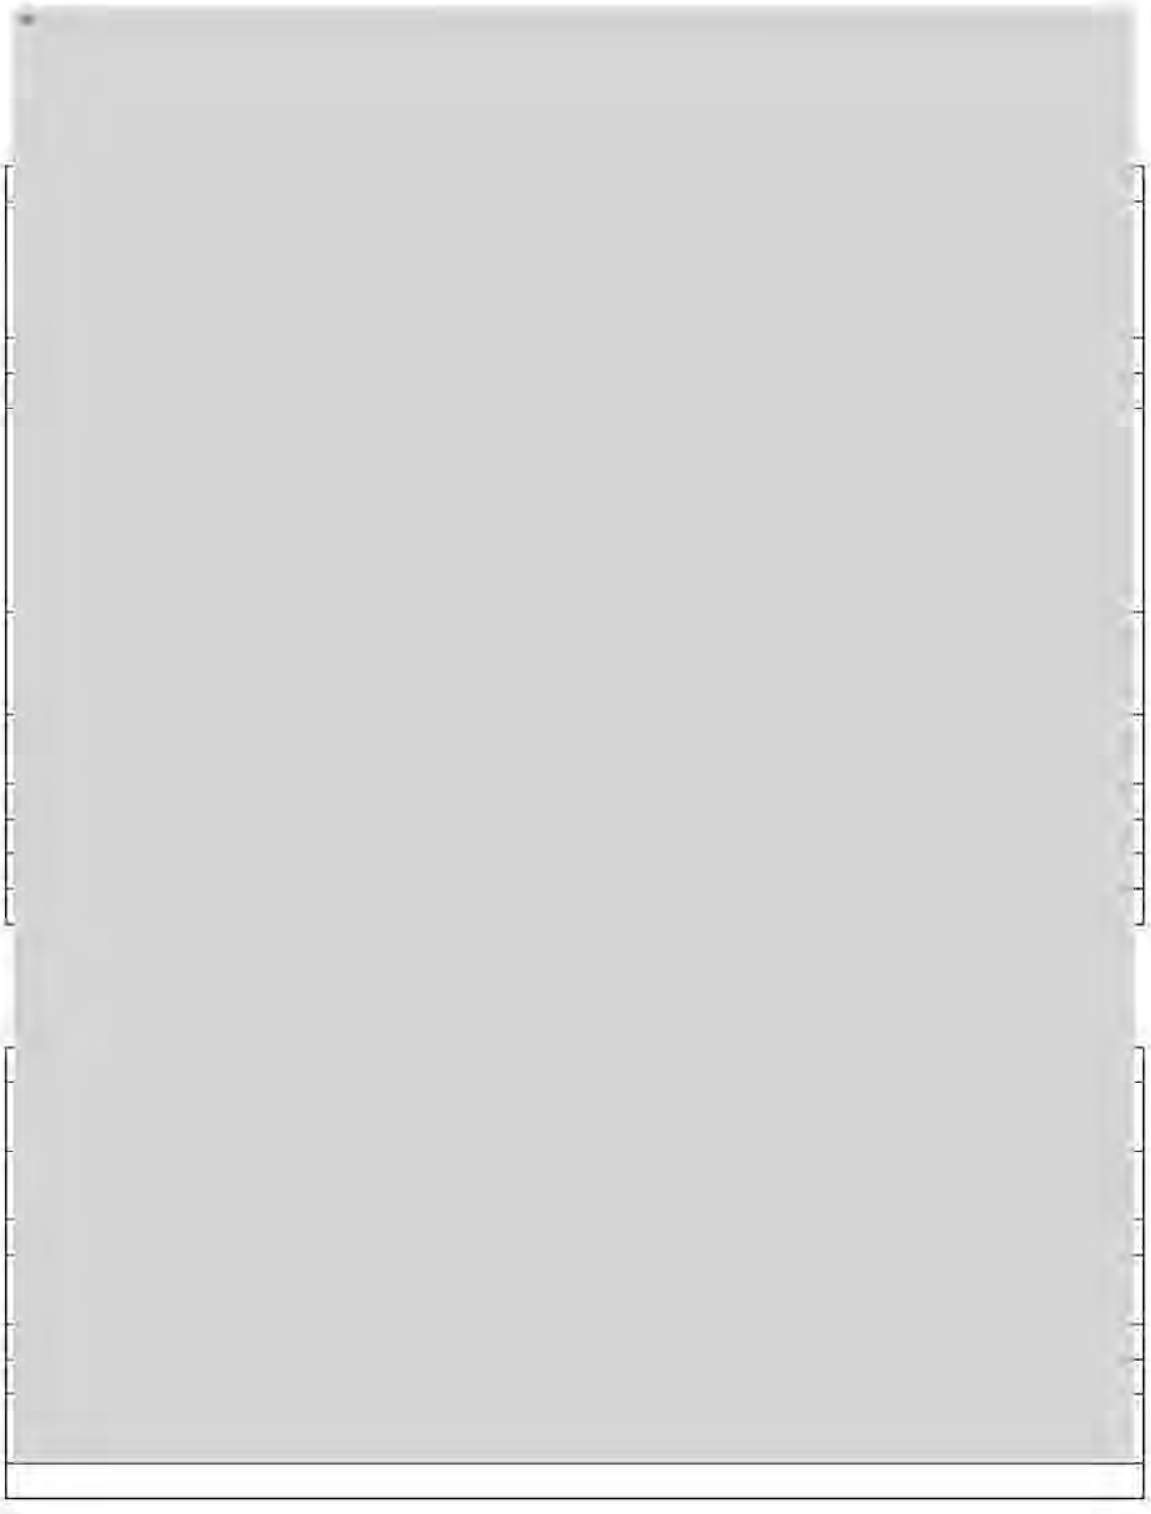

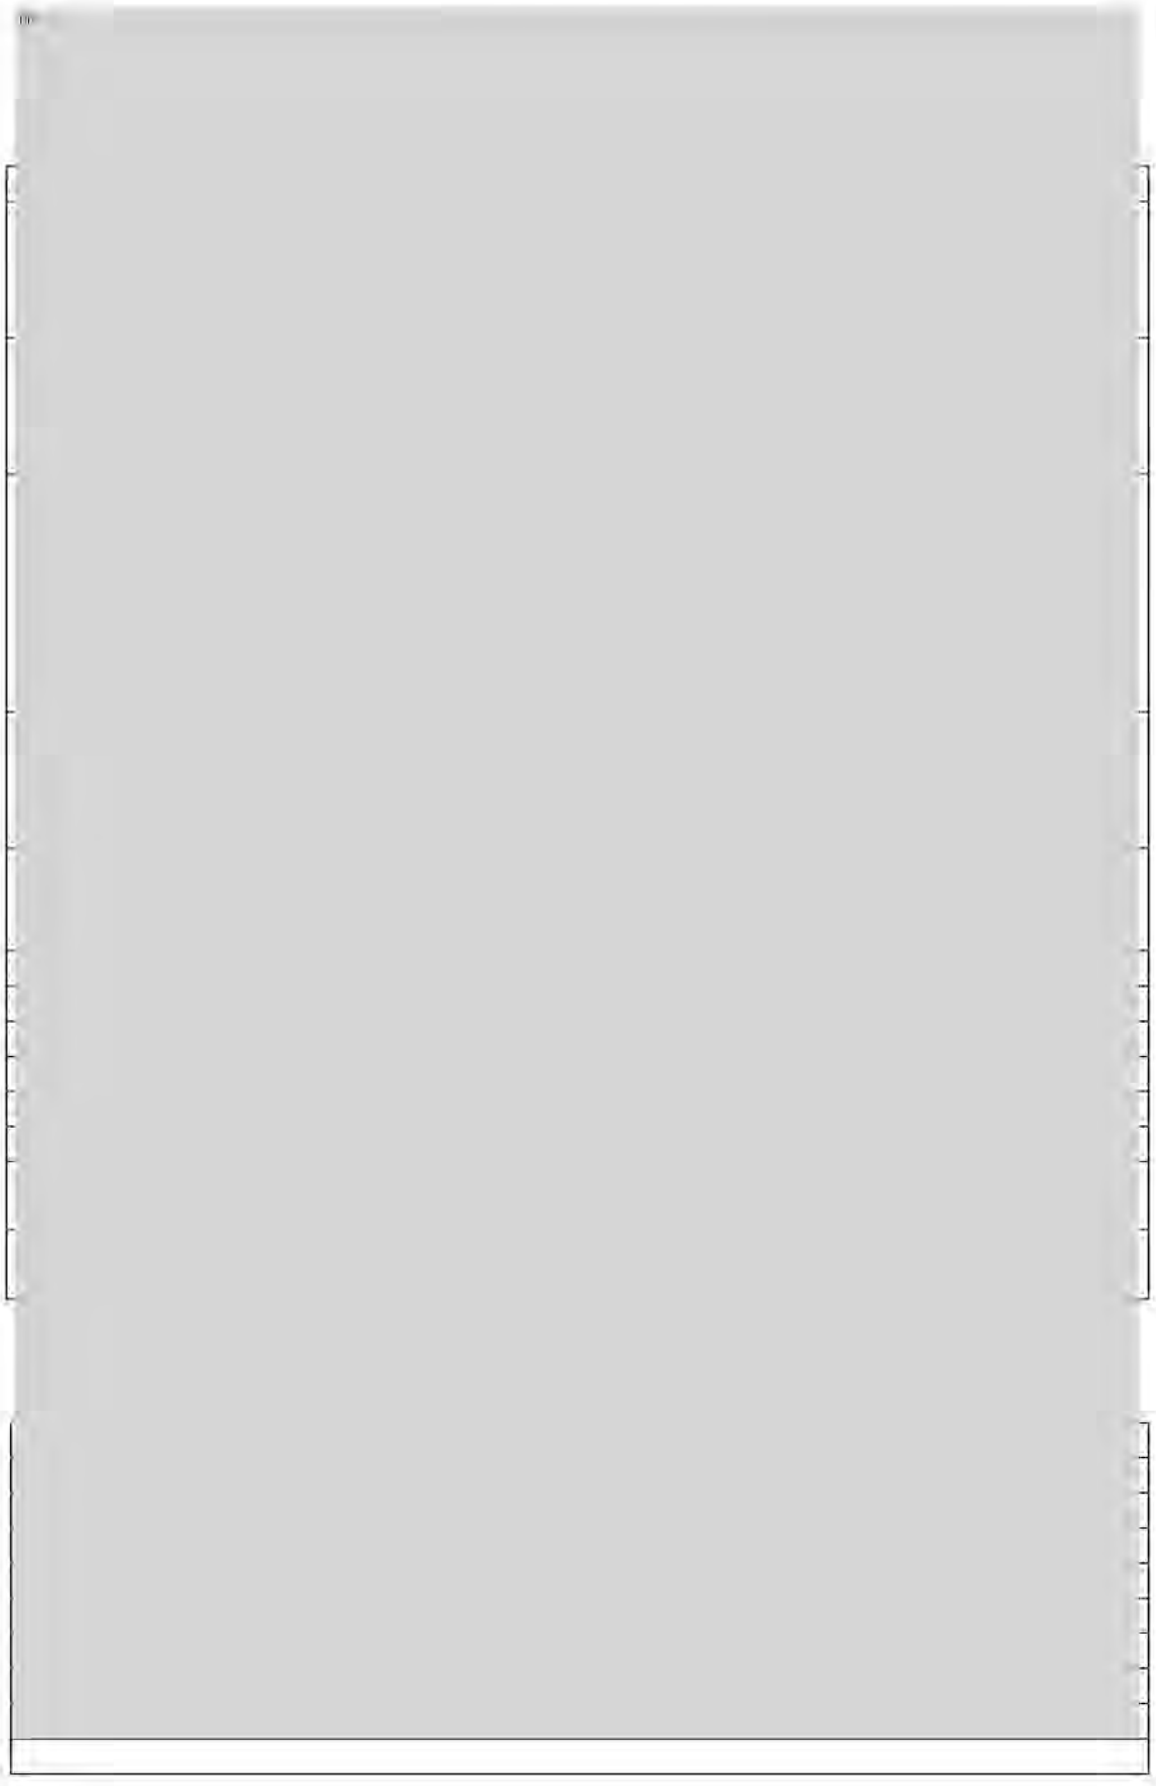

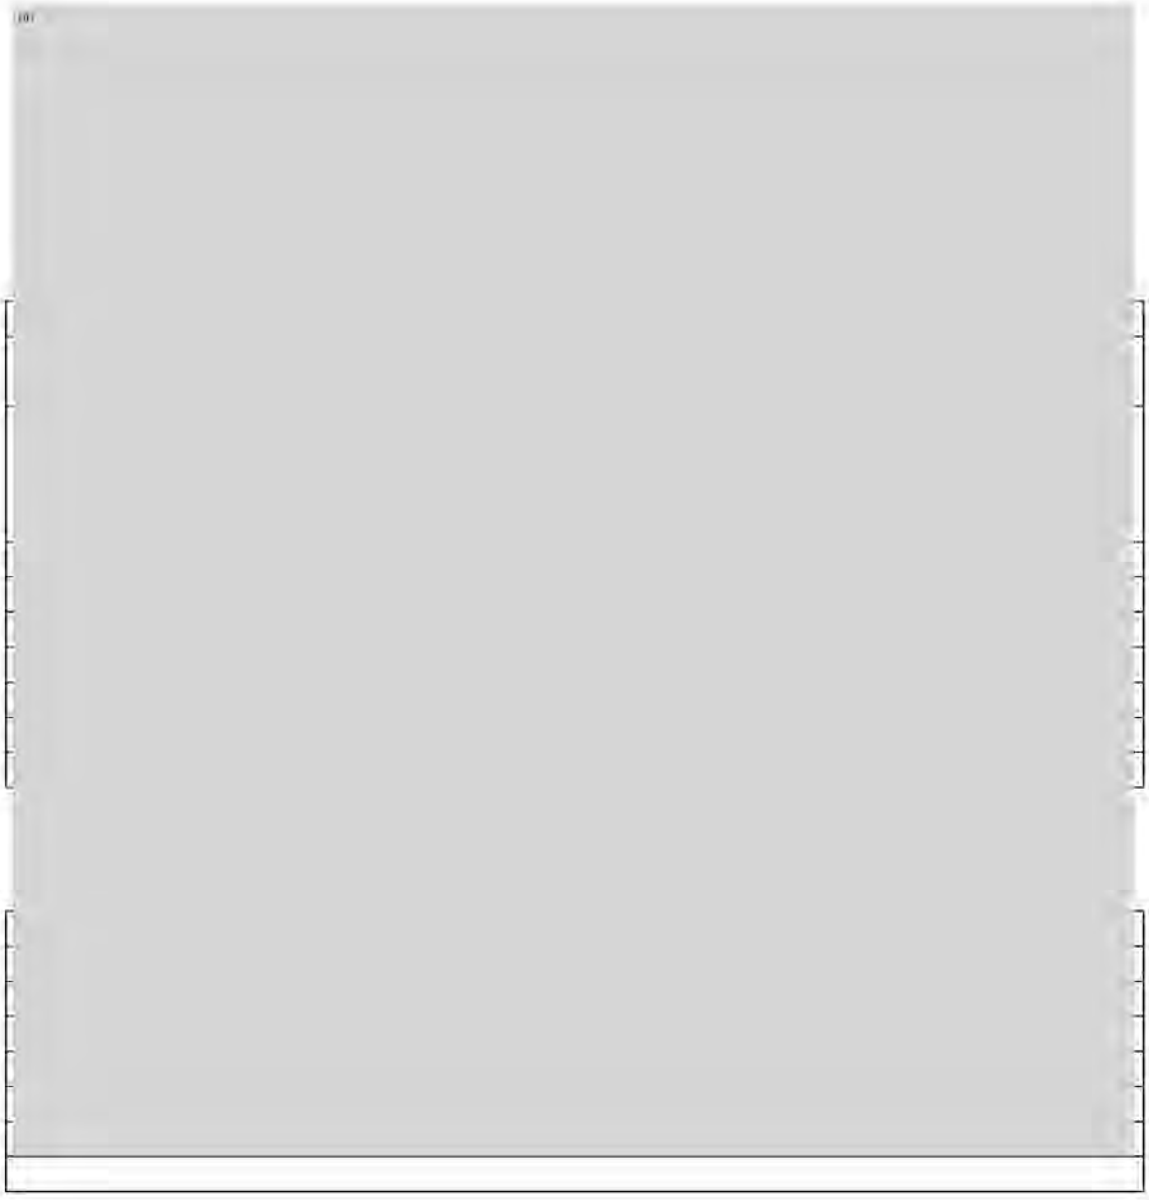

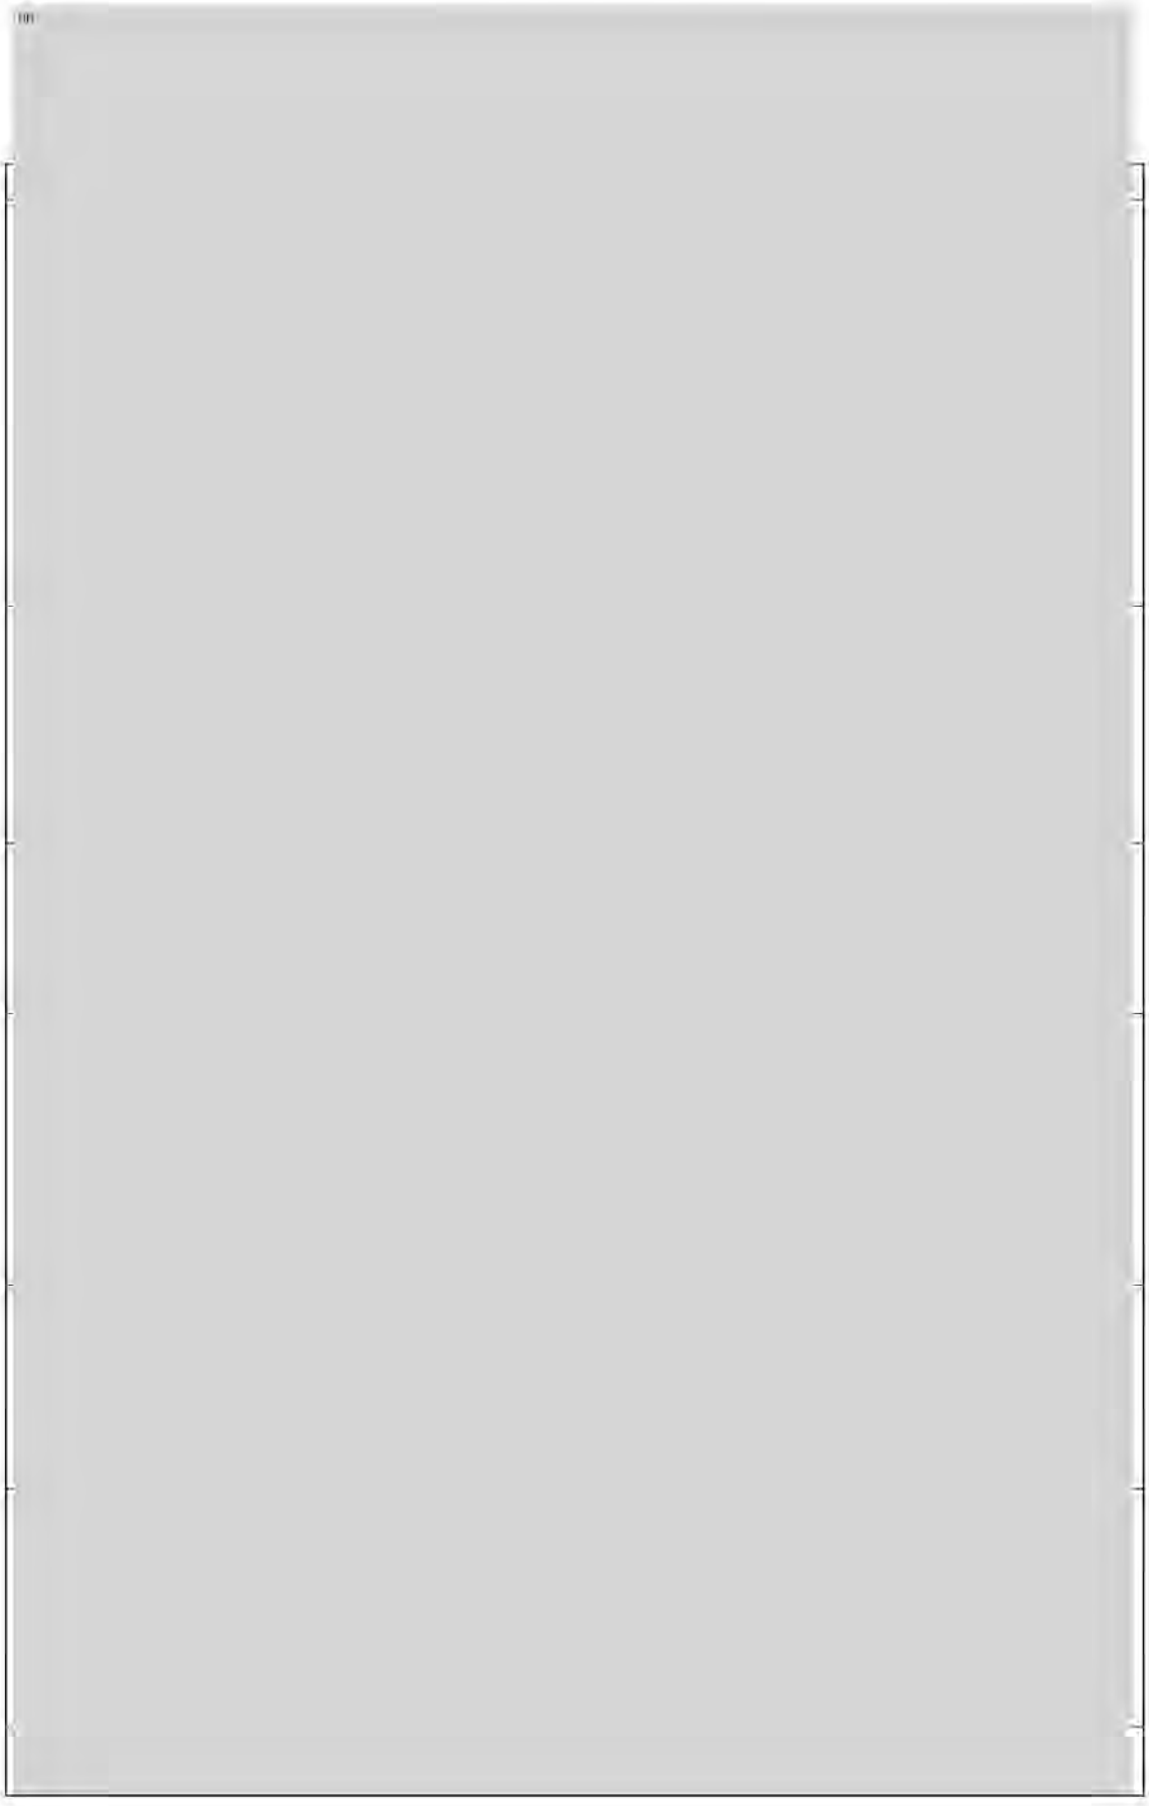

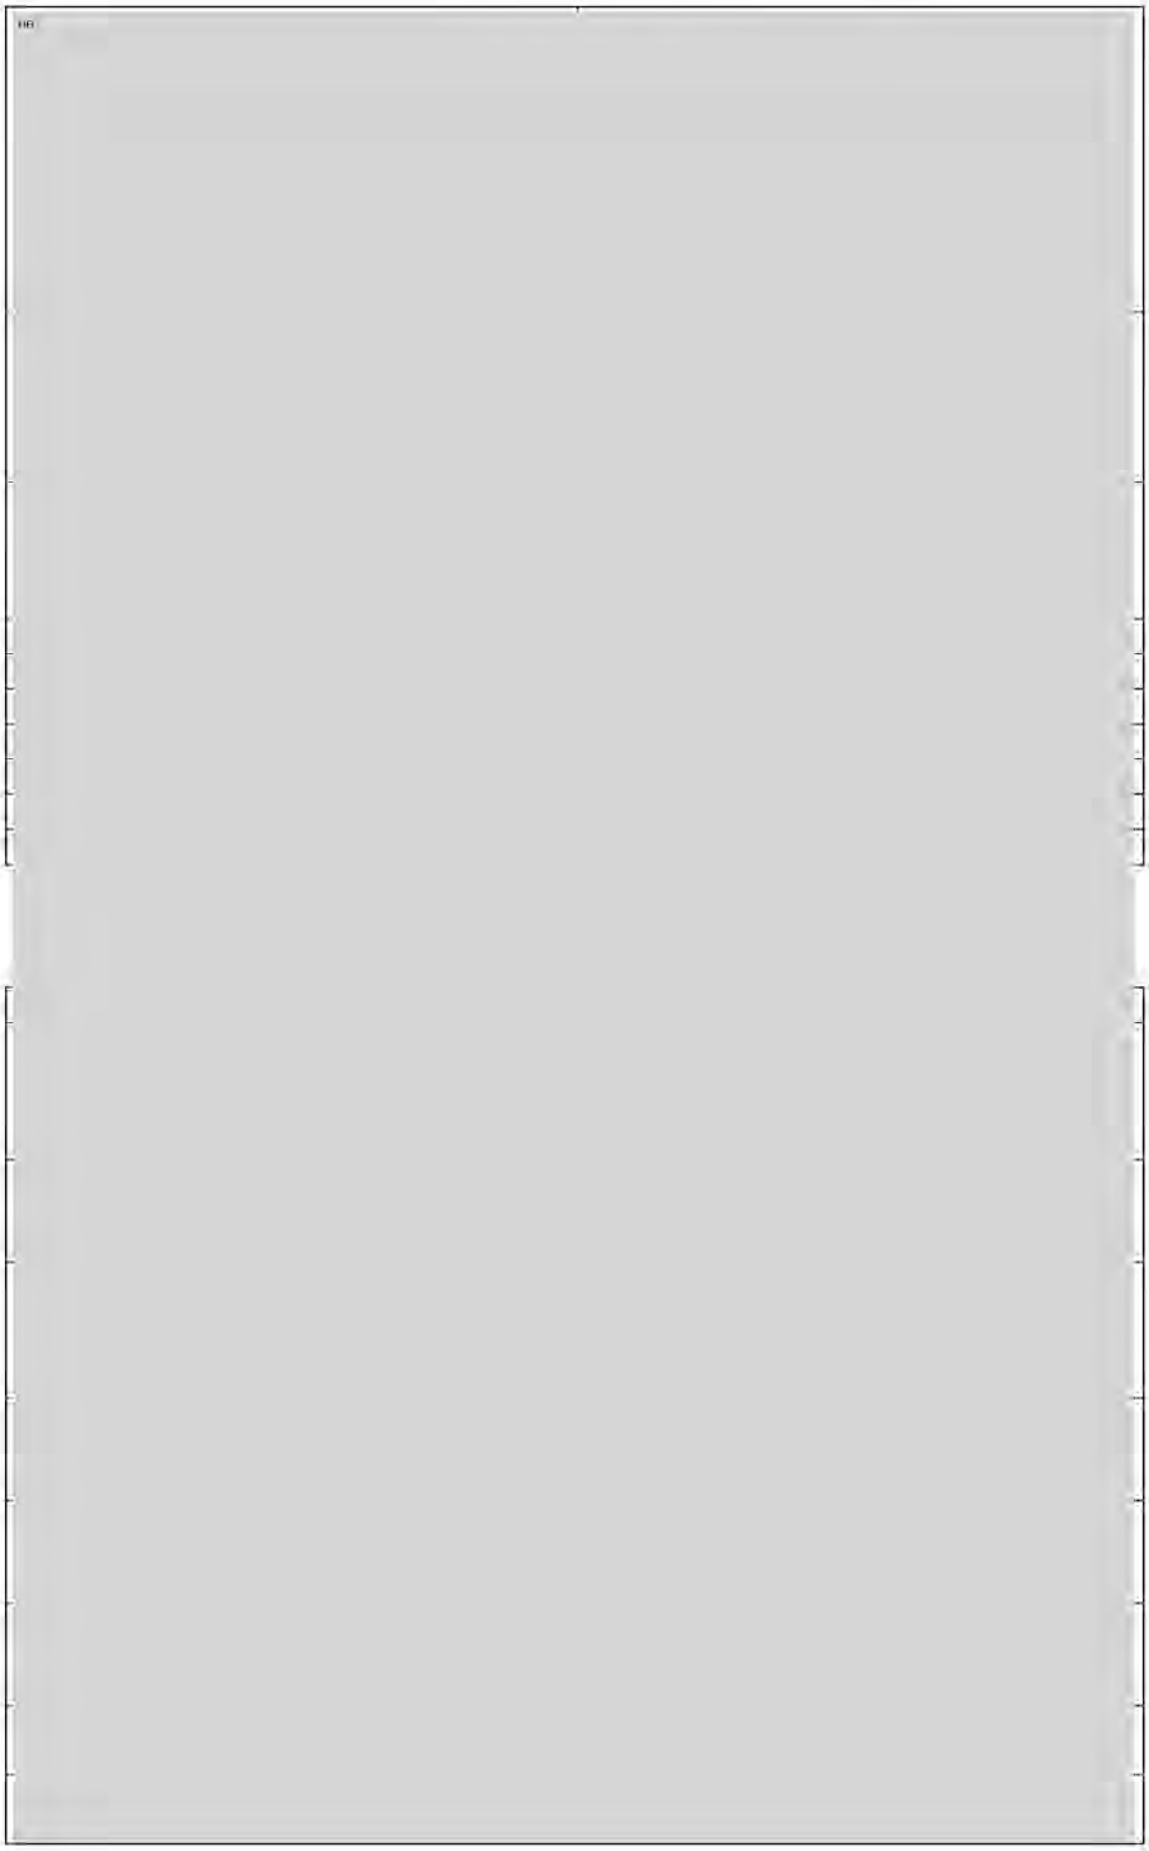

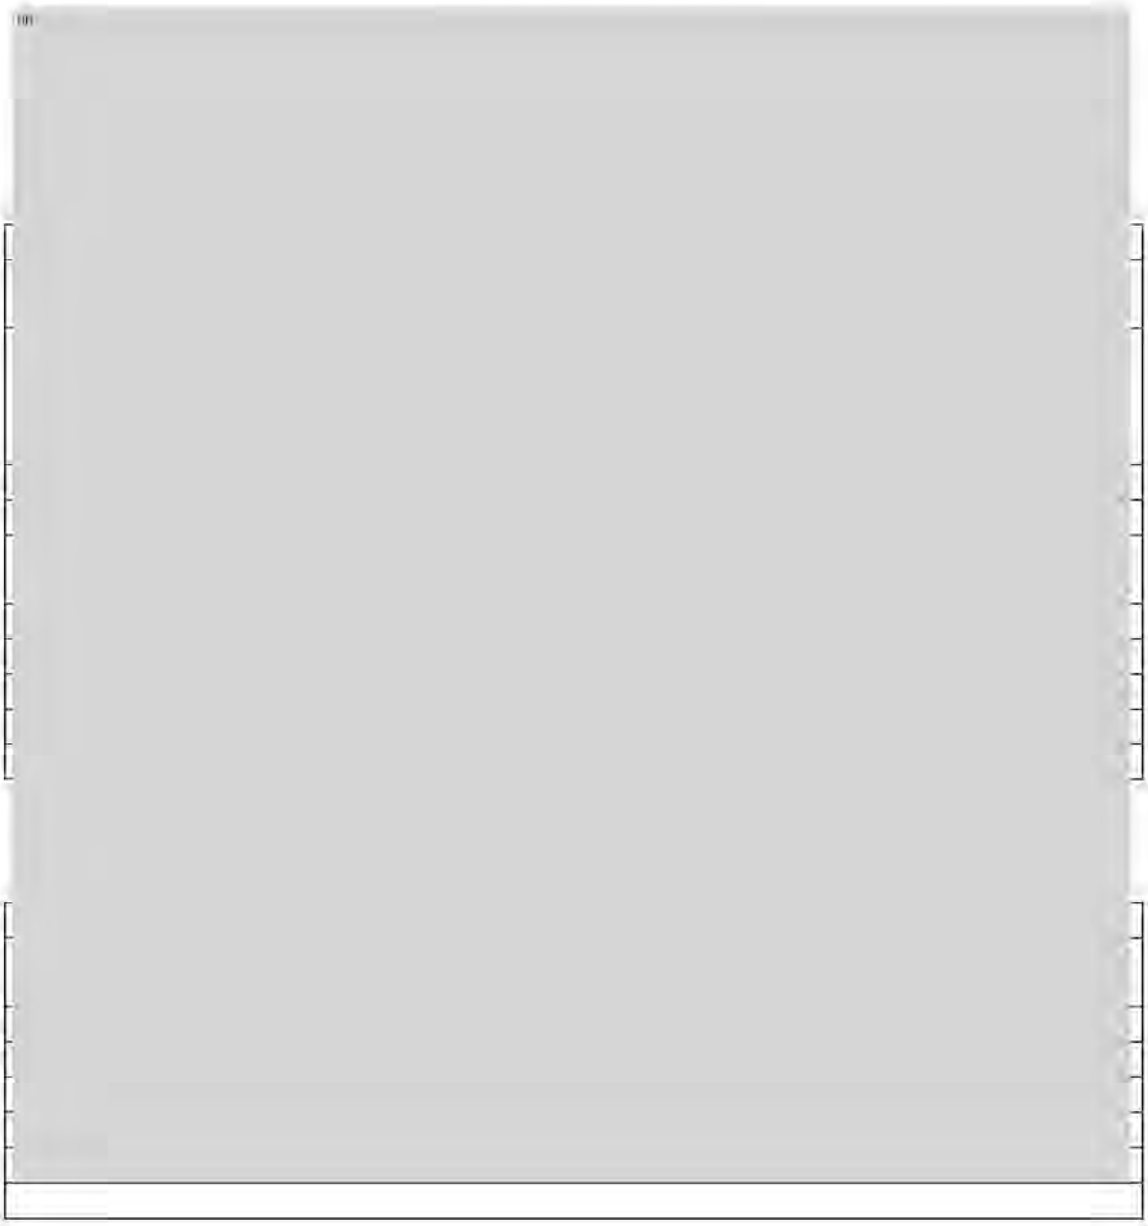

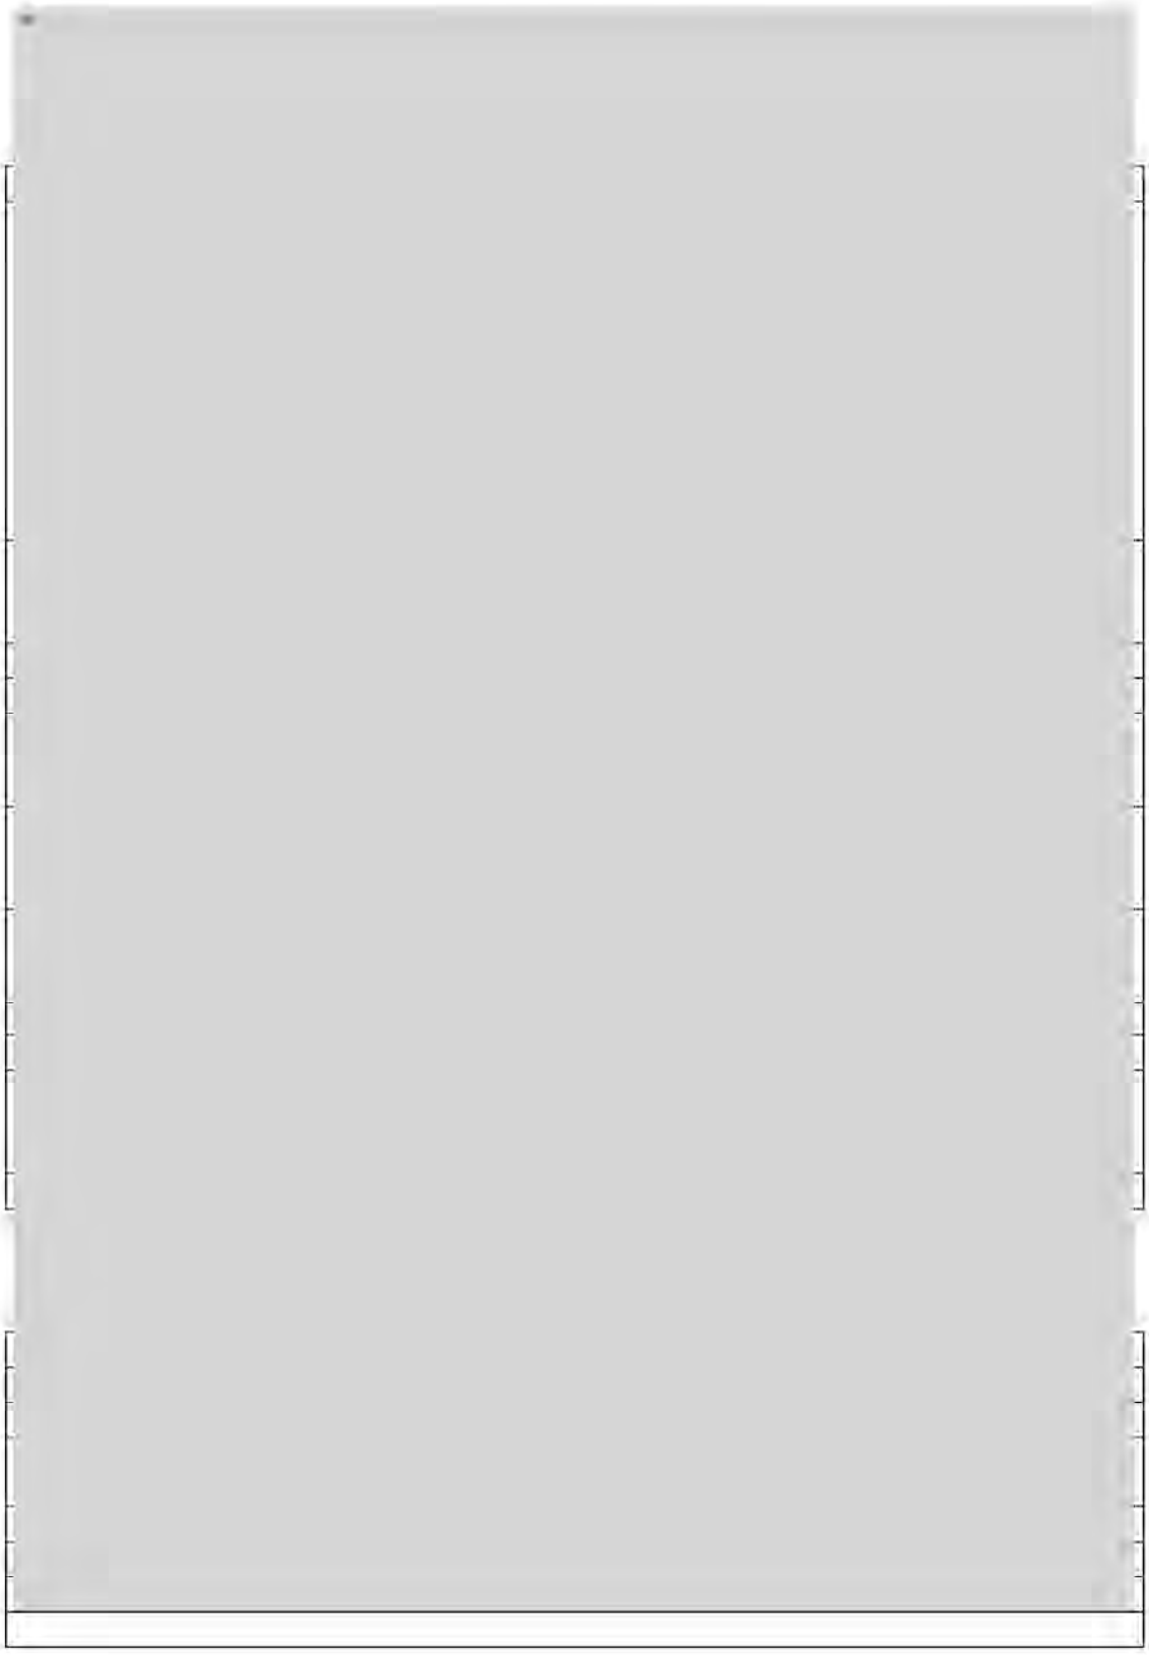

# 13 Communicatie

## 13.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| | |
| De vergadering van de begeleidingscommissie Vlietzone eind mei is ingericht als informatiebijeenkomst over het 'Molenvlietpark'. Naast de leden van de commissie werden bewoners en andere belanghebbenden uitgenodigd. Er werd een uitgebreide toelichting gegeven op het voorlopige ontwerp voor inpassing van de Rotterdamsebaan in de Vlietzone. Ook vertegenwoordigers van Drievliet waren aanwezig om hun plan voor een indoorhal nader toe te lichten. | |
| | |

[redacted]

## 13.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| [redacted] |
| Opstellen plan van aanpak communicatie Molenvlietpark, voorbereiden informatiebijeenkomst inspraak. |
| [redacted] |

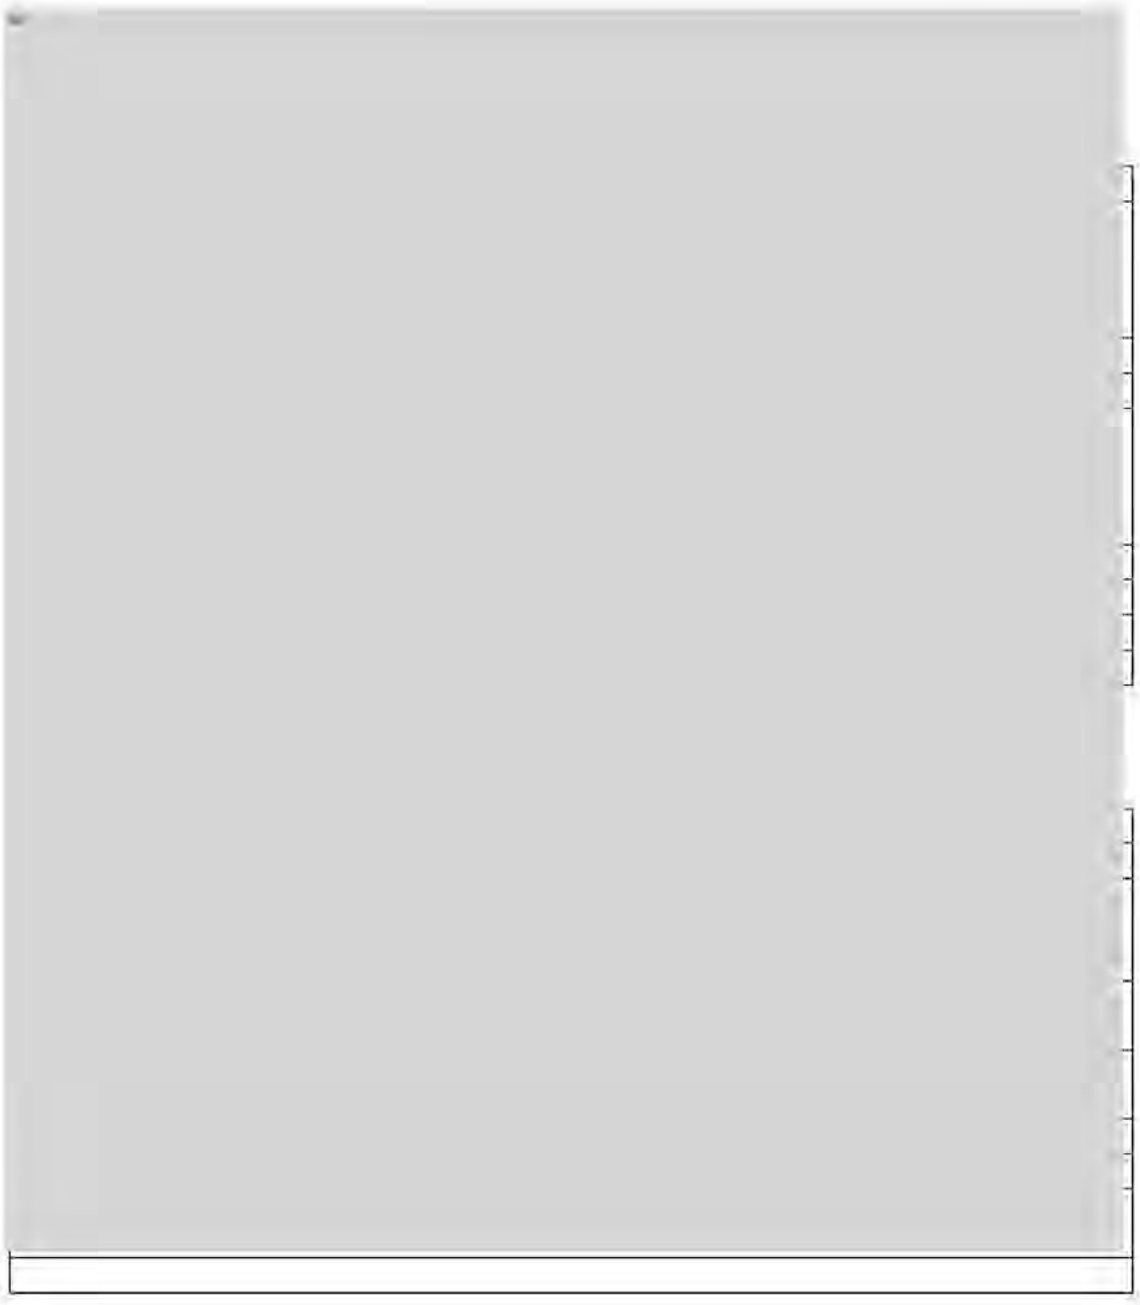

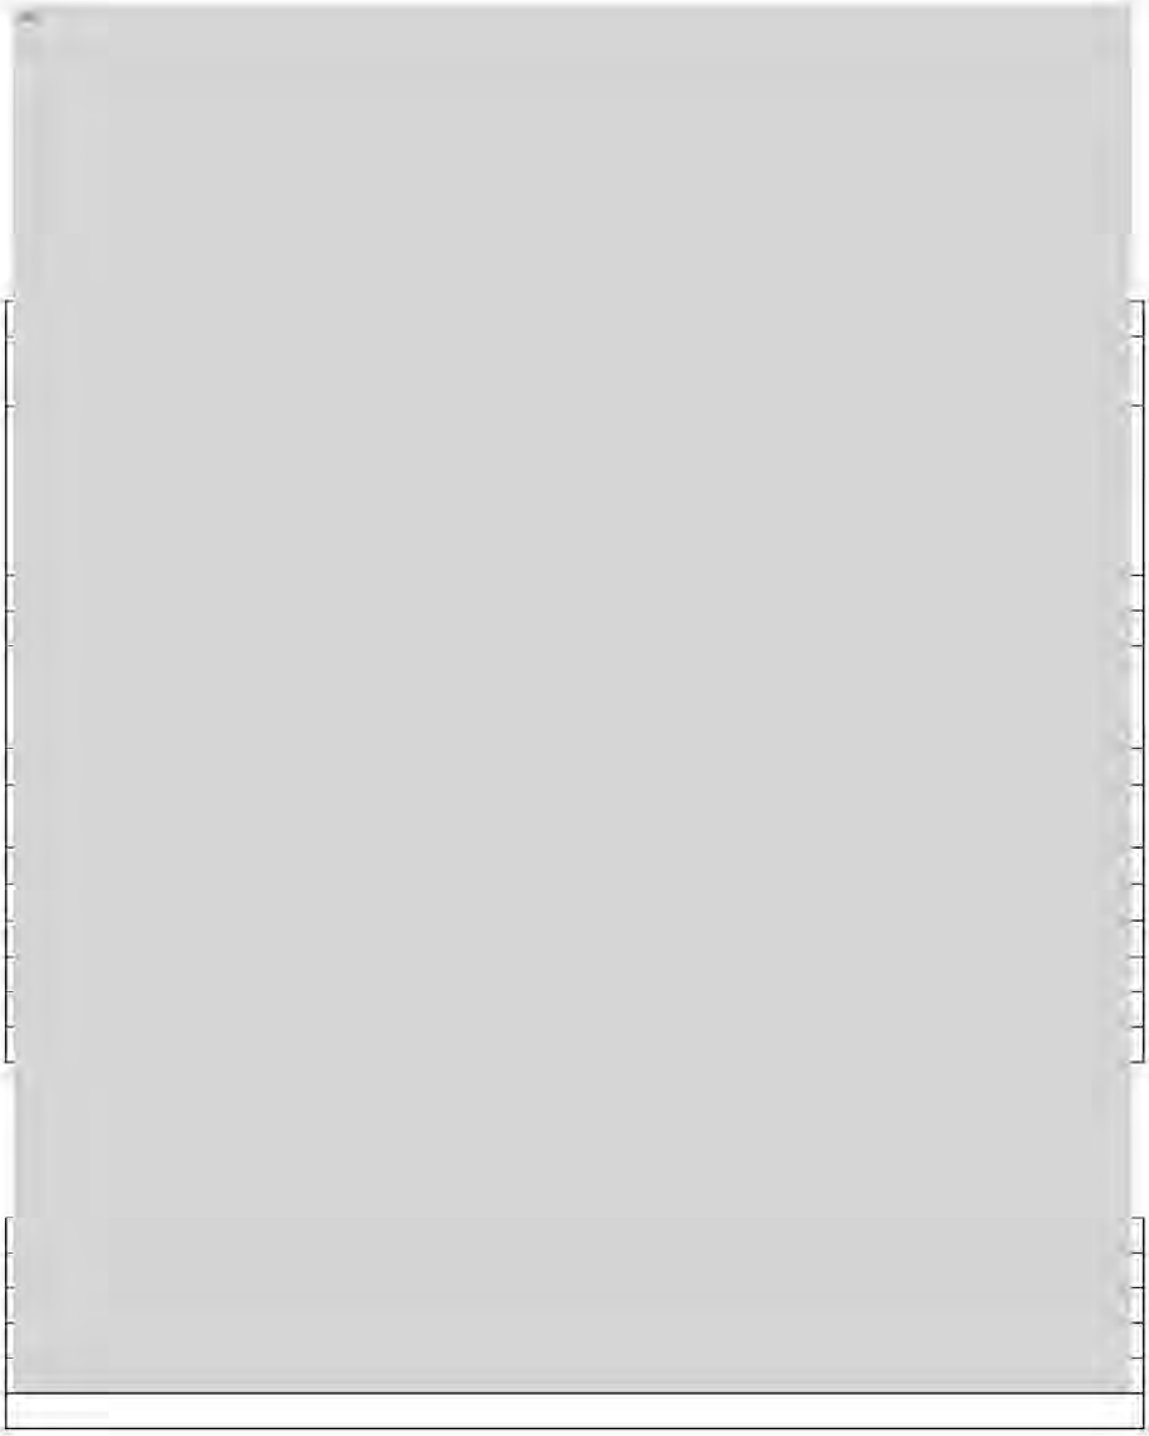

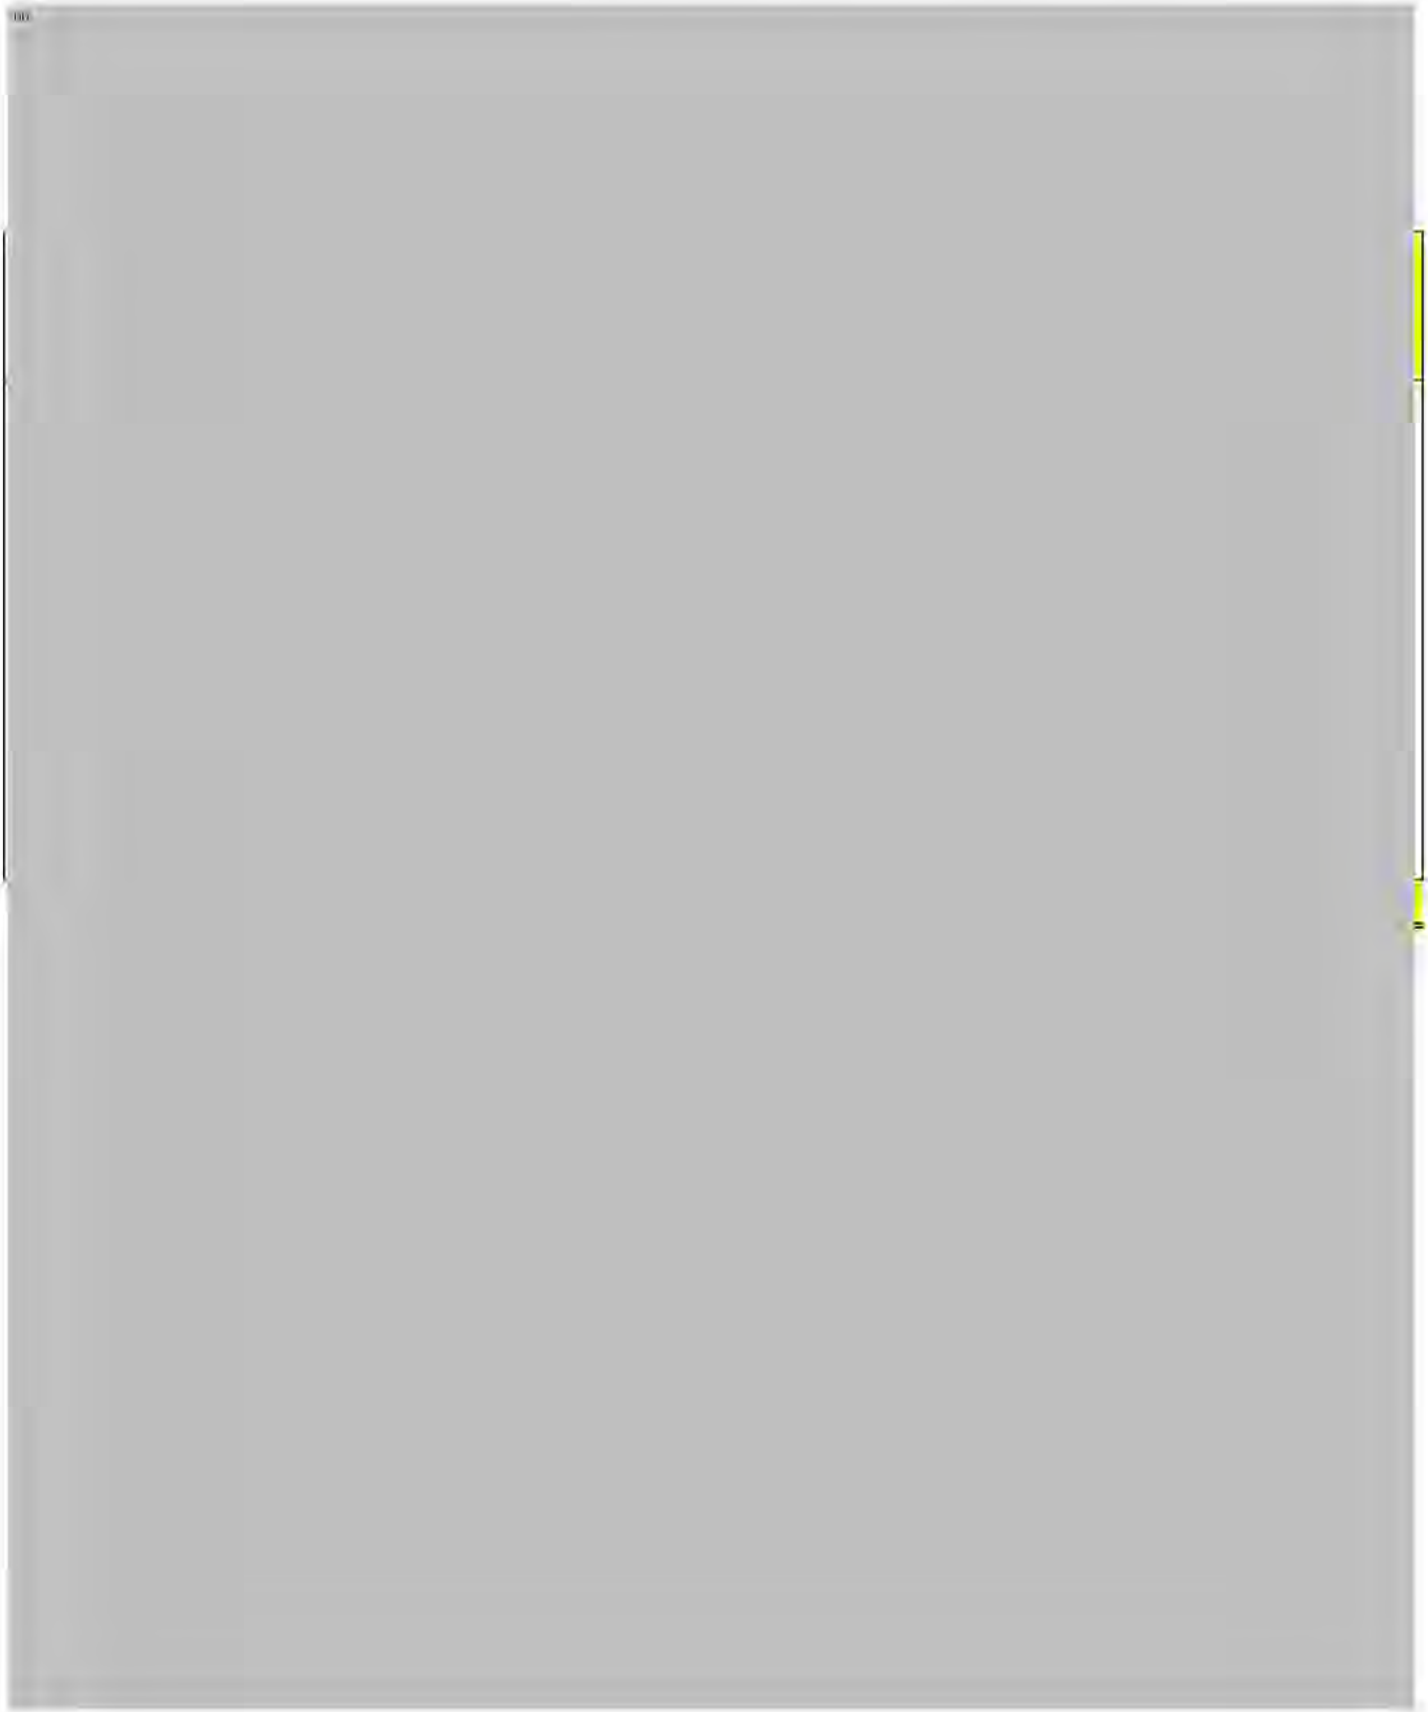

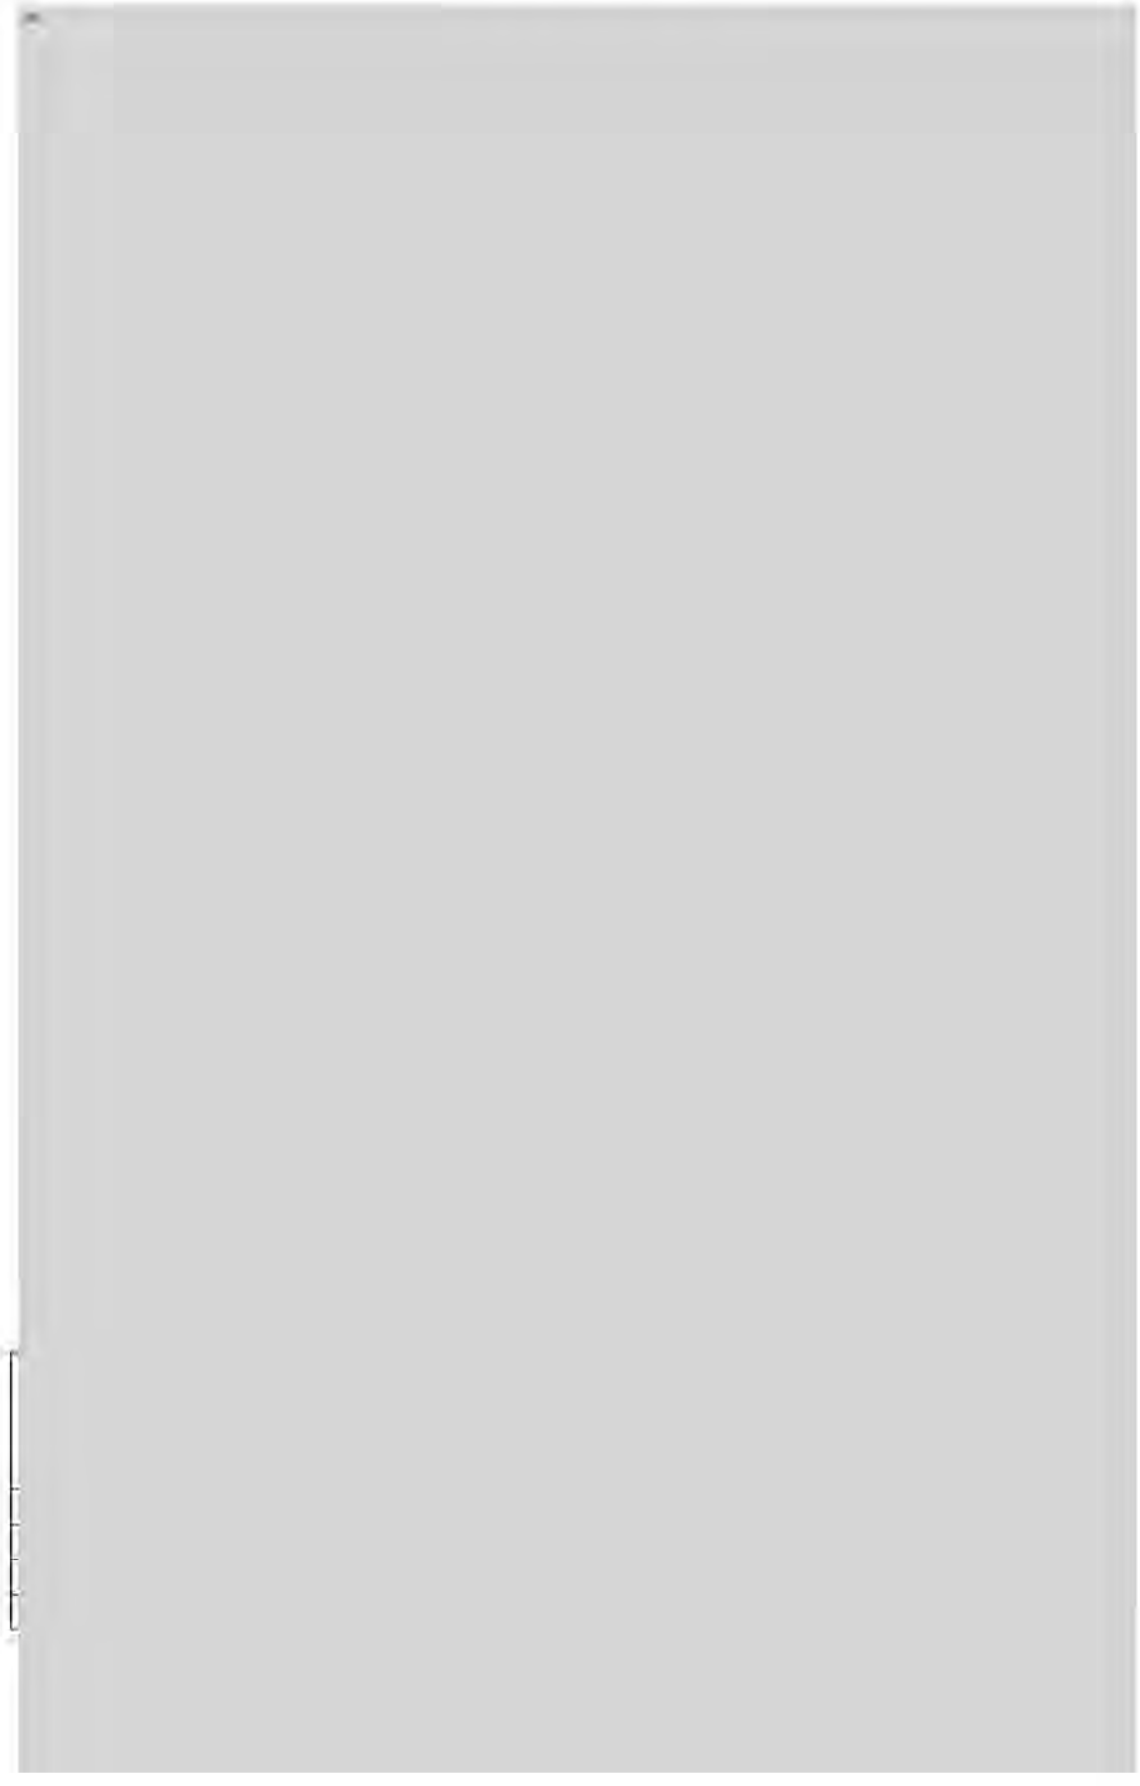



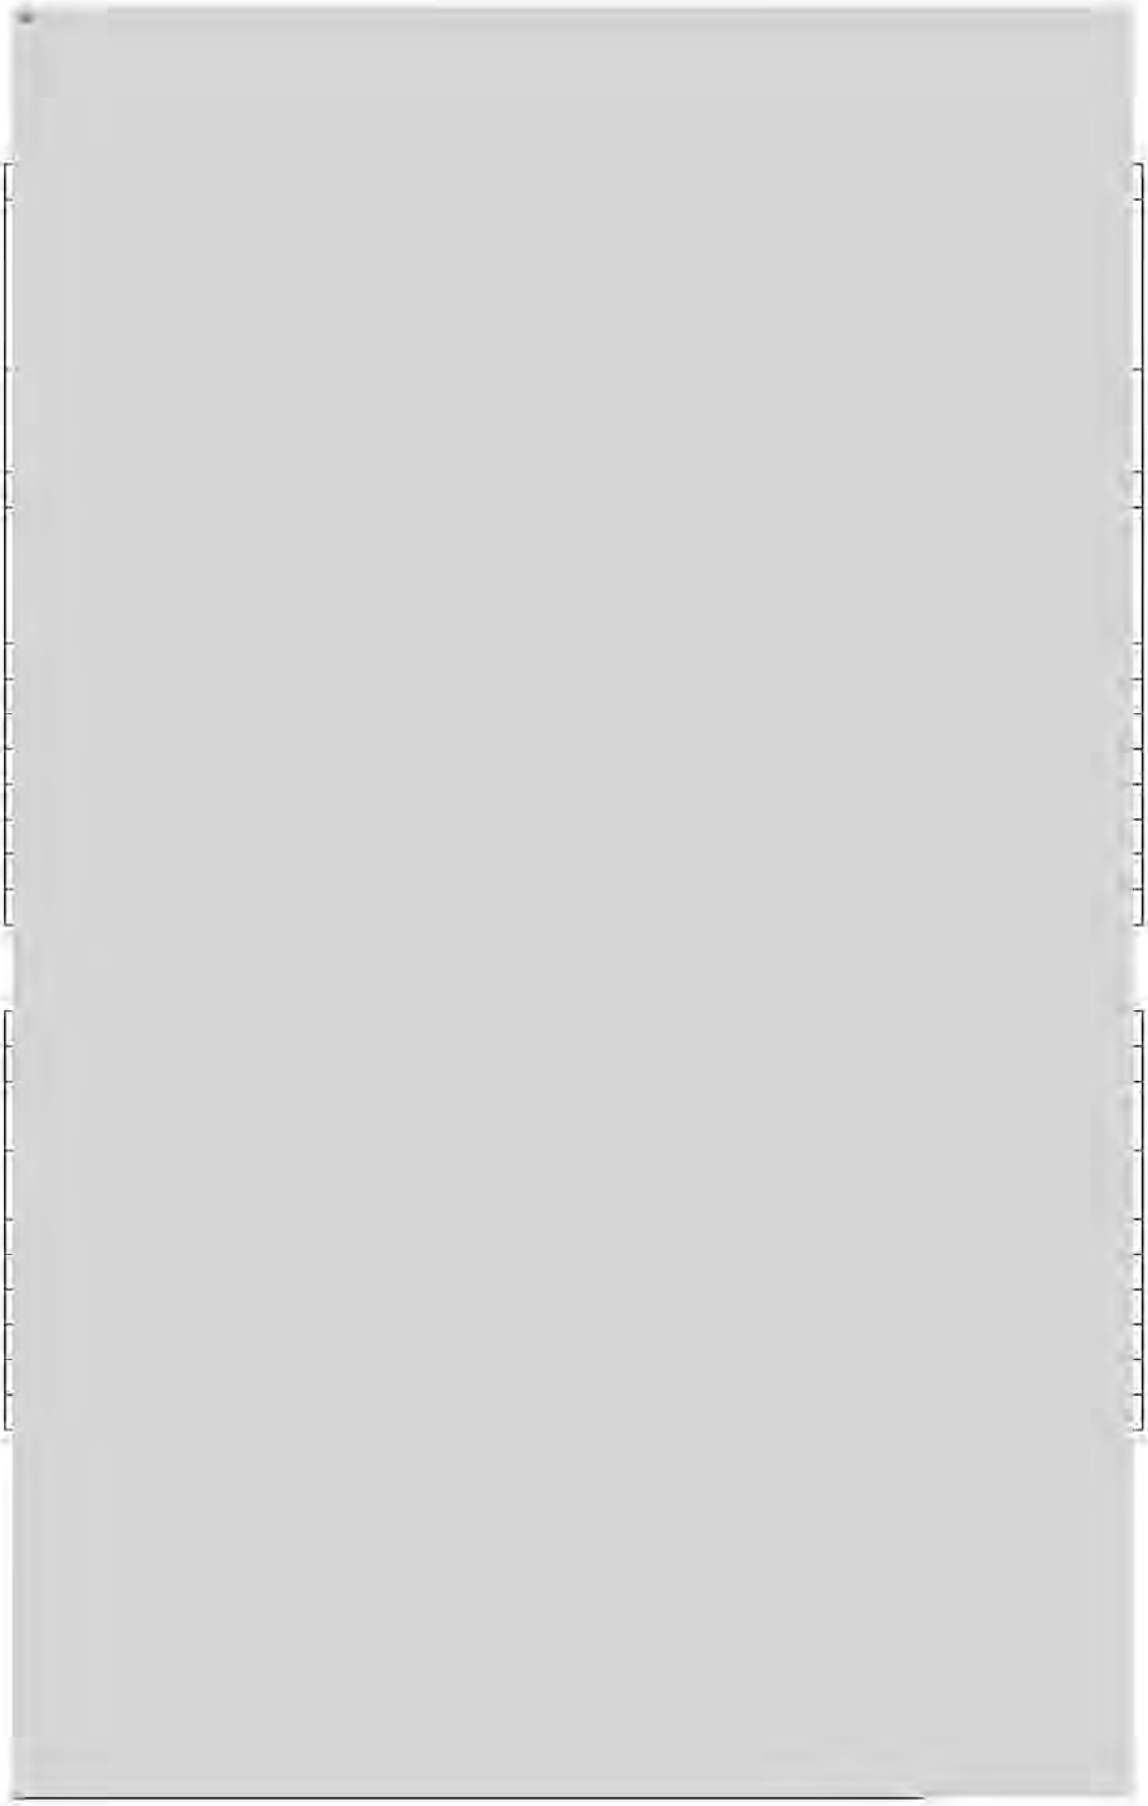

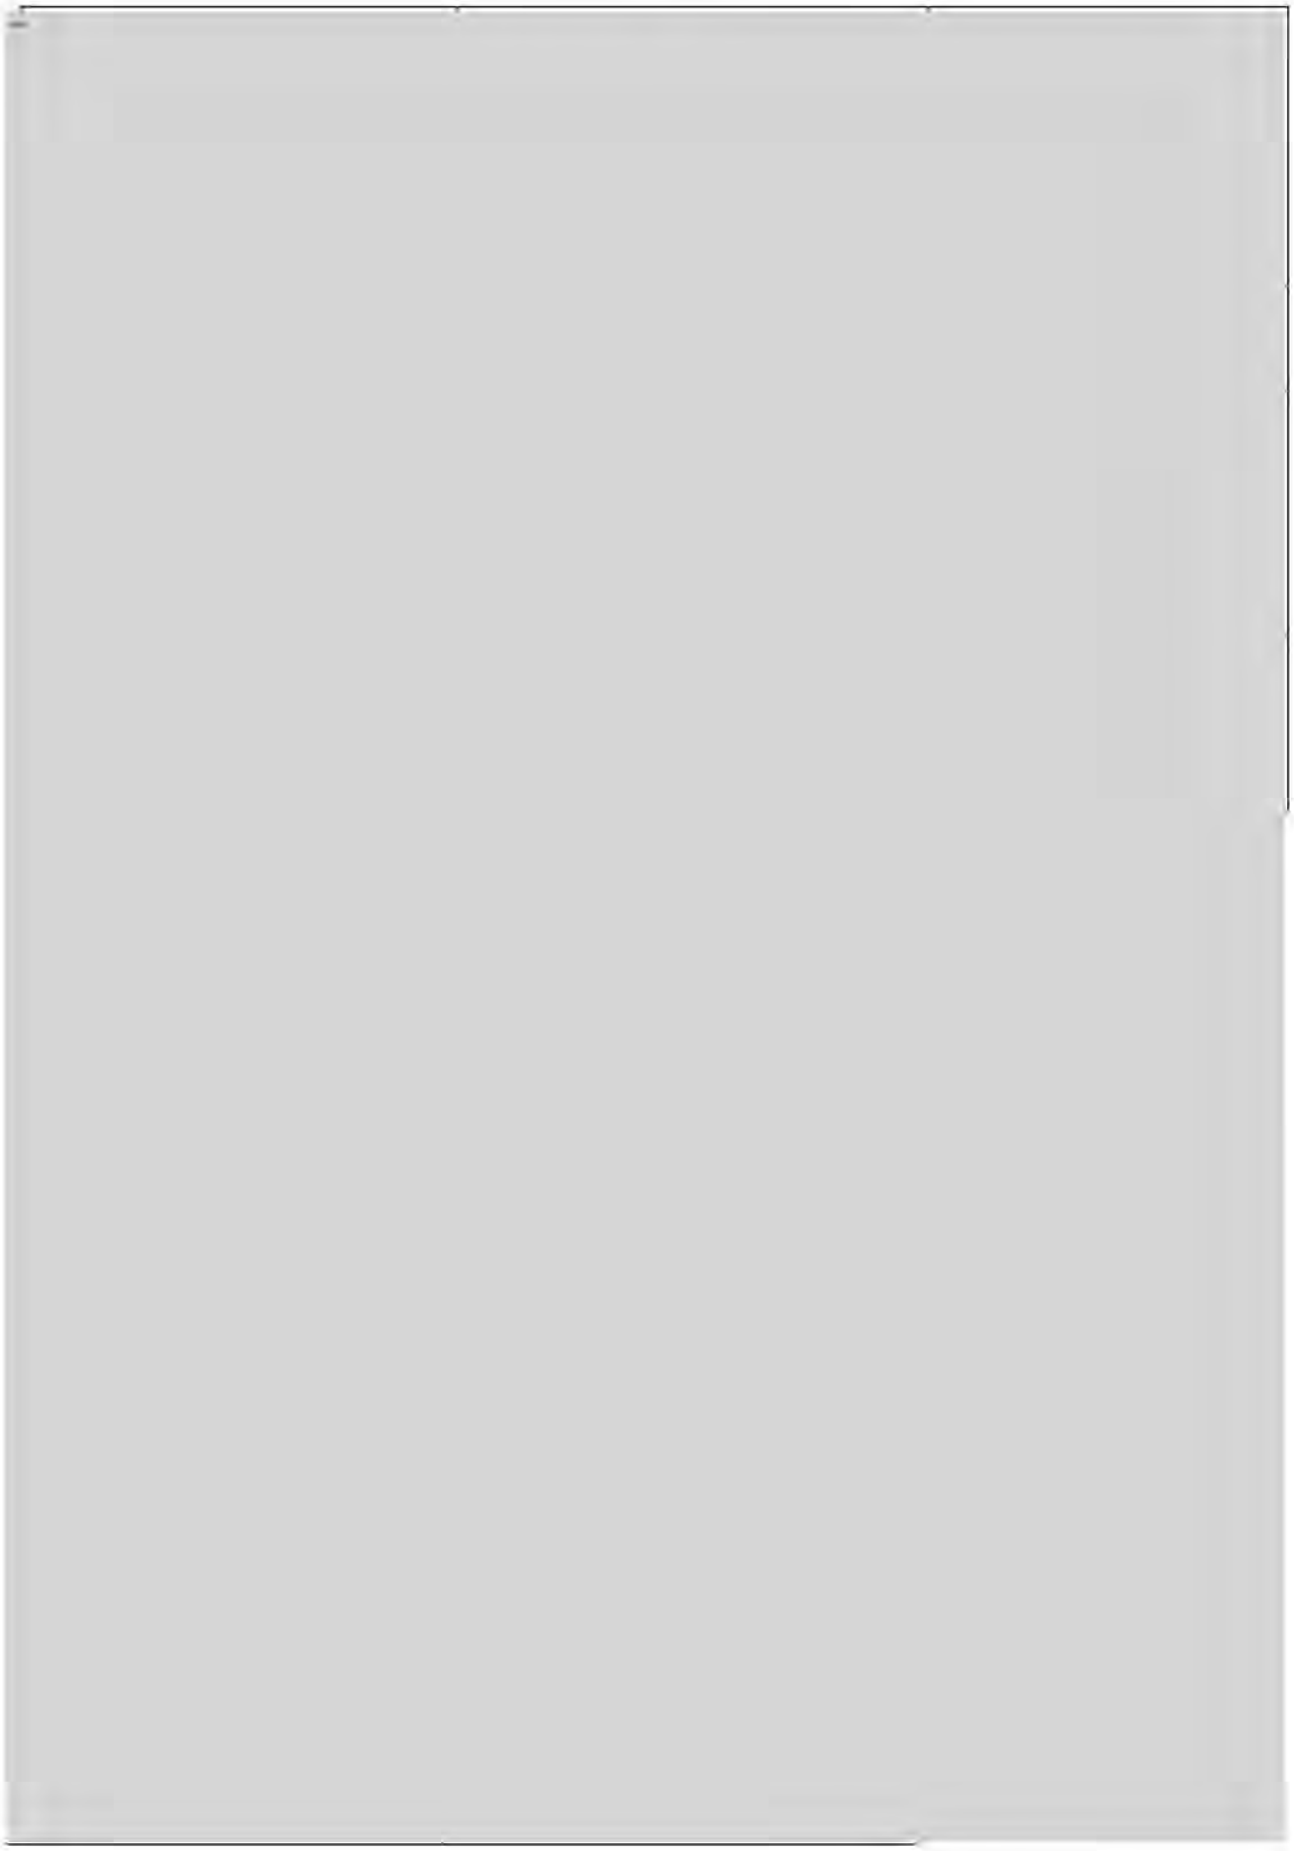

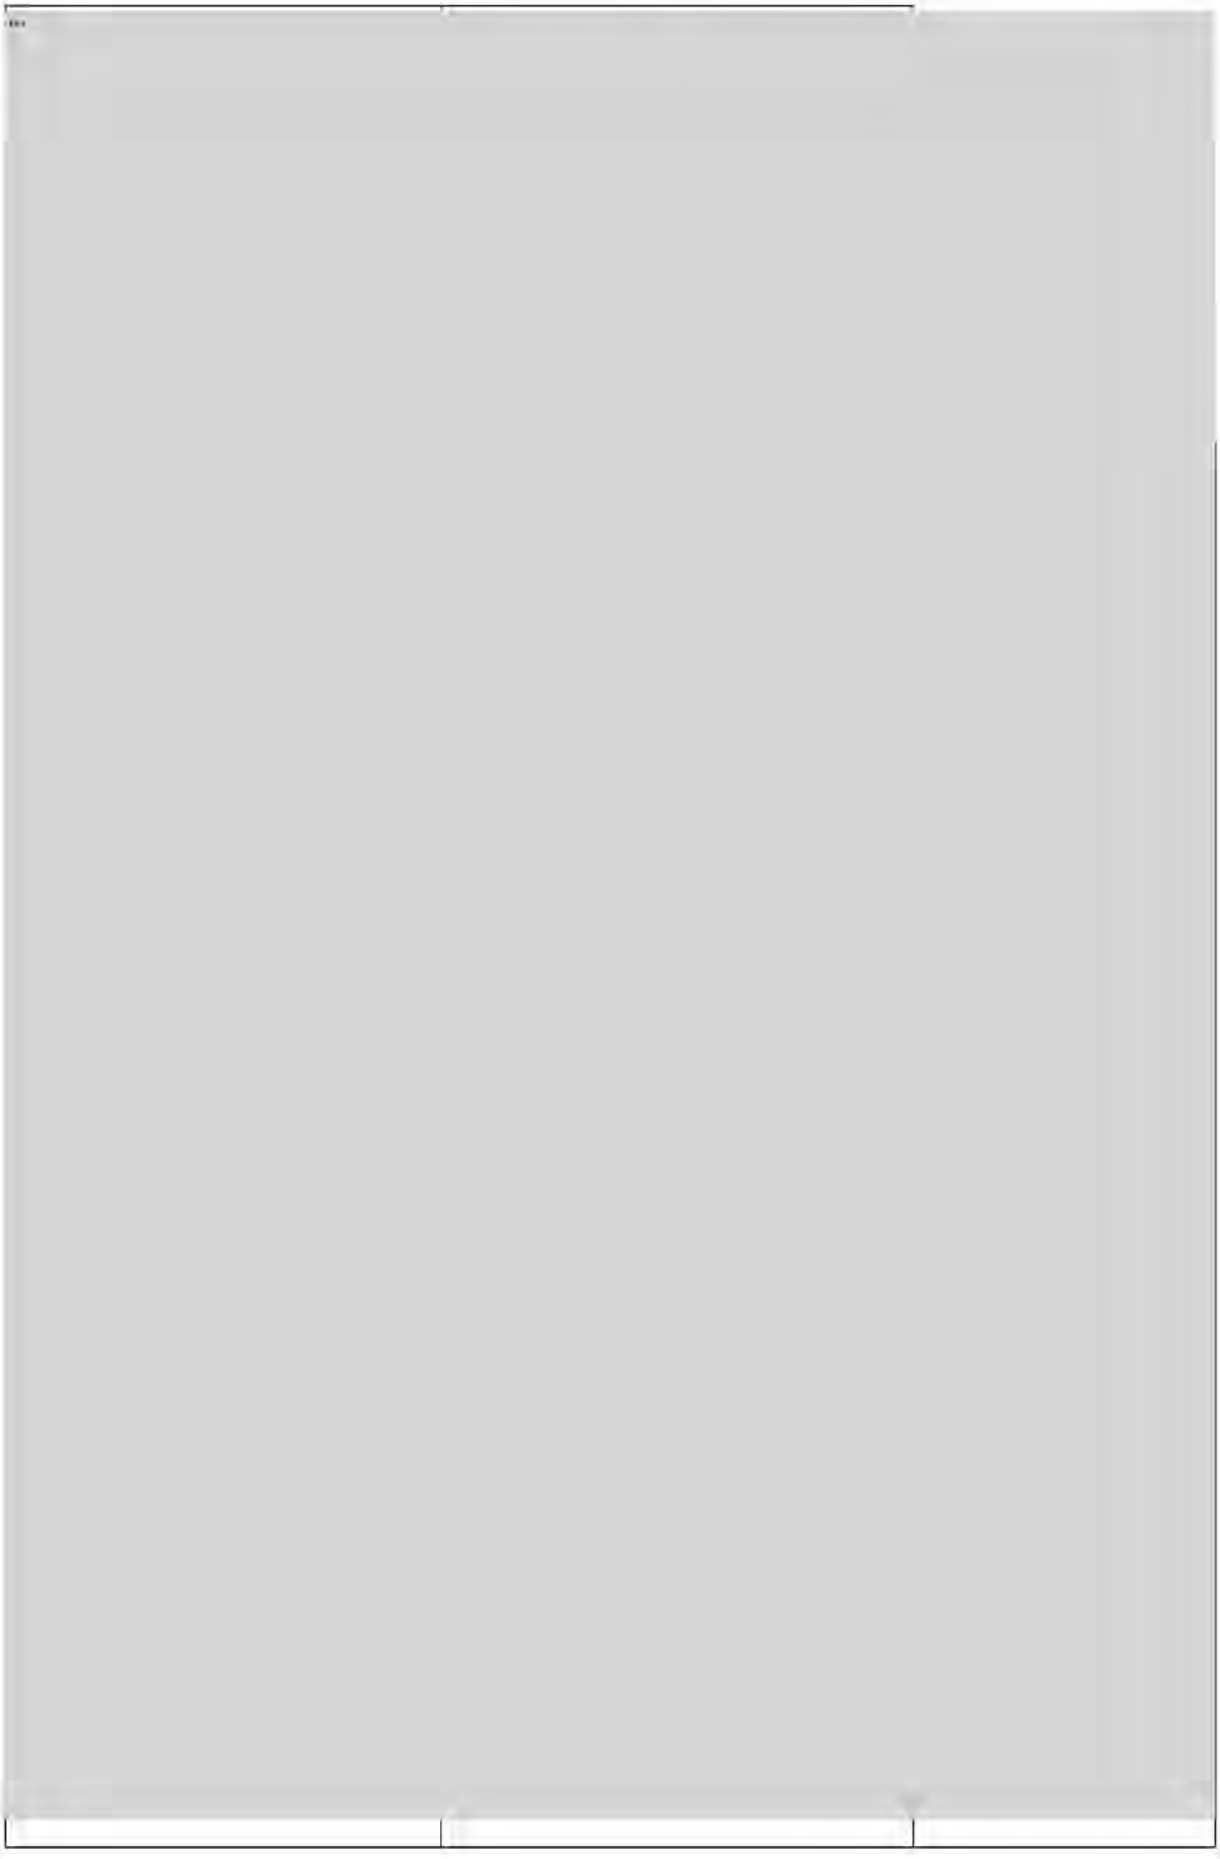

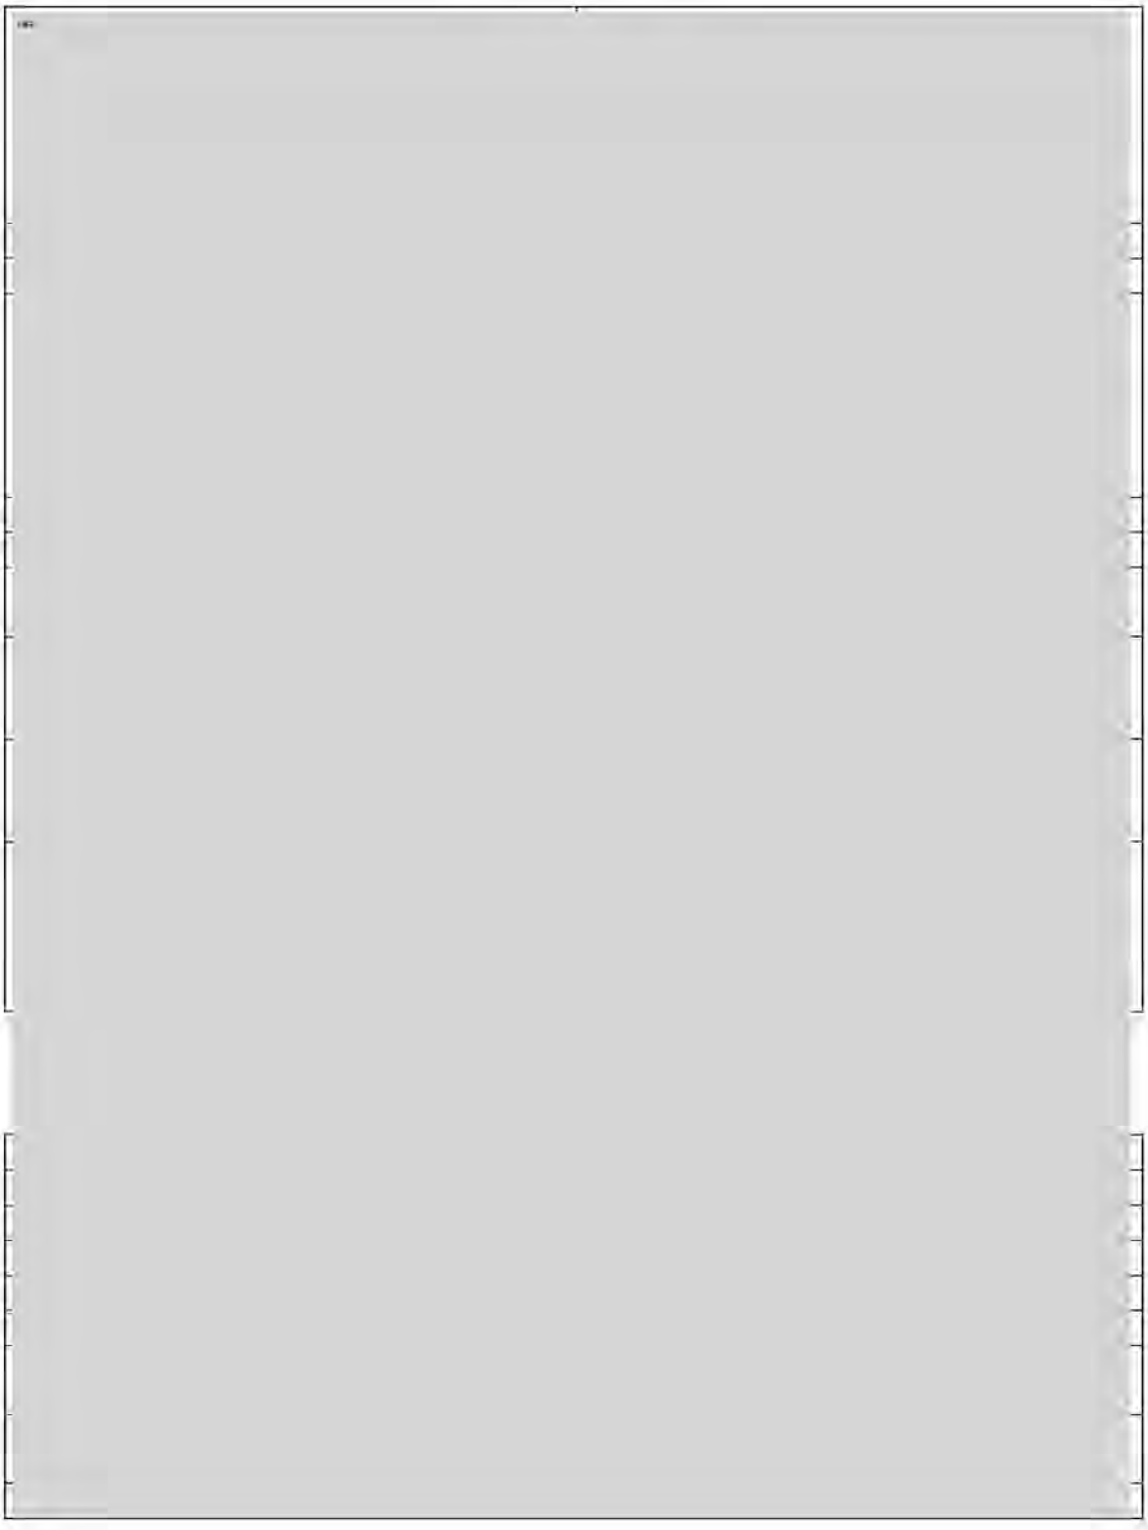

# 19 Scopemanagement

## 19.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| | |
| Opstellen Verzoek tot Wijziging Molenvlietpark (pm: excl. Trekfietstracé, hiervoor volgt, indien gewenst, op termijn een separate VtW i.s.m. DSO/Verkeer en weth. Verkeer). | |
| | |

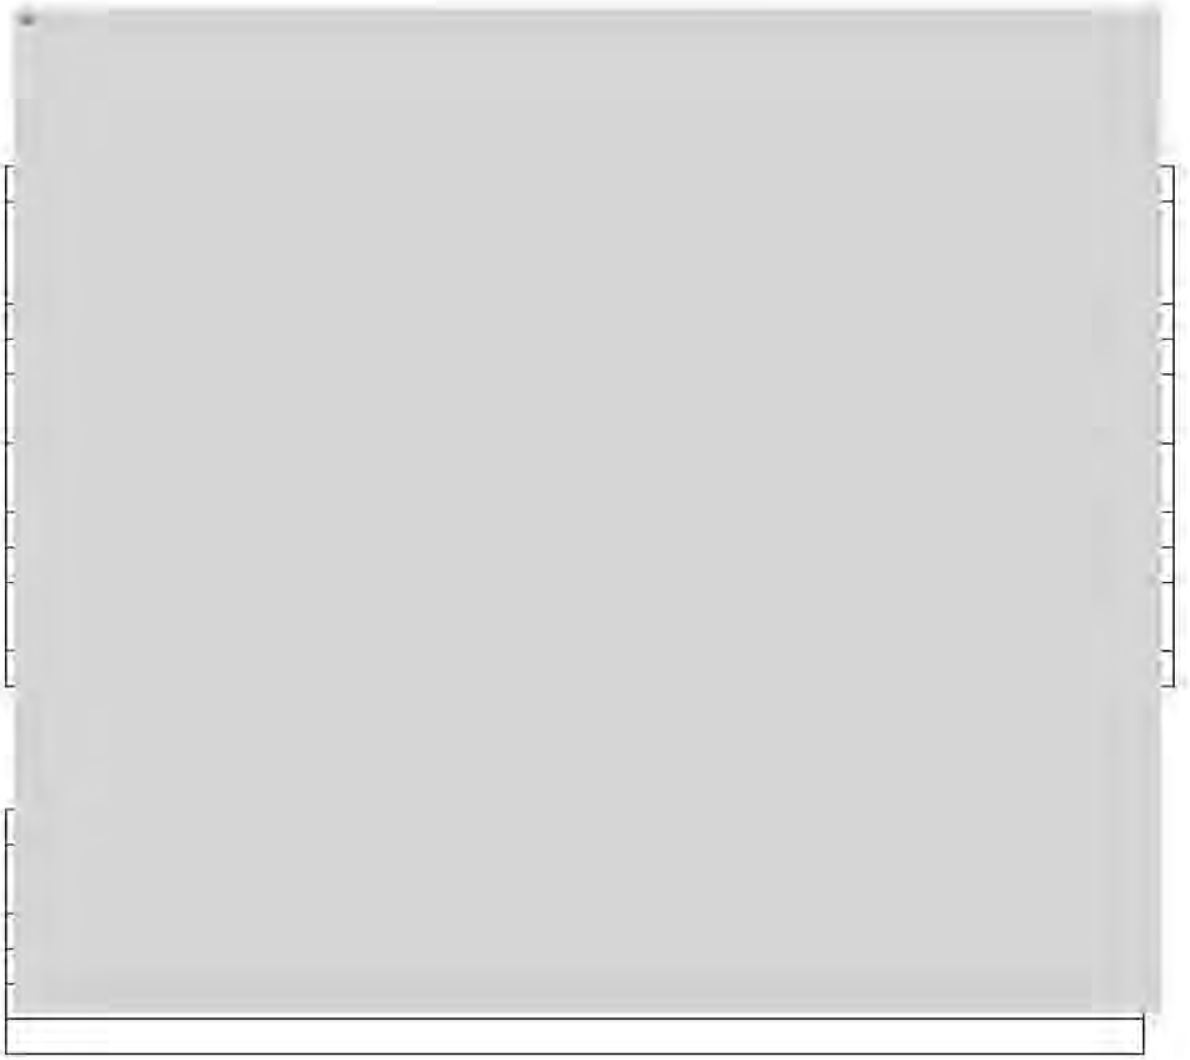

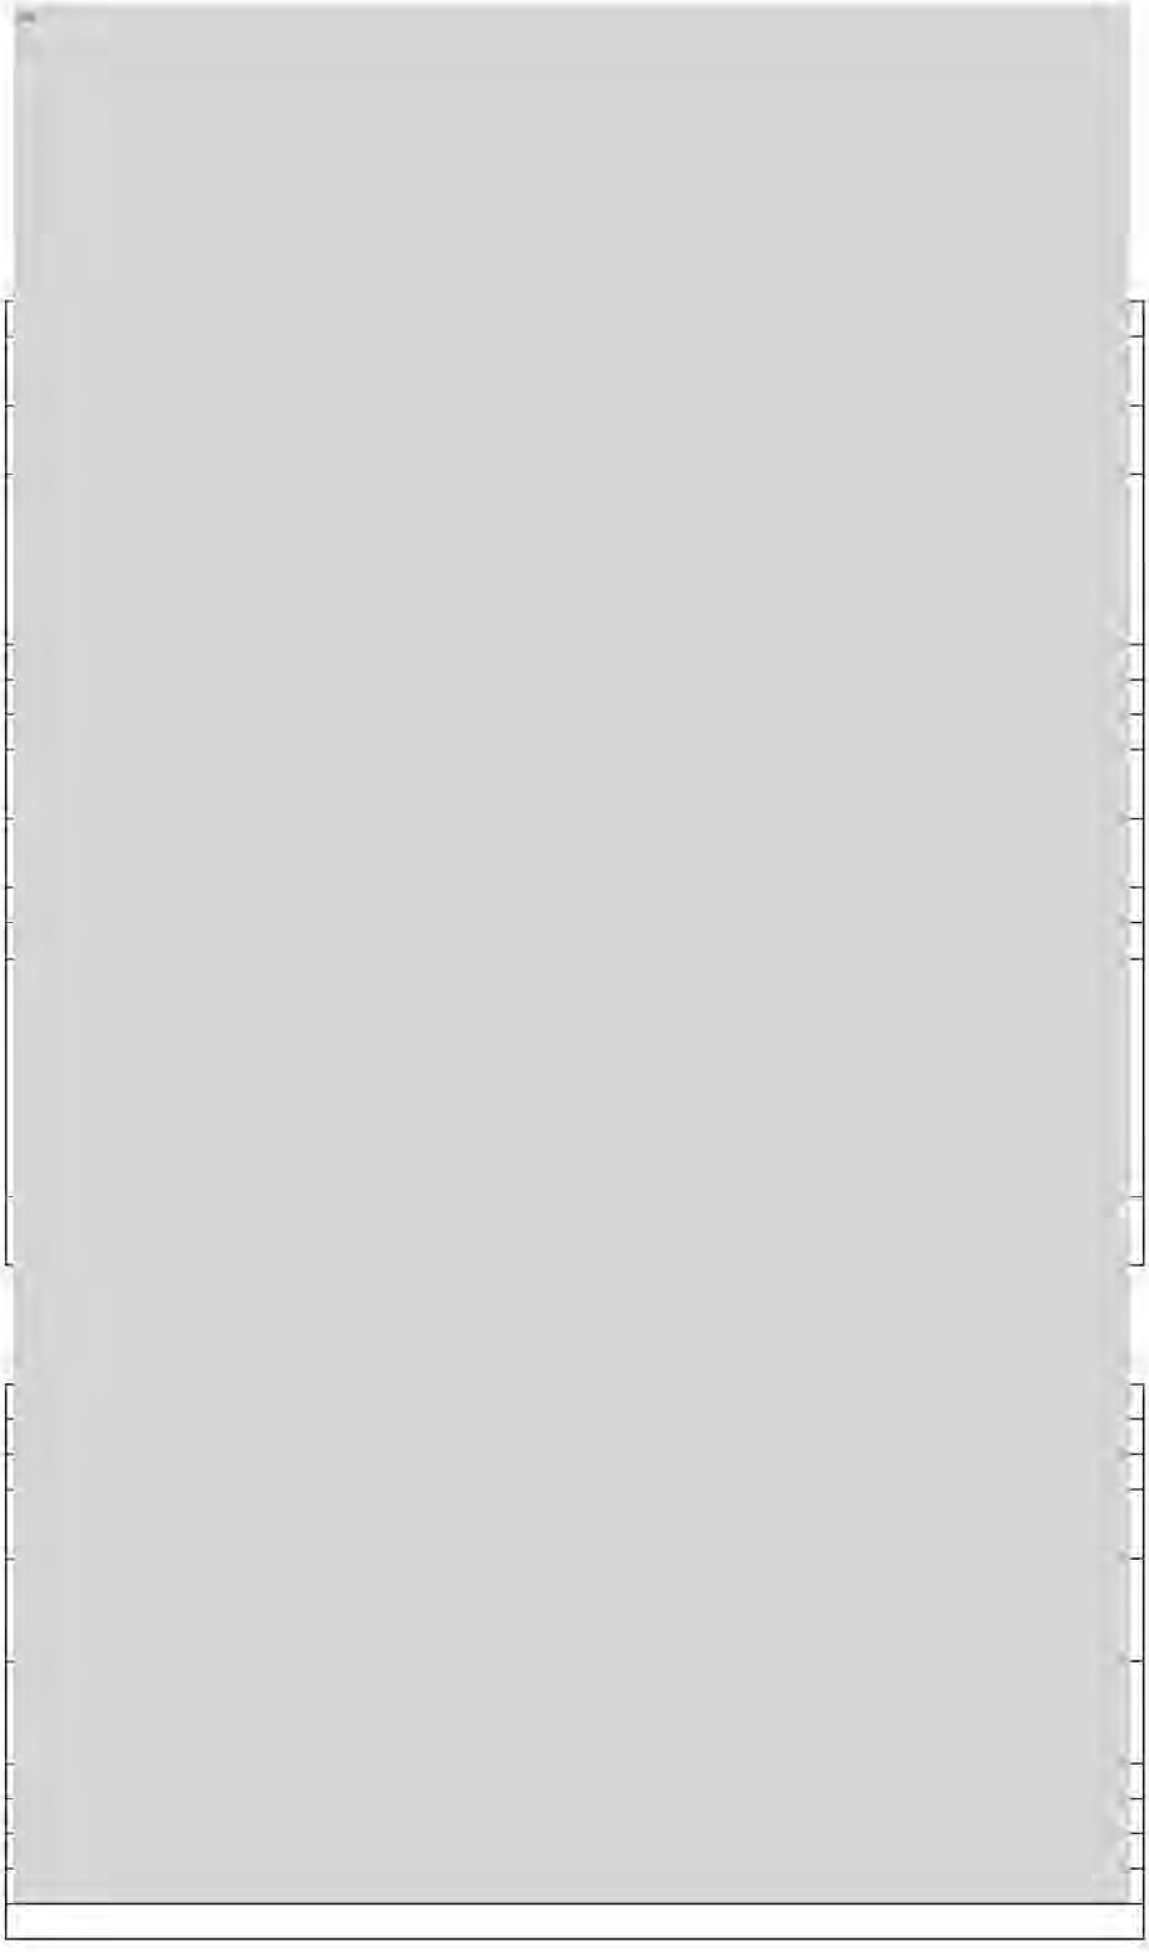

Docnr4

Dienst Stadsbeheer

Afdeling Opdrachtgeving

# Rotterdamsebaan

## Voortgangsrapportage

### 3e kwartaal 2014

**Datum: 16 oktober 2014**

**Intern/vertrouwelijk**

**Versie: 1.0**

| **Opgesteld:** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|
| d.d.: 10 oktober 2014 | d.d.: 13 oktober 2014 | d.d.: 15 oktober2014 | d.d.: 27 oktober 2014 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Directeur Dienst Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever Rotterdamsebaan | Dhr. B. Revis, wethouder Verkeer, Binckhorst en Vlietzone / Portefeuillehouder Rotterdamsebaan |

# Inhoudsopgave

**1. Inleiding** ..... **5**
1.1 Aandachtspunten ..... 5
1.2 Algemeen ..... 5
1.3 Terugblik afgelopen kwartaal ..... 5
1.4 Stand van zaken KPI ..... 6
1.5 Verwachting / ontwikkeling ..... 6
1.6 Risico's ..... 6
1.7 Bestuurlijke besluitvorming ..... 6
1.8 Financiën ..... 6
1.9 Voortuitblik komende kwartaal ..... 7
**2 Planstudies** ..... **8**
2.1 Afgelopen kwartaal ..... 8
2.2 Komende kwartaal ..... 8
**3 Omgevingsmanagement** ..... **9**
3.1 Afgelopen kwartaal ..... 9
3.2 Komend kwartaal ..... 10
**4 Verwerving** ..... **11**
4.1 Afgelopen kwartaal ..... 11
4.2 Komende kwartaal ..... 12
**5 Vergunningen en overeenkomsten** ..... **13**
5.1 Afgelopen kwartaal ..... 13
5.2 Komende kwartaal ..... 13
**6 Conditionering Binckhorstlaan** ..... **14**
6.1 Afgelopen kwartaal ..... 14
6.2 Komende kwartaal ..... 14
**7 Conditionering Vlietzone** ..... **15**
7.1 Afgelopen kwartaal ..... 15
7.2 Komende kwartaal ..... 15
**8 Voorbereiding t.b.v. hoofdcontract** ..... **16**
8.1 Afgelopen kwartaal ..... 16
8.2 Komende kwartaal ..... 18
**9 Spoorboogweg, Regulusweg en Verlengde-Melkwegstraat** ..... **19**
9.1 Afgelopen kwartaal ..... 19
9.2 Komende kwartaal ..... 19
**10 Tunnelveiligheid** ..... **20**
10.1 Afgelopen kwartaal ..... 20
10.2 Komend kwartaal ..... 20
**11 Aanbesteding hoofdcontract** ..... **21**
11.1 Afgelopen kwartaal ..... 21
11.2 Komende kwartaal ..... 21
**12 Aanbesteding deelcontracten** ..... **22**
12.1 Afgelopen kwartaal ..... 22
12.2 Komende kwartaal ..... 22
**13 Communicatie** ..... **23**
13.1 Afgelopen kwartaal ..... 23
13.2 Komende kwartaal ..... 24
**14 Beheer en overdracht** ..... **25**

14.1 Afgelopen kwartaal ... 25
14.2 Komend kwartaal ... 25
**15 Organisatie ... 26**
15.1 Afgelopen kwartaal ... 26
15.2 Komend kwartaal ... 26
**16 Financien ... 27**
16.1 Kostenstructuur ... 27
16.2 Dekkingen ... 28
**17 Risicobeheer ... 31**
17.1 Afgelopen kwartaal ... 31
17.2 Komende kwartaal ... 31
17.3 Financiële toprisico's ... 32
17.4 Toprisico's planning ... 34
**18 Planning ... 36**
18.1 Afgelopen kwartaal ... 36
18.2 Komende kwartaal ... 37
**19 Scopemanagement ... 38**
19.1 Afgelopen kwartaal ... 38
19.2 Komende kwartaal ... 38
**20 Kwaliteitsbeheer ... 39**
20.1 Afgelopen kwartaal ... 39
20.2 Komende kwartaal ... 39
**21 Informatiebeheer ... 40**
21.1 Afgelopen kwartaal ... 40
21.2 Komend kwartaal ... 40
**Bijlage 1: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan ... 41**
**Bijlage 2: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer ... 43**

# 1. Inleiding

[redacted]

## 1.3 Terugblik afgelopen kwartaal

[redacted]

- Collegebesluit t.b.v. het voor inspraak vrijgeven van het VO Molenvlietpark t.b.v. de landschappelijke inpassing van de Rotterdamsebaan in de Vlietzone;

[redacted]

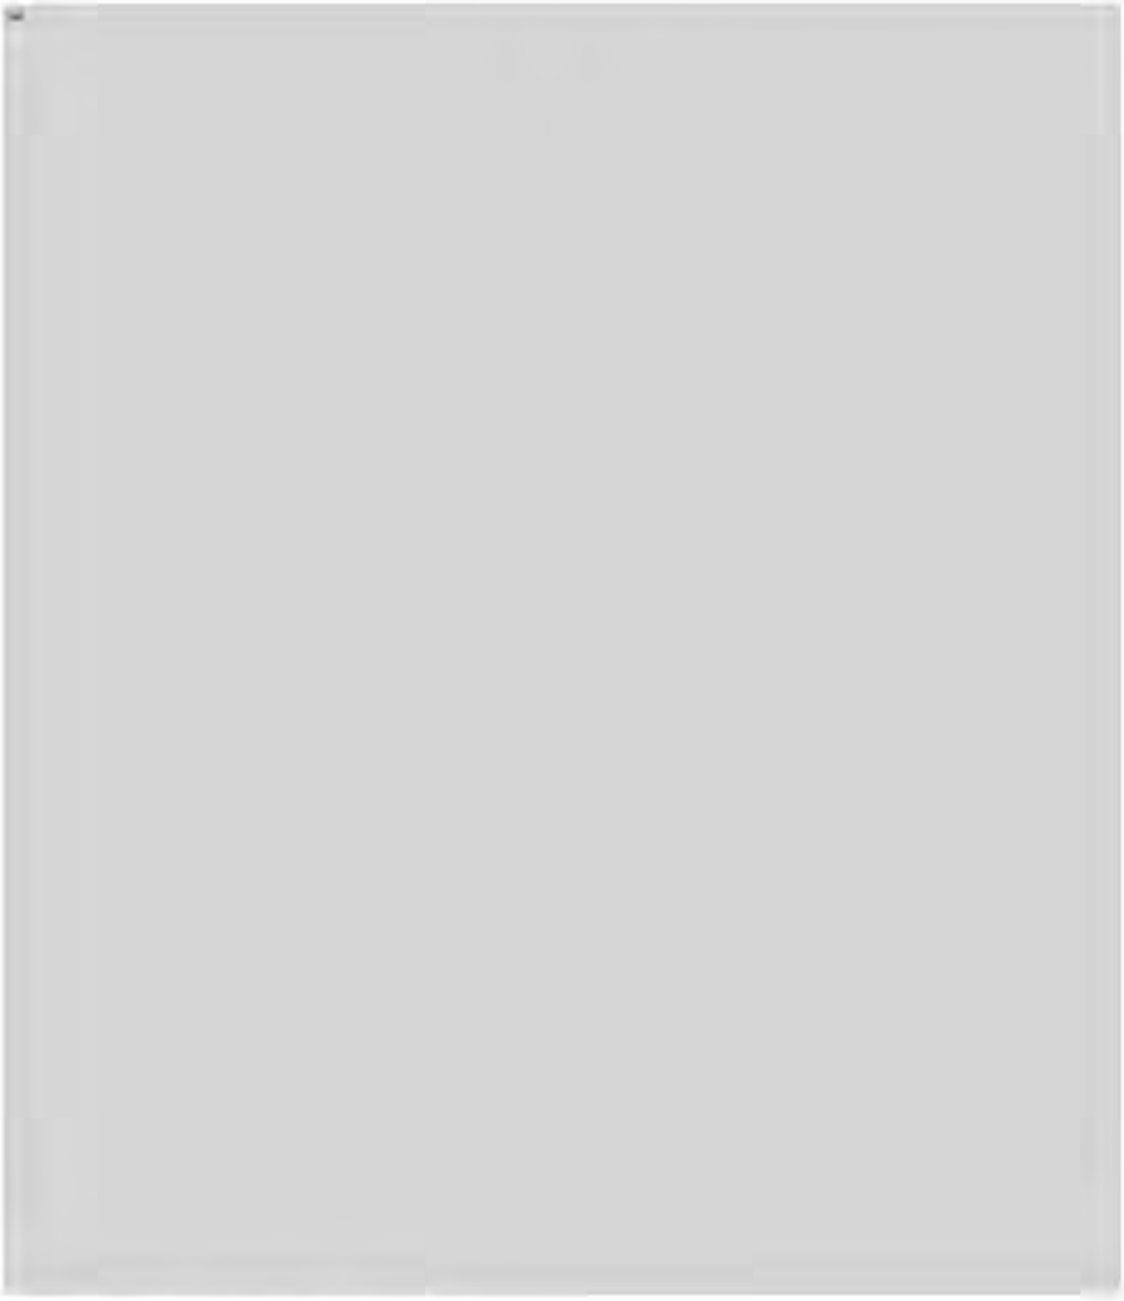

## 1.7 Bestuurlijke besluitvorming

- Raadsbesluit: Landschappelijke inpassing Rotterdamsebaan in de Vlietzone/Molenvlietpark (4e kwartaal 2014);

Het uitvoeringsbudget is per 30-09-2014 op € 635,4 mln. te stellen (was: € 565,0 mln.). In hoofdlijnen is deze toename het gevolg van het toevoegen van de post DSO-Vastgoed van € 45,0 mln., het uitwerken van het ontwerp, de architectonische vormgeving en de indexatie. In deze raming is geen rekening gehouden met de mogelijke komst van het Molenvlietpark en waterberging in de Vlietzone en beheer en onderhoud.

Op dit moment is er voor € 635,4 mln. (was: € 573,28 mln.) aan dekkingsmiddelen beschikbaar binnen de gemeente Den Haag voor het project Rotterdamsebaan. In hoofdlijnen is deze toename het gevolg van indexatie van de bijdragen vanuit Rijk, stadsgewest en gemeente en omdat per 30-09-2014 is er besloten om de dekkingsmiddelen op een andere wijze te verantwoorden (totale middelen beschikbaar voor project Rotterdamsebaan, direct via DSB en indirect via DSO. Bij deze dekkingsmiddelen is geen rekening gehouden met de mogelijke komst van het Molenvlietpark en waterberging in de Vlietzone en beheer en onderhoud.

## 1.9 Voortuitblik komende kwartaal

- Buiten de scope van het project Rotterdamsebaan: Besluitvorming over het Molenvlietpark n.a.v. het ter inzage leggen van het concept-Voorlopig Ontwerp, het dekkingsvoorstel en het besluit van Hoogheemraadschap Delfland over wel/niet calamiteitenberging in het plan betrekken;

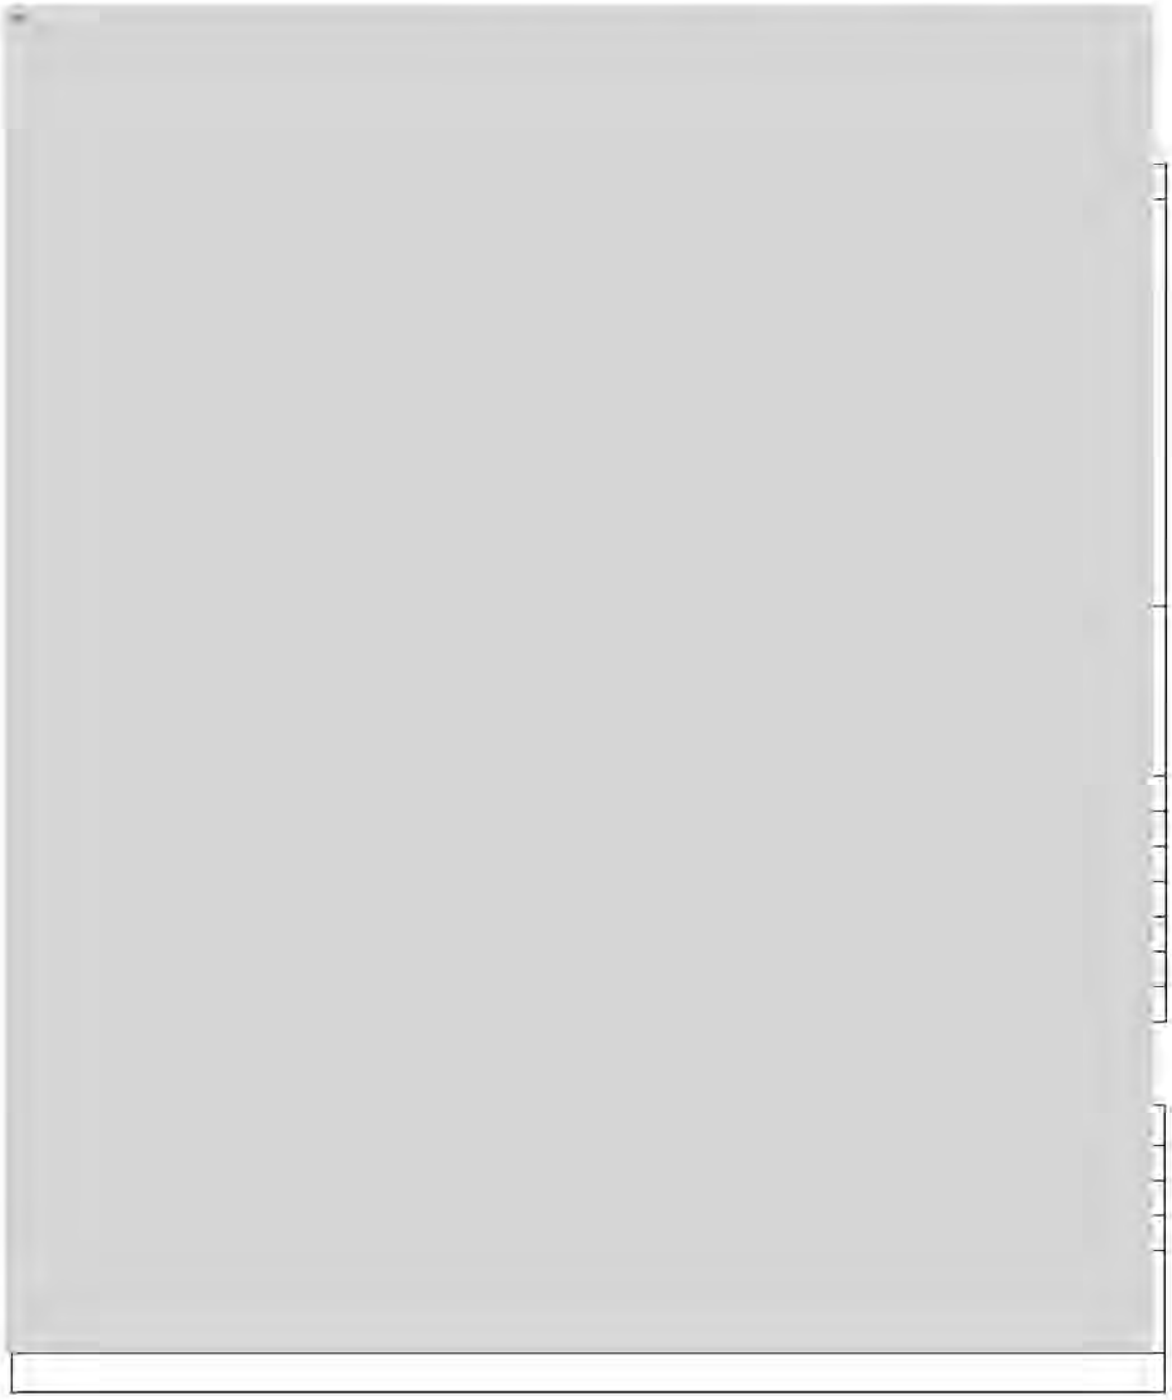

# 3 Omgevingsmanagement

## 3.1 Afgelopen kwartaal

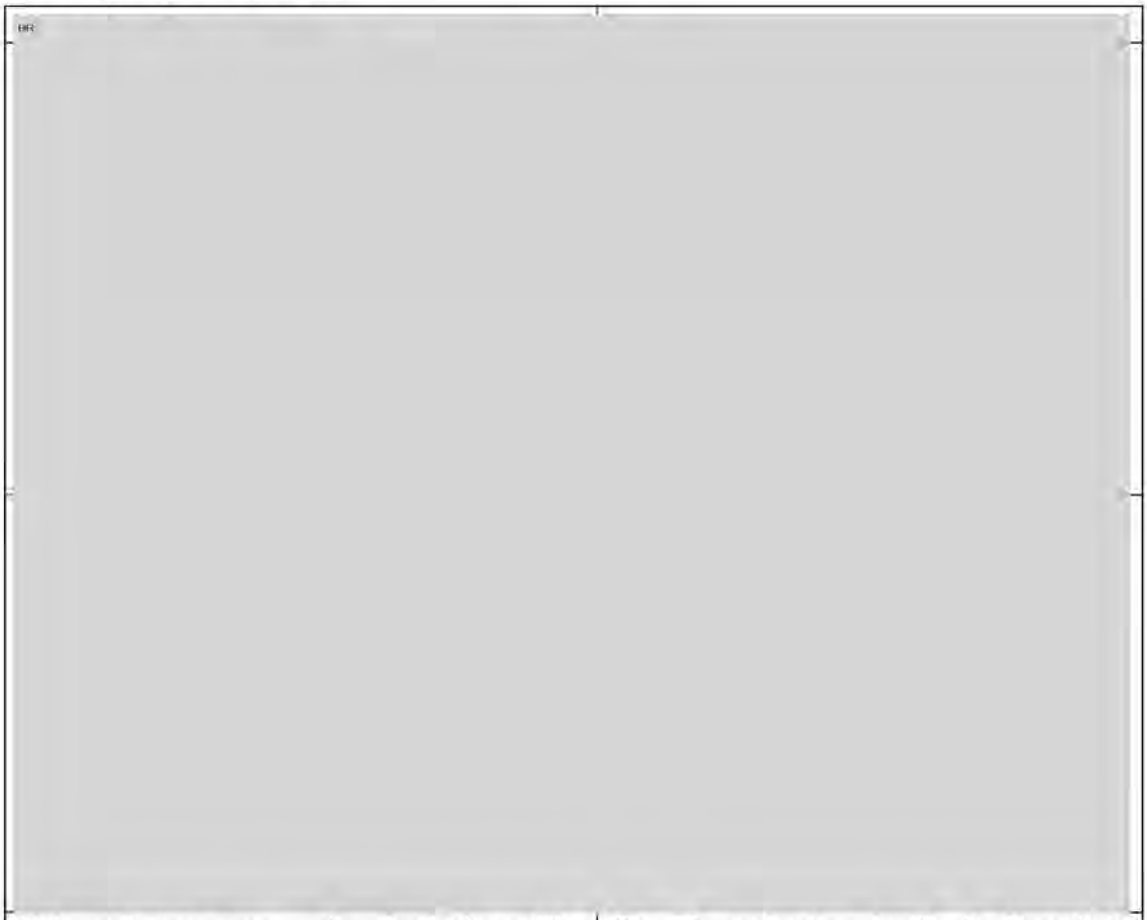

| | |
|---|---|
| Het ontwerp voor de landschappelijke inpassing van de Rotterdamsebaan, indoorhal Drievliet, parkeerterrein Drievliet is verder uitgewerkt en gecommuniceerd met de omgeving ter voorbereiding op bestuurlijke besluitvorming (vooral onder de werknaam 'Molenvlietpark'). Het ontwerp kent twee varianten (met en zonder extra calamiteitenberging afhankelijk van met hoogheemraadschap te bereiken overeenstemming). Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben op 10 juni 2014 besloten en in een brief aan het college van B&W Den Haag vastgelegd o.m. de calamiteitenberging verder met Den Haag te willen uitwerken. Bestuurlijke besluitvormingen binnen Den Haag en HH Delfland zullen zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. | Op 25 september heeft de Verenigde Vergadering van Delfland het Investeringsplan voor de calamiteitenberging vastgesteld. De afspraken tussen gemeente Den Haag en HHD worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het besluit van de Verenigde Vergadering is niet geheel in lijn met de bestuurlijke afspraken. Hiervoor wordt momenteel met HHD een passende oplossing gezocht.<br>Het ontwerp met calamiteiten berging ligt tot 3 november ter inzage voor indienen zienswijzen. Op 13 oktober is inloopbijeenkomst gepland.<br>Ter voorbereiding op het raadsvoorstel wordt momenteel door DSO naar aanvullende dekking gezocht. |

| Geplande besluiten | Genomen besluiten |
|---|---|
| Collegebesluit Molenvlietpark | Op 8 juli 2014 heeft college besloten het concept-raadsvoorstel vaststelling Voorontwerp 'Molenvlietpark' vrij te geven voor inspraak (na zomerreces). |
|  | |

## 3.2 Komend kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| |
| Proces Molenvlietpark voortzetten, waaronder voorbereiden raadsvoorstel. |
| |
| College- en raadsbesluit inzake Molenvlietpark (ontwerp vaststellen en operationaliseren) |

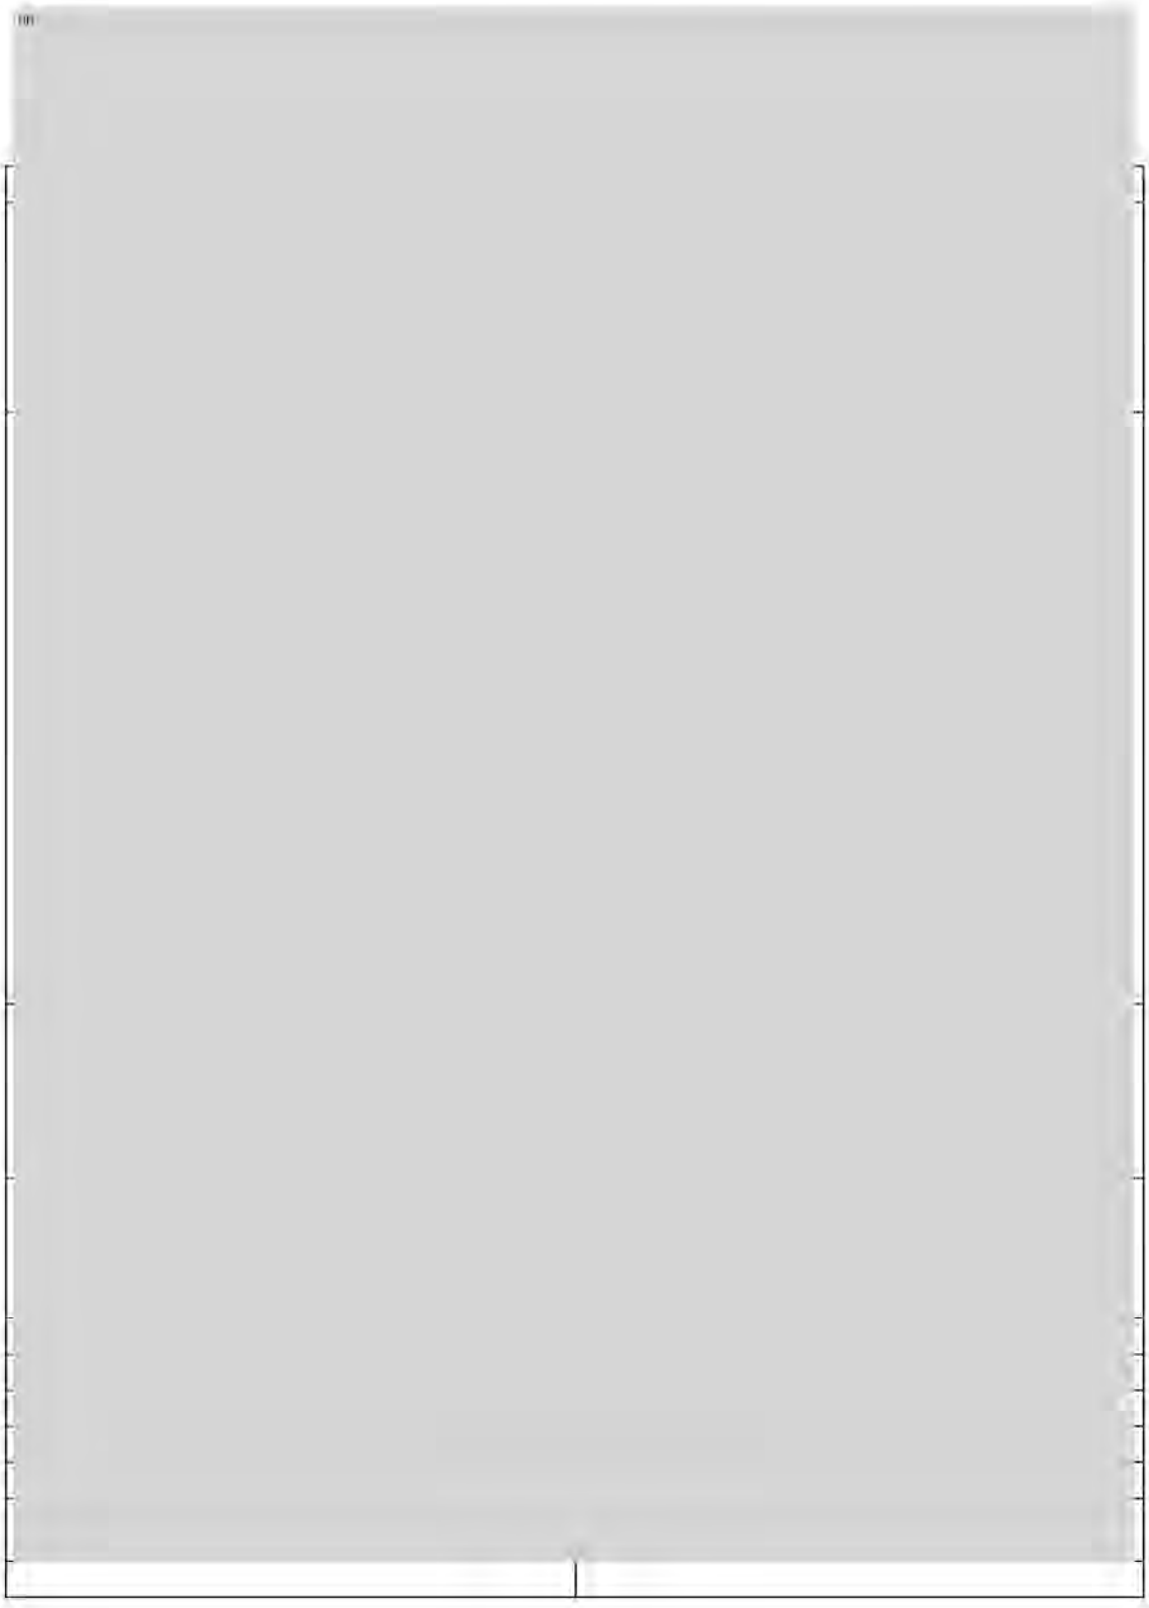

# 5 Vergunningen en overeenkomsten

## 5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Meer gedetailleerde vergunningenoverzichten maken voor de andere delen van het project, zoals nu uitgewerkt voor de Binckhorst. | Het vergunningenoverzicht voor de voorbereidende c.q. conditionerende fase van de Vlietzone is in detail uitgewerkt (incl. Molenvlietpark). Verder is een vergunningenoverzicht t.a.v. de vergunningen, waarvoor Rijkswaterstaat het bevoegd gezag is, opgesteld en ter bespreking aan RWS aangeboden. |

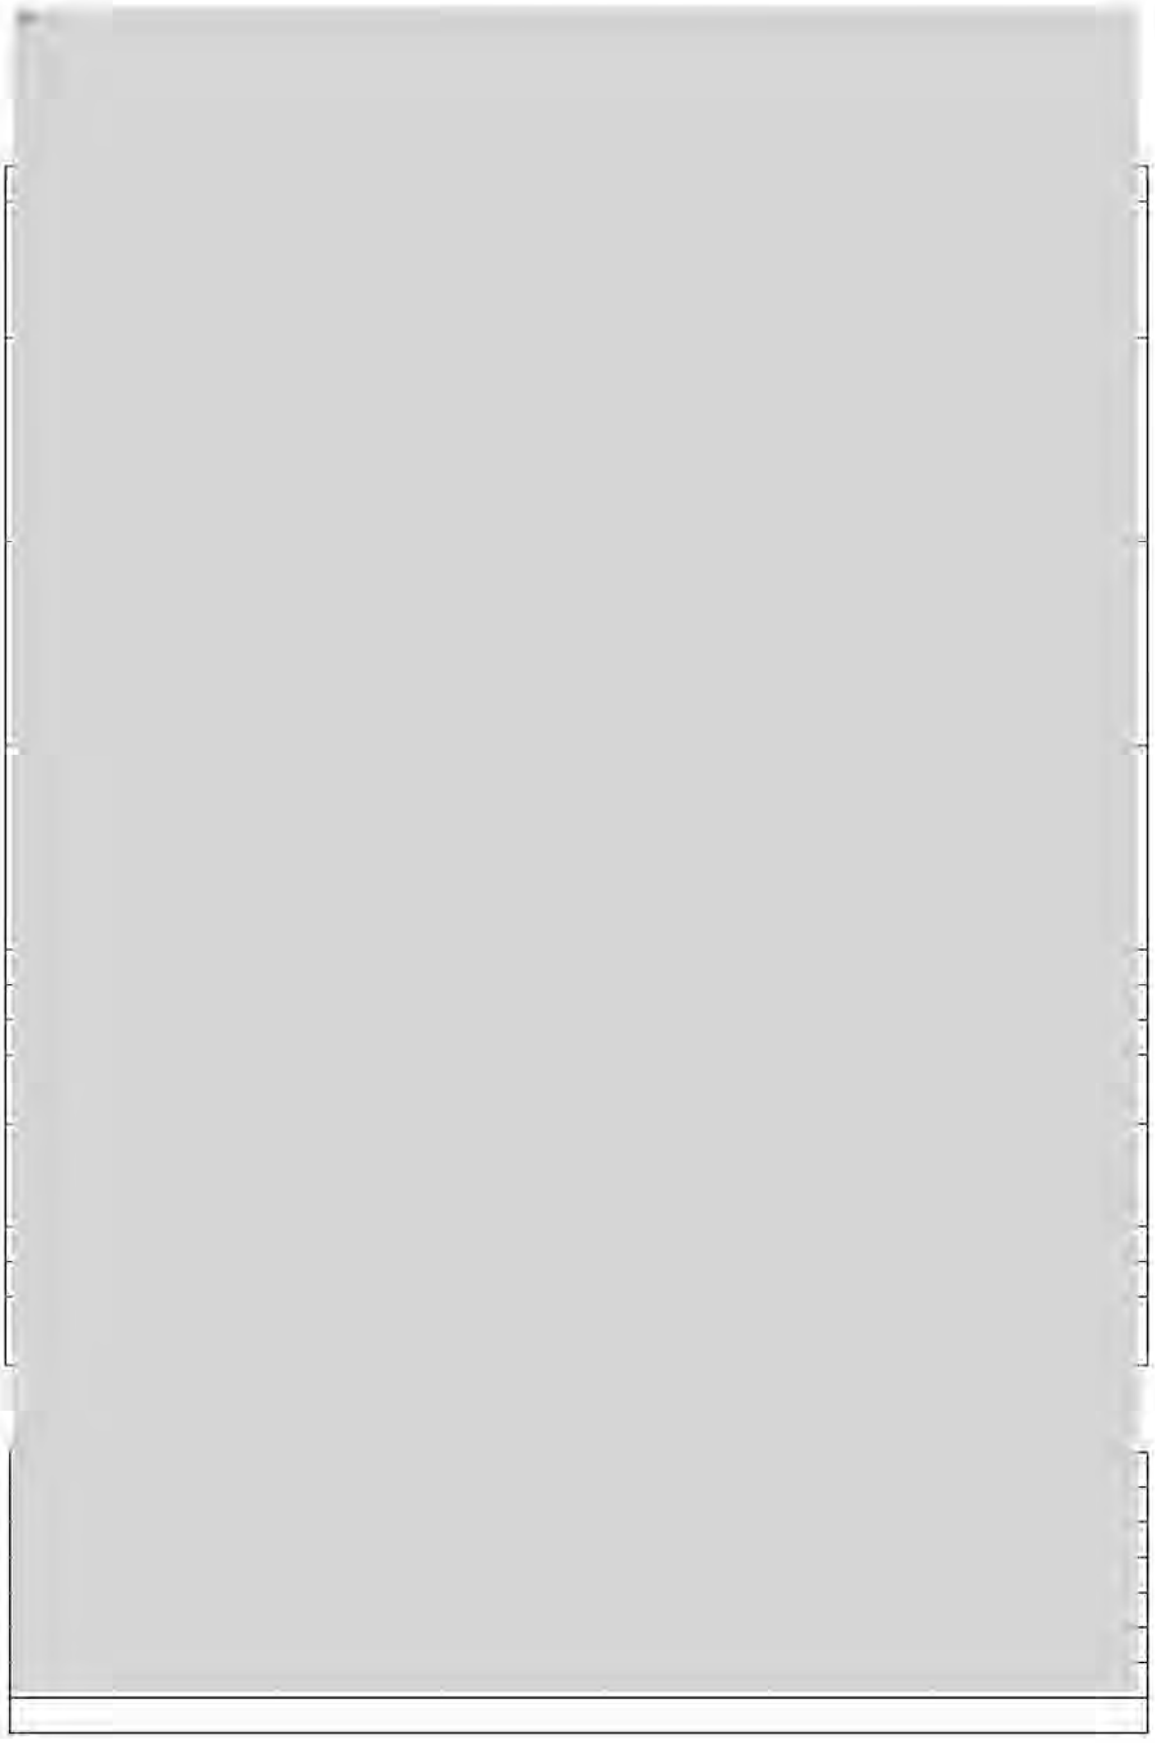

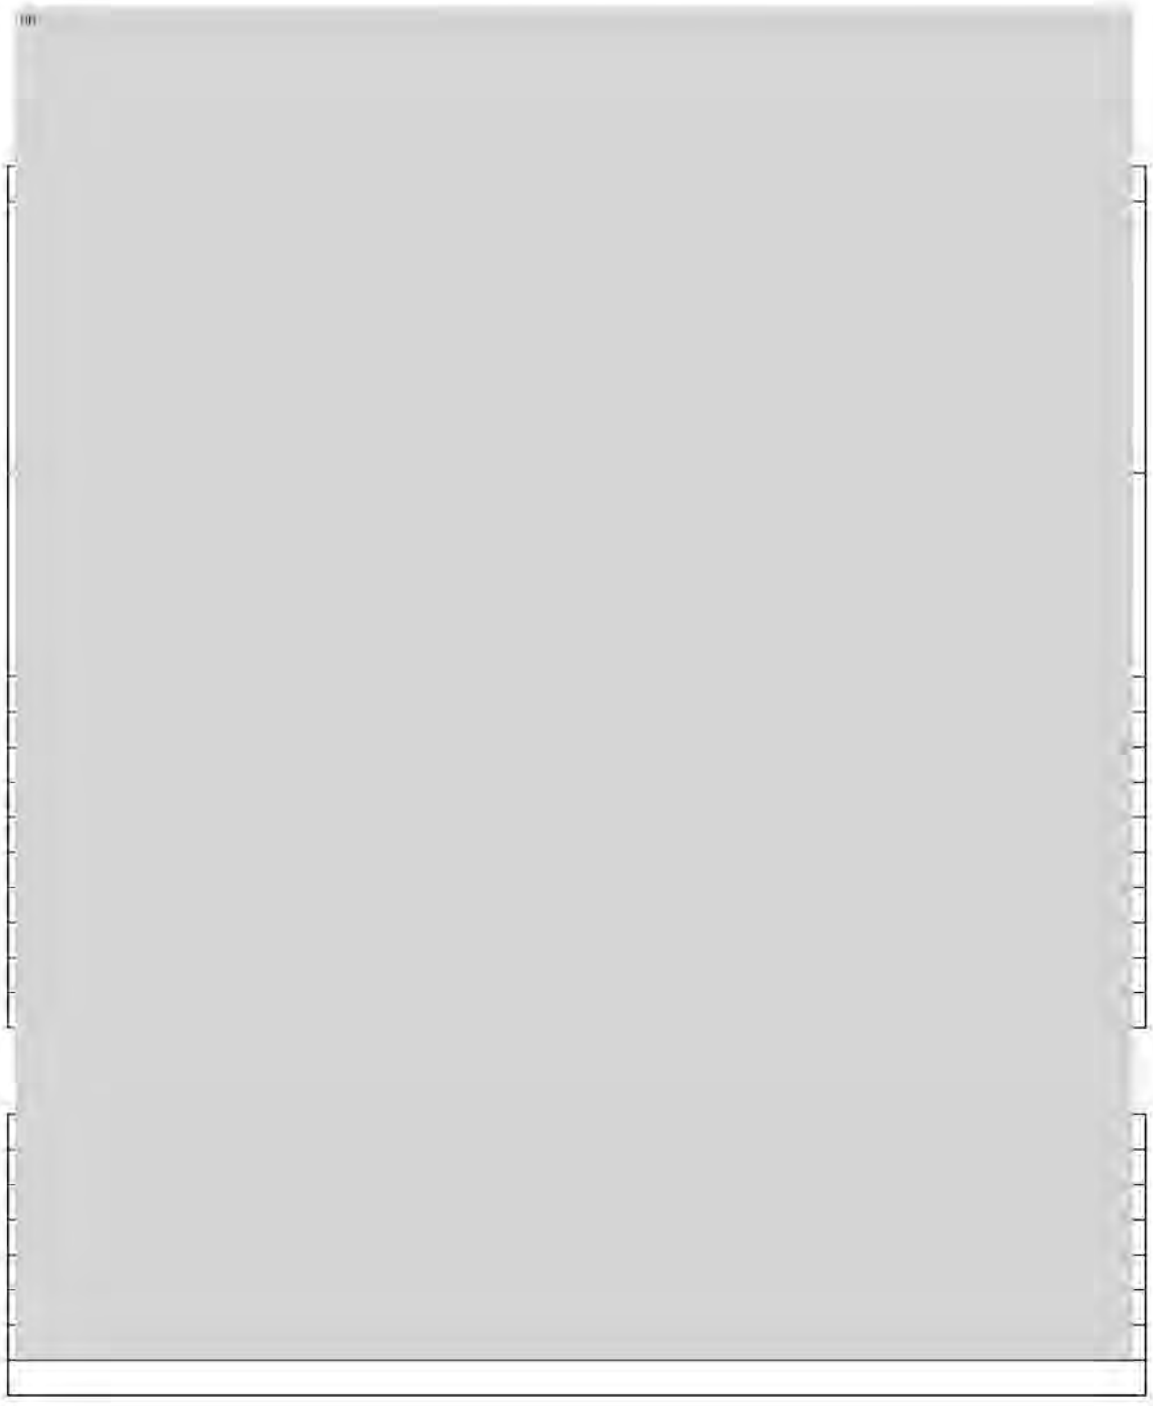

# 8 Voorbereiding t.b.v. hoofdcontract

## 8.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| | |
| | Het voorlopig ontwerp van de nieuwe inpassing in de Vlietzone (Molenvlietpark genoemd) ligt ter inzage. De termijn loopt af op 3 november 2014. Omdat het VV van het Hoogheemraadschap Delfland positief heeft besloten ten aanzien van de te realiseren waterberging, ligt de variant waarin ook een waterberging wordt gerealiseerd in het gebied ter inzage. |
| | |

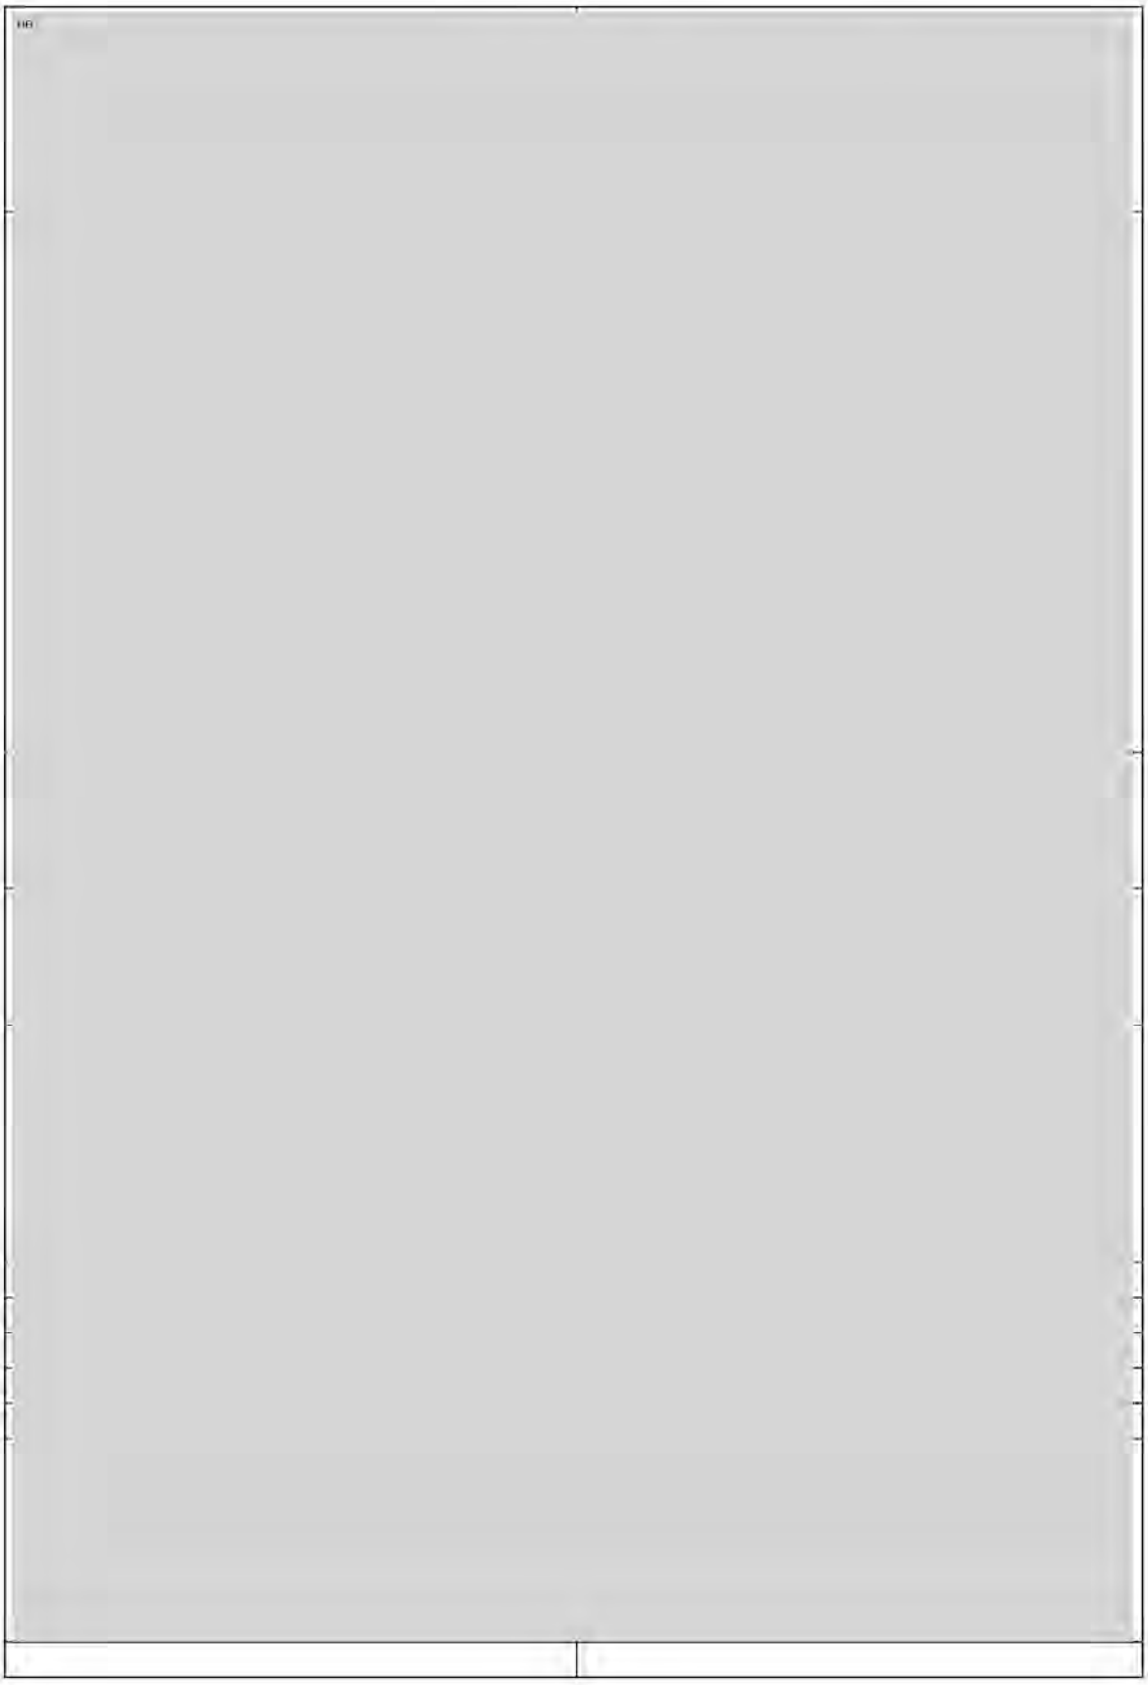

## 8.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| [redacted] |
| De inspraakreacties op het Voorlopig Ontwerp Molenvlietpark worden bezien en zullen zo nodig worden verwerkt. |
| |
| **Besluiten** |
| [redacted] |
| Vaststelling Voorlopig Ontwerp Molenvlietpark, inclusief raming en dekking door gemeenteraad Den Haag |
| |

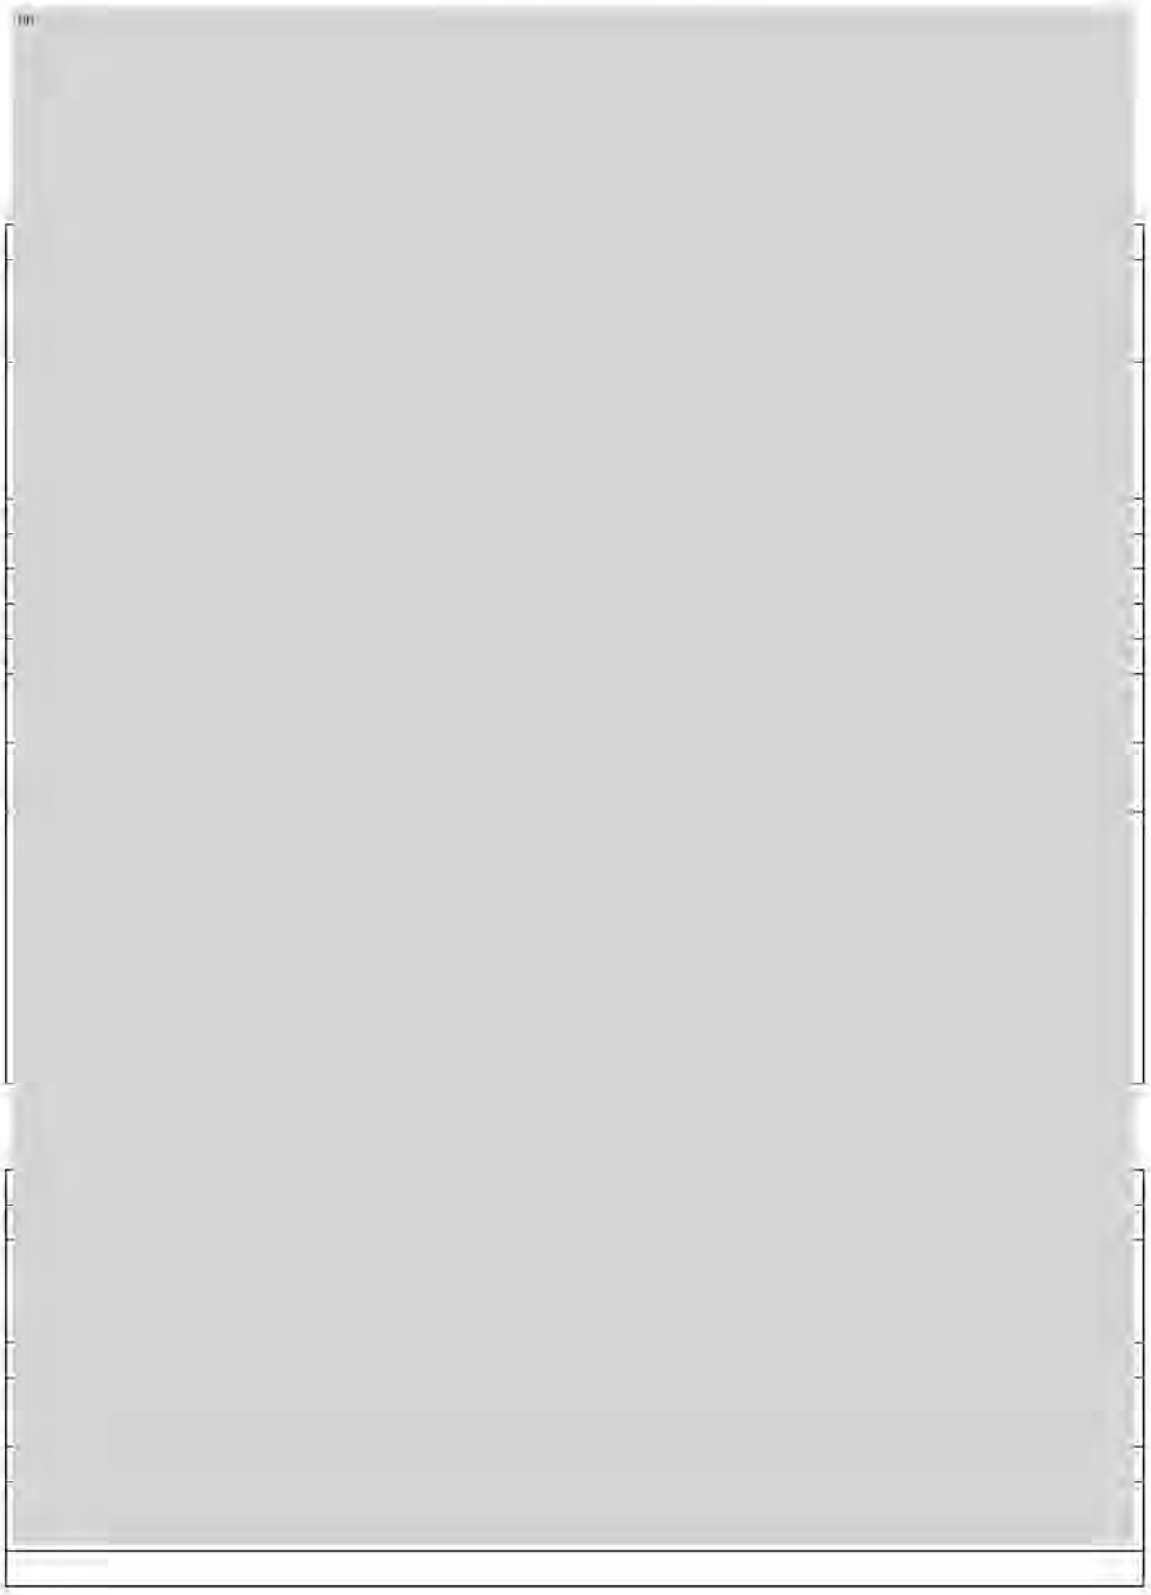

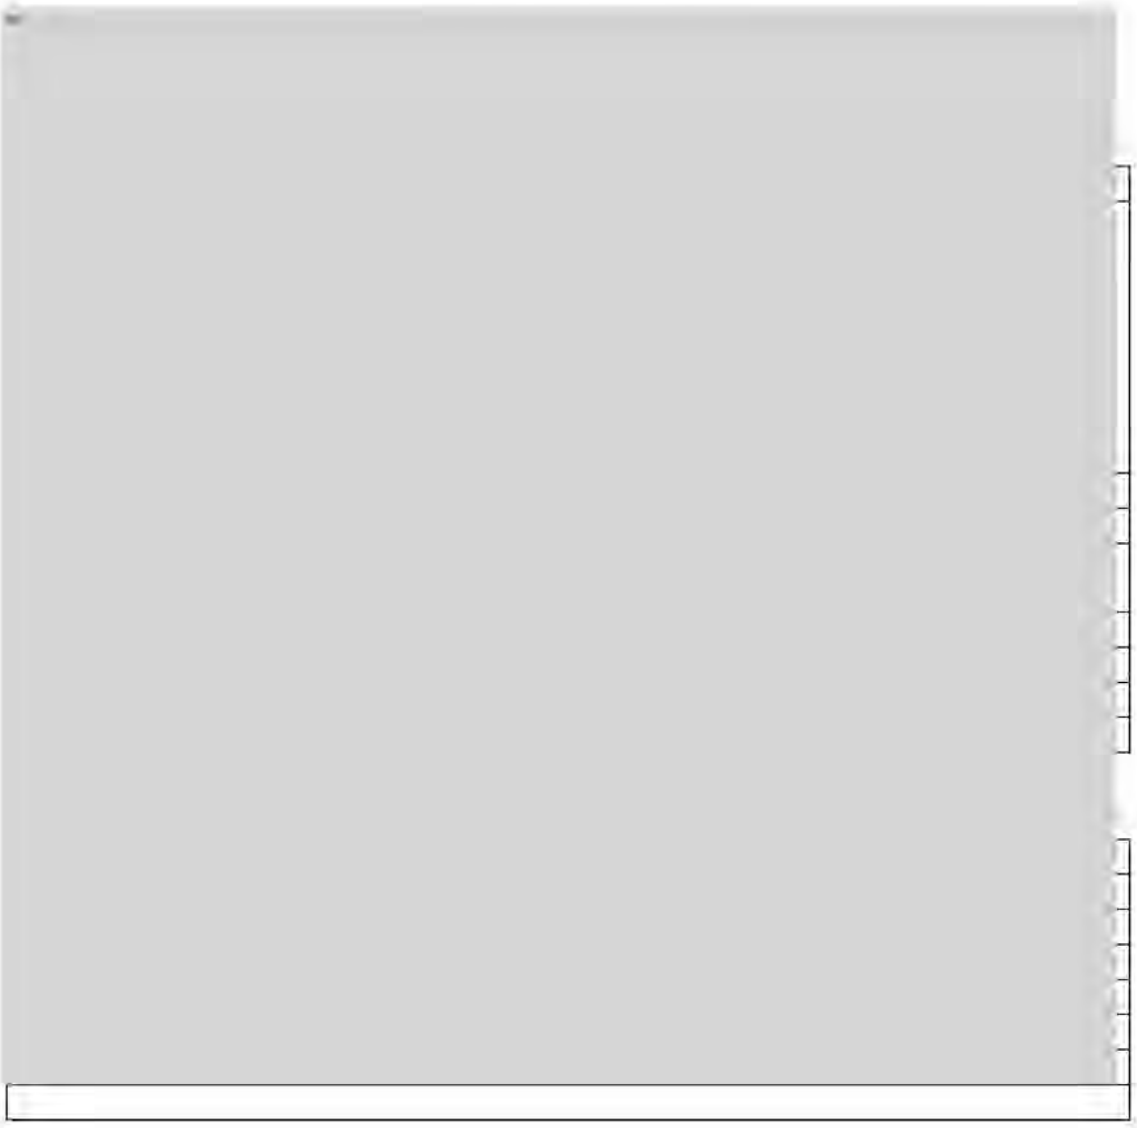

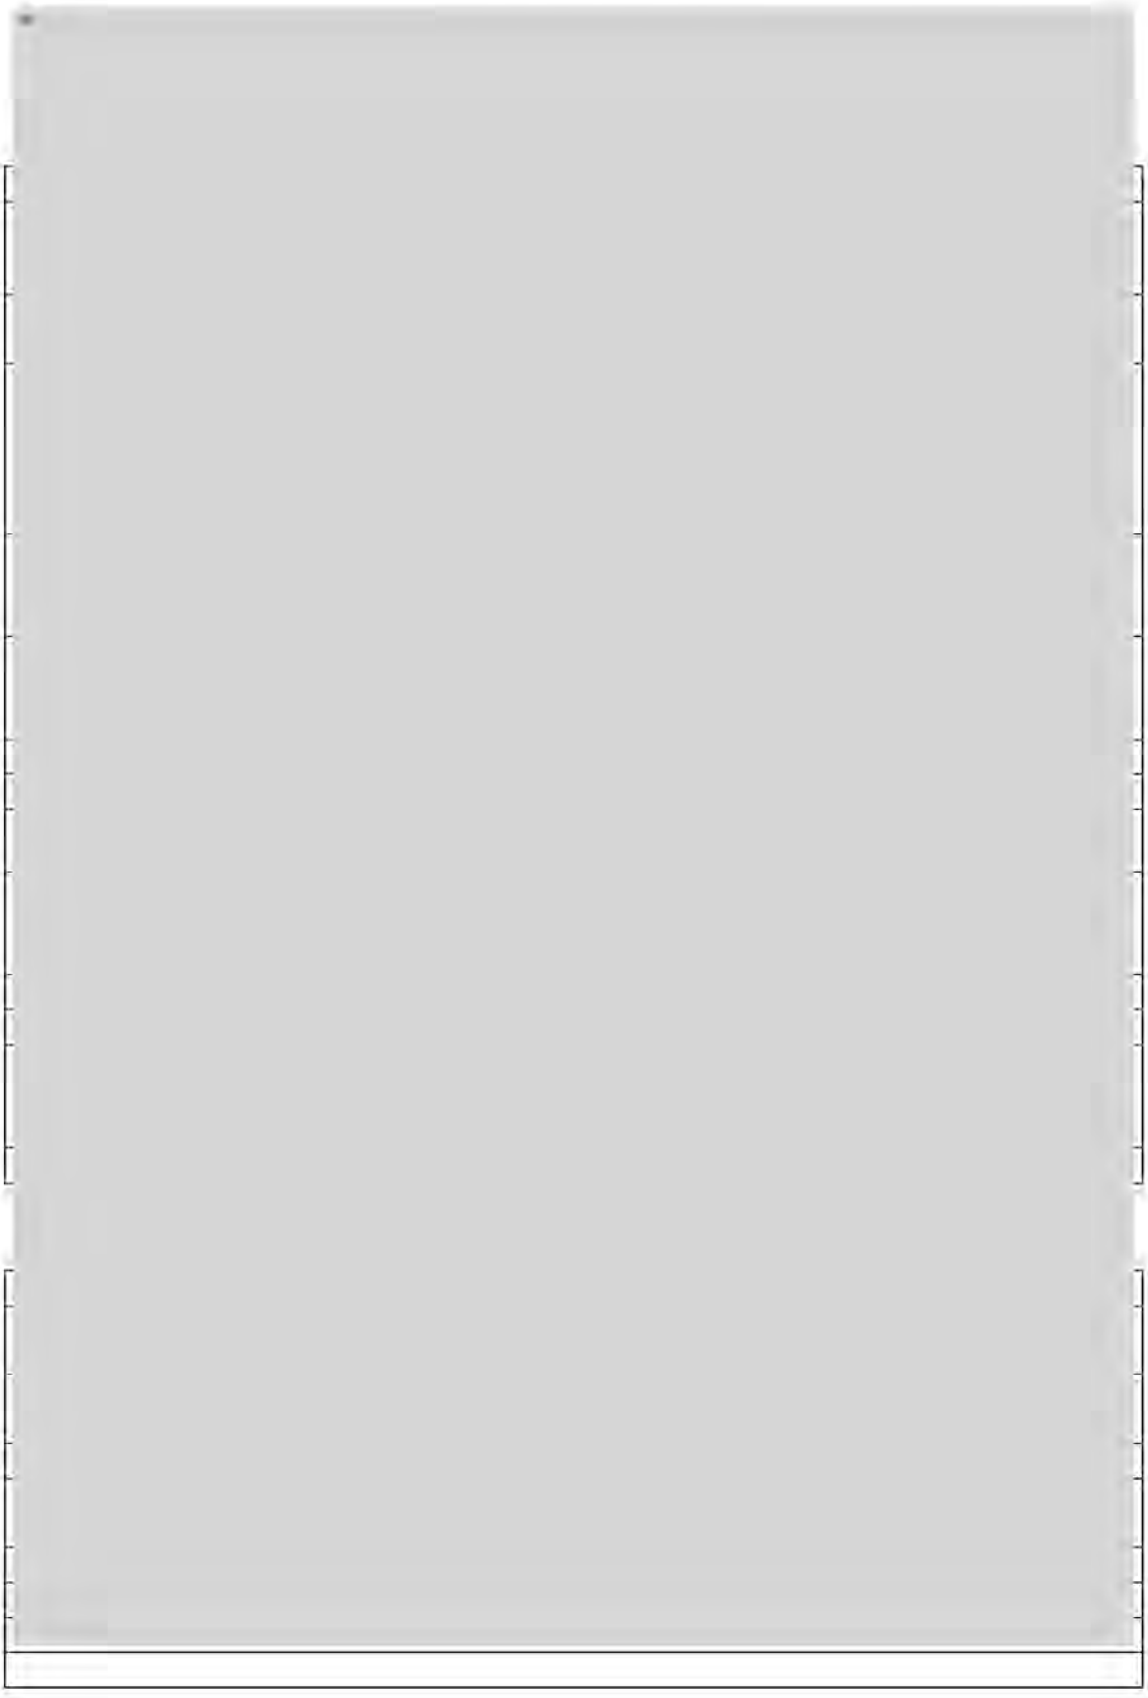

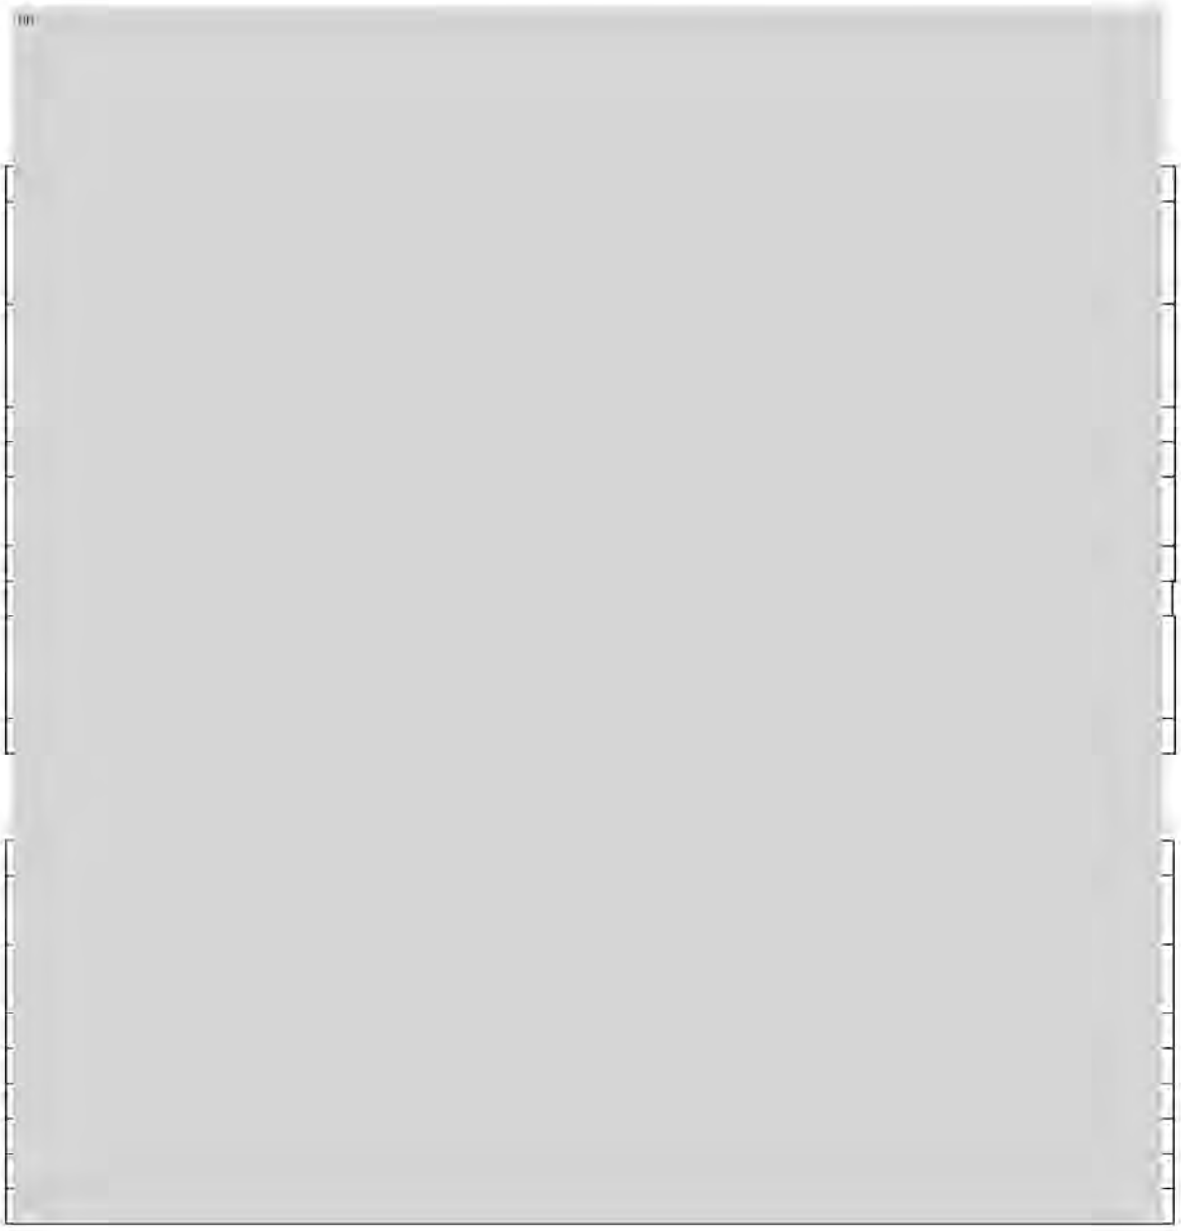

# 13 Communicatie

## 13.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| | |
| Opstellen plan van aanpak communicatie Molenvlietpark, voorbereiden informatiebijeenkomst inspraak. | In overleg met de projectleider Vlietzone is een actieplan voor de communicatie gemaakt. Maandag 13 oktober is er een inloopbijeenkomst over het concept-ontwerp voor het Molenvlietpark. |
| | |

| | |
|---|---|
| | |

## 13.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| |
| Inloopbijeenkomst concept-voorlopig ontwerp Molenvlietpark. |
| |

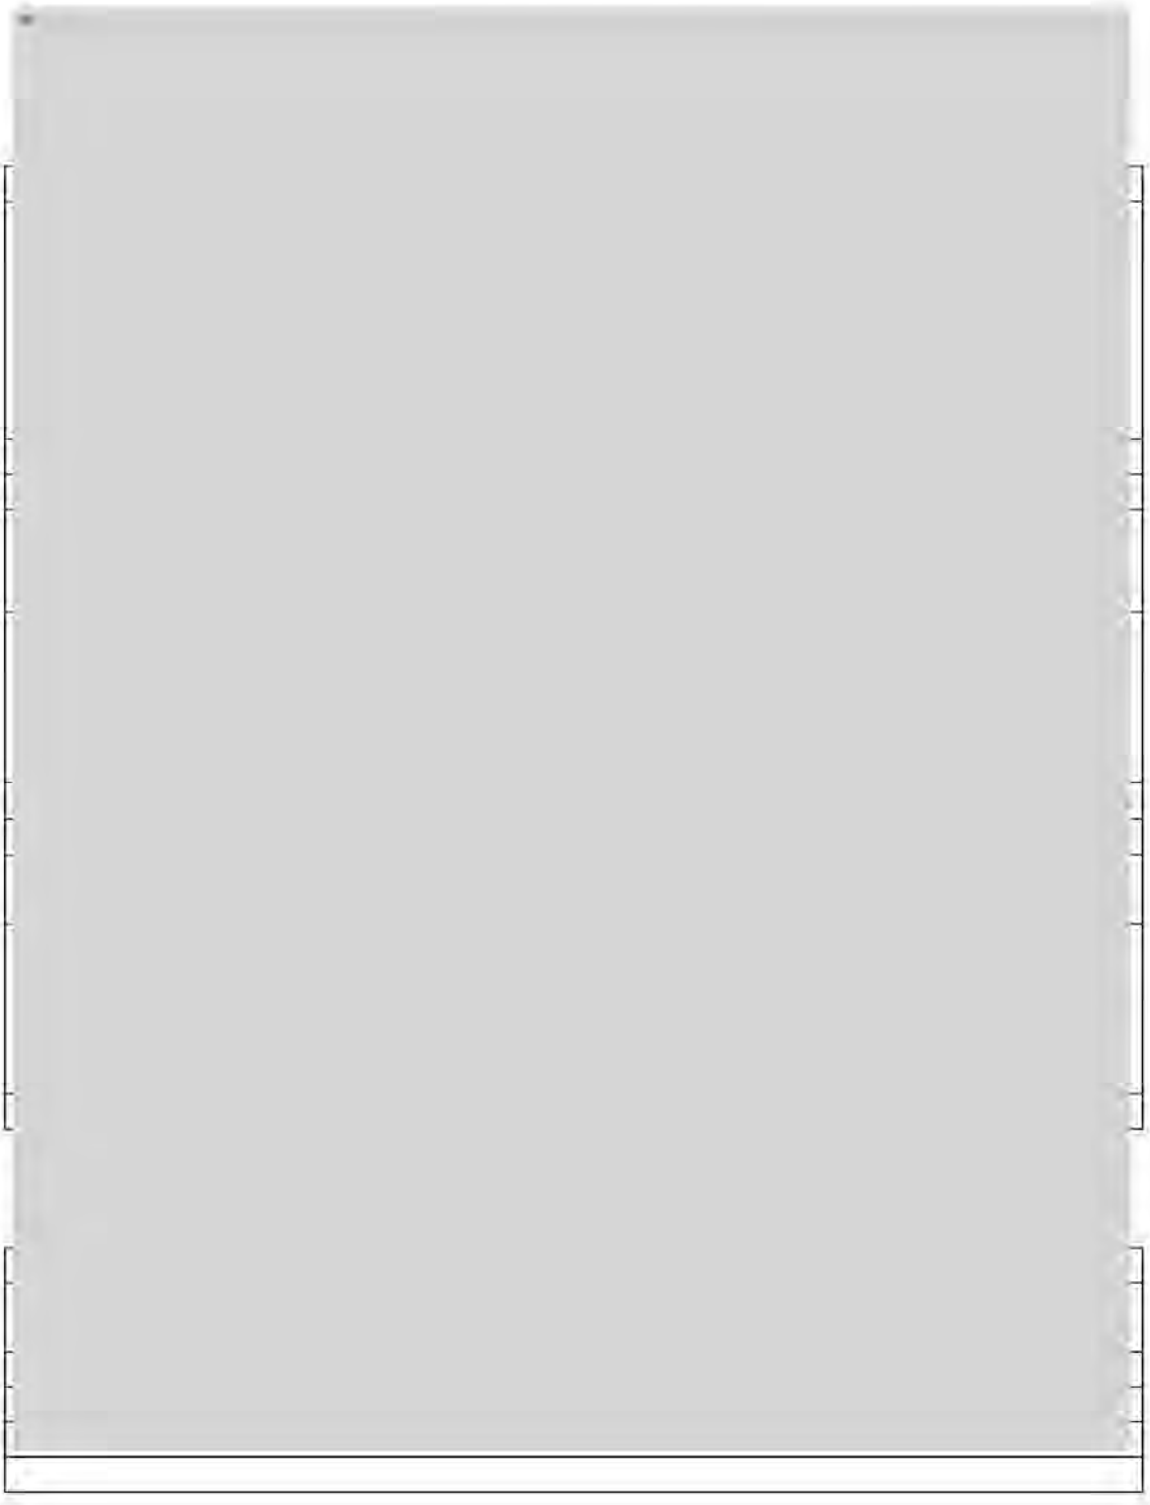

Het uitvoeringsbudget wordt in het vierde kwartaal nader uitgesplitst op detailniveau. Dit betekent dat er enige wijzigingen kunnen ontstaan in de onderverdeling van het uitvoeringsbudget. Echter de totale som van het uitvoeringsbudget wijzigt hier niet mee.
In deze raming is geen rekening gehouden met het Molenvlietpark en de waterberging in de Vlietzone. Hier dient nog bestuurlijke besluitvorming over plaats te vinden.



Conclusie
Het project Rotterdamsebaan kent een dekkende begroting. Eventuele toevoegingen aan de scope (Molenvlietpark en waterberging in de Vlietzone) dienen nog bestuurlijk te worden bekrachtigd, inclusief de daarvoor benodigde financiële middelen. Tevens dient er aandacht te zijn voor beheer en onderhoud.

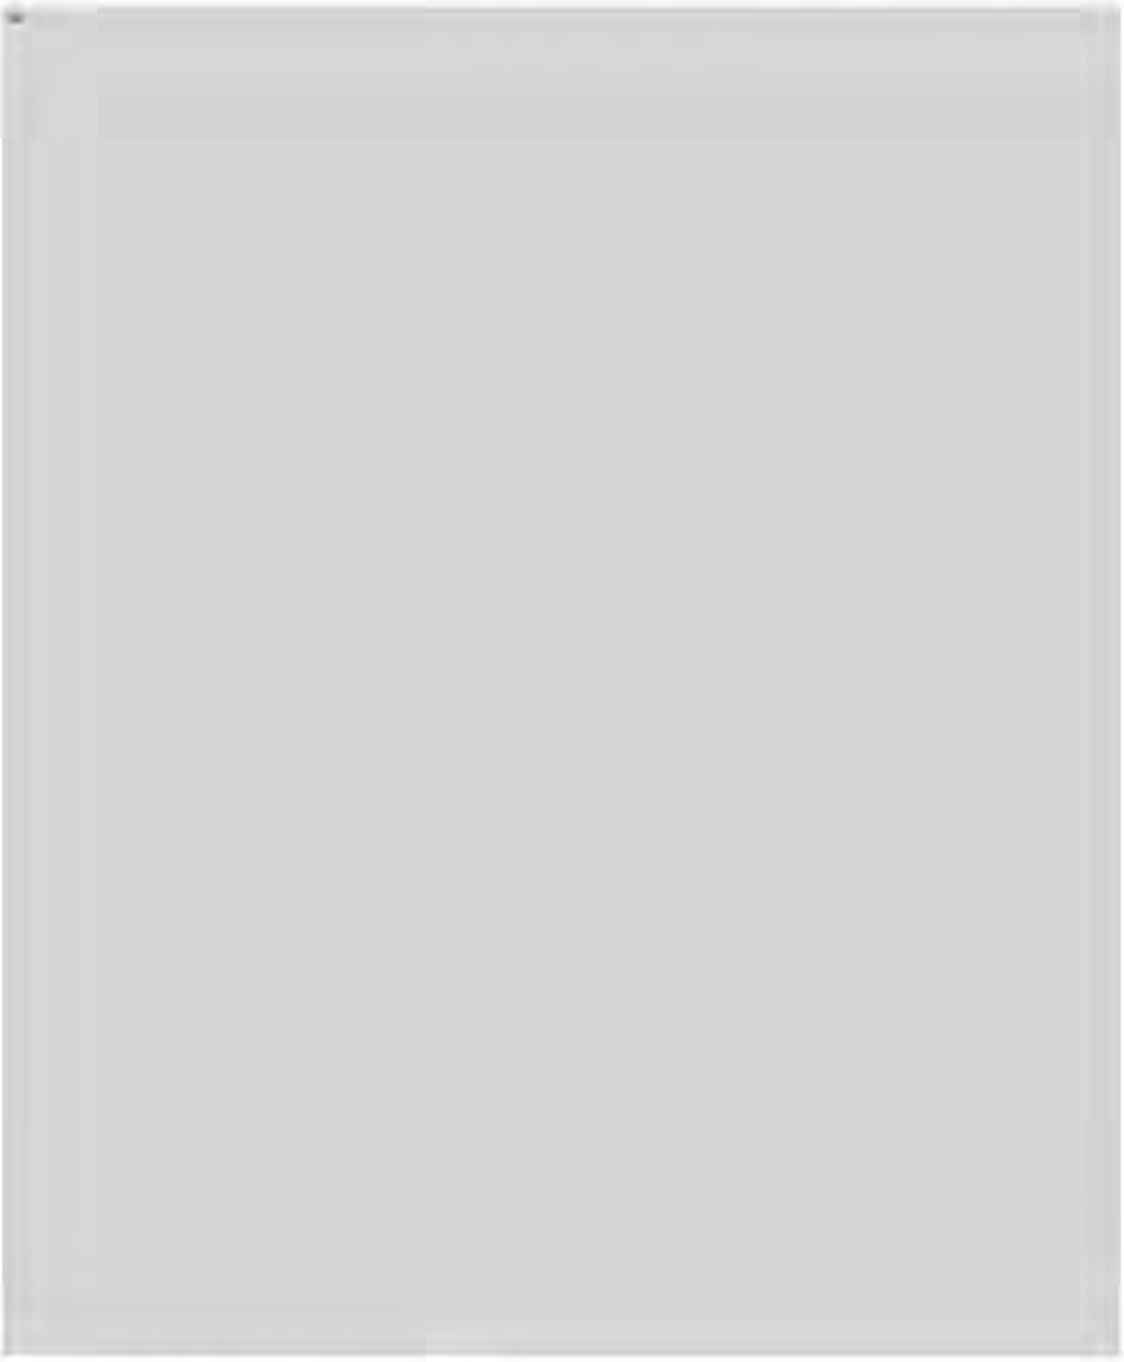

Molenvlietpark en waterberging Vlietzone

Bij deze dekkingsmiddelen is geen rekening gehouden met het Molenvlietpark en de waterberging in de Vlietzone. Hier dient nog bestuurlijke besluitvorming over plaats te vinden.

## 17.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| [redacted] |
| Inventariseren & kwantificeren risico's Molenvlietpark inclusief calamiteitenberging. |
| |
| [redacted] |
| |

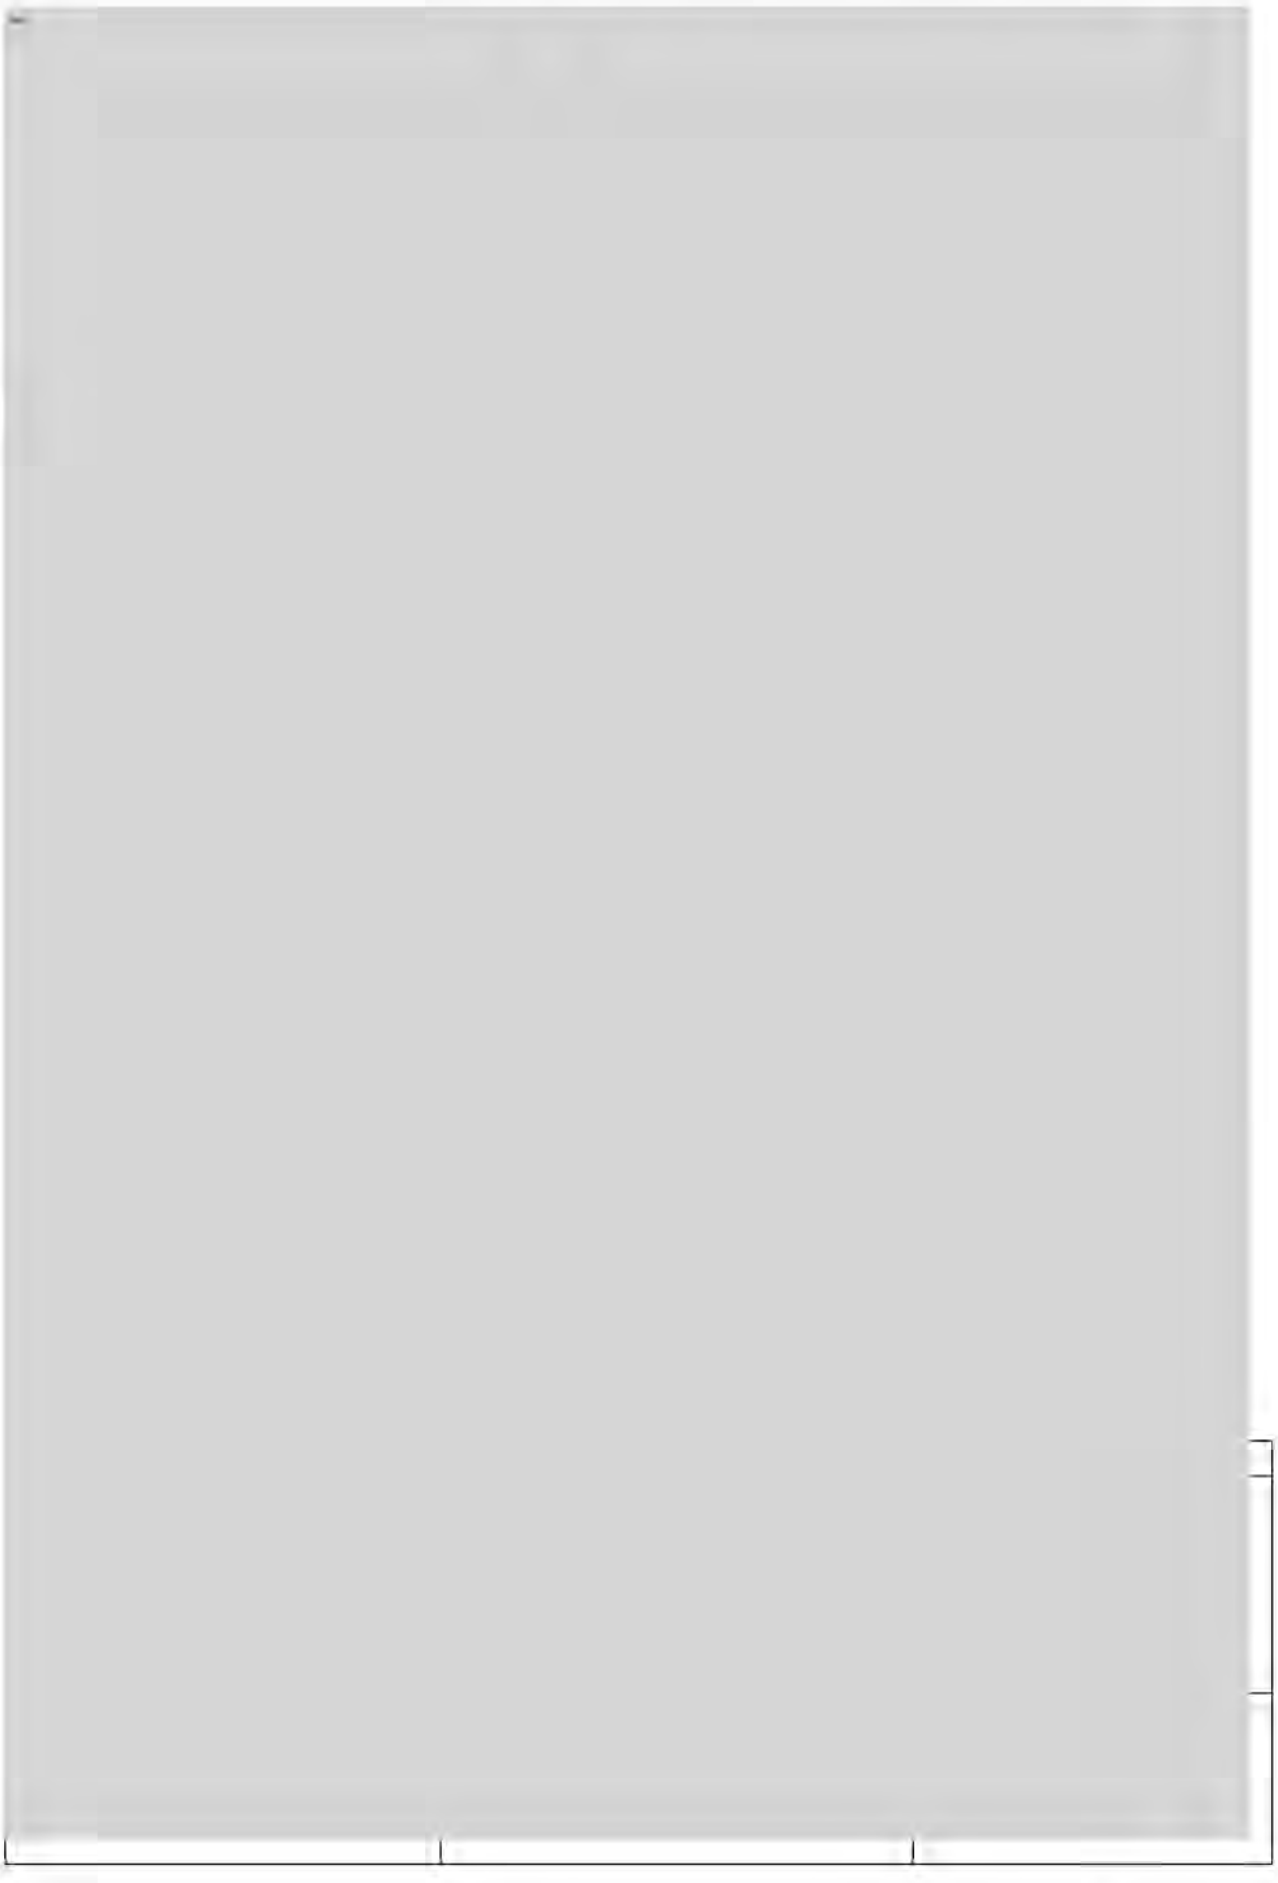

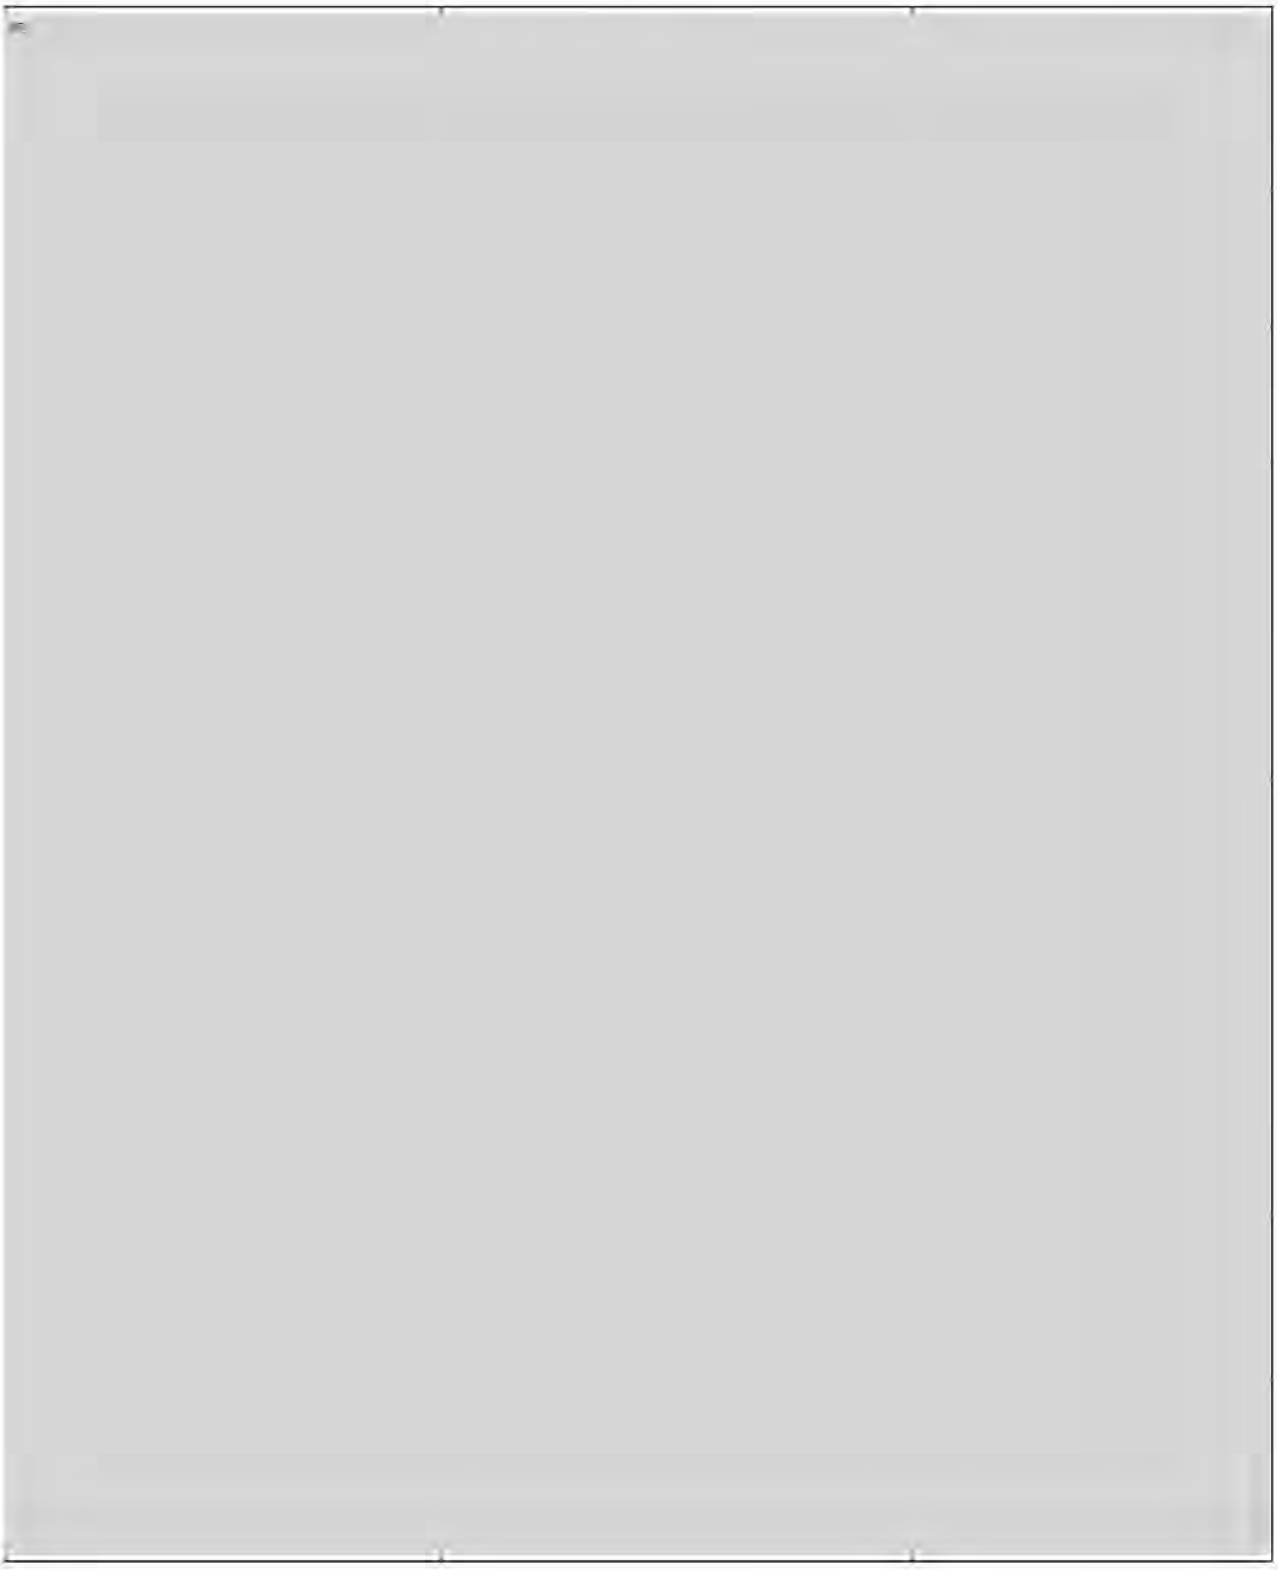

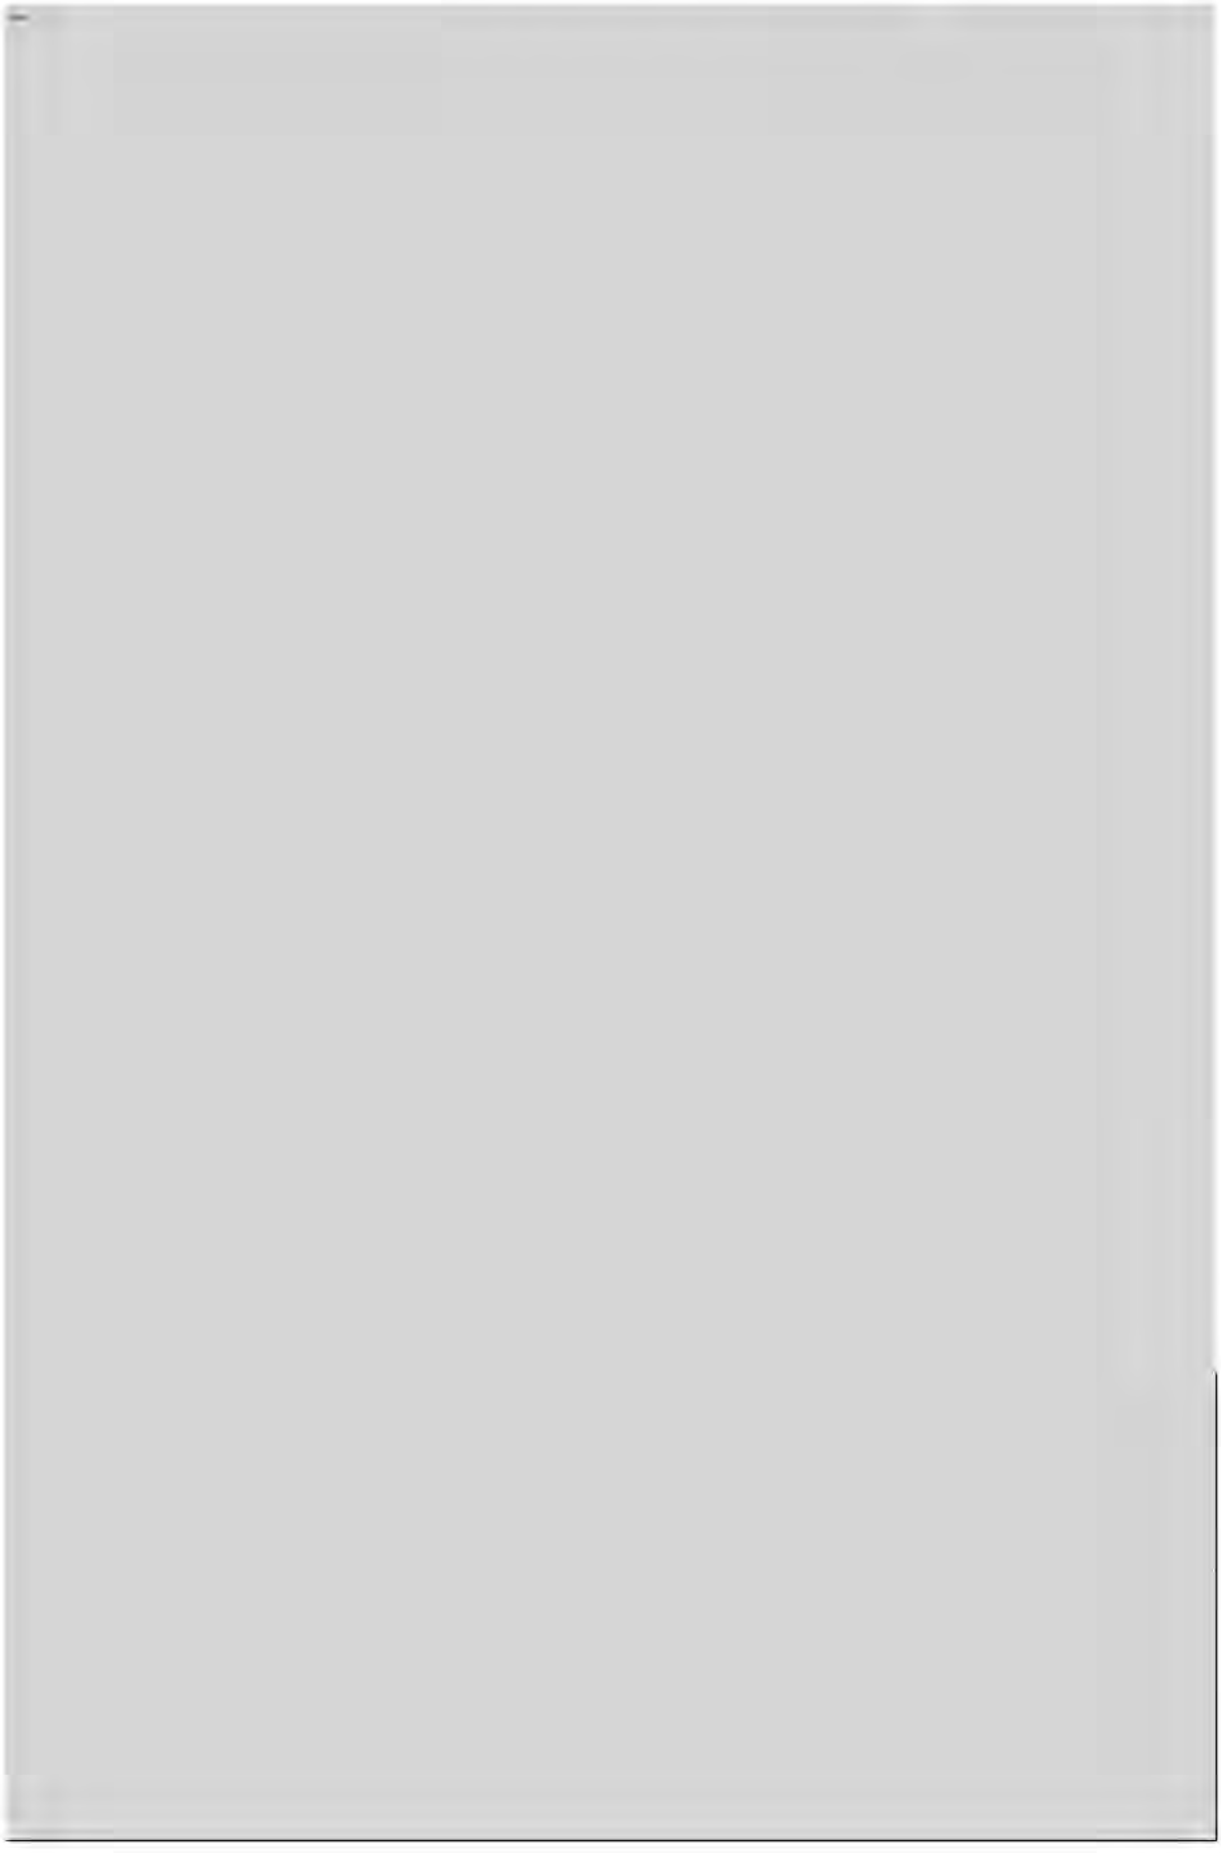

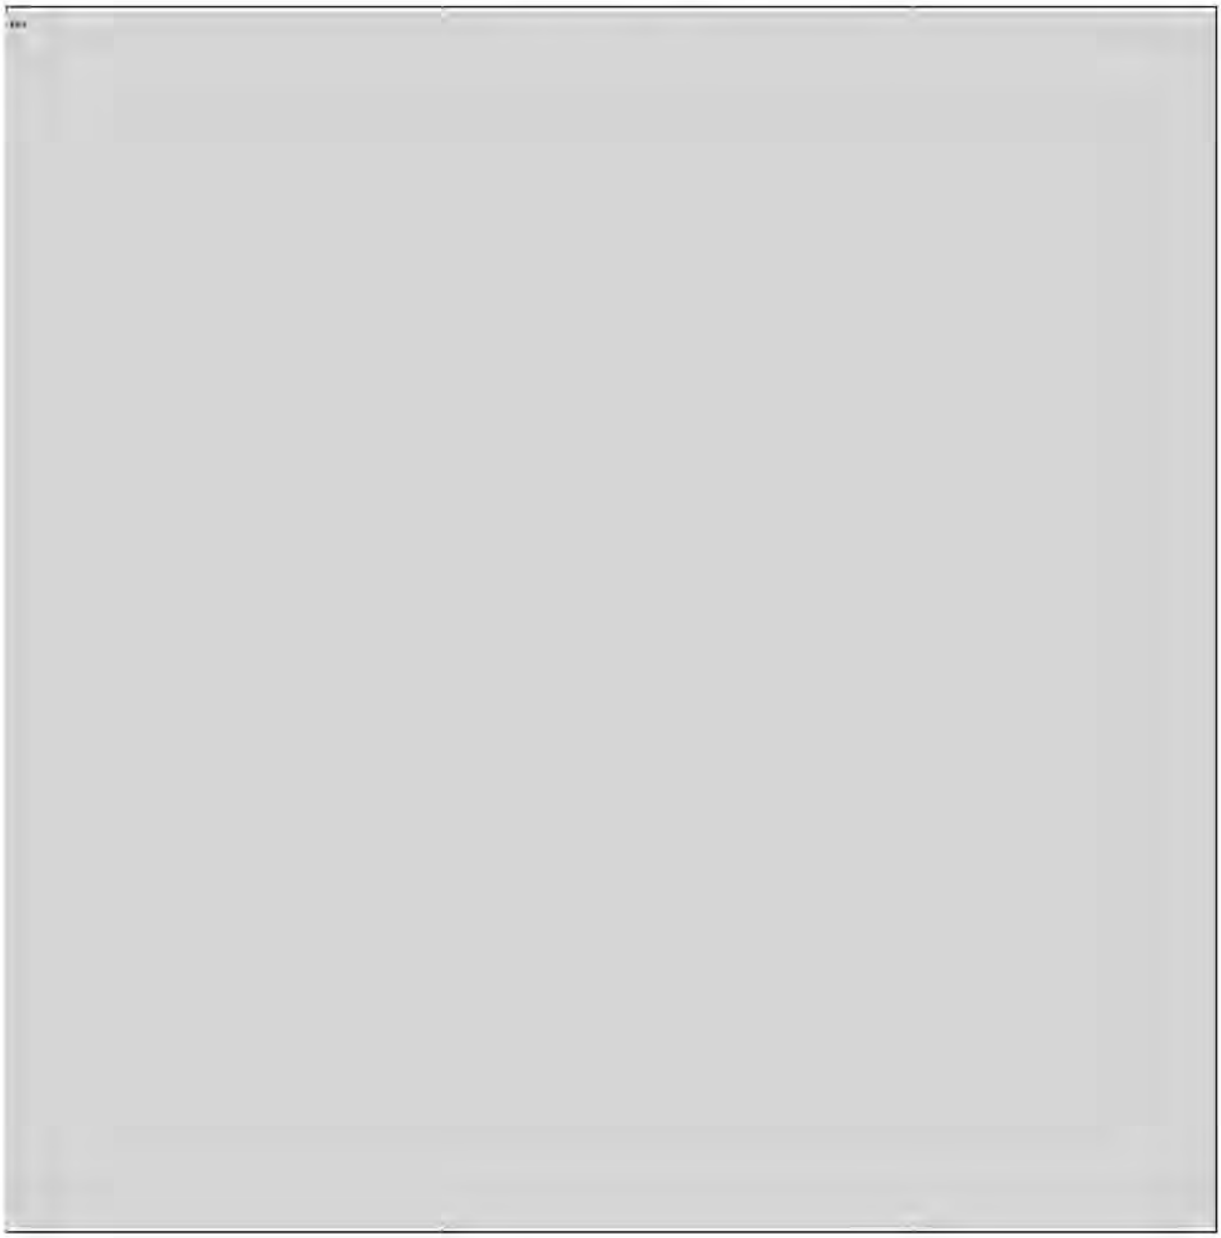

# 18 Planning

## 18.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Uitwerking planning Vlietzone | De planning 'Vlietzone' is tijdens de uitwerking uitgebreid tot de planning 'Rotterdamsebaan Zuid', inclusief het Molenvlietpark, de Laan van Hoornwijck en Ypenburg inclusief een uitgangspuntennotitie. Deze planning is vervolgens gebruikt bij de uitvoering van een onzekerheidsanalyse op dit deel van de planning. De resultaten uit de analyse zijn gebruikt bij het bepalen van de data waarop de hoofdaannemer er vanuit kan gaan dat werkterreinen beschikbaar komen. Deze mijlpaaldata zijn vervolgens met onzekerheidsmarge in de aanbestedingsstukken opgenomen. |
| | |
| [redacted] | |

# 19 Scopemanagement

## 19.1 Afgelopen kwartaal

| | |
|---|---|
| Opstellen VtW 4 Scopewijziging plan Molenvlietpark. | Is nog in bewerking. |
| | |

| Geplande besluiten | Genomen besluiten |
|---|---|
| Goedkeuren VtW Molenvlietpark. | Nog niet naar MT doorgeleid, omdat nog niet alle informatie t.b.v. VtW beschikbaar is. |
| | |

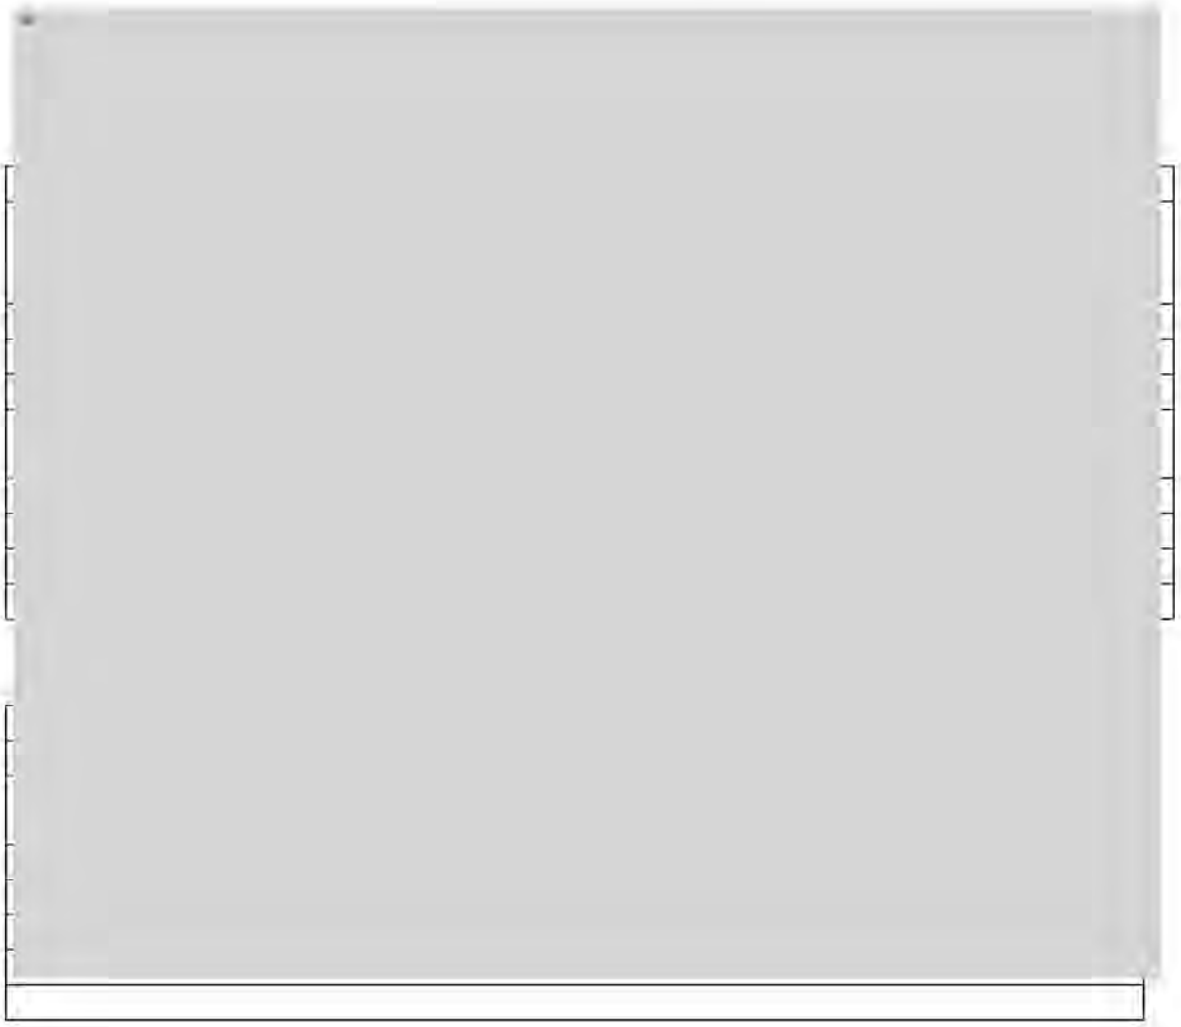

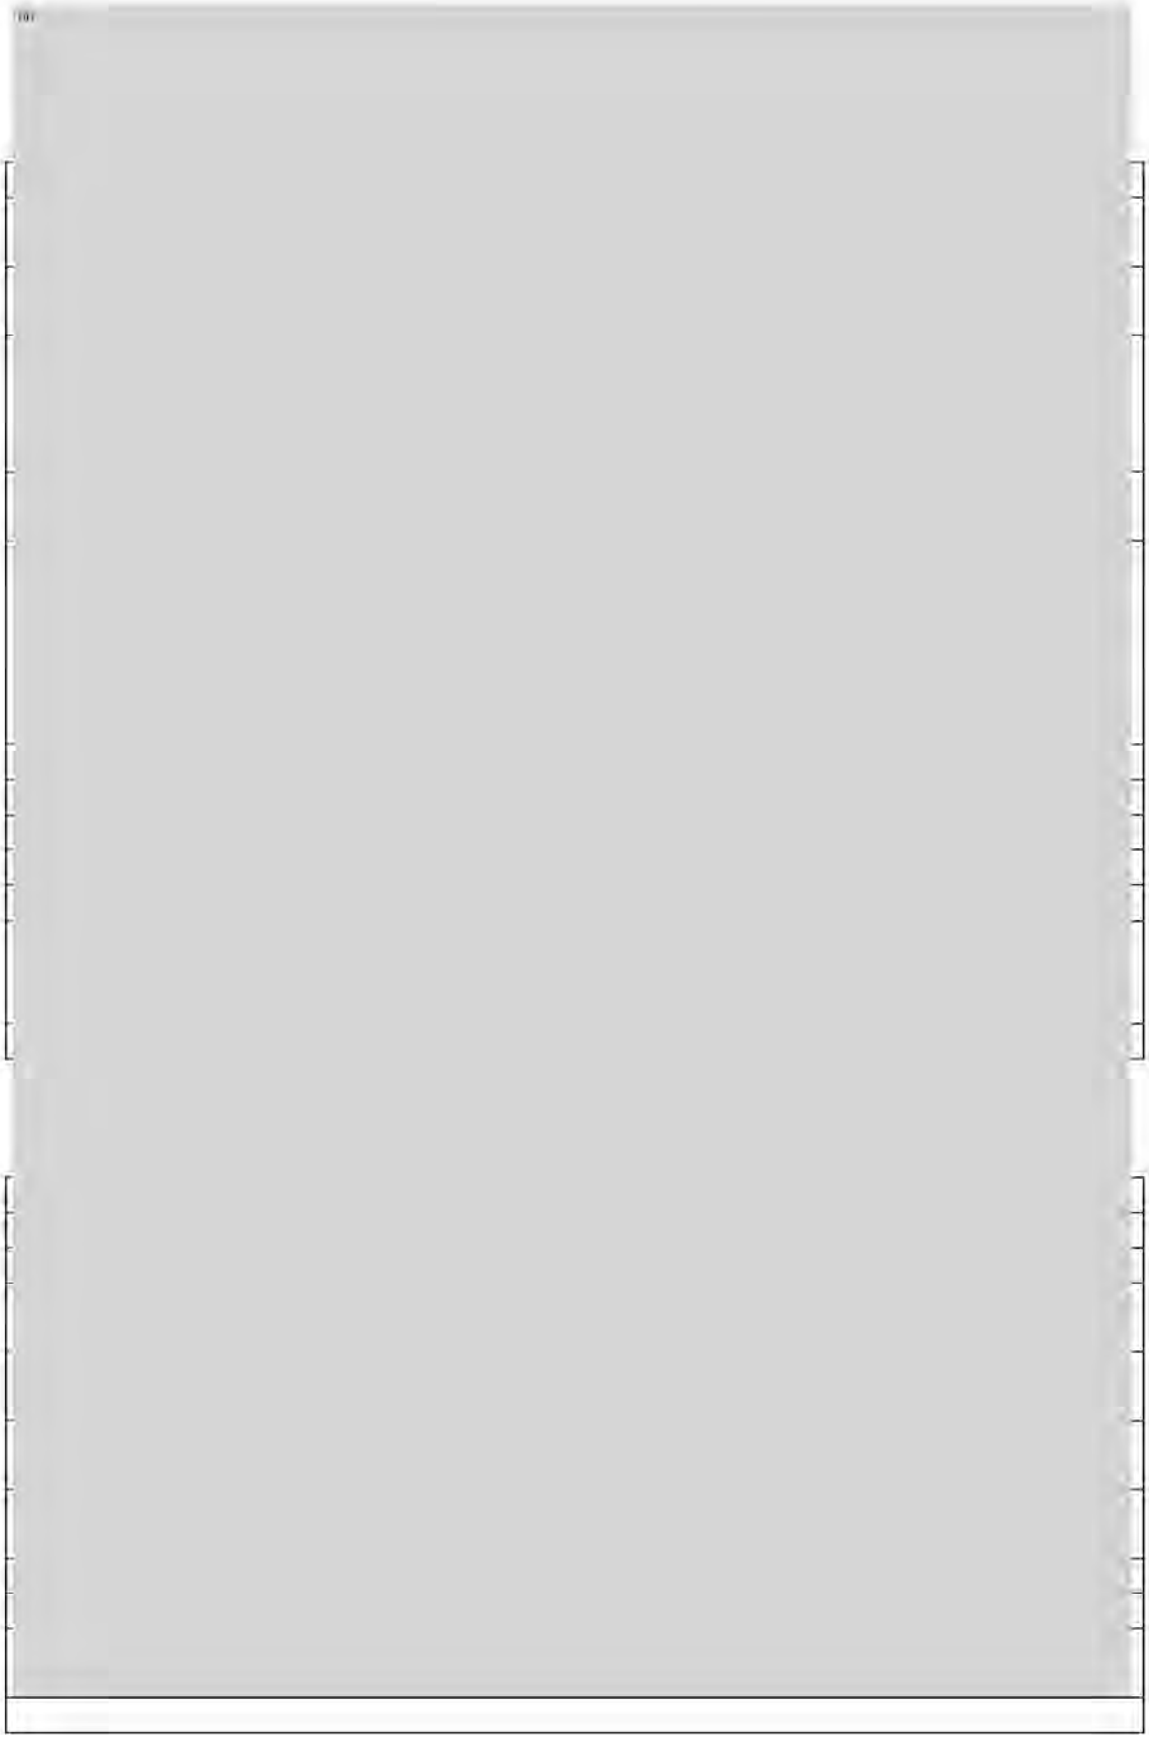

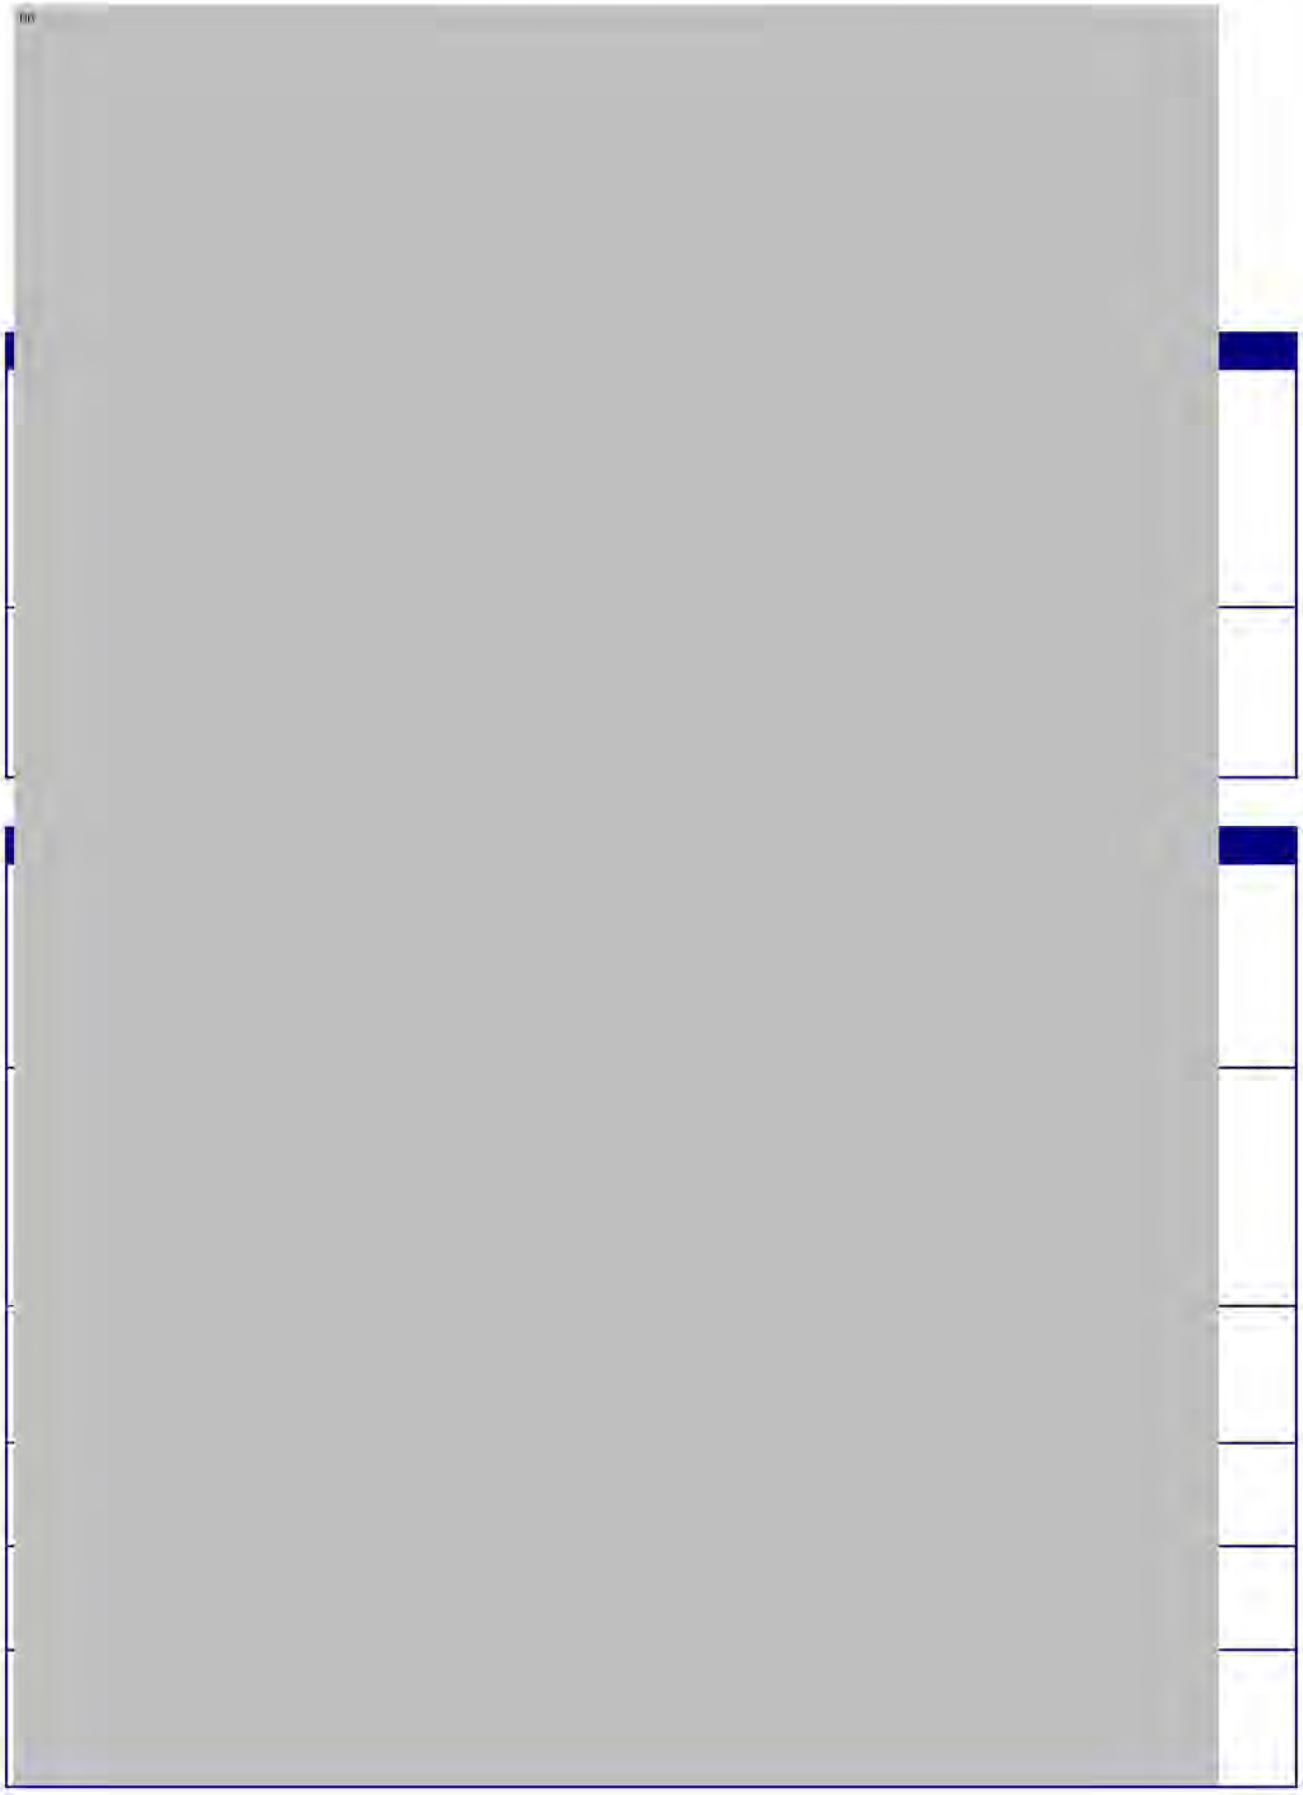

Docnr5

Dienst Stadsbeheer
Afdeling Opdrachtgeving

# Rotterdamsebaan

## Voortgangsrapportage

### 4e kwartaal 2014

**Datum: 2 februari 2015**
**Vertrouwelijk**
**Versie: 1.0**

**Kenmerken en gegevens t.b.v. subsidieverleners:**
Kenmerk en datum subsidie ministerie: IENM/BSK-2013/79475, 4 juni 2013
Kenmerk en datum subsidie Haaglanden: SH13.8997, 9 oktober 2013
Project: 02ADG001
Werkplannummers: VVB604 en VVV241
Paraaf namens Metropoolregio Rotterdam – Den Haag: ……..
Naam: ……..Functie: …….. Datum: ……..

| Opgesteld: | Geautoriseerd: | Vastgesteld: | Aangeboden: |
|---|---|---|---|
| d.d.: 9 januari 2015 | d.d.: 12 januari 2015 | d.d.: 15 januari 2015 | d.d.: 2 februari 2015 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Directeur Dienst Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever Rotterdamsebaan | Dhr. B. Revis, wethouder Verkeer, Binckhorst en Vlietzone / Portefeuillehouder Rotterdamsebaan |

# Inhoudsopgave

**1. Inleiding ..... 5**
1.1 Aandachtspunten ..... 5
1.2 Algemeen ..... 5
1.3 Terugblik afgelopen kwartaal ..... 5
1.4 Stand van zaken KPI ..... 6
1.5 Verwachting / ontwikkeling ..... 6
1.6 Risico's ..... 6
1.7 Bestuurlijke besluitvorming ..... 7
1.8 Financiën ..... 7
1.9 Voortuitblik komende kwartaal ..... 7
**2. Planstudies ..... 9**
2.1 Afgelopen kwartaal ..... 9
2.2 Komende kwartaal ..... 9
**3. Omgevingsmanagement ..... 10**
3.1 Afgelopen kwartaal ..... 10
3.2 Komend kwartaal ..... 12
**4. Verwerving ..... 13**
4.1 Afgelopen kwartaal ..... 13
4.2 Komende kwartaal ..... 13
**5. Vergunningen en overeenkomsten ..... 14**
5.1 Afgelopen kwartaal ..... 14
5.2 Komende kwartaal ..... 14
**6. Conditionering Binckhorstlaan ..... 15**
6.1 Afgelopen kwartaal ..... 15
6.2 Komende kwartaal ..... 16
**7. Conditionering Vlietzone ..... 17**
7.1 Afgelopen kwartaal ..... 17
7.2 Komende kwartaal ..... 17
**8. Voorbereiding t.b.v. hoofdcontract ..... 18**
8.1 Afgelopen kwartaal ..... 18
8.2 Komende kwartaal ..... 19
**9. Spoorboogweg, Regulusweg en Verlengde-Melkwegstraat ..... 20**
9.1 Afgelopen kwartaal ..... 20
9.2 Komende kwartaal ..... 20
**10. Tunnelveiligheid ..... 22**
10.1 Afgelopen kwartaal ..... 22
10.2 Komend kwartaal ..... 22
**11. Aanbesteding hoofdcontract ..... 23**
11.1 Afgelopen kwartaal ..... 23
11.2 Komende kwartaal ..... 24
**12. Aanbesteding deelcontracten ..... 25**
12.1 Afgelopen kwartaal ..... 25
12.2 Komende kwartaal ..... 25
**13. Communicatie ..... 26**
13.1 Afgelopen kwartaal ..... 26
13.2 Komende kwartaal ..... 27
**14. Beheer en overdracht ..... 28**

14.1 Afgelopen kwartaal ..... 28
14.2 Komend kwartaal ..... 28
**15. Organisatie ..... 29**
15.1 Afgelopen kwartaal ..... 29
15.2 Komend kwartaal ..... 29
**16. Financiën ..... 30**
16.1 Kostenstructuur ..... 30
16.2 Dekkingen ..... 32
**17. Risicobeheer ..... 34**
17.1 Afgelopen kwartaal ..... 34
17.2 Komende kwartaal ..... 34
17.3 Financiële toprisico's ..... 35
17.4 Toprisico's planning ..... 37
**18. Planning ..... 40**
18.1 Afgelopen kwartaal ..... 40
18.2 Komende kwartaal ..... 41
**19. Scopemanagement ..... 42**
19.1 Afgelopen kwartaal ..... 42
19.2 Komende kwartaal ..... 42
**20. Kwaliteitsbeheer ..... 43**
20.1 Afgelopen kwartaal ..... 43
20.2 Komende kwartaal ..... 43
**21. Informatiebeheer ..... 44**
21.1 Afgelopen kwartaal ..... 44
21.2 Komend kwartaal ..... 44
**Bijlage 1: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan ..... 45**
**Bijlage 2: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer ..... 47**

# 1. Inleiding

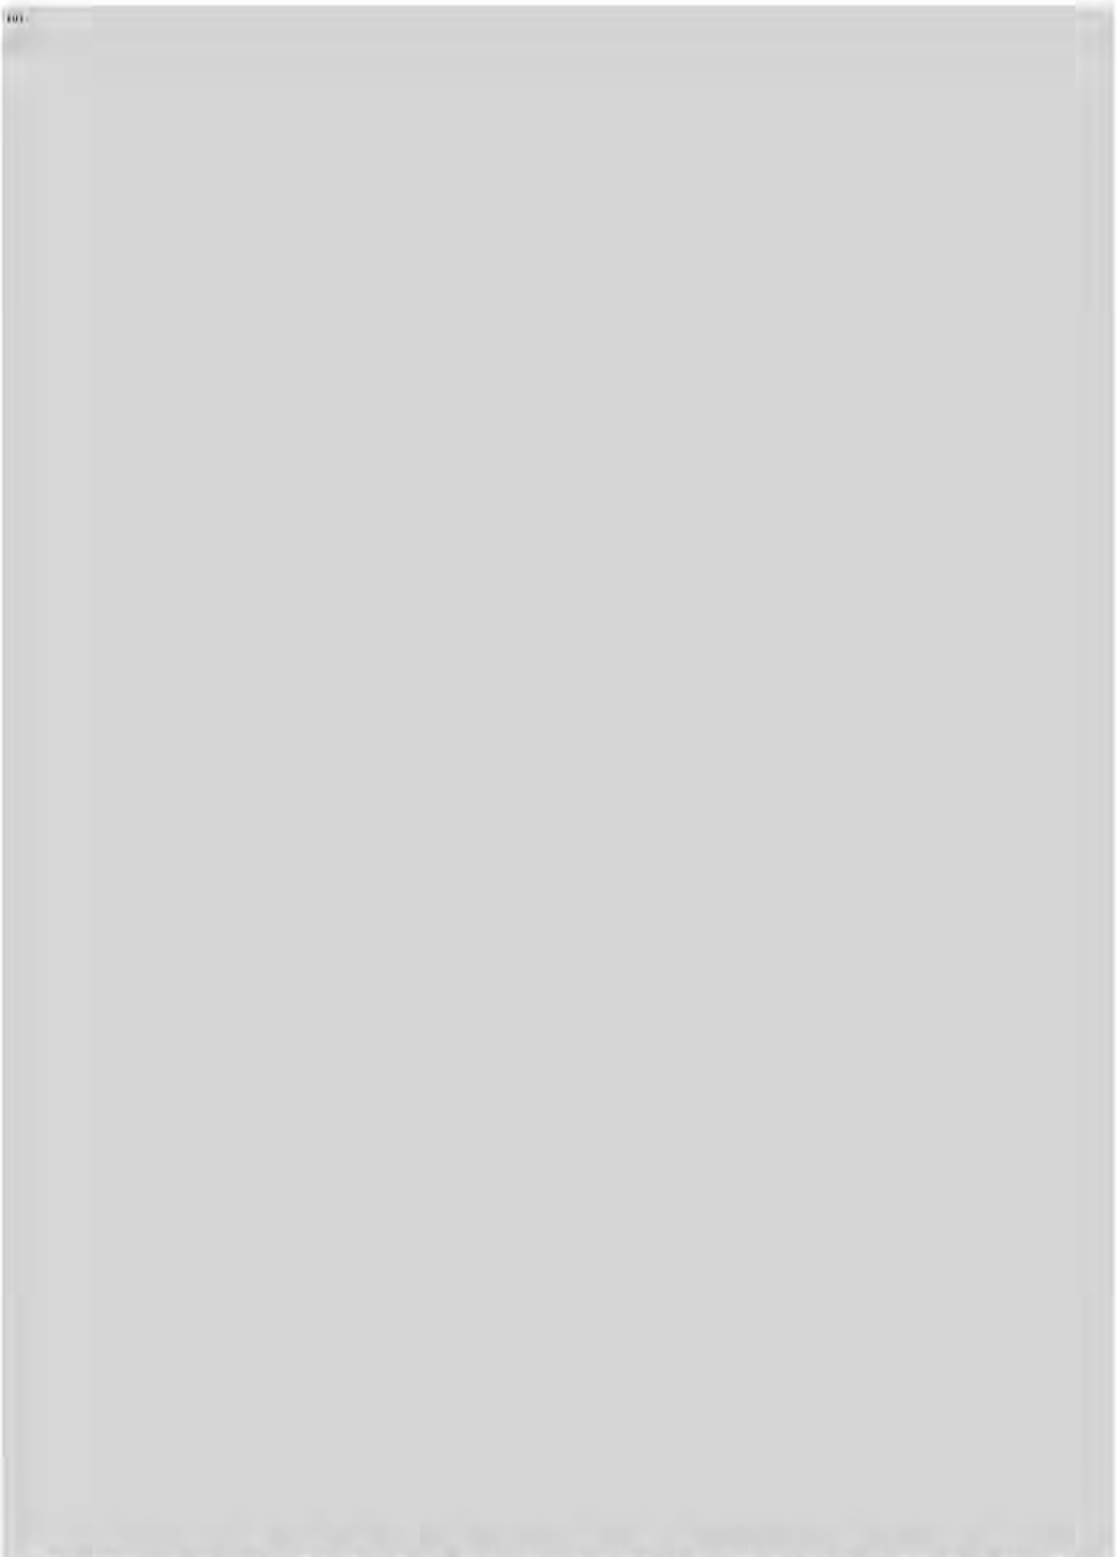

- Op 16 december heeft het college ingestemd met het raadsvoorstel vaststelling Voorlopig Ontwerp en dekkingsvoorstel Molenvlietpark t.b.v. de inpassing van de Rotterdamsebaan in de Vlietzone en de calamiteitenberging (Molenvlietpark);

- Op 19 december zijn vele documenten aan de gegadigden voor het hoofdcontract verstrekt t.b.v. de komende dialooggesprekken tijdens de aanbesteding. Het gaat o.a. om hernieuwde versies van de vraagspecificaties en contractdocumenten zoals de (stuur)mijlpalen van de planning, de eisen aan de vormgeving van de Rotterdamsebaan, de eisen aan de waterhuishouding in de deelgebieden Vlietzone, Laan van Hoornwijck en knooppunt Ypenburg, de eisen aan het Molenvlietpark, het DO inpassing Binckhorst en het nieuwe alignement van de tunnel.

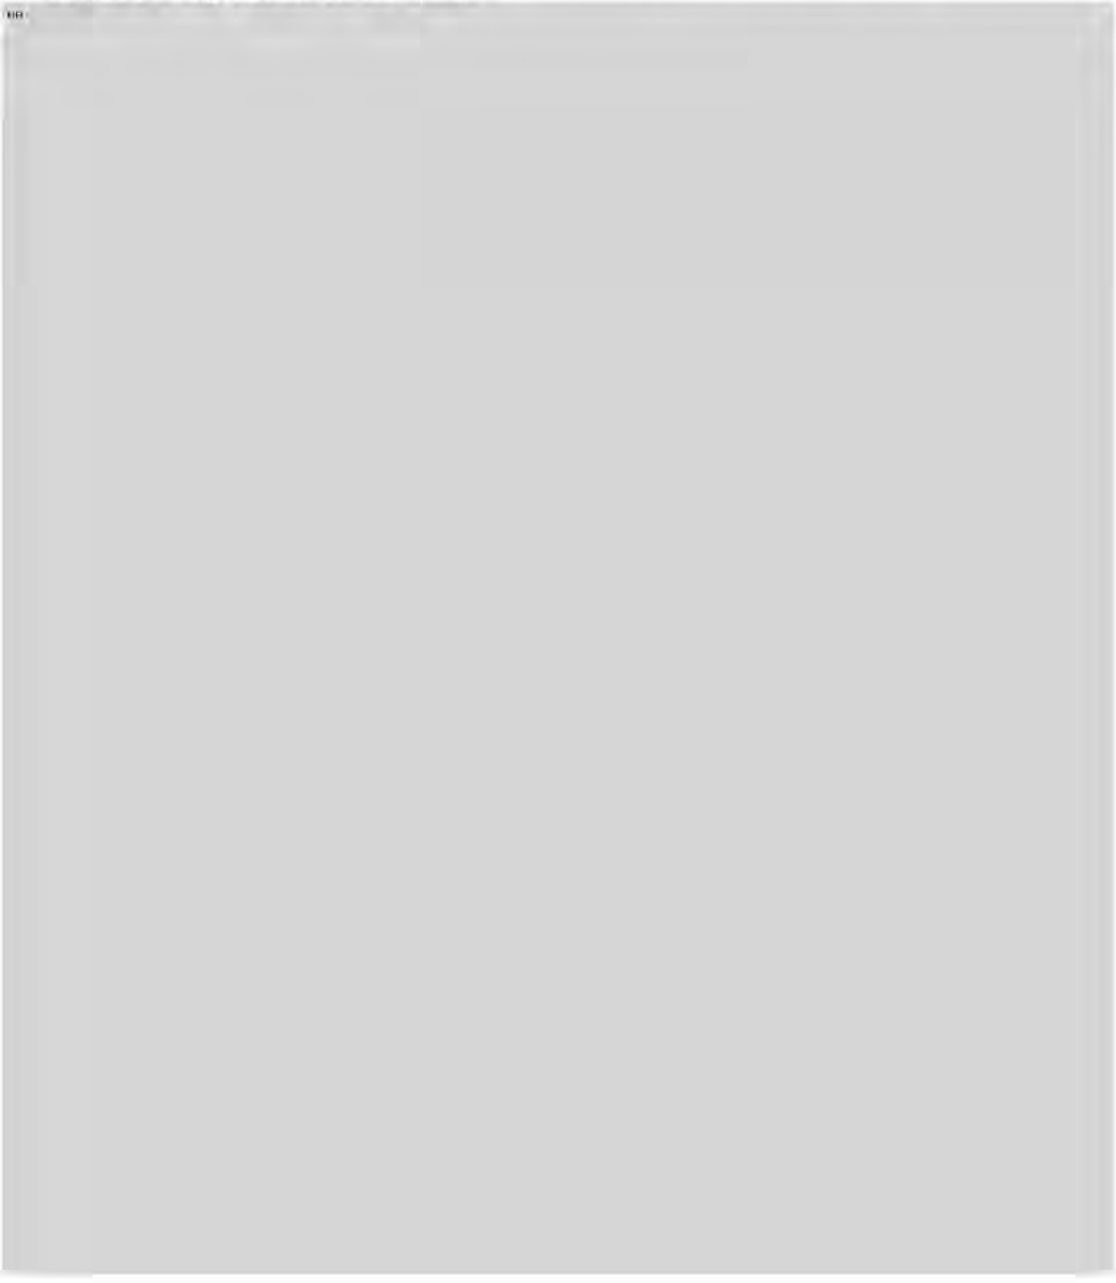

## 1.7 Bestuurlijke besluitvorming

- Raadsbesluit: Vaststelling Voorlopig Ontwerp en dekkingsvoorstel Molenvlietpark t.b.v. de inpassing van de Rotterdamsebaan in de Vlietzone en de calamiteitenberging op verzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland (Molenvlietpark) (januari/februari 2015);

## 1.8 Financiën

Het uitvoeringsbudget is per 31-12-2014 op € 635,4 mln. te stellen (was: € 635,4 mln.). In deze raming is geen rekening gehouden met de mogelijke komst van het Molenvlietpark en waterberging in de Vlietzone en beheer en onderhoud. Hier dient nog bestuurlijke besluitvorming over plaats te vinden (verwacht in kwartaal 1-2015).

## 1.9 Voortuitblik komende kwartaal

Het komende kwartaal wordt, naast de hiervoor gemelde bestuurlijk besluitvorming o.a. het navolgende voorzien:

- Aanvragen van diverse vergunningen namens opdrachtgever: o.a. watervergunning tot wijzigen peil en leggerwijziging, omgevingsvergunning strijdig gebruik Molenvlietpark;

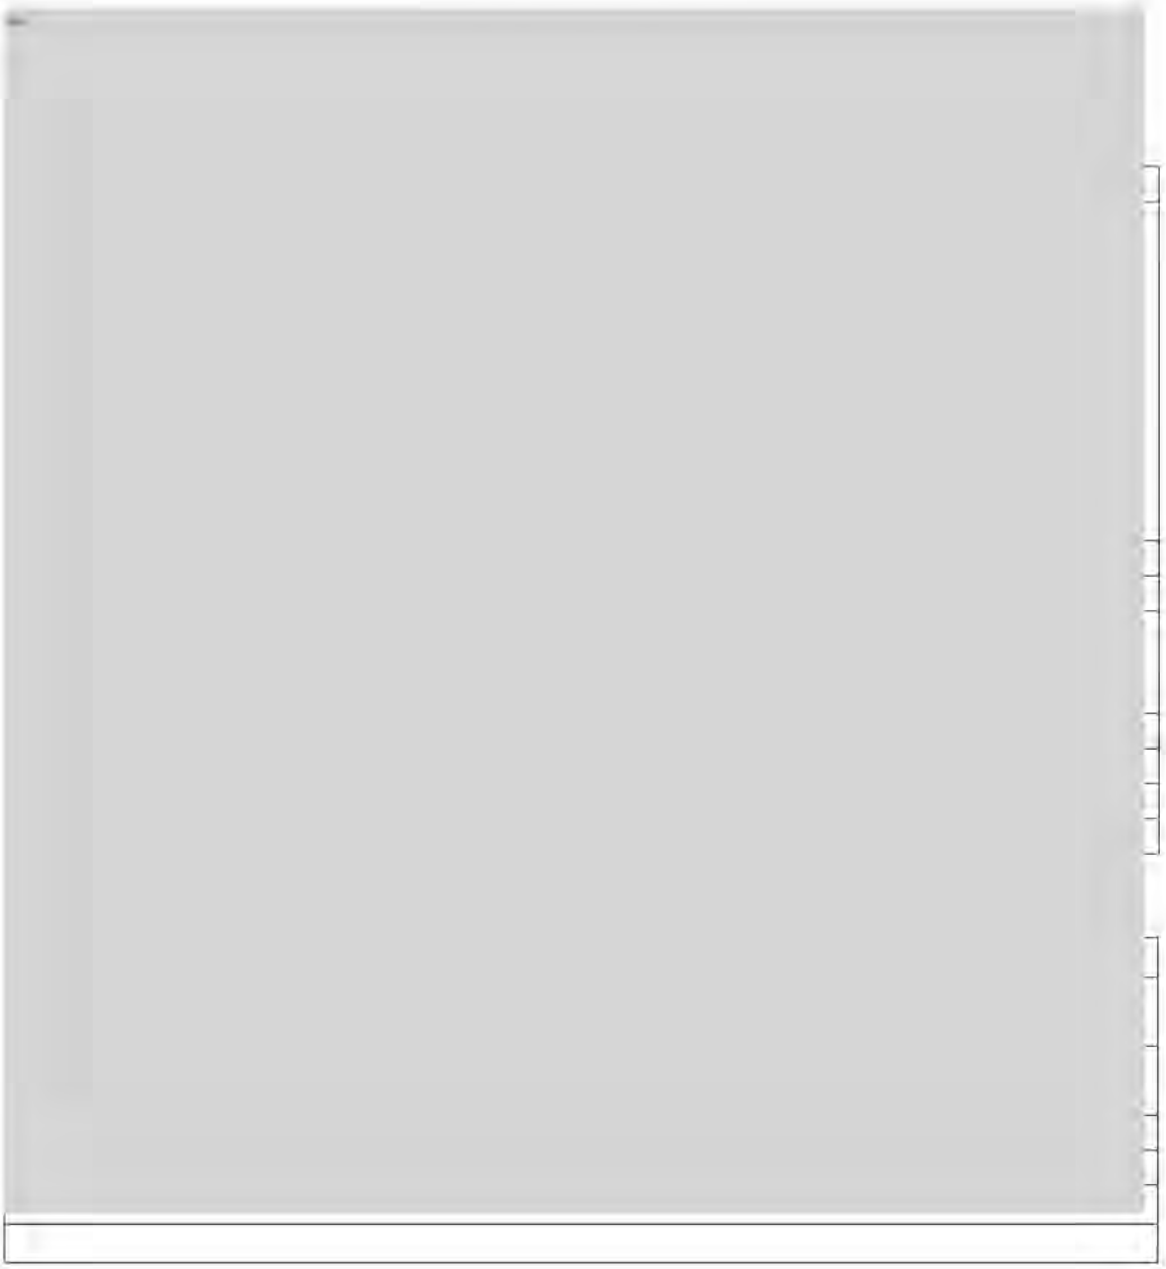

# 3. Omgevingsmanagement

## 3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Op 25 september heeft de Verenigde Vergadering van Delfland het Investeringsplan voor de calamiteitenberging vastgesteld. De afspraken tussen gemeente Den Haag en HHD | Op 13 november 2014 is door het Hoogheemraadschap ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst v.w.b. de realisatie van de calamiteitenberging en |

| | |
|---|---|
| worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het besluit van de Verenigde Vergadering is niet geheel in lijn met de bestuurlijke afspraken.<br>Het ontwerp met calamiteiten berging ligt tot 3 november ter inzage voor indienen zienswijzen.<br>Ter voorbereiding op het raadsvoorstel wordt momenteel door DSO naar aanvullende dekking gezocht. | vispaaiplaats. Op 16 december 2014 heeft het college besloten in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en het raadsvoorstel tot vaststelling van het Voorlopig Ontwerp Molenvlietpark. |

| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
|---|---|
| Collegebesluit instemming SOK gemeente en HHD | Op 16 december 2014 heeft het college besloten in te stemmen met het aangaan van de SOK. |
| College- en raadsbesluit inzake Molenvlietpark (ontwerp vaststellen en operationaliseren) | Op 16 december 2014 heeft het college ingestemd met het raadsvoostel tot vaststelling van het Voorlopig Ontwerp Molenvlietpark als scope uitbreiding van project Rotterdamsebaan. Met de provincie moeten subsidiemogelijkheden onderzocht worden t.b.v. gewenste kwaliteitsimpuls. |

## 3.2 Komend kwartaal

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| BR |
| Uitvoering van het raadsvoorstel Molenvlietpark en SOK met HHD. Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het VO en de dekking van de kosten vindt ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats en zal een omgevingsvergunning strijdig gebruik worden aangevraagd en in procedure worden gebracht om de aanleg van het Molenvlietpark planologisch mogelijk te maken. Parallel aan dit traject worden onderhandelingen gevoerd met de grondeigenaren om conform het programma van eisen de inlaat naar de waterberging te kunnen realiseren. |
| BR |
| **Besluiten** |
| Raadsbesluit inzake VO en dekking Molenvlietpark. |
| |

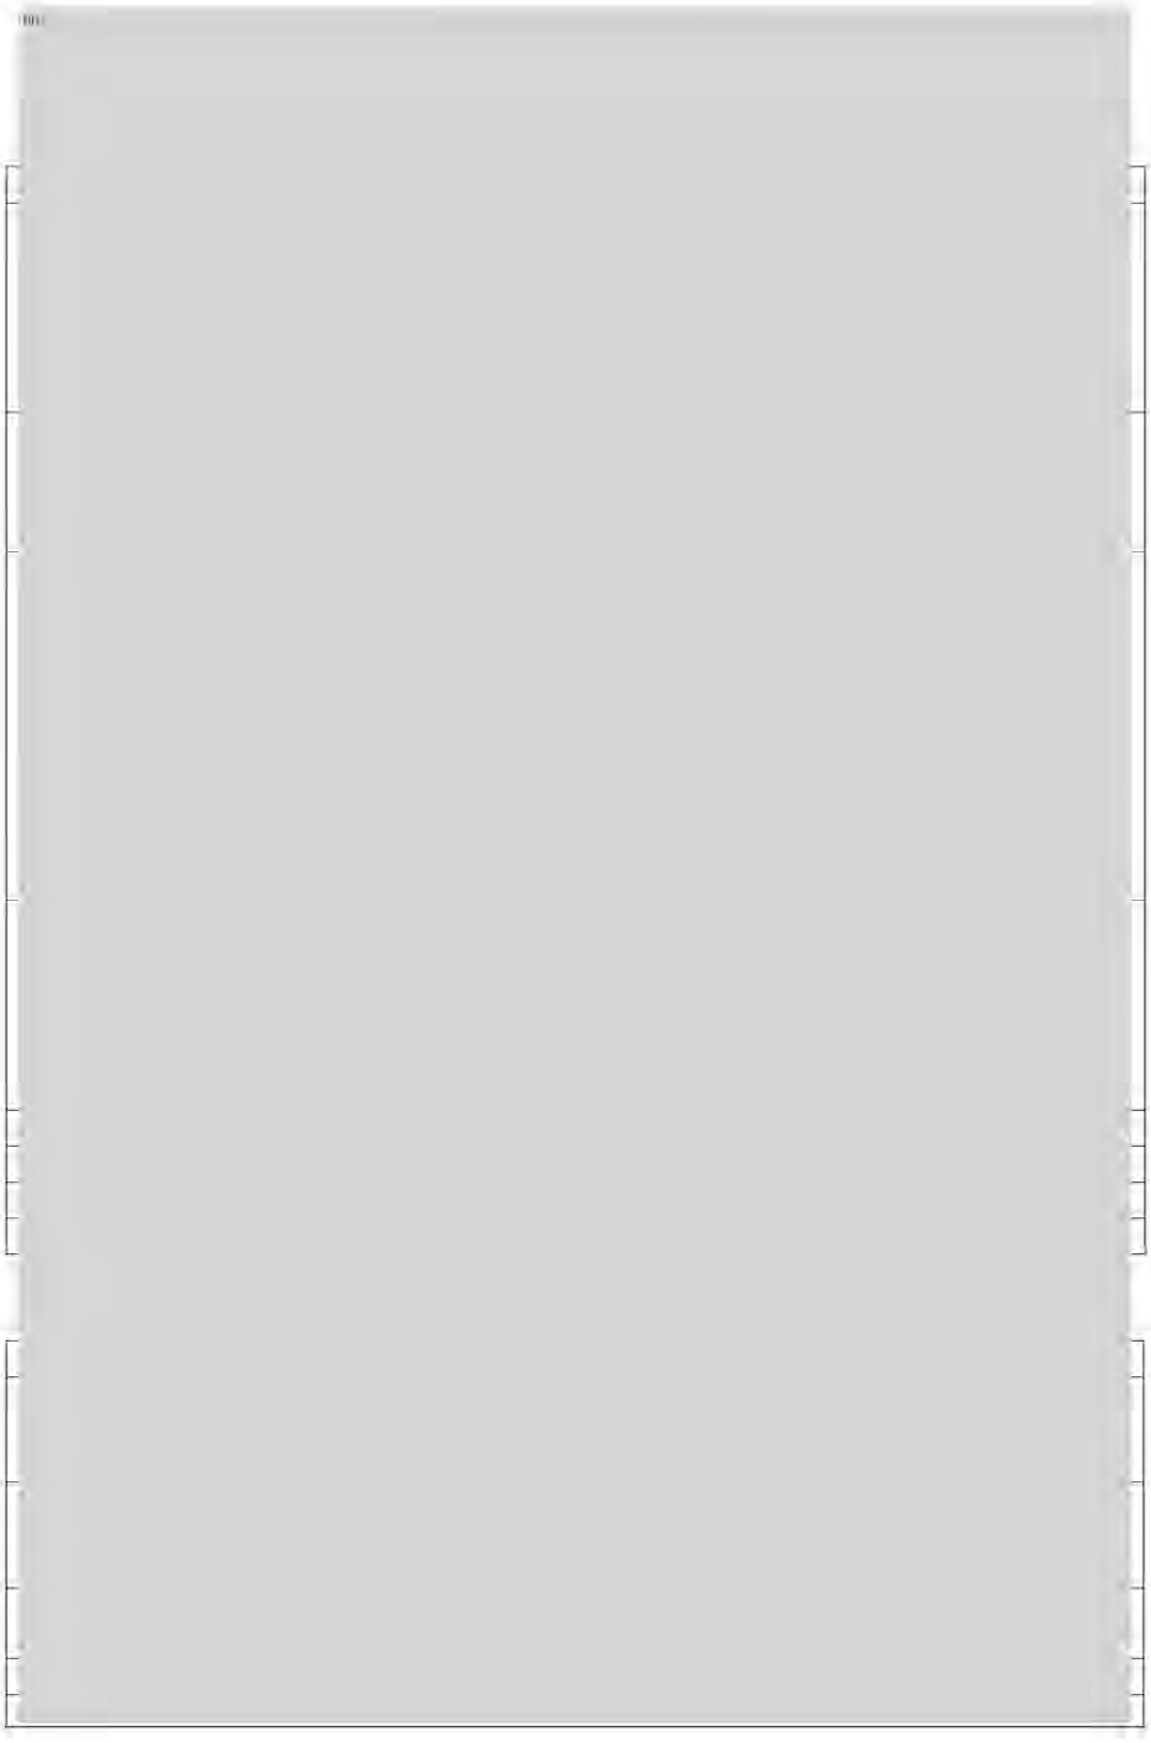

# 5. Vergunningen en overeenkomsten

## 5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Het vergunningenoverzicht voor de voorbereidende c.q. conditionerende fase van de Vlietzone is in detail uitgewerkt (incl. Molenvlietpark). Verder is een vergunningenoverzicht t.a.v. de vergunningen, waarvoor Rijkswaterstaat het bevoegd gezag is, opgesteld en ter bespreking aan RWS aangeboden. | Gestart is met het opstellen van een vergunningenoverzicht voor de benodigde vergunningen voor de uitvoeringsfase. In eerste instantie zijn de vergunningen met lange doorlooptijden en degene welke de opdrachtgever dient te verzorgen in kaart gebracht en aan de planning gekoppeld. |
| BR | |

## 5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Aanvragen van diverse vergunningen namens opdrachtgever: o.a. watervergunning tot wijzigen peil en leggerwijziging, omgevingsvergunning strijdig gebruik Molenvlietpark. |
| BR |

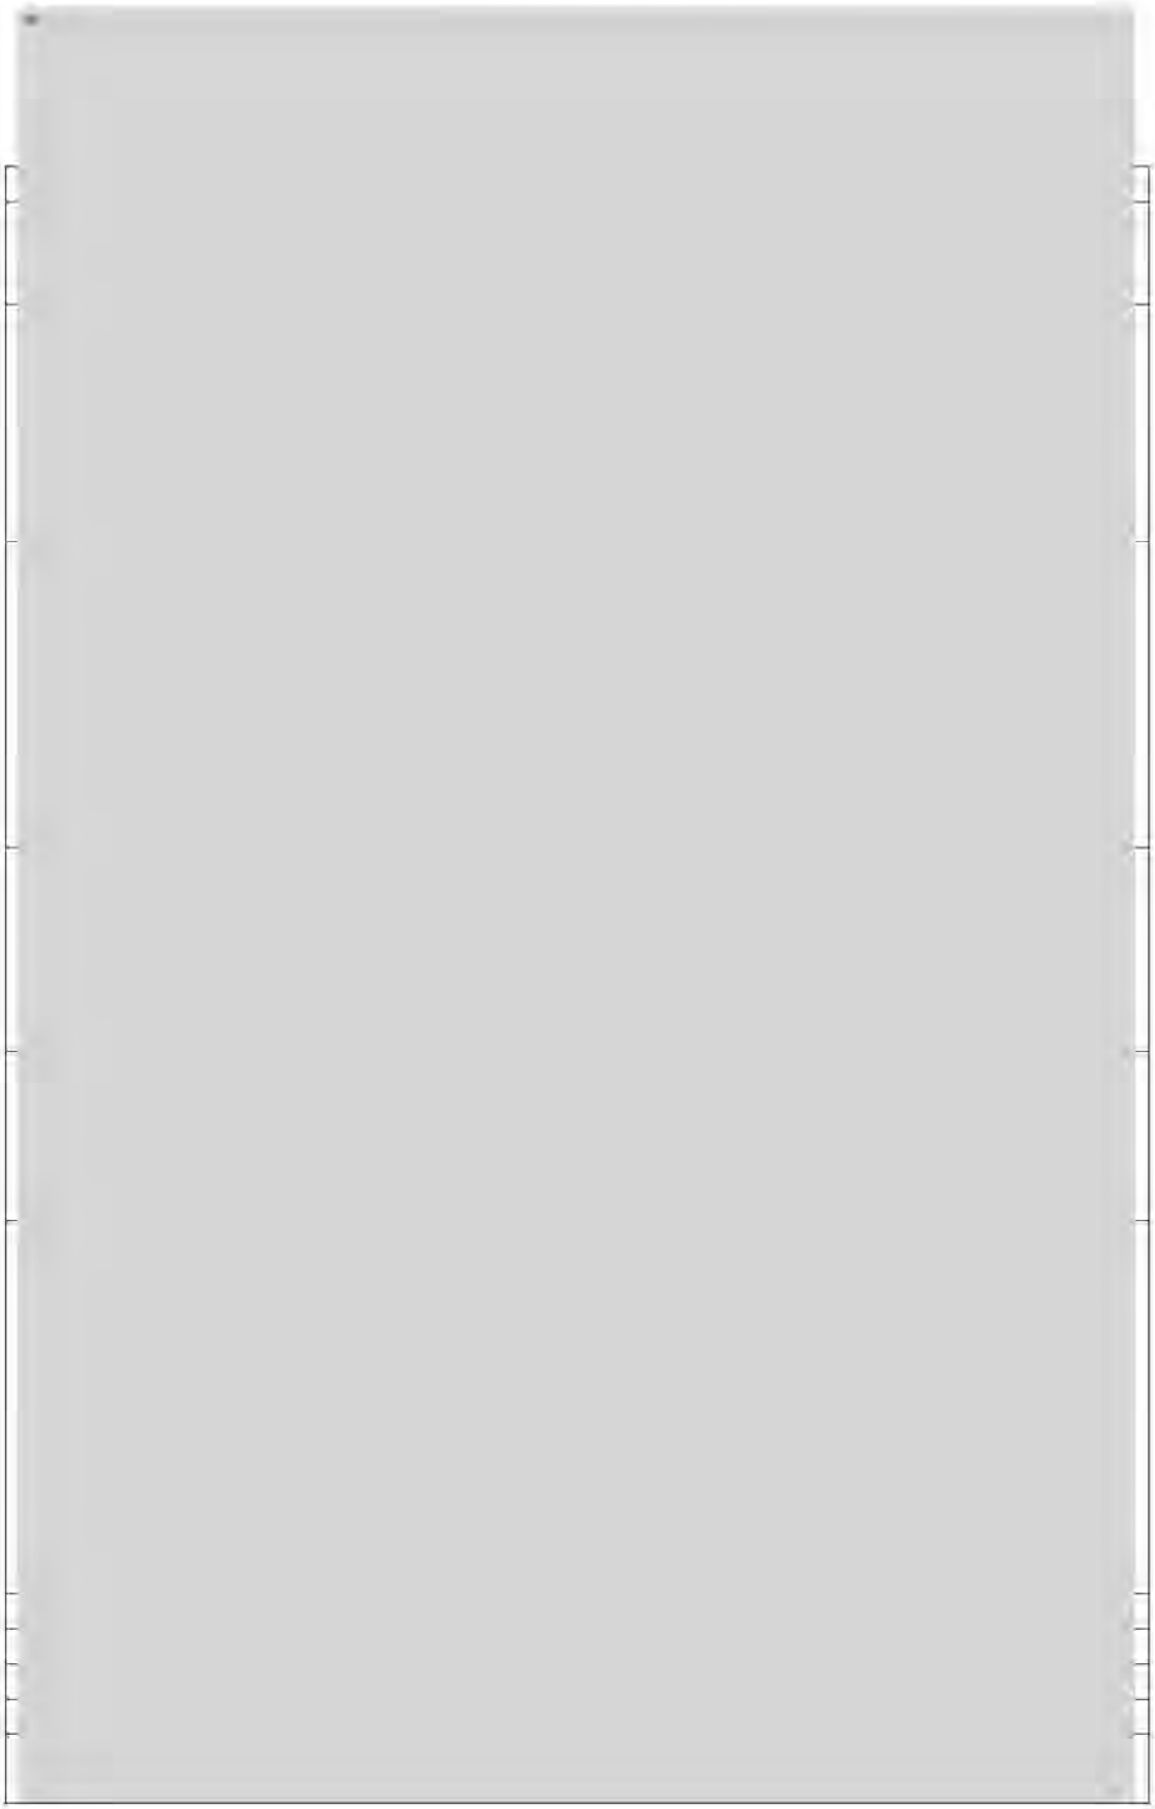

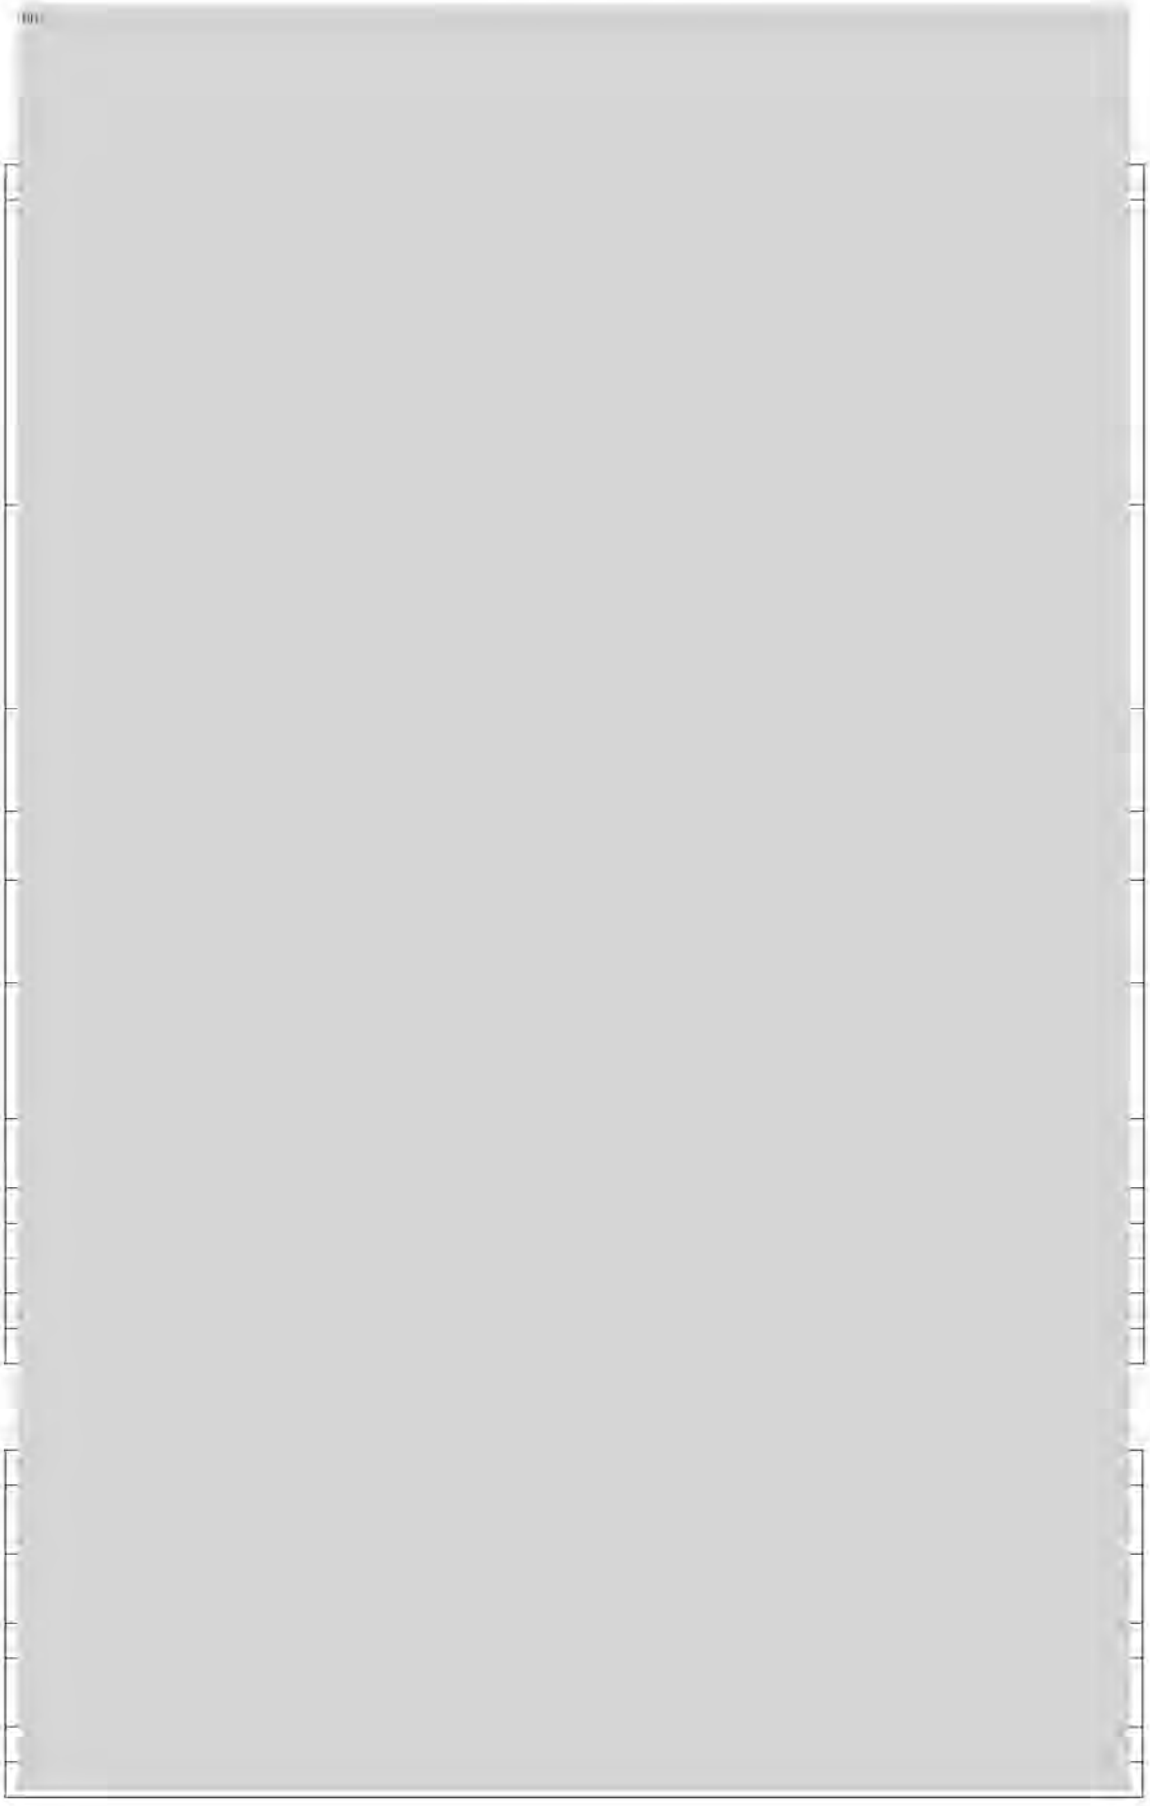

# 8. Voorbereiding t.b.v. hoofdcontract

## 8.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Medio december 2014 volgt de eerste update van de Vraagspecificatie deel 1A. Met name de eisen aan de omgevingsbeïnvloeding (zettingseisen belendingen), eisen aan de vormgeving en eisen aan de inpassing (inclusief waterhuishouding) worden in deze periode gecompleteerd. Gestreefd wordt om in de versie van december een volledig dekkende Vraagspecificatie deel 1A te verstrekken. | 19 december jl. is versie B van de Vraagspecificatie deel 1A gepubliceerd. De belangrijkste toevoegingen in versie B zijn de eisen aan de vormgeving van de Rotterdamsebaan, de eisen aan de waterhuishouding in de deelgebieden Vlietzone, Laan van Hoornwijck en knooppunt Ypenburg en de eisen aan het Molenvlietpark. |

| |
|---|
| |

| Geplande besluiten | Genomen besluiten: |
|---|---|
|  | |
| Vaststelling Voorlopig Ontwerp Molenvlietpark, inclusief raming en dekking door gemeenteraad Den Haag | Het Raadsvoorstel Molenvlietpark is in de routing gebracht en vastgesteld door het college van B&W. Behandeling door de gemeenteraad volgt begin 2015. |
| | |

## 8.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Nadat de raad het raadsvoorstel voor het Molenvlietpark heeft goedgekeurd, wordt de Omgevingsvergunning Molenvlietpark voorbereid en ingediend. |
| Onderdeel van het Molenvlietpark is de waterberging. De toevoer van deze berging wordt nader uitgewerkt ten behoeve van de aanbesteding en de verwerving van de benodigde gronden. |
| 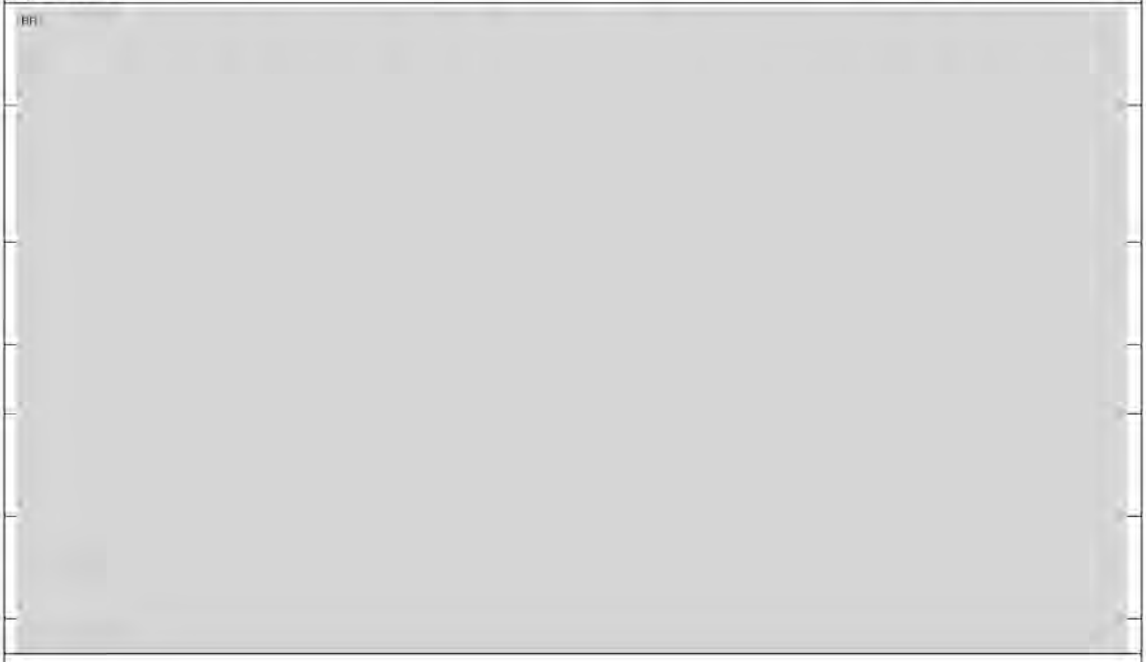 |

| Besluiten |
|---|
| Raadsbesluit Molenvlietpark |
| |

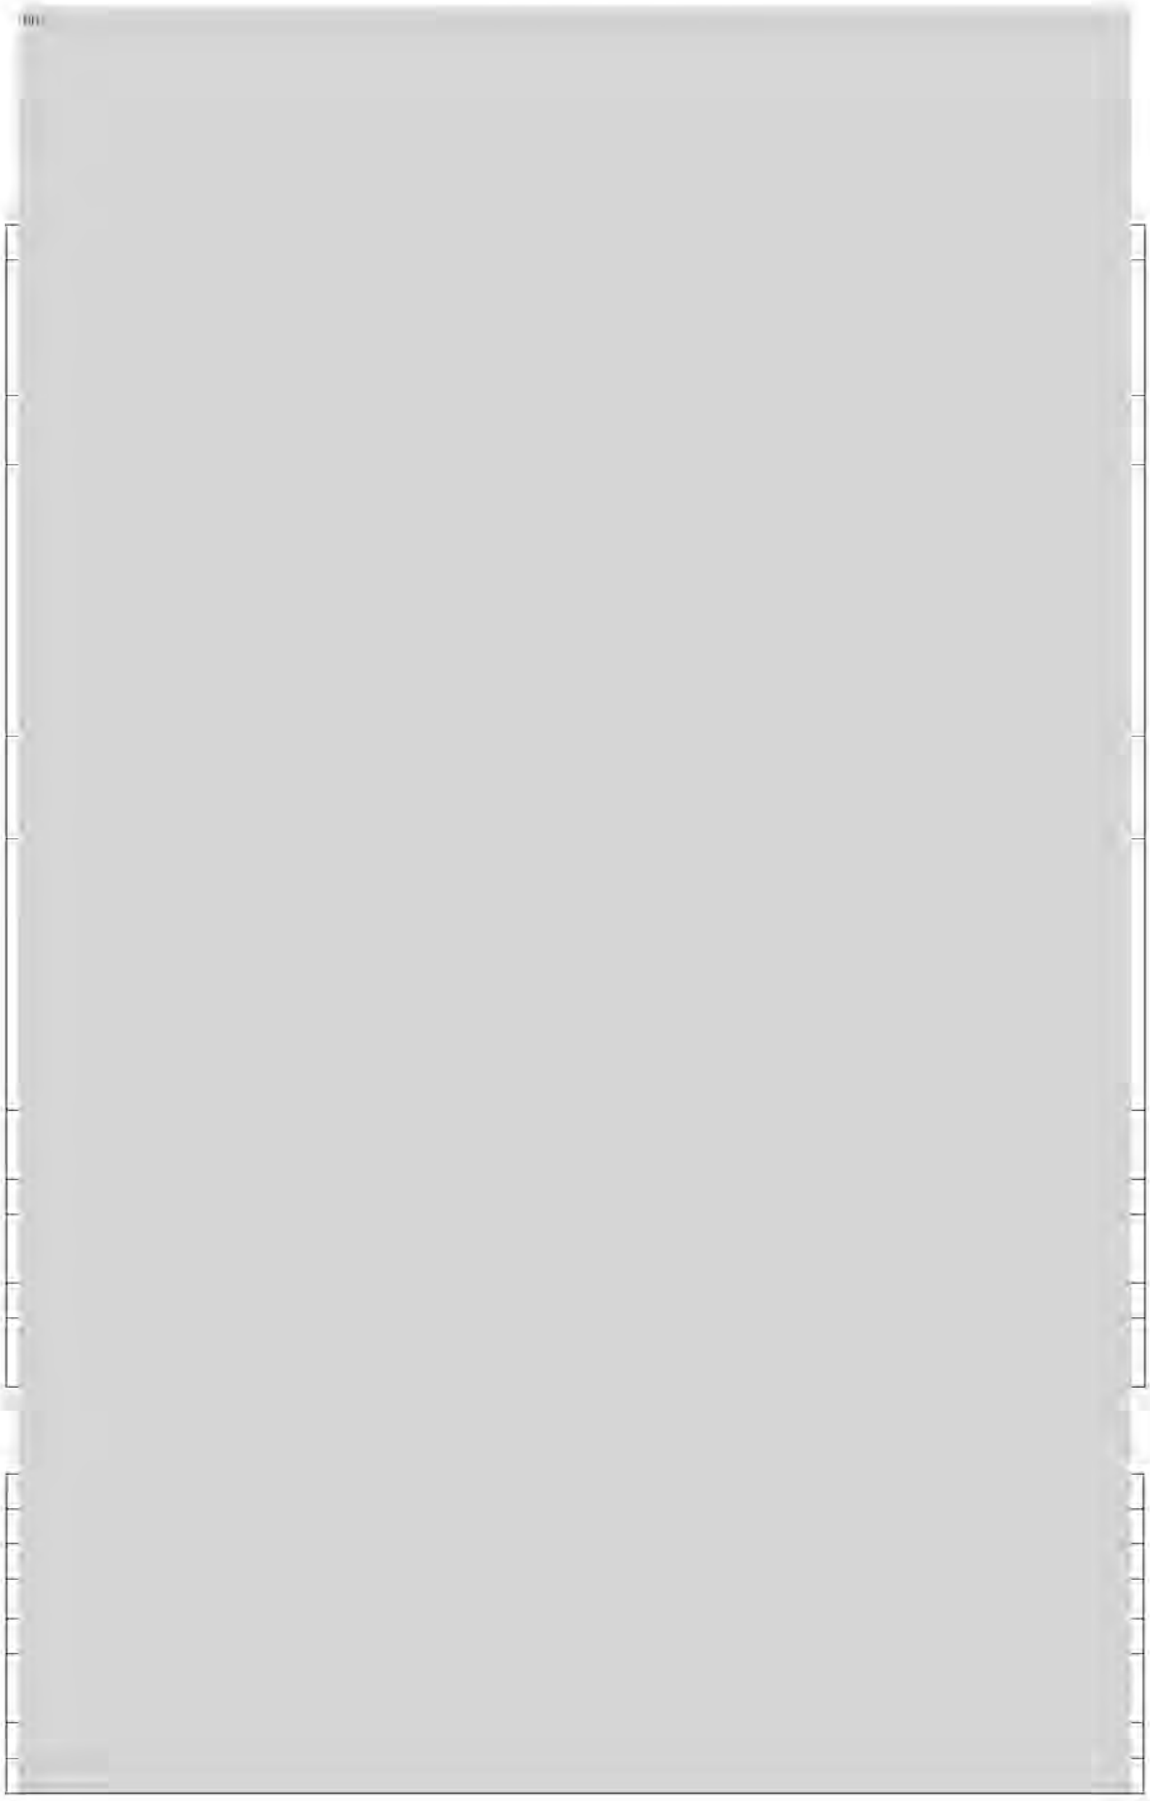

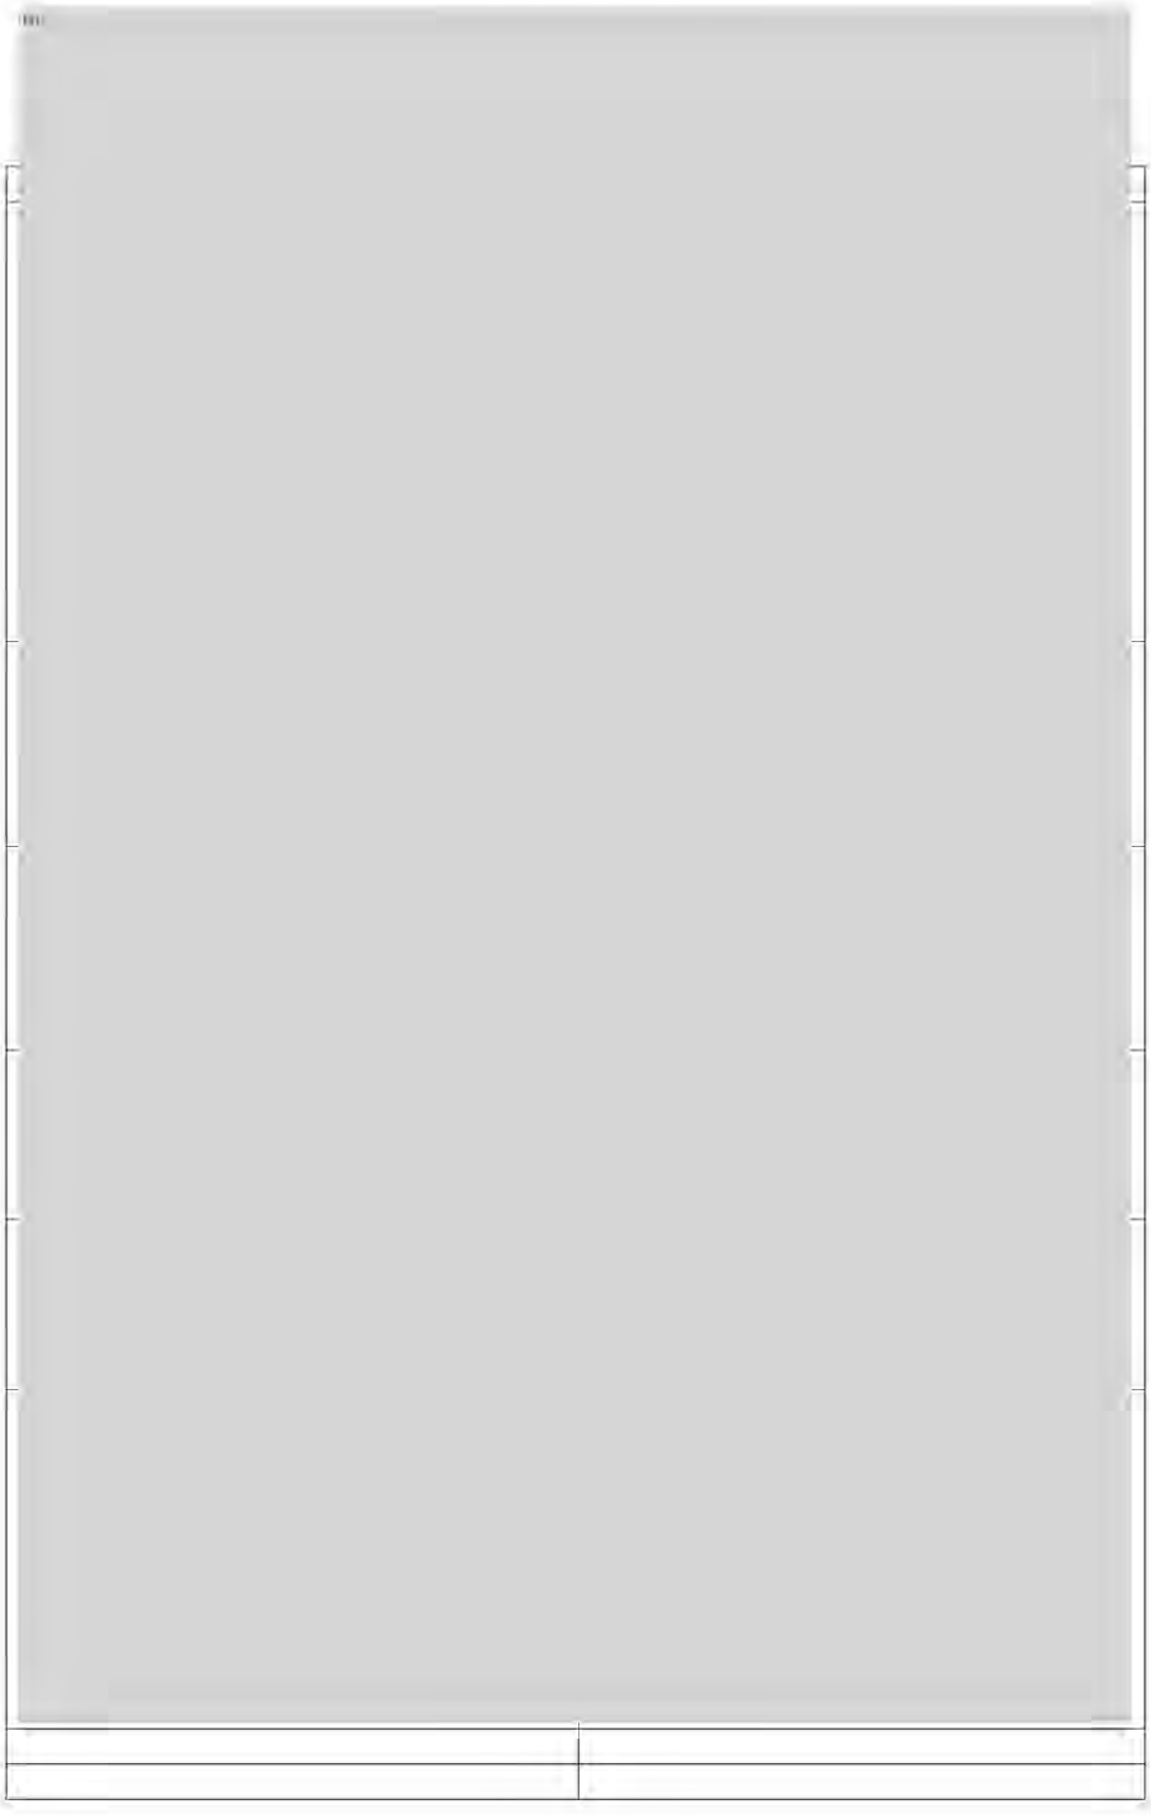

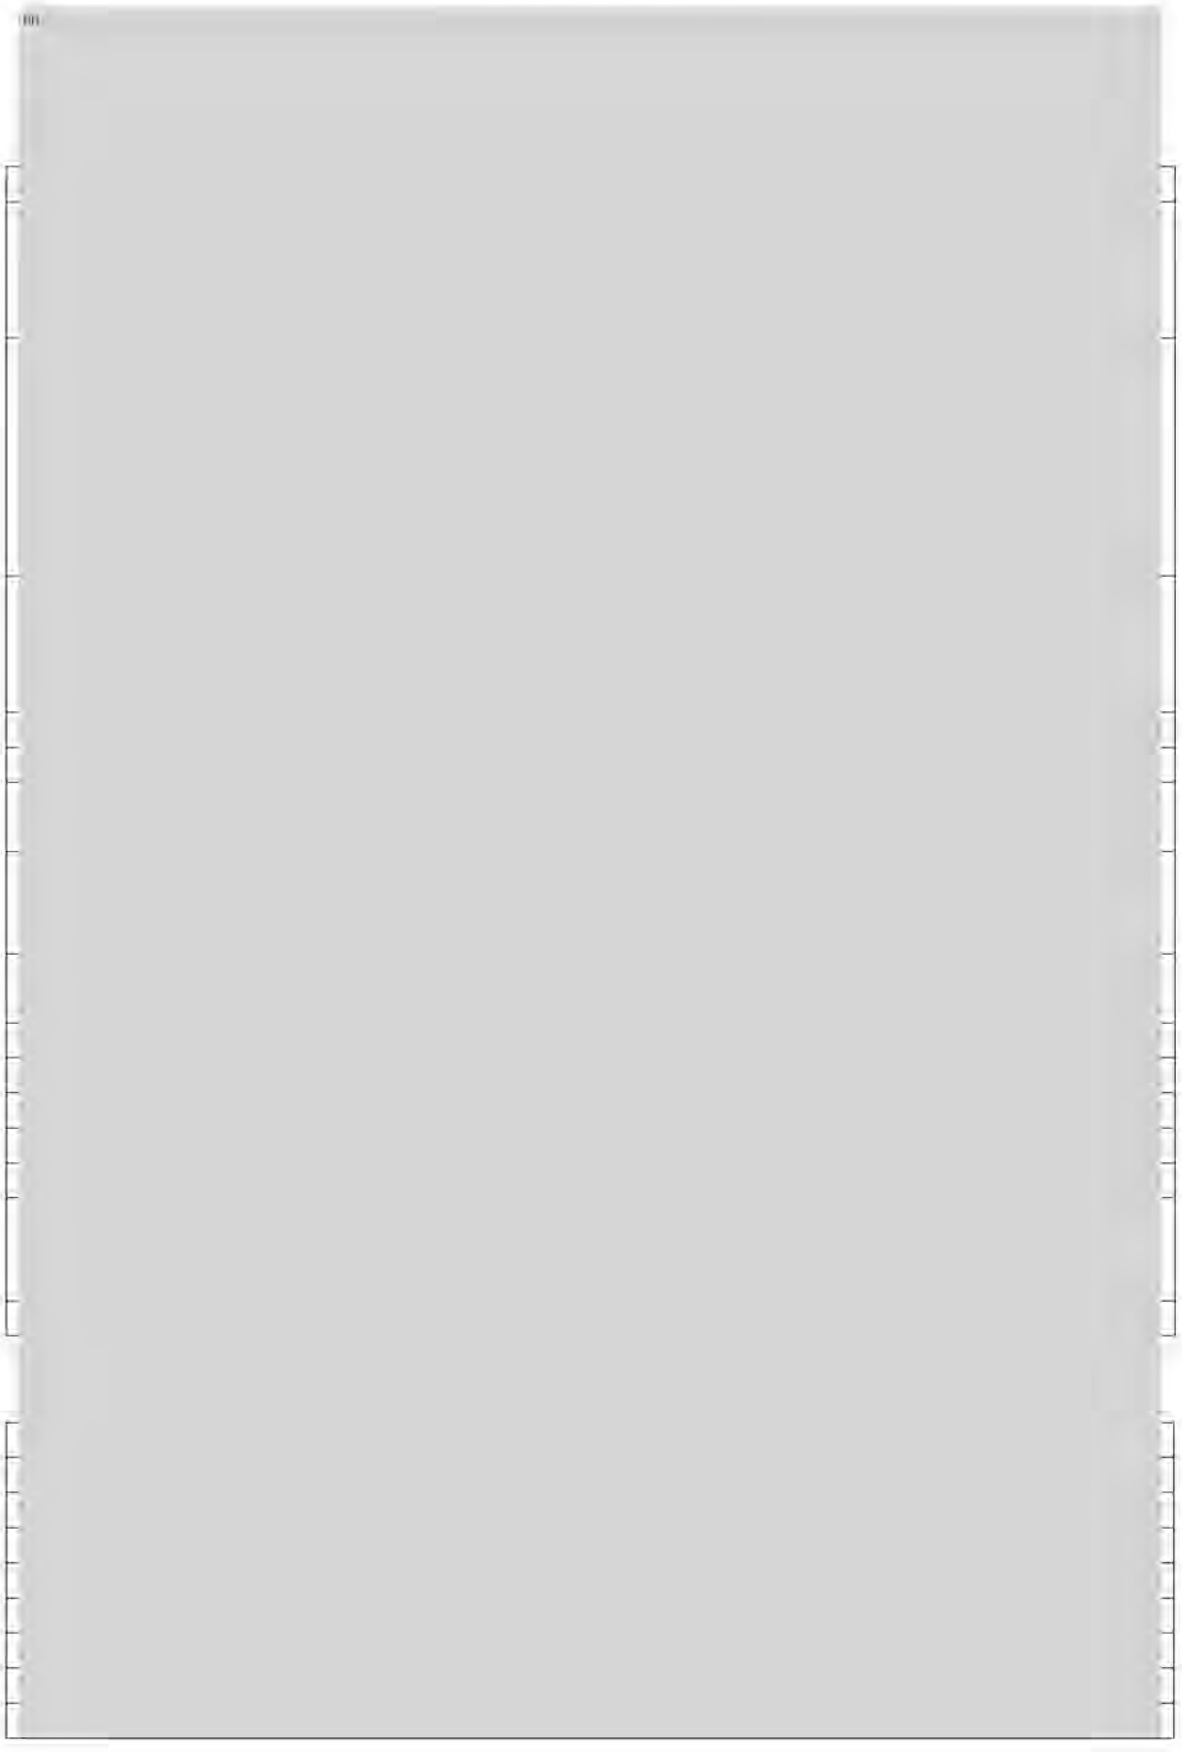

# 13. Communicatie

## 13.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Inloopbijeenkomst over het concept-ontwerp voor het Molenvlietpark. | Maandag 13 oktober was er een inloopavond over het voorlopig ontwerp Molenvlietpark.Circa 100 mensen kwamen langs in het Trefpunt Rotterdamsebaan. Tijdens de avond werd het landschapsontwerp toegelicht door de architect en was het Hoogheemraadschap van Delfland aanwezig om vragen over de voorziene calamiteitenberging te beantwoorden. |
| [redacted] | |

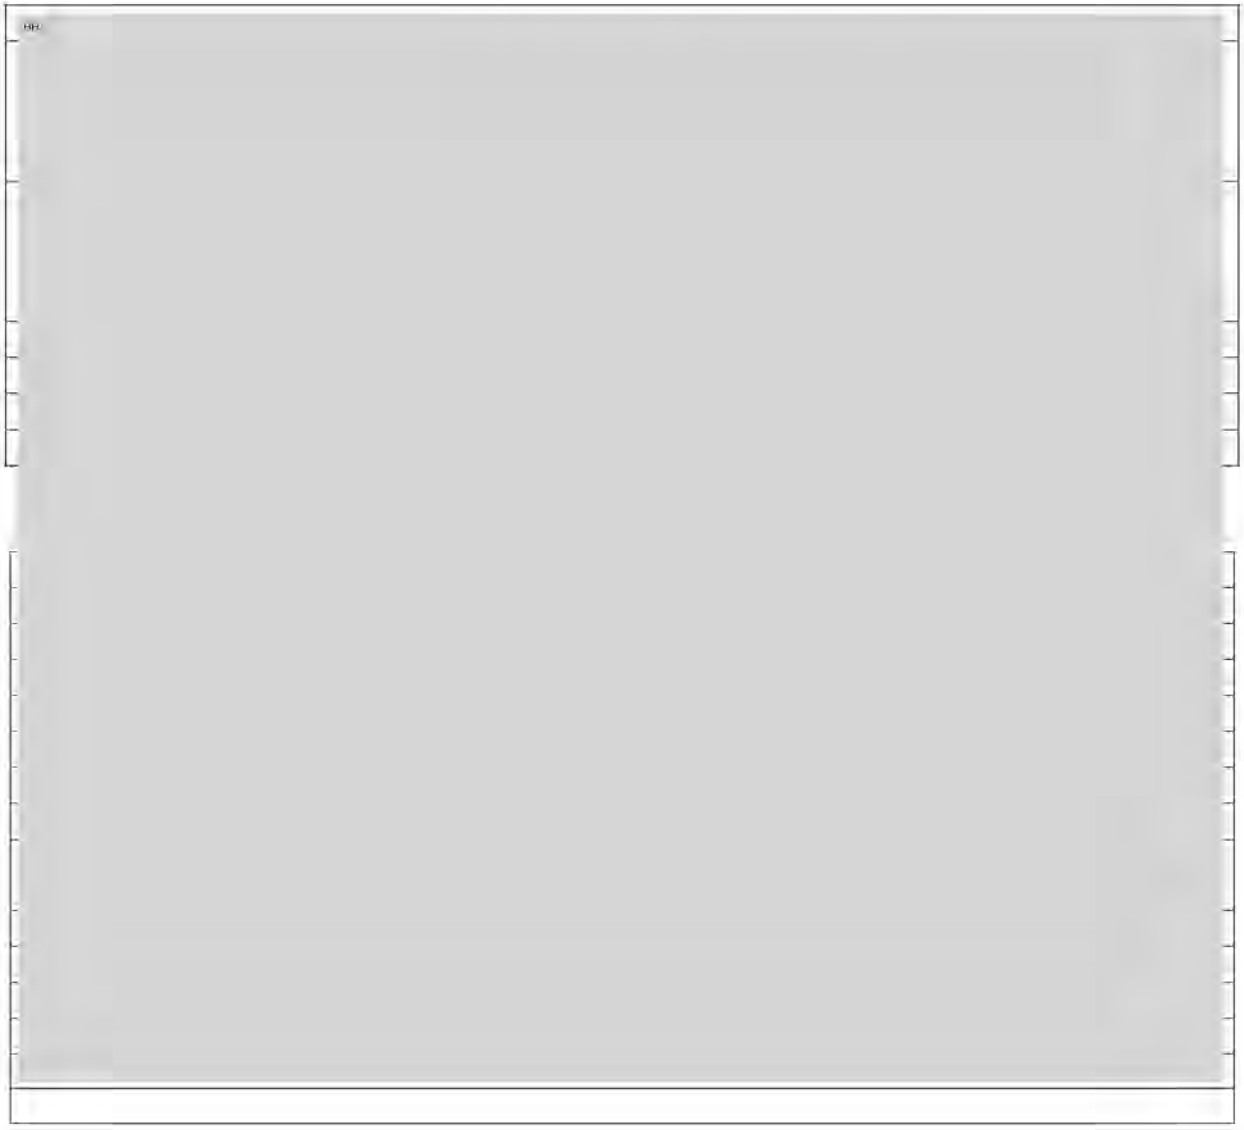

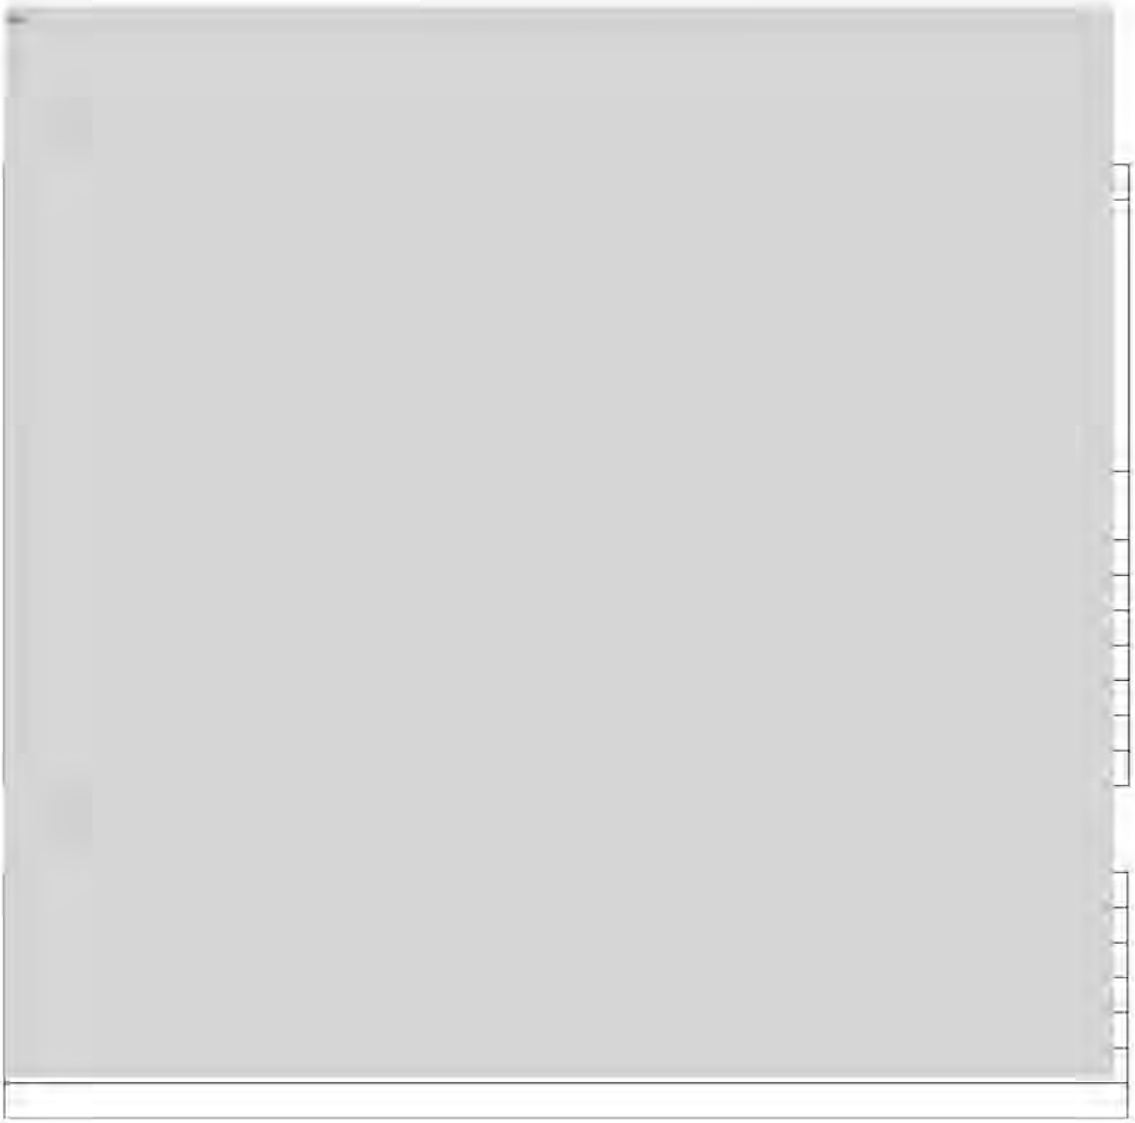

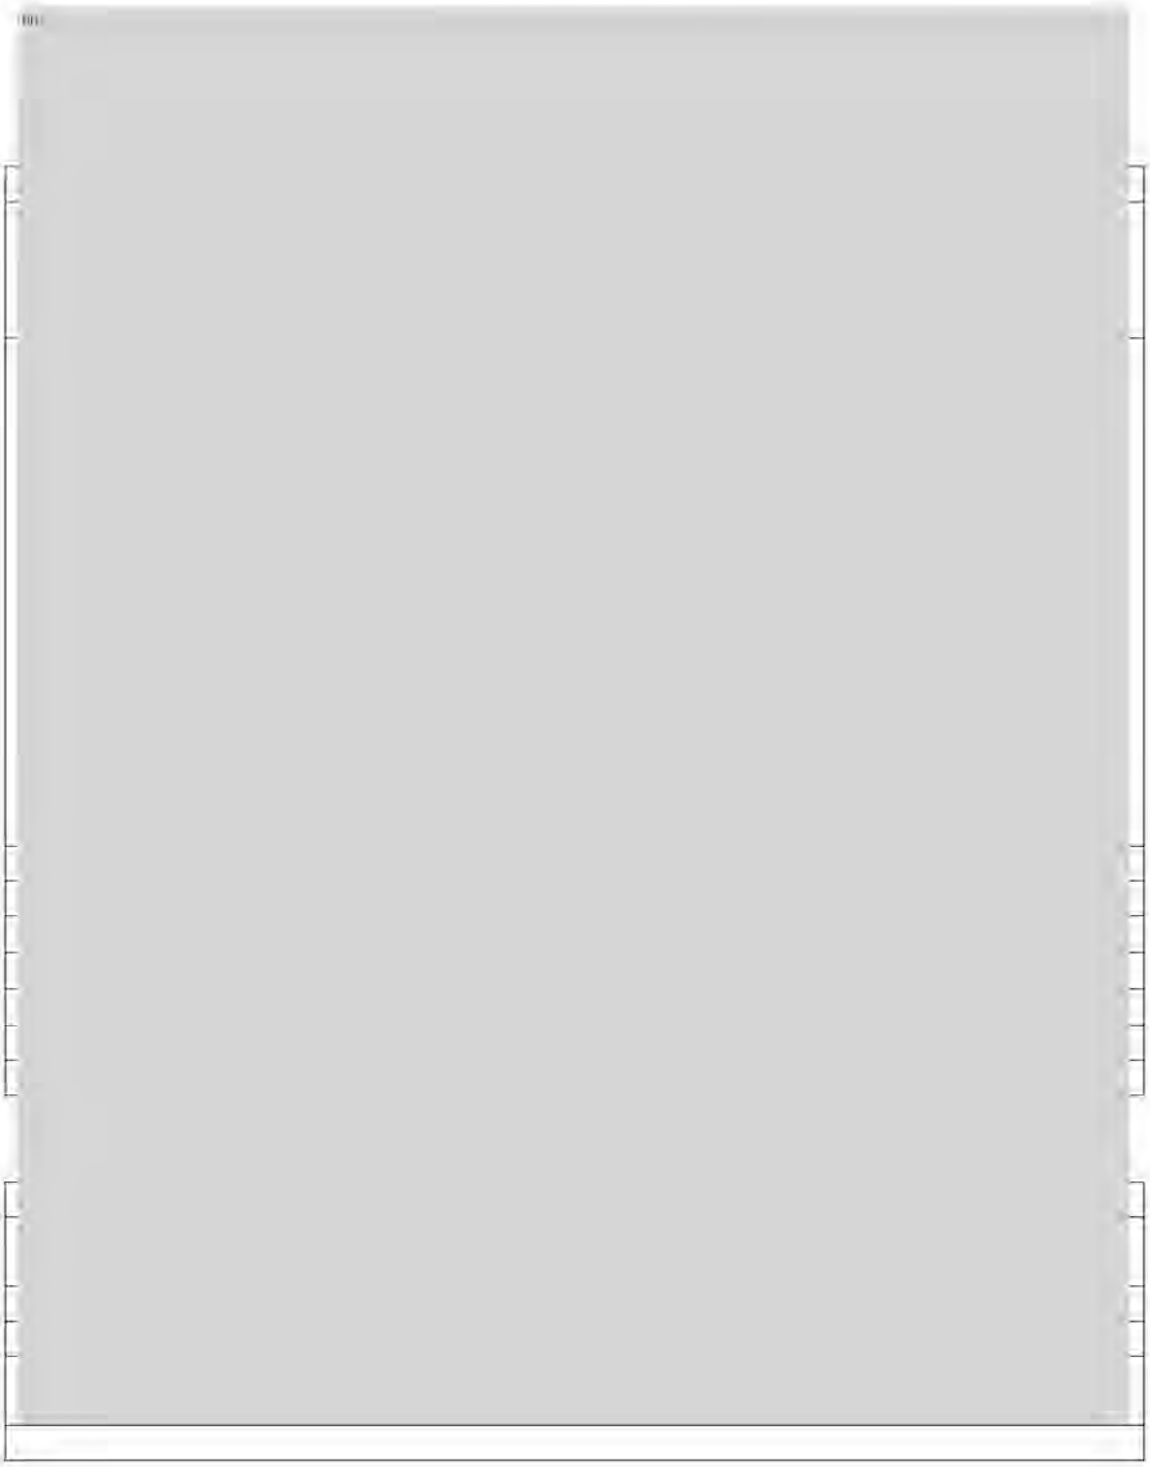

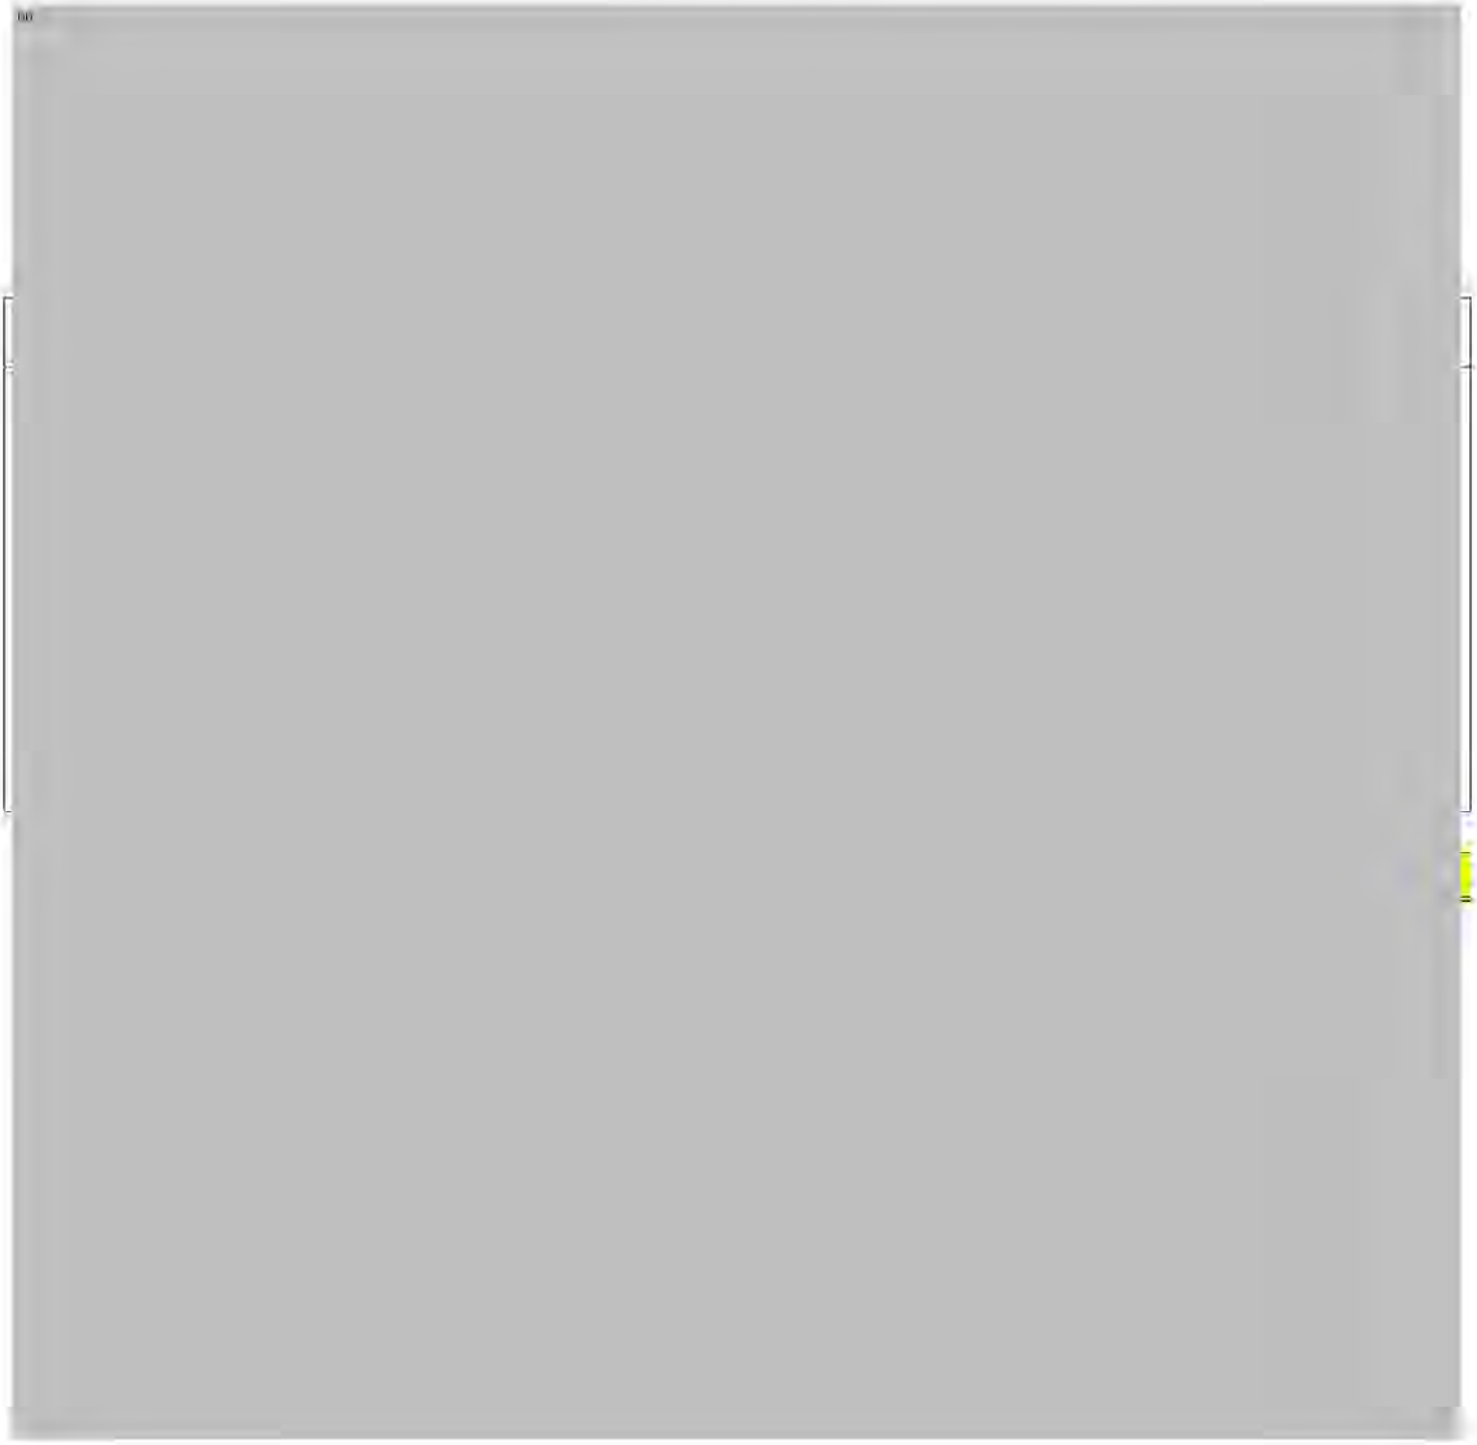

| | | |
|---|---|---|
| | | |

In deze raming is geen rekening gehouden met het Molenvlietpark en de waterberging in de Vlietzone. Hier dient nog bestuurlijke besluitvorming over plaats te vinden (verwacht in kwartaal 1-2015).

Conclusie

Het project Rotterdamsebaan kent een dekkende begroting. Eventuele toevoegingen aan de scope (Molenvlietpark en waterberging in de Vlietzone) dienen nog bestuurlijk te worden bekrachtigd, inclusief de daarvoor benodigde financiële middelen.

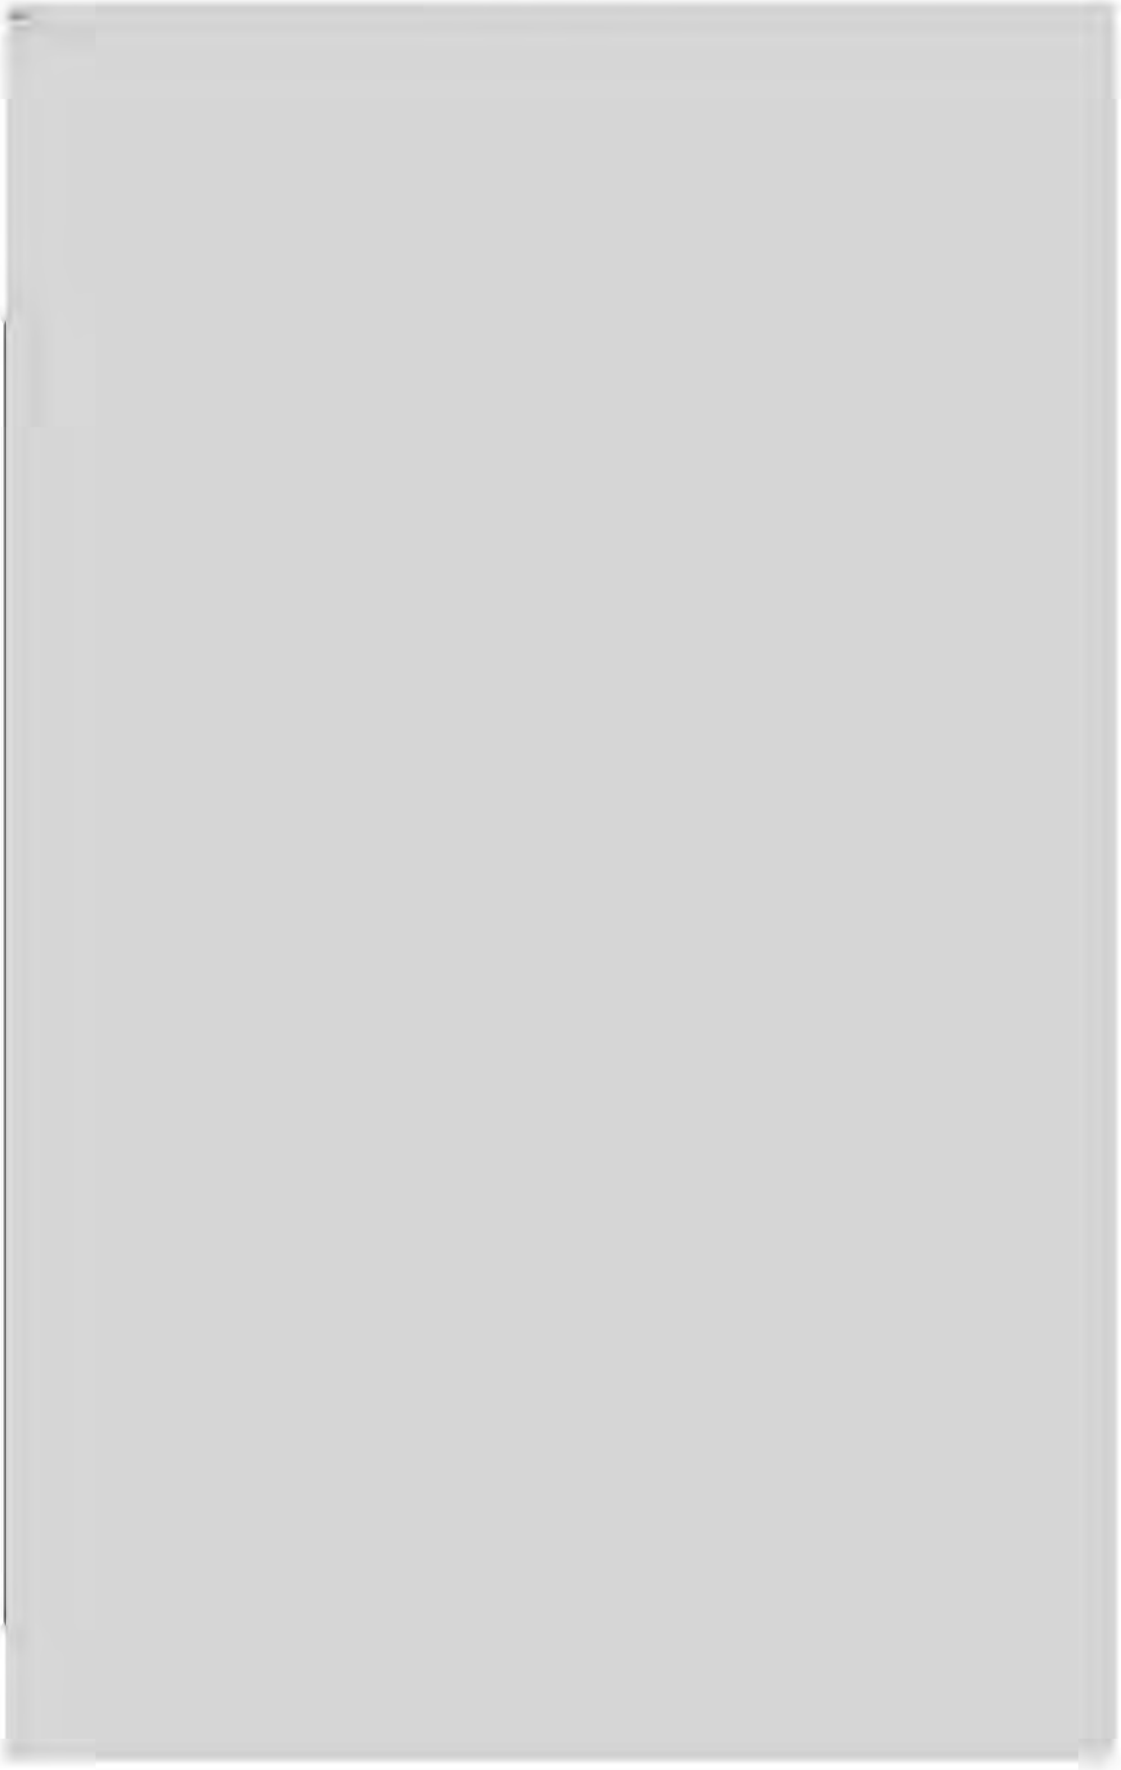

Molenvlietpark en waterberging Vlietzone

Bij deze dekkingsmiddelen is geen rekening gehouden met het Molenvlietpark en de waterberging in de Vlietzone. Hier dient nog bestuurlijke besluitvorming over plaats te vinden.

# 17. Risicobeheer

## 17.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| | |
| Inventariseren & kwantificeren risico's Molenvlietpark inclusief calamiteitenberging. | Uitgevoerd |
| | |
| | |
| | |

## 17.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Opstellen financieel risicoprofiel, inclusief Molenvlietpark en de geactualiseerde vastgoedraming (begin eerste kwartaal 2015). |
| |
| |
| |
| **Besluiten** |
| Vaststellen financieel risicoprofiel, inclusief Molenvlietpark en de geactualiseerde vastgoedraming. |
| |
| |

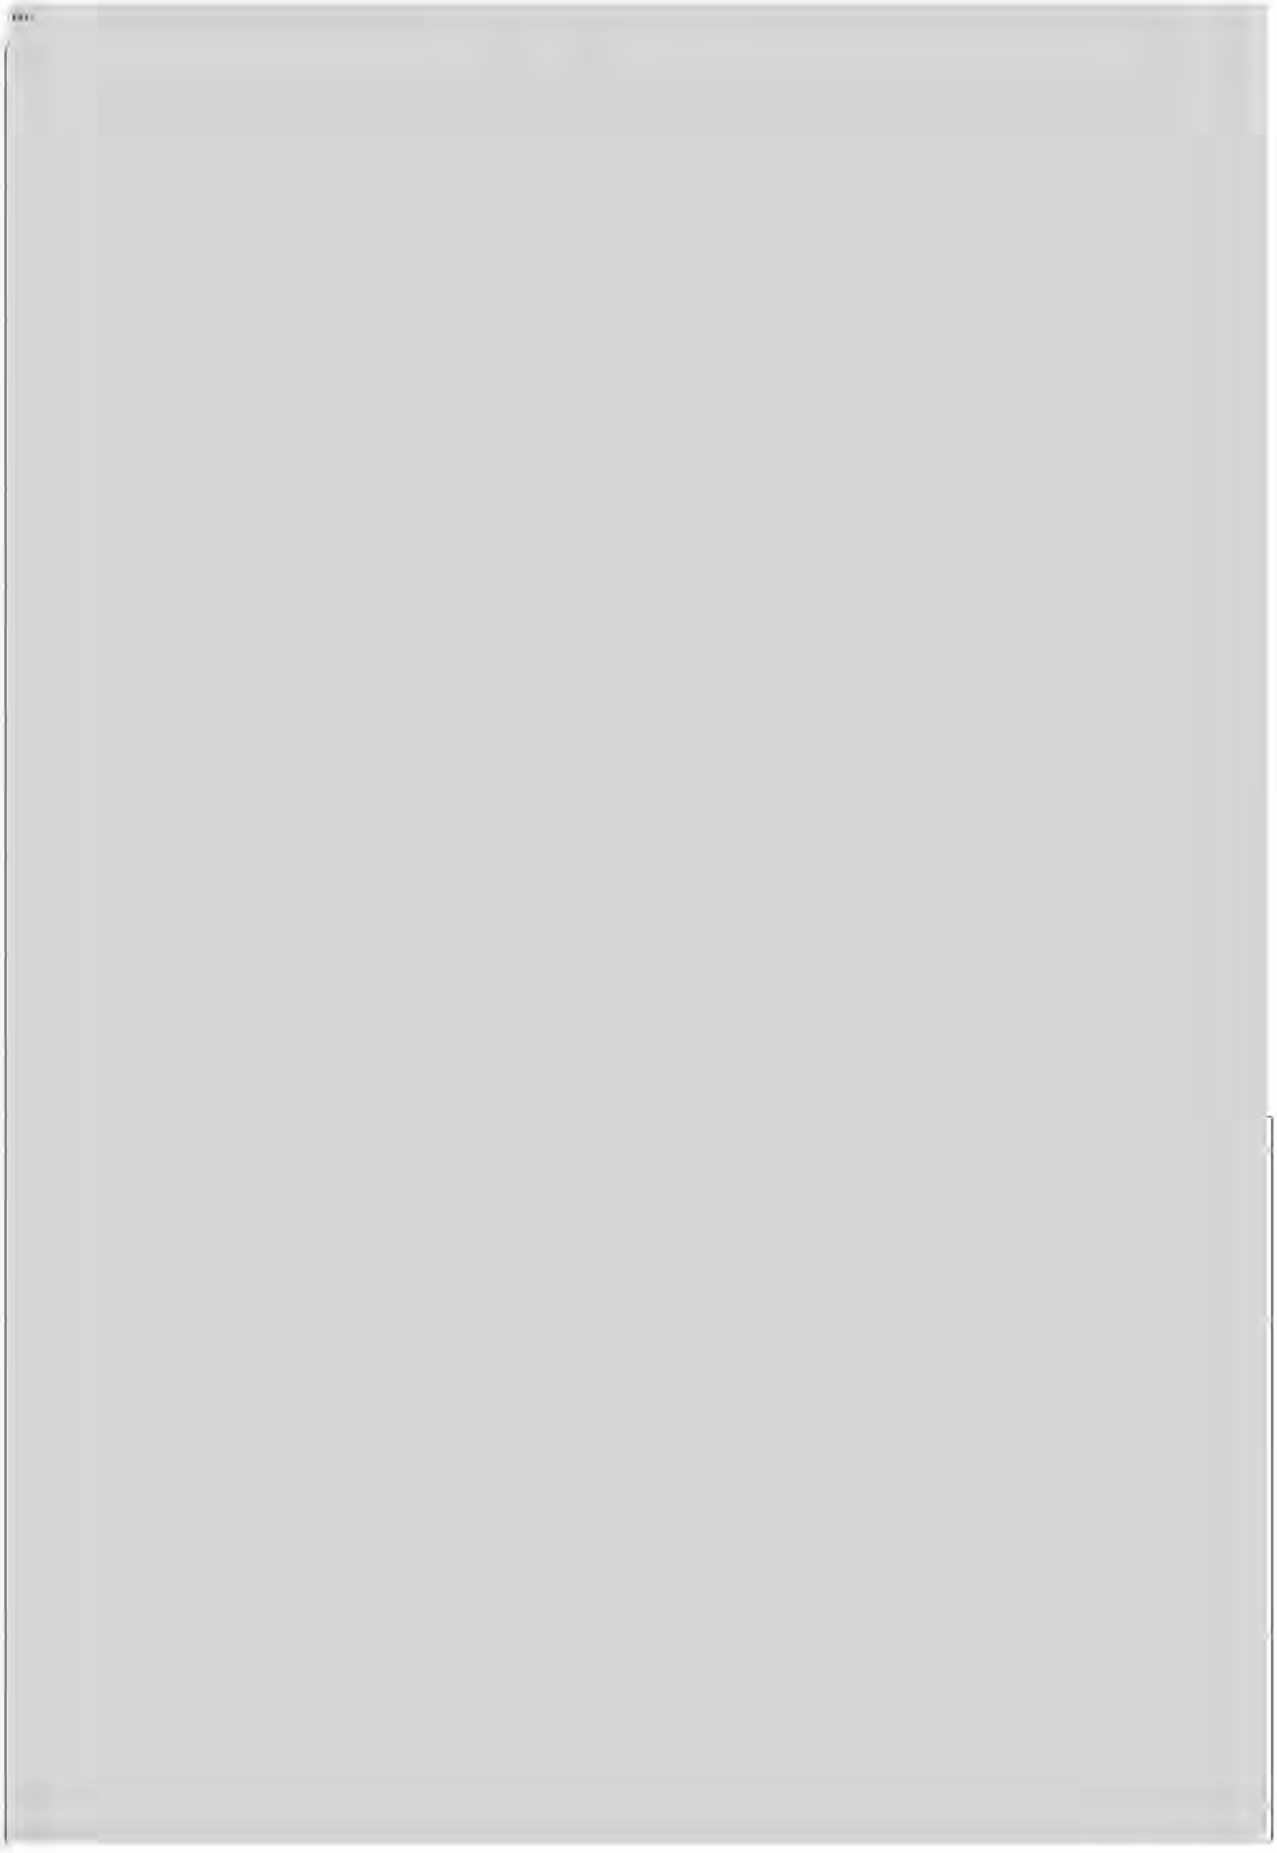

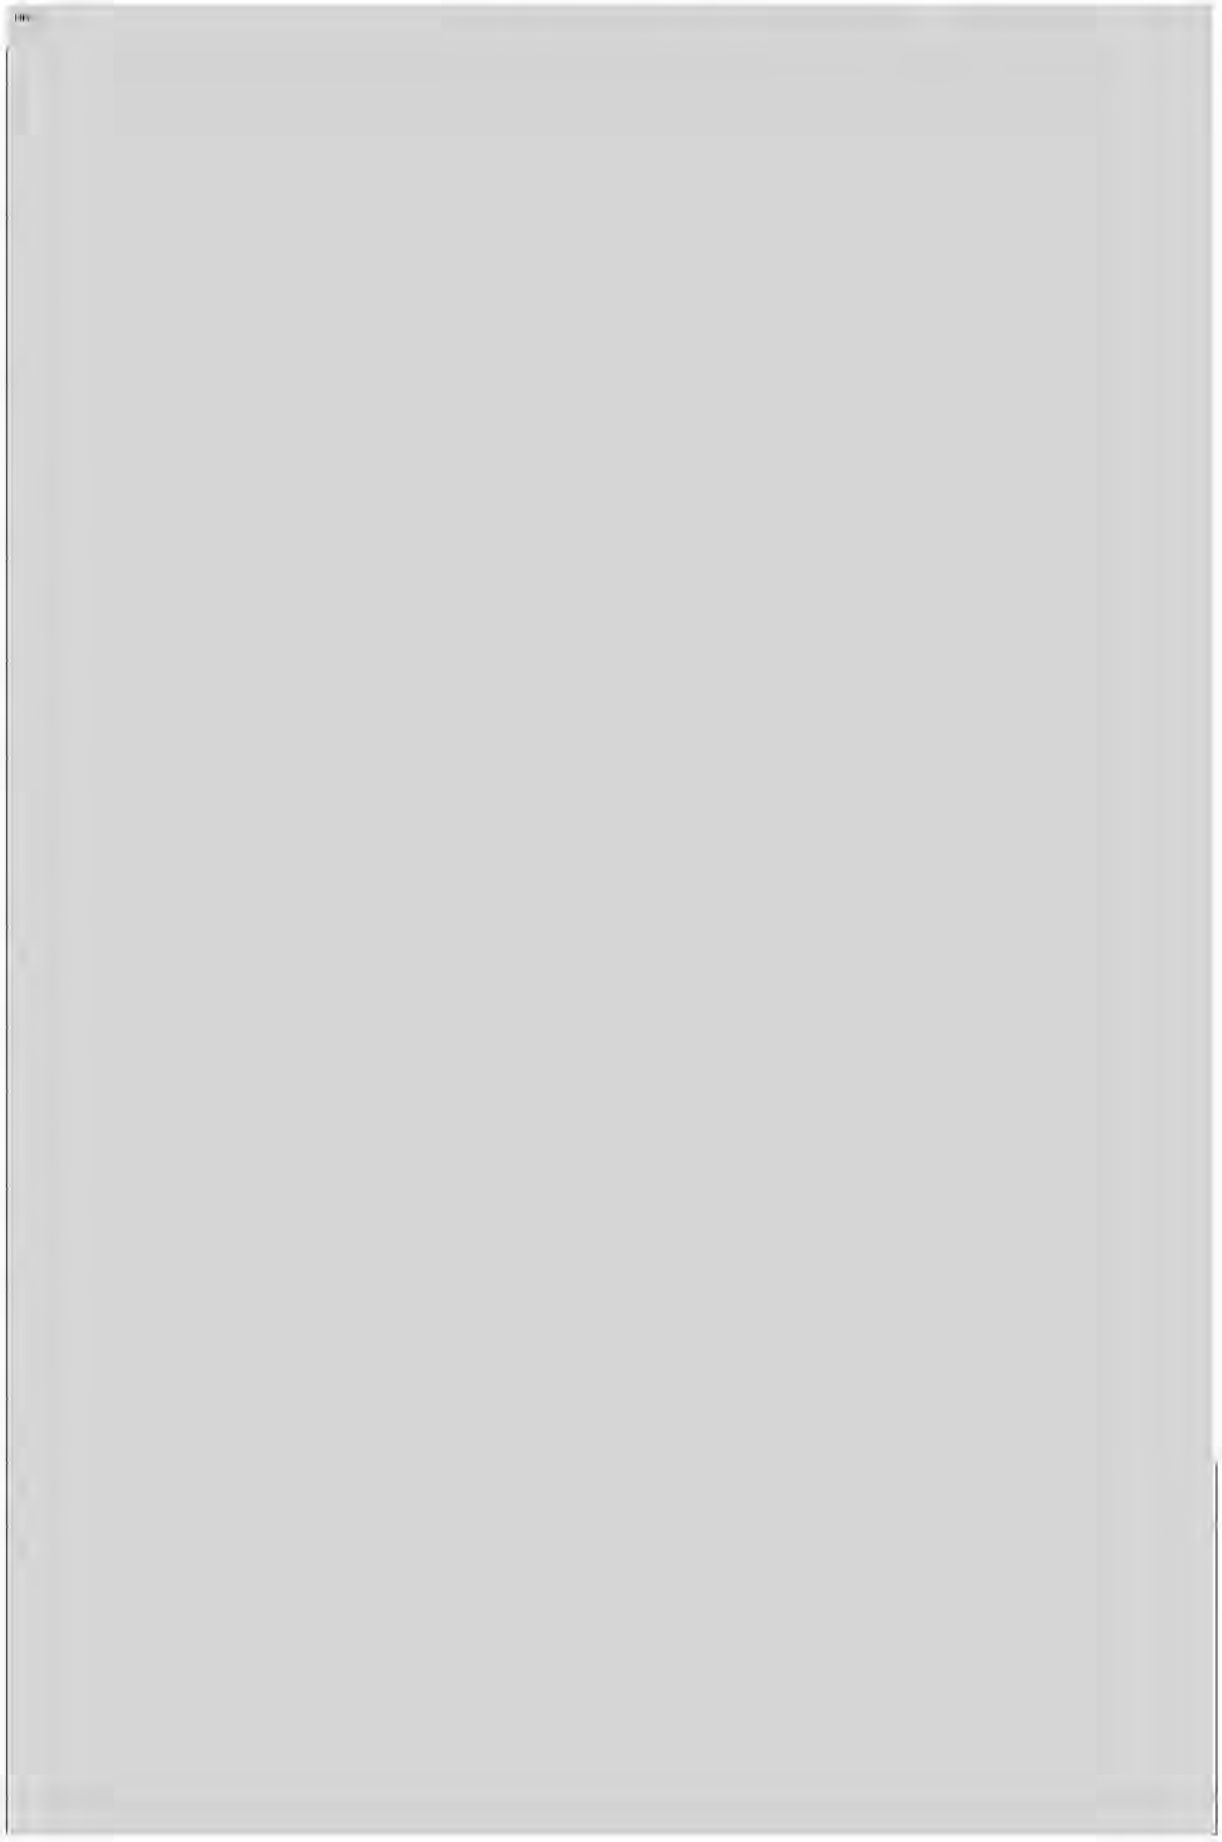

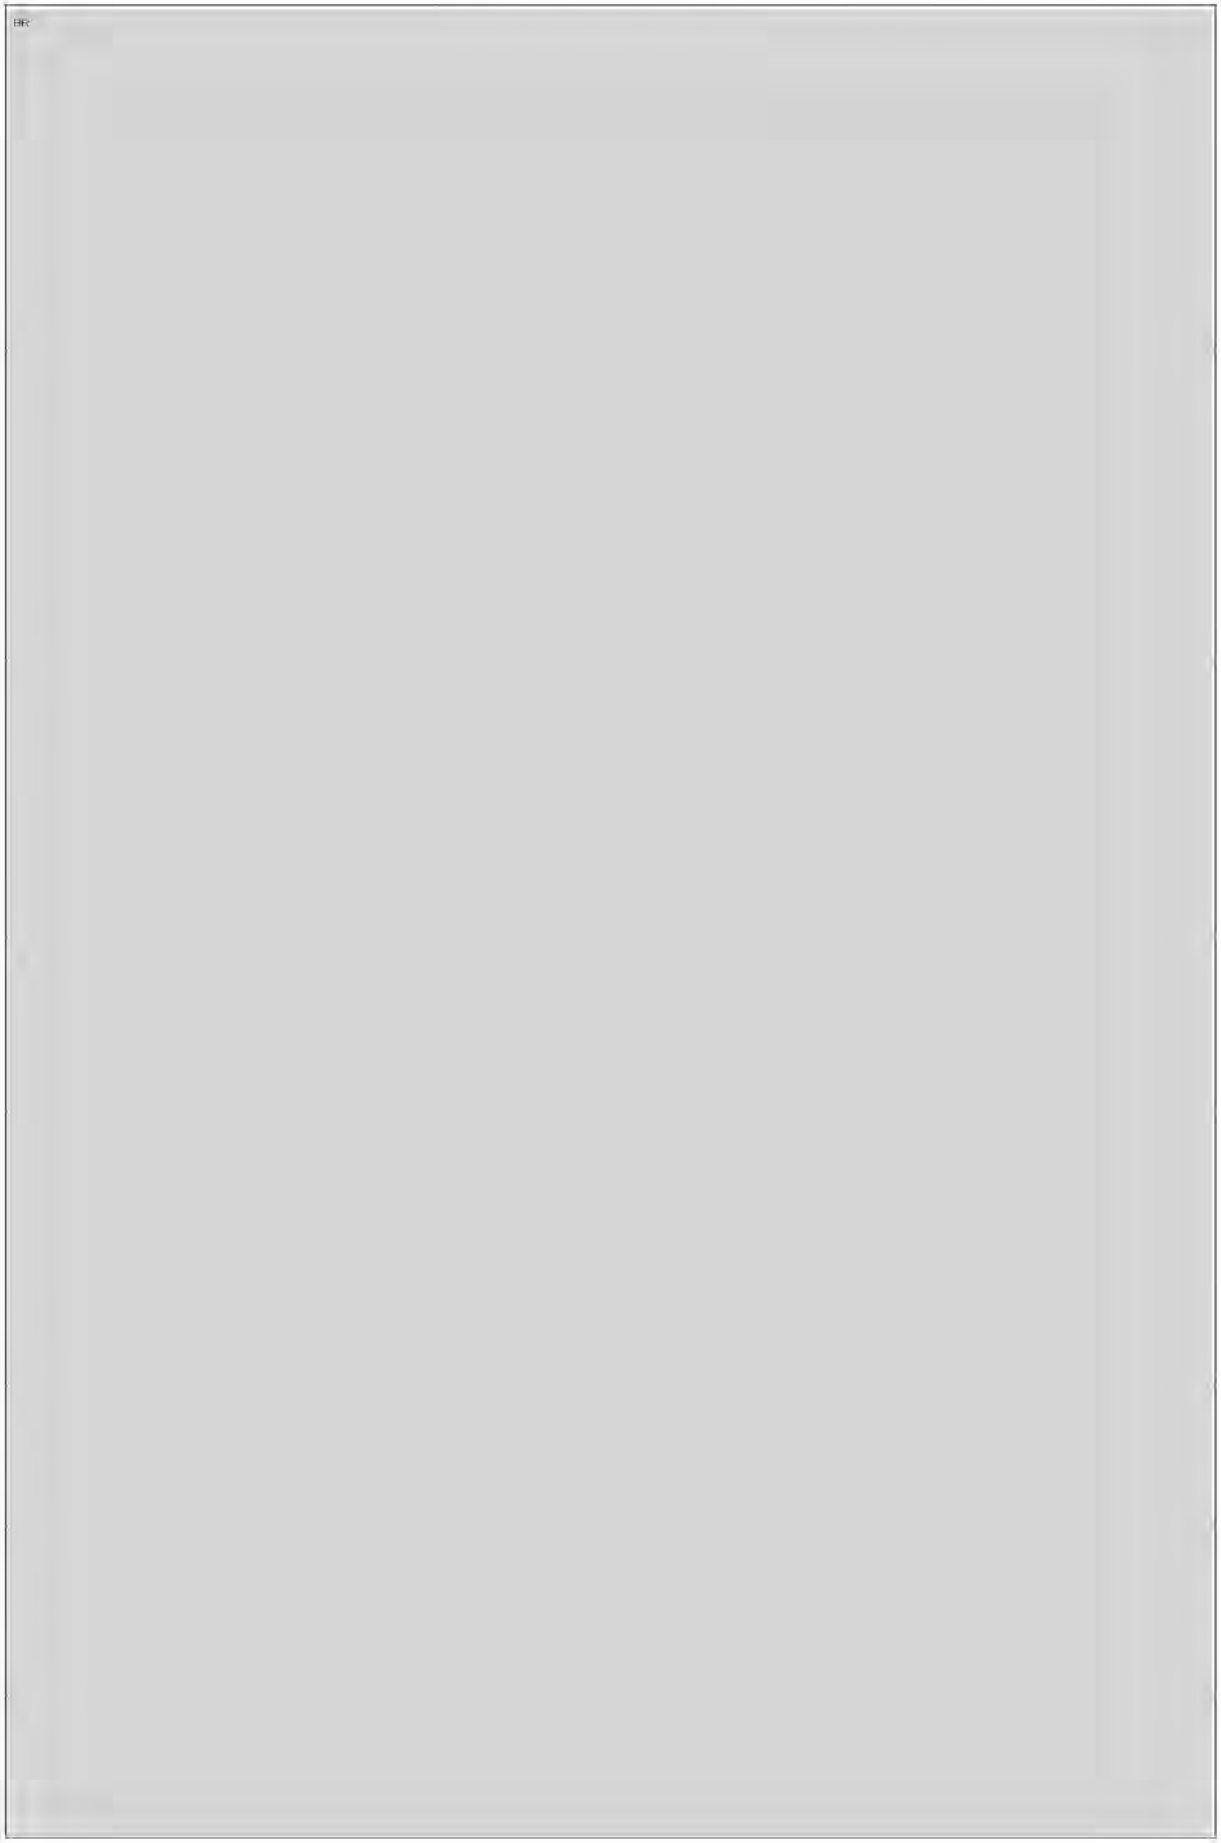

# 18. Planning

## 18.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| | |
| De planning 'Vlietzone' is tijdens de uitwerking uitgebreid tot de planning 'Rotterdamsebaan Zuid', inclusief het Molenvlietpark, de Laan van Hoornwijck en knooppunt Ypenburg inclusief een uitgangspuntennotitie. Deze planning is vervolgens gebruikt bij de uitvoering van een onzekerheidsanalyse op dit deel van de planning. De resultaten uit de analyse zijn gebruikt bij het bepalen van de data waarop de hoofdaannemer er vanuit kan gaan dat werkterreinen beschikbaar komen. Deze mijlpaaldata zijn vervolgens met onzekerheidsmarge in de aanbestedingsstukken opgenomen. | Eind december zijn er nadere/herziene documenten vrijgegeven ten behoeve van het aanbestedingsproces. De mijlpaaldata inclusief onzekerheidsmarges van afgelopen september zijn tegen het licht gehouden (voortgang voorbereidende werkzaamheden) en opnieuw afgegeven. |
| | |

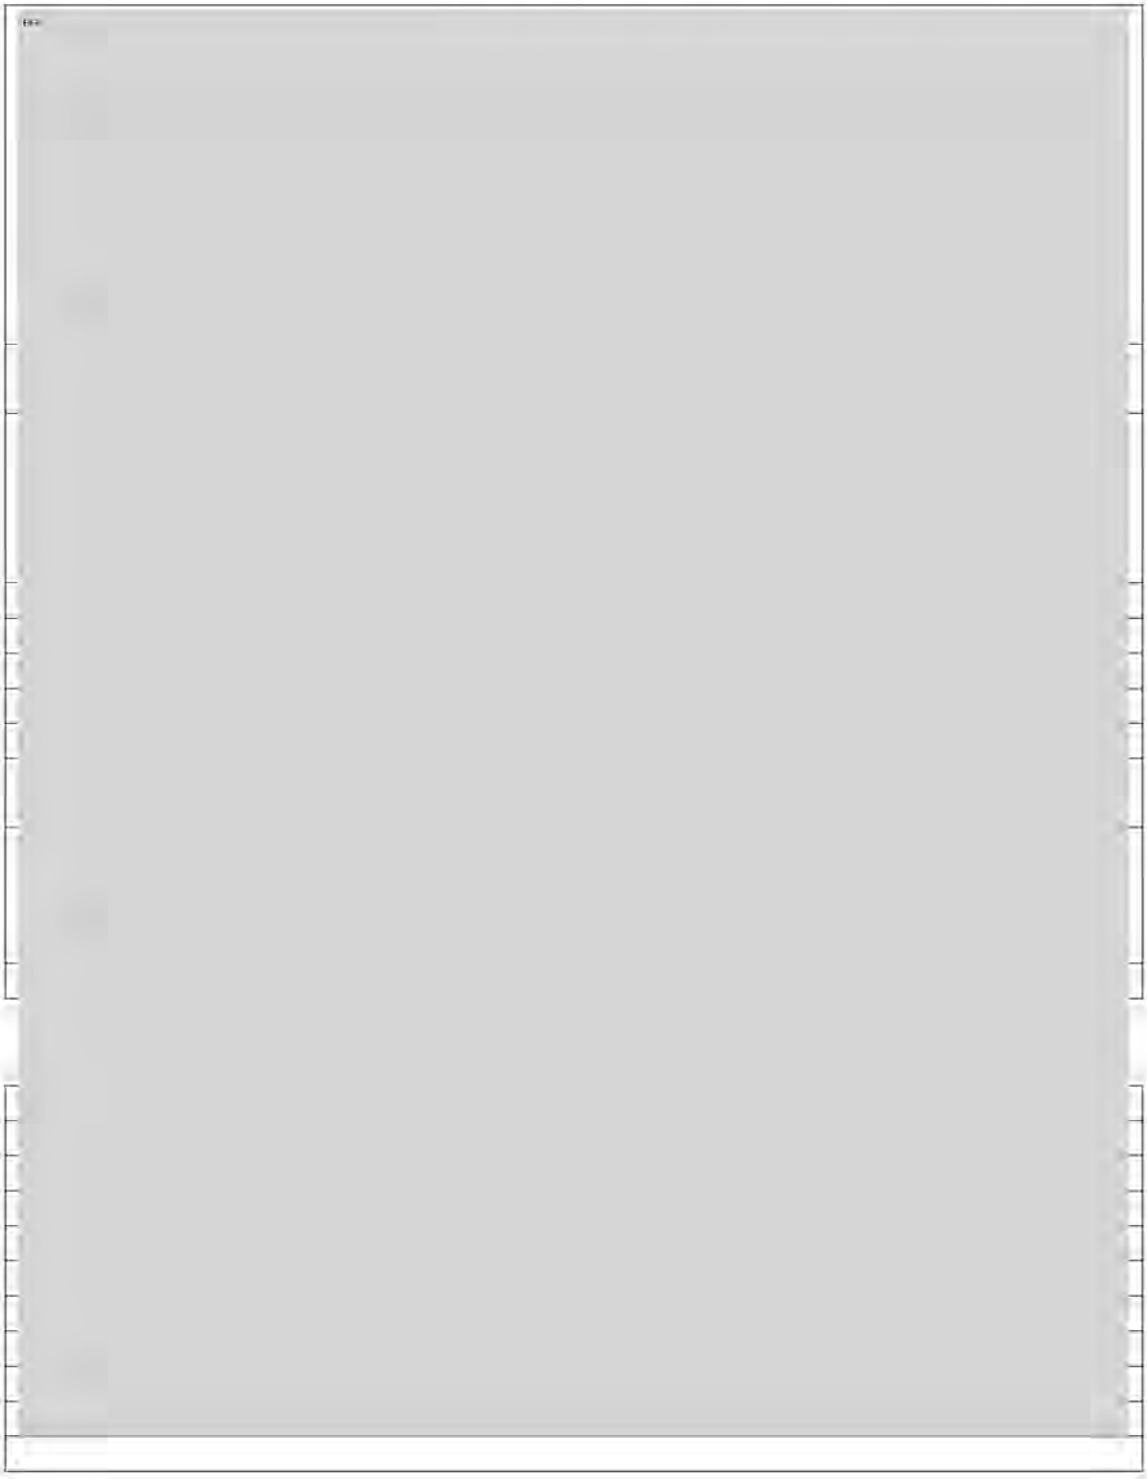

# 19. Scopemanagement

## 19.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Afronden Verzoek tot Wijziging (VtW) 4 Scopewijziging t.a.v. het toevoegen van het Molenvlietpark. | Besluitvorming plan Molenvlietpark heeft op 16 december in het college plaatsgevonden, voorstel wordt in januari/februari in de raad behandeld. Vervolgens wordt de VtW formeel vastgesteld. |
| BR | |

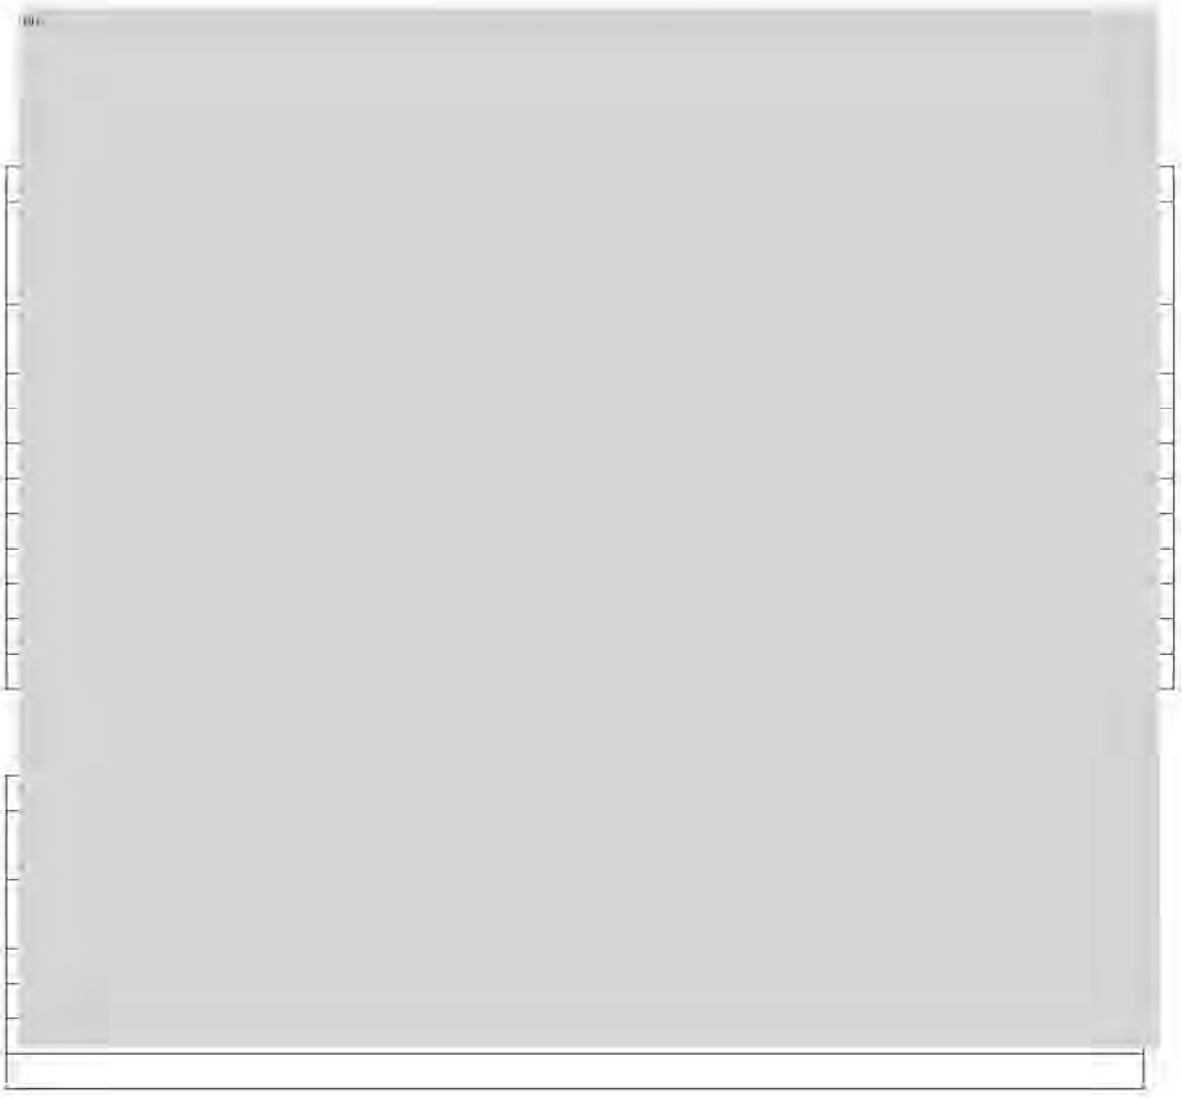

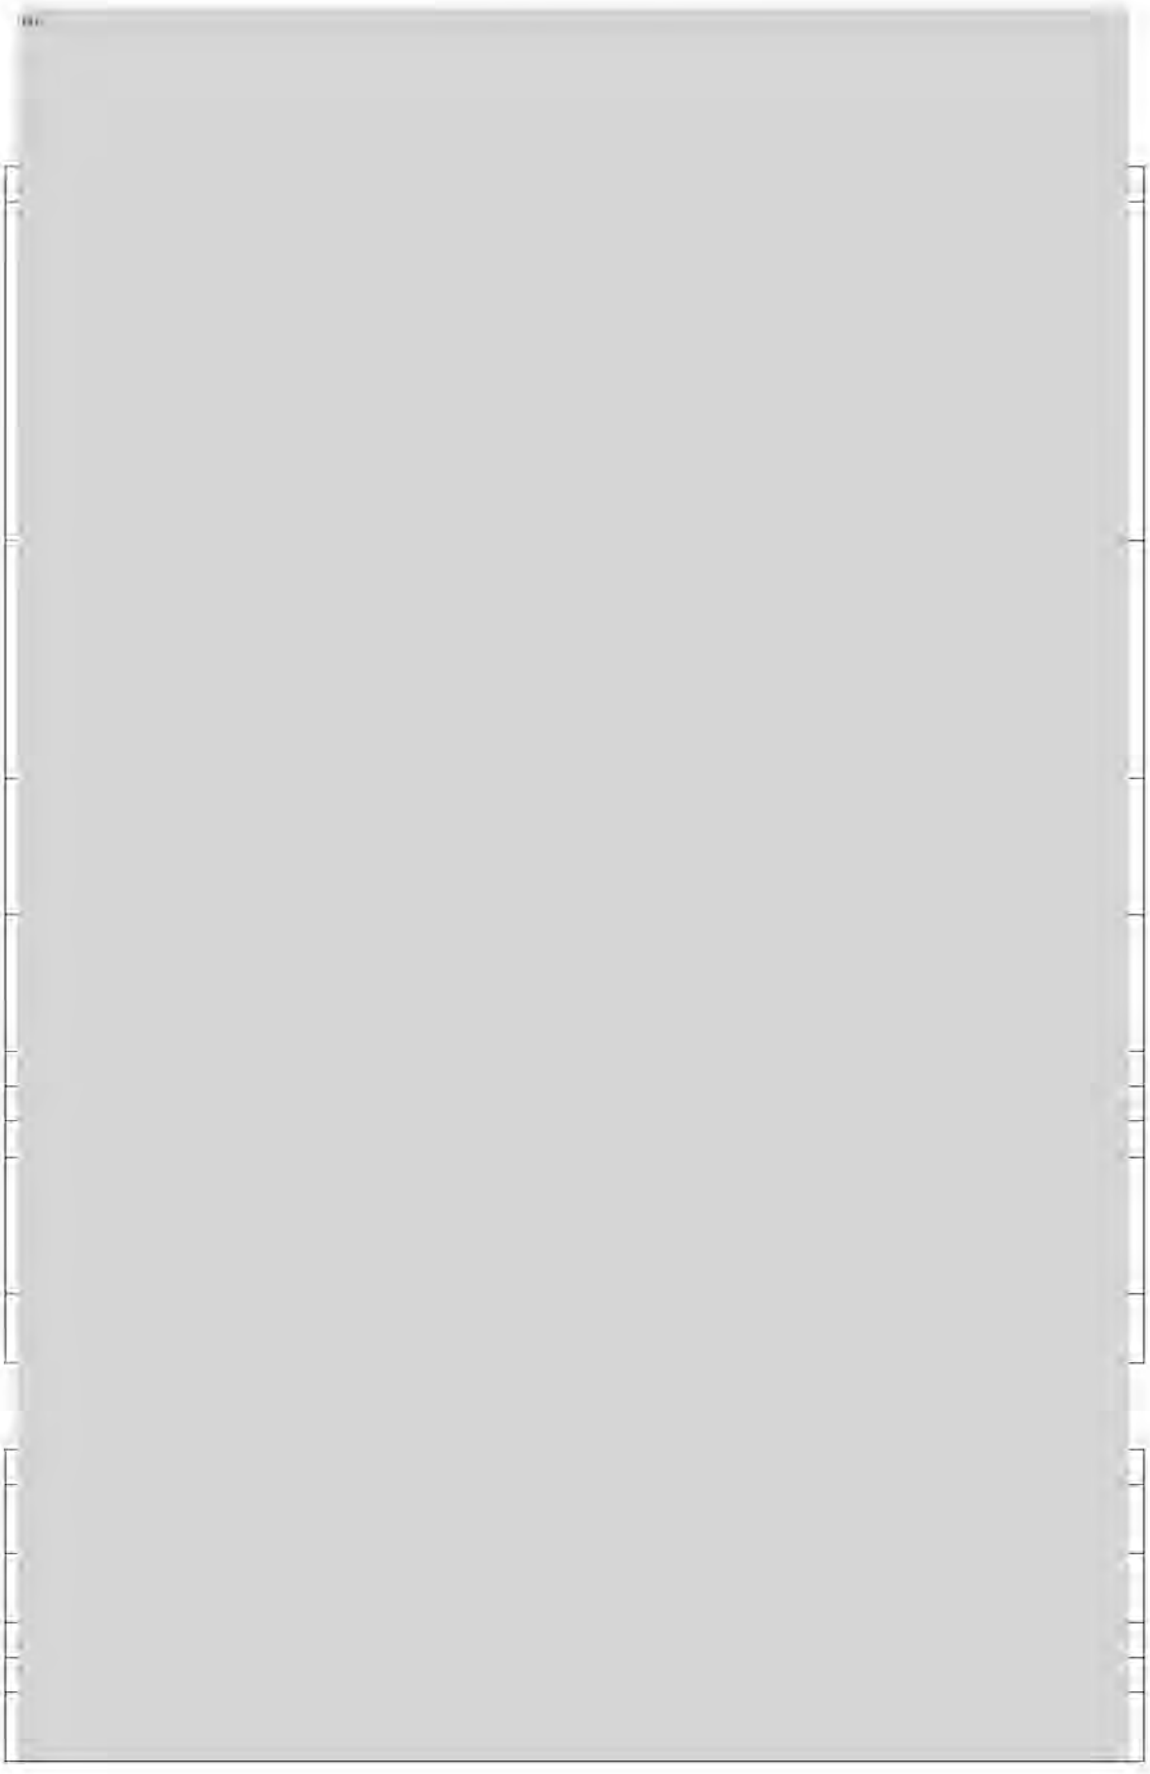

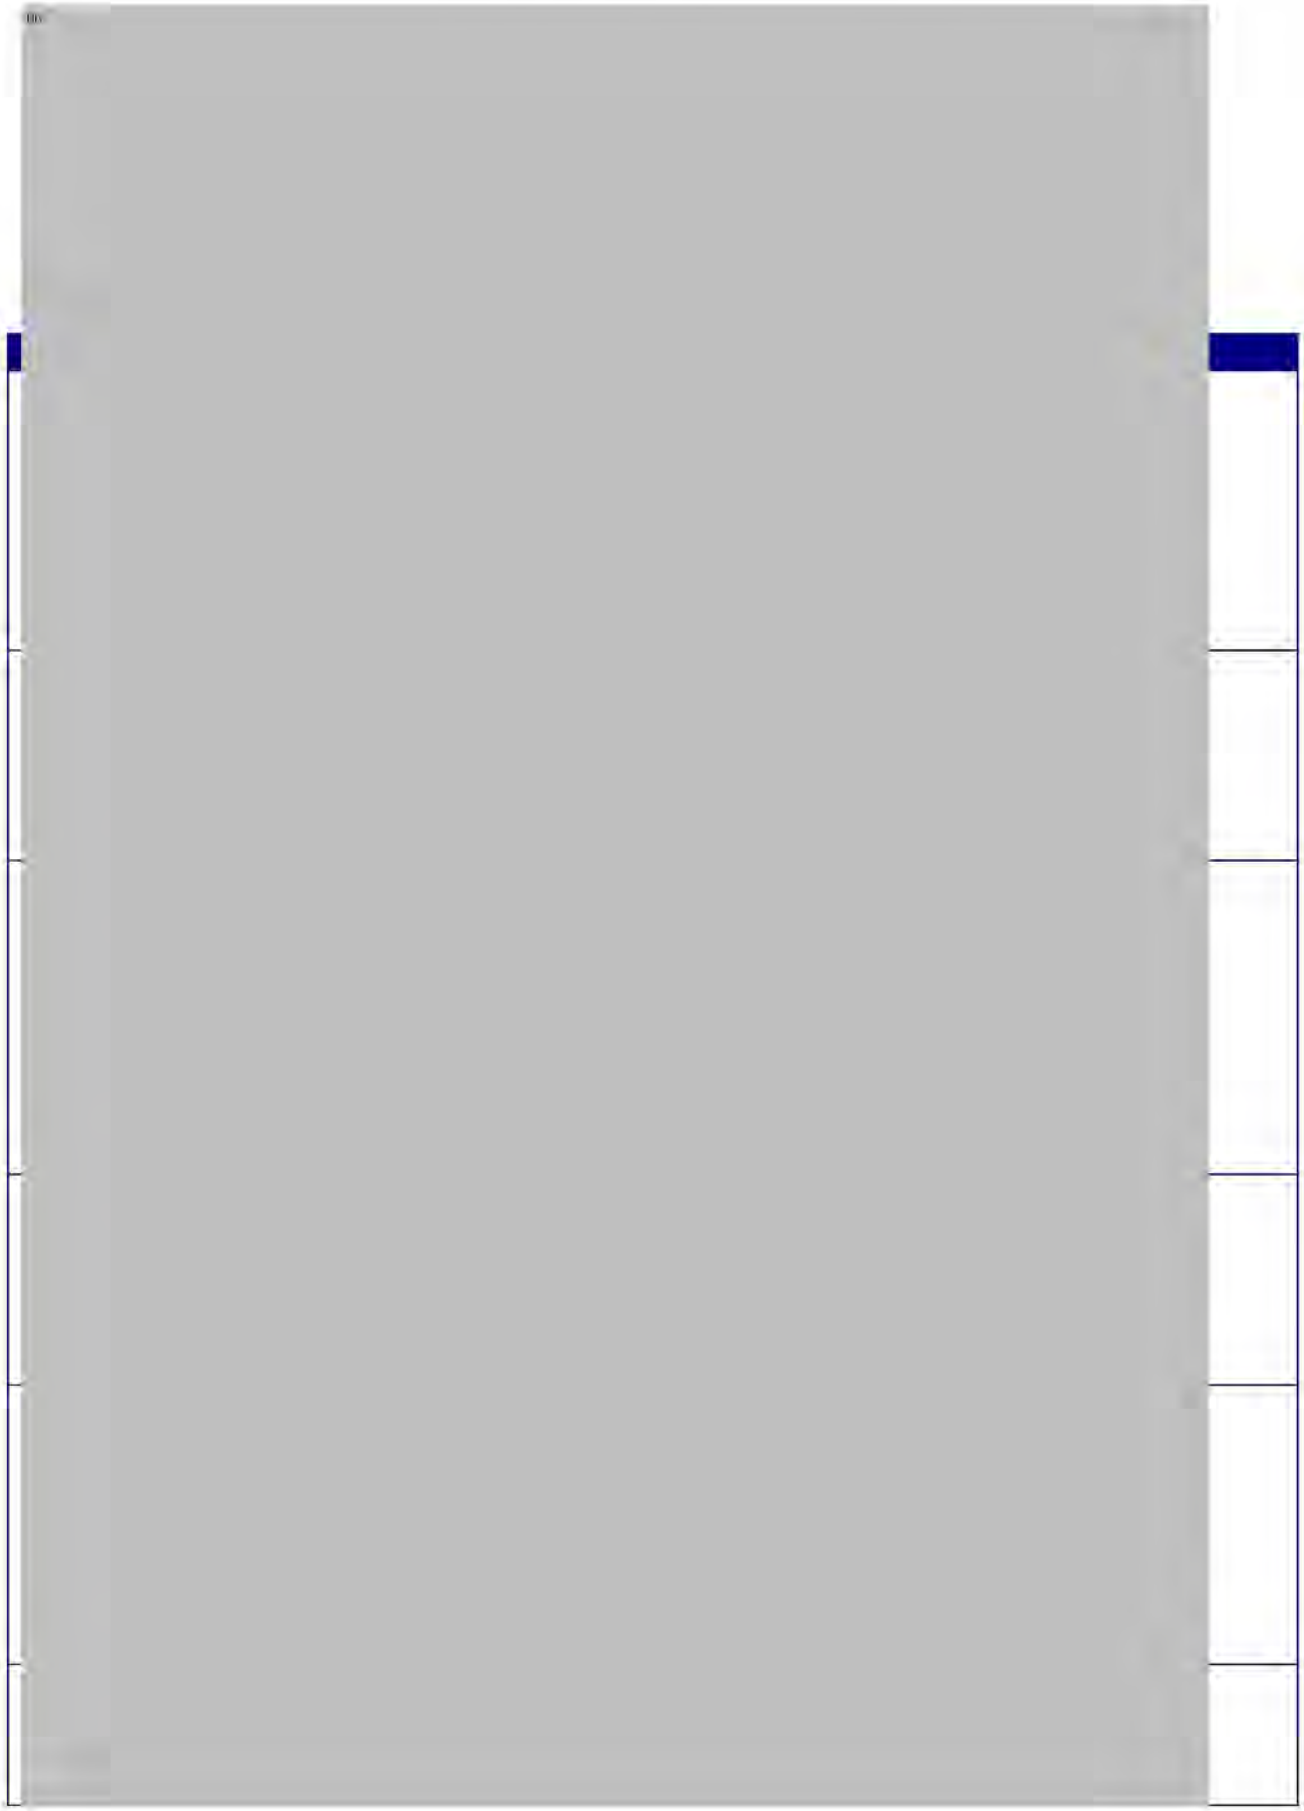

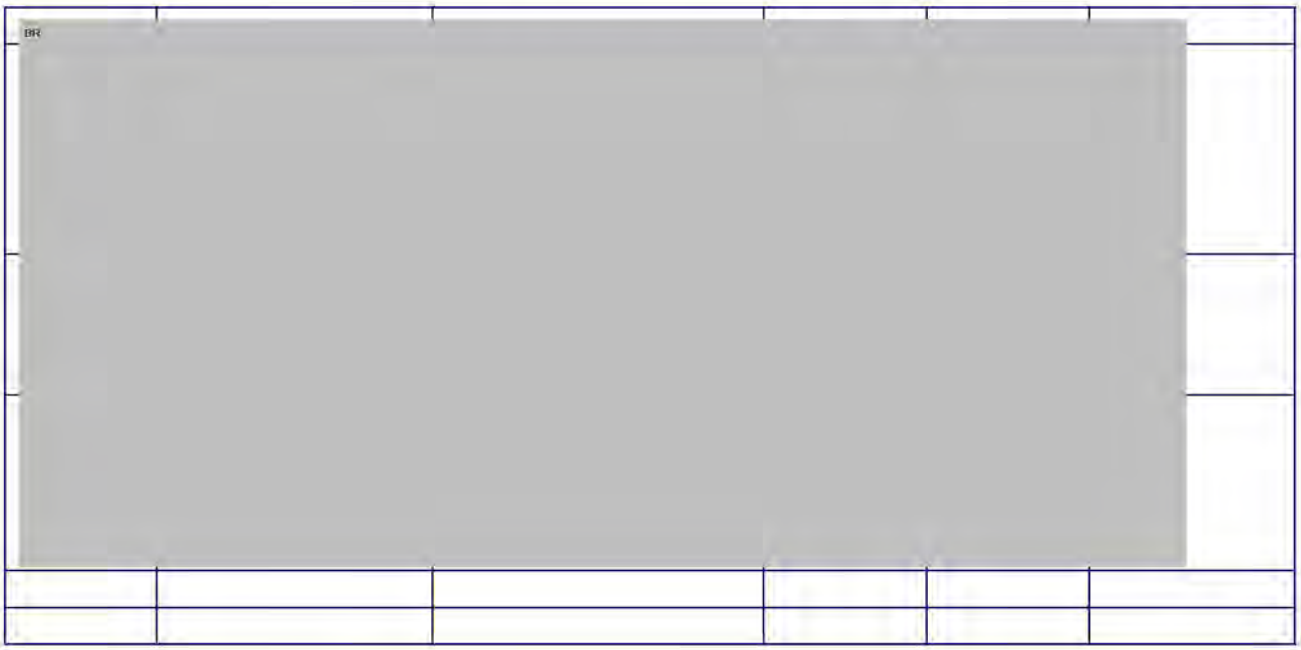

Docnr6

Dienst Stadsbeheer
Afdeling Opdrachtgeving

# Rotterdamsebaan

## Voortgangsrapportage

## 1e kwartaal 2015

**Datum: 4 juni 2015**
**Vertrouwelijk**
**Versie: 3.0**

**Kenmerken en gegevens t.b.v. subsidieverleners:**
Kenmerk en datum subsidie ministerie: IENM/BSK-2013/79475, 4 juni 2013
Kenmerk en datum subsidie Haaglanden: SH13.8997, 9 oktober 2013

| **Opgesteld:** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|
| d.d.: 17 april 2015 | d.d.: 20 april 2015 | d.d.: 22 april 2015 | d.d.: 3 juni 2015 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Directeur Dienst Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever Rotterdamsebaan | Dhr. B. Revis, wethouder Verkeer, Binckhorst en Vlietzone / Portefeuillehouder Rotterdamsebaan |

# Inhoudsopgave

**1. Inleiding ..... 5**
**2. Planstudies ..... 7**
2.1 Afgelopen kwartaal ..... 7
2.2 Komende kwartaal ..... 7
**3. Omgevingsmanagement ..... 8**
3.1 Afgelopen kwartaal ..... 8
3.2 Komend kwartaal ..... 9
**4. Verwerving ..... 10**
4.1 Afgelopen kwartaal ..... 10
4.2 Komende kwartaal ..... 10
**5. Vergunningen en overeenkomsten ..... 11**
5.1 Afgelopen kwartaal ..... 11
5.2 Komende kwartaal ..... 11
**6. Conditionering Binckhorstlaan ..... 12**
6.1 Afgelopen kwartaal ..... 12
6.2 Komende kwartaal ..... 12
**7. Conditionering Vlietzone ..... 13**
7.1 Afgelopen kwartaal ..... 13
7.2 Komende kwartaal ..... 13
**8. Voorbereiding t.b.v. hoofdcontract ..... 14**
8.1 Afgelopen kwartaal ..... 14
8.2 Komende kwartaal ..... 15
**9. Spoorboogweg, Regulusweg, Verlengde Mercuriusweg/Mercuriusweg-Oost en Verlengde-Melkwegstraat ..... 16**
9.1 Afgelopen kwartaal ..... 16
9.2 Komende kwartaal ..... 16
**10. Tunnelveiligheid ..... 17**
10.1 Afgelopen kwartaal ..... 17
10.2 Komend kwartaal ..... 17
**11. Aanbesteding hoofdcontract ..... 18**
11.1 Afgelopen kwartaal ..... 18
11.2 Komende kwartaal ..... 19
**12. Aanbesteding nevencontracten ..... 20**
12.1 Afgelopen kwartaal ..... 20
12.2 Komende kwartaal ..... 20
**13. Communicatie ..... 21**
13.1 Afgelopen kwartaal ..... 21
13.2 Komende kwartaal ..... 22
**14. Beheer en overdracht ..... 23**
14.1 Afgelopen kwartaal ..... 23
14.2 Komend kwartaal ..... 23
**15. Organisatie ..... 24**
15.1 Afgelopen kwartaal ..... 24
15.2 Komend kwartaal ..... 24
**16. Financiën ..... 25**
16.1 Kostenstructuur ..... 25

16.2 Dekkingen....26
**17. Risicobeheer....29**
17.1 Afgelopen kwartaal....29
17.2 Komende kwartaal....29
17.3 Financiële toprisico's....30
17.4 Toprisico's planning....31
**18. Planning....34**
18.1 Afgelopen kwartaal....34
18.2 Komende kwartaal....34
**19. Scopemanagement....35**
19.1 Afgelopen kwartaal....35
19.2 Komende kwartaal....35
**20. Kwaliteitsbeheer....36**
20.1 Afgelopen kwartaal....36
20.2 Komende kwartaal....36
**21. Informatiebeheer....37**
21.1 Afgelopen kwartaal....37
21.2 Komend kwartaal....37
**Bijlage 1: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan....38**
**Bijlage 2: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer....40**

# 1. Inleiding

[redacted]

- Op 5 maart heeft de gemeenteraad het Voorlopig Ontwerp en dekkingsvoorstel Molenvlietpark vastgesteld t.b.v. de inpassing van de Rotterdamsebaan in de Vlietzone en de calamiteitenberging op verzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland. De scope van de Rotterdamsebaan is hiermee uitgebreid. Op 11 maart 2015 is de samenwerkingsovereenkomst met het Hoogheemraadschap van Delfland door partijen ondertekend;

[redacted]

**Risico's**
In januari is de vastgoedraming geactualiseerd, waarbij ook de aanleg van het Molenvlietpark is opgenomen. De berekende haalbaarheid van het projectbudget is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande rapportage en valt in de categorie 50%-60%.

**Bestuurlijke besluitvorming**
In 2015 zal een aantal bestuurlijke besluiten worden genomen:

- Collegebesluit: vrijgeven voor inspraak van het concept-bestemmingsplan Molenvlietpark (voor het zomerreces 2015);
- Raadsbesluit bestemmingsplan Molenvlietpark (najaar 2015);

**Financiën**
Conform de huidige inzichten bevindt het project zich binnen het gestelde budget. Het uitvoeringsbudget is per 31-03-2015 op € 640,8 mln. te stellen (was: € 635,4 mln.) Het budget is per saldo met € 5,4 mln. toegenomen nadat in het eerste kwartaal 2015 bestuurlijke besluitvorming heeft plaats gevonden inzake Molenvlietpark en waterberging Vlietzone.
Per 31-03-2015 is er voor € 72,39 mln. (was: € 67,32 mln.) aan verplichtingen aangegaan.

# 2. Planstudies

## 2.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| Opstellen bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. en in procedure brengen |
| |
| |
| **Besluiten** |
| Collegebesluit: vrijgave bestemmingsplan Molenvlietpark voor inspraak |
| |

# 3. Omgevingsmanagement

## 3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het VO en de dekking van de kosten voor het Molenvlietpark vindt ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats en zal een omgevingsvergunning strijdig gebruik worden aangevraagd en in procedure worden gebracht om de aanleg van het Molenvlietpark planologisch mogelijk te maken | De gemeenteraad heeft op 5 maart 2015 het Voorlopig Ontwerp Molenvlietpark behandeld en ingestemd met de uitbreiding van de scope Roba met de verdere uitwerking en uitvoering van het Molenvlietpark. Tevens is aan het college de opdracht verstrekt om met de provincie de mogelijkheden te onderzoeken om extra kwaliteitsimpuls financieel mogelijk te maken.<br>Op 11 maart 2015 is de samenwerkingsovereenkomst met Hoogheemraadschap Delfland door partijen ondertekend. |
| Parallel aan de procedure vaststelling Molenvlietpark worden onderhandelingen gevoerd met de grondeigenaren om conform het programma van eisen de inlaat naar de waterberging te kunnen realiseren. | Op 11 maart 2015 is principe overeenstemming bereikt met 5.1.2.e 5.1.2.e om de inlaat op zijn gronden te kunnen realiseren. De overeenstemming moet nu in een overeenkomst (met HHD, 5.1.2.e gemeente) worden vastgelegd, die een nauwe relatie kent met de voorgestane ontwikkeling van Nieuw Vredenoord.<br>Met de eigenaar van het belendende perceel vindt overleg plaats om ook hiermee overeenstemming te bereiken.<br>Inmiddels is gestart met opstellen van bestemmingsplan om het Molenvlietpark juridisch planologisch mogelijk te maken (incl. Trekfietstracé) |
| 5.1.2.e | |

| | |
|---|---|
| | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Raadsbesluit inzake VO en dekking Molenvlietpark. | Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad bedoeld besluit genomen. |
| | |

## 3.2 Komend kwartaal

| **Werkzaamheden** |
|---|
| |
| Met de eigenaar van het perceel naast Nieuw Vredenoord ) overeenstemming zien te bereiken over situering Molenvlietpad en waterinlaat. |
| |
| **Besluiten** |
| Collegebesluit bestemmingsplan Molenvlietpark (vrijgave voor inspraak) |

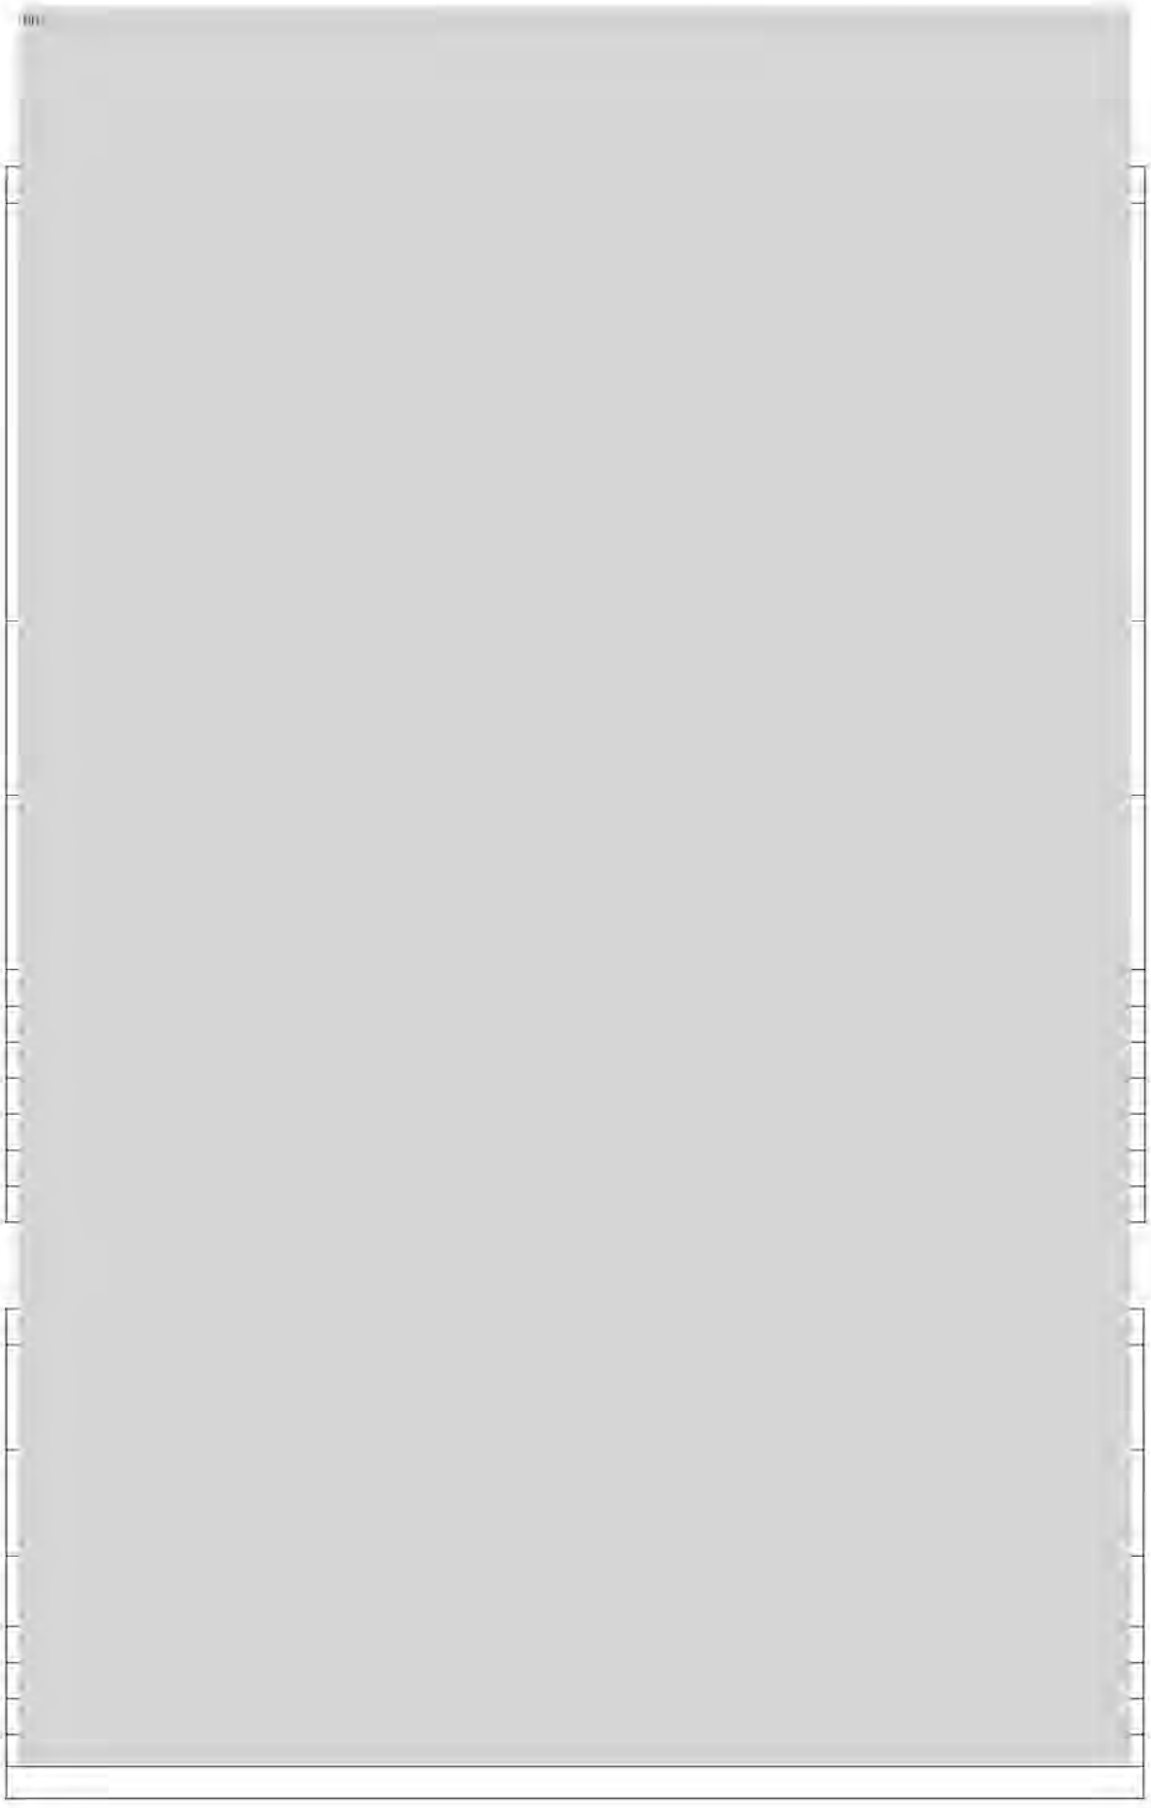

# 5. Vergunningen en overeenkomsten

## 5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Aanvragen van diverse vergunningen namens opdrachtgever: o.a. watervergunning tot wijzigen peil en leggerwijziging, omgevingsvergunning strijdig gebruik Molenvlietpark. | Er vindt regulier overleg plaats met het hoogheemraadschap van Delfland. Er is dit kwartaal vooral veel afstemming geweest over het rapport tot het wijzigen van het peil en de vraagspecificatie. Het is de verwachting dat de watervergunning tot wijzigen peil en leggerwijziging in het begin van het 2e kwartaal zullen worden ingediend. De ontheffing Flora- en faunawet i.v.m. de huismus is verleend. |
| [redacted] | |

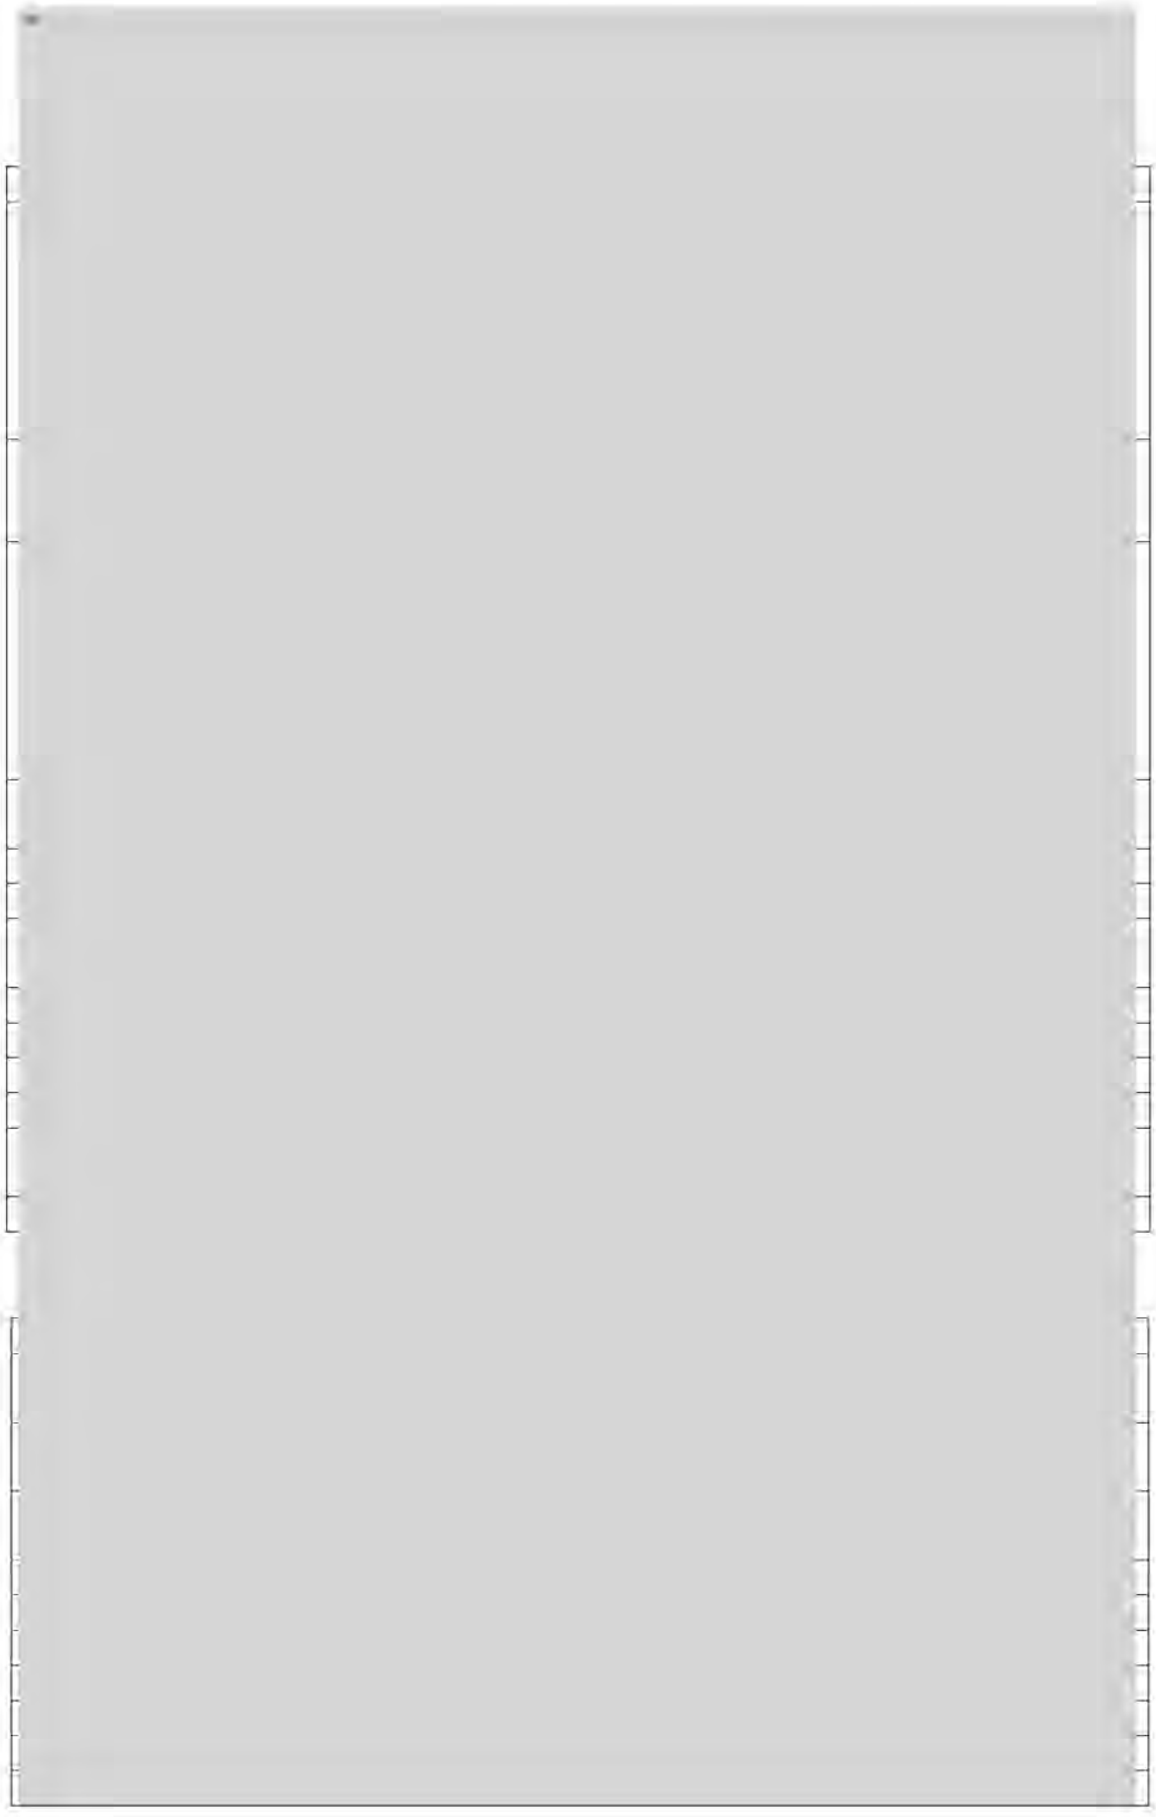

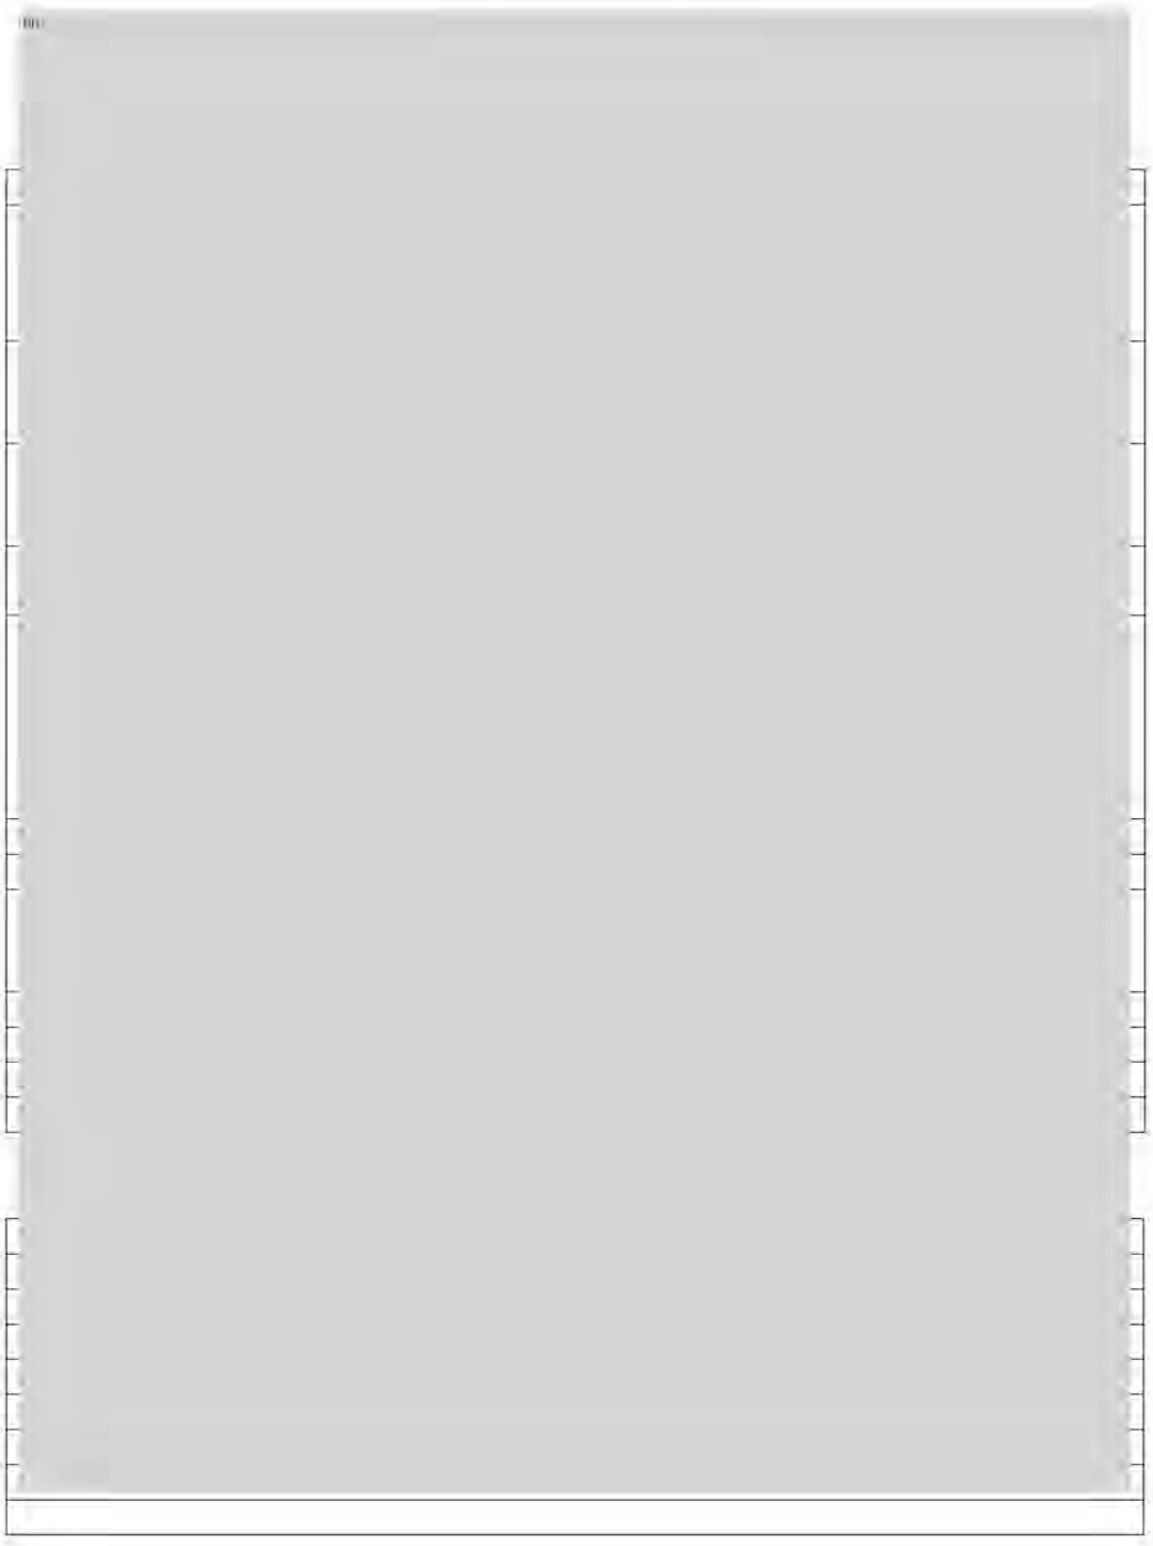

# 8. Voorbereiding t.b.v. hoofdcontract

## 8.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Onderdeel van het Molenvlietpark is de waterberging. De toevoer van deze berging wordt nader uitgewerkt. | De toevoer is nader uitgewerkt en het voorstel is besproken met direct betrokken stakeholders. Dit wordt komend kwartaal voortgezet. |

| Geplande besluiten | Genomen besluiten: |
|---|---|
| Raadsbesluit Molenvlietpark | Raadsbesluit Molenvlietpark 5 maart vastgesteld |
| | |

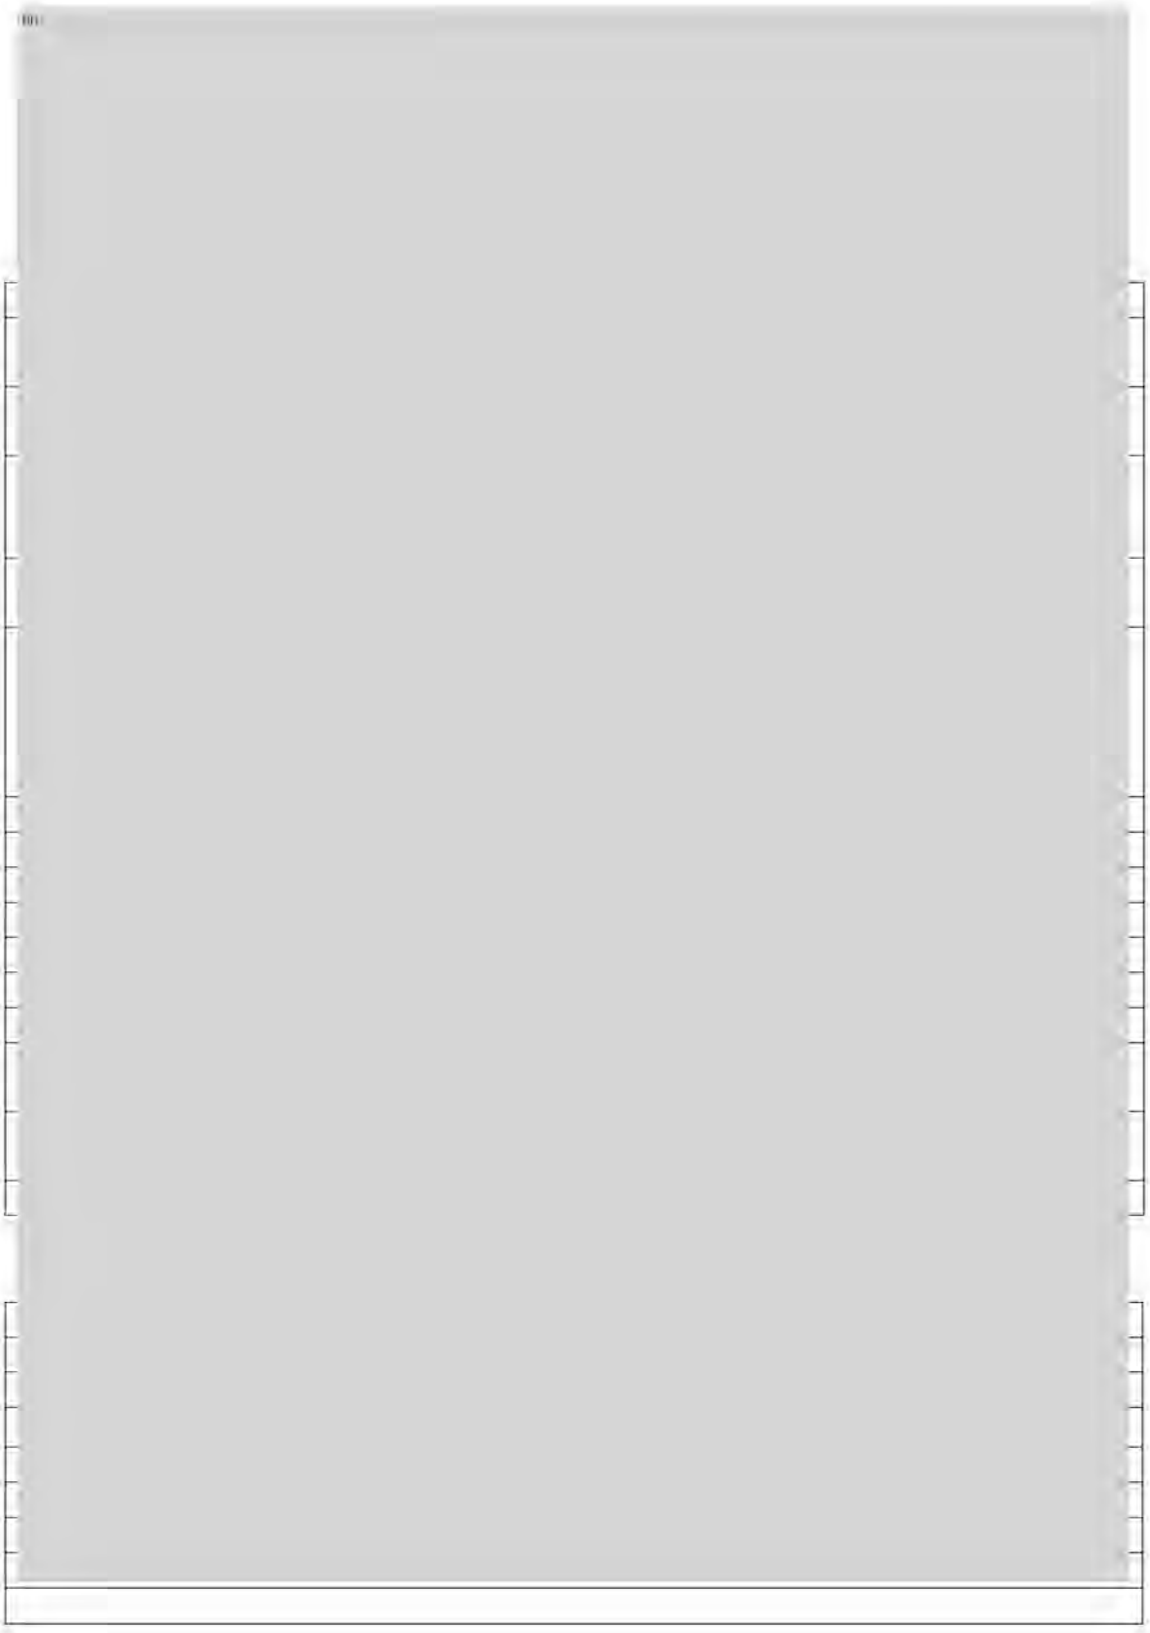

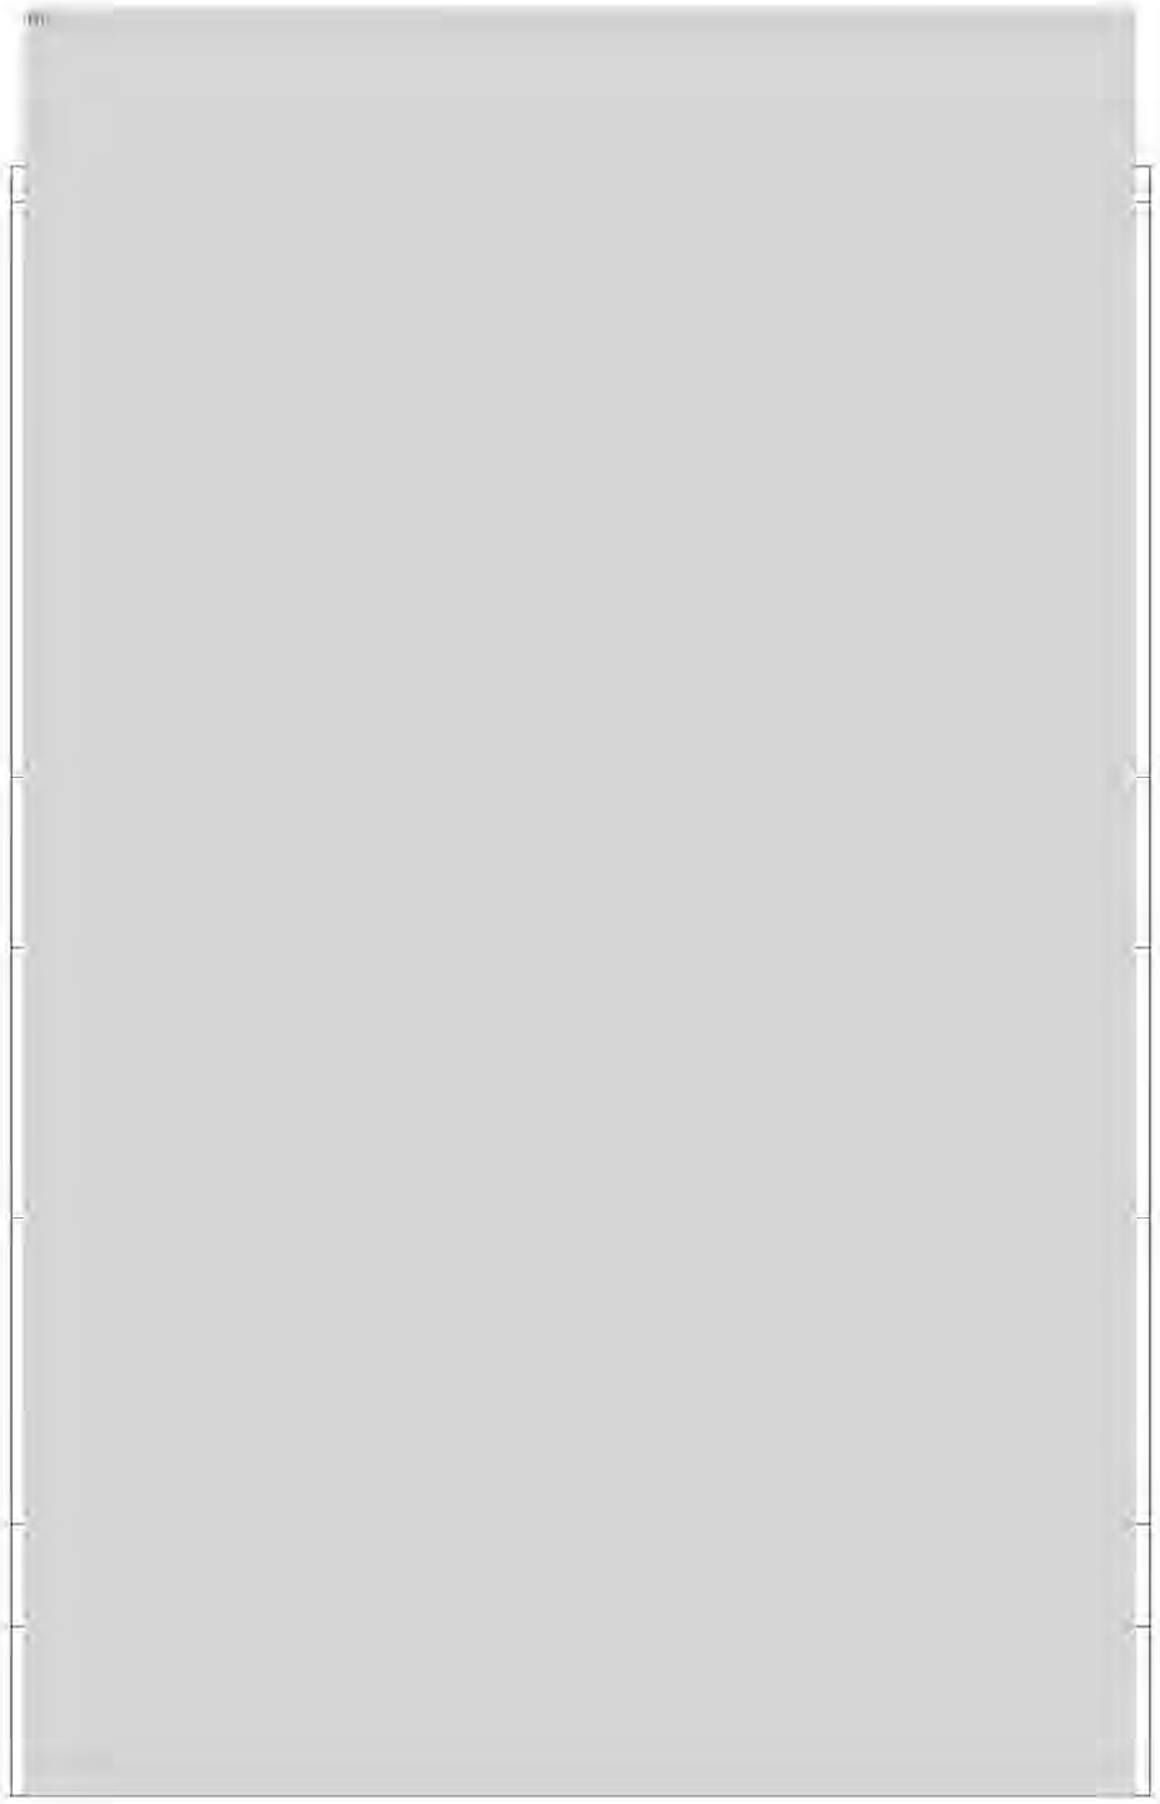

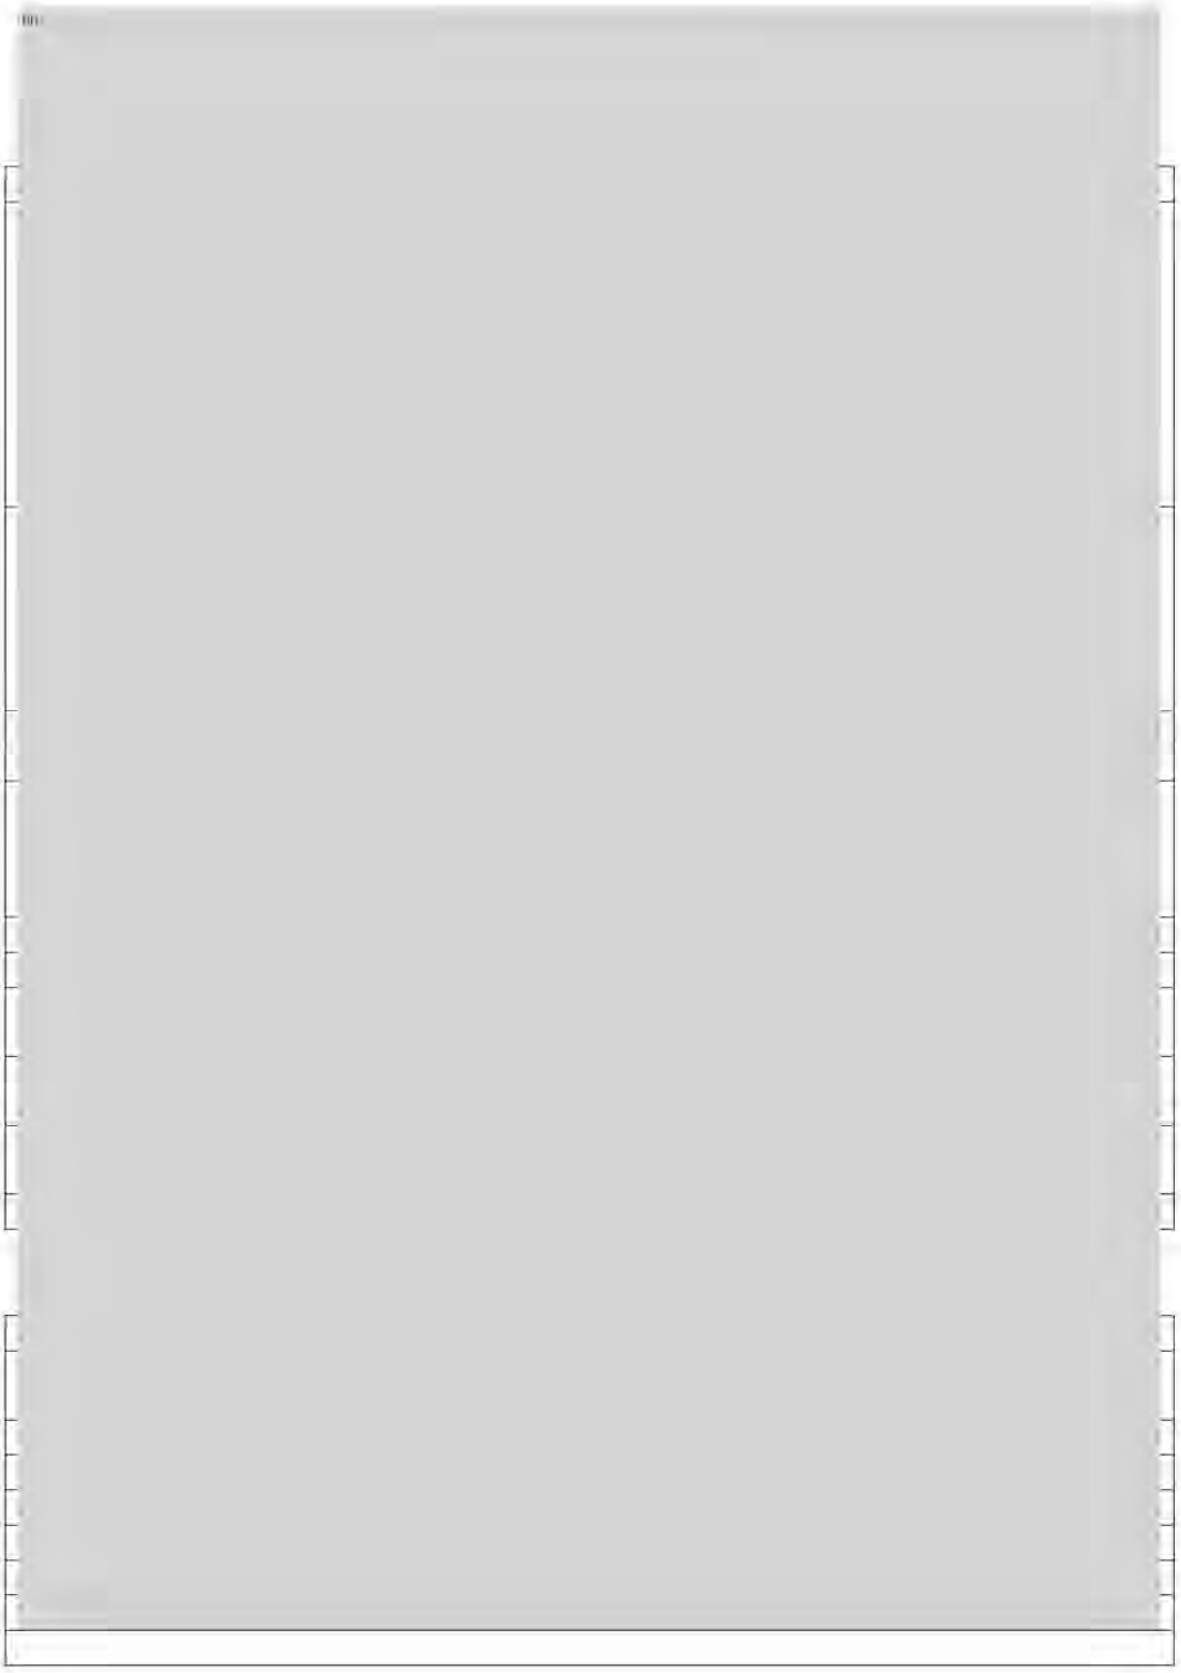

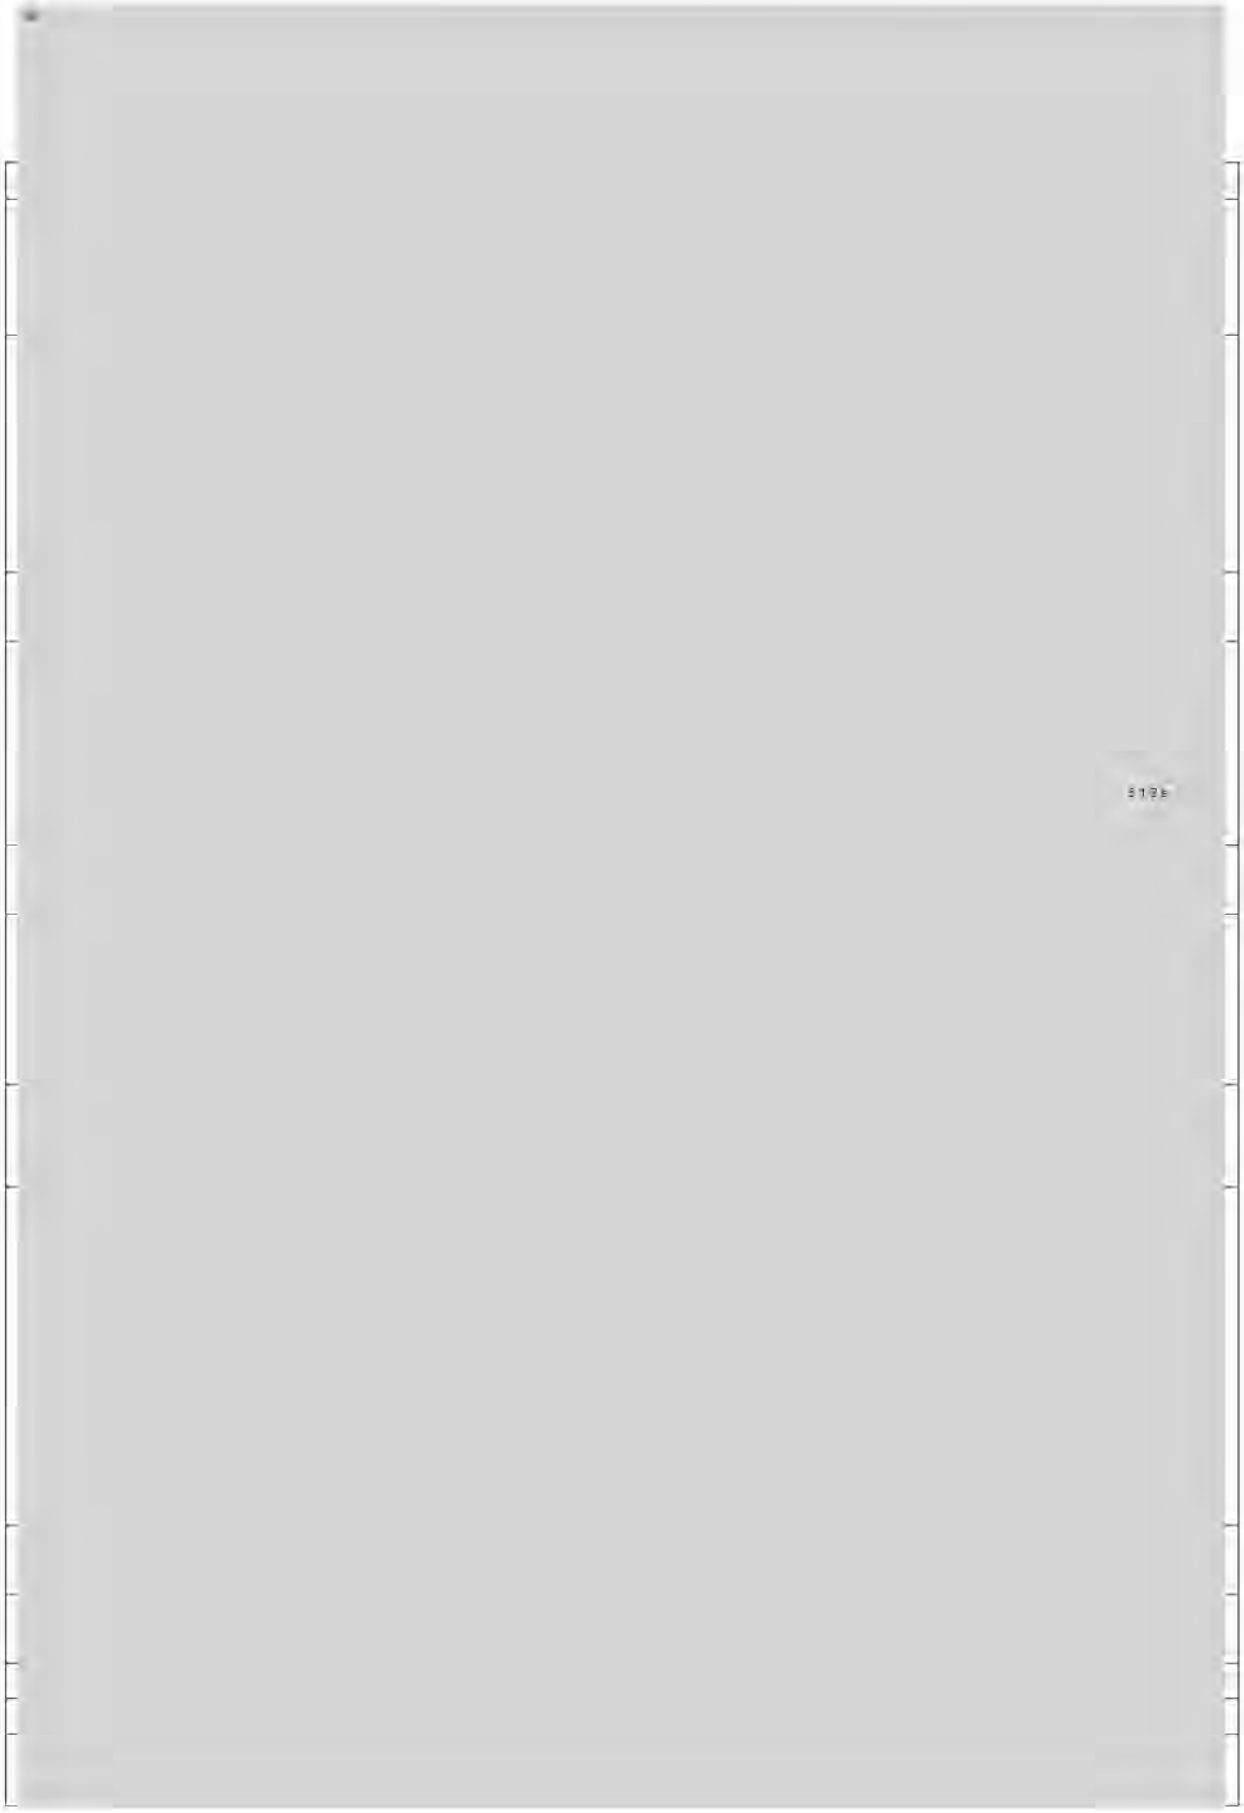

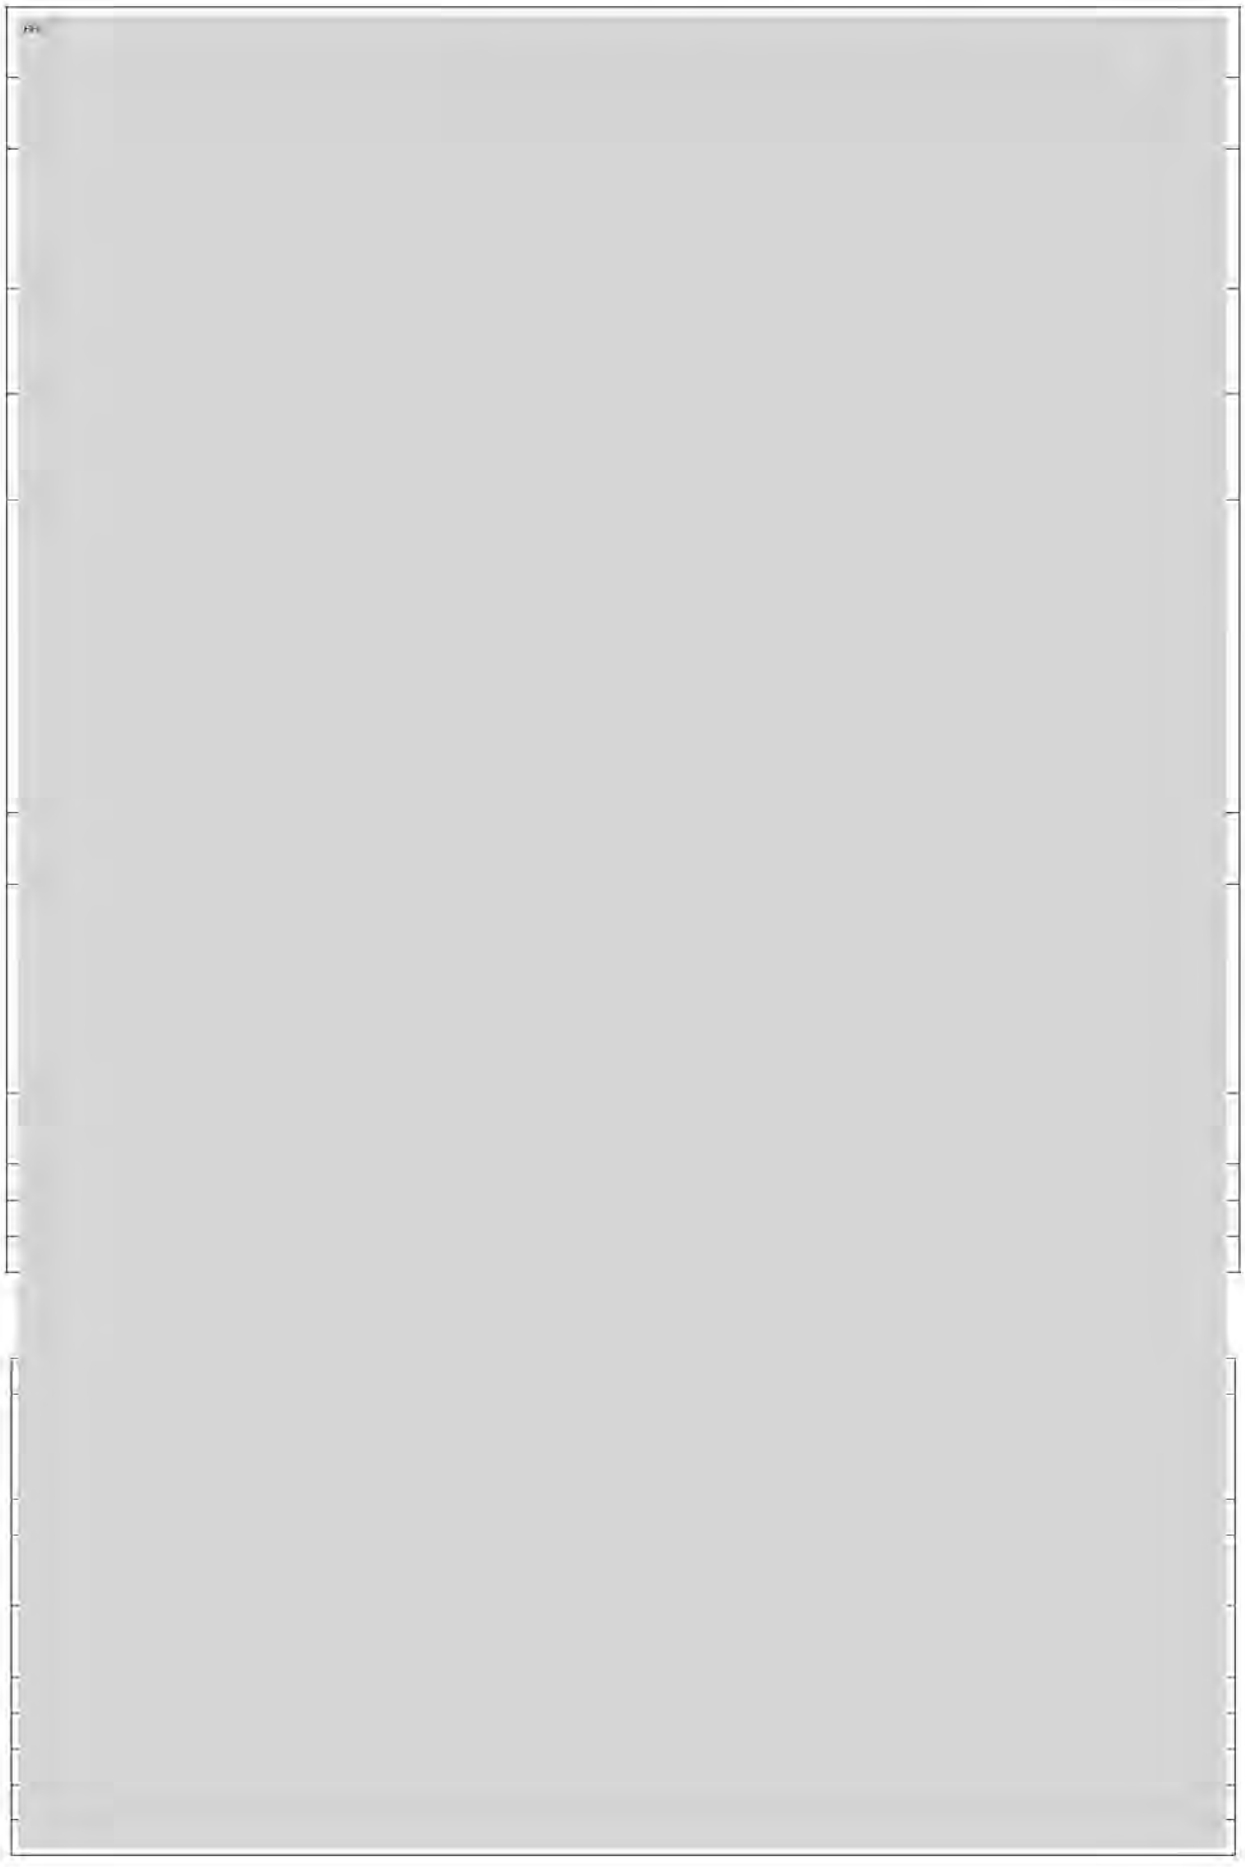

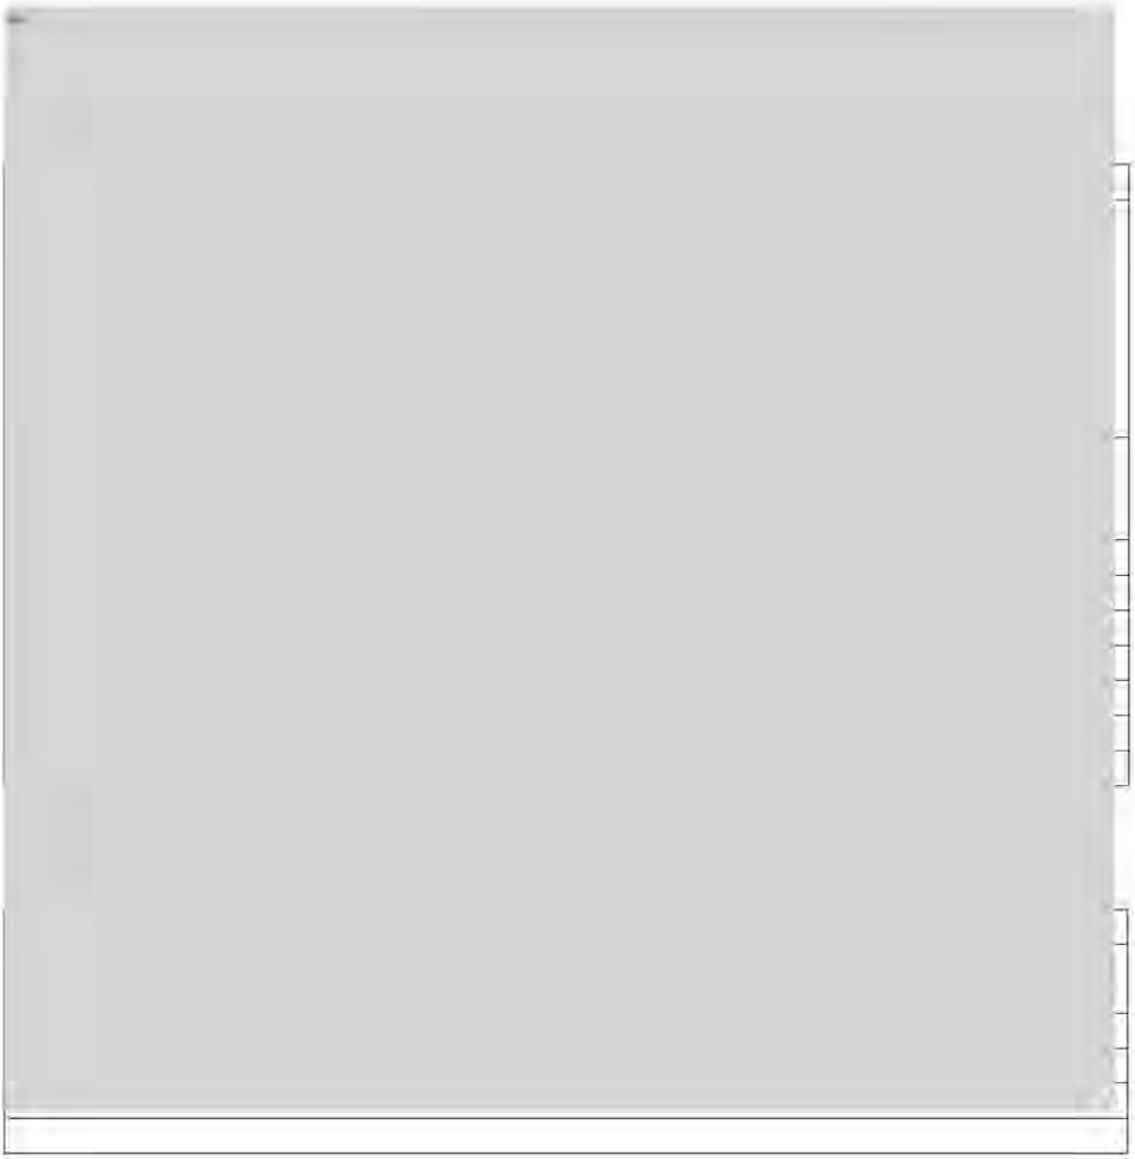

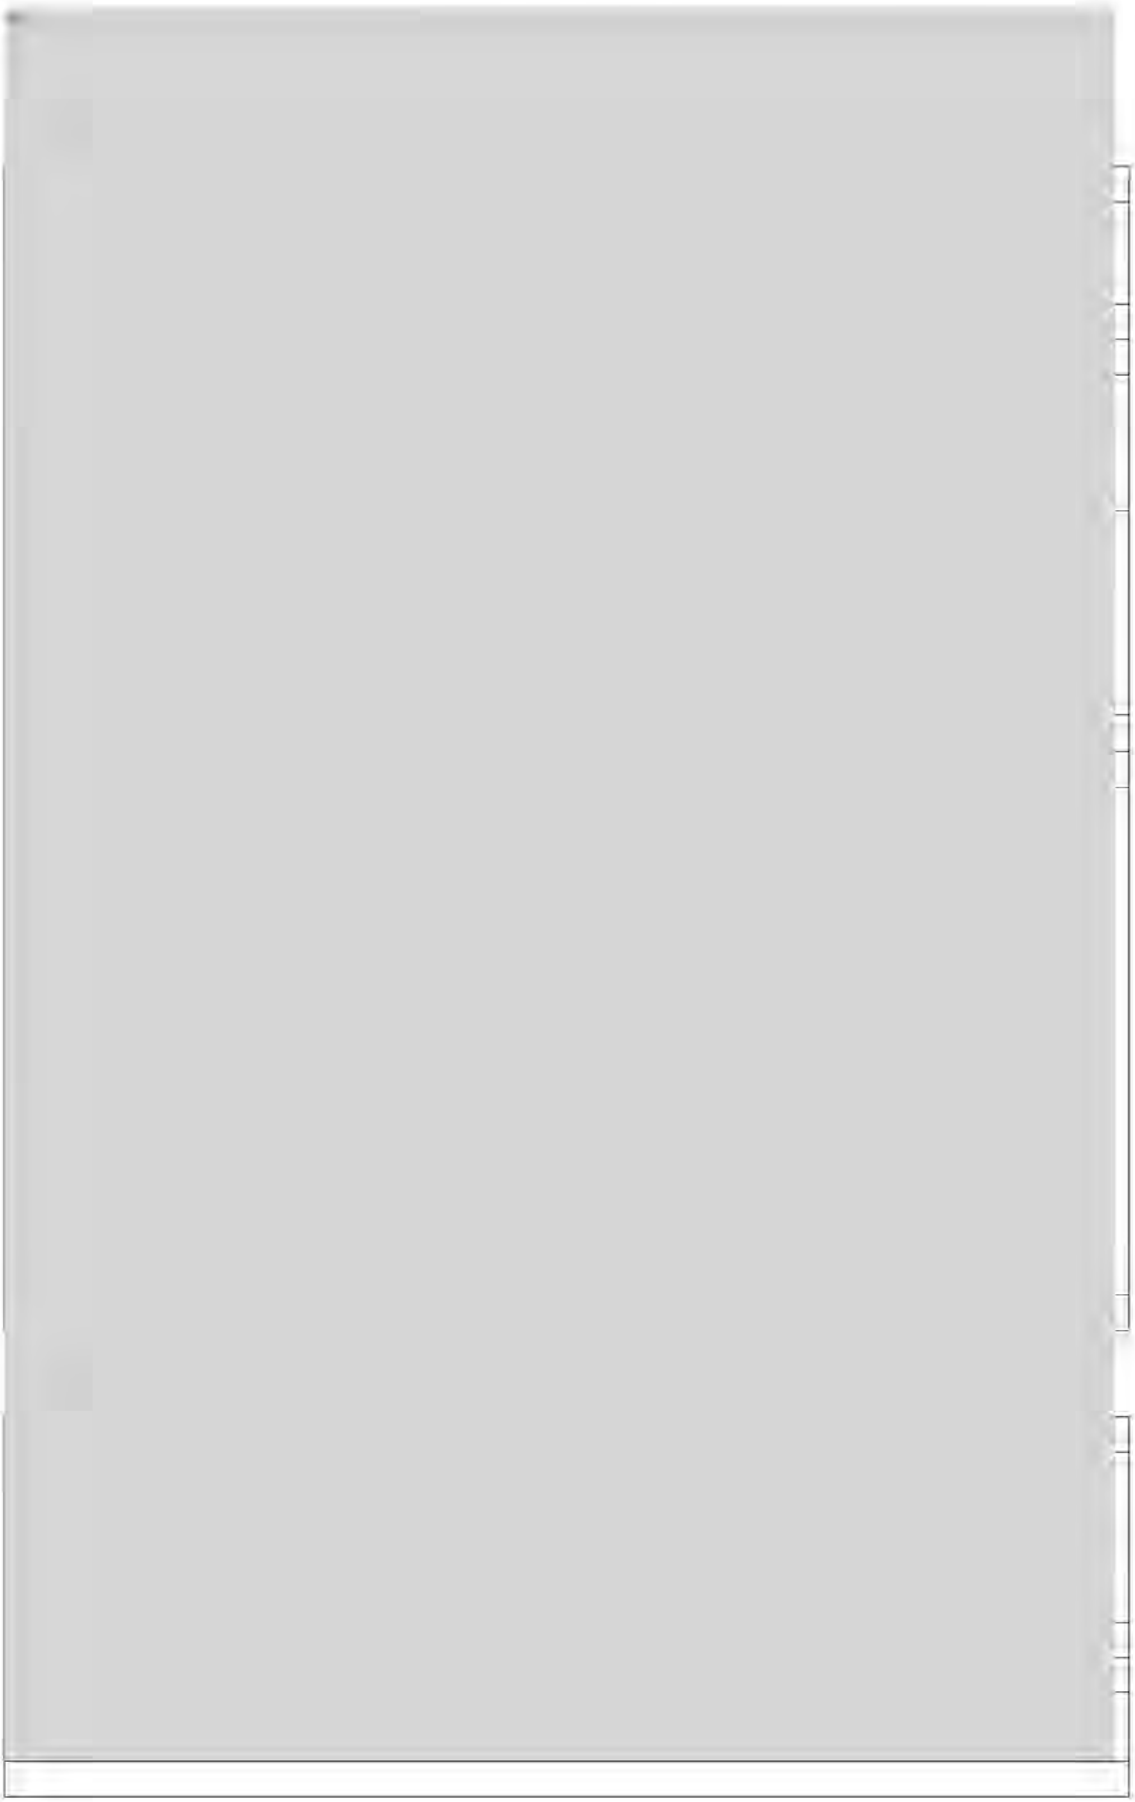

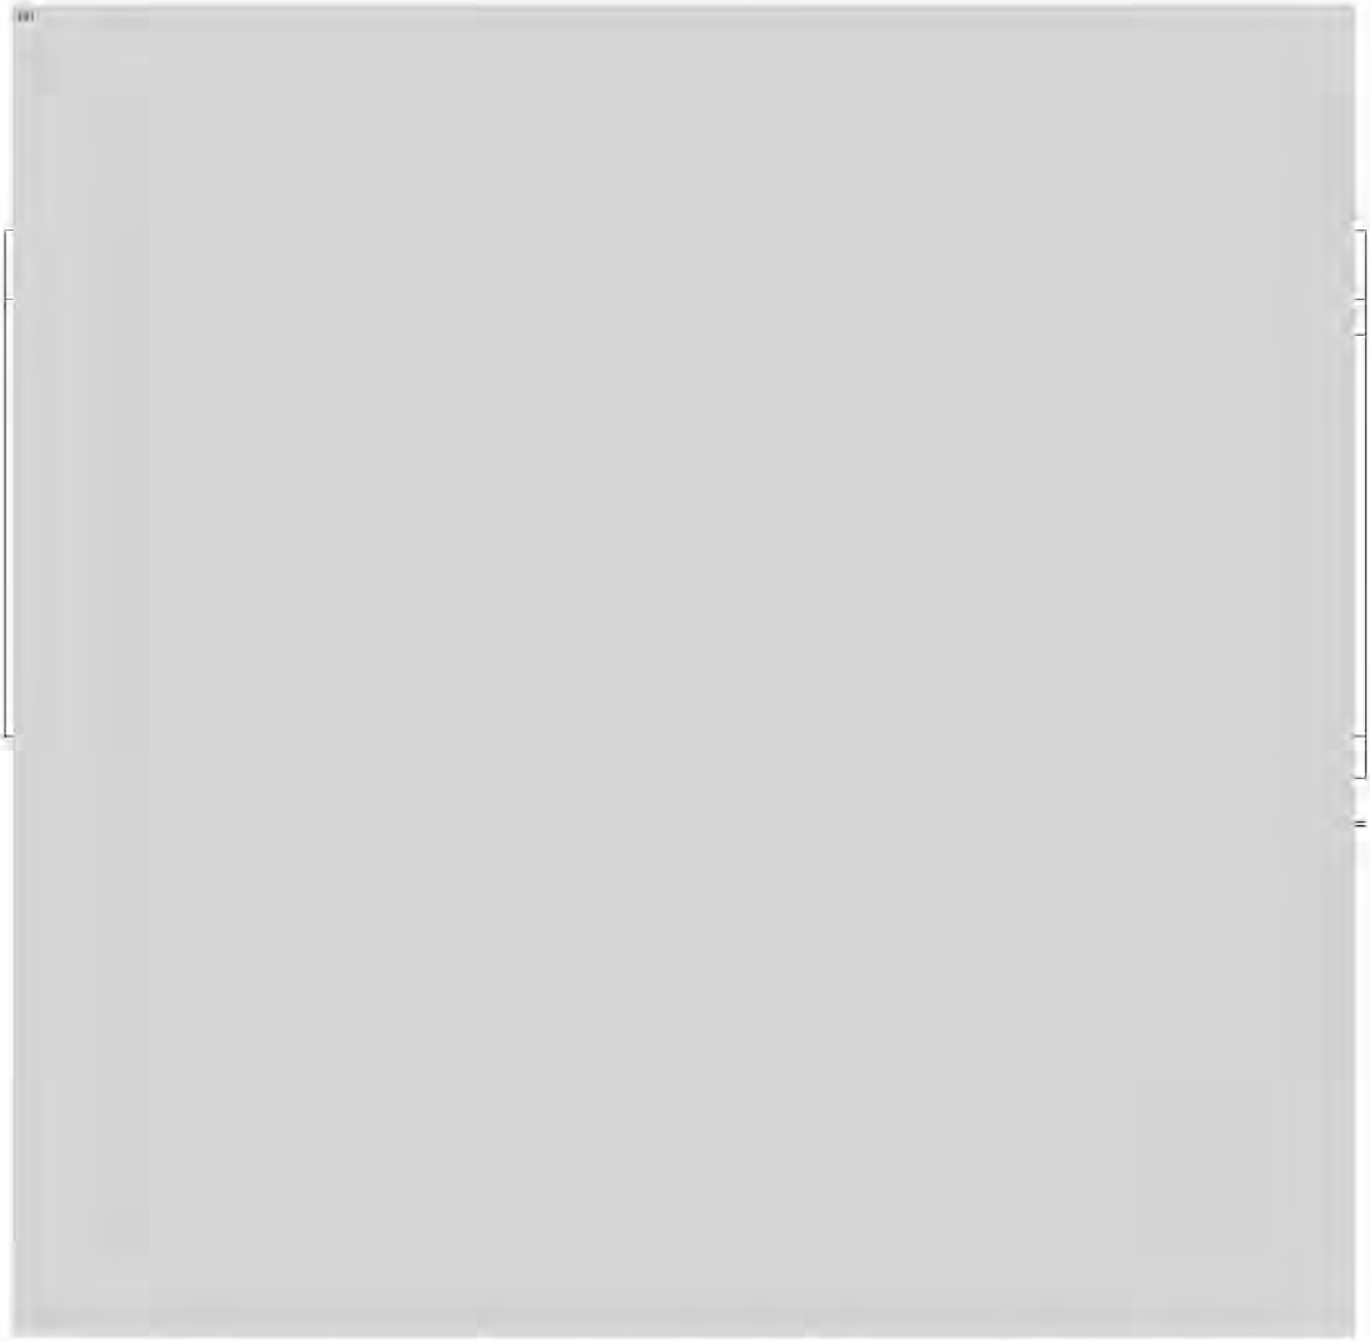

Toelichting op het uitvoeringsbudget: Het uitvoeringsbudget is per 31-03-2015 op € 640,8 mln. te stellen (was: € 635,4 mln.). Het budget is per saldo met € 5,4 mln. toegenomen nadat in het eerste kwartaal 2015 bestuurlijke besluitvorming heeft plaats gevonden inzake Molenvlietpark en waterberging Vlietzone. Het budget kan verder toenemen met de subsidiebijdrage welke de Provincie Zuid-Holland mogelijk bijdraagt aan het Molenvlietpark. Veiligheidshalve is de bijdrage vooralsnog op pm. gesteld. (zie hoofdstuk dekkingen onderdeel bijdrage Provincie Zuid-Holland). In het kader van de bestuurlijke besluitvorming omtrent het Molenvlietpark en de waterberging Vlietzone is tevens € 9,0 mln. uit het onvoorzien toegevoegd aan de bouwsom. Het onvoorzien is derhalve met € 9,0 mln. afgenomen. Inzake de genoemde bestuurlijke besluitvorming was tevens binnen de bouwsom reeds een bedrag van € 8,0 mln. opgenomen voor het Molenvlietpark.

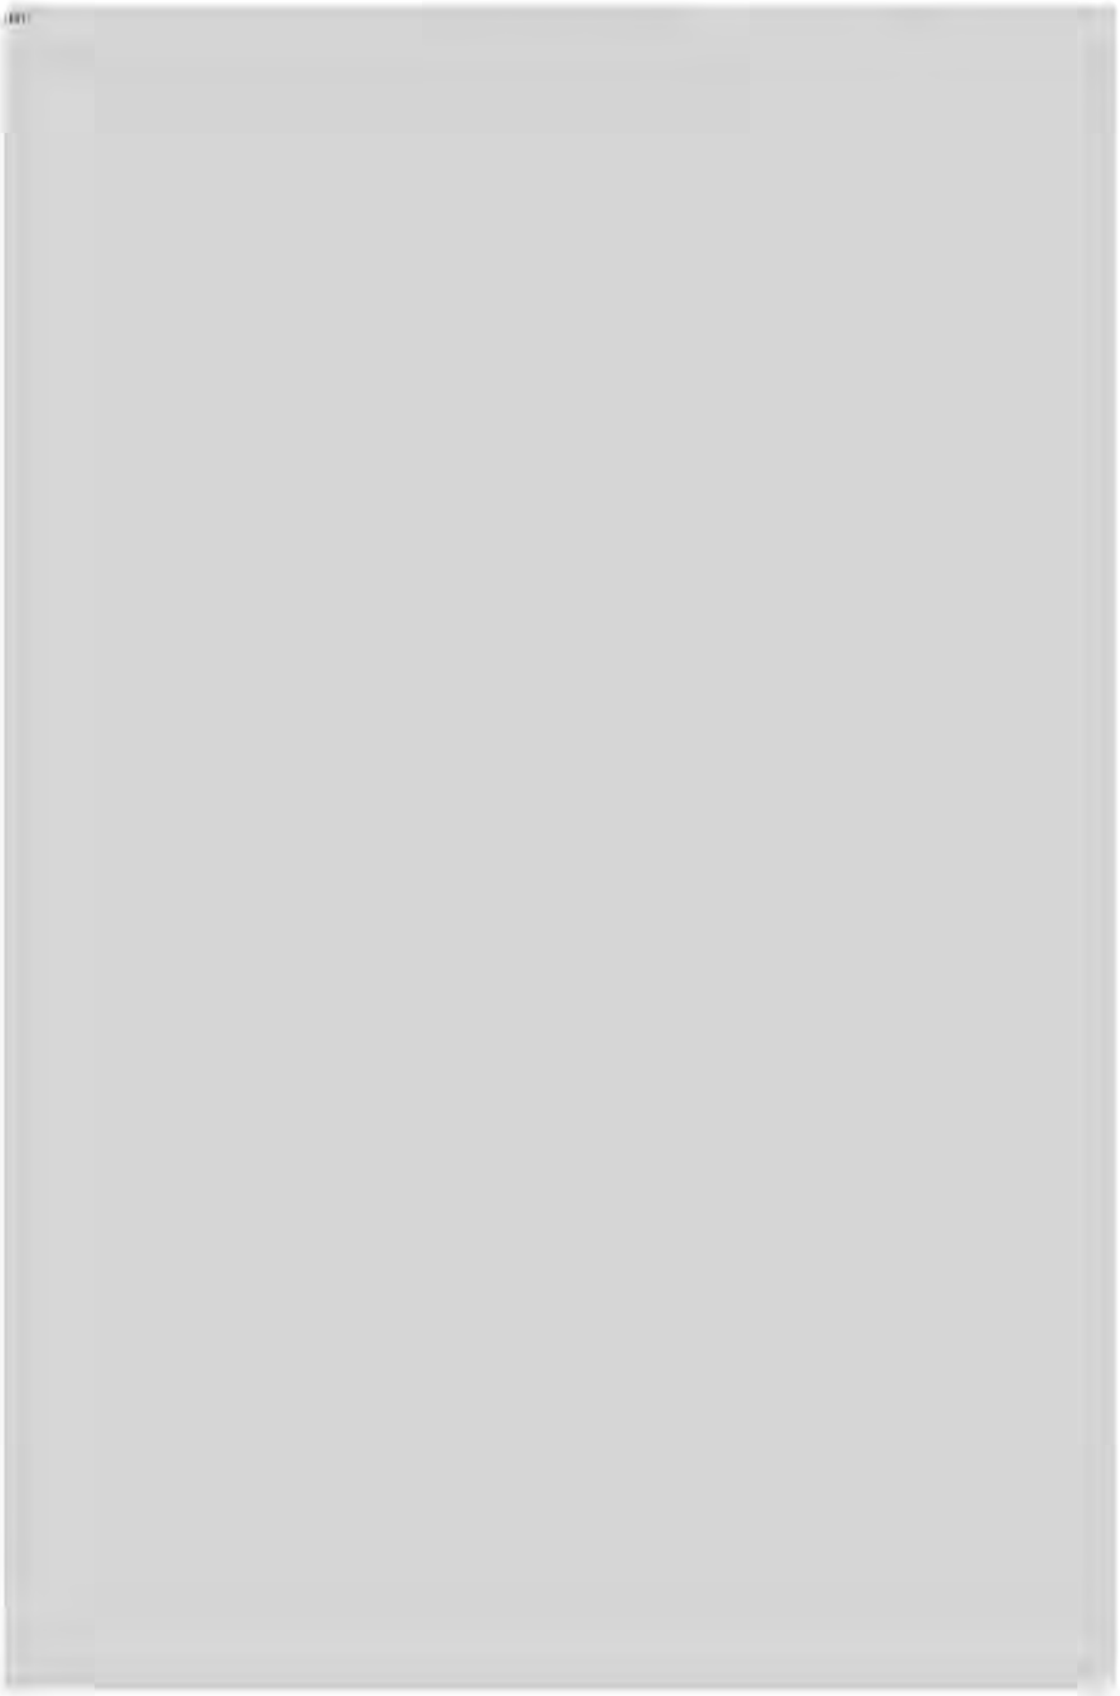

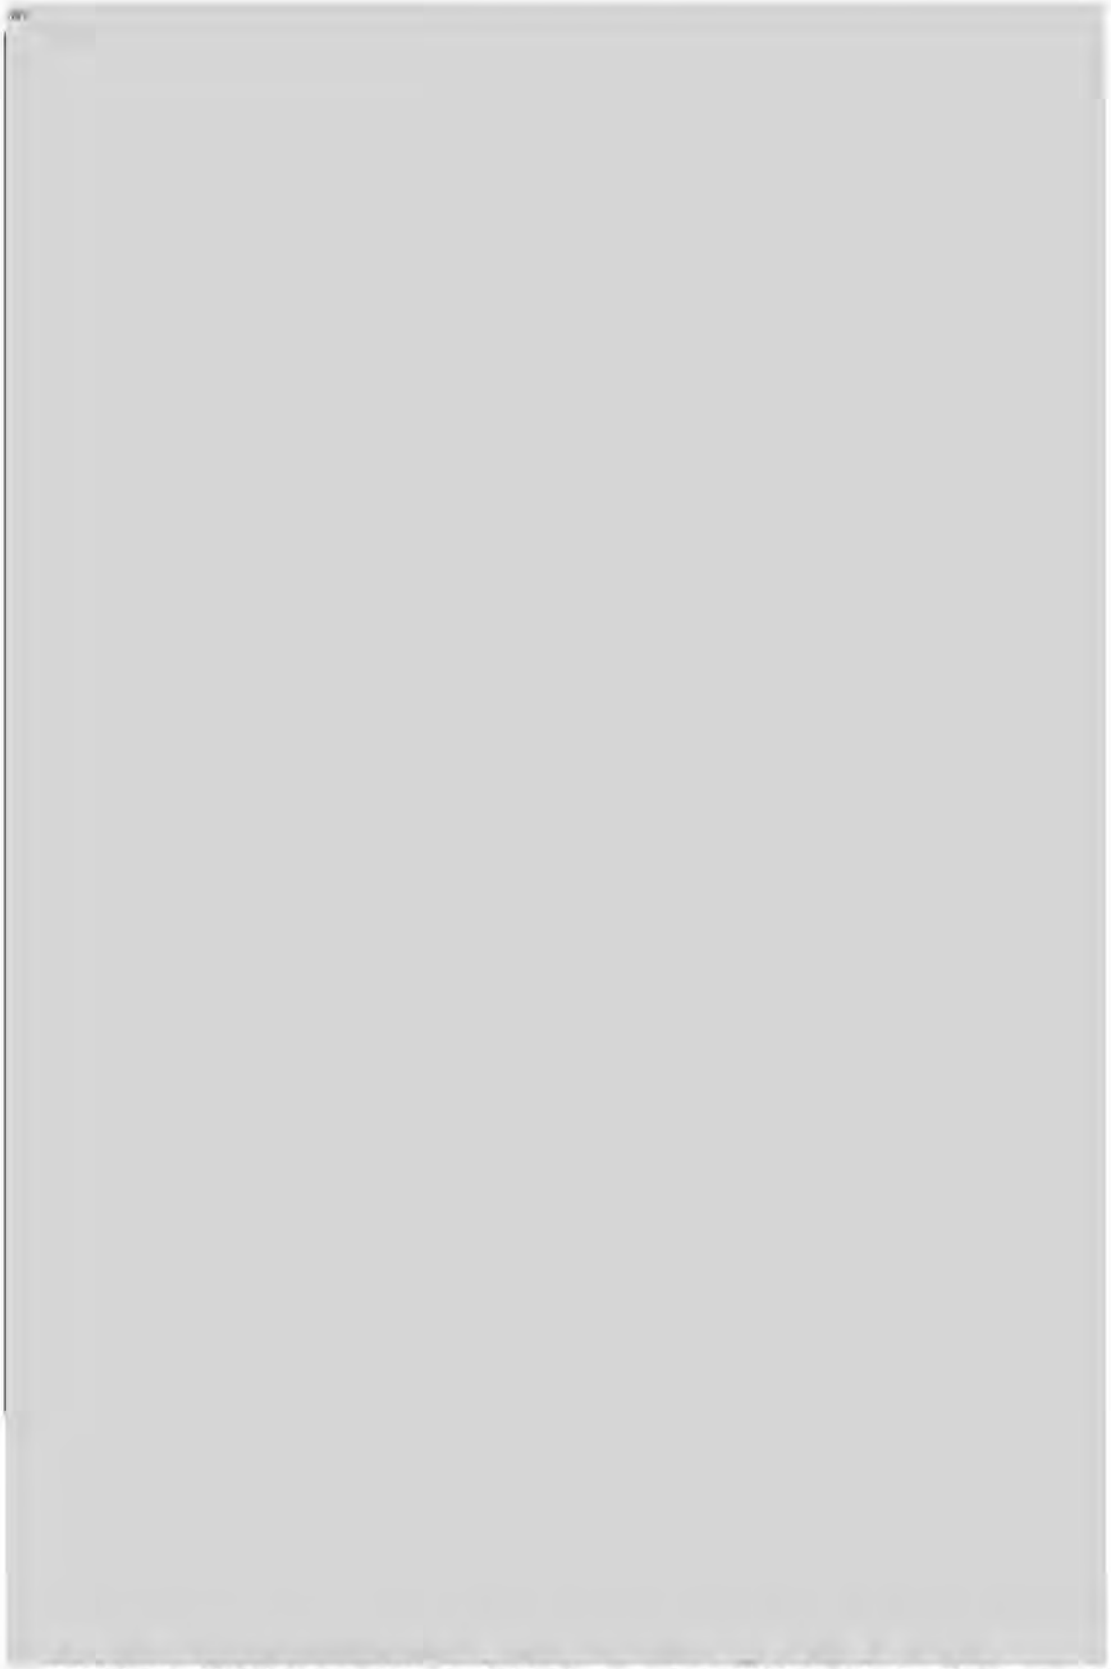

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland: In maart 2015 heeft de Raad van de gemeente Den Haag ingestemd met toevoeging van de realisatie van het Molenvlietpark (incl. watercompensatie) aan de scope van het project Rotterdamsebaan (rv6 RIS 279688_150130). Bij de toevoeging van deze scope heeft

het Hoogheemraadschap Delfland een bijdrage van € 5,4 mln. aan het project Rotterdamsebaan toegevoegd. Deze middelen zijn toegevoegd aan het beschikbare krediet Rotterdamsebaan. Optioneel draagt het Hoogheemraadschap Delfland aan ververwerving t.b.v. aanvoer mogelijkheden maximaal € 0,8 mln. bij op basis van werkelijk gemaakte kosten.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland: In maart 2015 heeft de Raad van de gemeente Den Haag ingestemd met toevoeging van de realisatie van het Molenvlietpark (incl. watercompensatie) aan de scope van het project Rotterdamsebaan (rv6 RIS 279688_150130). Een eventuele financiële bijdrage van de Provincie Zuid-Holland t.b.v. de realisatie van het Molenvlietpark wordt nader onderzocht. Veiligheidshalve is de mogelijke dekkingsbijdrage van de Provincie Zuid-Holland op pm. gesteld.

# 17. Risicobeheer

## 17.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Opstellen financieel risicoprofiel, inclusief Molenvlietpark en de geactualiseerde vastgoedraming (begin eerste kwartaal 2015) | Opgesteld, geverifieerd in MT en vastgesteld op 2 februari 2015. Gepresenteerd aan OGON 12 maart 2015. |
| | |
| | |
| **Geplande besluiten** | |
| Vaststellen financieel risicoprofiel, inclusief Molenvlietpark en de geactualiseerde vastgoedraming. | Vastgesteld in MT 2 februari 2015. |
| | |

| |
|---|
| |
| |

[redacted]

| | |
|---|---|
| Kosten grondverwerving (diverse risico's). | Risicoprofiel grondverwerving is afgenomen door bereikte voortgang minnelijke verwerving. Het risicoprofiel van de Vastgoedraming als geheel is toegenomen als gevolg van het gaan realiseren van het Molenvlietpark. |
| | |

[redacted]

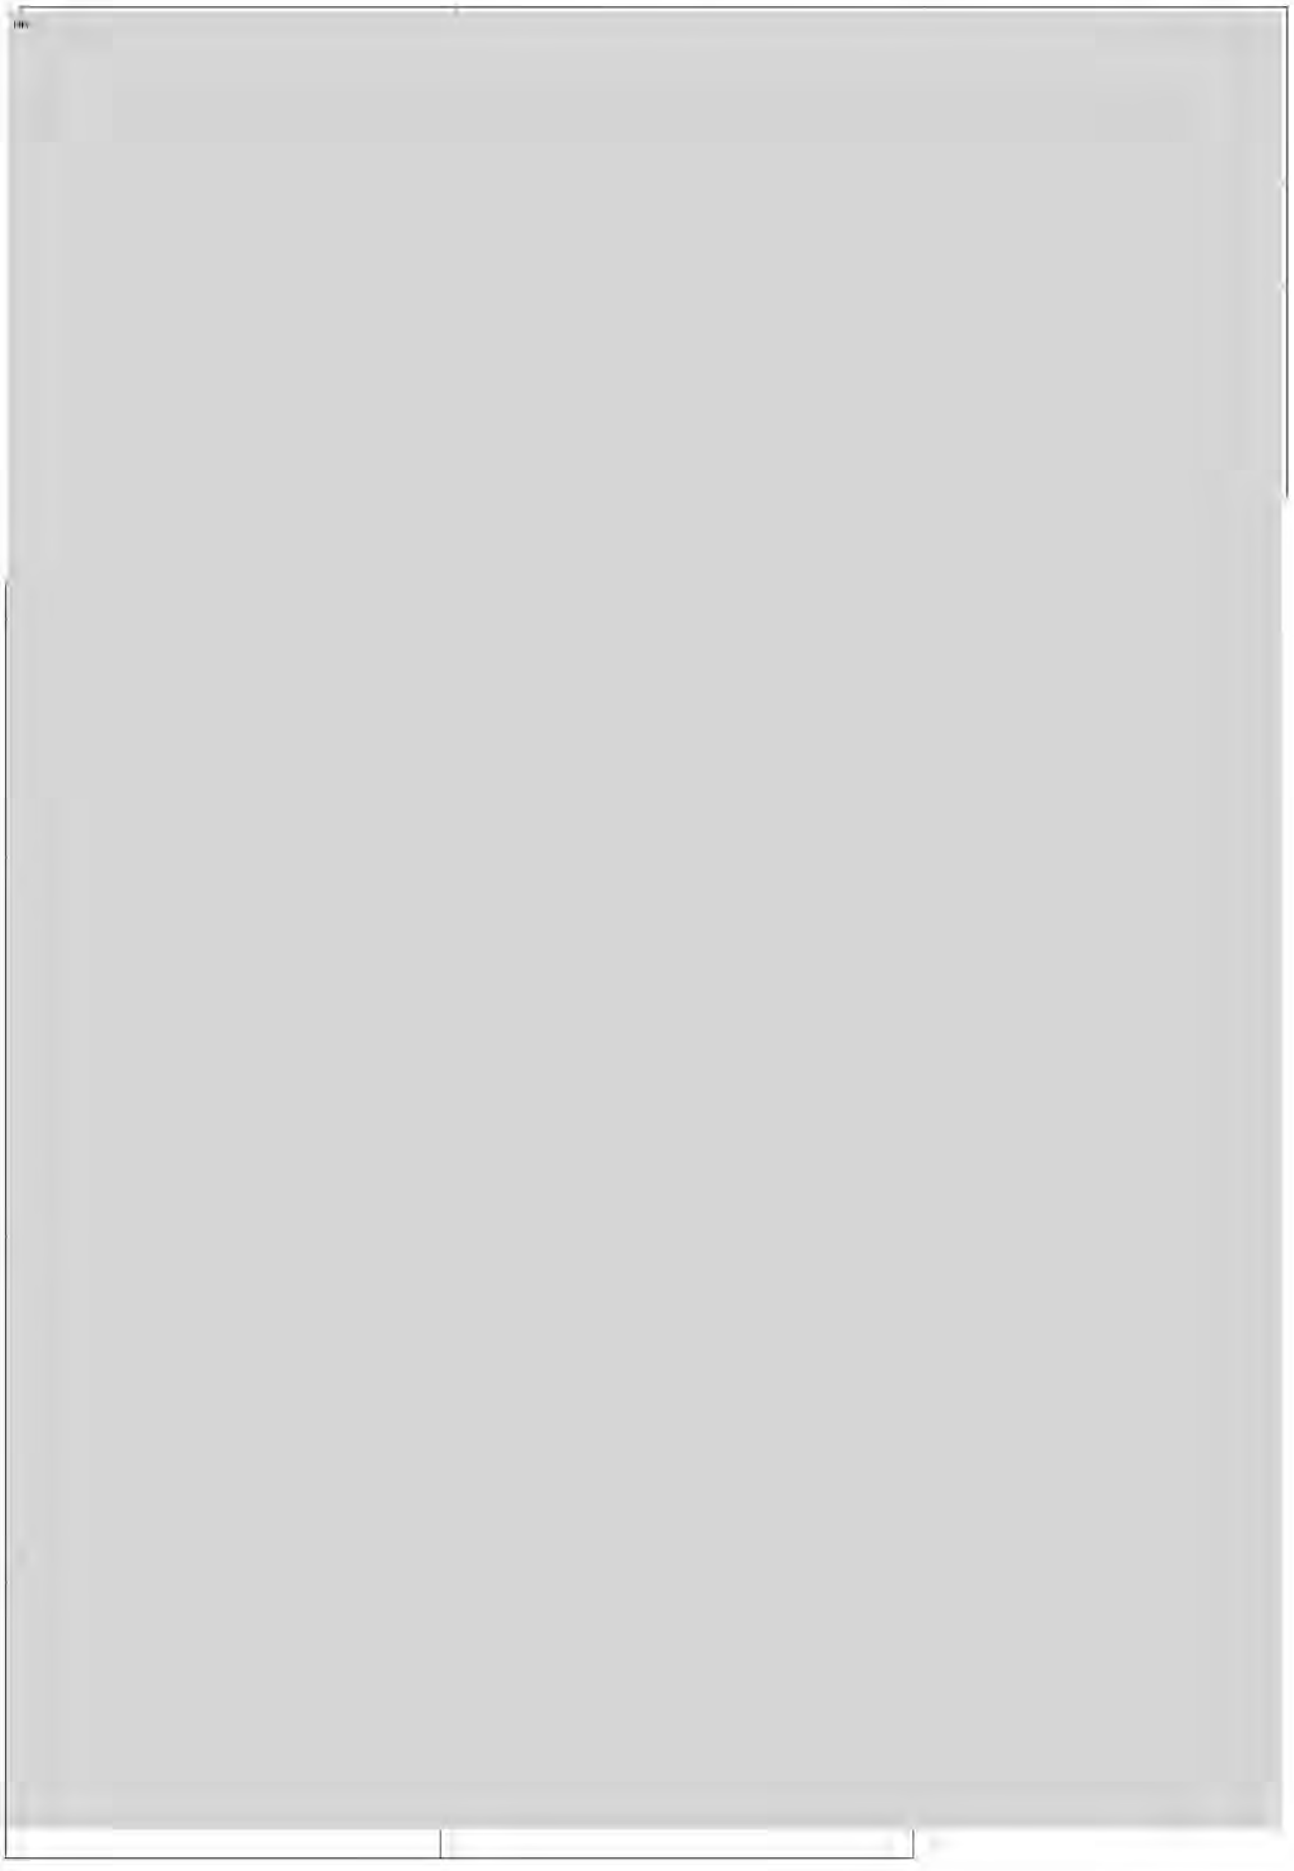

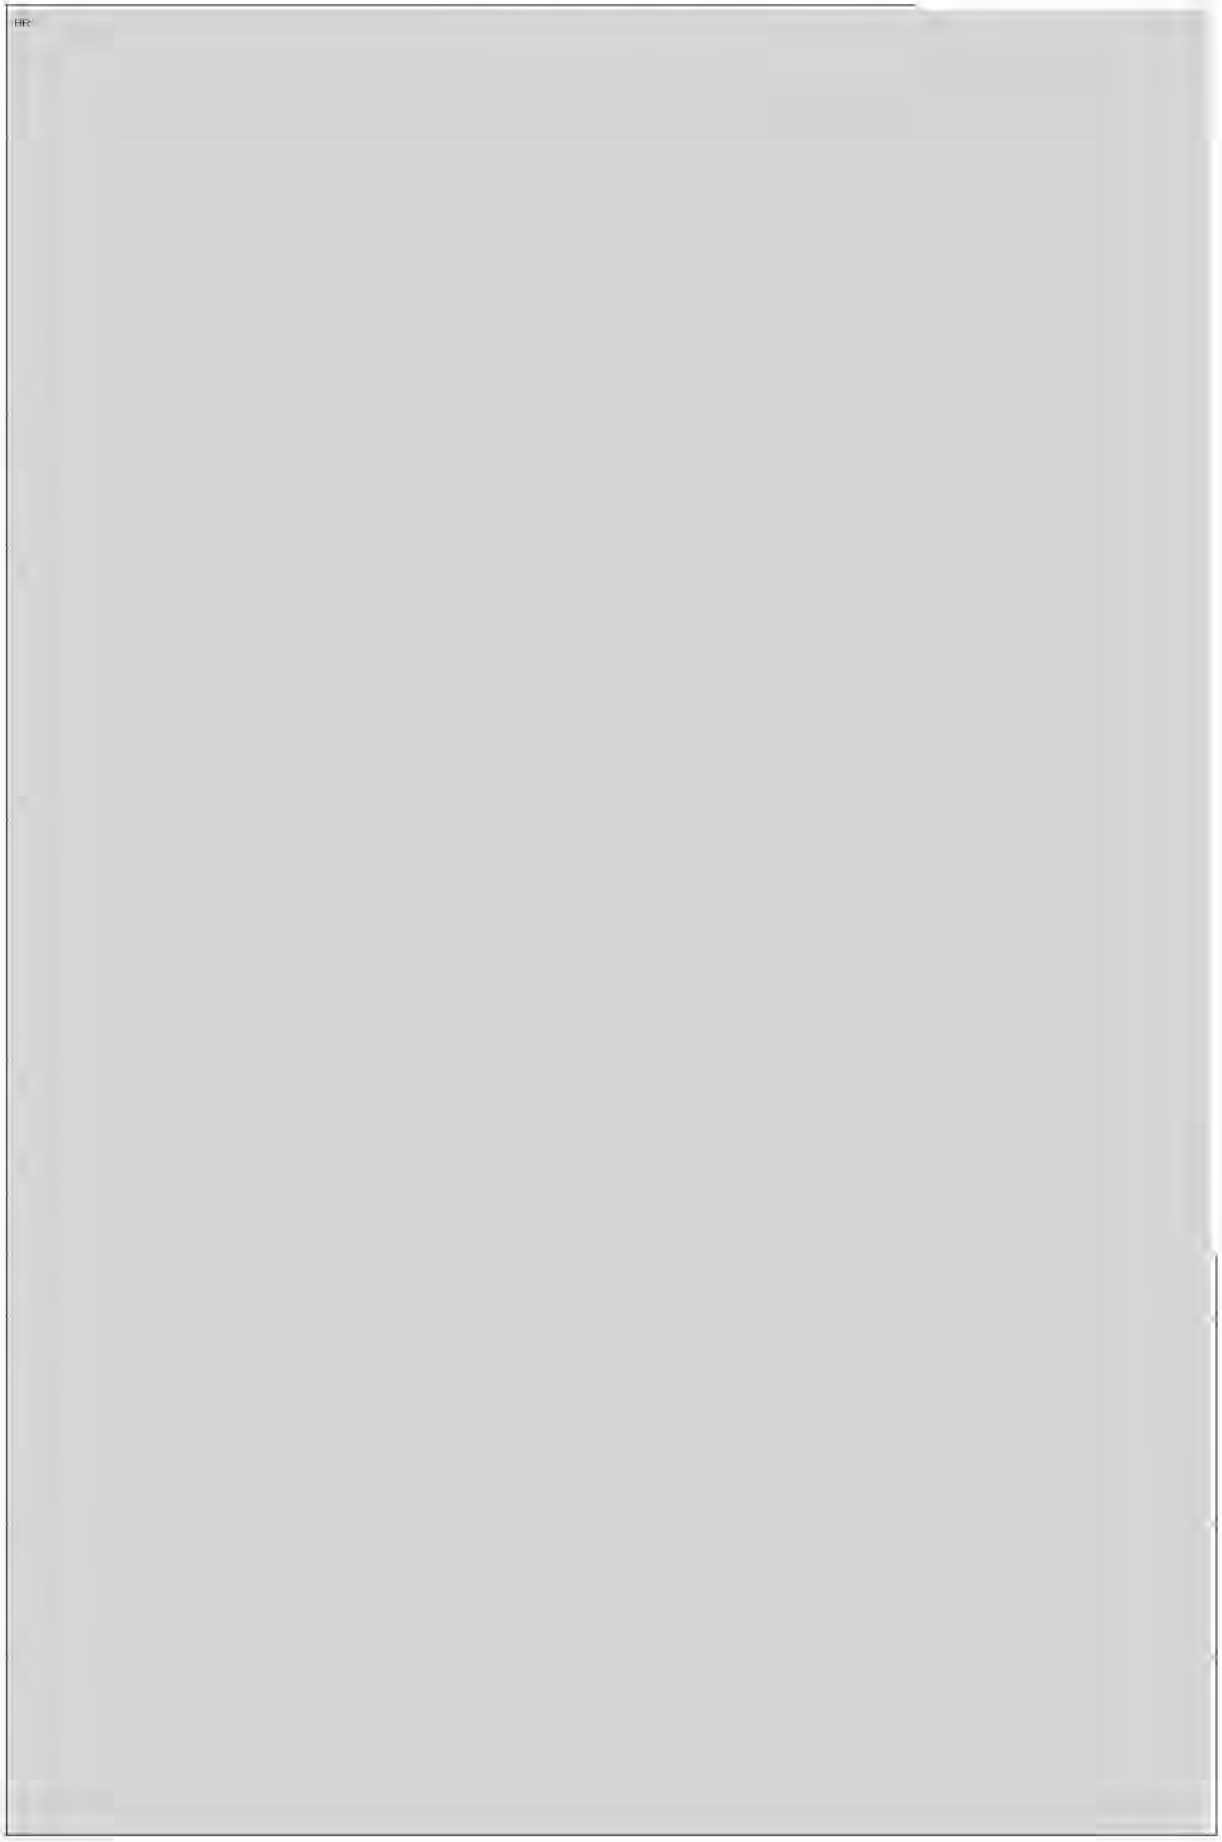

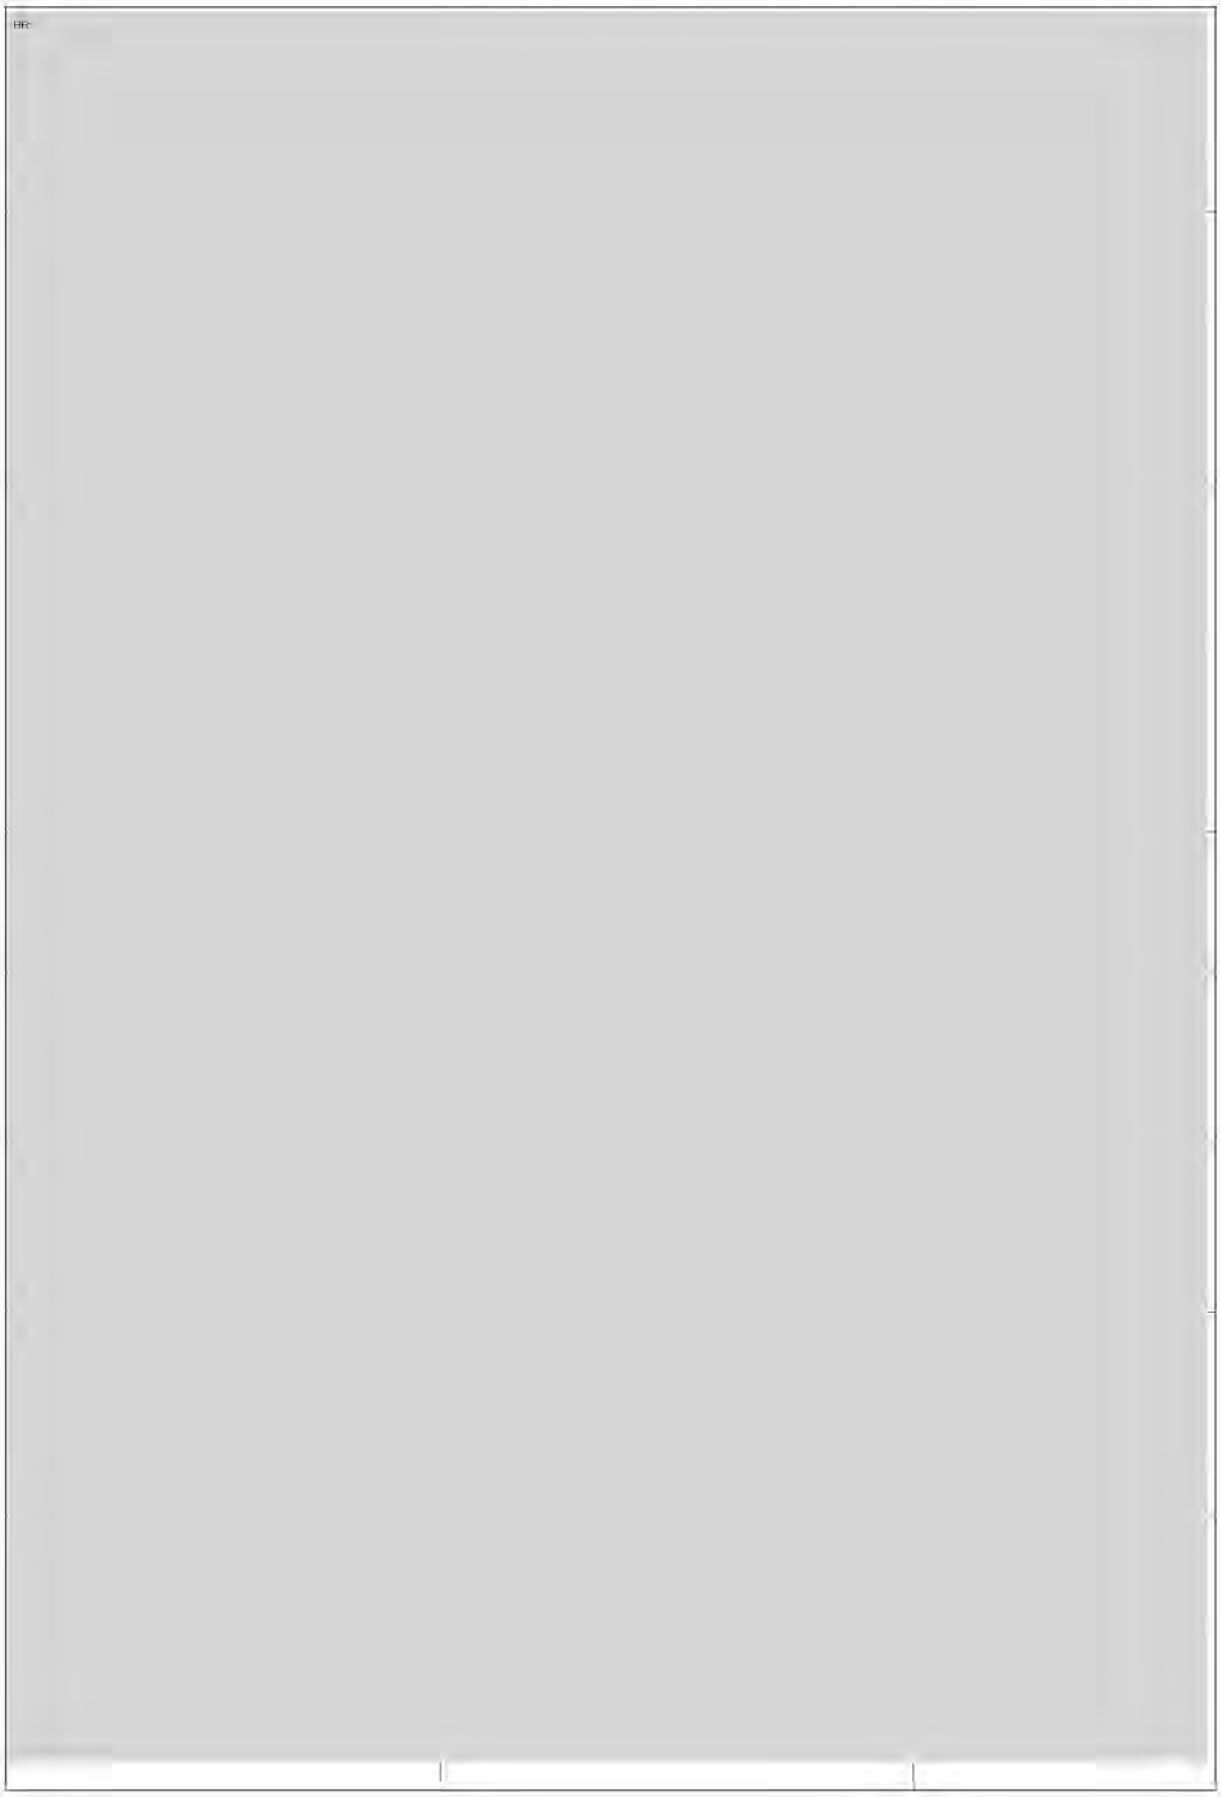

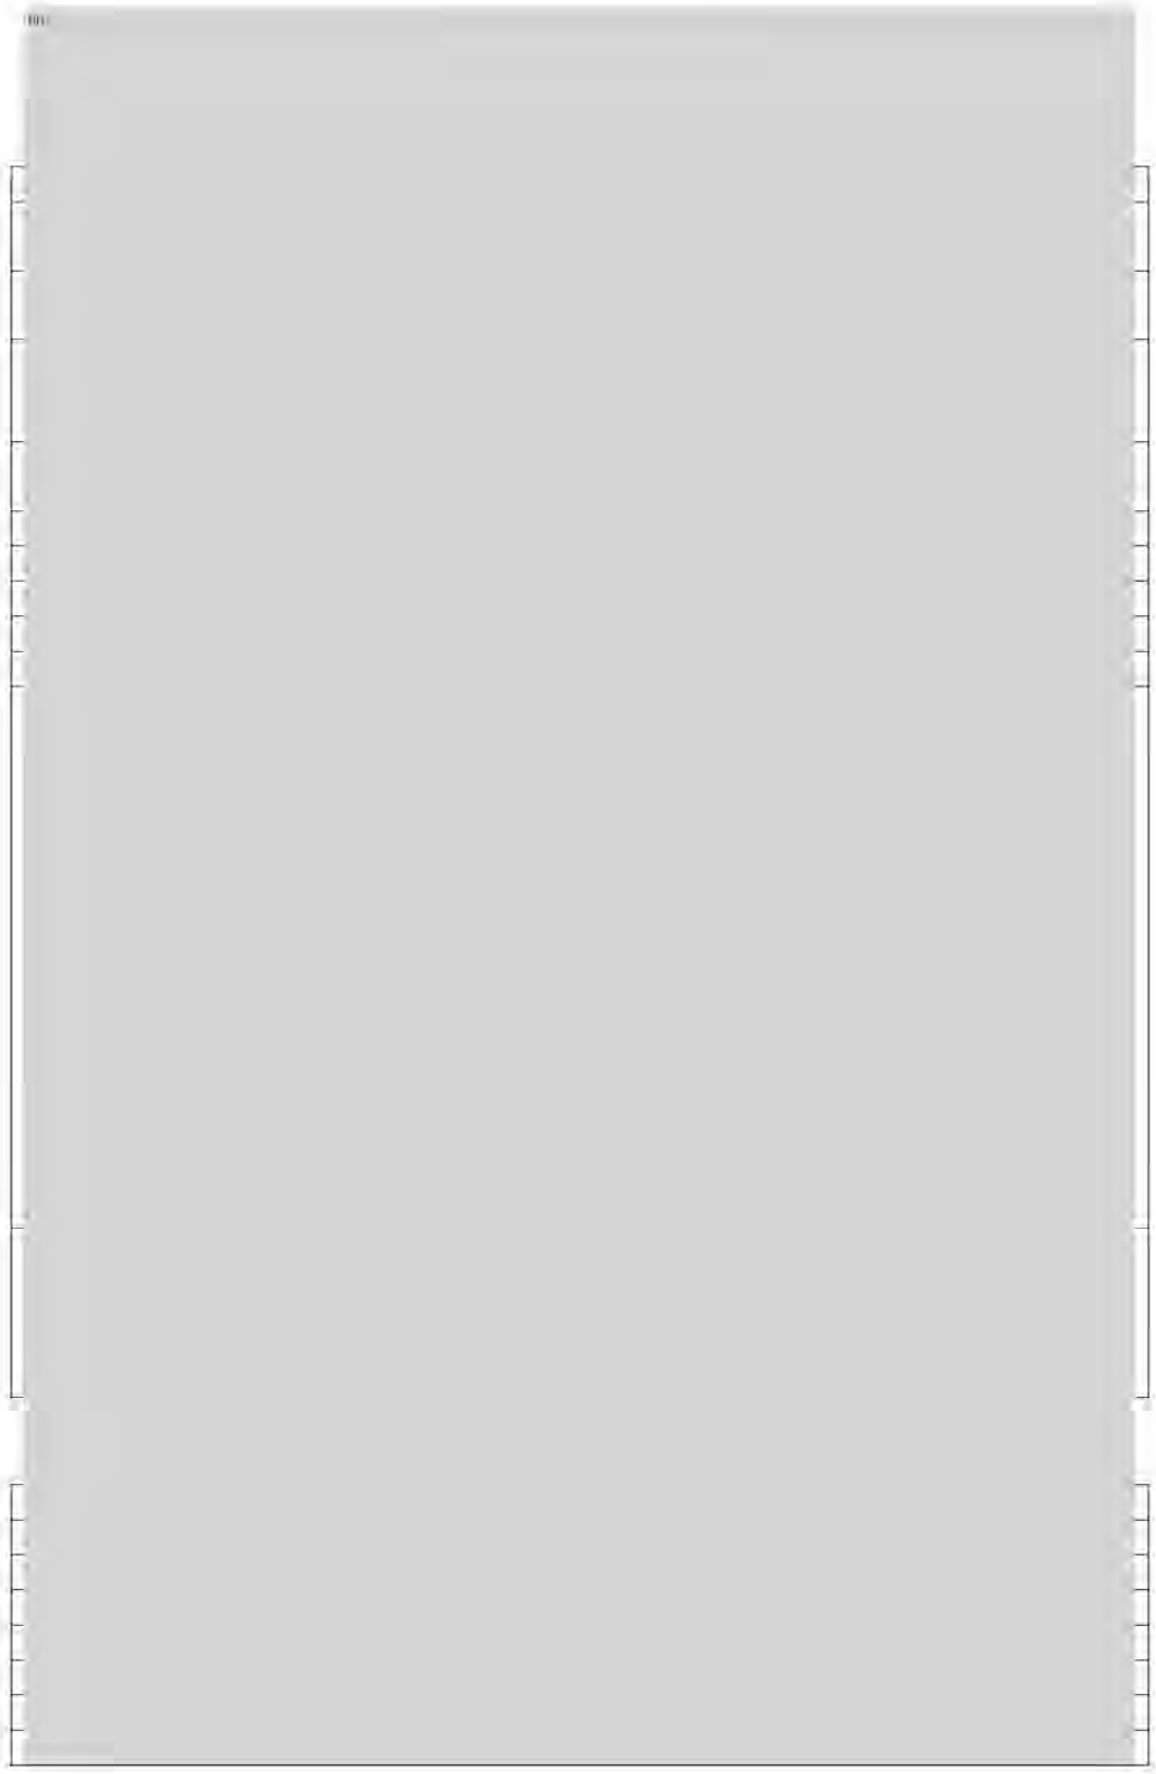

# 19. Scopemanagement

## 19.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Afronden verzoek tot projectmutatie (nr. 4) t.a.v. aan scope toevoegen van het Molenvlietpark. | Na het raadsbesluit (5 maart) is de concept-projectmutatie op 23 maart in het MT besproken. Volgend kwartaal wordt deze in procedure gebracht. |
| [redacted] | |

| Geplande besluiten | Genomen besluiten |
|---|---|
| Goedkeuren door MT, OGON en Stuurgroep van VtW's 4 t/m 7. | Projectmutatie Molenvlietpark (nr. 4) en VtW Calamiteitenberging (nr. 5) zijn in concept besproken tijdens MT van 23 maart en zullen in het komende kwartaal in MT, OGON en Stuurgroep ter vaststelling geagendeerd worden.<br>Projectmutatie Wegastraat-Oost (nr. 6) en projectmutatie KPN/Commerzbank-garage (nr. 7) zullen na wederzijdse ondertekening van de overeenkomsten worden afgerond en in procedure worden gebracht. |

## 19.2 Komende kwartaal

| |
|---|
| [redacted] |
| |
| **Besluiten** |
| Projectmutatie Molenvlietpark (nr. 4) en VtW Calamiteitenberging (nr. 5) vaststellen in OGON en Stuurgroep. |
| [redacted] |
| |

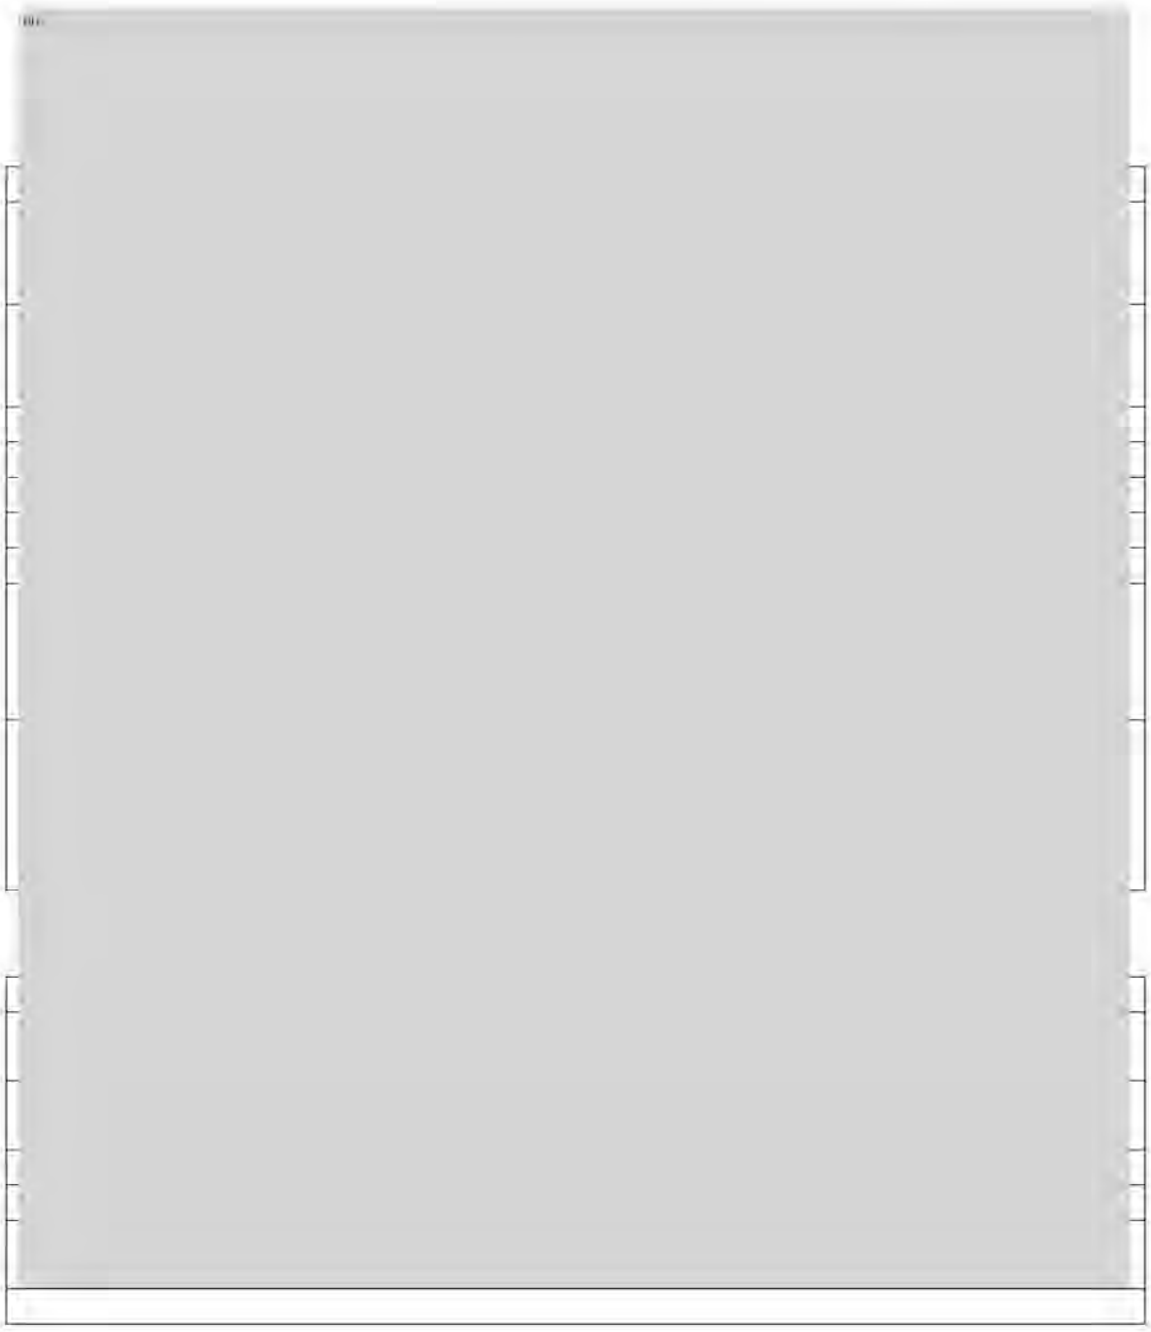

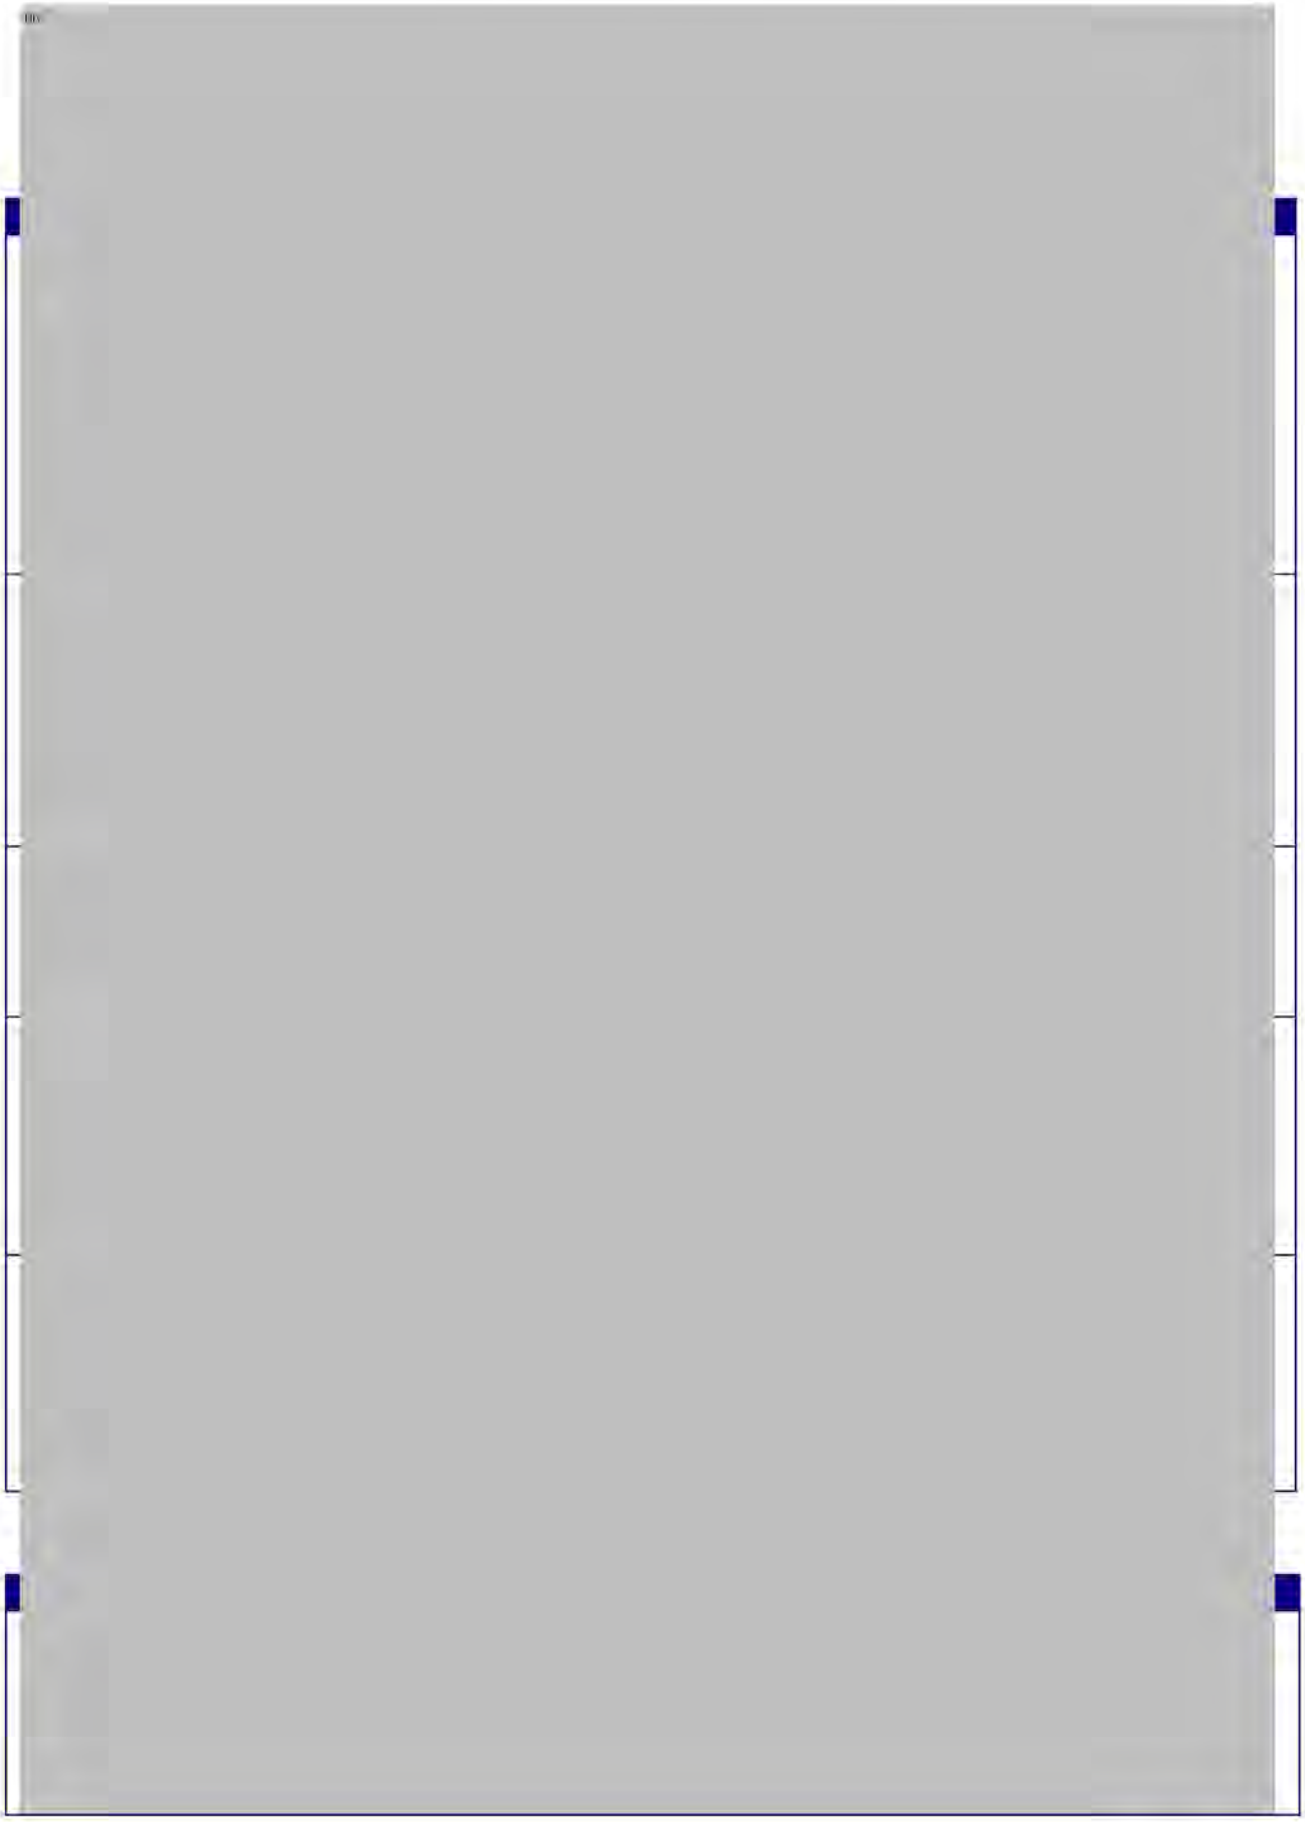

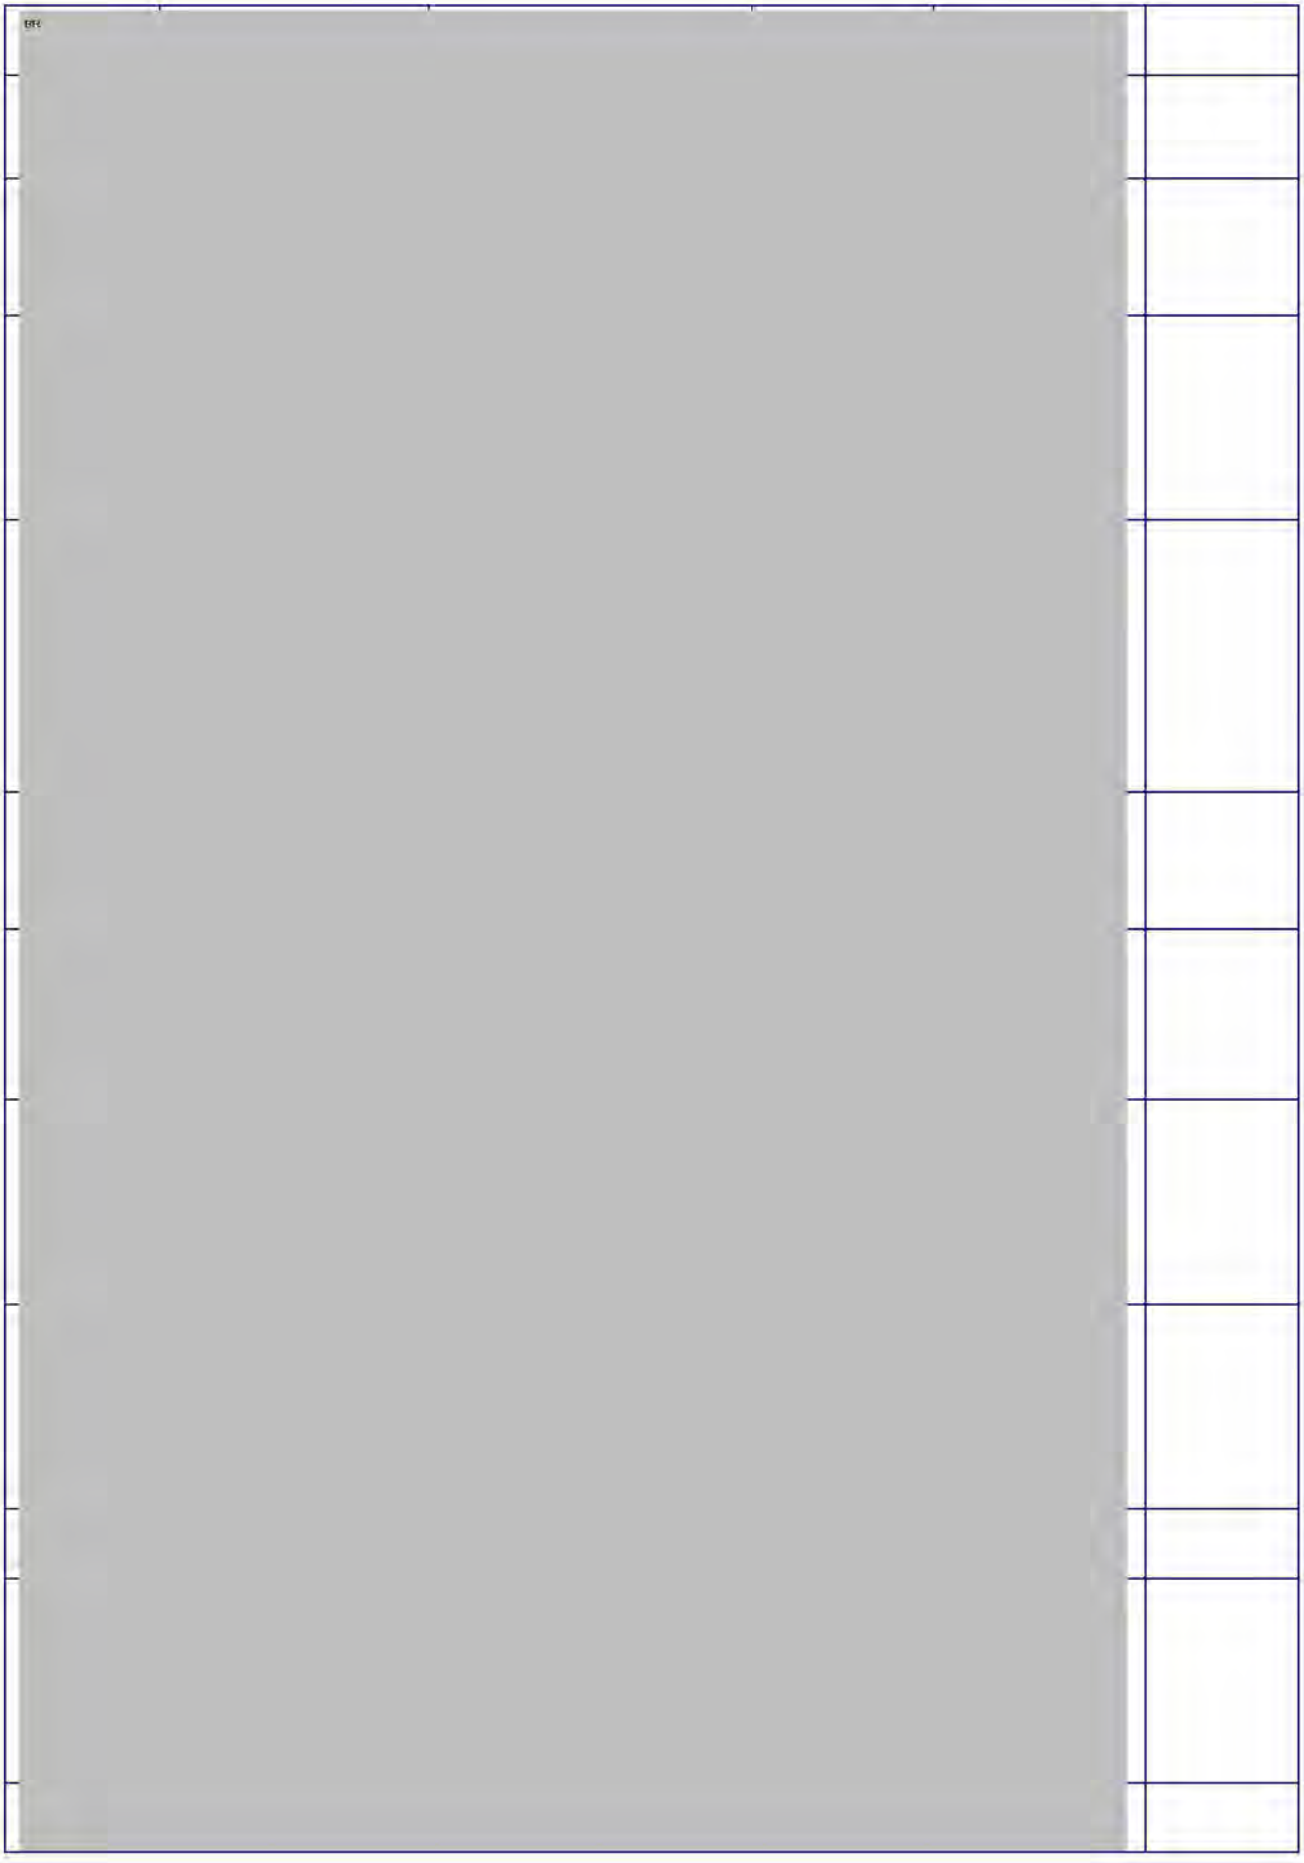

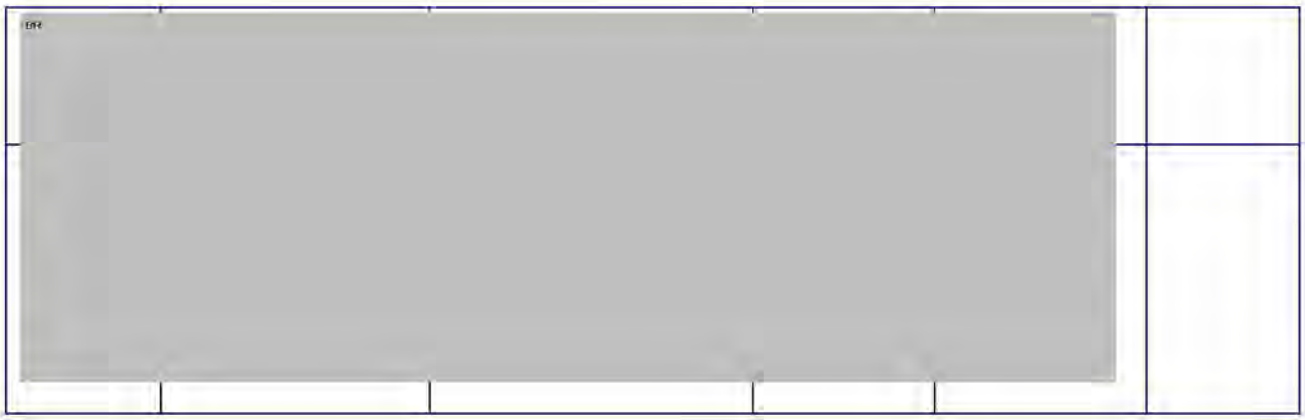

Docnr7

Dienst Stadsbeheer
Afdeling Opdrachtgeving

# Rotterdamsebaan

## Voortgangsrapportage

### 2e kwartaal 2015

**Datum: 11 augustus 2015**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie: 1.0**

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd:** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.1<br>d.d.:24 juli 2015 | Versie 0.2<br>d.d. 7 augustus 2015 | Versie 0.3<br>d.d.: 10 augustus 2015 | Versie 1.0<br>d.d.: 3 september 2015 | Versie 1.0<br>d.d.: 10 september 2015 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Directeur Dienst Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever Rotterdamsebaan | Dhr. B. Revis, wethouder Verkeer, Binckhorst en Vlietzone / Portefeuillehouder Rotterdamsebaan |

# Inhoudsopgave

**1. Inleiding ..... 5**
**2. Planstudies ..... 7**
2.1 Afgelopen kwartaal ..... 7
2.2 Komende kwartaal ..... 7
**3. Omgevingsmanagement ..... 8**
3.1 Afgelopen kwartaal ..... 8
3.2 Komend kwartaal ..... 9
**4. Verwerving ..... 10**
4.1 Afgelopen kwartaal ..... 10
4.2 Komende kwartaal ..... 11
**5. Vergunningen en overeenkomsten ..... 12**
5.1 Afgelopen kwartaal ..... 12
5.2 Komende kwartaal ..... 13
**6. Conditionering Binckhorstlaan ..... 14**
6.1 Afgelopen kwartaal ..... 14
6.2 Komende kwartaal ..... 14
**7. Conditionering Vlietzone ..... 15**
7.1 Afgelopen kwartaal ..... 15
7.2 Komende kwartaal ..... 15
**8. Voorbereiding t.b.v. hoofdcontract ..... 16**
8.1 Afgelopen kwartaal ..... 16
8.2 Komende kwartaal ..... 17
**9. Spoorboogweg, Regulusweg, Verlengde Mercuriusweg/Mercuriusweg-Oost en Verlengde-Melkwegstraat ..... 18**
9.1 Afgelopen kwartaal ..... 18
9.2 Komende kwartaal ..... 18
**10. Tunnelveiligheid ..... 19**
10.1 Afgelopen kwartaal ..... 19
10.2 Komend kwartaal ..... 19
**11. Aanbesteding hoofdcontract ..... 20**
11.1 Afgelopen kwartaal ..... 20
11.2 Komende kwartaal ..... 20
**12. Aanbesteding nevencontracten ..... 21**
12.1 Afgelopen kwartaal ..... 21
12.2 Komende kwartaal ..... 21
**13. Communicatie ..... 22**
13.1 Afgelopen kwartaal ..... 22
13.2 Komende kwartaal ..... 22
**14. Beheer en overdracht ..... 23**
14.1 Afgelopen kwartaal ..... 23
14.2 Komend kwartaal ..... 23
**15. Organisatie ..... 24**
15.1 Afgelopen kwartaal ..... 24
15.2 Komend kwartaal ..... 24
**16. Financiën ..... 25**
16.1 Kostenstructuur ..... 25

16.2 Dekkingen....26
**17. Risicobeheer....29**
17.1 Afgelopen kwartaal....29
17.2 Komende kwartaal....29
17.3 Financiële toprisico's....29
17.4 Toprisico's planning....31
**18. Planning....34**
18.1 Afgelopen kwartaal....34
18.2 Komende kwartaal....34
**19. Scopemanagement....35**
19.1 Afgelopen kwartaal....35
19.2 Komende kwartaal....35
**20. Kwaliteitsbeheer....36**
20.1 Afgelopen kwartaal....36
20.2 Komende kwartaal....36
**21. Informatiebeheer....37**
21.1 Afgelopen kwartaal....37
21.2 Komend kwartaal....37
**Bijlage 1: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan....38**
**Bijlage 2: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer....40**

# 1. Inleiding

**Terugblik tweede kwartaal 2015**

- College heeft concept-bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. vrijgeven voor inspraak;

[redacted]

**Bestuurlijke besluitvorming**
In 2015 zal een aantal bestuurlijke besluiten worden genomen:

[redacted]

- Raadsbesluit bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. (najaar 2015);

[redacted]

# 2. Planstudies

## 2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Opstellen bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. en in procedure brengen | Ontwerp-bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. is in procedure gebracht. Ligt ter inzage vanaf 12 juni tot en met 23 juli 2015 |
| | |
| BR | |
| | |
| | |

| Geplande besluiten | Genomen besluiten |
|---|---|
| Collegebesluit: vrijgave bestemmingsplan Molenvlietpark voor inspraak | Collegebesluit 2 juni 2015: vrijgave ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. |
| | |

## 2.2 Komende kwartaal

| |
|---|
| BR |
| |
| **Besluiten** |
| Collegebesluit vaststelling bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. (gepland 01-09-2015) |
| BR |
| |

# 3. Omgevingsmanagement

## 3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| De principe overeenstemming met 5.1.2e 5.1.2e om de inlaat naar de waterberging in het Molenvlietpark op zijn gronden te realiseren moet in een overeenkomst (met HHD, 5.1.2e gemeente) worden vastgelegd. | Op hoofdlijnen is overeenstemming met 5.1.2e bereikt over een conceptovereenkomst. Punten van discussie: opschortende voorwaarden (koppeling met ontwikkeling Nw Vredenoord) en (woon)bestemming opstallen op Nw Vredenoord. |
| Begeleiden en bewaken tot stand komen van bestemmingsplan Molenvlietpark. | In juni vrijgegeven door college voor inspraak |
| Met eigenaar van perceel naast 5.1.2e (5.1.2e ) overeenstemming bereiken over situering Molenvlietpad en waterinlaat. | Op hoofdlijnen is overeenstemming met 5.1.2e bereikt. Overeenkomst moet nog worden opgesteld. (nauw verband met SOK 5.1.2e ) |
| BR | |

## 3.2 Komend kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| |
| De conceptovereenkomst met 5.1.2.e om de inlaat naar de waterberging in het Molenvlietpark op zijn gronden te realiseren afronden ter voorbereiding op behandeling in college in combinatie met ontwikkeling Nw Vredenoord en SOK 5.1.2.e |
| De Samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e afronden |
| |

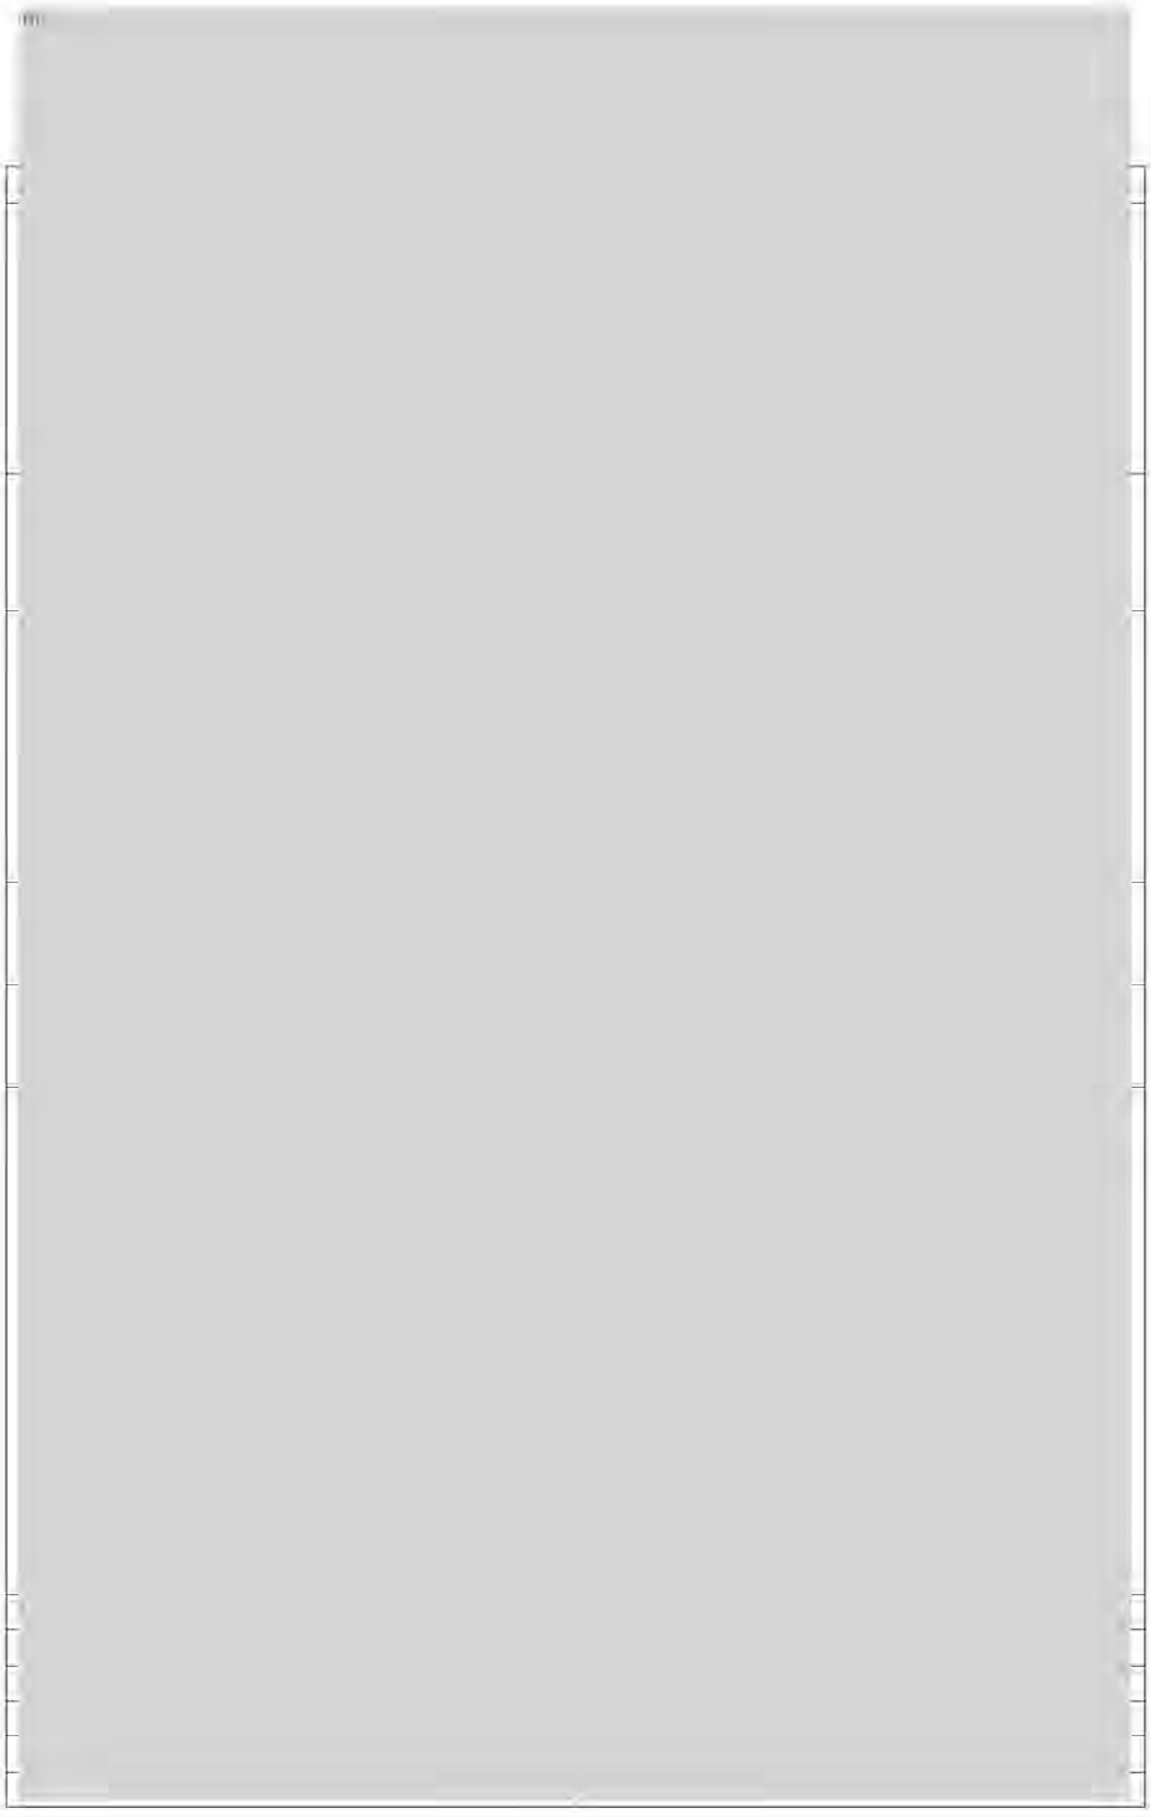

| | |
|---|---|

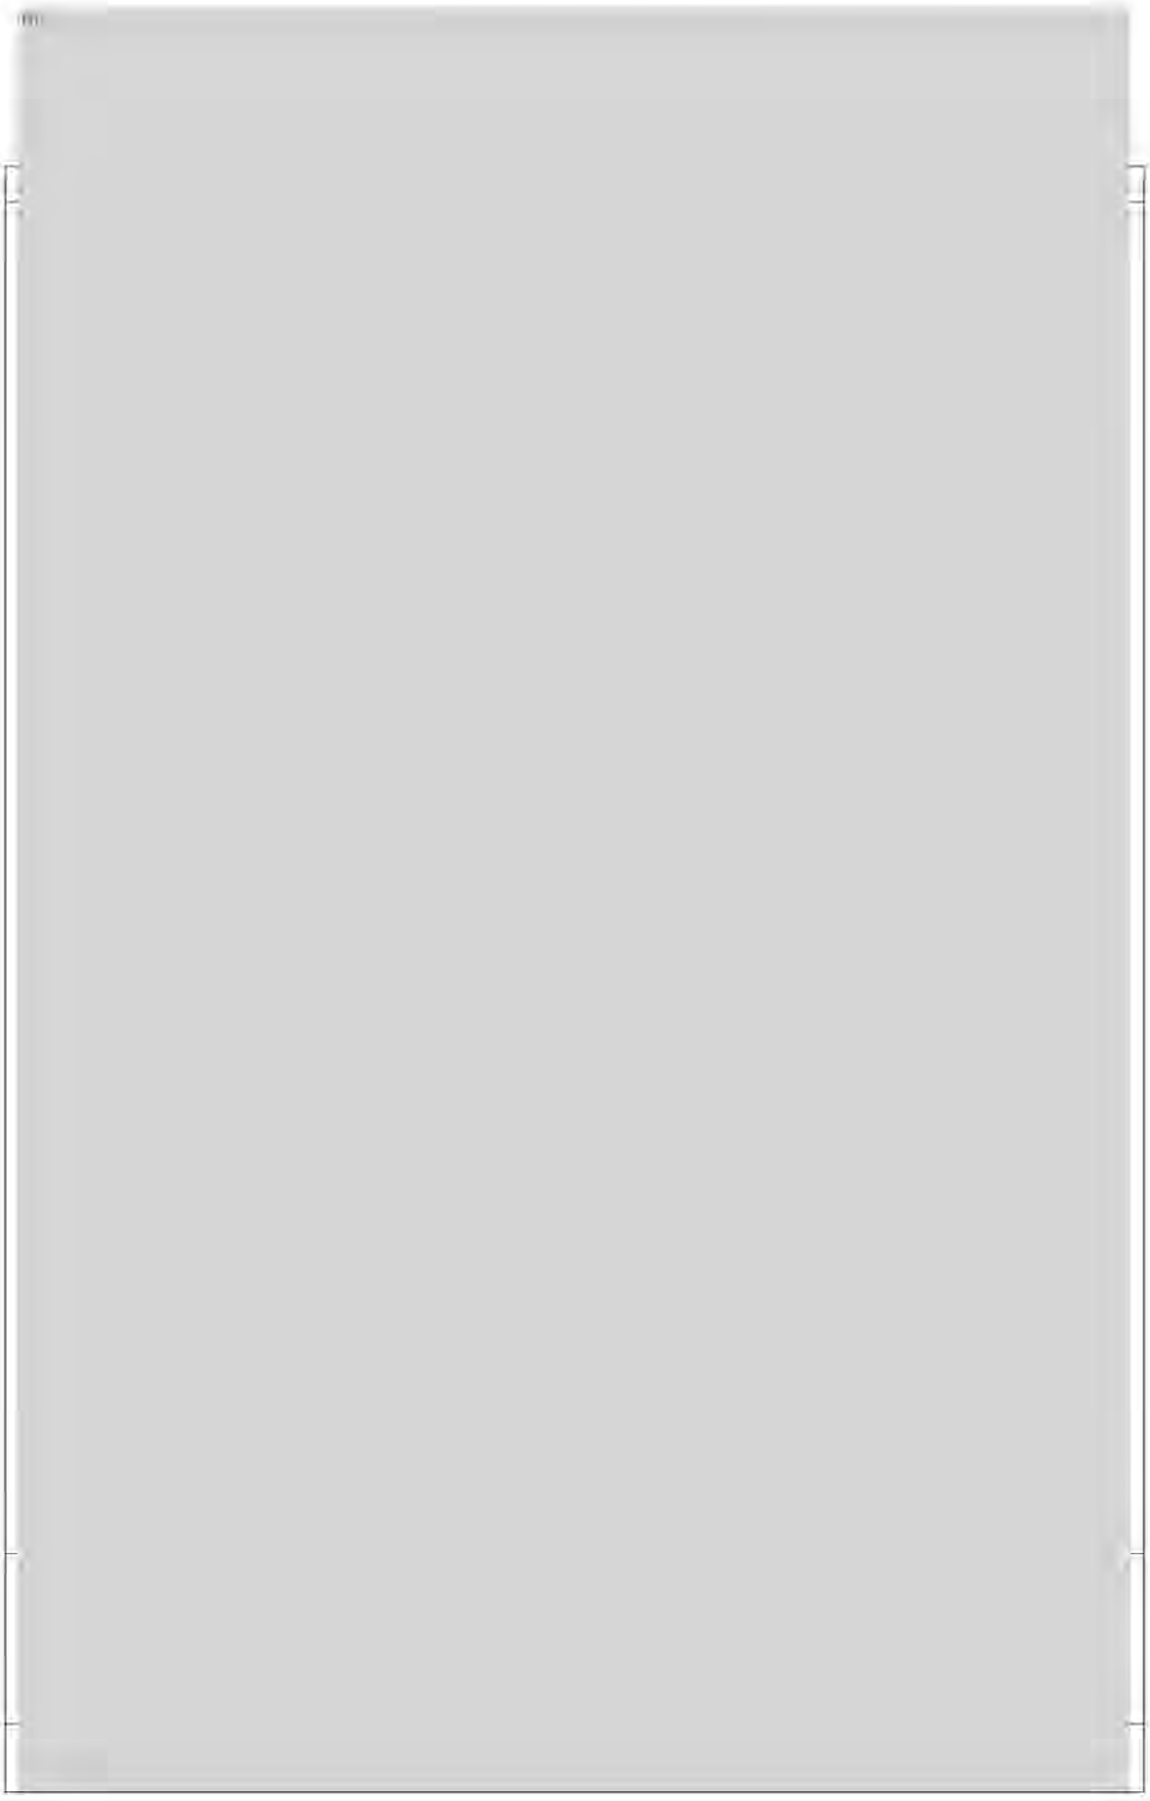

| |
|---|
| [redacted] |
| |

## 5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| [redacted] |
| Werkzaamheden m.b.t. bestemmingplanprocedures ten behoeve van het Molenvlietpark en de 1e herziening Rotterdamsebaan Binckhorstlaan-Zuid. |
| |
| [redacted] |

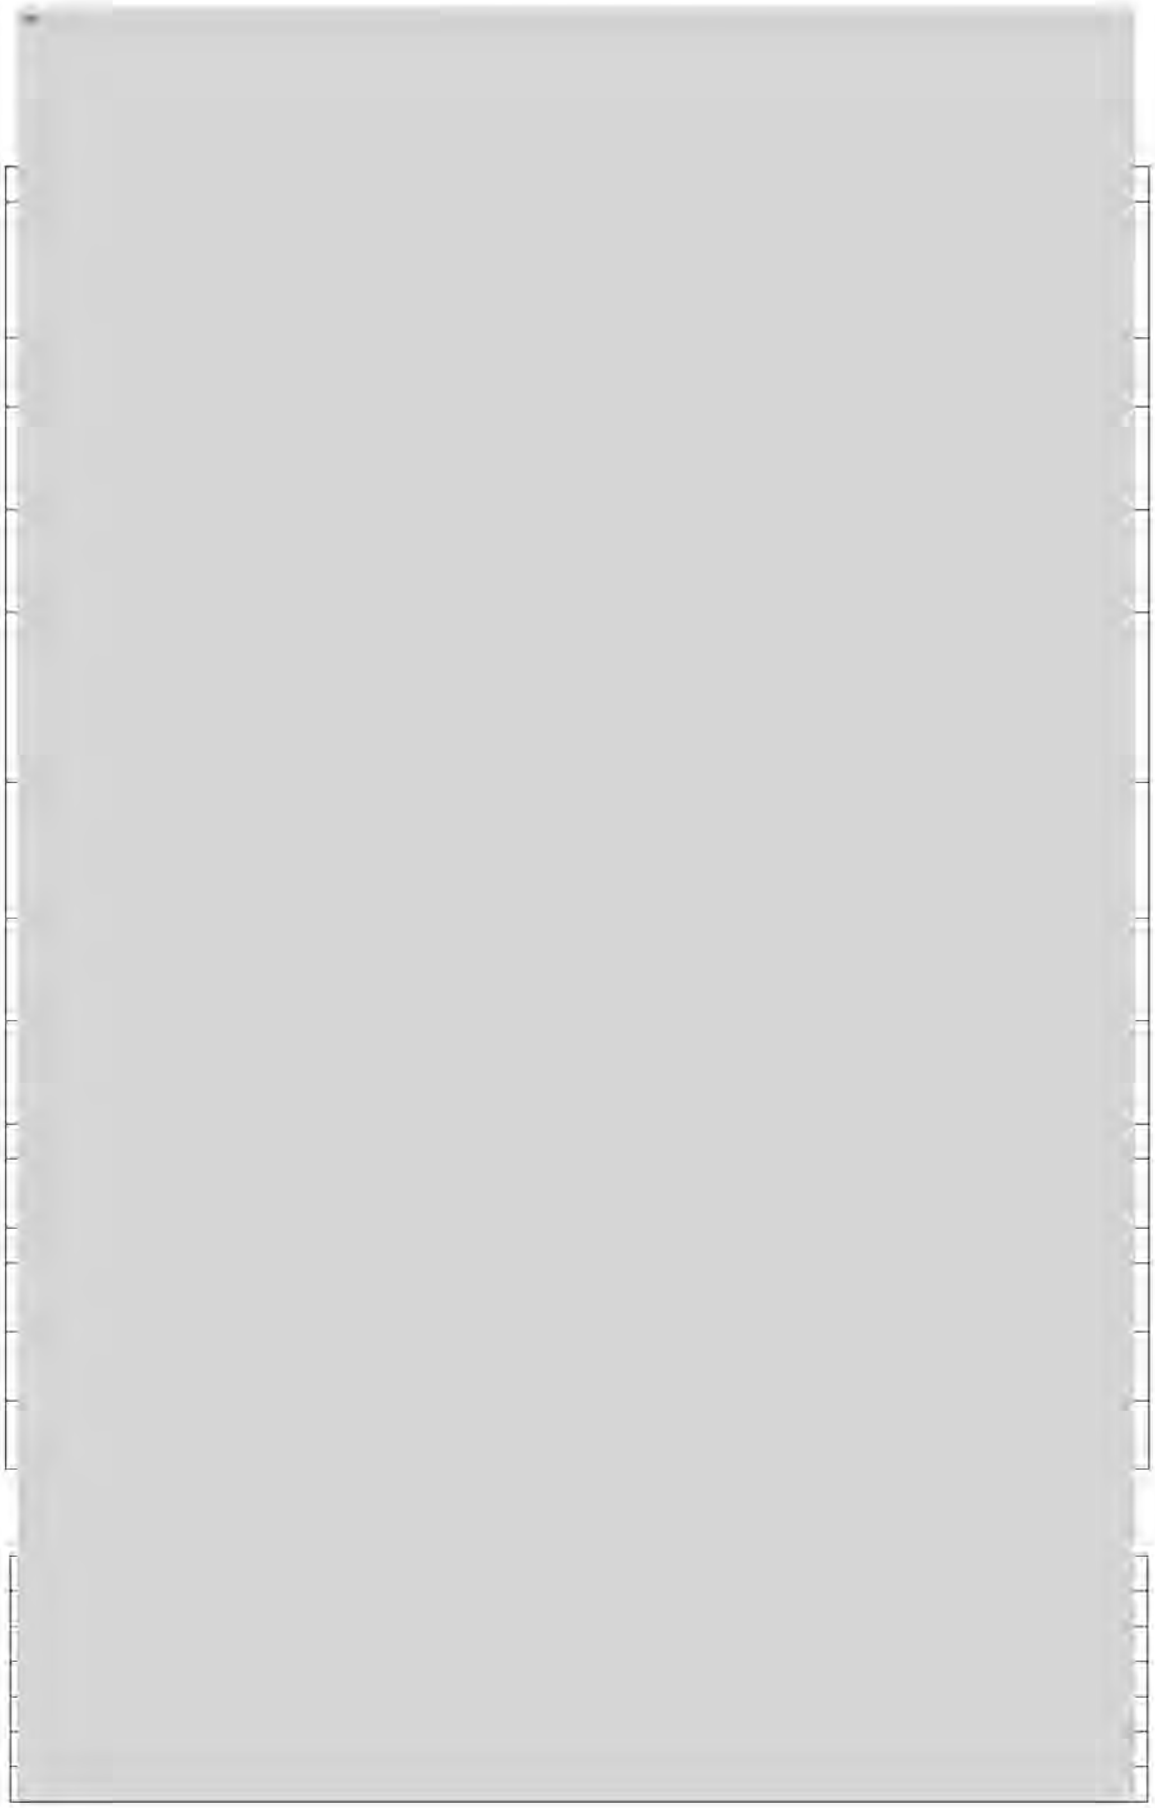

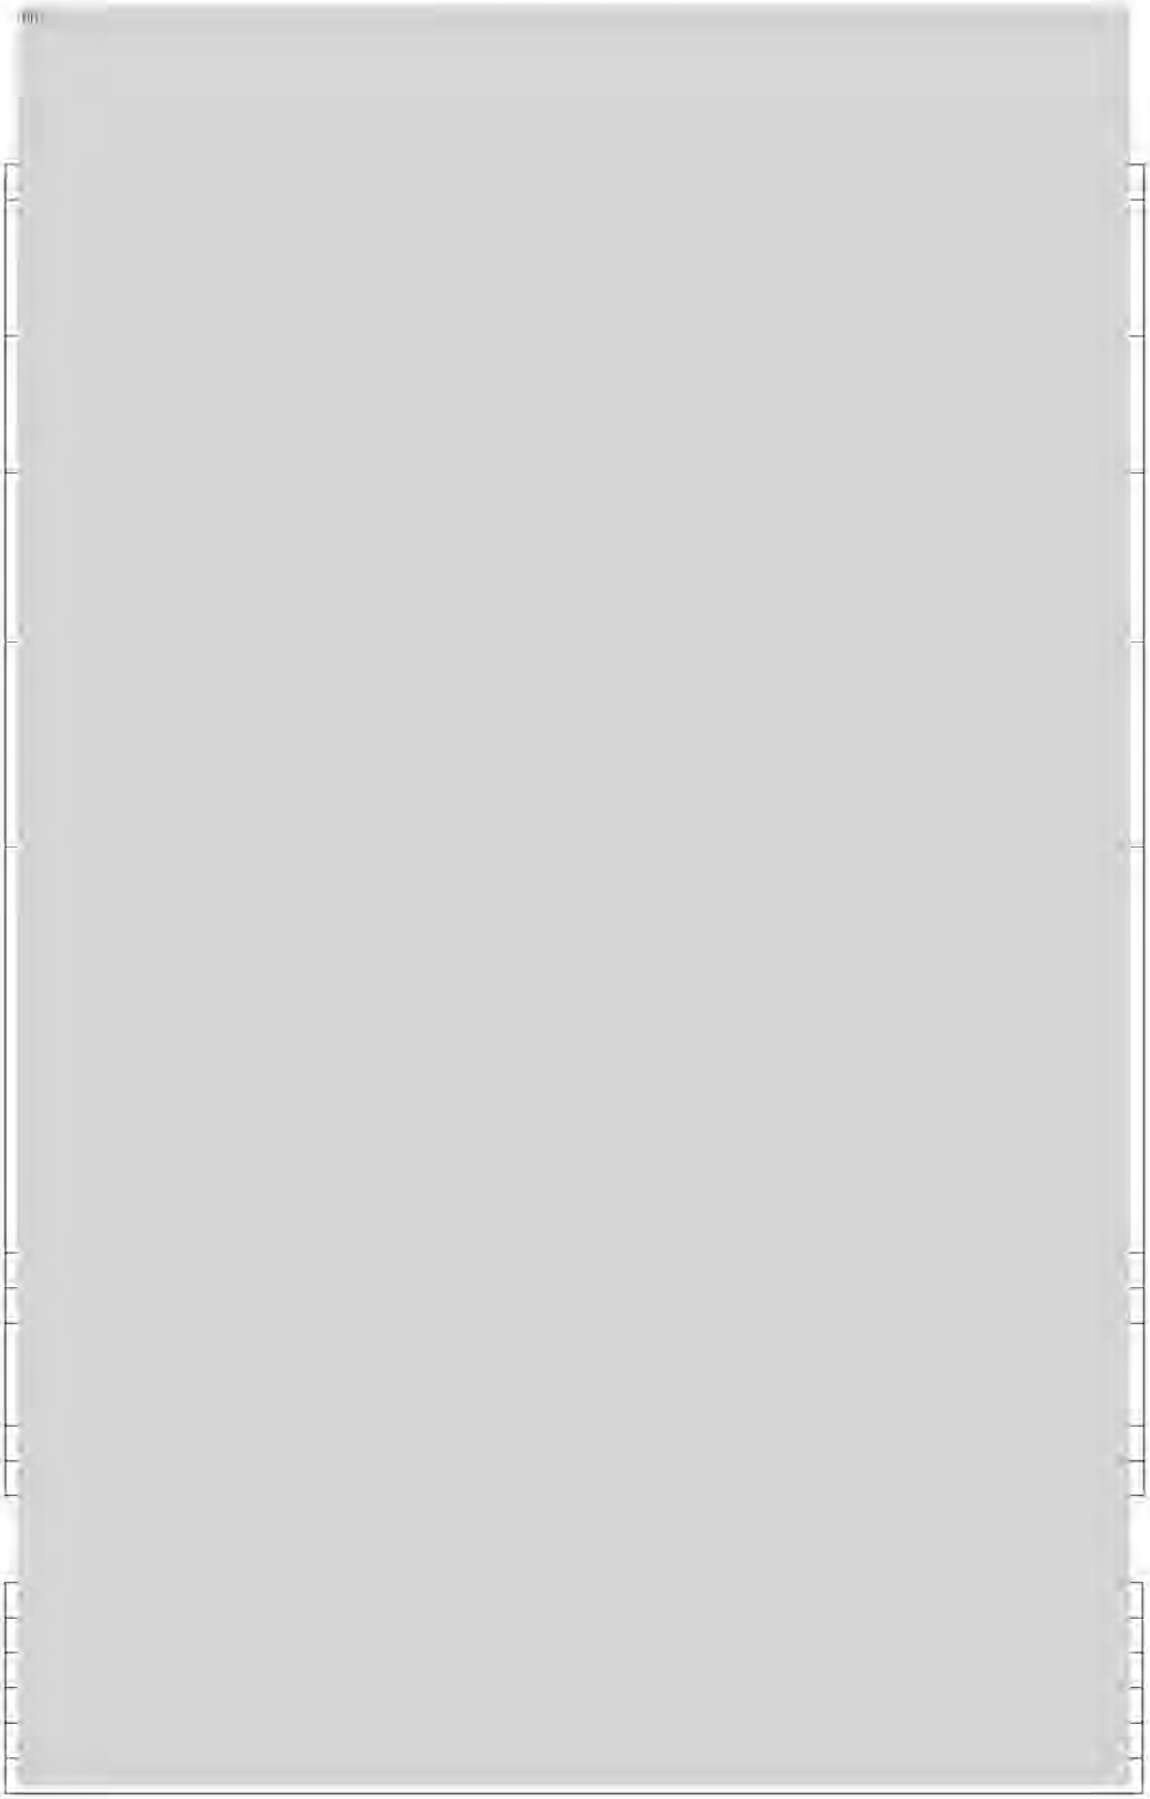

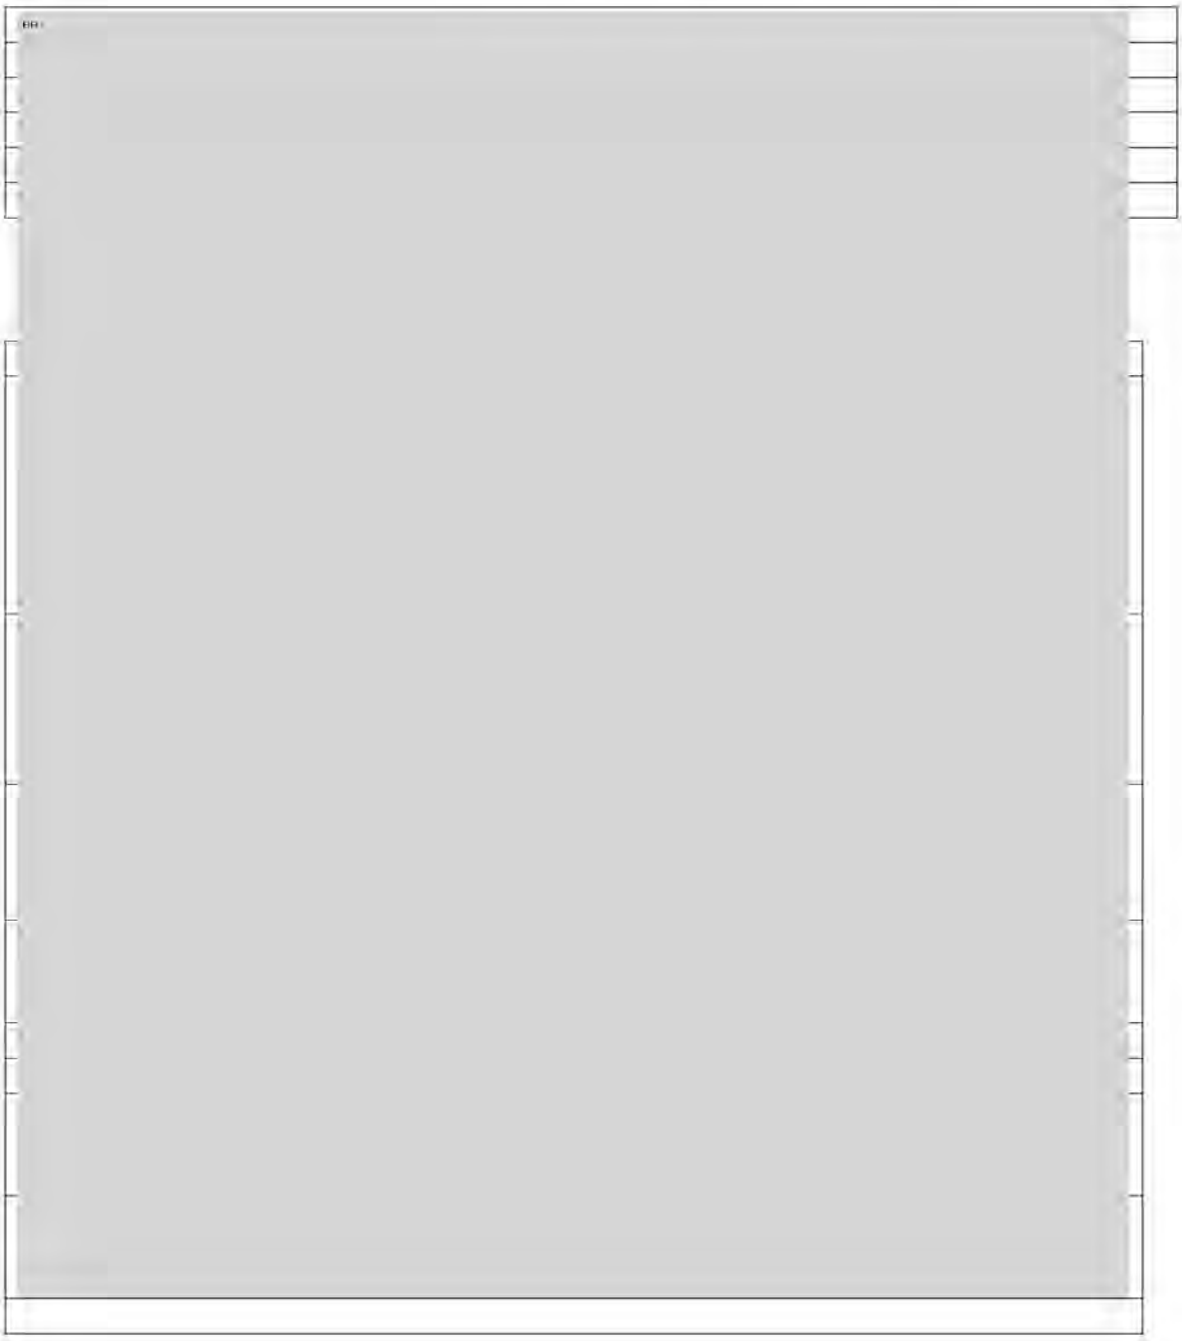

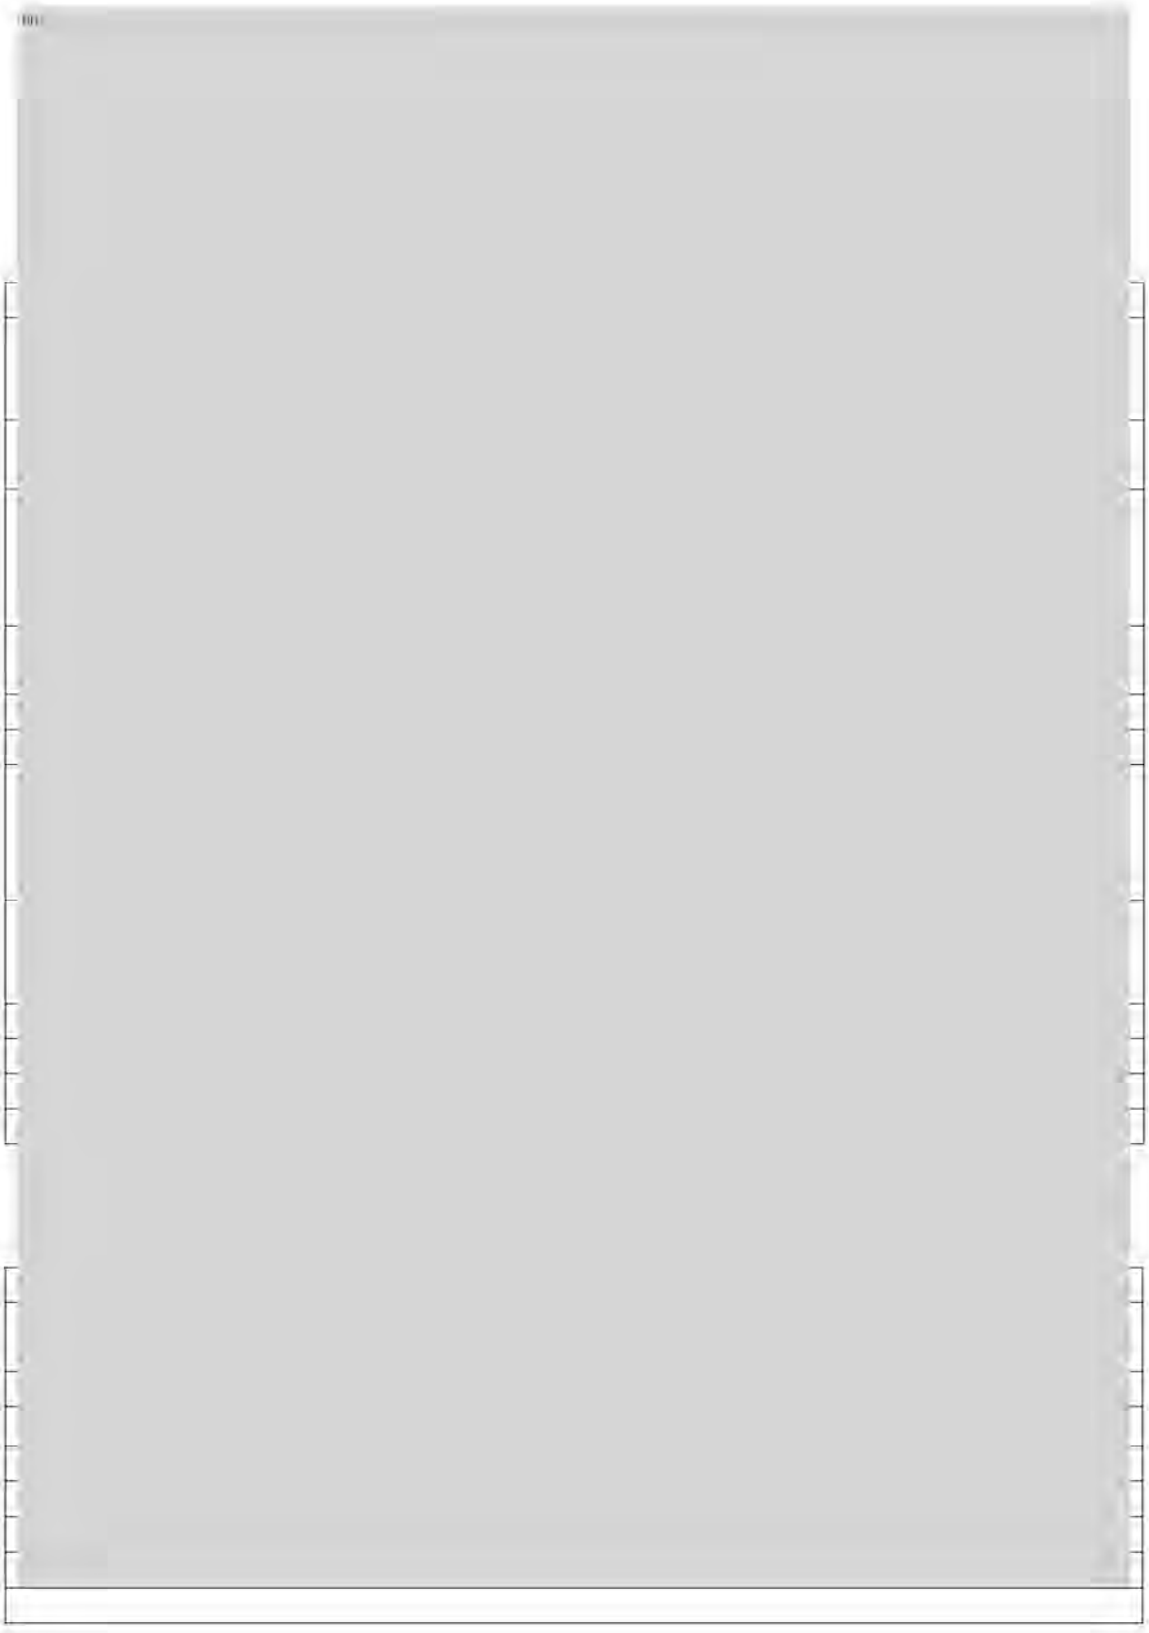

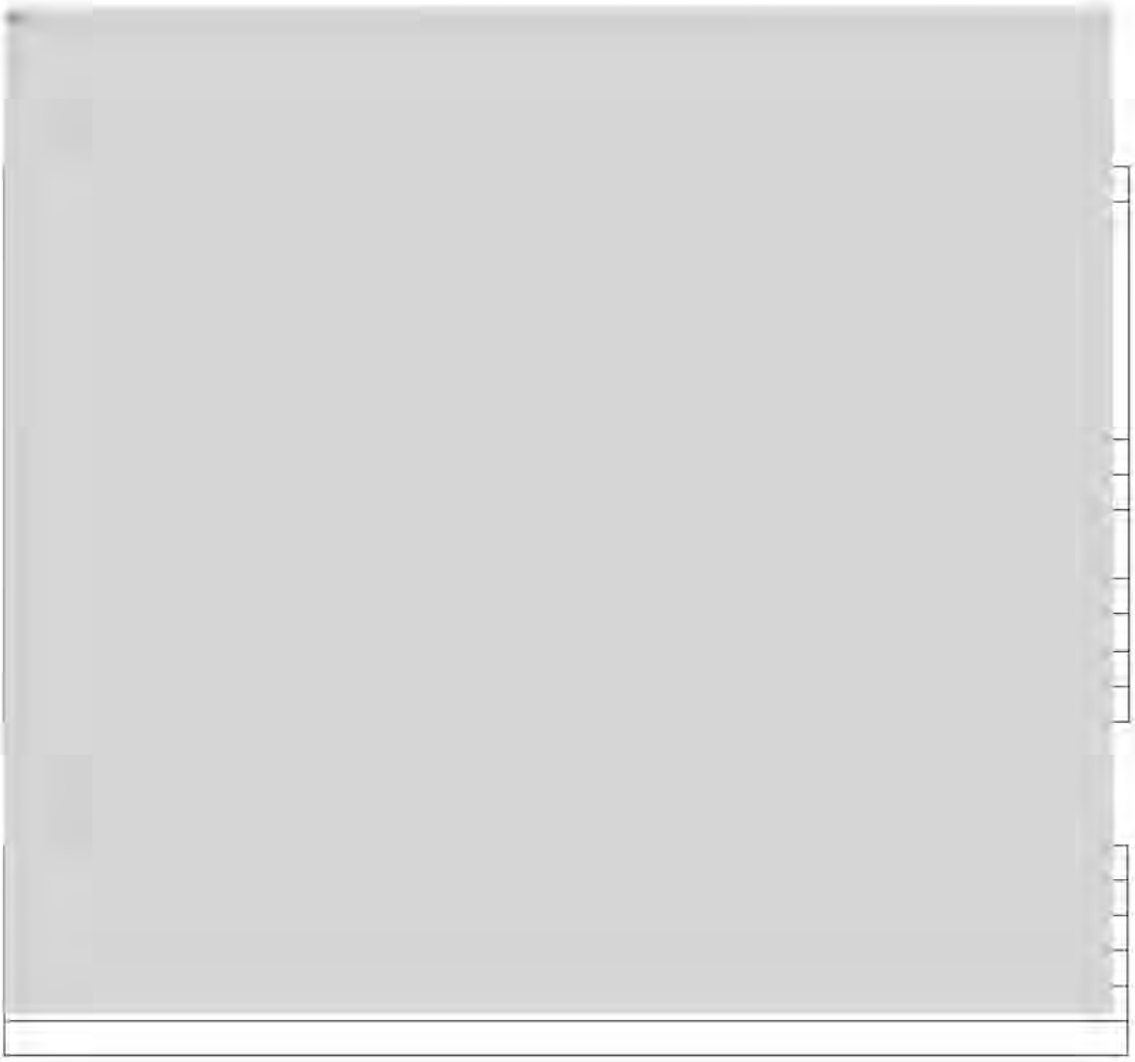

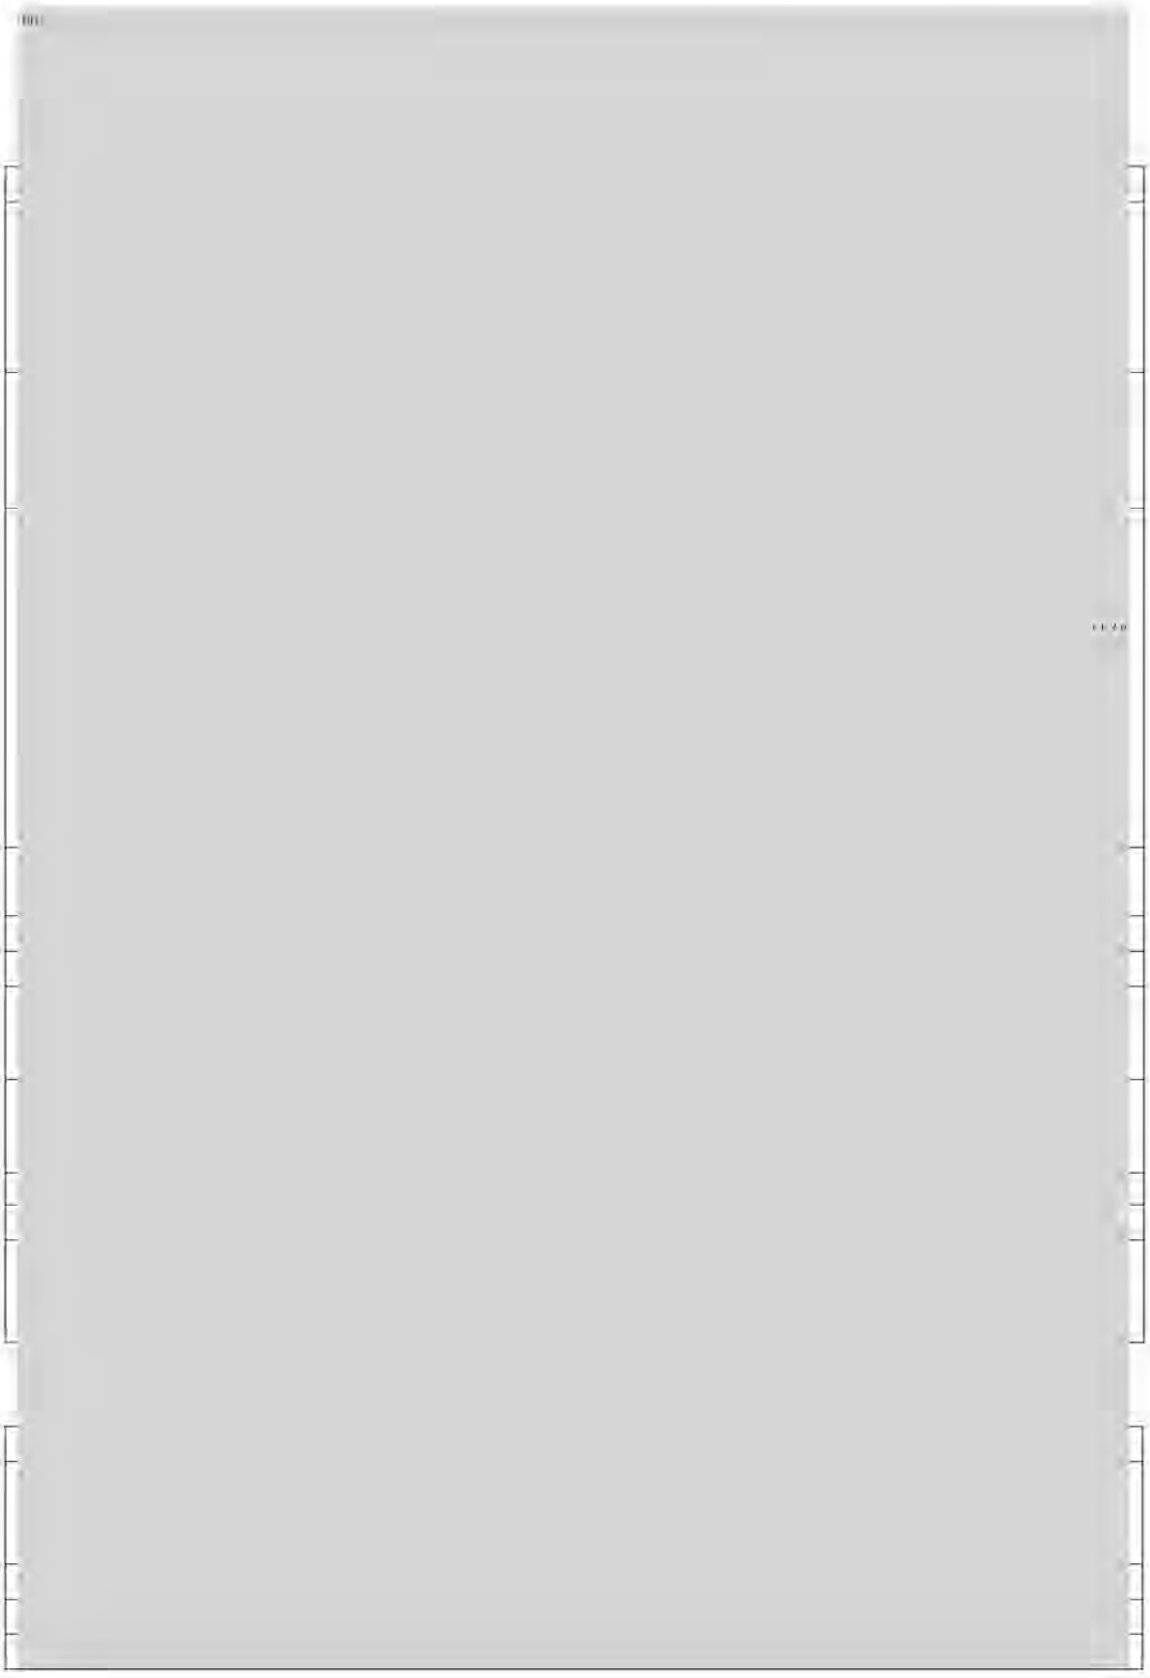

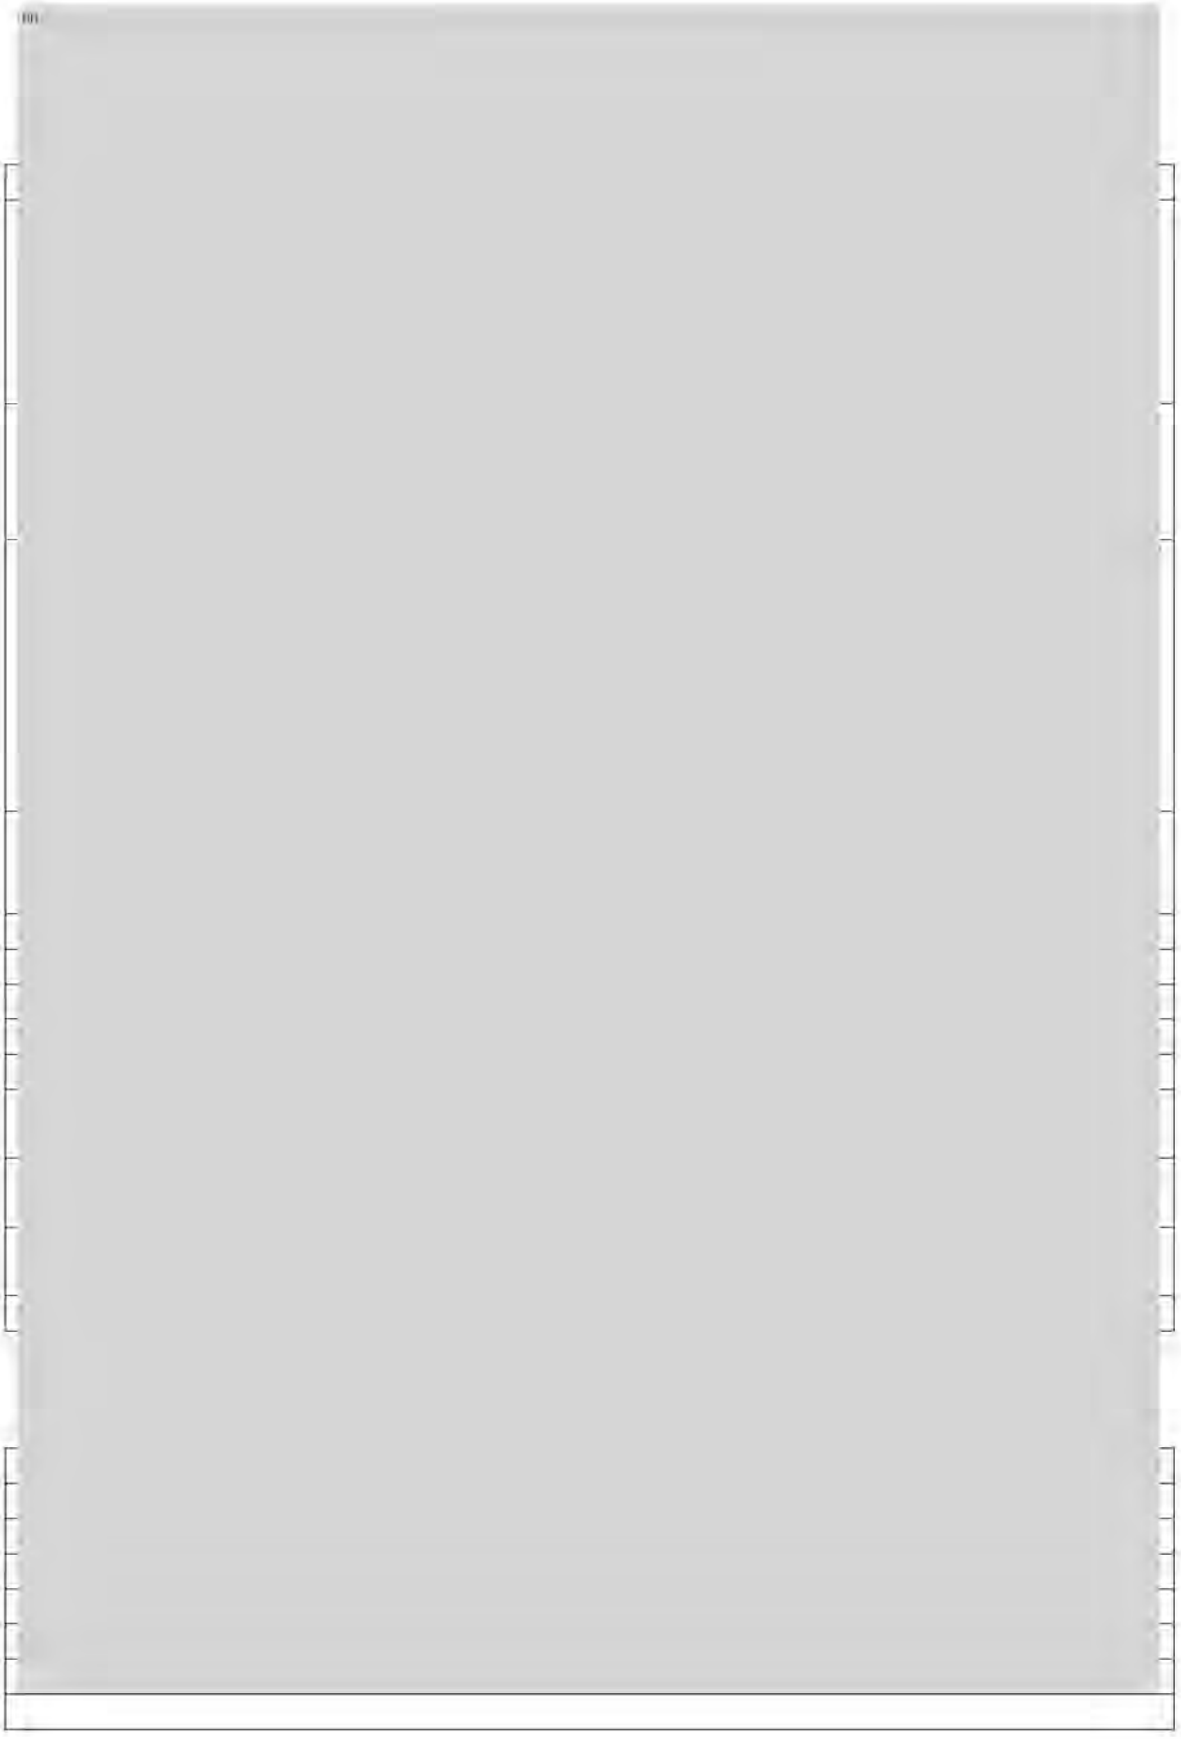

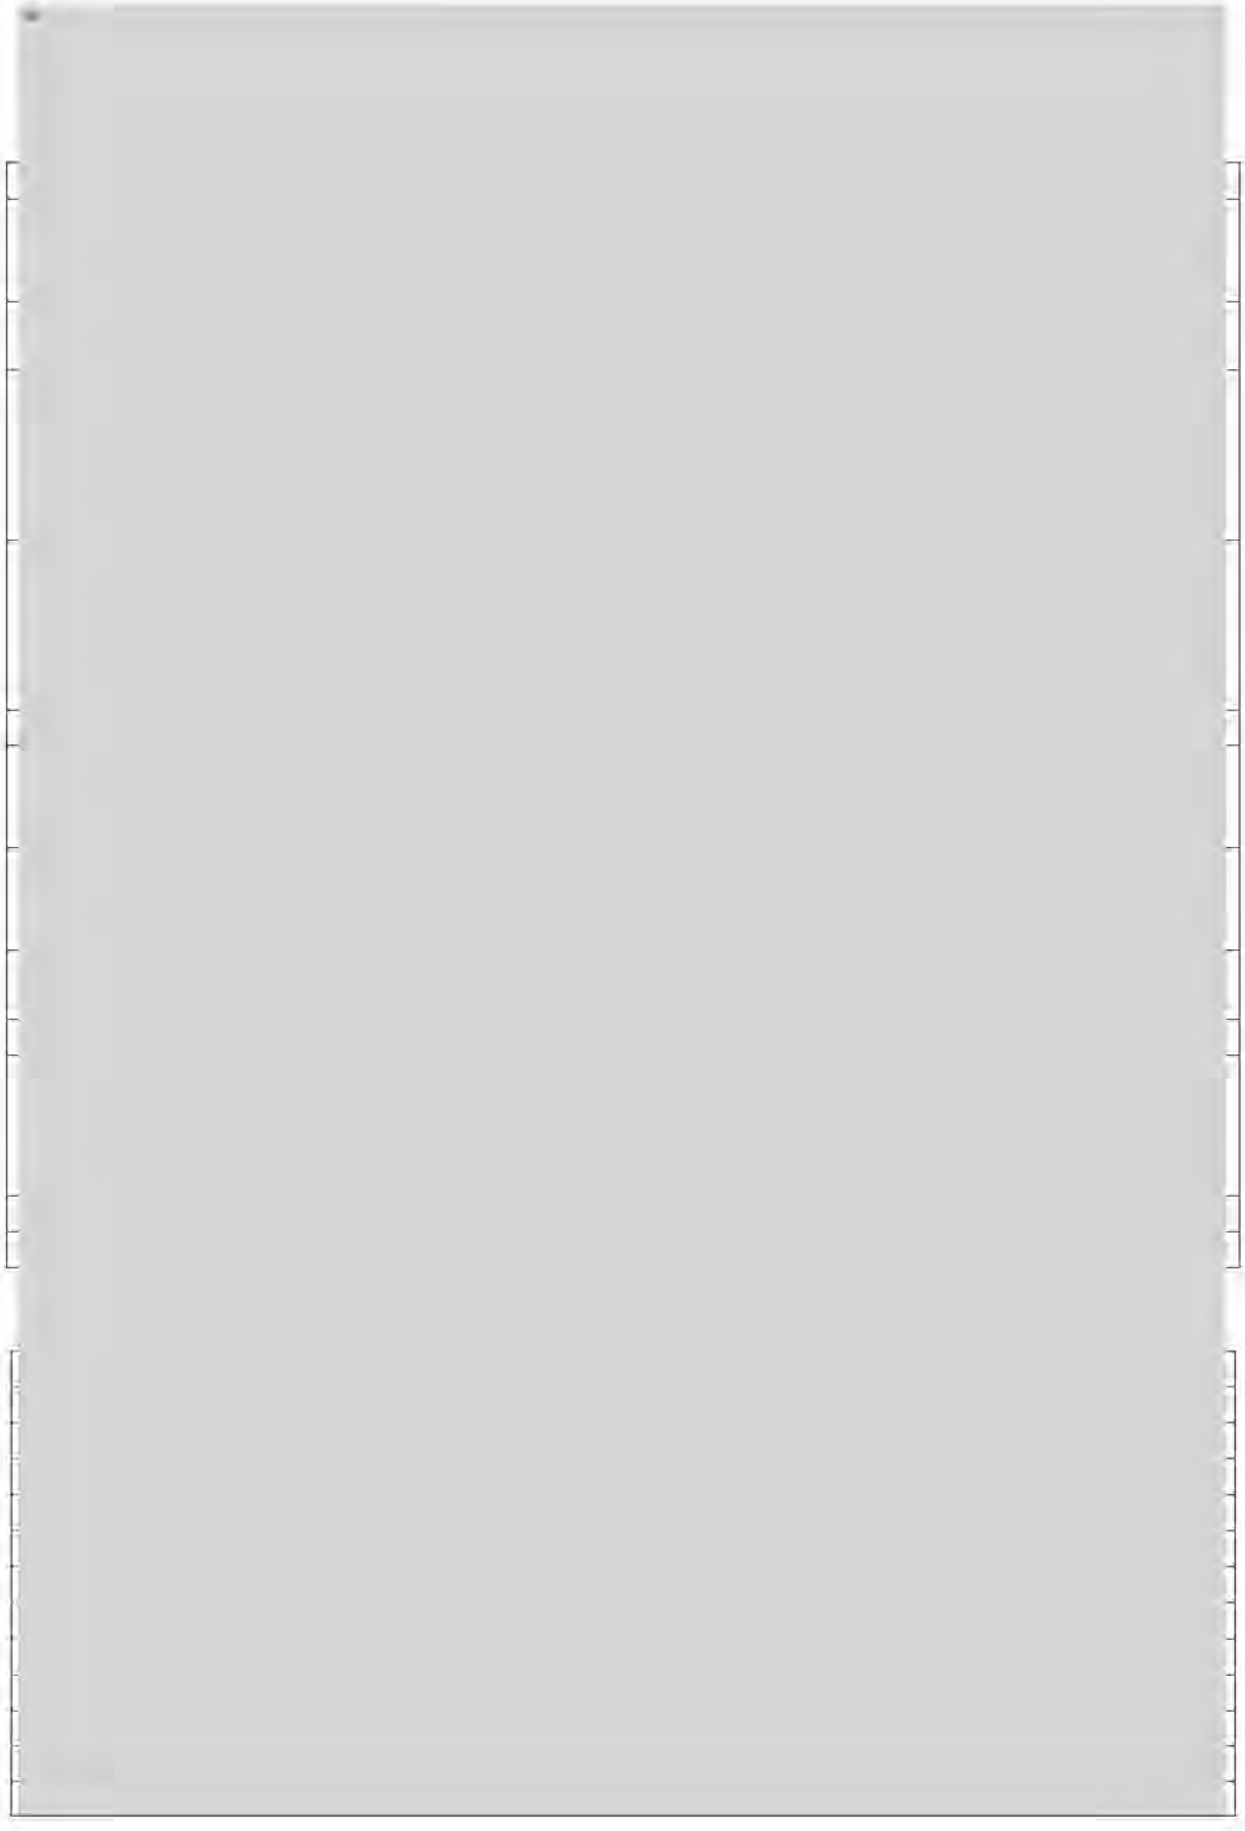

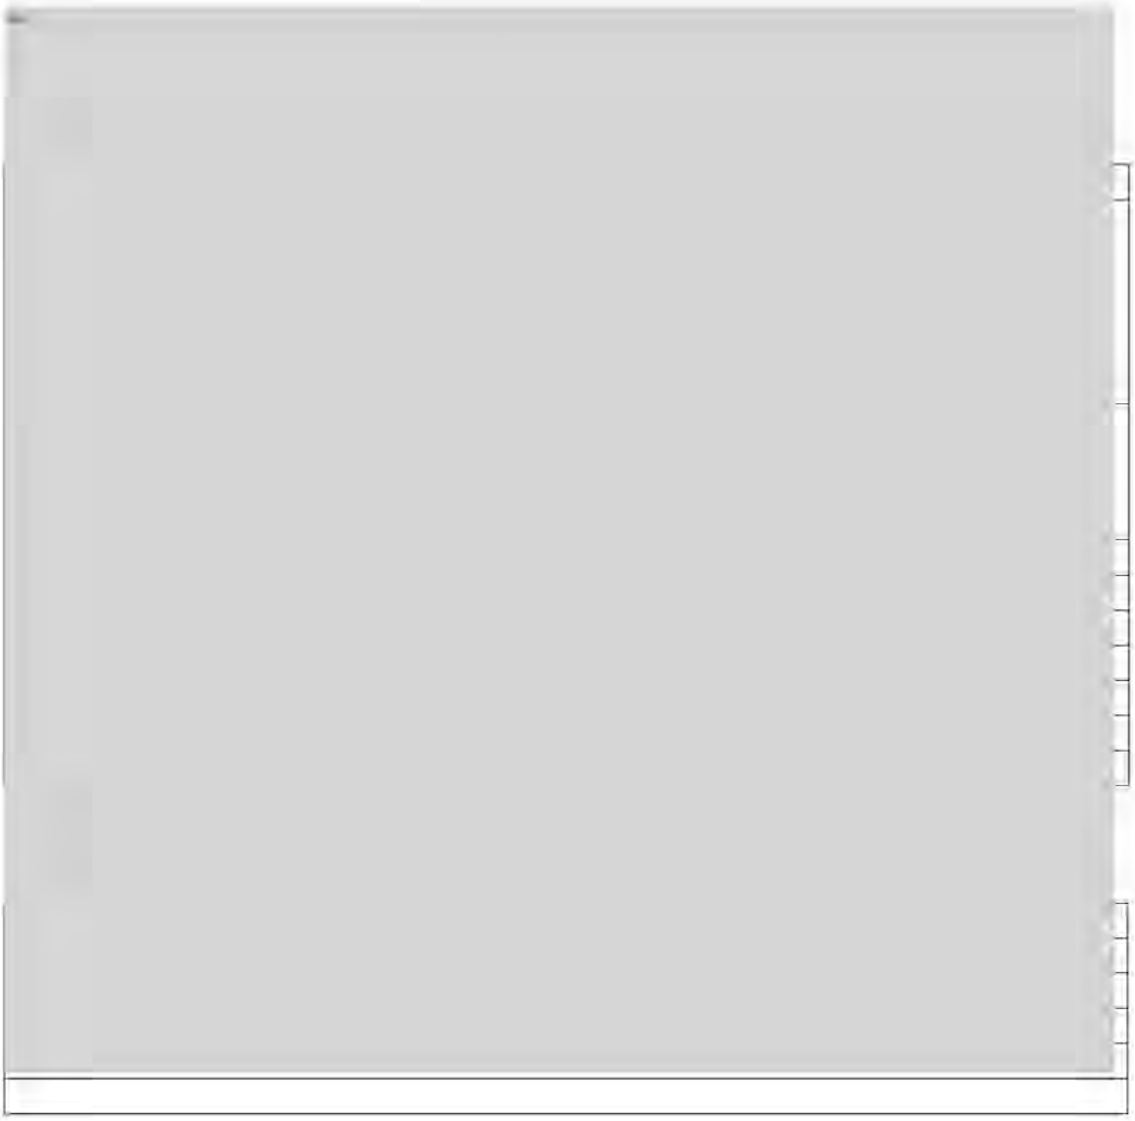

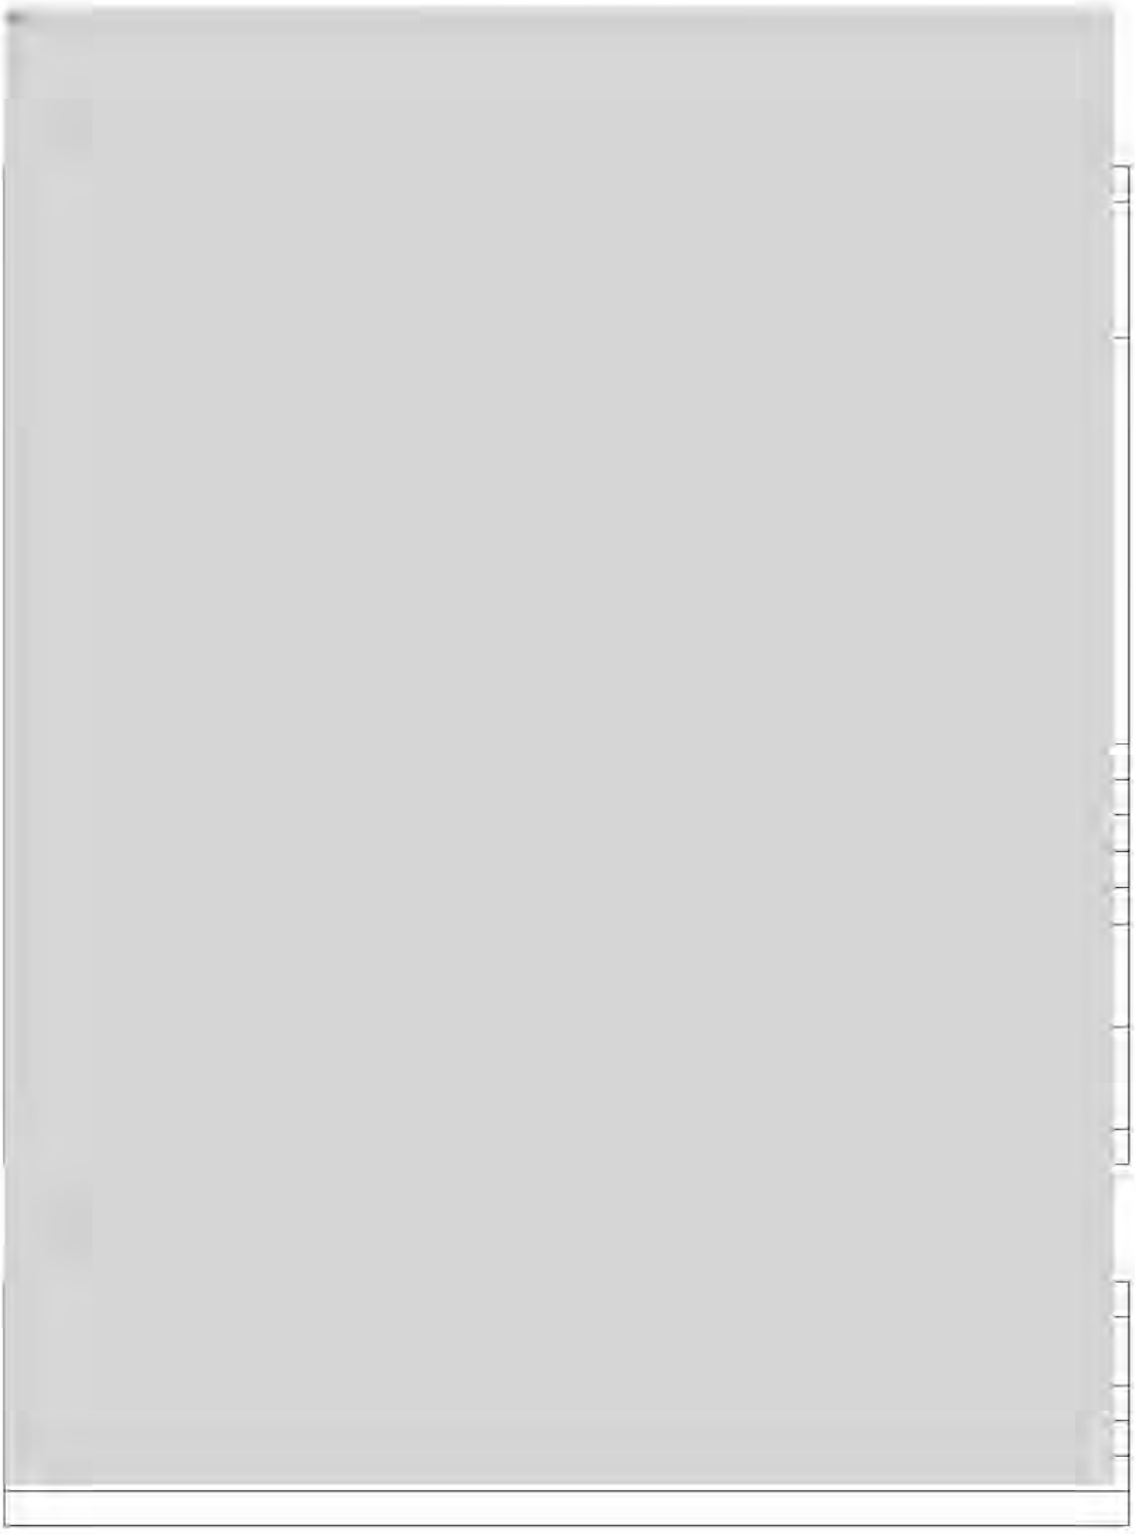

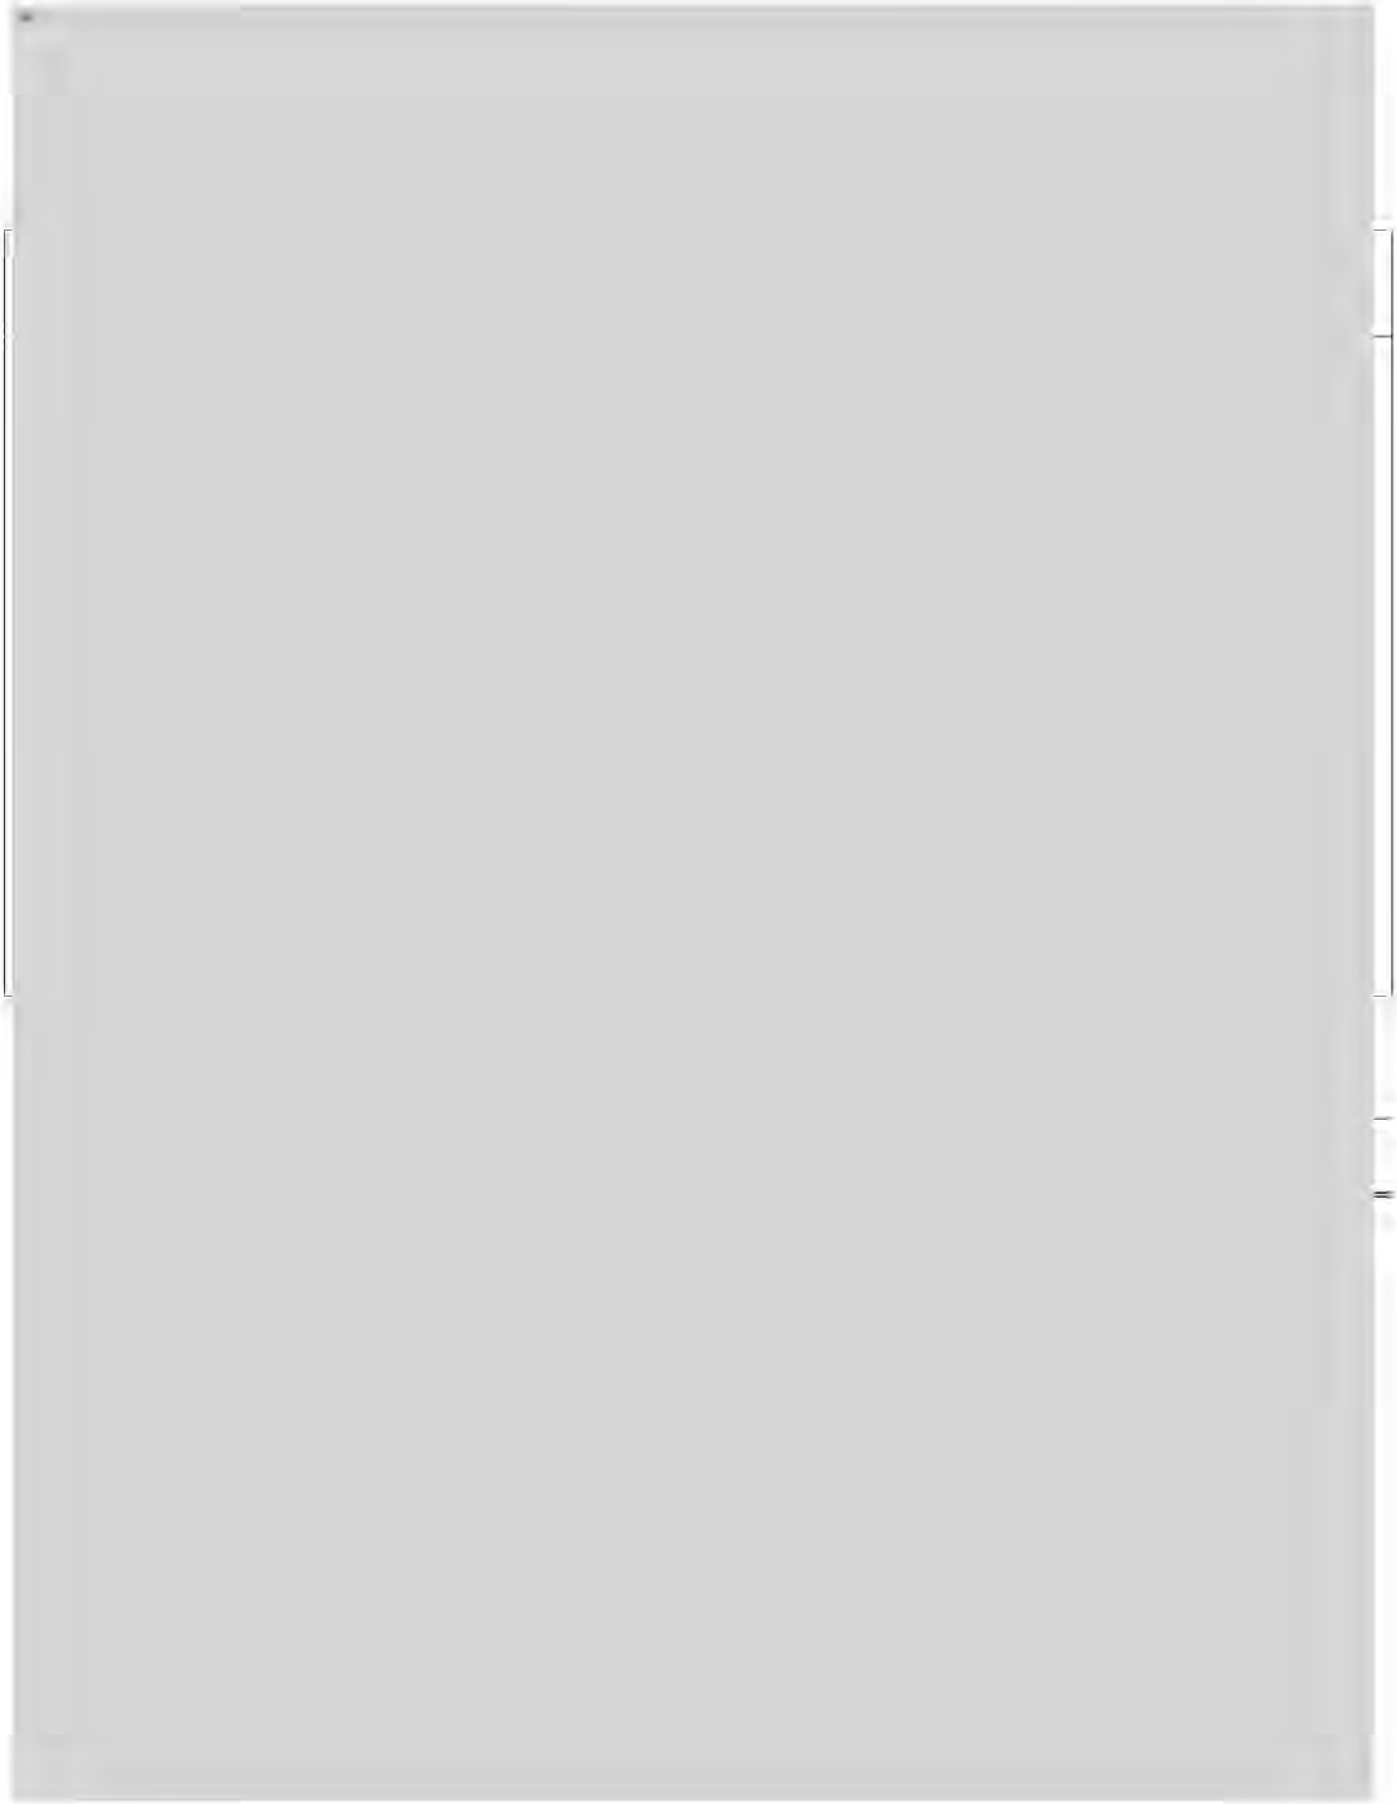

| | | |
|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 |
| 3.4 Bijdrage Prov. Zuid-Holland Molenvlietpark | pm. | pm. |

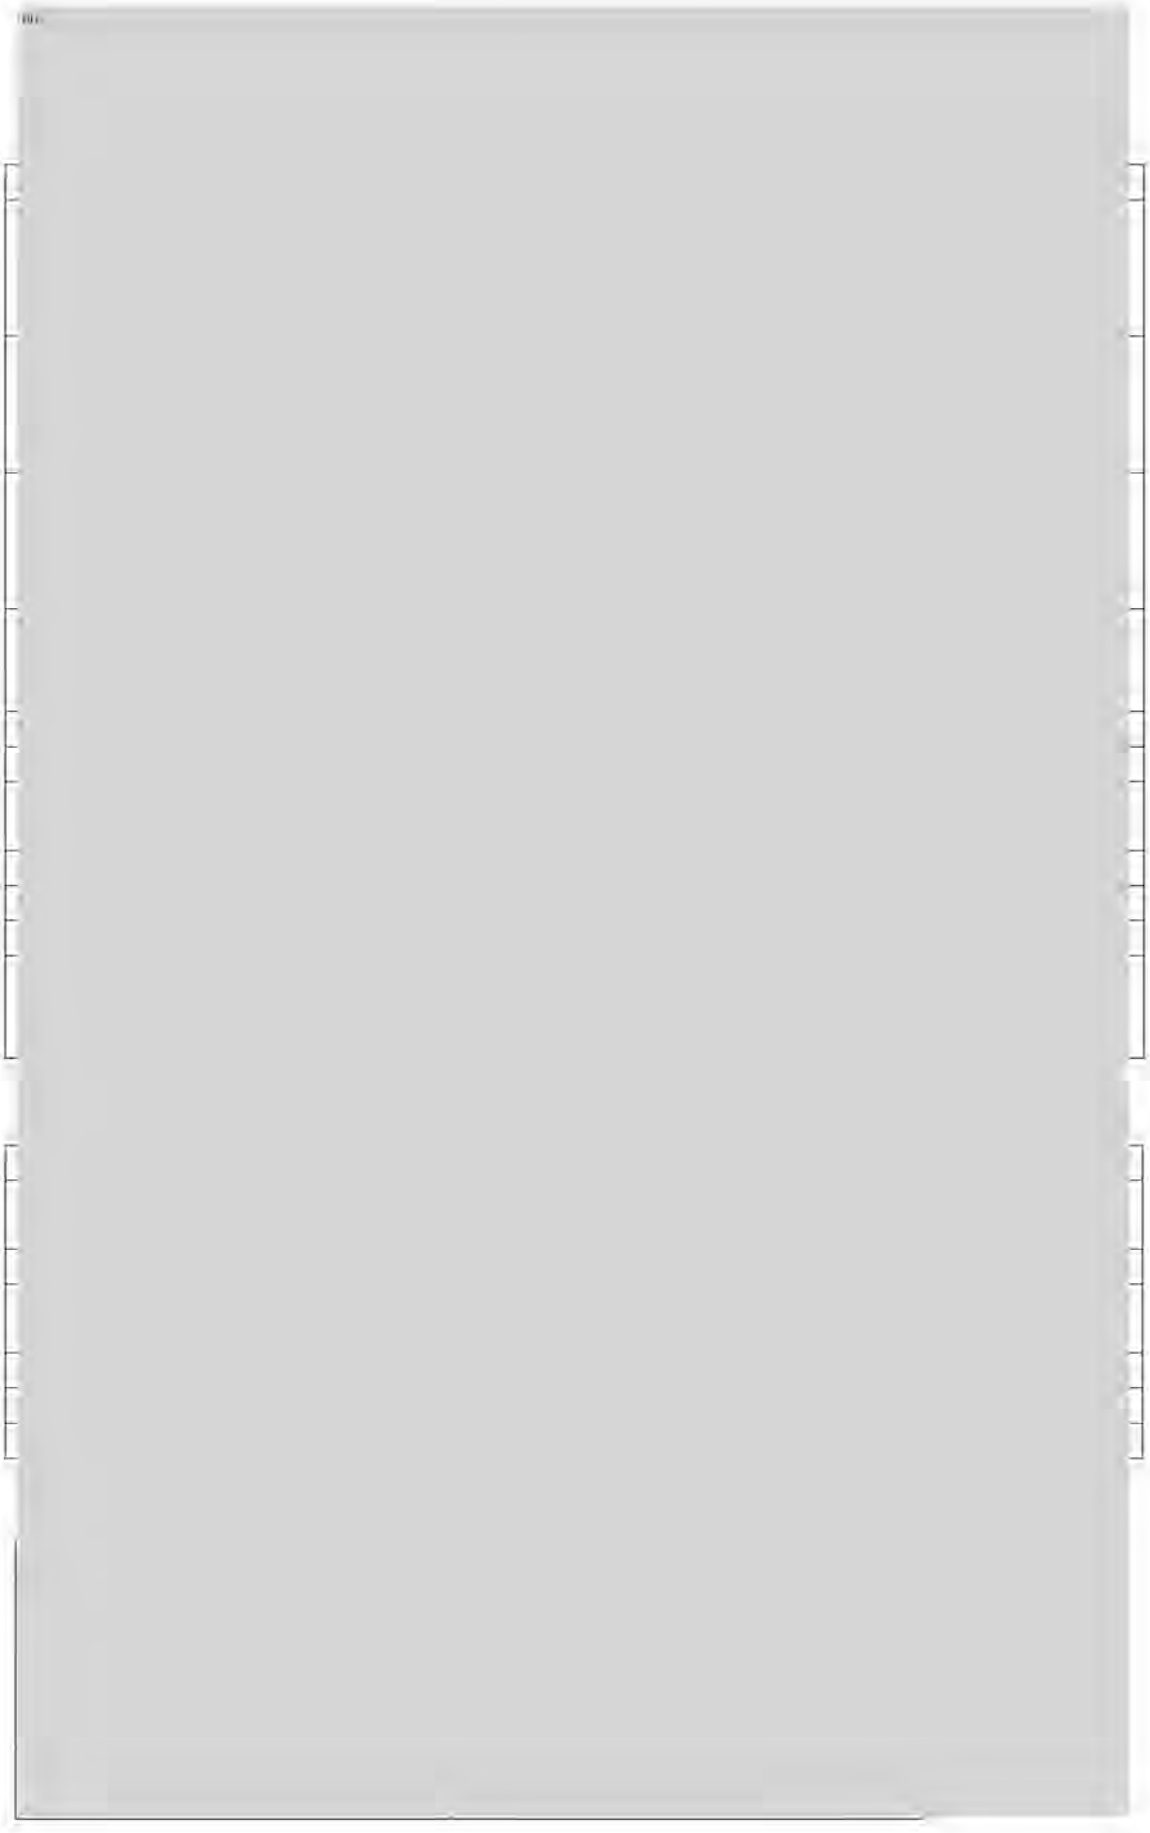

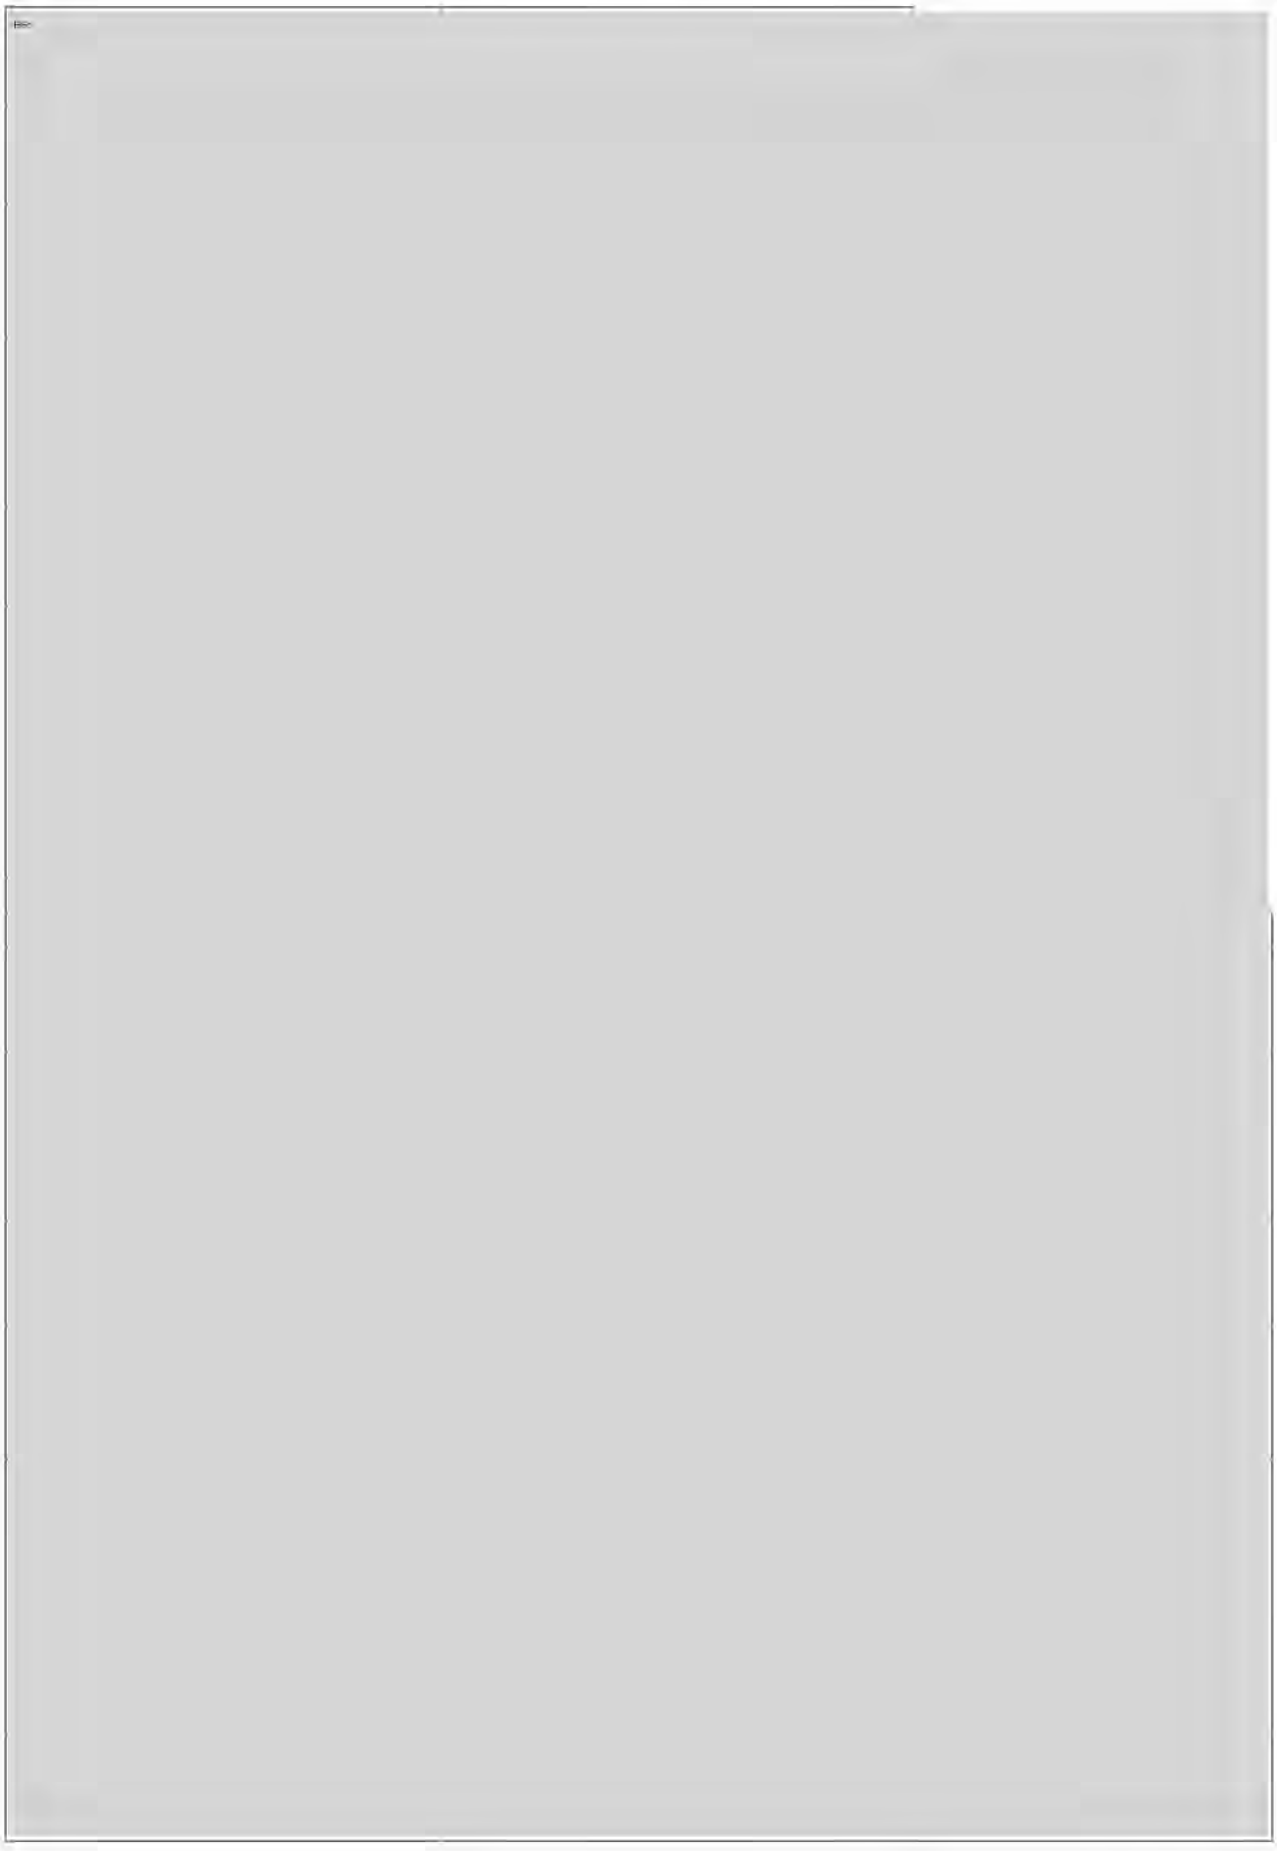

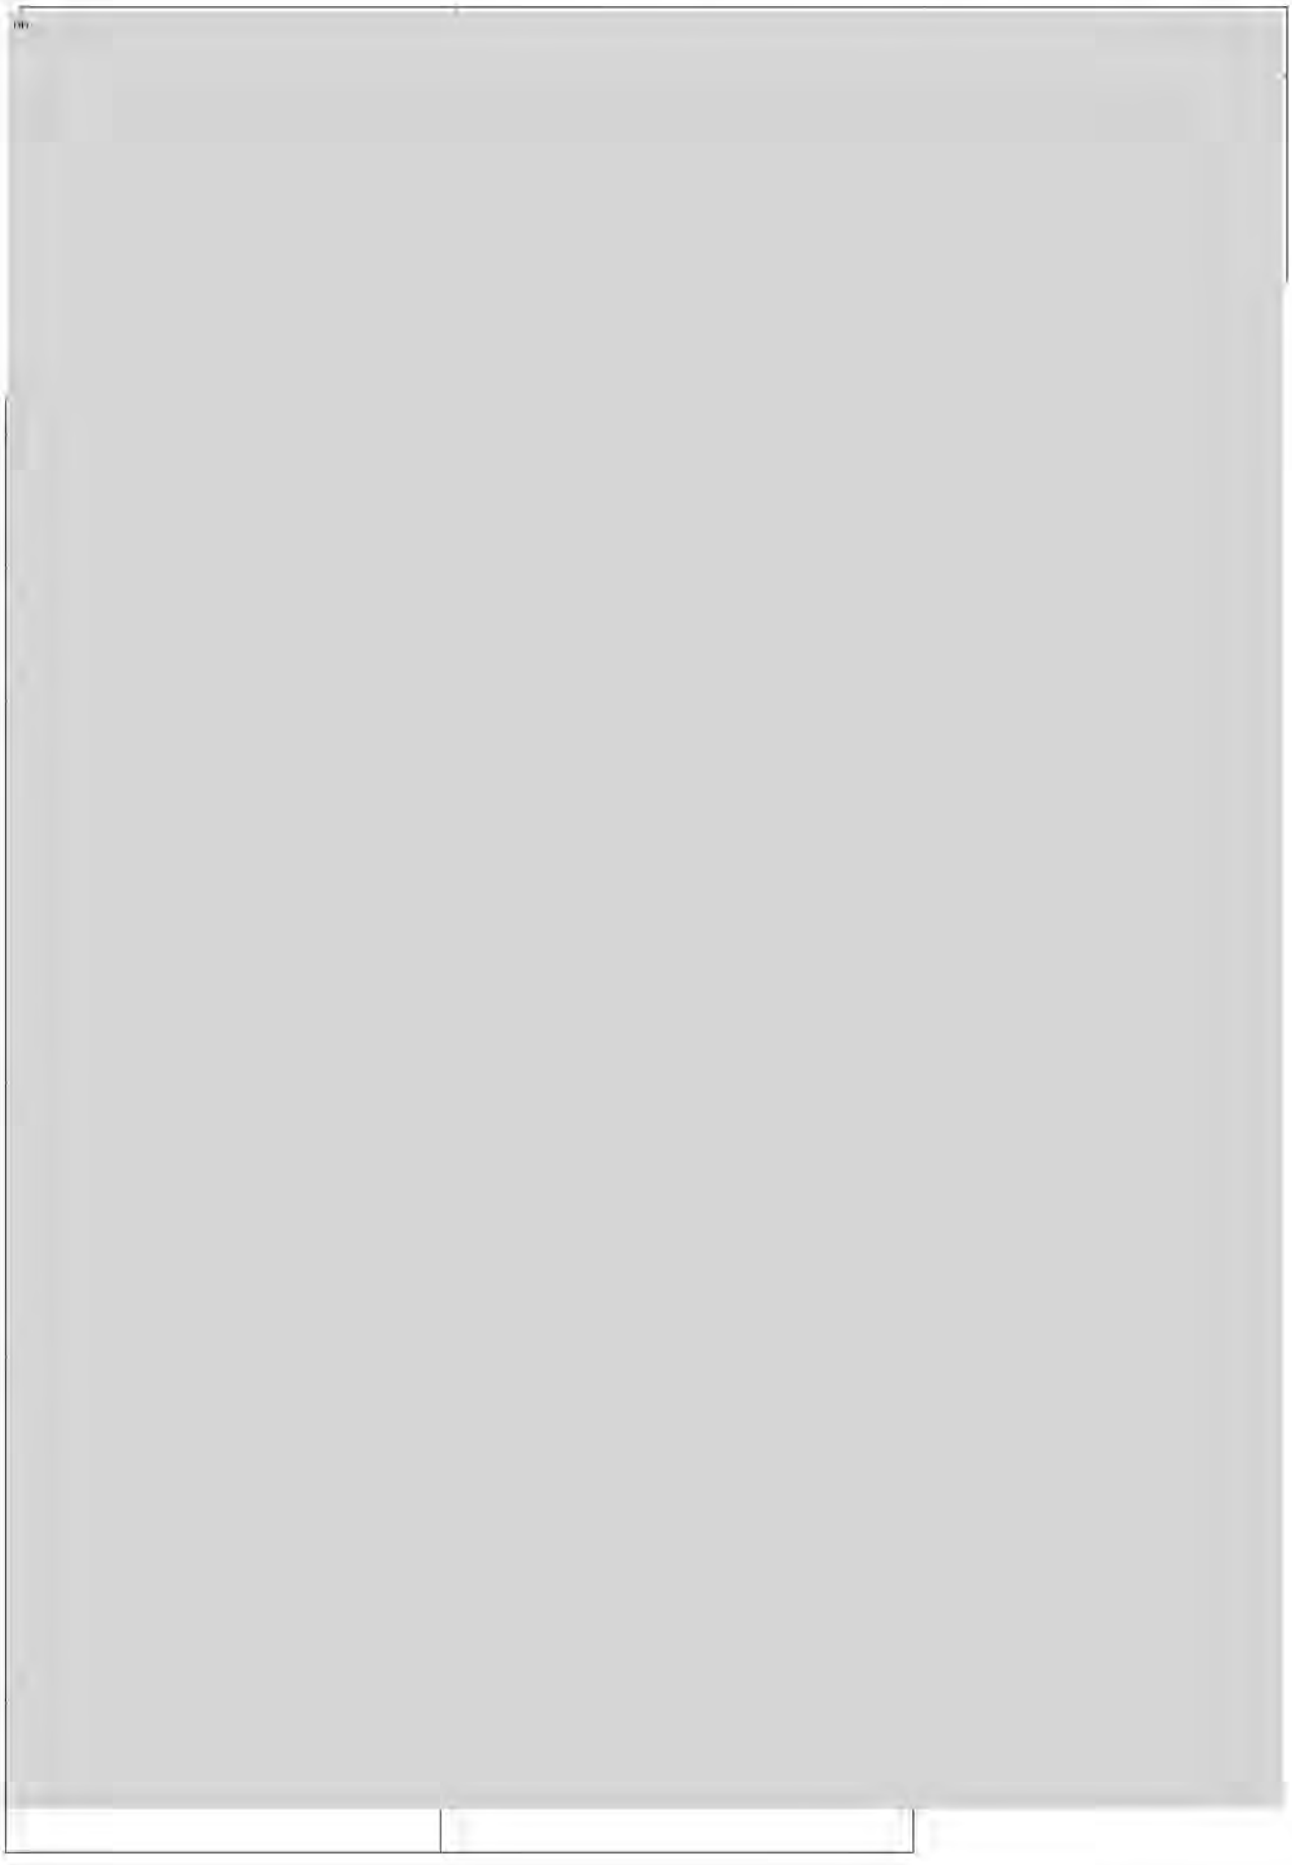

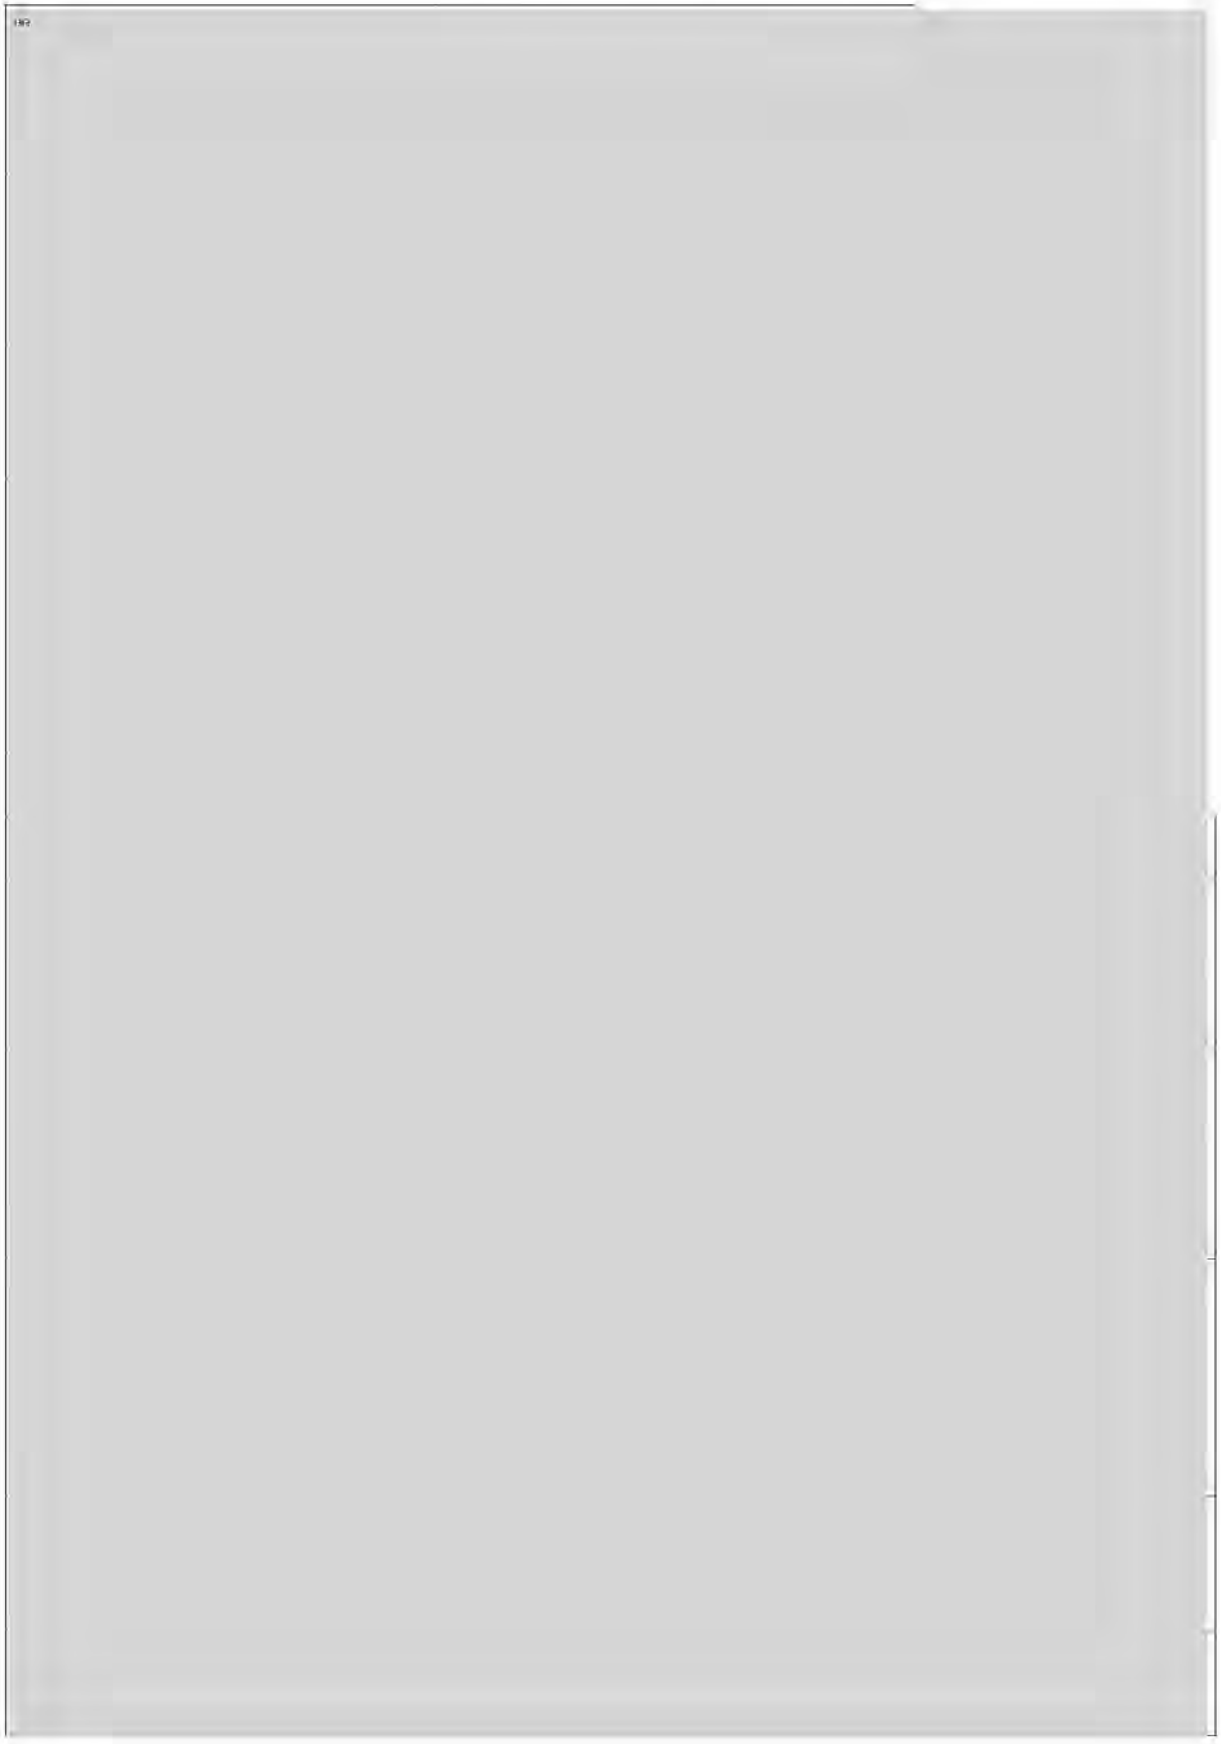

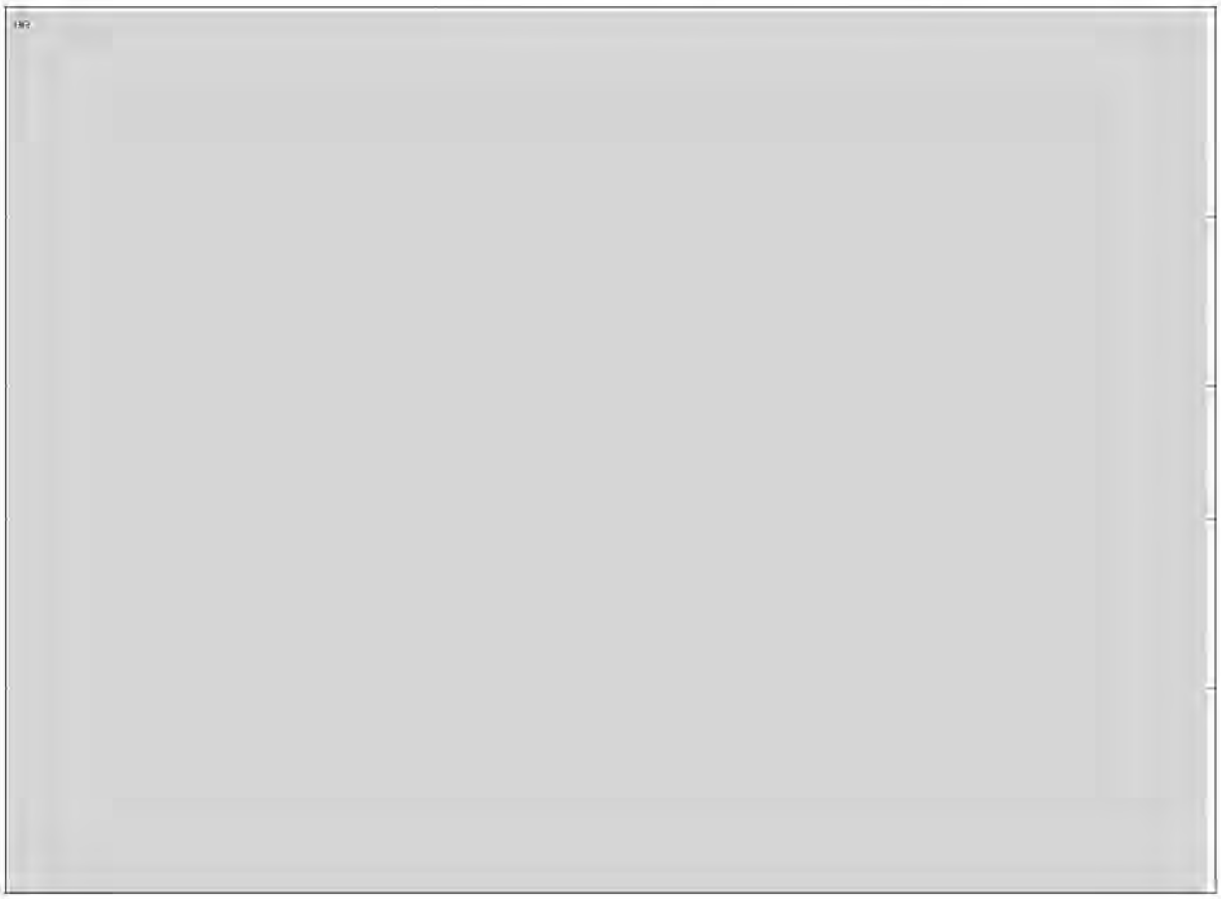

# 18. Planning

## 18.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Planning Vlietzone en Ypenburg gereed maken voor vaststelling. | Planning Vlietzone en Ypenburg is niet vastgesteld door ontwikkelingen onderhevig, maar voldoet om te sturen. De verschillende secties waarin Vlietzone is opgedeeld, zijn afgestemd met aanbestedingsteam. Secties worden gefaseerd overgedragen aan hoofdaannemer. Voorbereidend werk voor uitvoering van hoofdcontract t.p.v. golfbaan worden voorgetrokken en afspraken met TenneT betreffende aanleg nieuwe kabel worden herzien. Planning van archeologisch onderzoek moet opnieuw worden afgestemd. Aan einde van kwartaal is gestart met uitwerken planning Trekfietstracé. Aanleg fietspad heeft raakvlakken met bestemmingsplan 'Molenvlietpark e.o.' en uitvoering hoofdcontract Rotterdamsebaan. |

| Overige / extra verrichte werkzaamheden |
|---|
| De gevolgen van bestemmingsplanprocedure 'Molenvlietpark e.o.' en herziening bestemmingsplan t.p.v. Binckhorstlaan-Zuid zijn in kaart gebracht. De procedures met bijbehorende relaties zijn opgenomen in de planning. |

# 19. Scopemanagement

## 19.1 Afgelopen kwartaal

| Geplande besluiten | Genomen besluiten |
|---|---|
| Projectmutatie Molenvlietpark (nr. 4) en VtW Calamiteitenberging (nr. 5) vaststellen in OGON en Stuurgroep. | In de Stuurgroep van 3 juni zijn de projectmutaties 4 t/m 7 vastgesteld. |

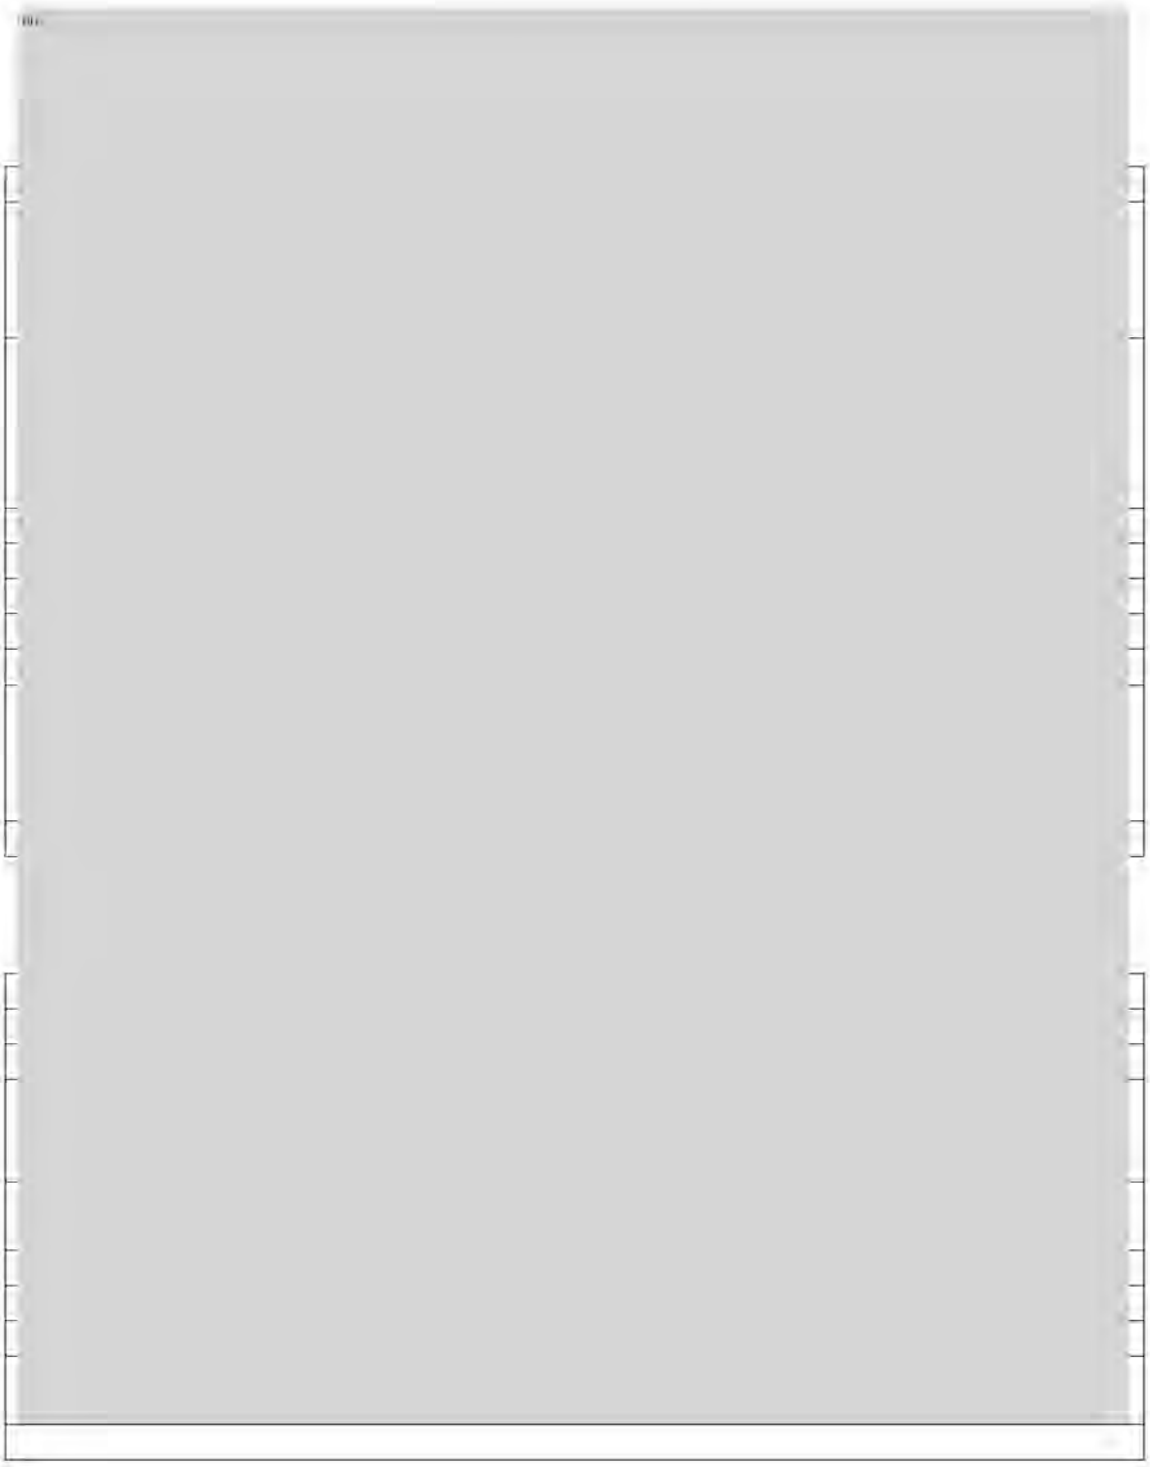

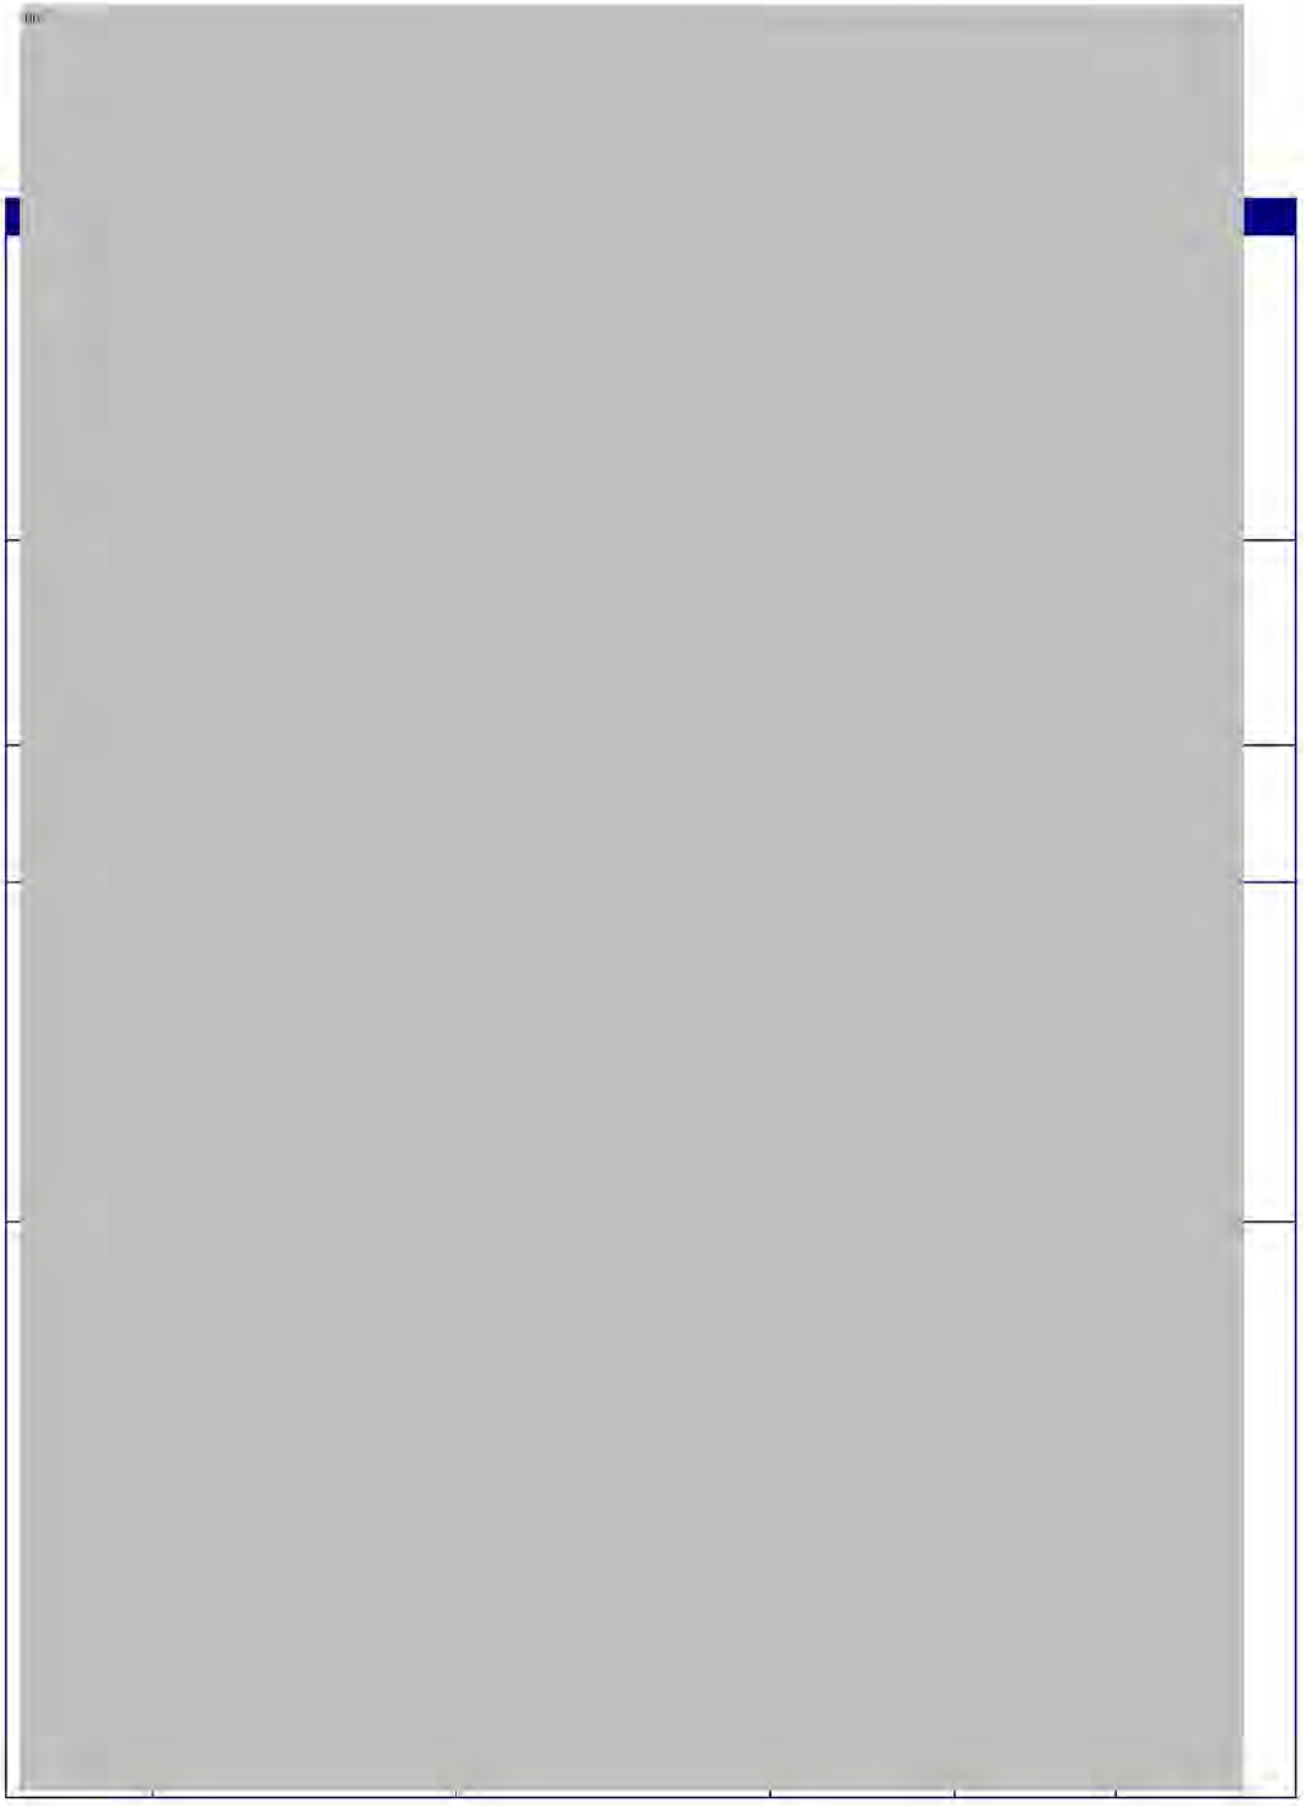

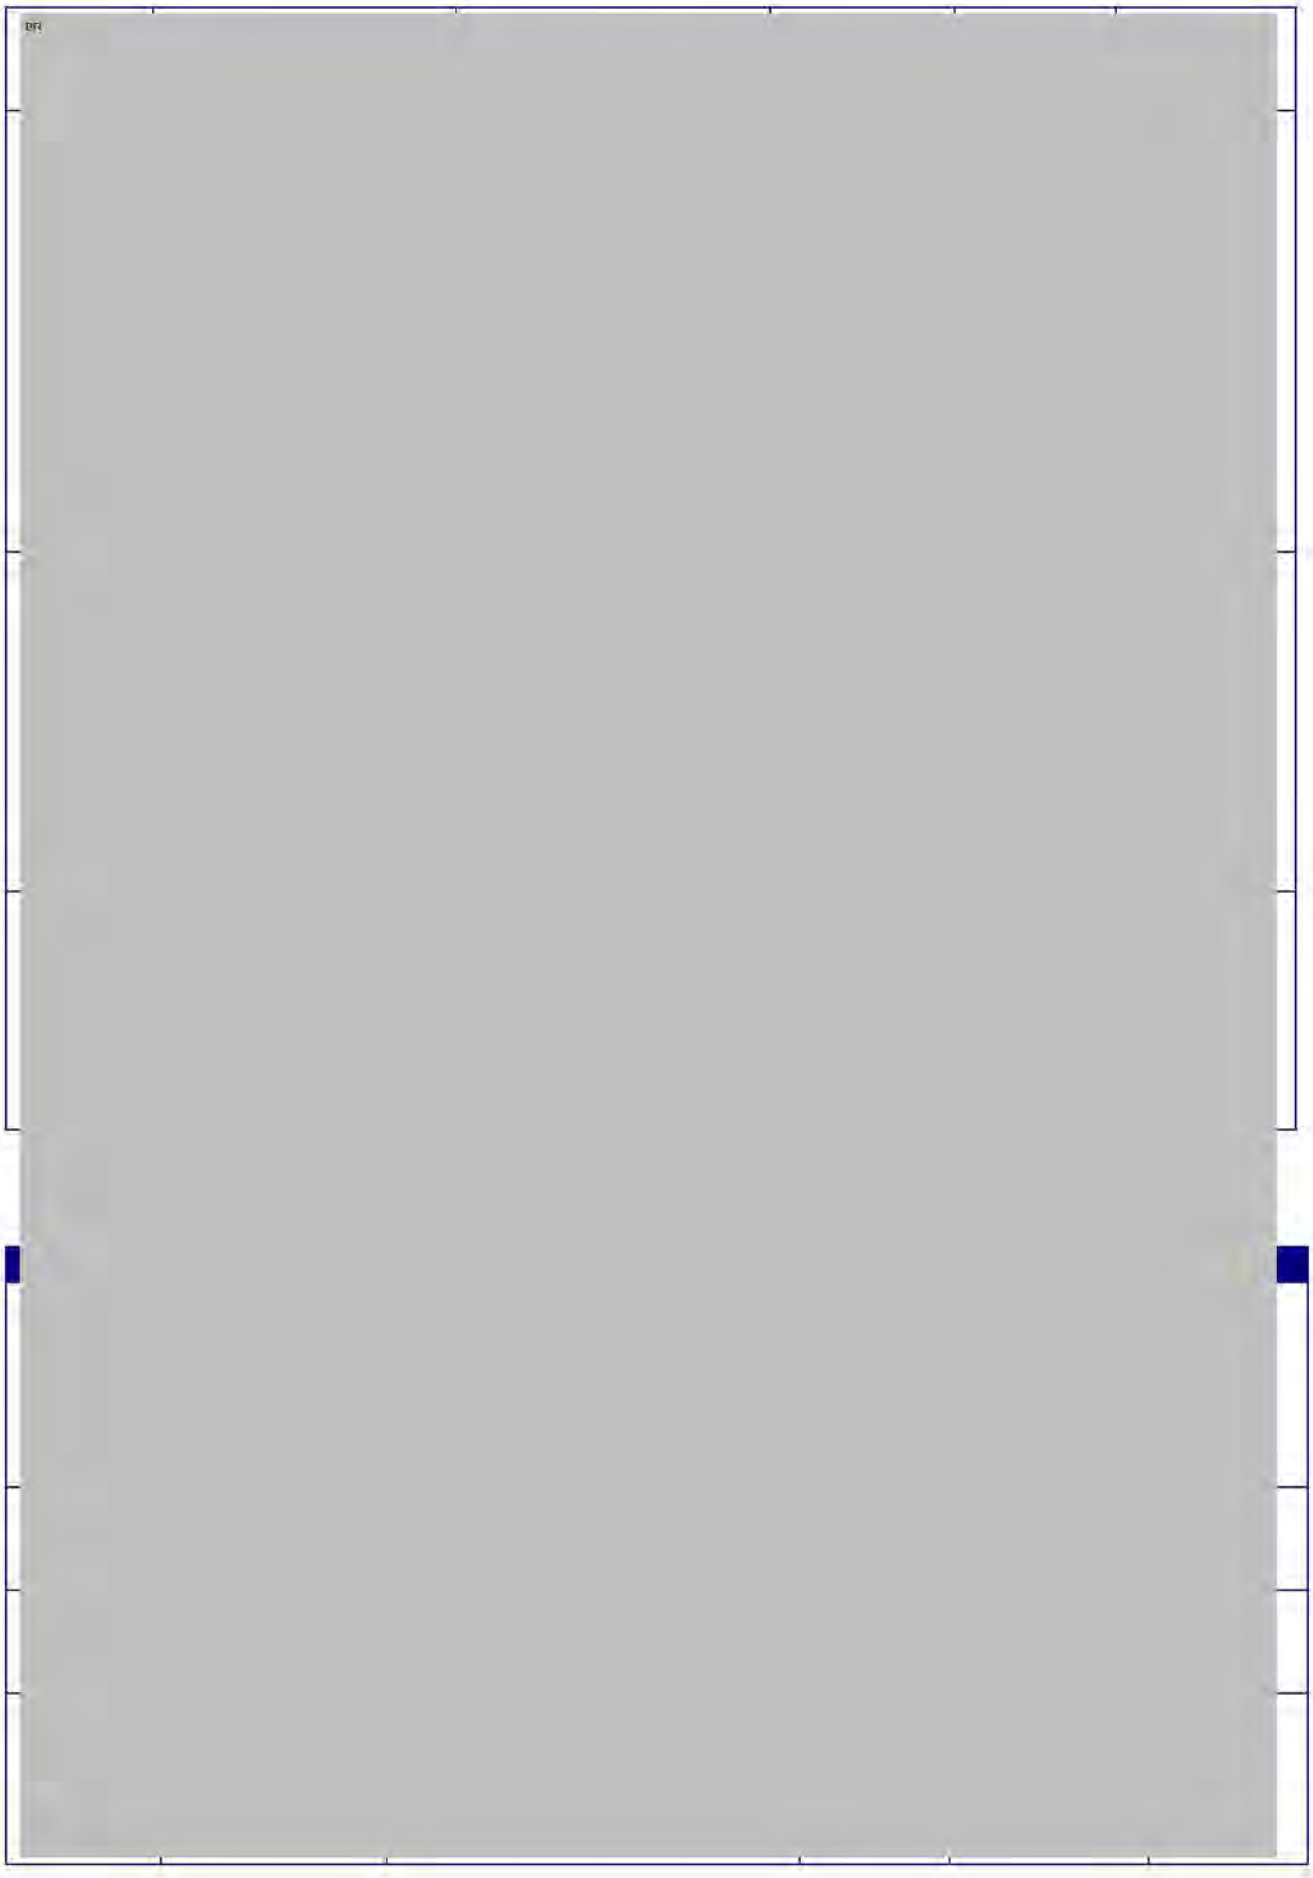

Docnr7

Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan, 2e kwartaal 2015

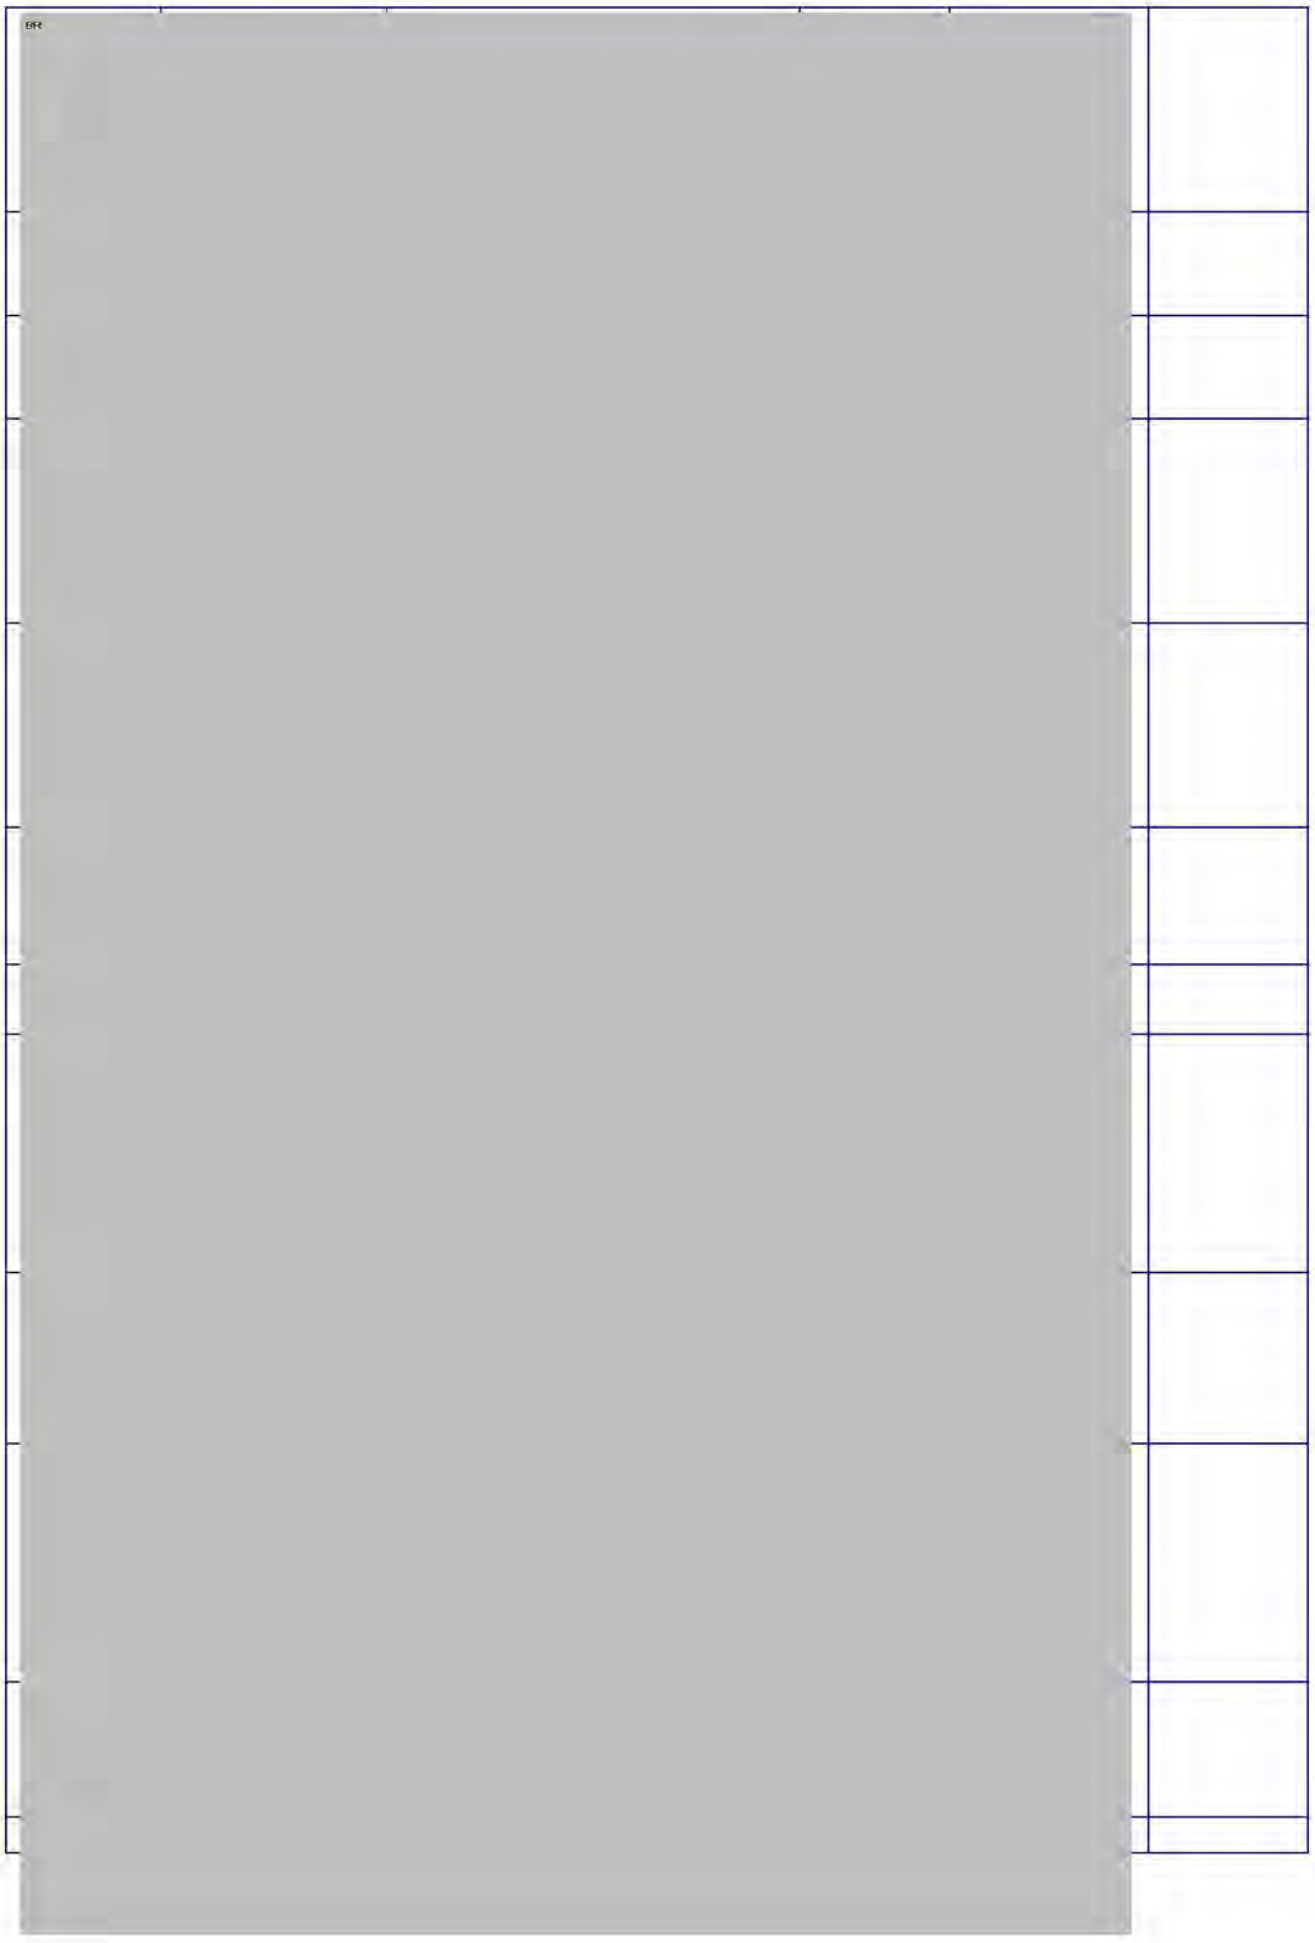

Docnr8

Dienst Stadsbeheer
Afdeling Opdrachtgeving

# Rotterdamsebaan

## Voortgangsrapportage

### 3e kwartaal 2015

**Datum: 4 november 2015**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie: 2.0**

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd:** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.1<br>d.d.:9 oktober 2015 | Versie 0.2<br>d.d. 16 oktober 2015 | Versie 1.0<br>d.d. 19 oktober 2015 | Versie 2.0<br>d.d. 4 november 2015 | Versie 2.0<br>d.d. 4 november 2015 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Algemeen directeur Dienst Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever Rotterdamsebaan | Dhr. B. Revis, wethouder / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

# Inhoudsopgave

**1. Inleiding ..... 5**
**2. Planstudies ..... 7**
2.1 Afgelopen kwartaal ..... 7
2.2 Komende kwartaal ..... 7
**3. Omgevingsmanagement ..... 8**
3.1 Afgelopen kwartaal ..... 8
3.2 Komend kwartaal ..... 9
**4. Verwerving ..... 10**
4.1 Afgelopen kwartaal ..... 10
4.2 Komende kwartaal ..... 10
**5. Vergunningen en overeenkomsten ..... 11**
5.1 Afgelopen kwartaal ..... 11
5.2 Komende kwartaal ..... 12
**6. Conditionering Binckhorstlaan ..... 13**
6.1 Afgelopen kwartaal ..... 13
6.2 Komende kwartaal ..... 13
**7. Conditionering Vlietzone ..... 14**
7.1 Afgelopen kwartaal ..... 14
7.2 Komende kwartaal ..... 14
**8. Voorbereiding t.b.v. hoofdcontract ..... 15**
8.1 Afgelopen kwartaal ..... 15
8.2 Komende kwartaal ..... 16
**9. Spoorboogweg, Regulusweg, Verlengde Mercuriusweg/Mercuriusweg-Oost en Verlengde-Melkwegstraat ..... 17**
9.1 Afgelopen kwartaal ..... 17
9.2 Komende kwartaal ..... 17
**10. Tunnelveiligheid ..... 18**
10.1 Afgelopen kwartaal ..... 18
10.2 Komend kwartaal ..... 18
**11. Aanbesteding hoofdcontract ..... 19**
11.1 Afgelopen kwartaal ..... 19
11.2 Komende kwartaal ..... 19
**12. Aanbesteding nevencontracten ..... 20**
12.1 Afgelopen kwartaal ..... 20
12.2 Komende kwartaal ..... 20
**13. Communicatie ..... 21**
13.1 Afgelopen kwartaal ..... 21
13.2 Komende kwartaal ..... 21
**14. Beheer en overdracht ..... 22**
14.1 Afgelopen kwartaal ..... 22
14.2 Komend kwartaal ..... 22
**15. Organisatie ..... 23**
15.1 Afgelopen kwartaal ..... 23
15.2 Komend kwartaal ..... 23
**16. Financiën ..... 24**
16.1 Kostenstructuur ..... 24

16.2 Dekkingen....25
**17. Risicobeheer....28**
17.1 Afgelopen kwartaal....28
17.2 Komende kwartaal....28
17.3 Financiële toprisico's....28
17.4 Toprisico's planning....29
**18. Planning....31**
18.1 Afgelopen kwartaal....31
18.2 Komende kwartaal....31
**19. Scopemanagement....33**
19.1 Afgelopen kwartaal....33
19.2 Komende kwartaal....33
**20. Kwaliteitsbeheer....34**
20.1 Afgelopen kwartaal....34
20.2 Komende kwartaal....34
**21. Informatiebeheer....35**
21.1 Afgelopen kwartaal....35
21.2 Komend kwartaal....35
**Bijlage 1: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan....36**
**Bijlage 2: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer....38**

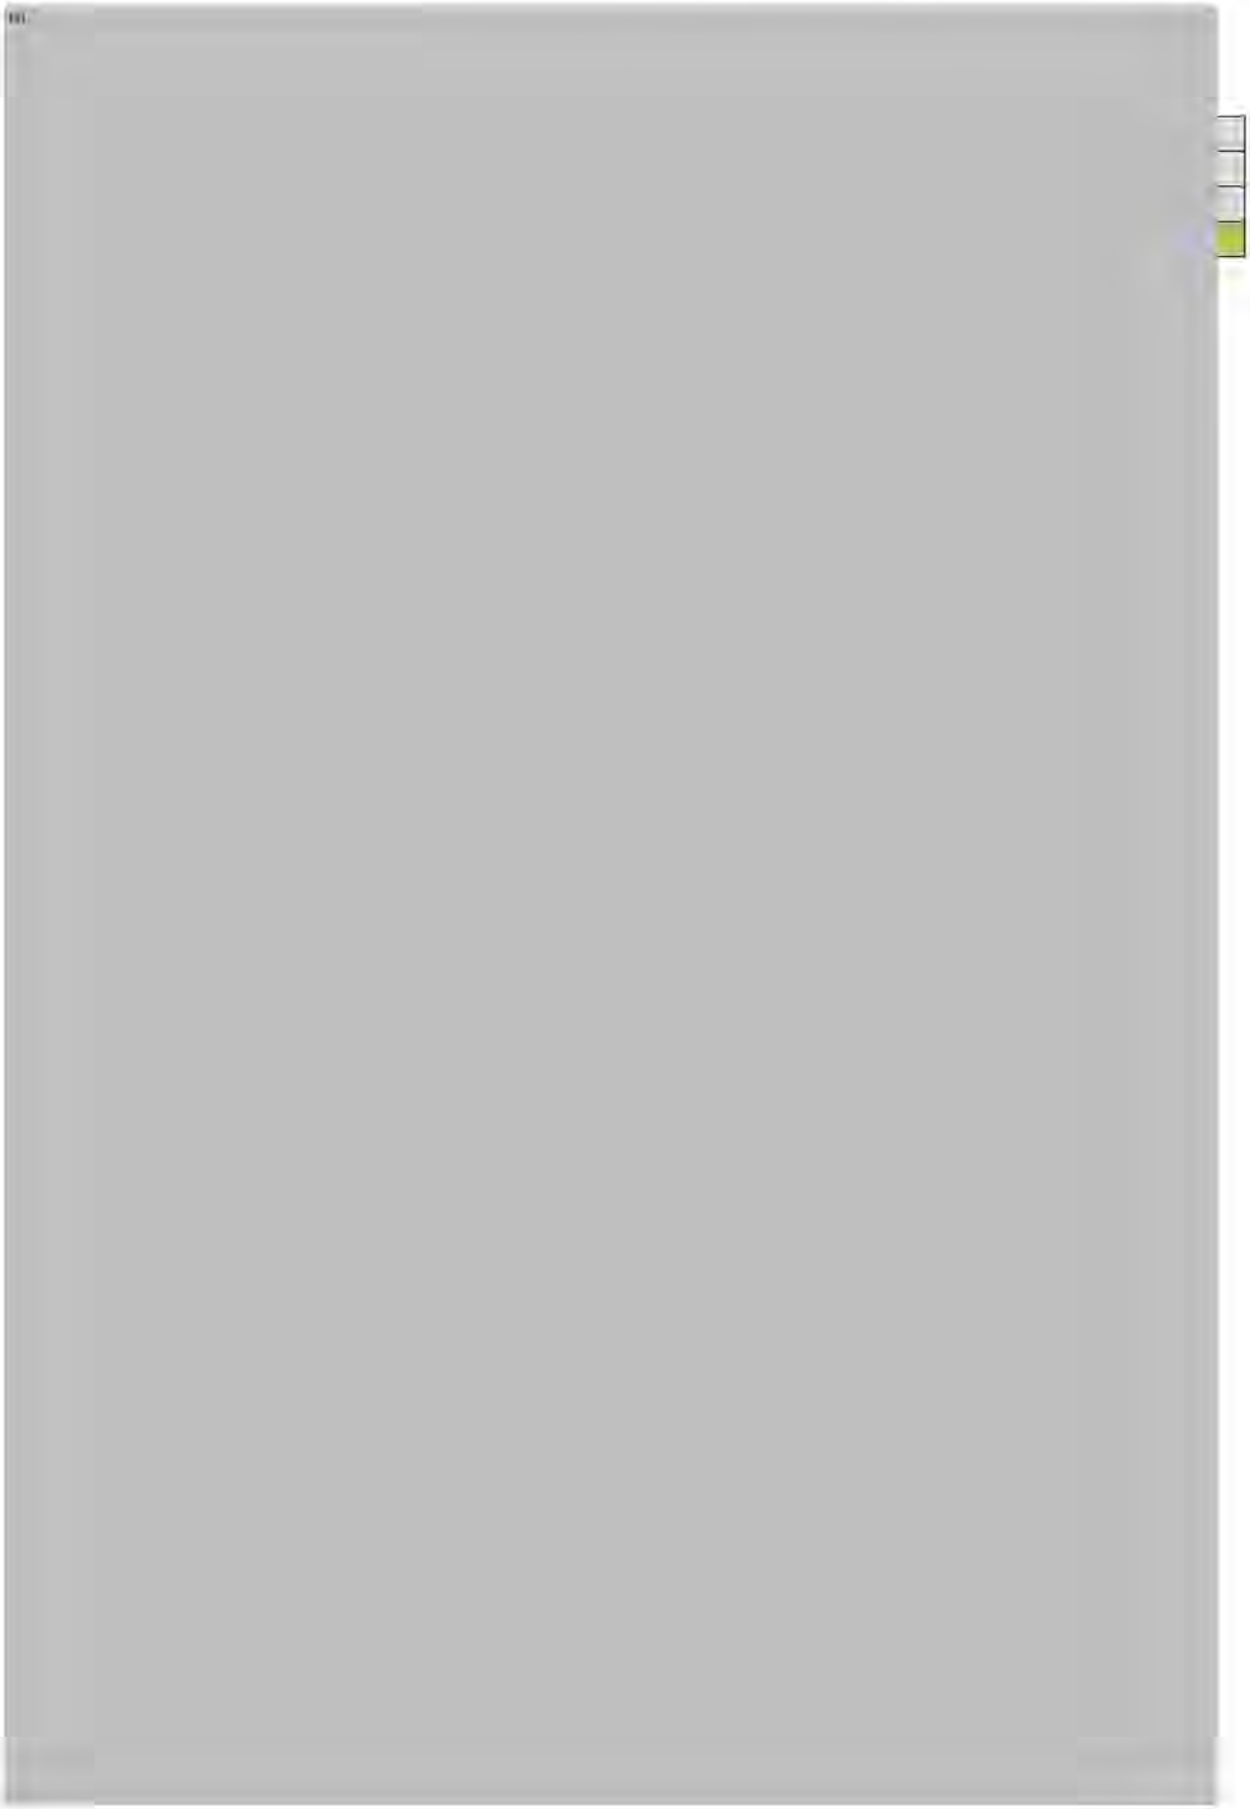

- Het college heeft op 1 september ingestemd met het concept-bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. naar aanleiding van de inspraak periode en de ingediende zienswijzen. Het plan is vervolgens op 24 september besproken in de raadscommissie en op 1 oktober vastgesteld door de gemeenteraad;

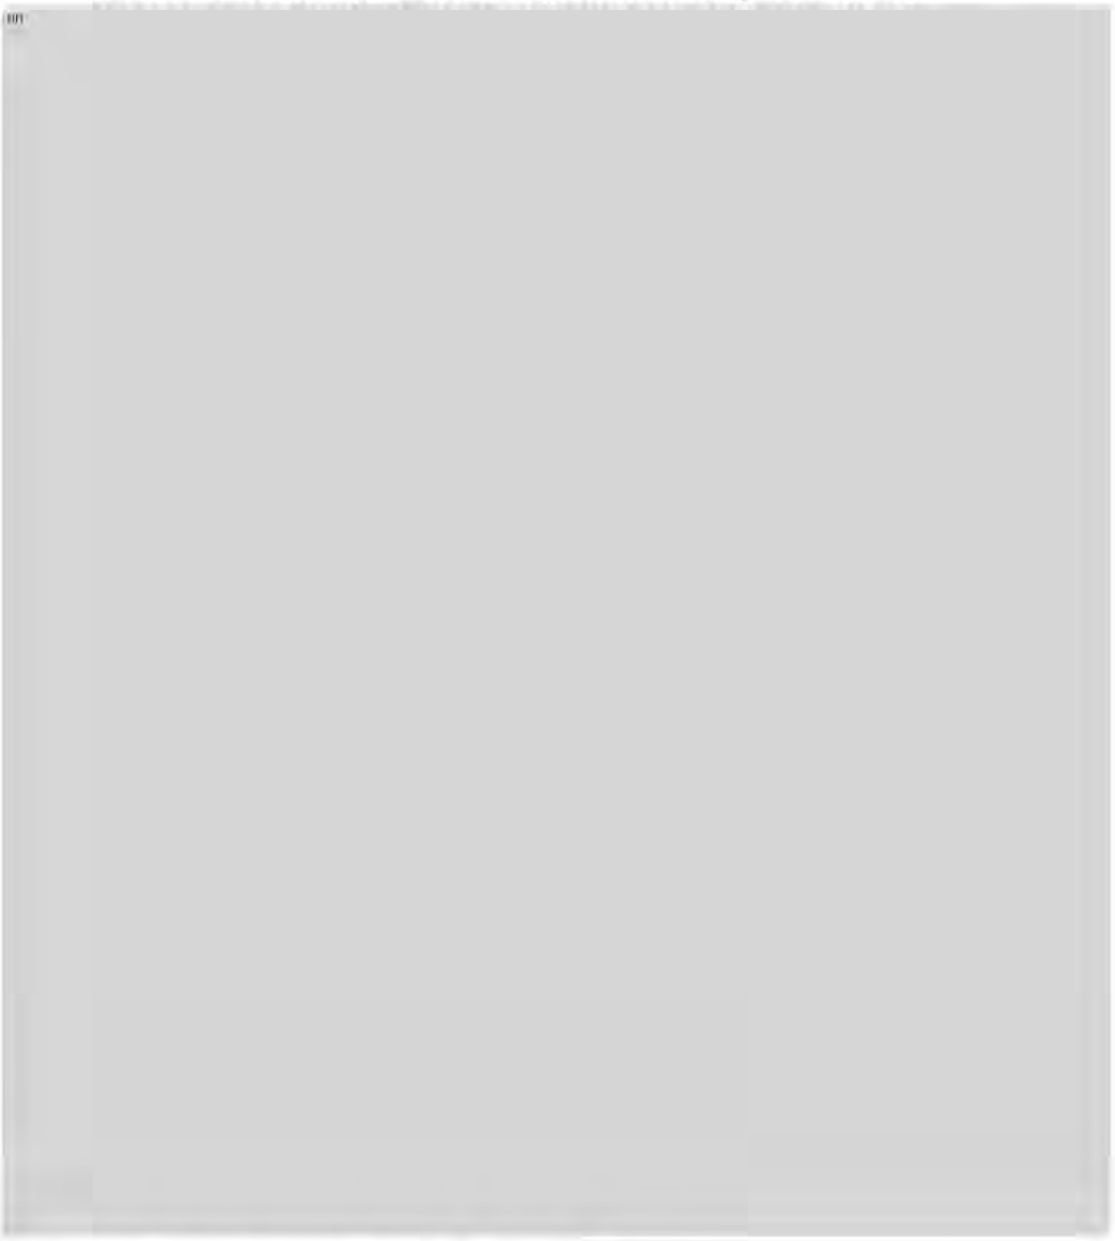

**Bestuurlijke besluitvorming komende periode:**

- Collegebesluit samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e t.a.v. waterinlaat van Vliet naar calamiteitenberging Molenvlietpark (tezamen met PUK ontwikkeling Nieuw Vredenoord en overeenkomst grondruil) (december 2015);
- Collegebesluit samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e t.a.v. waterinlaat van Vliet naar calamiteitenberging Molenvlietpark (december 2015);

# 2. Planstudies

## 2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| | |
| Ontwerp-bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. is in procedure gebracht. Ligt ter inzage vanaf 12 juni tot en met 23 juli 2015 | Op 1 september 2015 heeft college ingestemd met raadvoorstel ontwerp-bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. Behandeld in de cie Leefomgeving op 24 september 2015 en vastgesteld in de raad van 1 oktober. |
| | |

| Geplande besluiten | Genomen besluiten |
|---|---|
| | |
| Collegebesluit vrijgave ontwerp-bestemmingsplan 'Rotterdamsebaan 1e herziening, Binckhorstlaan zuid' voor inspraak (gepland 08-09-2015) | College op 22 september 2015 ontwerp-bestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak |

| |
|---|
| |

# 3. Omgevingsmanagement

## 3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Afronden overeenkomst met 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark over zijn gronden. | Overleg over overeenkomst verloopt voorspoedig. Uiteindelijk behandeling in college in combinatie met ontwikkeling Nieuw Vredenoord en SOK 5.1.2.e |
| Afronden overeenkomst met 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging en verlegging Molenvlietpark. | Principeovereenstemming met 5.1.2.e 5.1.2.e bereikt. Echter enige terugtrekkende bewegingen. |
| BR | |
| | |

## 3.2 Komend kwartaal

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| BR |
| Afronden overeenkomst 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark over zijn gronden. |
| Alsnog overeenkomst zien te bewerkstelligen met 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark, verlegging Molenvlietpark en aanpassing brug. |
| BR |
| |
| **Besluiten** |
| Collegebesluit aangaande overeenkomst met 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark, ontwikkeling Nieuw Vredenoord en Samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e 5.1.2.e |
| |

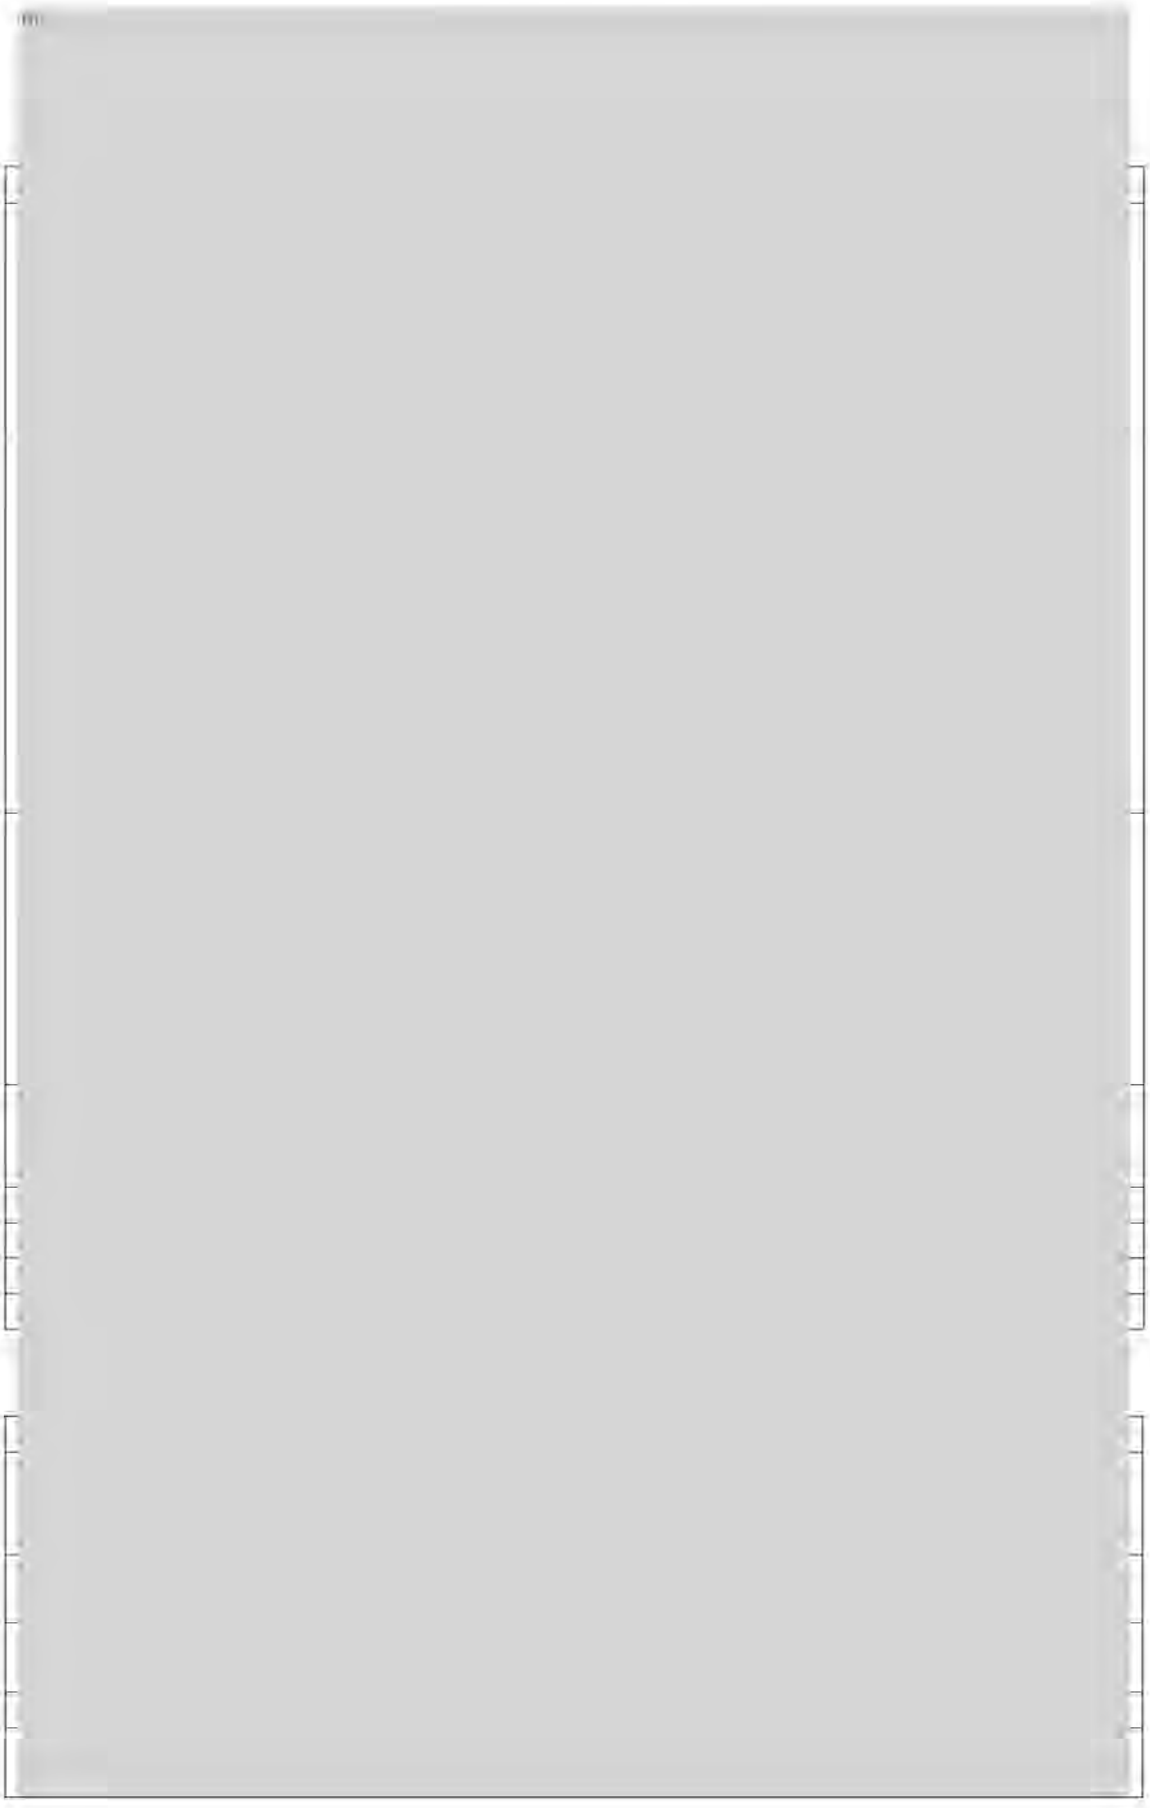

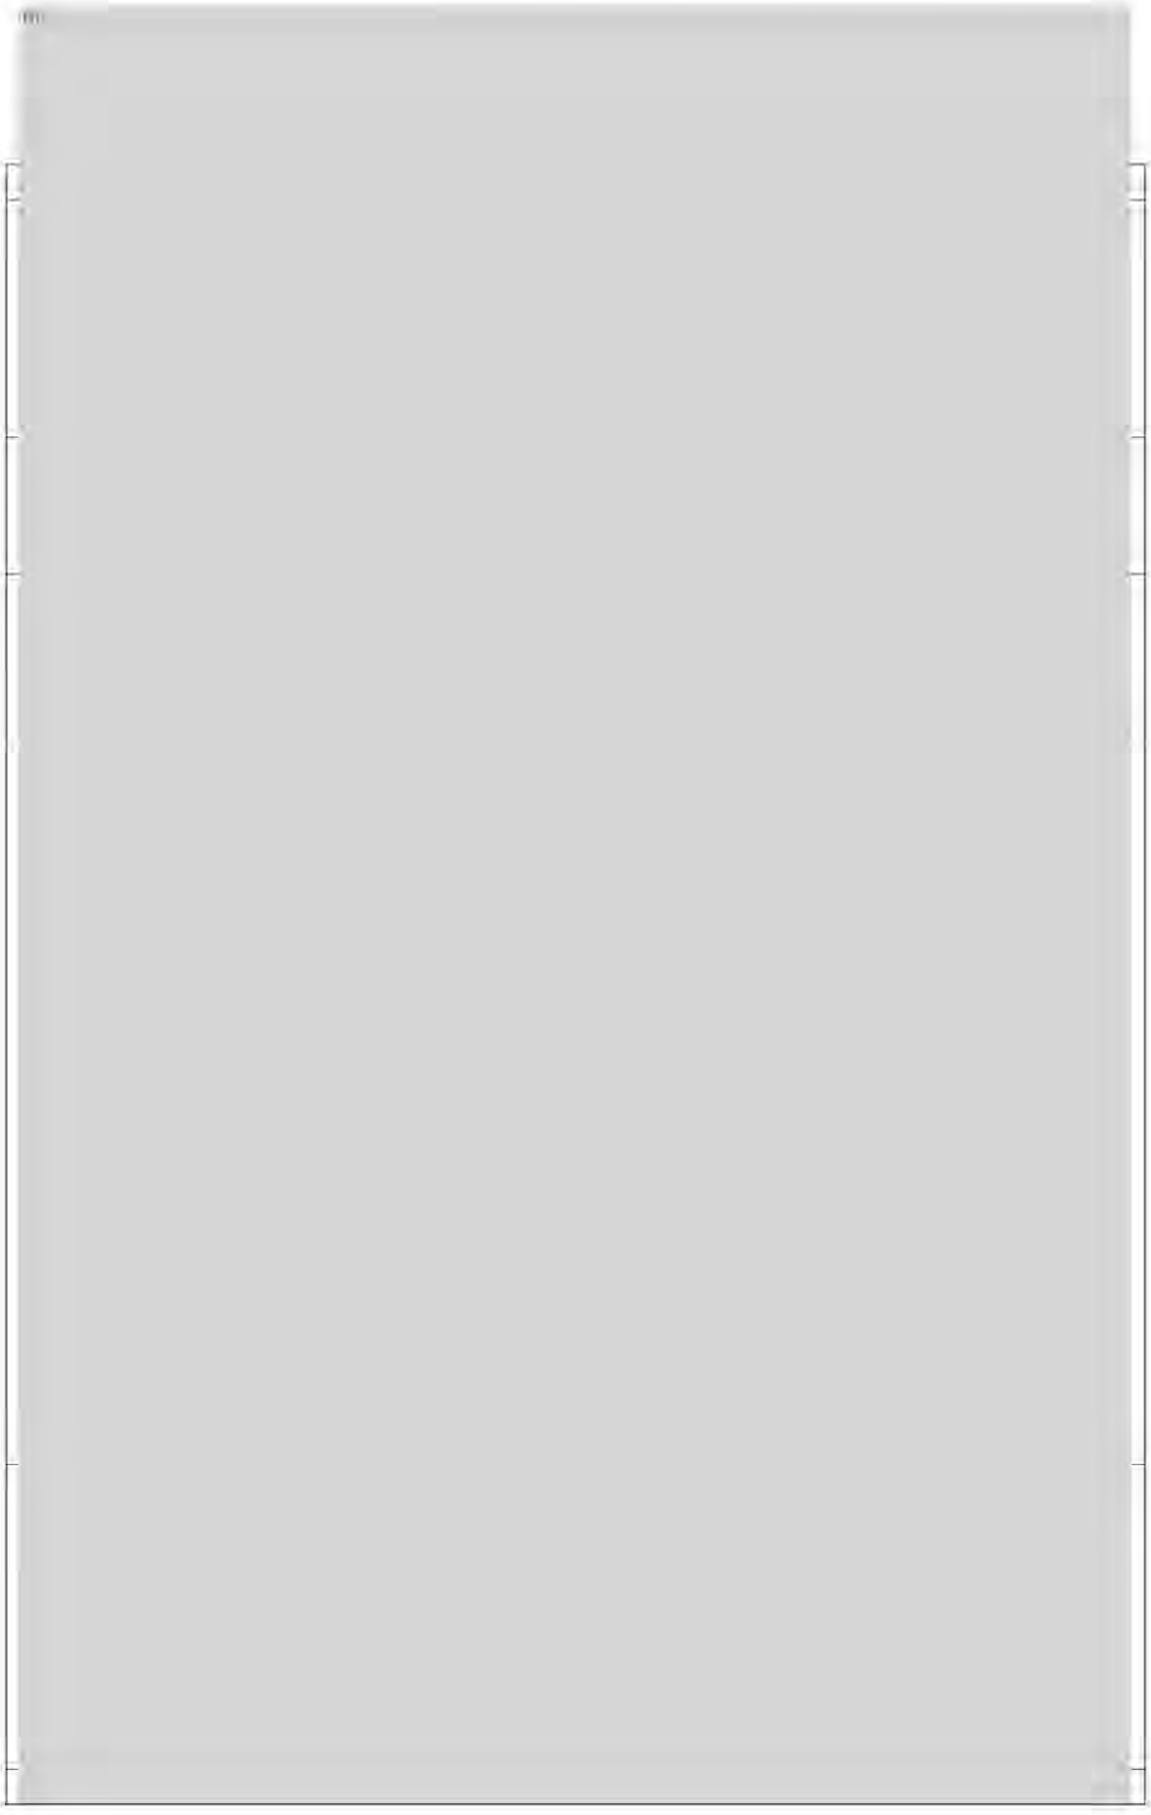

## 5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| Opstellen en afronden van afsprakenkaders / samenwerkingsovereenkomsten met eigenaren / gebruikers (o.a. [illegible] S12e S12e |
| [illegible] |

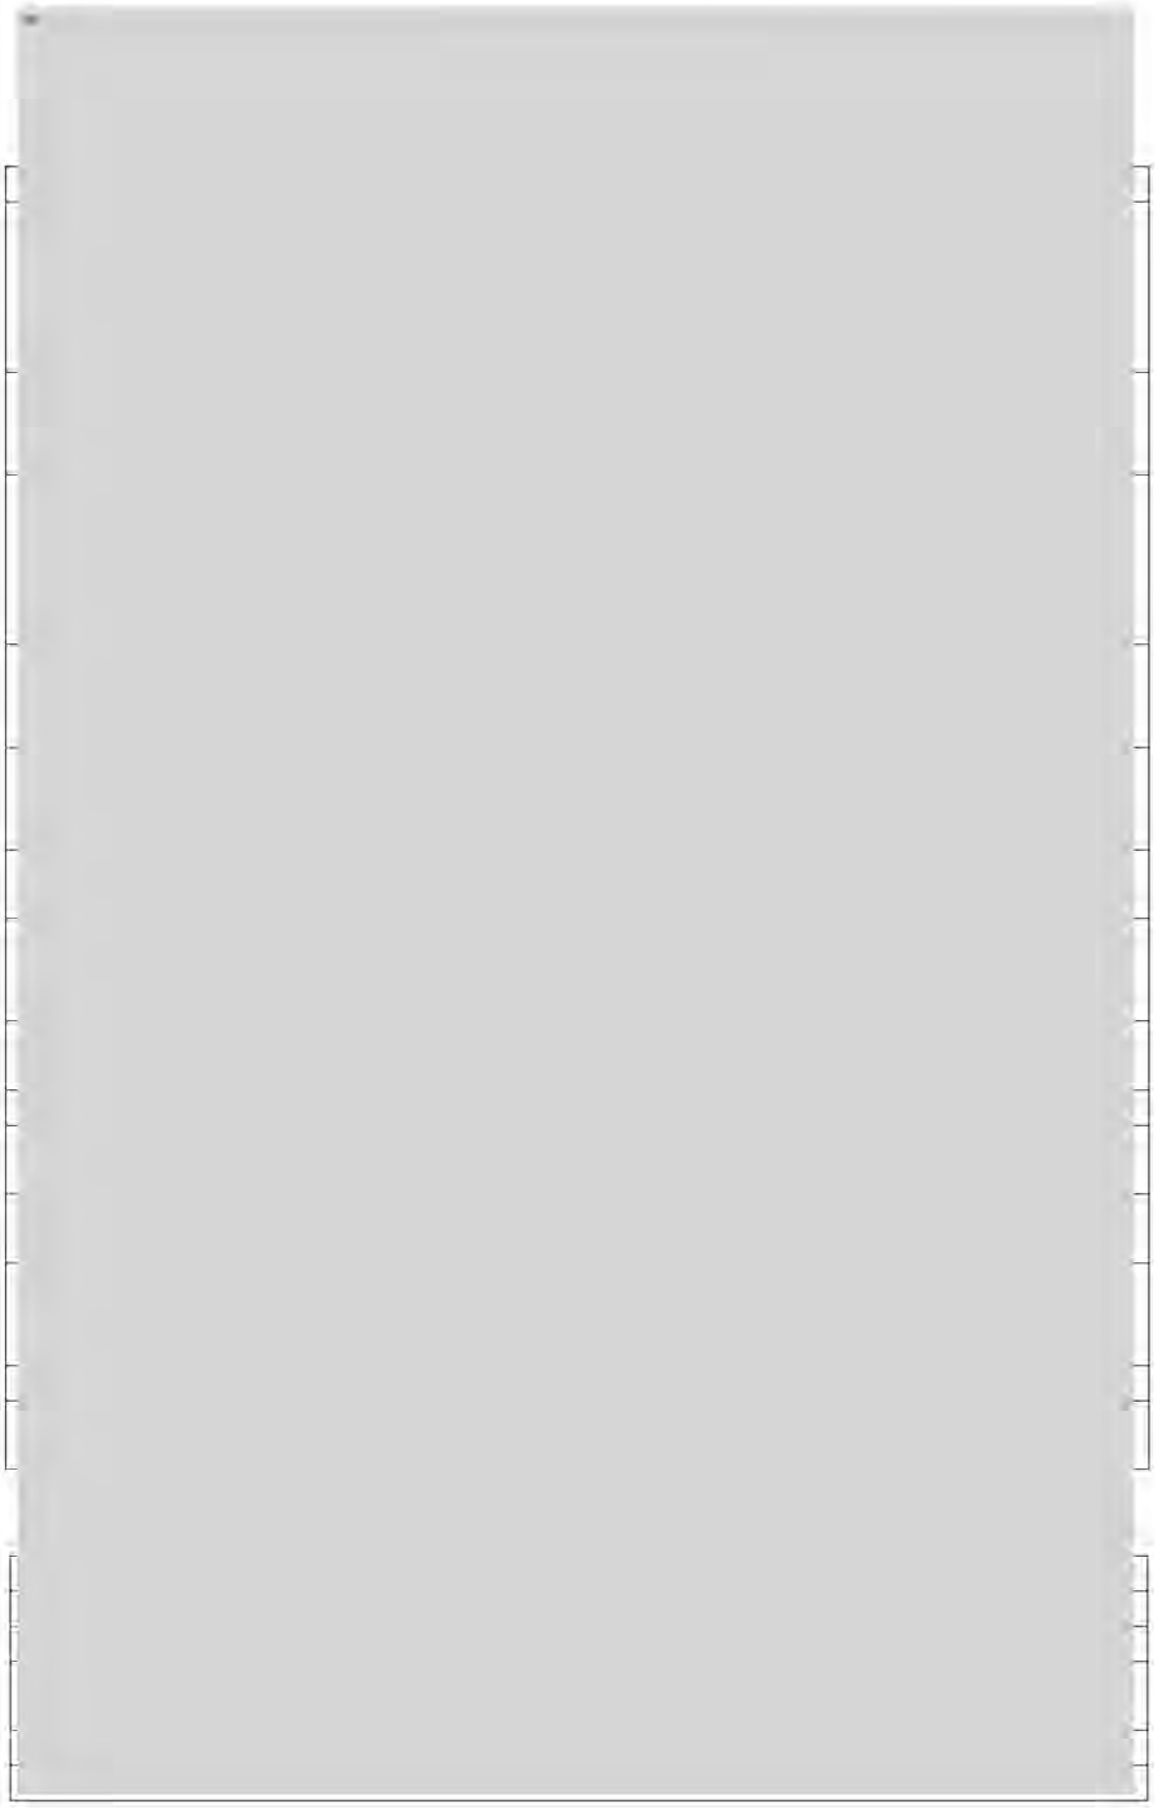

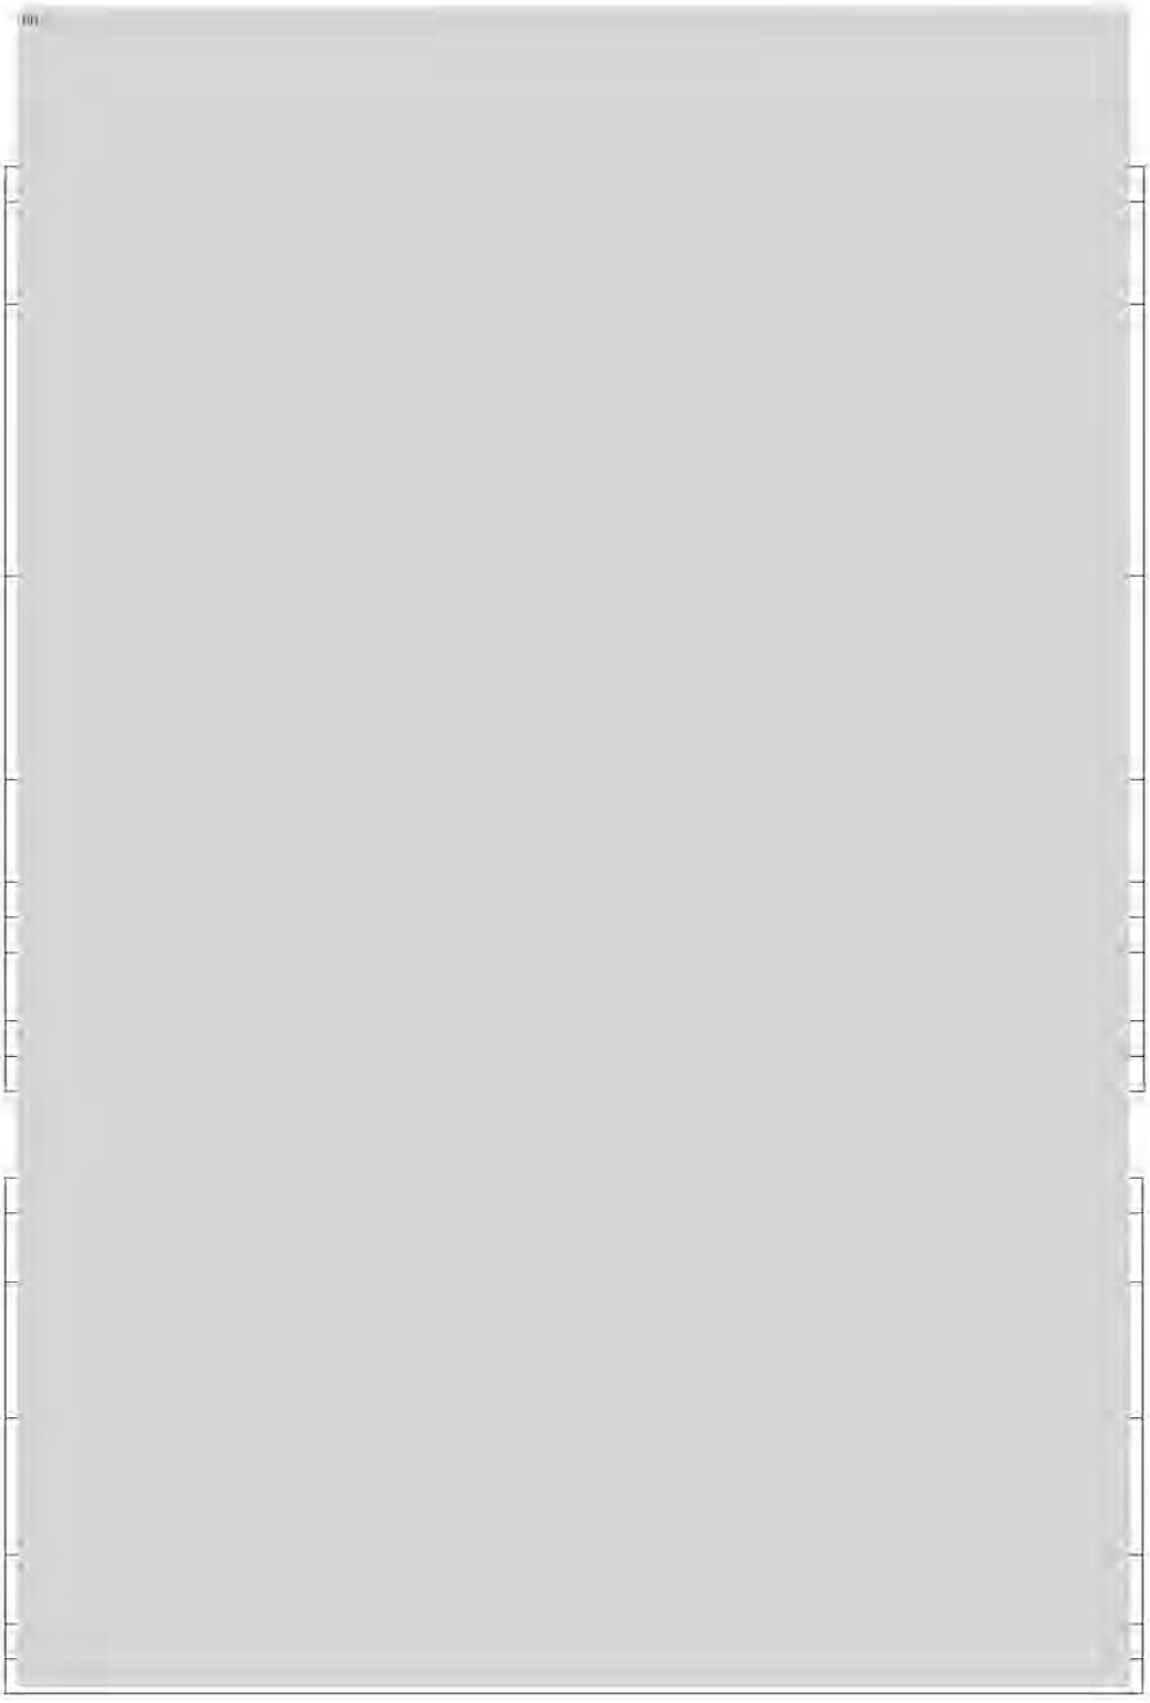

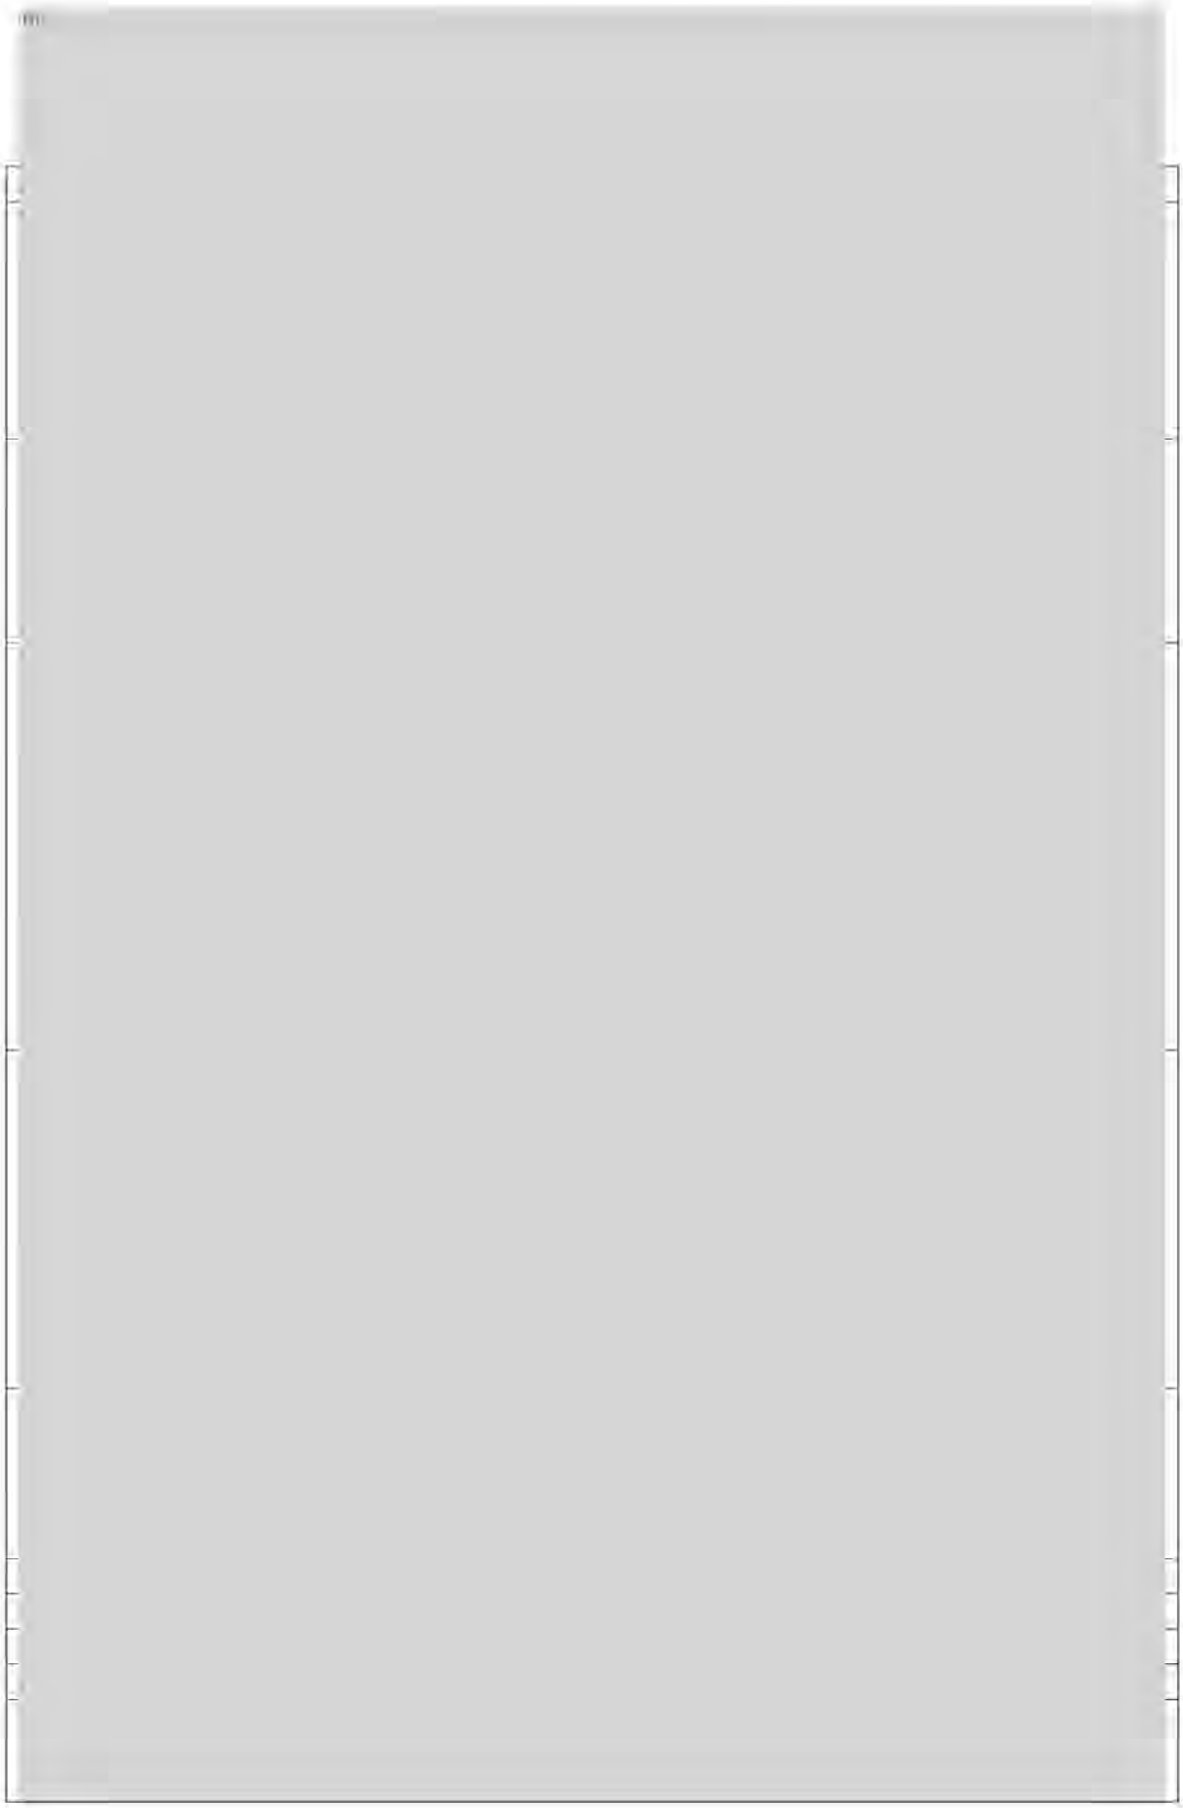

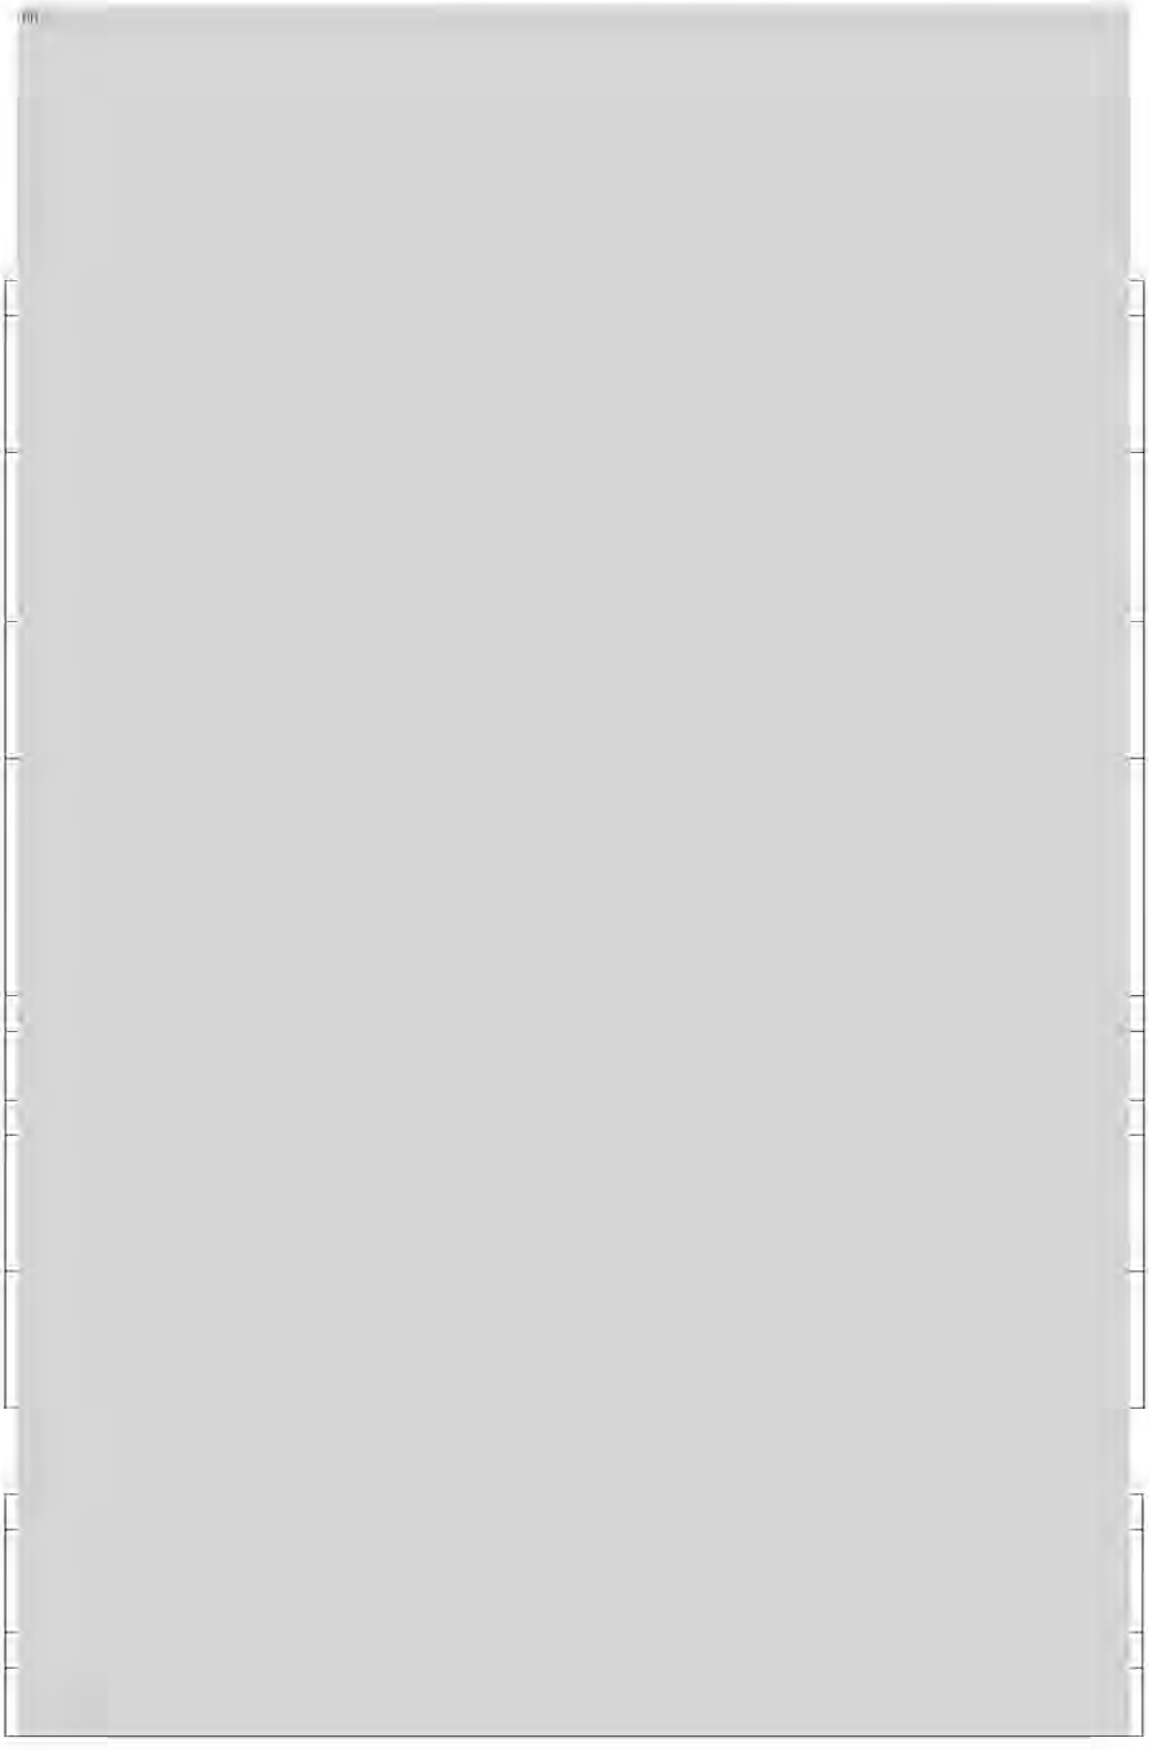

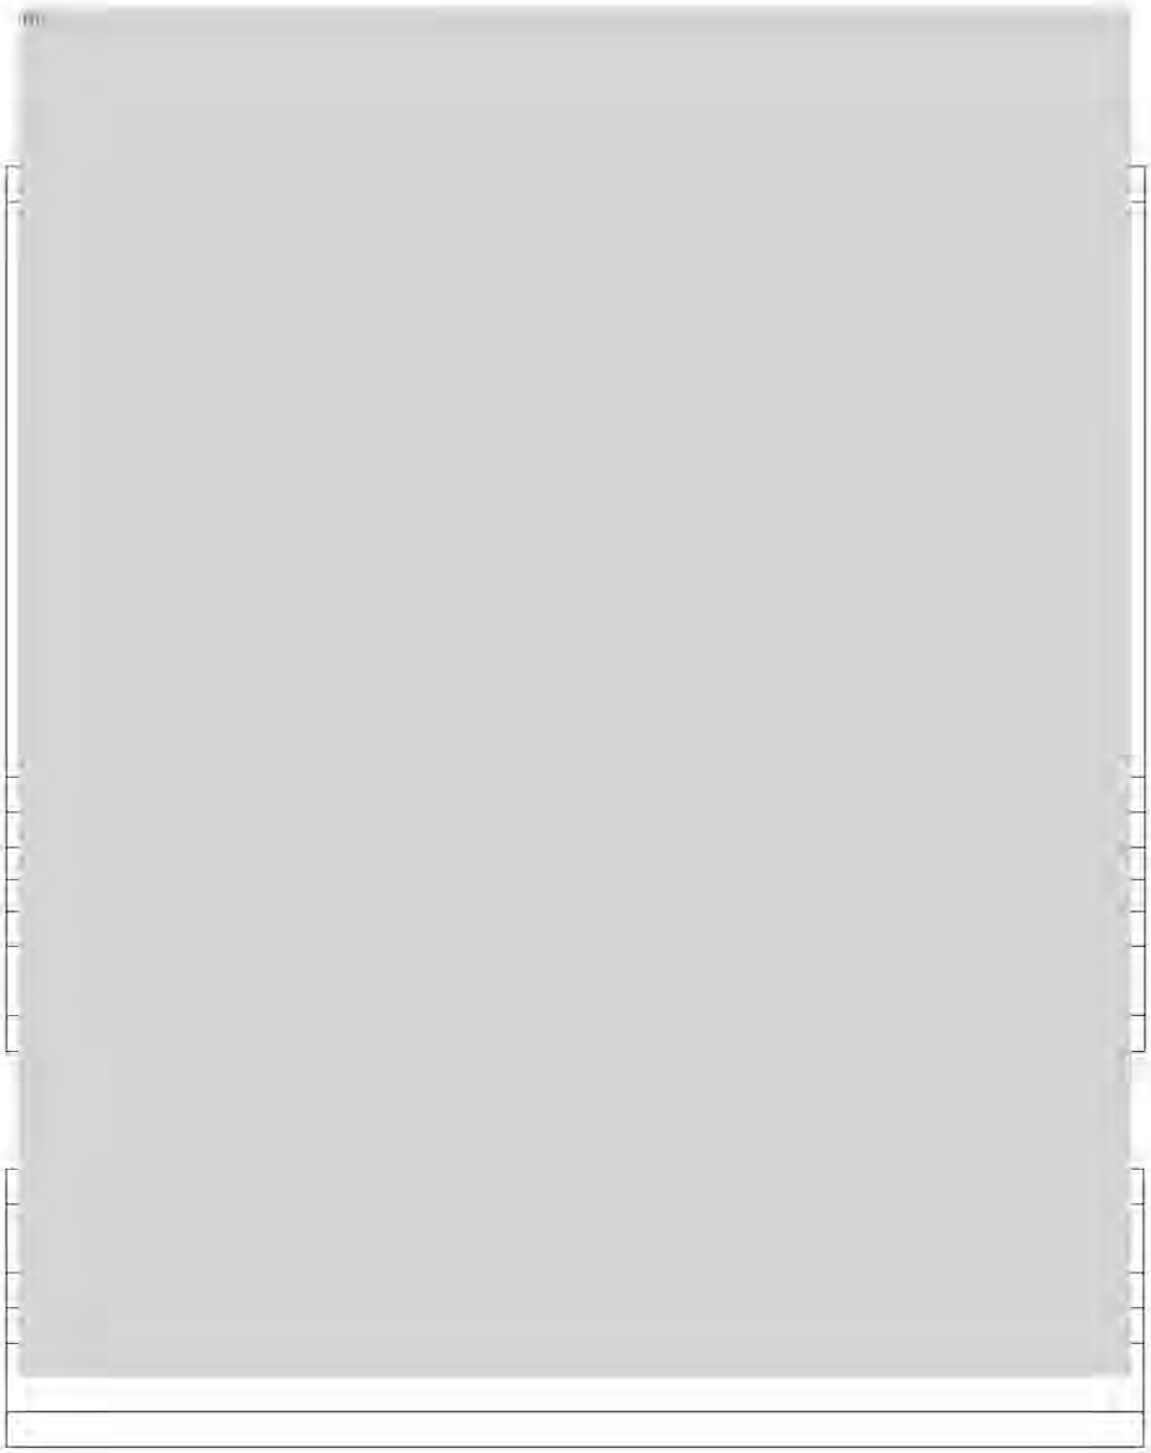

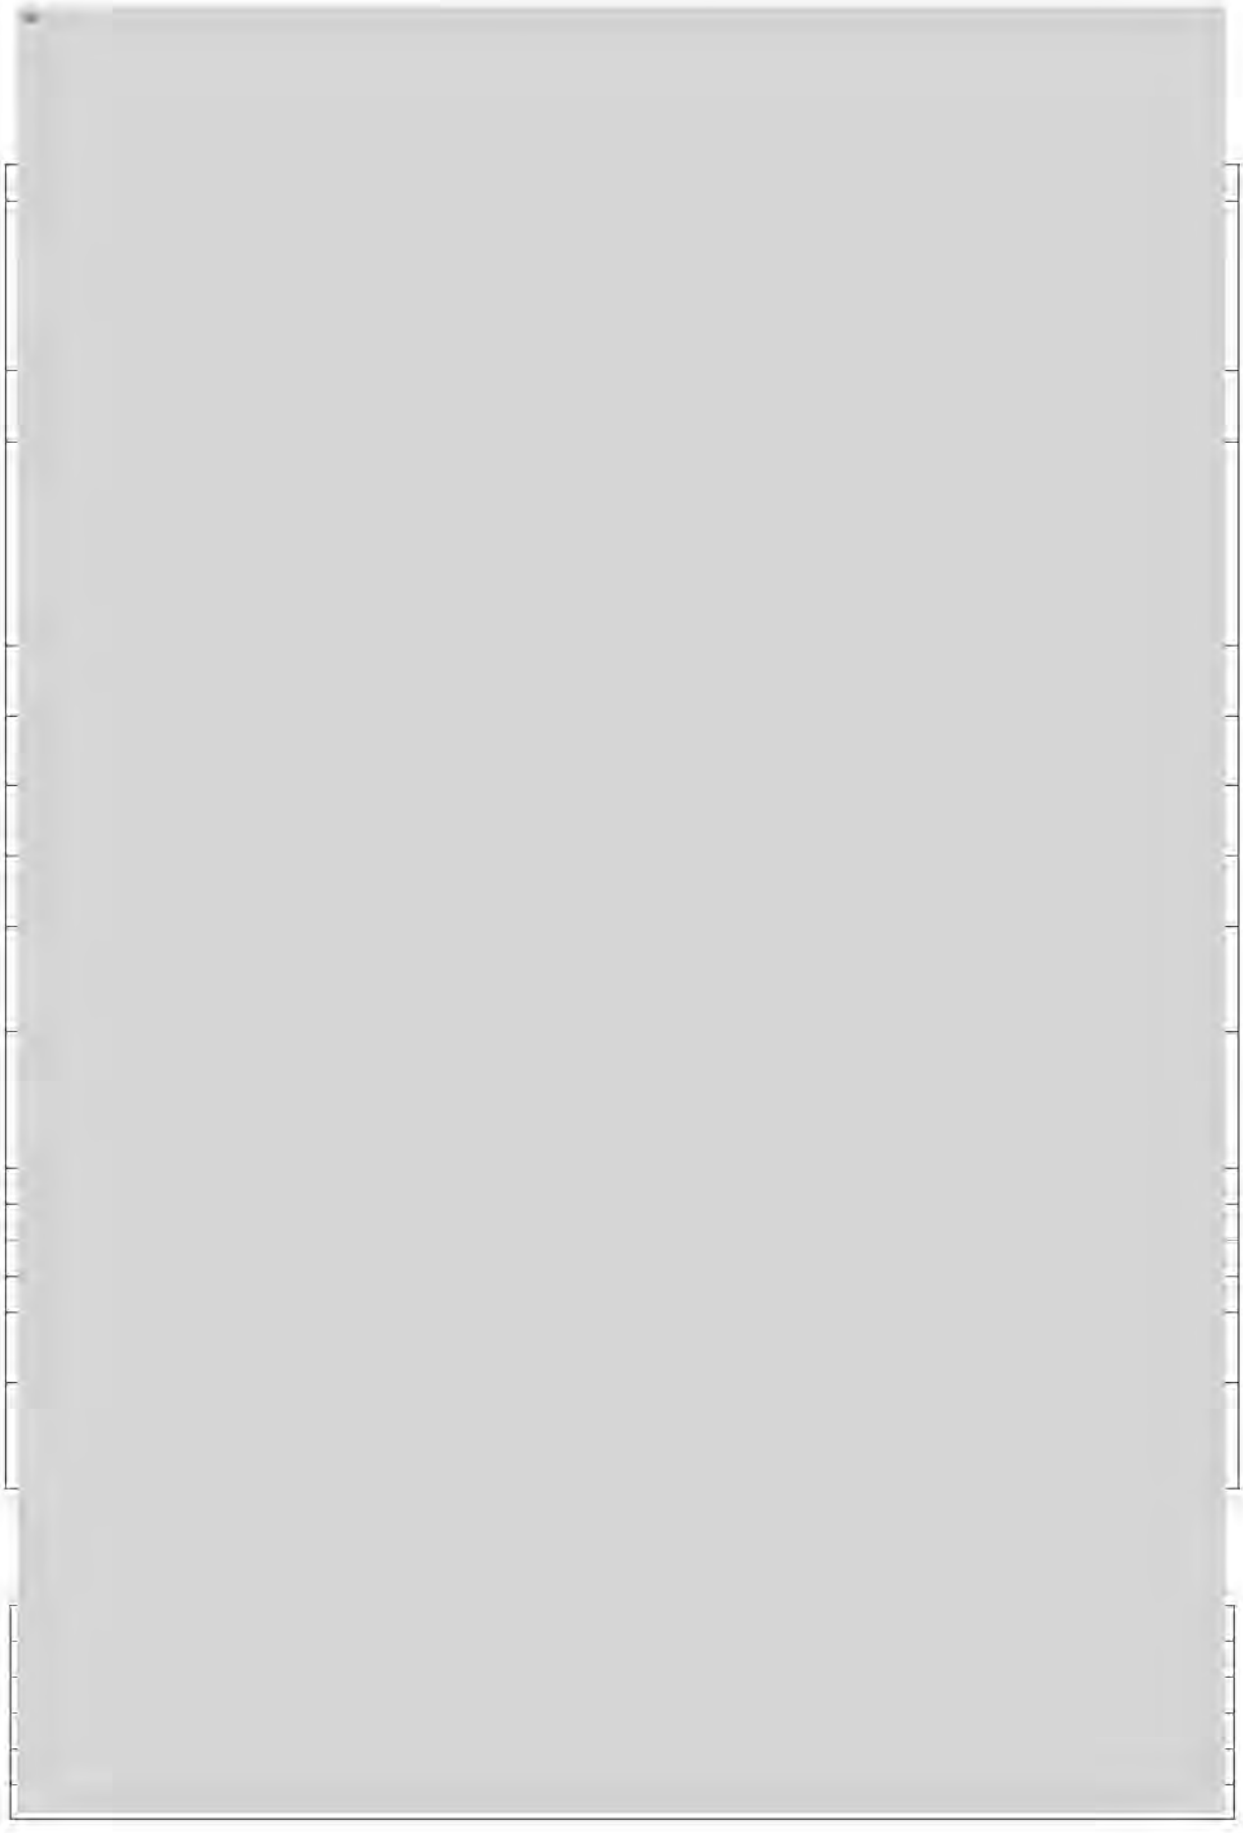

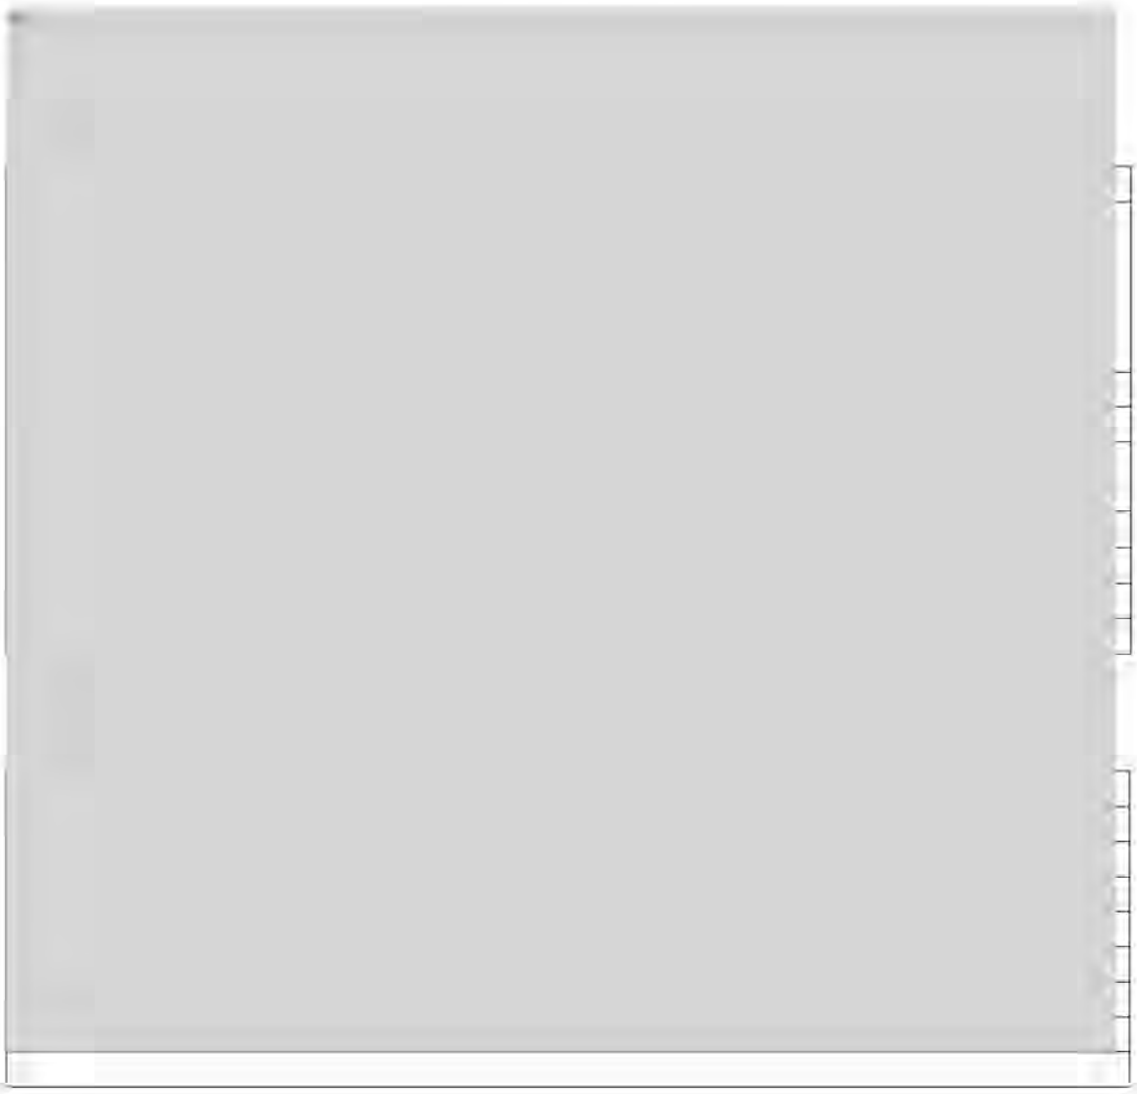

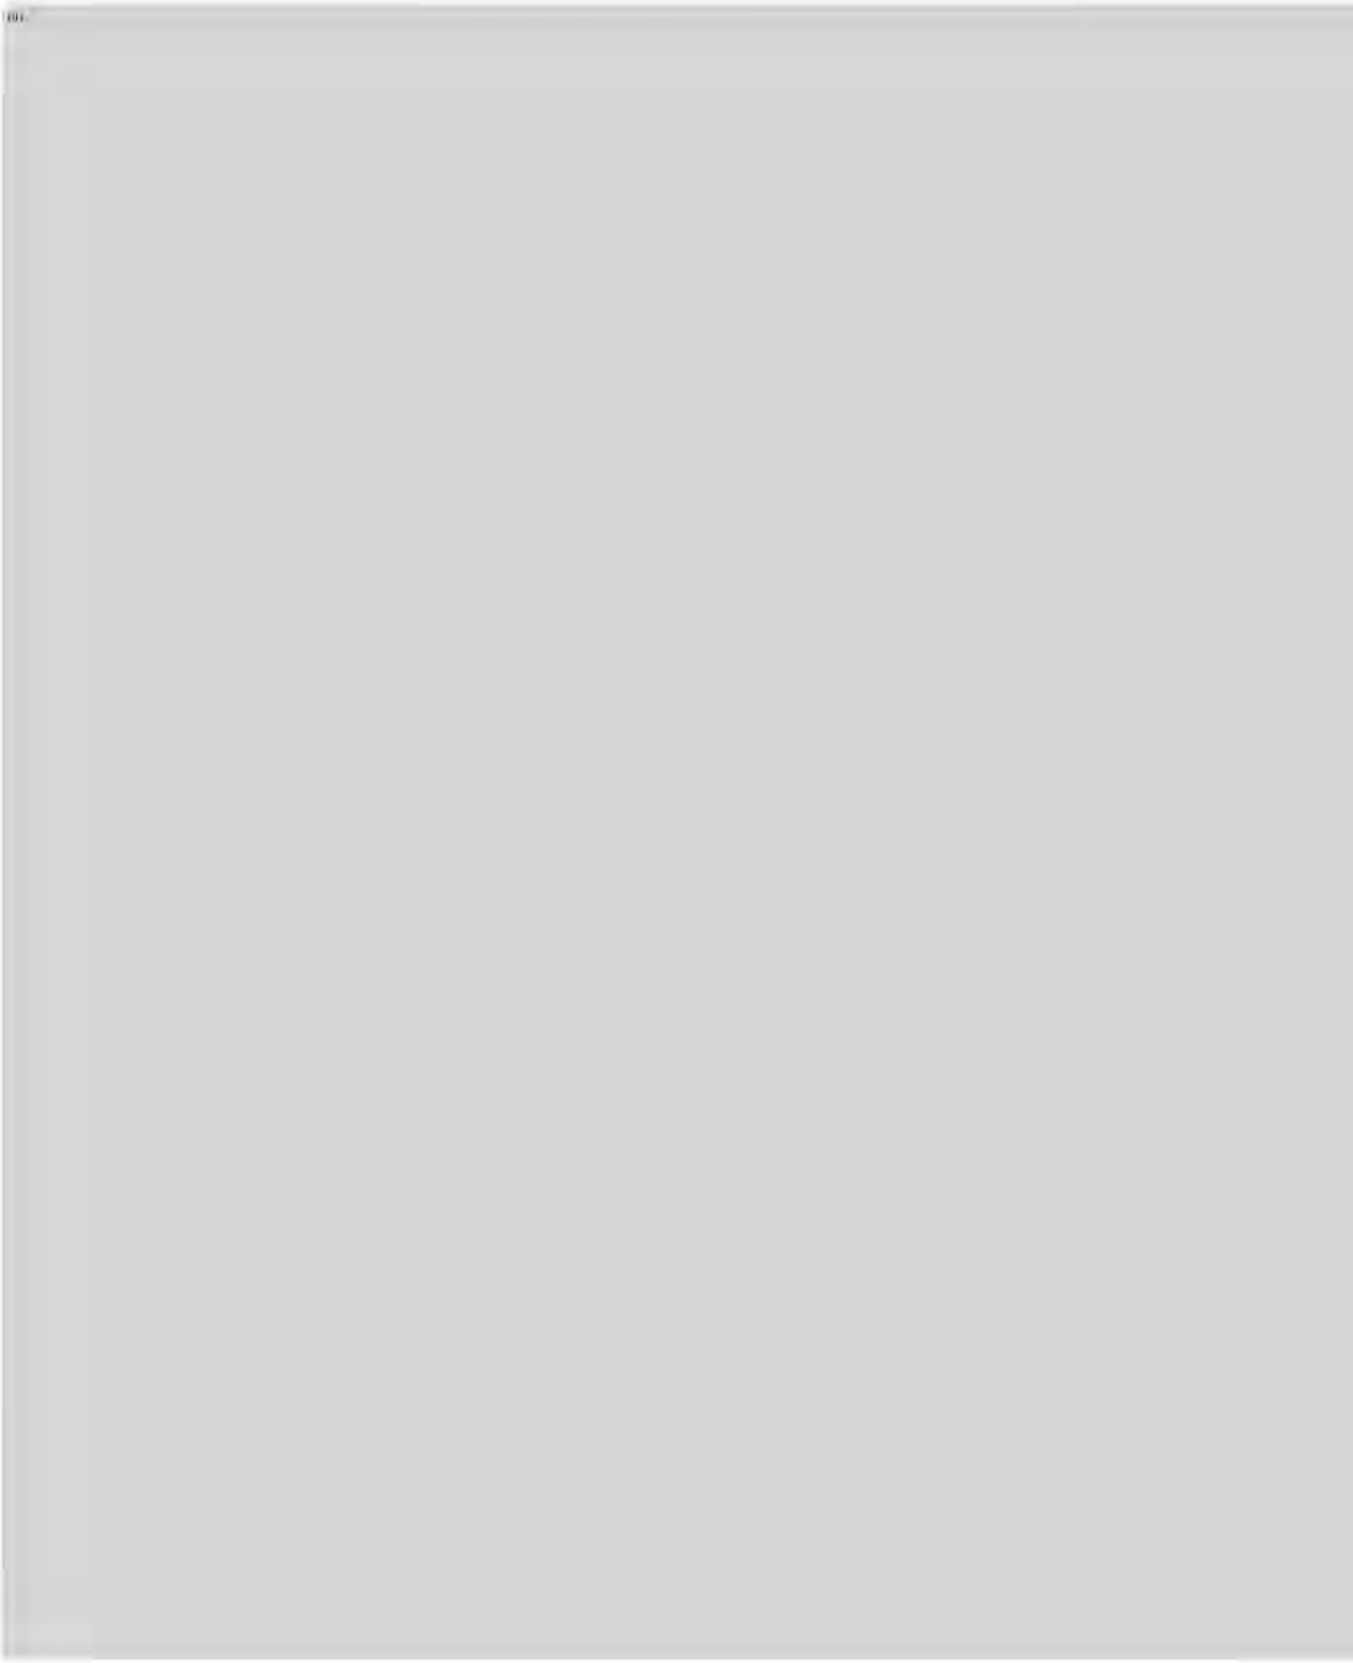

| | | |
|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 |
| 3.4 Bijdrage Prov. Zuid-Holland Molenvlietpark | pm | pm |

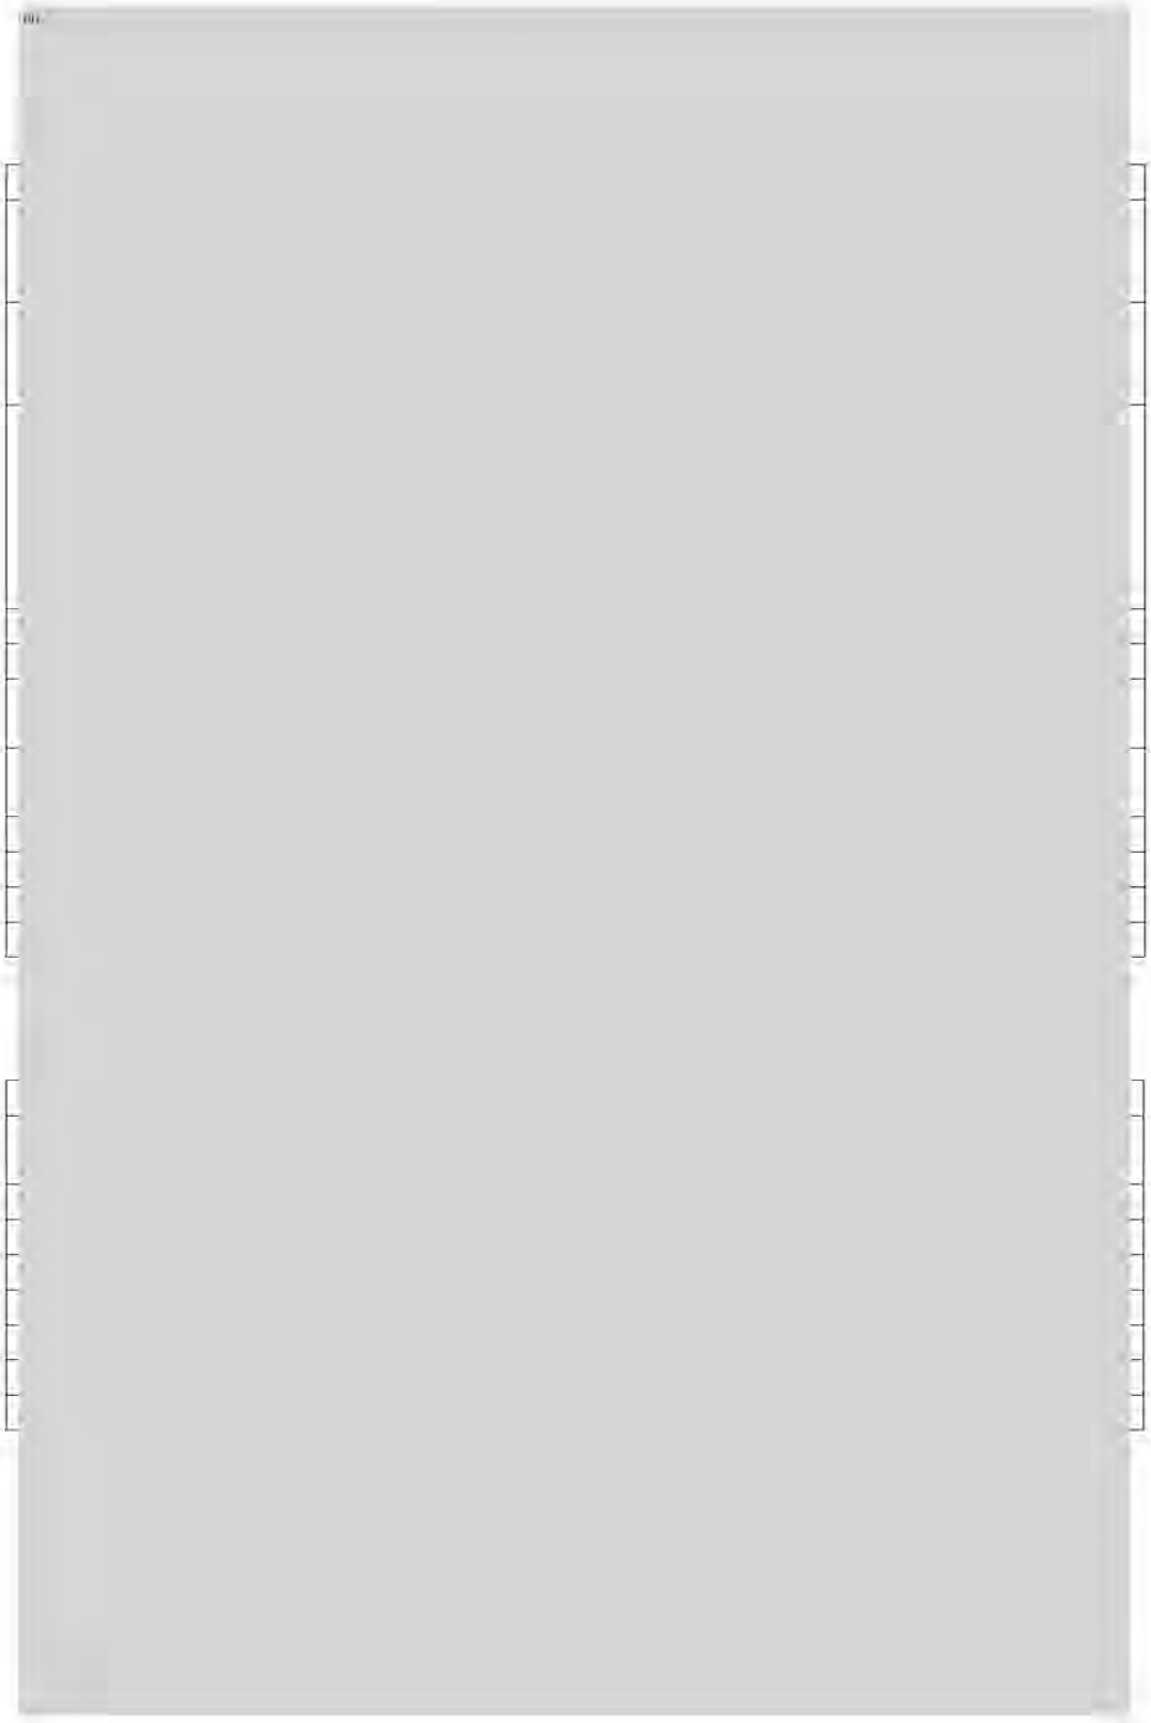

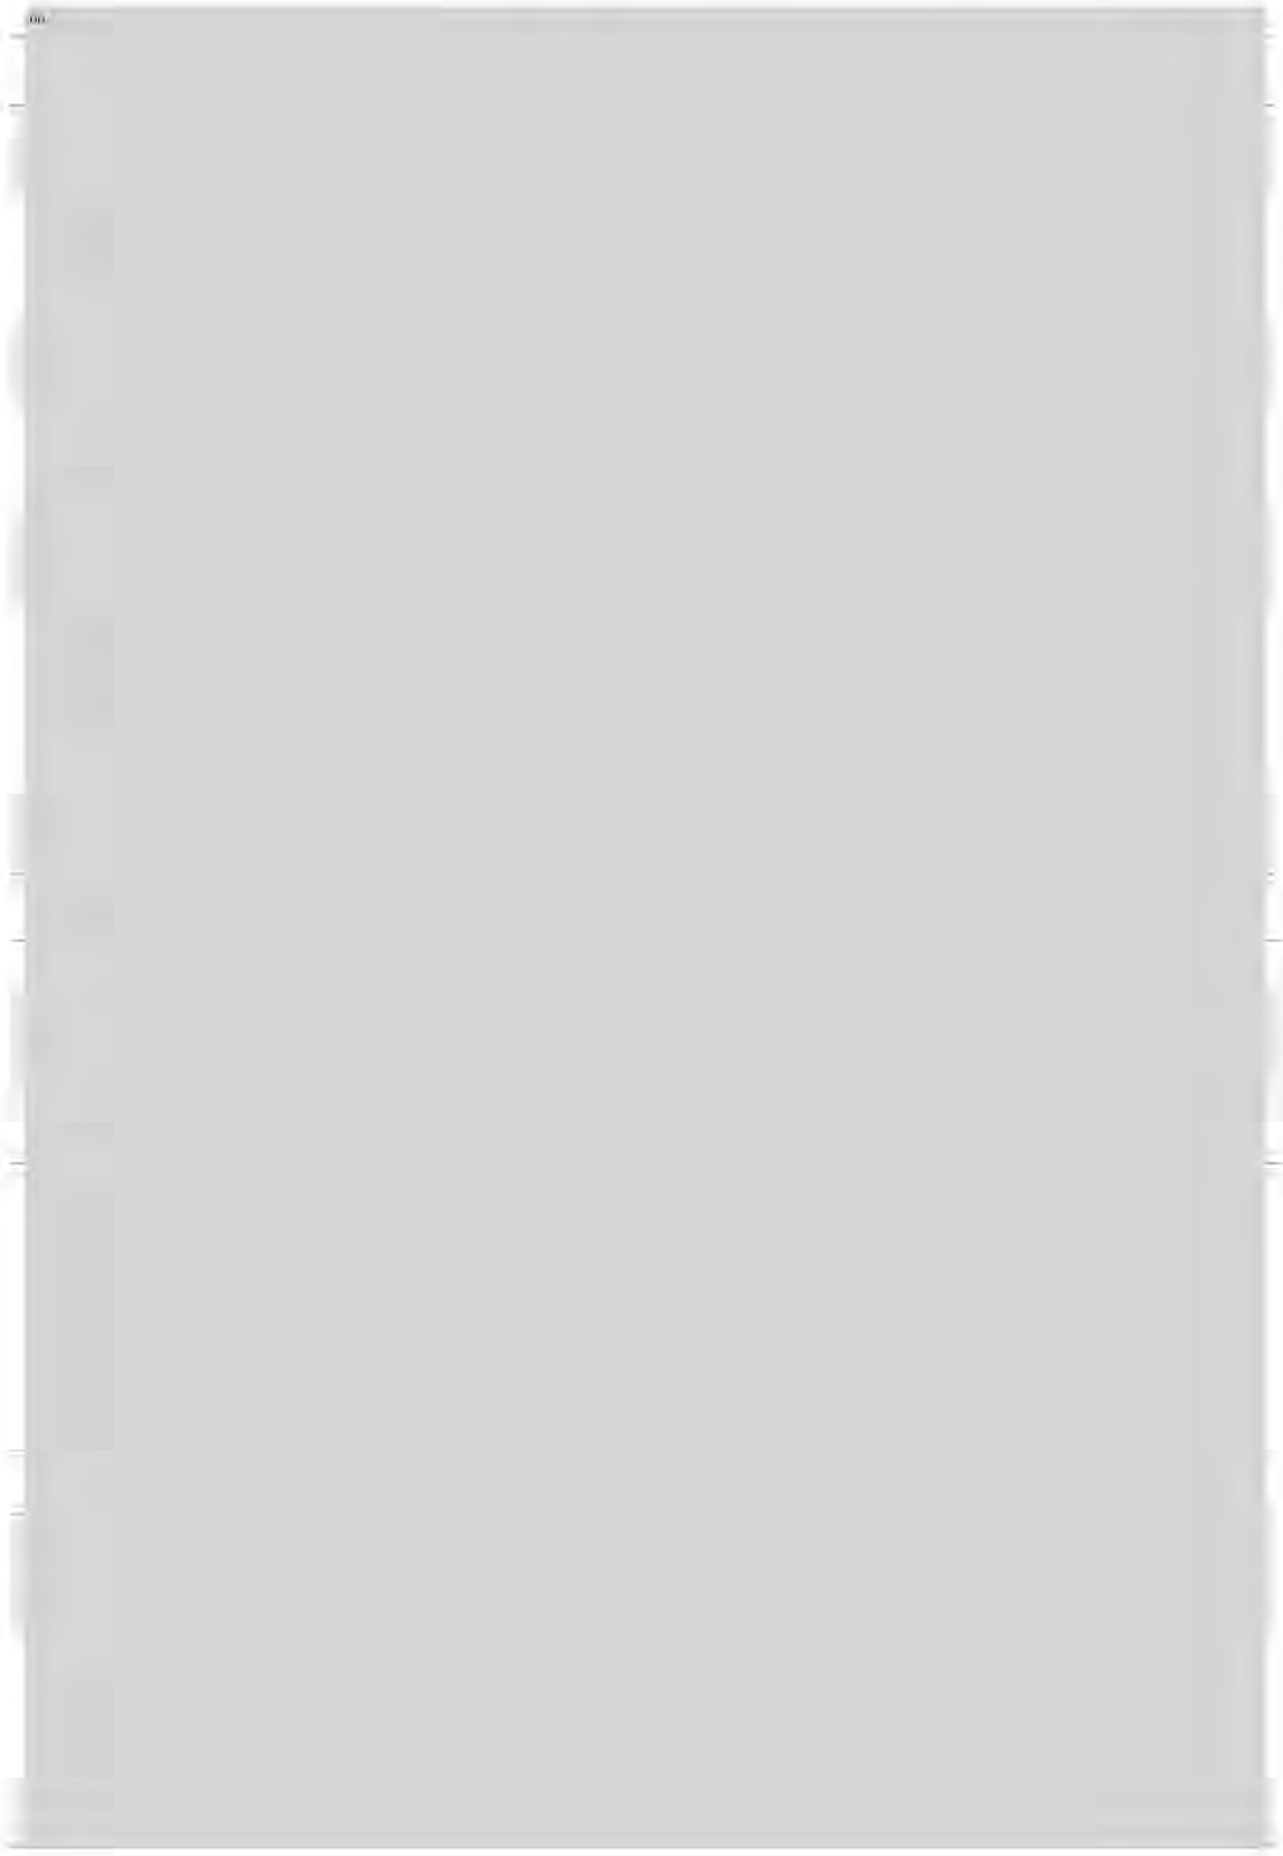

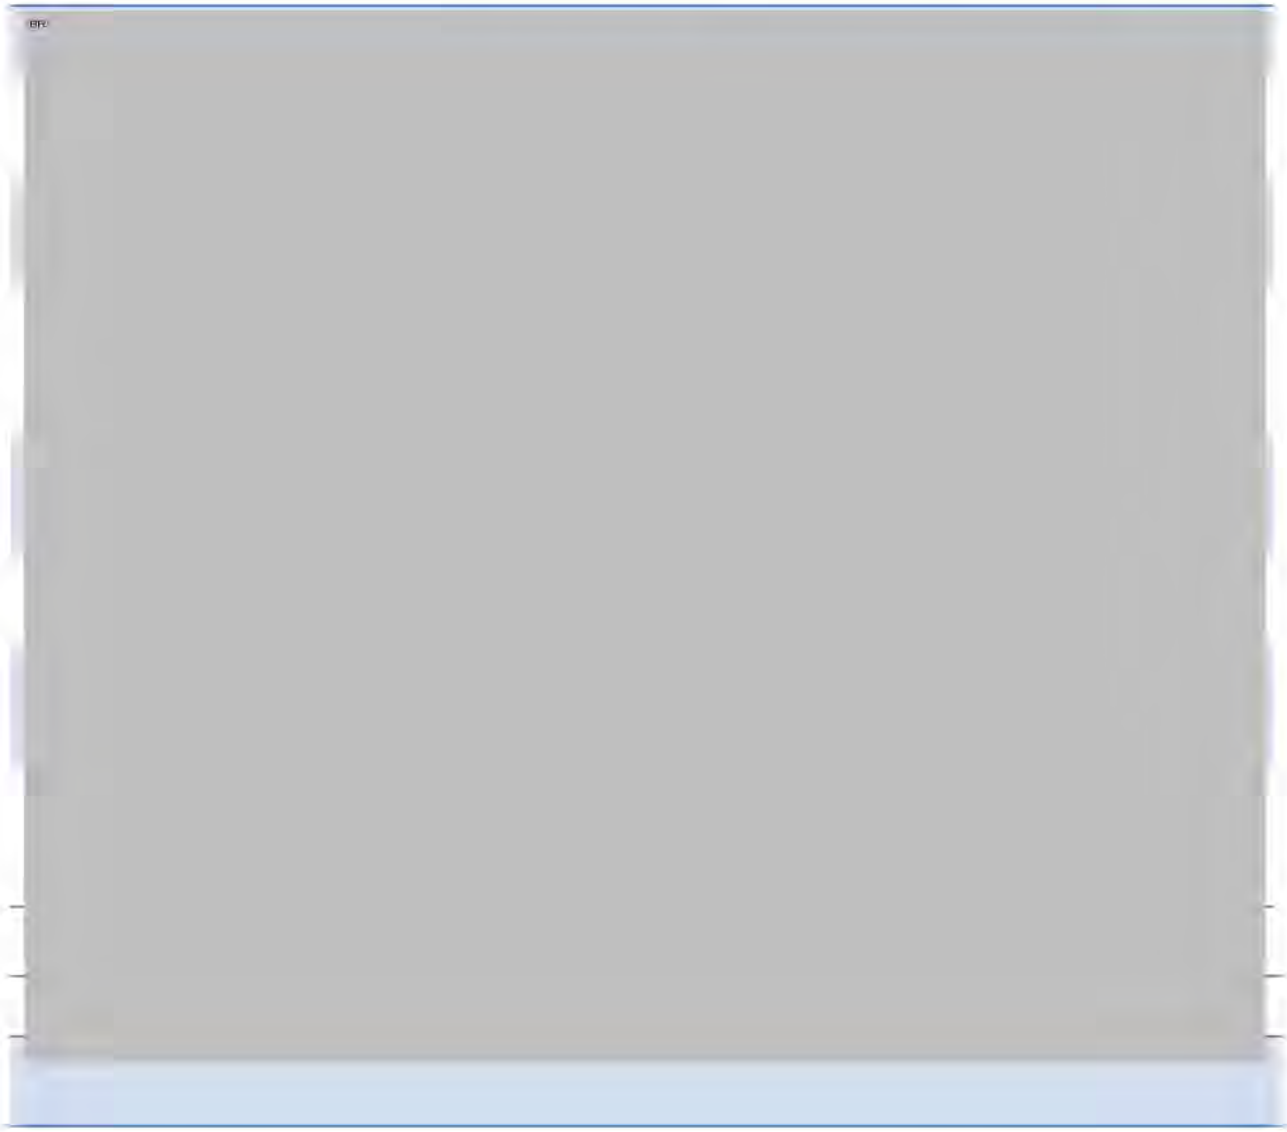

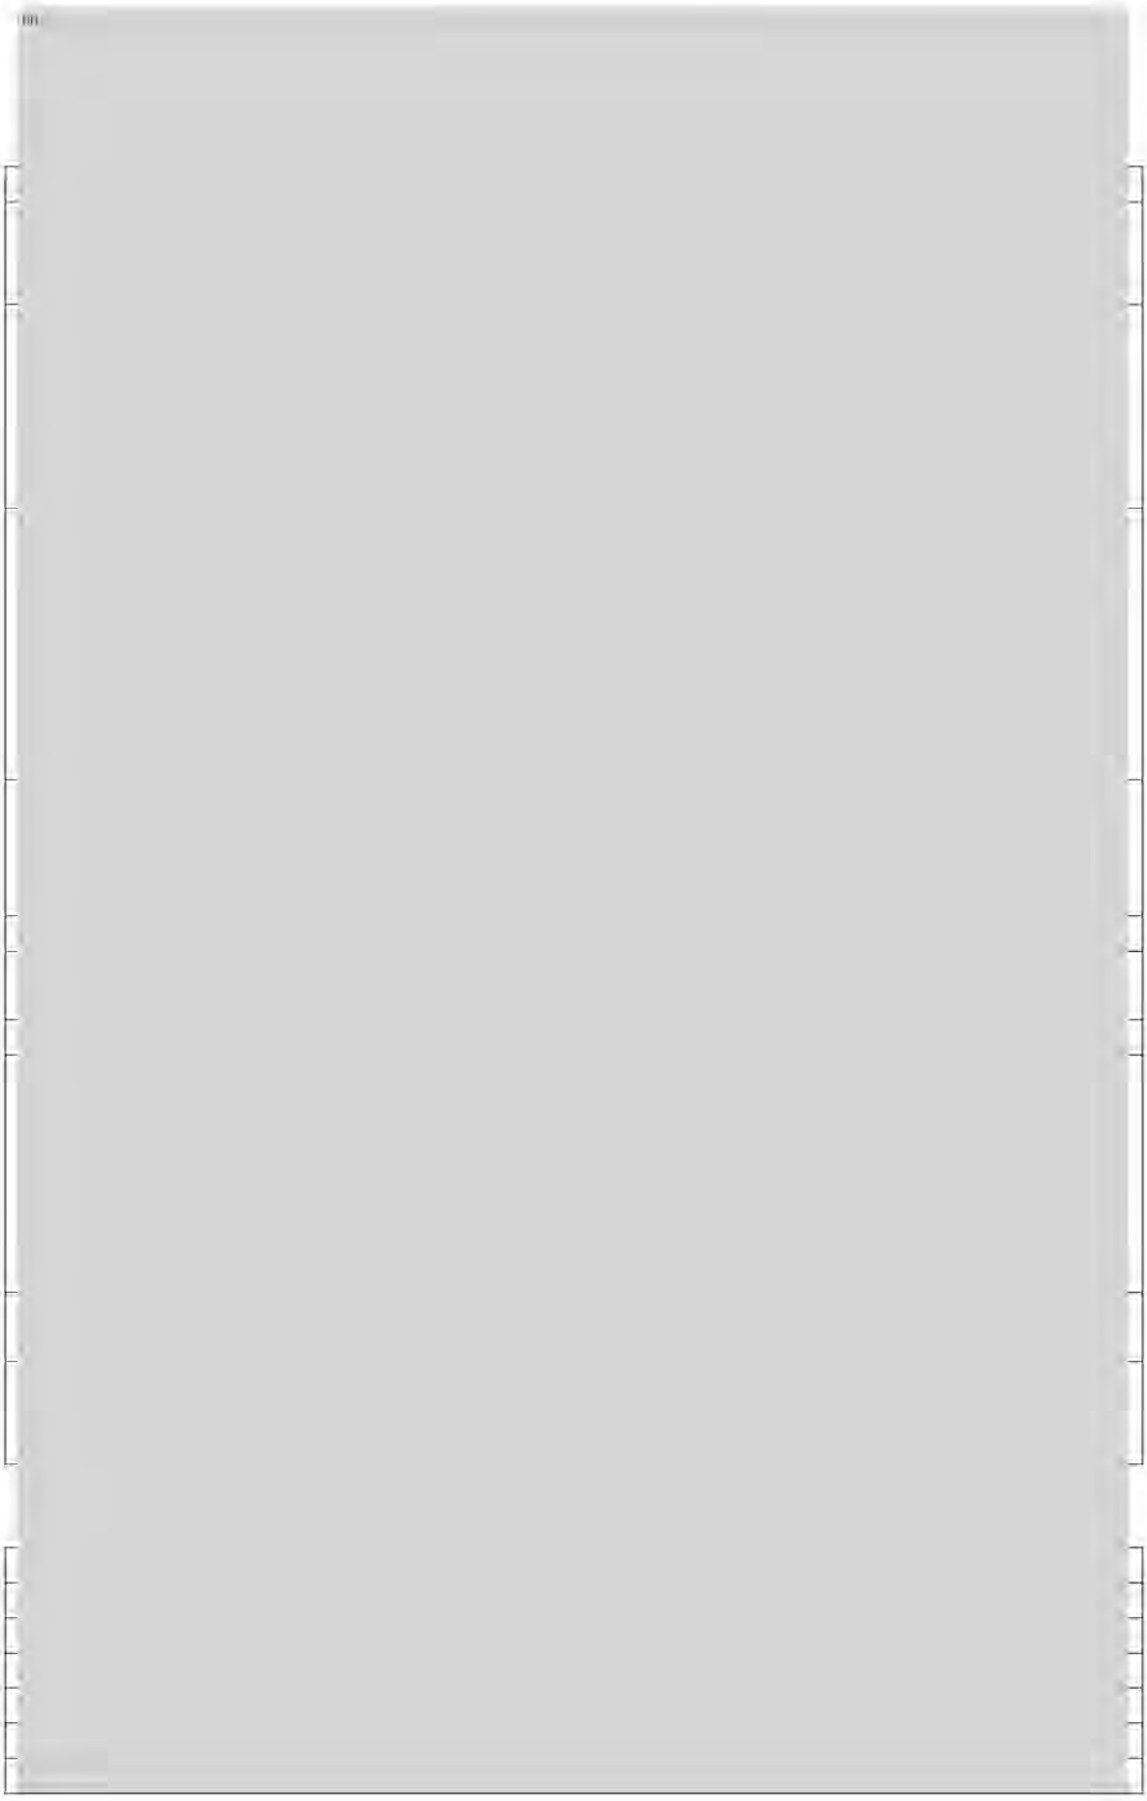

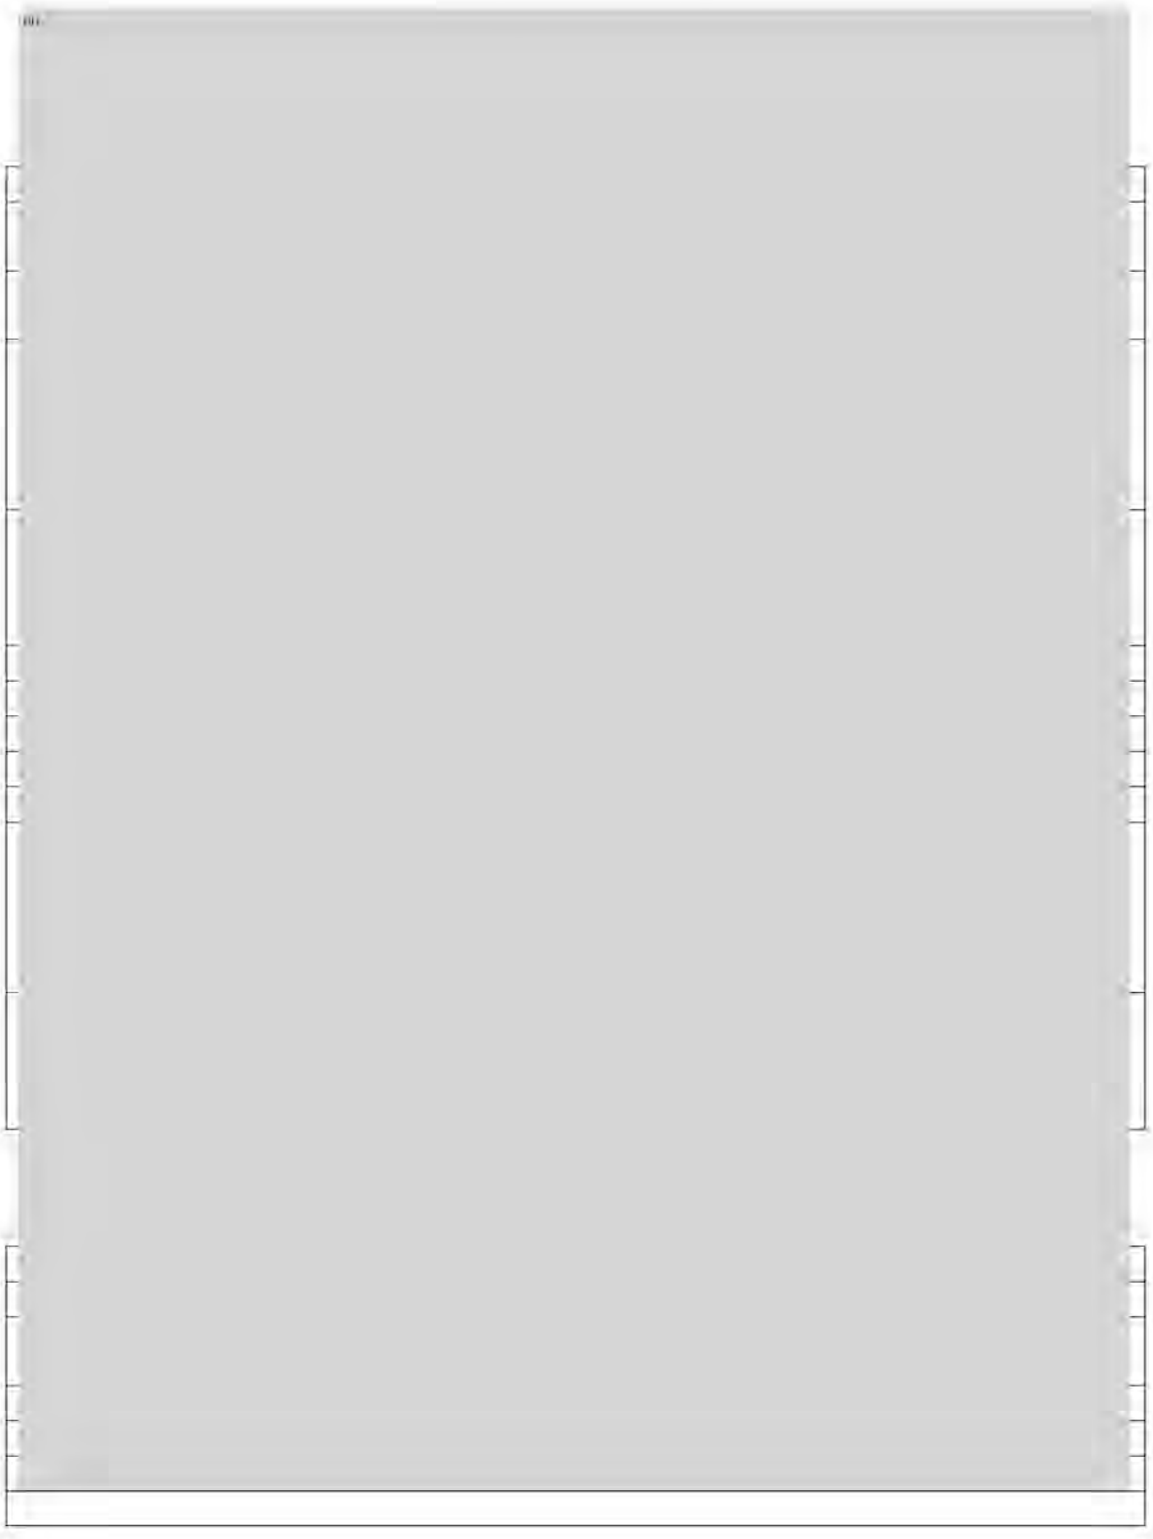

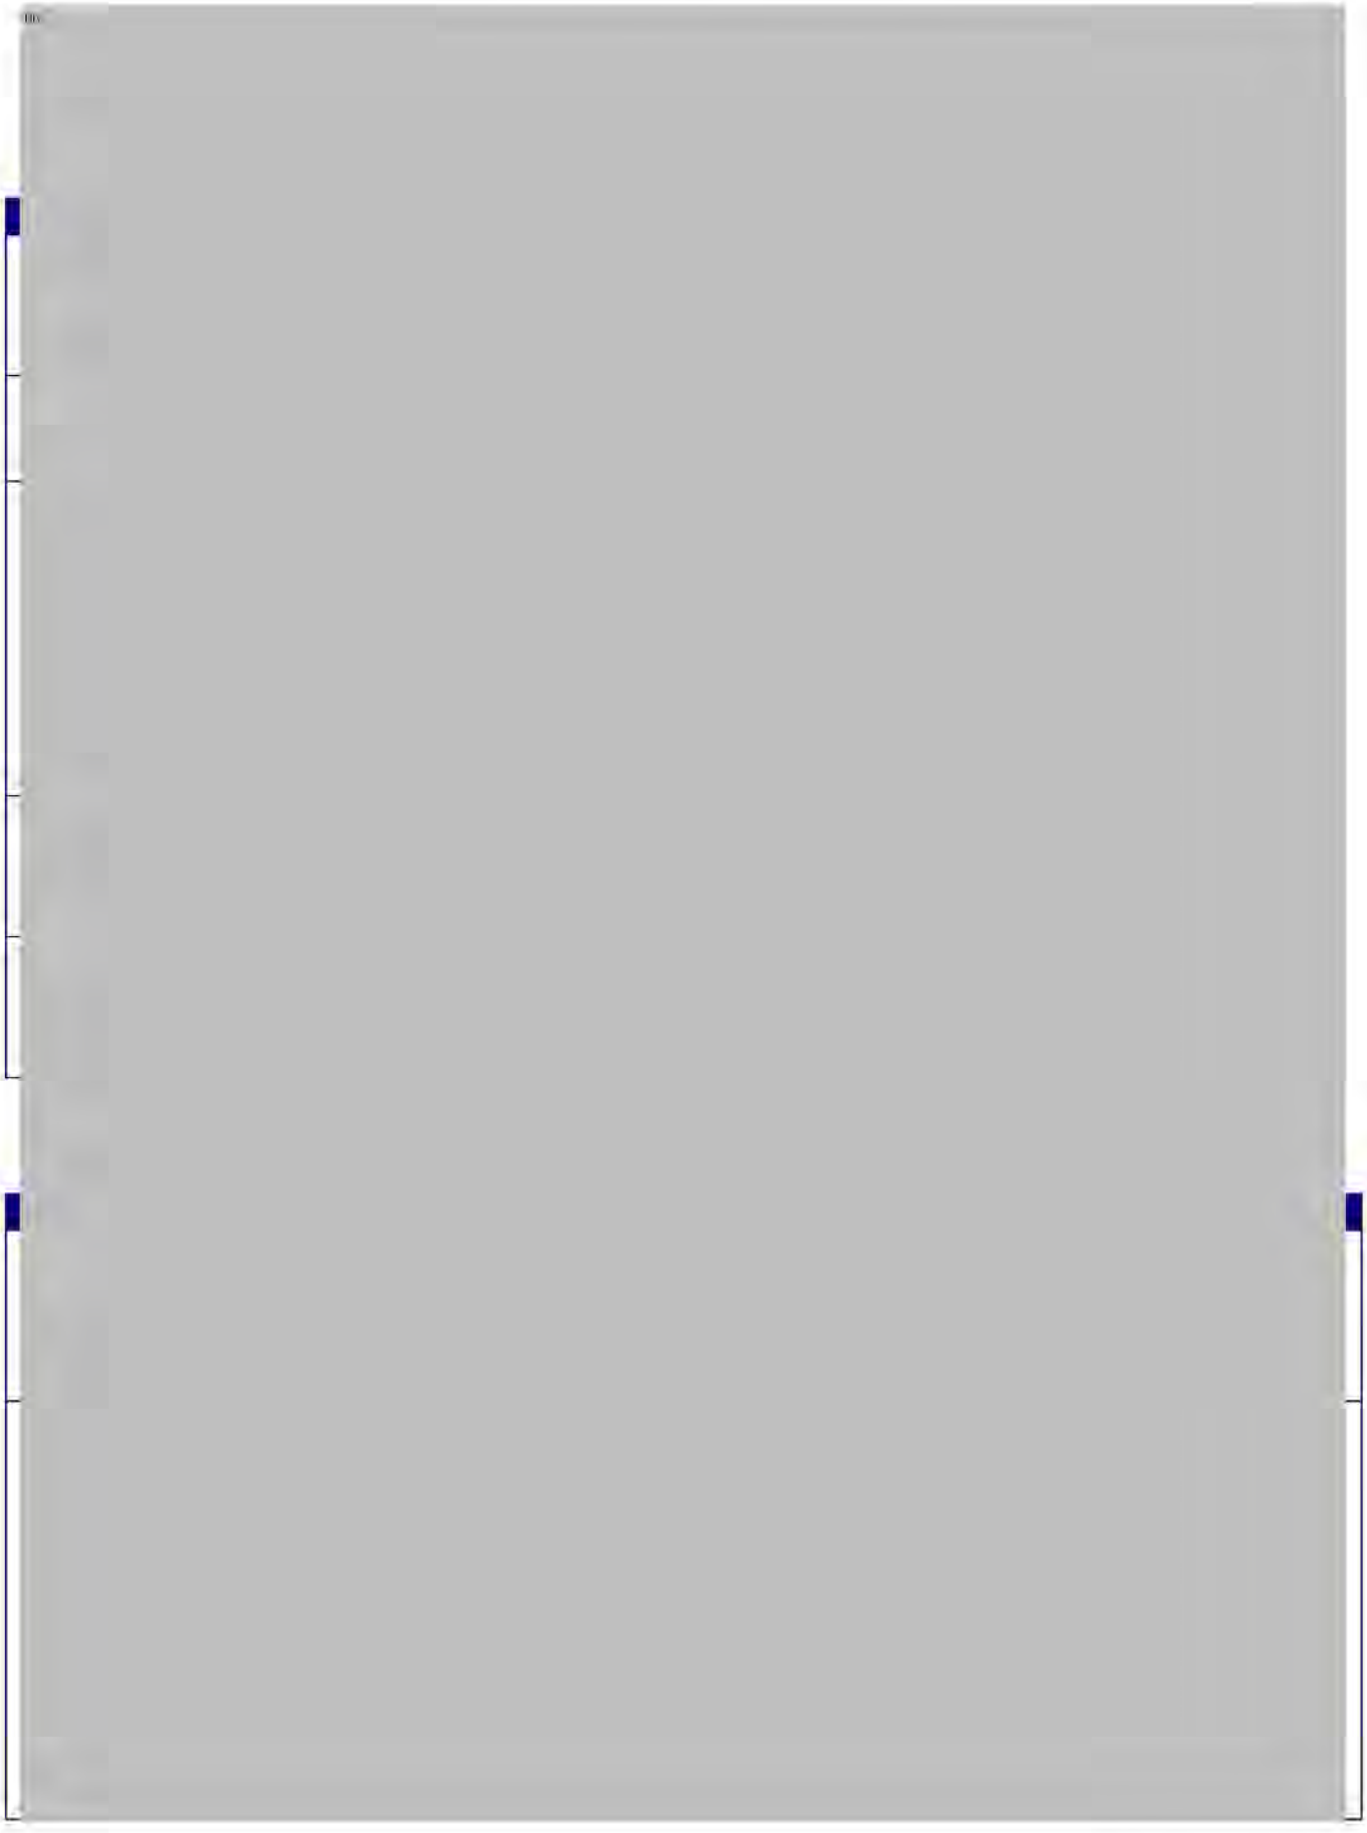

Docnr9

Dienst Stadsbeheer
Afdeling Opdrachtgeving

# Rotterdamsebaan

## Voortgangsrapportage

### 4e kwartaal 2015

**Datum: 28 januari 2016**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie: 2.0**

| Opgesteld: | Gecontroleerd: | Geautoriseerd: | Vastgesteld: | Aangeboden: |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.1<br>12 januari 2016 | Versie 0.1<br>18 januari 2016 | Versie 1.0<br>20 januari 2016 | Versie 2.0<br>28 januari 2016 | Versie 2.0<br>5 februari 2016 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Directeur Dienst Stadsbeheer | Dhr. B. Revis, wethouder / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

# Inhoudsopgave

**1. Managementsamenvatting ..... 6**
**1.1** Projectgegevens ..... 6
**1.2** Algemeen ..... 6
**1.3** Toelichting beheersmaatregelen ..... 6
**1.4** Terugblik afgelopen kwartaal ..... 7
**1.5** Verwachting komende kwartaal ..... 7
**1.6** Financiën ..... 8
**1.7** Planning ..... 8
**1.8** Risico's ..... 8
**1.9** Bestuurlijke besluitvorming komende periode ..... 8
**2 Omgevingsmanagement & Communicatie ..... 9**
**2.1** Omgevingsmanagement ..... 9
2.1.1 Afgelopen kwartaal ..... 9
2.1.2 Komende kwartaal ..... 10
**2.2** Planologie ..... 11
2.2.1 Afgelopen kwartaal ..... 11
2.2.2 Komende kwartaal ..... 11
**2.3** Vergunningen ..... 12
2.3.1 Afgelopen kwartaal ..... 12
2.3.2 Komende kwartaal ..... 12
**2.4** Verwervingen ..... 13
2.4.1 Afgelopen kwartaal ..... 13
2.4.2 Komende kwartaal ..... 13
**2.5** Overeenkomsten ..... 14
2.5.1 Afgelopen kwartaal ..... 14
2.5.2 Komende kwartaal ..... 14
**2.6** Communicatie ..... 15
2.6.1 Afgelopen kwartaal ..... 15
2.6.2 Komende kwartaal ..... 15
2.6.3 Diversen ..... 16
**3. Projectvoortgang ..... 17**
**3.1** Aanbesteden en contracteren ..... 17
3.1.1 Afgelopen kwartaal ..... 17
3.1.2 Komende kwartaal ..... 17
**3.2** Vormgeving ..... 18
3.2.1 Afgelopen kwartaal ..... 18
3.2.2 Komende kwartaal ..... 18
**3.3** Monitoring ..... 19
3.3.1 Afgelopen kwartaal ..... 19
3.3.2 Komende kwartaal ..... 19
**3.4** Inpassing Binckhorst ..... 20
3.4.1 Afgelopen kwartaal ..... 20
3.4.2 Komende kwartaal ..... 21
**3.5** Inpassing Vlietzone ..... 22
3.5.1 Afgelopen kwartaal ..... 22

3.5.2 Komende kwartaal ..... 23
**3.6** Boortunnel en toeritten ..... 24
3.6.1 Afgelopen kwartaal ..... 24
3.6.2 Komende kwartaal ..... 24
**3.7** Verdiepte ligging Ypenburg ..... 25
3.7.1 Afgelopen kwartaal ..... 25
3.7.2 Komende kwartaal ..... 25
**3.8** Installaties ..... 26
3.8.1 Afgelopen kwartaal ..... 26
3.8.2 Komende kwartaal ..... 26
**3.9** Veiligheid en gezondheid ..... 27
3.9.1 Afgelopen kwartaal ..... 27
3.9.2 Komende kwartaal ..... 27
**3.10** Uitvoeringskwaliteit ..... 28
3.10.1 Afgelopen kwartaal ..... 28
3.10.2 Komende kwartaal ..... 28
**3.11** Contractmanagement ..... 29
3.11.1 Afgelopen kwartaal ..... 29
3.11.2 Komende kwartaal ..... 29
**4. Overdracht en openstelling ..... 30**
**4.1** Tunnelveiligheid ..... 30
4.1.1 Afgelopen kwartaal ..... 30
4.1.2 Komende kwartaal ..... 30
**4.2** Overdracht aan beheerders ..... 31
4.2.1 Afgelopen kwartaal ..... 31
4.2.2 Komende kwartaal ..... 31
**4.3** Beheer en onderhoud ..... 32
4.3.1 Afgelopen kwartaal ..... 32
4.3.2 Komende kwartaal ..... 32
**5. Projectbeheersing ..... 33**
**5.1** Scope ..... 33
5.1.1 Afgelopen kwartaal ..... 33
5.1.2 Komende kwartaal ..... 33
**5.2** Financiën ..... 34
5.2.1 Kostenstructuur ..... 34
5.2.2 Dekkingen ..... 36
**5.3** Planning ..... 38
5.3.1 Afgelopen kwartaal ..... 38
5.3.2 Komende kwartaal ..... 38
**5.4** Risico's ..... 39
5.4.1 Afgelopen kwartaal ..... 39
5.4.2 Komende kwartaal ..... 39
5.4.3 Financiële toprisico's ..... 39
5.4.4 Toprisico's planning ..... 41
**5.5** Interne kwaliteit ..... 43
5.5.1 Afgelopen kwartaal ..... 43
5.5.2 Komende kwartaal ..... 43
**5.6** Informatie ..... 44
5.6.1 Afgelopen kwartaal ..... 44
5.6.2 Komende kwartaal ..... 44
**5.7** Organisatie ..... 45

5.7.1 Afgelopen kwartaal ..... 45
5.7.2 Komende kwartaal ..... 45
**6. Bijlage: Hoofdlijnenplanning ..... 46**
**7. Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan ..... 47**
**8. Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer ..... 49**

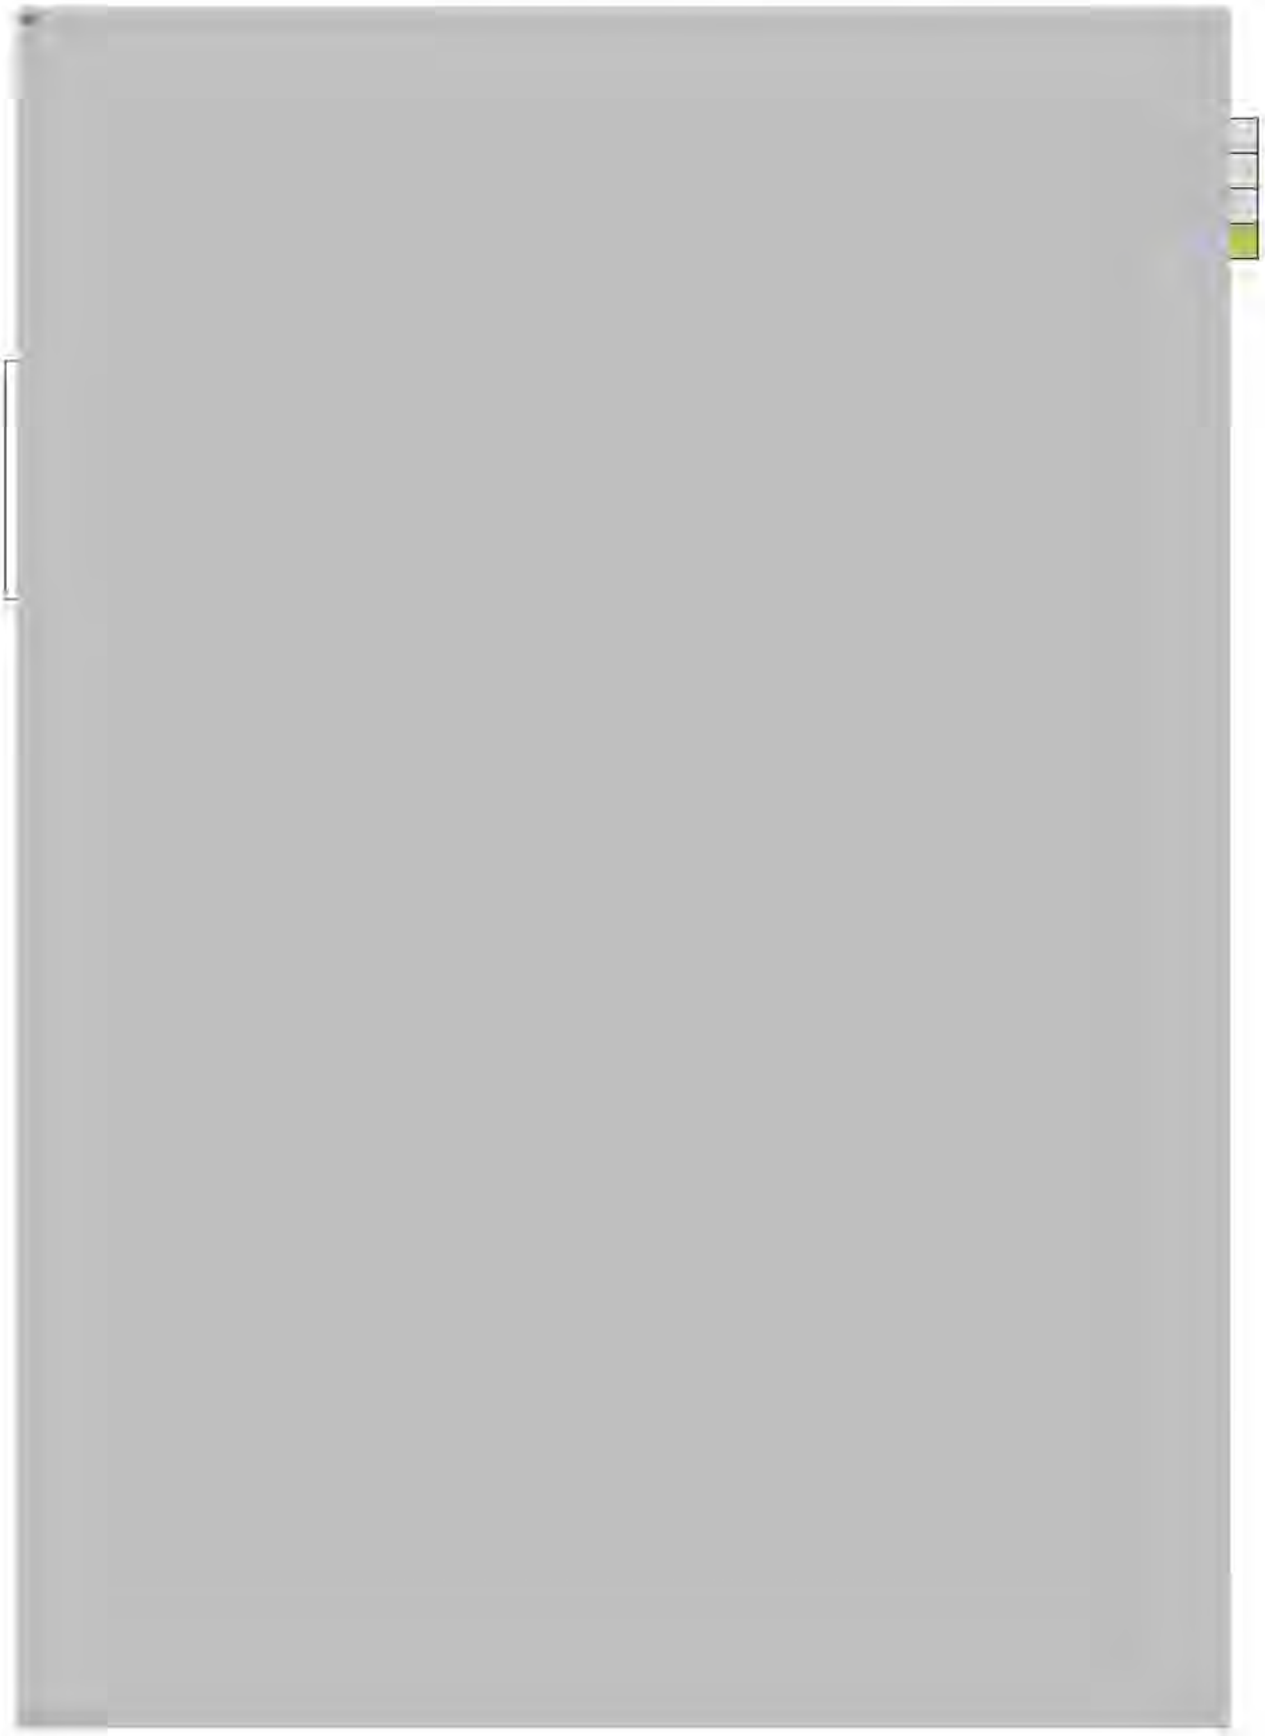

## 1.4 Terugblik afgelopen kwartaal

- Na de vaststelling van het bestemmingsplan Molenvlietpark hebben de bewoners van twee woningen aan de Westvlietweg een beroep ingediend bij de Raad van State tegen het bestemmen van hun twee woningen. Dit beroep is nog niet behandeld. Er is geen opschortende werking aangevraagd waardoor het bestemmingsplan in werking is getreden;

## 1.9 Bestuurlijke besluitvorming komende periode

- Collegebesluit samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e t.a.v. waterinlaat van Vliet naar calamiteitenberging Molenvlietpark (tezamen met PUK ontwikkeling Nieuw Vredenoord en overeenkomst grondruil) (begin 2016);
- Collegebesluit samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e t.a.v. waterinlaat van Vliet naar calamiteitenberging Molenvlietpark (begin 2016).

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Afronden overeenkomst 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark over zijn gronden. | Uit nadere berekeningen is gebleken dat de inlaat van de waterberging een groter ruimtebeslag legt op gronden van 5.1.2.e Ontwerp wordt in overleg met 5.1.2.e i.r.t. ontwikkeling Nieuw Vredenoord, hierop aangepast. |
| Alsnog overeenkomst zien te bewerkstelligen met 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark, verlegging Molenvlietpark en aanpassing brug. | Met 5.1.2.e nog geen overeenstemming over aanpassingen inzake inlaat bereikt. Doorstart onderhandelingen nadat met 5.1.2.e op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over nieuw ontwerp voor inlaat. |
| [redacted] | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Collegebesluit aangaande overeenkomst met 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark, ontwikkeling Nieuw Vredenoord en Samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e 5.1.2.e | Nog in afwachting van aangepast ontwerp alvorens besluitvorming kan plaatsvinden. |
| | |

### 2.1.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| [redacted] |
| Afronden overeenkomst 5.1.2e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark over zijn gronden. |
| Alsnog overeenstemming zien te bereiken met 5.1.2e t.a.v. de waterinlaat naar de waterberging Molenvlietpark, verlegging Molenslootpad en evt. aanpassing brug nadat overeenstemming met 5.1.2e is bereikt. |
| [redacted] |
| |
| **Besluiten** |
| Collegebesluit aangaande overeenkomst met 5.1.2e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark, ontwikkeling Nieuw Vredenoord en Samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2e 5.1.2e |
| |

## 2.2 Planologie

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

**Overige/extra verrichte werkzaamheden**

Gedurende de termijn van terinzagelegging (23 oktober tot en met 3 december 2015) van het besluit van de gemeenteraad, met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan Molenvlietpark e.o., is beroep ingediend bij de Raad van State. Er is gedurende deze termijn geen voorlopige voorziening bij de Afdeling bestuursrechtspraak aangevraagd. Hierdoor is het vastgestelde bestemmingsplan op 4 december 2015 in werking getreden.

## 2.3 Vergunningen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

**Overige/extra verrichte werkzaamheden**

Op 21 december 2015 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland het ontwerp-projectplan Vlietberging locatie Molenslootpad (Molenvlietpark) te Den Haag ter inzage gelegd.

Op 18 december 2015 heeft de Combinatie Rotterdamsebaan op haar verantwoordelijkheid een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 387 bomen ten behoeve van de Rotterdamsebaan in de Vlietzone. De herplant van de te kappen bomen is geregeld in het inrichtingsplan van het Molenvlietpark.

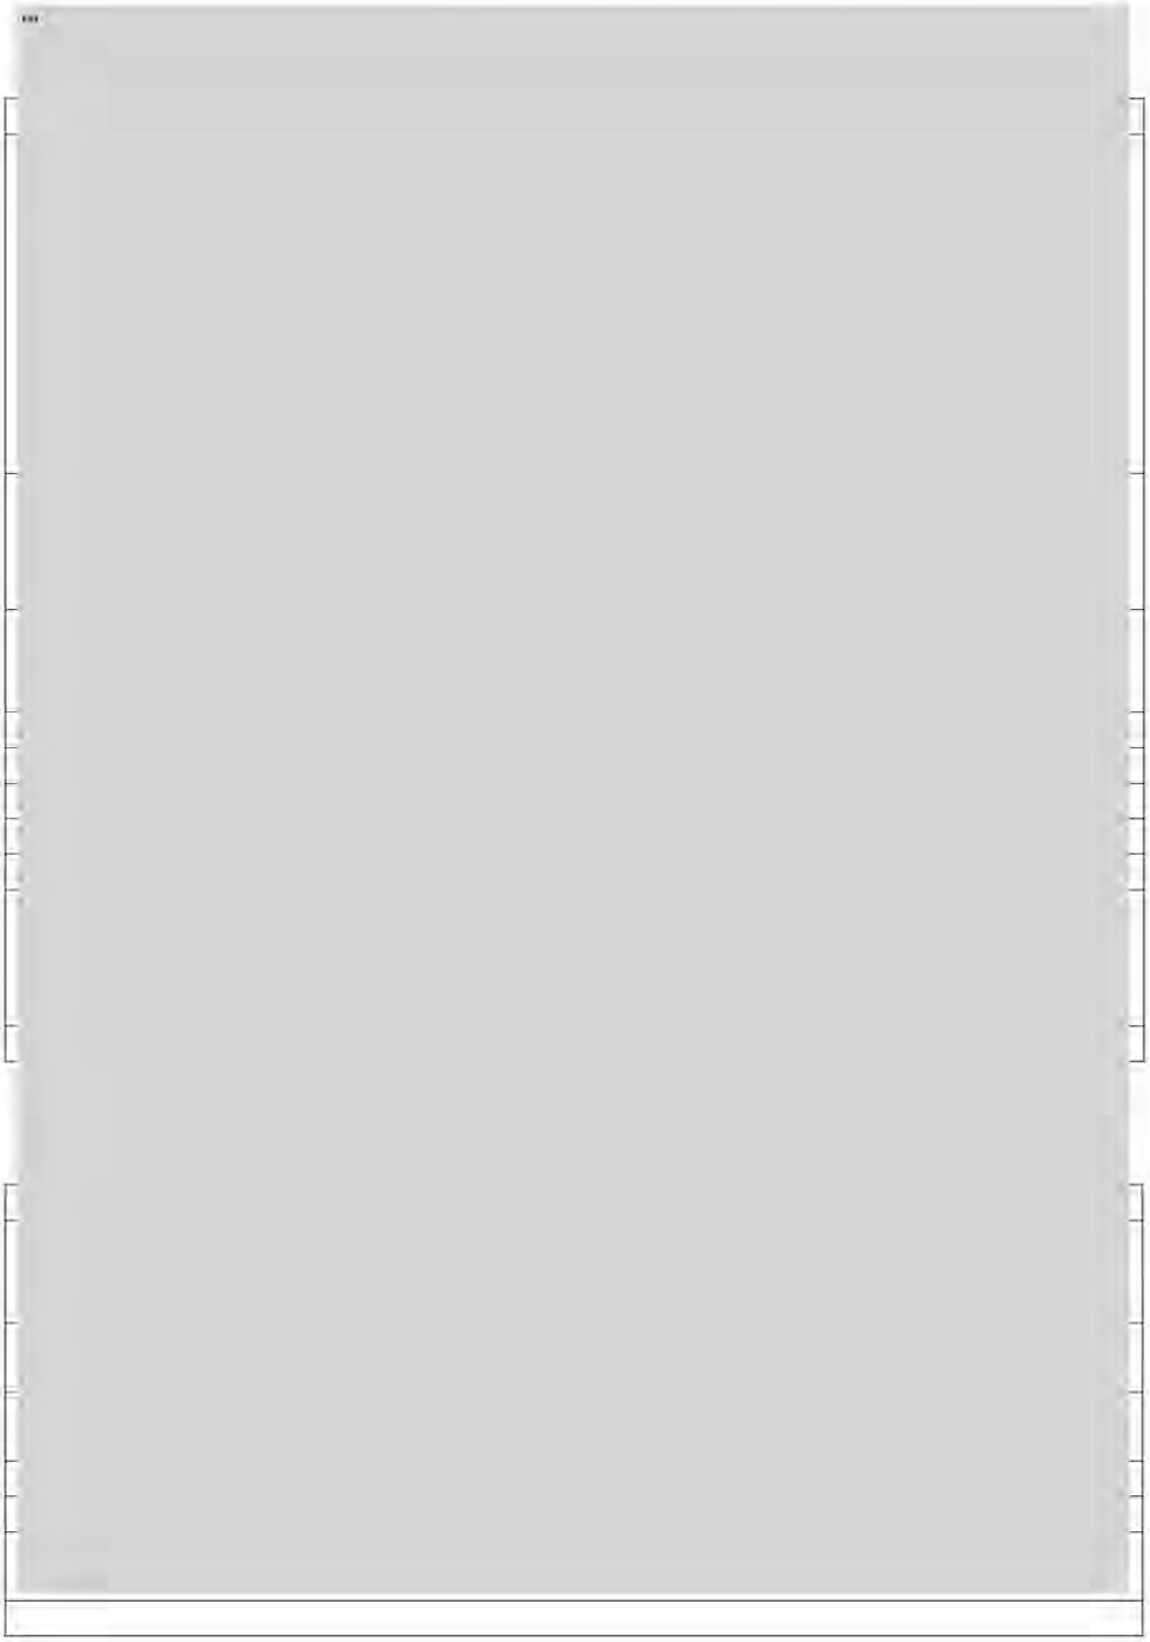

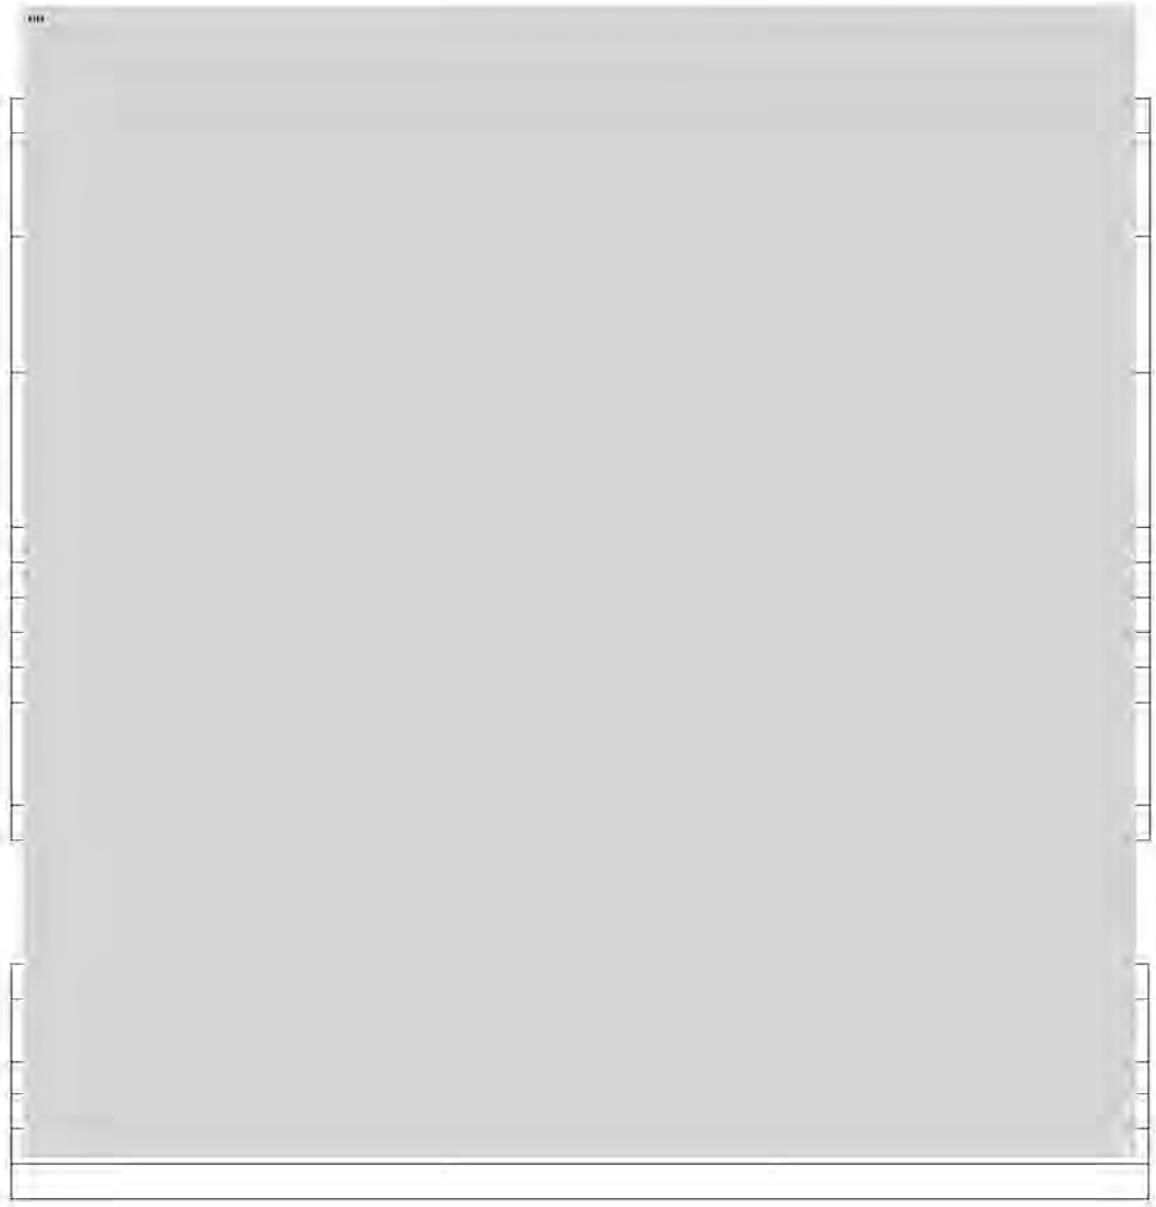

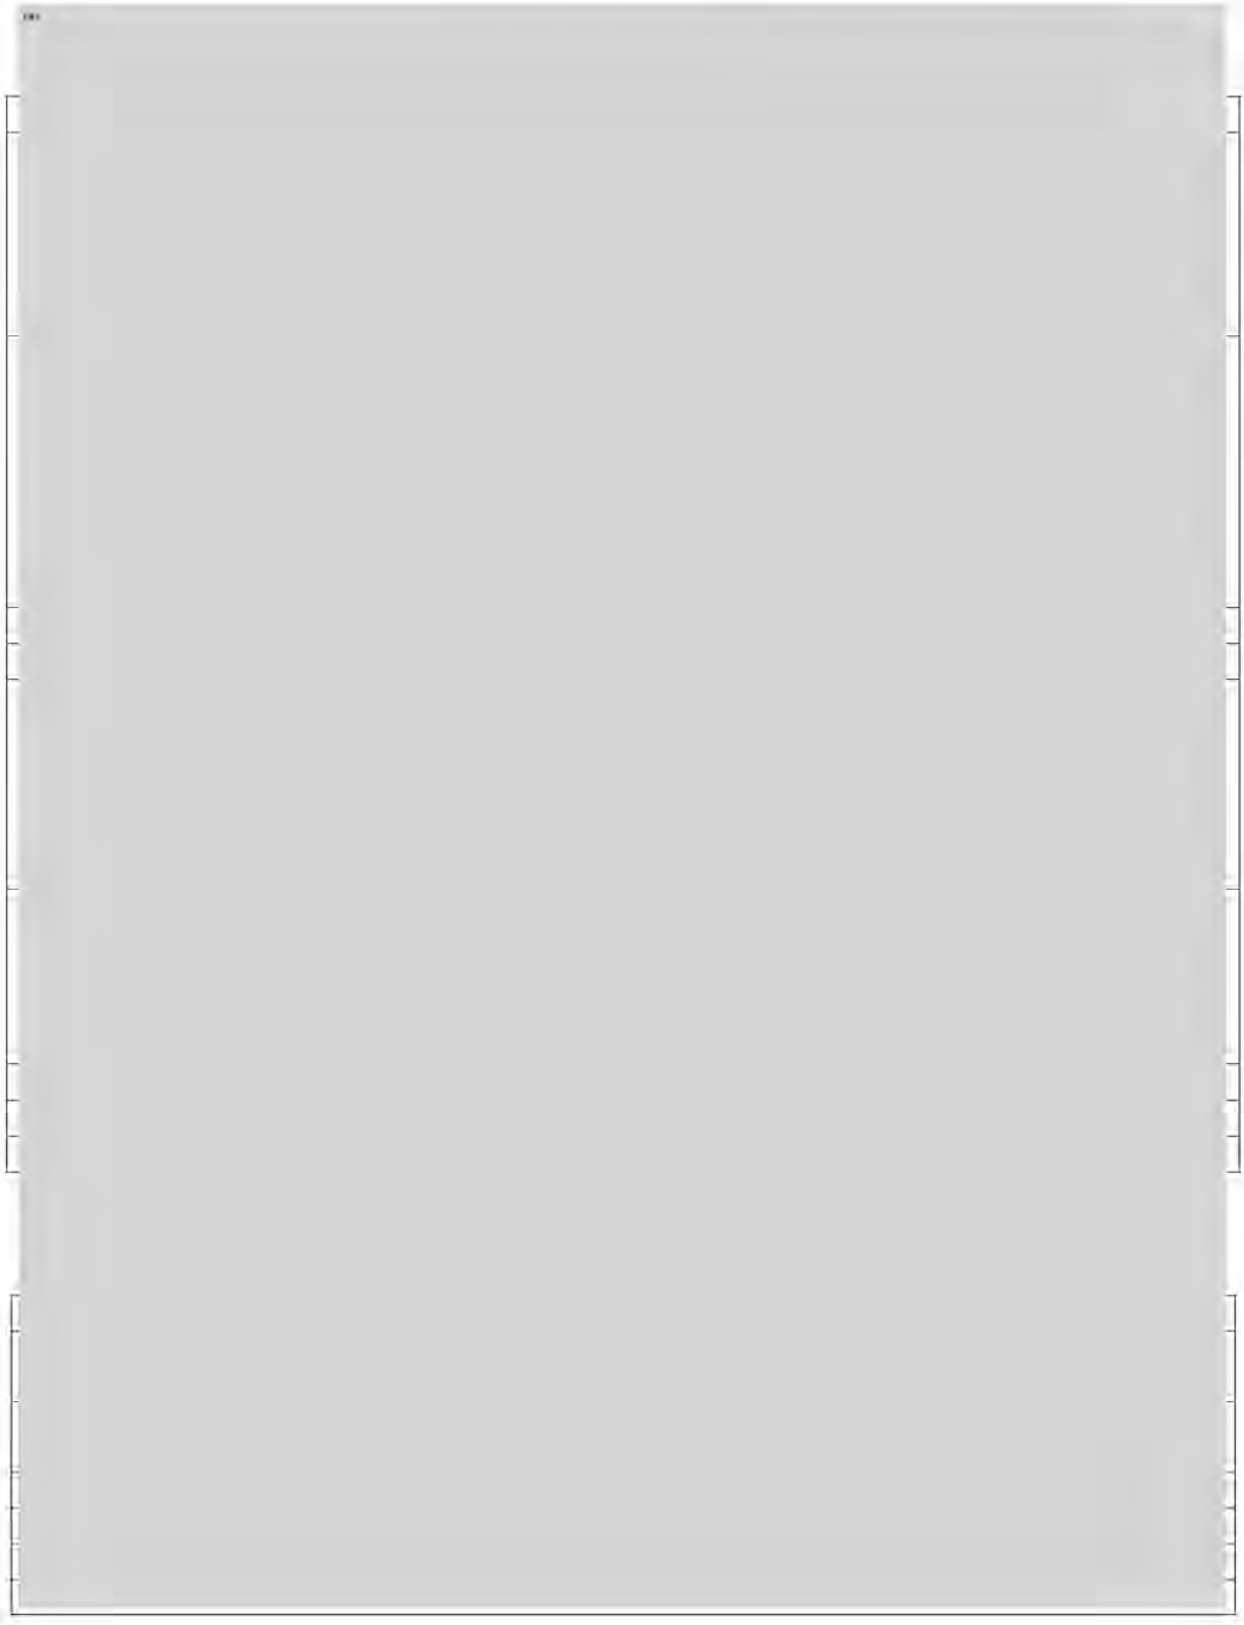

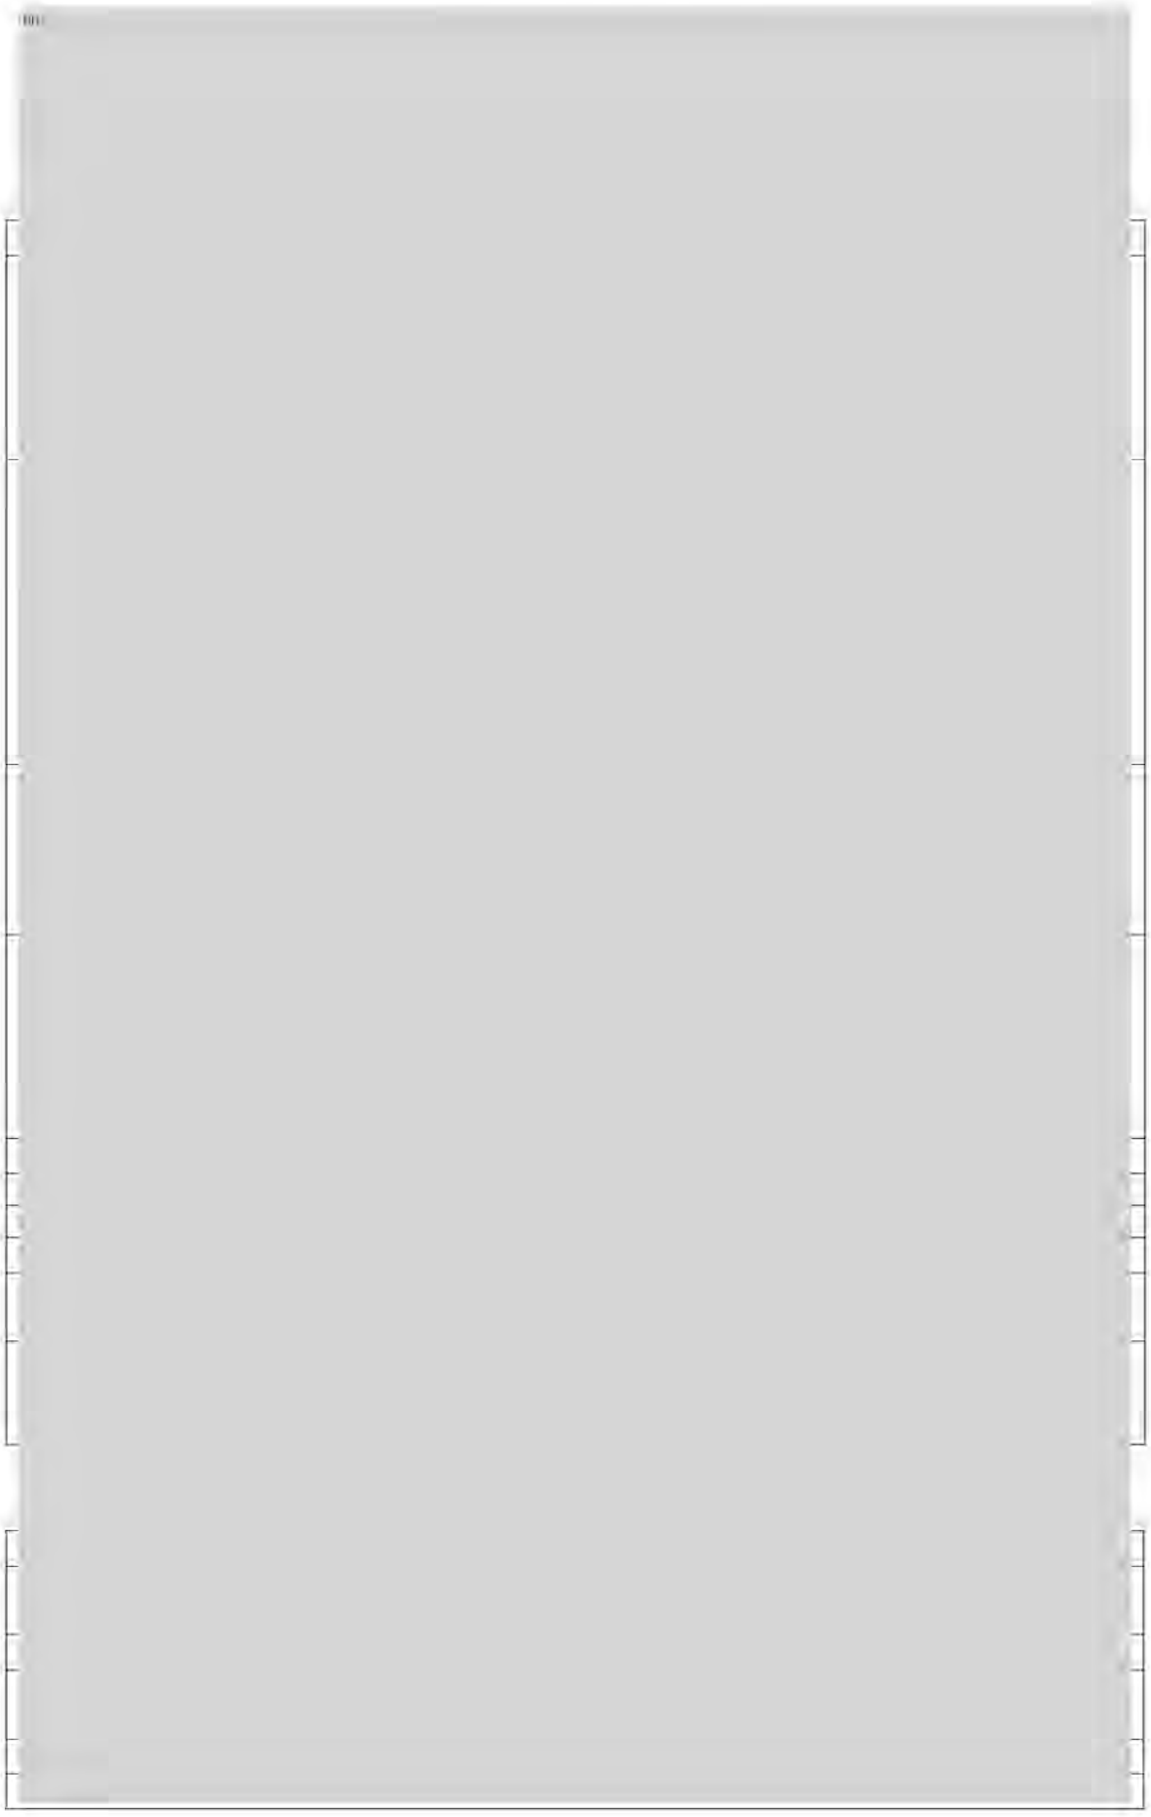

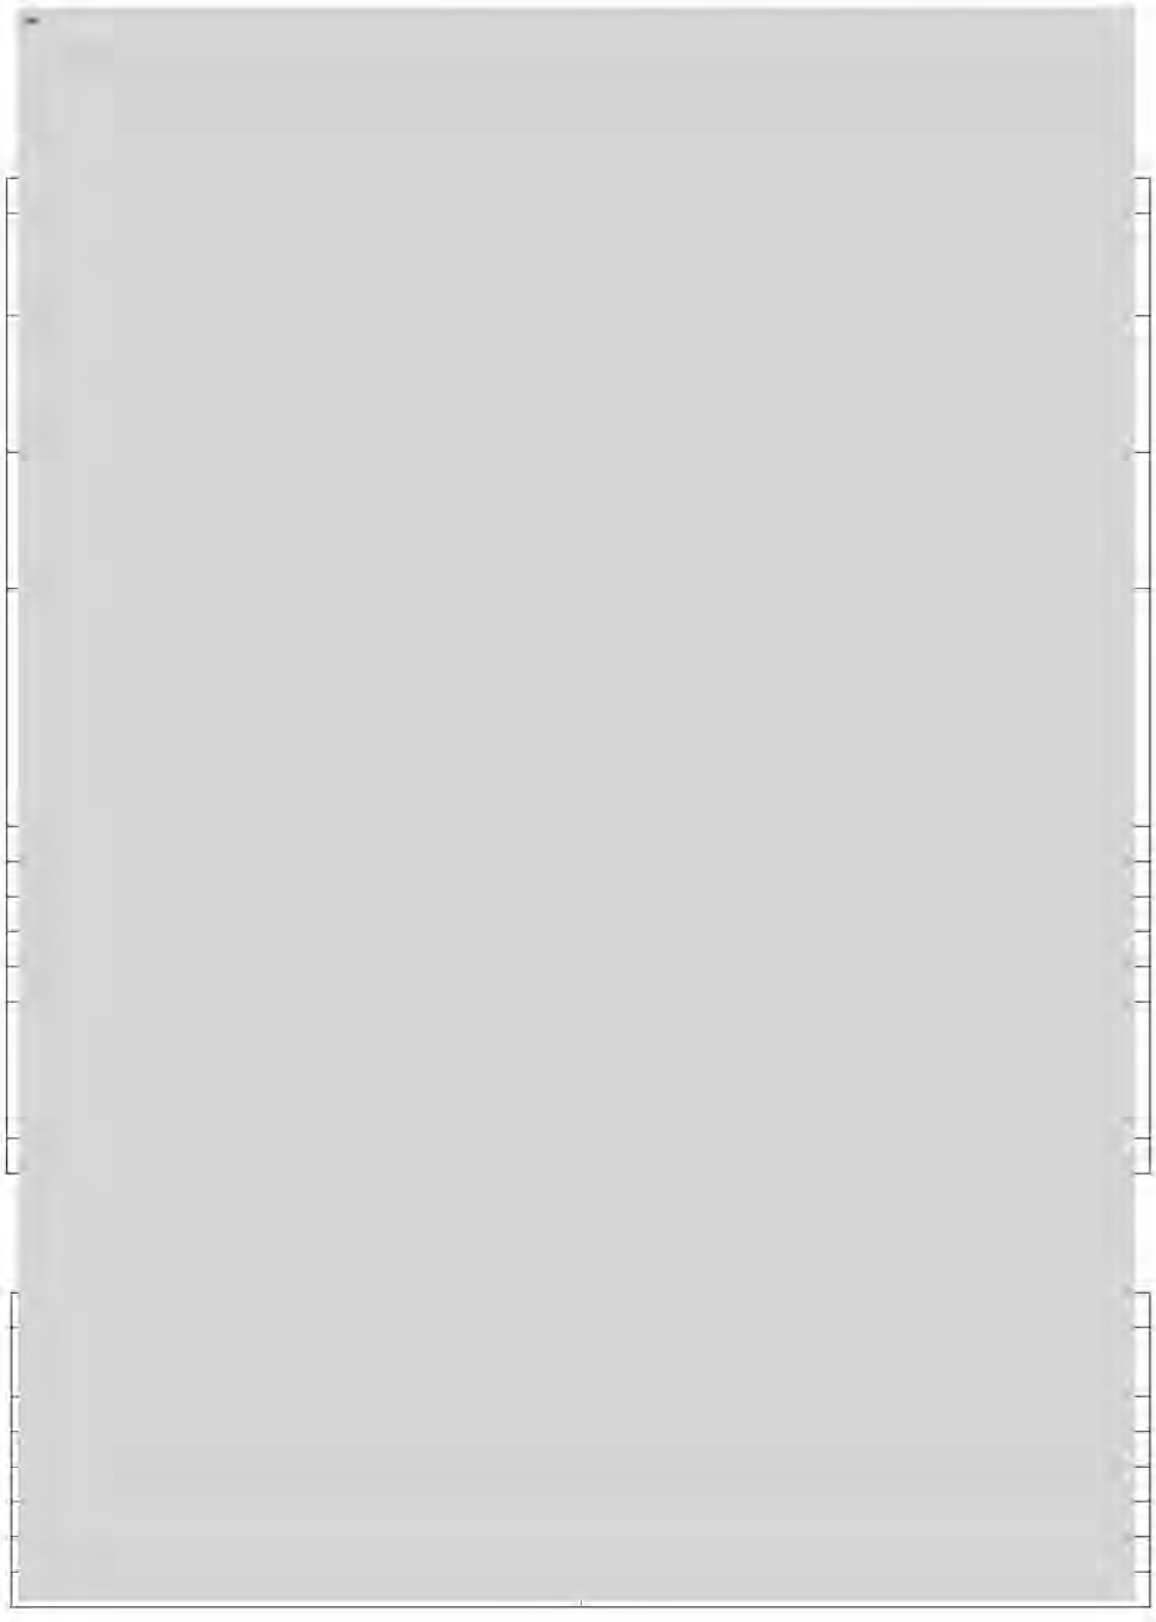

**Overige/extra verrichte werkzaamheden**

Vanwege de vergunningaanvraag bij het Hoogheemraadschap voor het wijzigen van de Legger is er een waterhuishoudkundige optimalisatie in het ontwerp van het Molenvlietpark doorgevoerd.

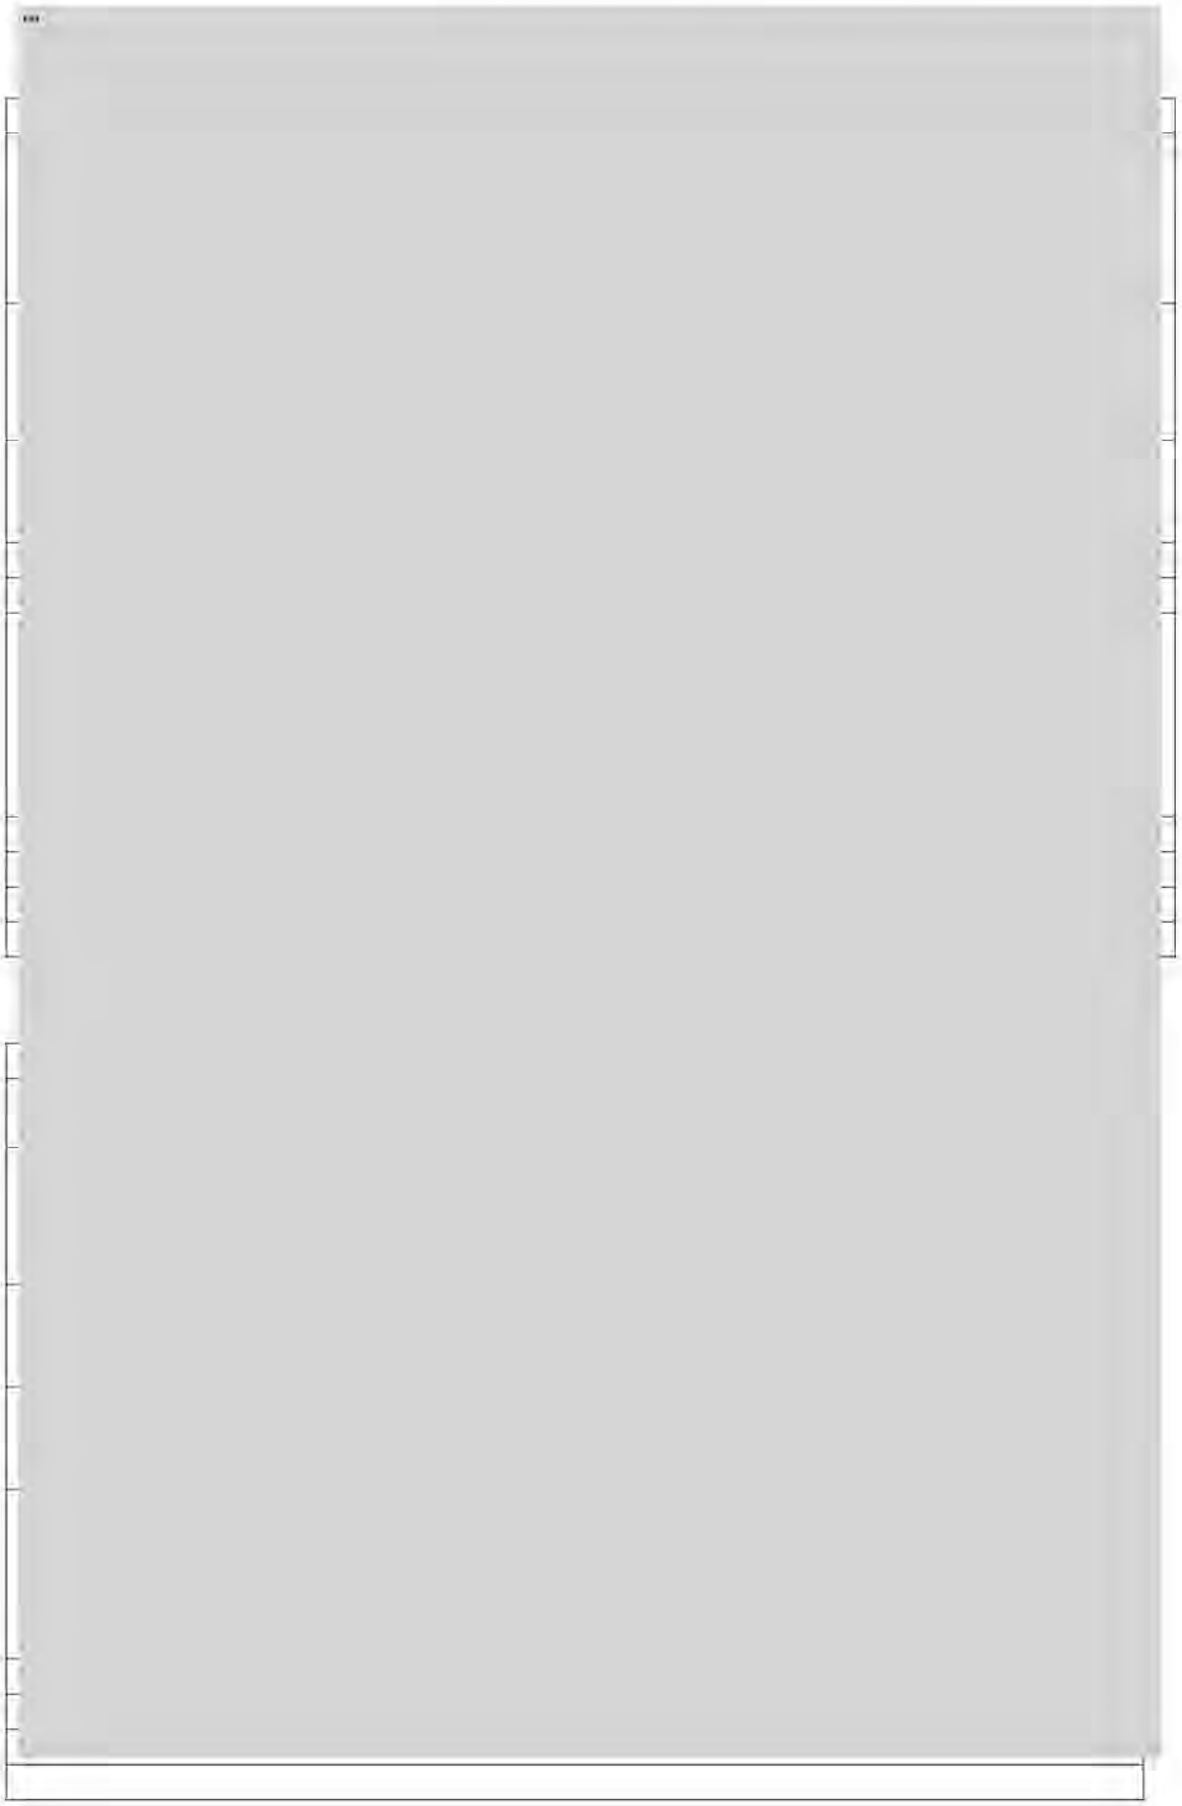

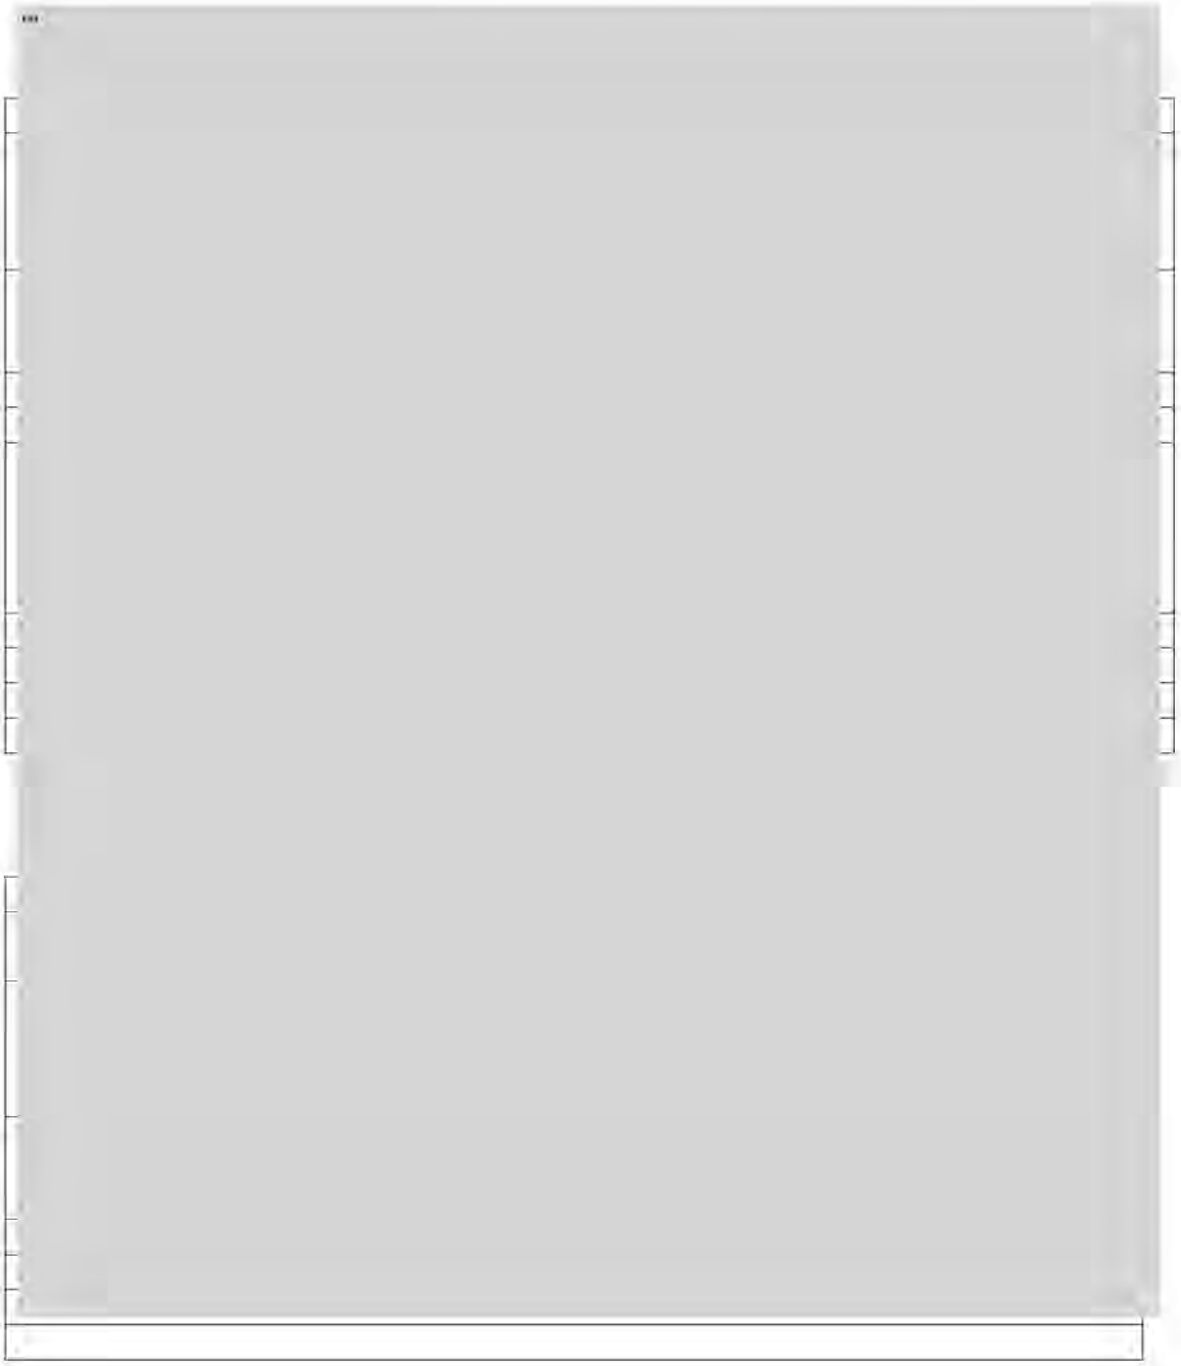

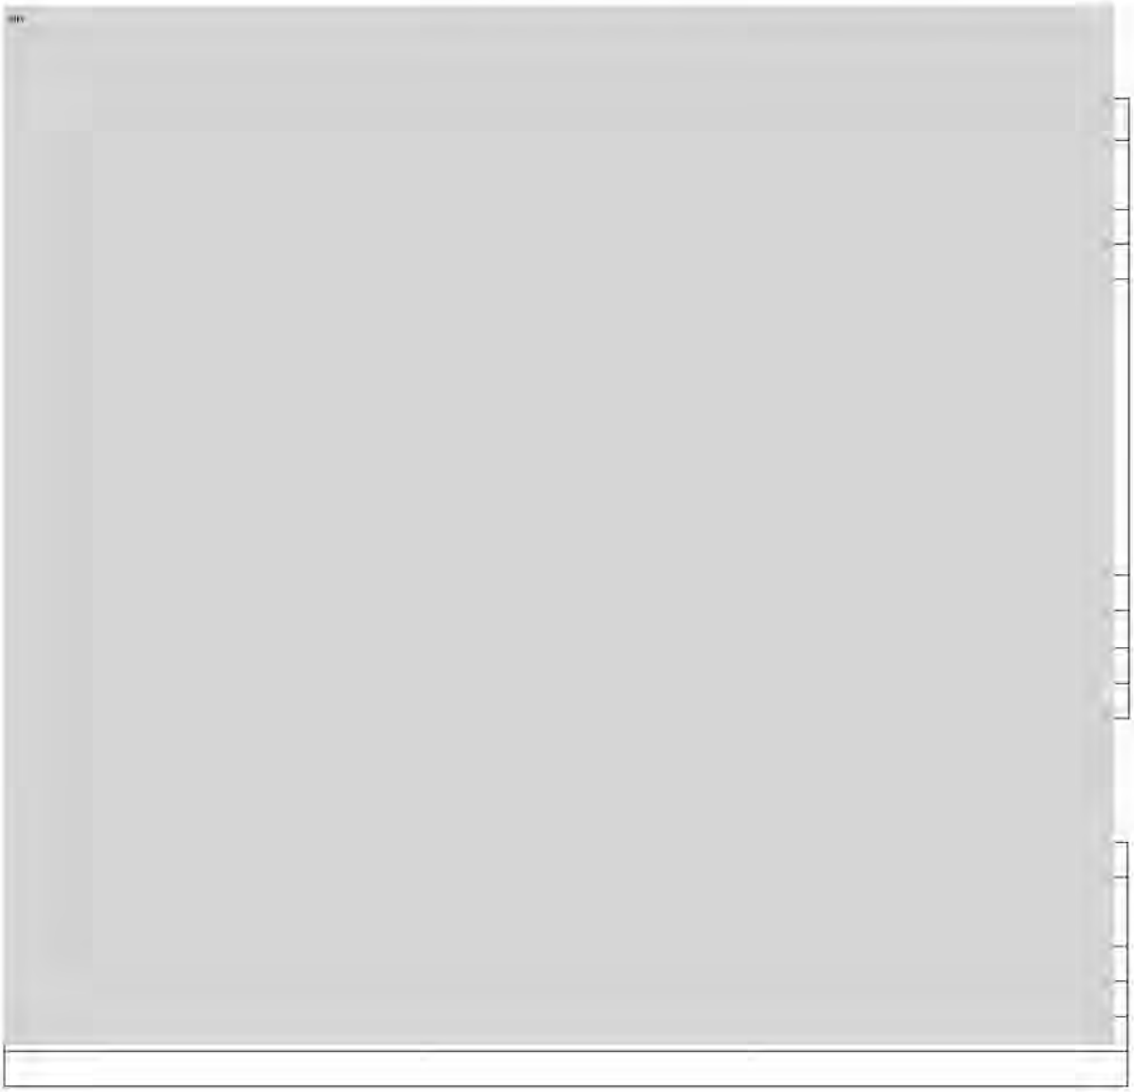

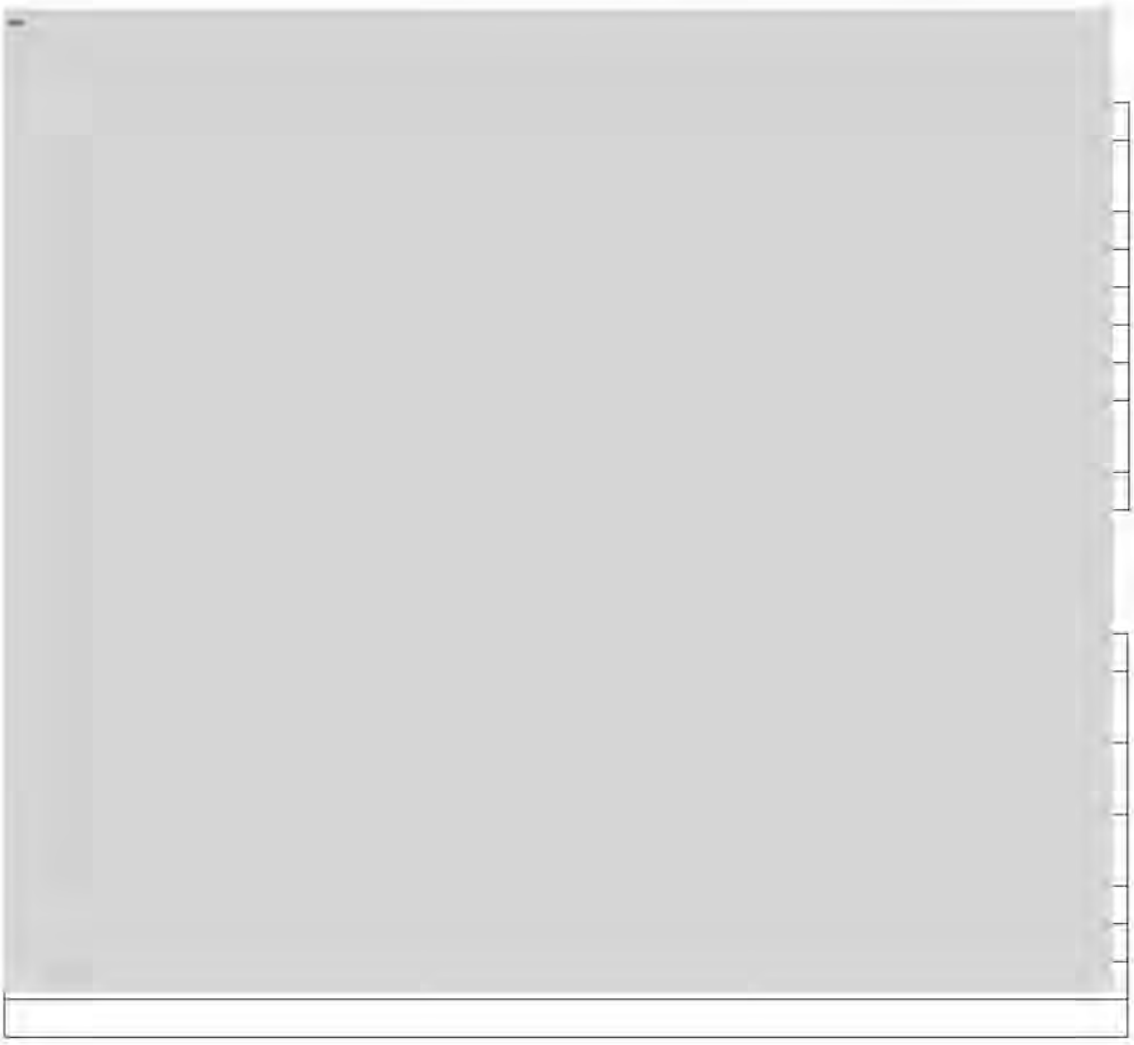

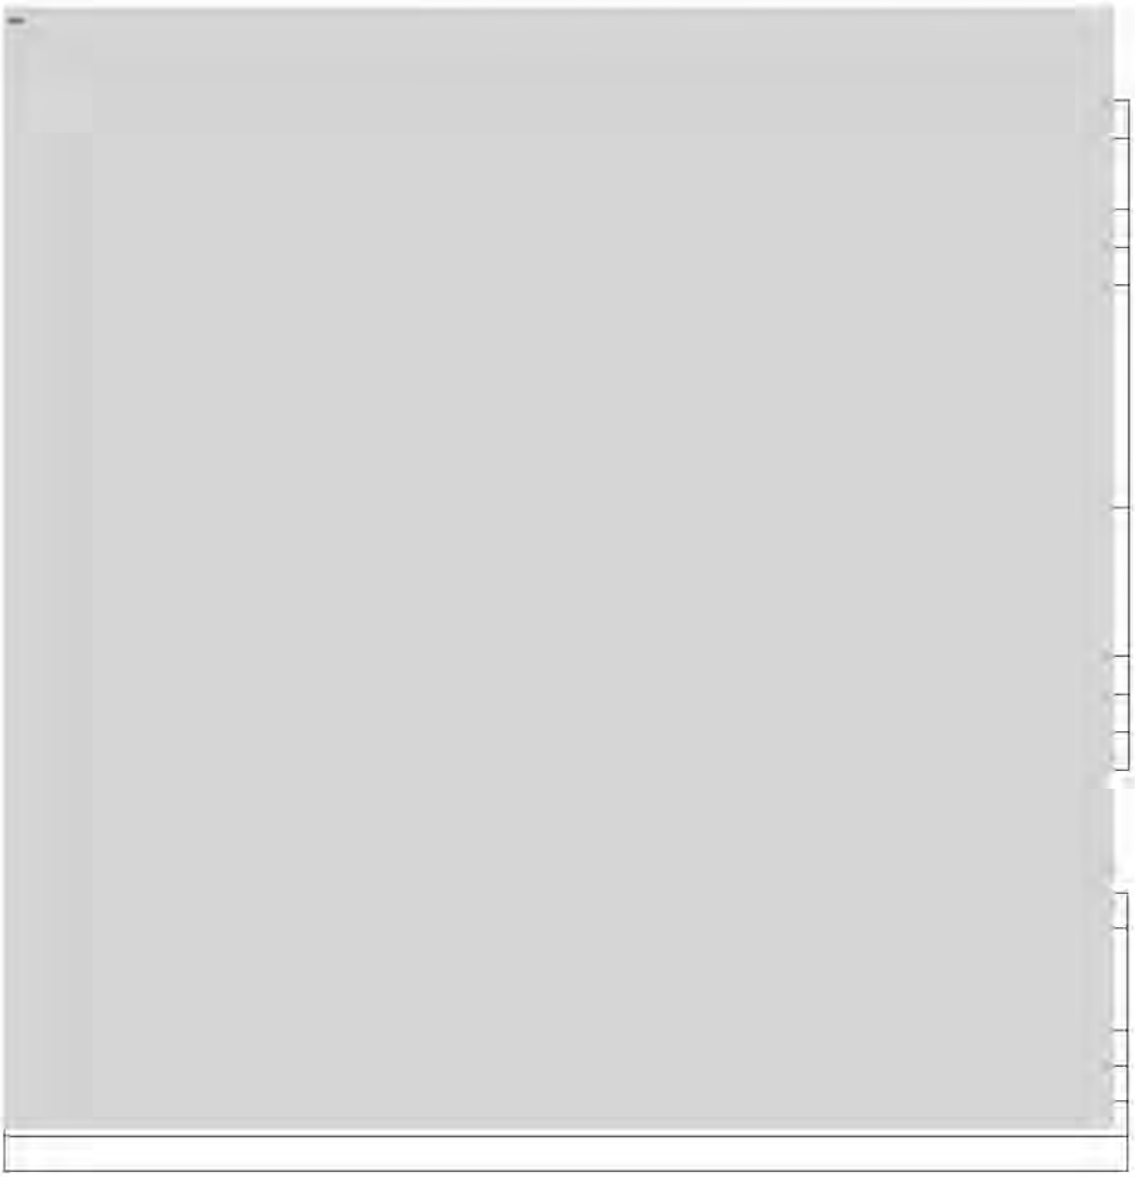

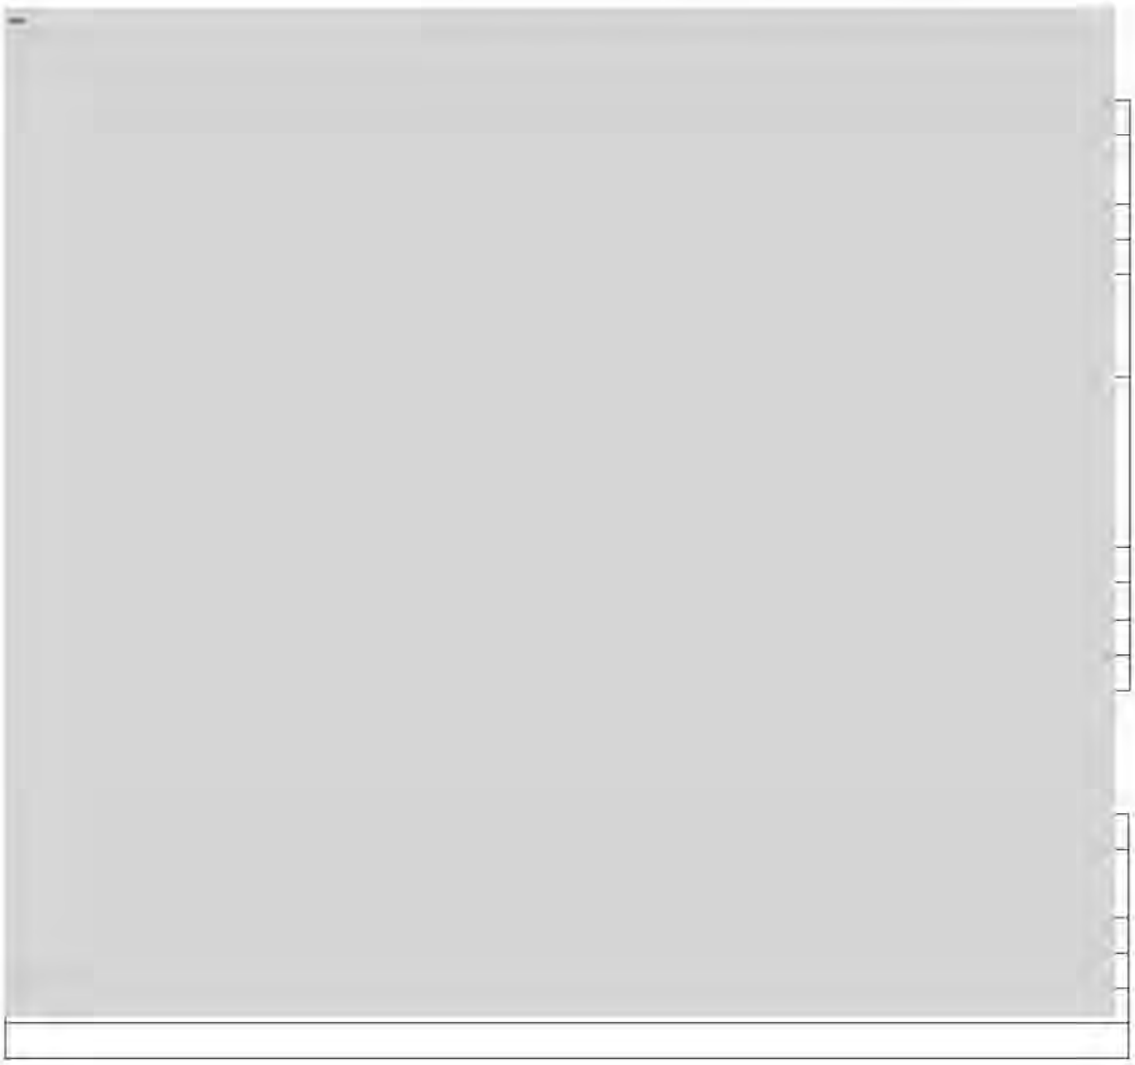

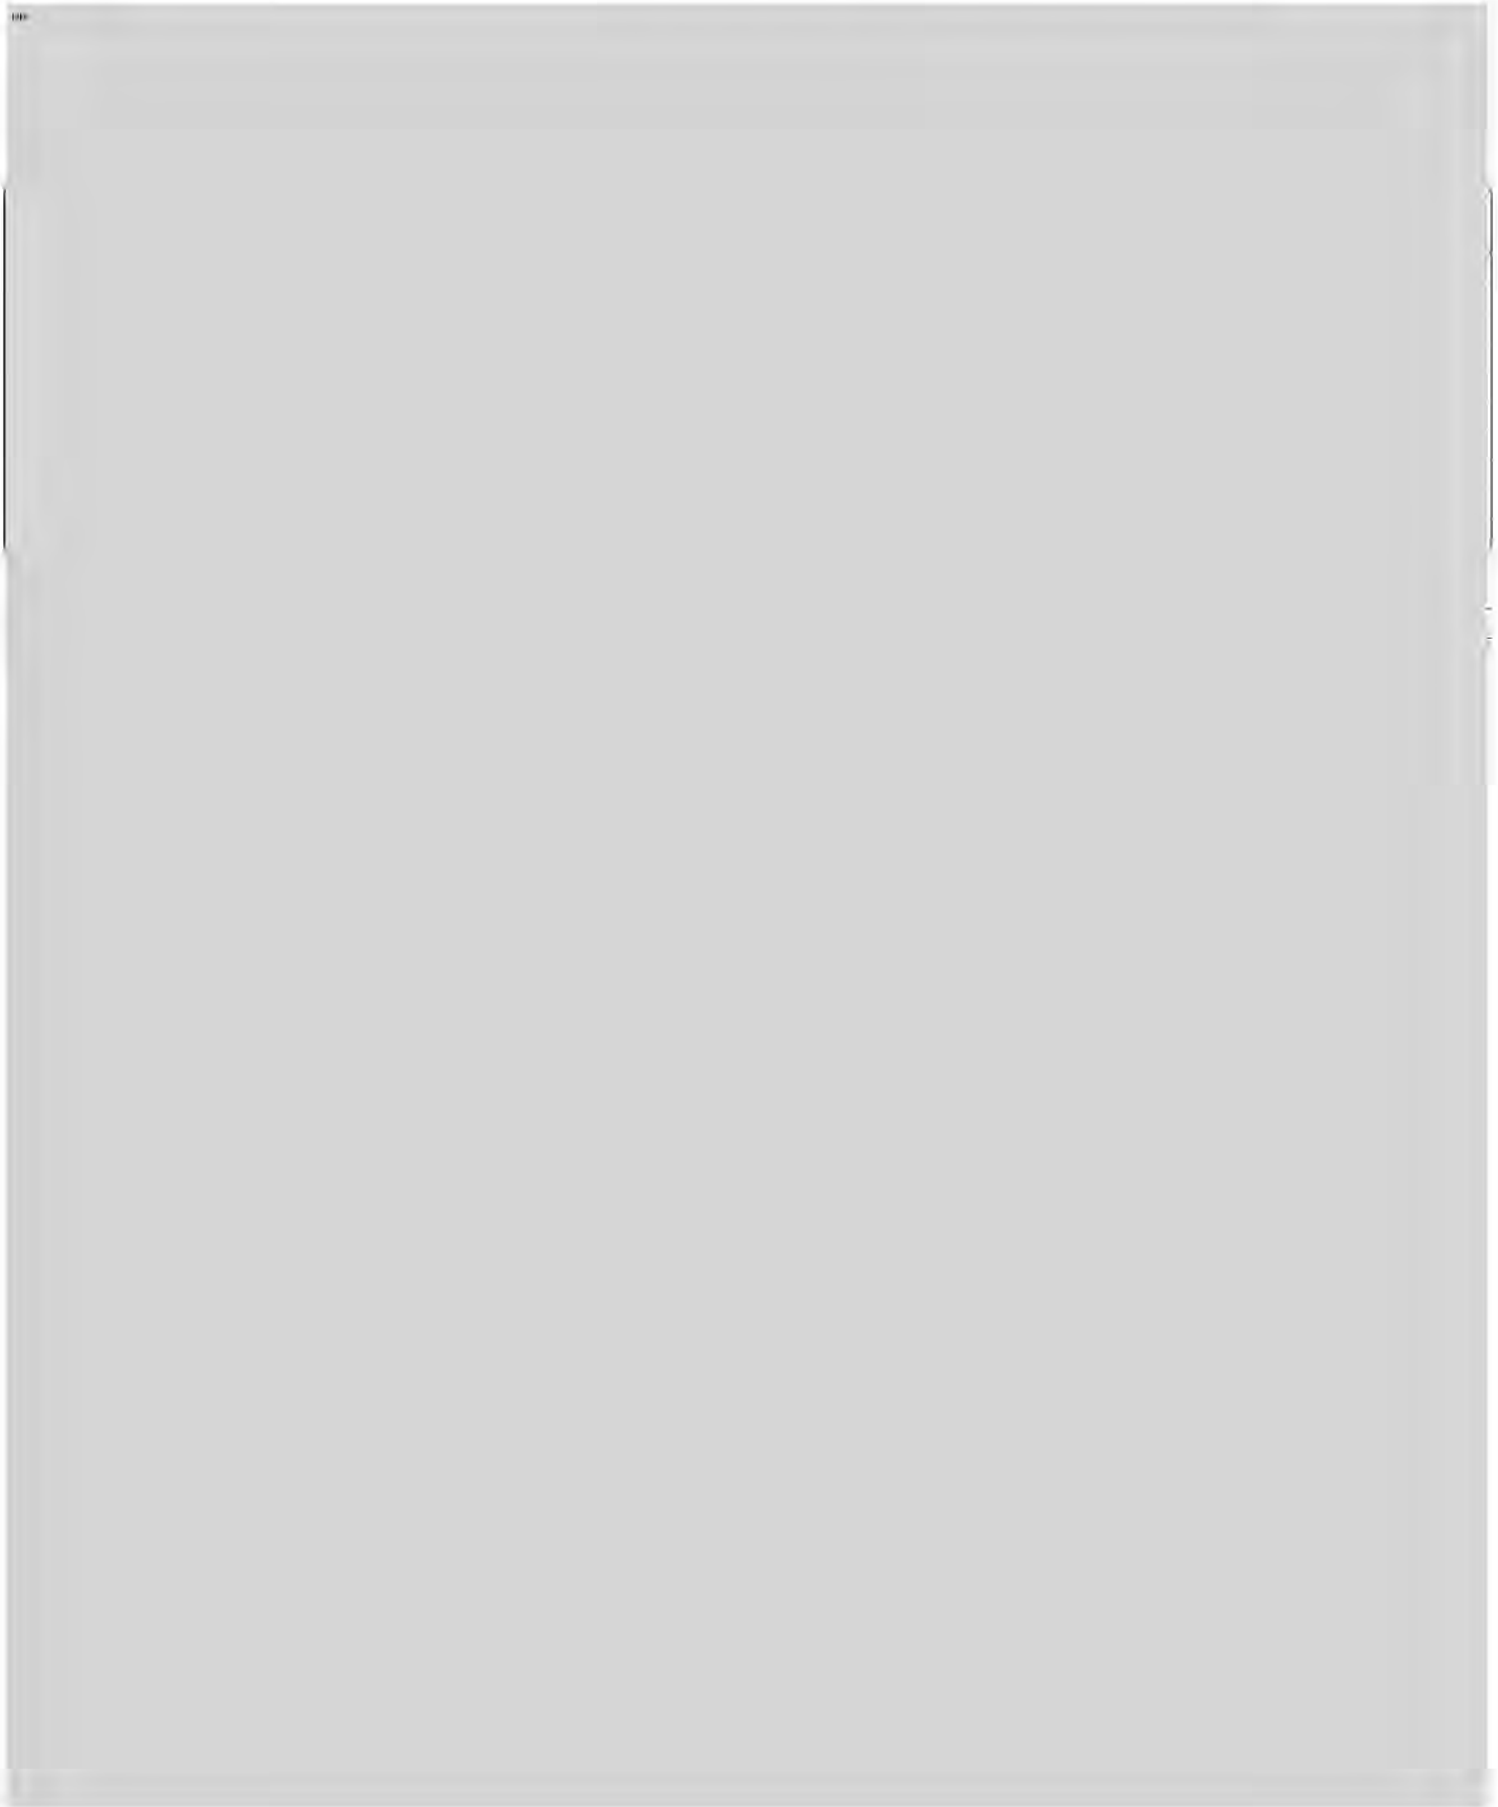

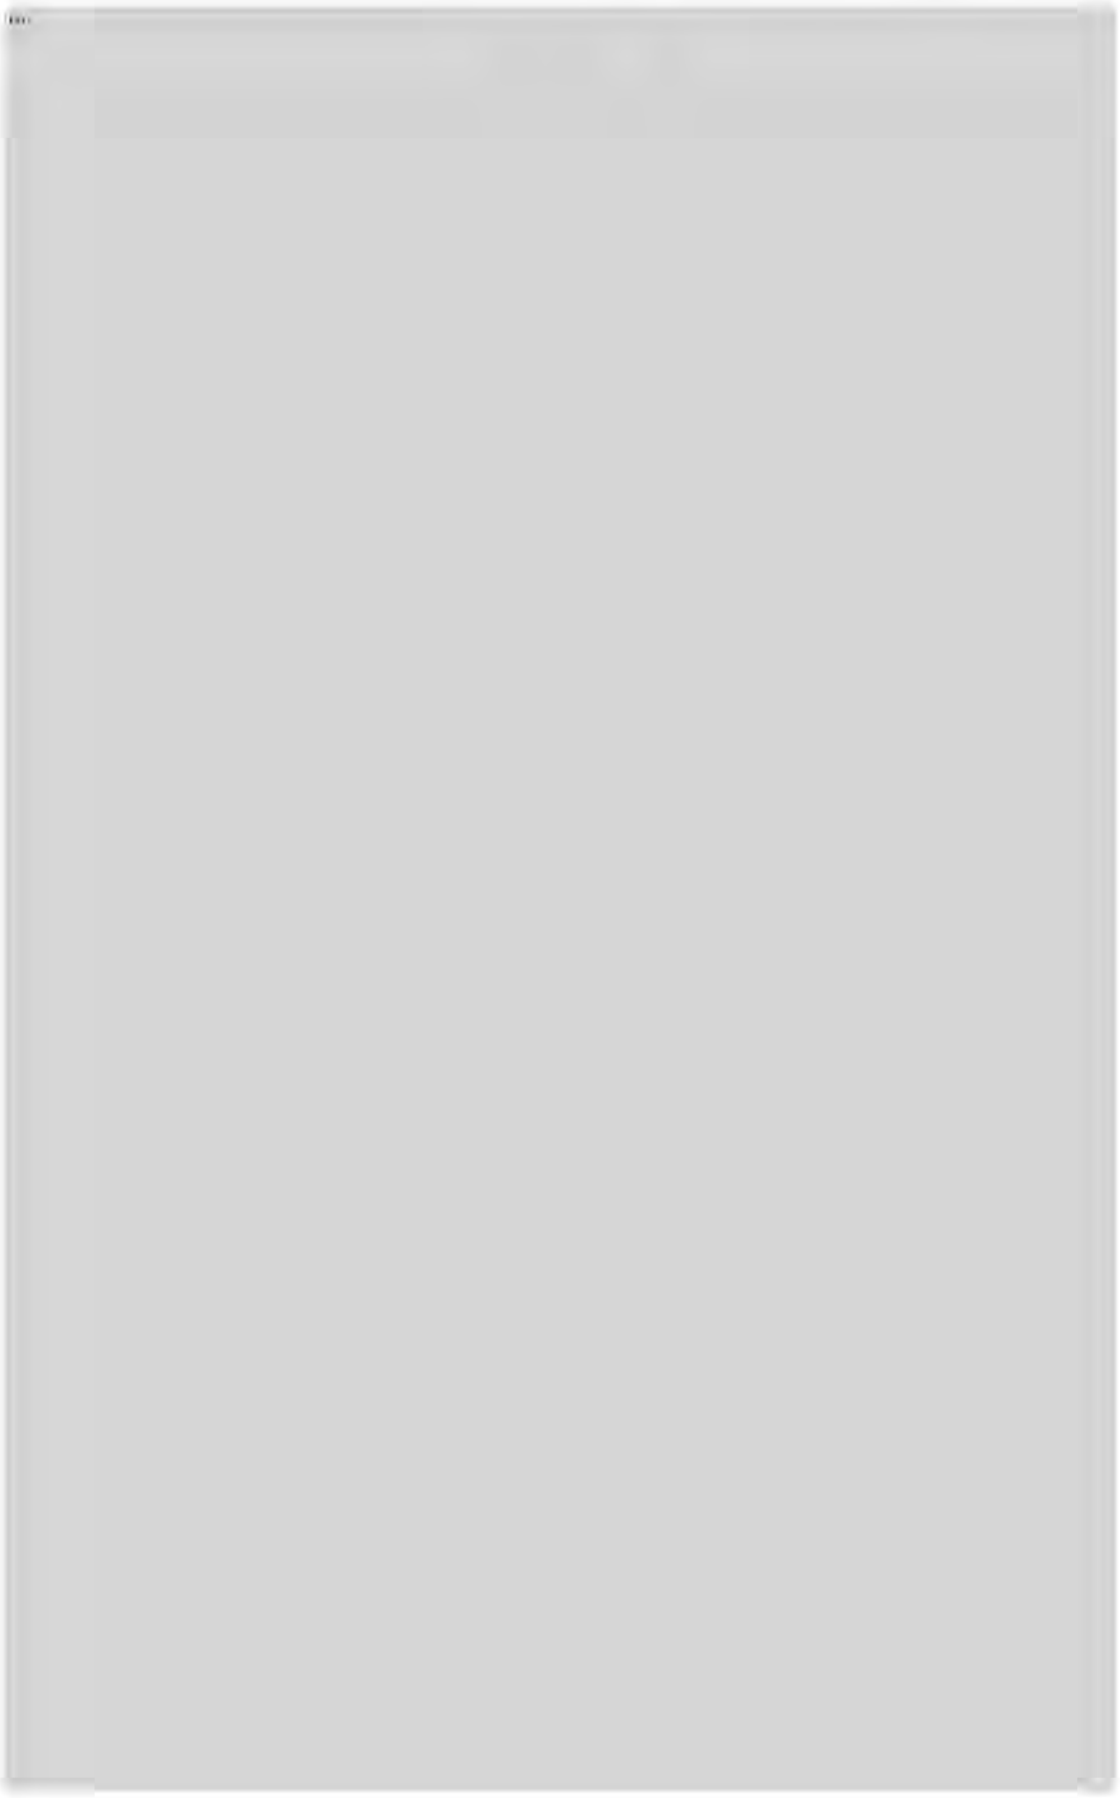

[redacted]

| | | |
|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 |
| 3.4 Bijdrage Prov. Zuid-Holland Molenvlietpark | pm. | pm. |

[redacted]

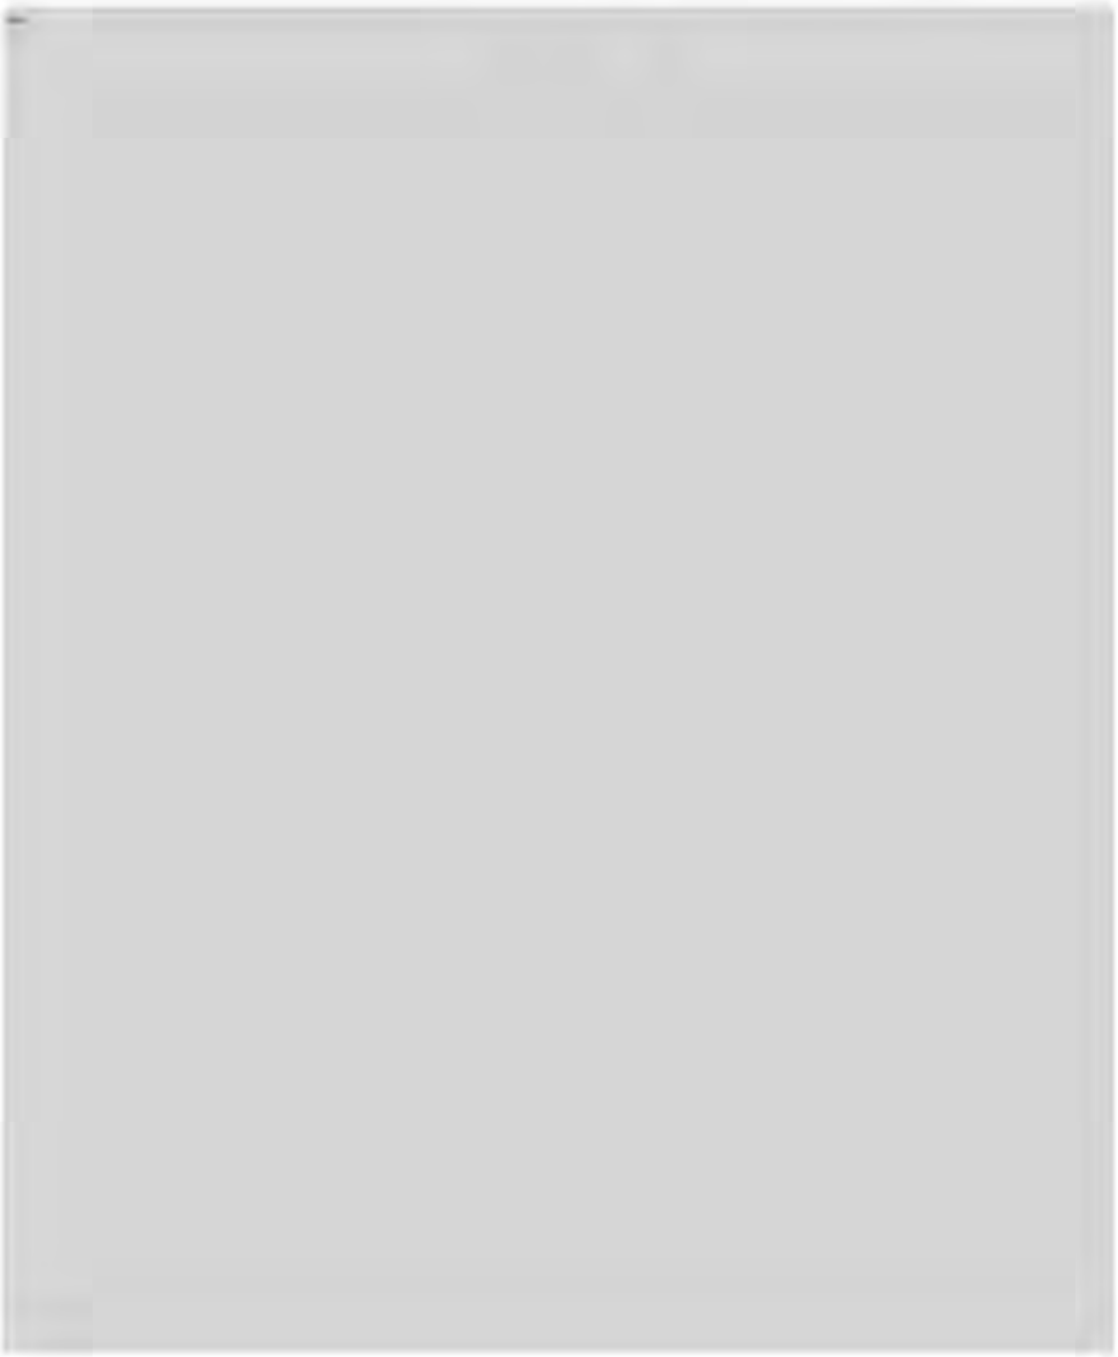

Opstellen detailplanning 2e toevoer waterberging Molenvlietpark.

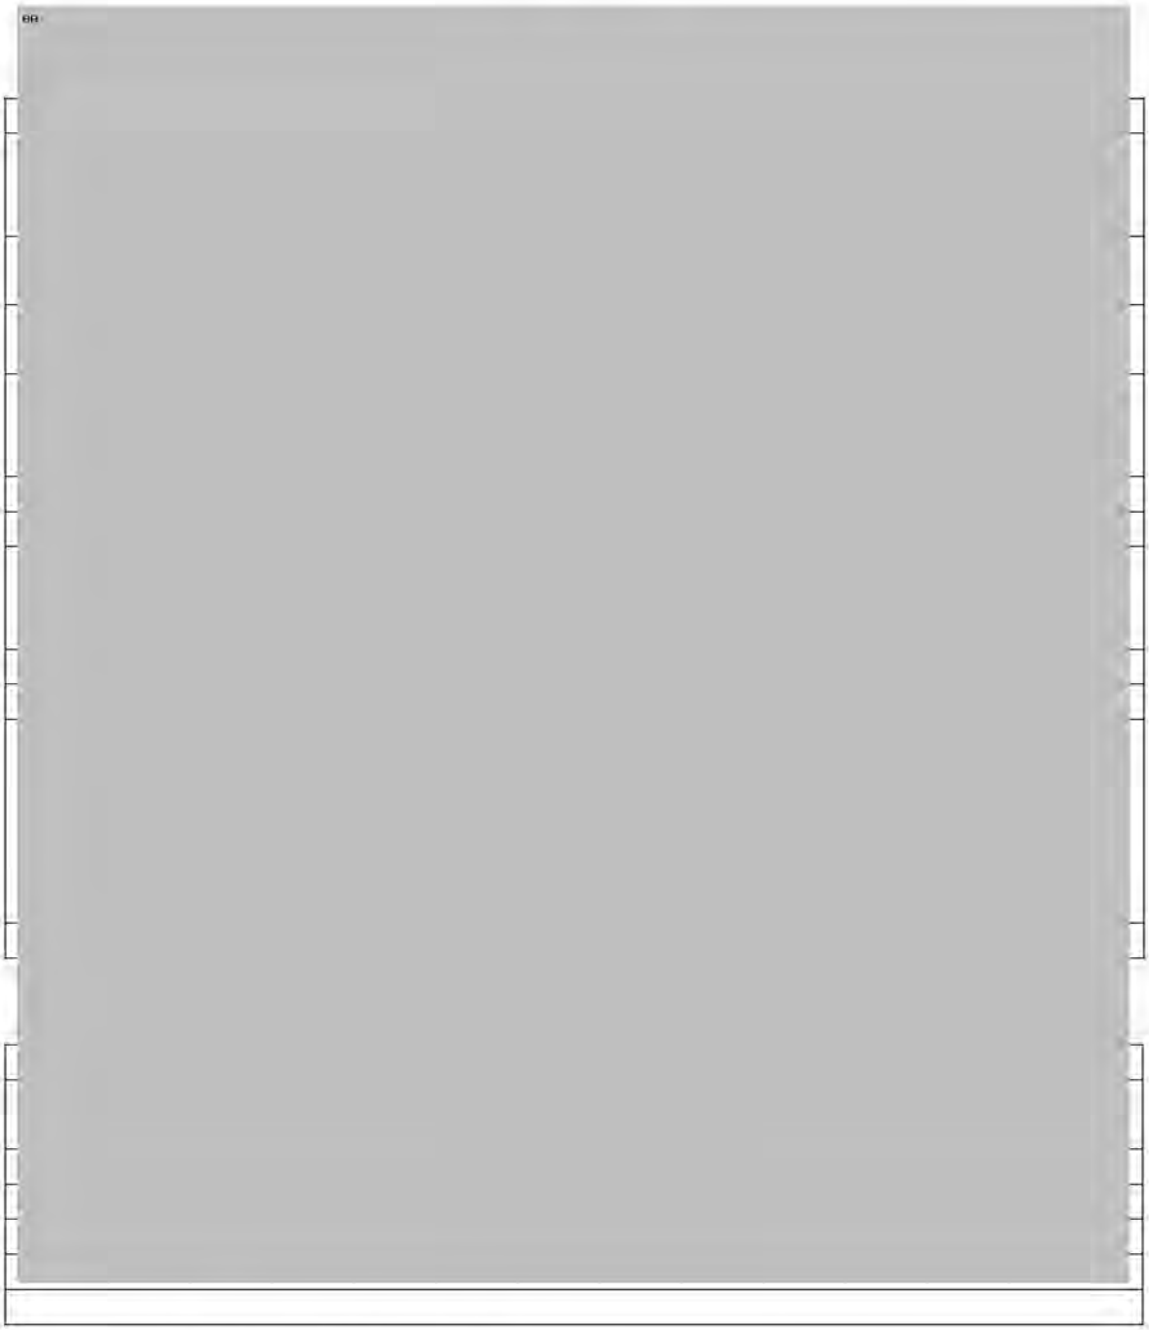

### 5.4.3 Financiële toprisico's

Er is een onzekerheidsanalyse op de financiën uitgevoerd waarin de resultaten van de aanbesteding zijn meegenomen. De toprisico's zijn hieronder weergegeven. Inclusief de ontwikkelingen in de beheersing (indien van toepassing). Bij de faseovergang is er een top-down benadering als aanvulling op de reguliere actualisatie gebruikt. Dit heeft geleid tot een grondige herijking van het risicodossier en daarmee tot een groot aantal wijzigingen in de toprisico's.

Huidige toprisico's:

| Rang | Ris. nr. | Omschrijving | Beheersing | Vorige rang |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 550 | BP wijzigingen (Binckhorst, Molenvlietpark) worden niet ongewijzigd vastgesteld, waardoor het aangeboden ontwerp niet past. | Buiten top |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 549 | Vertraging/stagnatie aannemer vanwege vertragingen in Bestemmingsplanprocedures (Molenvlietpark e.o., wijziging Binckhorst) | Buiten top |

### 5.4.4 Toprisico's planning

In het 4e kwartaal is wederom een onzekerheidsanalyse op de planning uitgevoerd. De toprisico's zijn gerangschikt op basis van hun bijdrage aan het risicoprofiel van de planning. Ook hier zijn relatief veel wijzigingen in de toprisico's. Vanwege een kortere uitvoeringsduur en meer afhankelijkheden in de planning (nadere detaillering), zijn meer paden semi-kritiek geworden, waardoor nieuwe toprisico's ontstaan.

**Huidige toprisico's:**

| Rang | Risnr | Omschrijving | Beheersing | Vorige rang |
|---|---|---|---|---|
| BR | | | | |
| 2 | 533 | O.b.v. zienswijze BP Molenvlietpark e.o. wordt beroep aangetekend met schorsende werking. | | Buiten top |
| BR | | | | |

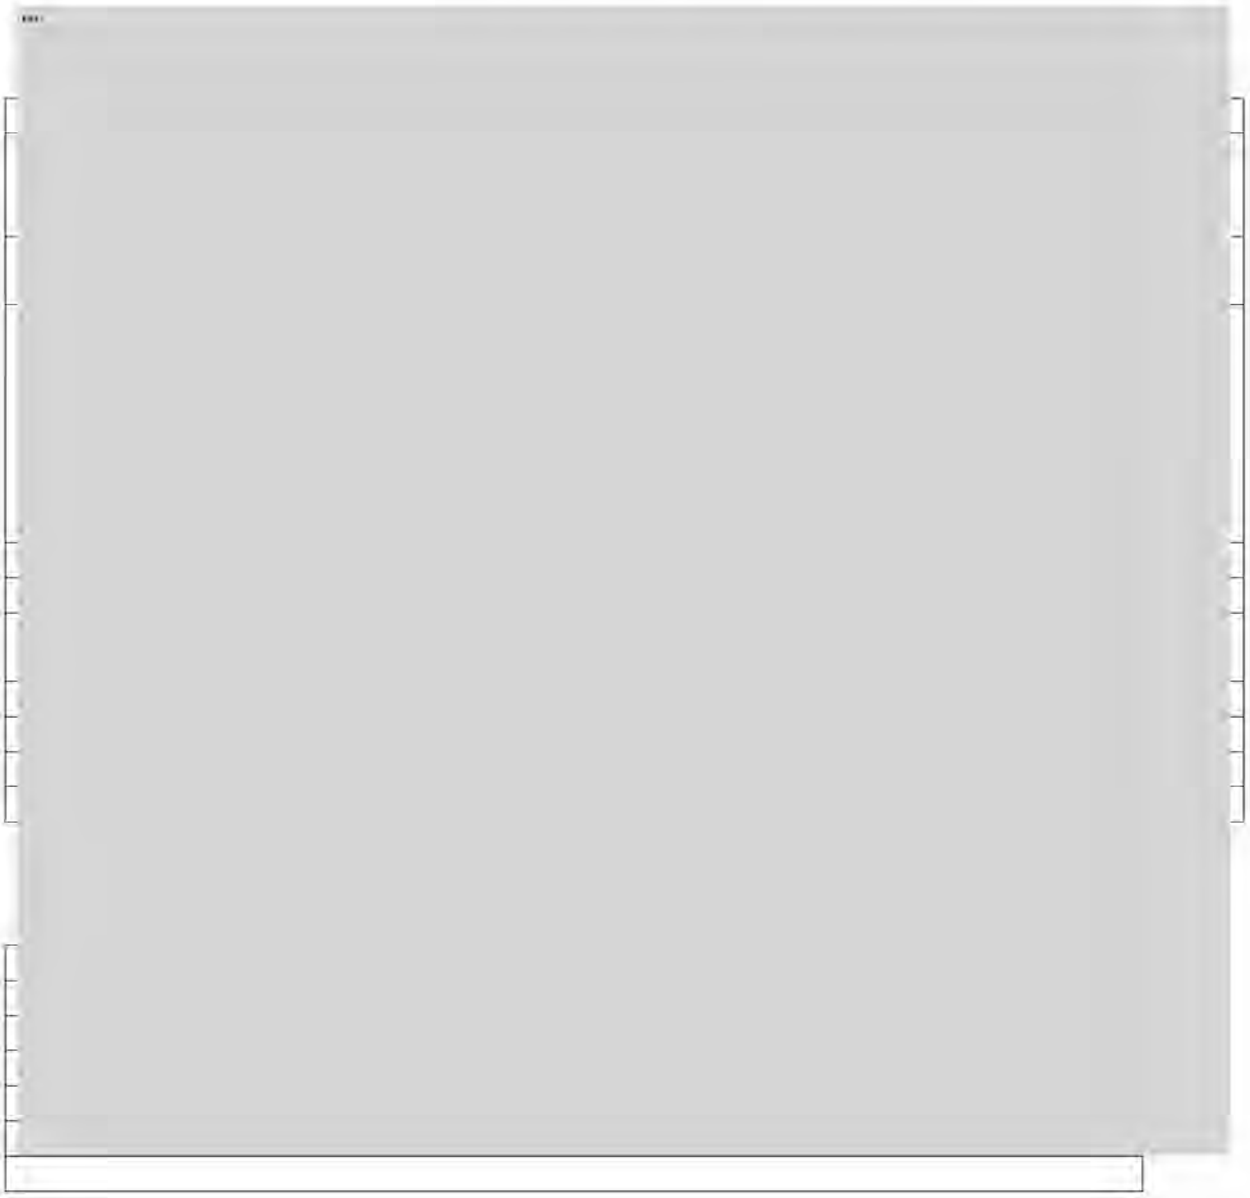

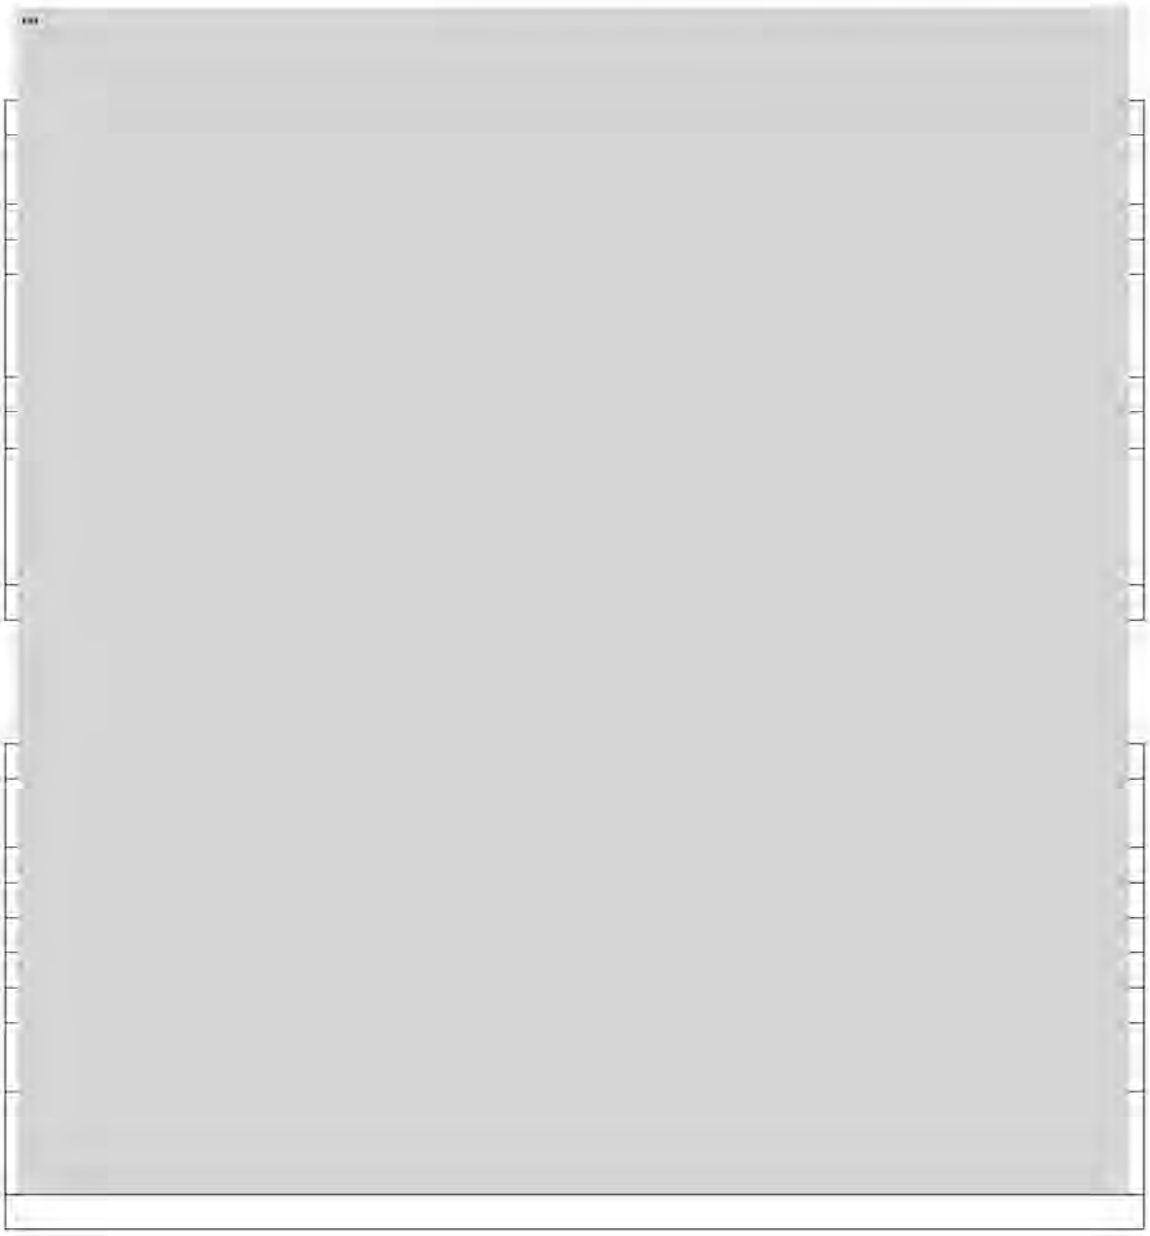

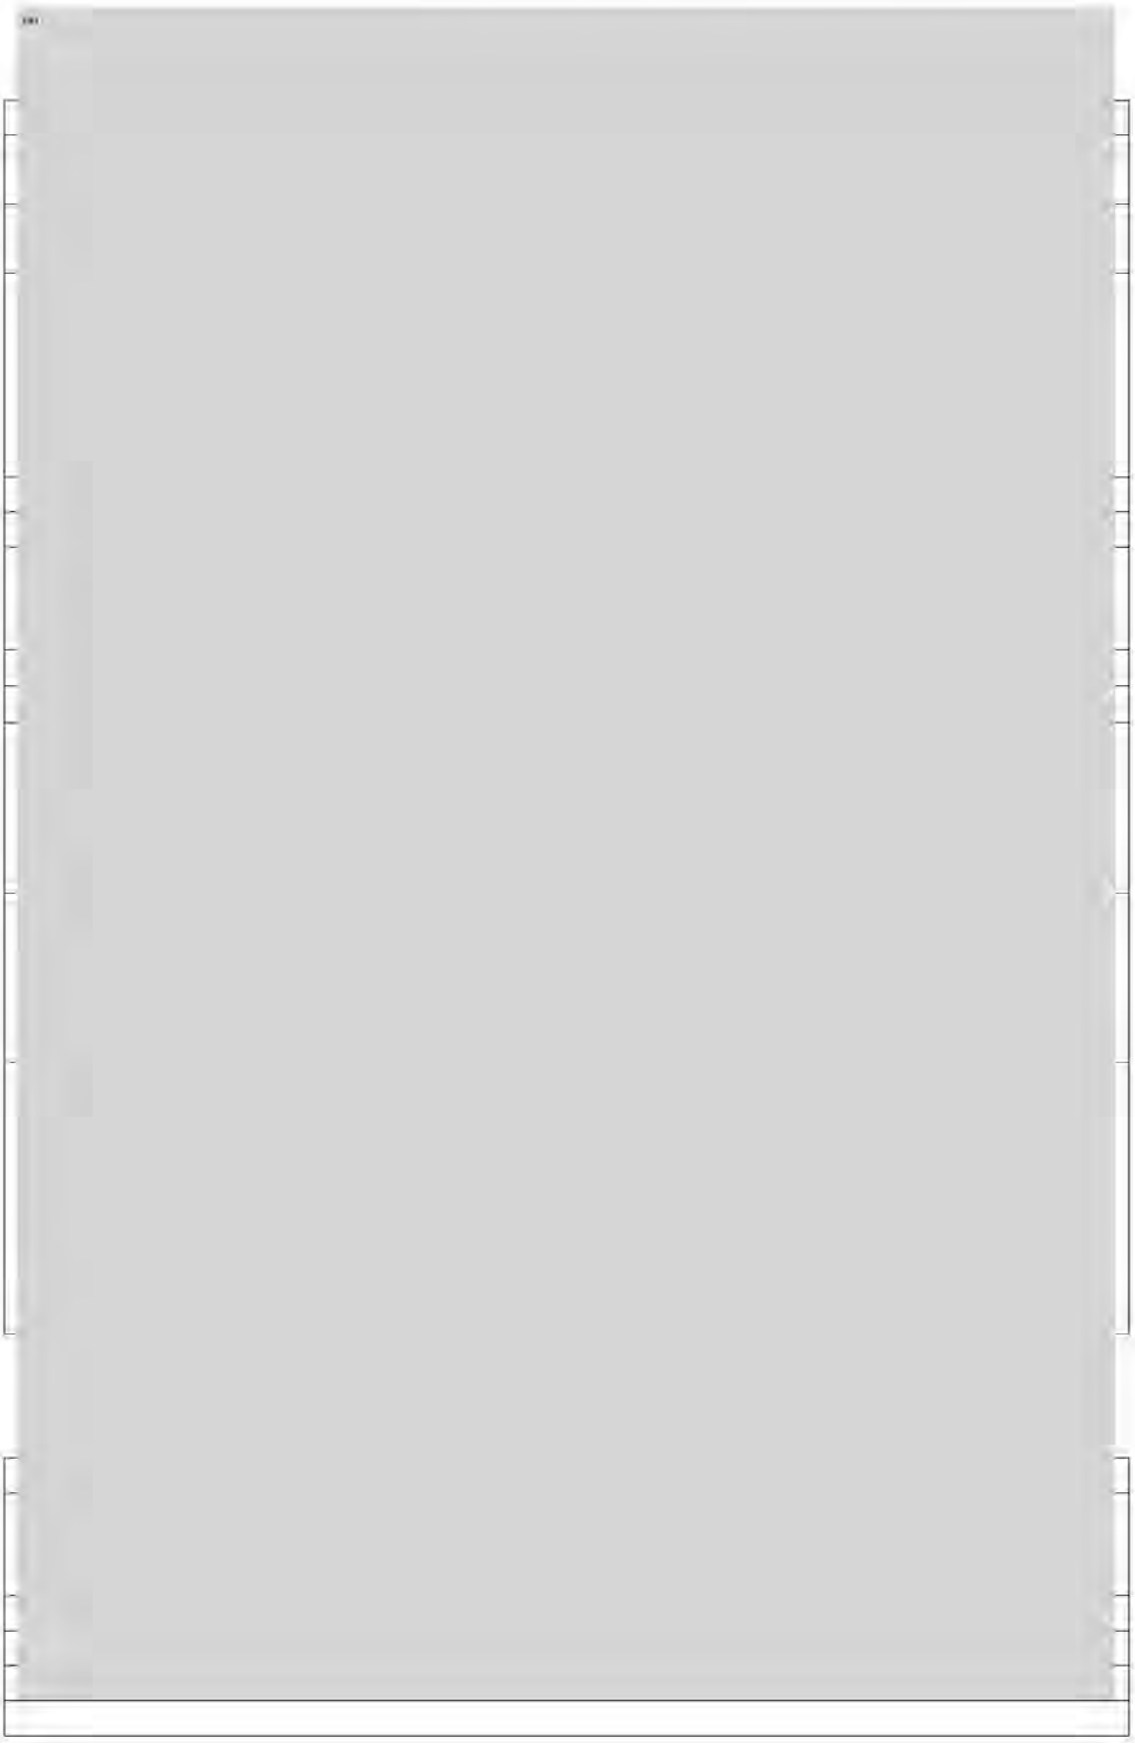

# 6. Bijlage: Hoofdlijnenplanning

## Mijlpalenoverzicht

| Mijlpaal | Naam | Datum |
|---|---|---|
| | BR | |
| 10 | Molenvlietpark gereed | 25-nov-19 |
| 5 | Eindoplevering/openstelling Rotterdamsebaan incl. Molenvlietpark | 01-jul-20 |

## Locatieaanduiding van de mijlpalen binnen het projectgebied

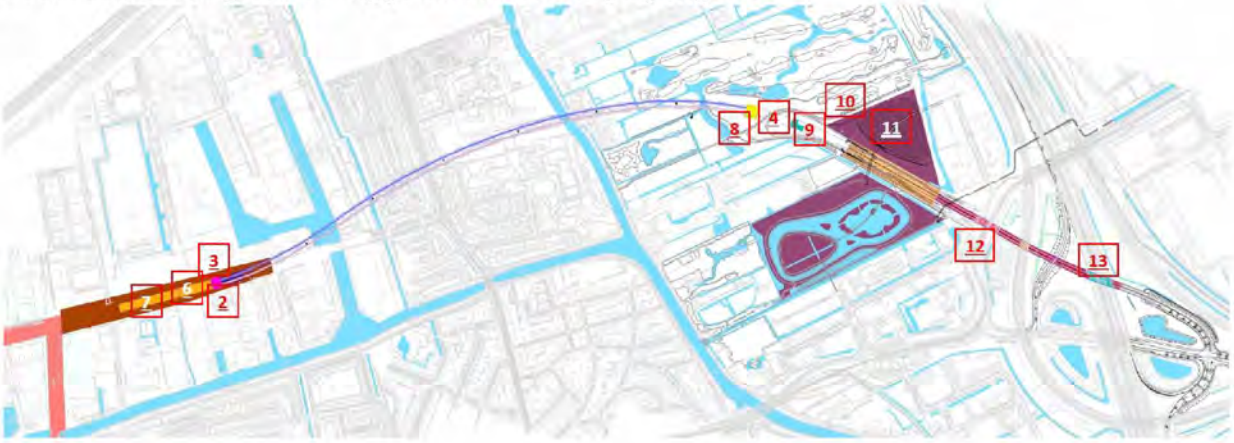

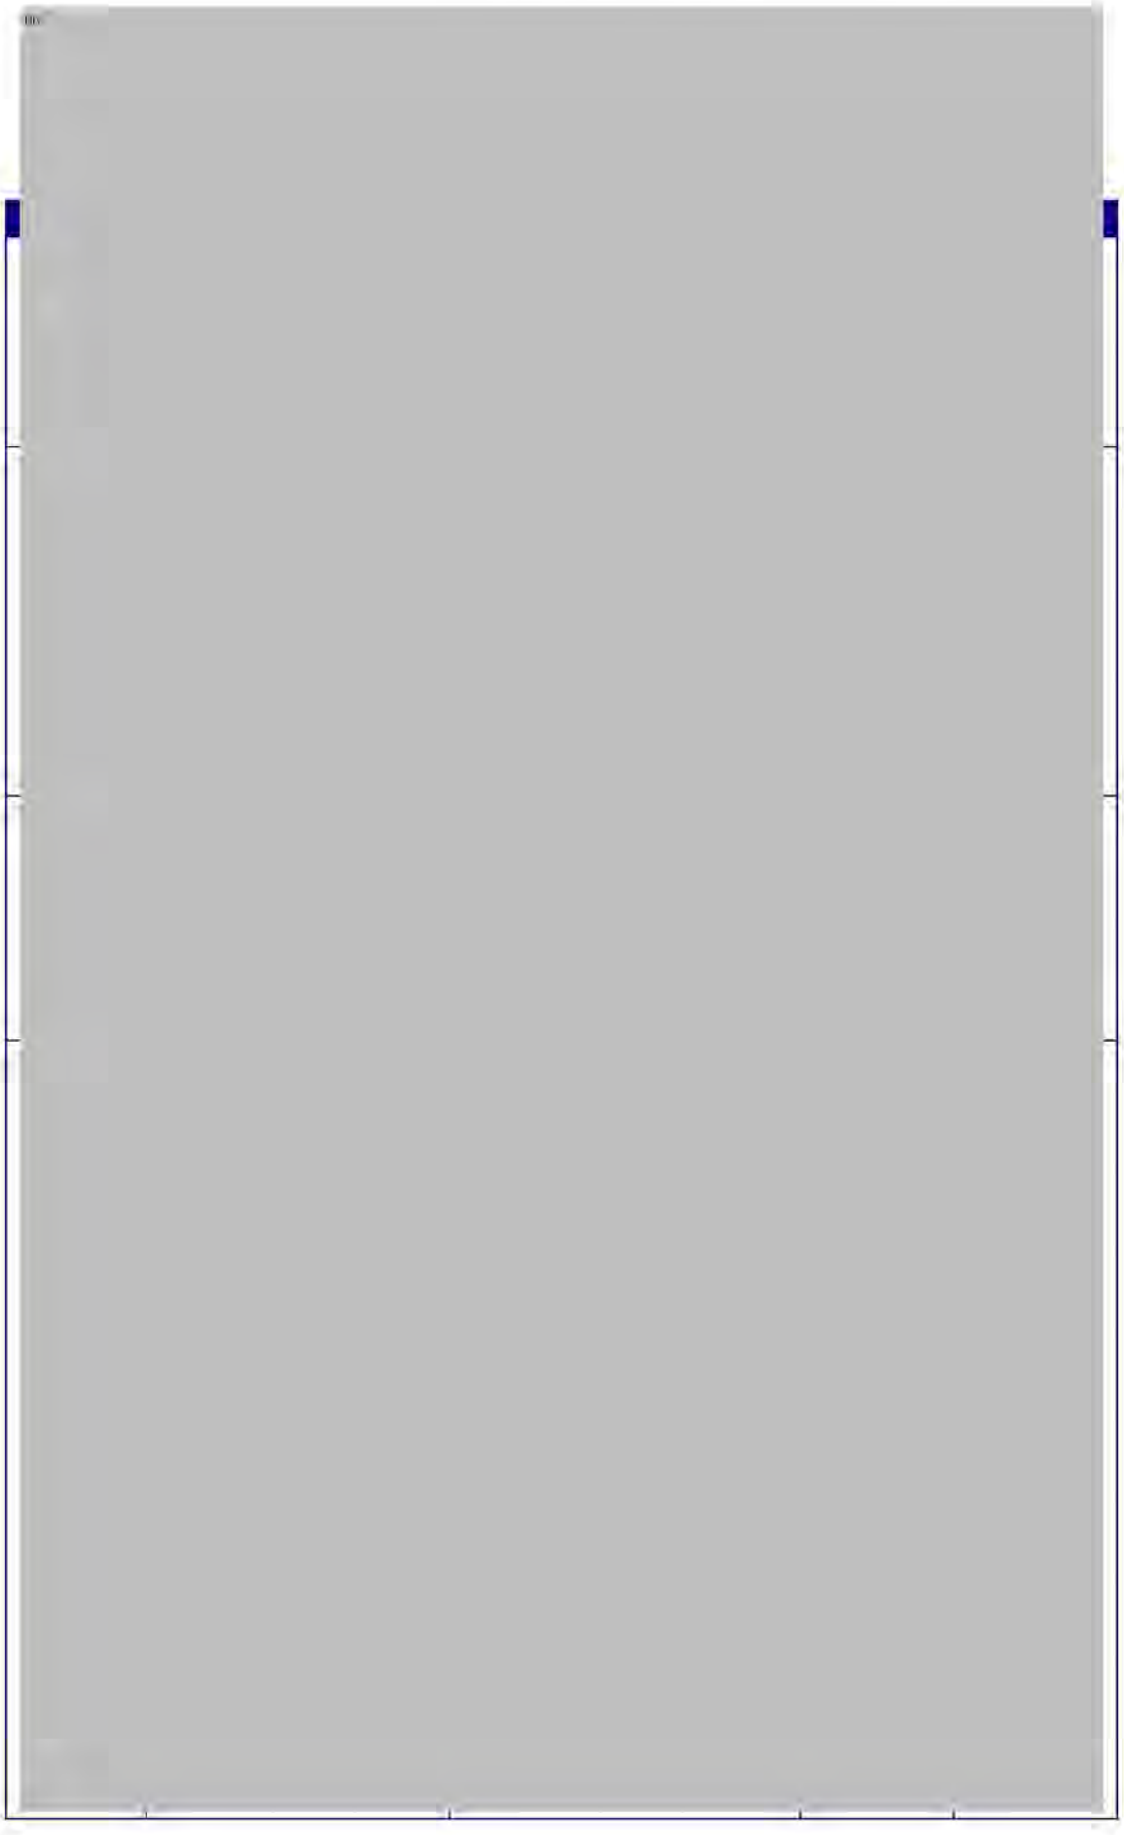

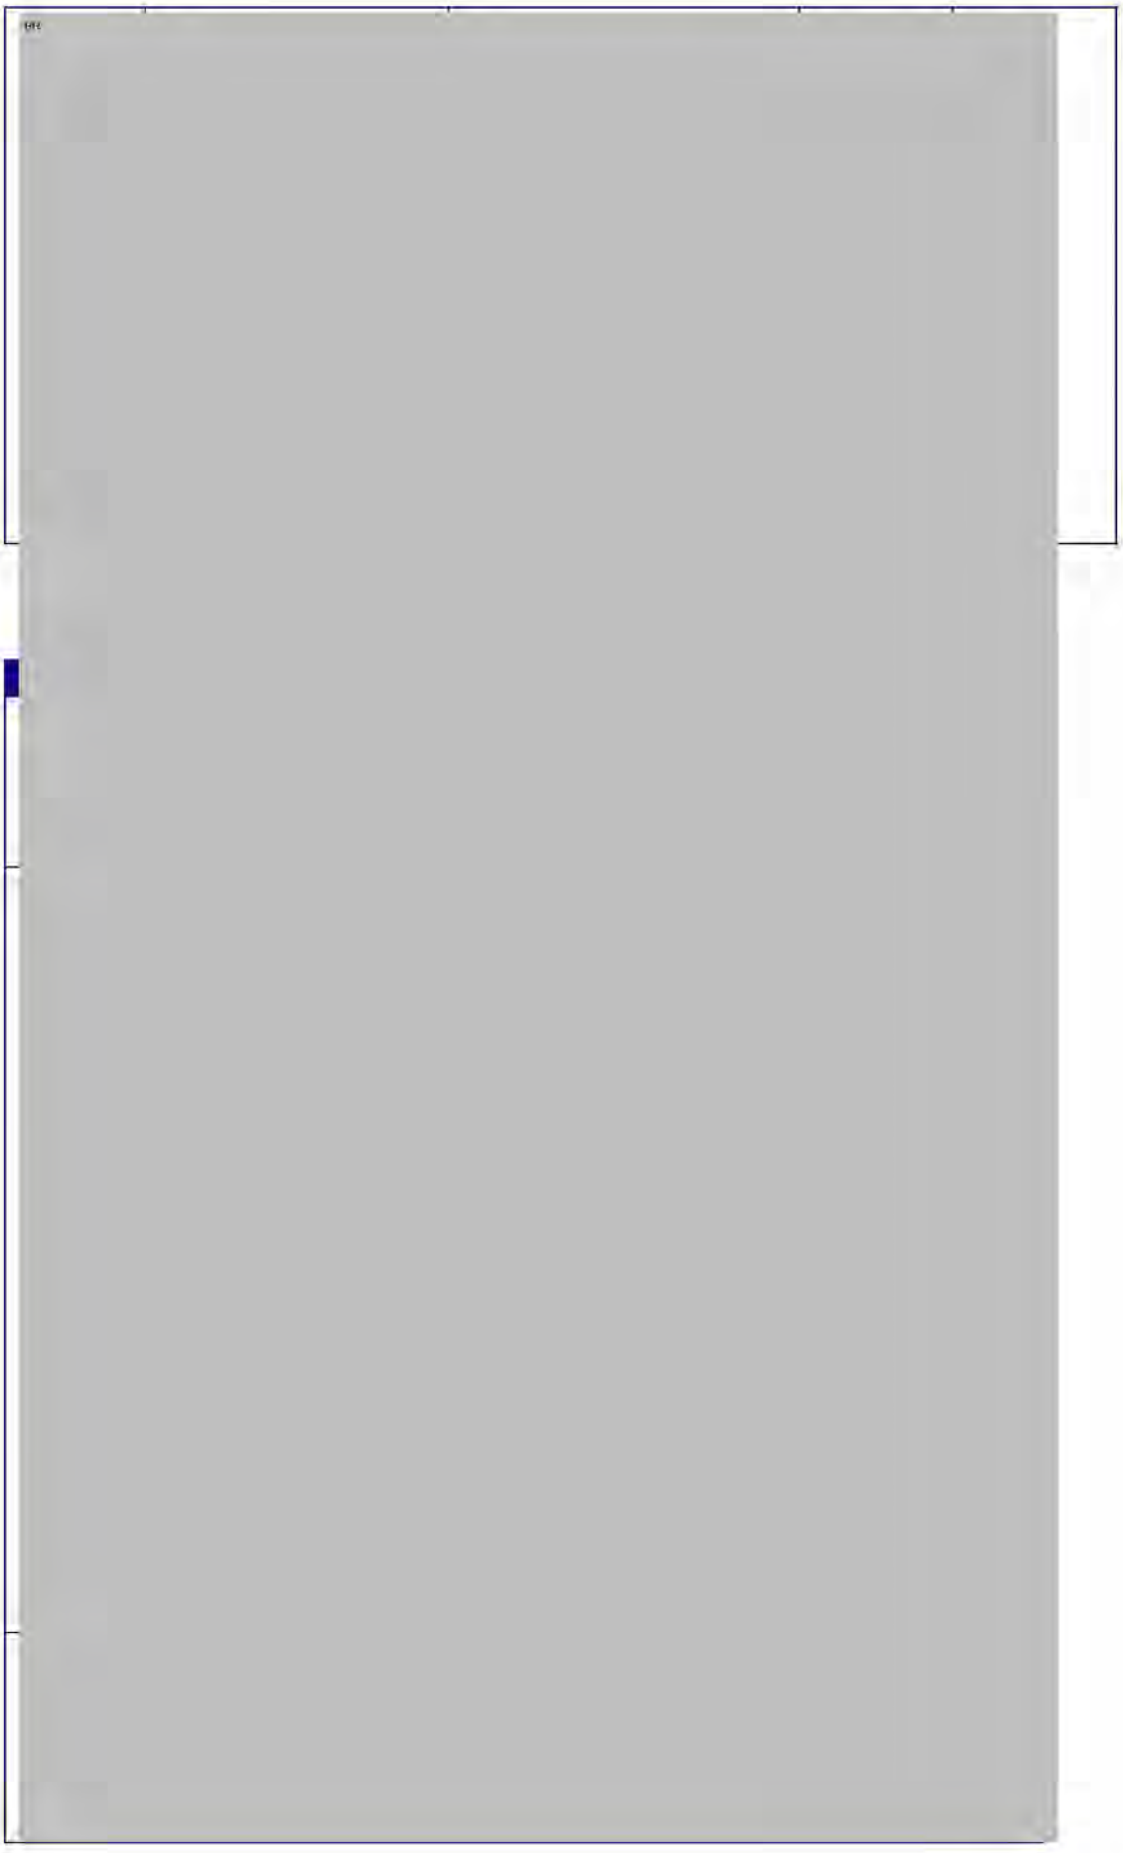

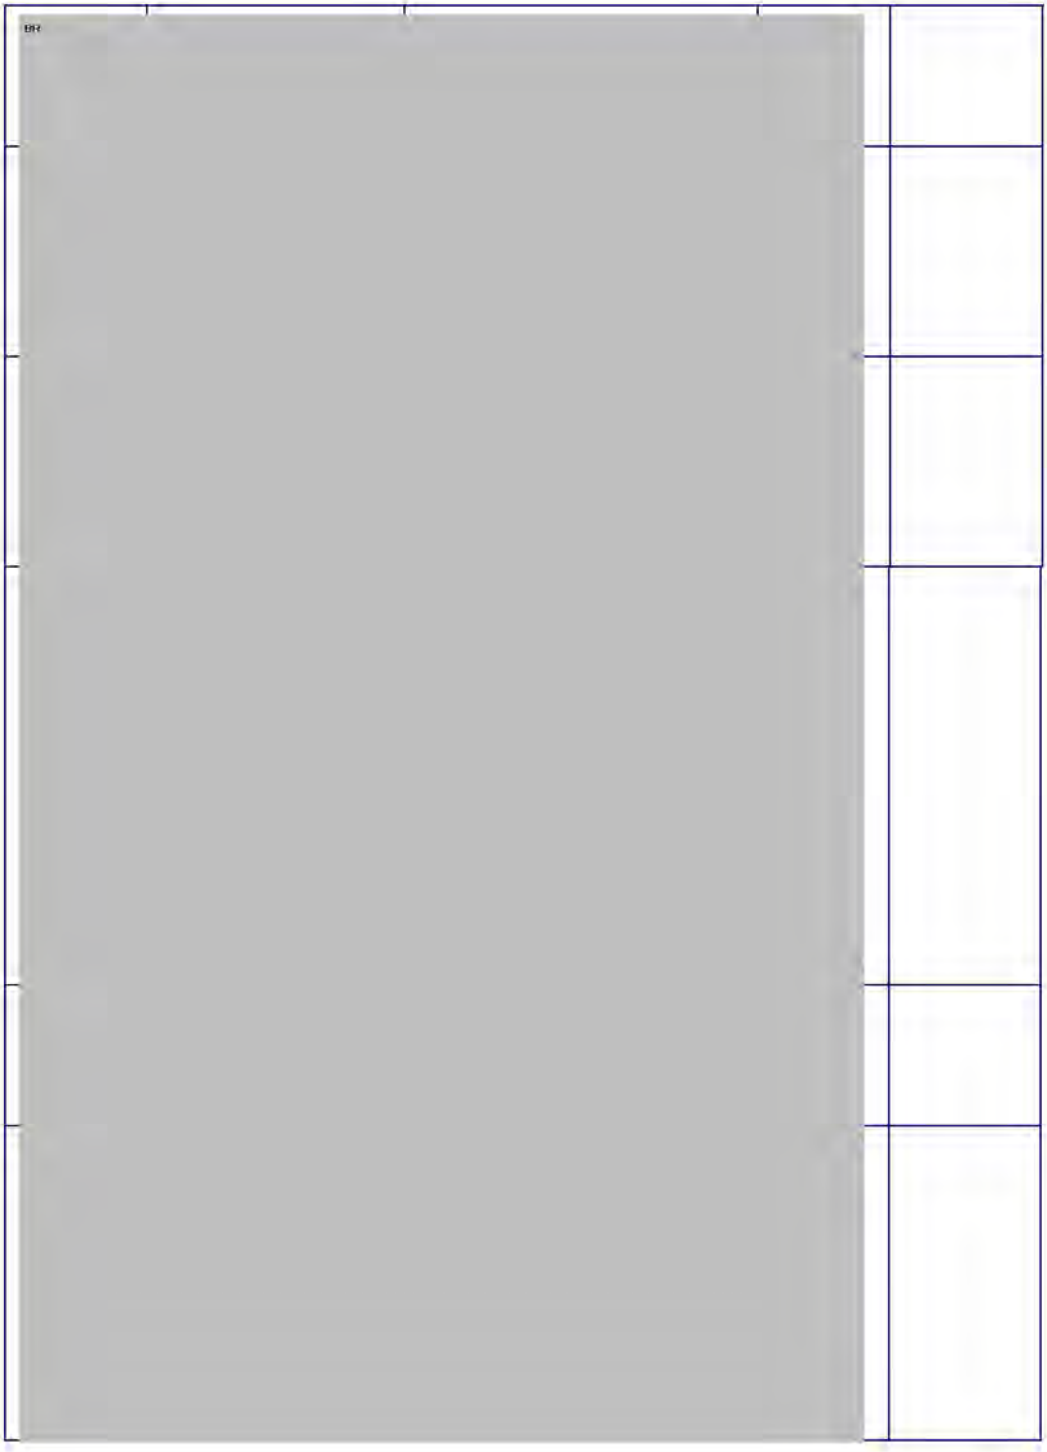

Docnr10

Den Haag

# Voortgangsrapportage

1e kwartaal 2016

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 20 april 2016**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd:** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>6 april 2016 | Versie 0.1<br>11 april 2016 | Versie 1.0<br>13 april 2016 | Versie 2.0<br>20 april 2016 | Versie 2.0<br>25 april 2016 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Alg. directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder BSKB / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

# Inhoudsopgave

**1. Managementsamenvatting ..... 6**
**1.1** Projectgegevens ..... 6
**1.2** Algemeen ..... 6
**1.3** Toelichting beheersmaatregelen ..... 6
**1.4** Terugblik afgelopen kwartaal ..... 6
**1.5** Verwachting komende kwartaal ..... 7
**1.6** Financiën ..... 8
**1.7** Planning ..... 8
**1.8** Risico's ..... 8
**1.9** Bestuurlijke besluitvorming komende periode ..... 8
**2 Omgevingsmanagement & Communicatie ..... 9**
**2.1** Omgevingsmanagement ..... 9
2.1.1 Afgelopen kwartaal ..... 9
2.1.2 Komende kwartaal ..... 10
**2.2** Planologie ..... 11
2.2.1 Afgelopen kwartaal ..... 11
2.2.2 Komende kwartaal ..... 11
**2.3** Vergunningen ..... 12
2.3.1 Afgelopen kwartaal ..... 12
2.3.2 Komende kwartaal ..... 12
**2.4** Verwervingen ..... 13
2.4.1 Afgelopen kwartaal ..... 13
2.4.2 Komende kwartaal ..... 13
**2.5** Overeenkomsten ..... 14
2.5.1 Afgelopen kwartaal ..... 14
2.5.2 Komende kwartaal ..... 14
**2.6** Communicatie ..... 15
2.6.1 Afgelopen kwartaal ..... 15
2.6.2 Komende kwartaal ..... 16
2.6.3 Diversen ..... 16
**3. Projectvoortgang ..... 17**
**3.1** Aanbesteden en contracteren ..... 17
3.1.1 Afgelopen kwartaal ..... 17
3.1.2 Komende kwartaal ..... 17
**3.2** Vormgeving ..... 18
3.2.1 Afgelopen kwartaal ..... 18
3.2.2 Komende kwartaal ..... 18
**3.3** Monitoring ..... 19
3.3.1 Afgelopen kwartaal ..... 19
3.3.2 Komende kwartaal ..... 19
**3.4** Inpassing Binckhorst ..... 20
3.4.1 Afgelopen kwartaal ..... 20
3.4.2 Komende kwartaal ..... 21
**3.5** Inpassing Vlietzone en Laan van Hoornwijck ..... 22
3.5.1 Afgelopen kwartaal ..... 22

3.5.2 Komende kwartaal ..... 23
**3.6** Boortunnel en toeritten ..... 24
3.6.1 Afgelopen kwartaal ..... 24
3.6.2 Komende kwartaal ..... 25
**3.7** Verdiepte ligging Ypenburg ..... 26
3.7.1 Afgelopen kwartaal ..... 26
3.7.2 Komende kwartaal ..... 26
**3.8** Installaties ..... 27
3.8.1 Afgelopen kwartaal ..... 27
3.8.2 Komende kwartaal ..... 27
**3.9** Veiligheid en gezondheid ..... 28
3.9.1 Afgelopen kwartaal ..... 28
3.9.2 Komende kwartaal ..... 28
**3.10** Uitvoeringskwaliteit ..... 29
3.10.1 Afgelopen kwartaal ..... 29
3.10.2 Komende kwartaal ..... 29
**3.11** Contractmanagement ..... 30
3.11.1 Afgelopen kwartaal ..... 30
3.11.2 Komende kwartaal ..... 30
**4. Overdracht en openstelling ..... 31**
**4.1** Tunnelveiligheid ..... 31
4.1.1 Afgelopen kwartaal ..... 31
4.1.2 Komende kwartaal ..... 31
**4.2** Overdracht aan beheerders ..... 32
4.2.1 Afgelopen kwartaal ..... 32
4.2.2 Komende kwartaal ..... 32
**4.3** Beheer en onderhoud ..... 33
4.3.1 Afgelopen kwartaal ..... 33
4.3.2 Komende kwartaal ..... 33
**5. Projectbeheersing ..... 34**
**5.1** Scope ..... 34
5.1.1 Afgelopen kwartaal ..... 34
5.1.2 Komende kwartaal ..... 34
**5.2** Financiën ..... 35
5.2.1 Kostenstructuur ..... 35
5.2.2 Dekkingen ..... 36
**5.3** Planning ..... 39
5.3.1 Afgelopen kwartaal ..... 39
5.3.2 Komende kwartaal ..... 39
**5.4** Risico's ..... 40
5.4.1 Afgelopen kwartaal ..... 40
5.4.2 Komende kwartaal ..... 40
5.4.3 Financiële toprisico's ..... 40
5.4.4 Toprisico's planning ..... 41
**5.5** Interne kwaliteit ..... 43
5.5.1 Afgelopen kwartaal ..... 43
5.5.2 Komende kwartaal ..... 43
**5.6** Informatie ..... 44
5.6.1 Afgelopen kwartaal ..... 44
5.6.2 Komende kwartaal ..... 44
**5.7** Organisatie ..... 45

5.7.1 Afgelopen kwartaal ..... 45
5.7.2 Komende kwartaal ..... 45
**6. Bijlage: Planningsmijlpalen ..... 46**
**7. Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan ..... 47**
**8. Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer ..... 49**

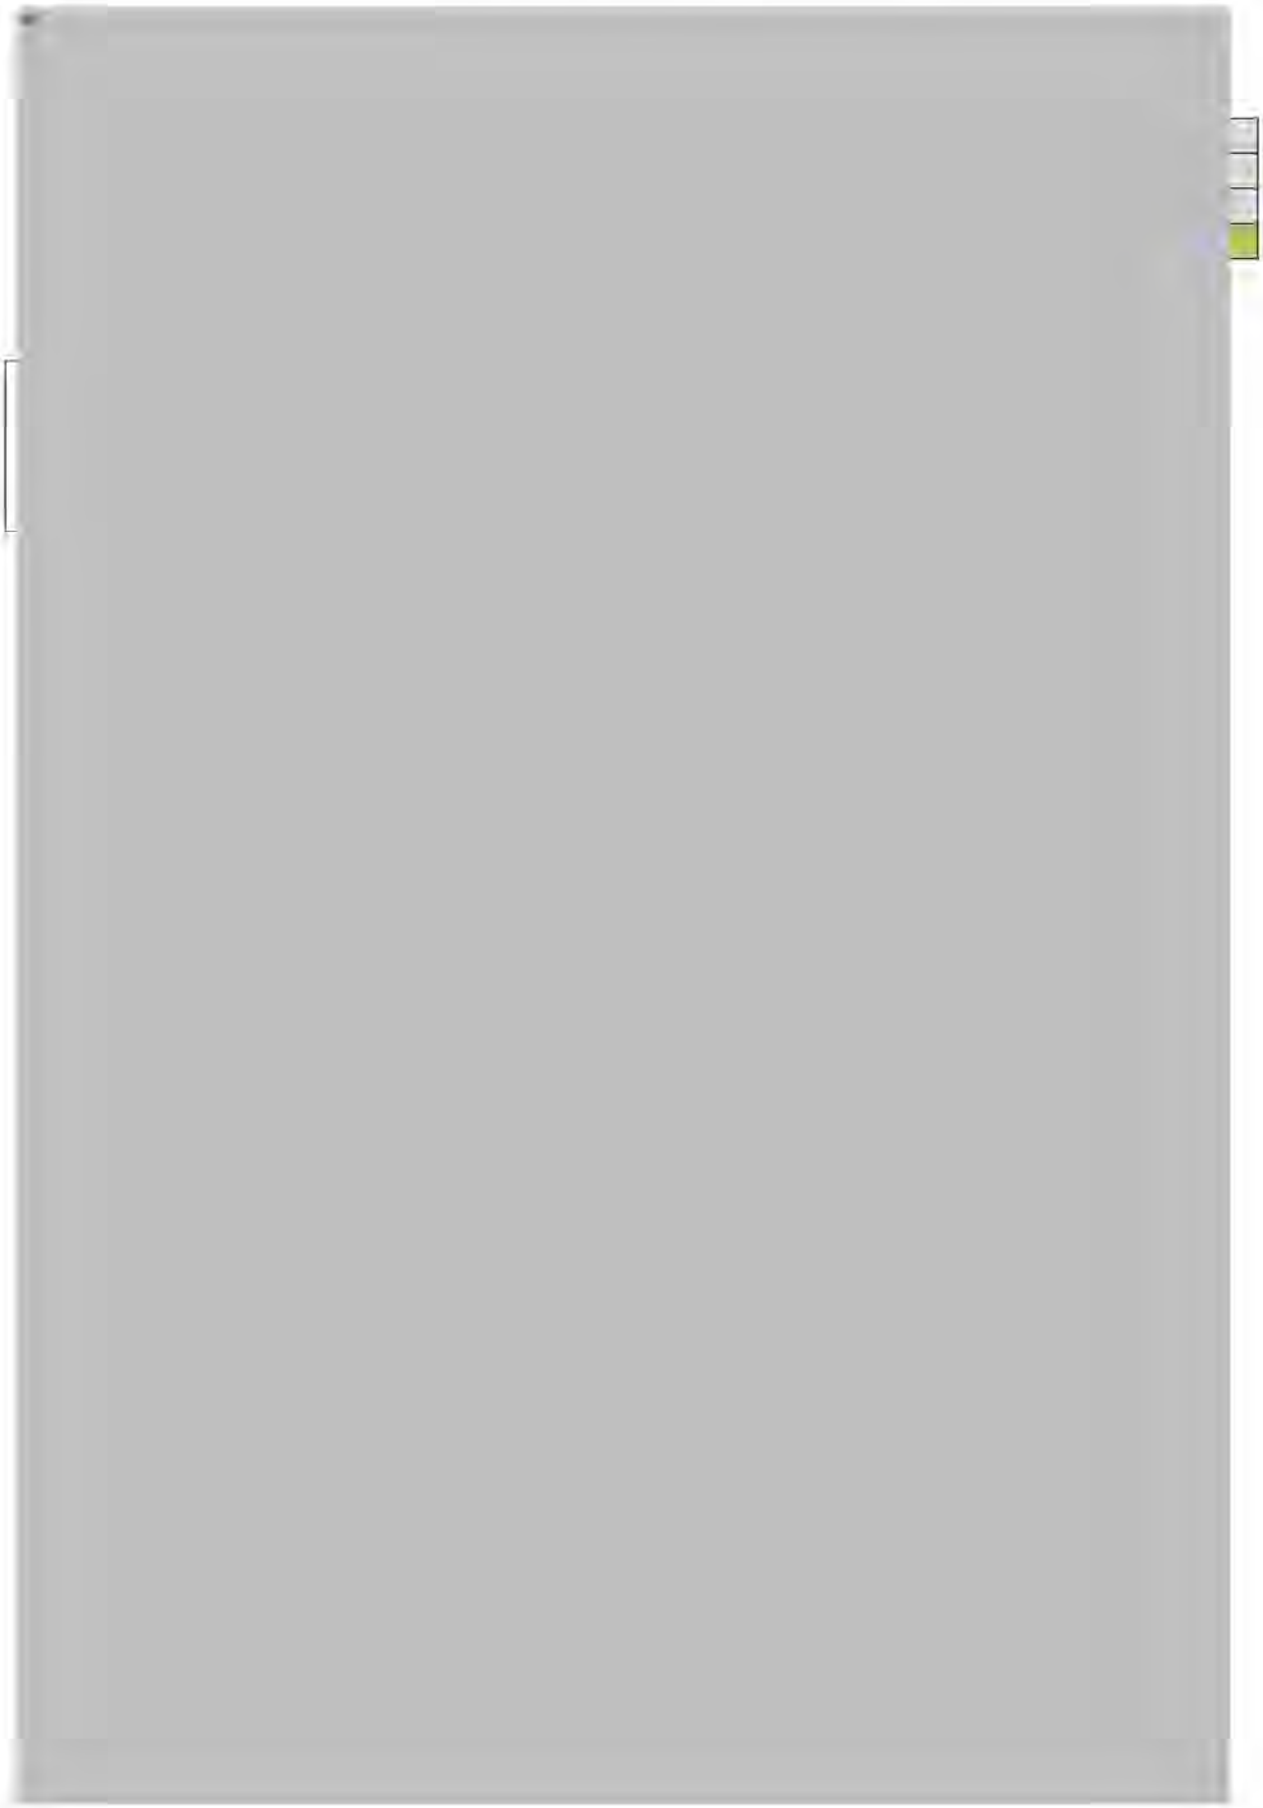

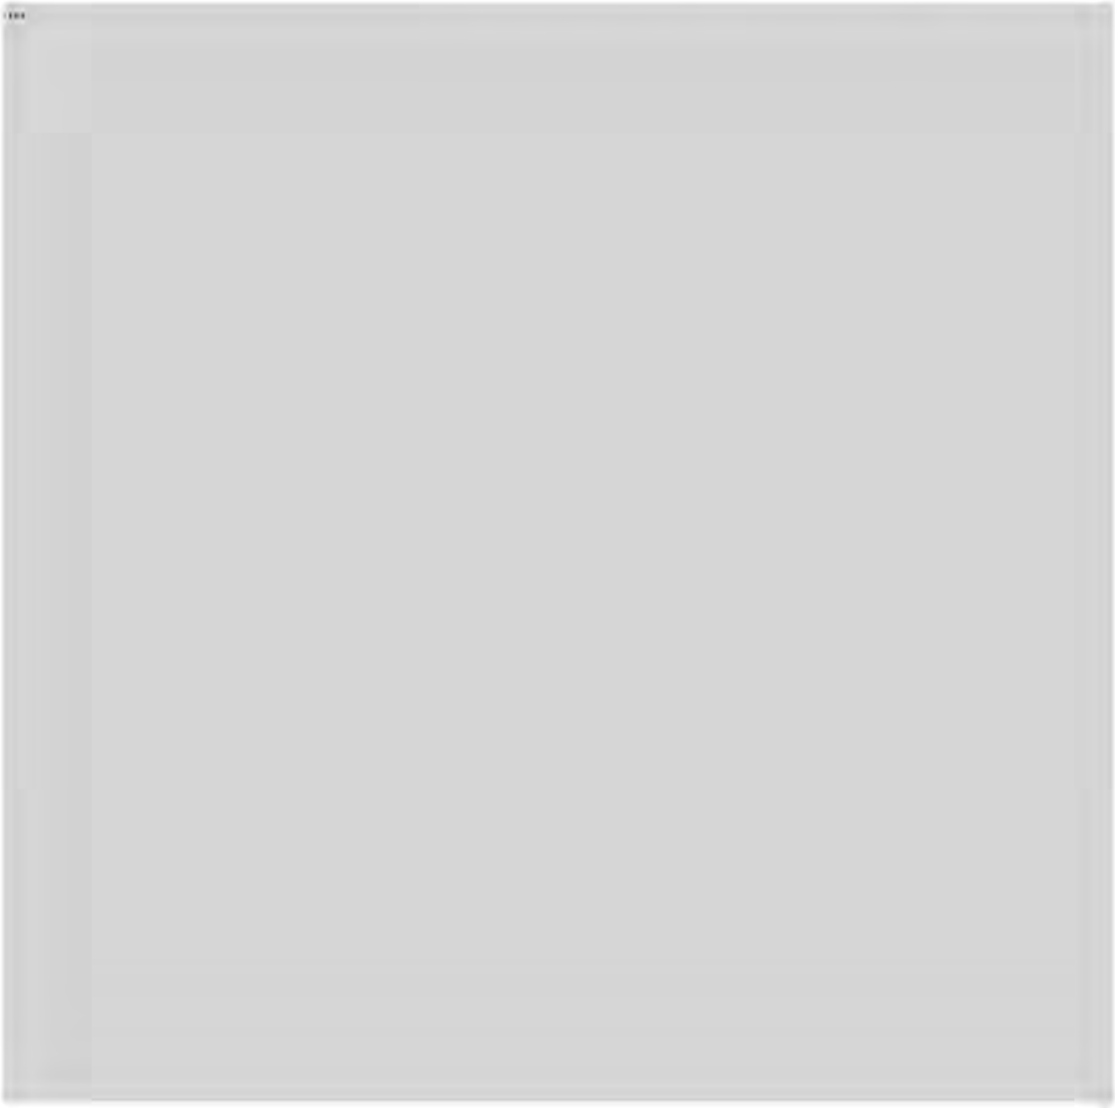

## 1.5 Verwachting komende kwartaal

- De waterinlaat tussen Zuidvliet en waterberging in Molenvlietpark nader ontwerpen in afstemming met het Hoogheemraadschap, 5.1.2.e (i.r.t. ontwikkeling Nieuw Vredenoord) en 5.1.2.e

## 1.9 Bestuurlijke besluitvorming komende periode

Het College B&W zal verzocht worden een besluit te nemen over de samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2e t.a.v. waterinlaat van Zuidvliet naar de calamiteitenberging in het Molenvlietpark (tezamen met Project UitvoeringsKader ontwikkeling Nieuw Vredenoord en overeenkomst grondruil) (medio 2016). Tevens zal het College B&W verzocht worden een besluit te nemen over de samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2e t.a.v. waterinlaat van de Zuidvliet naar calamiteitenberging Molenvlietpark (medio 2016).

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Afronden overeenkomst 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark over zijn gronden. | Uit nadere berekeningen is gebleken dat de inlaat van de waterberging een groter ruimtebeslag legt op de gronden van 5.1.2.e dan aanvankelijk aangenomen. In overleg met het Hoogheemraadschap en 5.1.2.e i.r.t. ontwikkeling Nieuw Vredenoord wordt onder meer het ontwerp aangepast. Daarna kunnen de consequenties t.a.v. de concept overeenkomst in beeld worden gebracht. |
| Alsnog overeenstemming zien te bereiken met 5.1.2.e t.a.v. de waterinlaat naar de waterberging Molenvlietpark, verlegging Molenslootpad en evt. aanpassing brug nadat overeenstemming met 5.1.2.e is bereikt. | De onderhandeling met van Aalst worden aangehouden tot het moment dat overeenstemming (met 5.1.2.e ) is bereikt over aangepast ontwerp aangaande de inlaat. |
| [redacted] | |
| | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Collegebesluit aangaande overeenkomst met 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark, ontwikkeling Nieuw Vredenoord en Samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e 5.1.2.e | Nog in afwachting van aangepast ontwerp alvorens besluitvorming kan plaatsvinden |
| | |

### 2.1.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| BR |
| Afronden overeenkomst 5.1.2e t.a.v. inlaat waterberging Molenvlietpark over zijn gronden. |
| Alsnog overeenstemming zien te bereiken met 5.1.2e t.a.v. de waterinlaat naar de waterberging Molenvlietpark, verlegging Molenslootpad en evt. aanpassing brug nadat overeenstemming met 5.1.2e is bereikt. |
| BH |
| |
| **Besluiten** |
| Collegebesluit aangaande overeenkomst met 5.1.2e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark, ontwikkeling Nieuw Vredenoord en Samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2e 5.1.2e |
| |

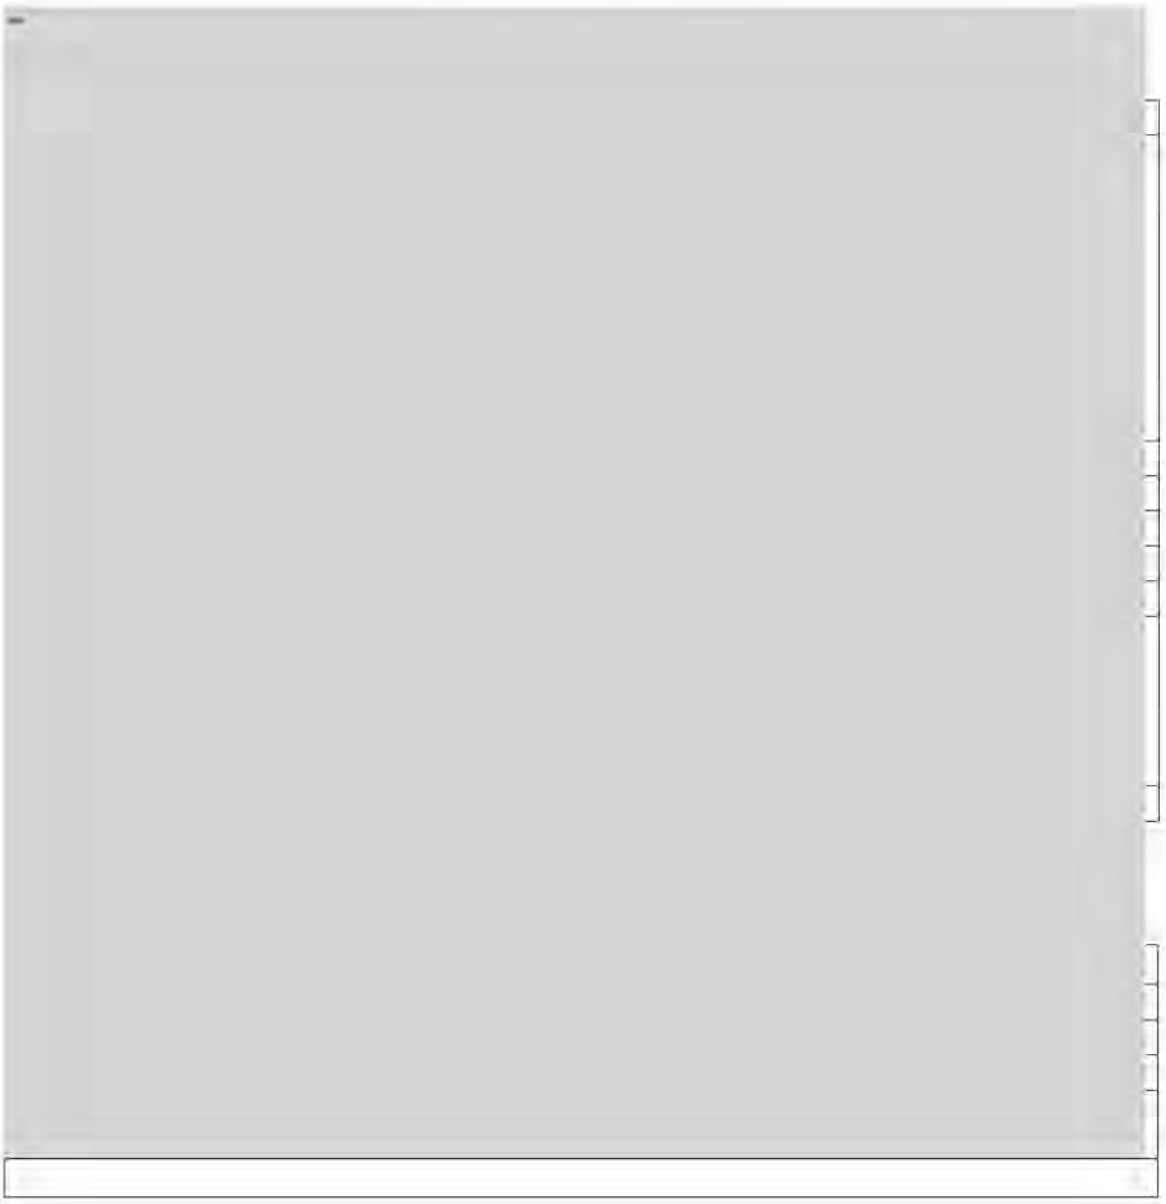

## 2.3 Vergunningen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Op 21 december 2015 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland het ontwerp-projectplan Vlietberging locatie Molenslootpad (Molenvlietpark) te Den Haag ter inzage gelegd. | In afwachting van besluitvorming. |
| | |
| BR | |
| | |

### 2.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Besluitvorming Hoogheemraadschap van Delfland afwachten over het ontwerp-projectplan Vlietberging locatie Molenslootpad (Molenvlietpark) welke ter inzage ligt. |
| BR |
| |

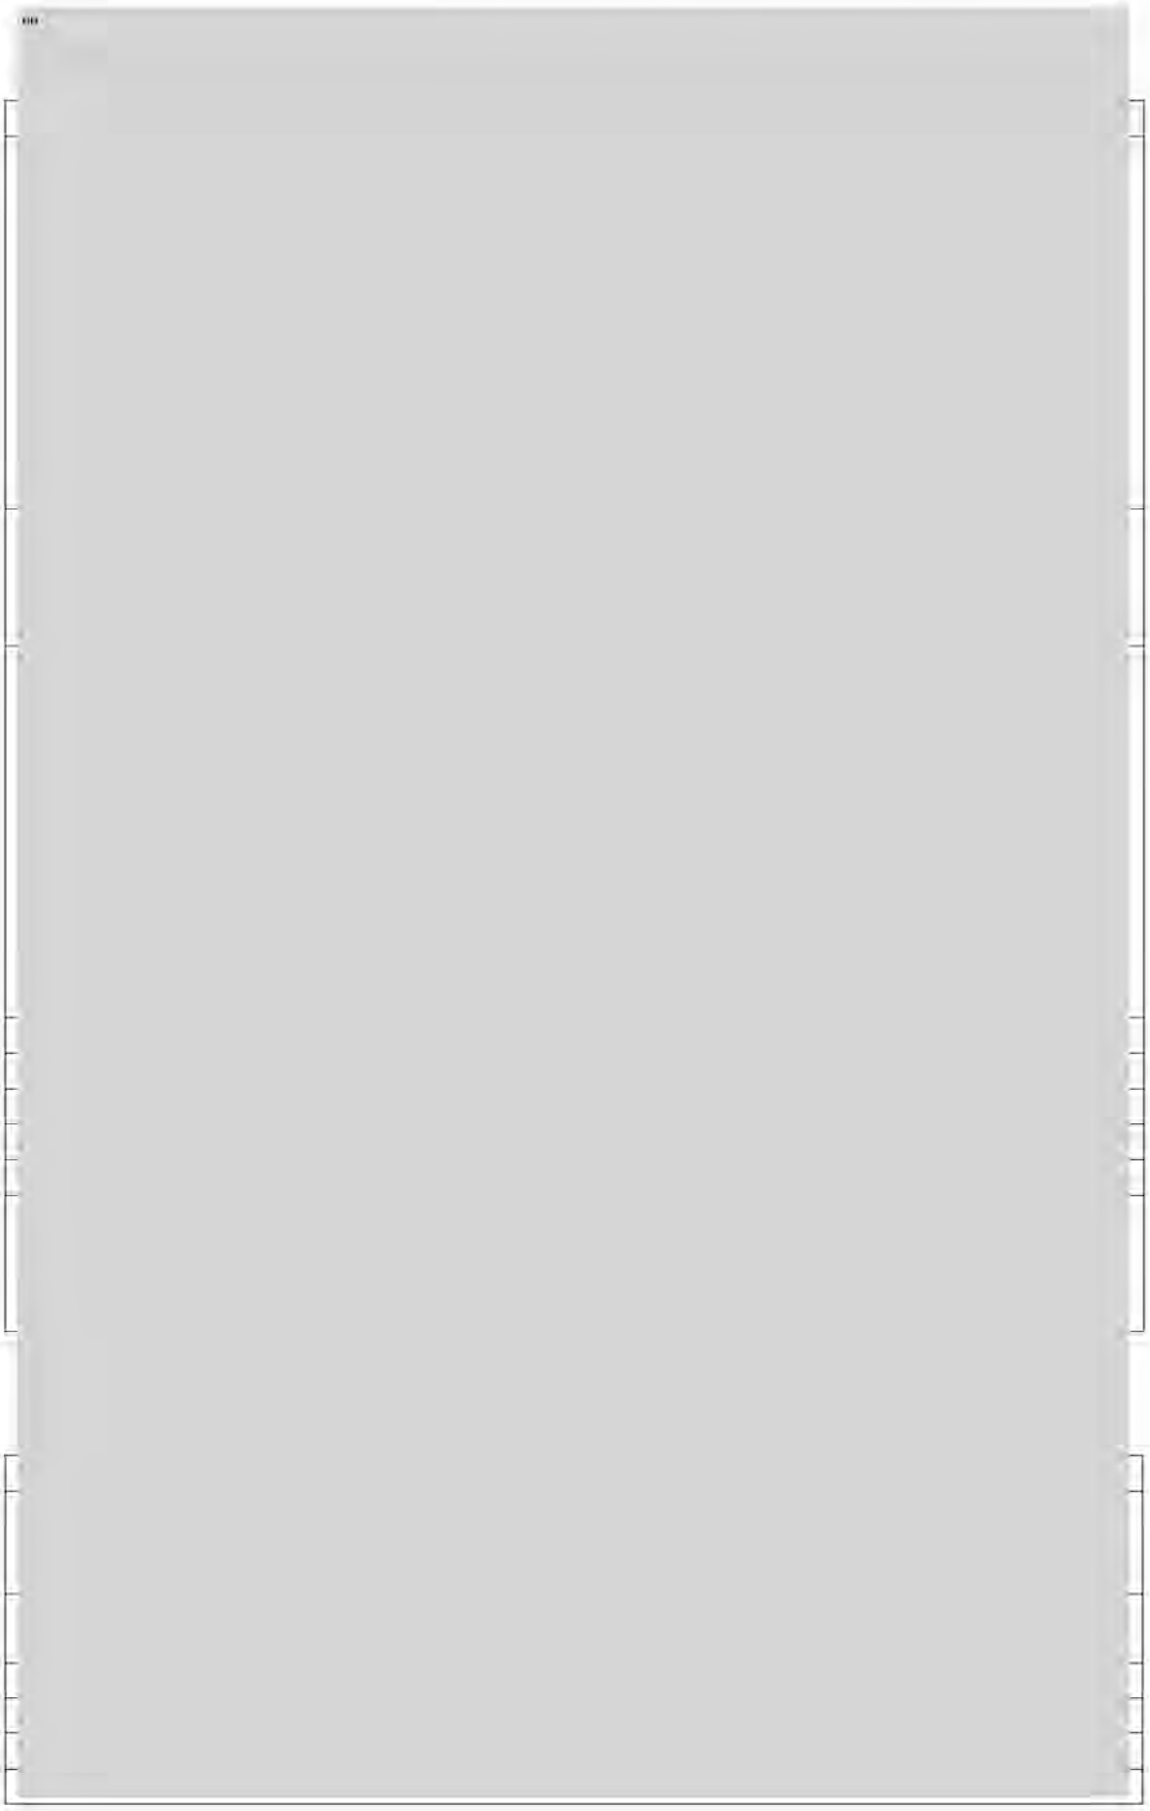

## 2.5 Overeenkomsten

### 2.5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| Opstellen en afronden van afsprakenkaders / (samenwerkings)overeenkomsten met eigenaren / gebruikers (5.1.2e / 5.1.2e ). |
| |

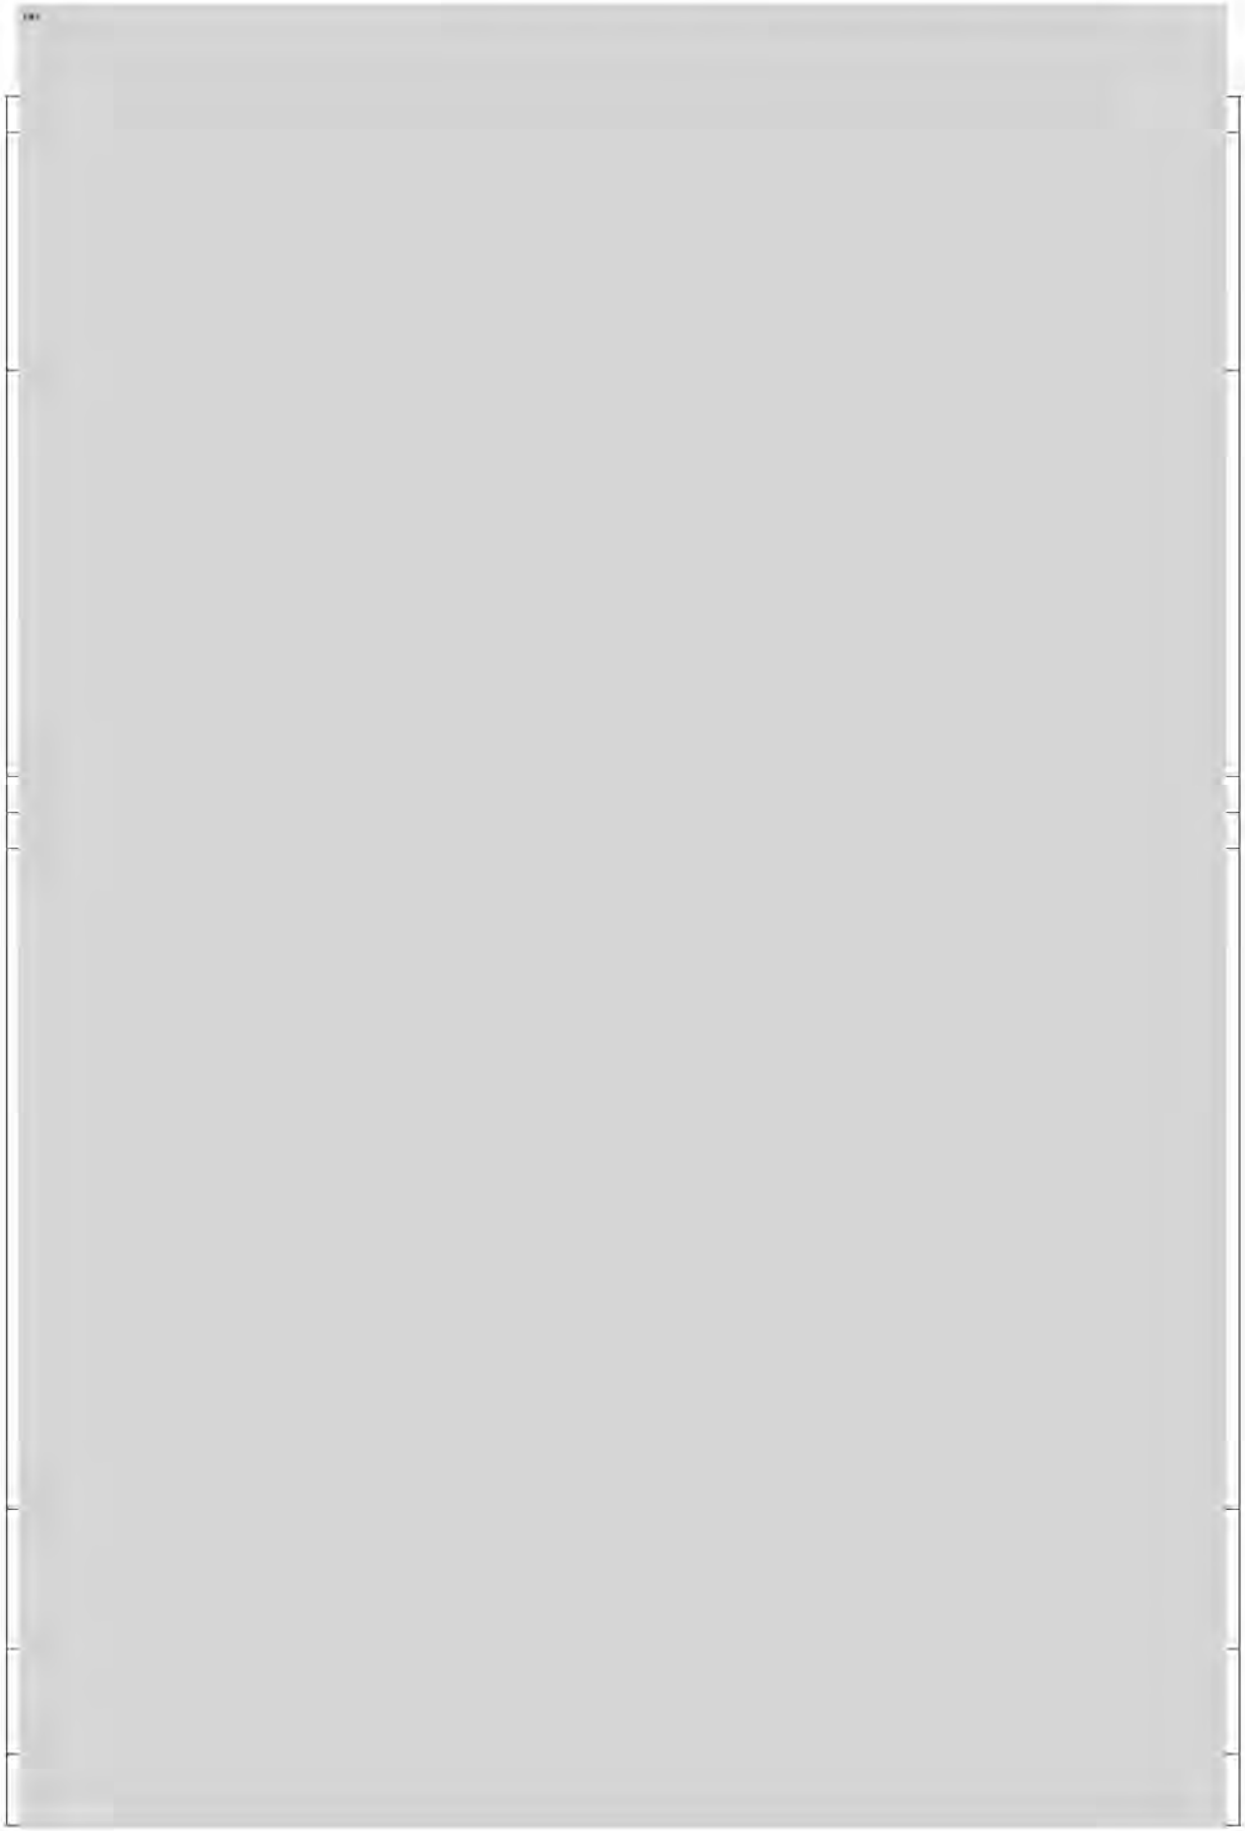

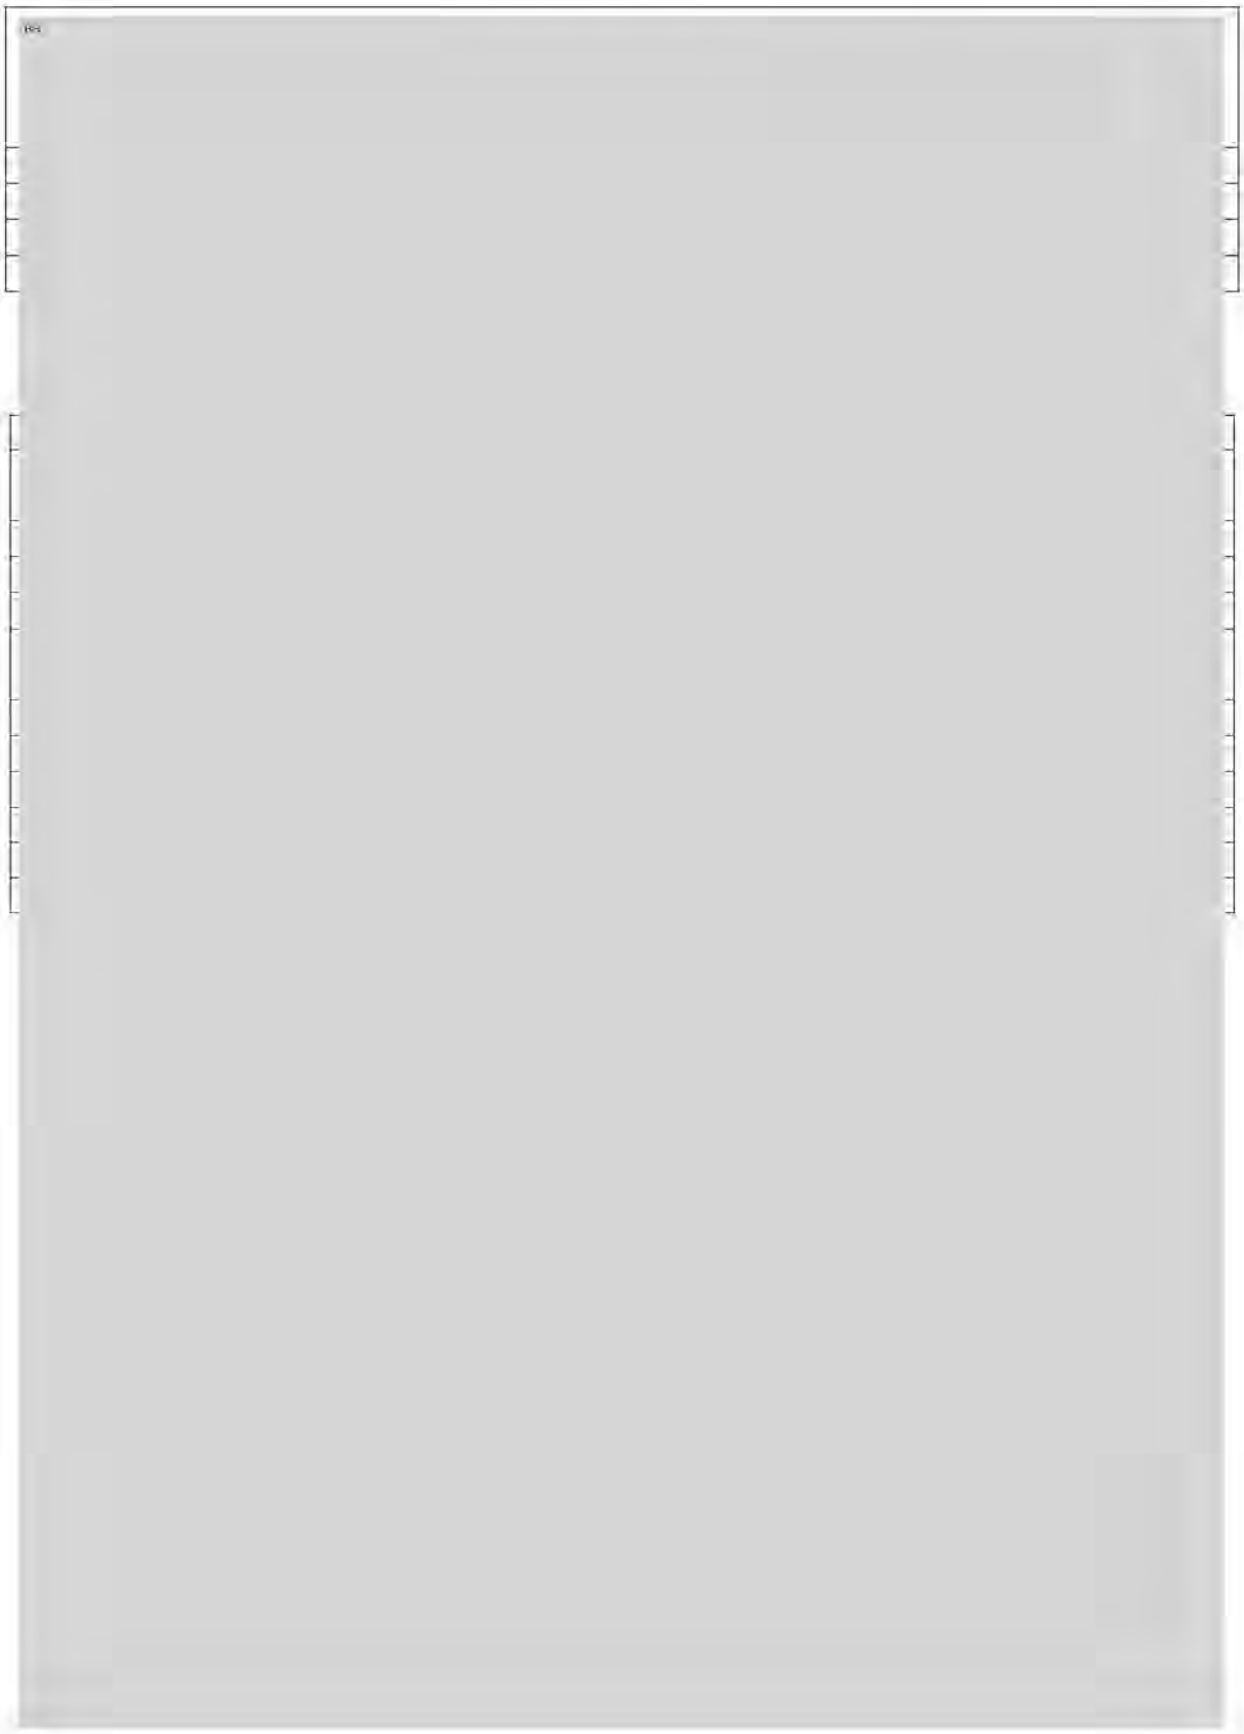

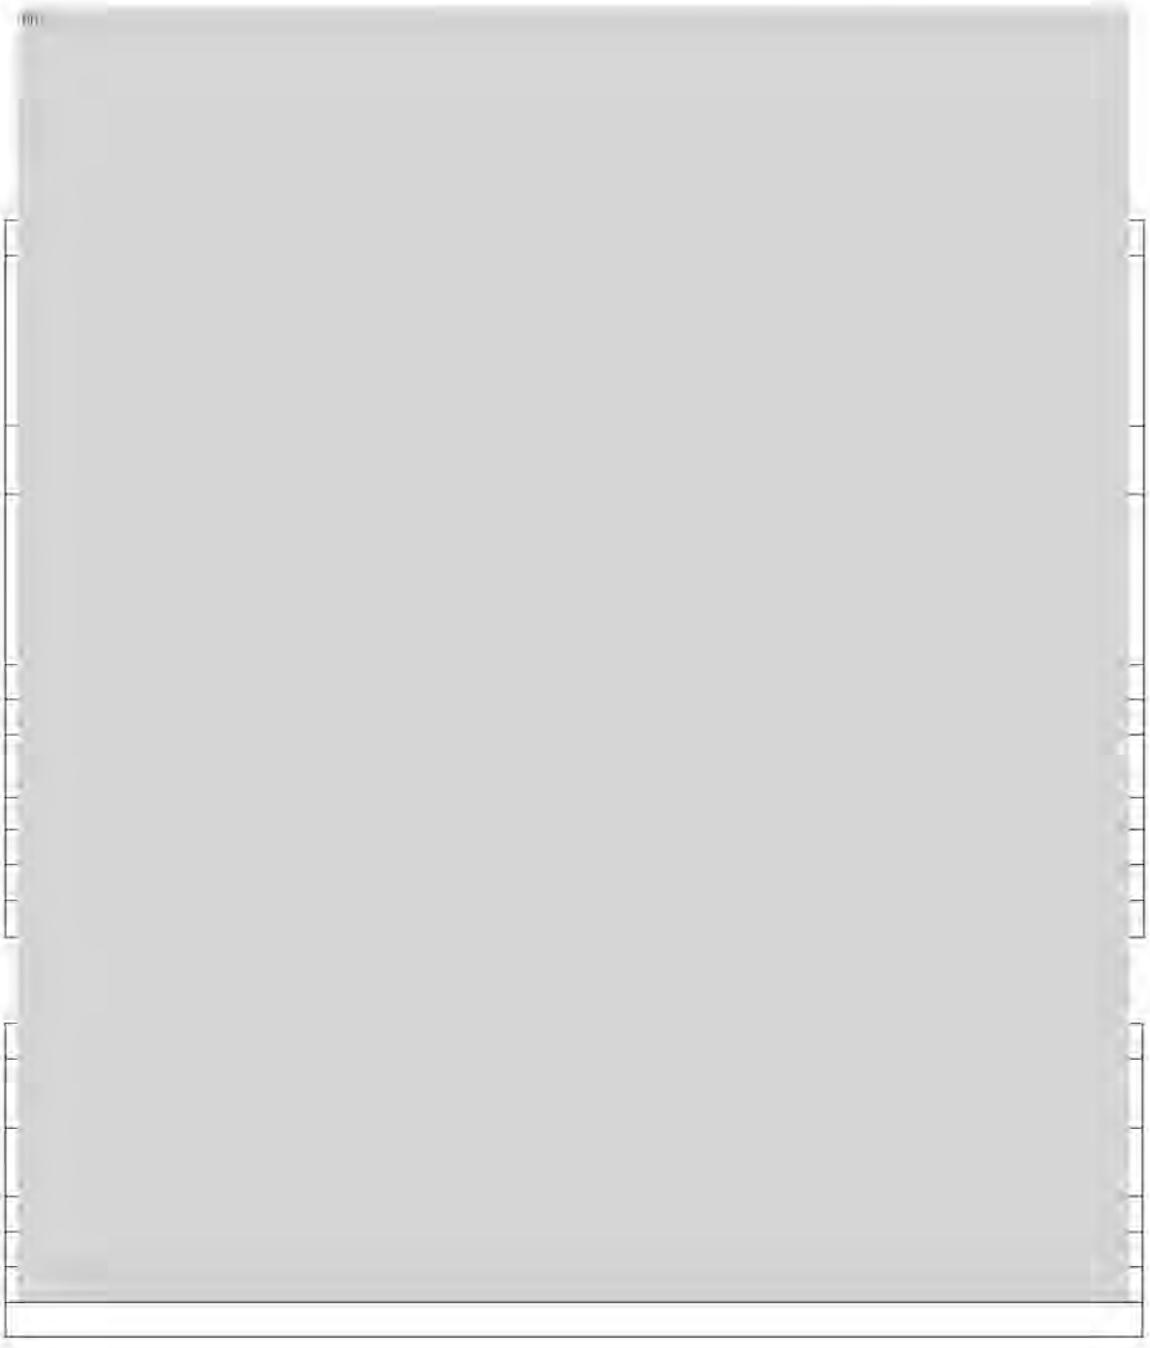

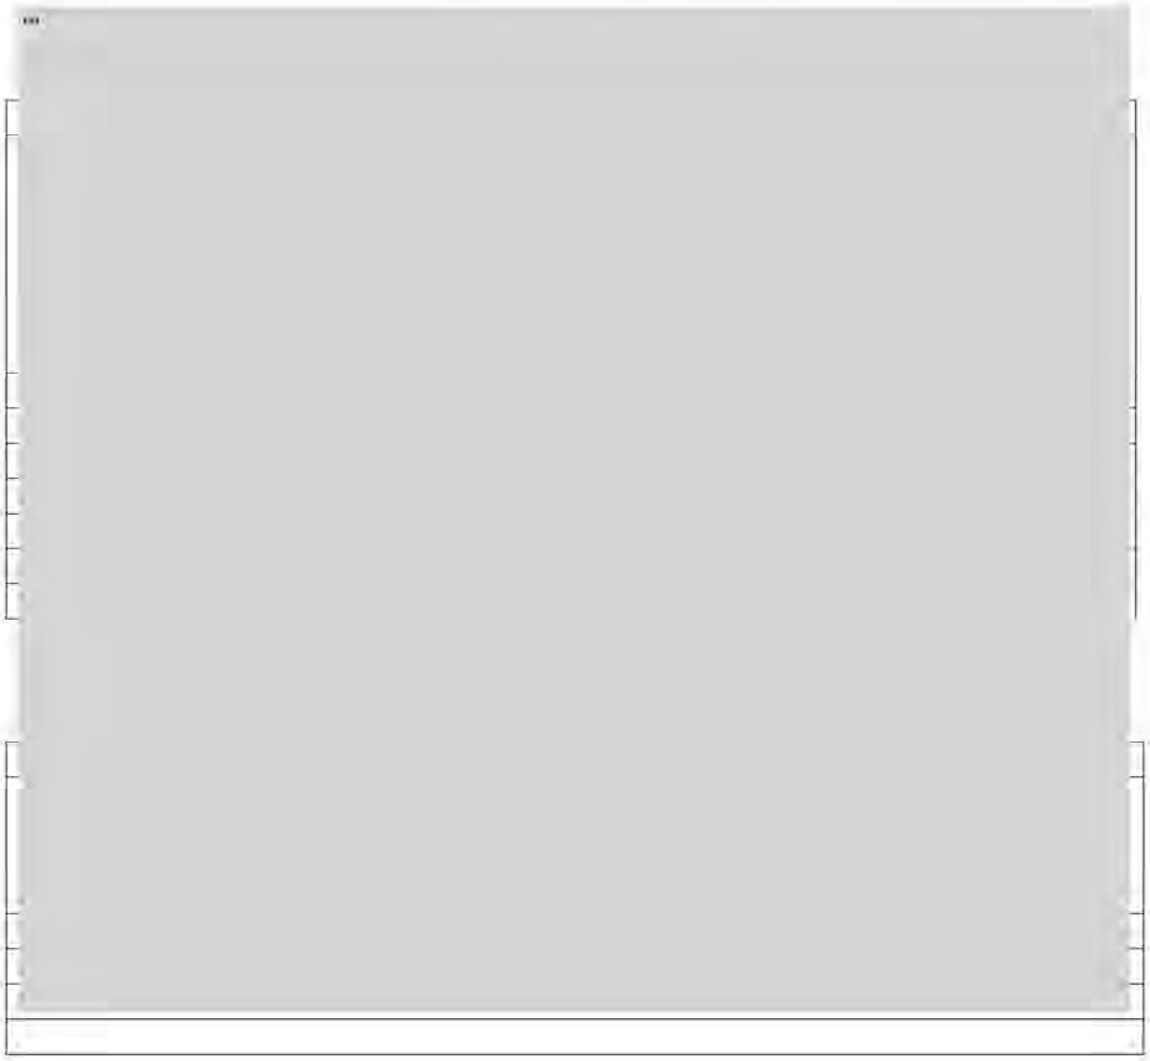

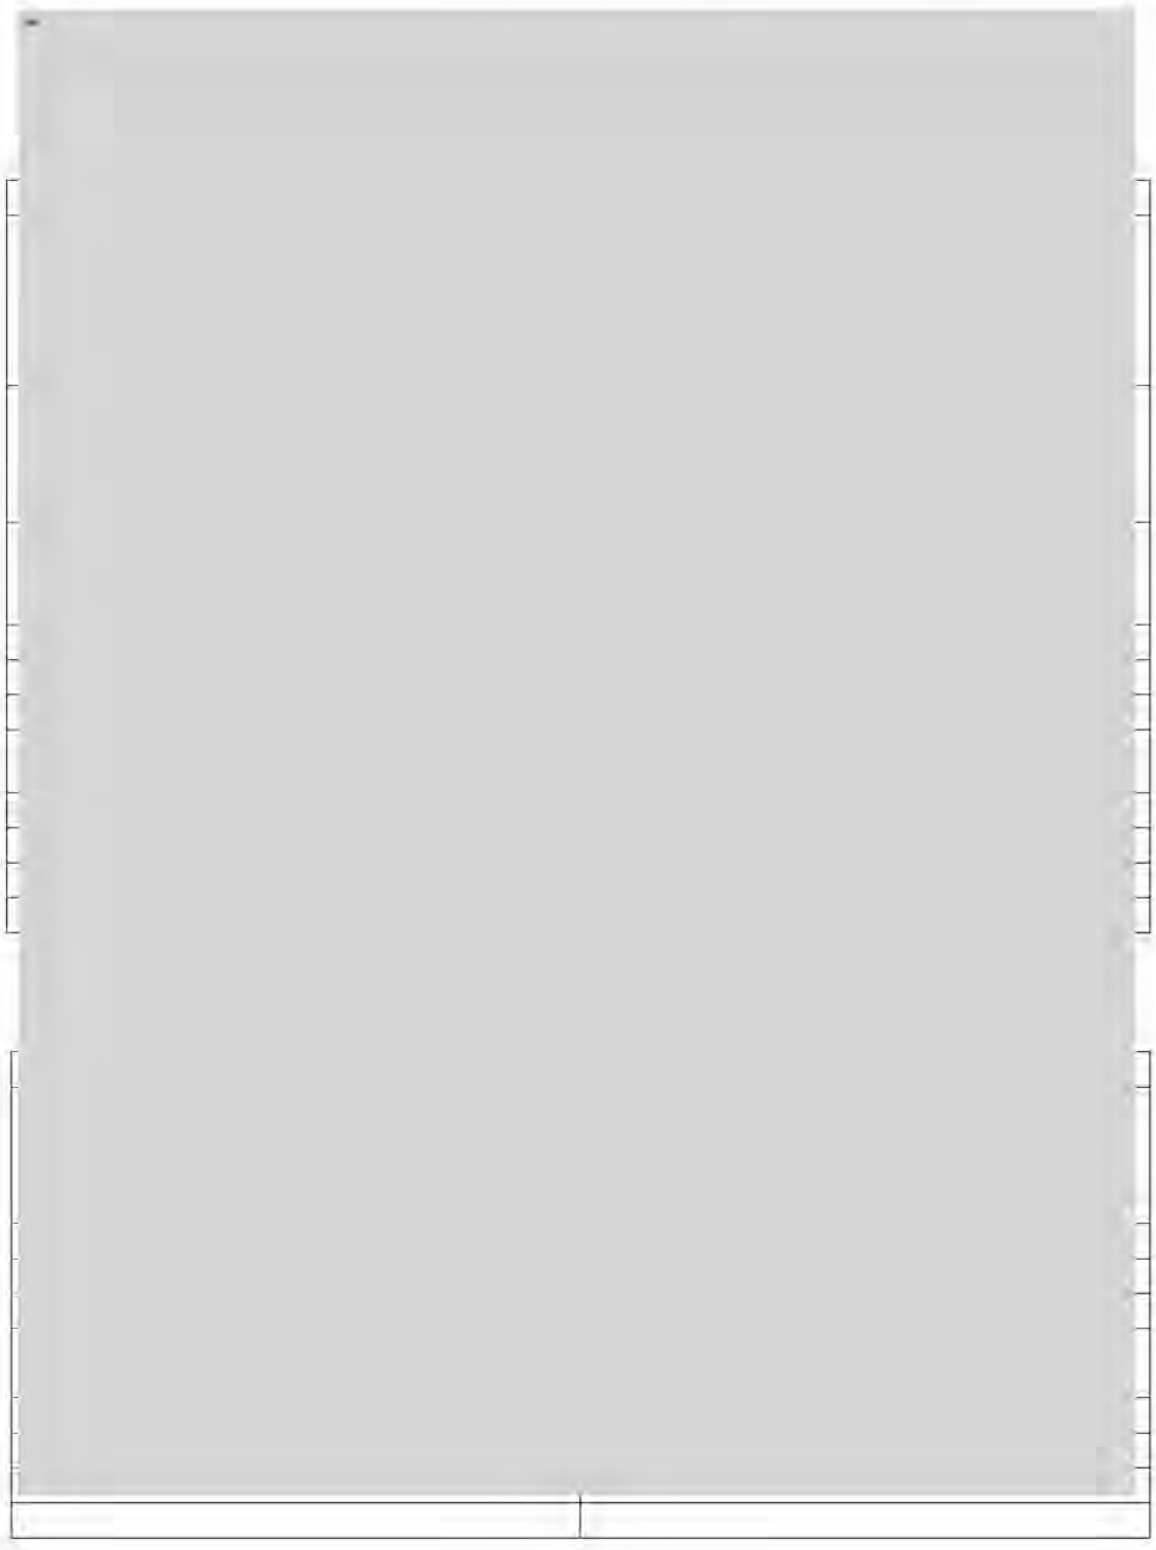

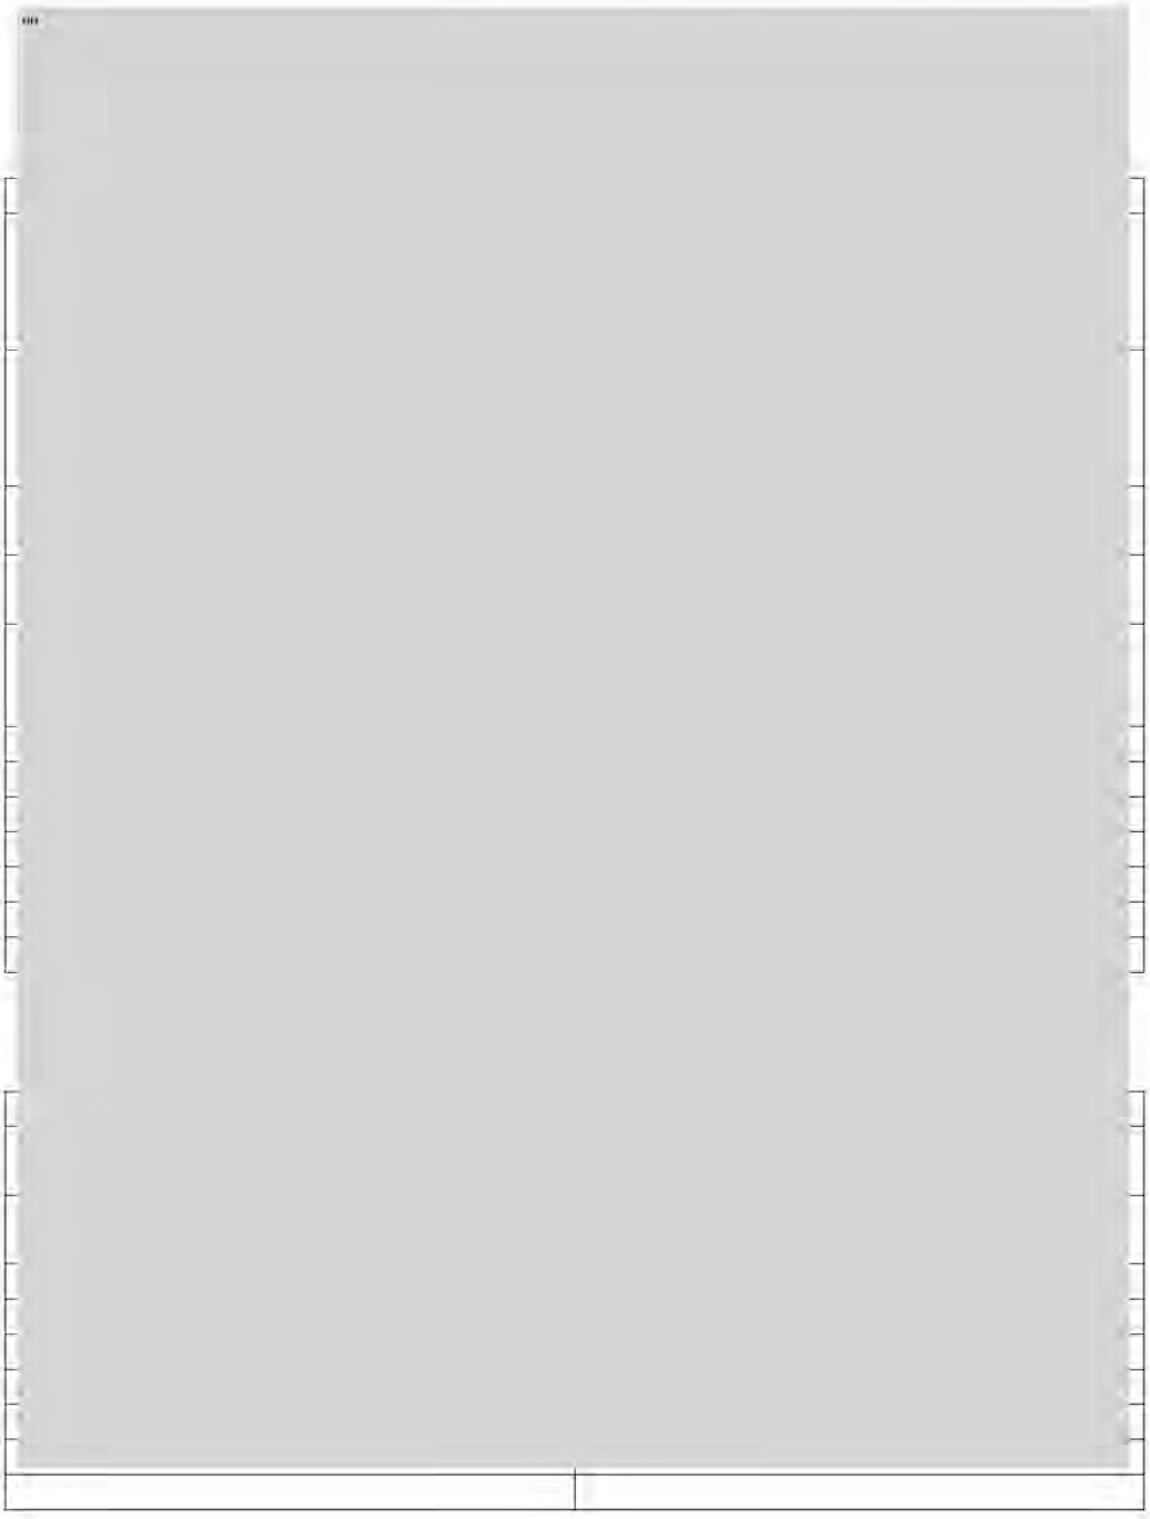

### 3.5.2 Komende kwartaal

## Conditionering

| Werkzaamheden |
| --- |
| [redacted] |
| Afronden van het VO/DO voor de tweede watertoevoer vanuit de Zuidvliet naar het Molenvlietpark. |
| |
| [redacted] |
| |

| [redacted] |
| --- |
| |

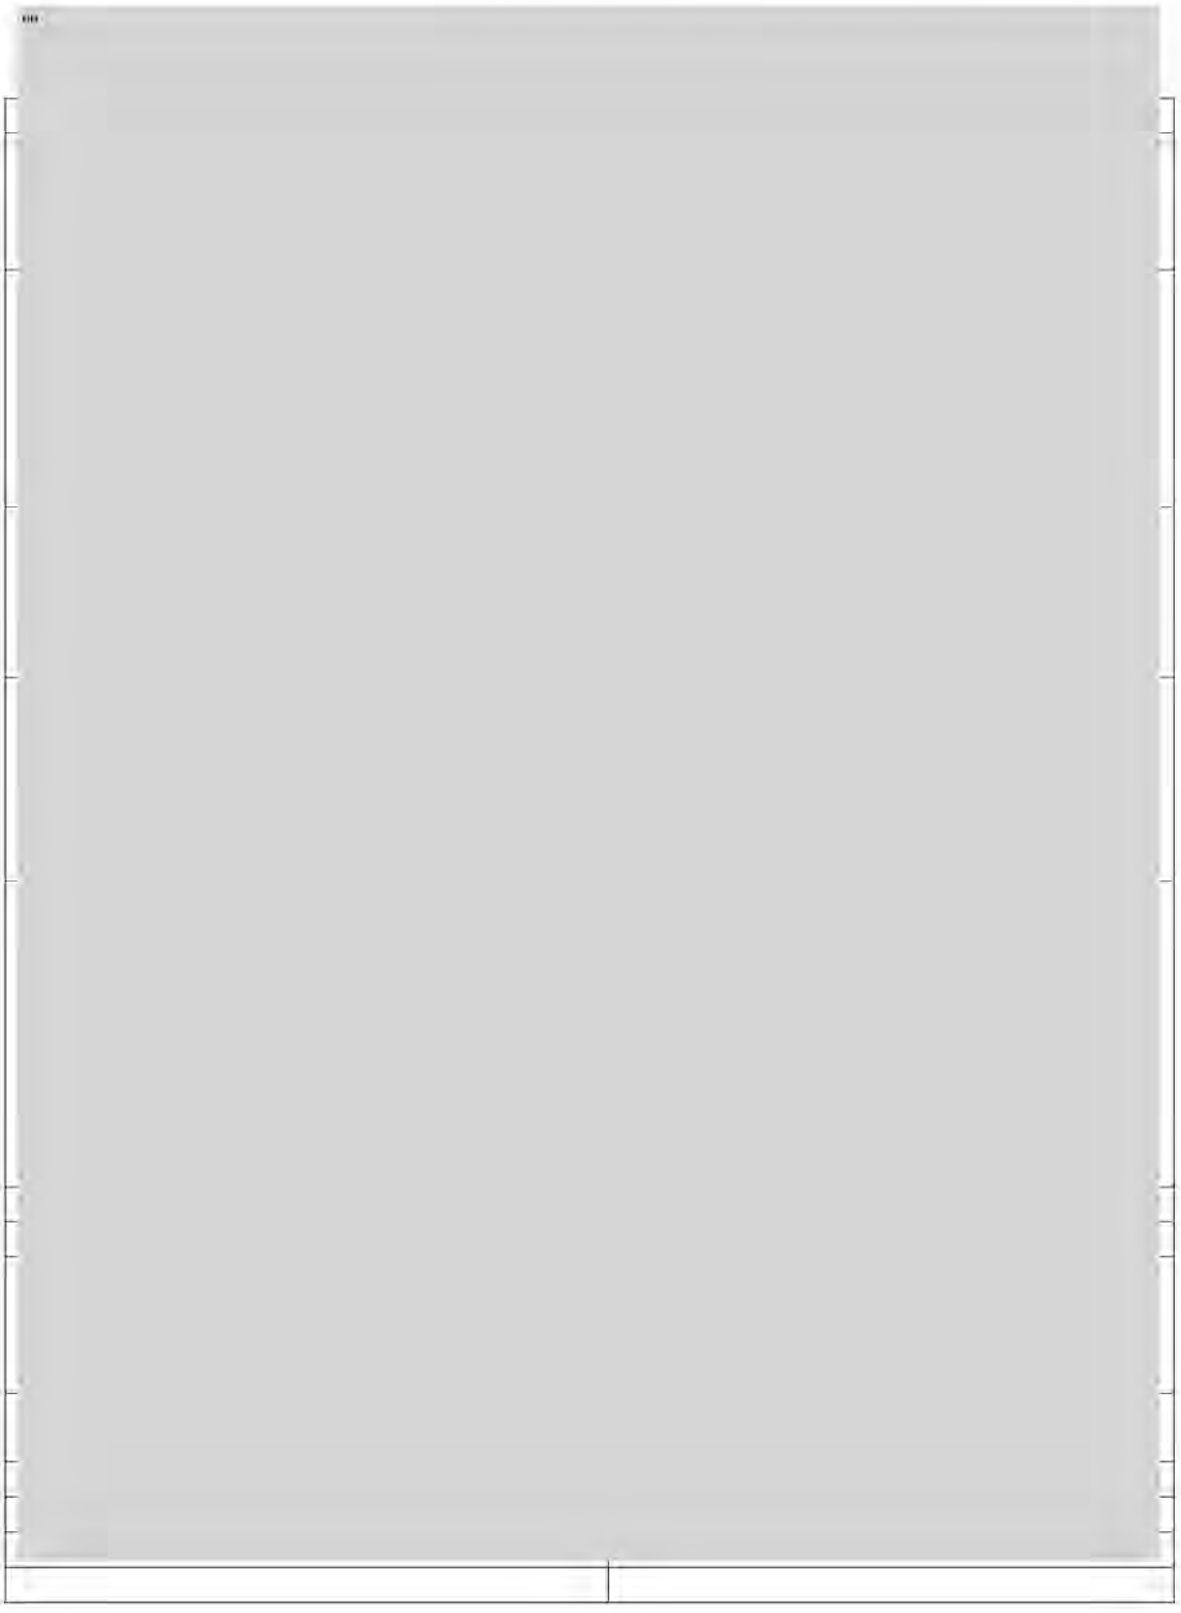

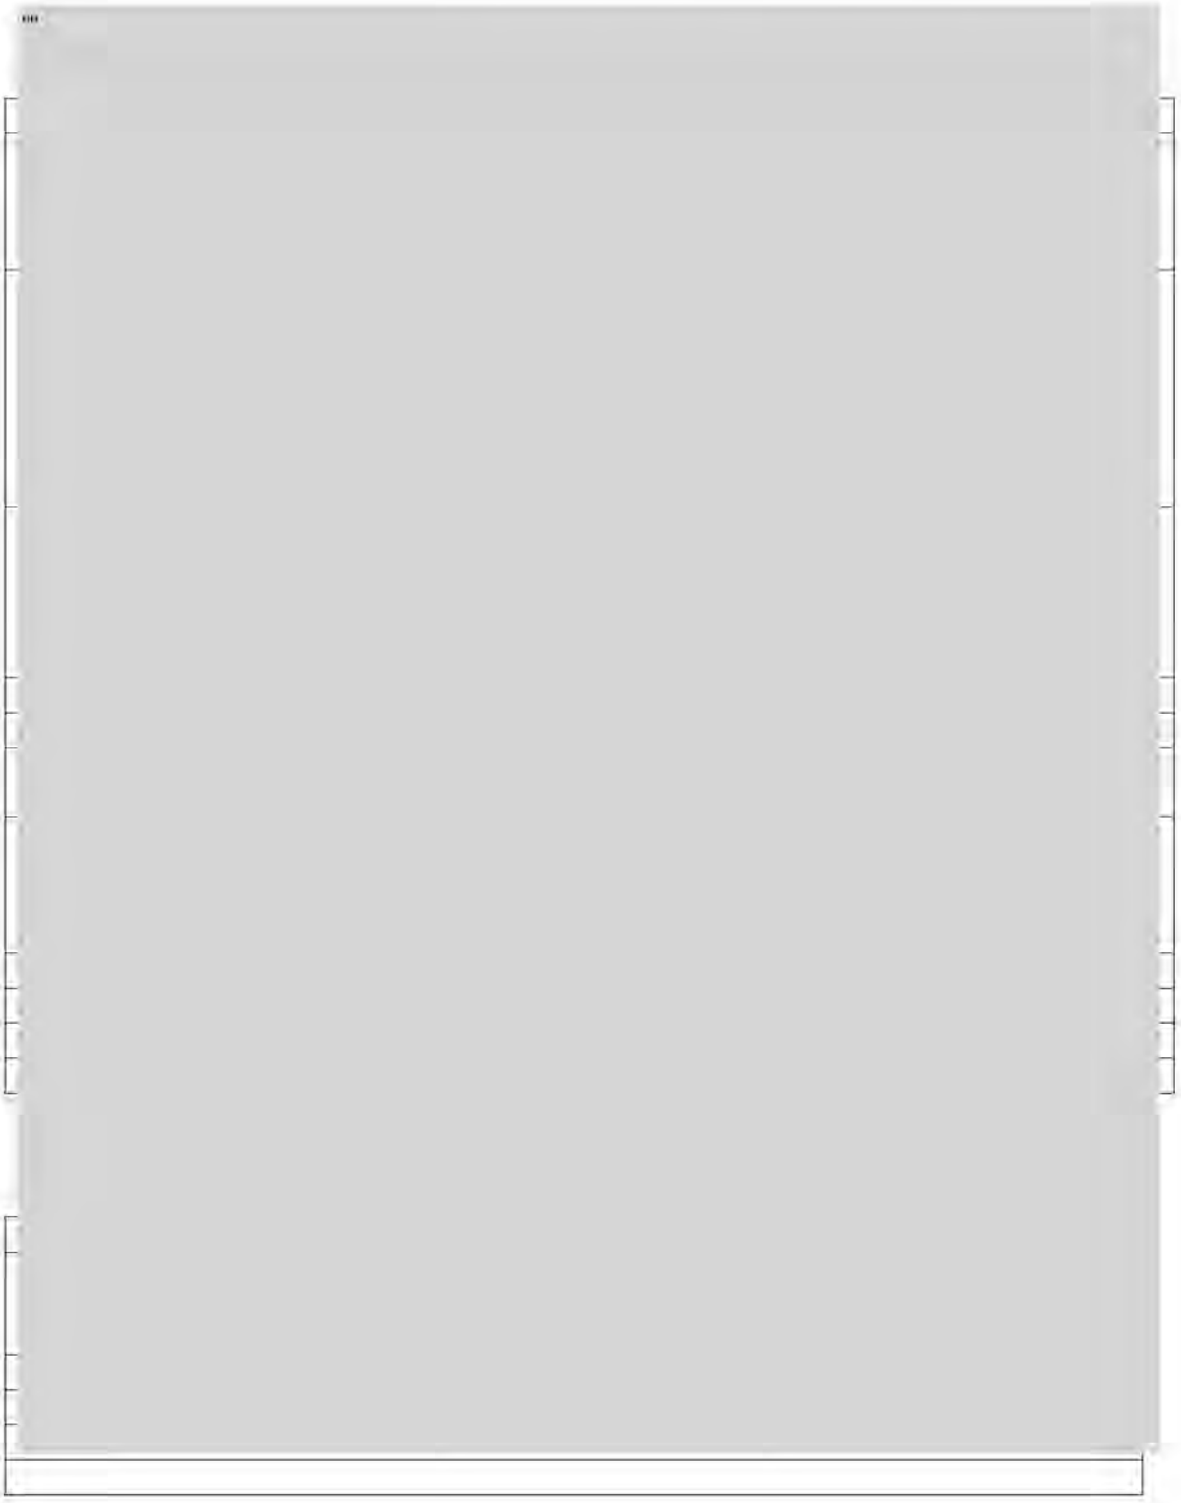

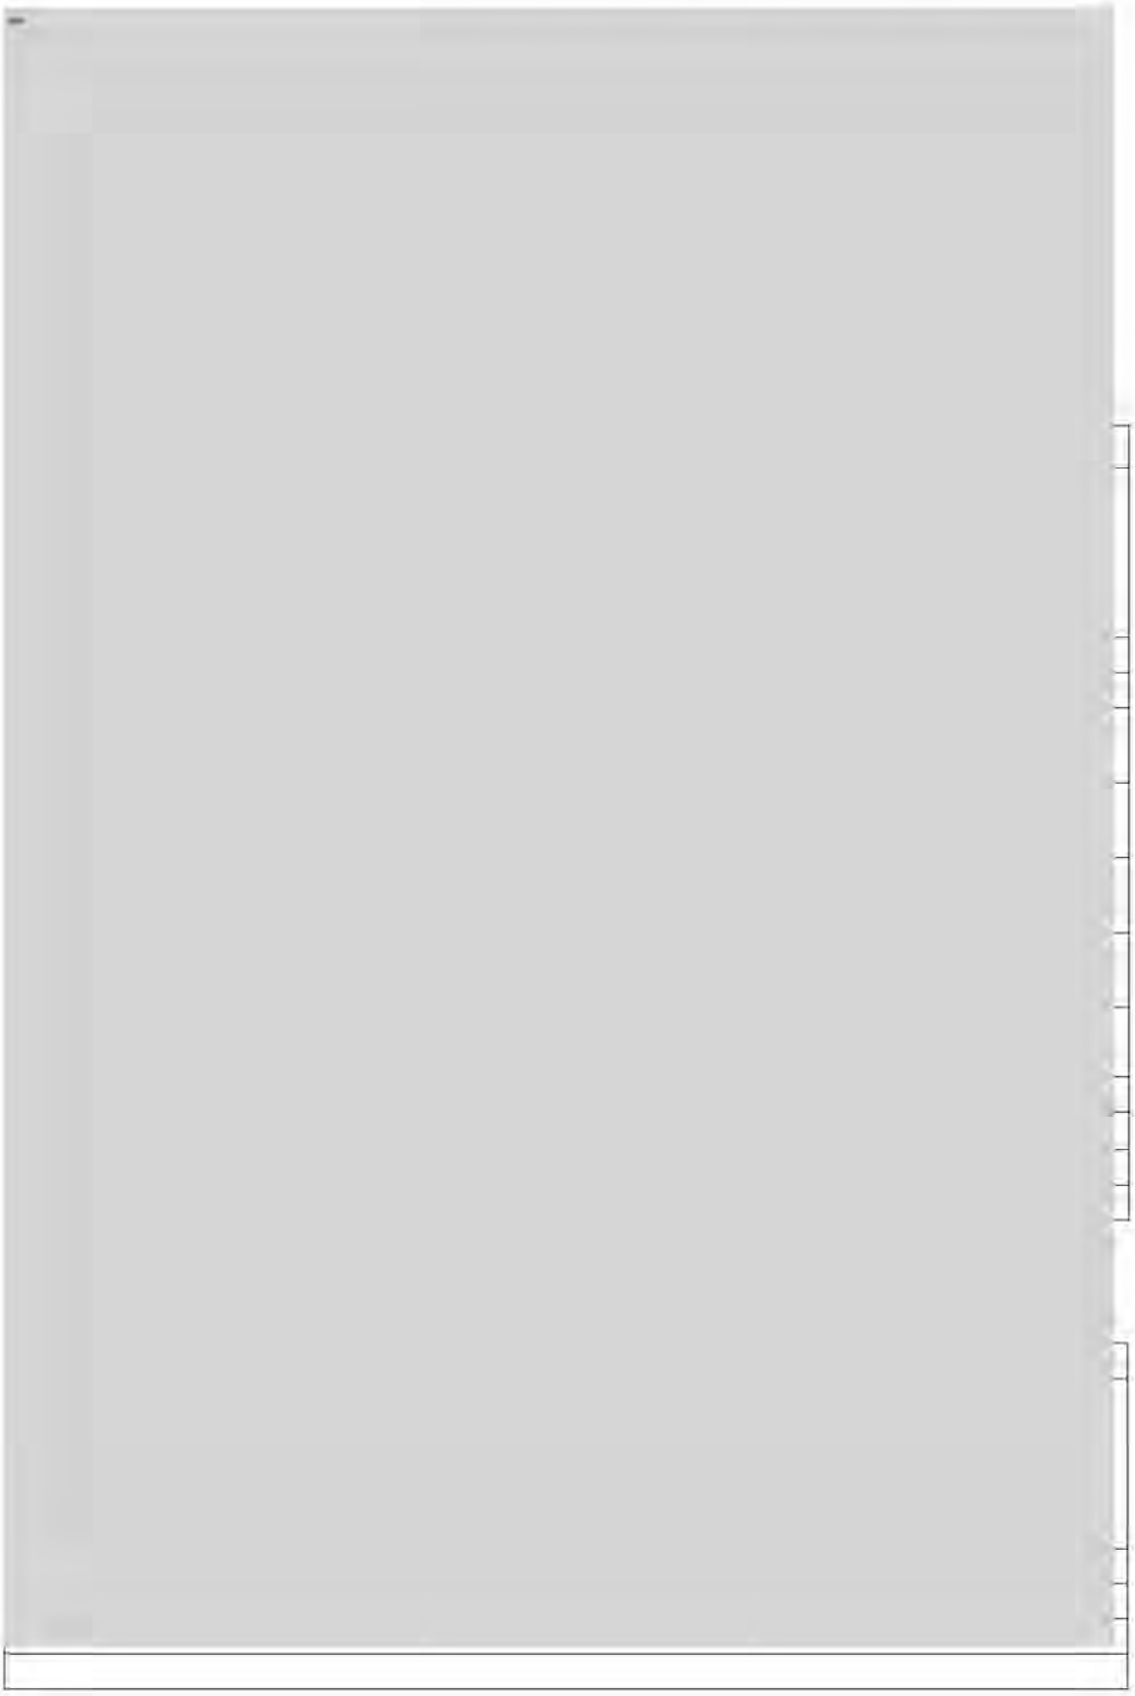

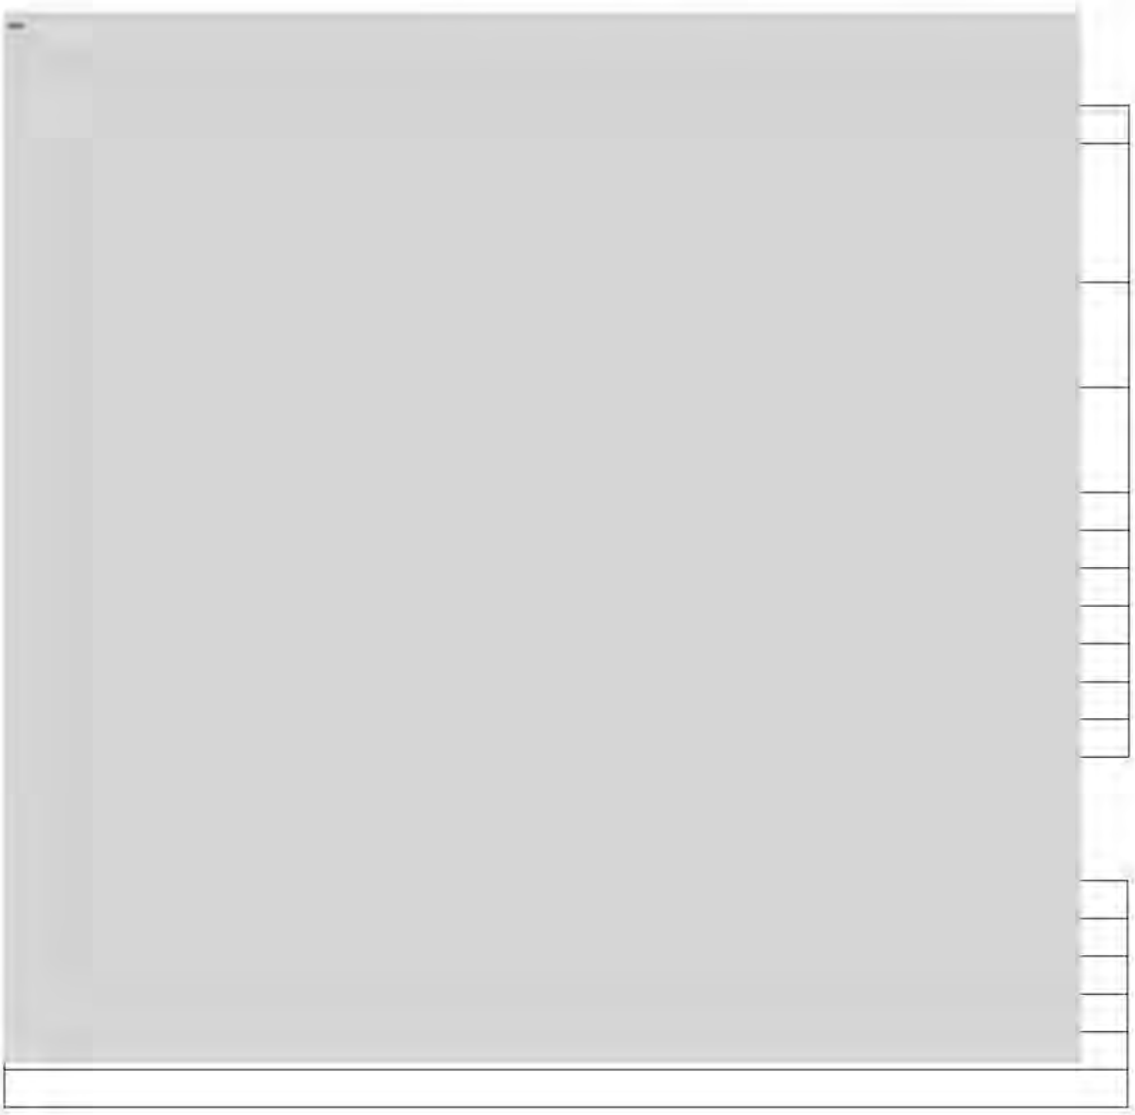

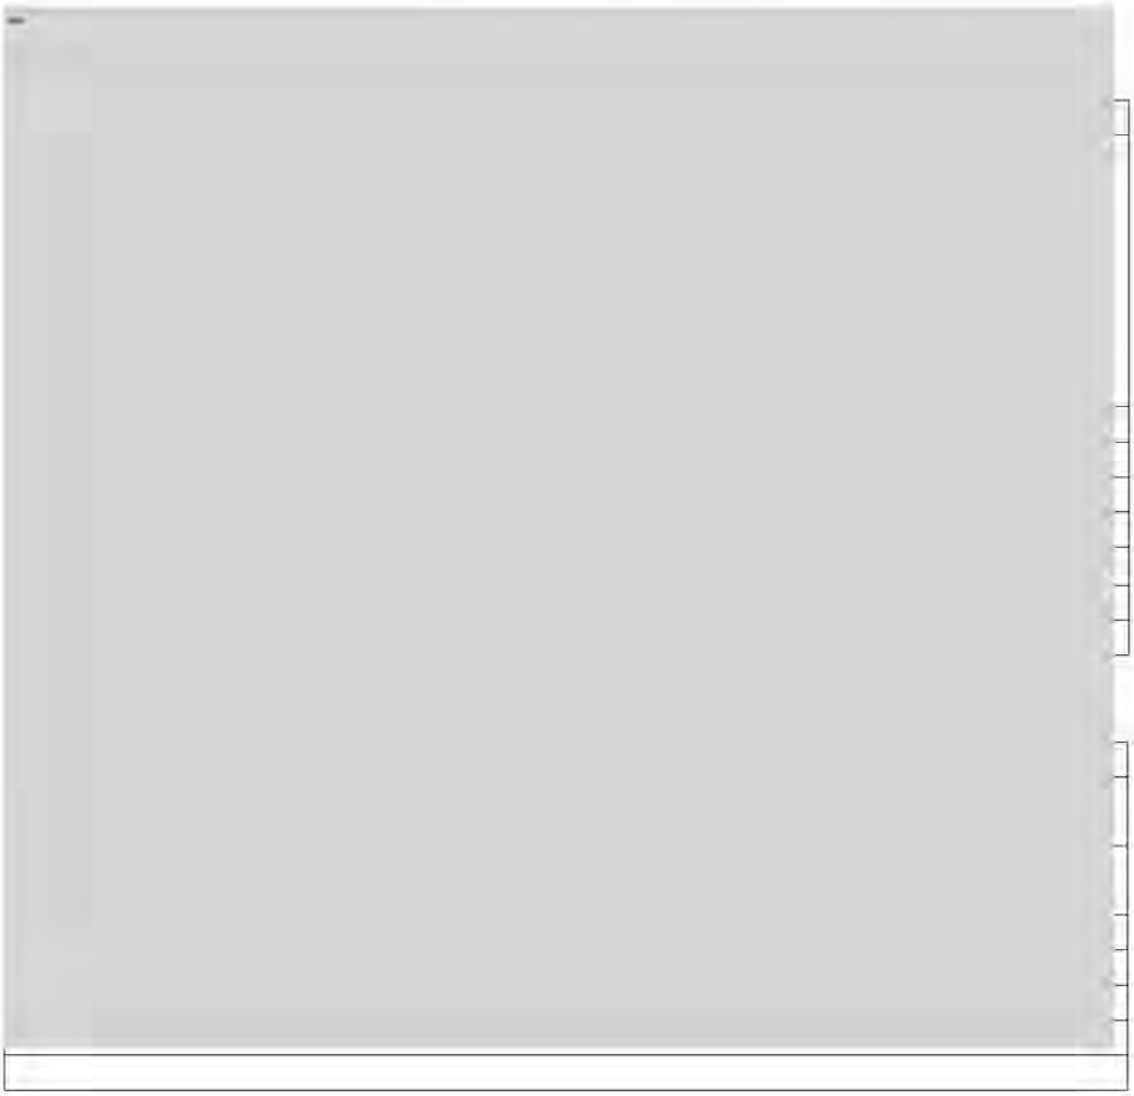

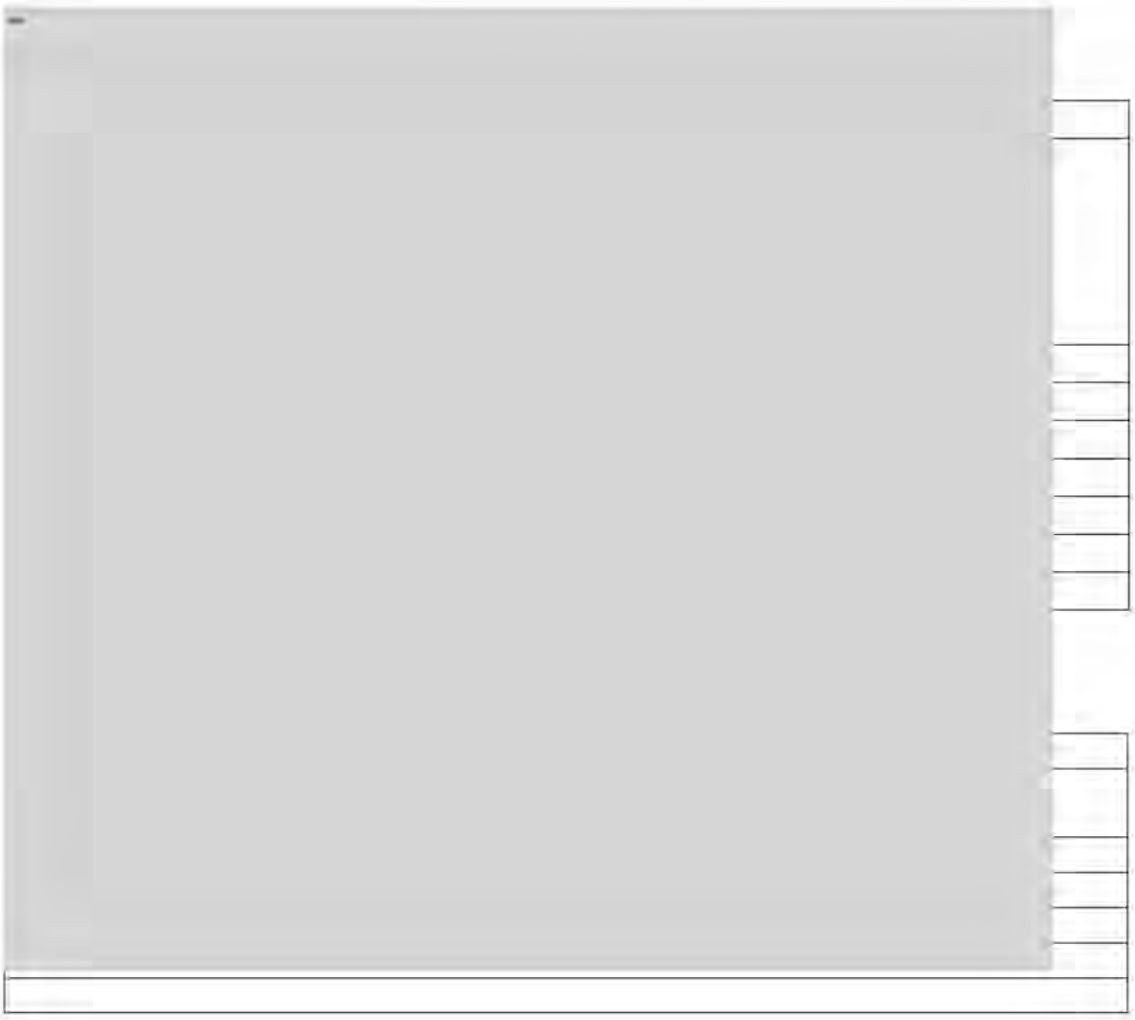

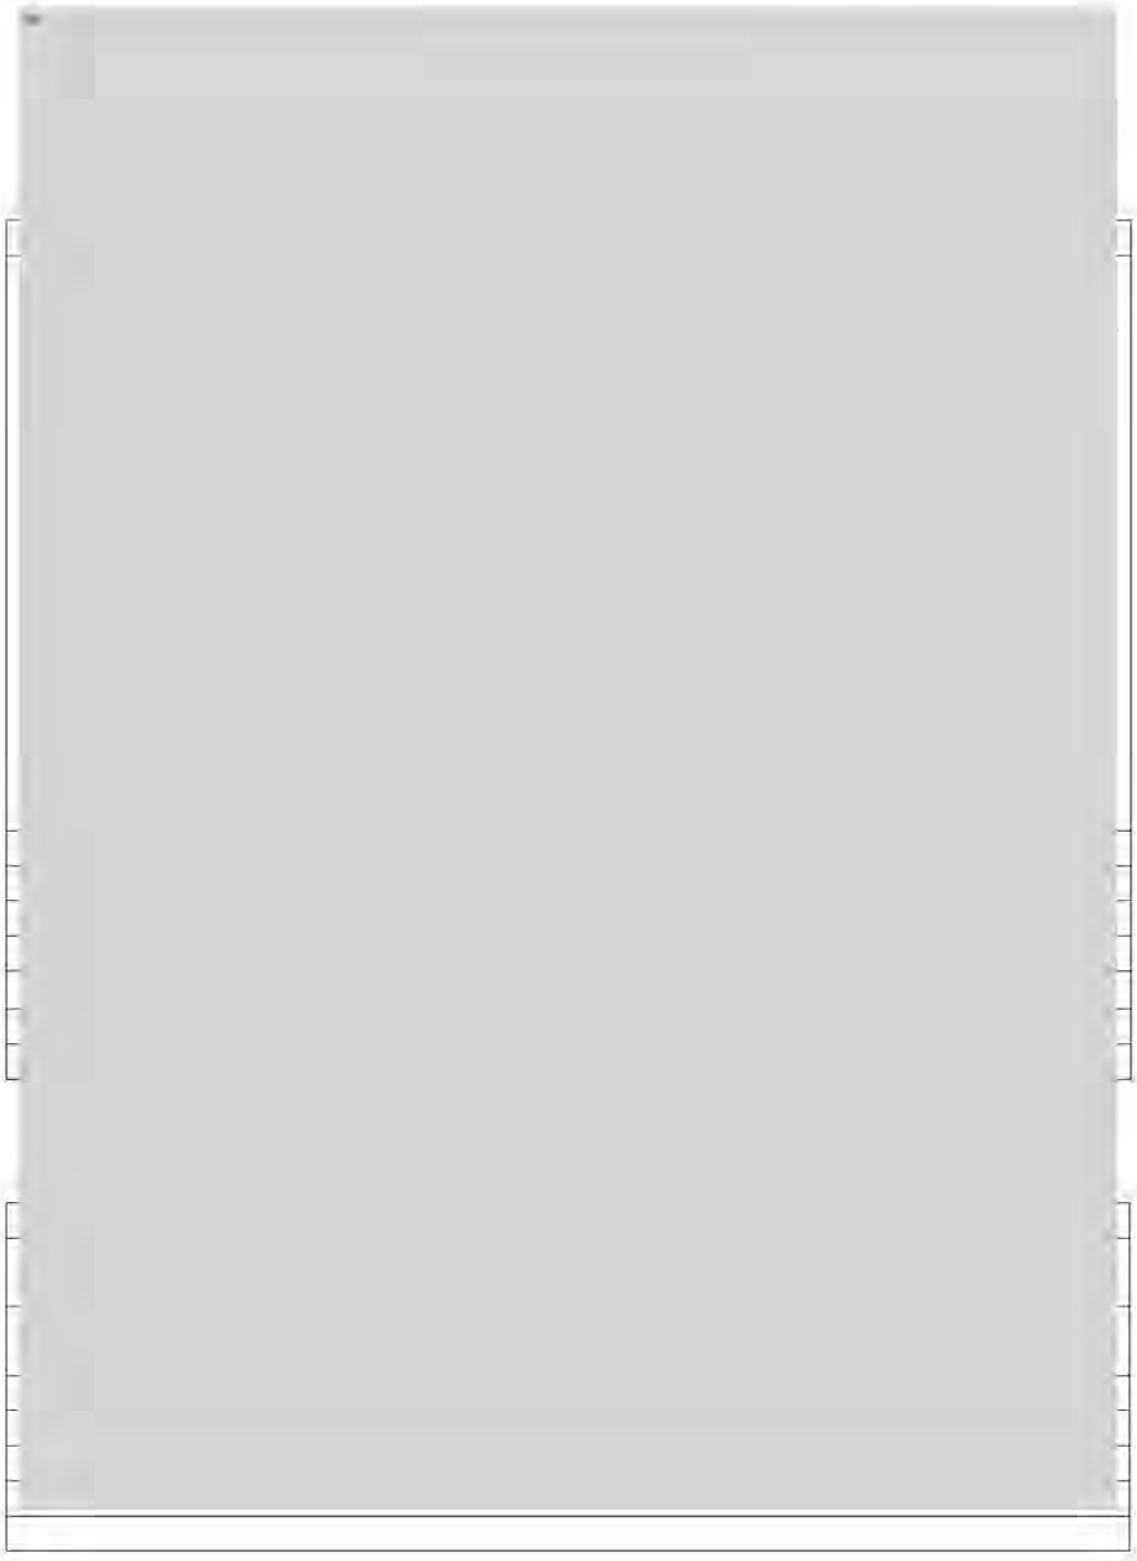

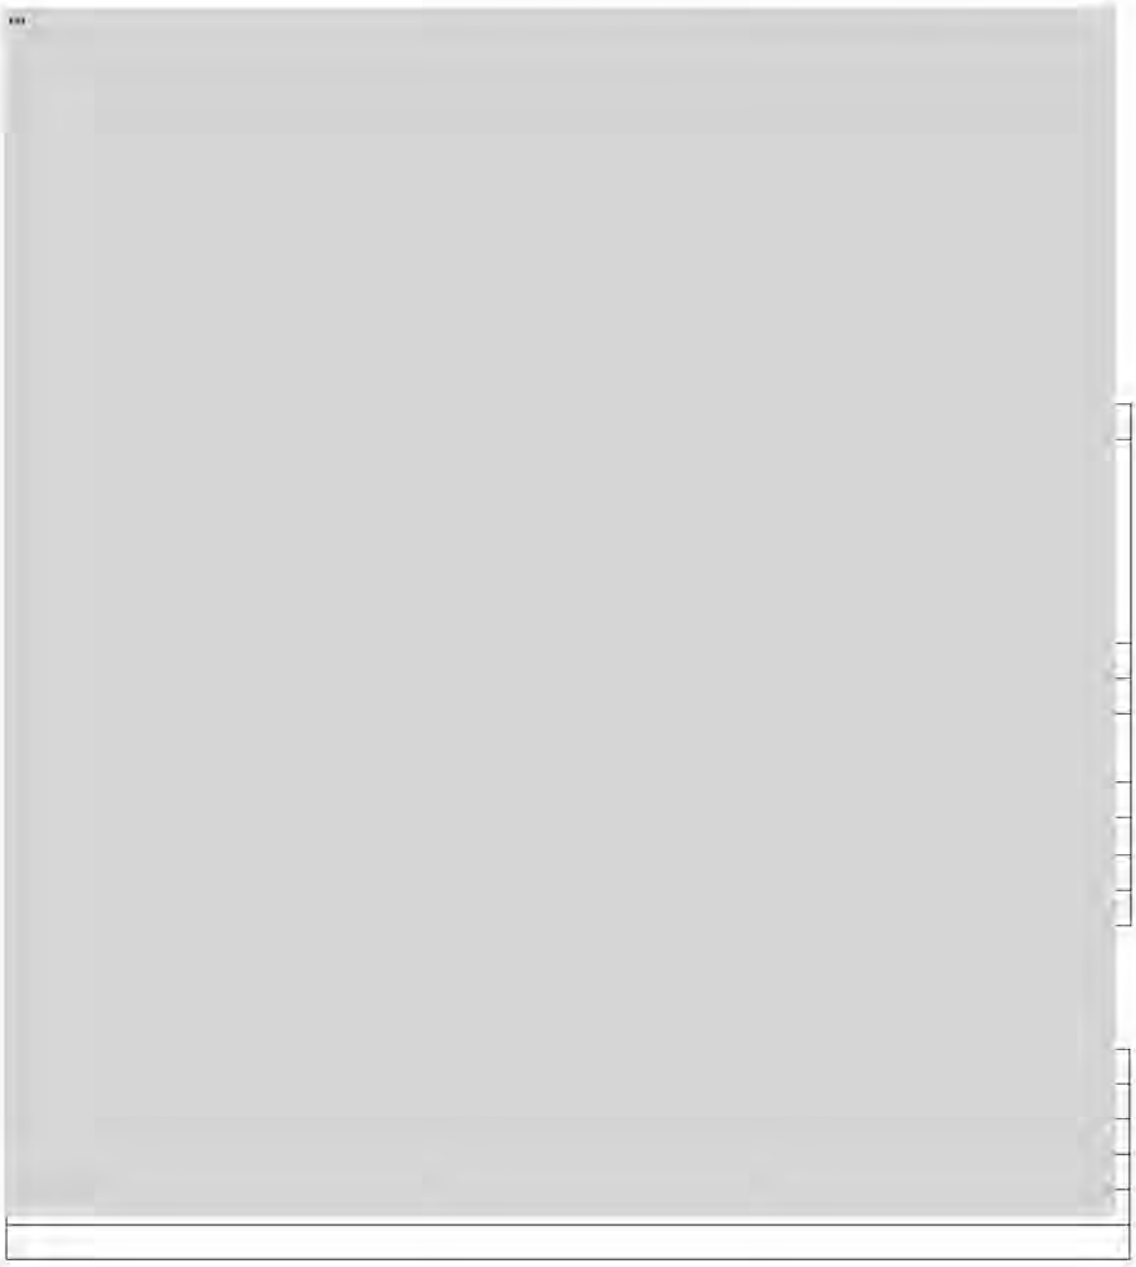

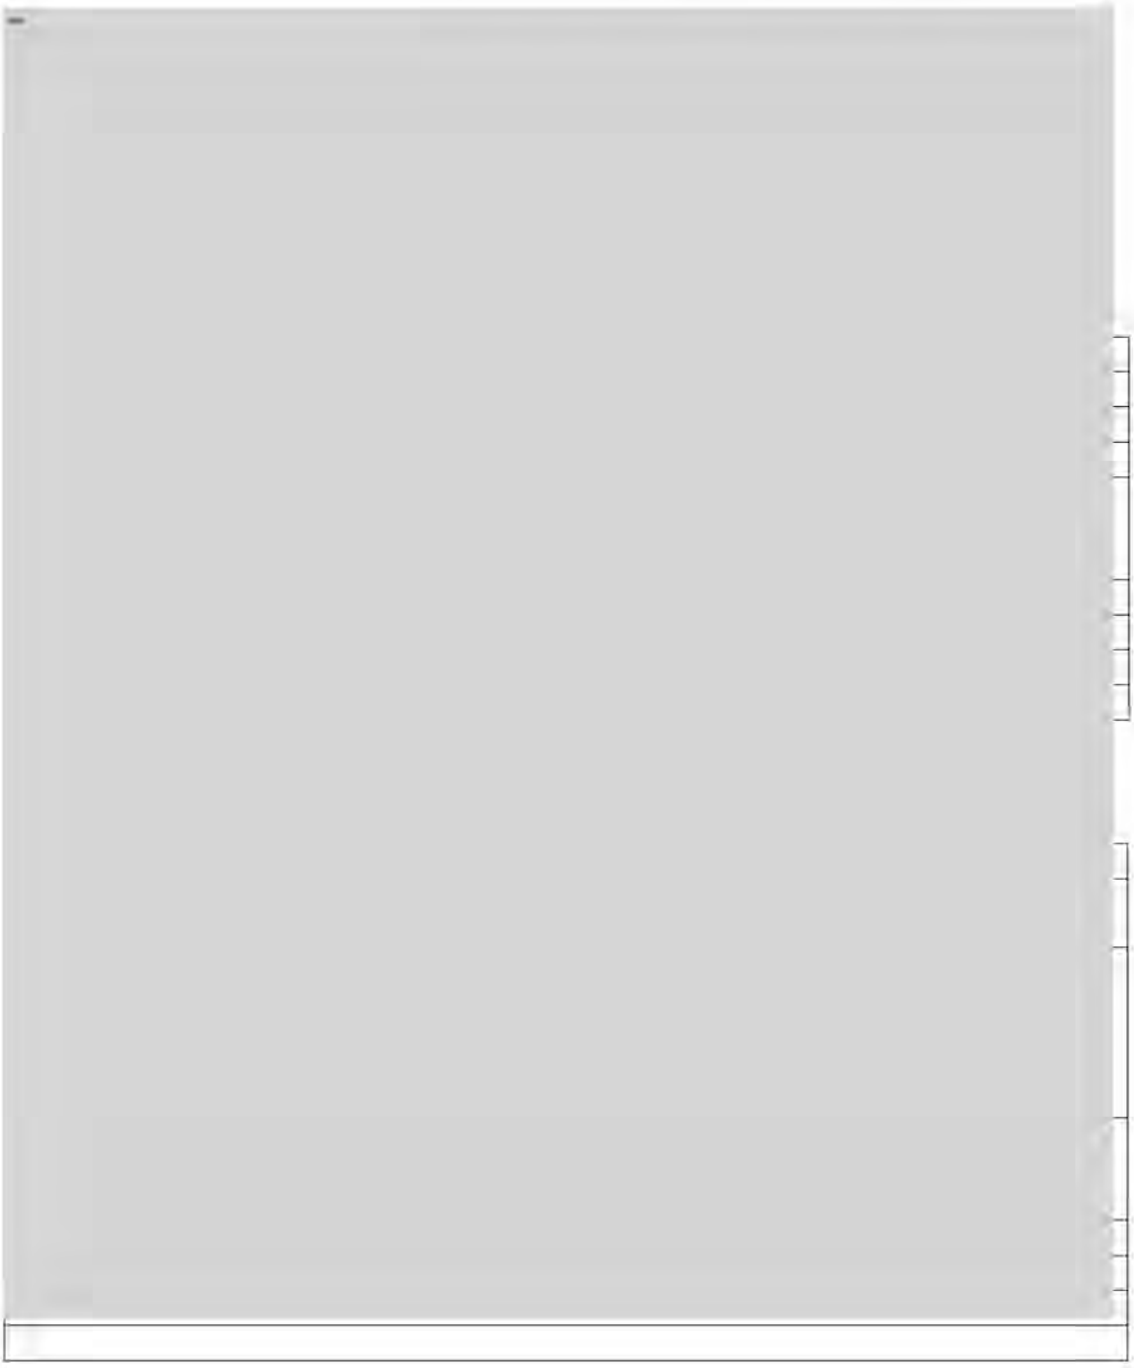

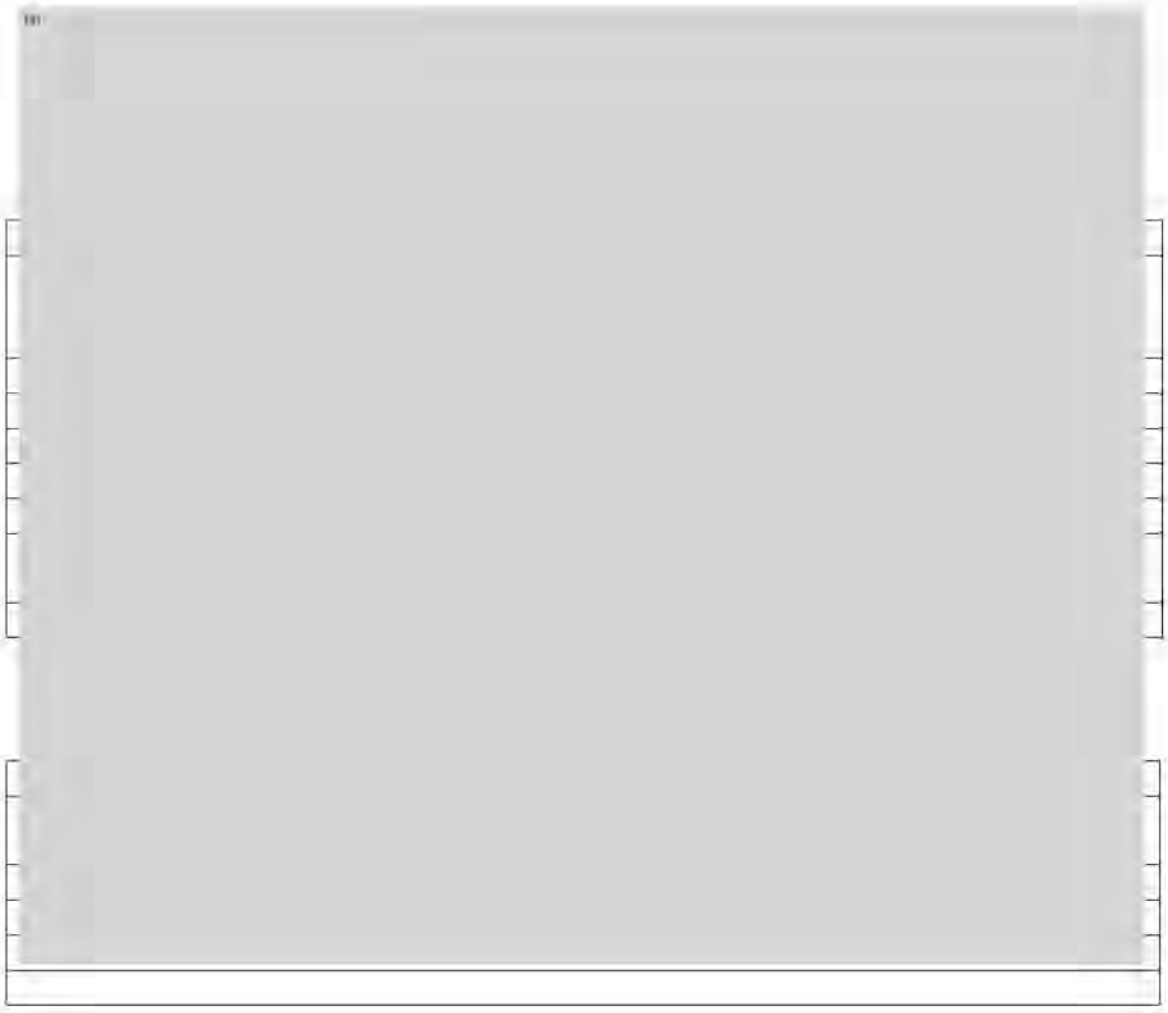

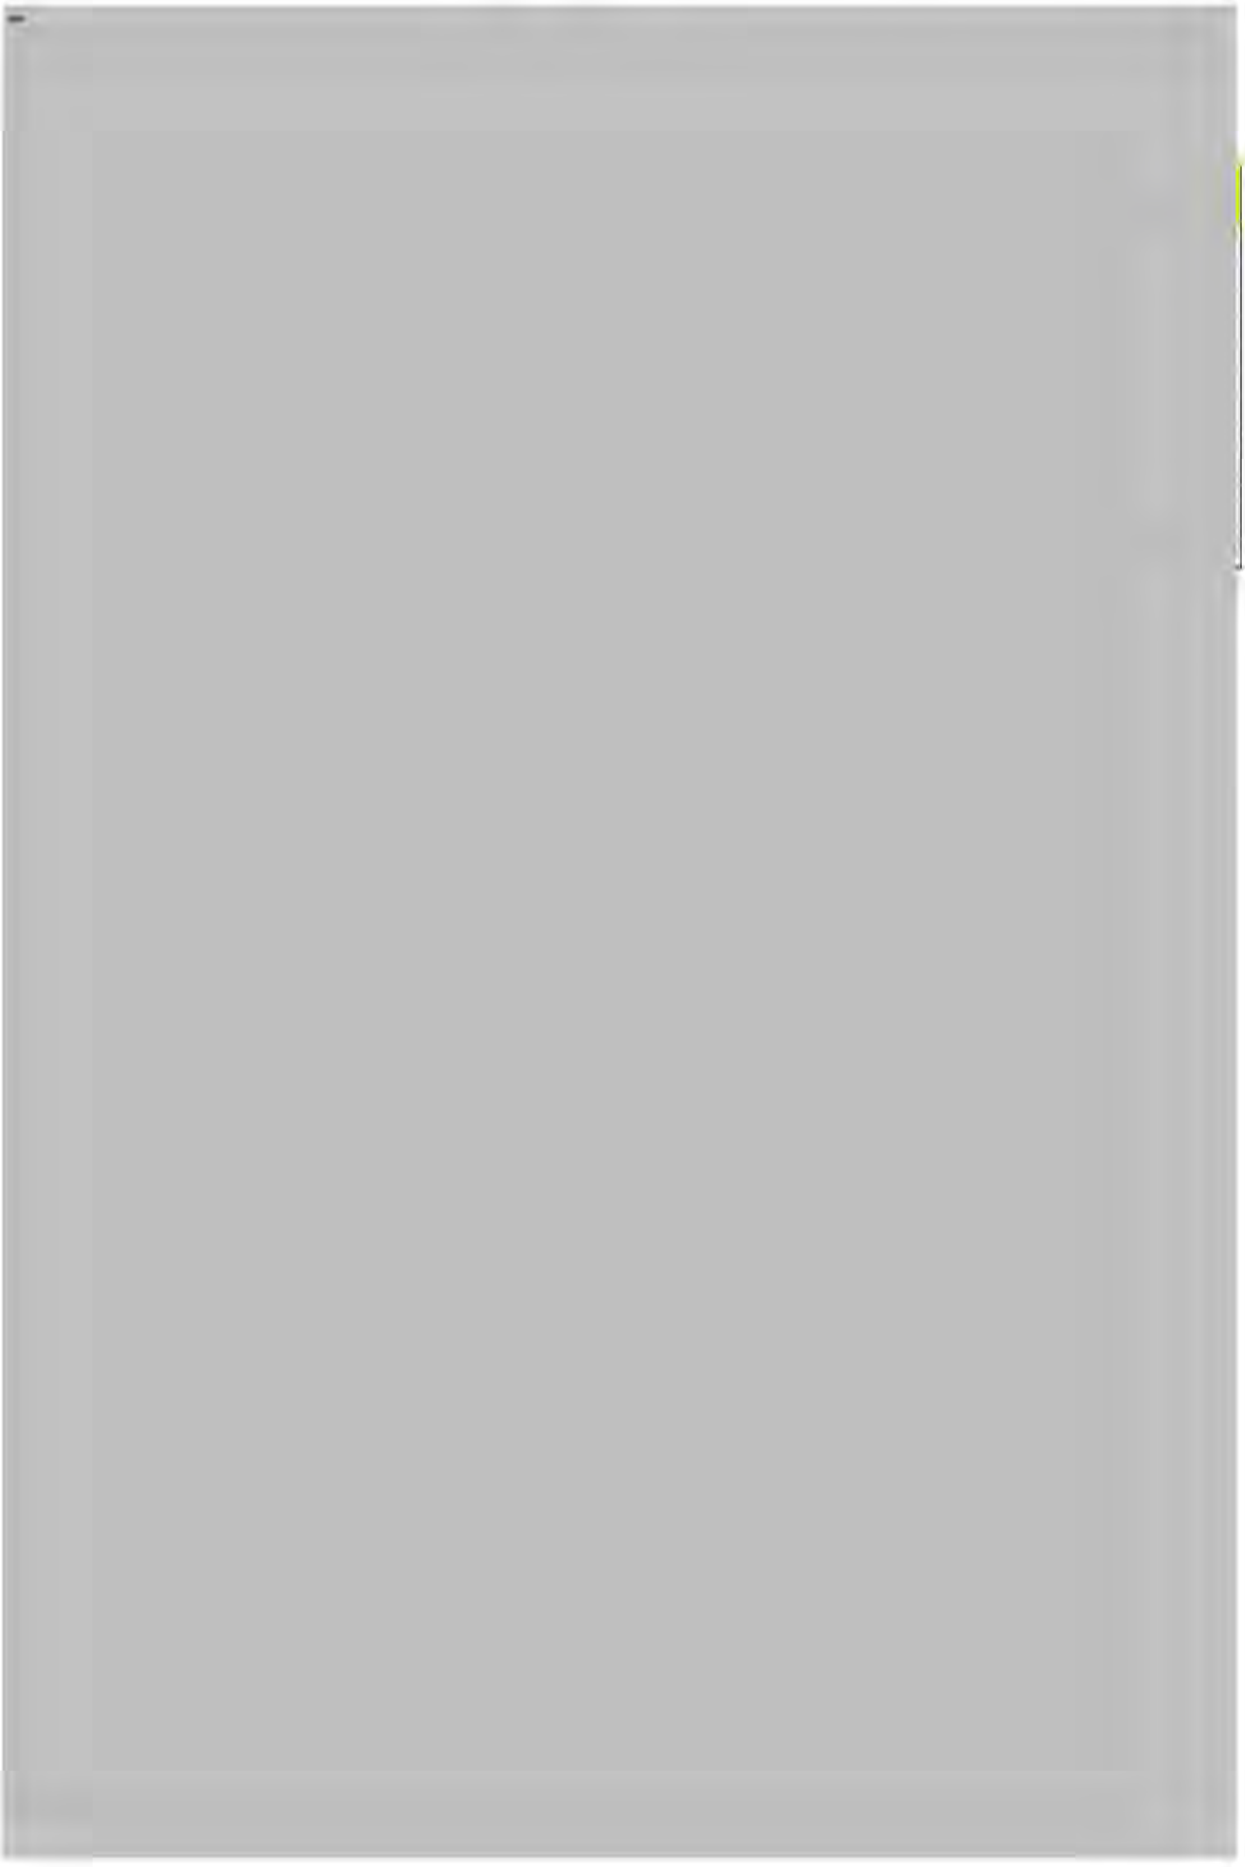

[redacted]

| | | |
|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 |
| 3.4 Bijdrage Prov. Zuid-Holland Molenvlietpark | pm. | pm. |

[redacted]

## 5.3 Planning

Zie de bijlage voor de ontwikkeling op de planningsmijlpalen.

### 5.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| | |
| Opstellen detailplanning 2e toevoer waterberging Molenvlietpark. | Dient nog plaats te vinden. |
| | |
| | |
| | |

### 5.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| |
| Planning 2e toevoer waterberging Molenvlietpark nader uitwerken |
| |

### 5.4.3 Financiële toprisico's

Er is een Monte Carlo analyse op de financiën uitgevoerd. De toprisico's zijn hieronder weergegeven. Inclusief de ontwikkelingen in de beheersing (indien van toepassing).

**Huidige toprisico's:**

| Rang | Omschrijving | Beheersing | Vorige rang |
|---|---|---|---|
| | BR | | |
| 3. | BP wijzigingen (Binckhorstlaan-zuid, Molenvlietpark) worden niet ongewijzigd vastgesteld, waardoor het aangeboden ontwerp niet past. | Risico is naar beneden bijgesteld. Vaststelling BP heeft wel een verzoek tot wijziging richting CRB tot gevolg. | 2 |
| | BR | | |

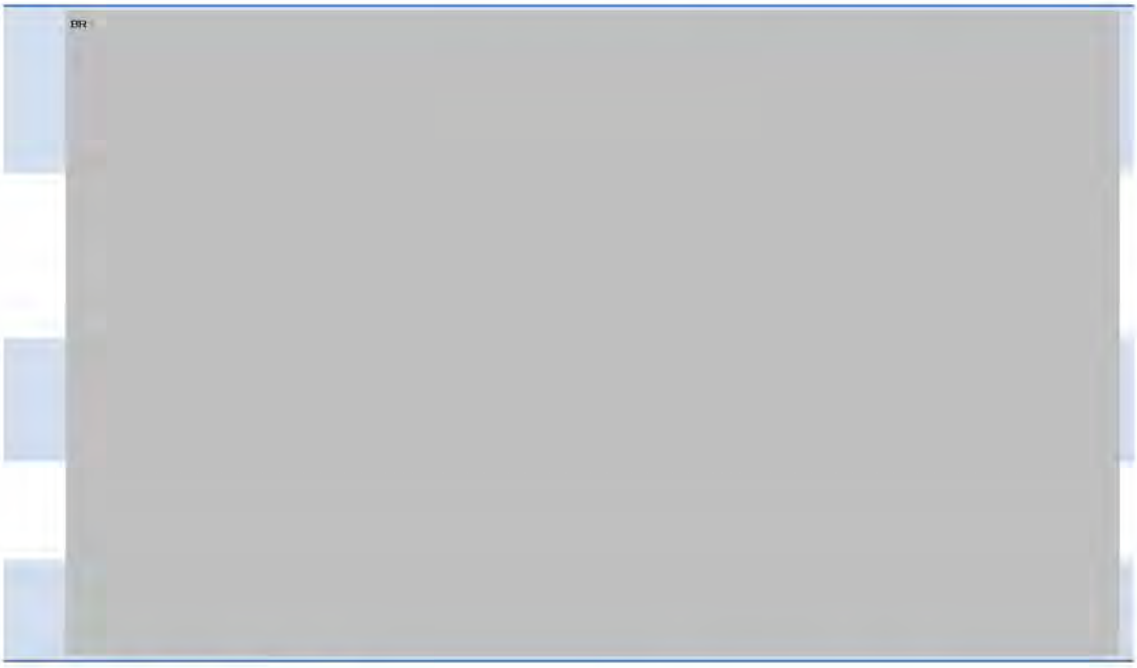

**Buiten de top gevallen risico's:**

| Risnr. | Omschrijving | Reden wegvallen uit top | Vorige rang |
|---|---|---|---|
| 549 | Vertraging/stagnatie aannemer vanwege vertragingen in Bestemmingsplanprocedures (Molenvlietpark e.o., wijziging Binckhorst) | Bestemmingsplannen zijn volgens planning vastgesteld, er heeft zich dus geen vertraging voorgedaan. | 7 |

### 5.4.4 Toprisico's planning

De toprisico's in de planning zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig kwartaal. In het komende kwartaal wordt weer een onzekerheidsanalyse op de planning uitgevoerd en zal onderstaande tabel geactualiseerd worden.

**Huidige toprisico's:**

| Rang | Omschrijving | Beheersing | Vorige rang |
|---|---|---|---|
| 2 | O.b.v. zienswijze BP Molenvlietpark e.o. wordt beroep aangetekend met schorsende werking. | | Buiten top |



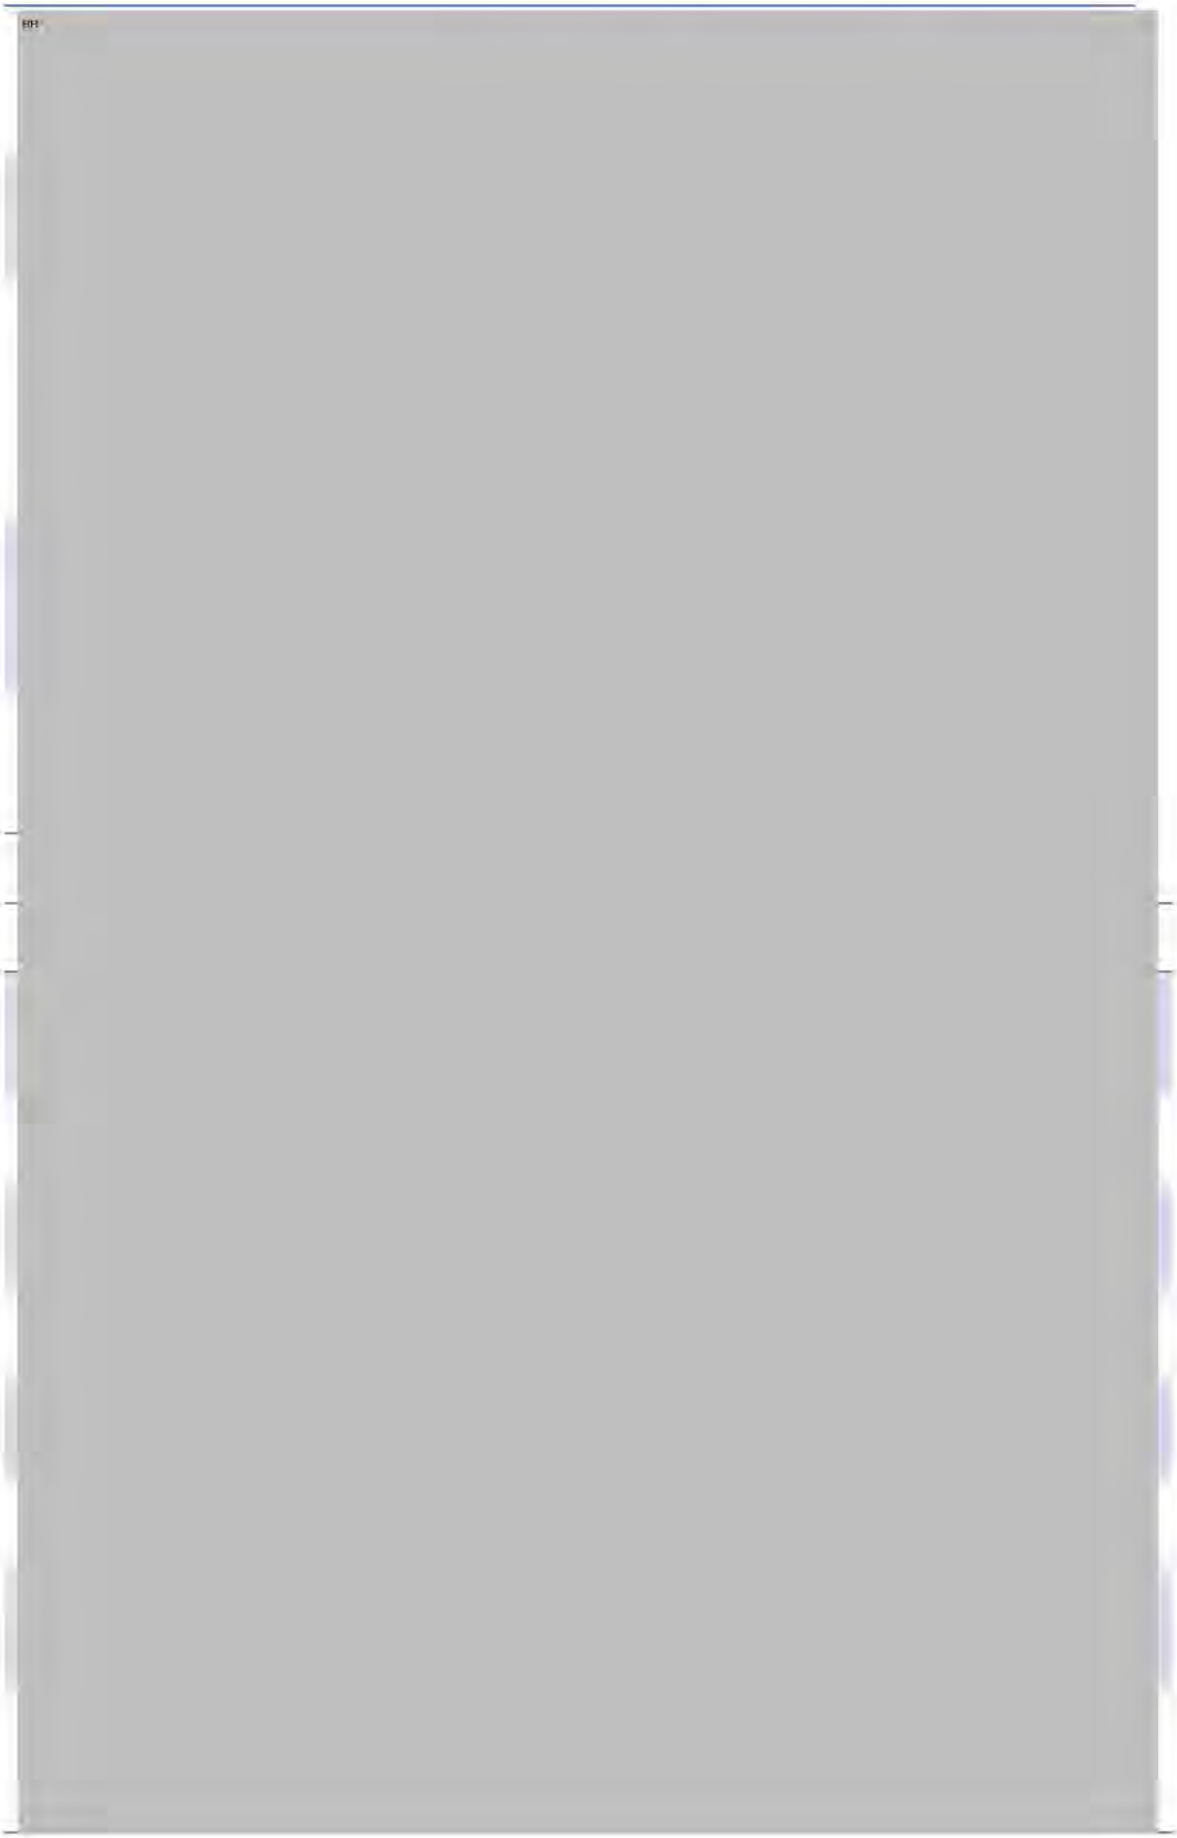

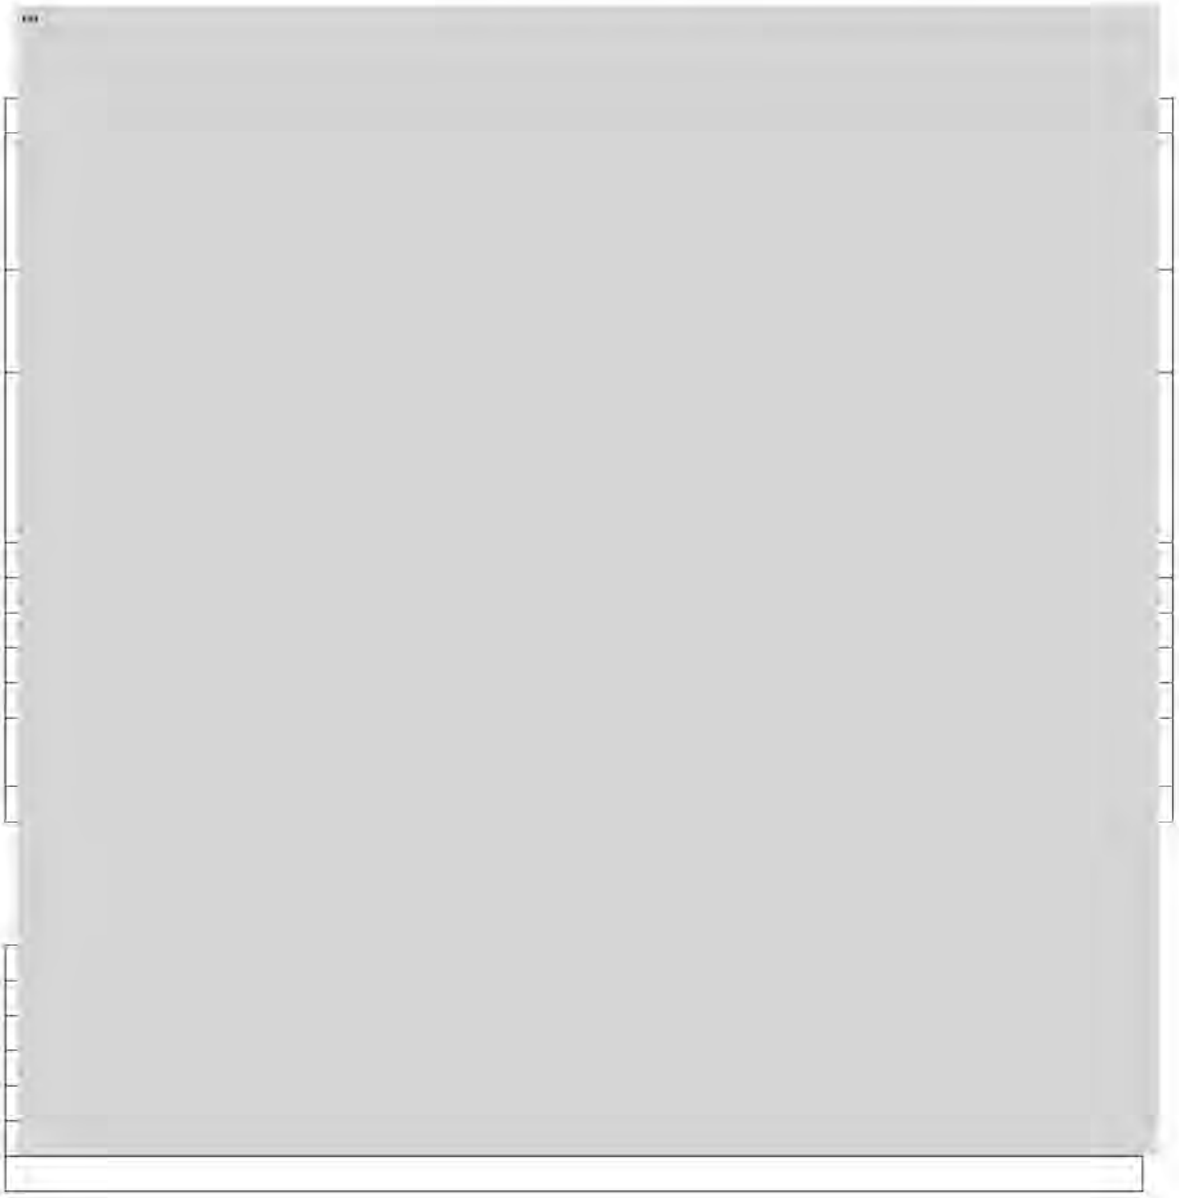

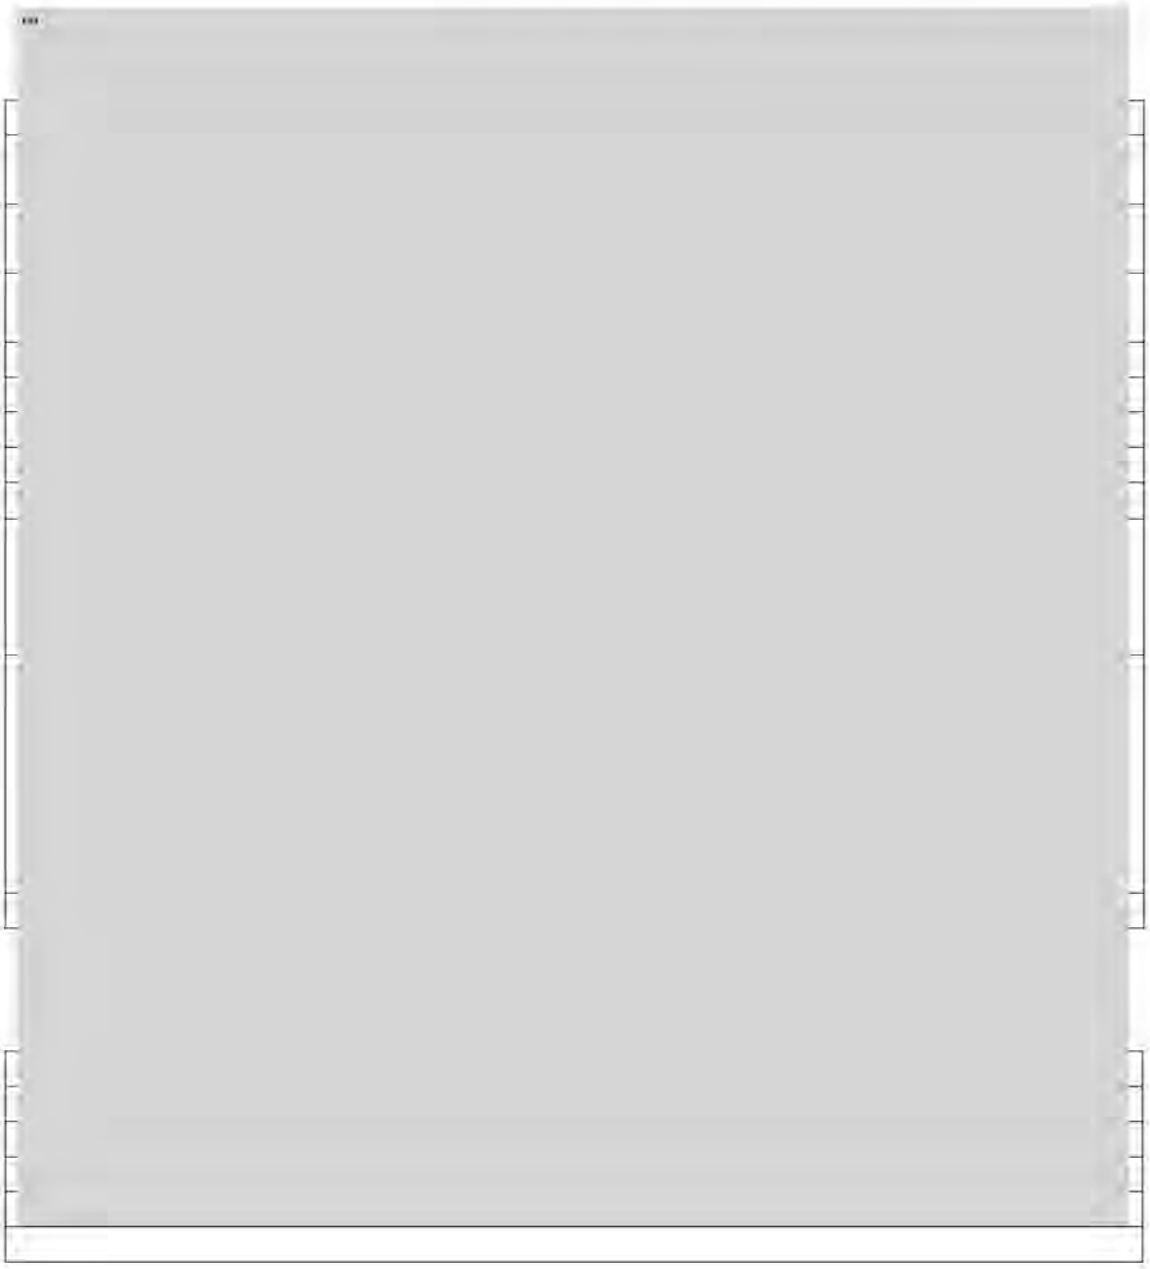

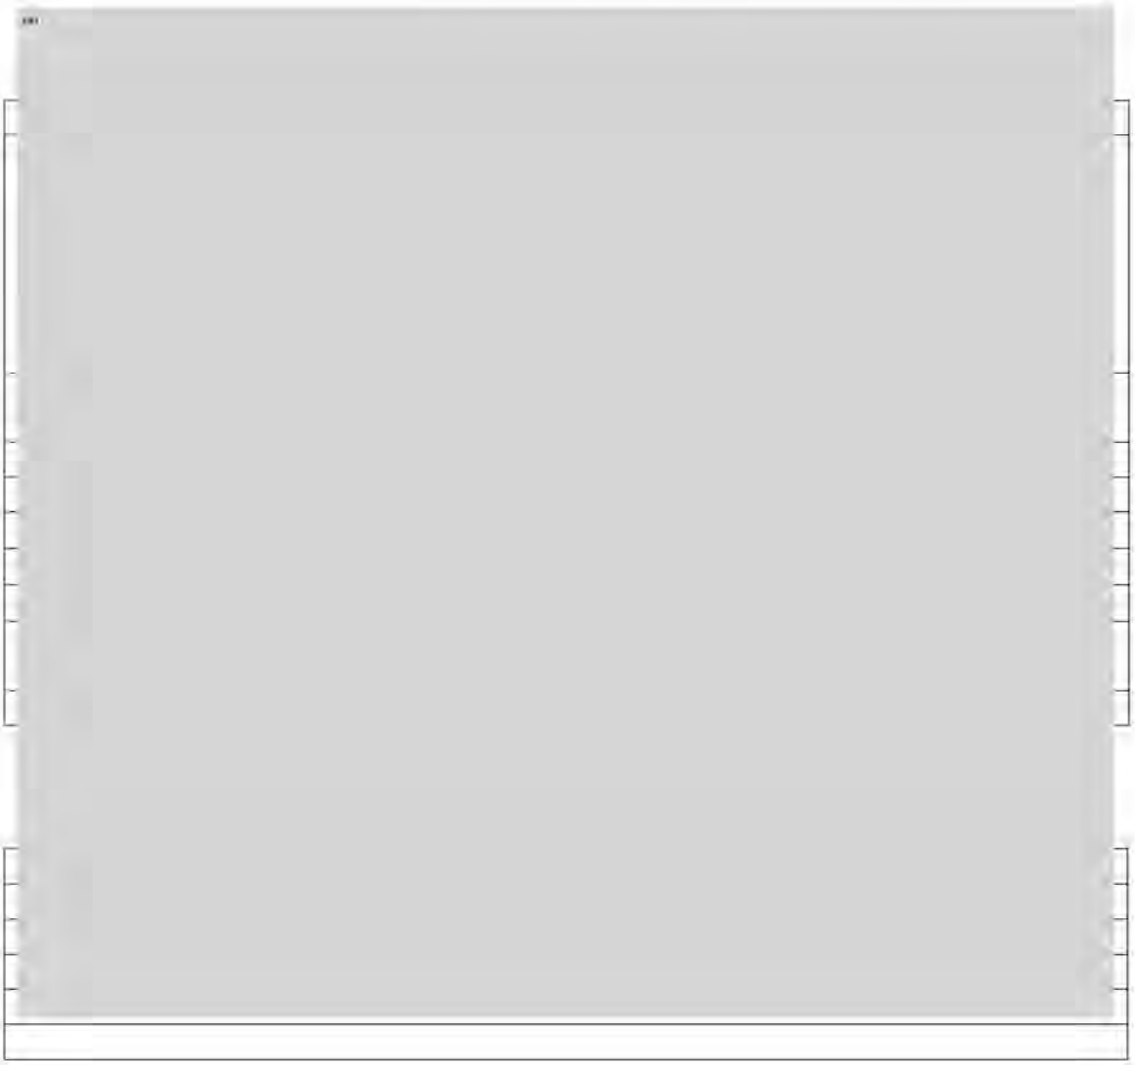

# 6. Bijlage: Planningsmijlpalen

## Overzicht planningsmijlpalen

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM CONTRACT | VERWACHTING KW 1-2016 | VERSCHIL (weken) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 13 | Molenvlietpark gereed | 25-nov-19 | 25-nov-19 | 0 | Geen bijzonderheden in 1e kwartaal. |
| BR | | | | | |

## Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen binnen het projectgebied

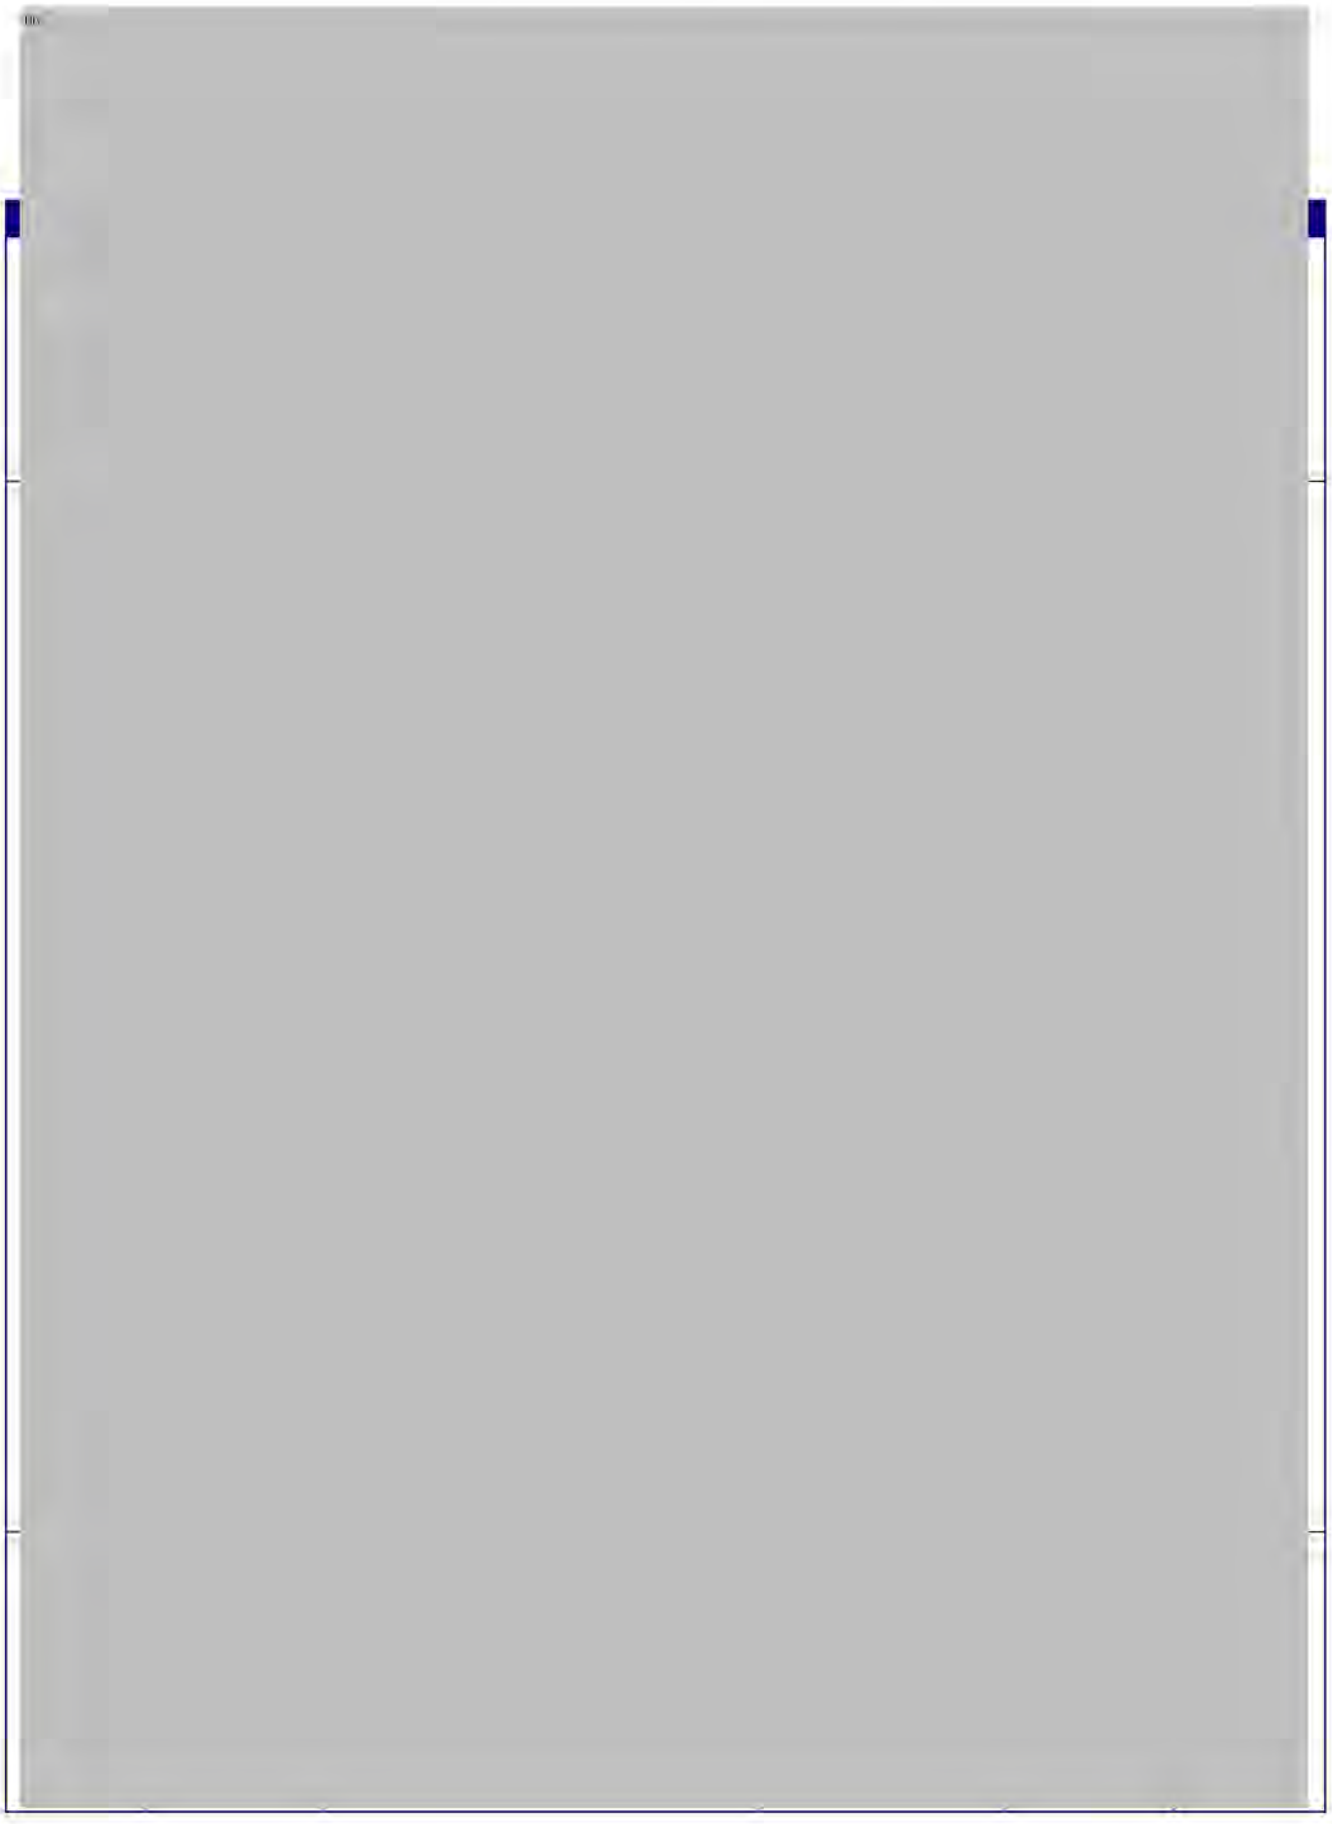

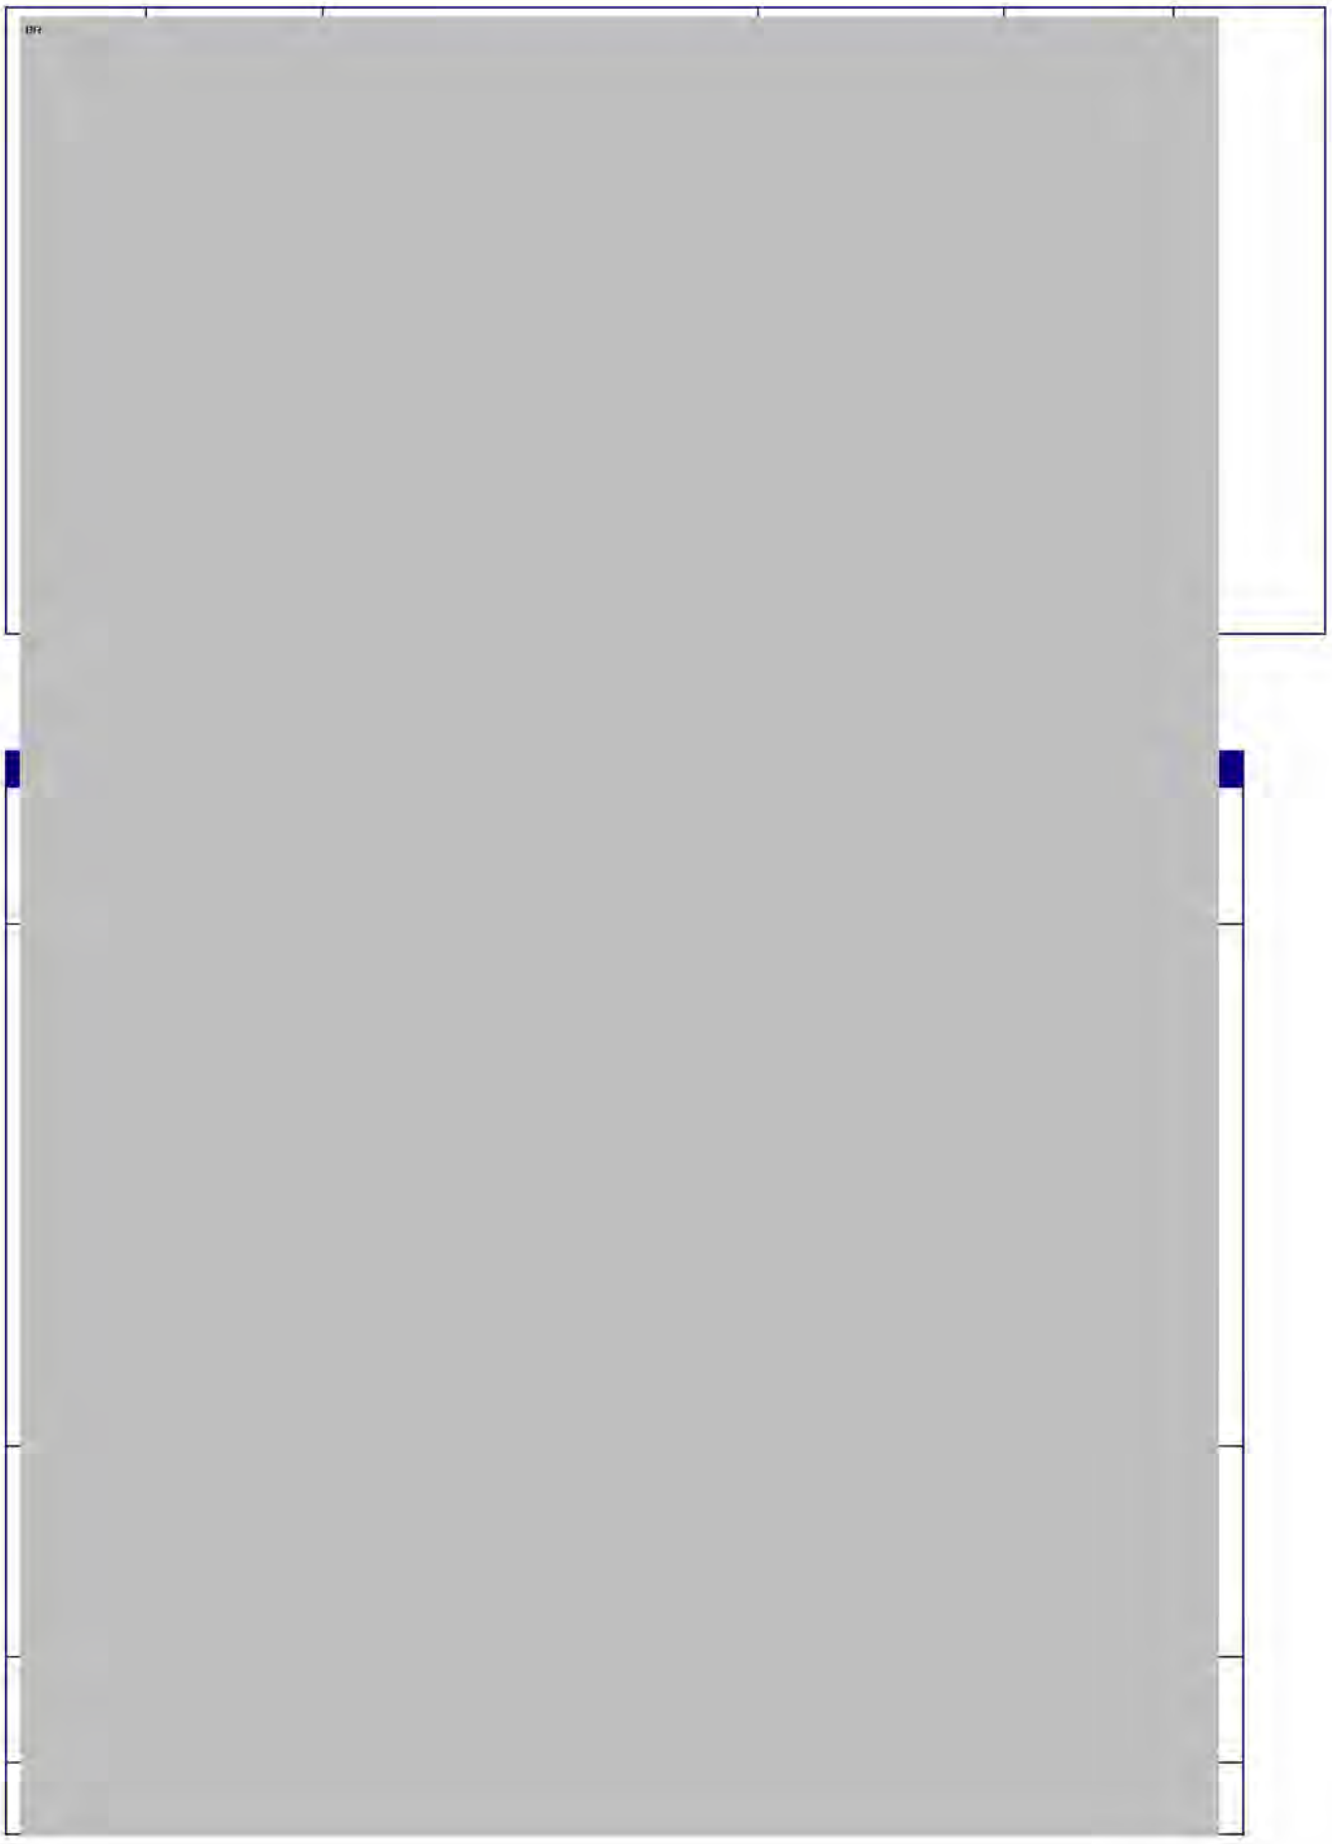

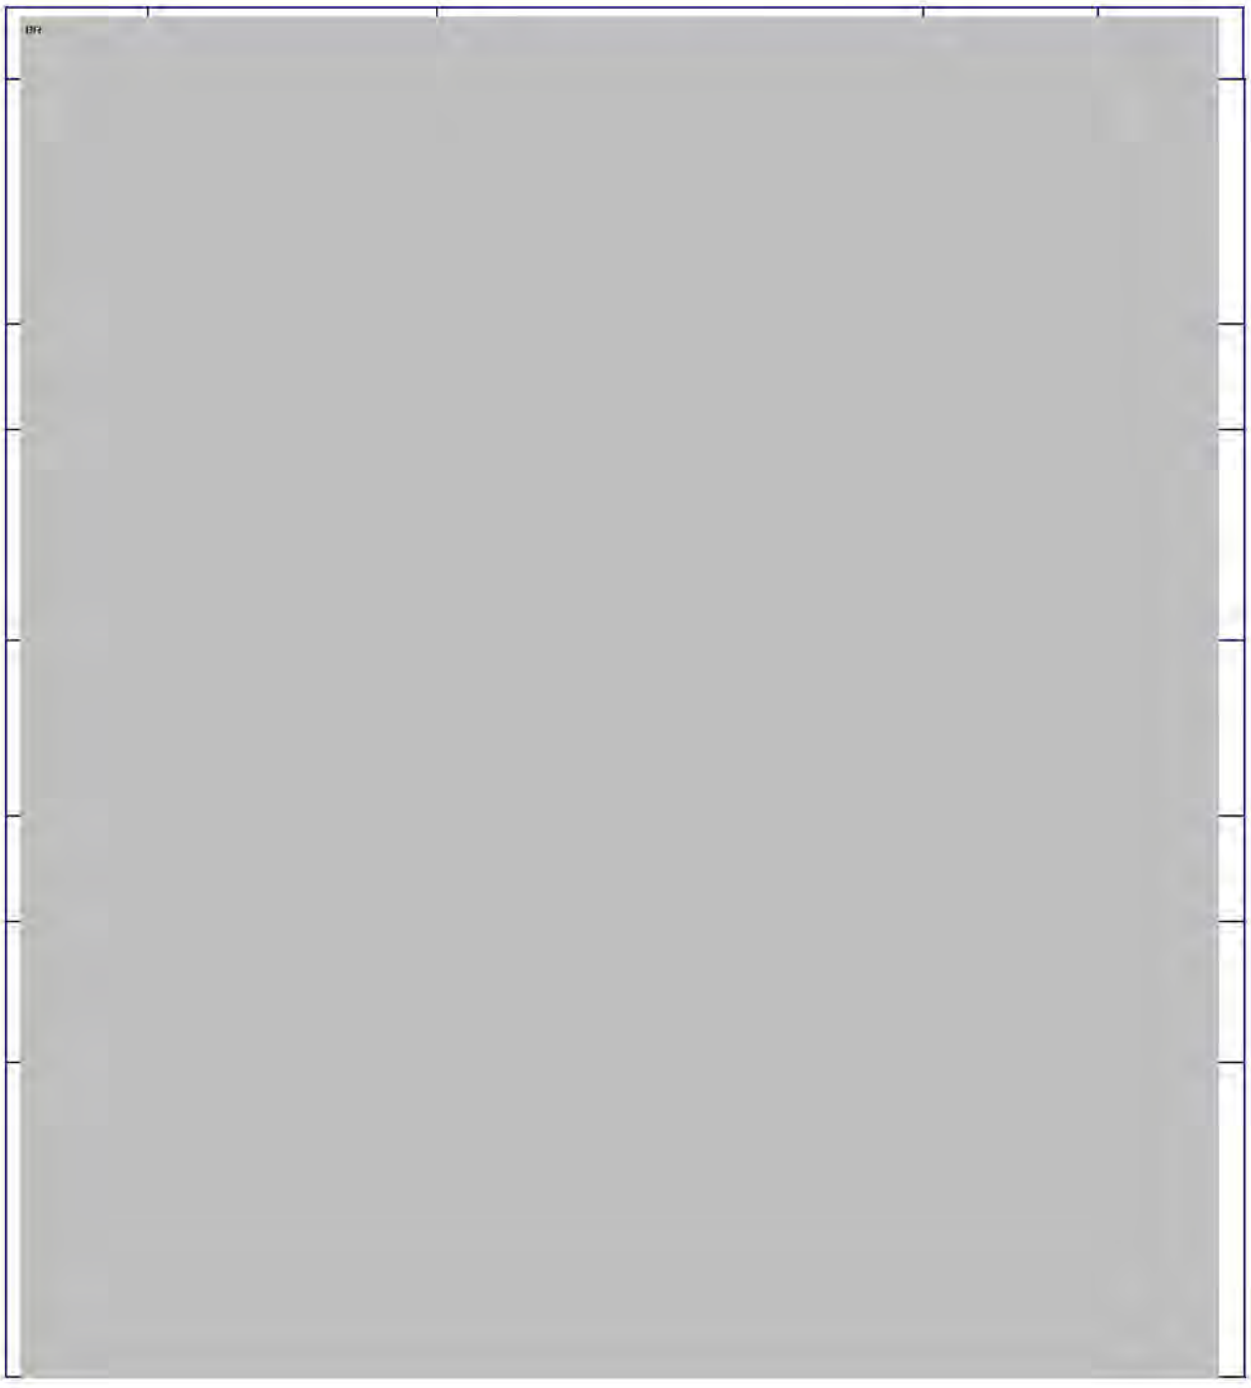

Docnr10

Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan, 1e kwartaal 2016

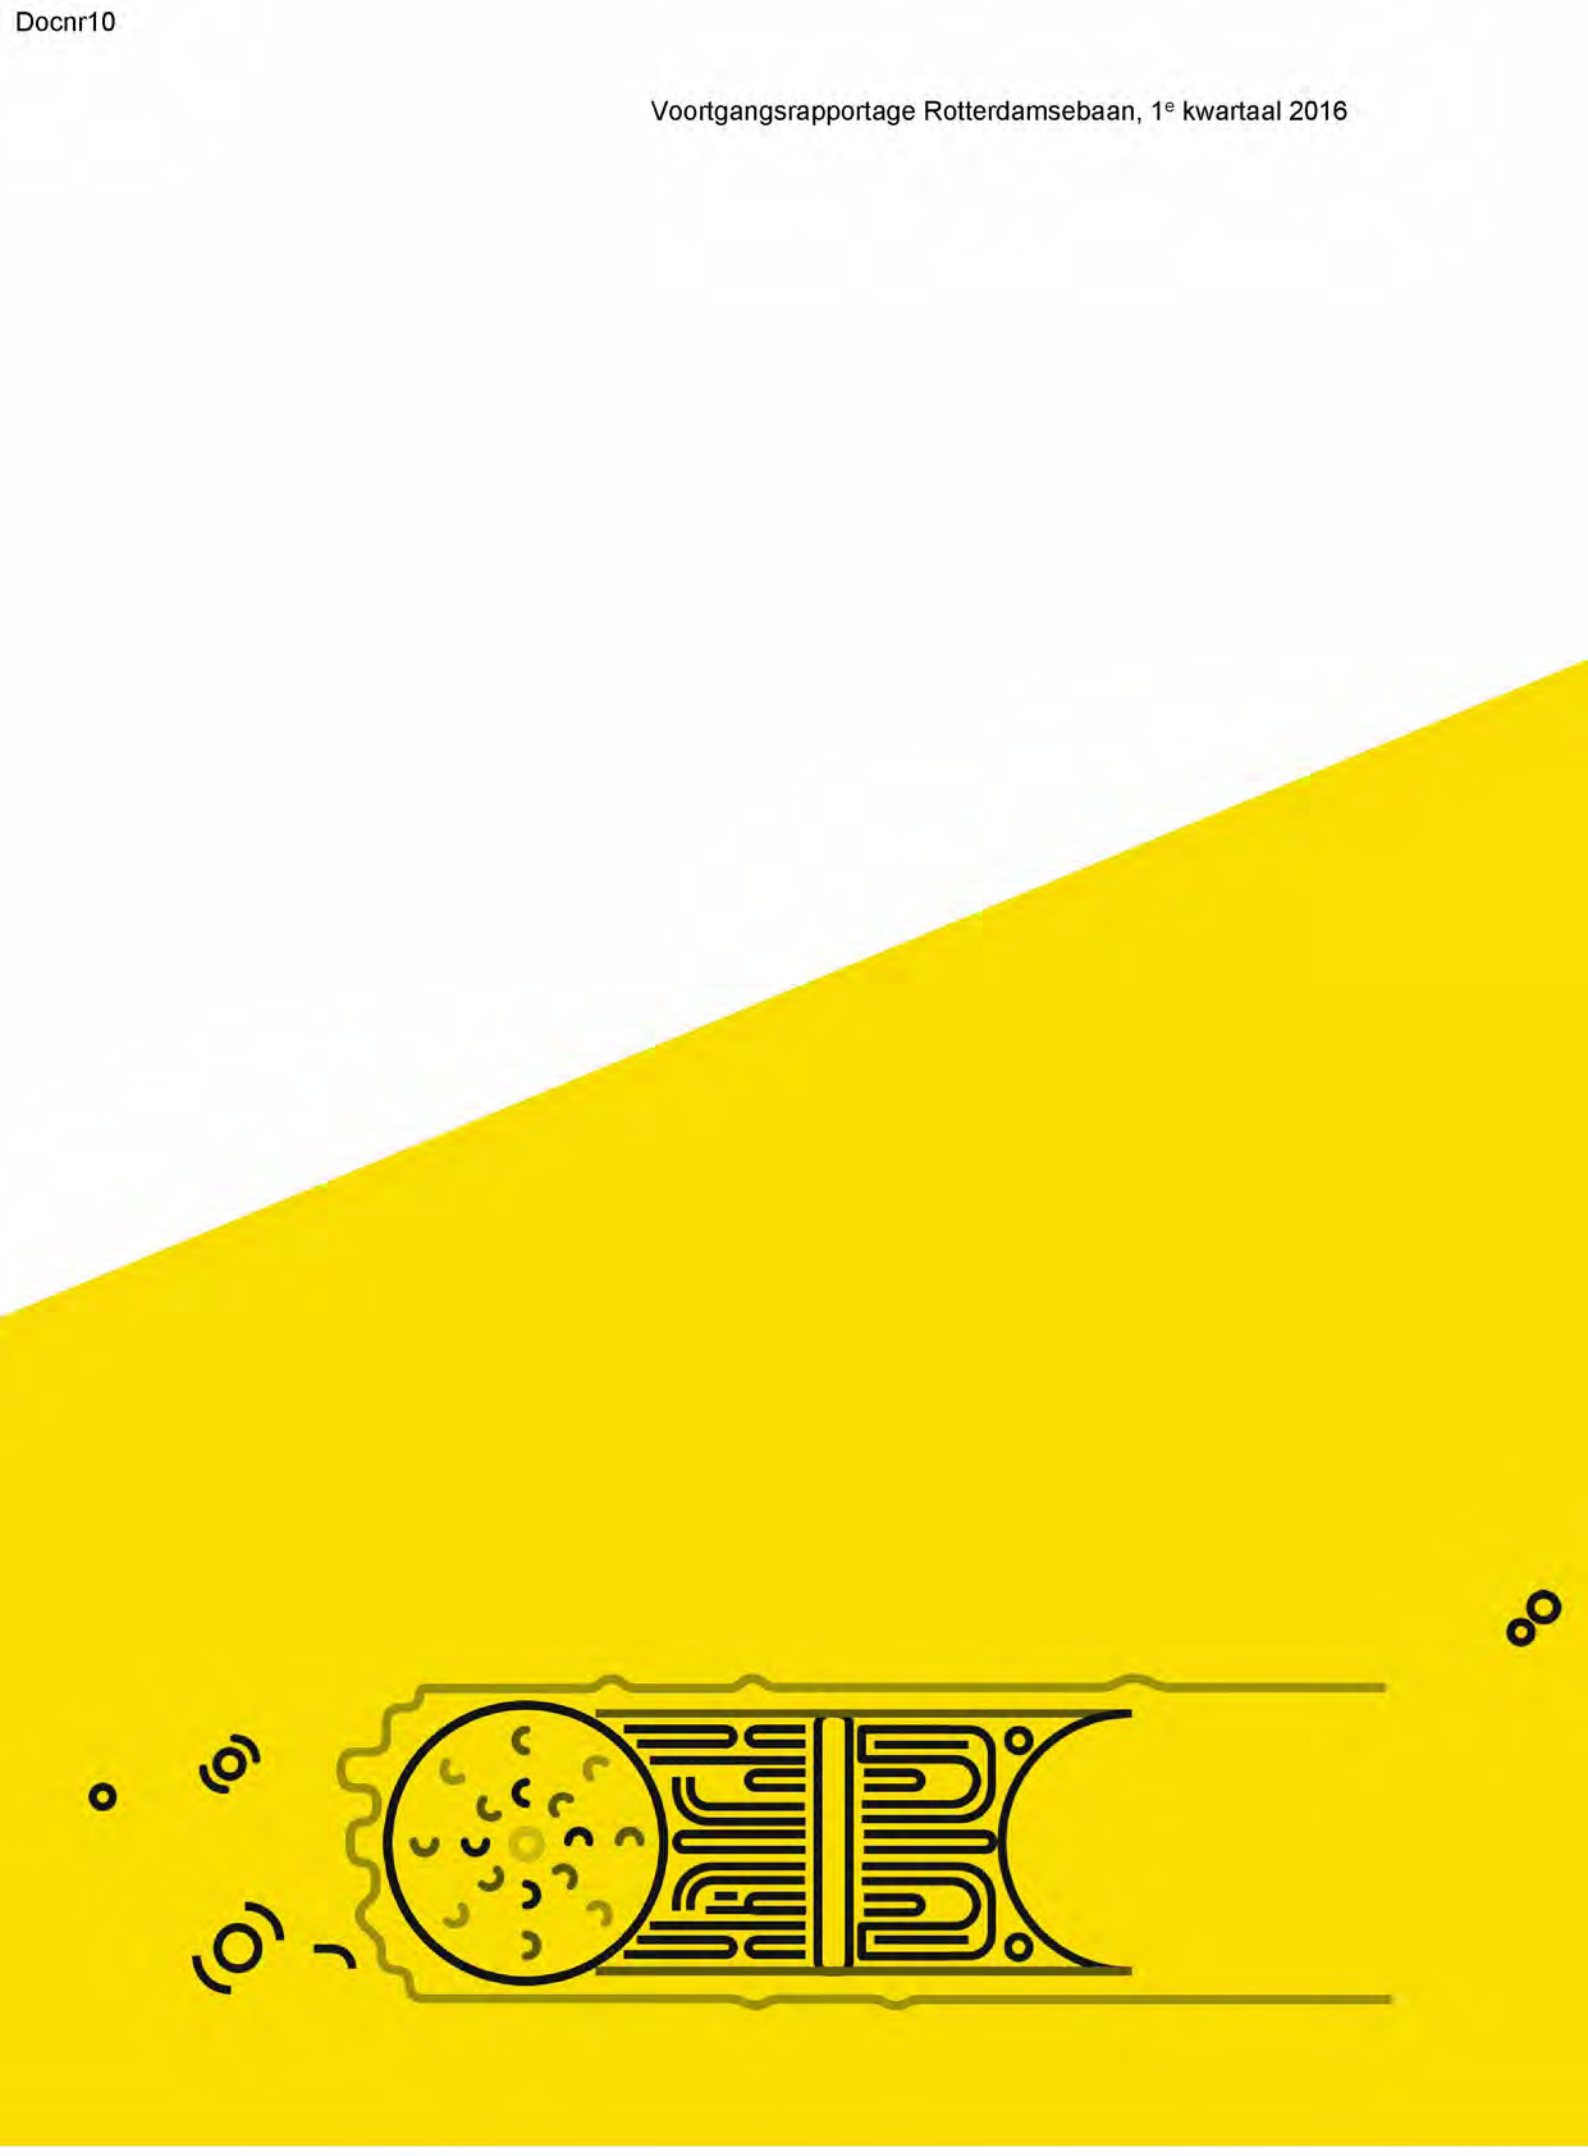

Docnr11

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 2e kwartaal 2016

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 11 augustus 2016**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

Docnr11

Docnr11



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 2e kwartaal 2016
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004356

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd:** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>20 juli 2016 | Versie 0.1<br>25 juli 2016 | Versie 1.0<br>3 augustus 2016 | Versie 2.0<br>11 augustus 2016 | Versie 2.0<br>1 september2016 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder BSKB / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr11



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

*1.1 Projectgegevens* 5

*1.2 Algemeen* 5

*1.3 Toelichting beheersmaatregelen* 5

*1.4 Terugblik afgelopen kwartaal* 6

*1.5 Verwachting komende kwartaal* 6

*1.6 Financien* 6

*1.7 Planning* 6

*1.8 Risico's* 7

*1.9 Bestuurlijke besluitvorming komende periode* 7

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* 8
2.1.1 Afgelopen kwartaal 8
2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie* 10
2.2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2.2 Komende kwartaal 10

*2.3 Vergunningen* 11
2.3.1 Afgelopen kwartaal 11
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Verwervingen* 12
2.4.1 Afgelopen kwartaal 12
2.4.2 Komende kwartaal 12

*2.5 Overeenkomsten* 13
2.5.1 Afgelopen kwartaal 13
2.5.2 Komende kwartaal 13

*2.6 Communicatie* 14
2.6.1 Afgelopen kwartaal 14
2.6.2 Komende kwartaal 15
2.6.3 Diversen 15

3 Projectvoortgang 16

*3.1 Aanbesteden en contracteren* 16
3.1.1 Afgelopen kwartaal 16
3.1.2 Komende kwartaal 16

*3.2 Vormgeving* 18
3.2.1 Afgelopen kwartaal 18
3.2.2 Komende kwartaal 18

*3.3 Monitoring* 19
3.3.1 Afgelopen kwartaal 19

Docnr11



3.3.2 Komende kwartaal 19

*3.4 Inpassing Binckhorst* *20*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 20
3.4.2 Komende kwartaal 21

*3.5 Inpassing Vlietzone en Laan van Hoornwijck* *22*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 22
3.5.2 Komende kwartaal 23

*3.6 Boortunnel en toeritten* *24*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 24
3.6.2 Komende kwartaal 24

*3.7 Verdiepte ligging Ypenburg* *26*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 26
3.7.2 Komende kwartaal 27

*3.8 Installaties* *28*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 28
3.8.2 Komende kwartaal 28

*3.9 Veiligheid en gezondheid* *29*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 29
3.9.2 Komende kwartaal 29

*3.10 Uitvoeringskwaliteit* *30*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 30
3.10.2 Komende kwartaal 30

*3.11 Contractmanagement* *31*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 31
3.11.2 Komende kwartaal 31

4 Overdracht en openstelling 32

*4.1 Tunnelveiligheid* *32*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 32
4.1.2 Komende kwartaal 32

*4.2 Overdracht aan beheerders* *33*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 33
4.2.2 Komende kwartaal 33

*4.3 Beheer en onderhoud* *34*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 34
4.3.2 Komende kwartaal 34

5 Projectbeheersing 35

*5.1 Scope* *35*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 35
5.1.2 Komende kwartaal 35

*5.2 Financien* *36*
5.2.1 Kostenstructuur 36
5.2.2 Dekkingen 36

*5.3 Planning* *39*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 39

Docnr11



5.3.2 Komende kwartaal 39

*5.4 Risico's* *40*

5.4.1 Afgelopen kwartaal 40

5.4.2 Komende kwartaal 40

5.4.3 Financiële toprisico's 40

5.4.4 Toprisico's planning 42

*5.5 Interne kwaliteit* *44*

5.5.1 Afgelopen kwartaal 44

5.5.2 Komende kwartaal 44

*5.6 Informatie* *45*

5.6.1 Afgelopen kwartaal 45

5.6.2 Komende kwartaal 45

*5.7 Organisatie* *46*

5.7.1 Afgelopen kwartaal 46

5.7.2 Komende kwartaal 46

**6 Bijlage: Planningsmijlpalen 47**

**7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 48**

**8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 50**

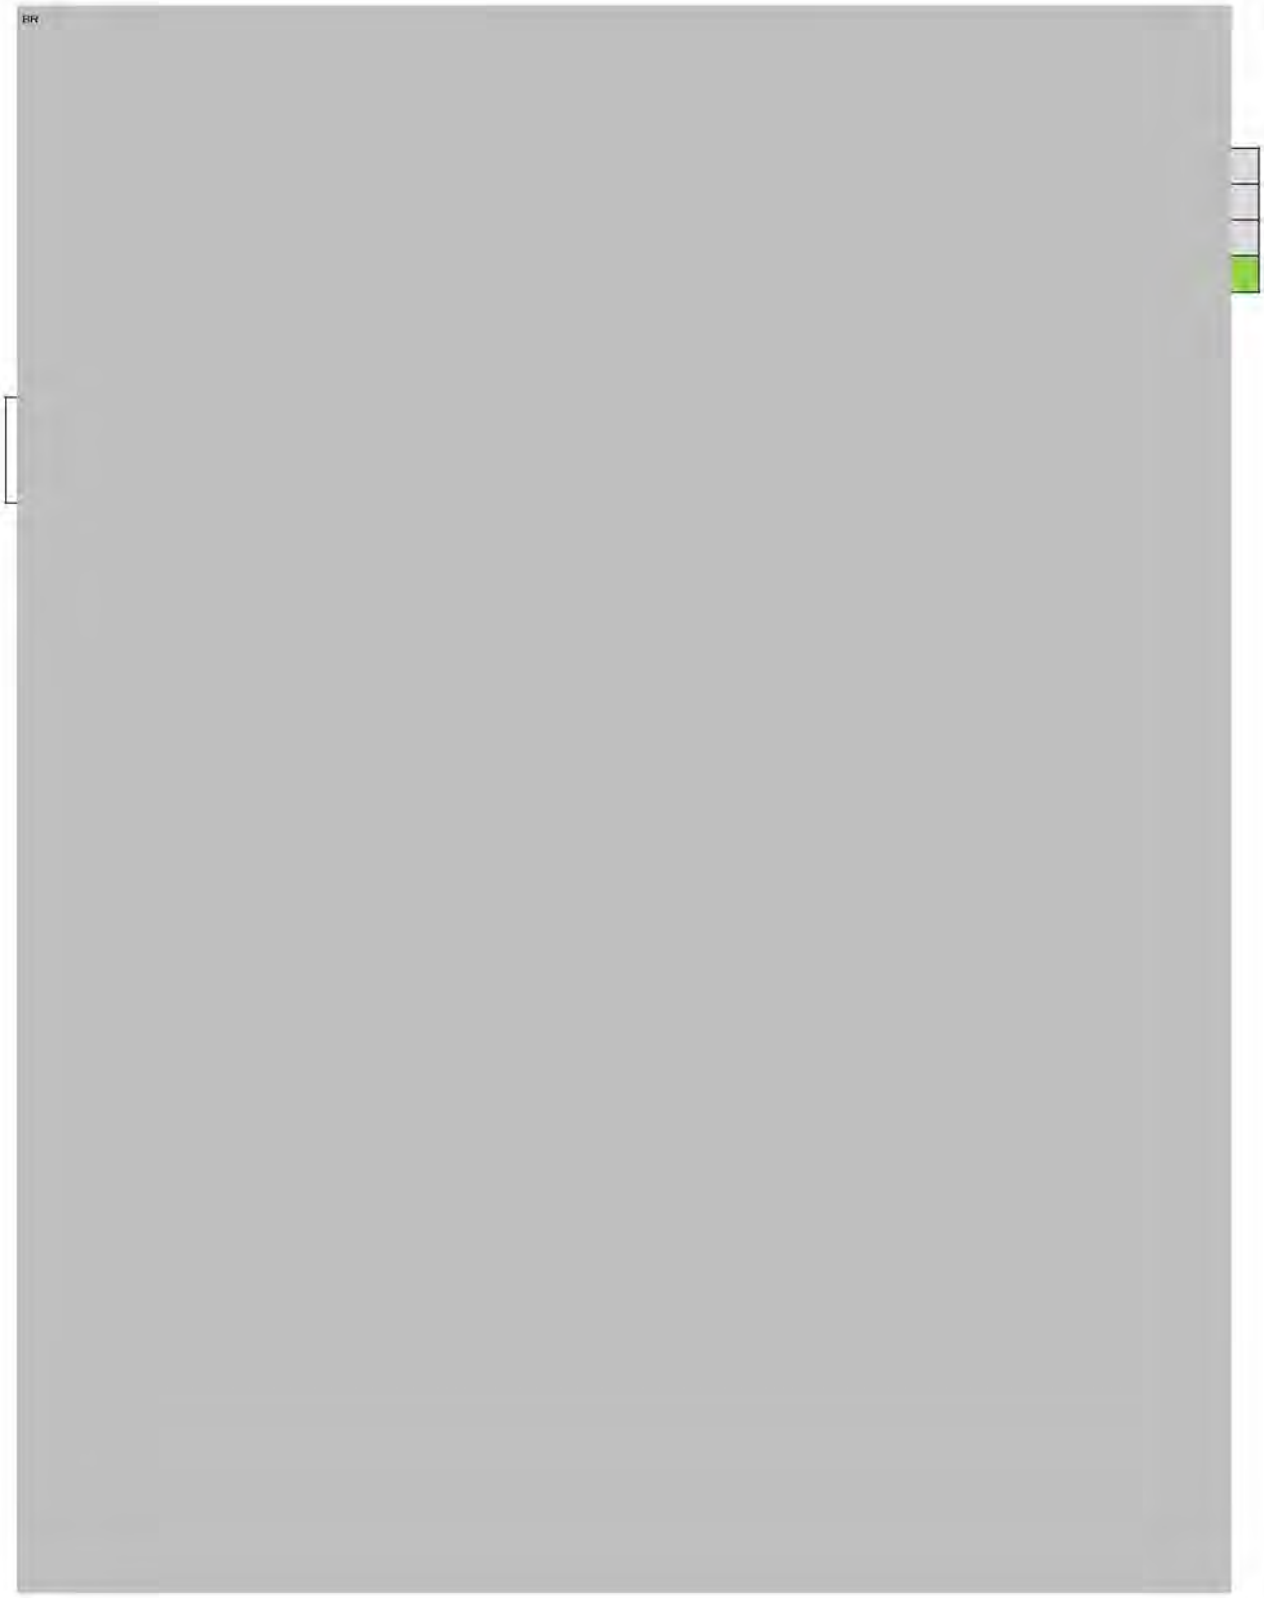

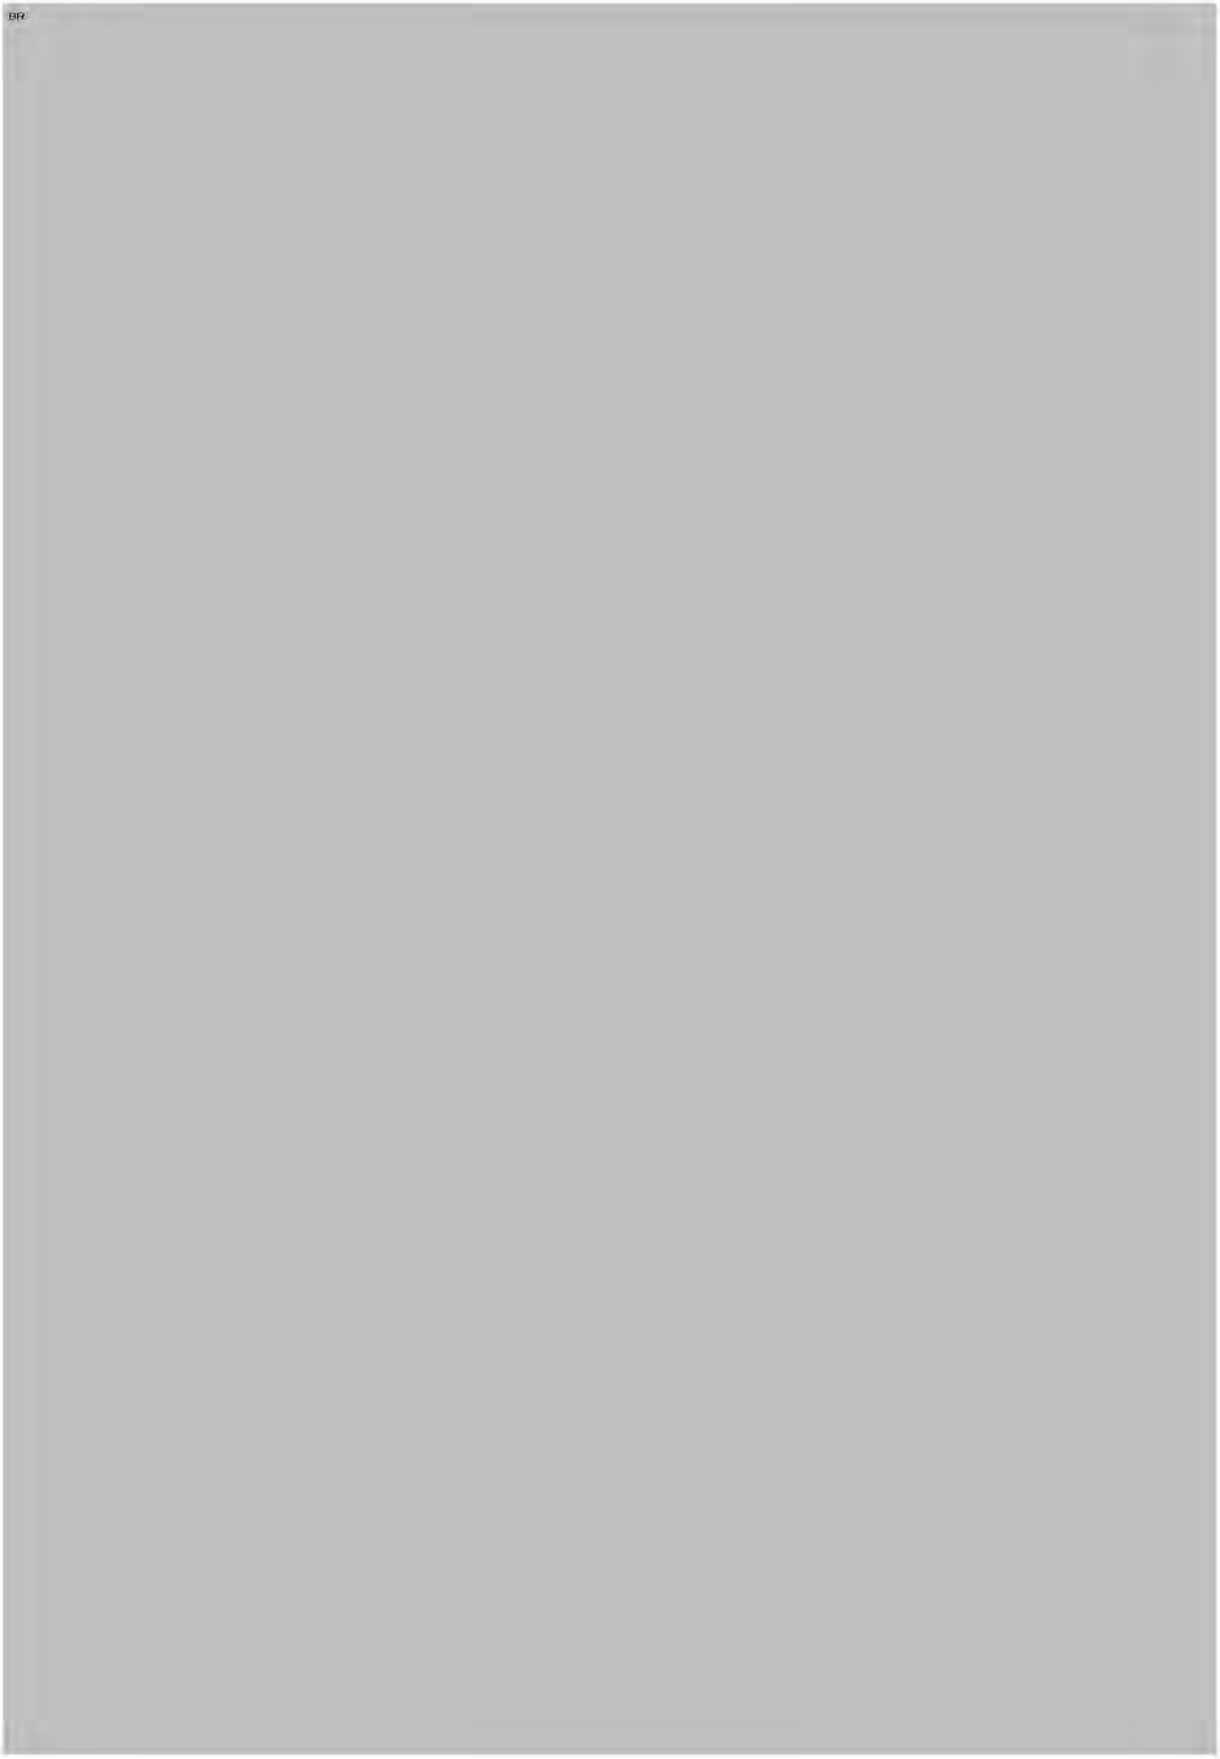
BR

## 1.8 Risico's

In het tweede kwartaal is het risicodossier voor wat betreft de planning geactualiseerd. Grote verbetering betreft het in werking treden van de bestemmingsplannen Molenvlietpark en Binckhorstlaan-Zuid. De financiële haalbaarheid van het project valt in de categorie >60% (dit is een 'Laag' risicoprofiel en is ongewijzigd gebleven sinds de vorige rapportage).

## 1.9 Bestuurlijke besluitvorming komende periode

- Het College B&W zal verzocht worden een besluit te nemen over de samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e t.a.v. waterinlaat van Zuidvliet naar de calamiteitenberging in het Molenvlietpark (tezamen met Project Uitvoeringskader ontwikkeling Nieuw Vredenoord en overeenkomst grondruil) (4e kwartaal 2016).
- Het College B&W zal verzocht worden een besluit te nemen over de samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e t.a.v. waterinlaat van de Zuidvliet naar calamiteitenberging Molenvlietpark (4e kwartaal 2016).

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Afronden overeenkomst 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark over zijn gronden. | Uit nadere berekeningen is gebleken dat de inlaat van de waterberging een groter ruimtebeslag legt op de gronden van 5.1.2.e dan aanvankelijk is aangenomen. In overleg met het Hoogheemraadschap en 5.1.2.e i.r.t. ontwikkeling Nieuw Vredenoord wordt onder meer het ontwerp aangepast. Daarna kunnen de consequenties t.a.v. de concept overeenkomst in beeld worden gebracht. |
| Alsnog overeenstemming zien te bereiken met 5.1.2.e t.a.v. de waterinlaat naar de waterberging Molenvlietpark, verlegging Molenslootpad en evt. aanpassing brug nadat overeenstemming met 5.1.2.e is bereikt. | De onderhandeling met van Aalst worden aangehouden tot het moment dat overeenstemming (met 5.1.2.e ) is bereikt over het aangepast ontwerp aangaande de waterinlaat van de Vliet naar het Molenvlietpark. |
| | |

| Overige / extra verrichte werkzaamheden |
|---|
| Geen |
| |

| Geplande besluiten | Genomen besluiten |
|---|---|
| Collegebesluit aangaande overeenkomst met 5.1.2.e 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark, ontwikkeling Nieuw Vredenoord en Samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e | Nog in afwachting van aangepast ontwerp alvorens besluitvorming kan plaatsvinden. |

[redacted]

| |
|---|
| BR |
| Afronden overeenkomst 5.1.2.e t.a.v. inlaat waterberging Molenvlietpark over zijn gronden. |
| Alsnog overeenstemming zien te bereiken met 5.1.2.e t.a.v. de waterinlaat naar de waterberging Molenvlietpark, verlegging Molenslootpad en evt. aanpassing brug nadat overeenstemming met 5.1.2.e is bereikt. |
| BR |
| |
| **Besluiten** |
| Collegebesluit aangaande overeenkomst met 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark, ontwikkeling Nieuw Vredenoord en Samenwerkingsovereenkomst met dhr. 5.1.2.e Geplande besluitvorming vooralsnog 4de kwartaal 2016. |
| |

BR

## 2.3 Vergunningen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| | |
|---|---|
| [redacted] | |
| Op 15 december 2015 is de leggerwijziging als gevolg van voornoemde watervergunning en het projectplan voor het bergingsgebied Vlietzone namens het Hoogheemraadschap van Delfland in procedure gebracht. | Op 21 april 2016 heeft het Hoogheemraadschap besloten tot wijziging van de legger regionale waterkeringen en de legger wateren als gevolg van het omleggen van een regionale waterkering en de aanleg van een bergingsgebied ter plaatse van het Molenslootpad (Vlietzone) vastgesteld. Dit besluit is op 3 juni onherroepelijk geworden. |
| Op 21 december 2015 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland het ontwerp-projectplan Vlietberging locatie Molenslootpad (Molenvlietpark) te Den Haag ter inzage gelegd. | Op 21 april 2016 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland het projectplan bergingsgebied Vlietzone vastgesteld. Het projectplan is vanaf 3 juni 2016 onherroepelijk. |
| | |
| [redacted] | |

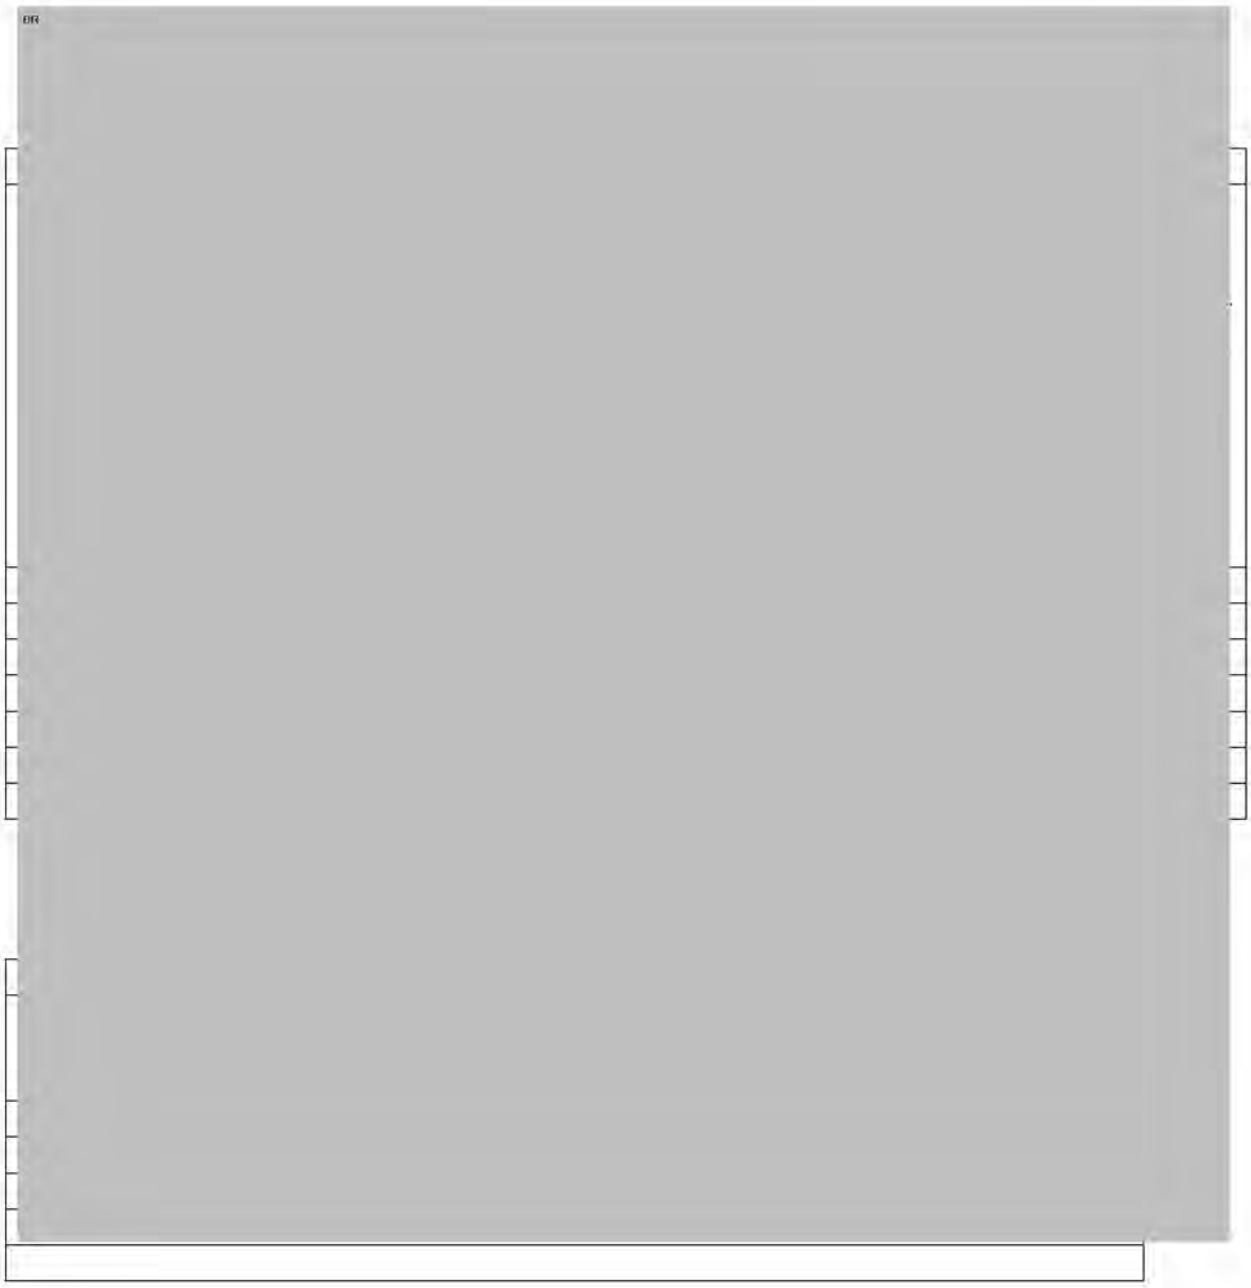

| |
|---|
| BR |
| |

### 2.5.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
|---|
| Opstellen en afronden van afsprakenkaders / (samenwerkings)overeenkomsten met eigenaren / gebruikers (5.1.2.e / 5.1.2.e). |
| BR |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |
| |

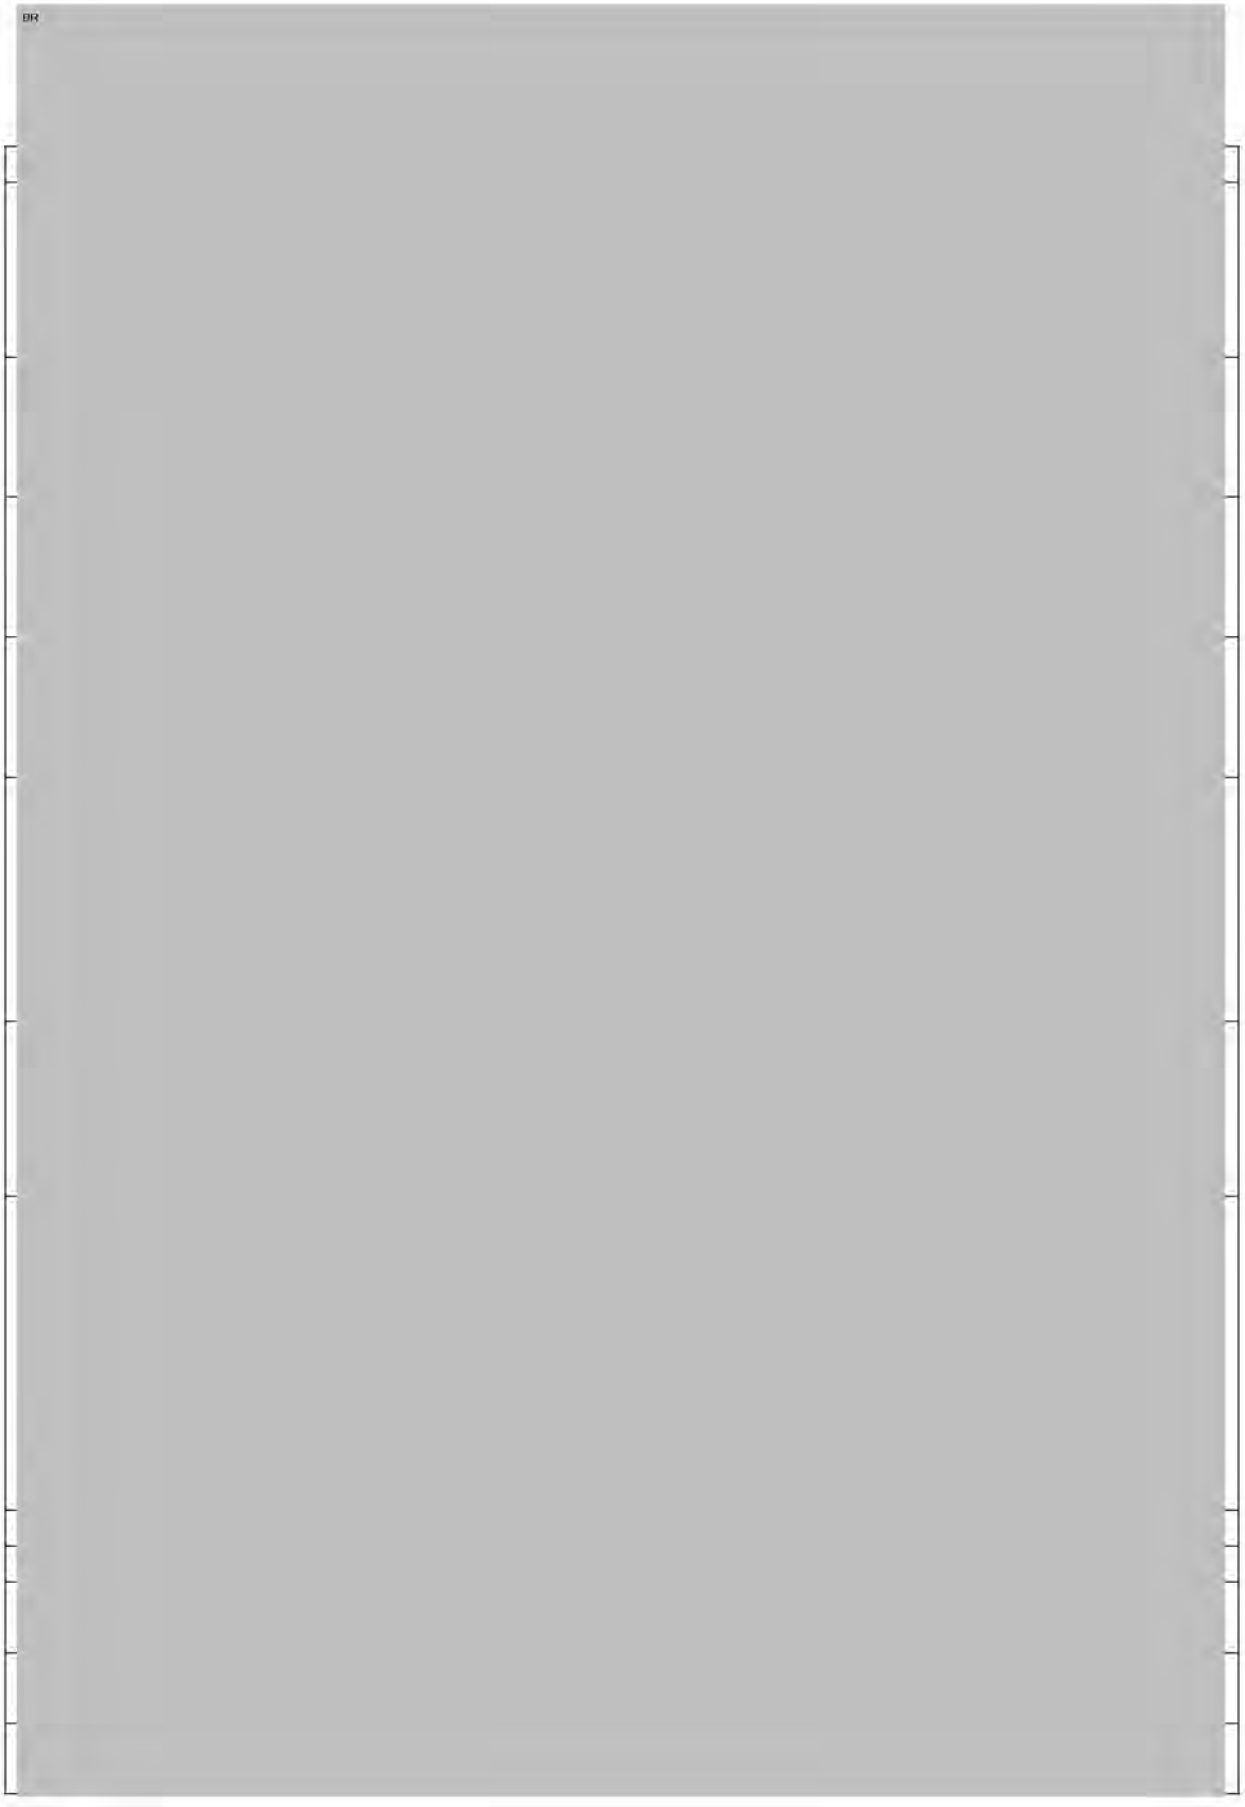
BR

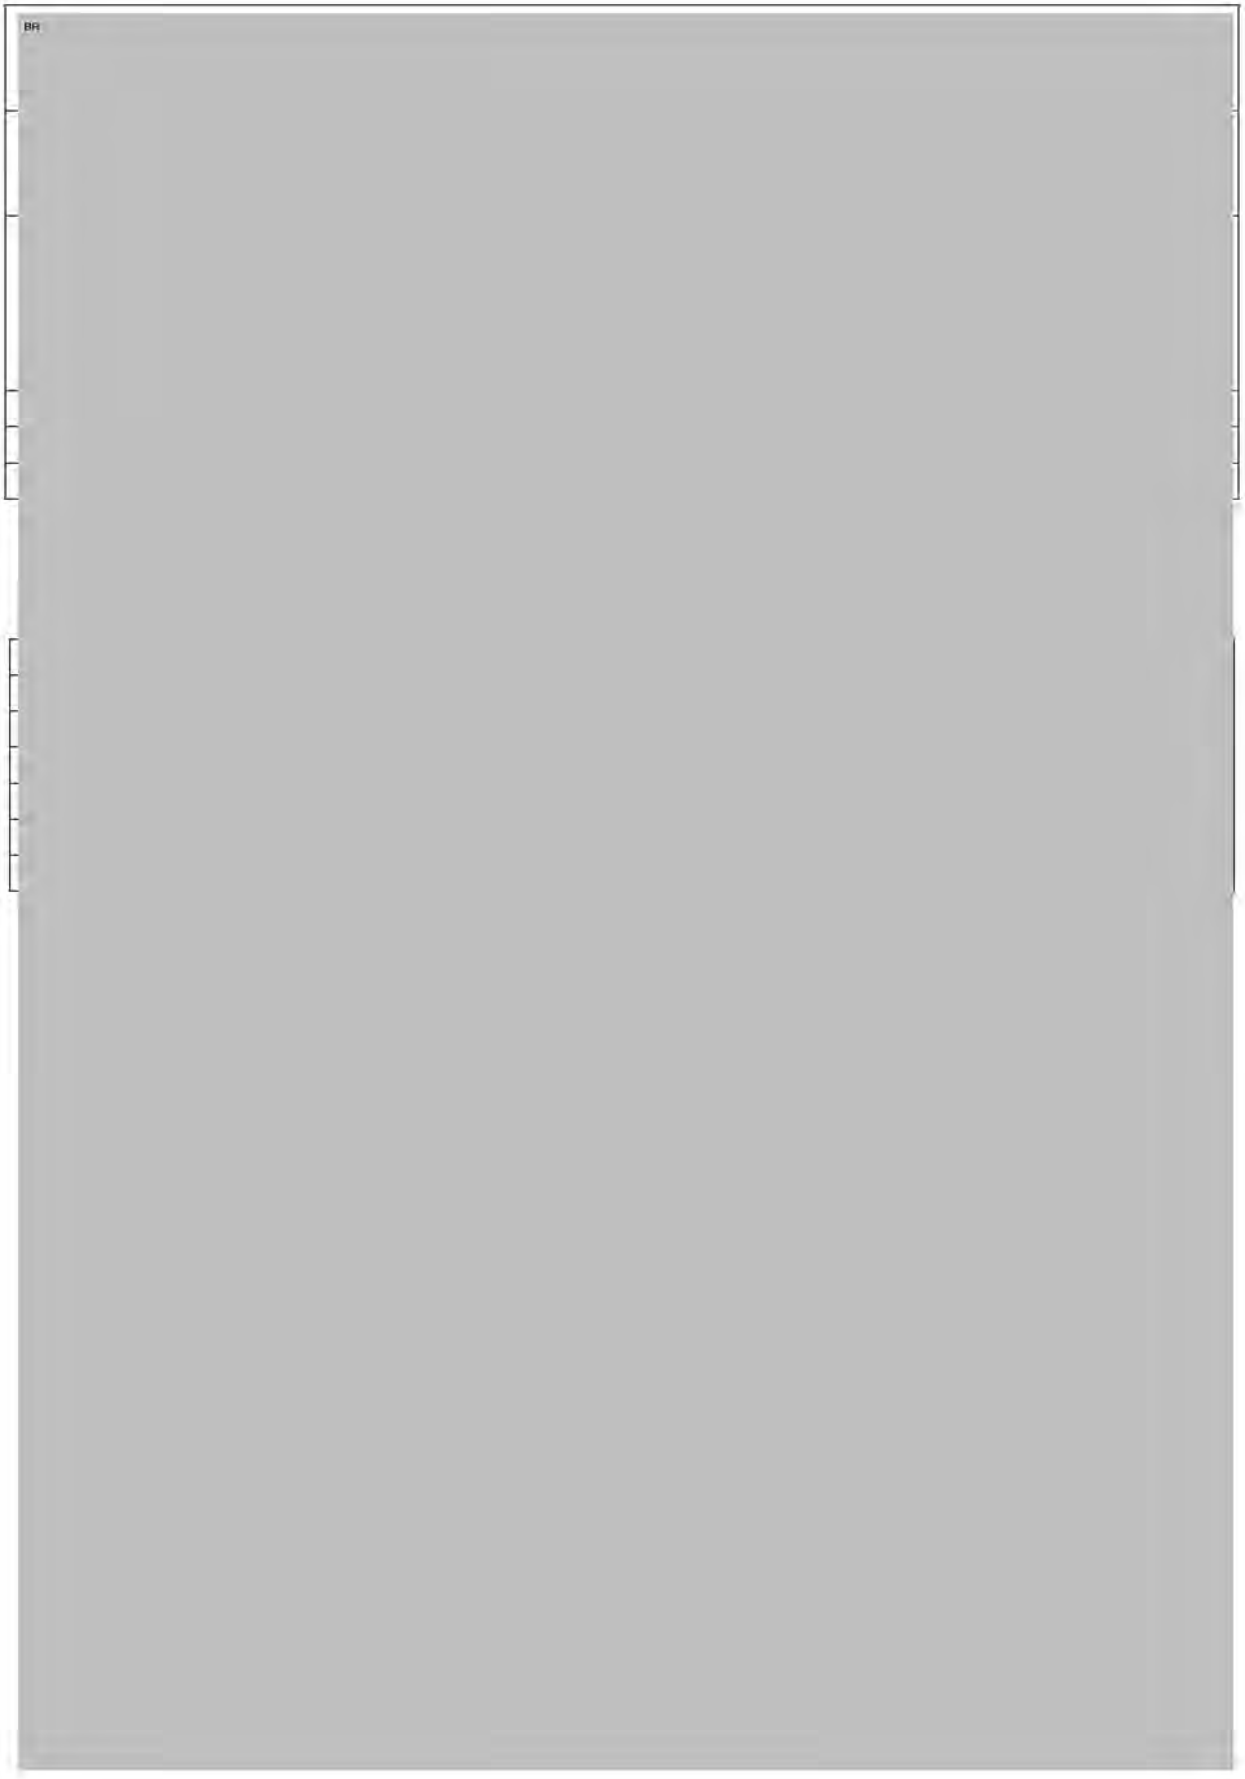
BR

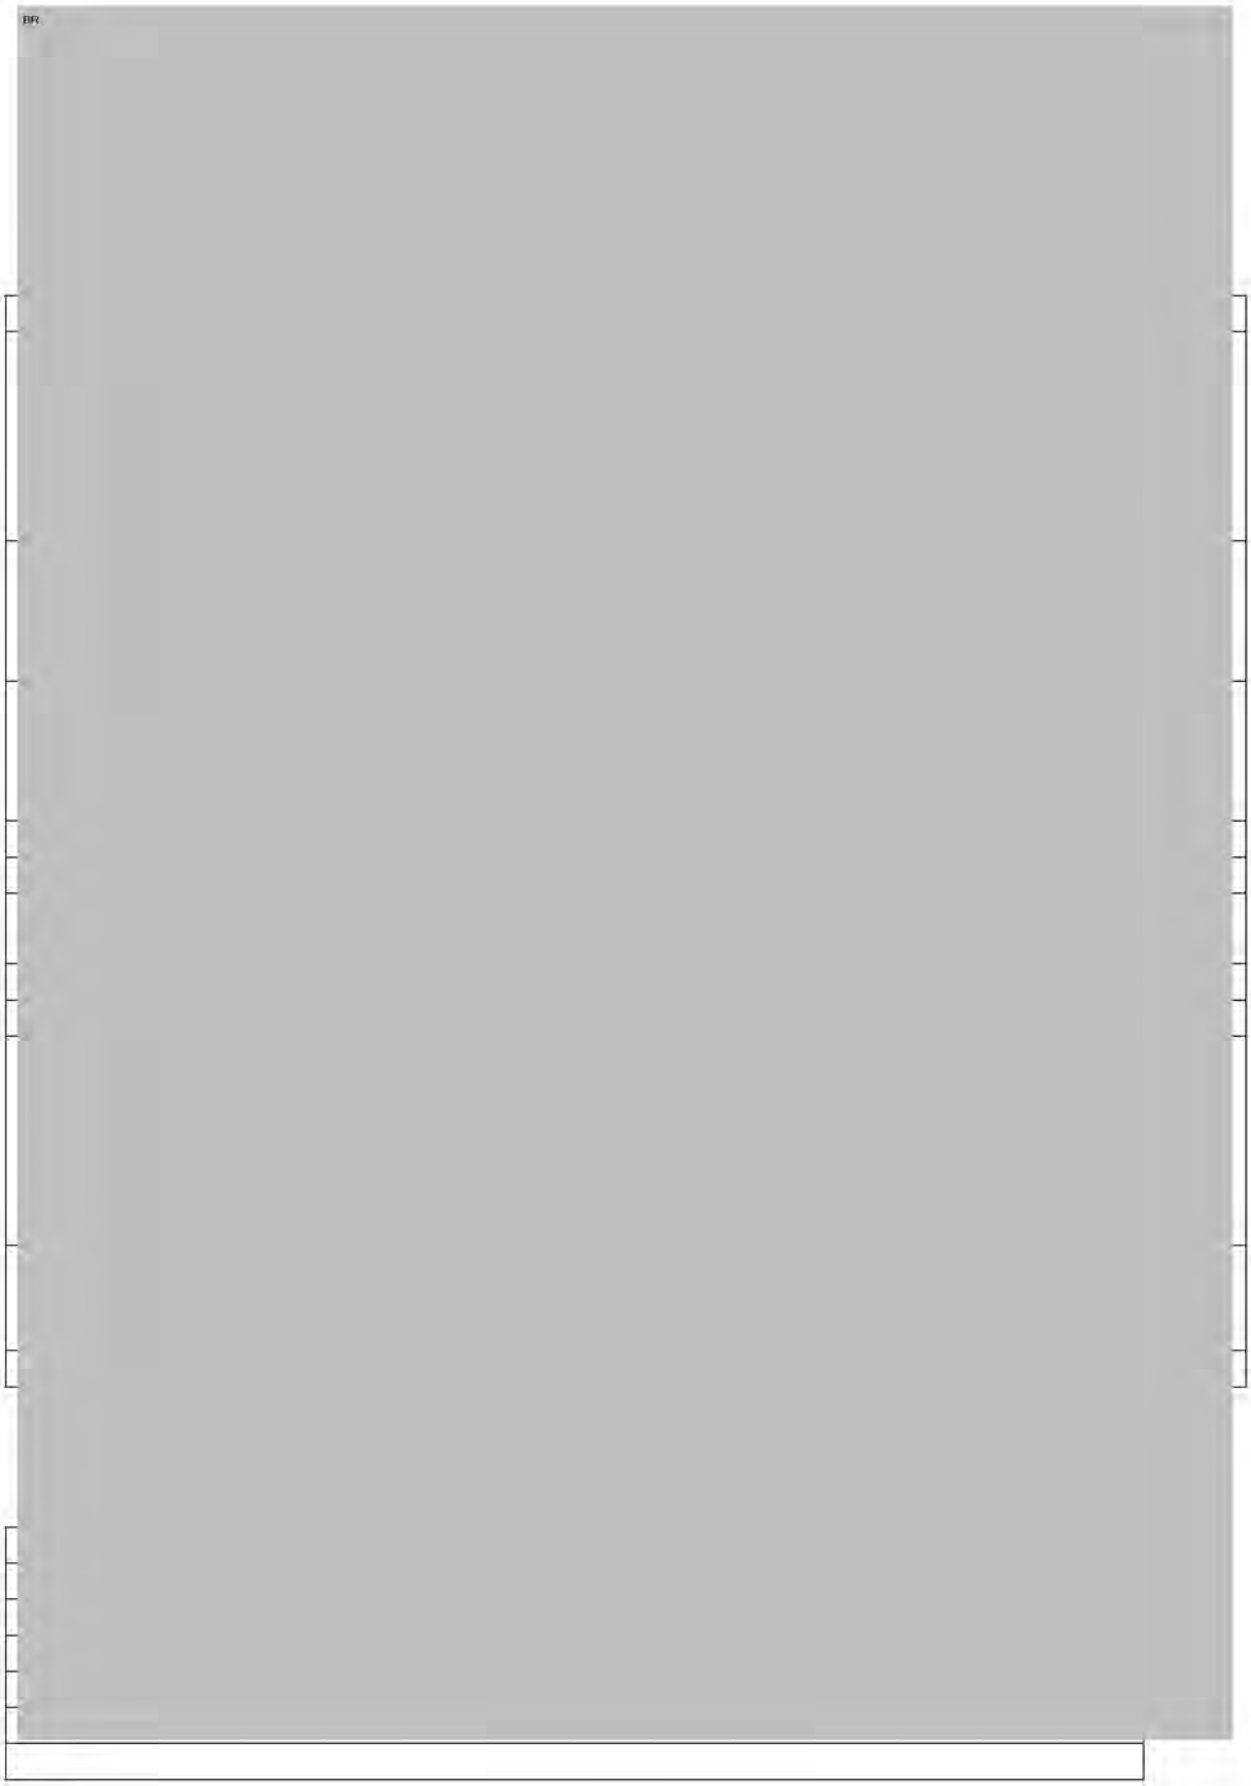

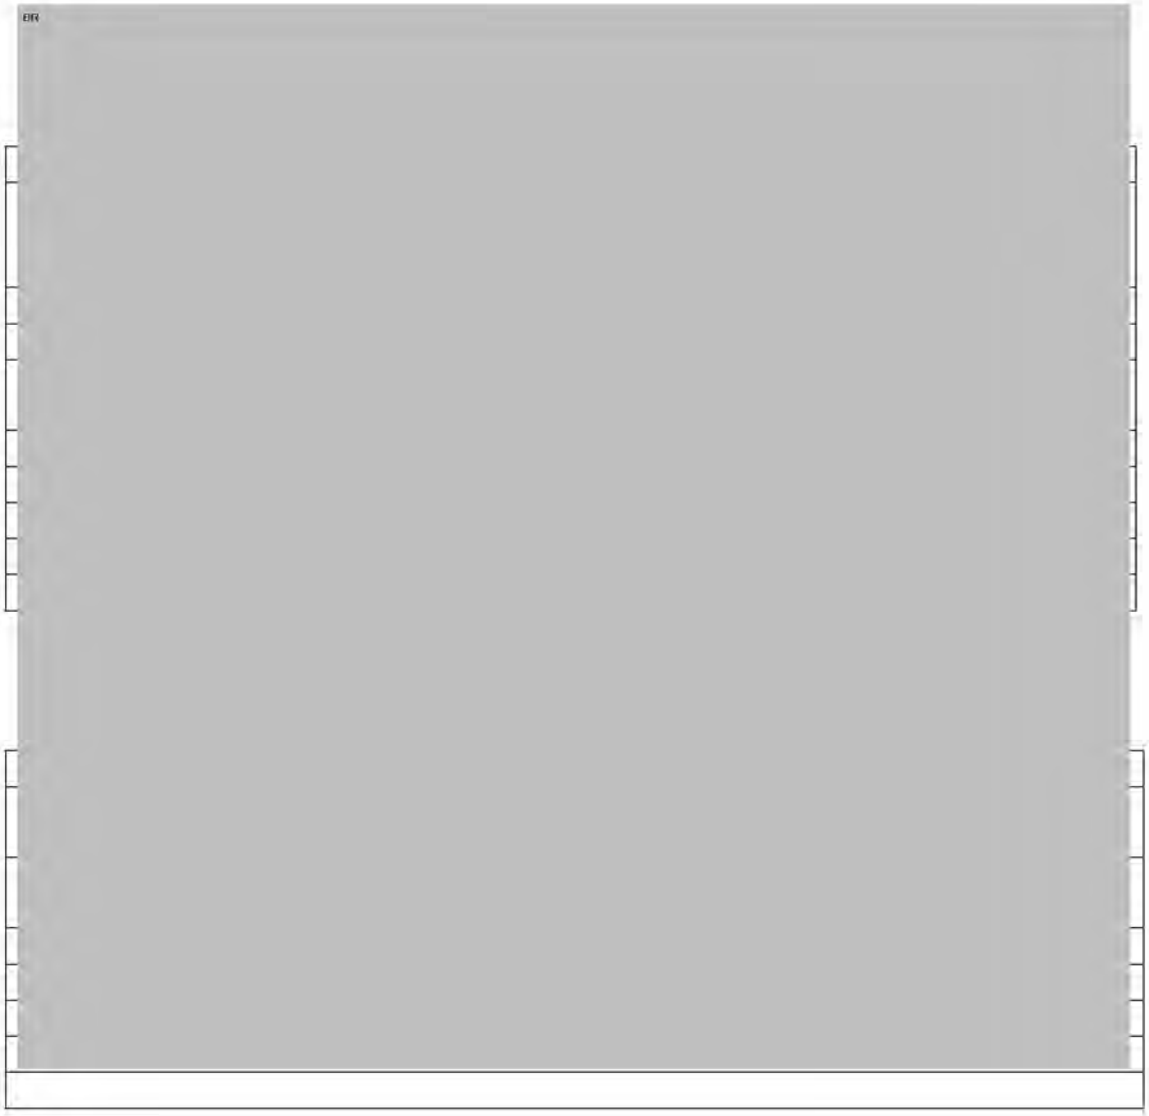
BR

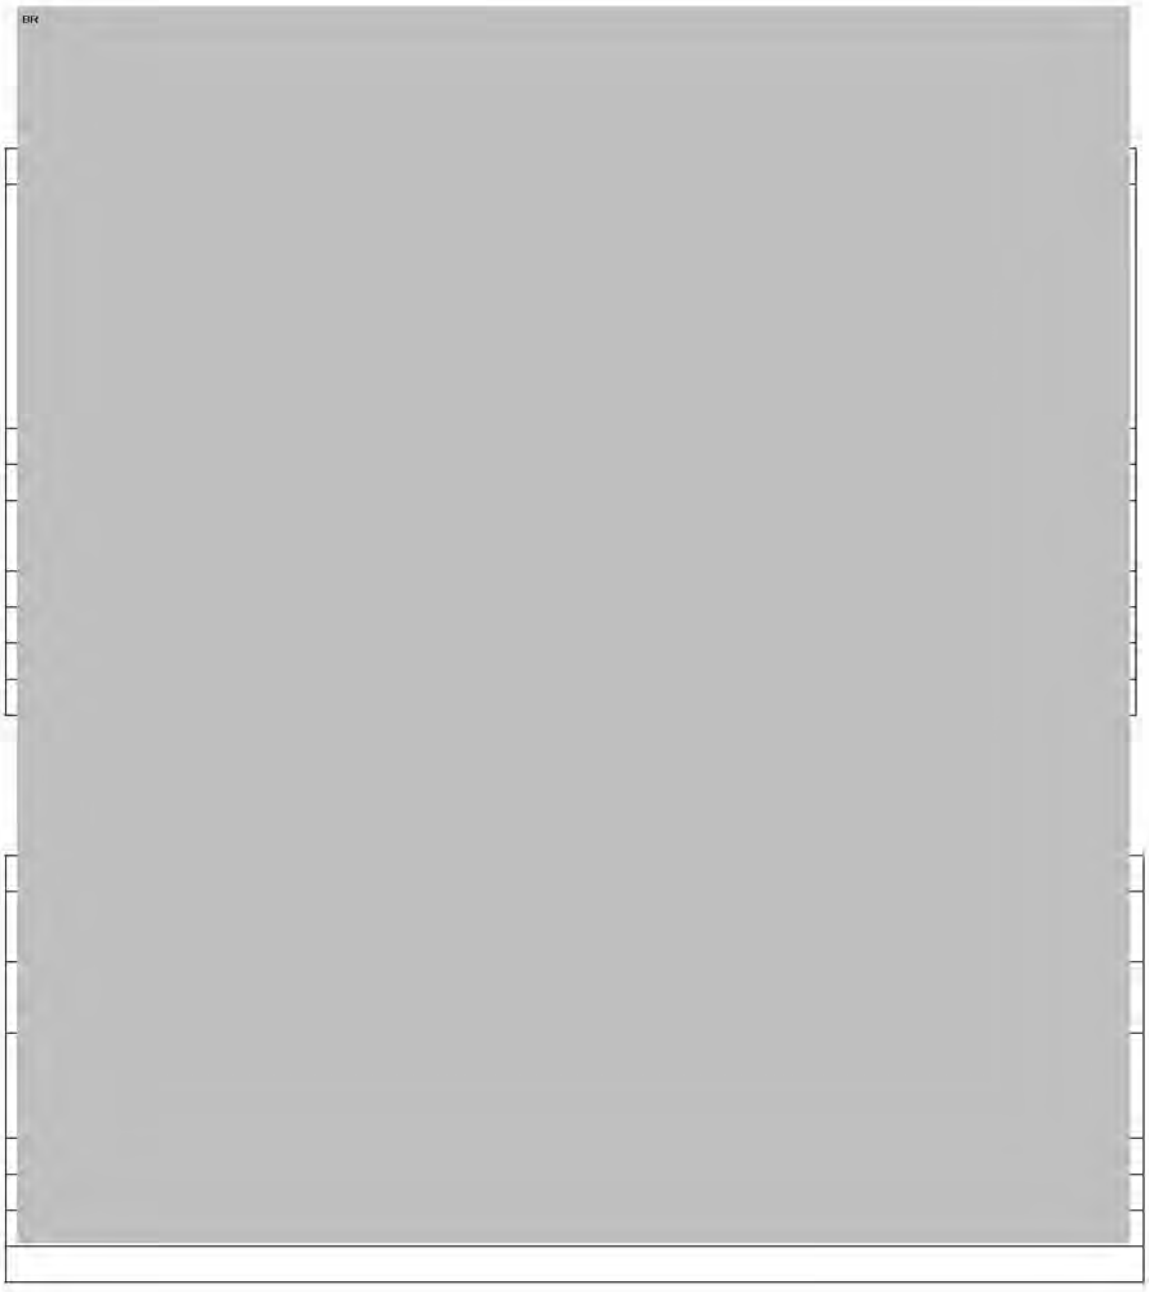
BR

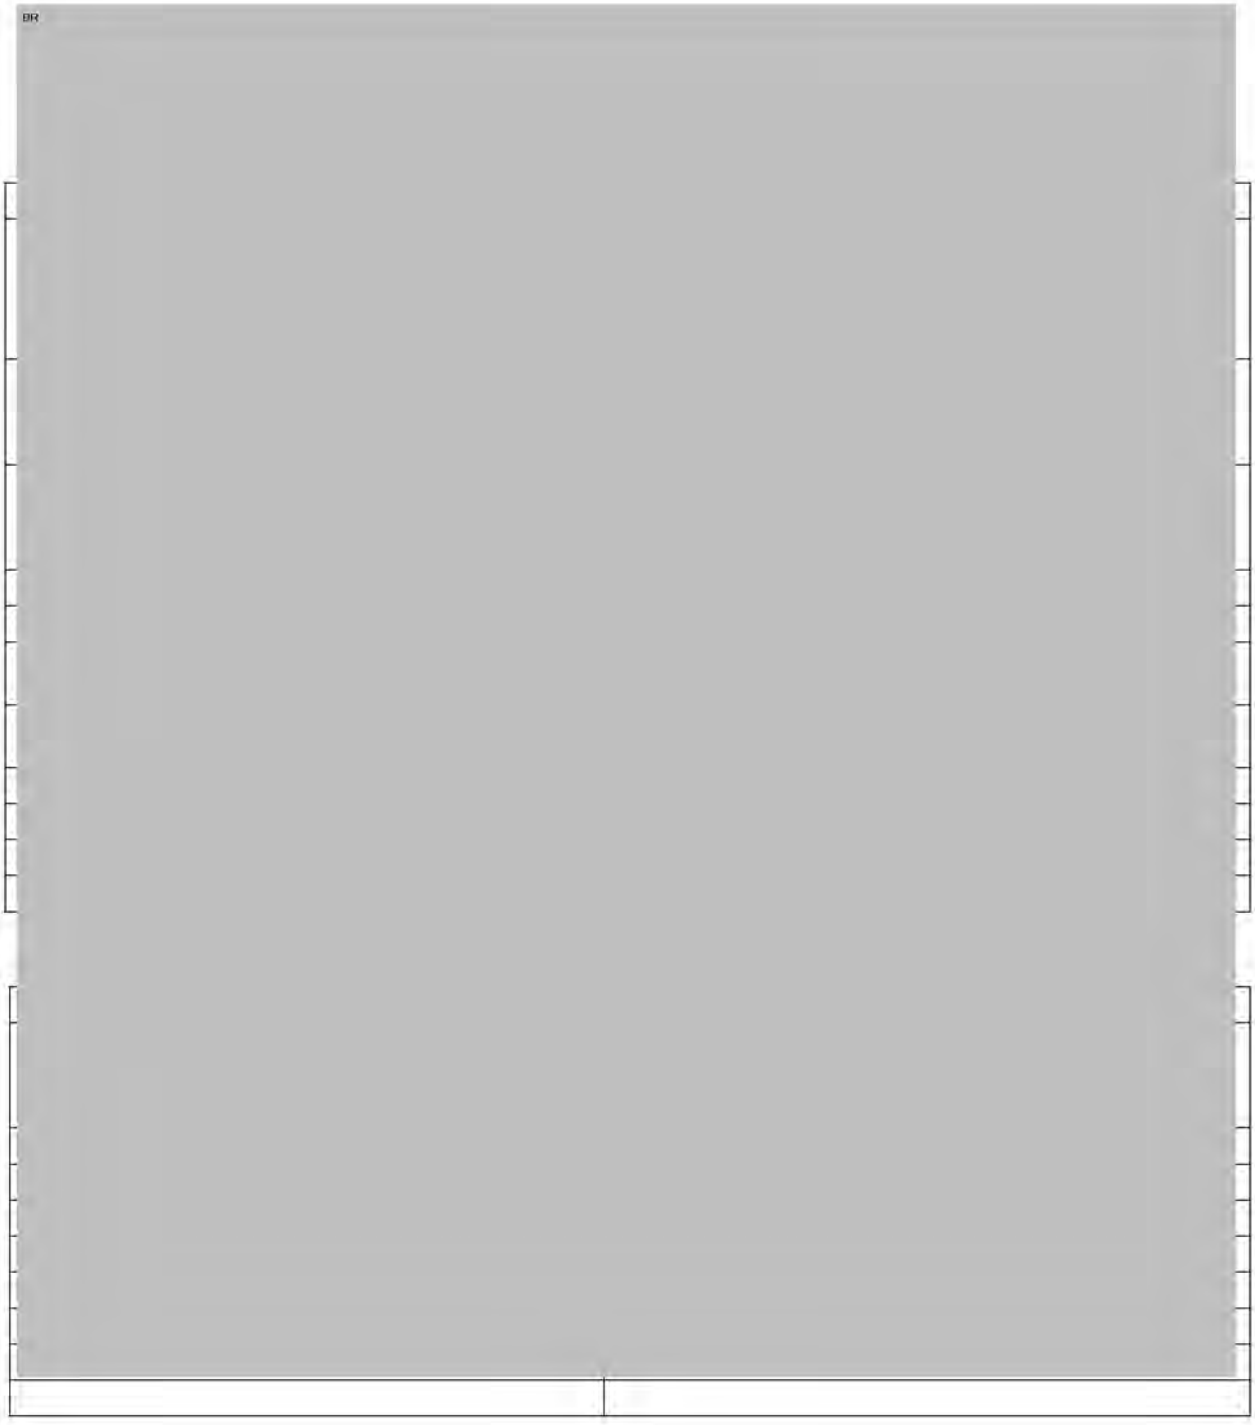
BR

BR

## 3.5 Inpassing Vlietzone en Laan van Hoornwijck

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

**Conditionering**

| | |
|---|---|
| BR | |
| Afronden van het VO/DO voor de tweede watertoevoer vanuit de Zuidvliet naar het Molenvlietpark. | De gesprekken over de het ontwerp van de tweede toevoer naar het bergingsgebied lopen nog. |
| | |
| BR | |
| | |

### 3.5.2 Komende kwartaal

**Conditionering**

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| [redacted] |
| Het ontwerp van de tweede watertoevoer vanuit de Zuidvliet naar het Molenvlietpark afronden in overleg met de stakeholders en de vergunningaanvraag bij het Hoogheemraadschap indienen. |
| |
| [redacted] |

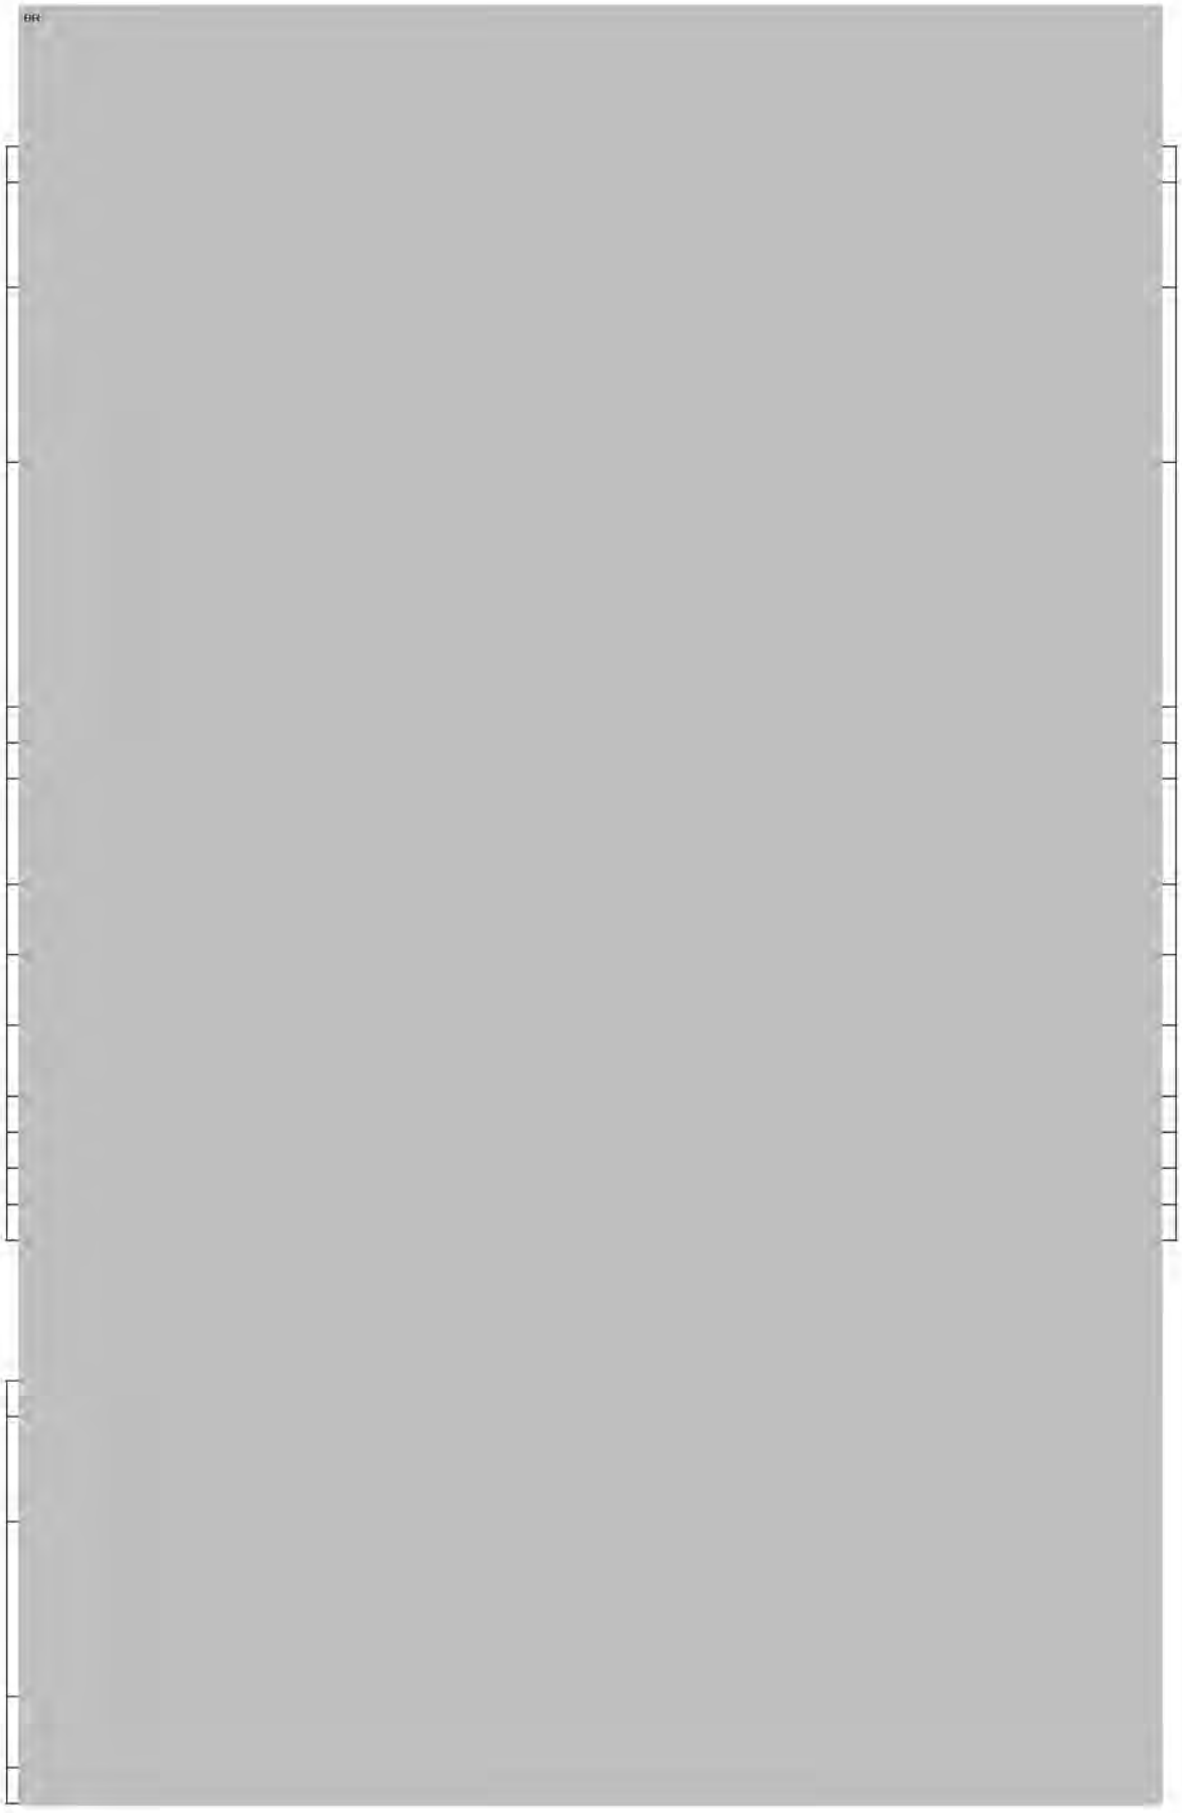

BR

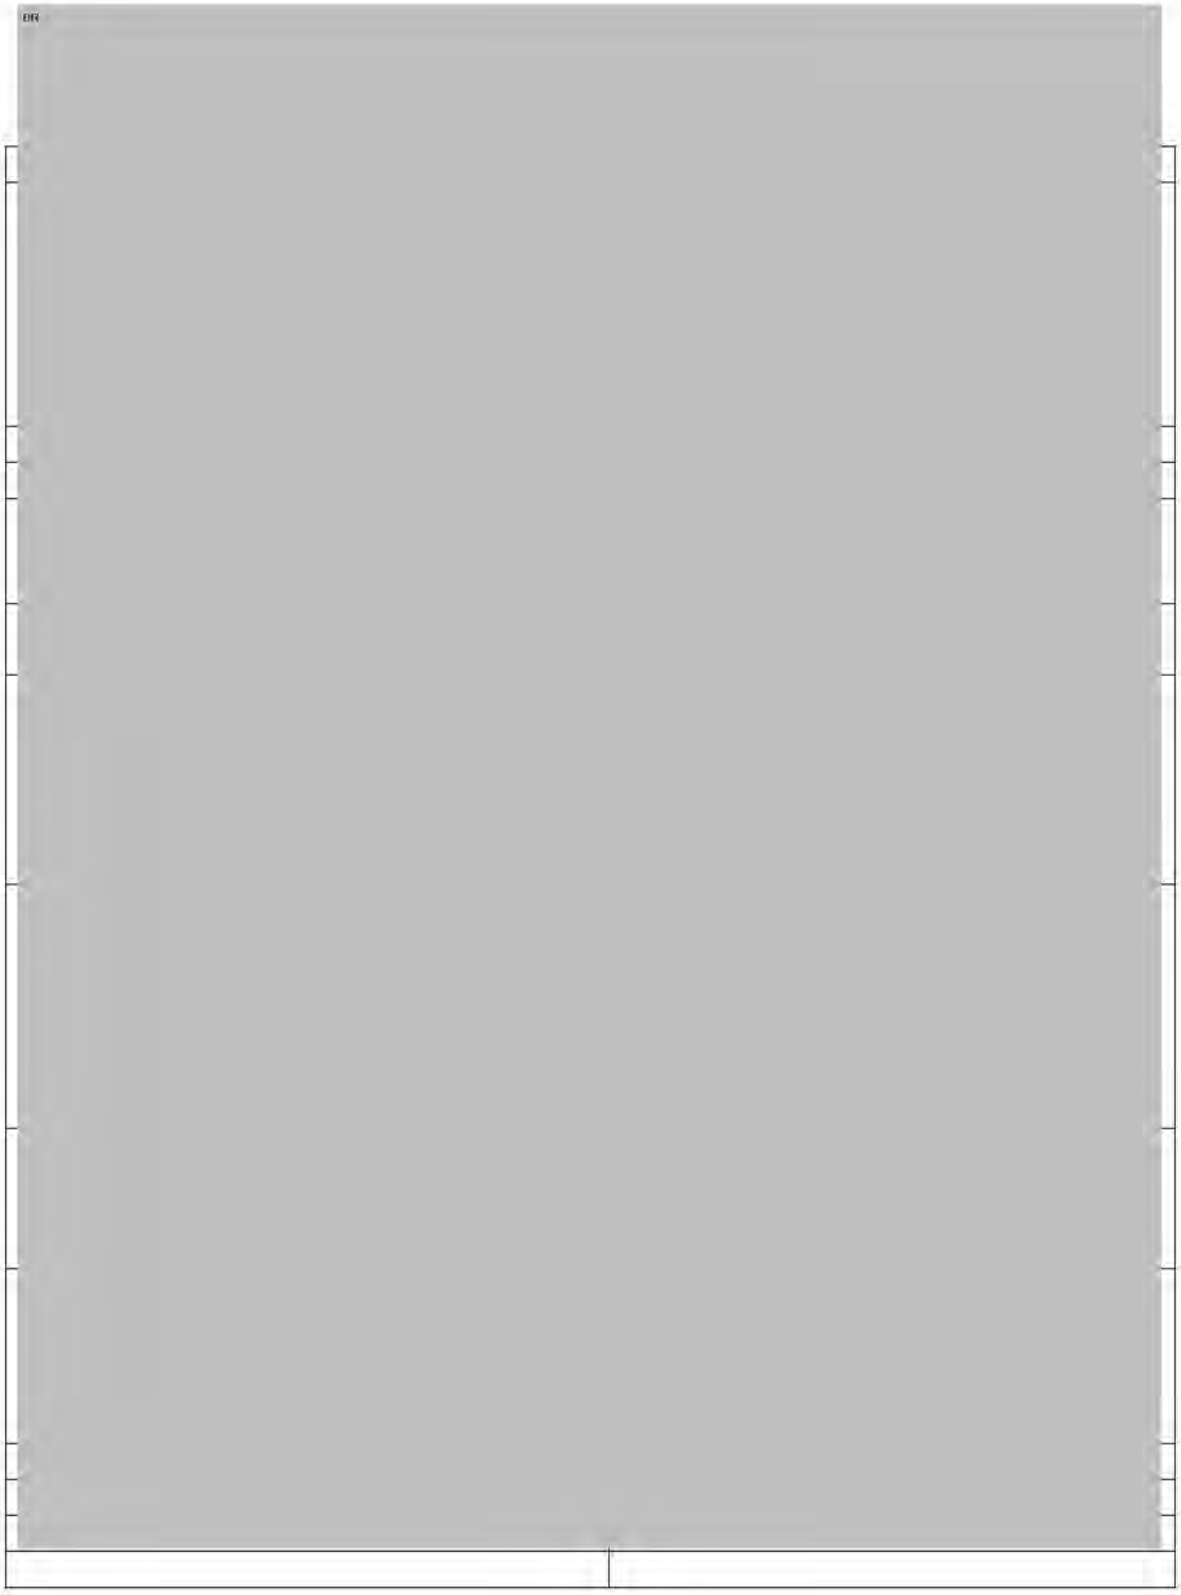

BR

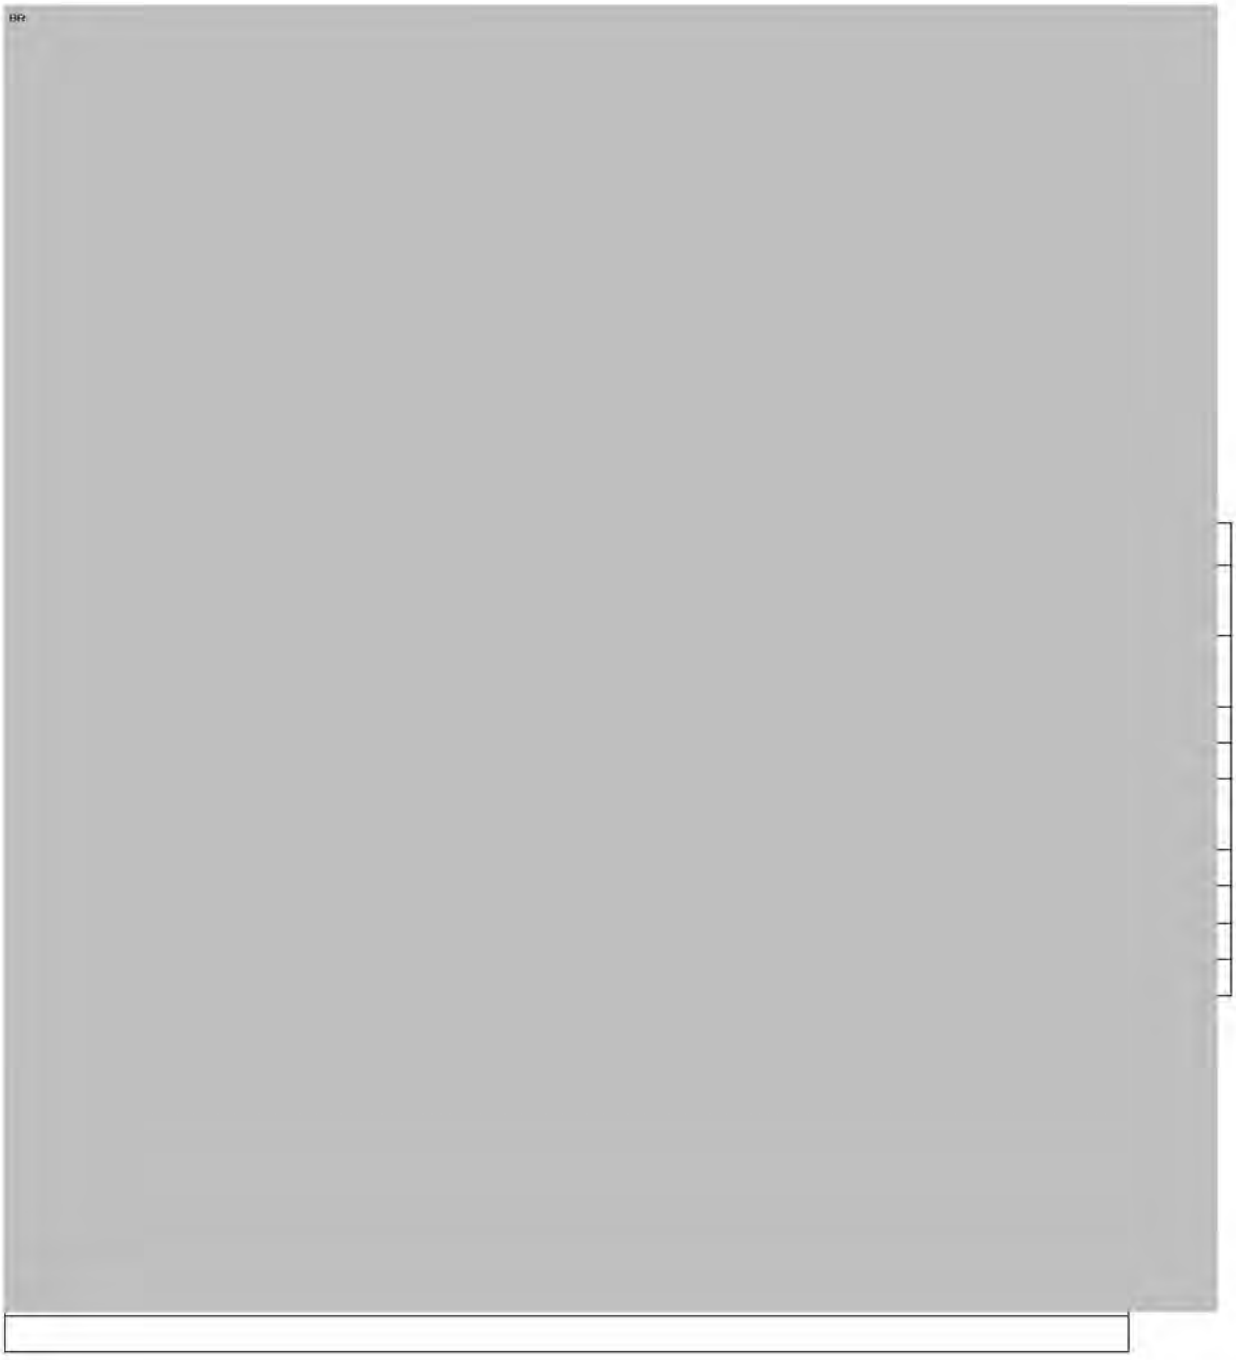
BR

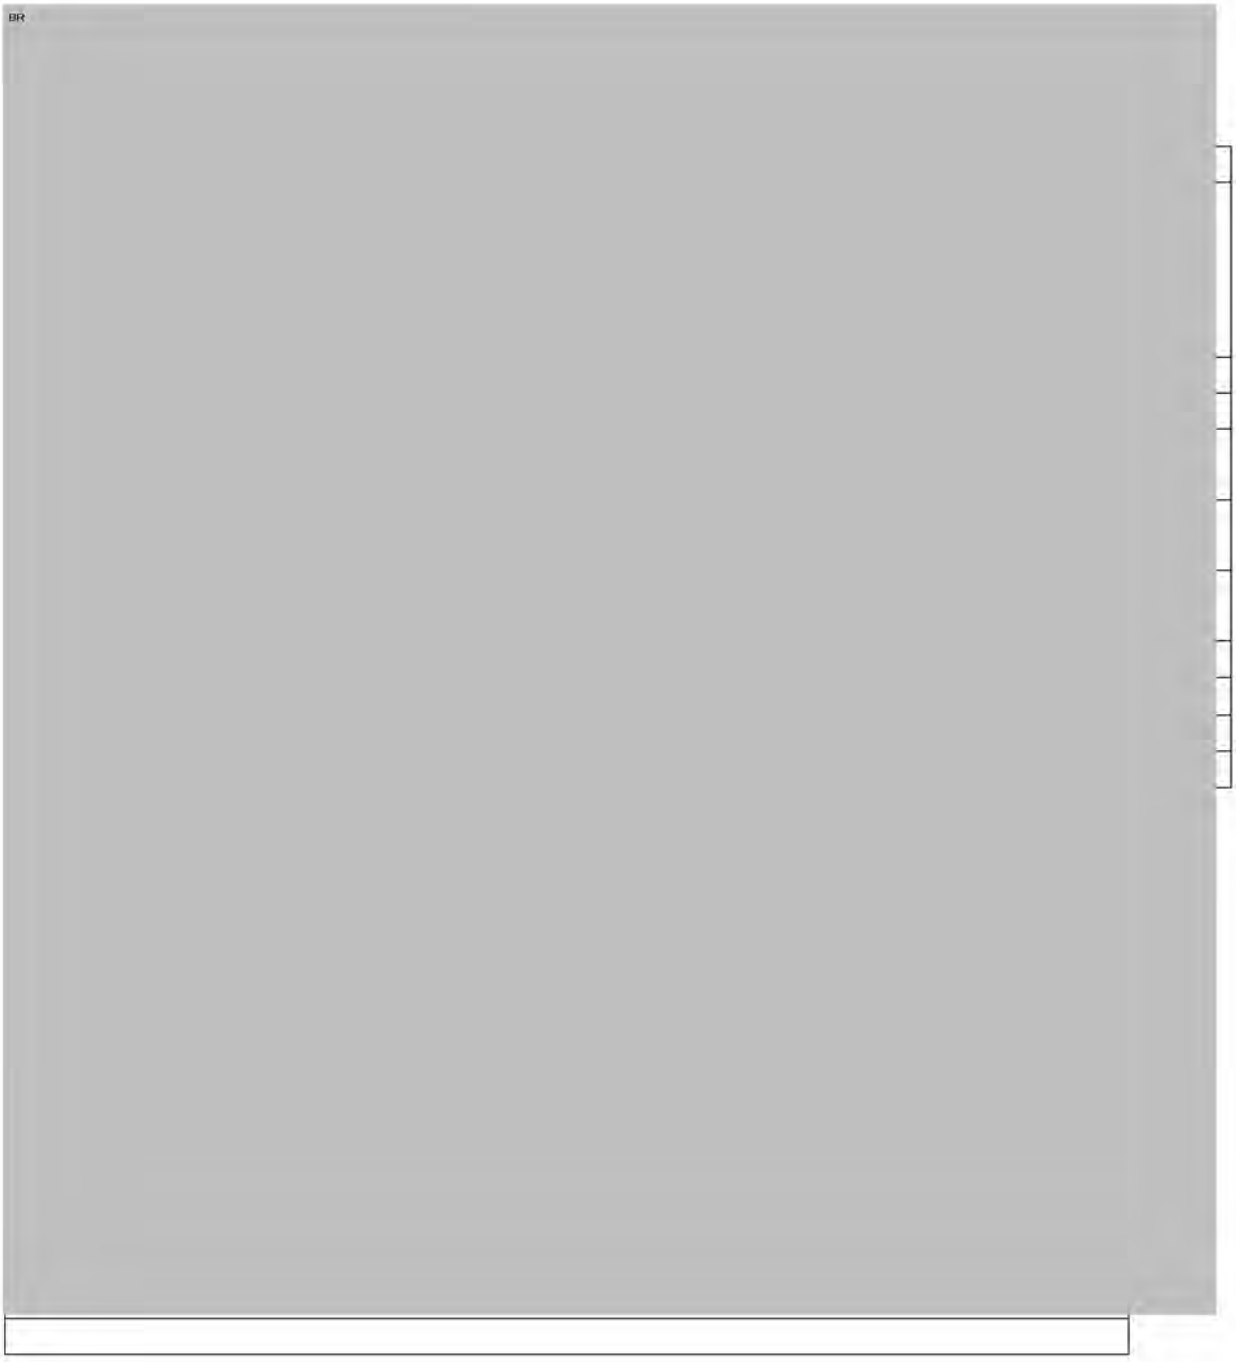
BR

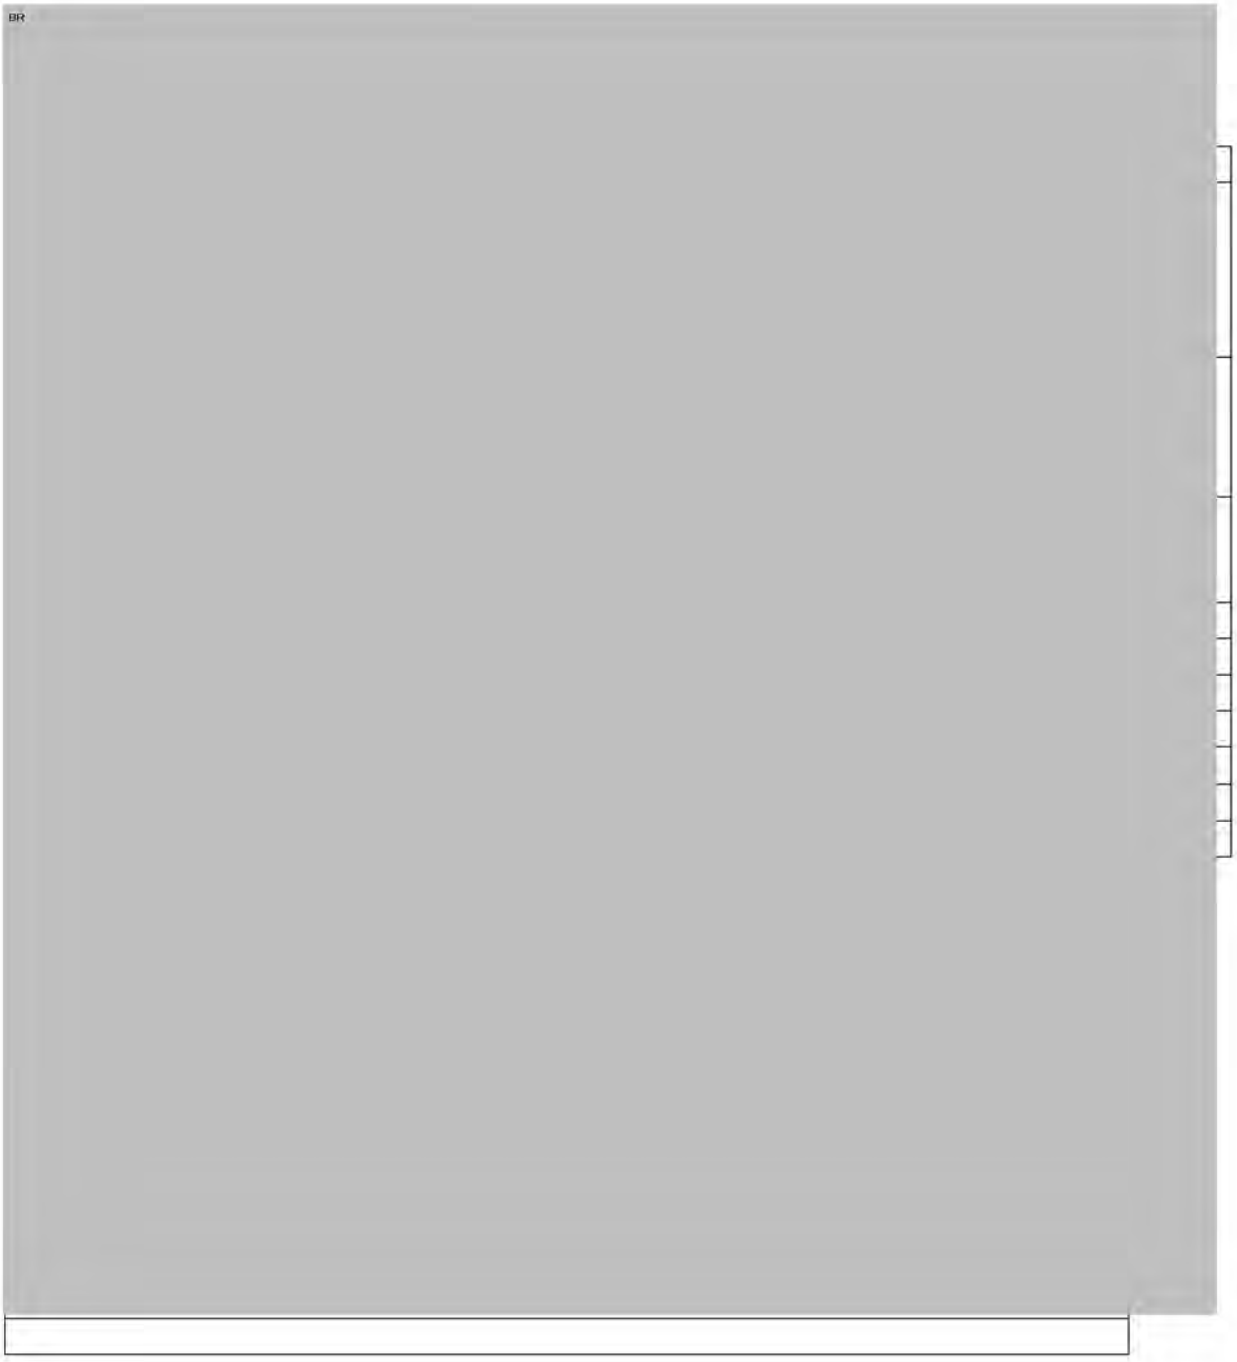
BR

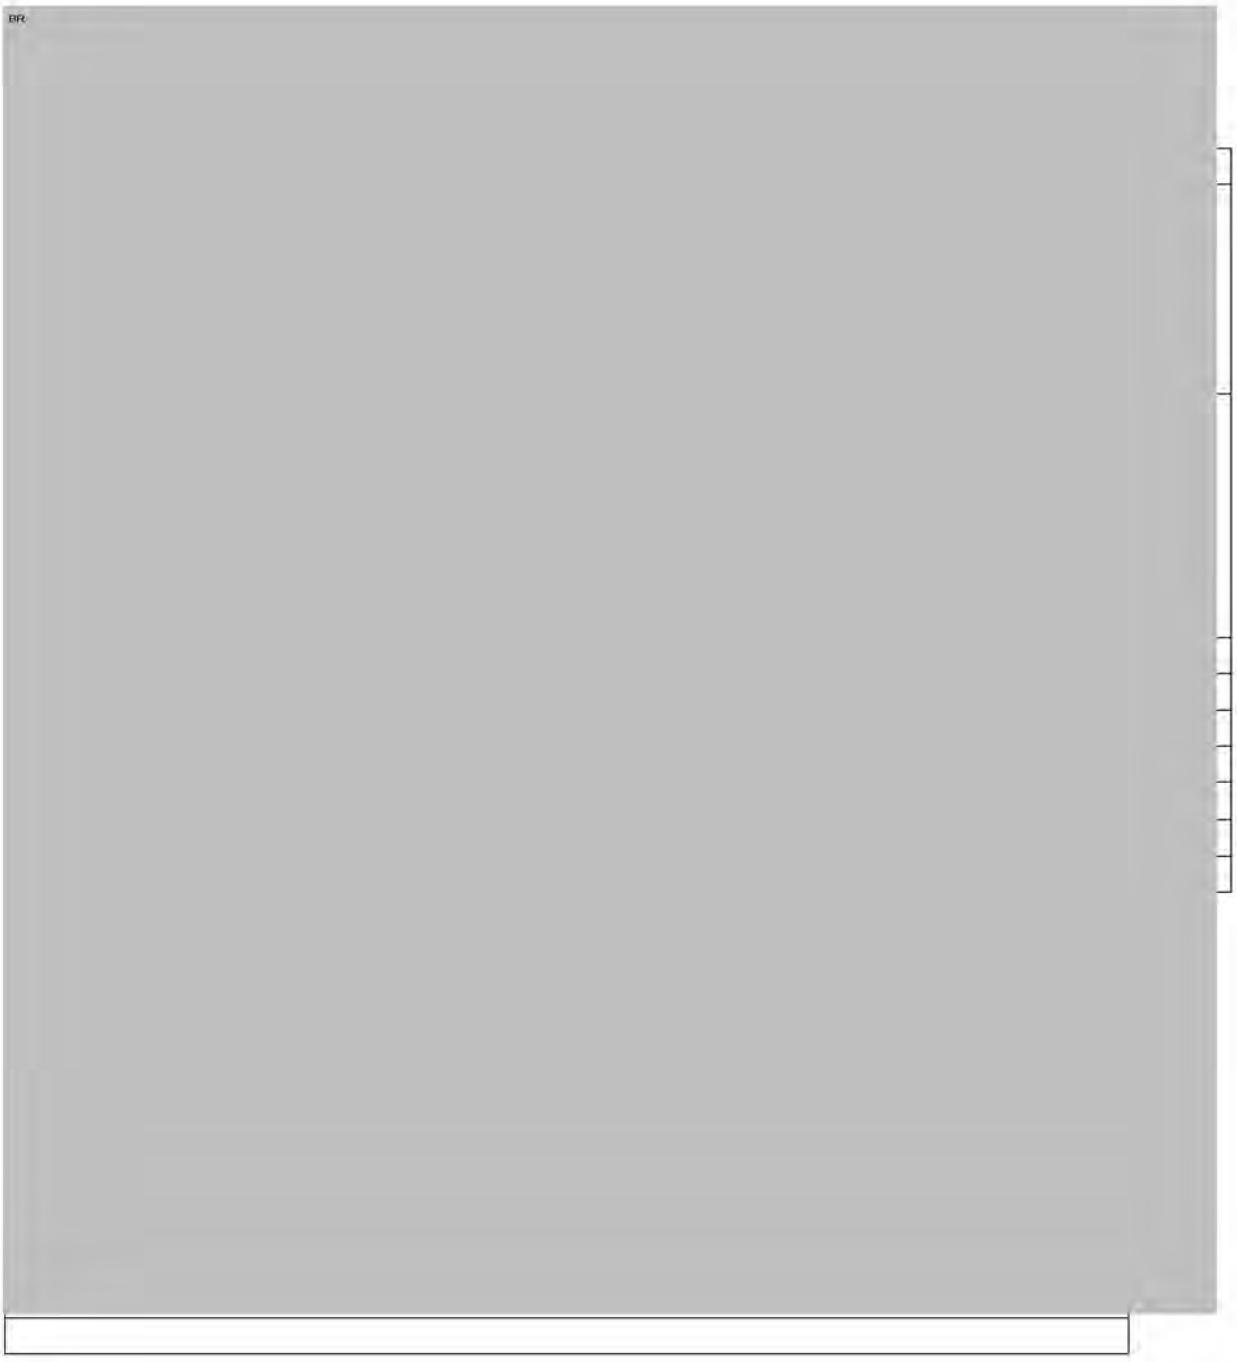

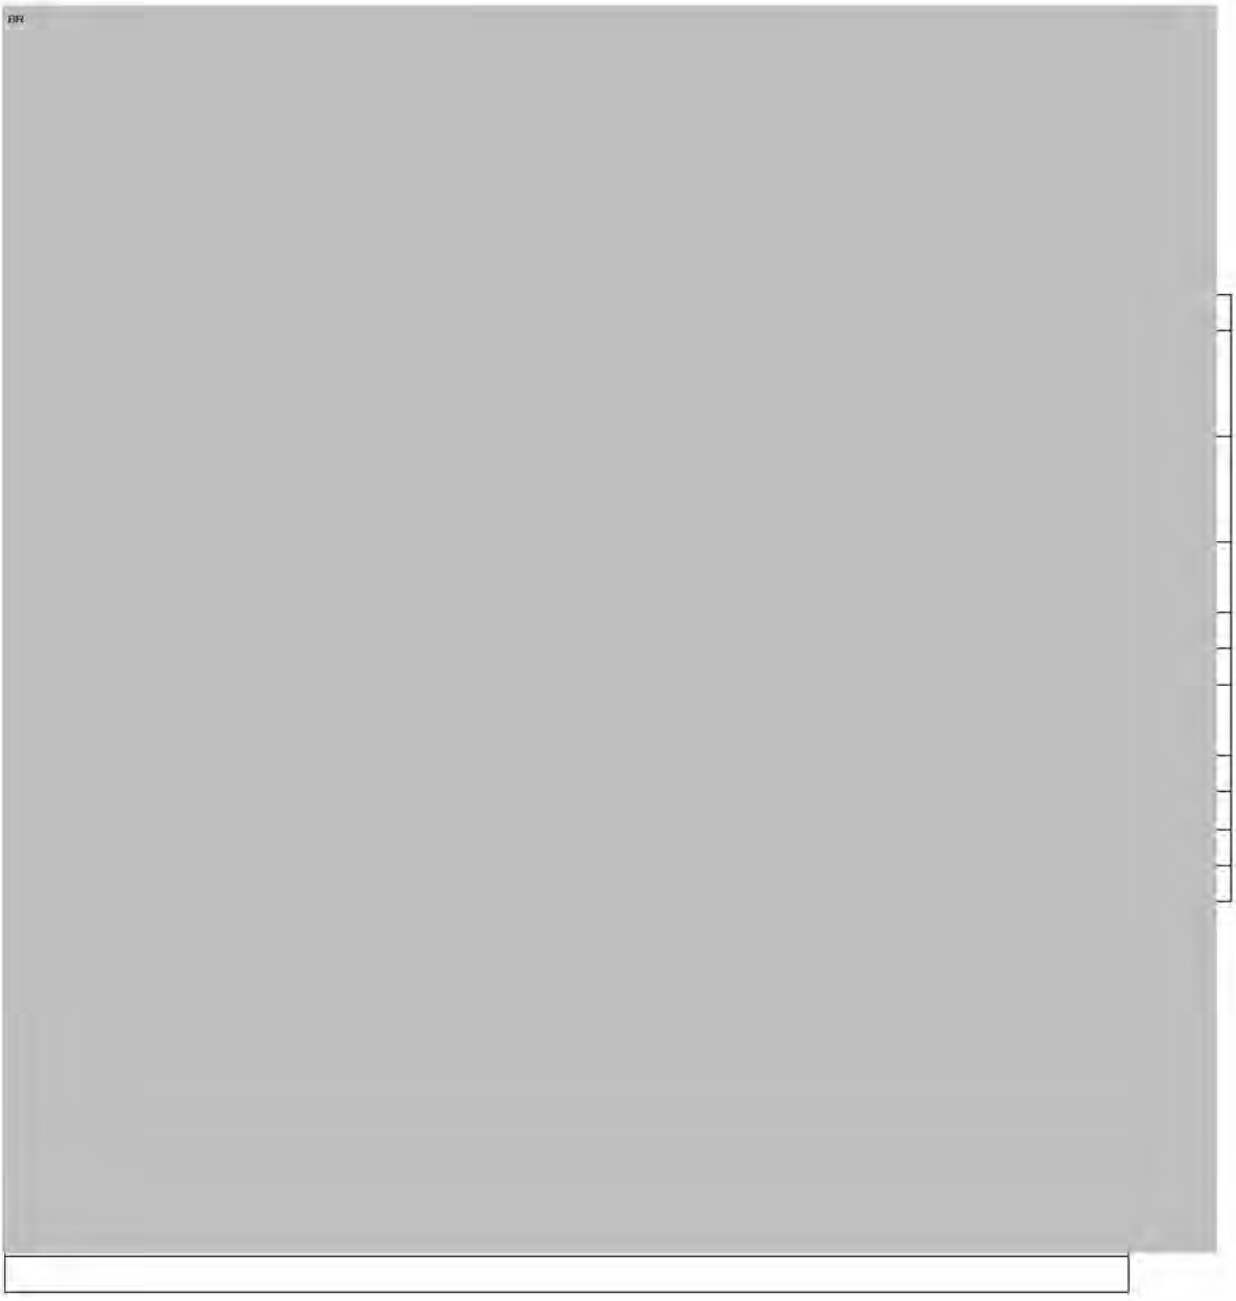

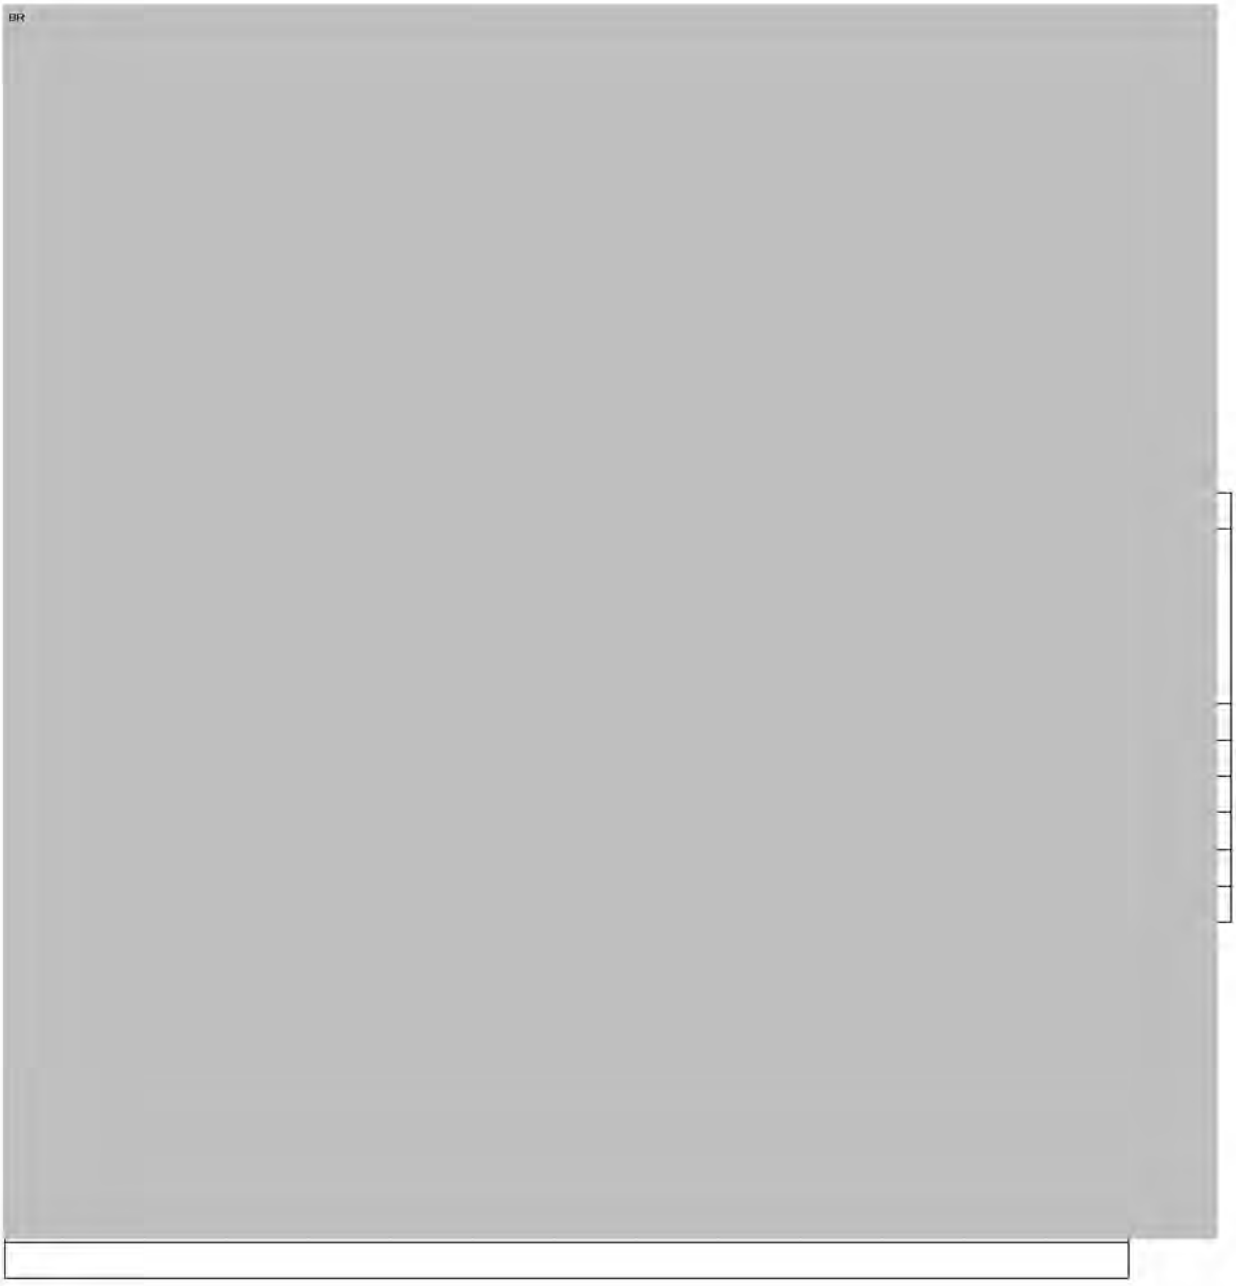

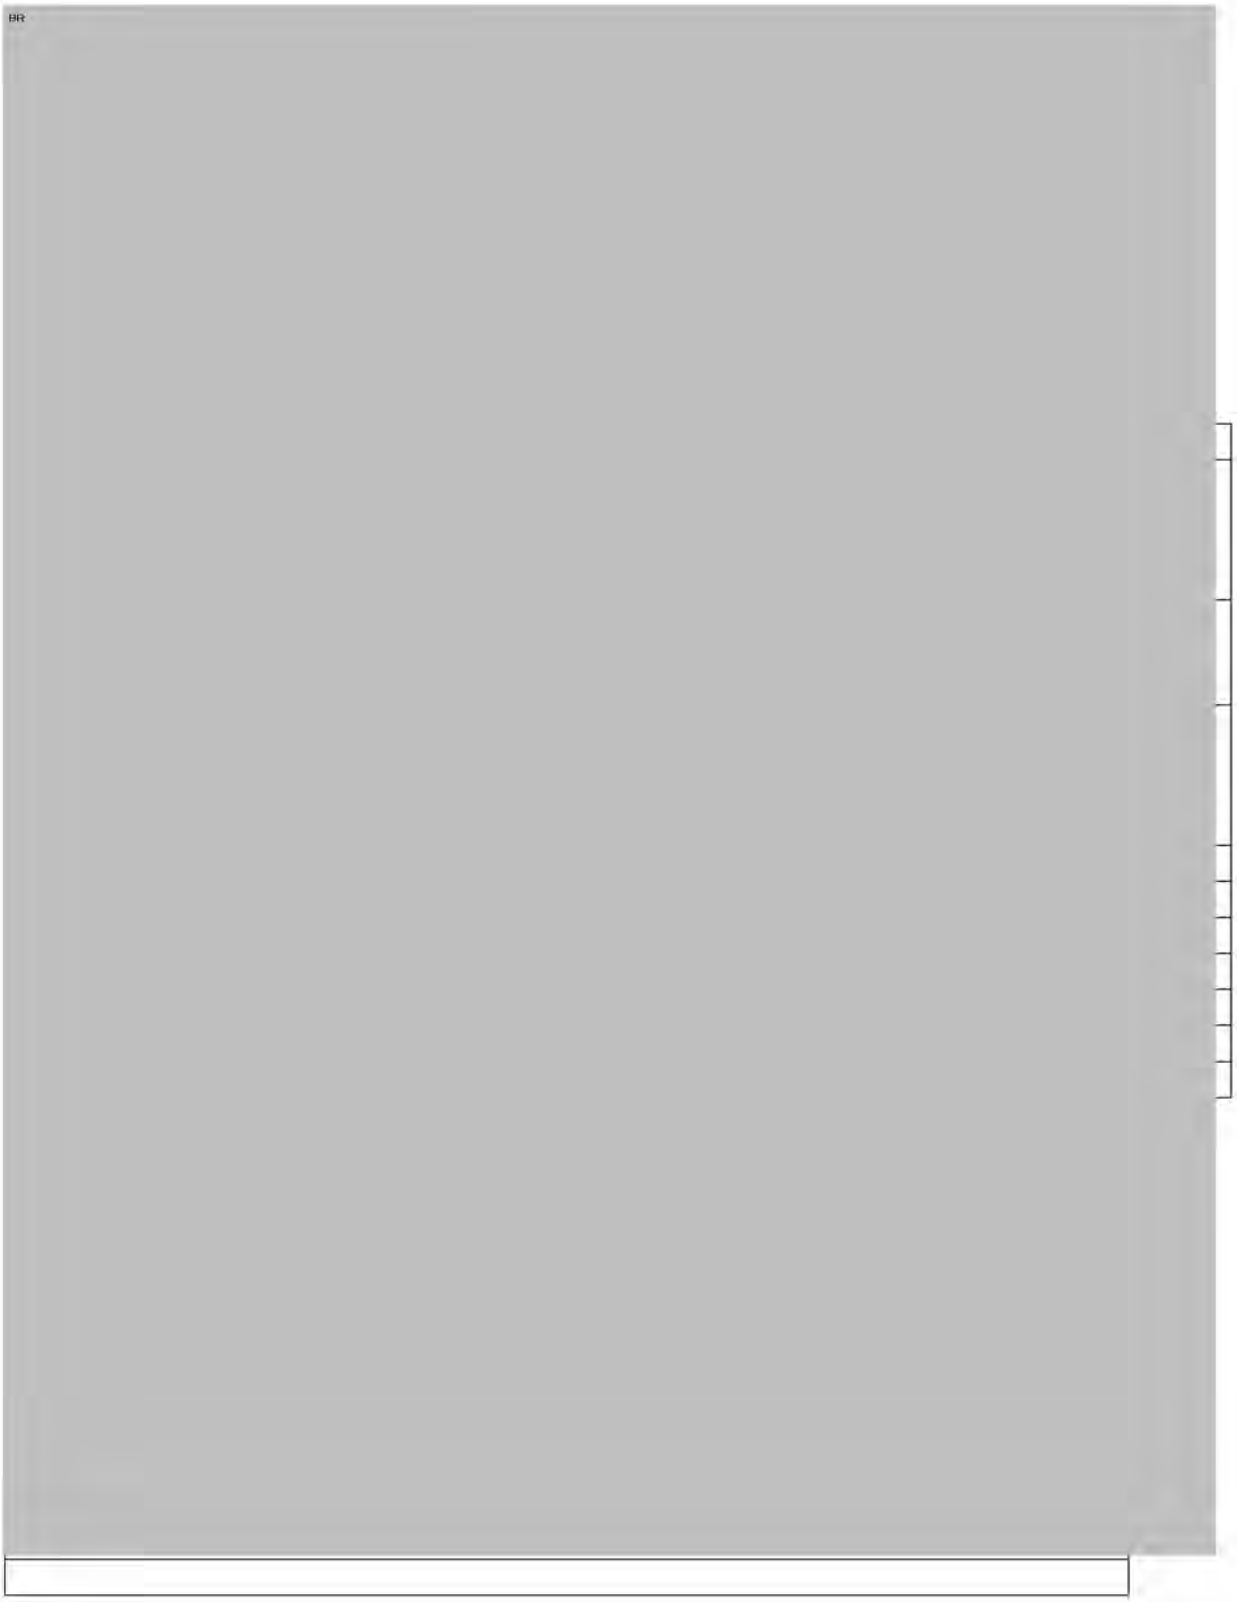
BR

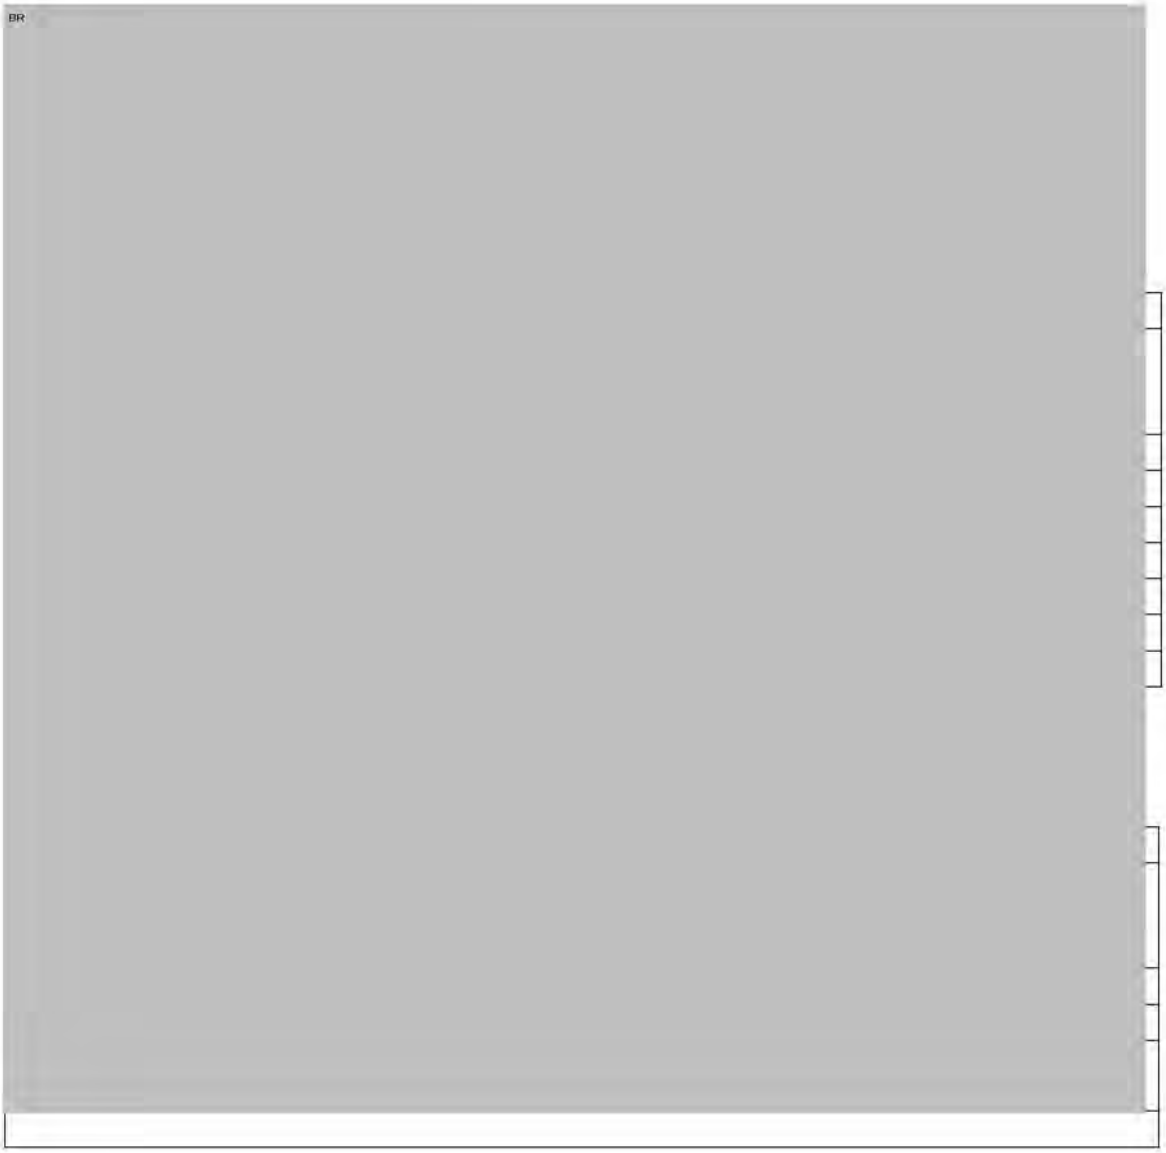
BR

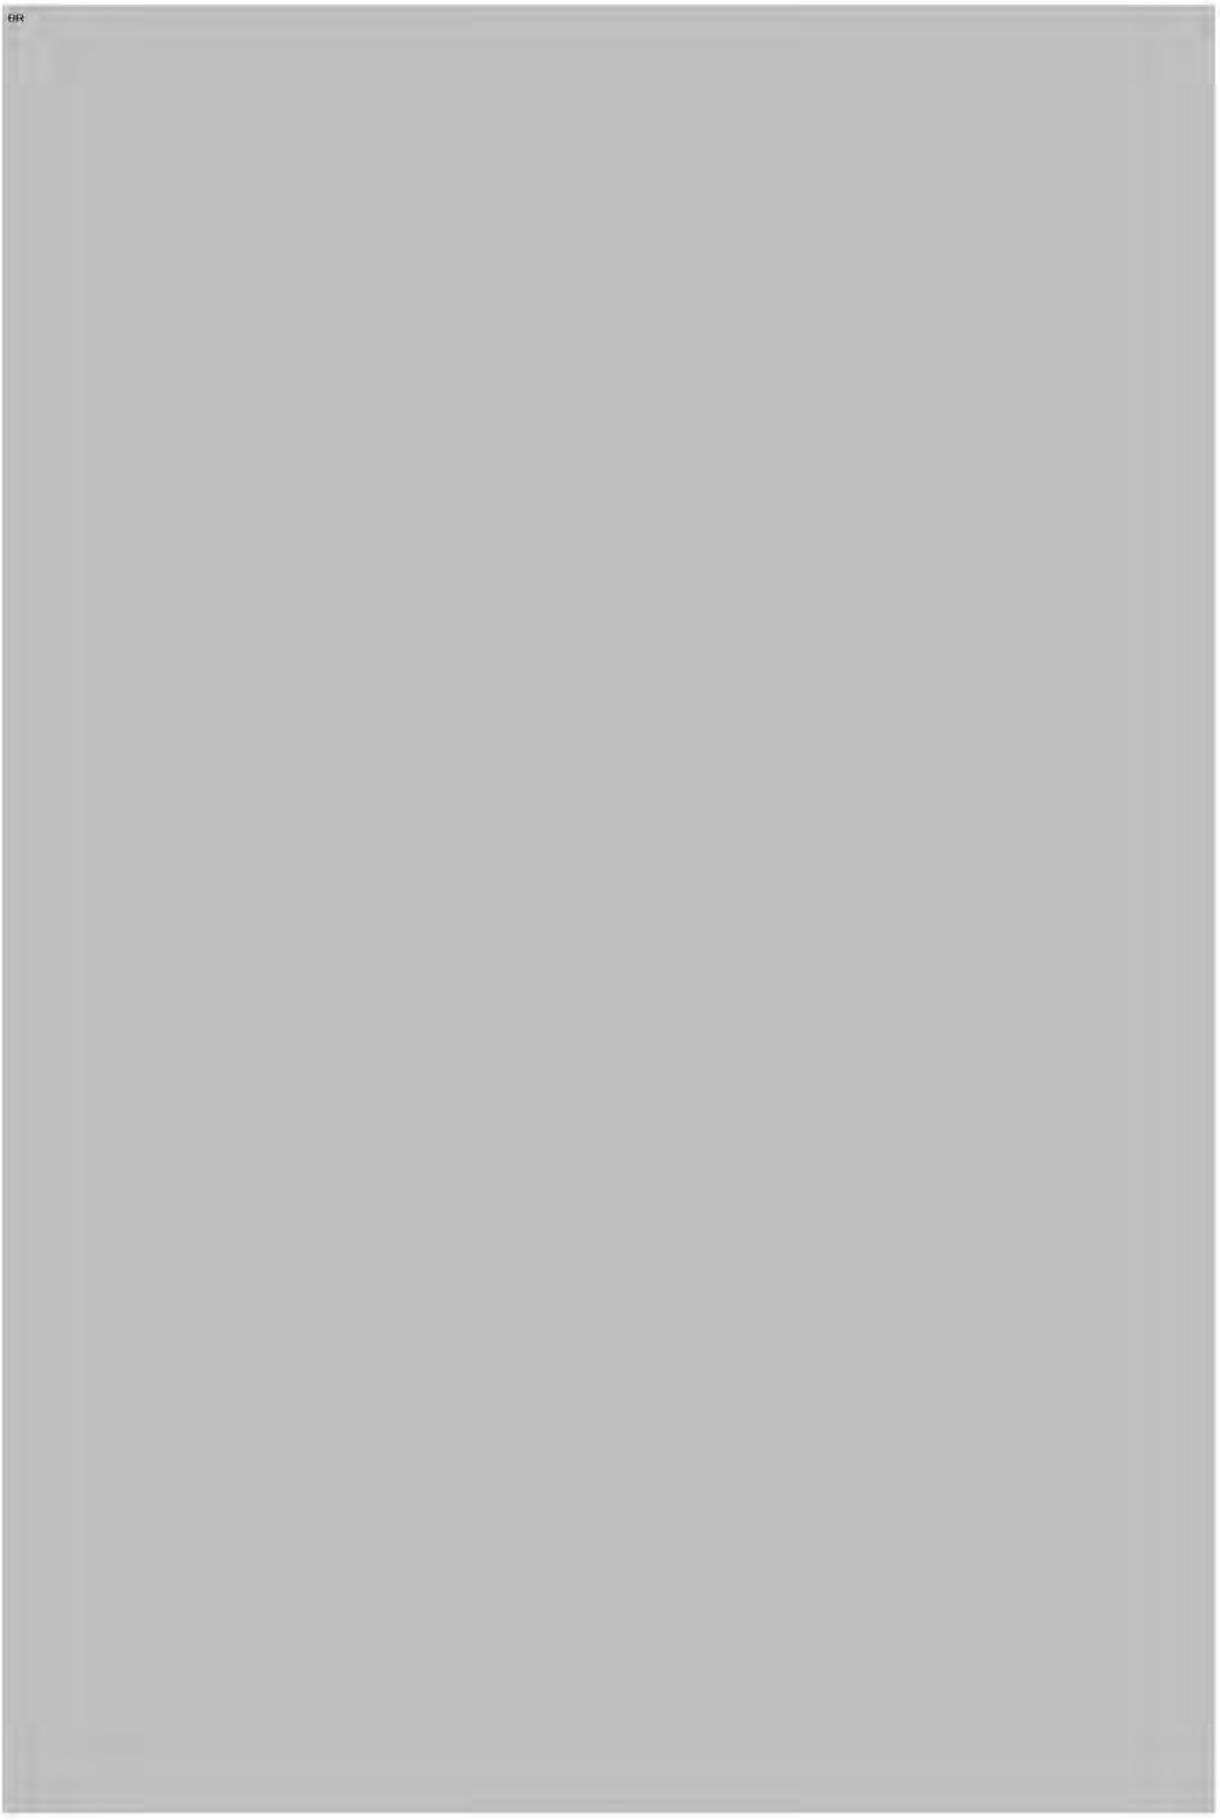
BR

| | | |
|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 |
| 3.4 Bijdrage Prov. Zuid-Holland Molenvlietpark | pm. | pm. |

Docnr11

## 5.3 Planning

Zie tevens de bijlage 'Planningsmijlpalen' (hoofdstuk 6)

### 5.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Planning 2e toevoer waterberging Molenvlietpark nader uitwerken | Dit dient nog plaats te vinden in afwachting van akkoord stakeholders met het ontwerp. |
| | |
| [redacted] | |

### 5.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| [redacted] |
| Planning 2e toevoer waterberging Molenvlietpark nader uitwerken |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |

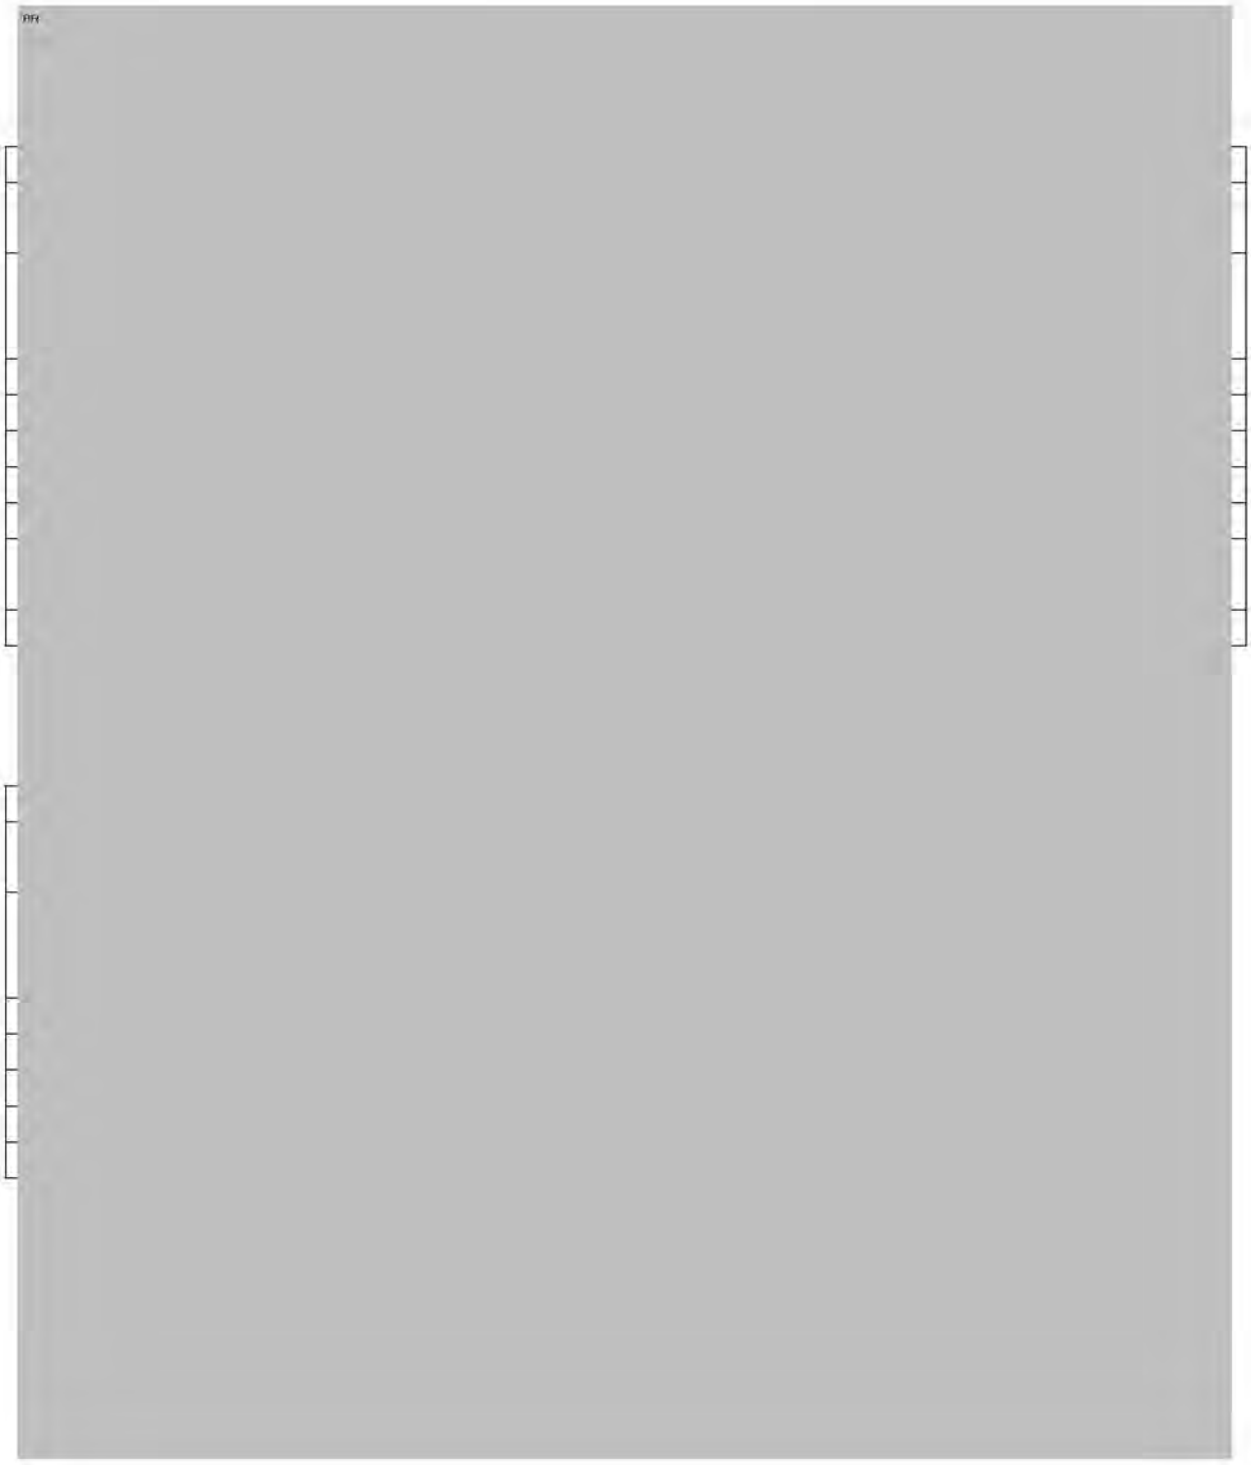

**Huidige toprisico's:**

| Rang | Omschrijving | Beheersing | Vorige rang |
|---|---|---|---|
| | BR | | |
| 3. | BP wijzigingen (Binckhorstlaan-zuid, Molenvlietpark) worden niet ongewijzigd vastgesteld, waardoor het aangeboden ontwerp niet past. | Risico is naar beneden bijgesteld. Vaststelling BP heeft wel een verzoek tot wijziging richting CRB tot gevolg. | 2 |
| | BR | | |

**Buiten de top gevallen risico's:**

| Risnr. | Omschrijving | Reden wegvallen uit top | Vorige rang |
|---|---|---|---|
| 549 | Vertraging/stagnatie aannemer vanwege vertragingen in Bestemmingsplanprocedures (Molenvlietpark e.o., wijziging Binckhorst) | Bestemmingsplannen zijn volgens planning vastgesteld, er heeft zich dus geen vertraging voorgedaan. | 7 |

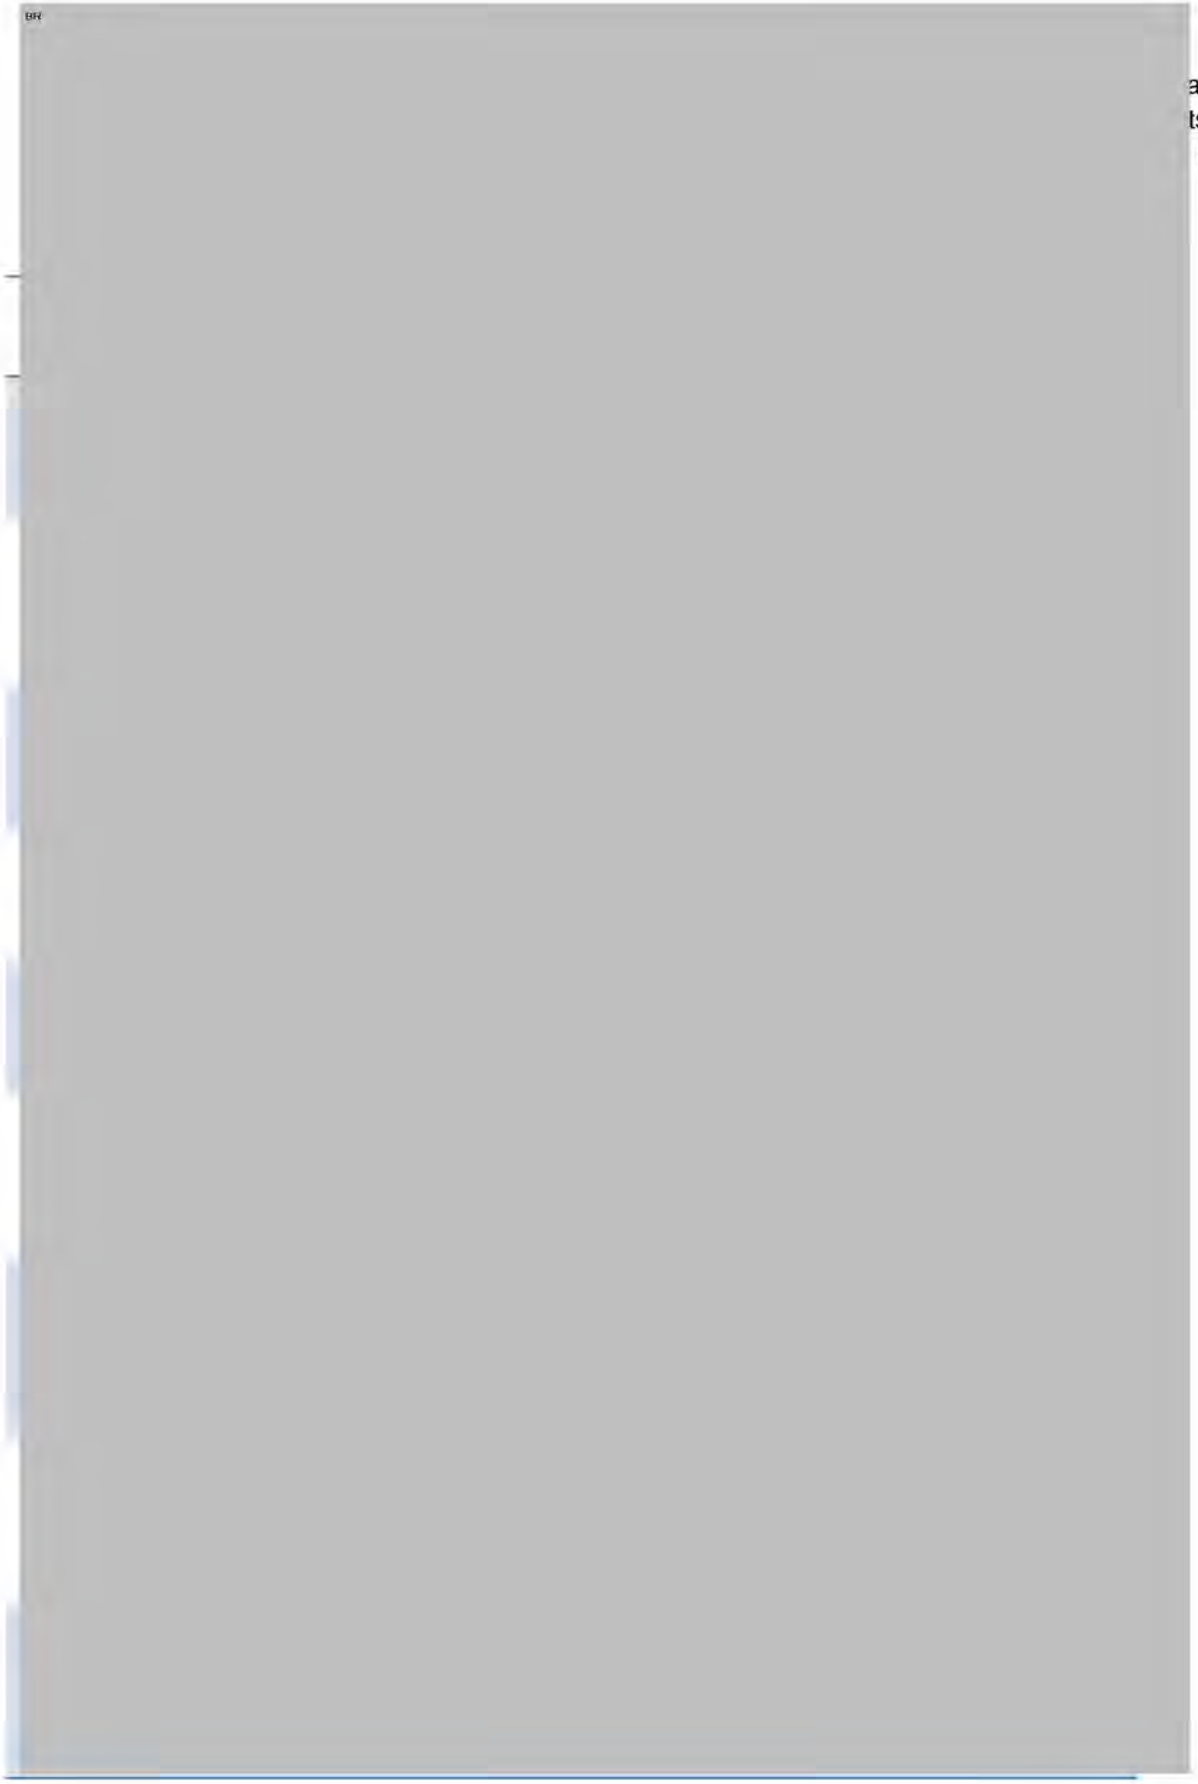

aan
tste
de




**Buiten de top gevallen risico's:**

| Omschrijving | Reden wegvallen uit top | Vorig rang |
|---|---|---|
| O.b.v. zienswijze BP Molenvlietpark e.o. wordt beroep aangetekend met schorsende werking. | Risico is gesloten, er is geen beroep ingediend. | 2 |

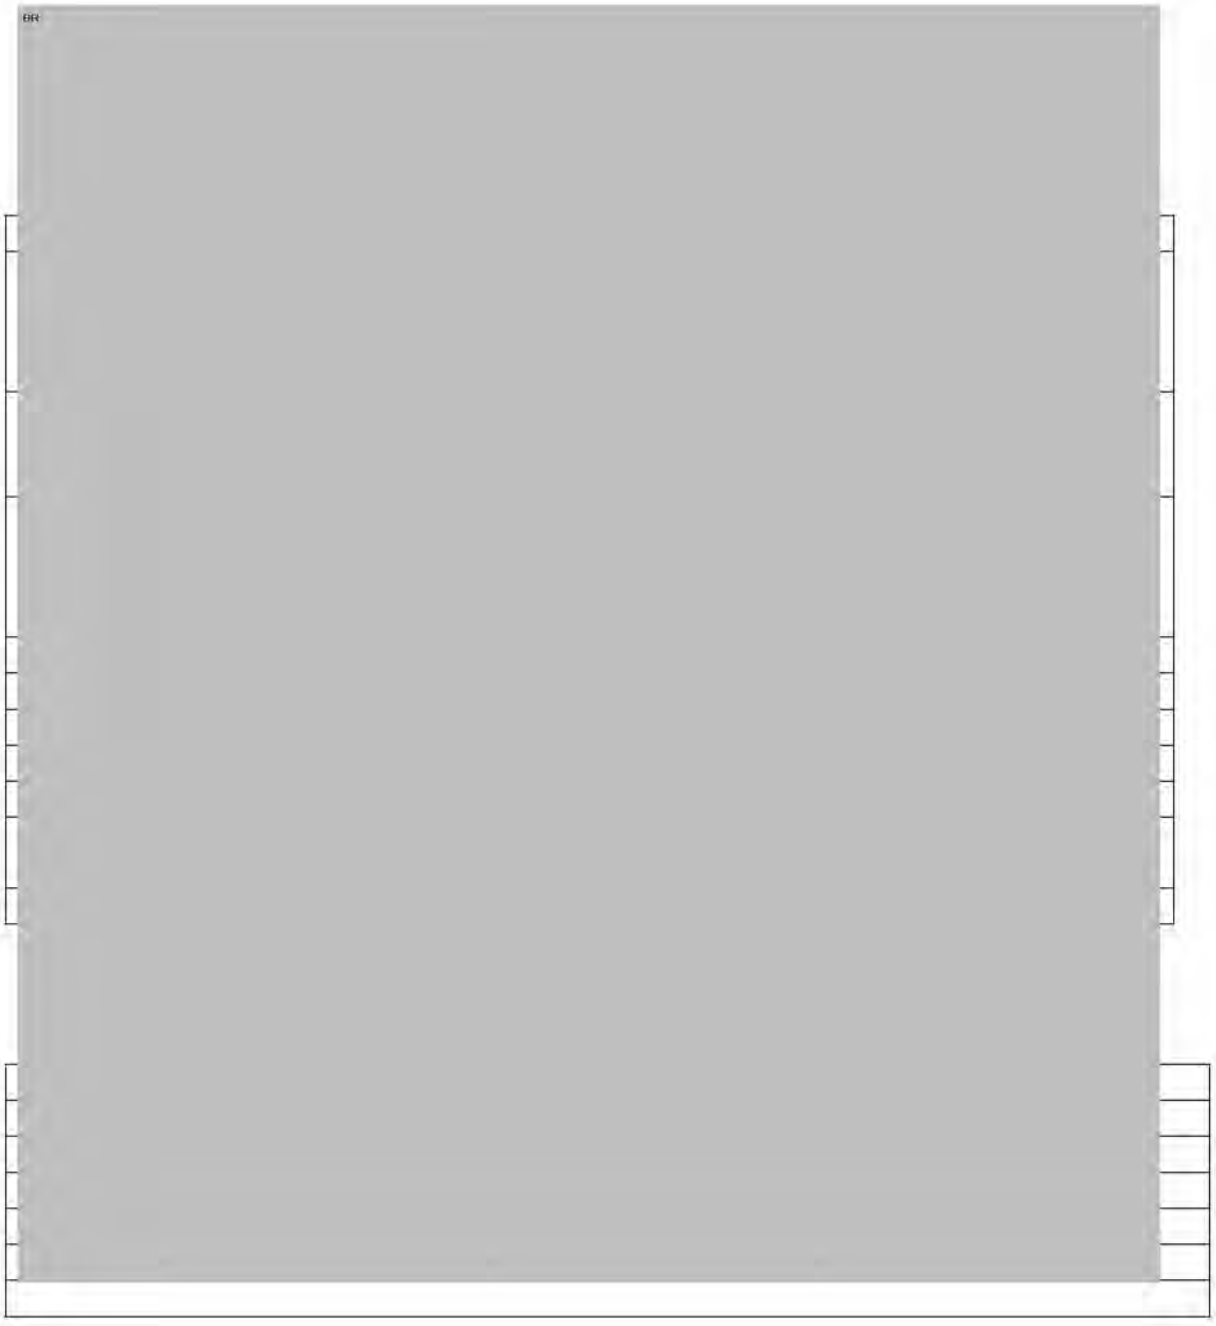

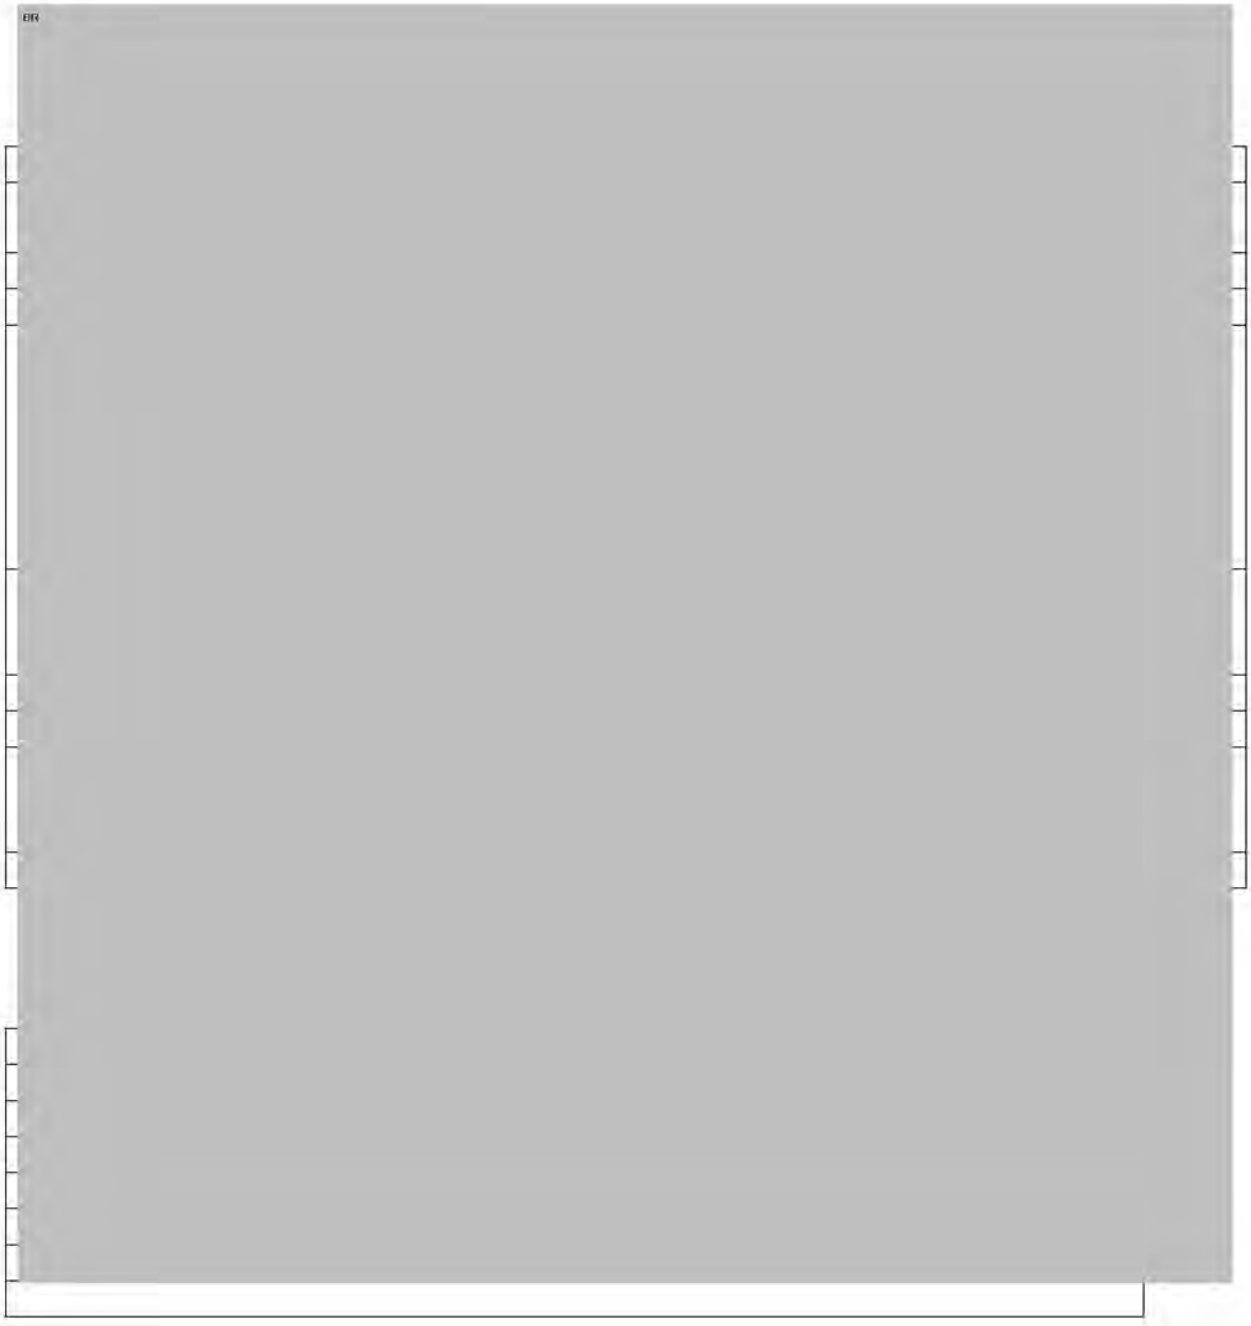
BR

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM REVISIE C (VIGEREND HEDEN) | VERSCHIL (weken) REV. C T.O.V. BASELINE PLANNING (mrt 2016) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|
| BR | | | | |
| **13** | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | -5 | Als gevolg van de eerdere boorstart. |
| BR | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen binnen het projectgebied**

Docnr11

Docnr11

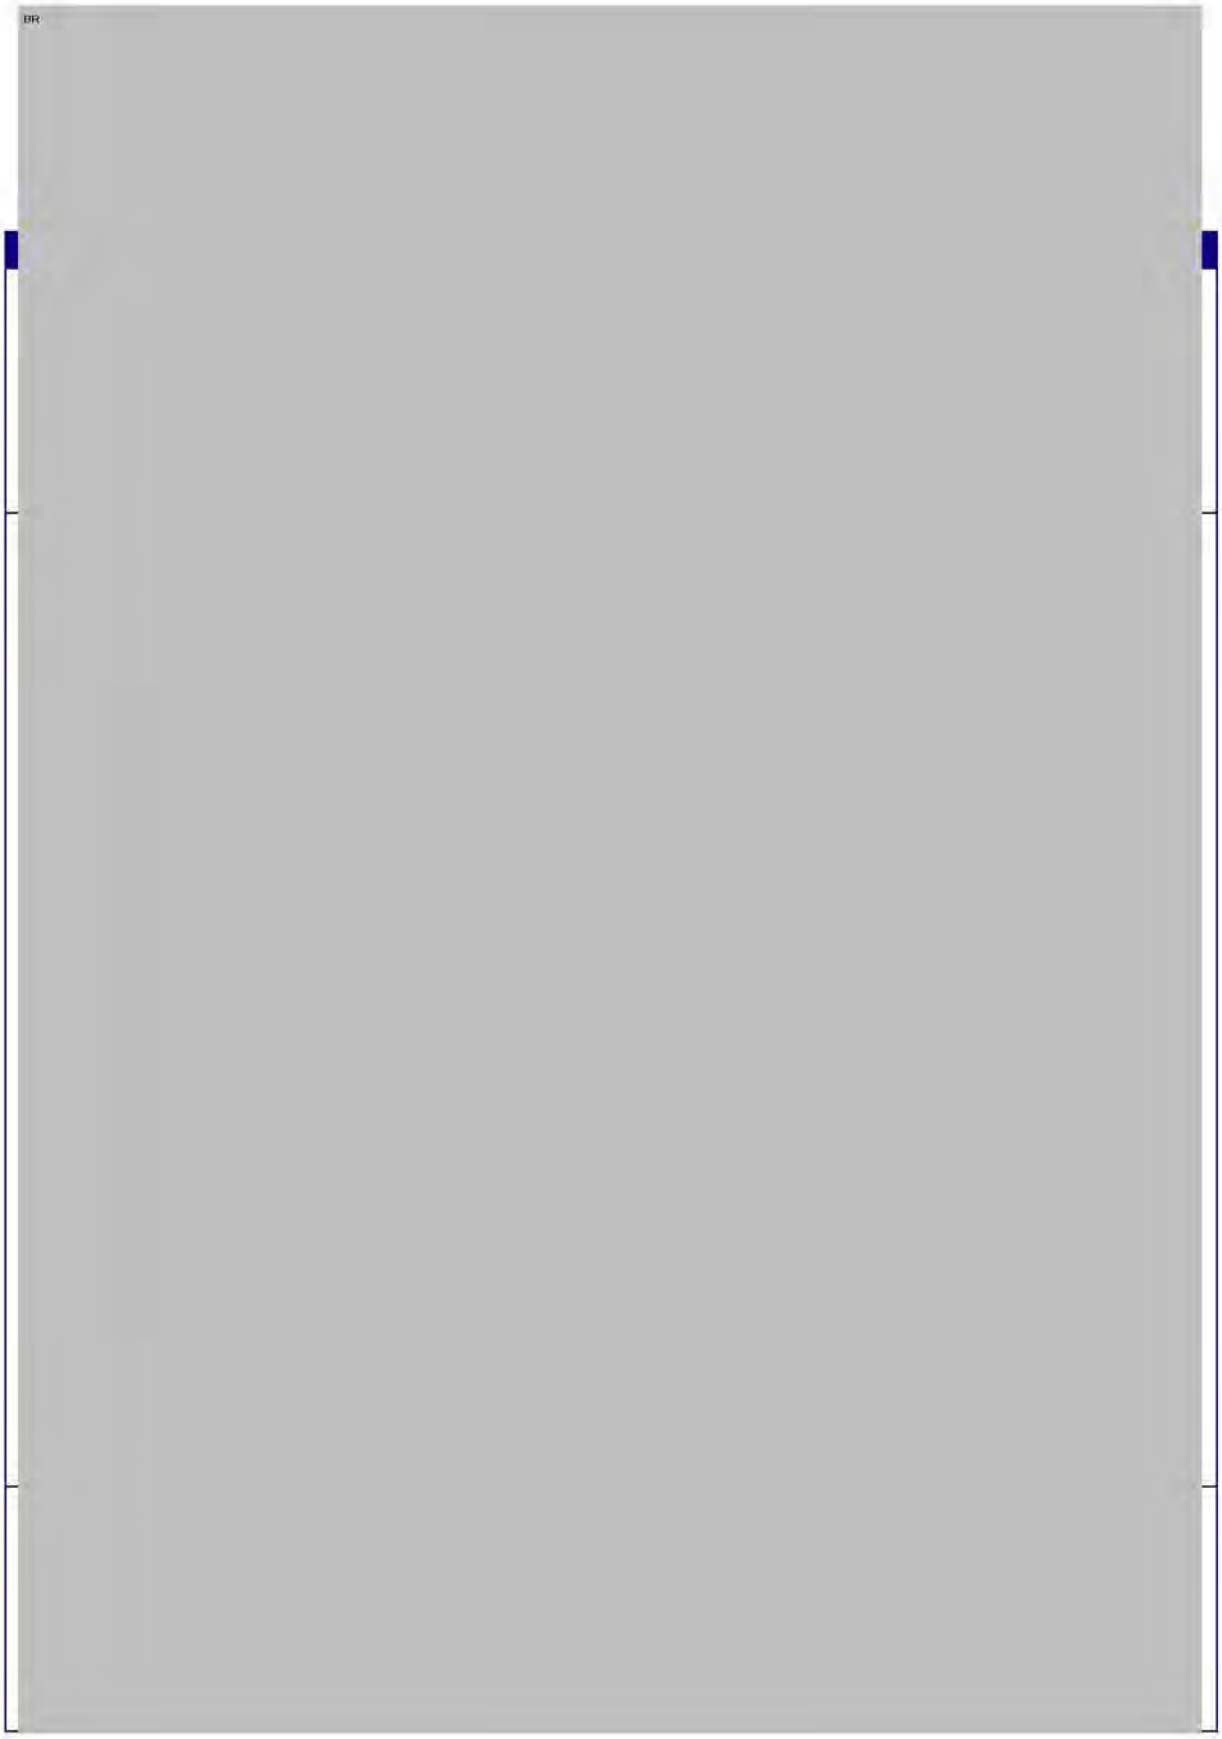
BR

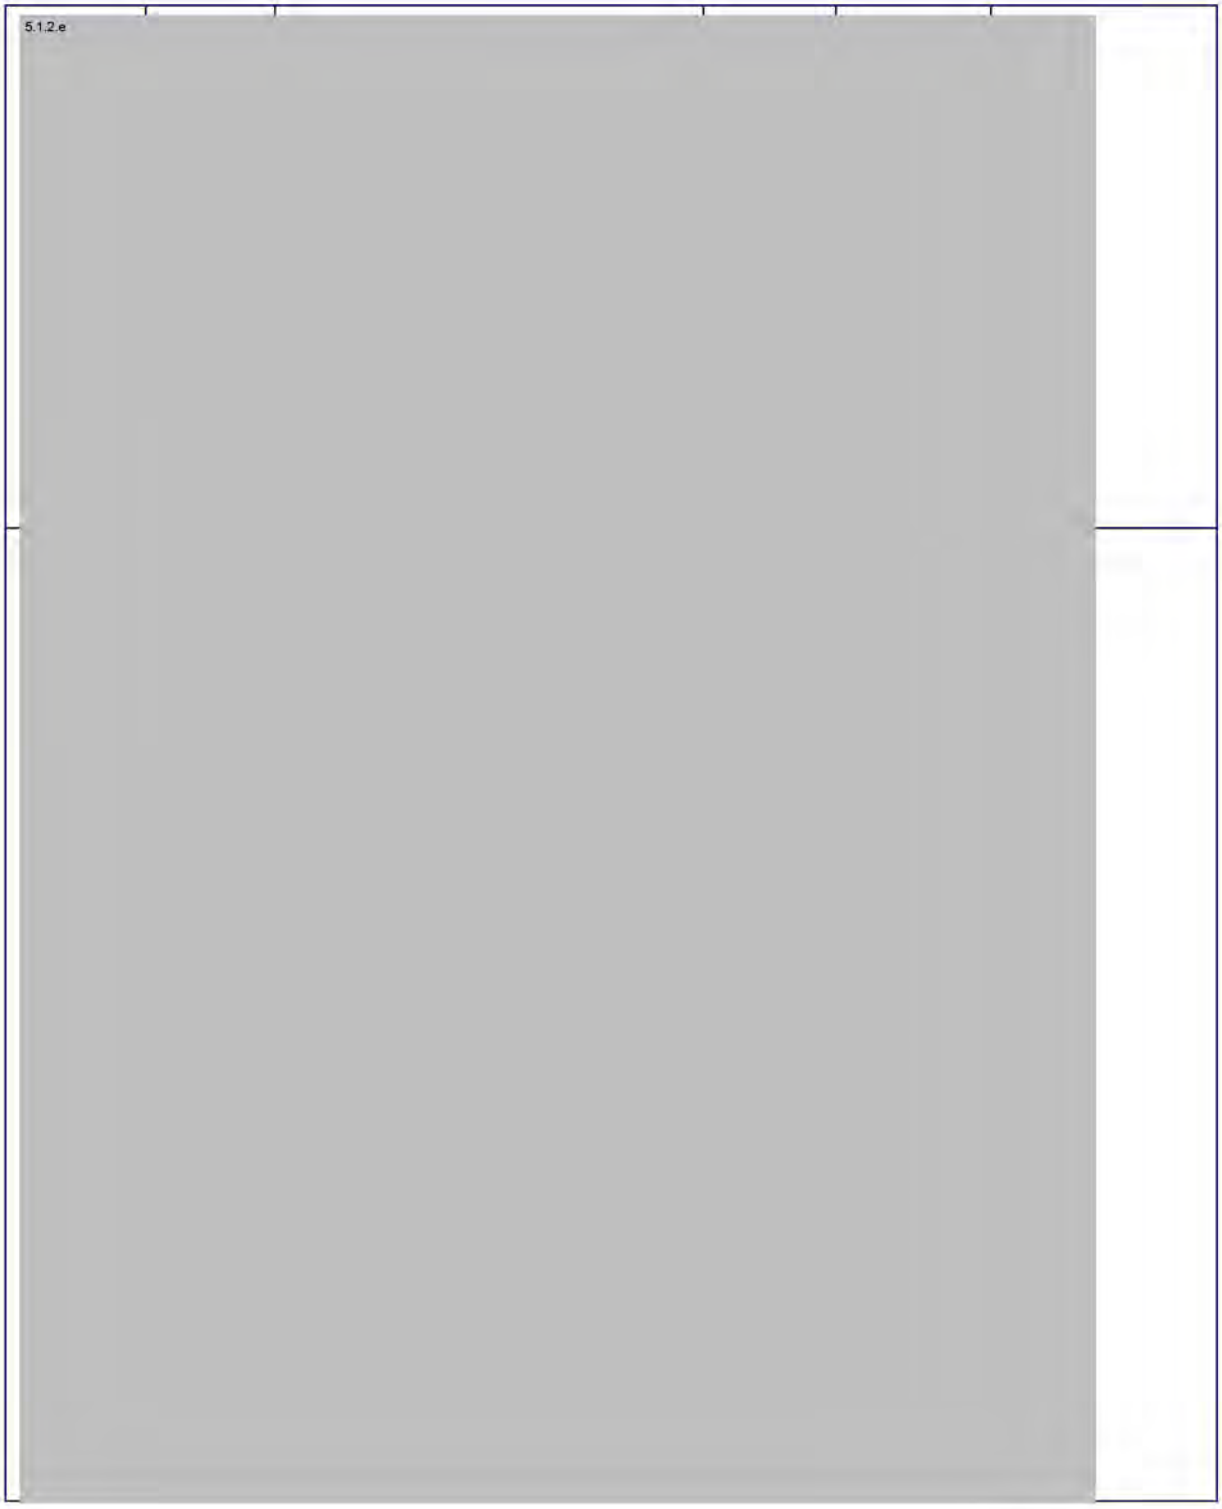
5.1.2.e

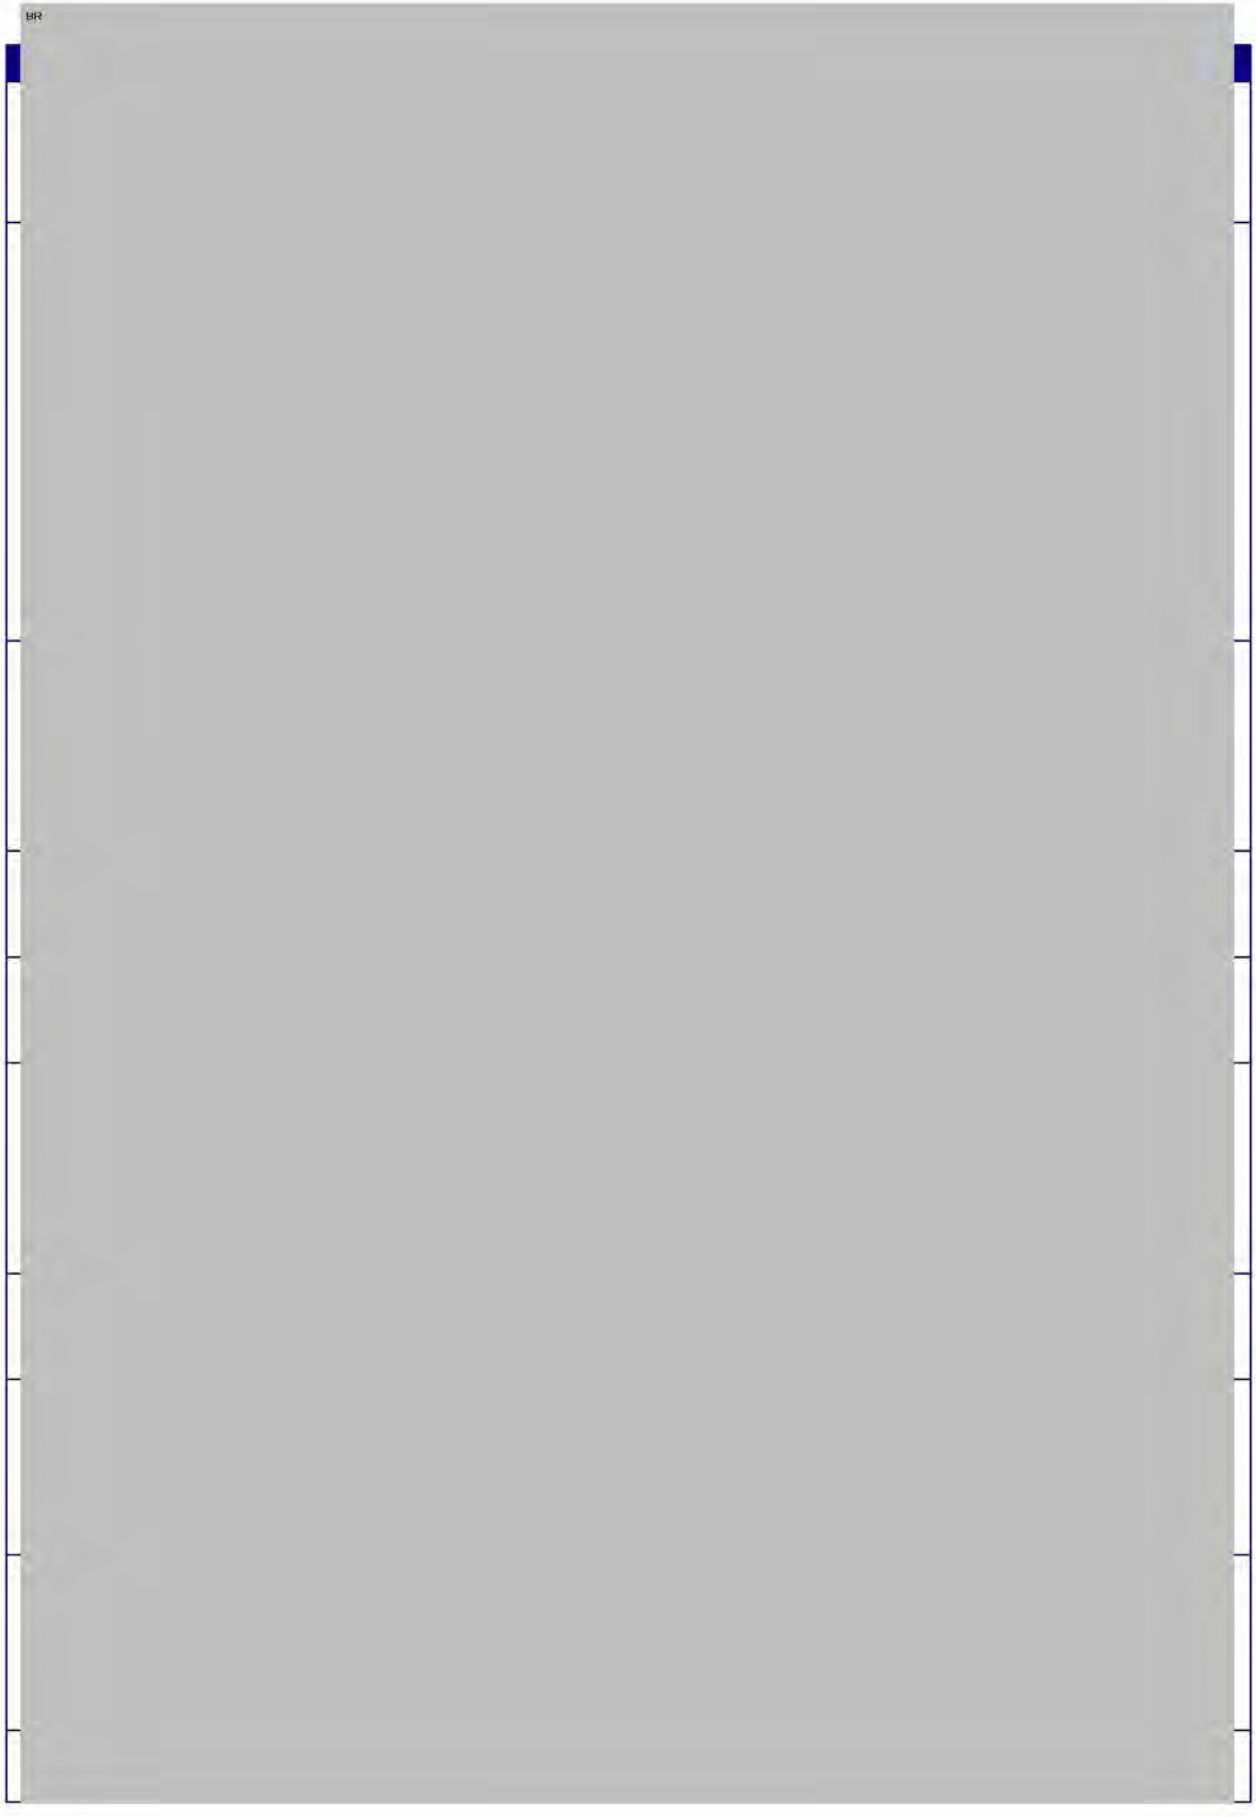

BR

Docnr11



Docnr12

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 3e kwartaal 2016

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 24 oktober 2016**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

Docnr12

Docnr12



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 3e kwartaal 2016
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004356

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd:** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>14 oktober 2016 | Versie 0.1<br>17 oktober 2016 | Versie 1.0<br>19 oktober 2016 | Versie 2.0<br>24 oktober 2016 | Versie 2.0<br>3 november2016 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder BSKB / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr12



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

*1.1 Projectgegevens* 5

*1.2 Algemeen* 5

*1.3 Toelichting beheersmaatregelen* 5

*1.4 Terugblik afgelopen kwartaal* 6

*1.5 Verwachting komende kwartaal* 6

*1.6 Financien* 7

*1.7 Planning* 7

*1.8 Risico's* 7

*1.9 Bestuurlijke besluitvorming komende periode* 7

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* 8

2.1.1 Afgelopen kwartaal 8

2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie* 10

2.2.1 Afgelopen kwartaal 10

2.2.2 Komende kwartaal 10

*2.3 Vergunningen* 11

2.3.1 Afgelopen kwartaal 11

2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Verwervingen* 12

2.4.1 Afgelopen kwartaal 12

2.4.2 Komende kwartaal 12

*2.5 Overeenkomsten* 13

2.5.1 Afgelopen kwartaal 13

2.5.2 Komende kwartaal 13

*2.6 Communicatie* 14

2.6.1 Afgelopen kwartaal 14

2.6.2 Komende kwartaal 15

2.6.3 Diversen 15

3 Projectvoortgang 16

*3.1 Aanbesteden en contracteren* 16

3.1.1 Afgelopen kwartaal 16

3.1.2 Komende kwartaal 16

*3.2 Vormgeving* 17

3.2.1 Afgelopen kwartaal 17

3.2.2 Komende kwartaal 17

*3.3 Monitoring* 18

3.3.1 Afgelopen kwartaal 18

3.3.2 Komende kwartaal 18

*3.4 Inpassing Binckhorst* *19*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 19
3.4.2 Komende kwartaal 19

*3.5 Inpassing Vlietzone* *21*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 21
3.5.2 Komende kwartaal 22

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* *23*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 23
3.6.2 Komende kwartaal 23

*3.7 Boortunnel en toeritten* *24*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 24
3.7.2 Komende kwartaal 25

*3.8 Verdiepte ligging Ypenburg* *26*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 26
3.8.2 Komende kwartaal 26

*3.9 Installaties* *27*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 27
3.9.2 Komende kwartaal 27

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *28*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 28
3.10.2 Komende kwartaal 28

*3.11 Uitvoeringskwaliteit* *29*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 29
3.11.2 Komende kwartaal 29

*3.12 Contractmanagement* *30*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 30
3.12.2 Komende kwartaal 30

4 Overdracht en openstelling 31

*4.1 Tunnelveiligheid* *31*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 31
4.1.2 Komende kwartaal 31

*4.2 Overdracht aan beheerders* *32*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 32
4.2.2 Komende kwartaal 32

*4.3 Beheer en onderhoud* *33*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 33
4.3.2 Komende kwartaal 33

5 Projectbeheersing 34

*5.1 Scope* *34*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 34
5.1.2 Komende kwartaal 34

*5.2 Financien* *35*
5.2.1 Kostenstructuur 35

Docnr12



5.2.2 Dekkingen 36

*5.3 Planning* *38*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 38
5.3.2 Komende kwartaal 38

*5.4 Risico's* *39*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 39
5.4.2 Komende kwartaal 39
5.4.3 Financiële toprisico's 40
5.4.4 Toprisico's planning 41

*5.5 Interne kwaliteit* *43*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 43
5.5.2 Komende kwartaal 43

*5.6 Informatiebeheer* *44*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 44
5.6.2 Komende kwartaal 44

*5.7 Organisatie* *45*
5.7.1 Afgelopen kwartaal 45
5.7.2 Komende kwartaal 45

6 Bijlage: Planningsmijlpalen 46

7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 47

8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 49

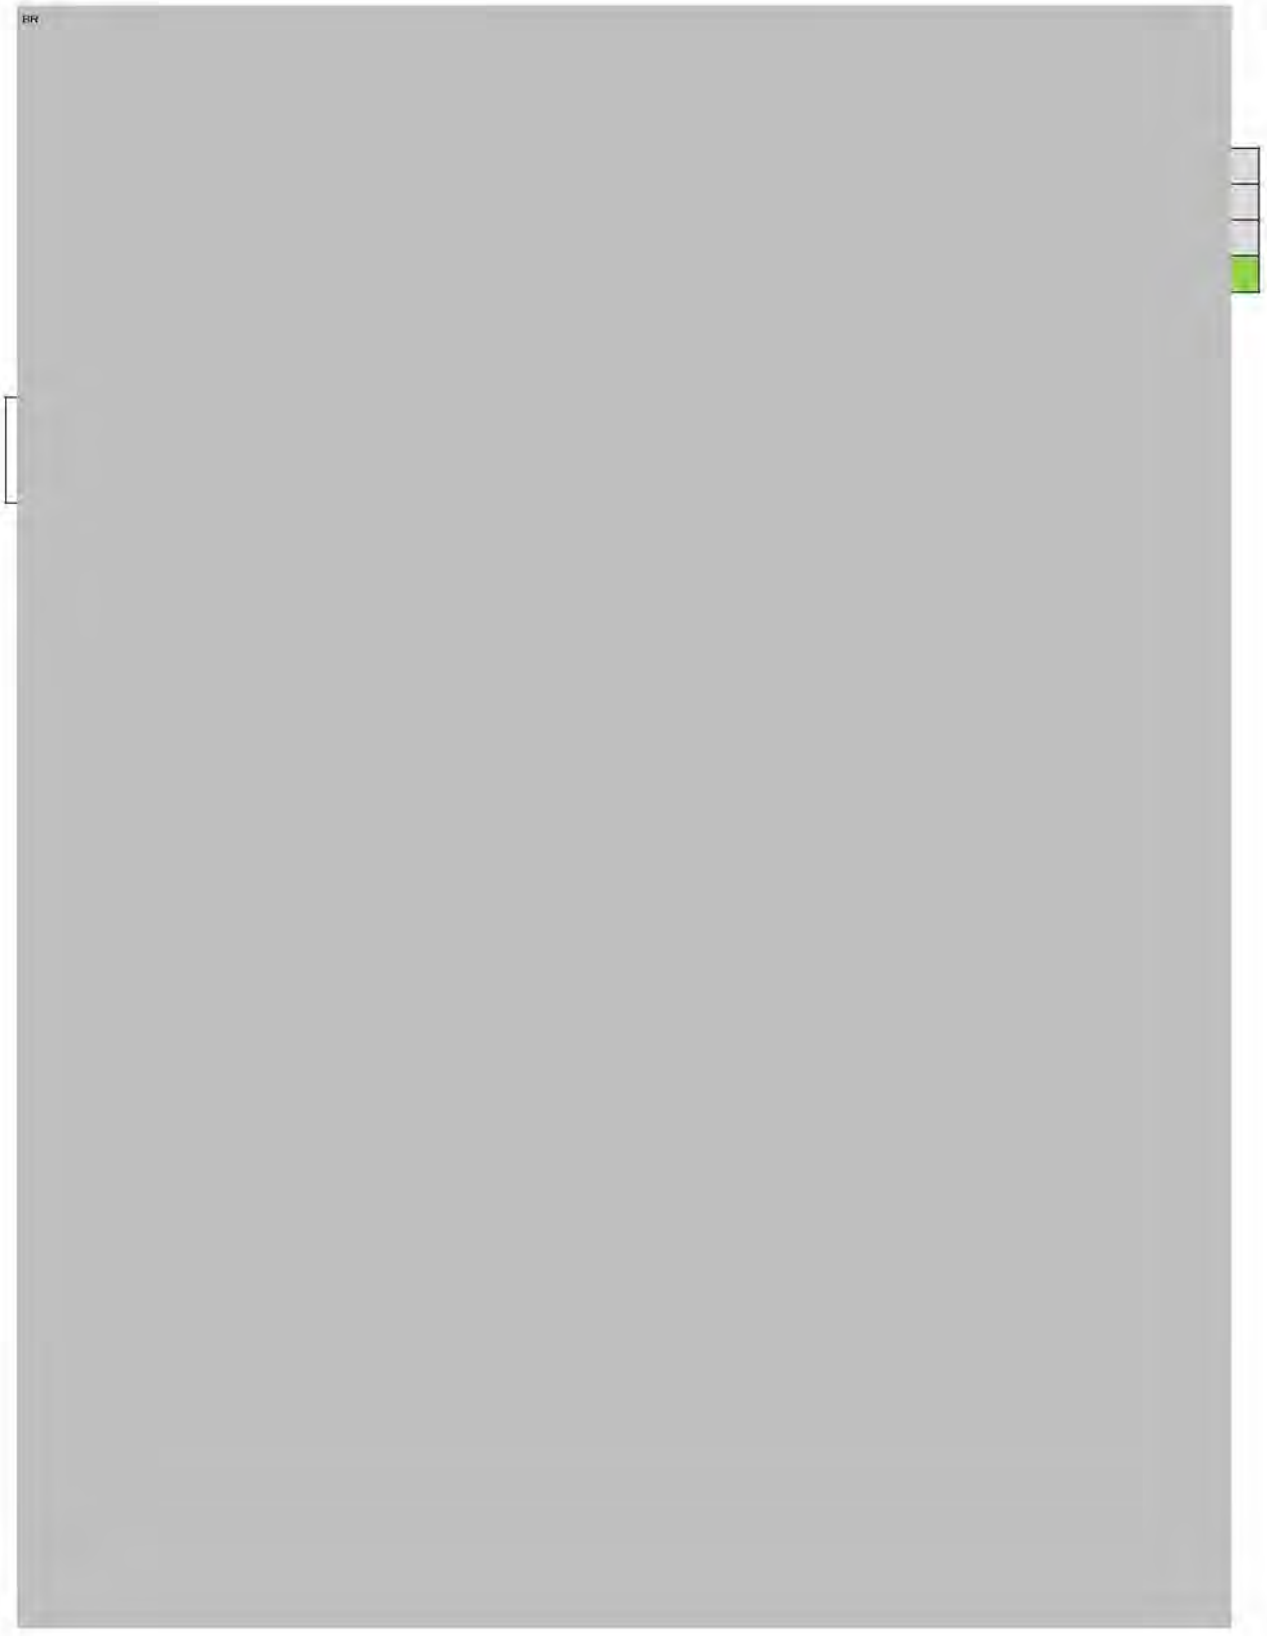

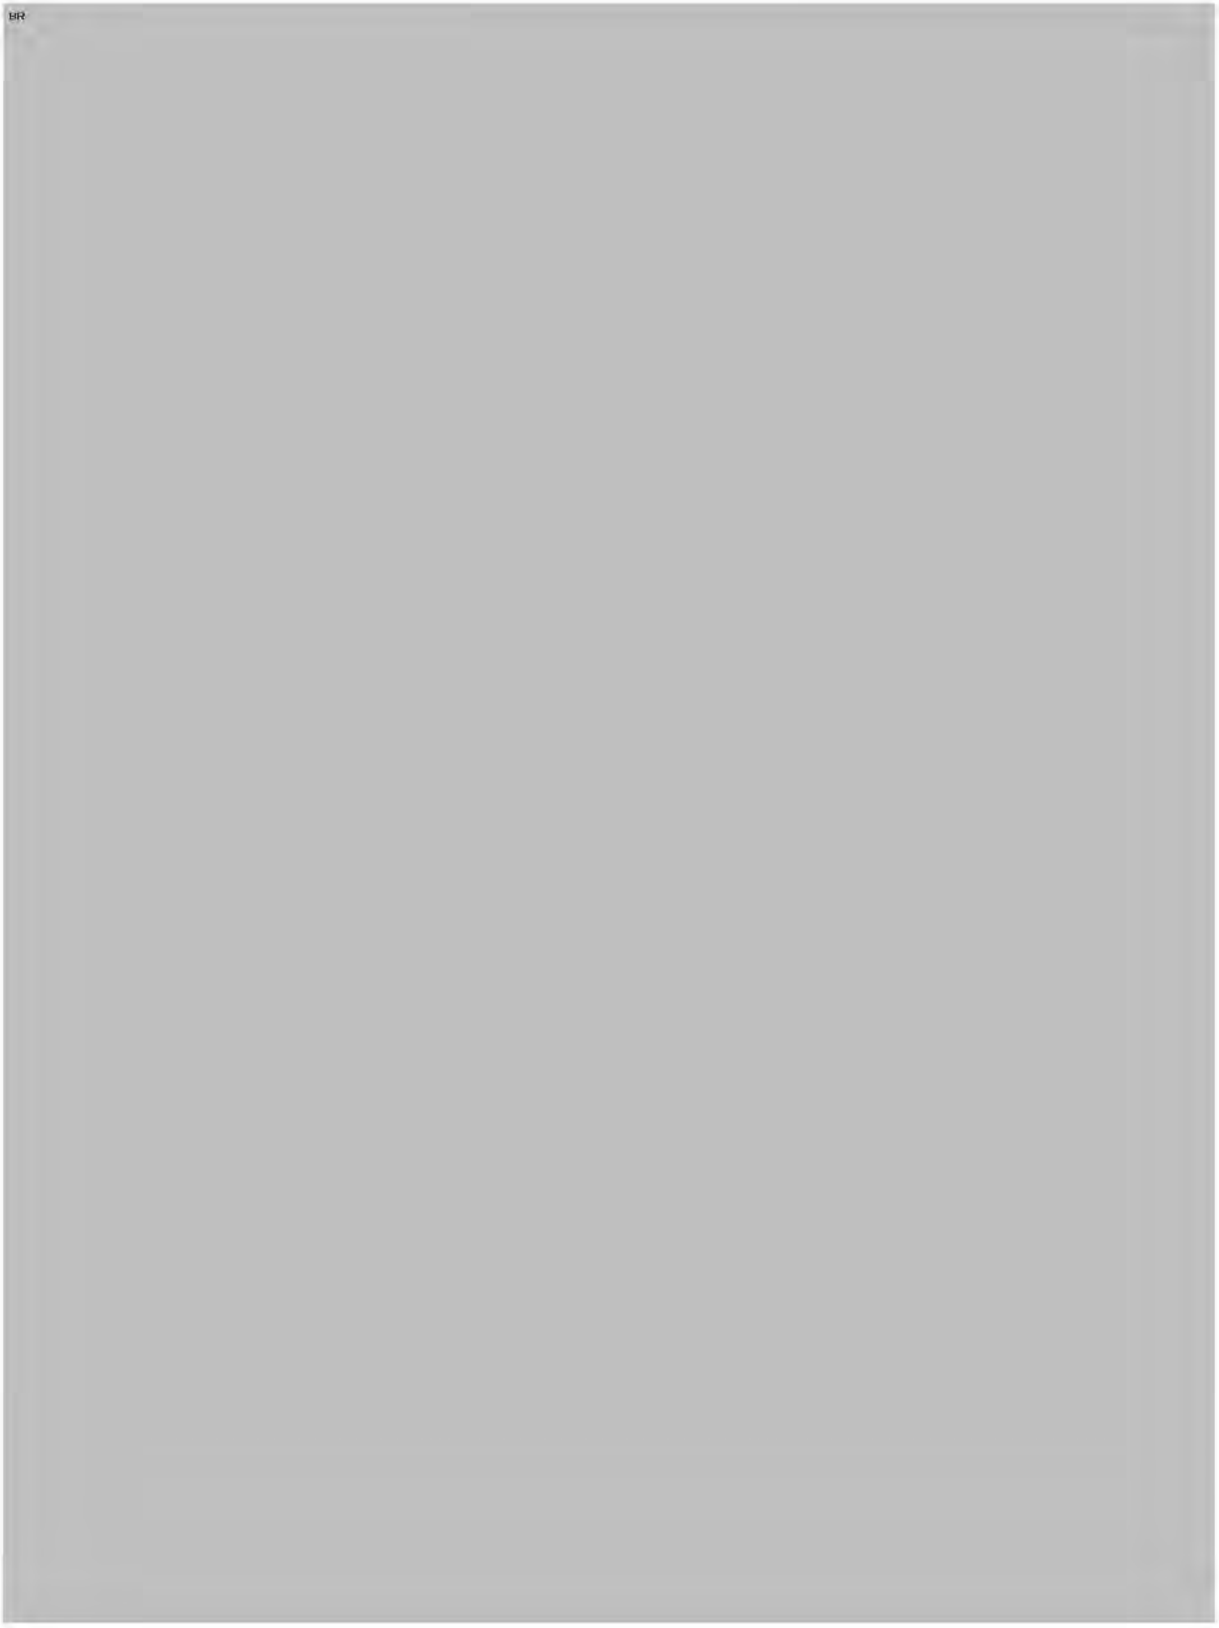
BR

## 1.9 Bestuurlijke besluitvorming komende periode

Het College B&W zal verzocht worden een besluit te nemen over de samenwerkingsovereenkomst met [redacted] t.a.v. waterinlaat van Zuidvliet naar de calamiteitenberging in het Molenvlietpark tezamen met Project Uitvoeringskader ontwikkeling Nieuw Vredenoord en overeenkomst grondruil. (4e kwartaal 2016).

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| | |
| Afronden overeenkomst 5.1.2e t.a.v. inlaat waterberging Molenvlietpark over zijn gronden. | Inmiddels is het ontwerp in overleg met het Hoogeheemraadschap aangepast. Op hoofdlijnen is hierover consensus met dhr. 5.1.2e De consequenties t.a.v. de eerdere afspraken (concept overeenkomst) zijn grotendeels in beeld gebracht. |
| Alsnog overeenstemming zien te bereiken met fam. 5.1.2e t.a.v. de waterinlaat naar de waterberging Molenvlietpark, verlegging Molenslootpad en evt. aanpassing brug nadat overeenstemming met 5.1.2e is bereikt. | De onderhandeling met 5.1.2e worden aangehouden tot het moment dat er definitieve overeenstemming (met 5.1.2e ) is bereikt over aangepast ontwerp aangaande de waterinlaat van de Vliet naar het Molenvlietpark. |
| BR | |
| | |

### 2.1.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| [redacted] |
| Afronden overeenkomst 5.1.2.e t.a.v. inlaat waterberging Molenvlietpark over zijn gronden op basis van het aangepaste ontwerp. |
| Alsnog overeenstemming zien te bereiken met 5.1.2.e t.a.v. de waterinlaat naar de waterberging Molenvlietpark en de verlegging van het Molenslootpad, waarbij de aanpassing (verhoging) van de brug geen issue meer is. |
| [redacted] |
| |
| **Besluiten** |
| Collegebesluit aangaande overeenkomst met 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark in relatie tot de ontwikkeling Nieuw Vredenoord. Geplande besluitvorming vooralsnog 4e kwartaal 2016. Na besluitvorming zal de verdere afhandeling (faciliteren) van de ontwikkeling Nieuw Vredenoord door DSO worden opgepakt. |
| |

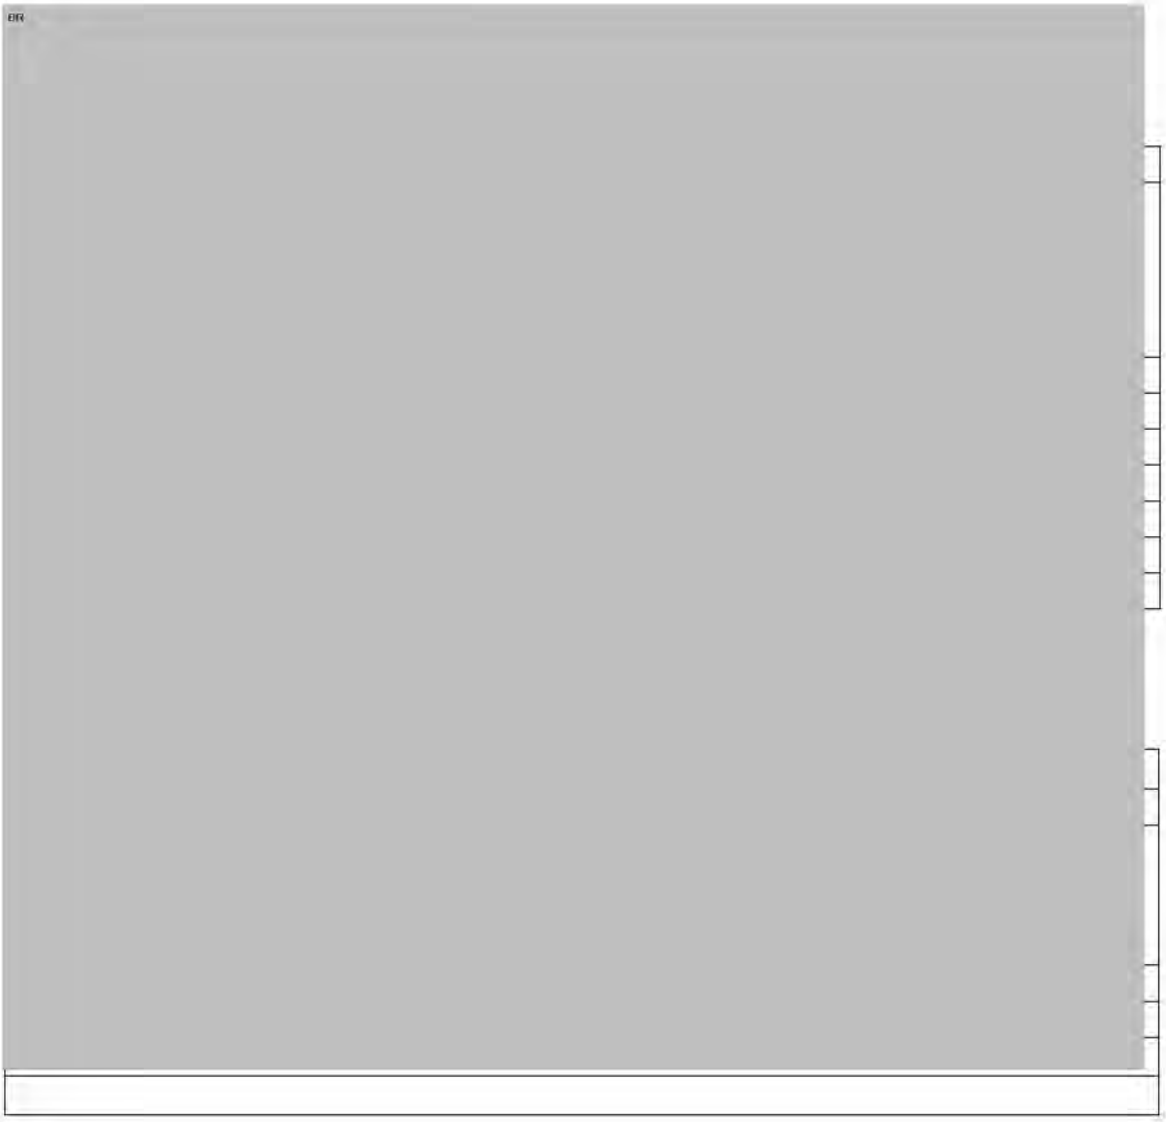

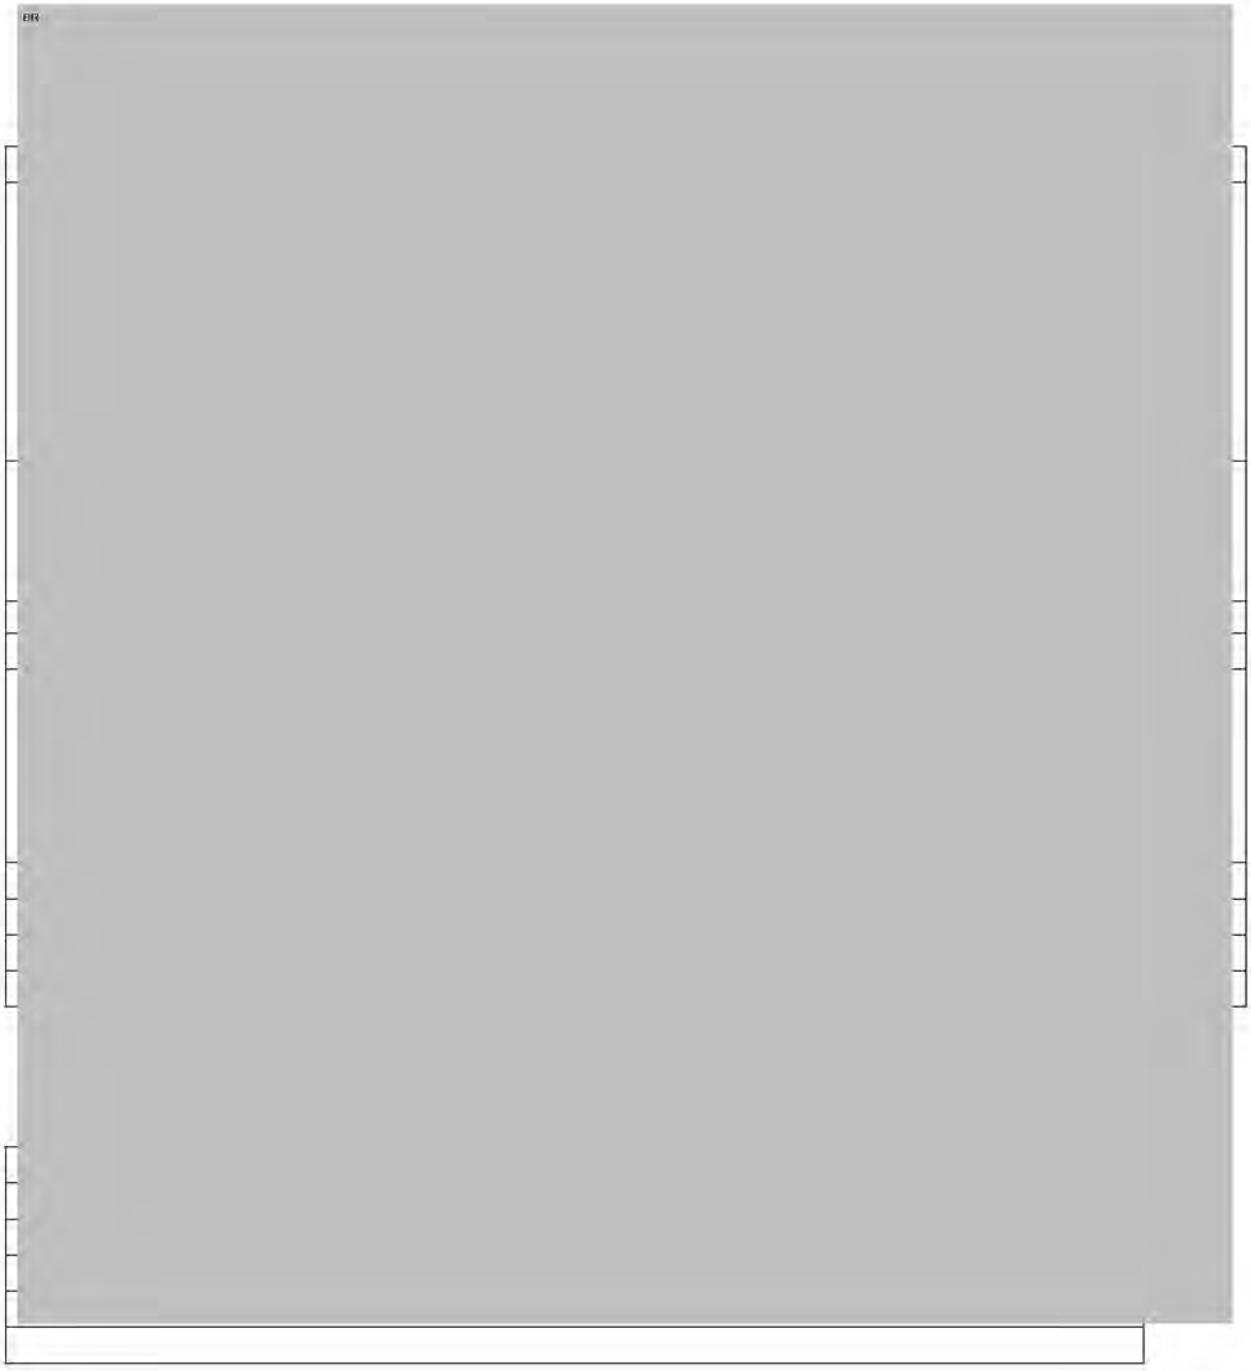
BR

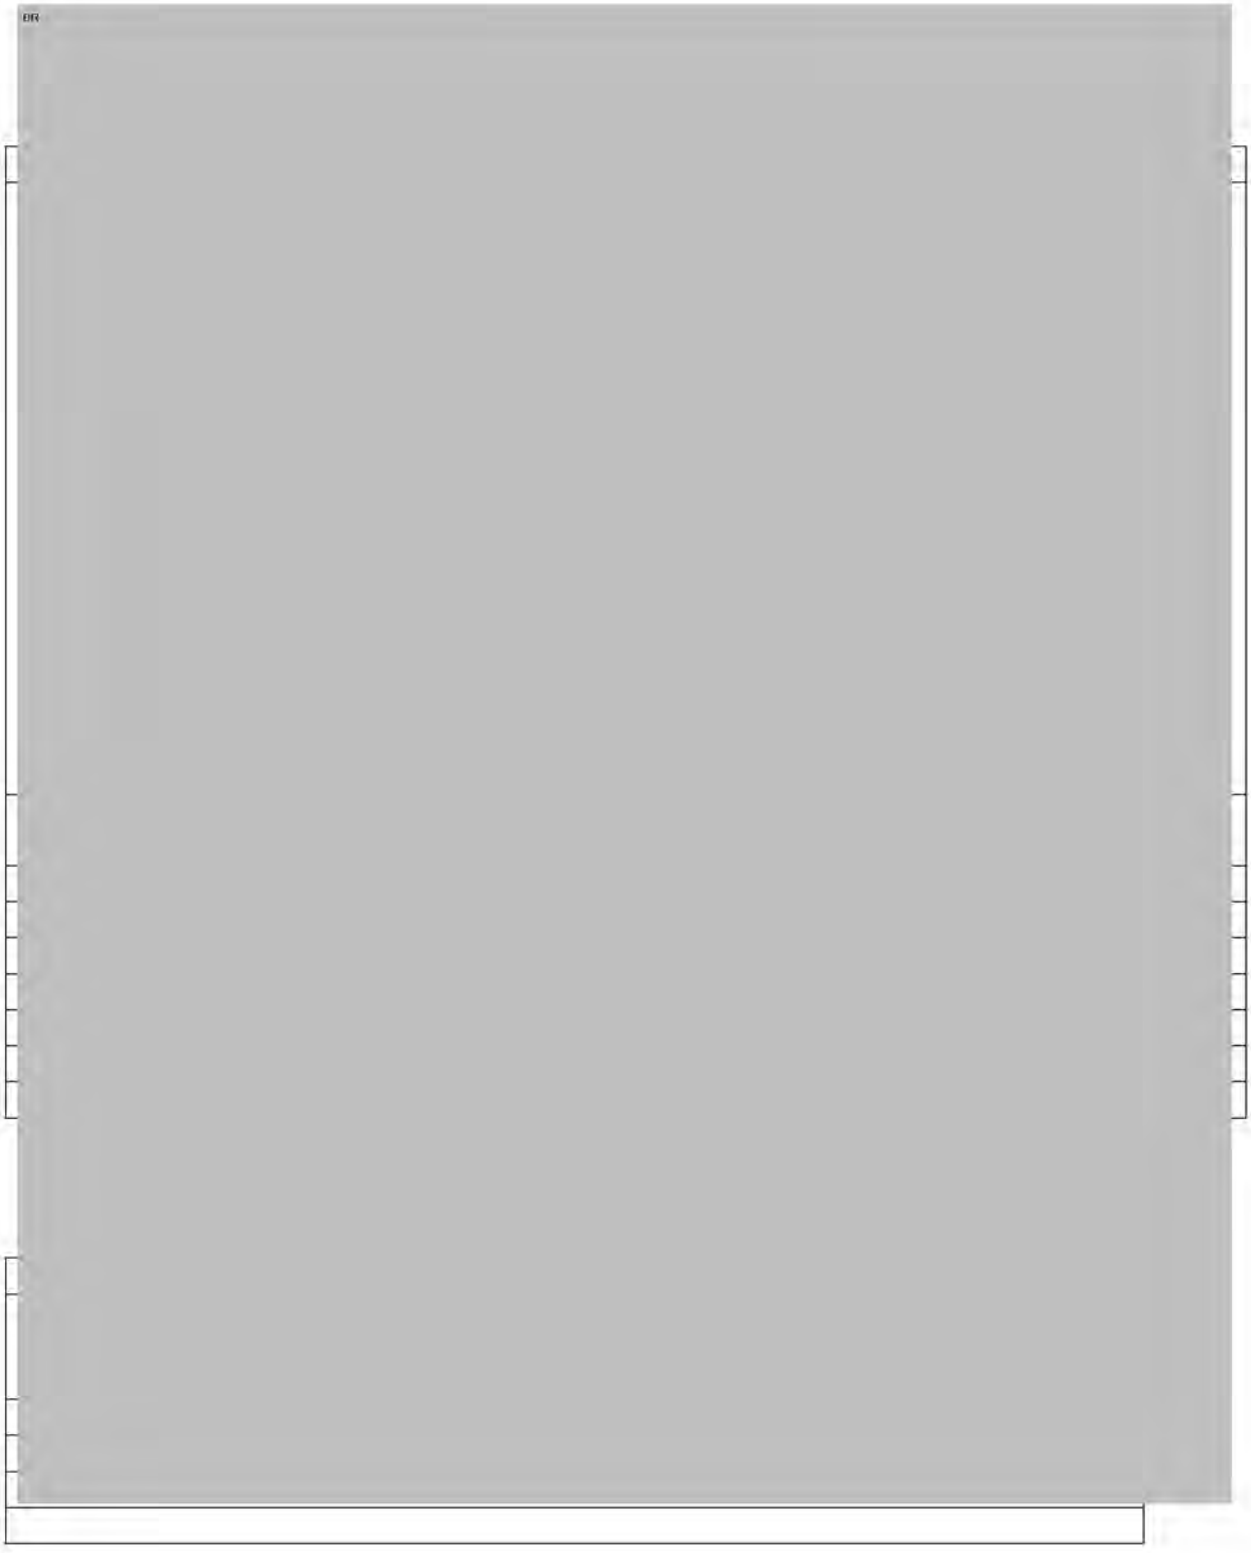
DR

| |
|---|
| BR |
| |
| |

### 2.5.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
|---|
| Opstellen en afronden van overeenkomsten met 5.1.2.e en 5.1.2.e |
| BR |
| |

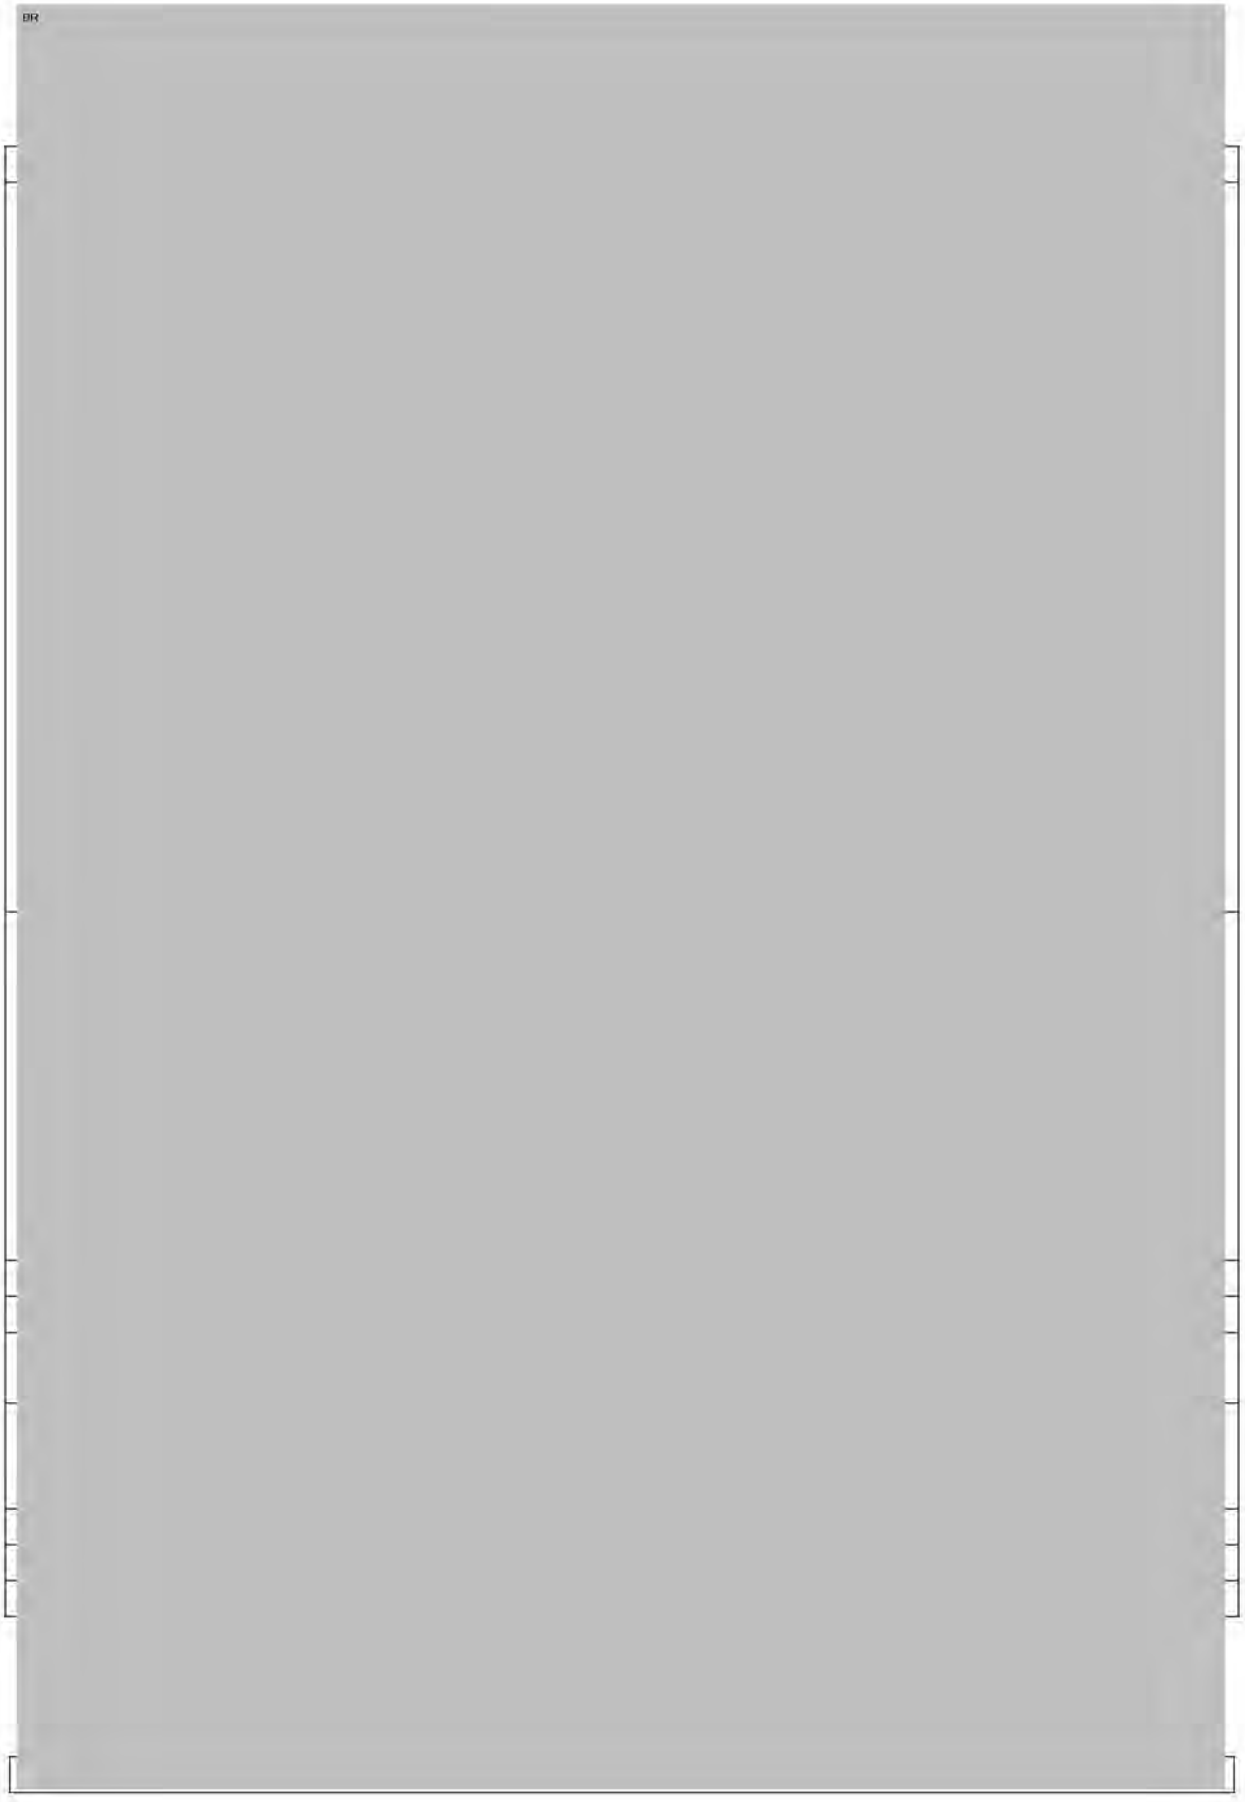
BR

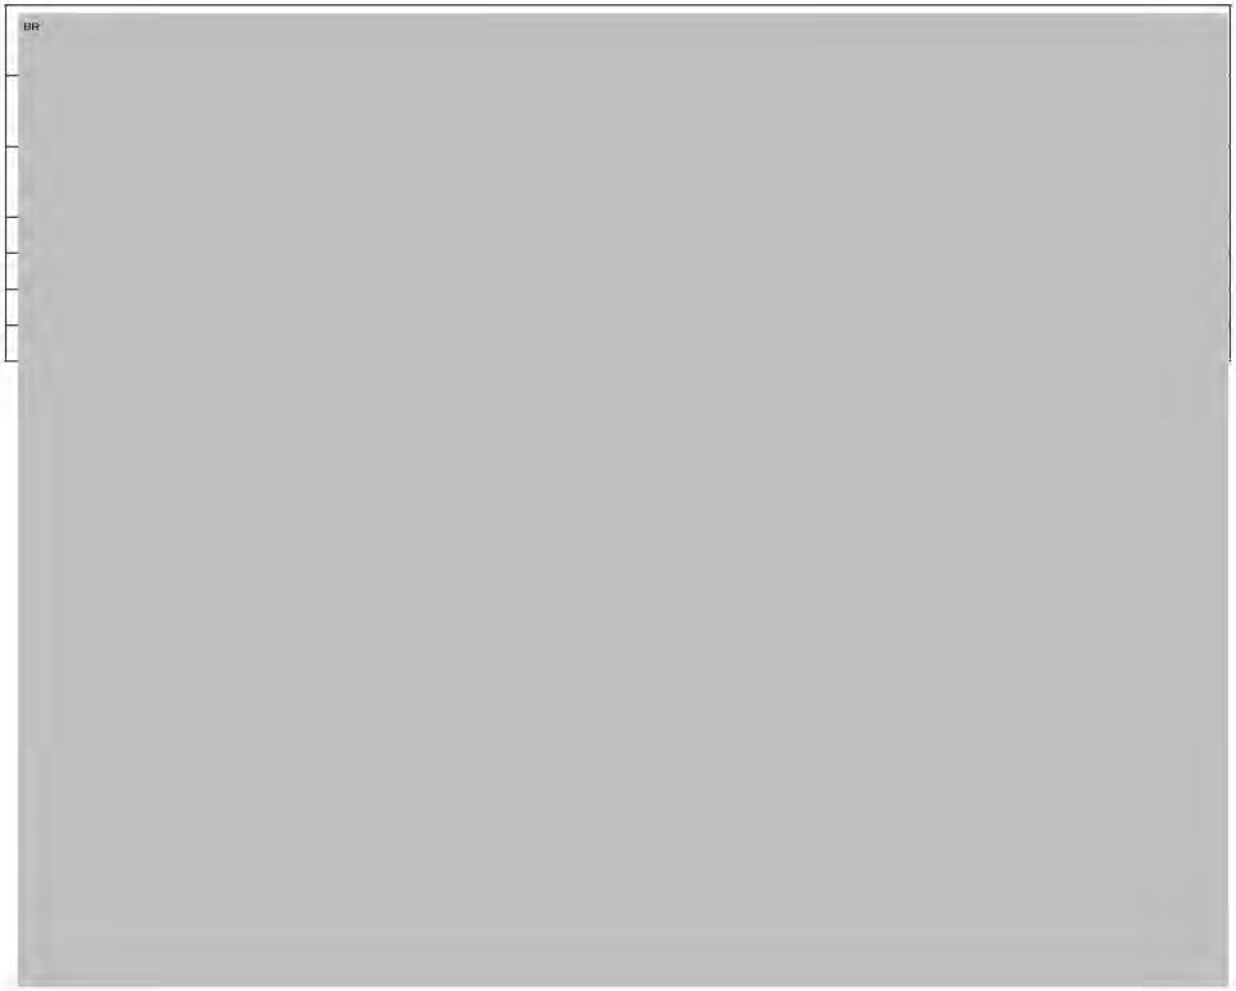
BR

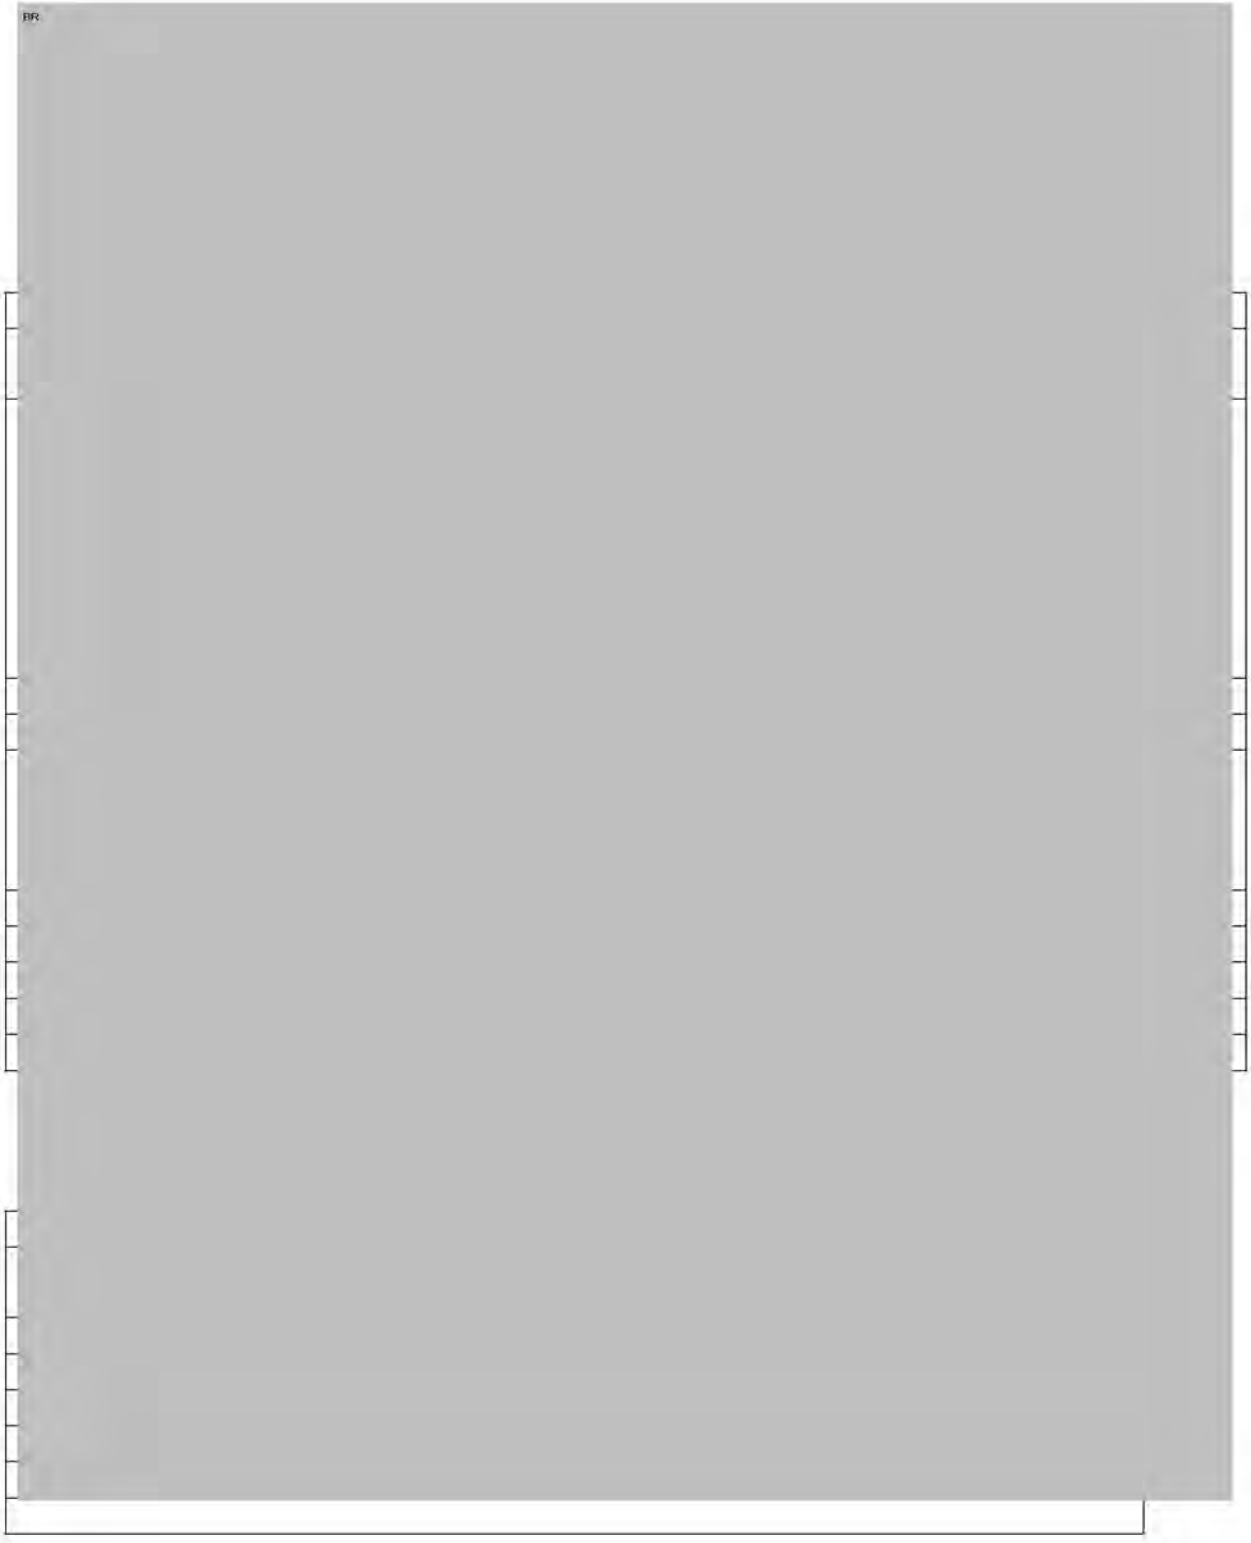

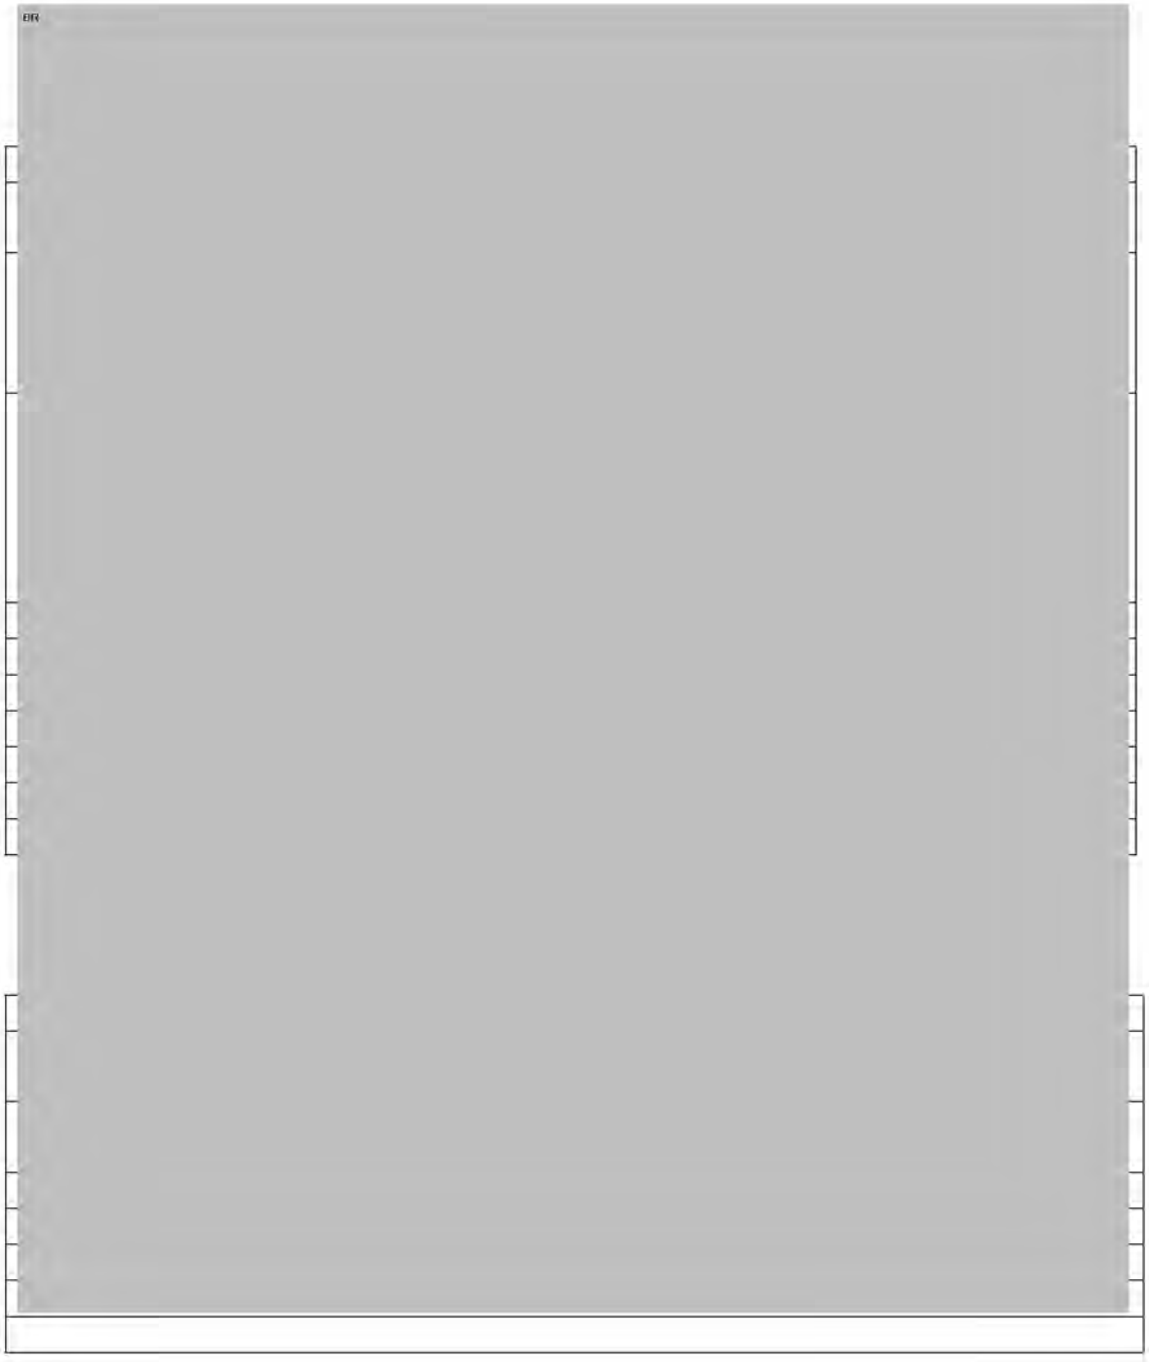
BR

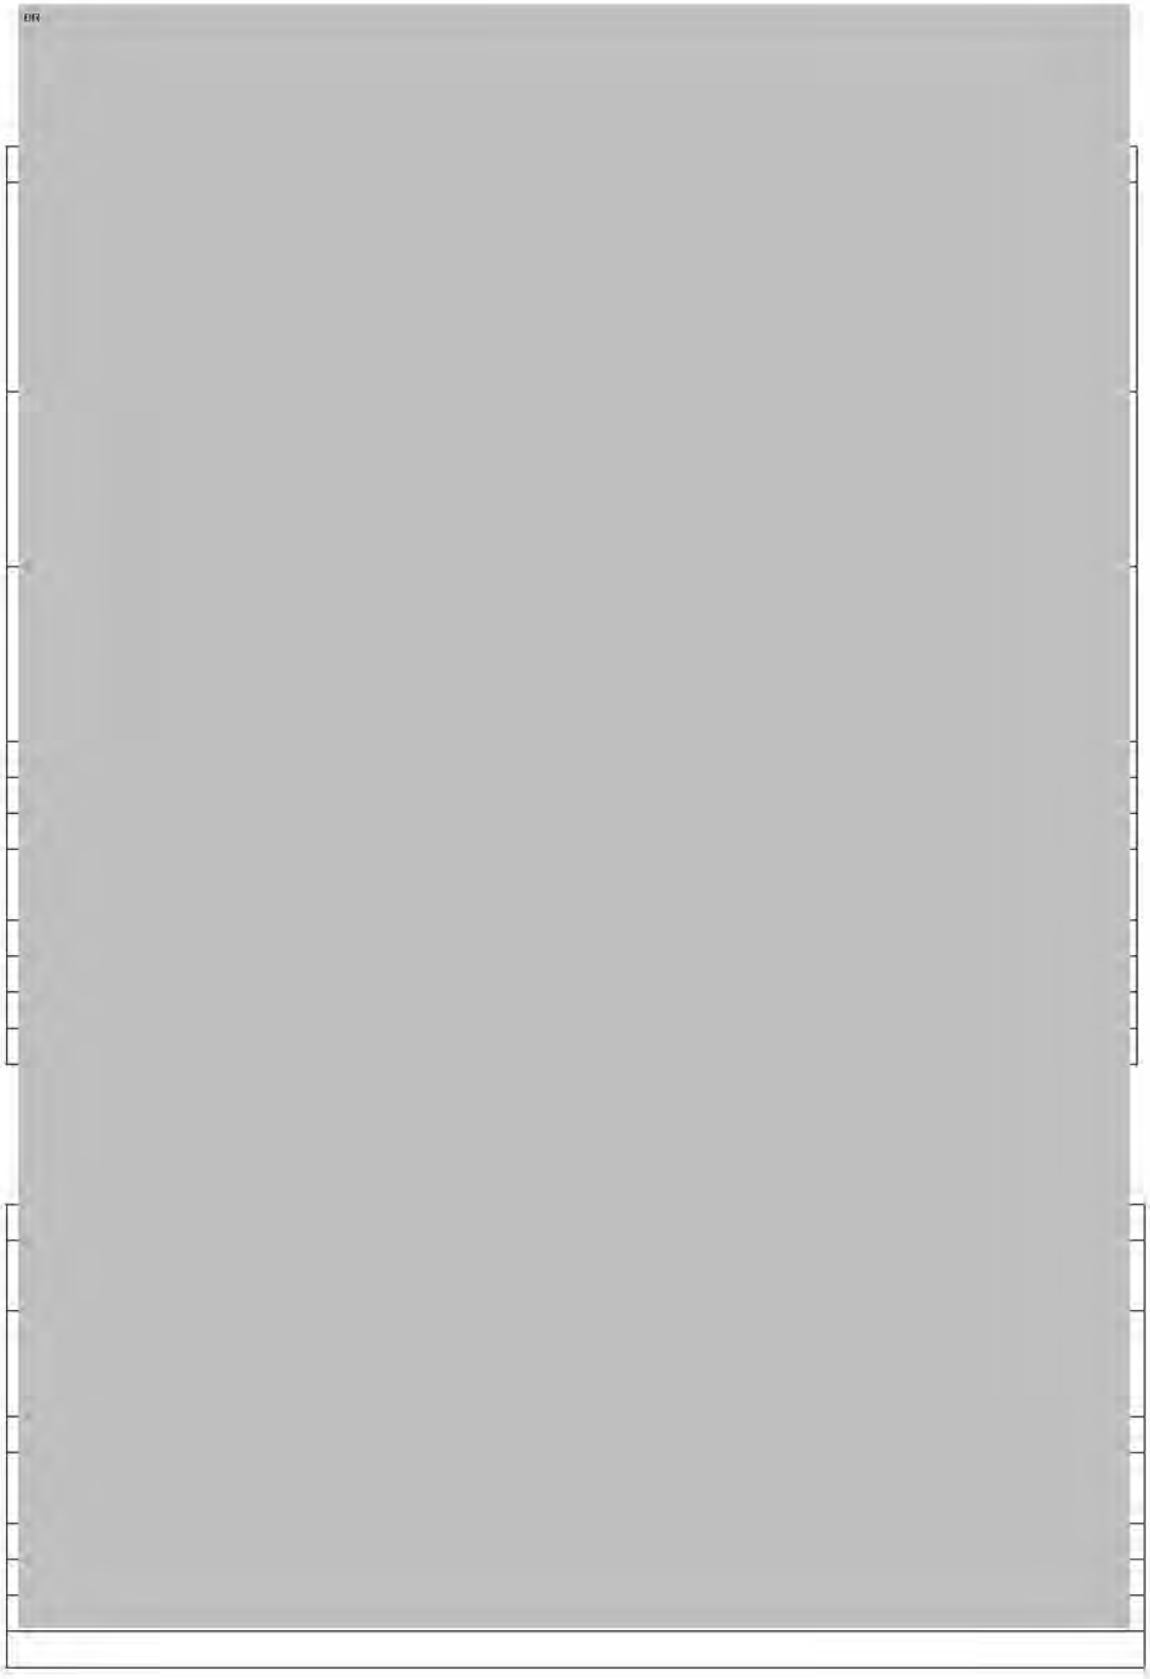

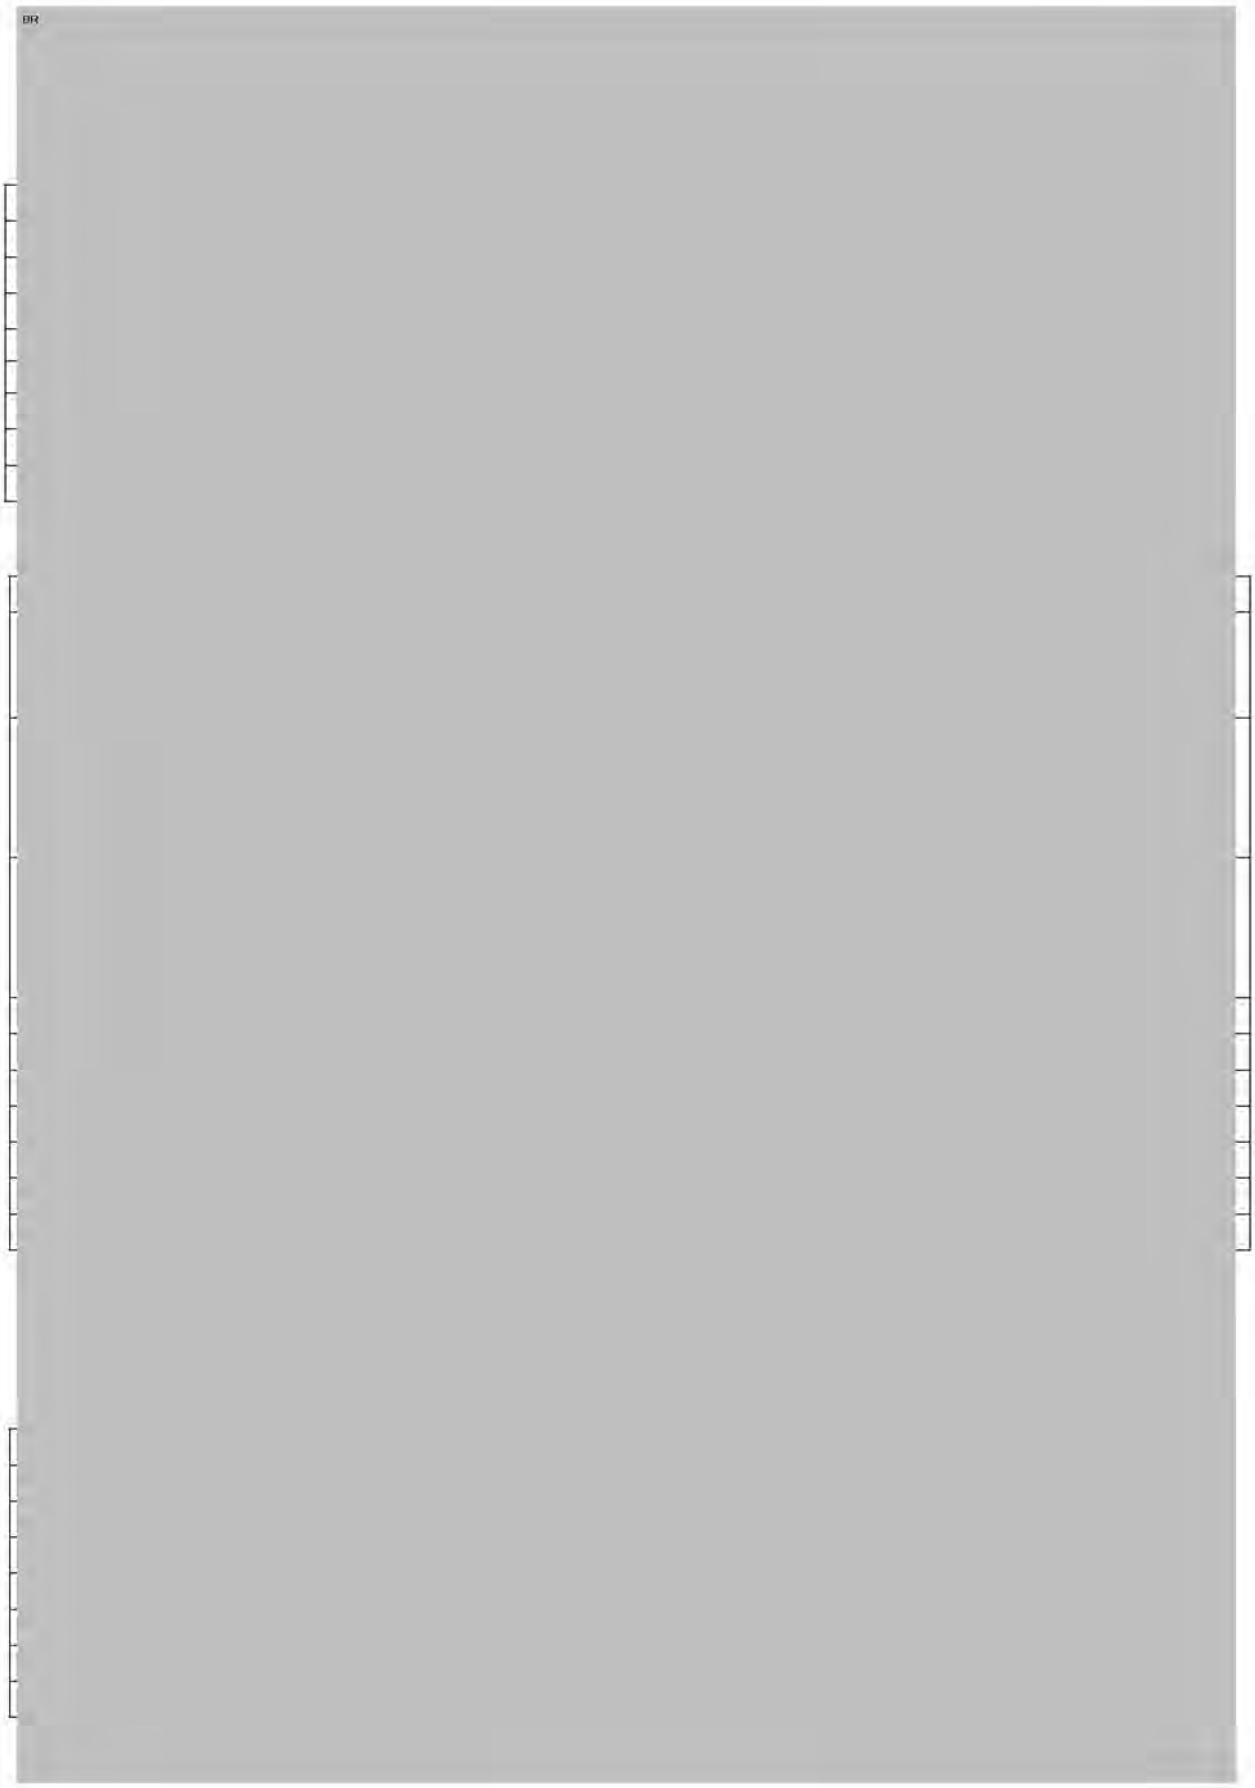
BR

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

**Conditionering**

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Het ontwerp van de tweede watertoevoer vanuit de Zuidvliet naar het Molenvlietpark afronden in overleg met de stakeholders en de vergunningaanvraag bij het Hoogheemraadschap indienen. | De gesprekken zijn gaande. |
| | |
| BR | |
| | |

**Hoofdcontract**

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Bouwrijp maken van het bouw-/werkterrein in de Vlietzone, o.a. door het kappen van de bomen. | Fase 1 (Stap 1 t/m 4) van het aanpassen van het waterhuishoudkundige systeem (dempen en graven van watergangen, aanleggen van (tijdelijke) stuwen en duikers) is gereed (Met uitzondering van het aanbrengen van de doorvaarbare duikers t.h.v. Drievliet, hiervoor zijn tijdelijke voorzieningen getroffen). De bomen zijn gekapt. De bouwwegen zijn aangelegd en bouwkeet is geplaatst. Verder zijn de grondverbeteringen t.b.v. het aanbrengen van de bouwkuip uitgevoerd. Er zijn diverse voorbelastingen aangebracht o.a. t.b.v. toekomstige duiker onder de Rotterdamsebaan en de grondscheidings-installatie. De in de Vlietzone aanwezige grond is afgevoerd naar diverse locaties in de omgeving o.a. het Bentwoud bij Benthuizen.<br>Door afd. Archeologie van de gemeente Den Haag zijn archeologische werkzaamheden verricht t.h.v. het golfterrein. |
| BR | |

| |
|---|
| BR |
| |

### 3.5.2 Komende kwartaal

**Conditionering**

| **Werkzaamheden** |
|---|
| BR |
| Ontwerp tweede watertoevoer vanuit de Zuidvliet naar het Molenvlietpark afronden, zodanig dat het vergunningenproces richting HHD opgestart kan worden. |
| |
| BR |
| |

BR

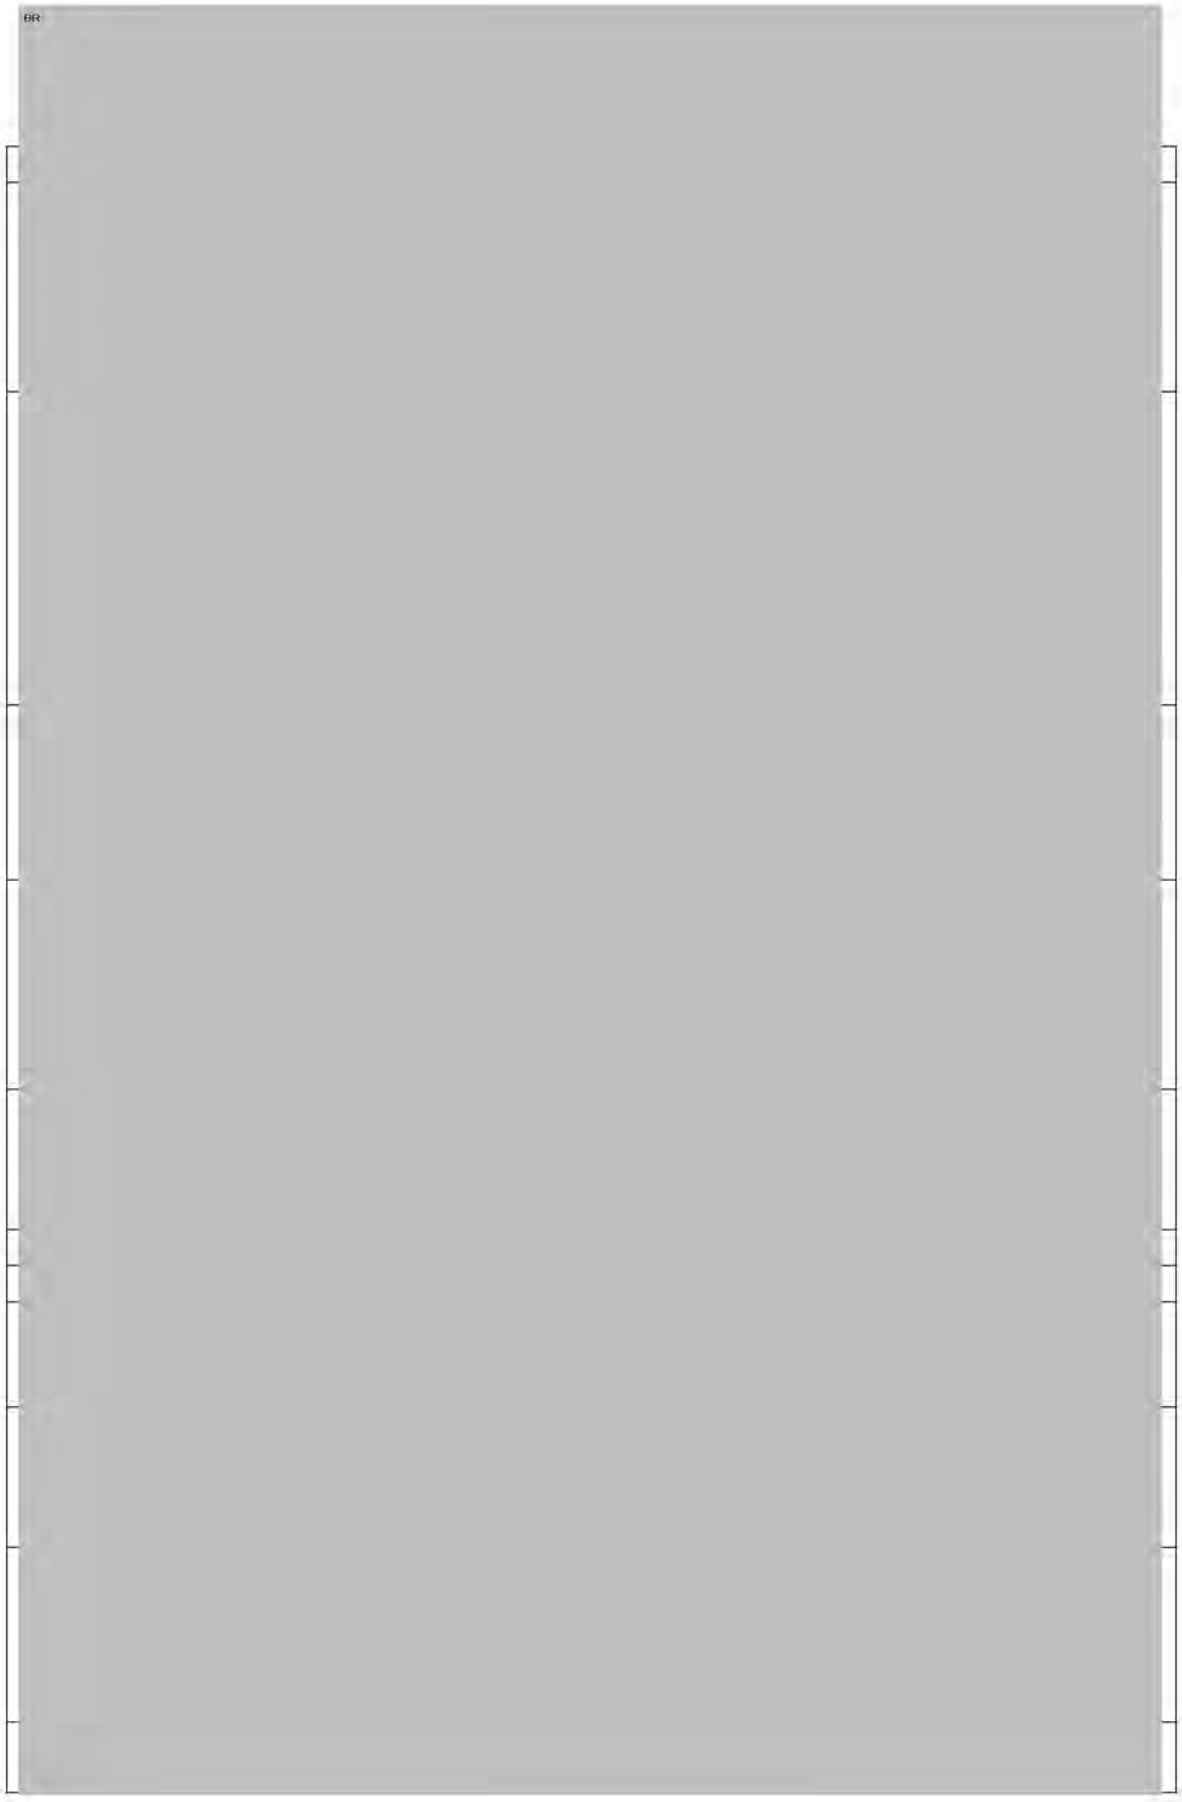

BR

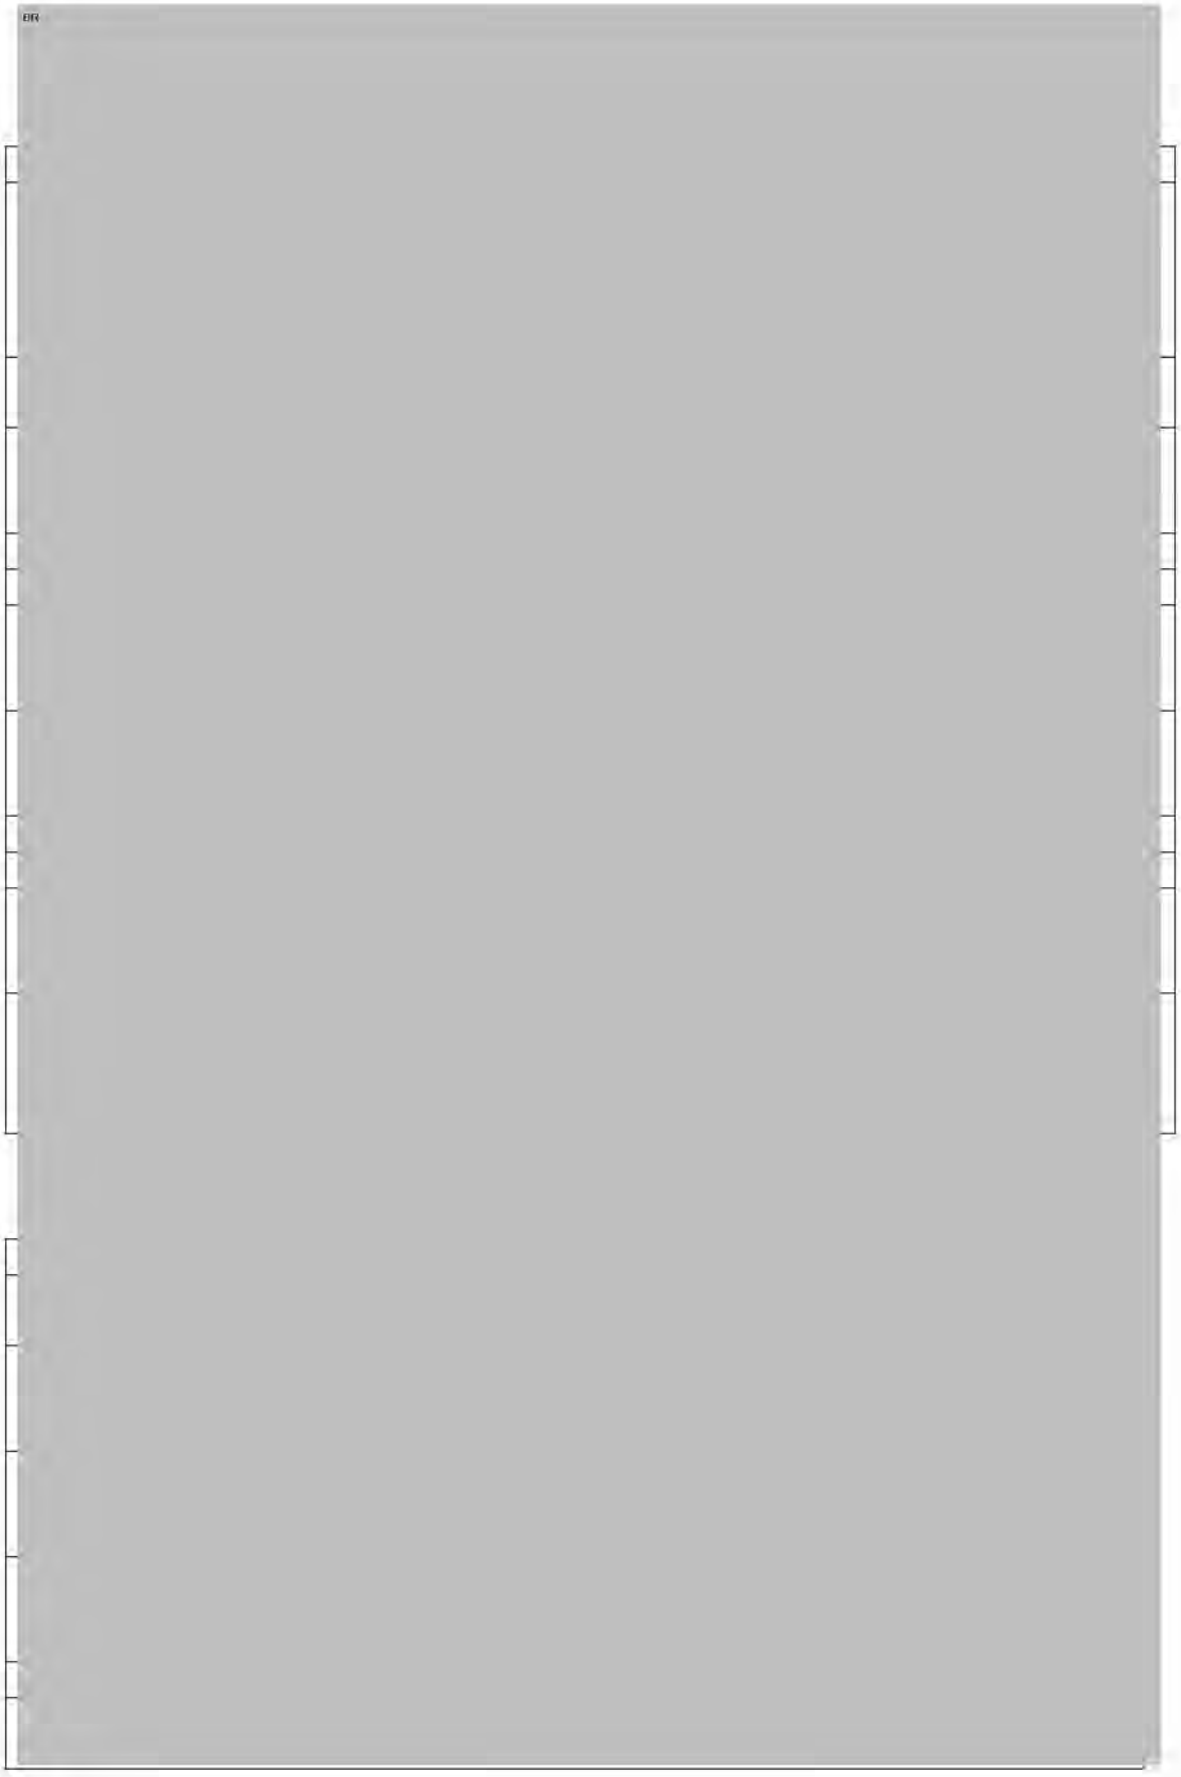
BR

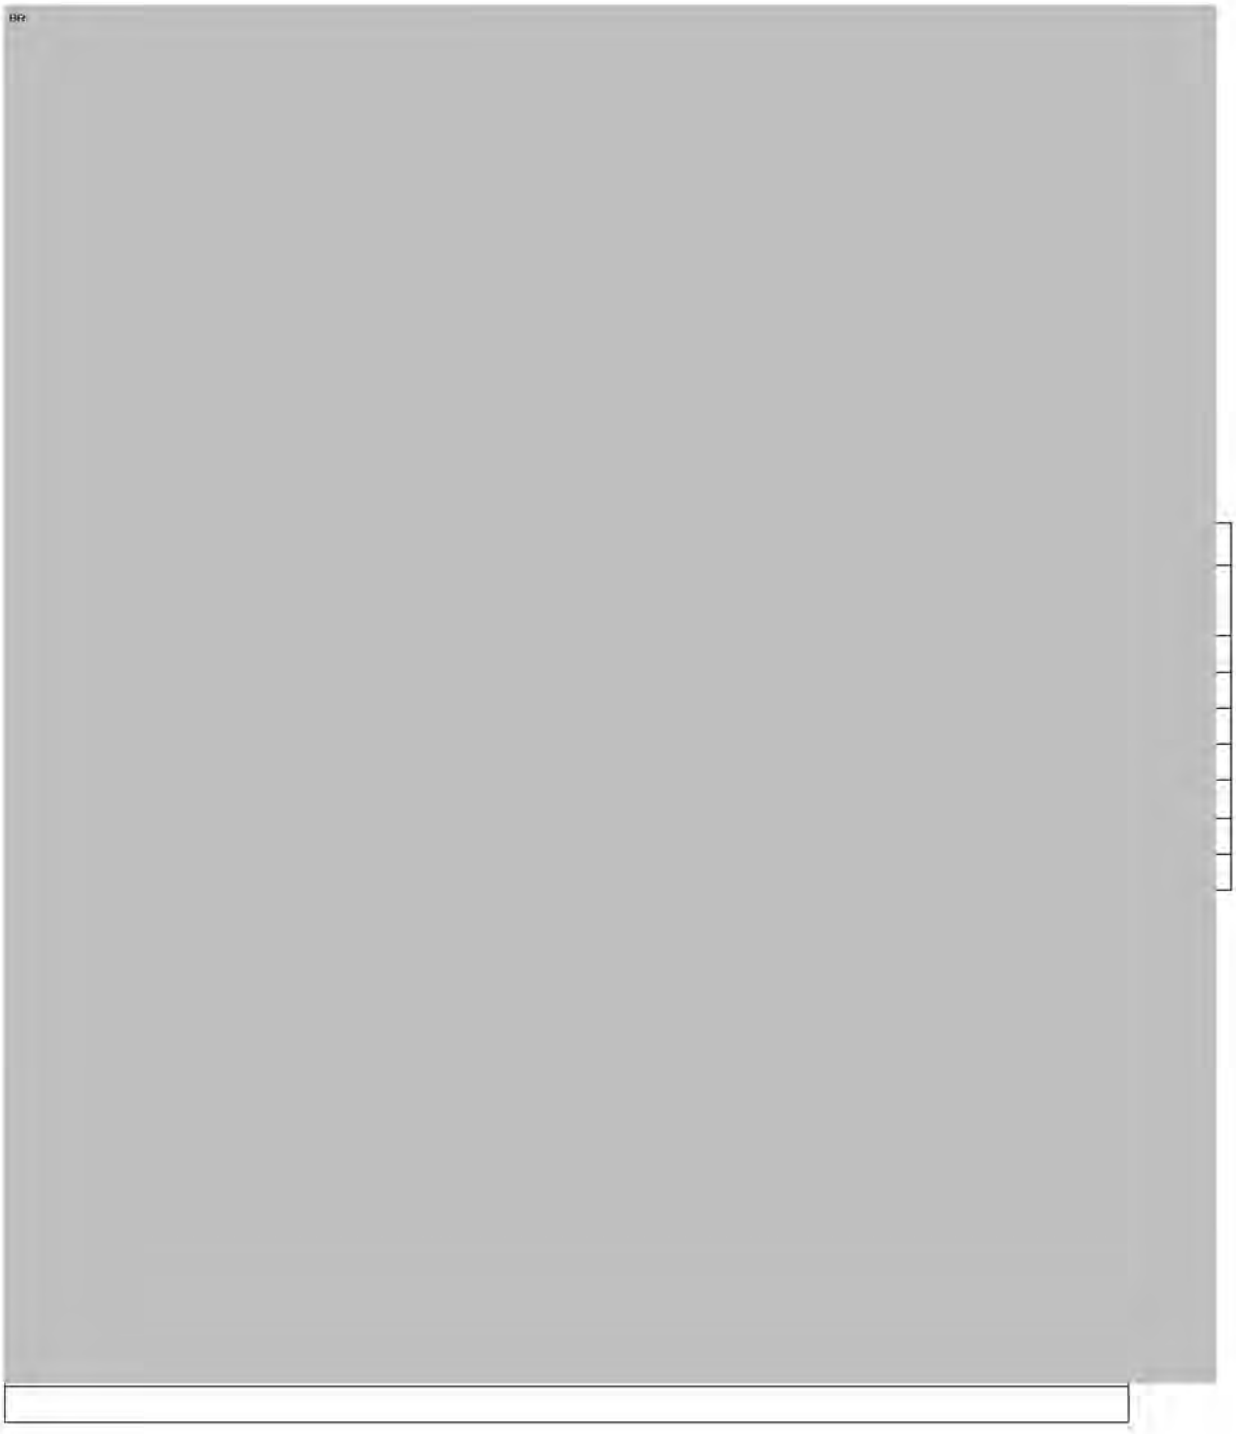

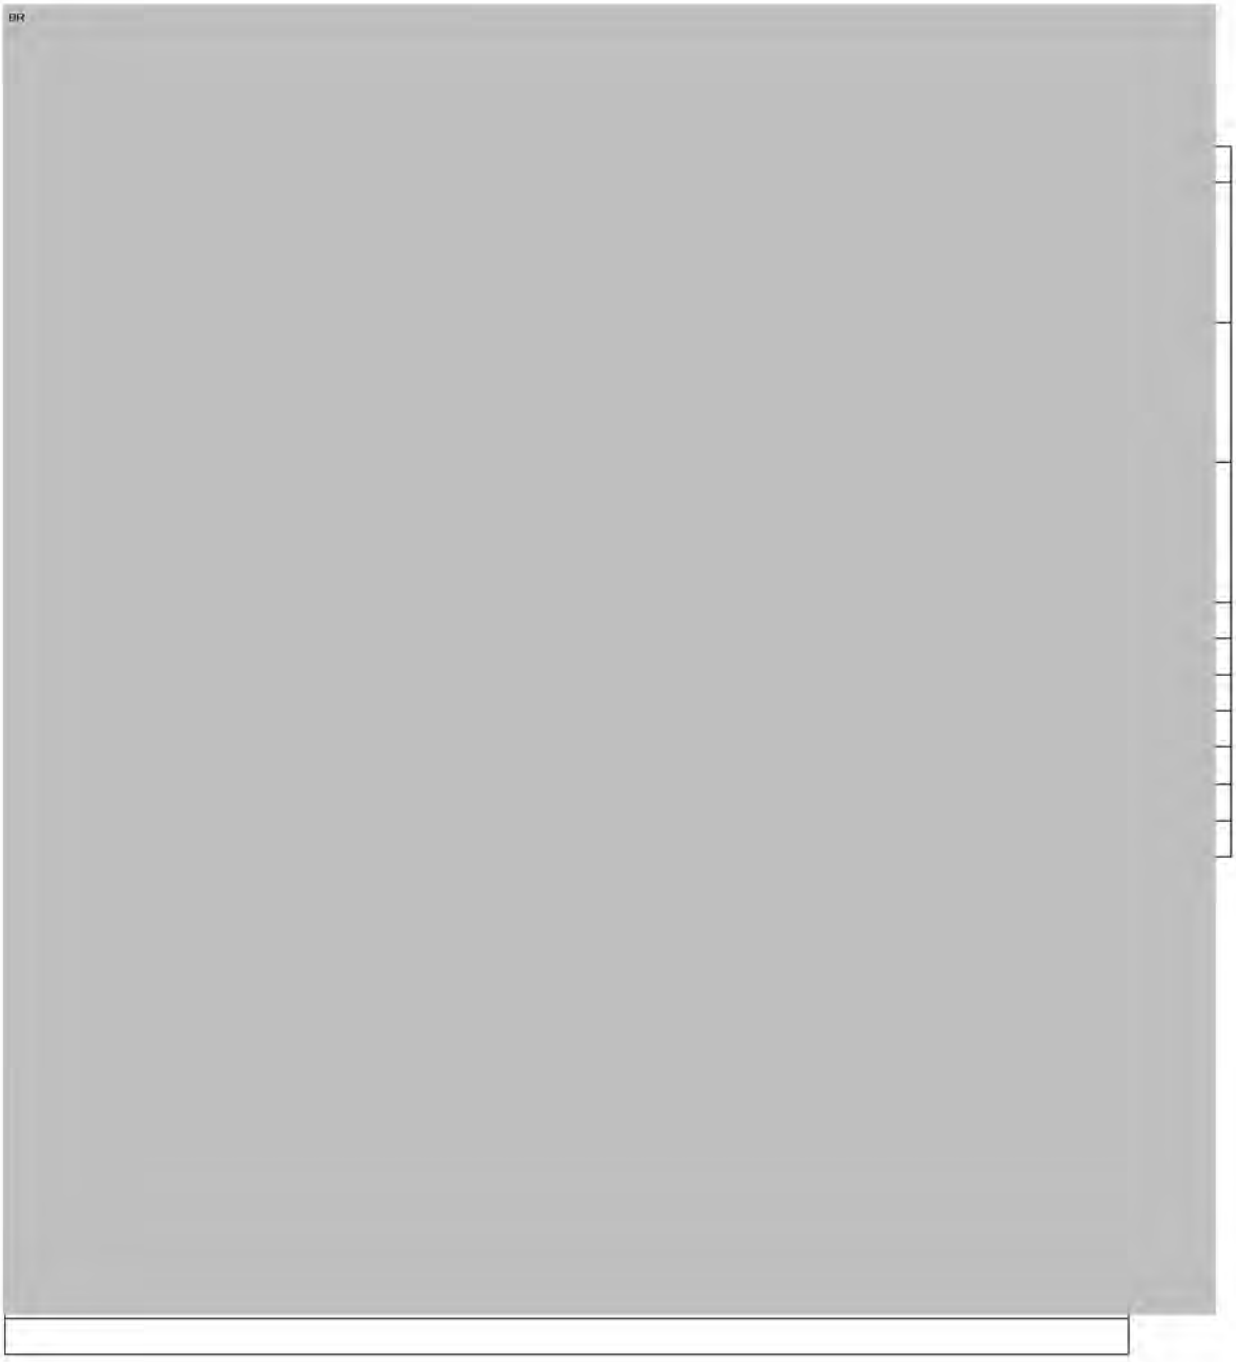
BR

BR

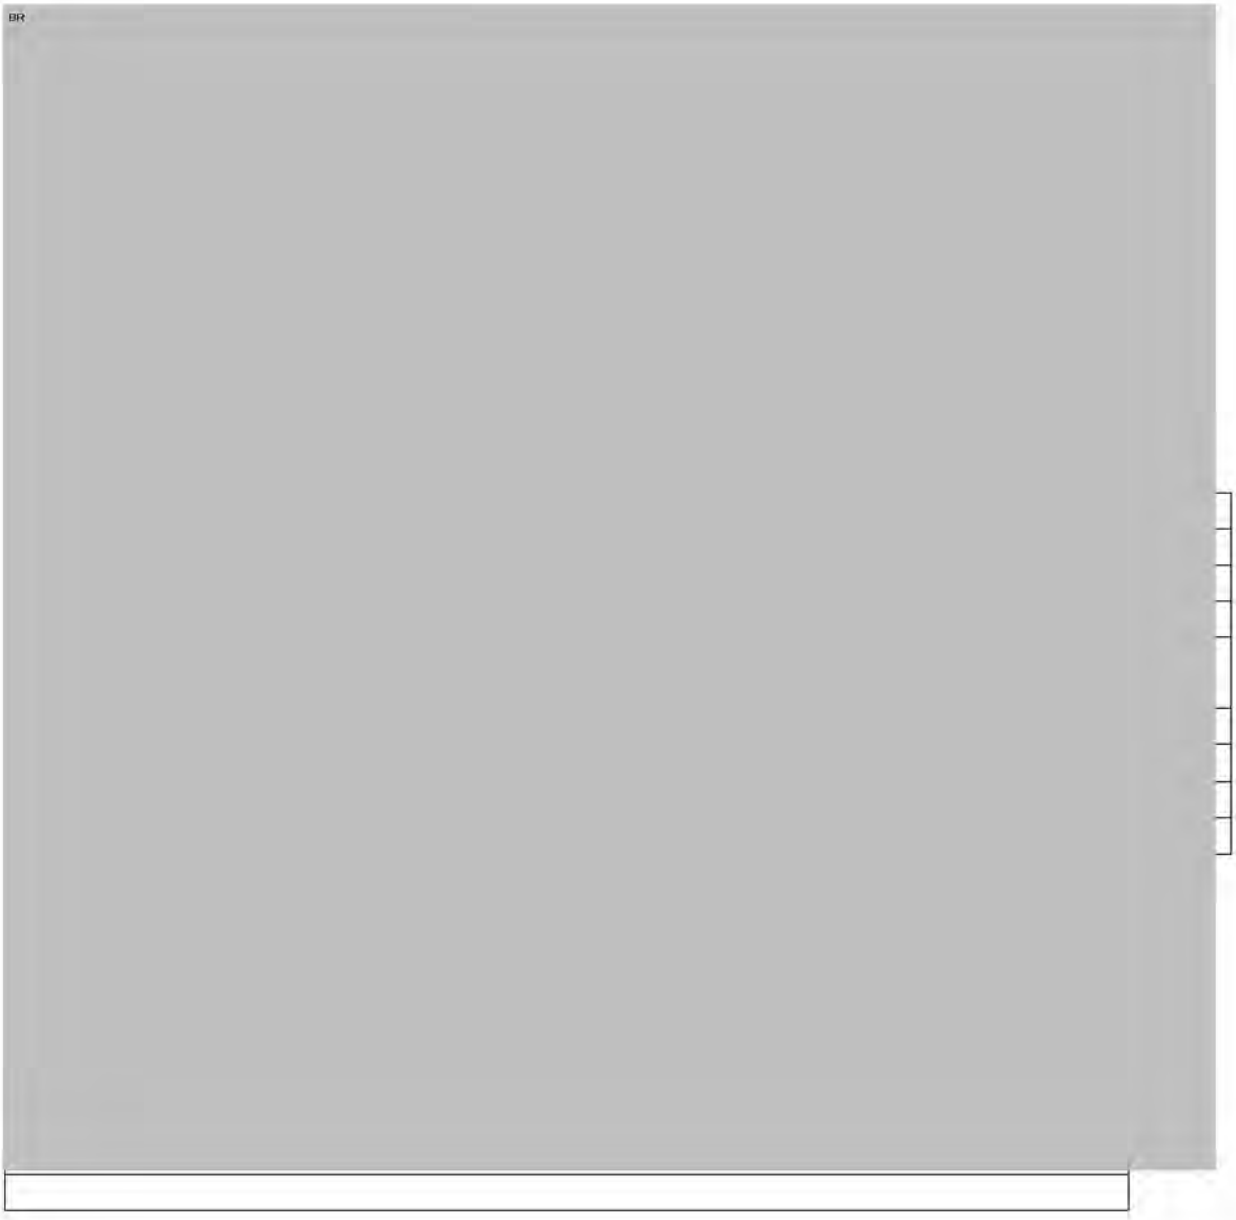
BR

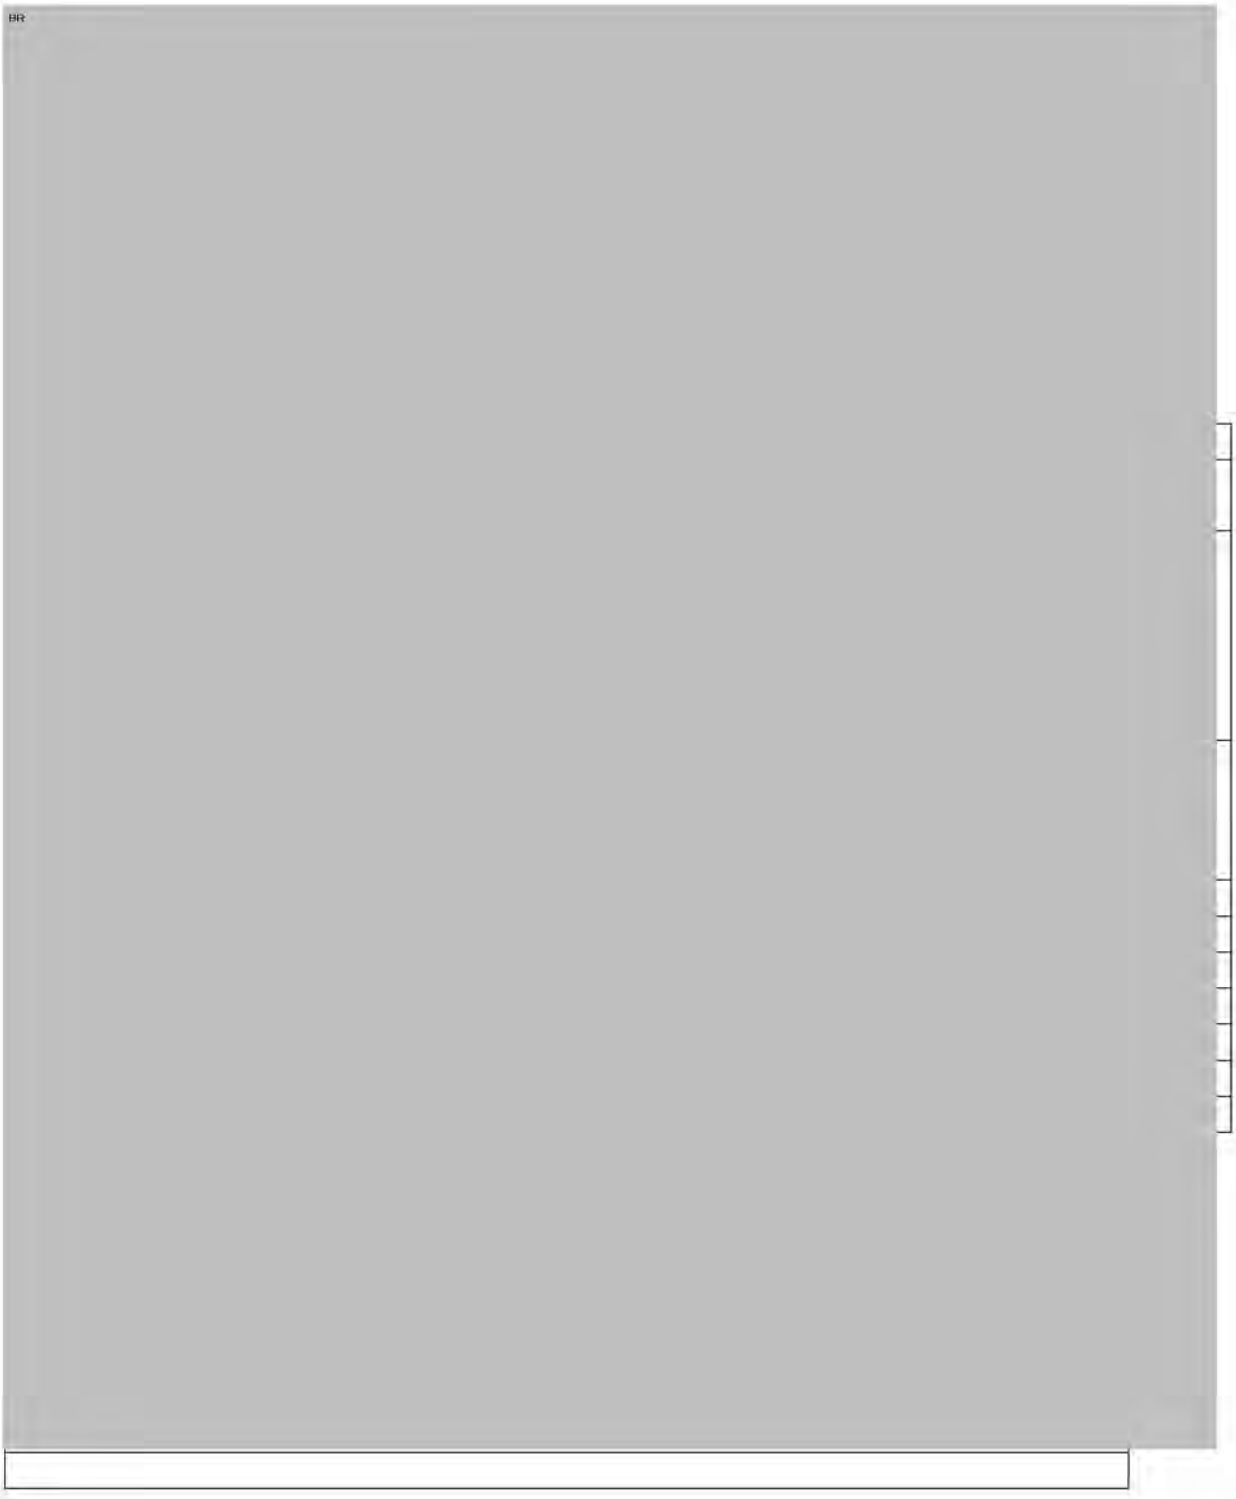
BR

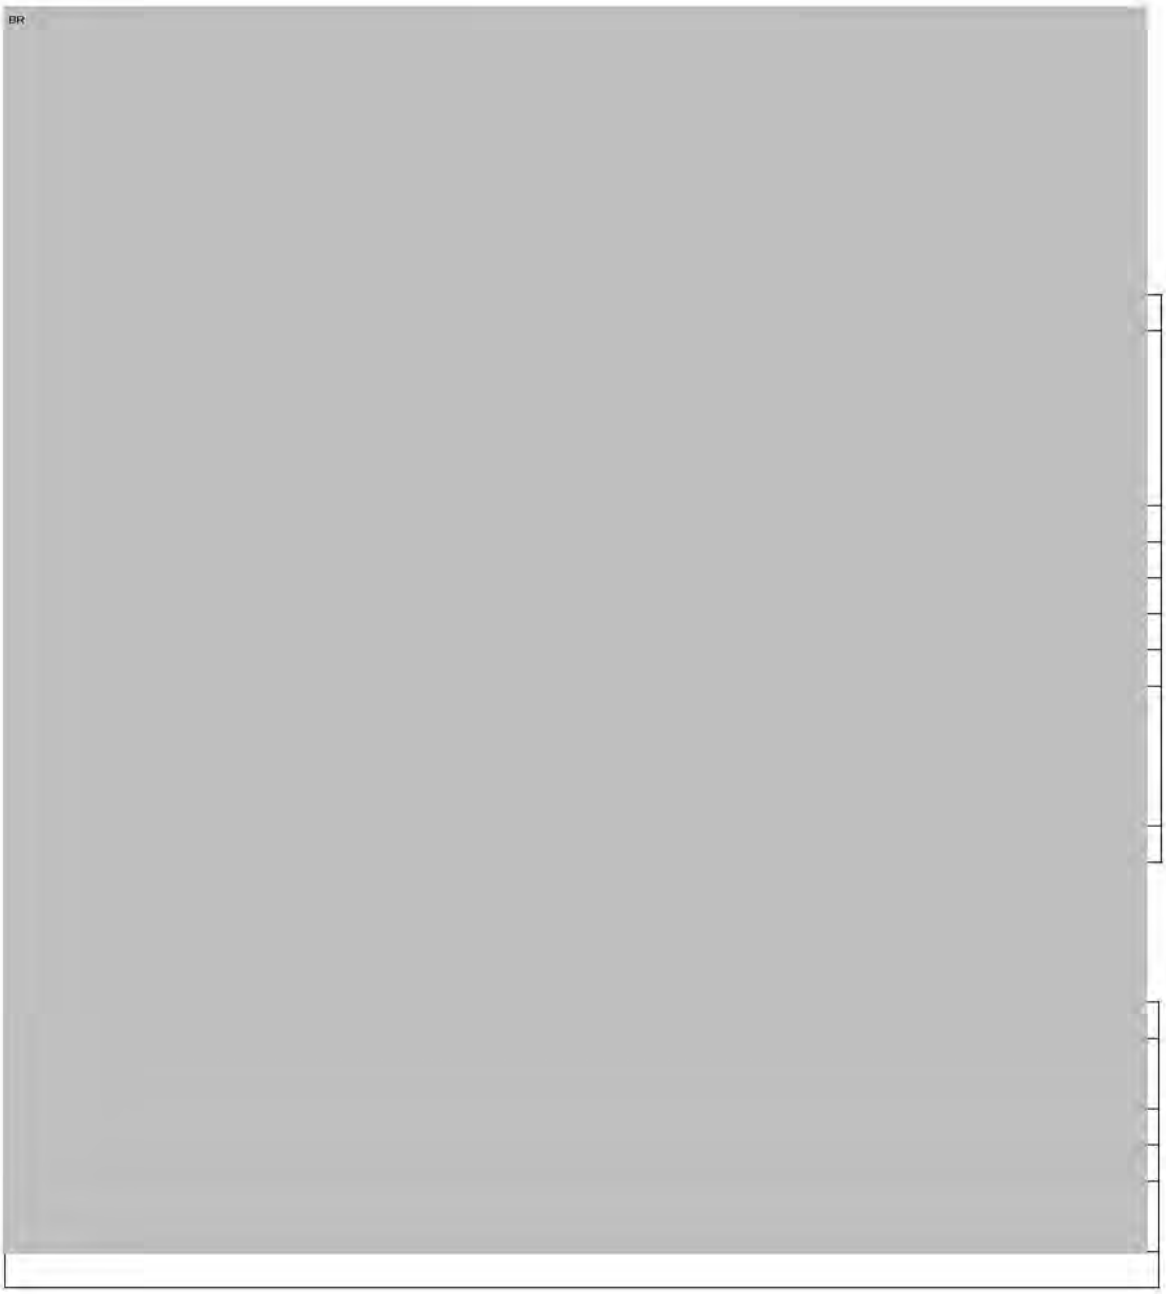
BR

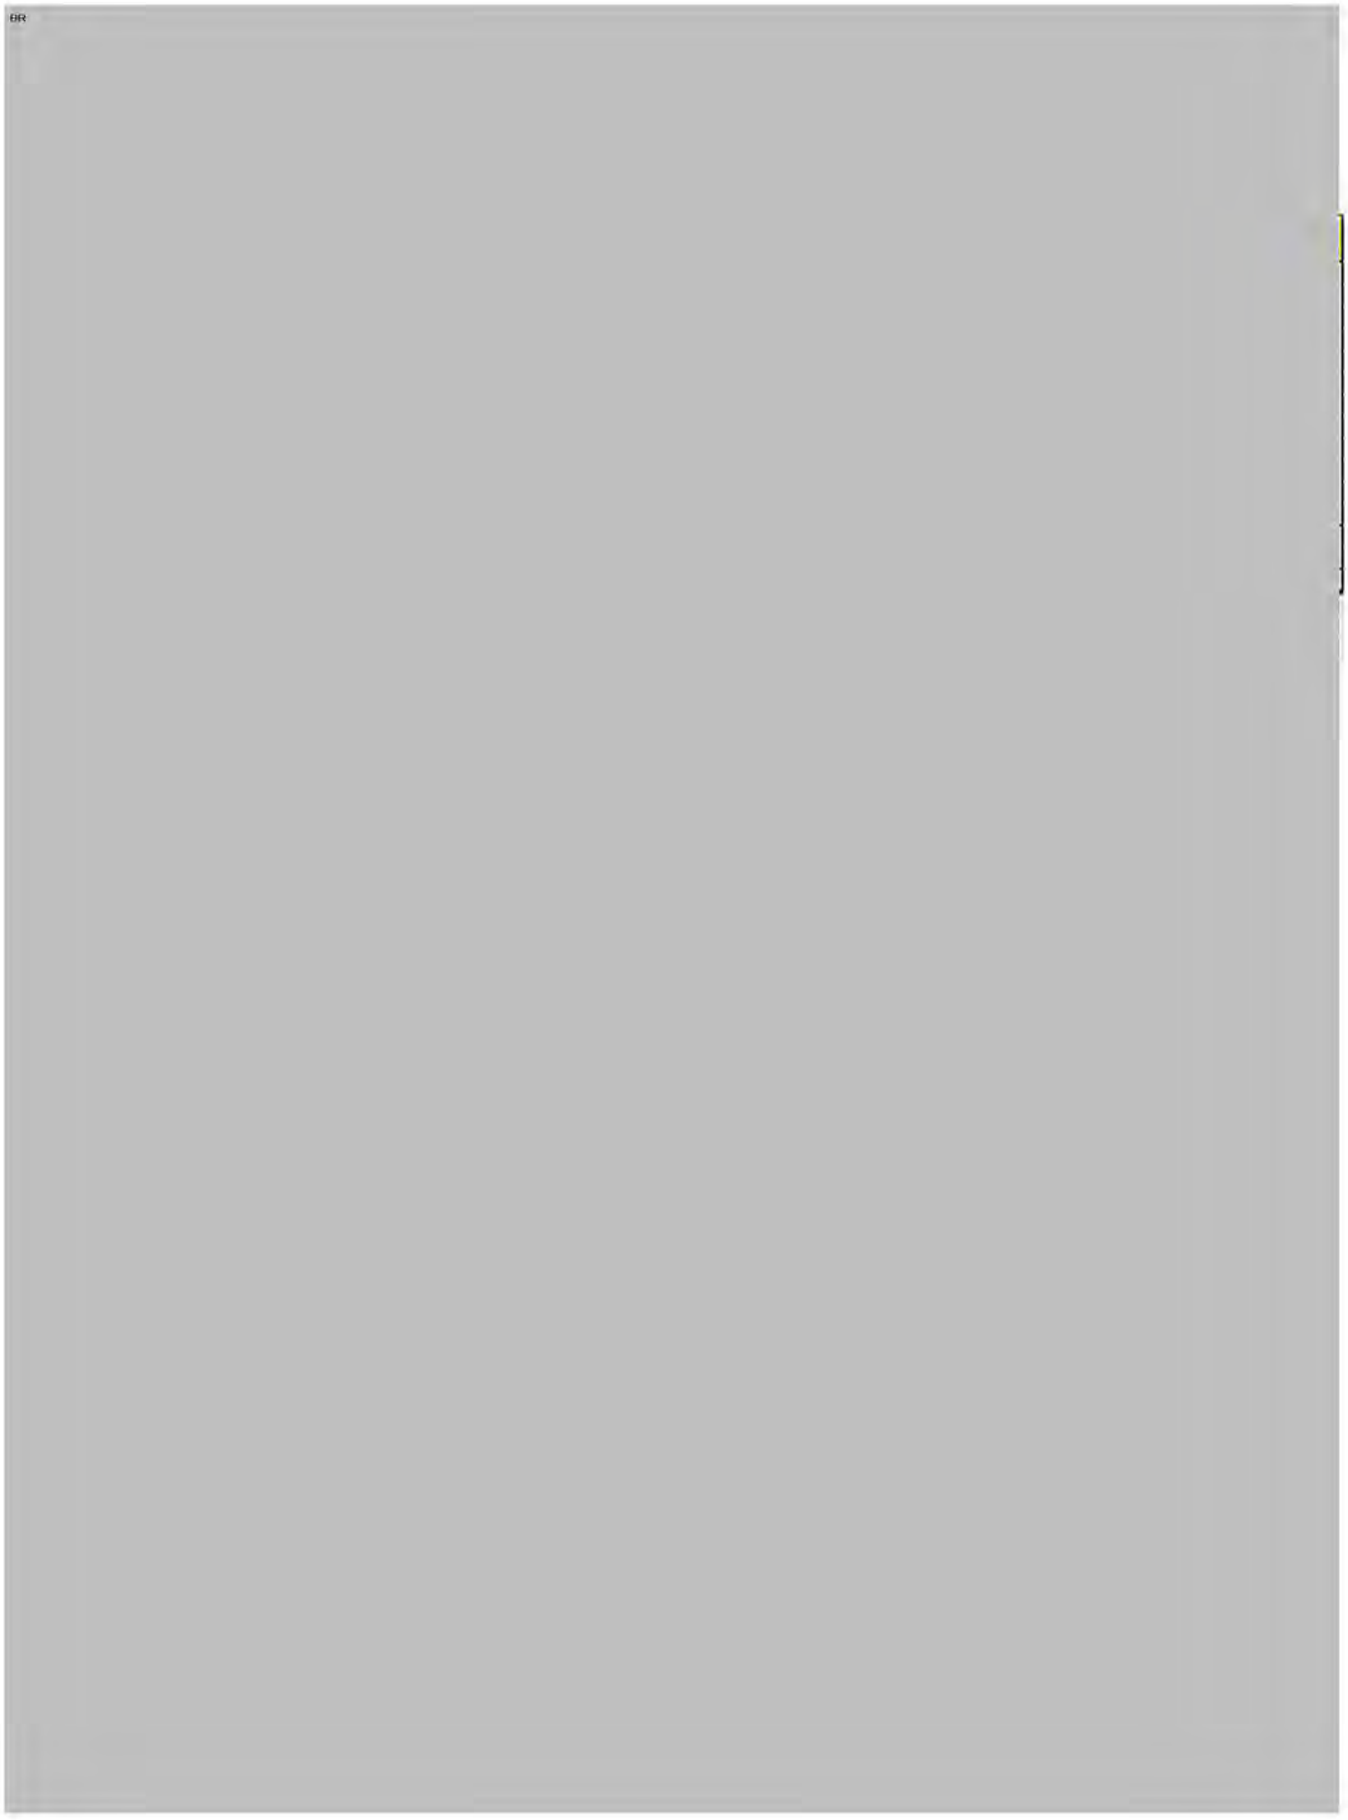

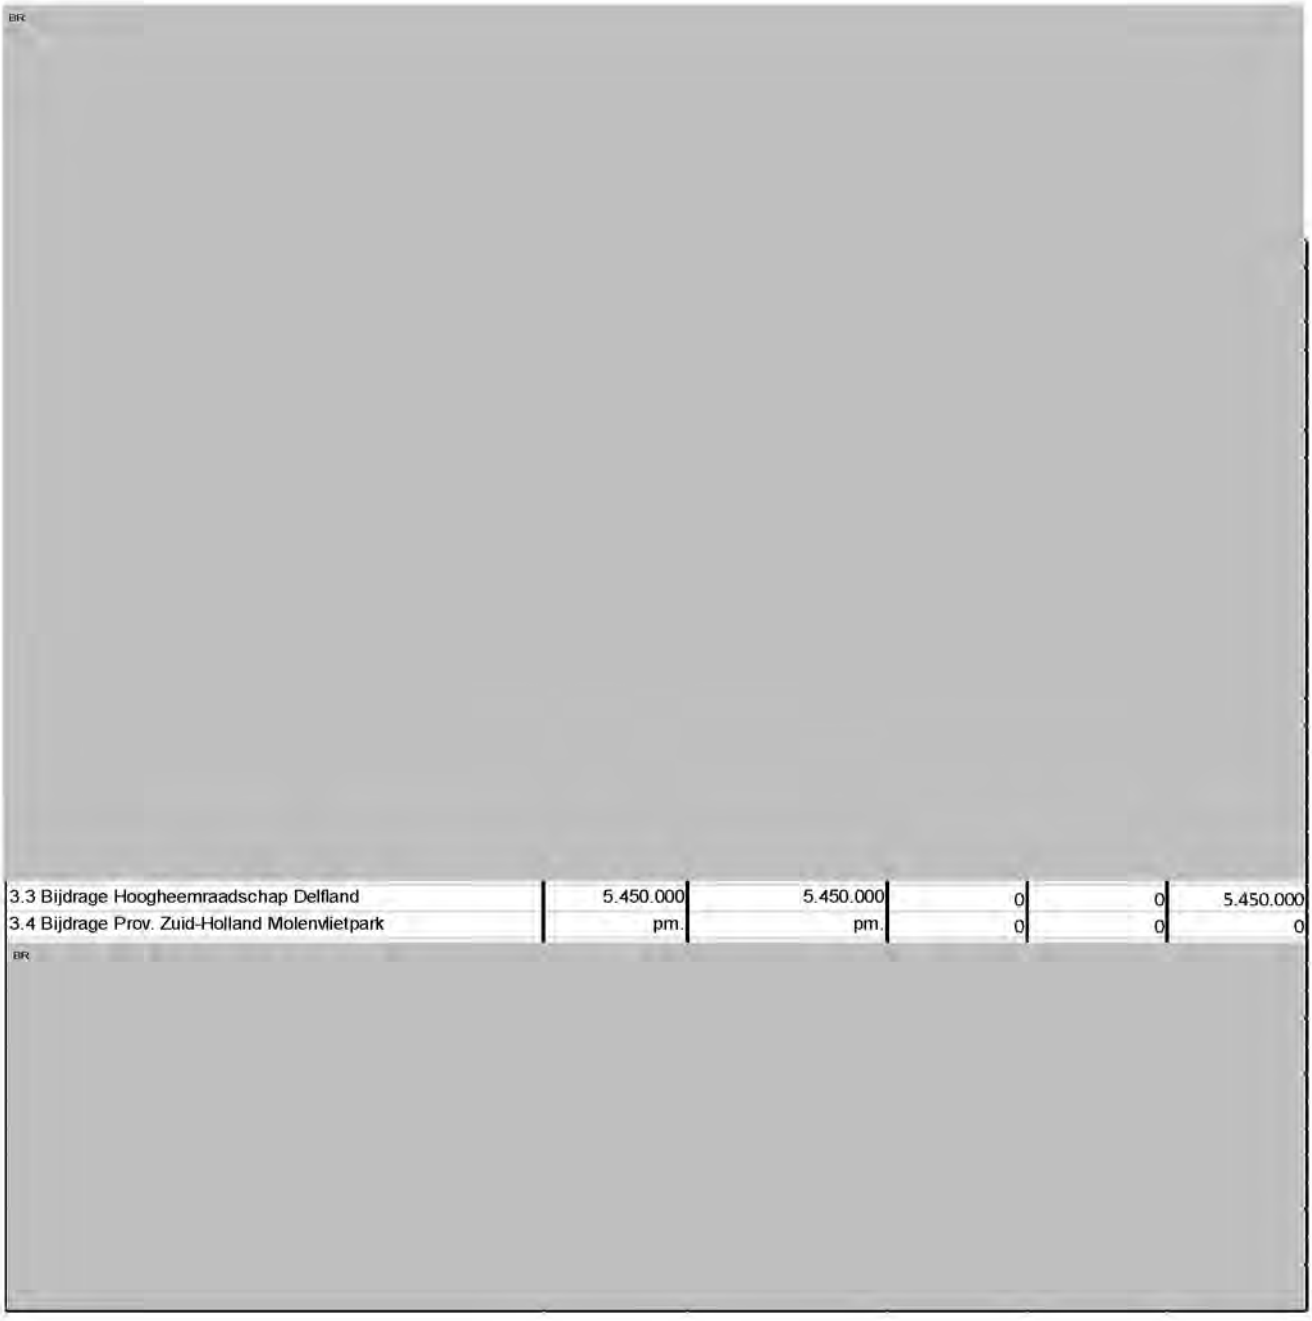

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 0 | 5.450.000 |
| 3.4 Bijdrage Prov. Zuid-Holland Molenvlietpark | pm. | pm. | 0 | 0 | 0 |

Toelichting op de dekkingsmiddelen:

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland: Geen mutaties

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland: Geen mutaties

## 5.3 Planning

Zie tevens de bijlage 'Planningsmijlpalen' (hoofdstuk 6)

### 5.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Planning 2e toevoer waterberging Molenvlietpark nader uitwerken | Deze planning dient nog geüpdatet te worden. |
| | |
| BR | |
| | |

### 5.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Planning 2e toevoer waterberging Molenvlietpark nader uitwerken |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |
| |

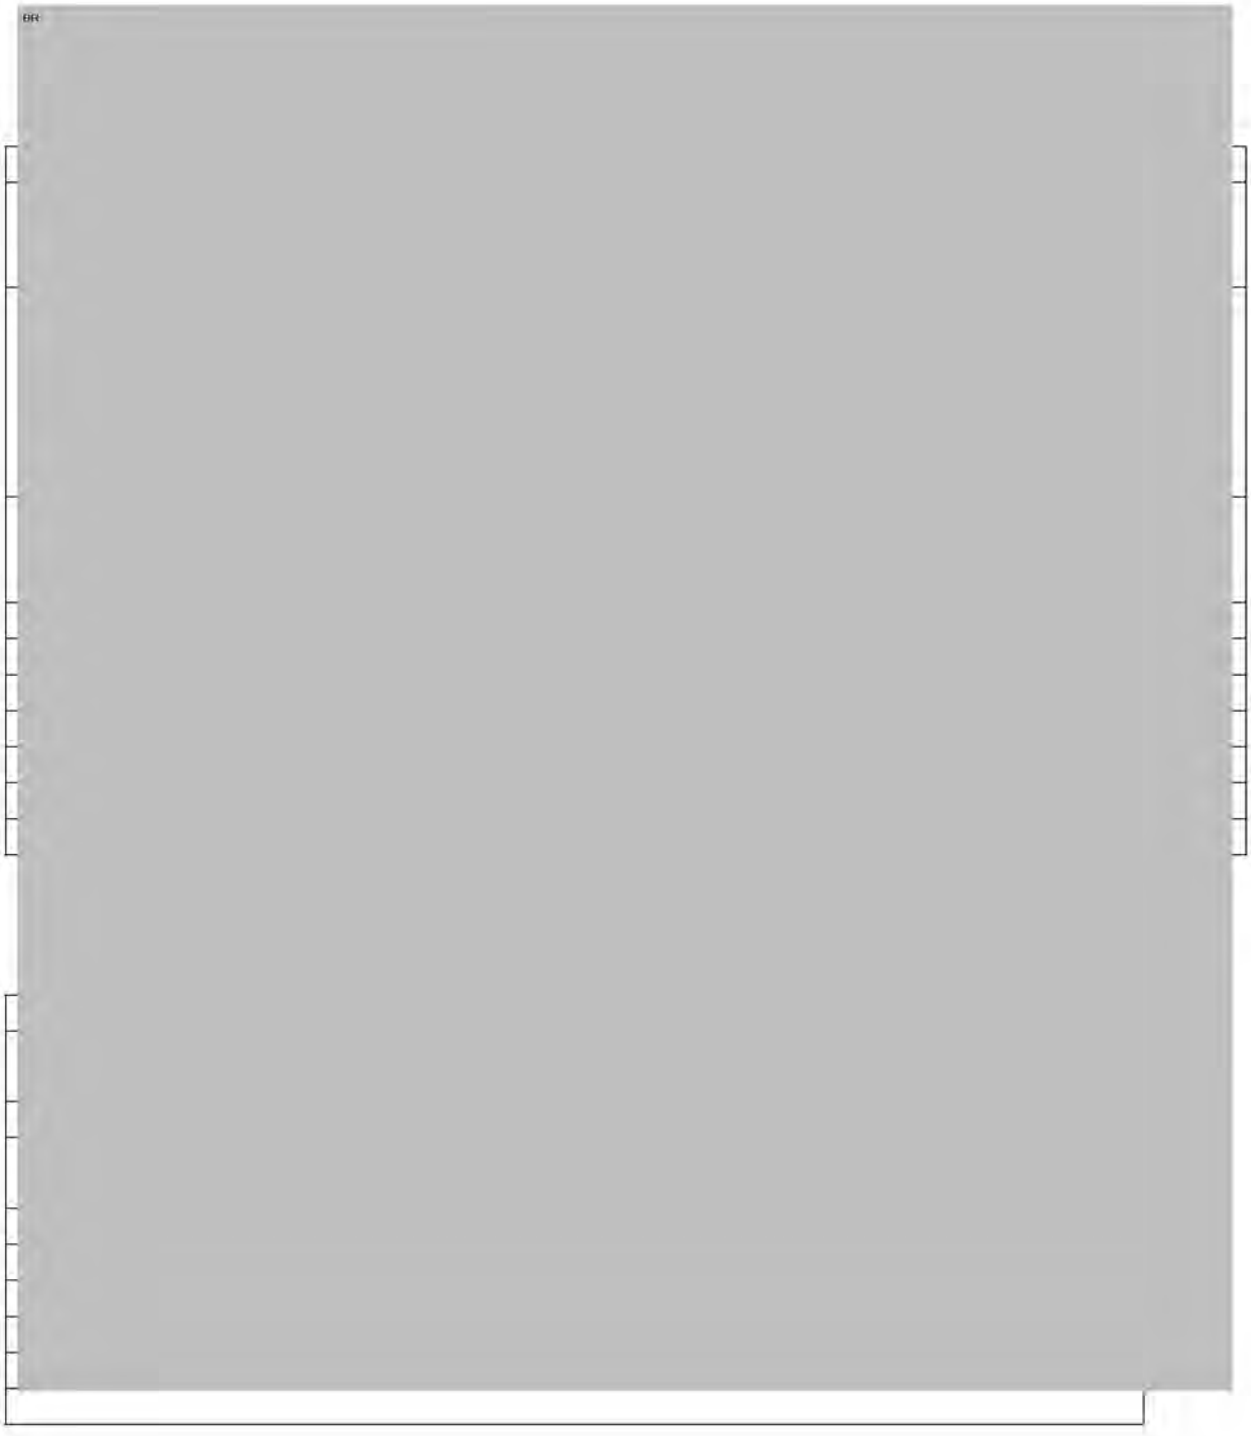

### 5.4.3 Financiële toprisico's

In het 3e kwartaal is er een Monte Carlo analyse op de financiën uitgevoerd. De toprisico's hieronder zijn in de rangorde daarvan weergegeven. Inclusief de ontwikkelingen in de beheersing (indien van toepassing). De financiële risicoanalyse heeft uitgewezen dat het project conform vigerend budget gerealiseerd kan worden.

**Huidige toprisico's:**

| Rang | Omschrijving | Beheersing | Vorige rang |
|---|---|---|---|
| BR | | | |
| 3. | Vastgestelde BP wijzigingen (Binckhorstlaan-zuid, Molenvlietpark) veroorzaken een verzoek tot wijziging van CRB. | In z'n algemeenheid wordt alert opgetreden en kritisch getoetst op ingediende verzoeken tot wijziging. | 3 |
| BR | | | |

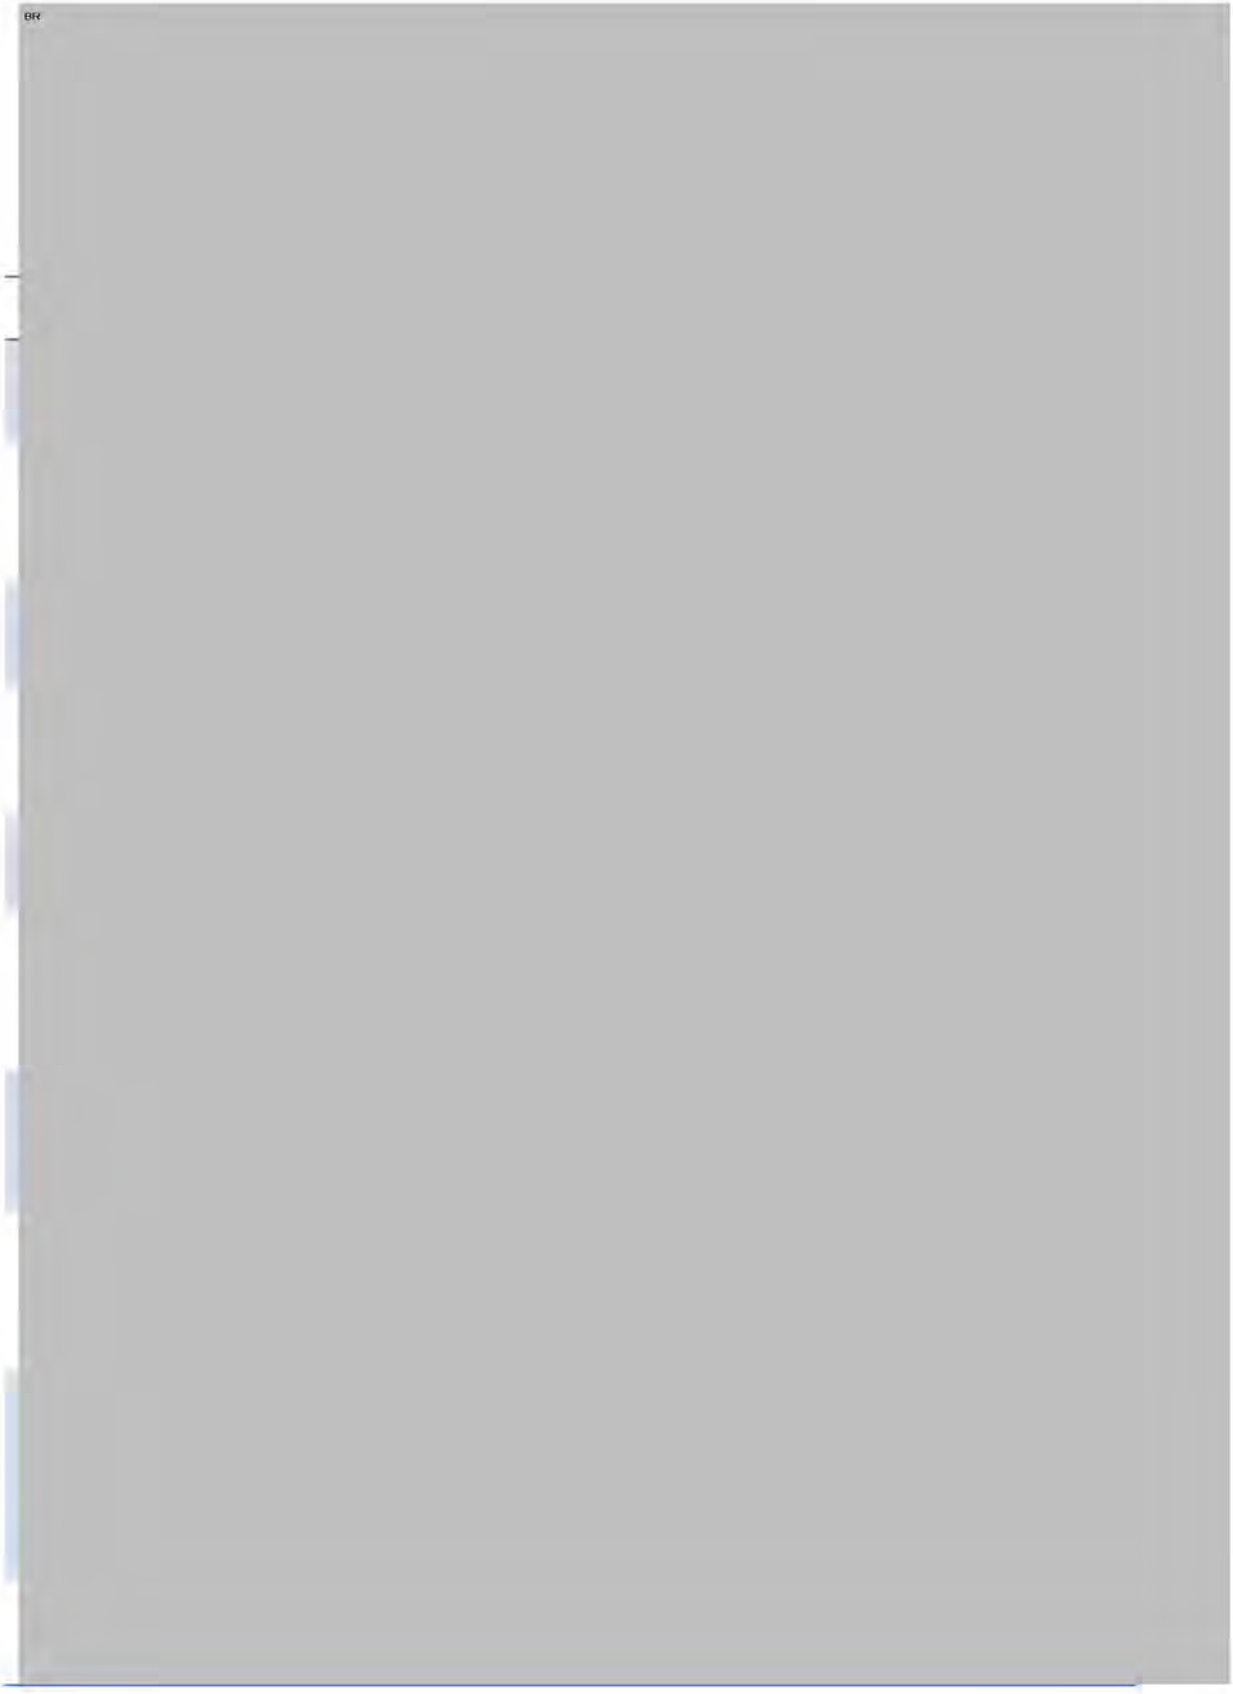

## Buiten de top gevallen risico's:

| Omschrijving | Reden wegvallen uit top | Vorig rang |
|---|---|---|
| O.b.v. zienswijze BP Molenvlietpark e.o. wordt beroep aangetekend met schorsende werking. | Risico is gesloten, er is geen beroep ingediend. | 2 |

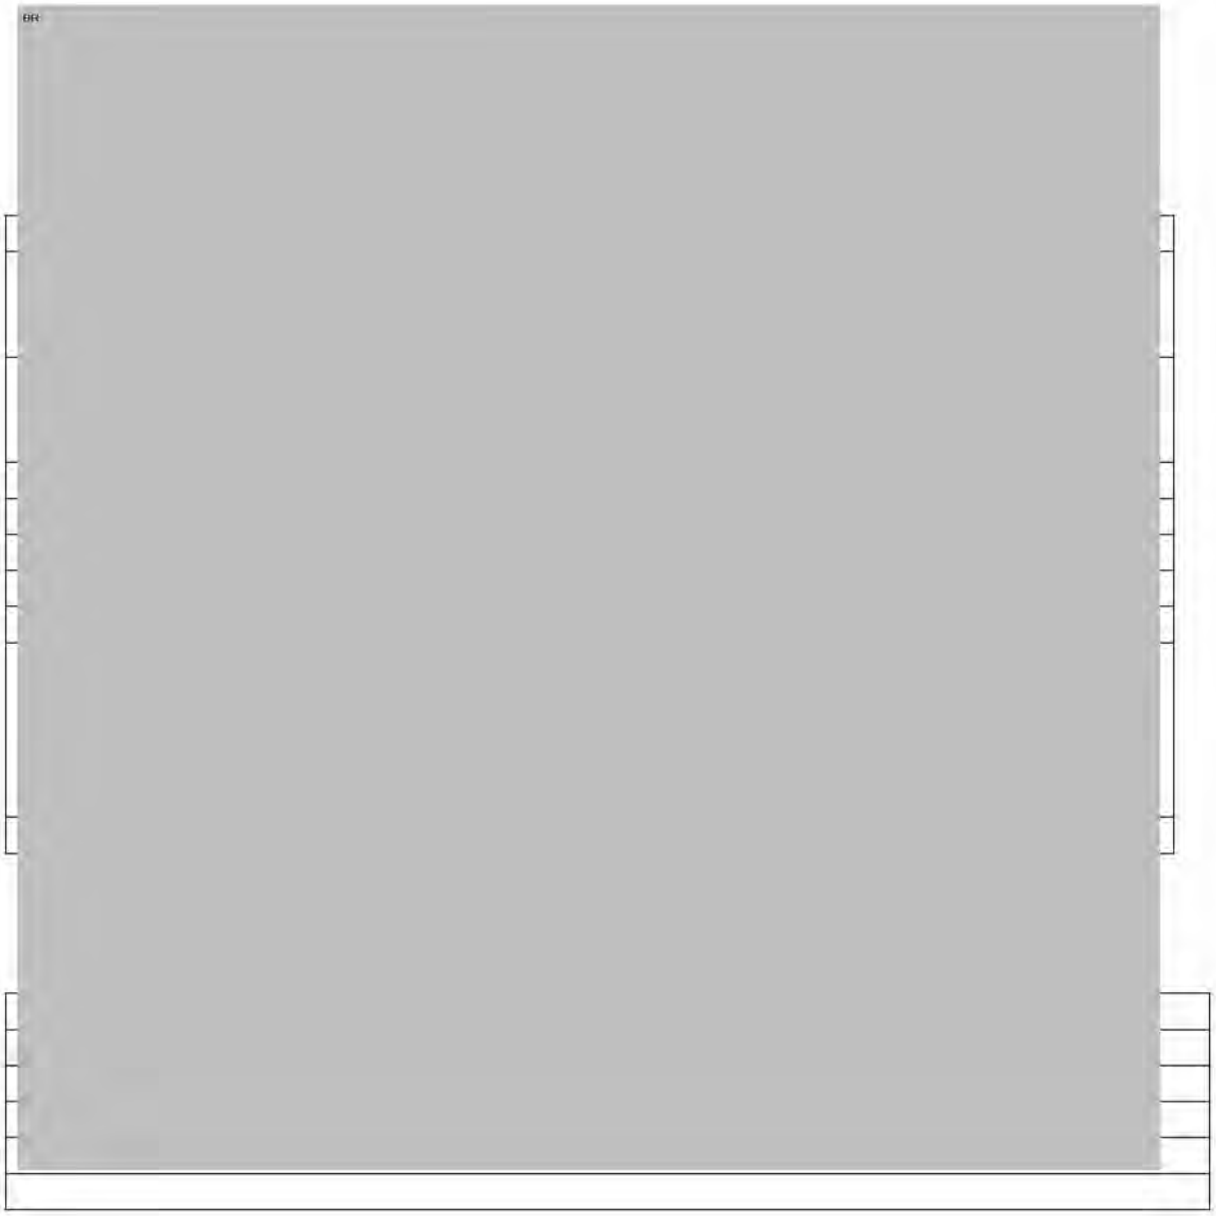

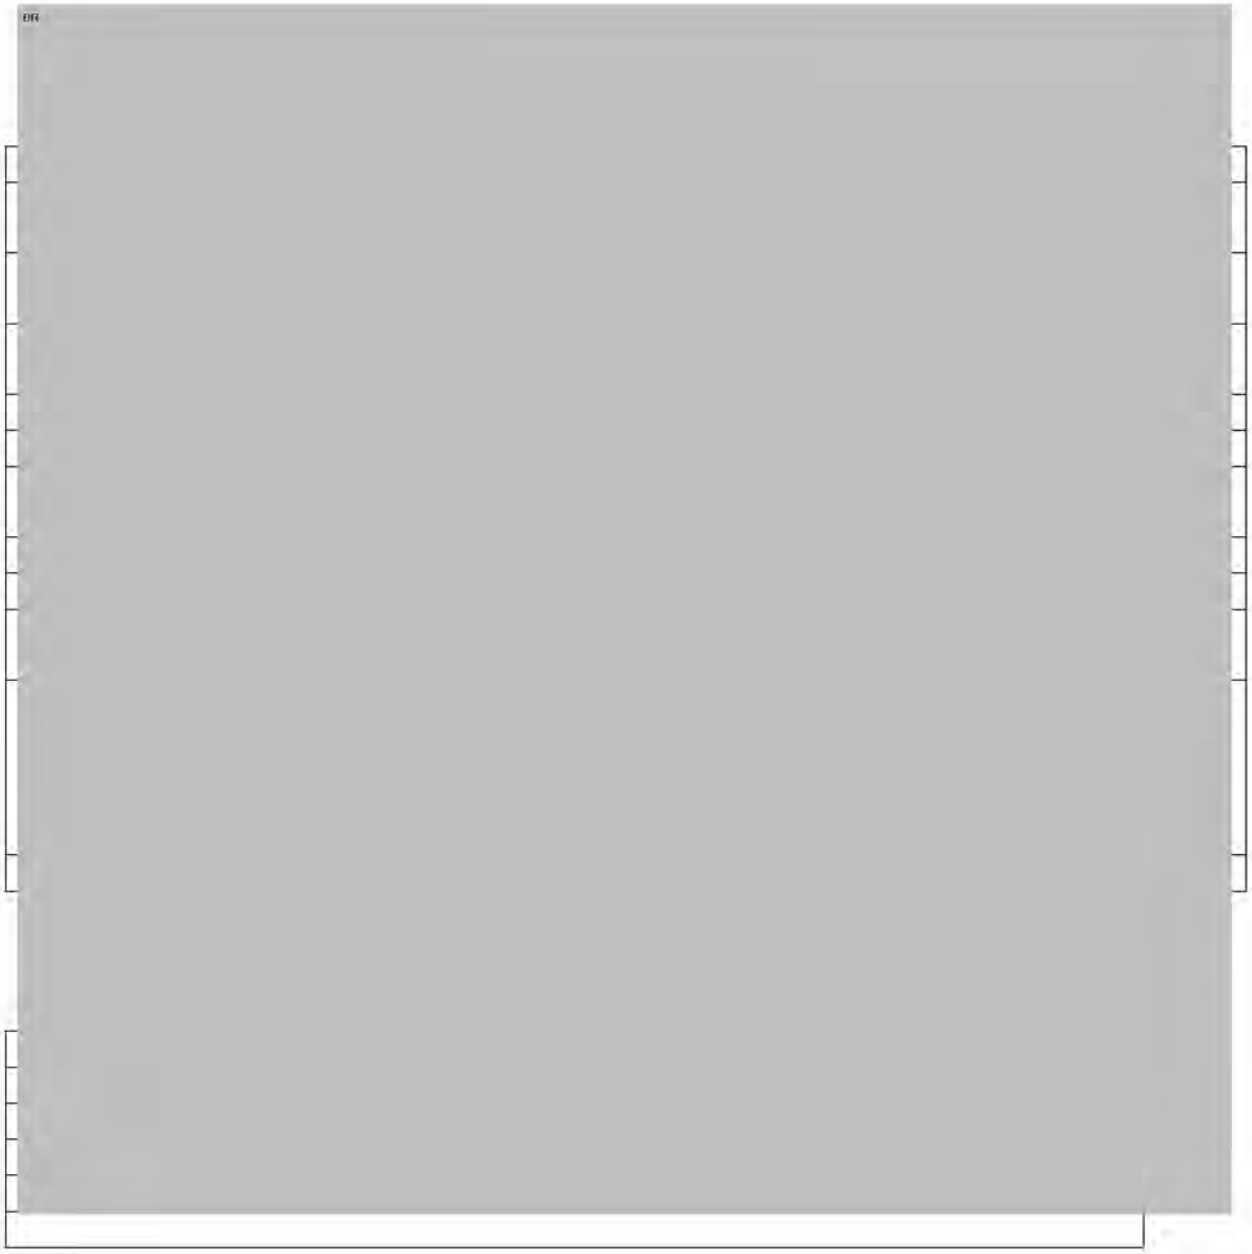

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM REVISIE C (VIGEREND) | VERSCHIL (weken*) T.O.V. VIGERENDE PLANNING (okt 2016) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|
| BR | | | | |
| 13 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 1 | Als gevolg van een correctie in de planning; tijdelijk P-terrein Drievliet kan pas opgeheven worden wanneer loopbrug over de rijbanen Rotterdamsebaan is afgerond. |
| BR | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen binnen het projectgebied**

BR

BR

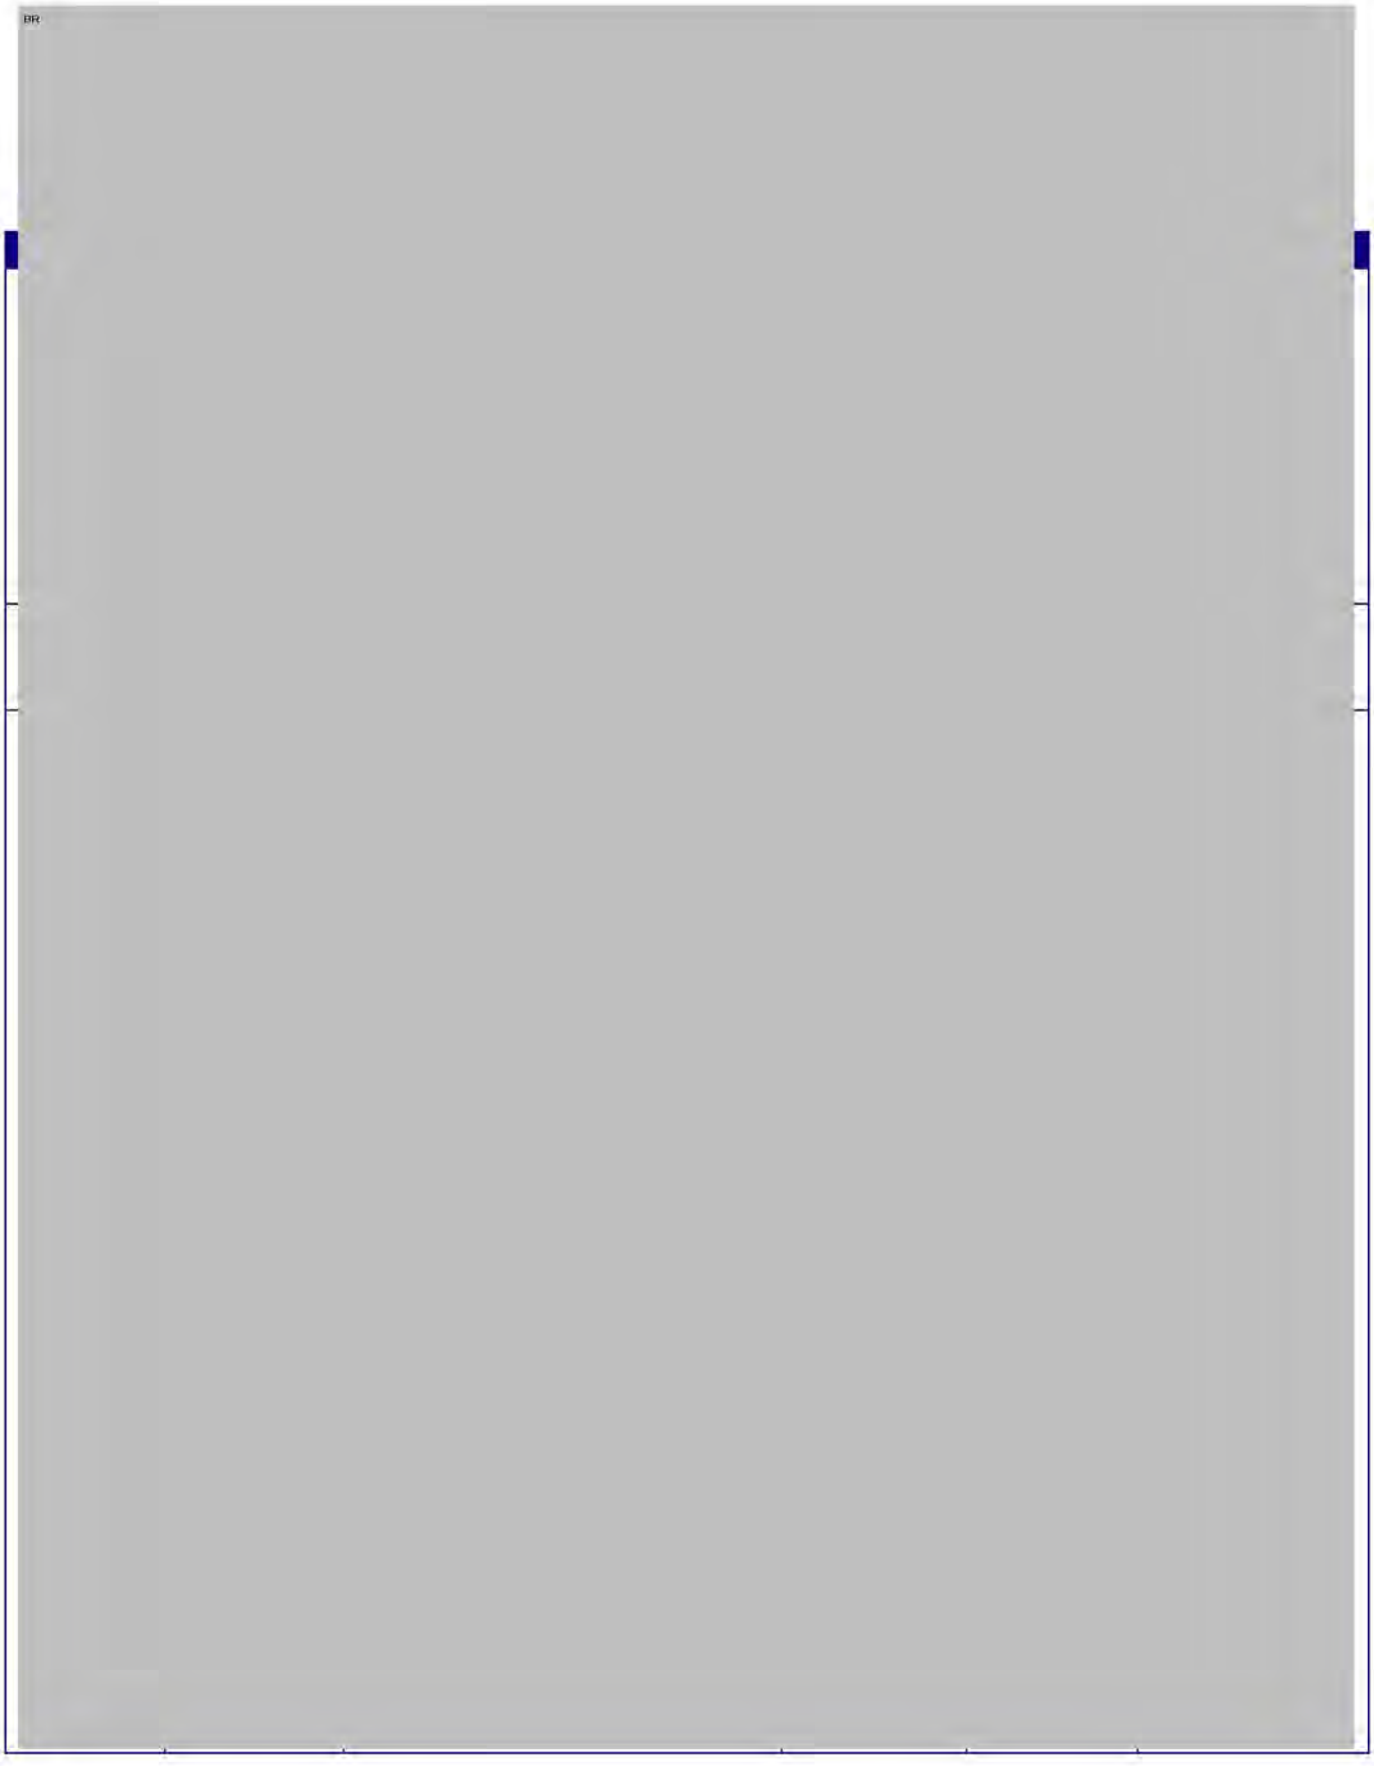

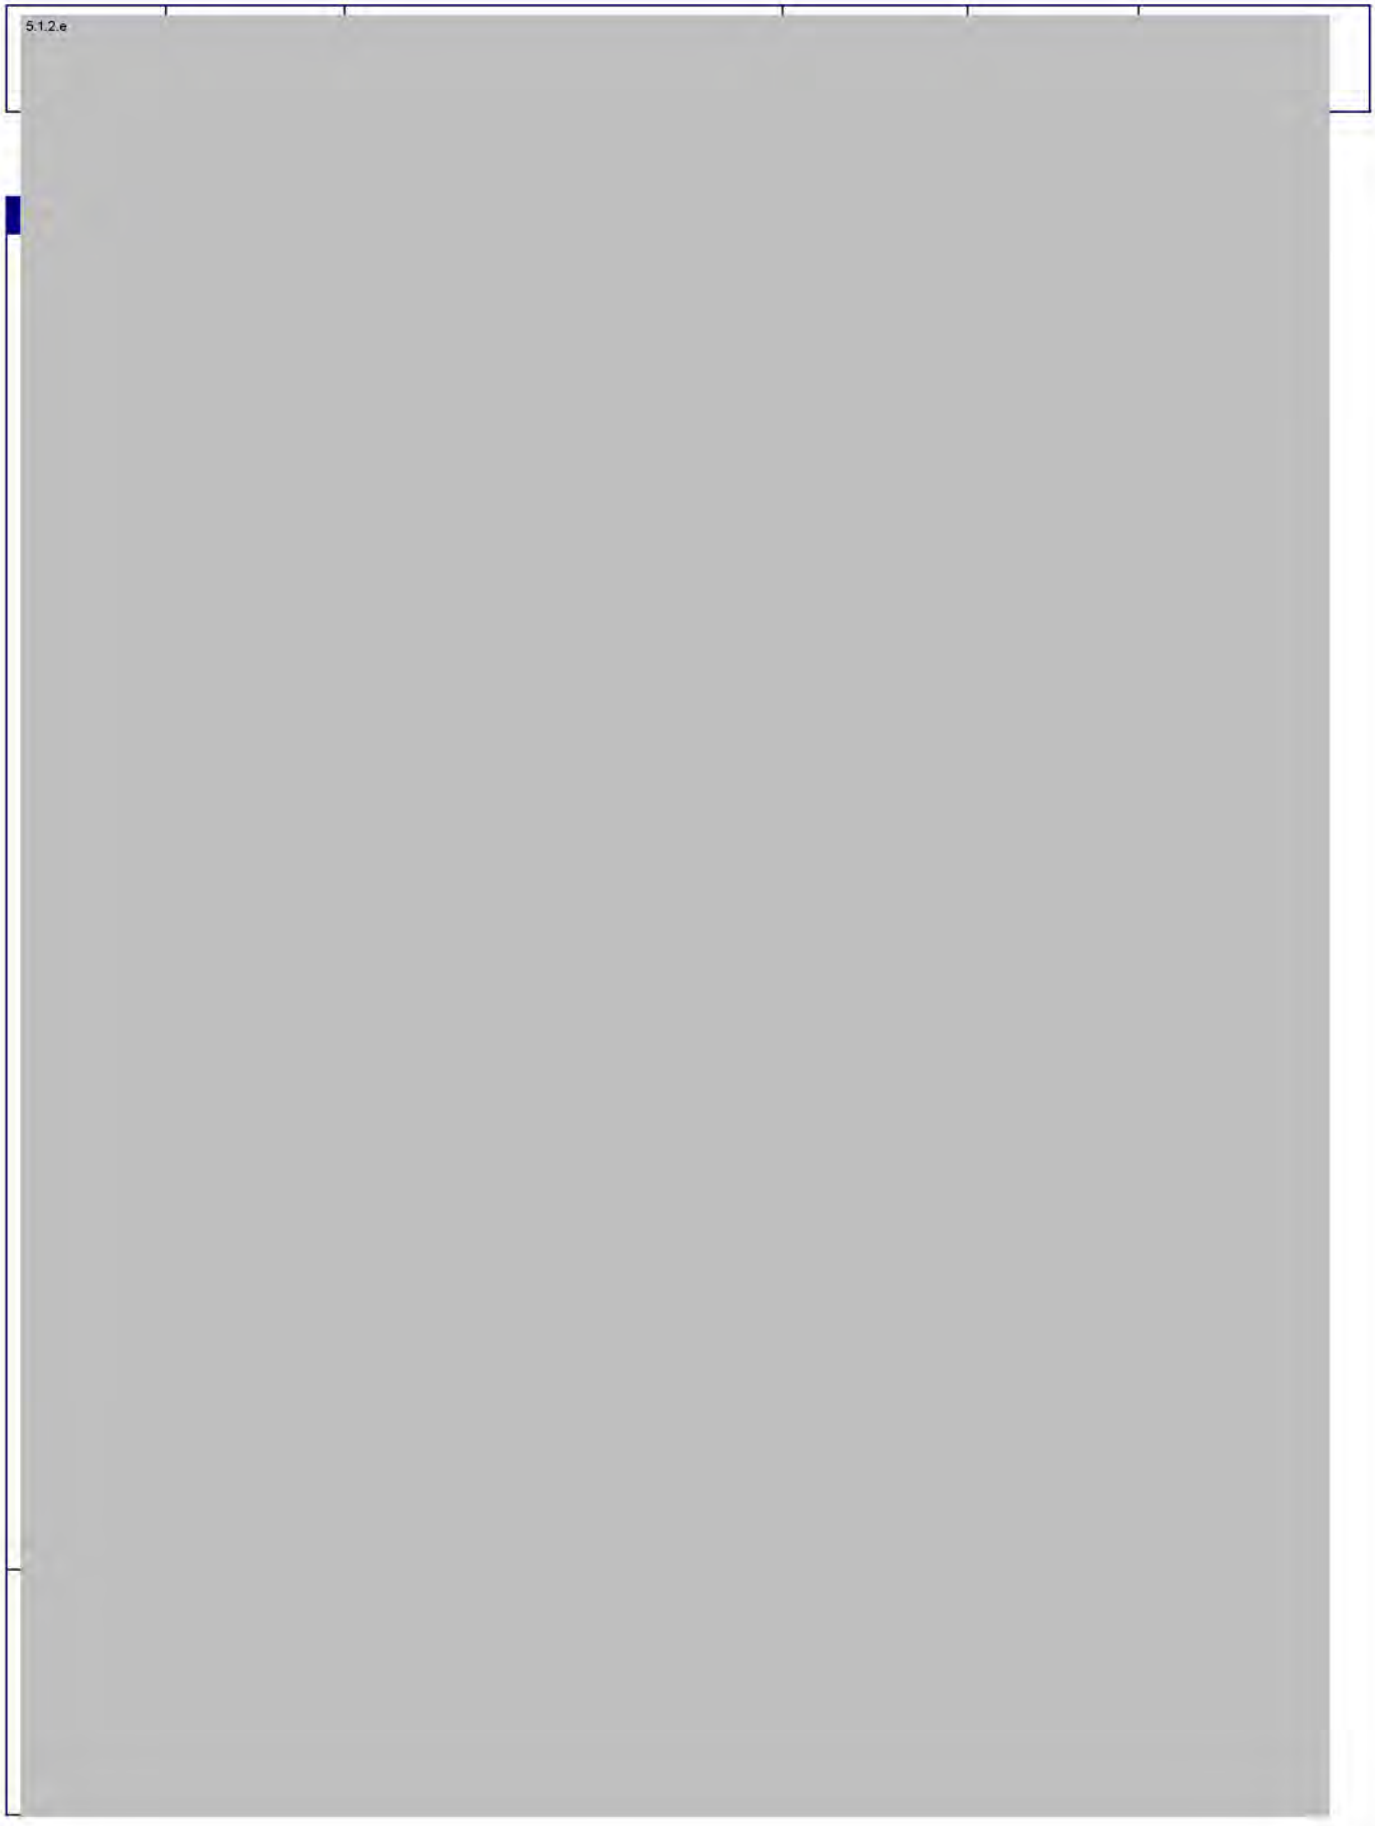
5.1.2.e

BR

Docnr12



Docnr13

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 4e kwartaal 2016

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 8 maart 2017**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

Docnr13

Docnr13



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 4e kwartaal 2016
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004373

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd:** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>10 januari 2017 | Versie 0.1<br>13 januari 2017 | Versie 1.0<br>18 januari 2017 | Versie 1.0<br>2 februari 2017 | Versie 2.0<br>8 maart 2017 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder BSKB / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr13



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

*1.1 Projectgegevens* 5

*1.2 Algemeen* 5

*1.3 Toelichting beheersmaatregelen* 5

*1.4 Terugblik afgelopen kwartaal* 6

*1.5 Verwachting komende kwartaal* 6

*1.6 Financien* 7

*1.7 Planning* 7

*1.8 Risico's* 7

*1.9 Bestuurlijke besluitvorming komende periode* 7

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 9

*2.1 Omgevingsmanagement* 9

2.1.1 Afgelopen kwartaal 9

2.1.2 Komende kwartaal 10

*2.2 Planologie* 11

2.2.1 Afgelopen kwartaal 11

2.2.2 Komende kwartaal 11

*2.3 Vergunningen* 12

2.3.1 Afgelopen kwartaal 12

2.3.2 Komende kwartaal 12

*2.4 Verwervingen* 13

2.4.1 Afgelopen kwartaal 13

2.4.2 Komende kwartaal 13

*2.5 Overeenkomsten* 14

2.5.1 Afgelopen kwartaal 14

2.5.2 Komende kwartaal 14

*2.6 Communicatie* 15

2.6.1 Afgelopen kwartaal 15

2.6.2 Komende kwartaal 15

2.6.3 Diversen 16

3 Projectvoortgang 17

*3.1 Aanbesteden en contracteren* 17

3.1.1 Afgelopen kwartaal 17

3.1.2 Komende kwartaal 17

*3.2 Vormgeving* 18

3.2.1 Afgelopen kwartaal 18

3.2.2 Komende kwartaal 18

*3.3 Monitoring* 19

3.3.1 Afgelopen kwartaal 19

Docnr13



3.3.2 Komende kwartaal 19

*3.4 Inpassing Binckhorst* *20*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 20
3.4.2 Komende kwartaal 21

*3.5 Inpassing Vlietzone* *23*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 23
3.5.2 Komende kwartaal 24

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* *26*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 26
3.6.2 Komende kwartaal 26

*3.7 Boortunnel en toeritten* *27*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 27
3.7.2 Komende kwartaal 27

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *28*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 28
3.8.2 Komende kwartaal 28

*3.9 Installaties* *30*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 30
3.9.2 Komende kwartaal 30

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *31*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 31
3.10.2 Komende kwartaal 31

*3.11 Uitvoeringskwaliteit* *32*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 32
3.11.2 Komende kwartaal 32

*3.12 Contractmanagement* *33*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 33
3.12.2 Komende kwartaal 33

**4 Overdracht en openstelling** **34**

*4.1 Tunnelveiligheid* *34*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 34
4.1.2 Komende kwartaal 34

*4.2 Overdracht aan beheerders* *35*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 35
4.2.2 Komende kwartaal 35

*4.3 Beheer en onderhoud* *36*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 36
4.3.2 Komende kwartaal 36

**5 Projectbeheersing** **37**

*5.1 Scope* *37*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 37
5.1.2 Komende kwartaal 37

*5.2 Financien* *38*
5.2.1 Kostenstructuur 38

Docnr13



5.2.2 Dekkingen 39

*5.3 Planning* *42*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 42
5.3.2 Komende kwartaal 42

*5.4 Risico's* *43*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 43
5.4.2 Komende kwartaal 43
5.4.3 Financiële toprisico's 43
5.4.4 Toprisico's planning 44

*5.5 Interne kwaliteit* *47*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 47
5.5.2 Komende kwartaal 47

*5.6 Informatiebeheer* *48*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 48
5.6.2 Komende kwartaal 48

*5.7 Organisatie* *49*
5.7.1 Afgelopen kwartaal 49
5.7.2 Komende kwartaal 49

6 Bijlage: Planningsmijlpalen 50

7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 51

8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 53

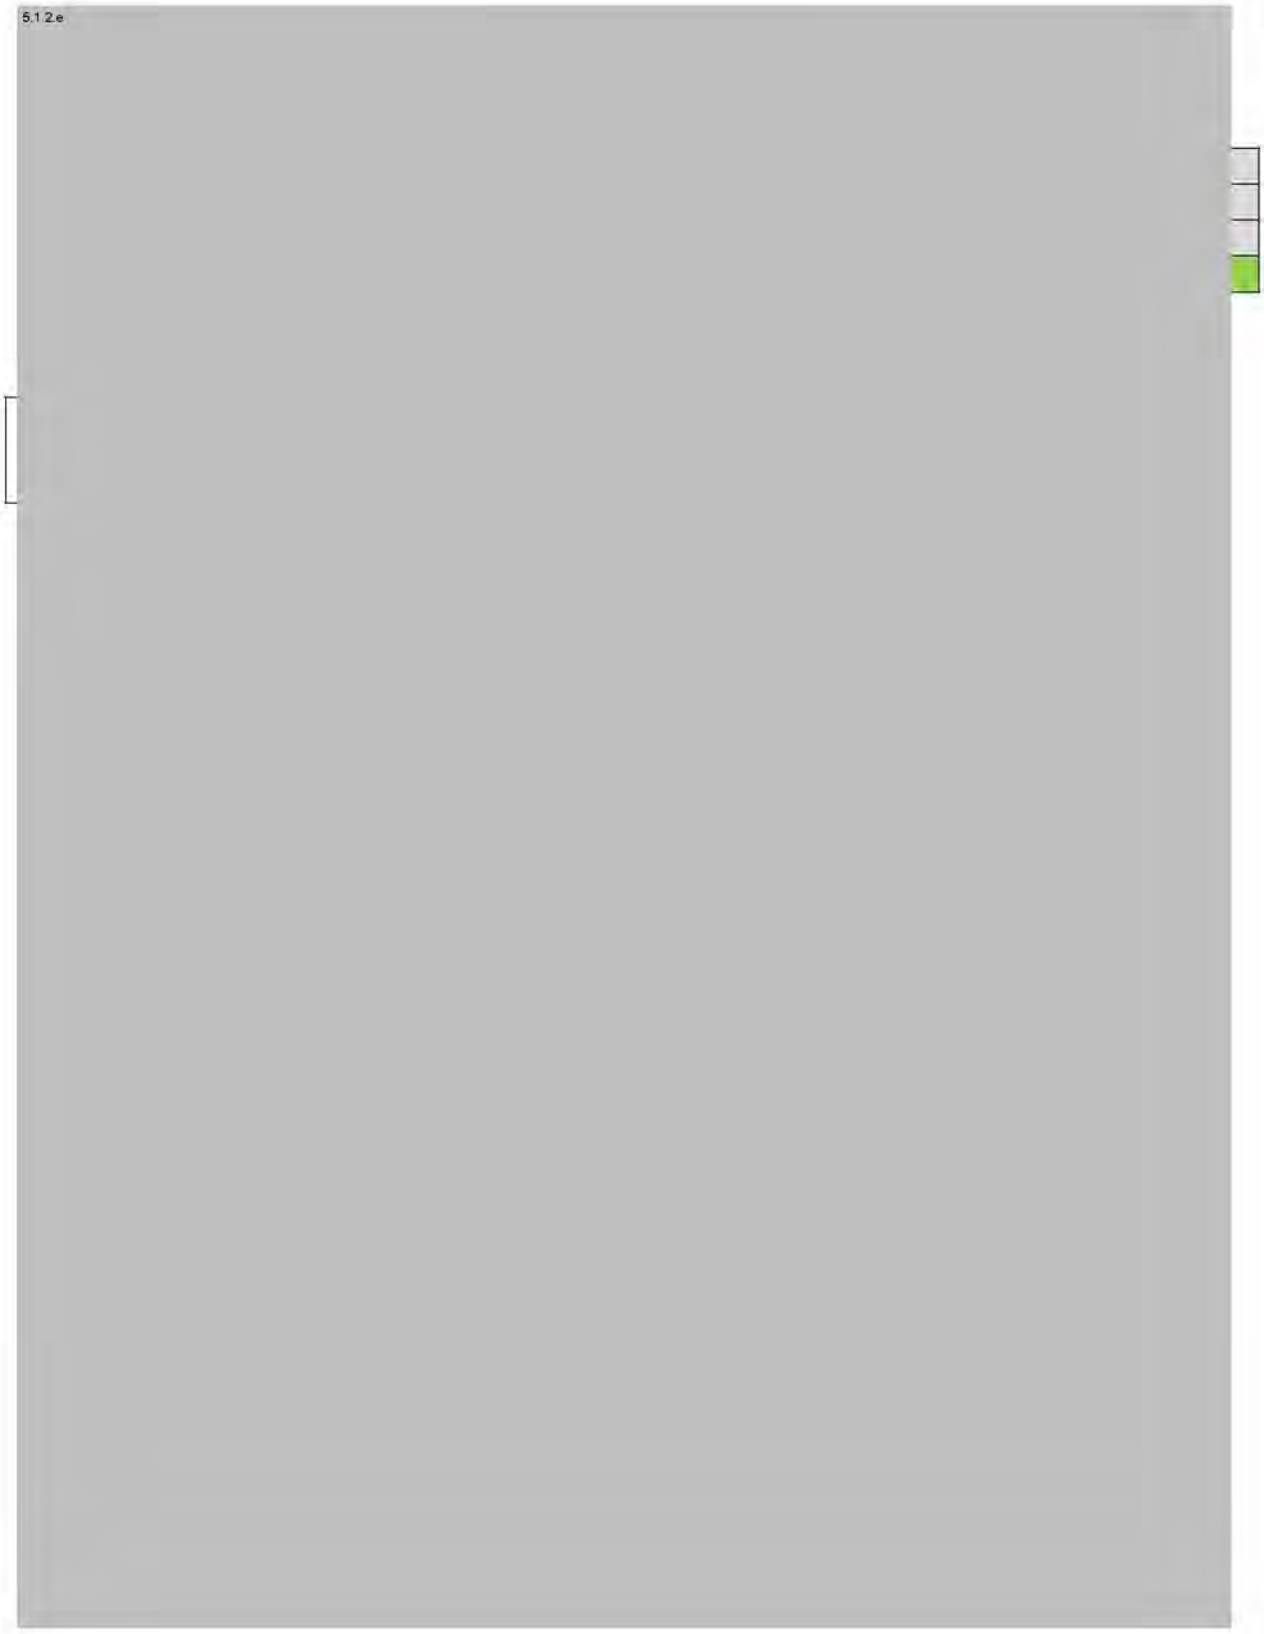
5.1.2.e

## 1.4 Terugblik afgelopen kwartaal

[redacted]

- De consequenties van het ruimtebeslag van de 2e watertoevoer over het perceel van 5.1.2.e zijn in beeld gebracht. Er wordt gewerkt aan zowel een planologisch uitvoeringskader (PUK) voor het toetsen van de de ruimtelijke ontwikkeling van Nieuw-Vredenoord als een samenwerkingsovereenkomst;

[redacted]

## 1.5 Verwachting komende kwartaal

[redacted]

- Afronden van het PUK t.b.v. de ontwikkeling van Nieuw Vredenoord en parallel afronden van de overeenkomst met 5.1.2.e t.a.v. de waterinlaat naar de calamiteitenberging in het Molenvlietpark;
- CRB zal de omgevingsvergunning voor het dienstgebouw in de Vlietzone aanvragen;

[redacted]

## 1.7 Planning

- de latere realisatie van de eerste fase van het Molenvlietpark ter plaatse van de waterberging wegens de gecompliceerde waterhuishouding en daarmee intensieve afstemming tussen CRB en het Hoogheemraadschap;

## 1.9 Bestuurlijke besluitvorming komende periode

Het College B&W zal verzocht worden een besluit te nemen over de samenwerkingsovereenkomst met [redacted] t.a.v. waterinlaat van Zuidvliet naar de calamiteitenberging in het Molenvlietpark

tezamen met Project Uitvoeringskader ontwikkeling Nieuw Vredenoord en overeenkomst grondruil. (1e kwartaal 2017).

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| [redacted] | |
| Afronden overeenkomst 5.1.2.e t.a.v. inlaat waterberging Molenvlietpark over zijn gronden op basis van het aangepaste ontwerp. | De consequenties van het ruimtebeslag van de 2e watertoevoer over het perceel van dhr. 5.1.2.e zijn in beeld gebracht. In de samenwerkingsovereenkomst die in de maak is bestaat er een koppeling tussen de ruimtelijke ontwikkeling van Nieuw-Vredenoord en de aanleg van de waterinlaat. Om de plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van 5.1.2.e door te gemeente te kunnen toetsen is er een planologisch uitvoeringskader (PUK) nodig. |
| Overeenstemming bereiken met 5.1.2.e t.a.v. de waterinlaat naar de waterberging Molenvlietpark en de verlegging van het Molenslootpad, waarbij de aanpassing (verhoging) van de brug geen issue meer is. | In afwachting van het moment van overeenstemming met 5.1.2.e is verdere bespreking met 5.1.2.e aangehouden. |
| | |
| **Overige / extra verrichte werkzaamheden** | |
| Geen | |
| | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Collegebesluit aangaande overeenkomst met dhr. 5.1.2.e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark in relatie tot de ontwikkeling Nieuw Vredenoord. | Geen |
| | |

### 2.1.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|

| |
|---|
| BR |
| Starten en afronden van een PUK t.b.v. de ontwikkeling van Nieuw Vredenoord en parallel daaraan het afronden van de overeenkomst met 5.1.2.e t.a.v. inlaat waterberging Molenvlietpark over zijn gronden op basis van het aangepaste ontwerp. Na besluitvorming zal de verdere ontwikkeling Nieuw Vredenoord door DSO worden opgepakt (faciliteren). |
| Overeenstemming bereiken met 5.1.2.e t.a.v. de waterinlaat naar de waterberging Molenvlietpark en de verlegging van het Molenslootpad, waarbij de aanpassing (verhoging) van de brug geen issue meer is (afhankelijk van uitkomst overeenkomst met 5.1.2.e ).. |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |
| |

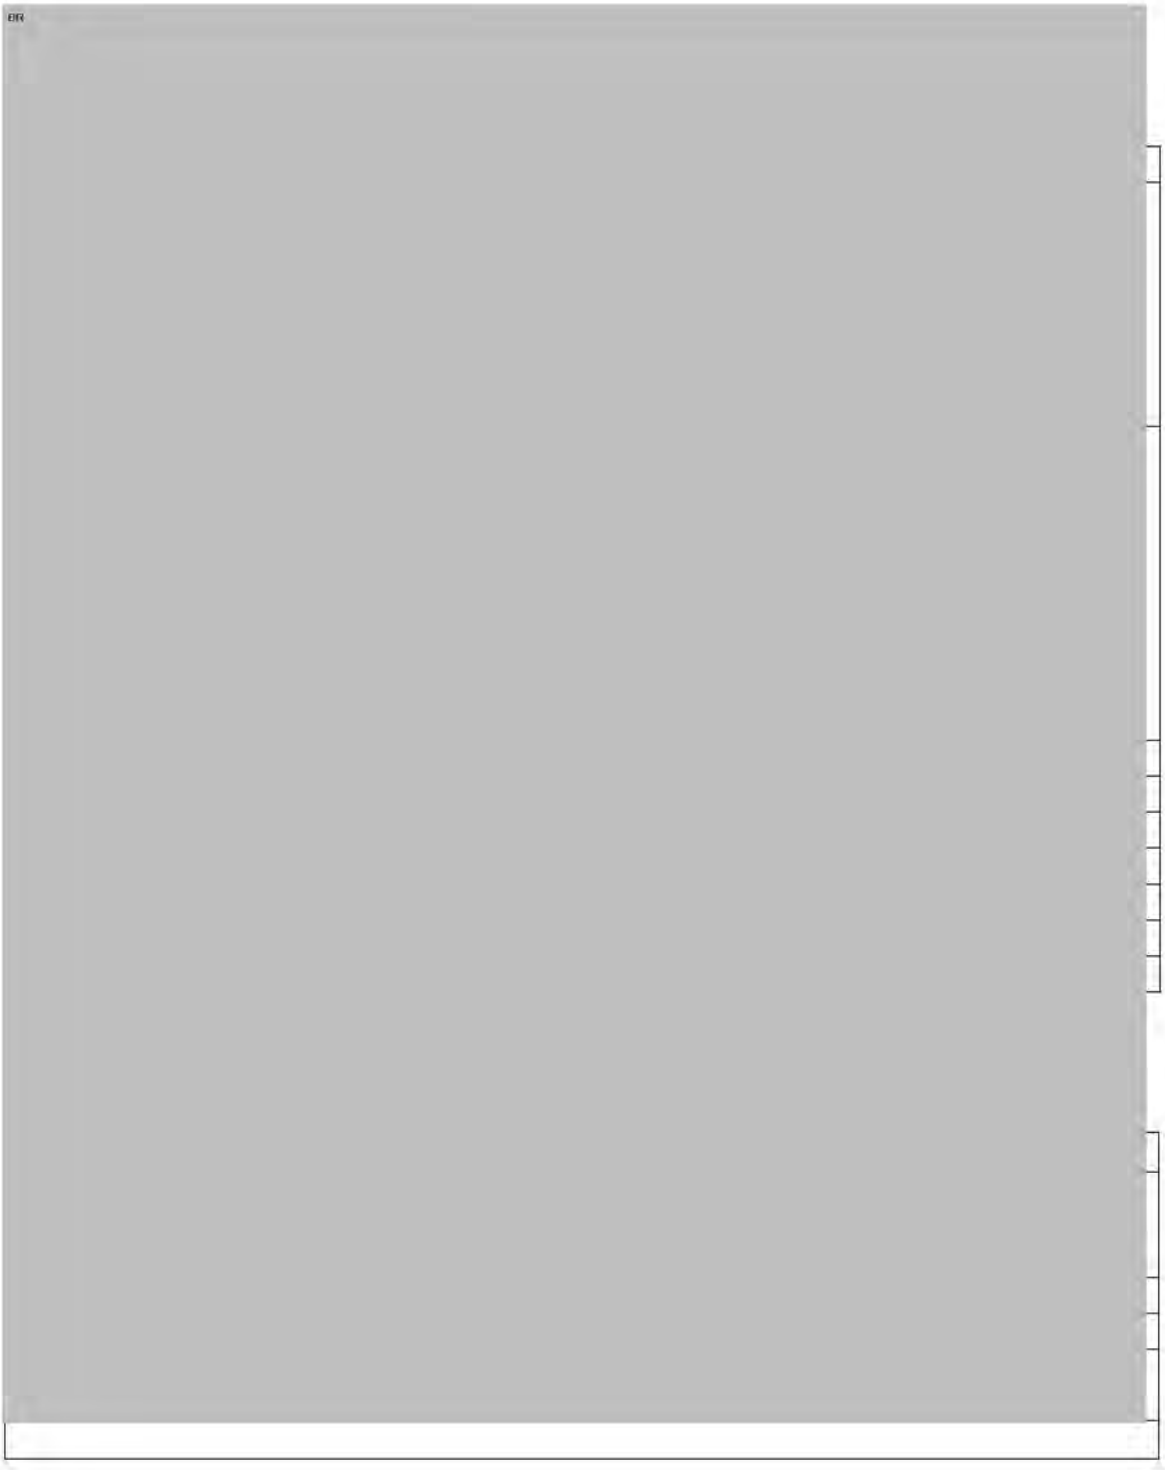
BR

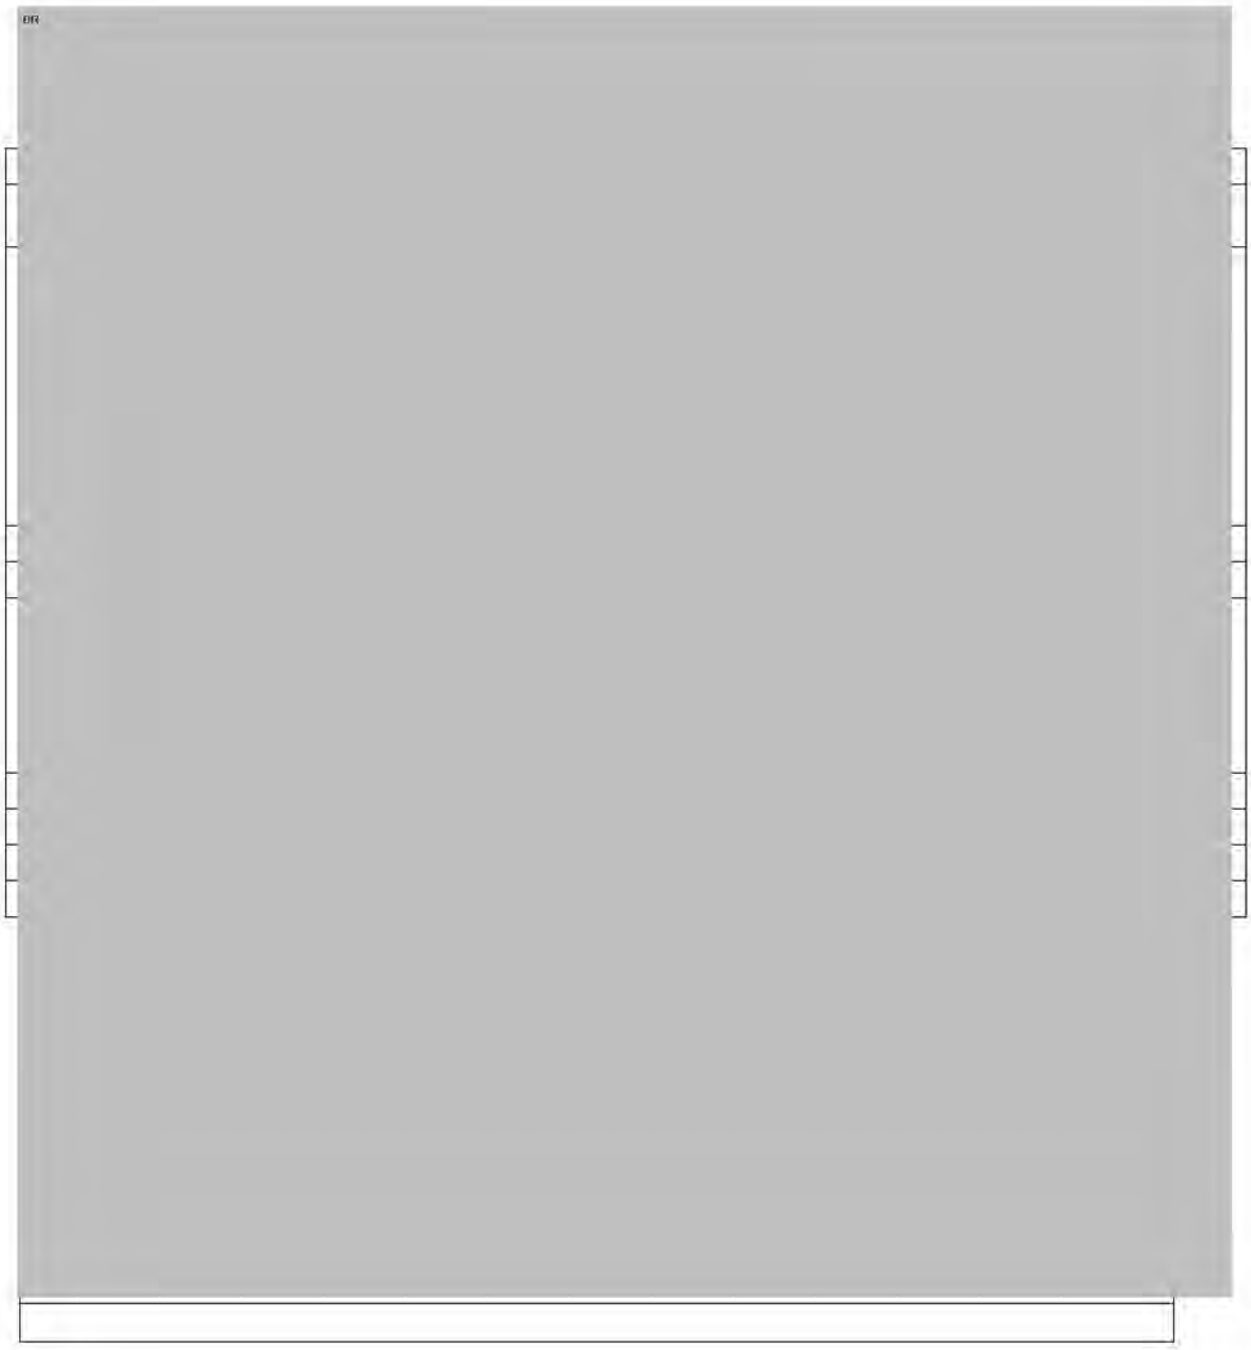
DR

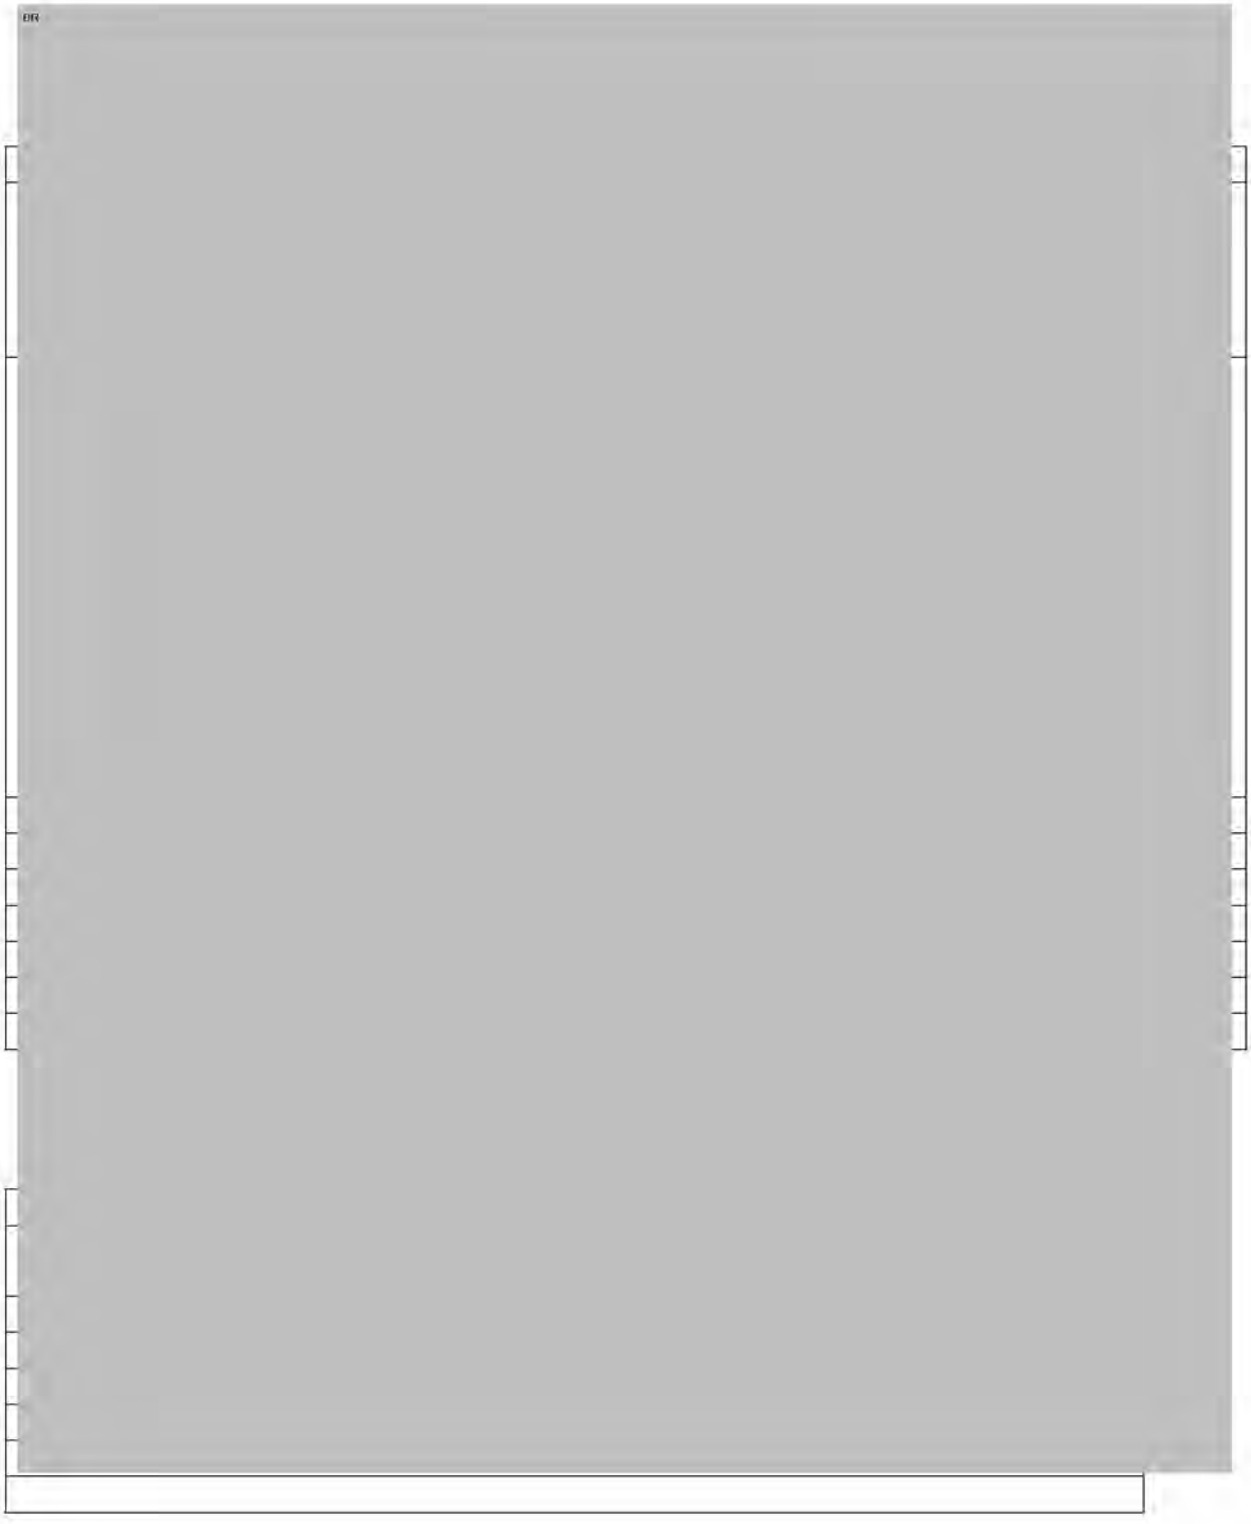

## 2.5 Overeenkomsten

### 2.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Opstellen en afronden van overeenkomsten met 5.1.2e en 5.1.2e | Loopt (zie Omgevingsmanagement). |
| [redacted] | |

### 2.5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Afronden overeenkomst met 5.1.2e |
| [redacted] |
| |
| **Besluiten** |
| Collegebesluit aangaande overeenkomst met 5.1.2e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark in relatie tot de ontwikkeling Nieuw Vredenoord staat vooralsnog gepland voor 1e kwartaal 2017. |
| |

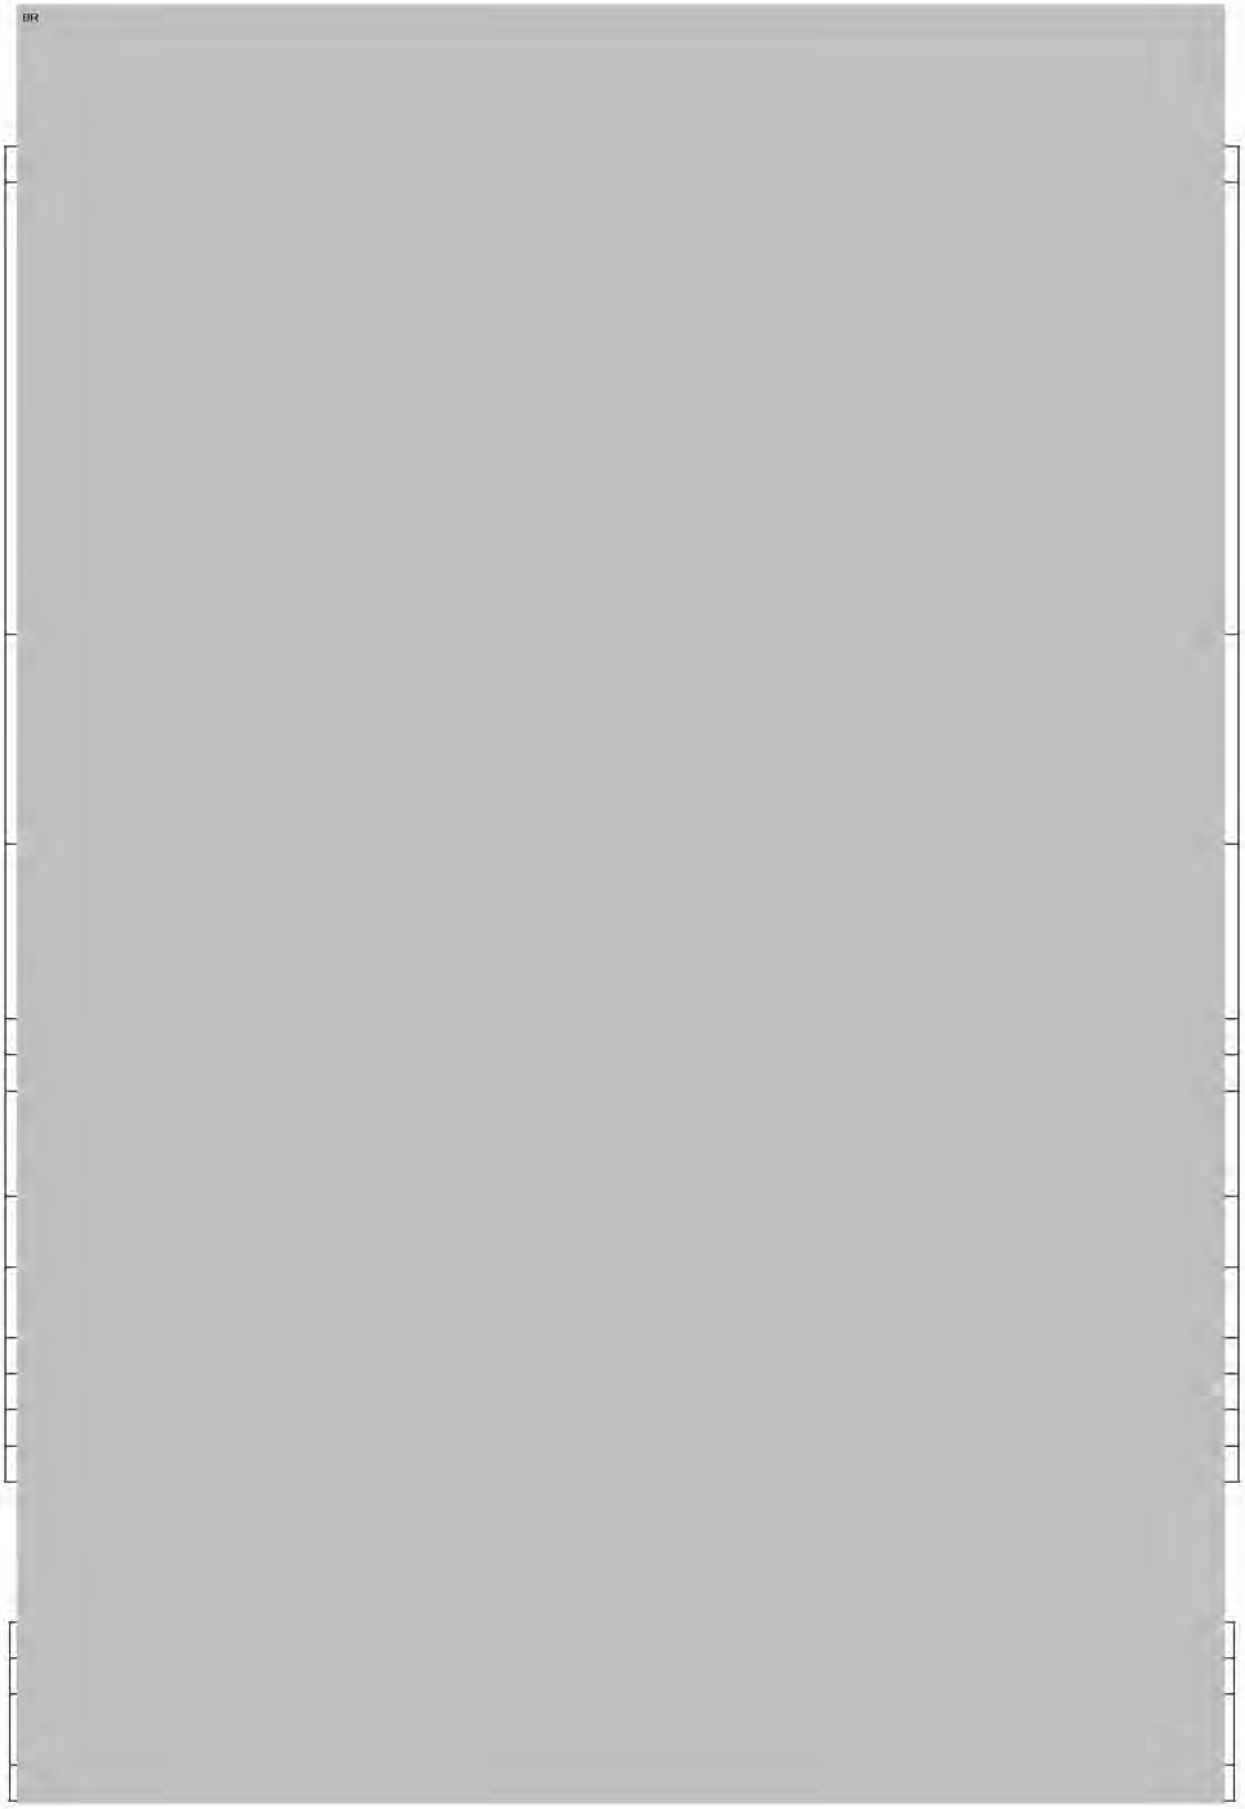
BR

BR

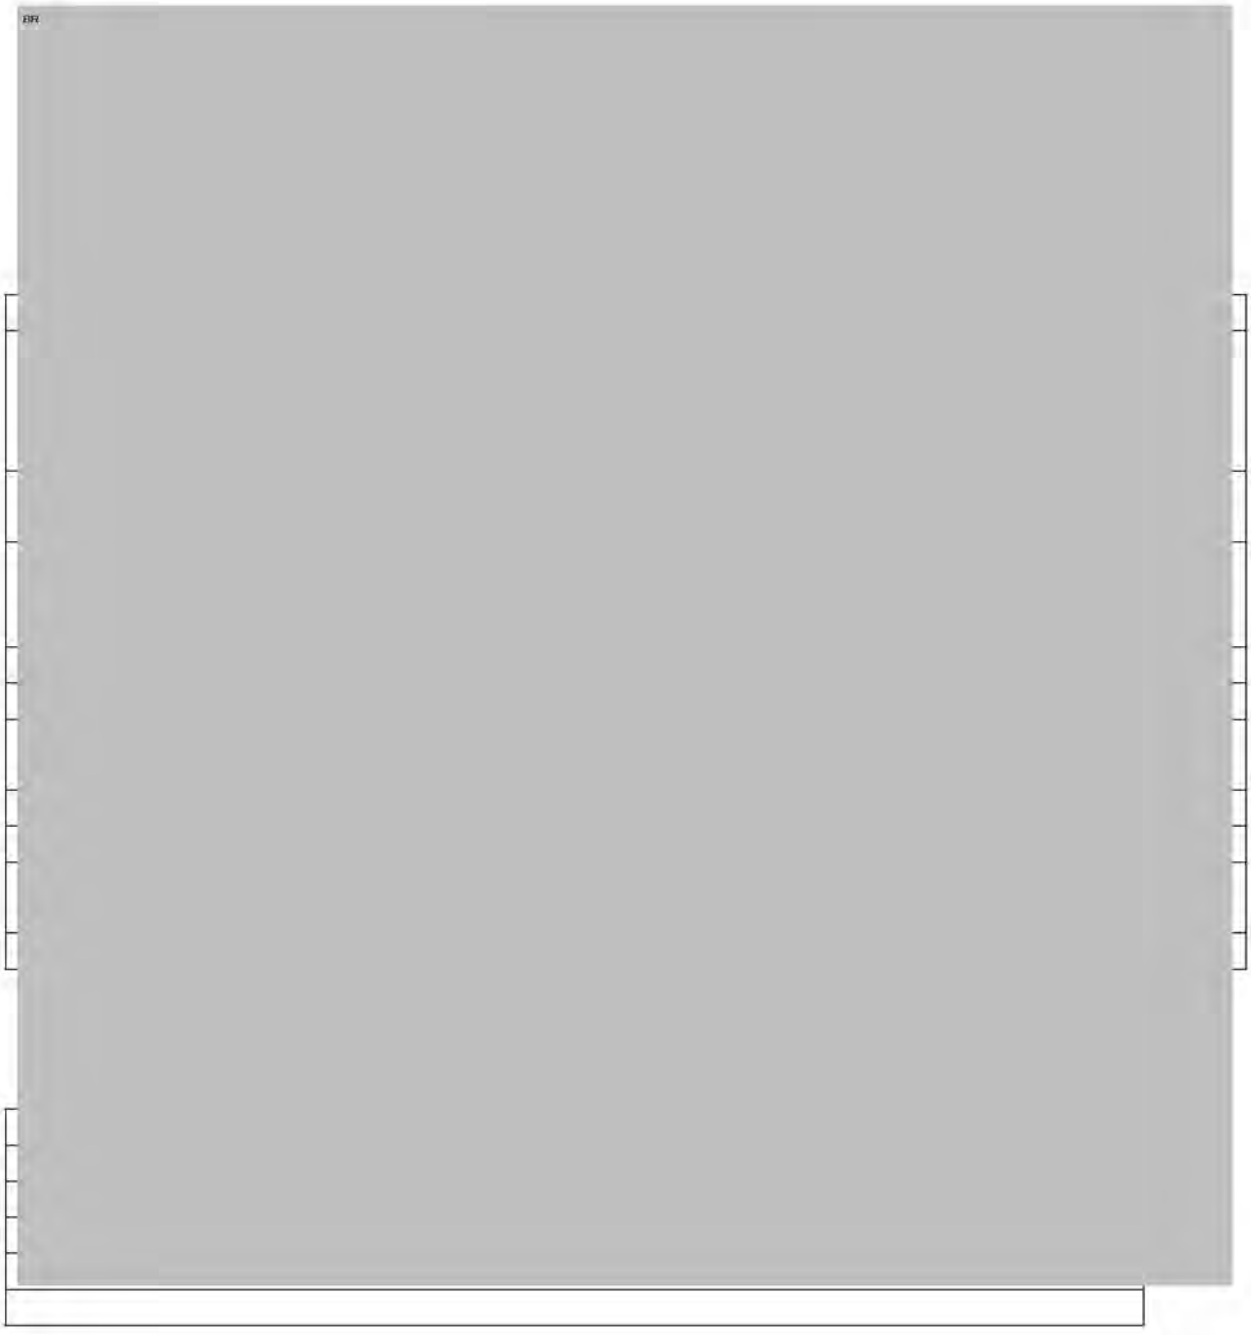

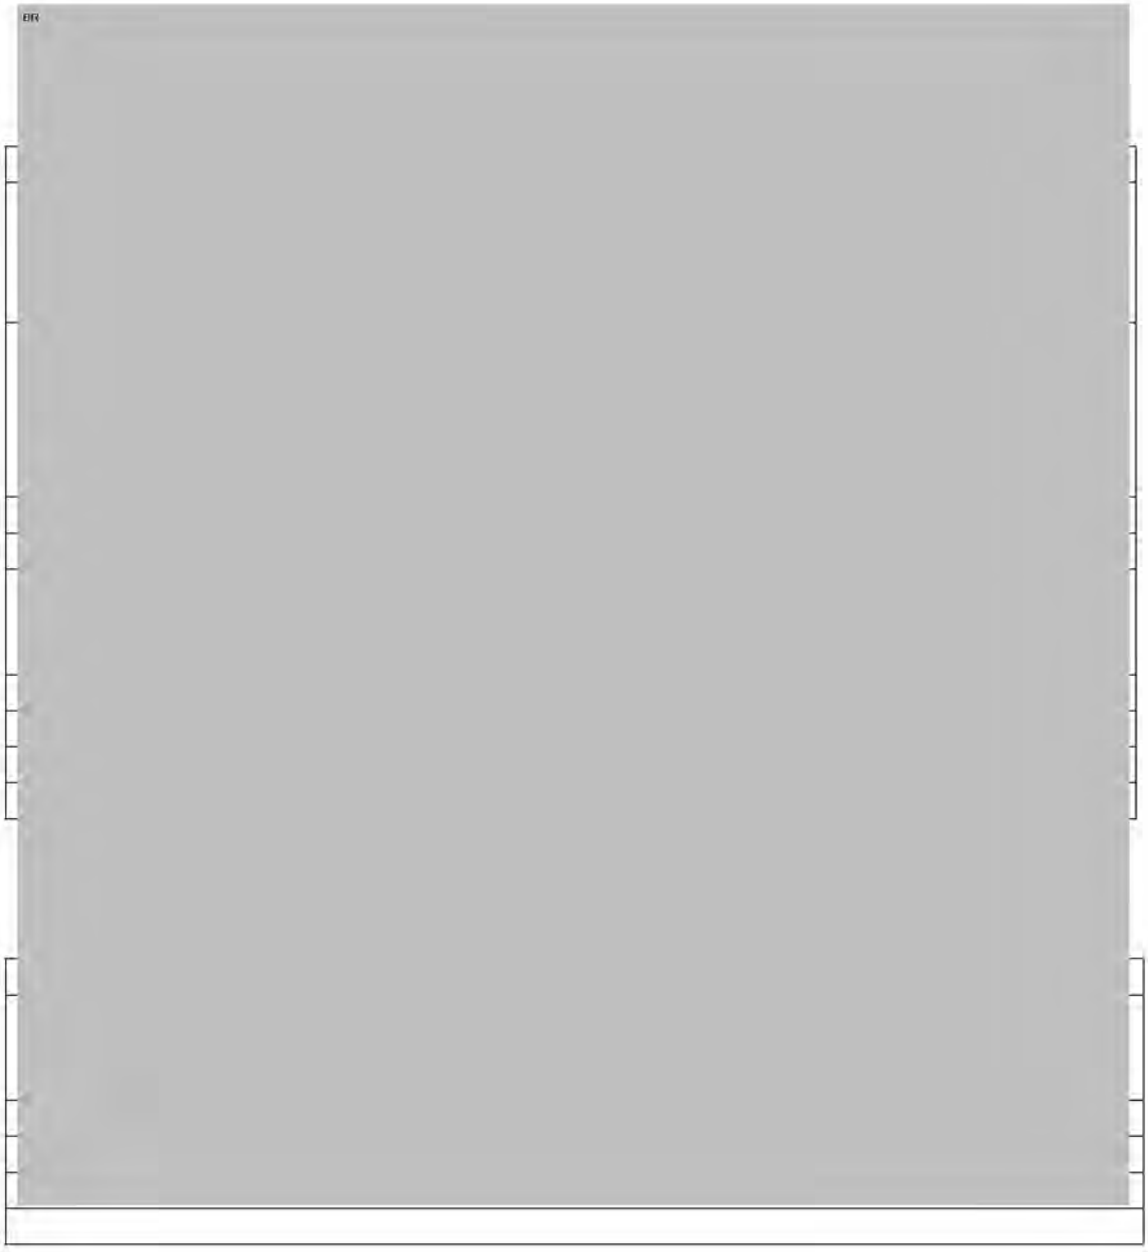
BR

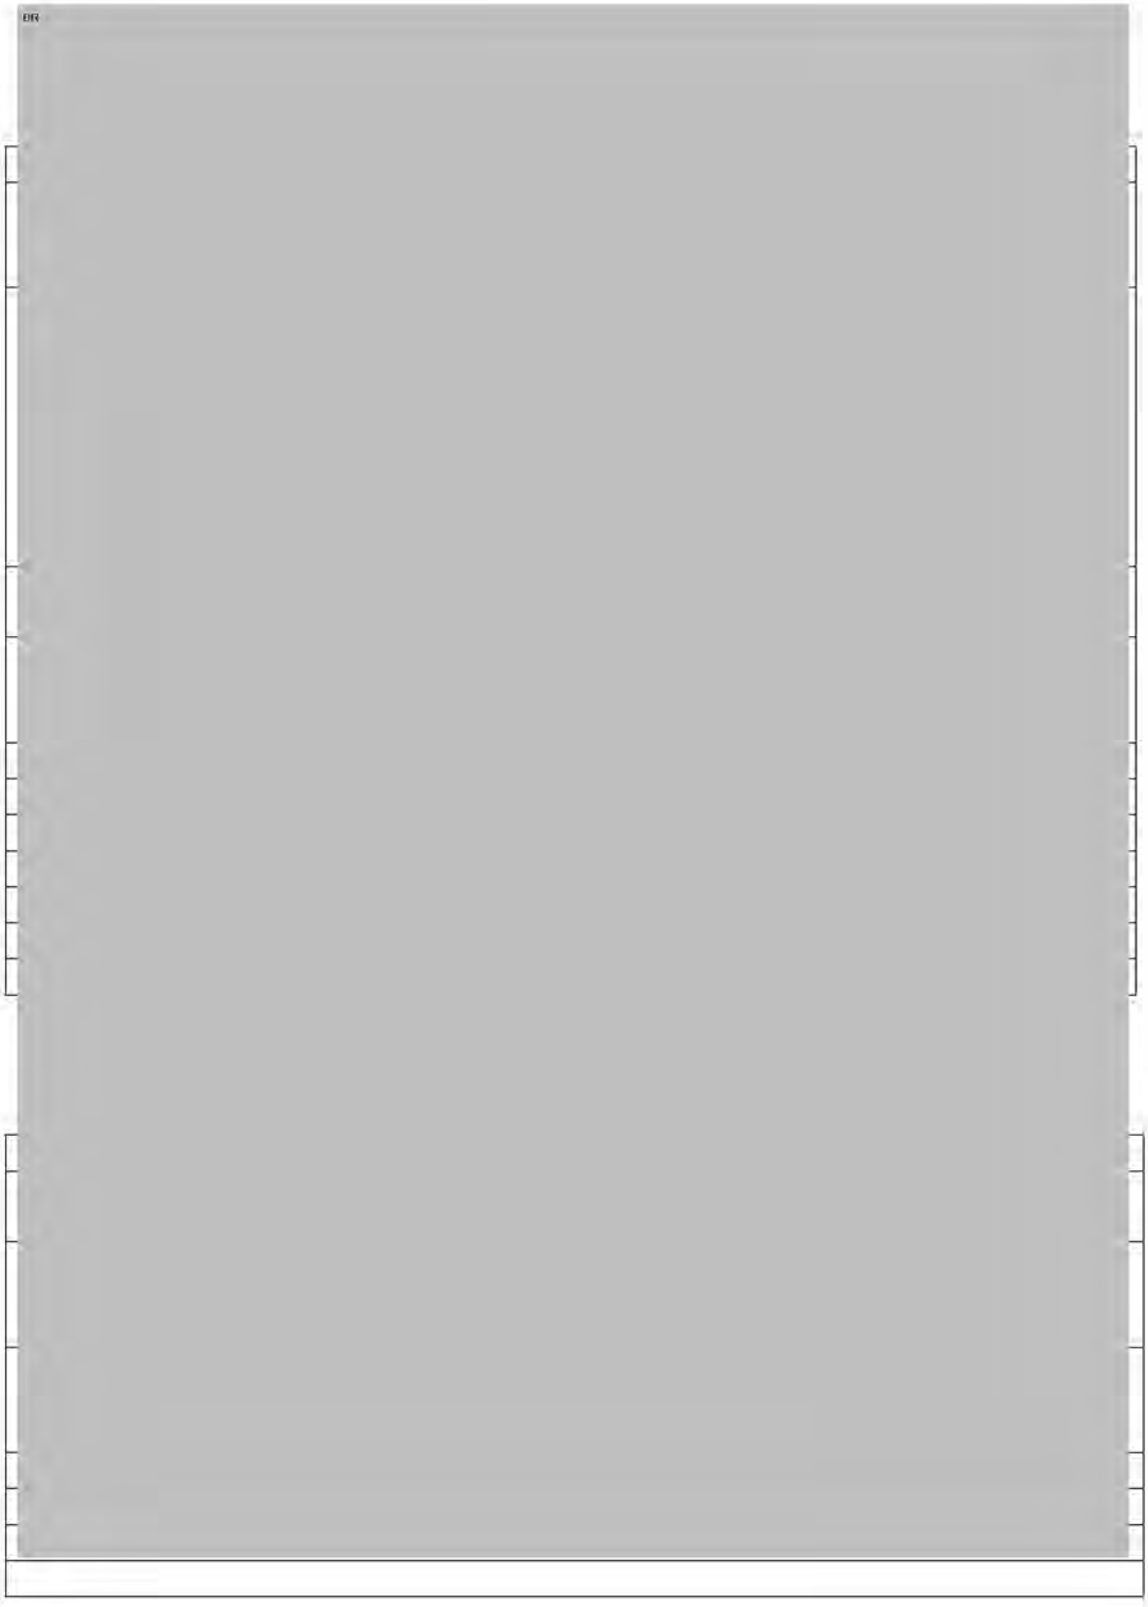
DR

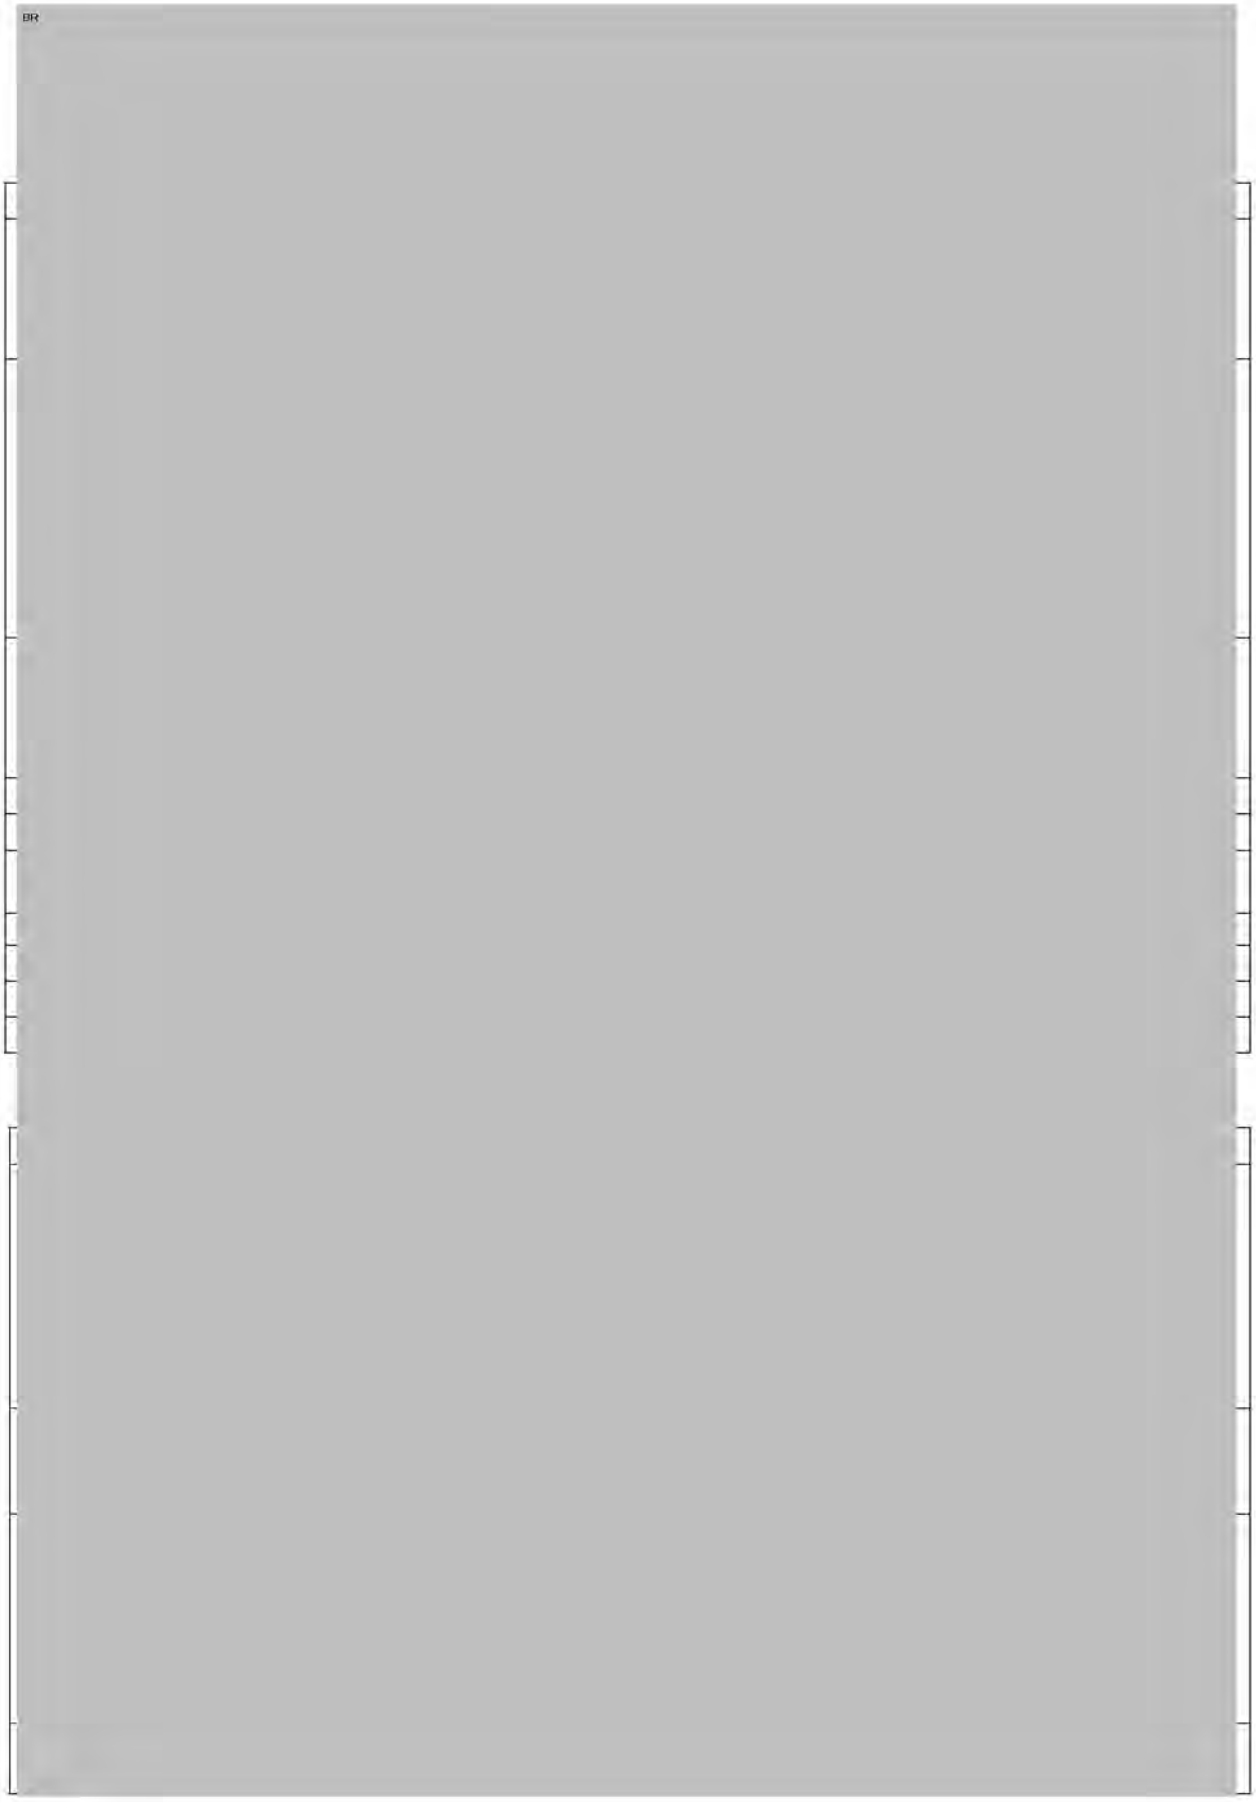
BR

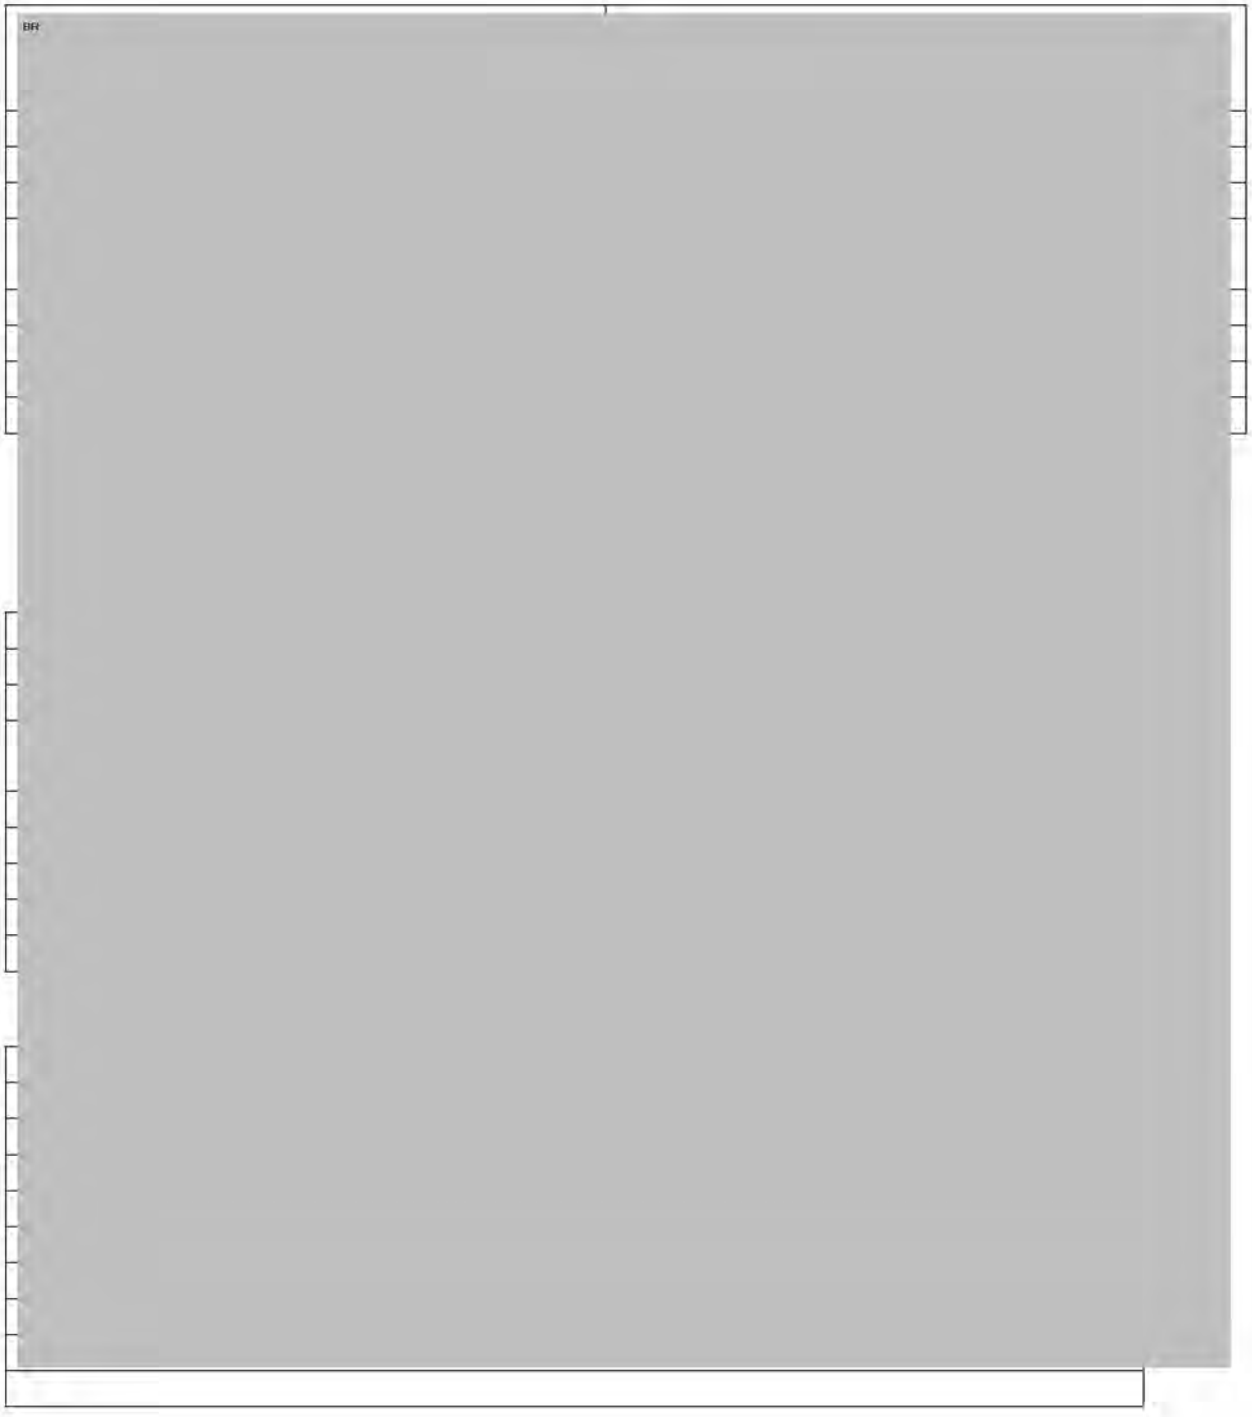
BR

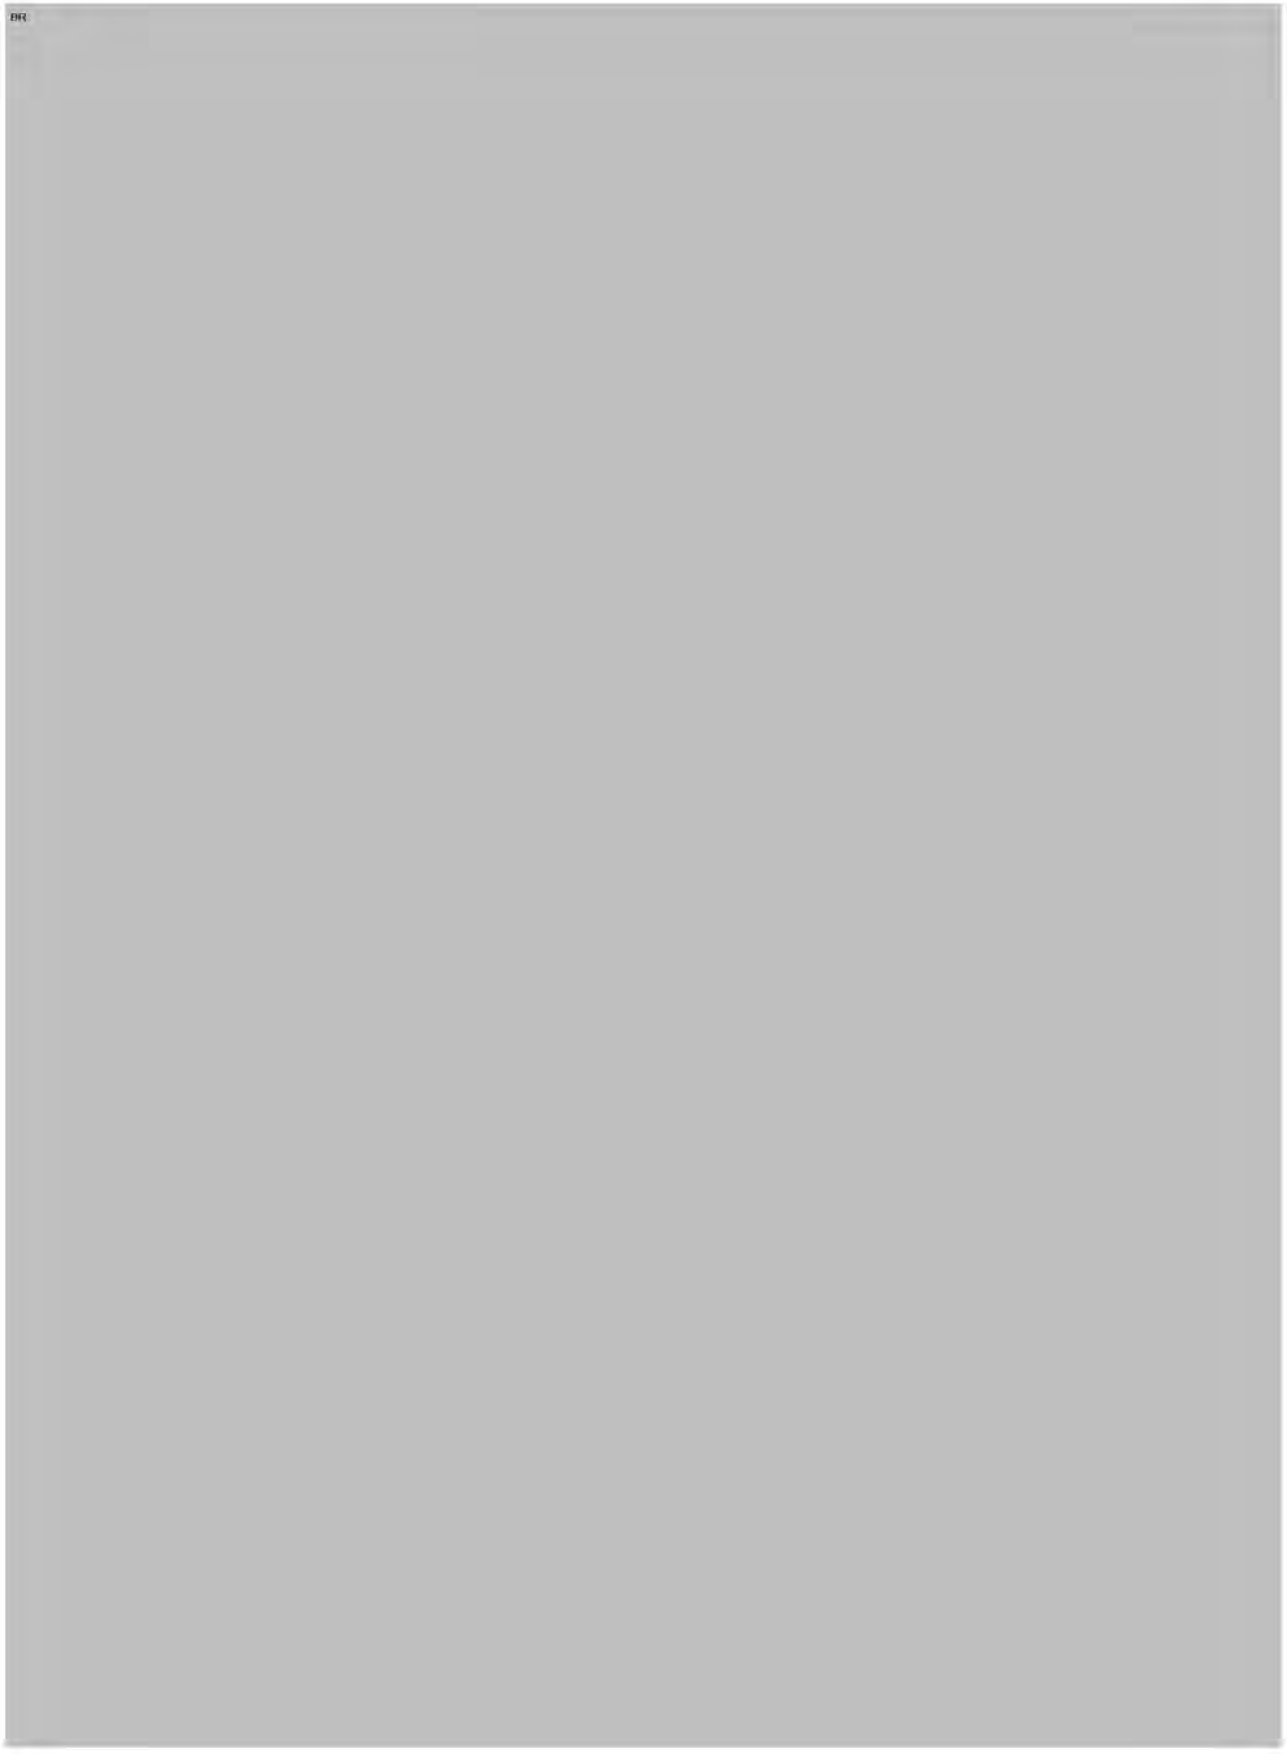
BR

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

**Conditionering**

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Het ontwerp voor het vergunningenproces bij het hoogheemraadschap afronden voor de tweede watertoevoer vanuit de Zuidvliet naar het Molenvlietpark. | De vertaling van het ontwerp naar het vergunningenproces blijft afhankelijk van de overeenstemming die bereikt moet worden met de perceeleigenaar.<br>Ondertussen vindt afstemming plaats met aanpalende projecten (oeververvanging door provincie, werkzaamheden aan de weg en het fietspad door de gemeente) om synergie te creëren in de uitvoeringsplanning en daarmee hinder te beperken. |
| [redacted] | |

### 3.5.2 Komende kwartaal

**Conditionering**

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| Het ontwerp voor het vergunningenproces bij het hoogheemraadschap voorzetten voor de tweede watertoevoer vanuit de Zuidvliet naar het Molenvlietpark. Hiervoor wordt een projectplan ter inzage gelegd en een watervergunning aangevraagd. |
| Uitvoeren van milieu hygiënisch bodemonderzoek tweede watertoevoer. |
| 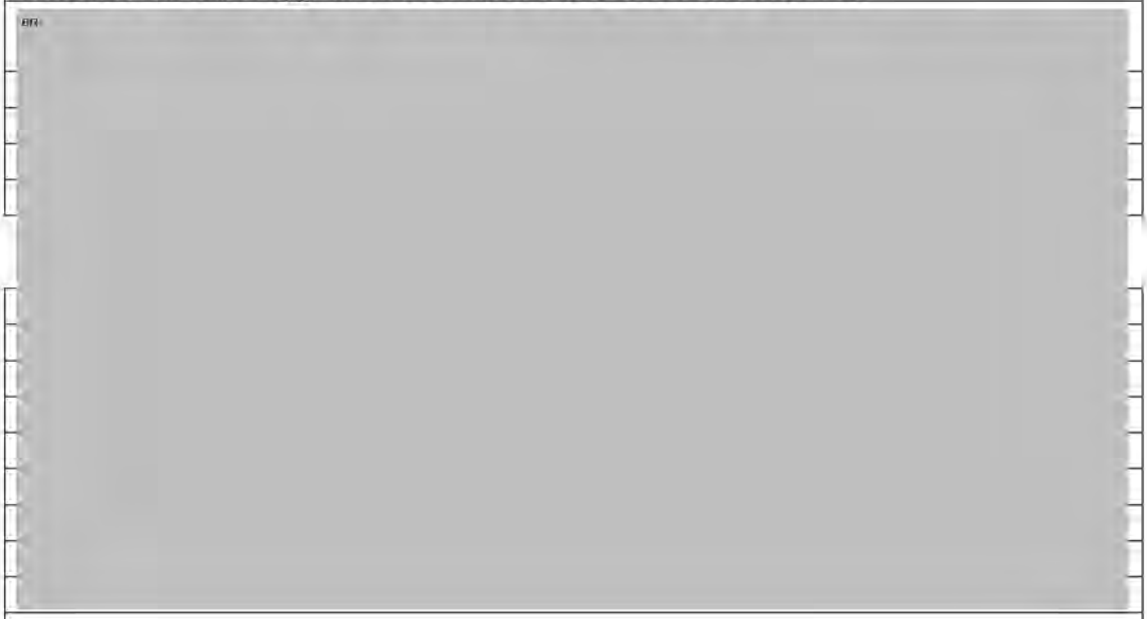 |

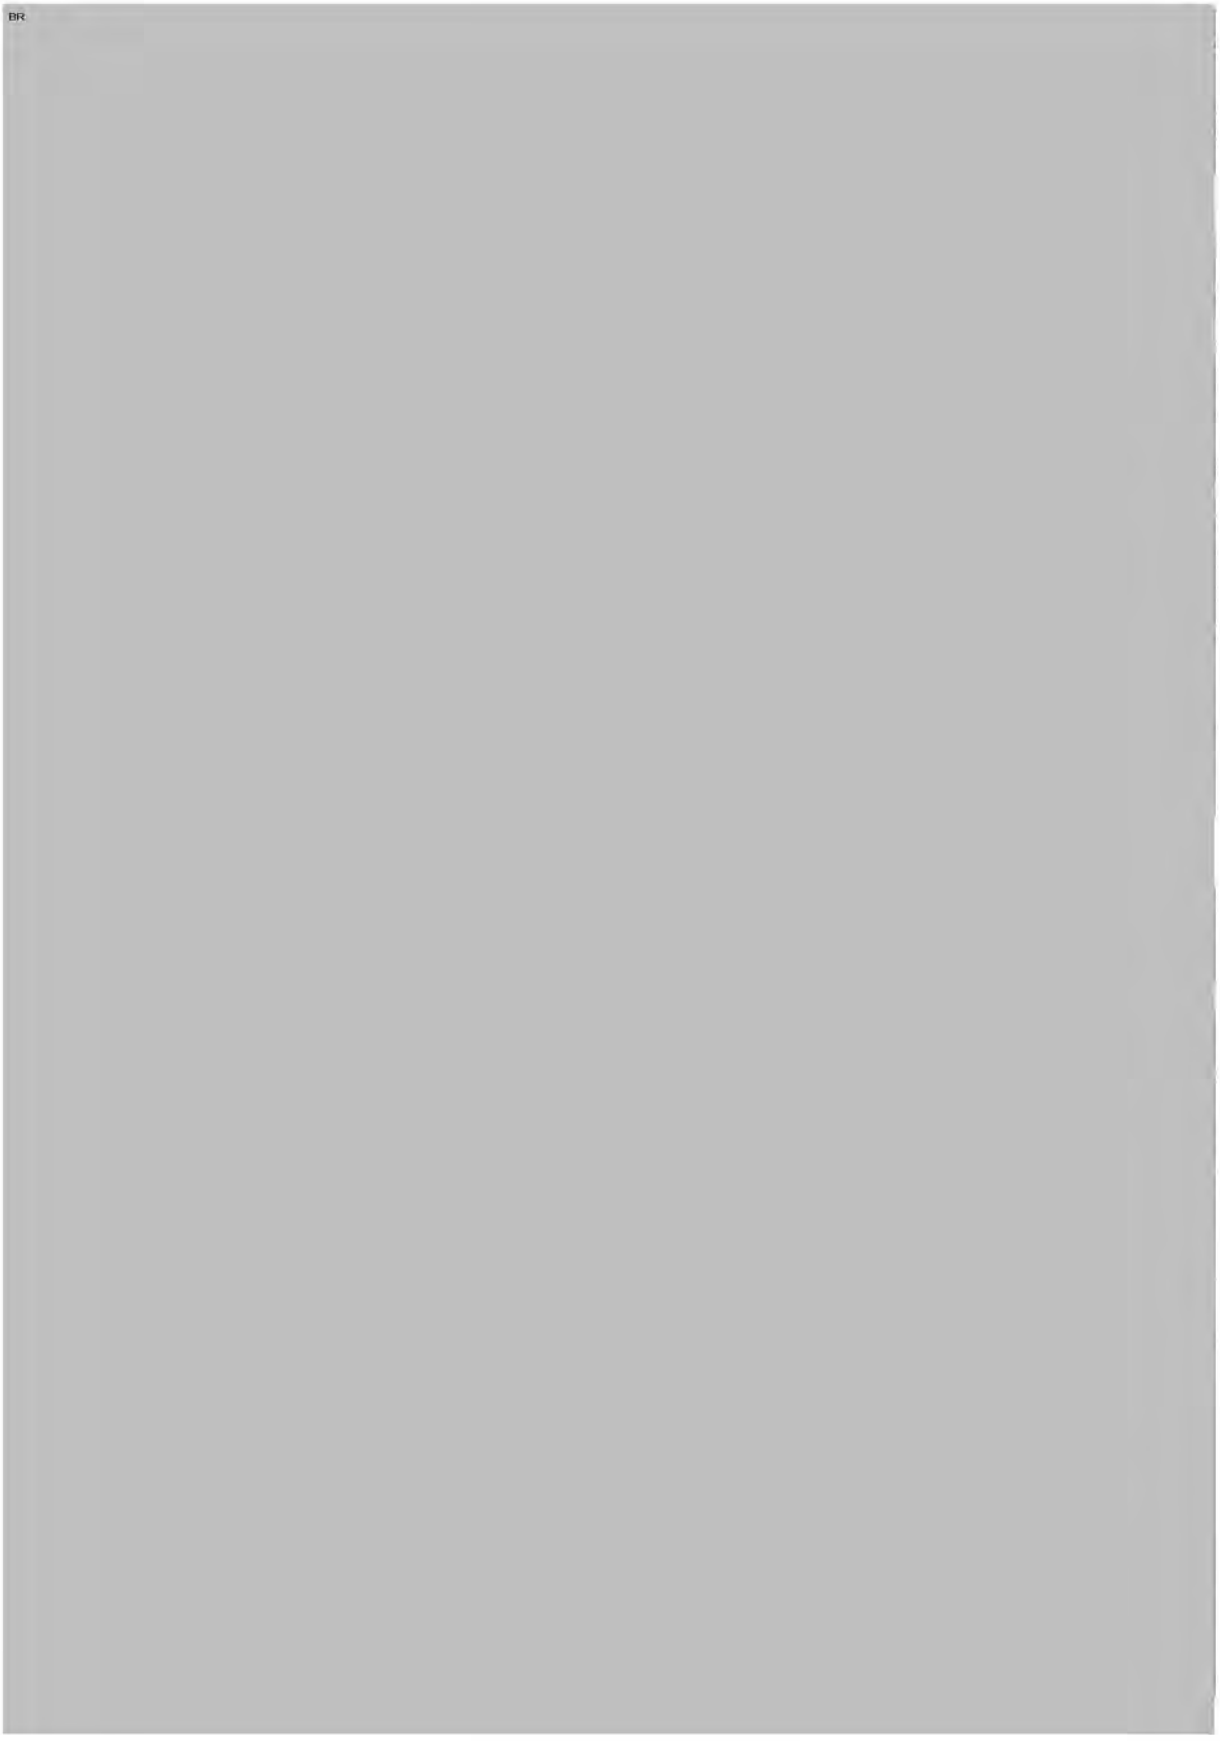
BR

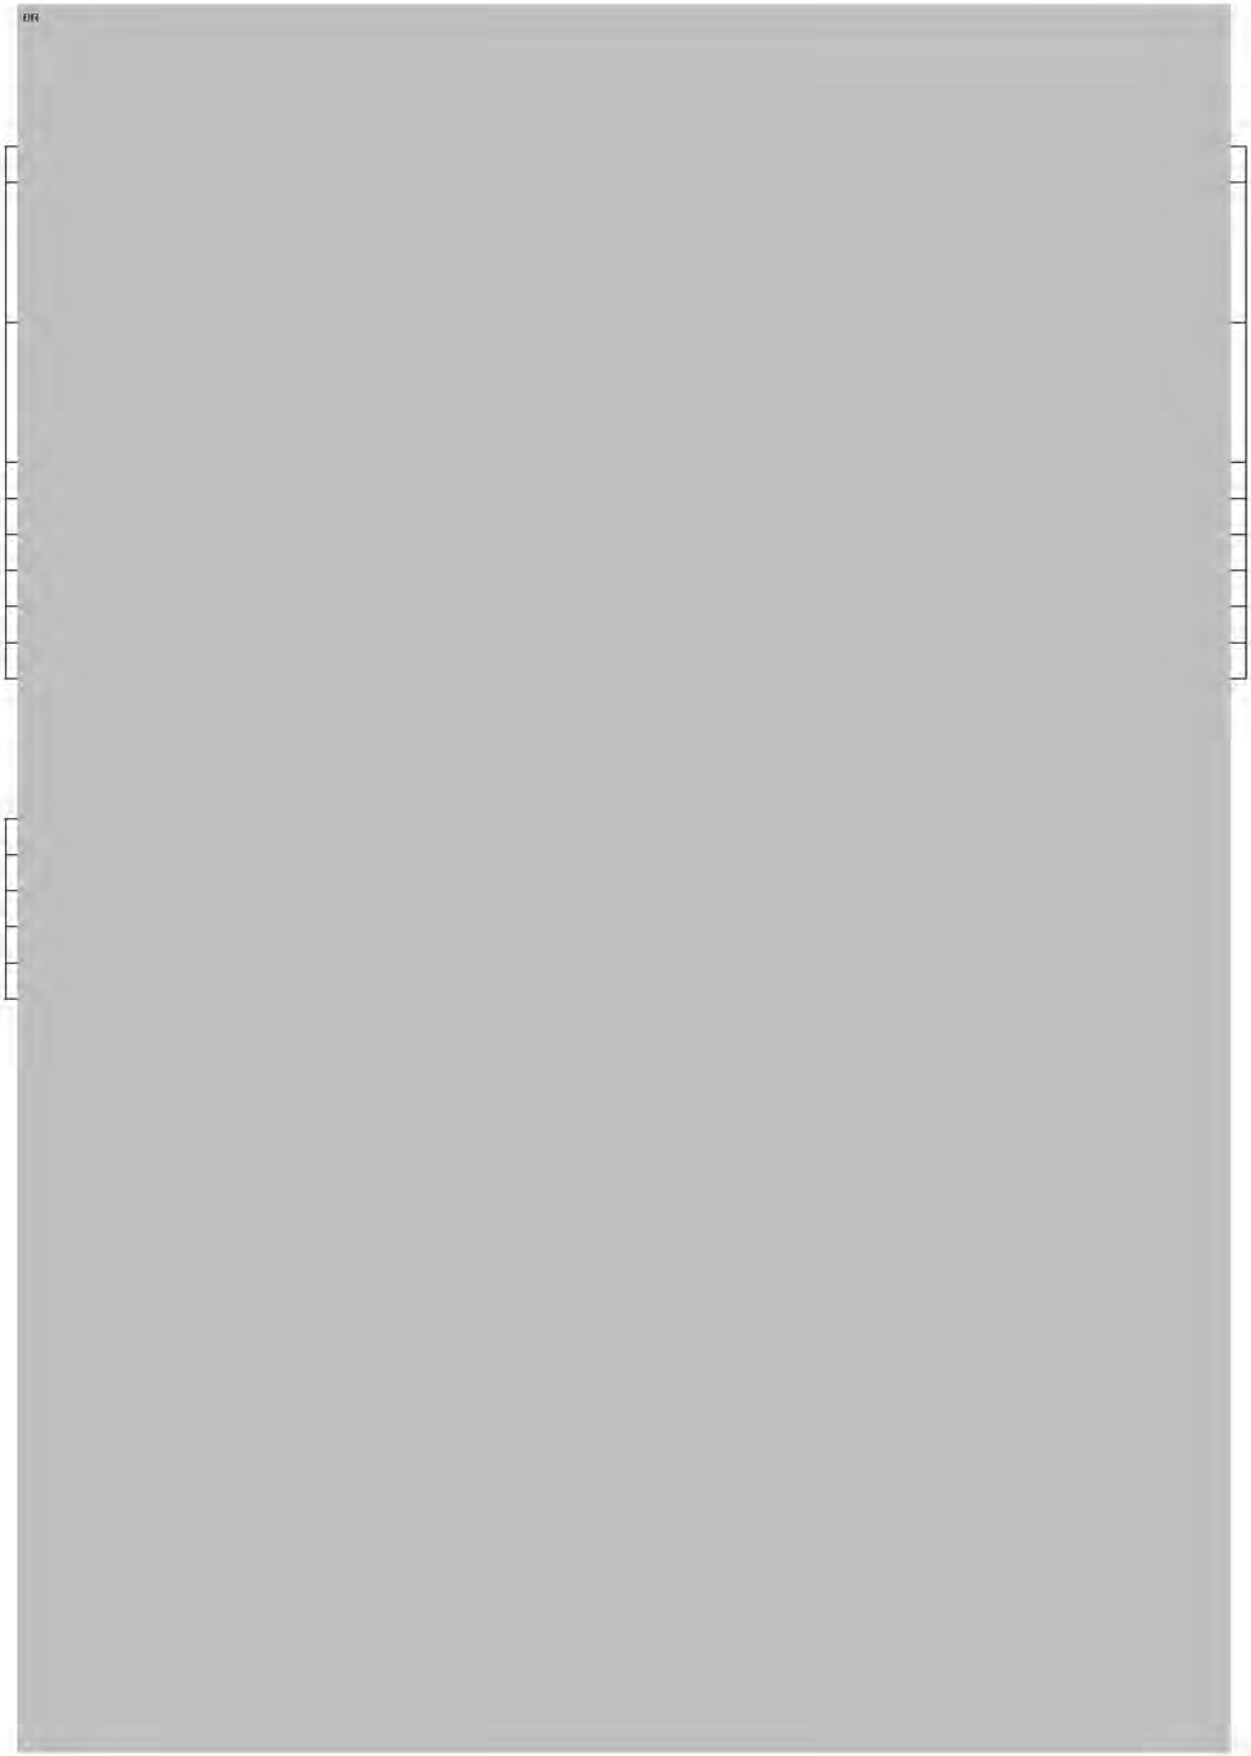

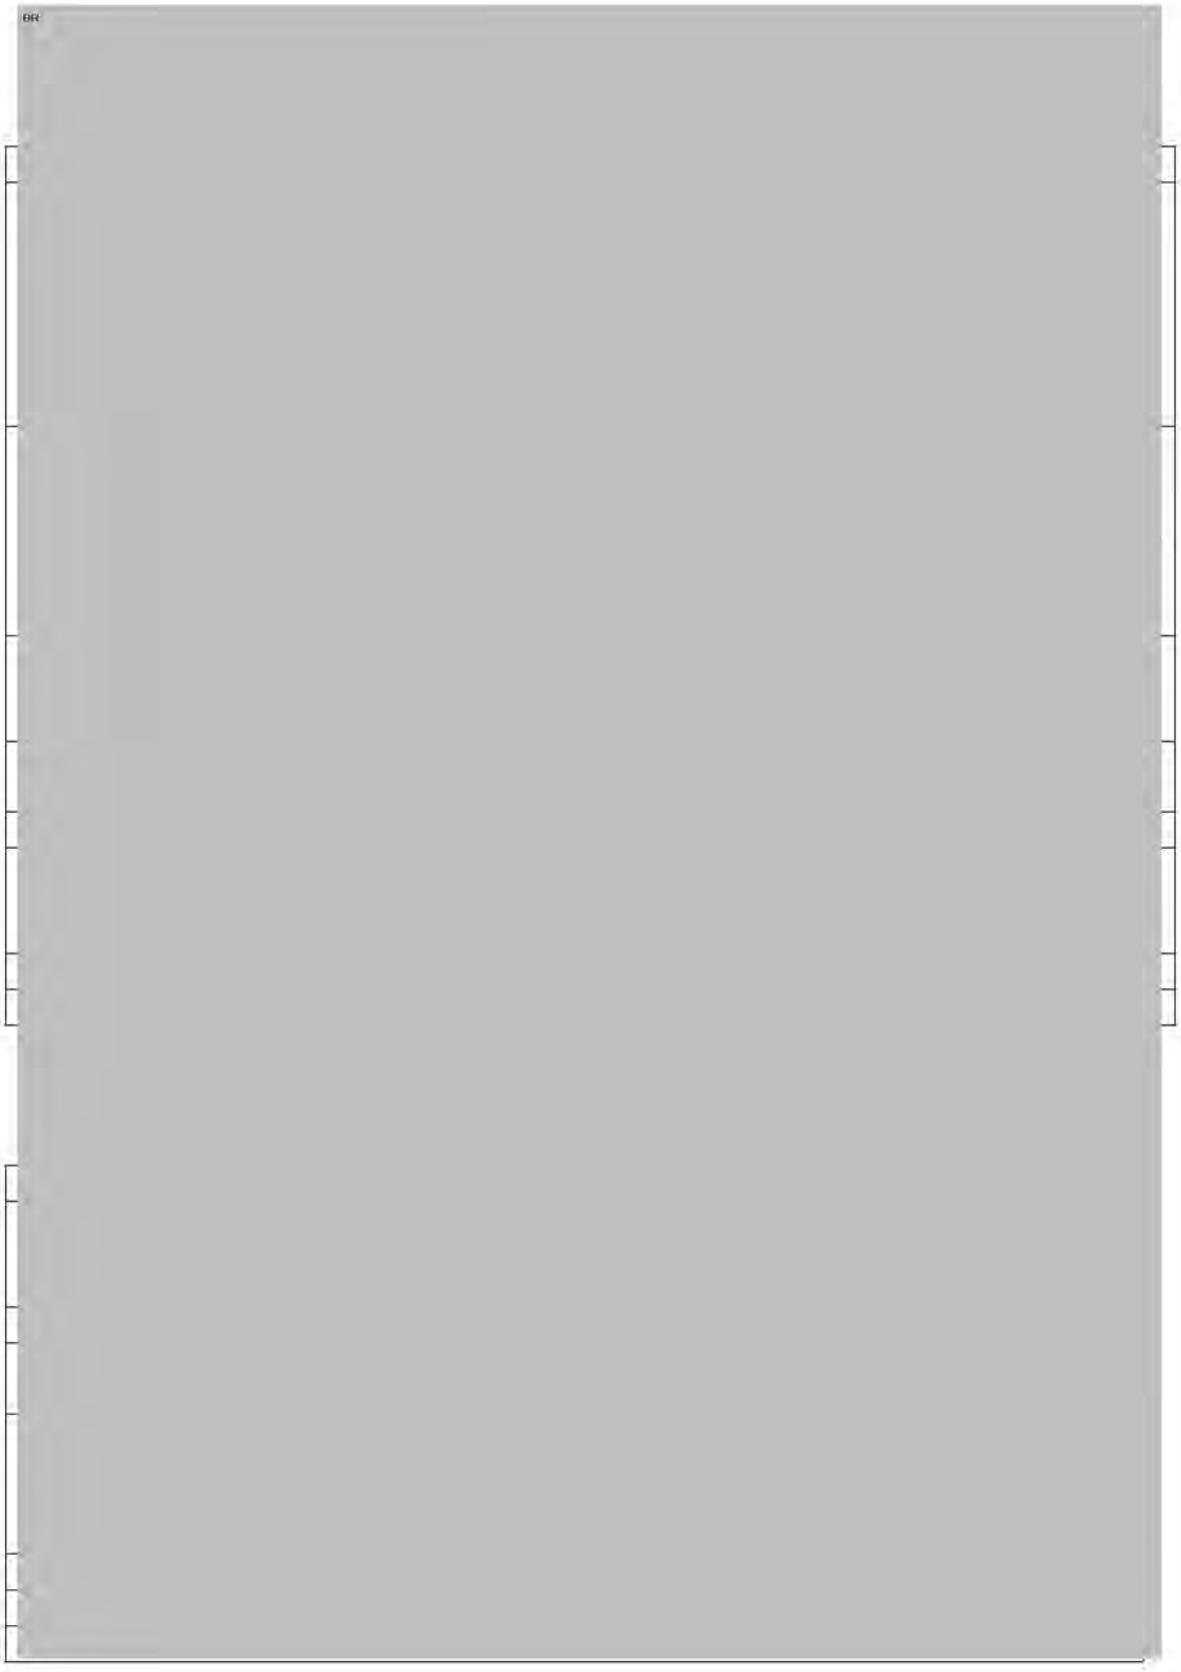

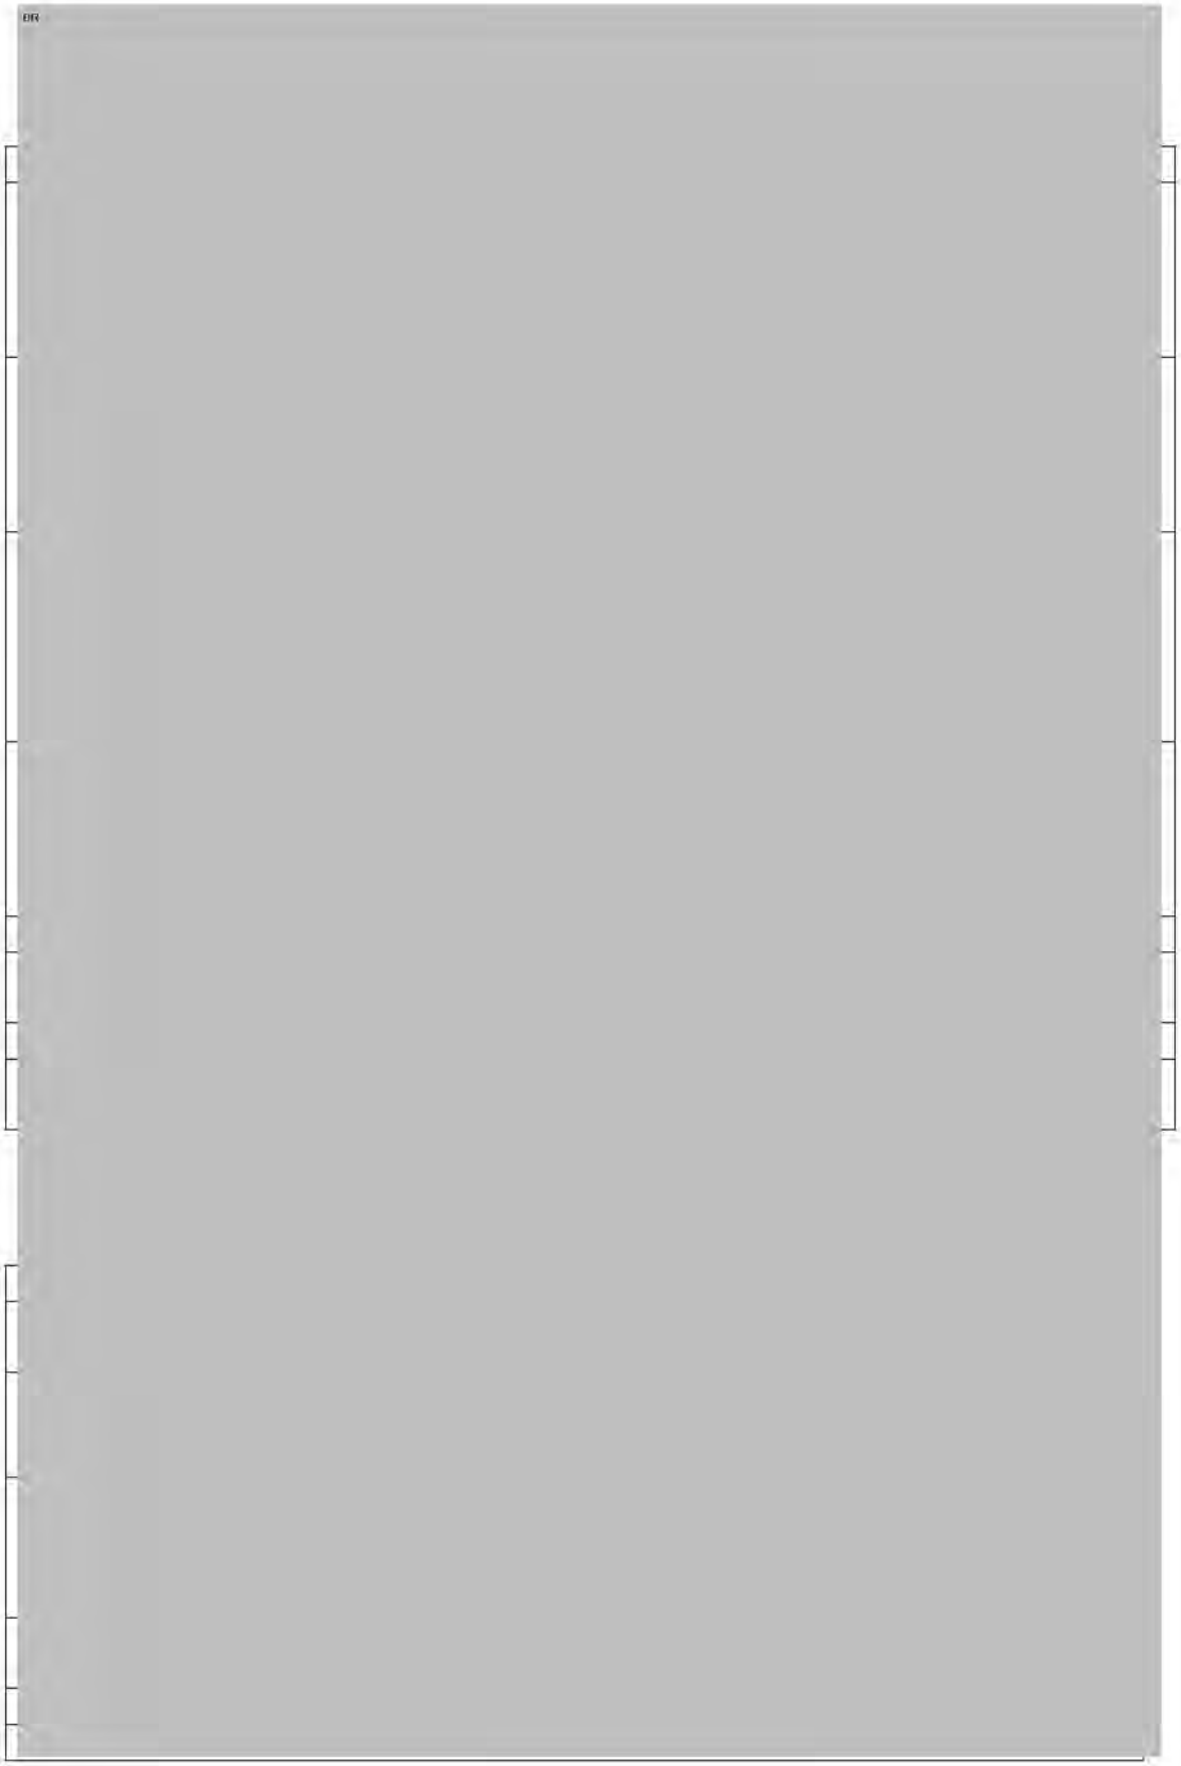

BR

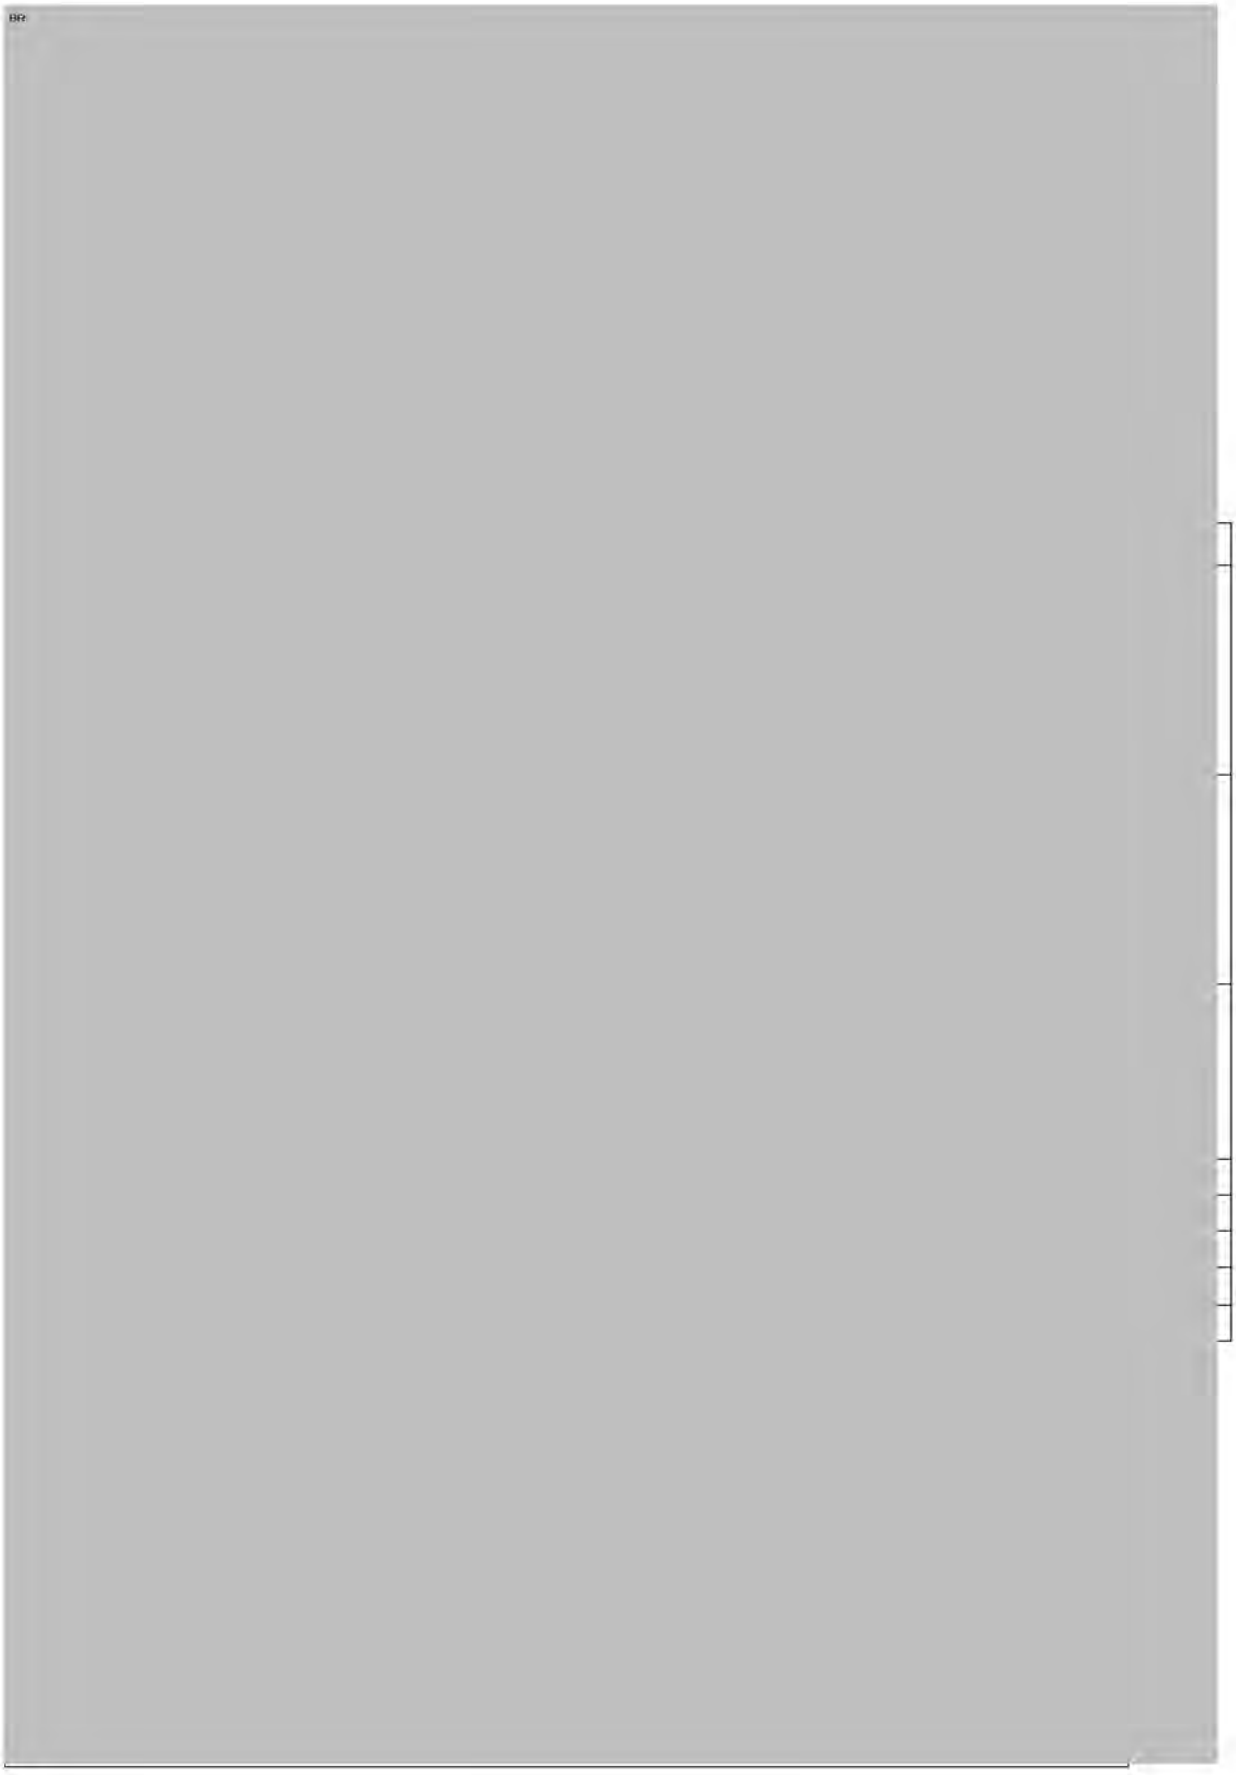

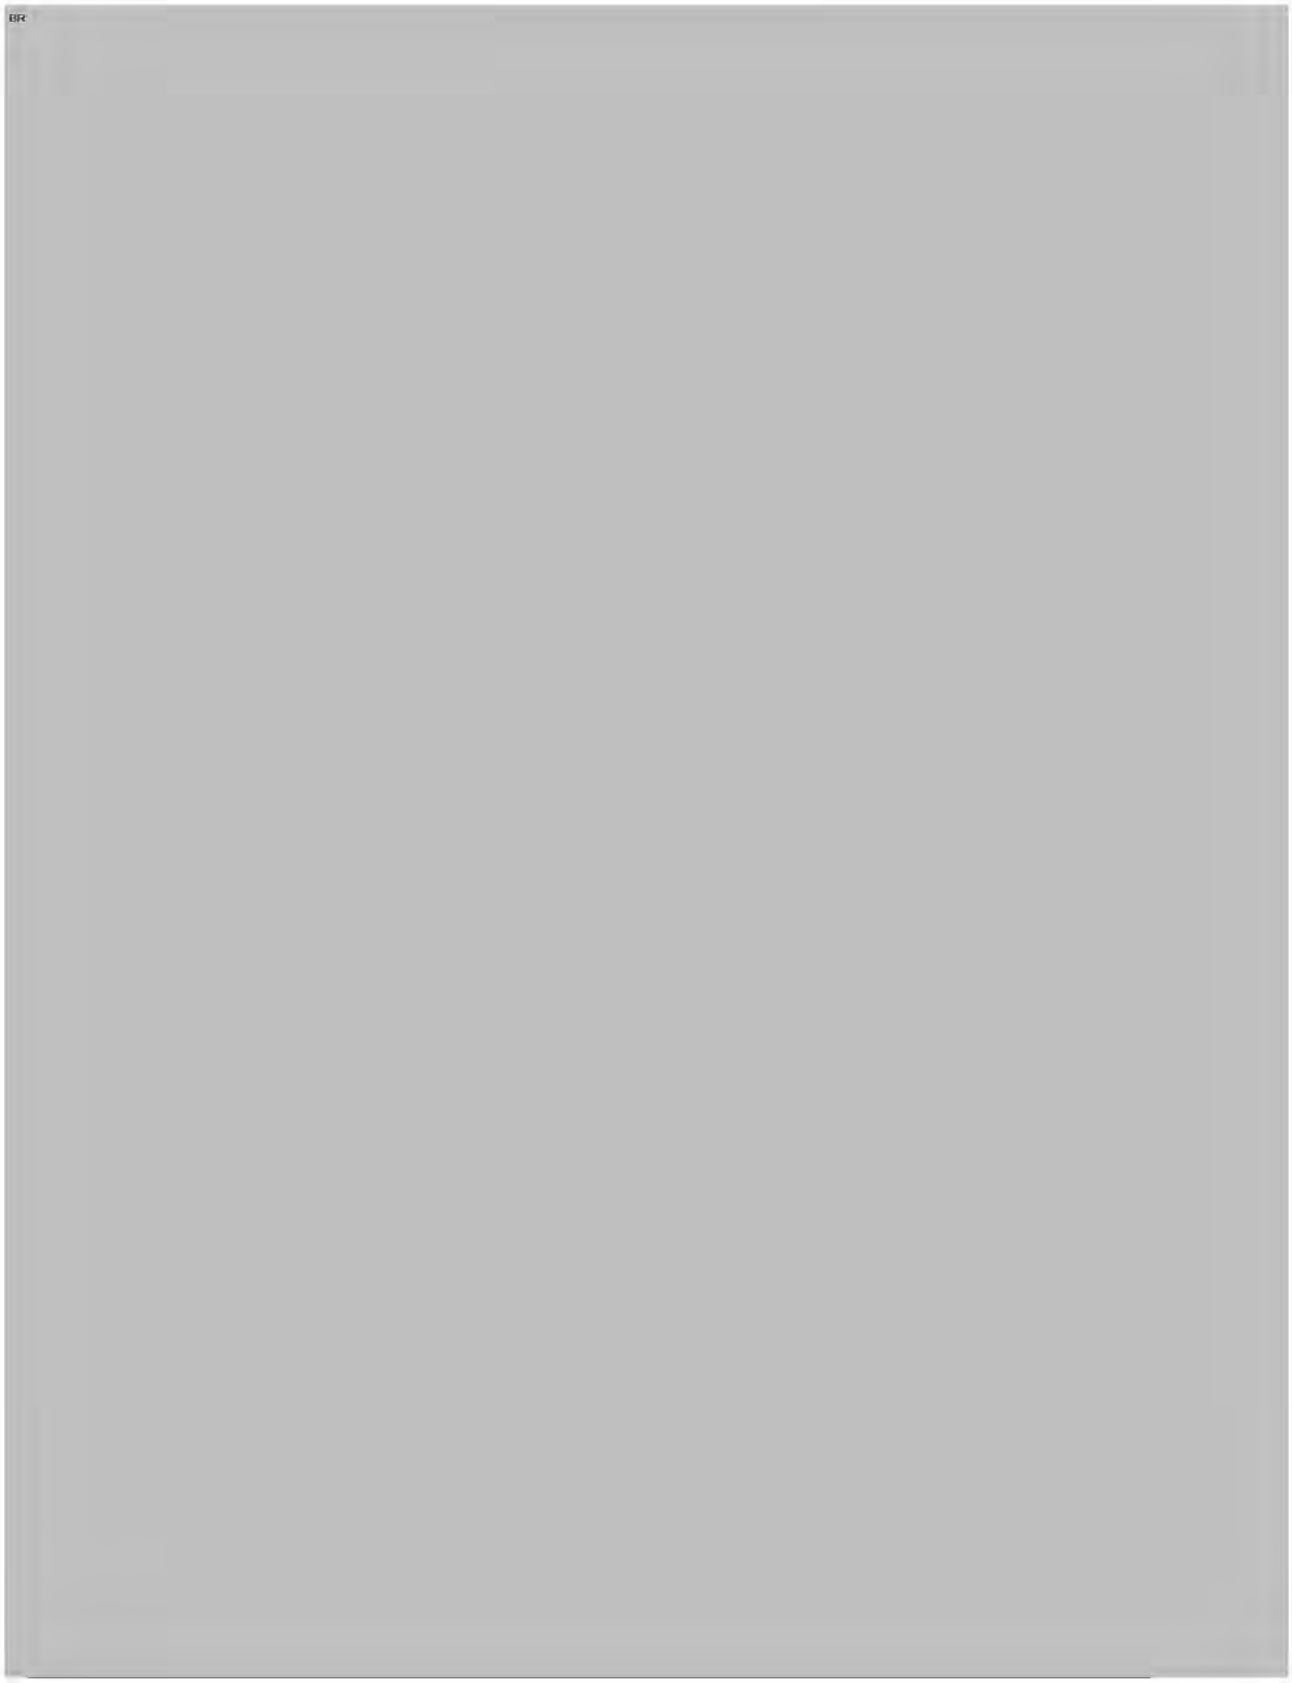
BR

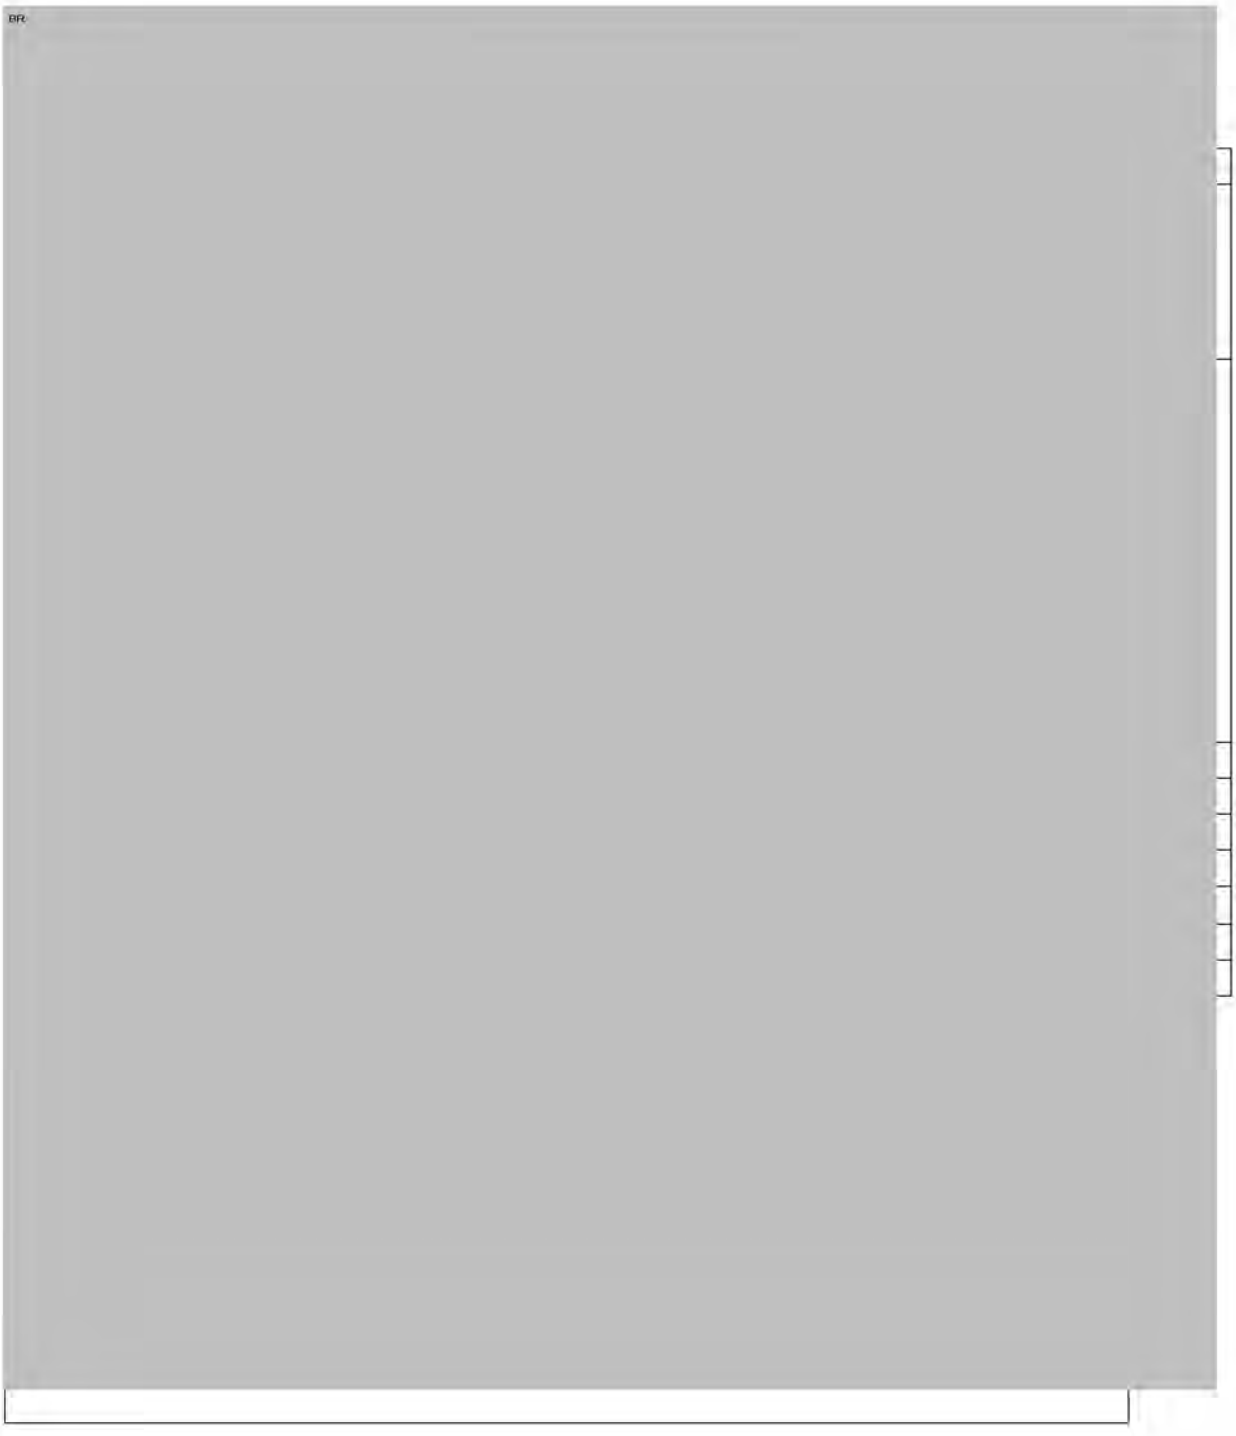

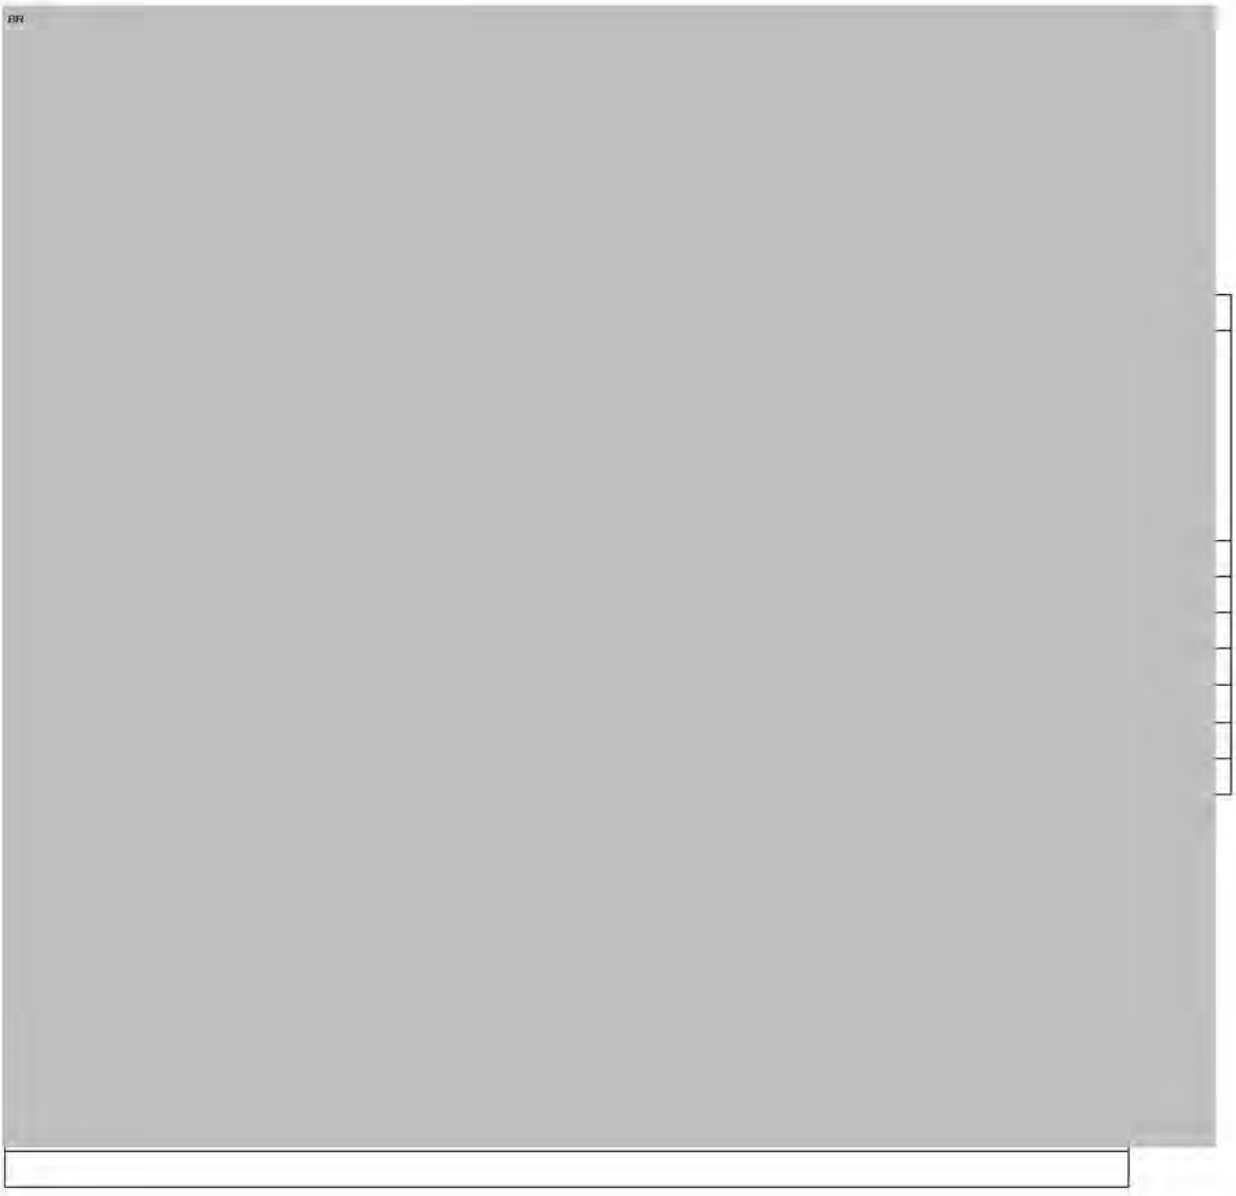

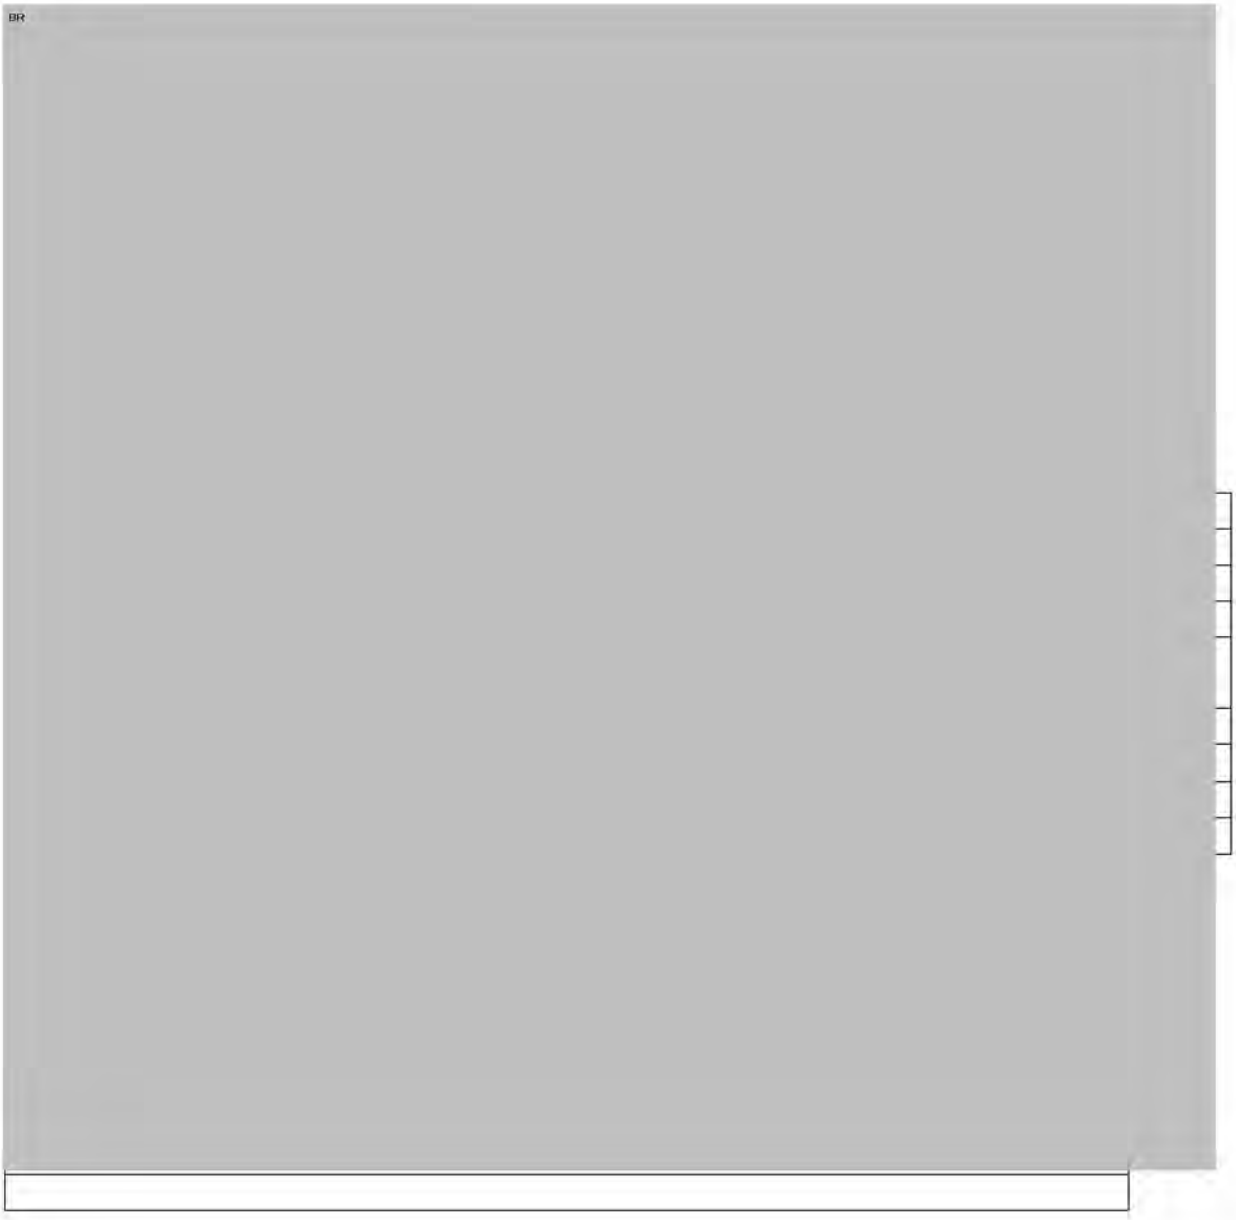
BR

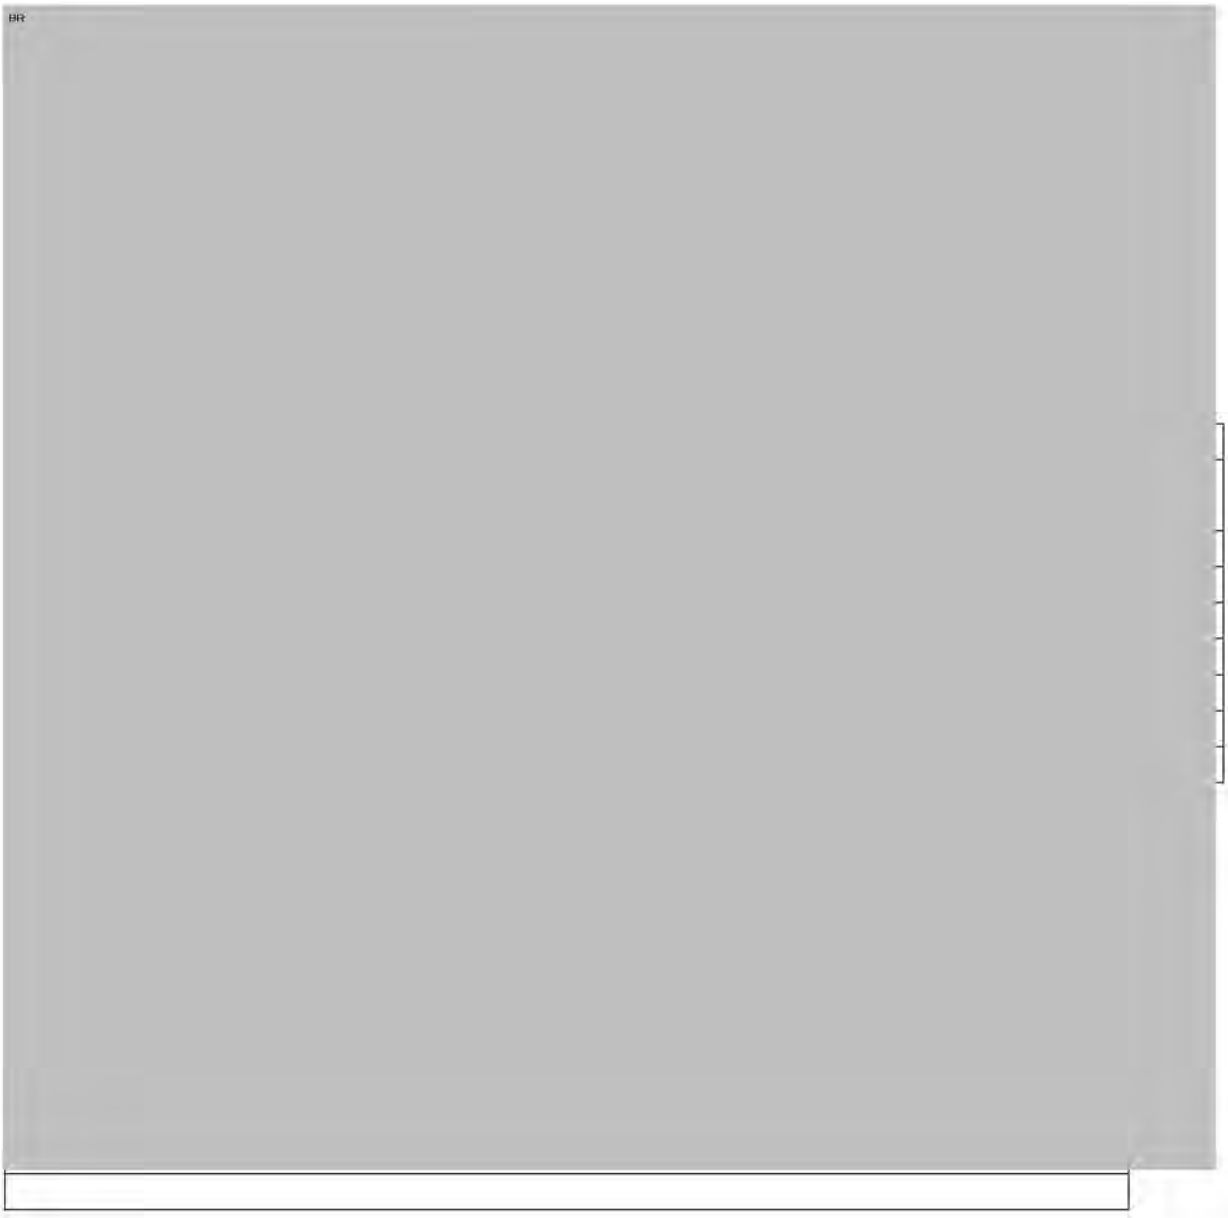
BR

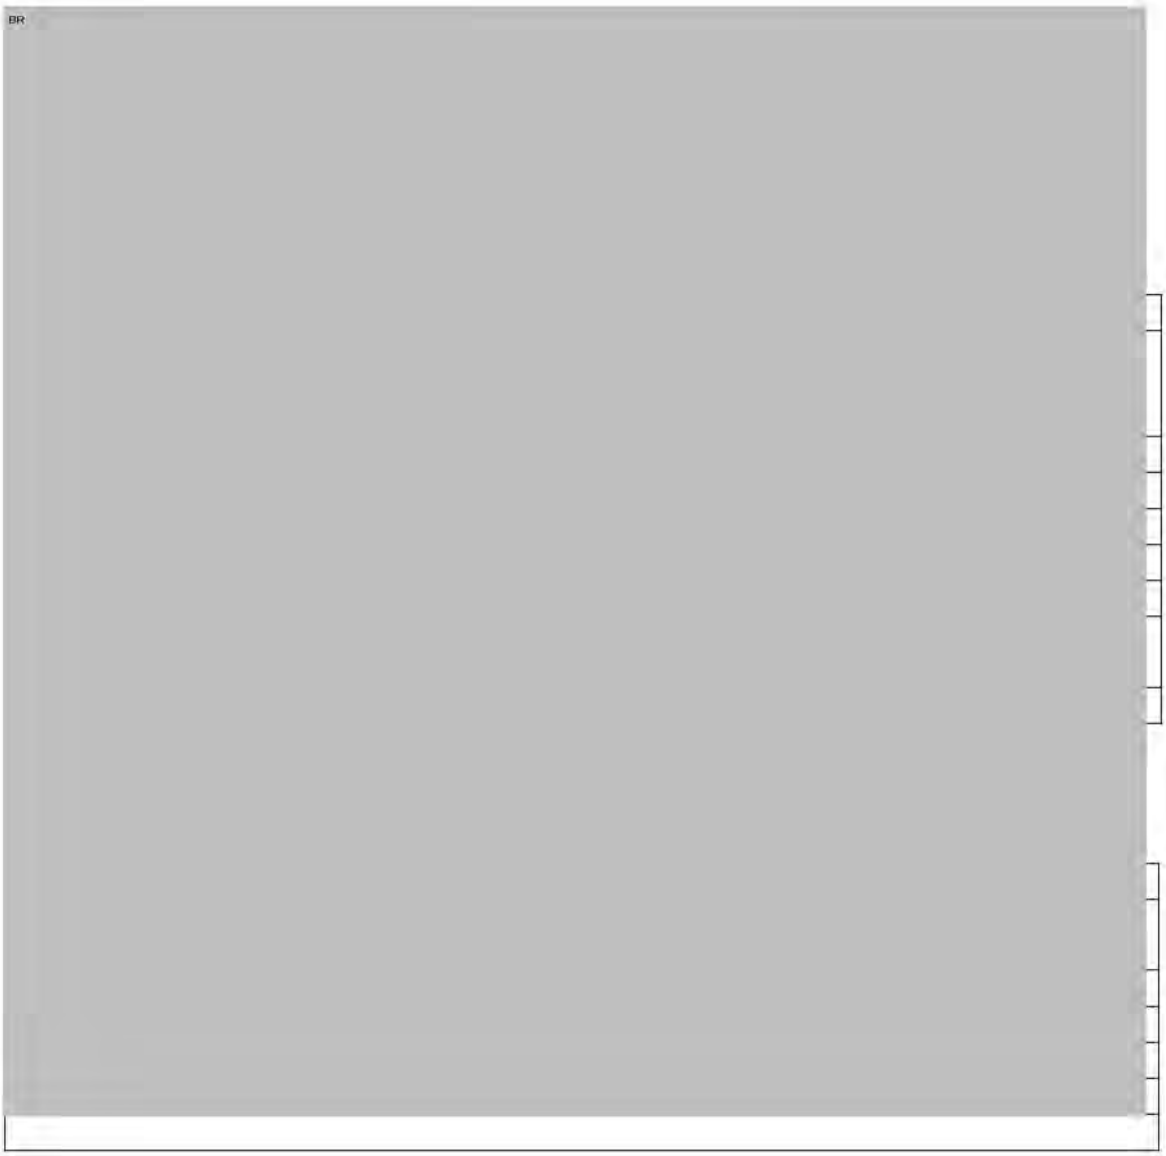
BR

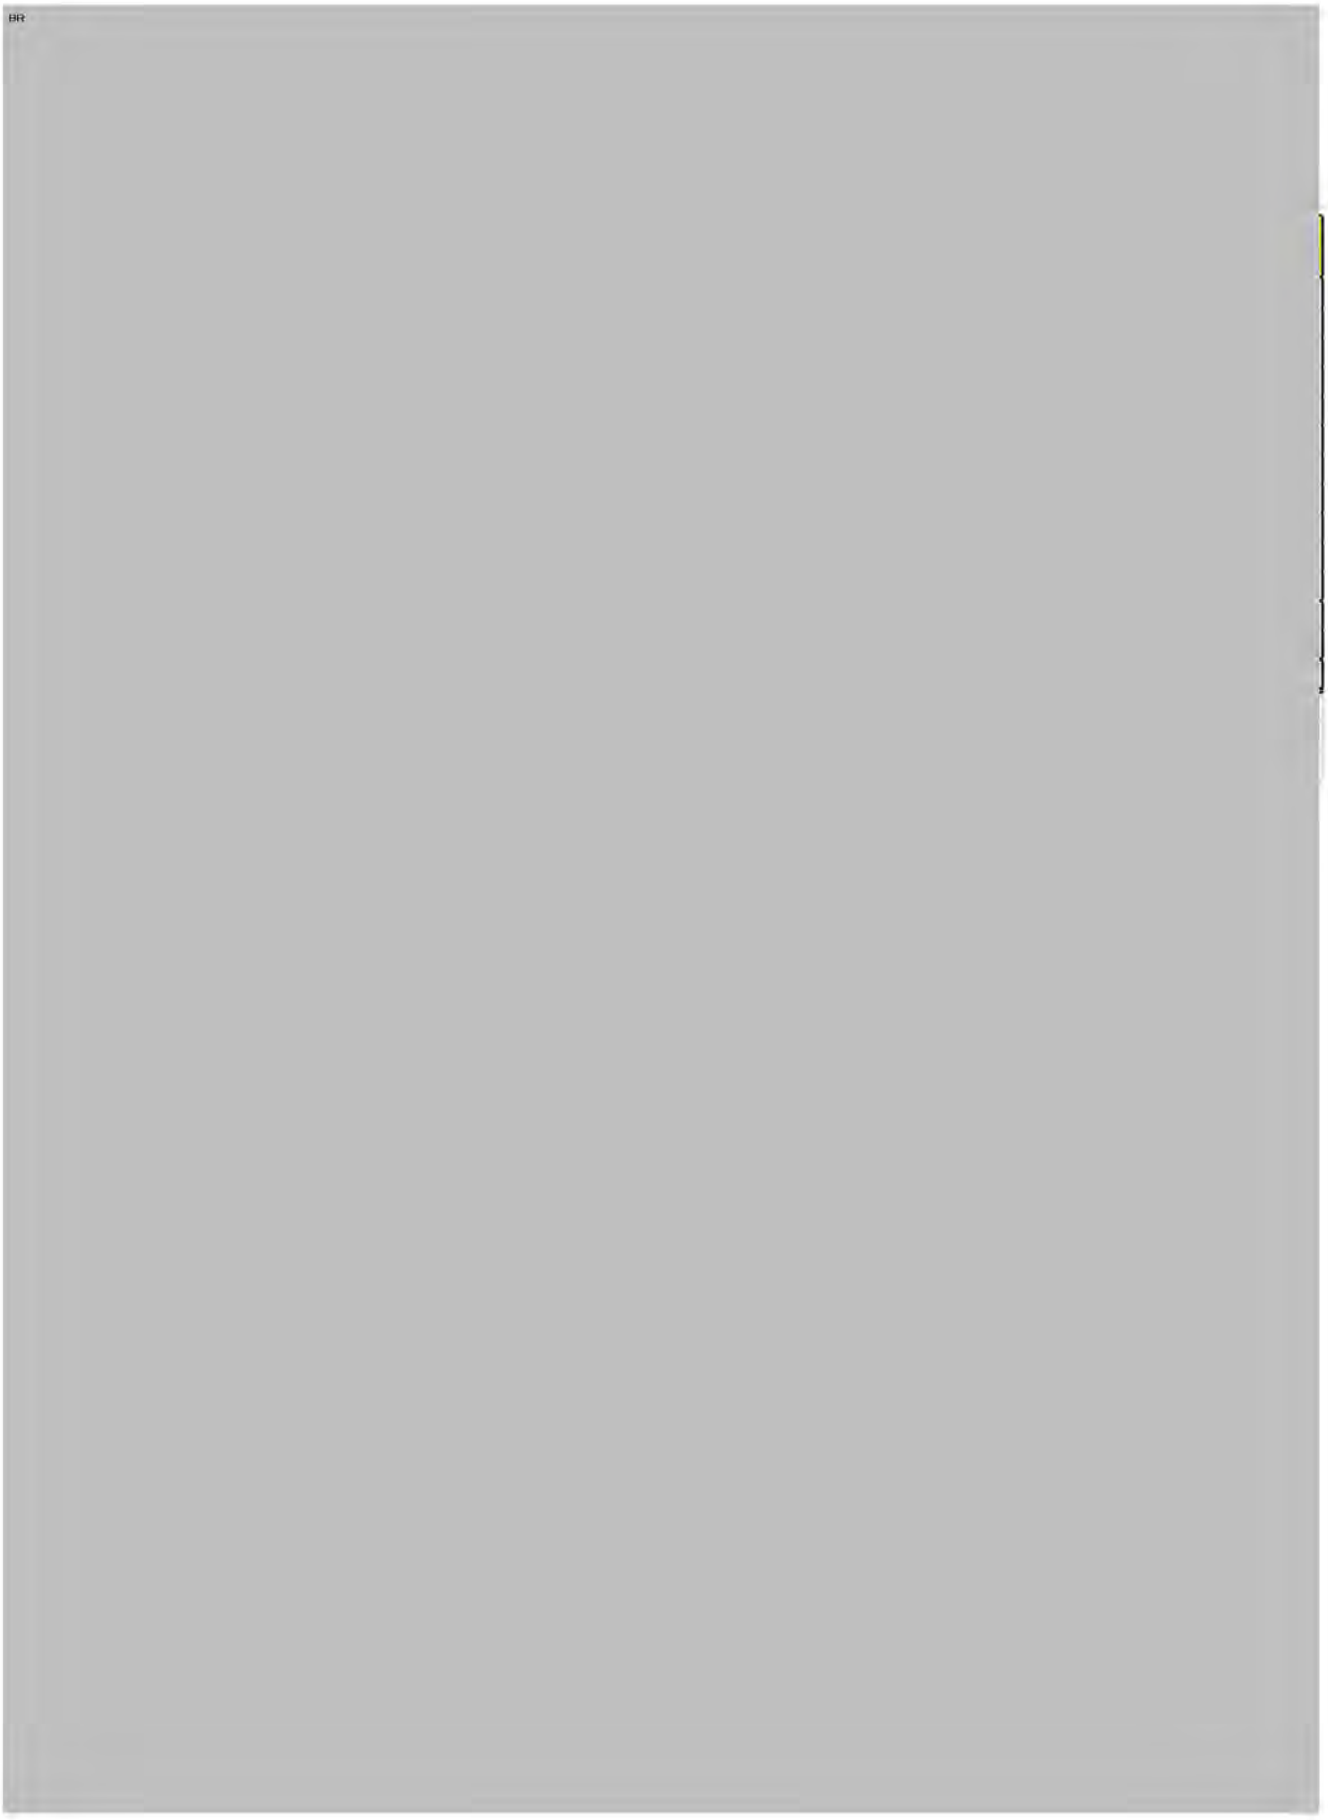

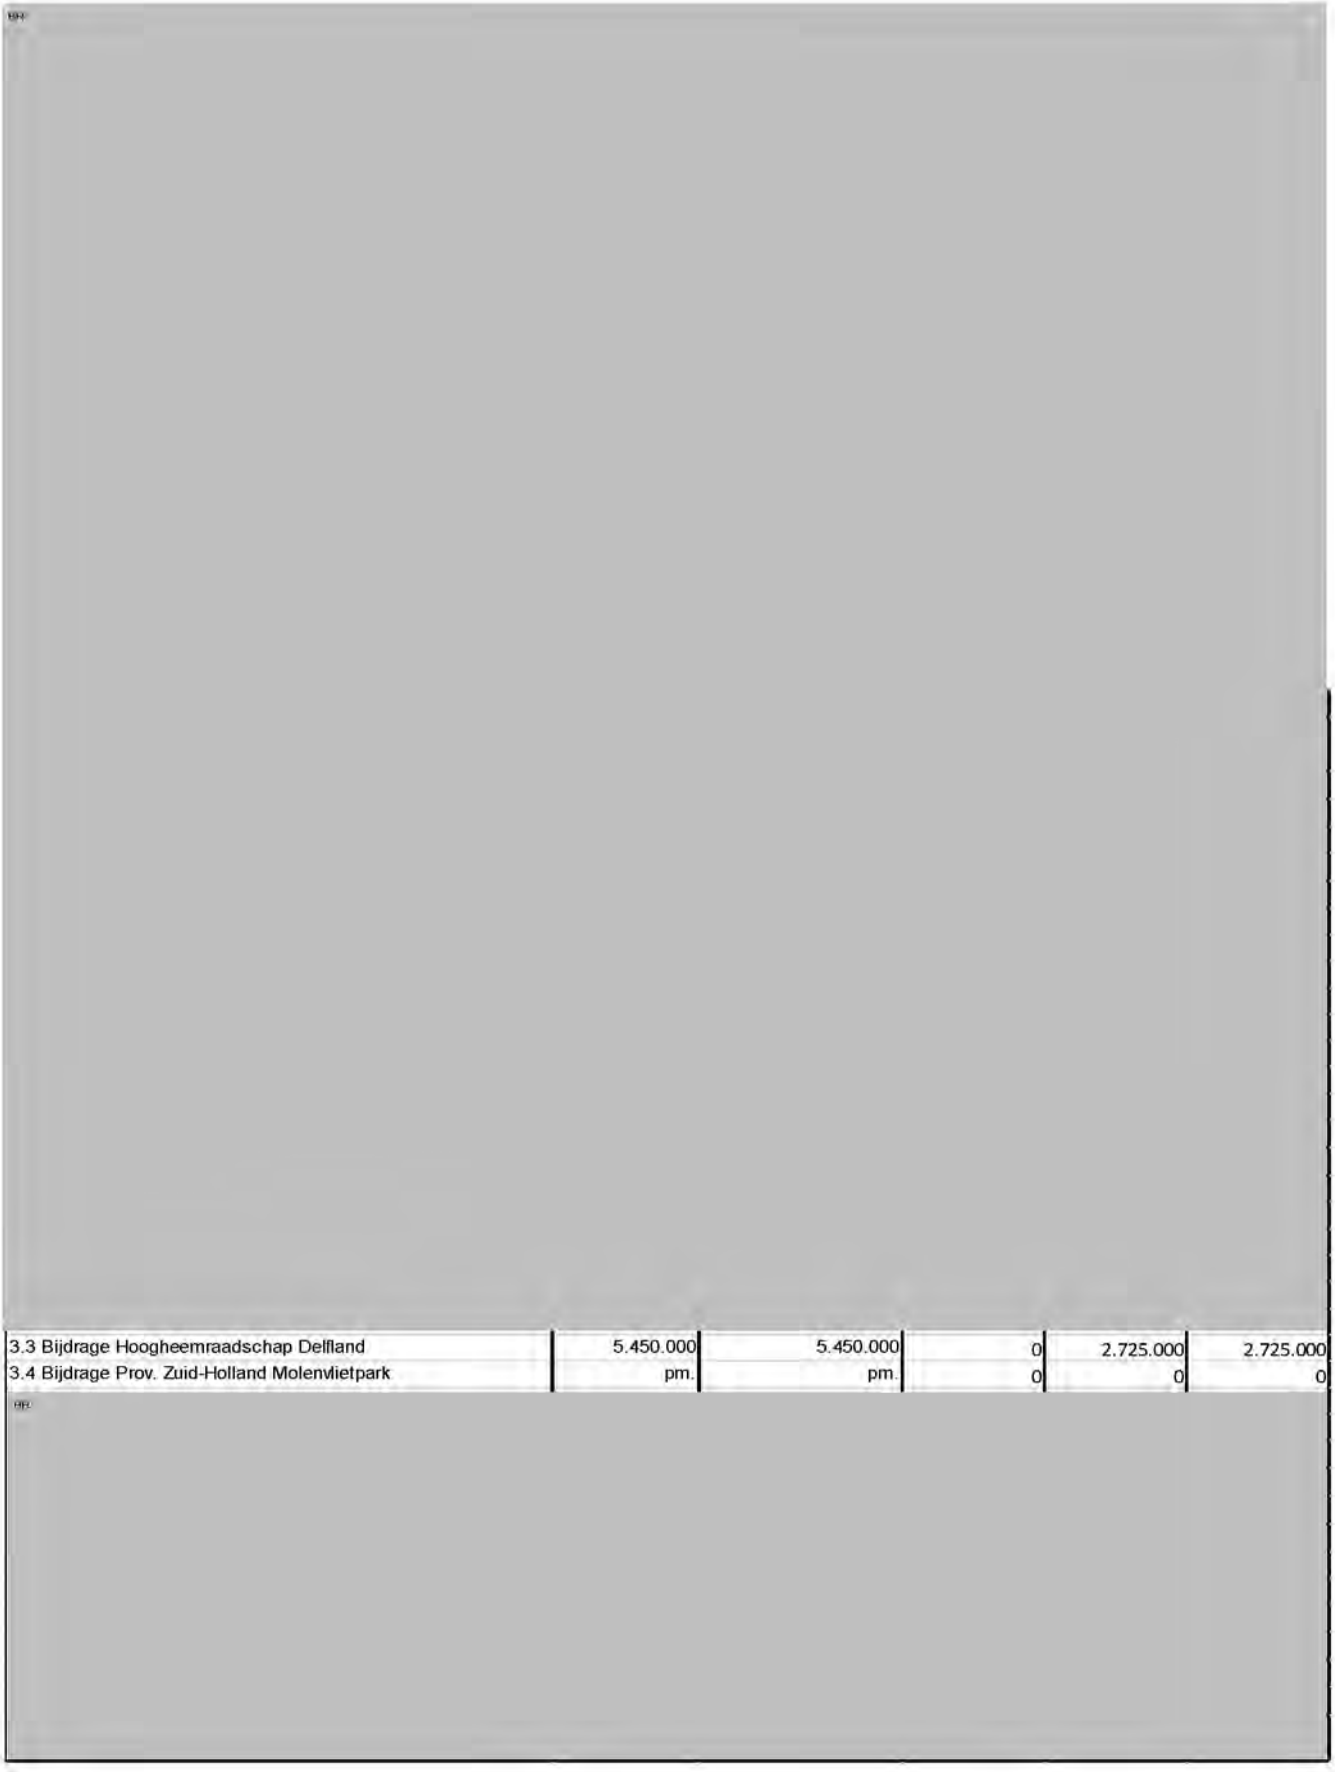

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Prov. Zuid-Holland Molenvletpark | pm. | pm. | 0 | 0 | 0 |

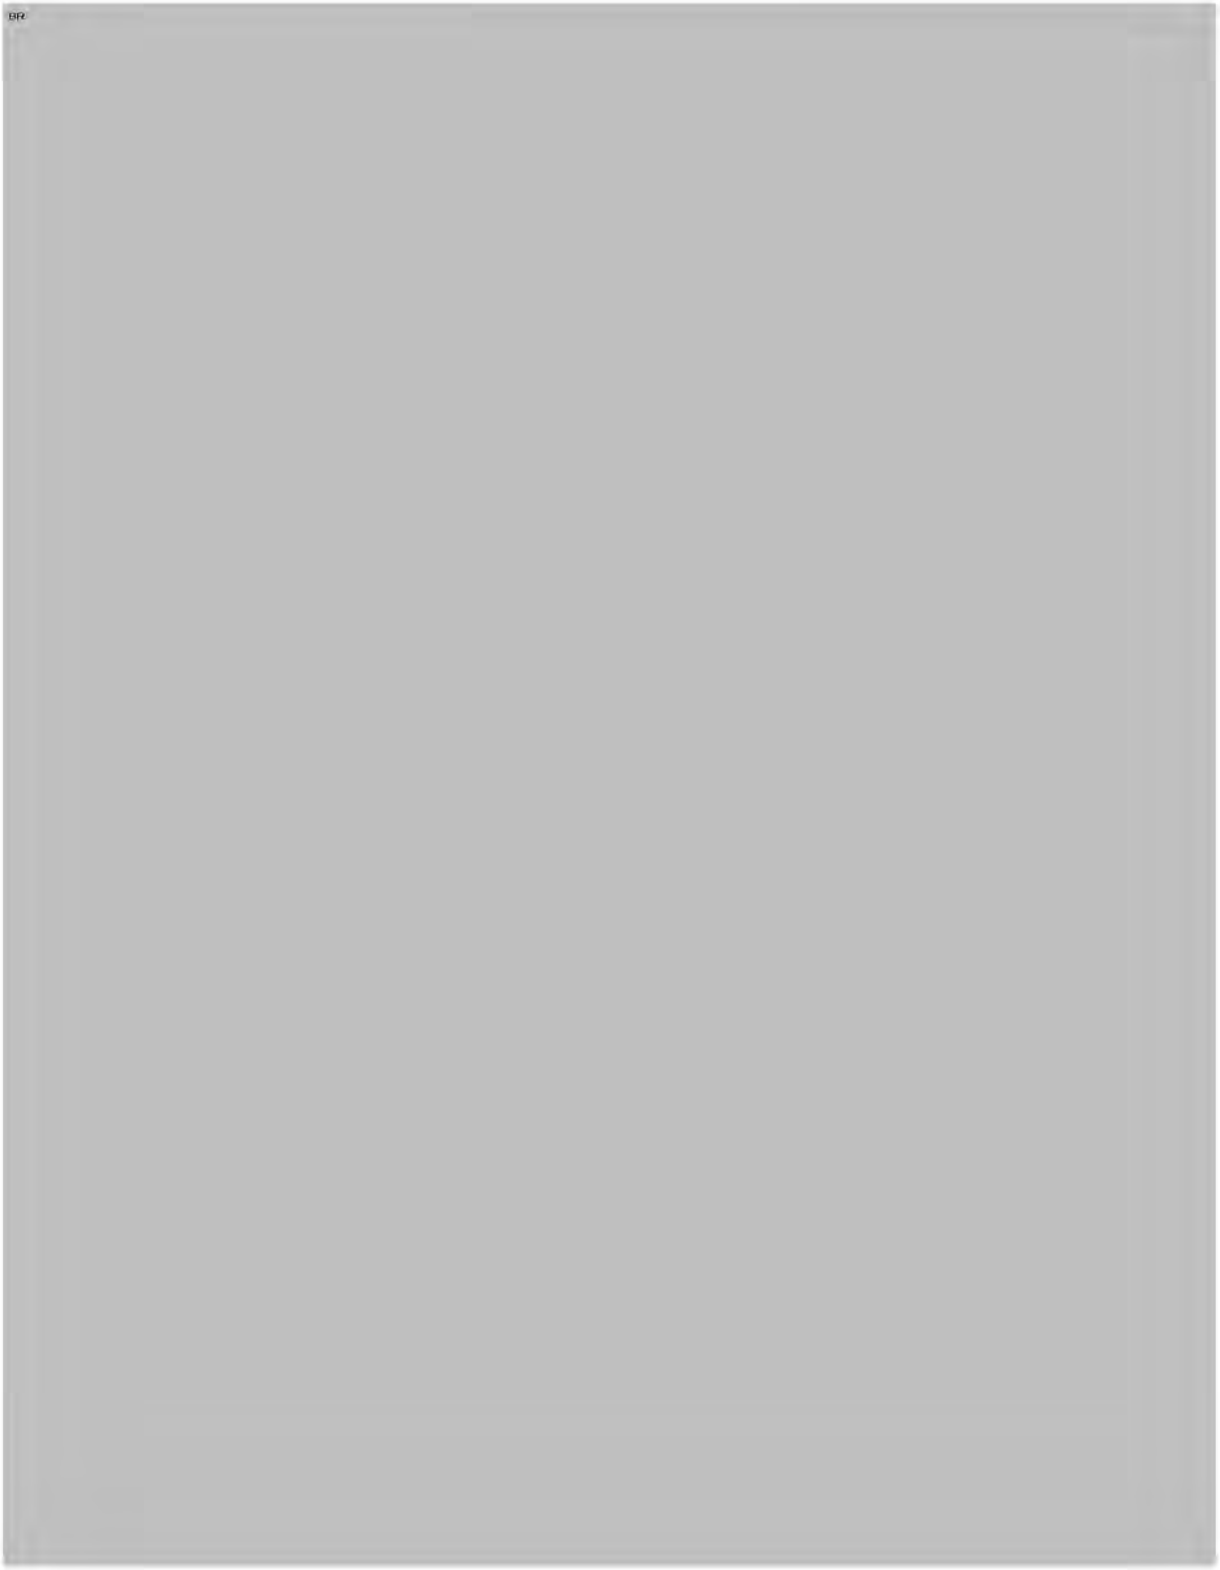
BR

BR

## 5.3 Planning

Zie tevens de bijlage 'Planningsmijlpalen' (hoofdstuk 6)

### 5.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Planning tweede toevoer naar waterberging in het Molenvlietpark nader uitwerken. | Door de nog lopende gesprekken met de stakeholders heeft de nadere uitwerking op zich laten wachten. |
| | |
| BR | |

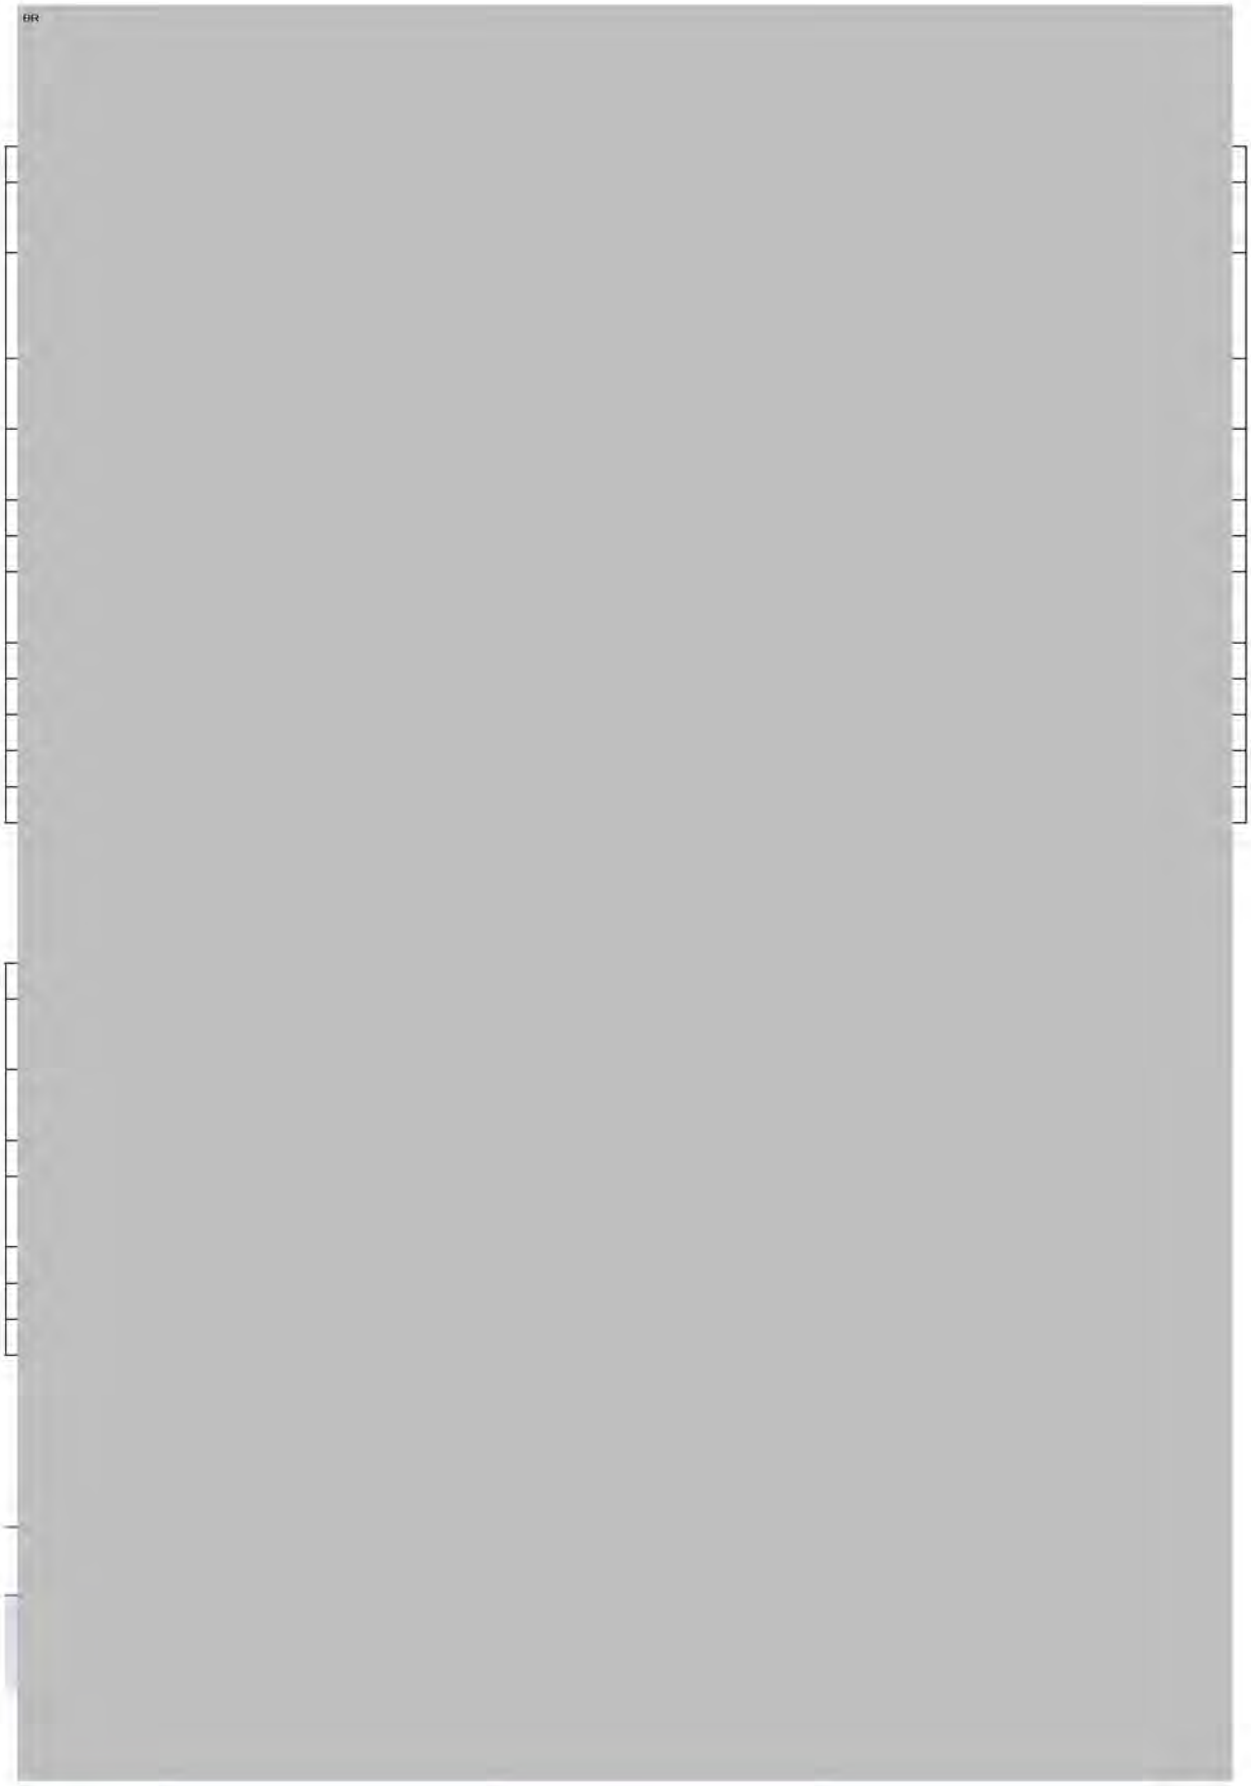
BR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | Vastgestelde BP wijzigingen (Binckhorstlaan-zuid, Molenvlietpark) veroorzaken een verzoek tot wijziging van CRB. | Er wordt alert opgetreden en kritisch getoetst op ingediende verzoeken tot wijziging. | 3 |

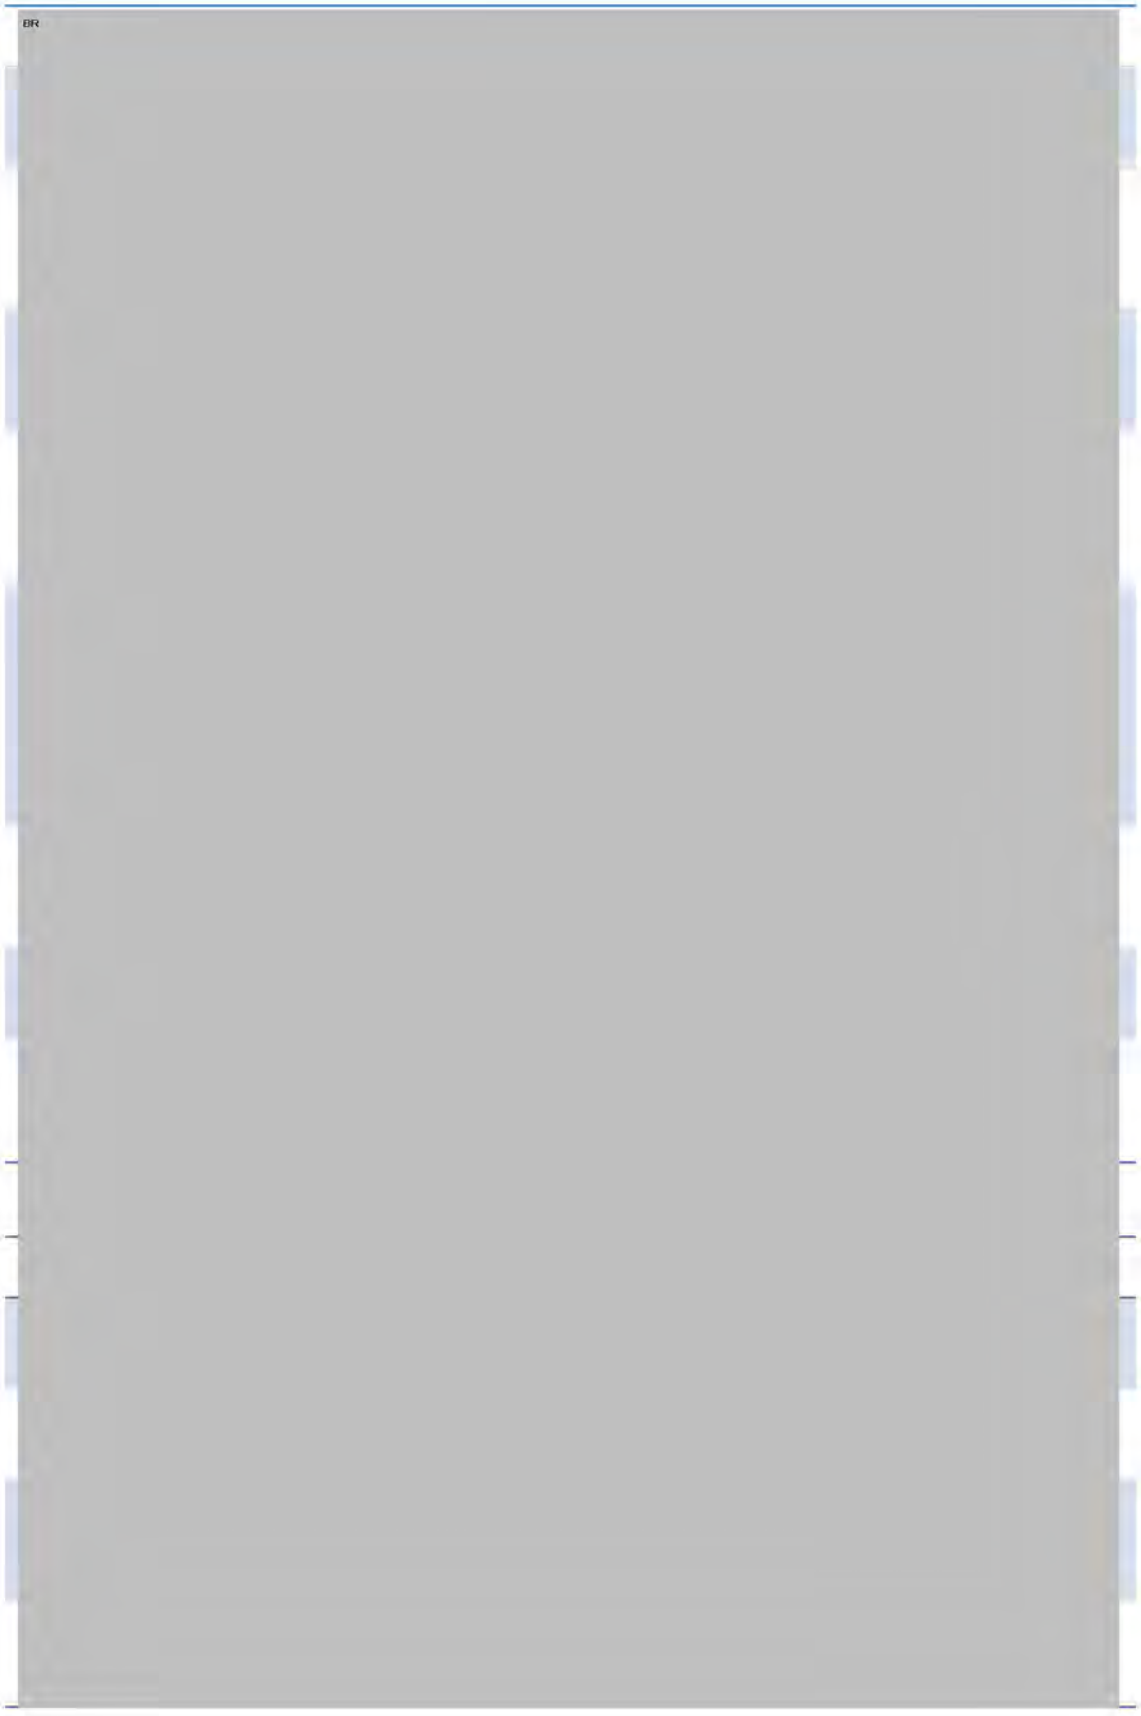
BR

DR

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-PLANNING (REVISIE C) | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-PLANNING* | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|
| BR | | | | |
| **13** | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 2 | Als gevolg van nadere uitwerking en verlaging boorsnelheid. |
| BR | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen binnen het projectgebied**

5.1.2.e

5.1.2.e

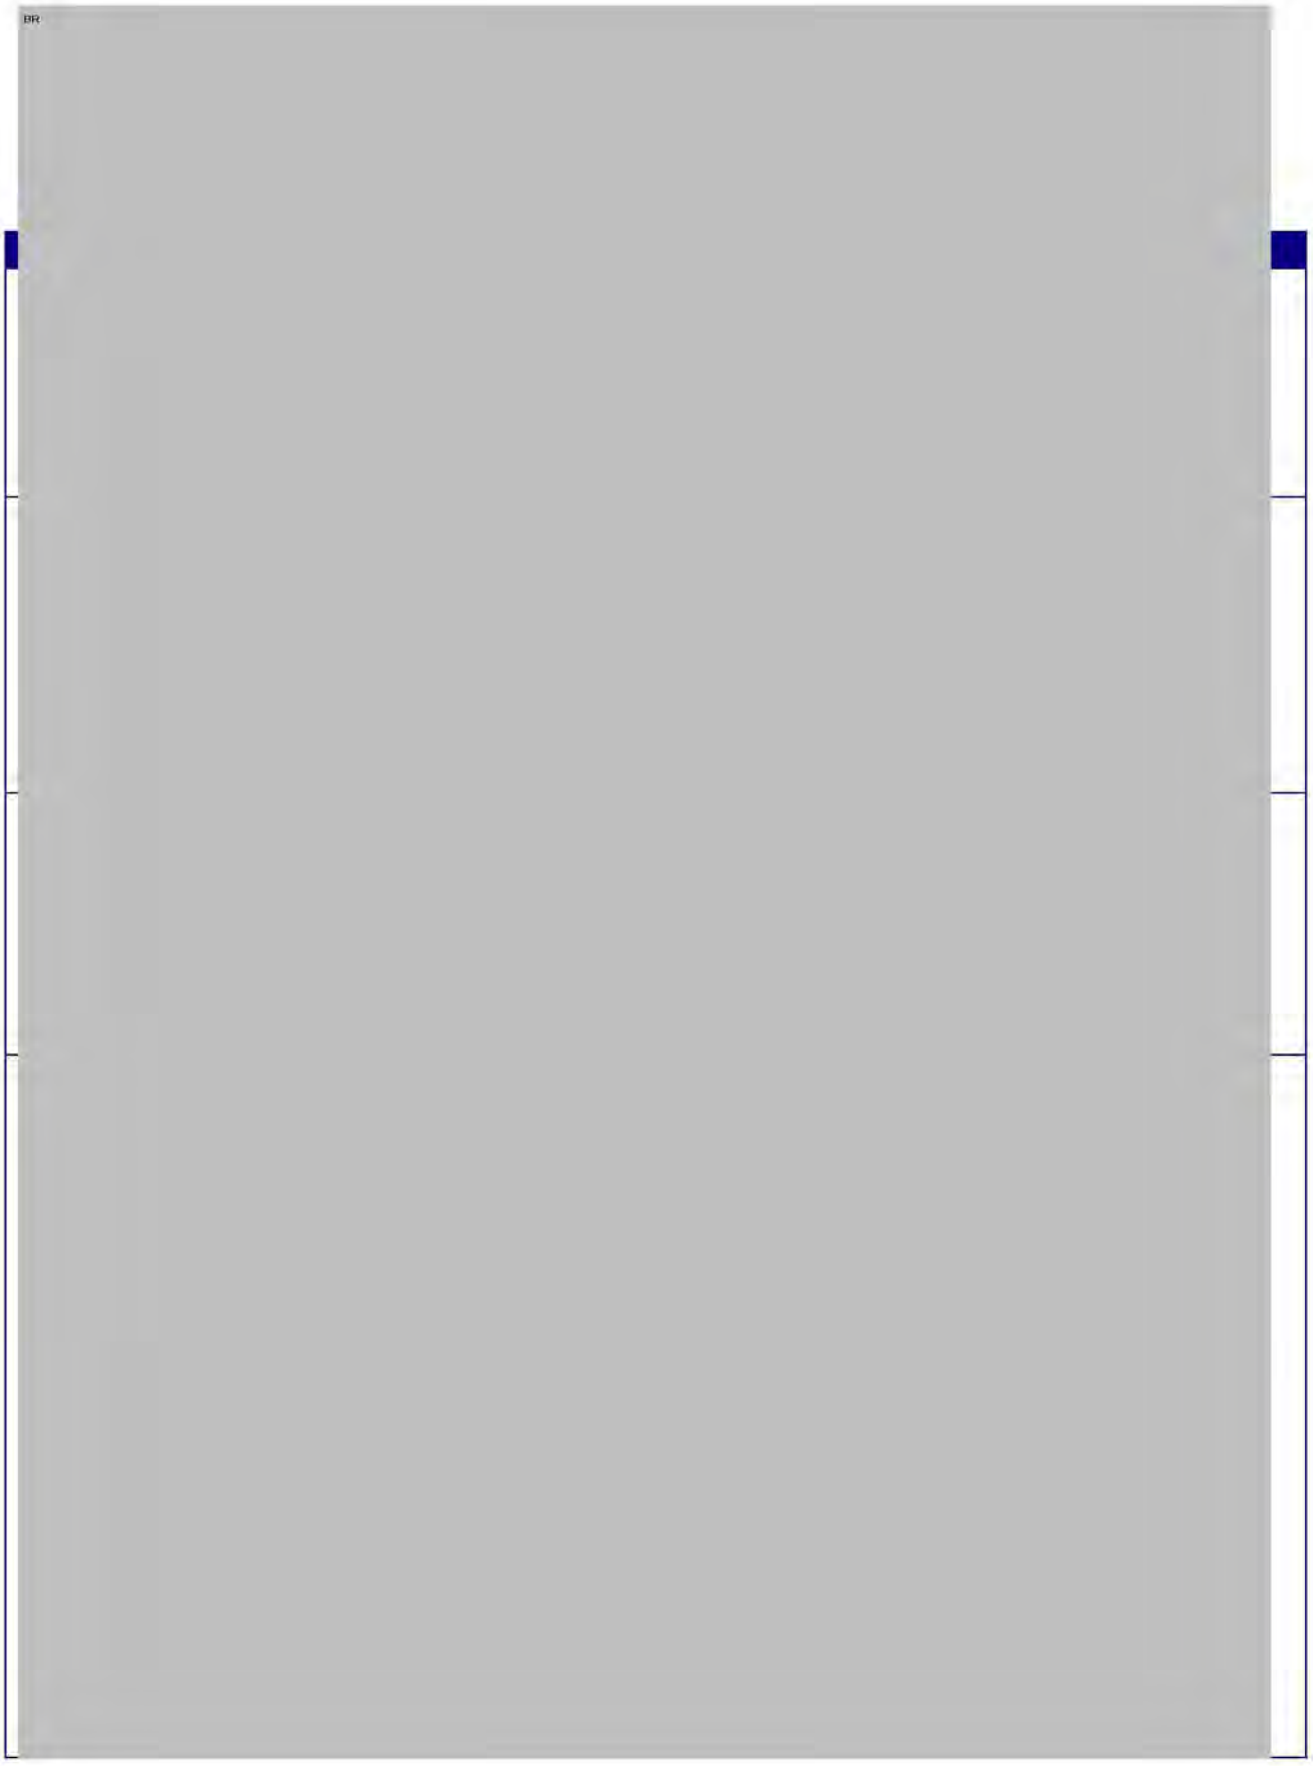
BR

BR

Docnr13



Docnr14

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 1e kwartaal 2017

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 20 april 2017**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

Docnr14

Docnr14



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 4e kwartaal 2016
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004389

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd:** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>7 april 2017 | Versie 0.1<br>13 april 2017 | Versie 1.0<br>18 april 2017 | Versie 2.0<br>20 april 2017 | Versie ??<br>11 mei 2017 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder BSKB / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr14



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

*1.1 Projectgegevens* 5

*1.2 Algemeen* 5

*1.3 Toelichting beheersmaatregelen* 5

*1.4 Terugblik afgelopen kwartaal* 5

*1.5 Verwachting komende kwartaal* 6

*1.6 Financien* 7

*1.7 Planning* 7

*1.8 Risico's* 7

*1.9 Bestuurlijke besluitvorming komende periode* 7

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* 8

2.1.1 Afgelopen kwartaal 8

2.1.2 Komende kwartaal 8

*2.2 Planologie en Vergunningen* 9

2.2.1 Afgelopen kwartaal 9

2.2.2 Komende kwartaal 9

*2.3 Verwervingen* 10

2.3.1 Afgelopen kwartaal 10

2.3.2 Komende kwartaal 10

*2.4 Overeenkomsten* 11

2.4.1 Afgelopen kwartaal 11

2.4.2 Komende kwartaal 12

*2.5 Communicatie* 13

2.5.1 Afgelopen kwartaal 13

2.5.2 Komende kwartaal 14

2.5.3 Diversen 14

3 Projectvoortgang 15

*3.1 Aanbesteden en contracteren* 15

3.1.1 Afgelopen kwartaal 15

3.1.2 Komende kwartaal 15

*3.2 Vormgeving* 16

3.2.1 Afgelopen kwartaal 16

3.2.2 Komende kwartaal 16

*3.3 Monitoring* 17

3.3.1 Afgelopen kwartaal 17

3.3.2 Komende kwartaal 17

*3.4 Inpassing Binckhorst* 18

3.4.1 Afgelopen kwartaal 18

Docnr14




3.4.2 Komende kwartaal 18

*3.5 Inpassing Vlietzone* *20*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 20
3.5.2 Komende kwartaal 21

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* *22*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 22
3.6.2 Komende kwartaal 22

*3.7 Boortunnel en toeritten* *24*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 24
3.7.2 Komende kwartaal 25

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *26*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 26
3.8.2 Komende kwartaal 26

*3.9 Installaties* *28*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 28
3.9.2 Komende kwartaal 28

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *29*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 29
3.10.2 Komende kwartaal 29

*3.11 Uitvoeringskwaliteit* *30*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 30
3.11.2 Komende kwartaal 30

*3.12 Contractmanagement* *31*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 31
3.12.2 Komende kwartaal 31

**4 Overdracht en openstelling** **32**

*4.1 Tunnelveiligheid* *32*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 32
4.1.2 Komende kwartaal 32

*4.2 Overdracht aan beheerders* *33*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 33
4.2.2 Komende kwartaal 33

*4.3 Beheer en onderhoud* *34*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 34
4.3.2 Komende kwartaal 34

**5 Projectbeheersing** **35**

*5.1 Scope* *35*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 35
5.1.2 Komende kwartaal 35

*5.2 Financien* *36*
5.2.1 Kostenstructuur 36
5.2.2 Dekkingen 37

*5.3 Planning* *39*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 39

Docnr14



5.3.2 Komende kwartaal 39

*5.4 Risico's* *40*

5.4.1 Afgelopen kwartaal 40

5.4.2 Komende kwartaal 40

5.4.3 Financiële toprisico's 40

5.4.4 Toprisico's planning 42

*5.5 Interne kwaliteit* *44*

5.5.1 Afgelopen kwartaal 44

5.5.2 Komende kwartaal 44

*5.6 Informatiebeheer* *45*

5.6.1 Afgelopen kwartaal 45

5.6.2 Komende kwartaal 45

*5.7 Organisatie* *46*

5.7.1 Afgelopen kwartaal 46

5.7.2 Komende kwartaal 46

6 Bijlage: Planningsmijlpalen 47

7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 48

8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 50

# 1 Managementsamenvatting

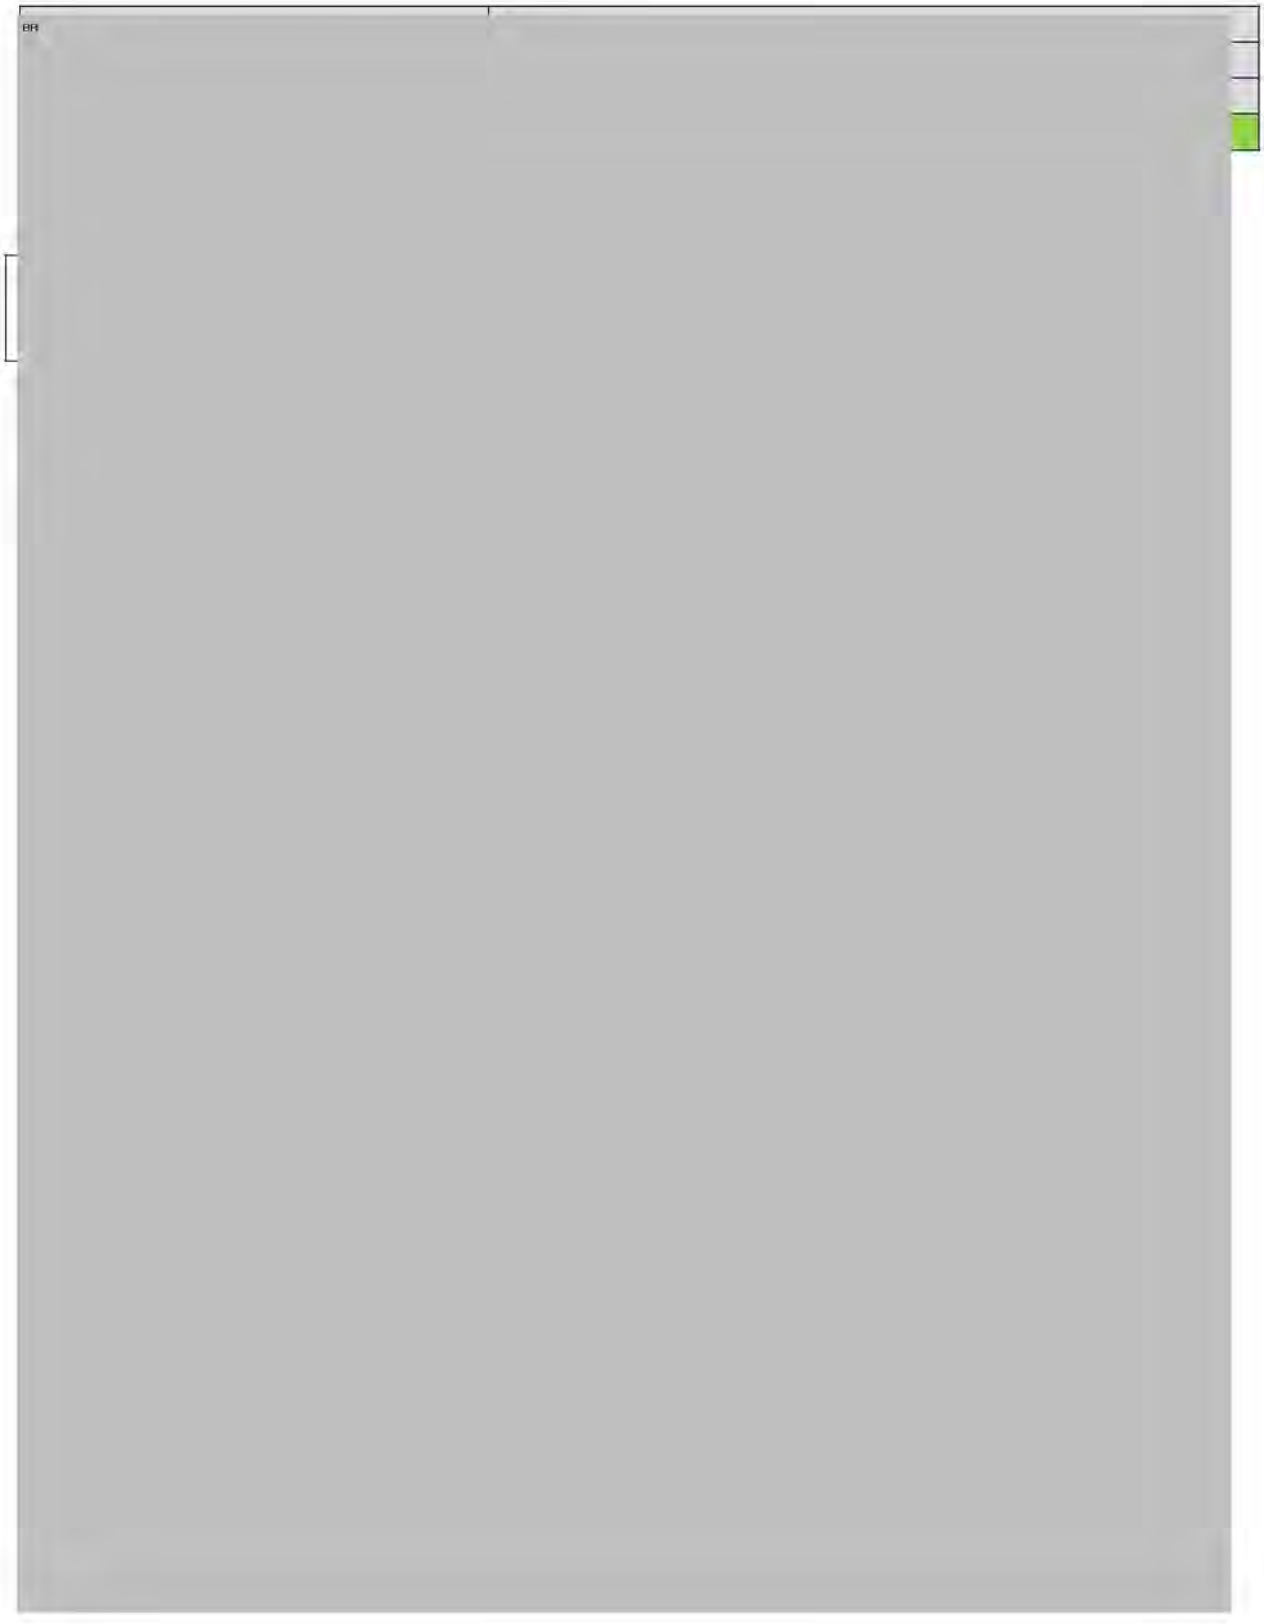

- Er is een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld t.b.v. het mogen realiseren van de 2e watertoevoer vanuit de Vliet, over het perceel van 5.1.2.e naar de calamiteitenberging in het Molenvlietpark. DSO is gestart met het opstellen van een planologisch uitvoeringskader (PUK) voor het toetsen van de particuliere herontwikkeling Vredenoord derde fase;

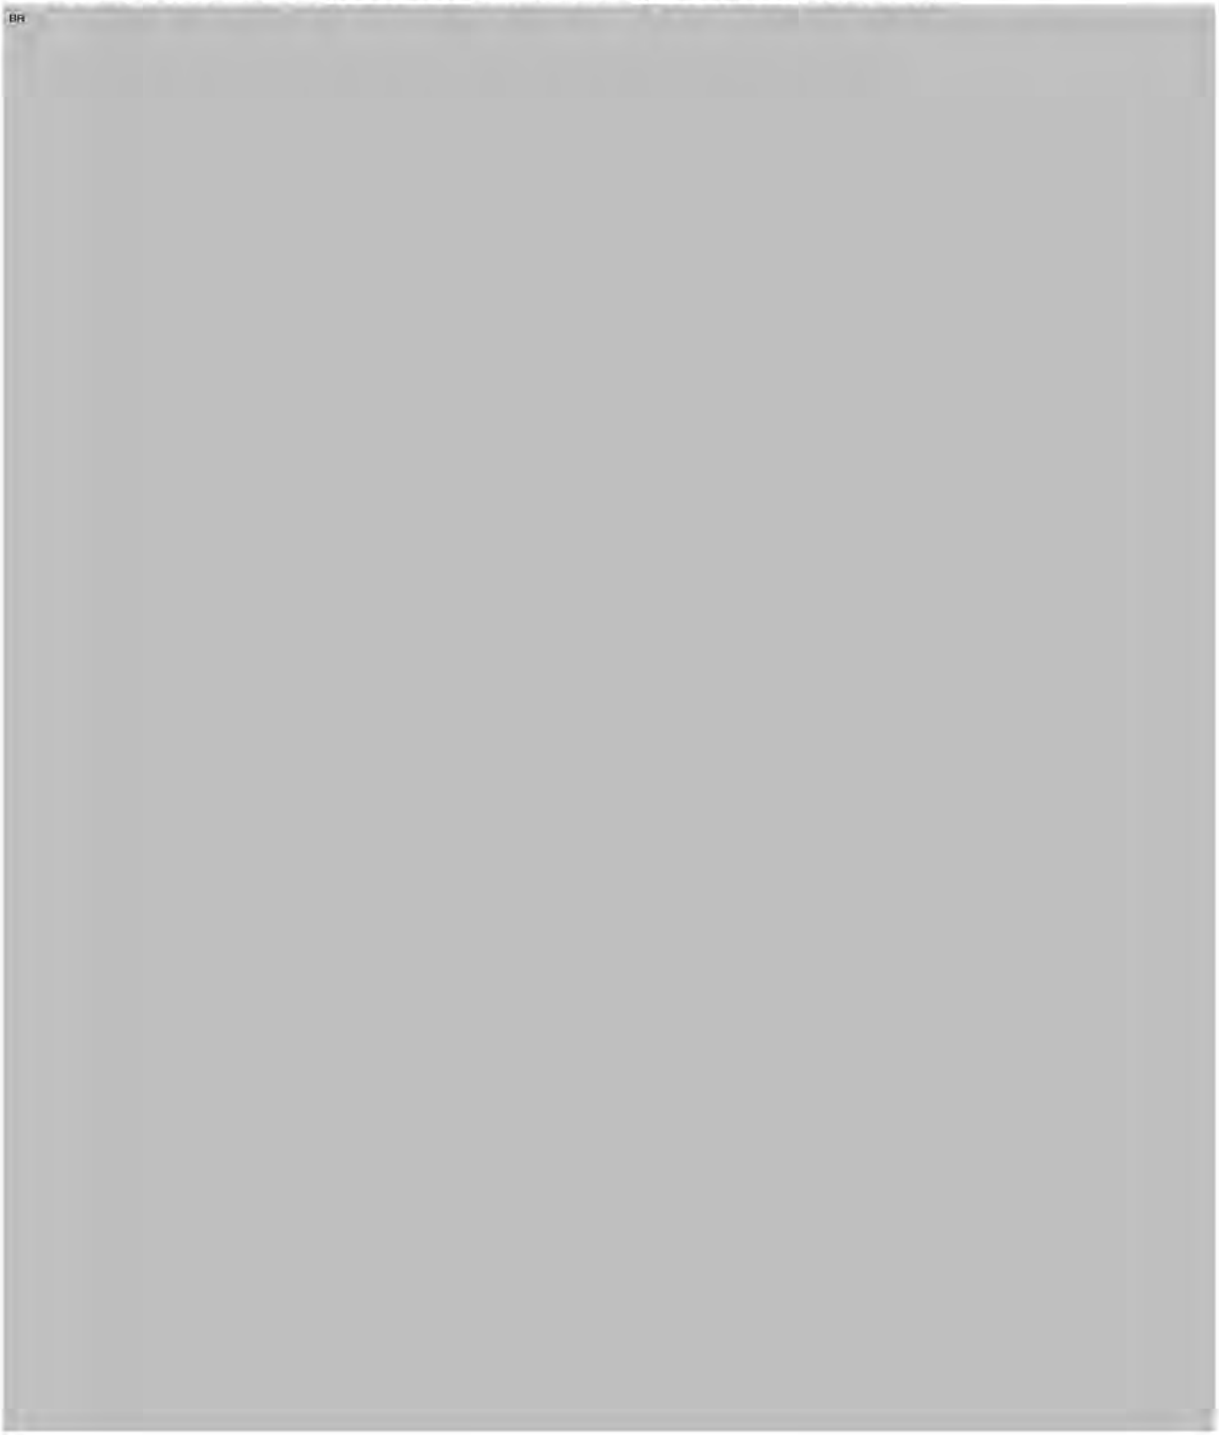

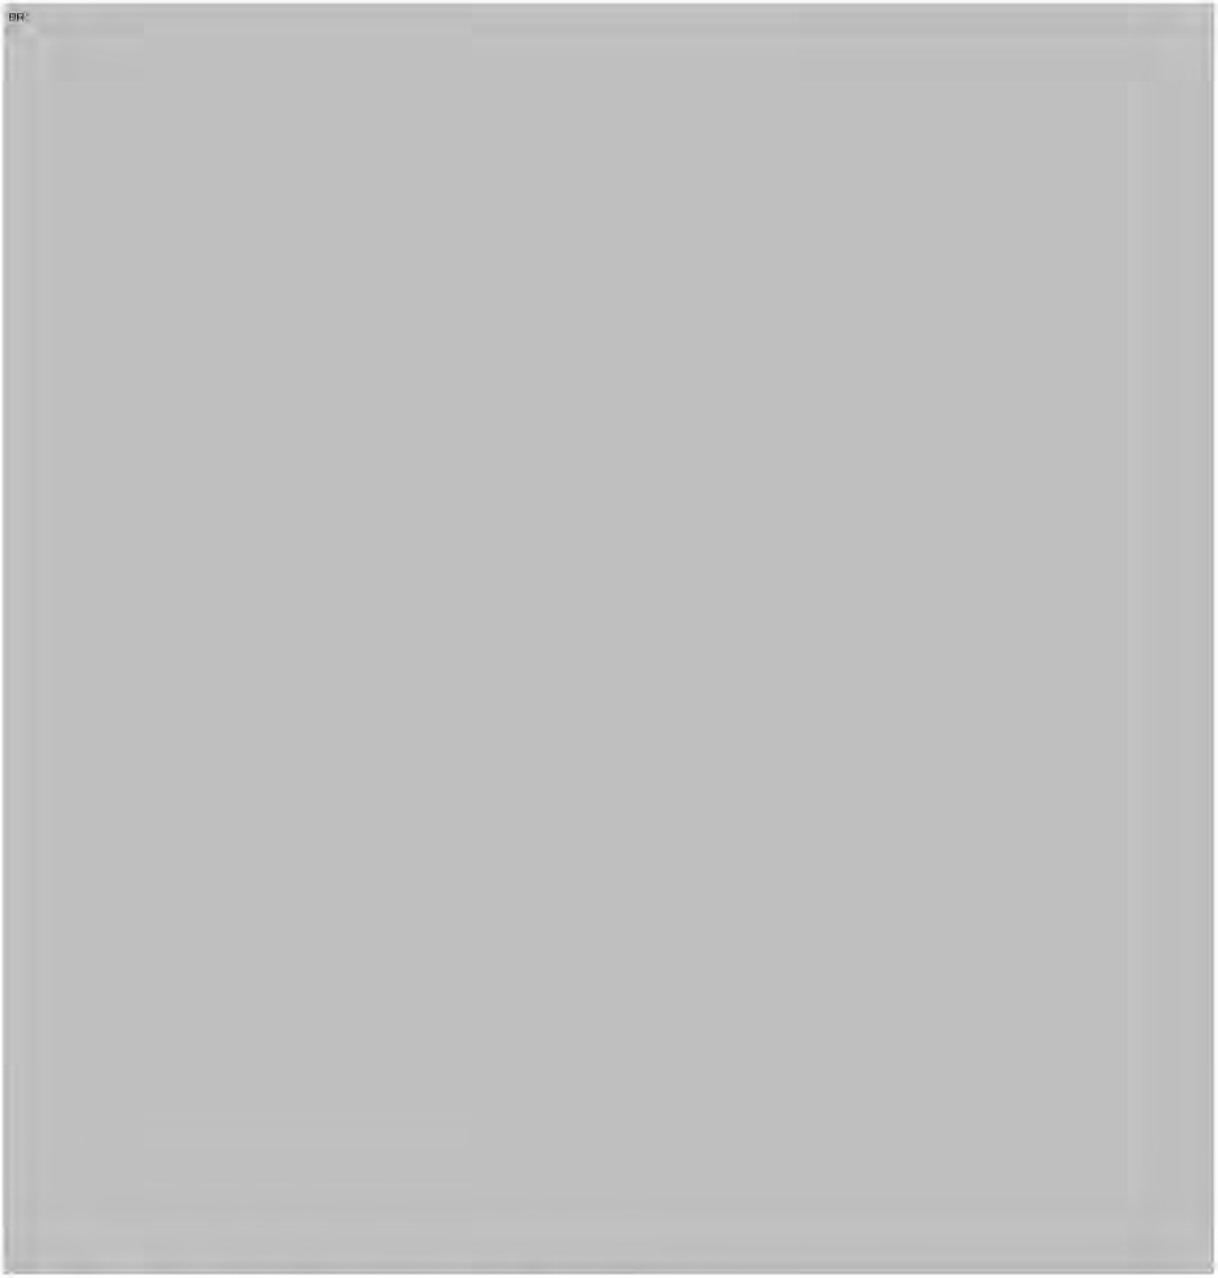

## 1.9 Bestuurlijke besluitvorming komende periode

Indien er overeenstemming bereikt wordt tussen 5.1.2.e en de gemeente Den Haag over de kaders voor zijn herontwikkeling Vredenoord derde fase en de door de gemeente gewenste waterinlaat naar het bergingsgebied in het Molenvlietpark, zal het College verzocht worden in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en het Project Uitvoeringskader.

Docnr14



# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

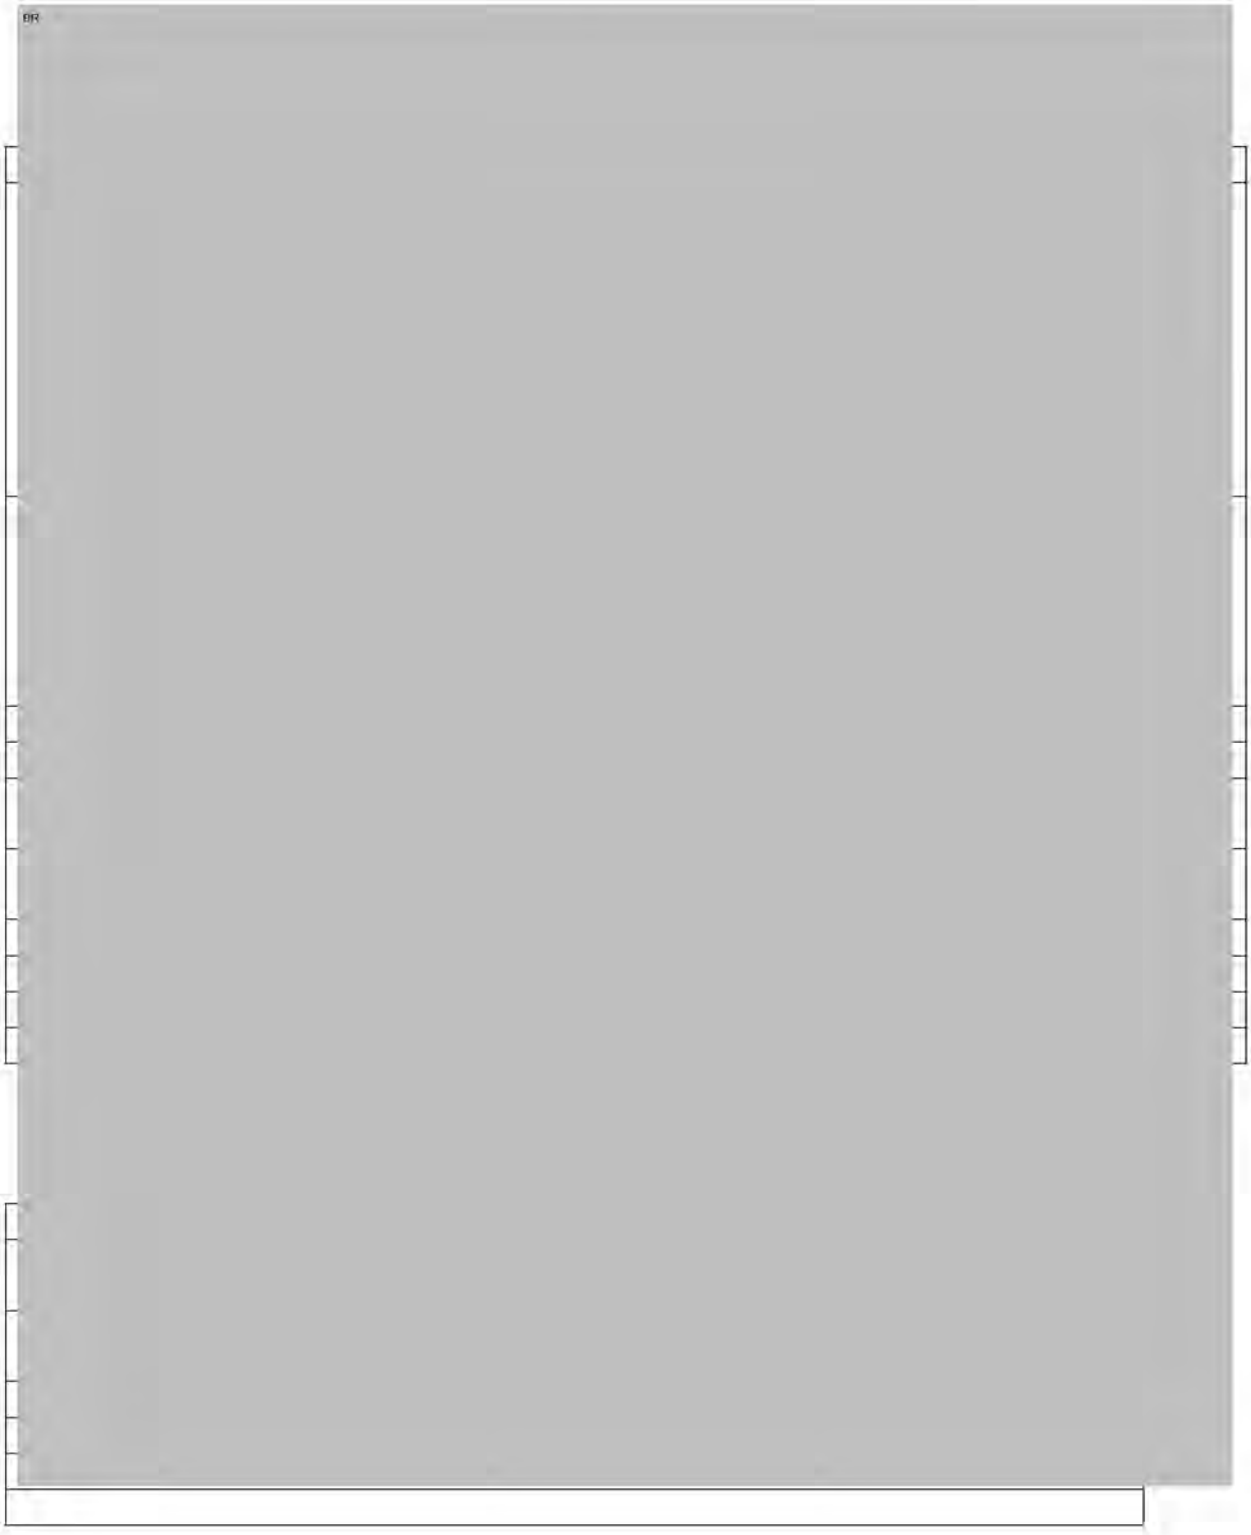

## 2.2 Planologie en Vergunningen

Vanaf heden worden de onderwerpen Planologie en Vergunningen gecombineerd gerapporteerd.

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Bij Hoogheemraadschap aanvragen vergunning voor watertoevoer vanuit Zuidvliet naar Molenvlietpark. Hiervoor wordt een projectplan ter inzage gelegd. | De gesprekken met het Hoogheemraadschap over de te doorlopen procedures zijn nog gaande. |
| | |
| [redacted] | |

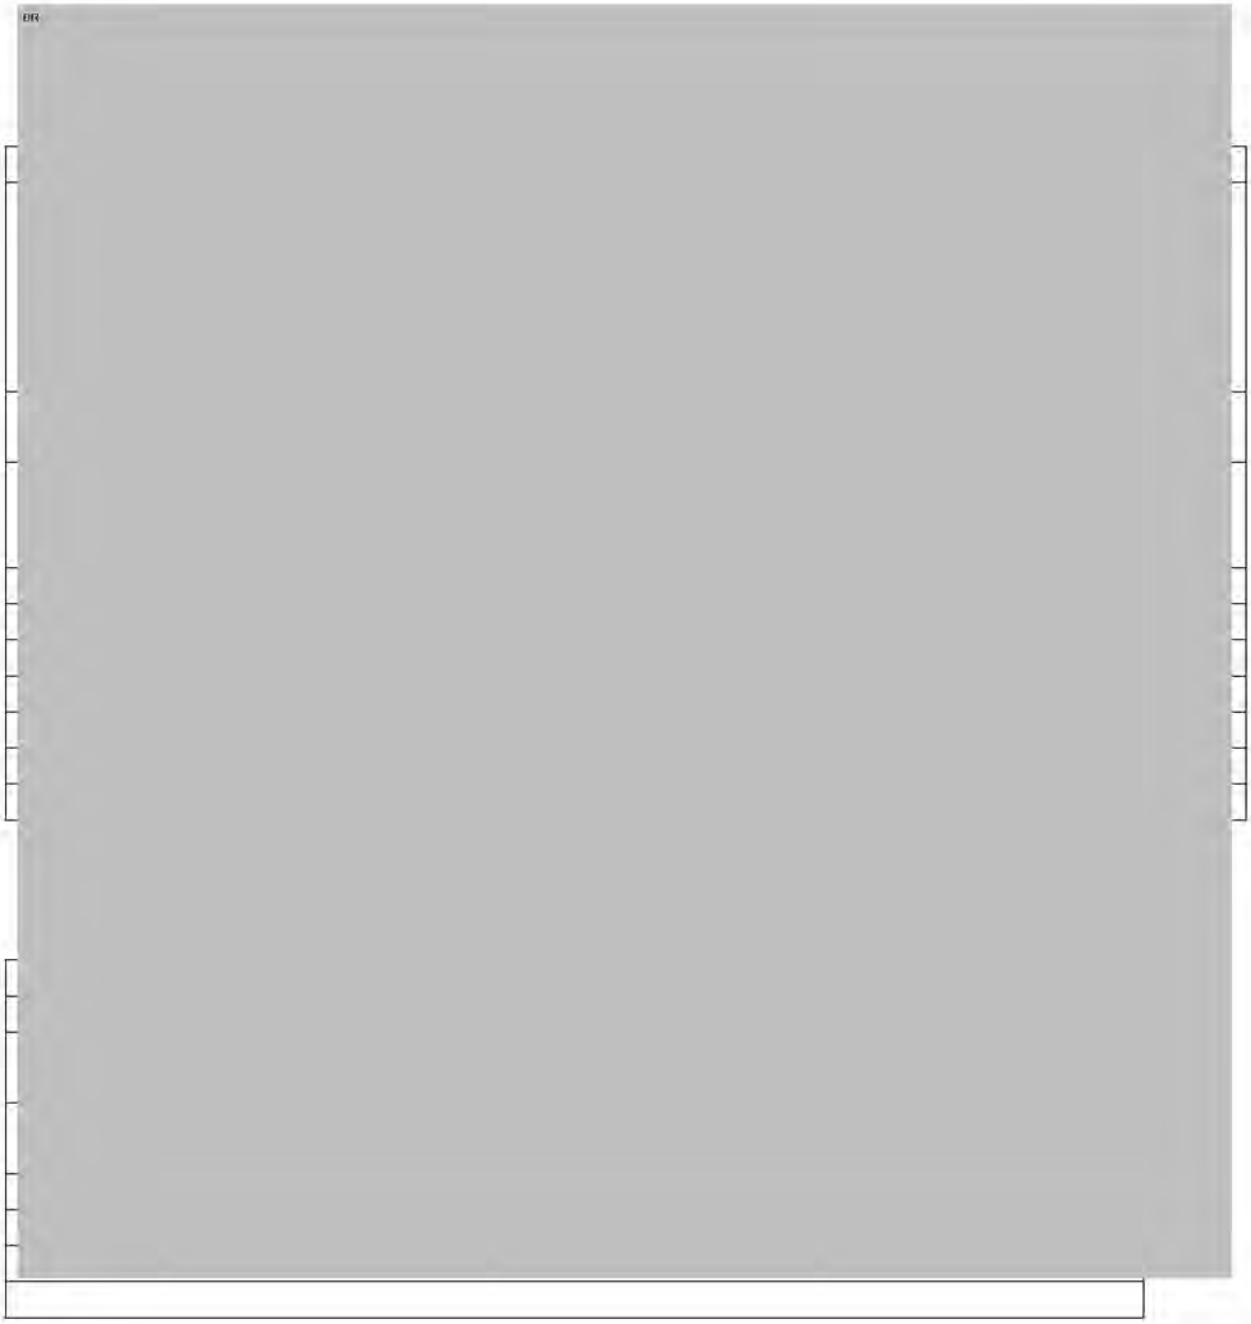

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Afronden samenwerkingsovereenkomst met dhr. 5.1.2e t.b.v. de inlaat waterberging Molenvlietpark over zijn perceel. Dit zal geschieden in samenhang met het op te stellen PUK t.a.v. zijn ontwikkeling Nieuw Vredenoord. Na besluitvorming zal de verdere ontwikkeling Nieuw Vredenoord door DSO worden opgepakt (faciliteren). | In samenwerking met DSO/Grondzaken is de concept-SOK voor de waterinlaat naar het bergingsgebied in ontwikkeling die binnenkort met 5.1.2e wordt besproken. Separaat is overleg gestart met DSO/PmDH voor het op verzoek van 5.1.2e opstellen van een PUK met daarin de ruimtelijke kaders voor de verdere planontwikkeling door 5.1.2e van herontwikkeling Vredenoord derde fase. Zodra deze in concept gereed zijn zullen beide documenten met wethouder BSKB worden bespreken. |
| Overeenstemming bereiken met 5.1.2e t.a.v. de waterinlaat naar de waterberging Molenvlietpark en de verlegging van het Molenslootpad, waarbij de aanpassing (verhoging) van de brug geen issue meer is (afhankelijk van uitkomst overeenkomst met dhr. 5.1.2e ).. | In afwachting van de uitkomsten van het proces met 5.1.2e is er afgelopen kwartaal geen contact geweest met fam. 5.1.2e 5.1.2e Dit wordt in het begin van het tweede kwartaal weer opgestart. |
| BR | |

| Geplande besluiten | Genomen besluiten |
|---|---|
| Collegebesluit aangaande overeenkomst met 5.1.2e t.a.v. inlaat naar waterberging Molenvlietpark in relatie tot de ontwikkeling Nieuw Vredenoord (PUK) staat vooralsnog gepland voor 1e kwartaal 2017. | Wegens de relatie tussen de SOK voor de waterinlaat en de PUK voor herontwikkeling Vredenoord derde fase is het in het afgelopen kwartaal niet gelukt deze documenten af te ronden. |
| | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Parallel aan het opstellen van het PUK herontwikkeling Vredenoord derde fase wordt ernaar |

| |
|---|
| gestreeft de SOK ten behoeve van de waterinlaat naar het bergingsgebied af te ronden. Daarnaast zal het overleg met 5.1.2e hervat worden. |
| RR |
| |
| |
| **Besluiten** |
| Collegebesluit aangaande samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2e t.a.v. waterinlaat naar het bergingsgebied, als ook het vaststellen van het PUK voor de particuliere herontwikkeling Vredenoord der fase. |
| |

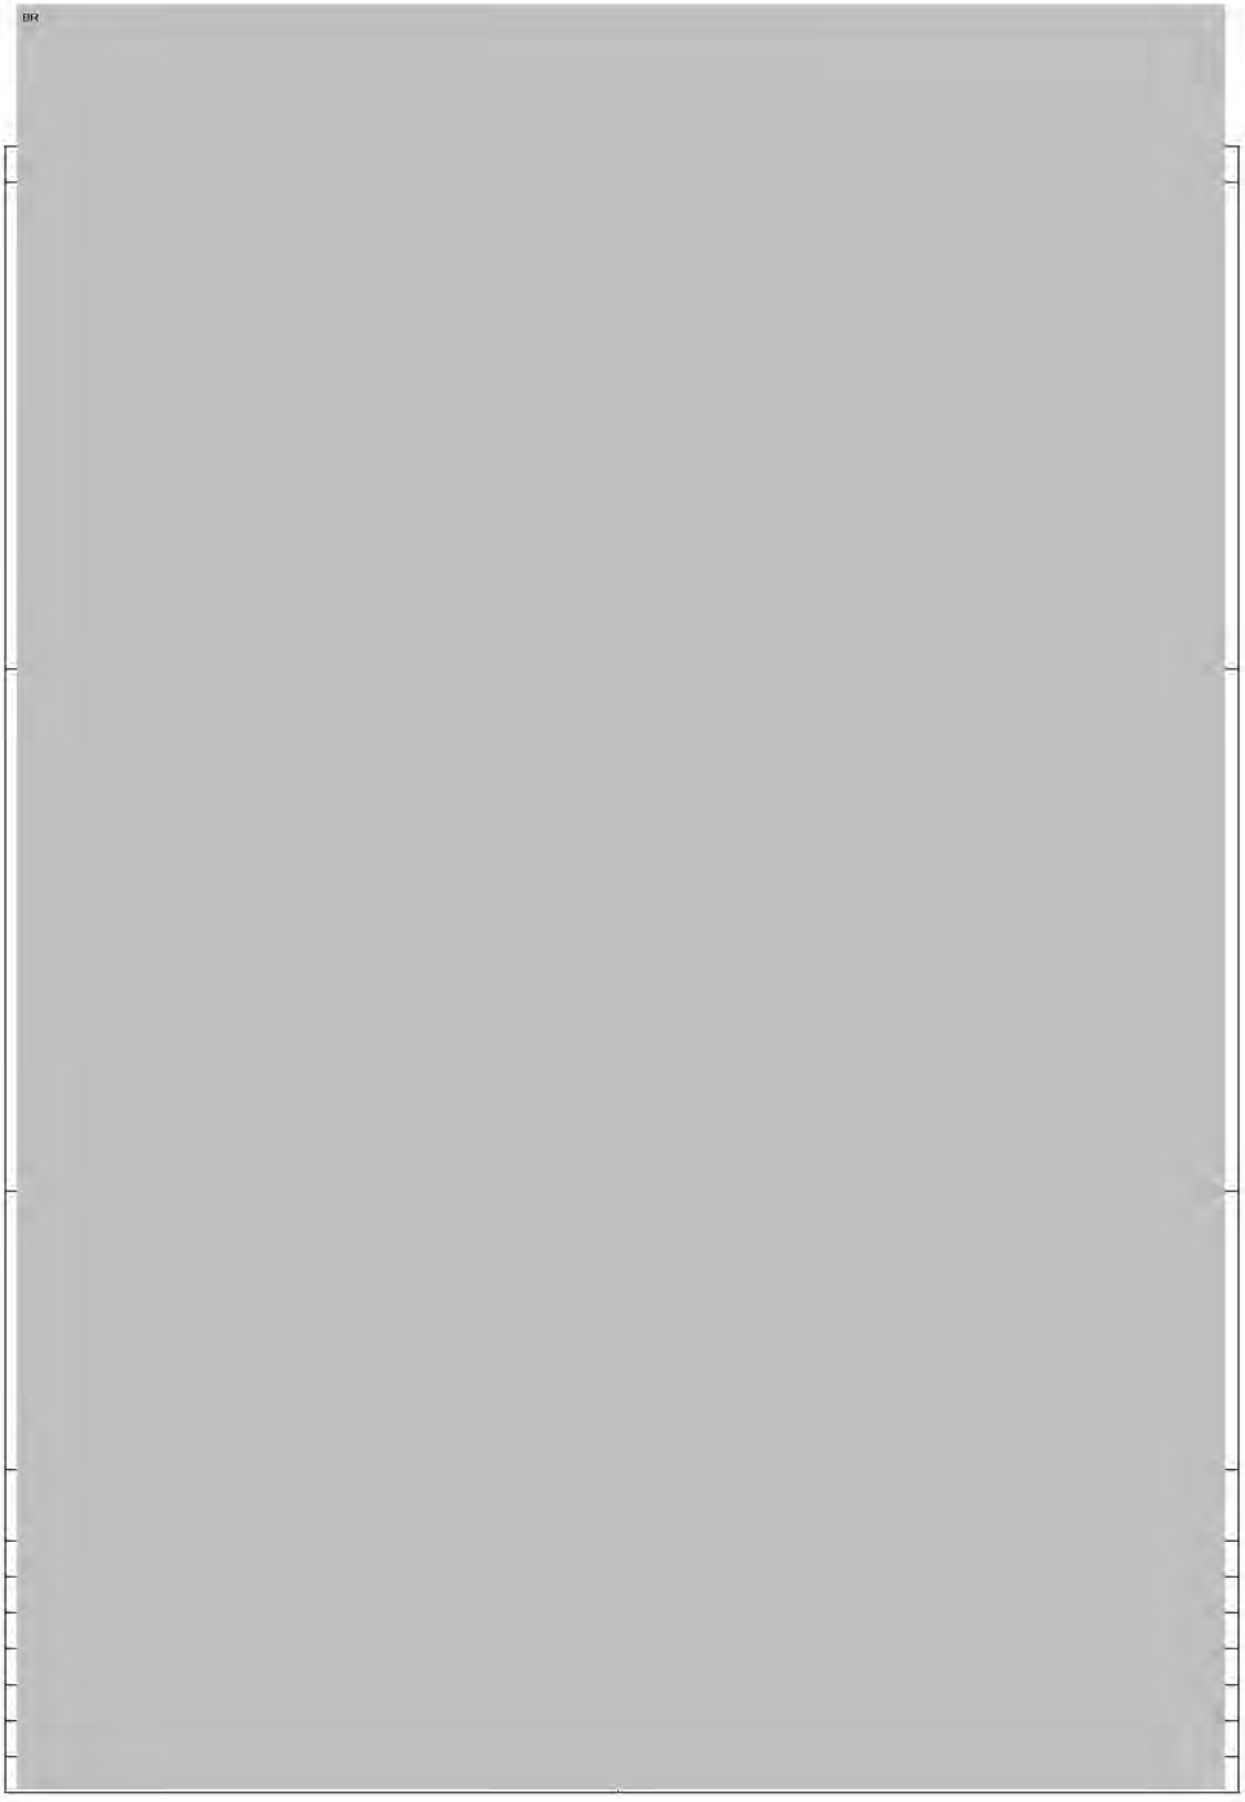
BR

BR

# 3 Projectvoortgang

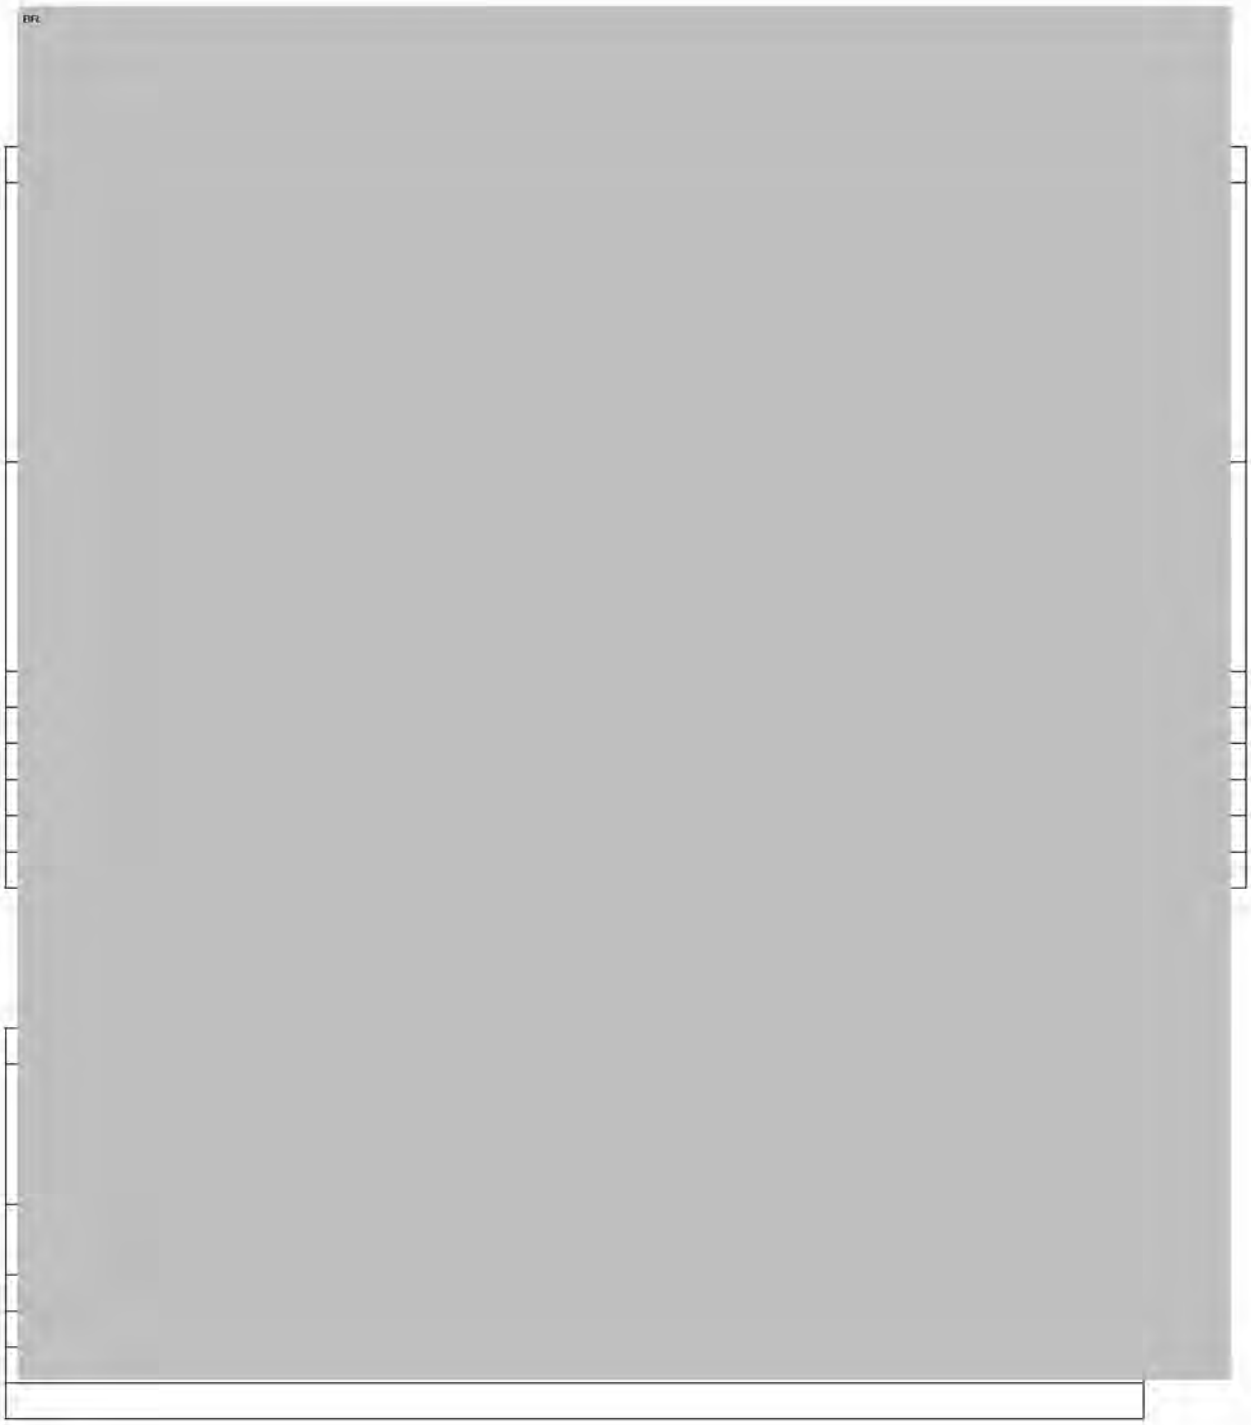

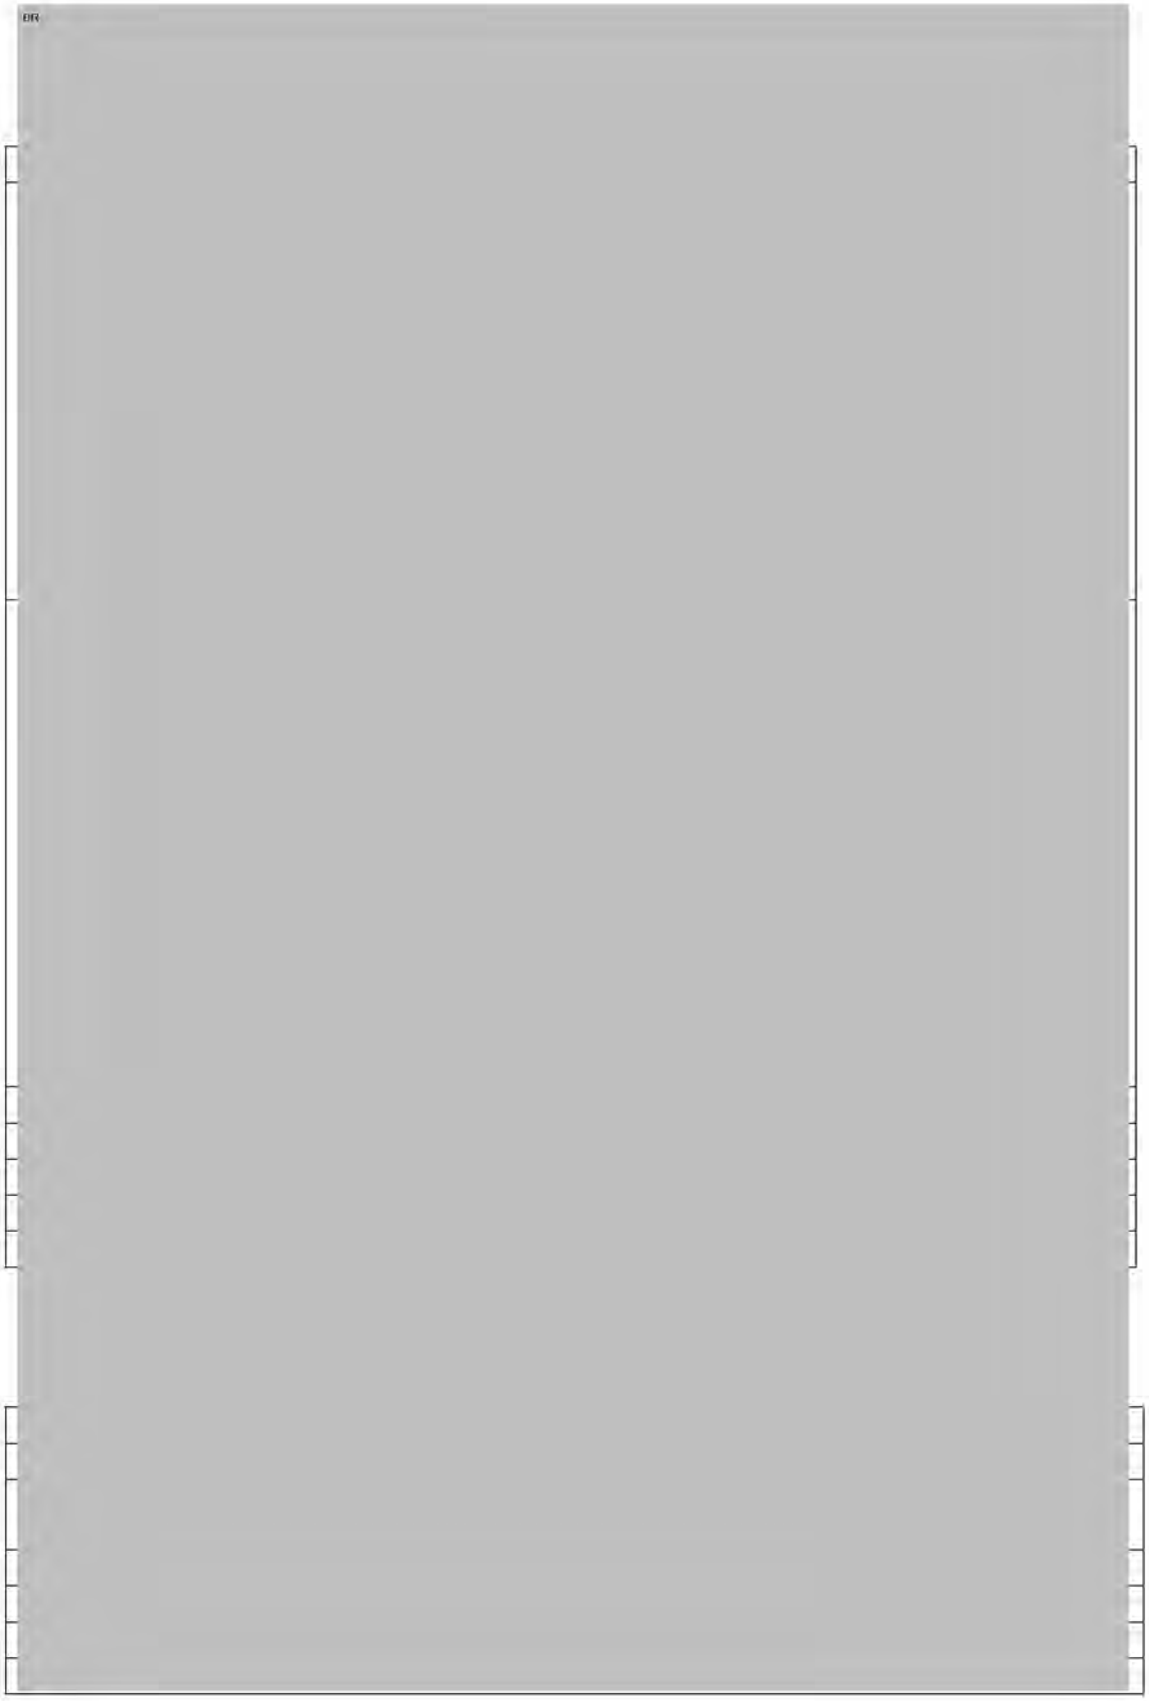

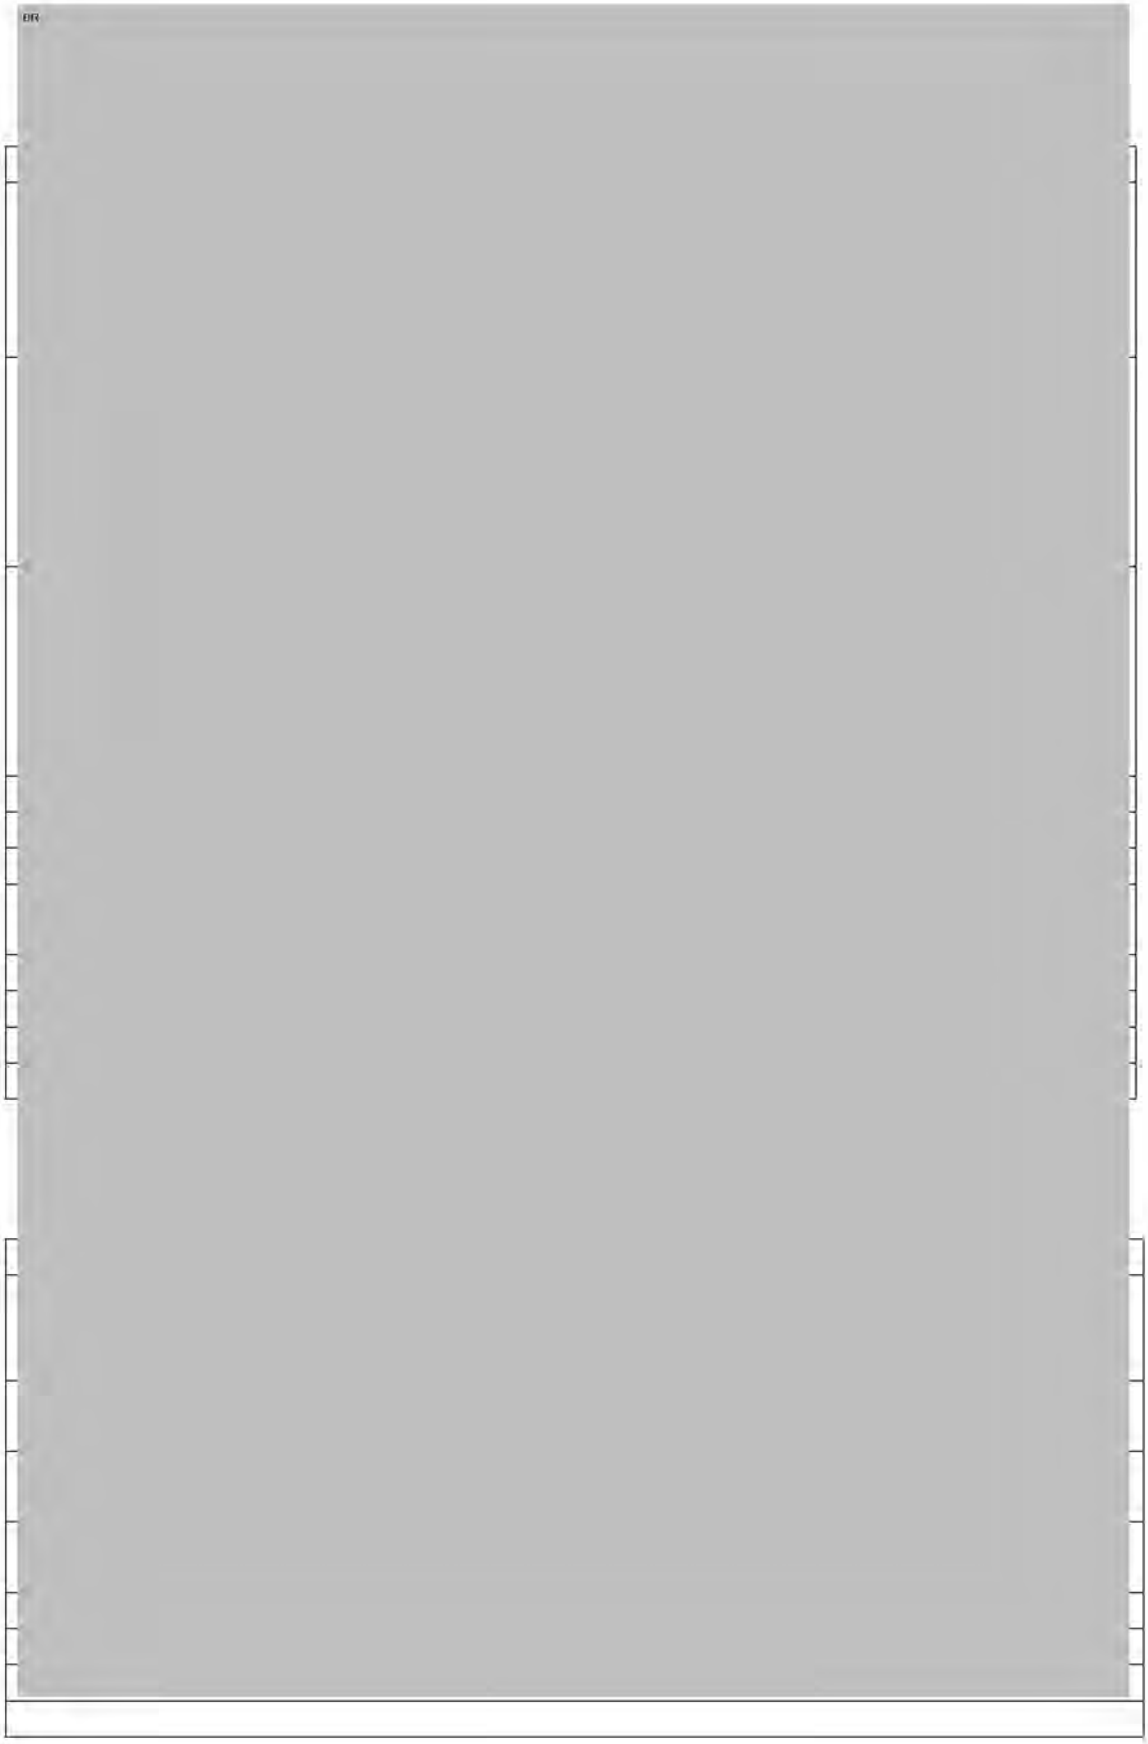

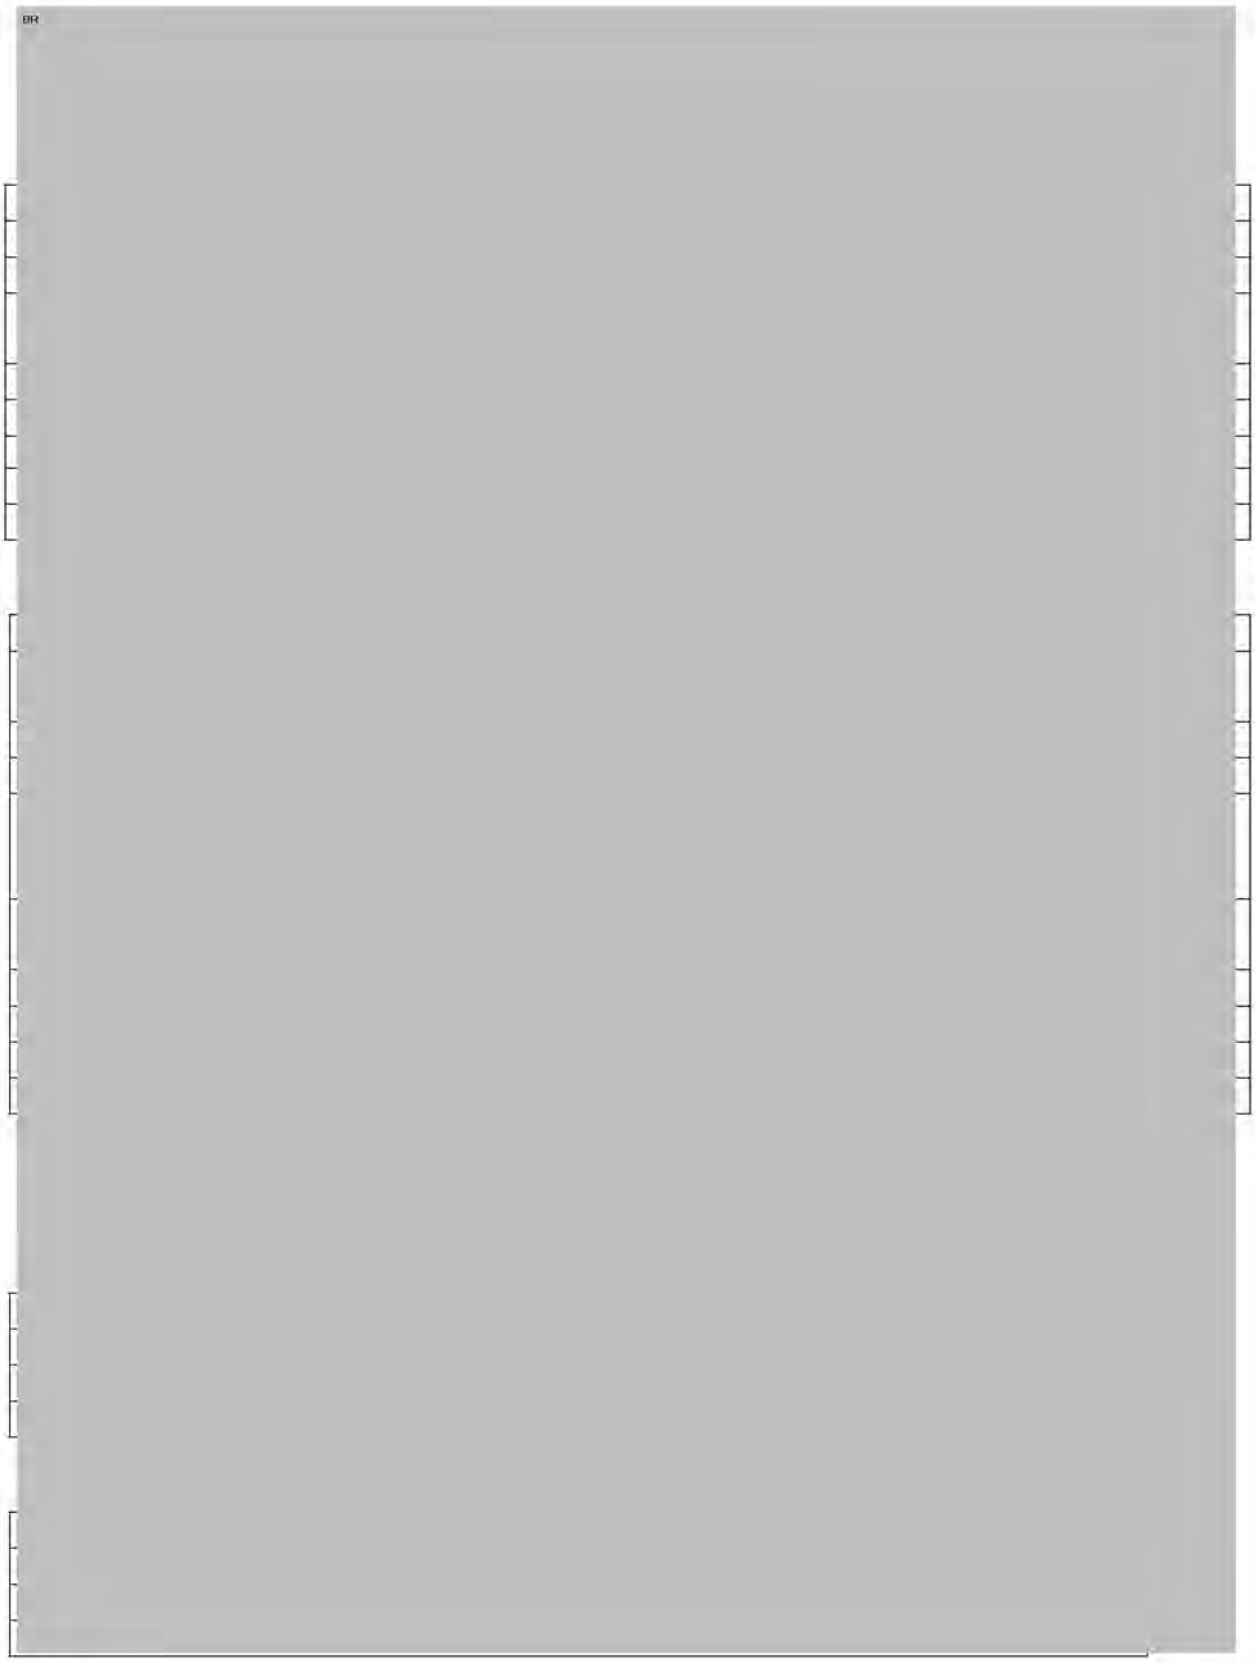
BR

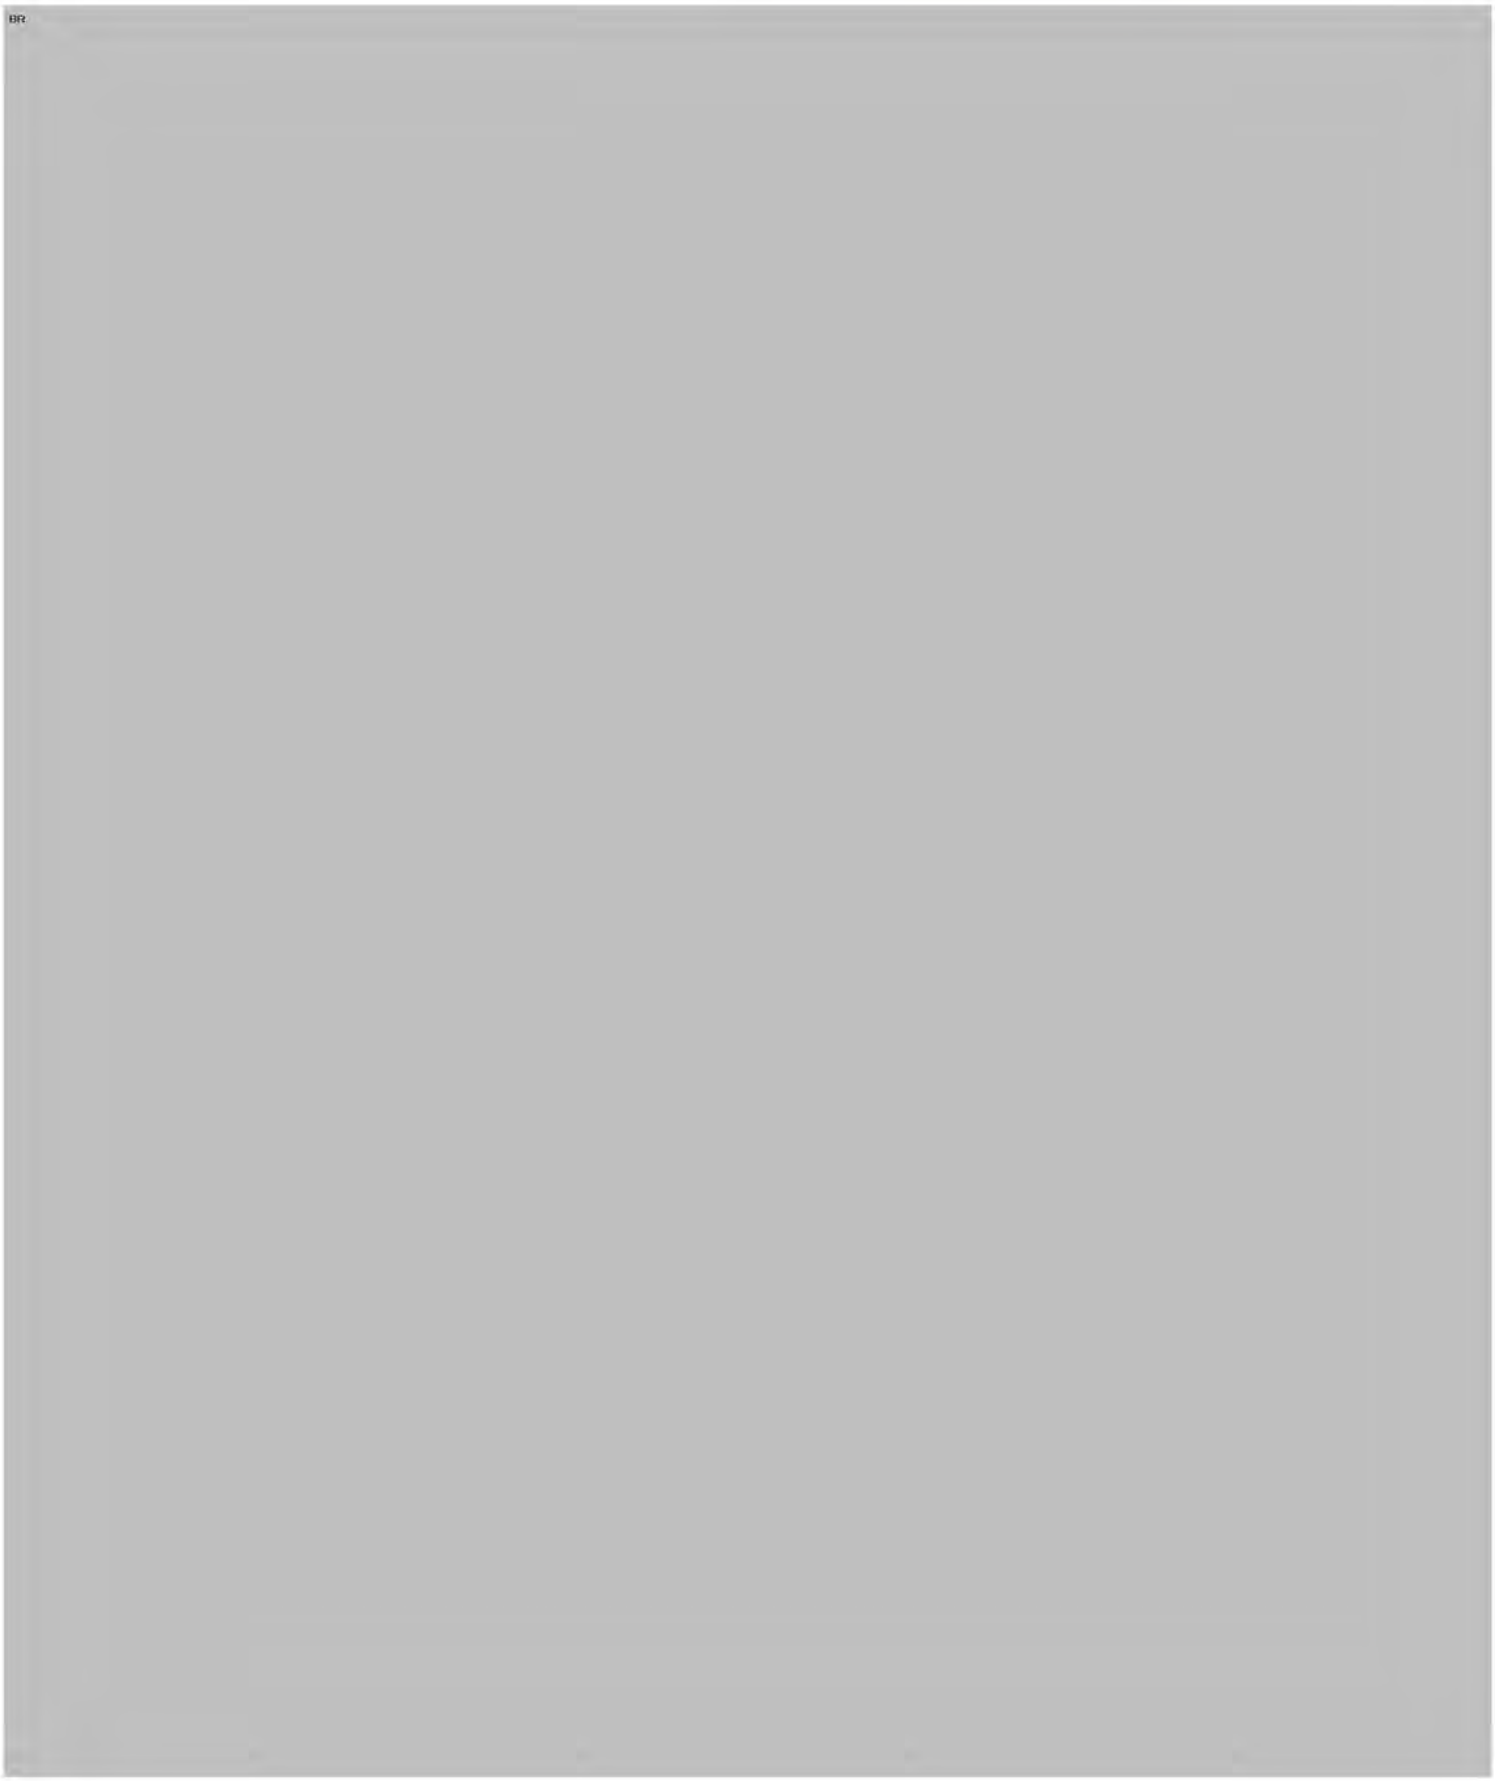
BR

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

**Conditionering**

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Uitvoeren van milieu hygiënisch bodemonderzoek tweede watertoevoer. | Het onderzoek is uitgevoerd en er is een lokale verontreiniging aangetroffen. |
| BR | |
| | |

**Hoofdcontract**

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Afronden realisatie tijdelijke waterhuishouding (stap 5 t/m 8). | Werkzaamheden gereed. |
| BR | |
| | |

### 3.5.2 Komende kwartaal

**Conditionering**

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| Voorzetten gesprekken Hoogheemraadschap over watertoevoer Molenvlietpark |
| Voorzetten gesprekken kabel- en leidingbeheerders over watertoevoer Molenvlietpark |
| |
| BR |
| |

**Hoofdcontract**

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| BR |
| Aanleggen kade Molenvlietpark. |
| BR |

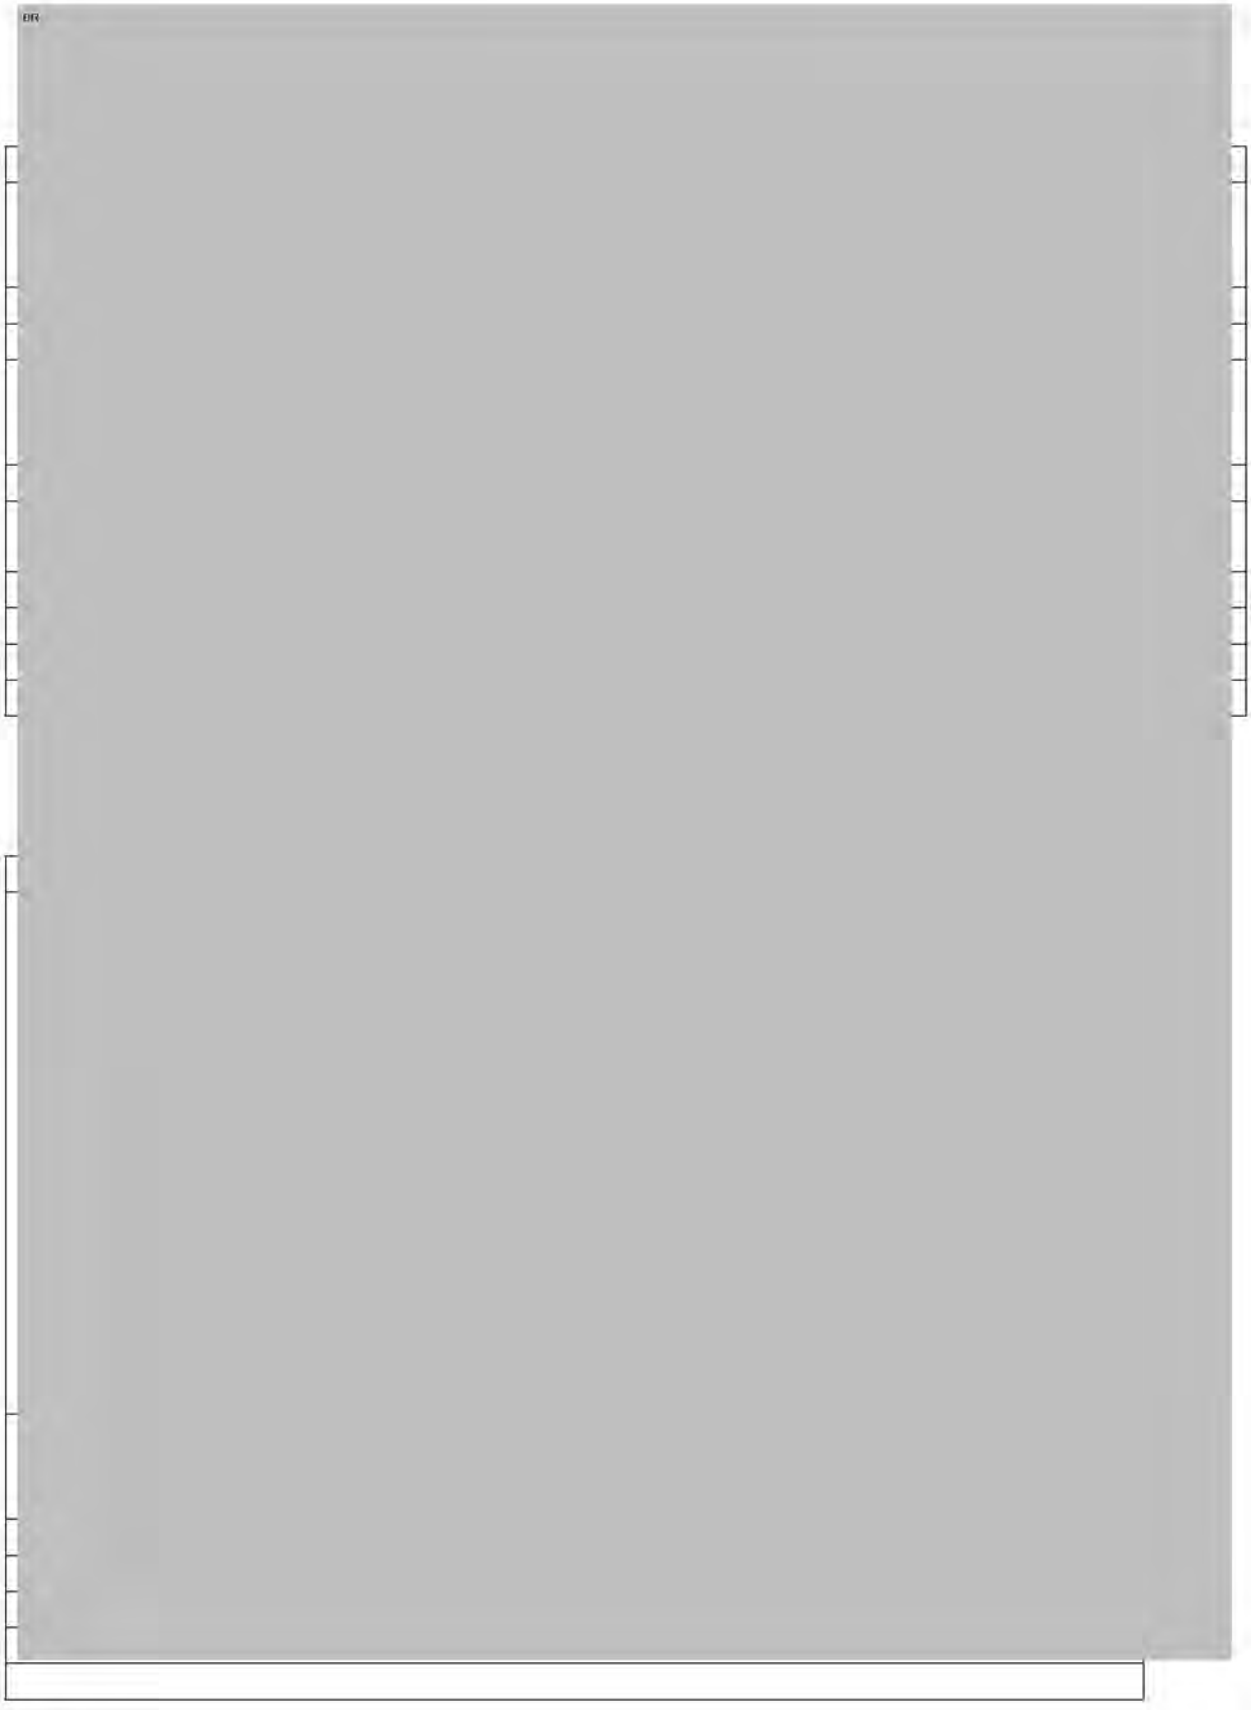

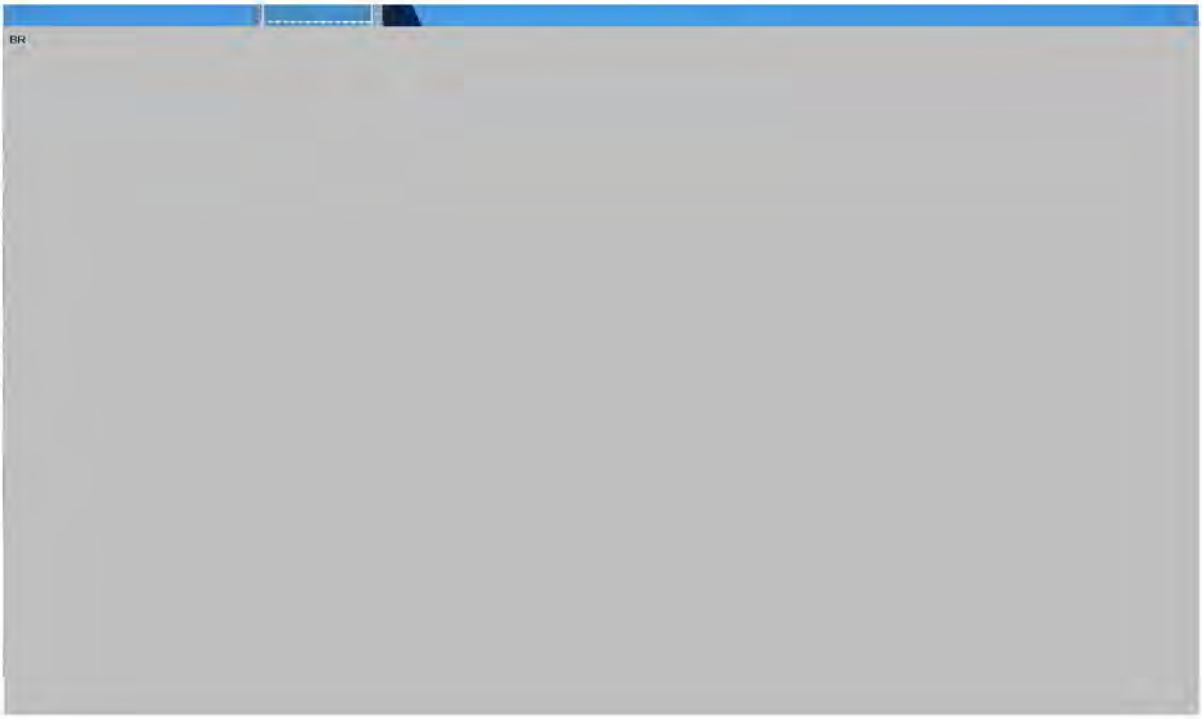
BR

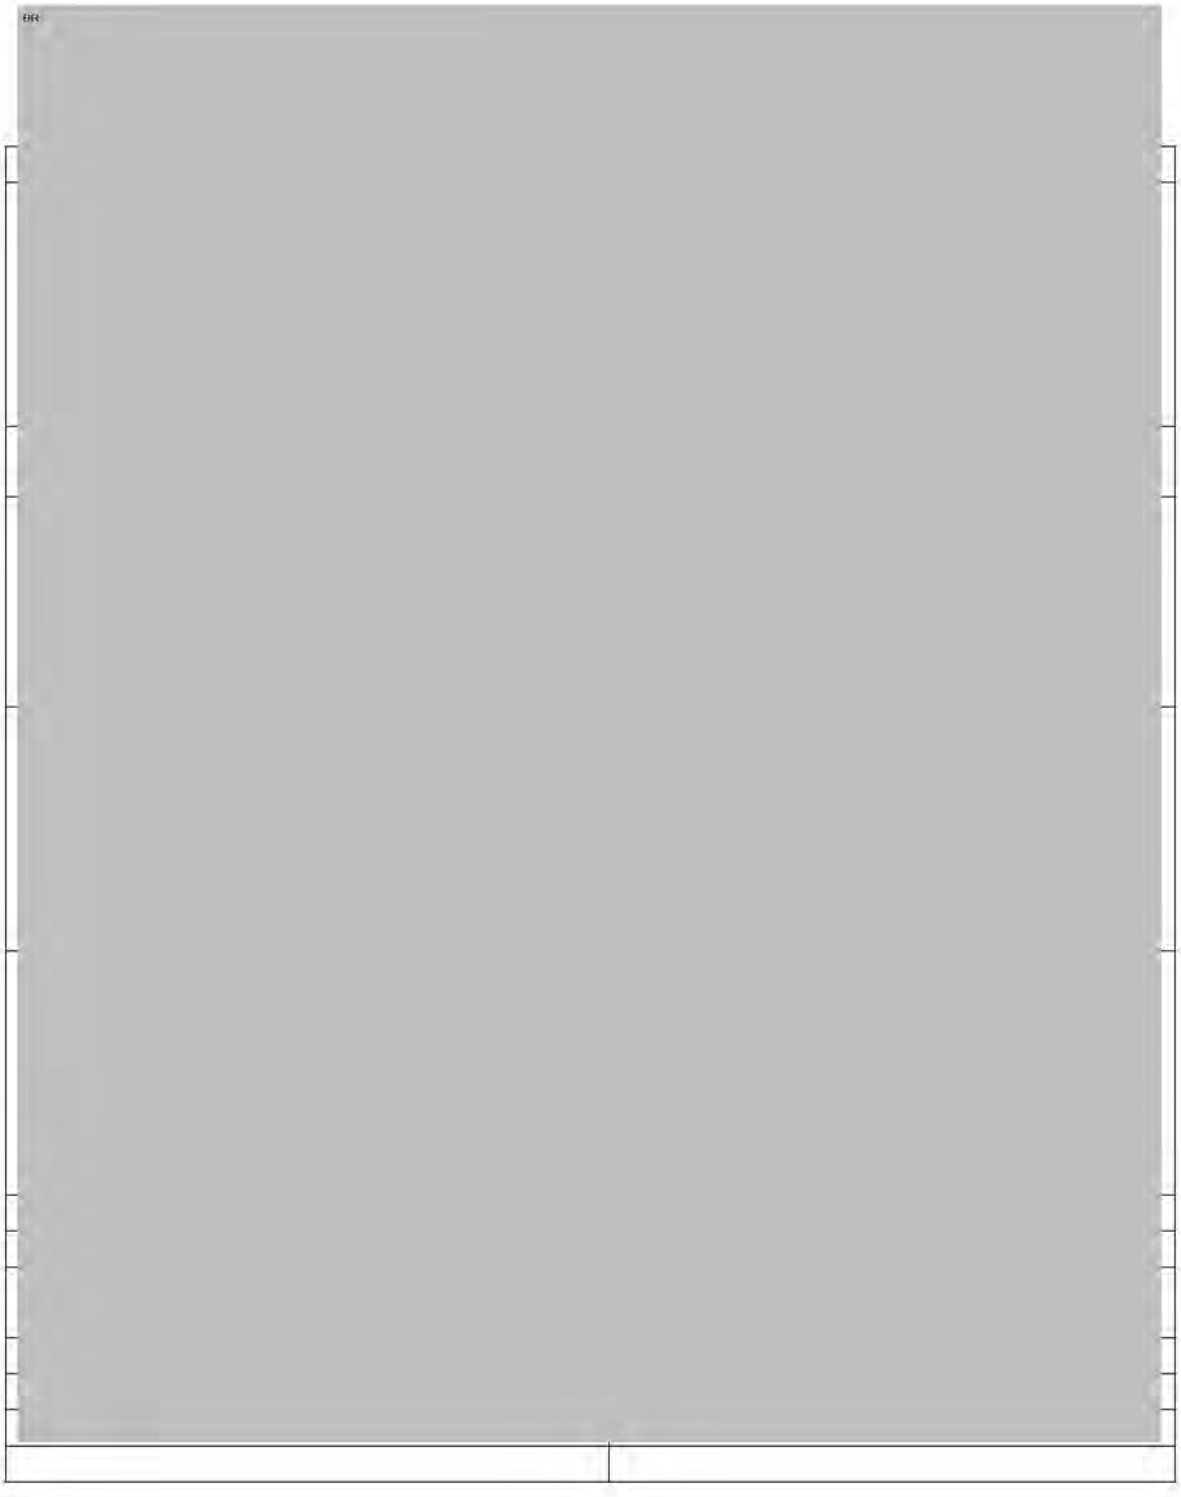

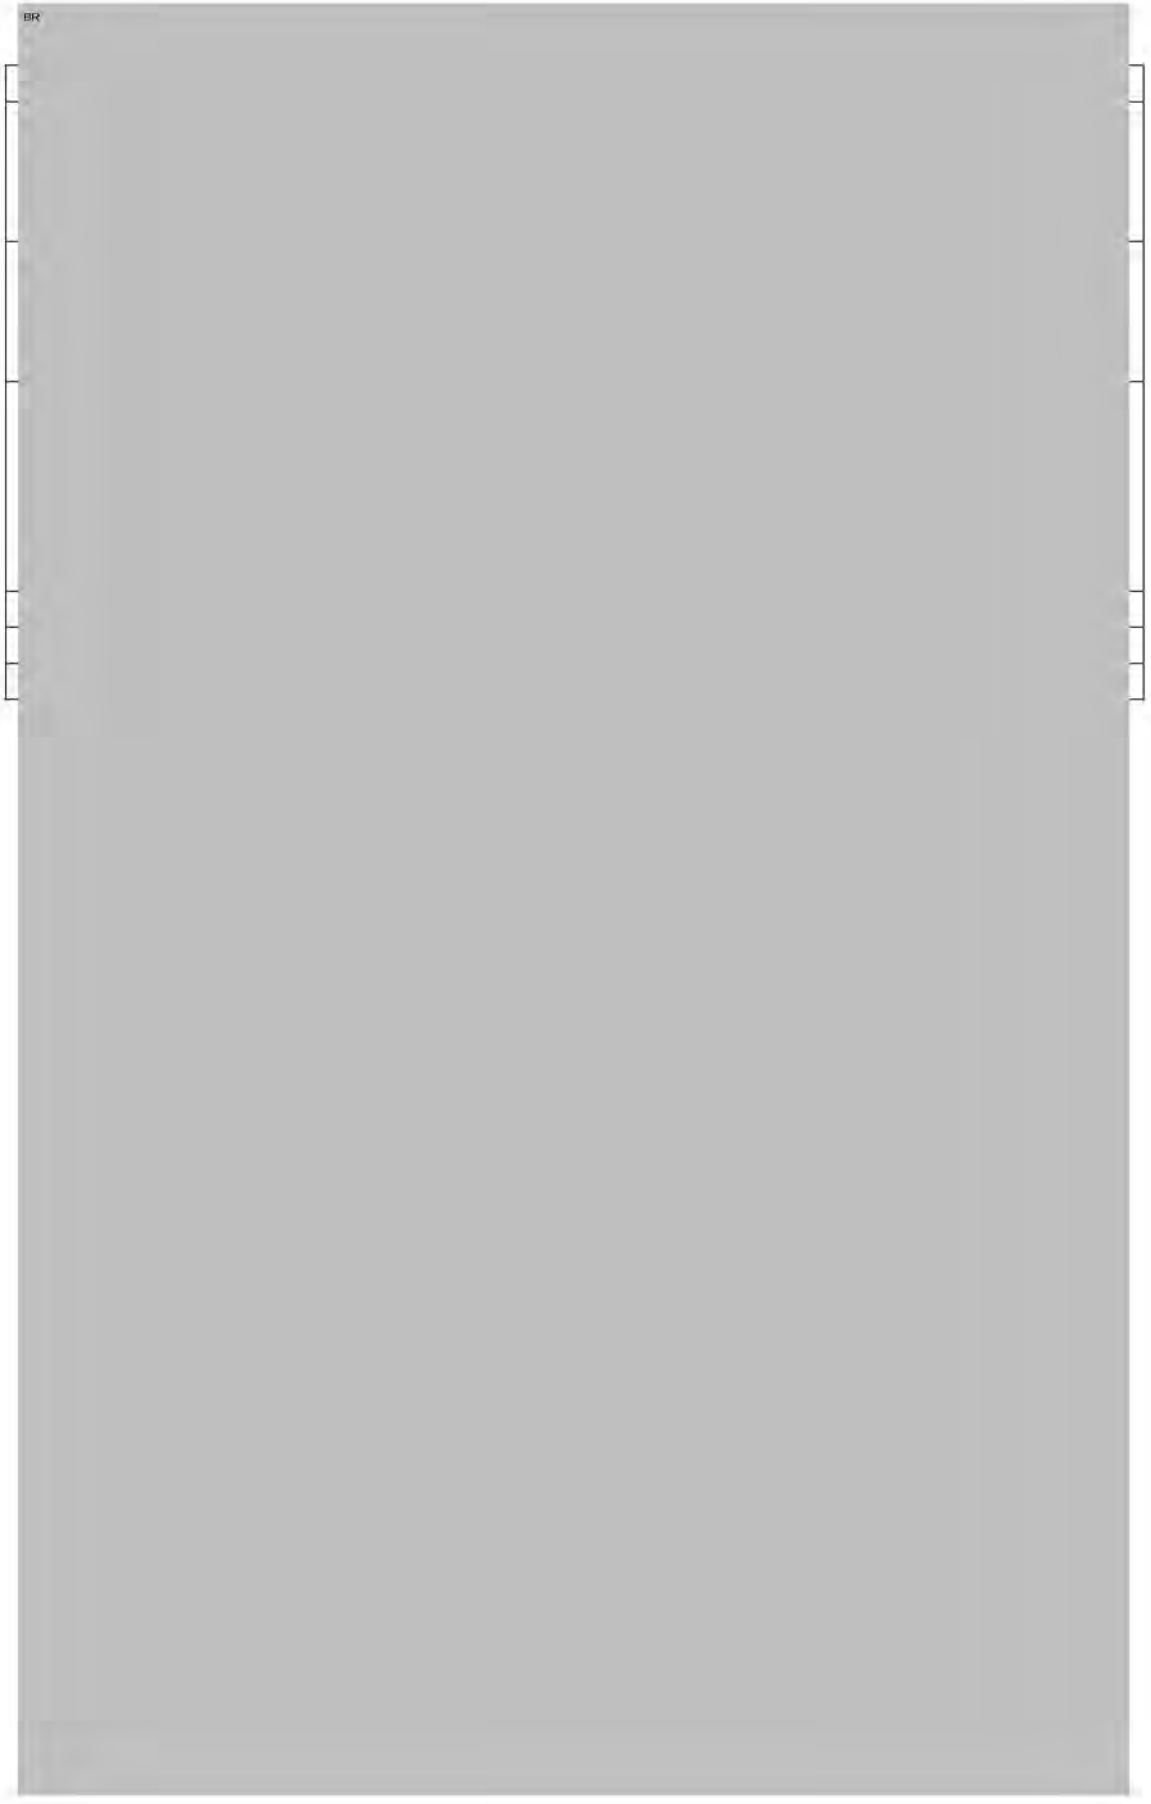

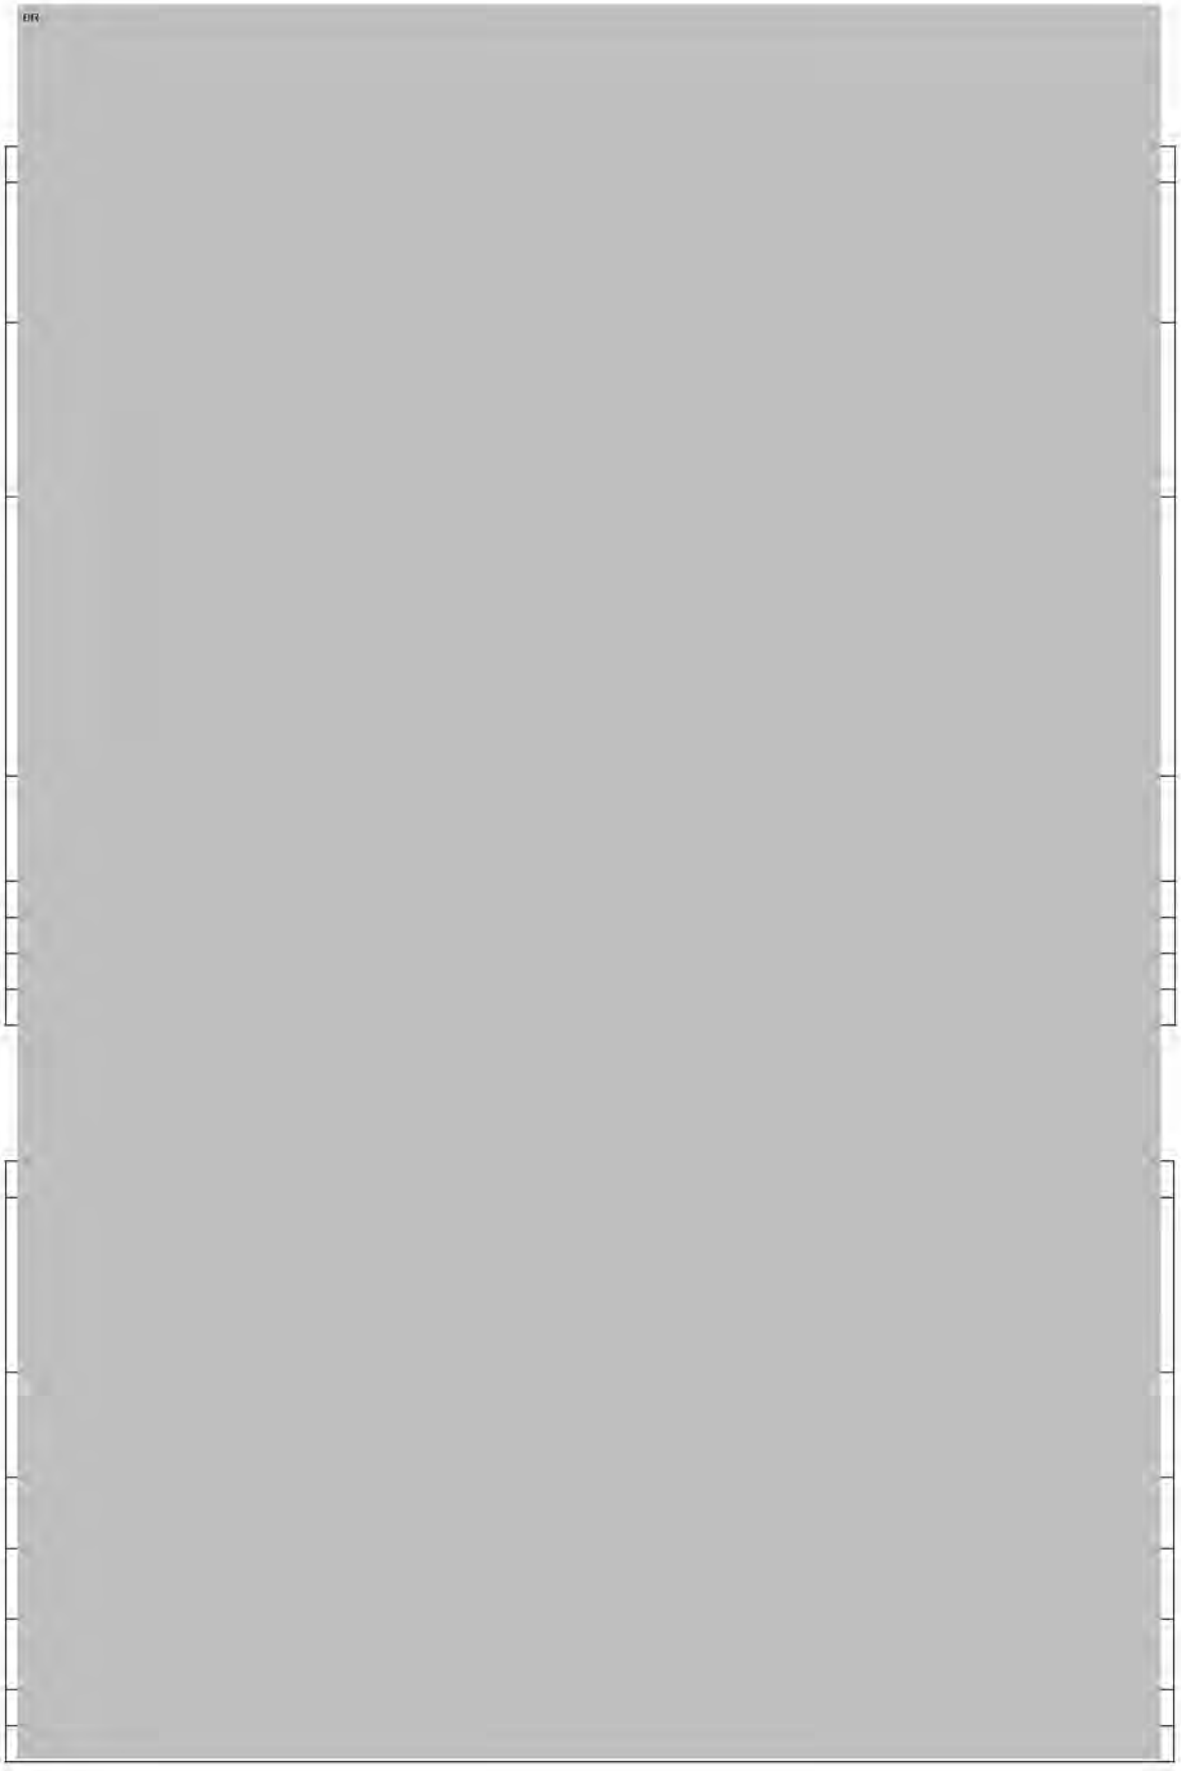

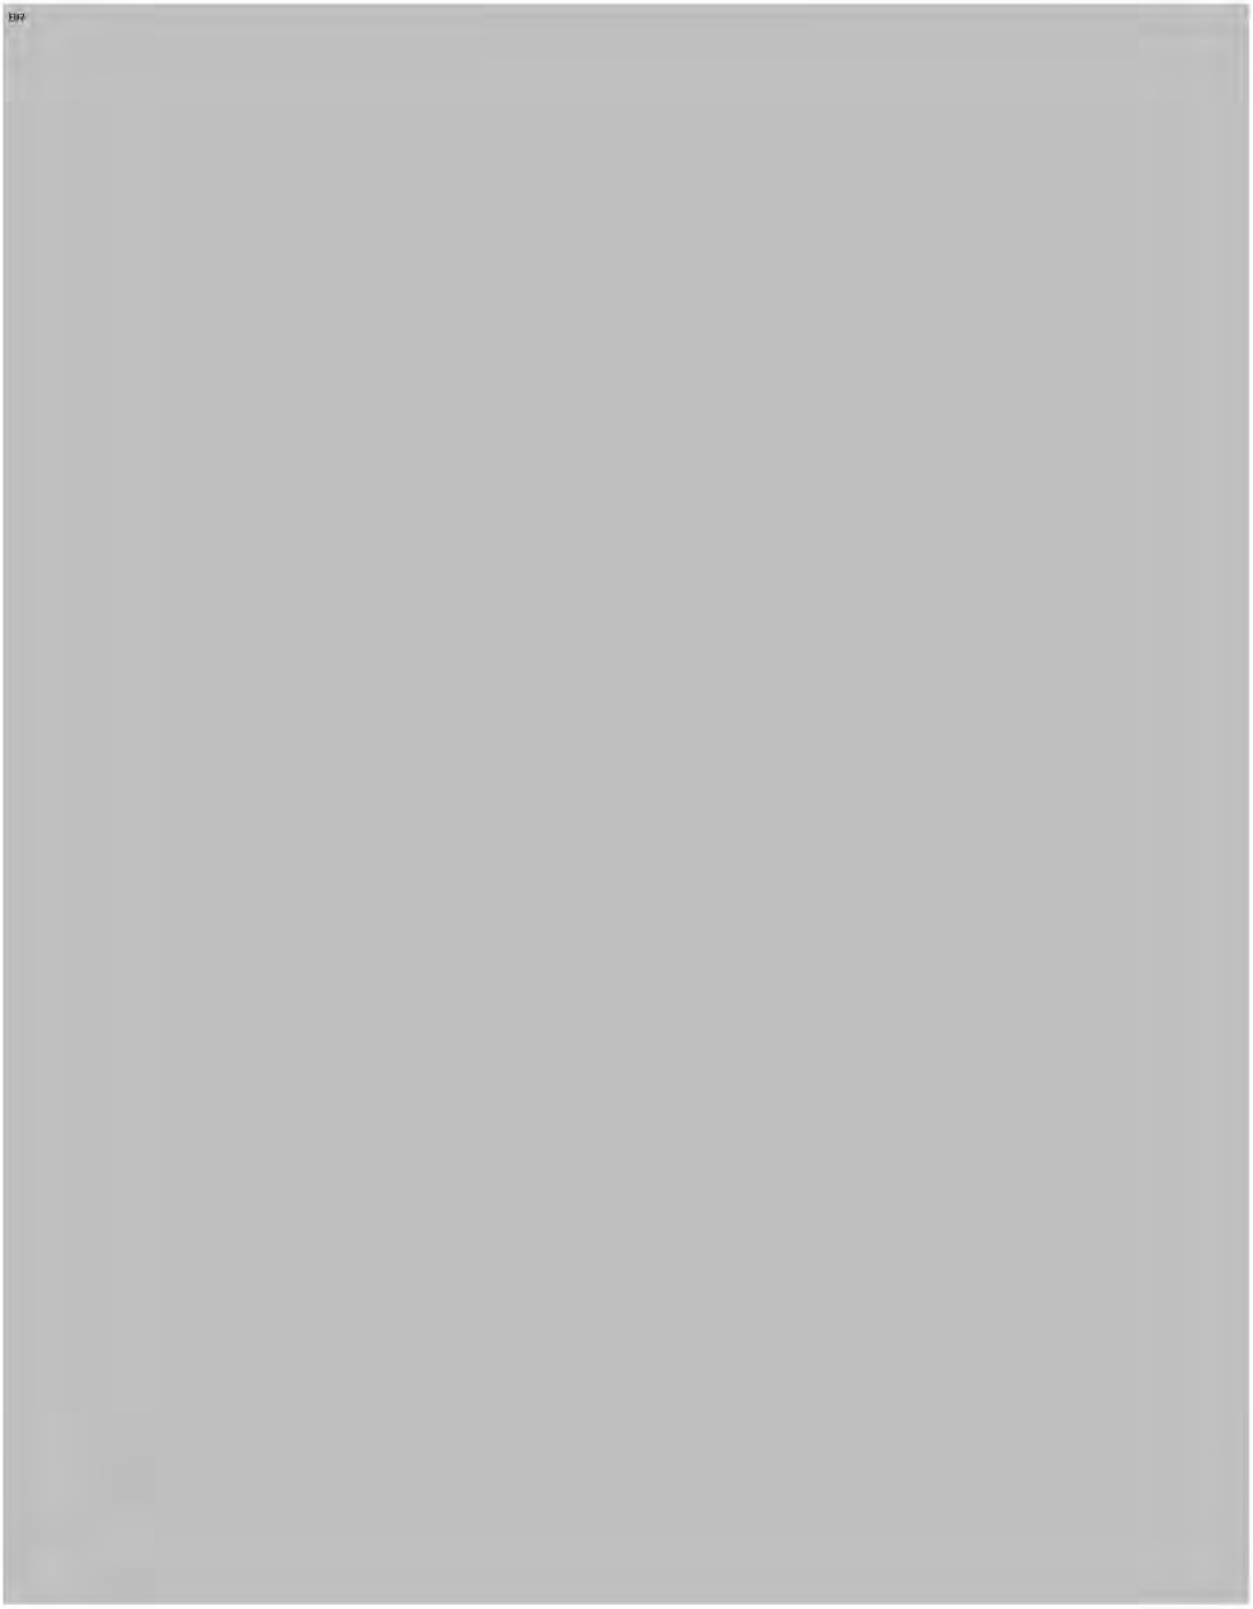

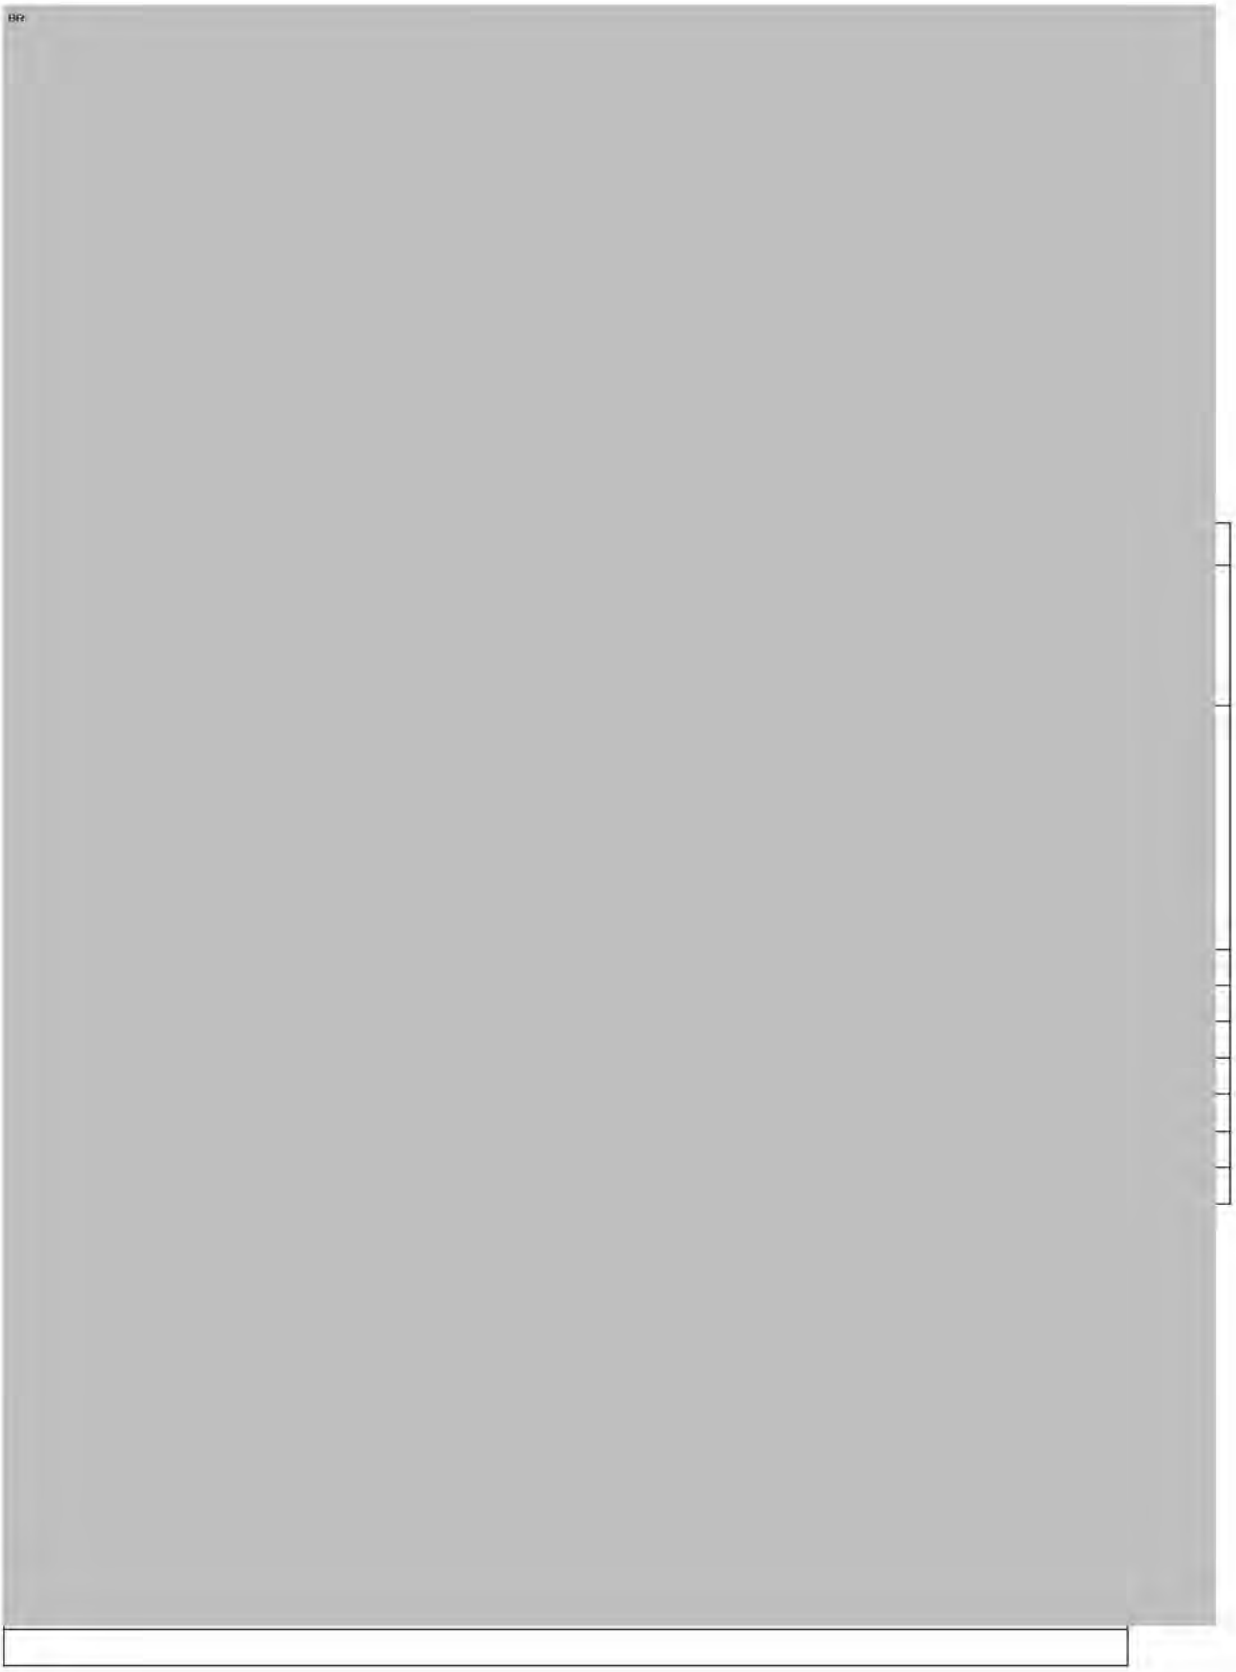

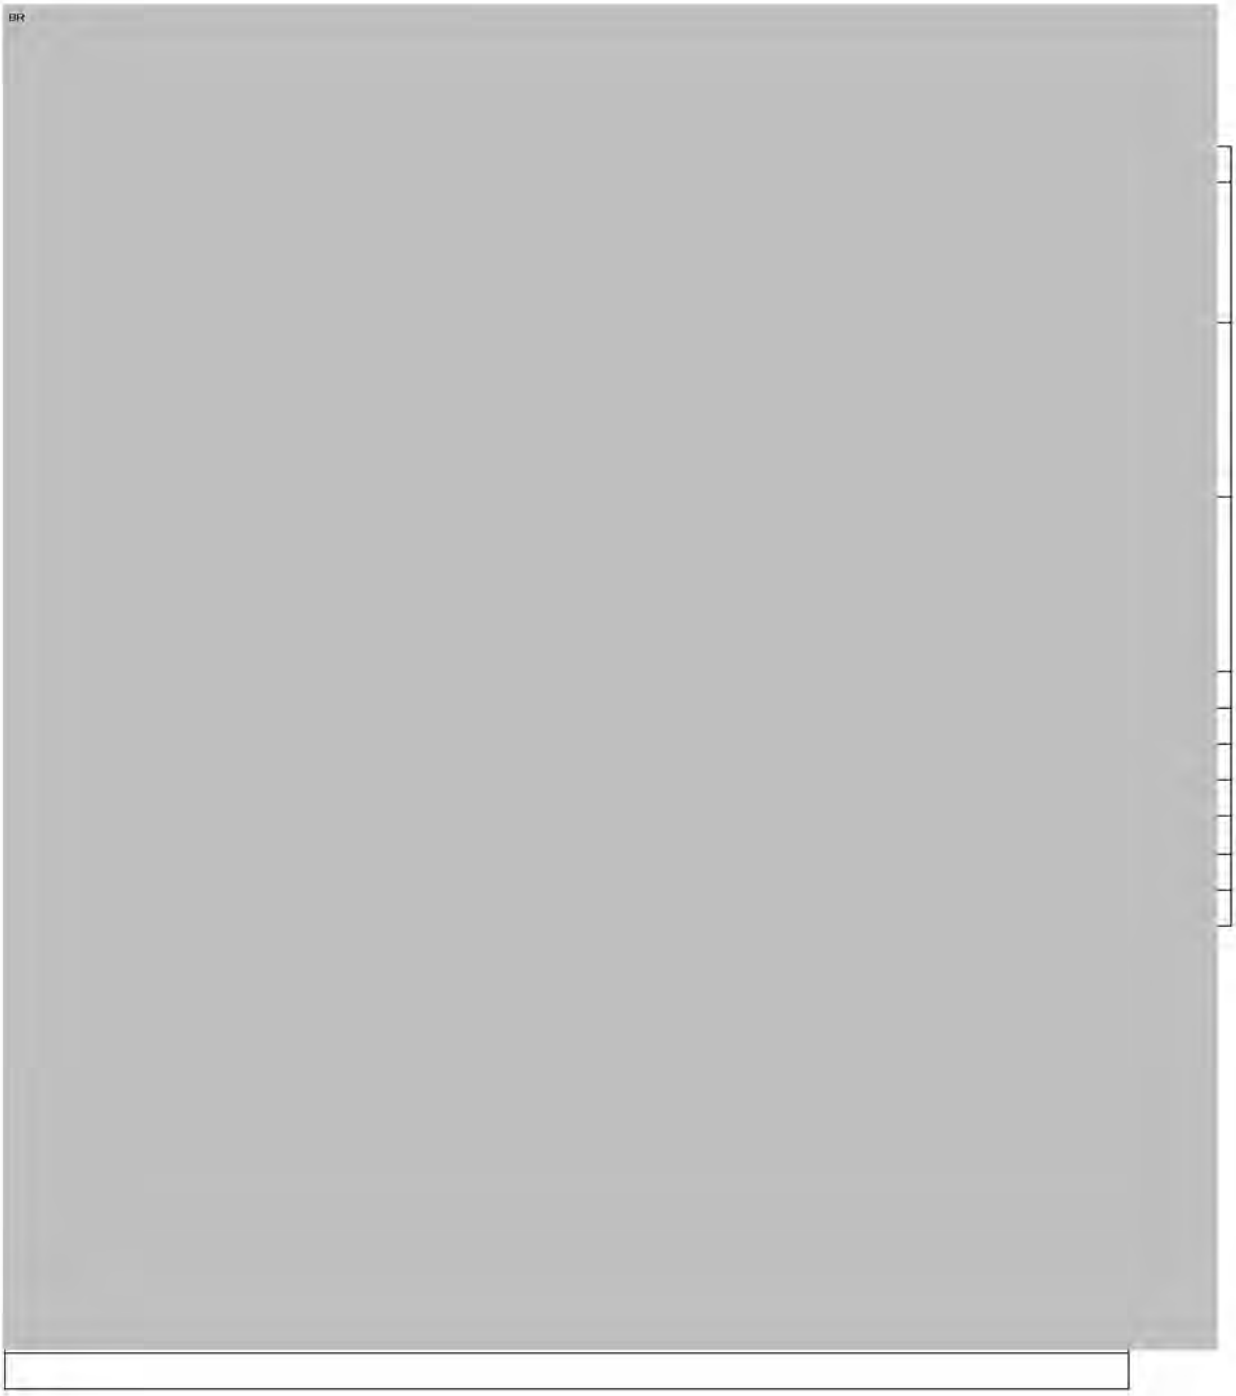
BR

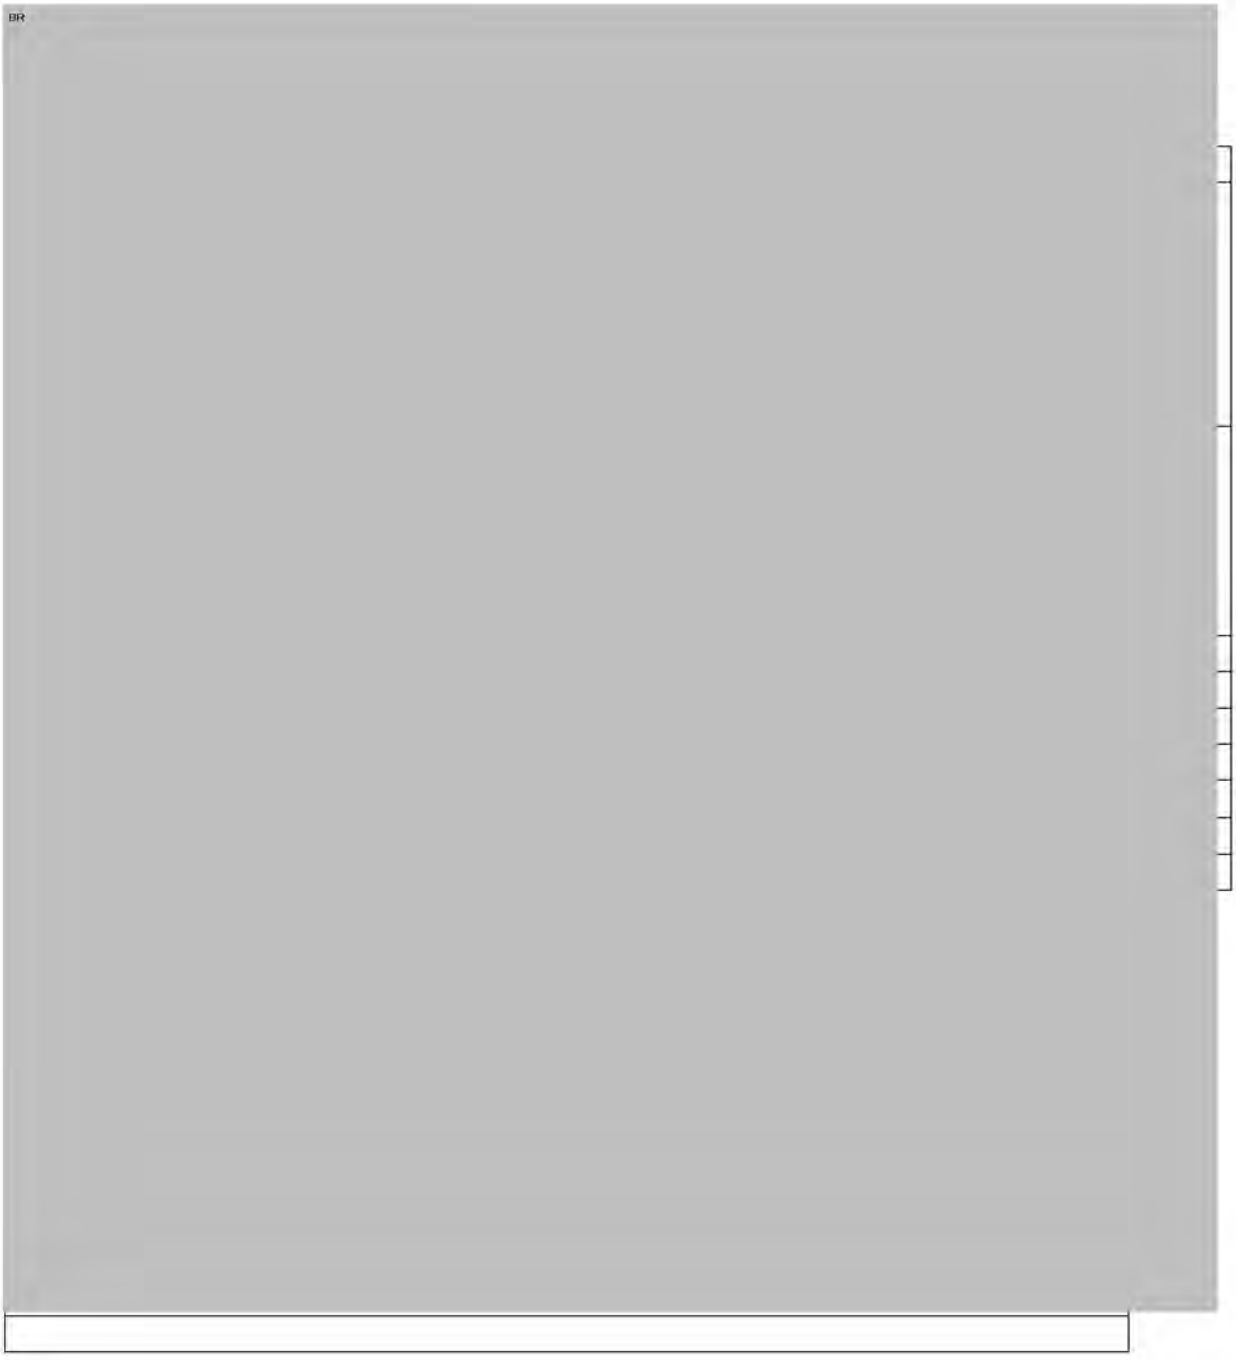
BR

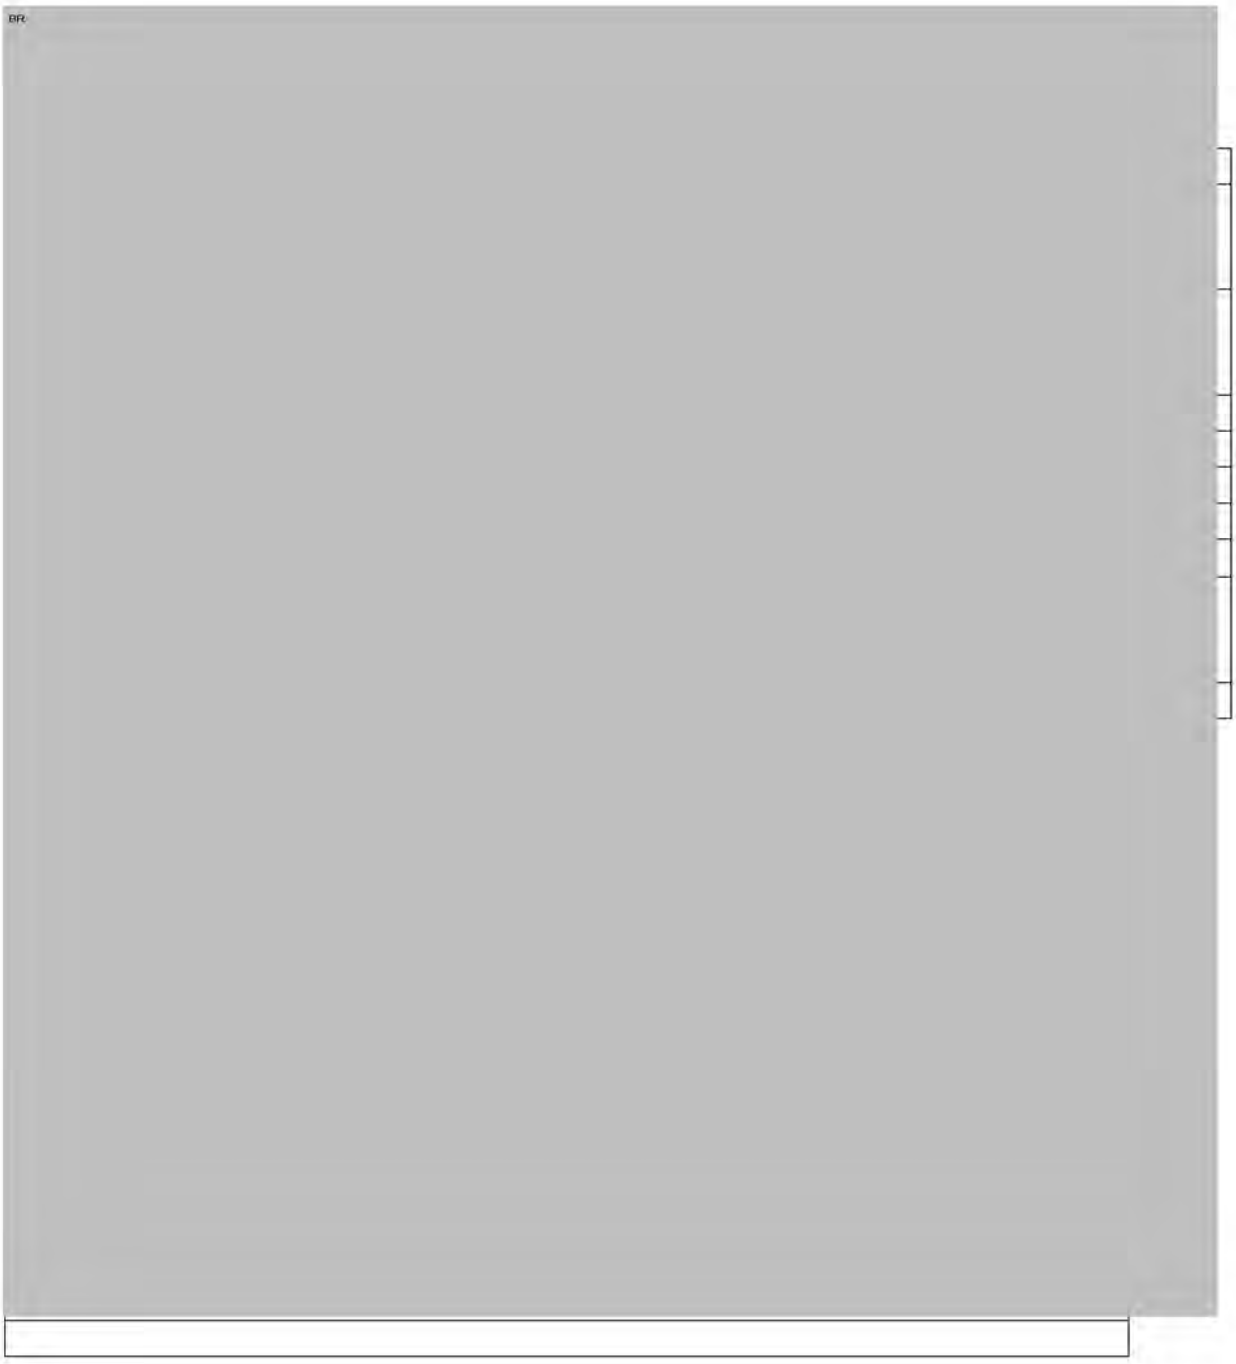

# 4 Overdracht en openstelling

BR

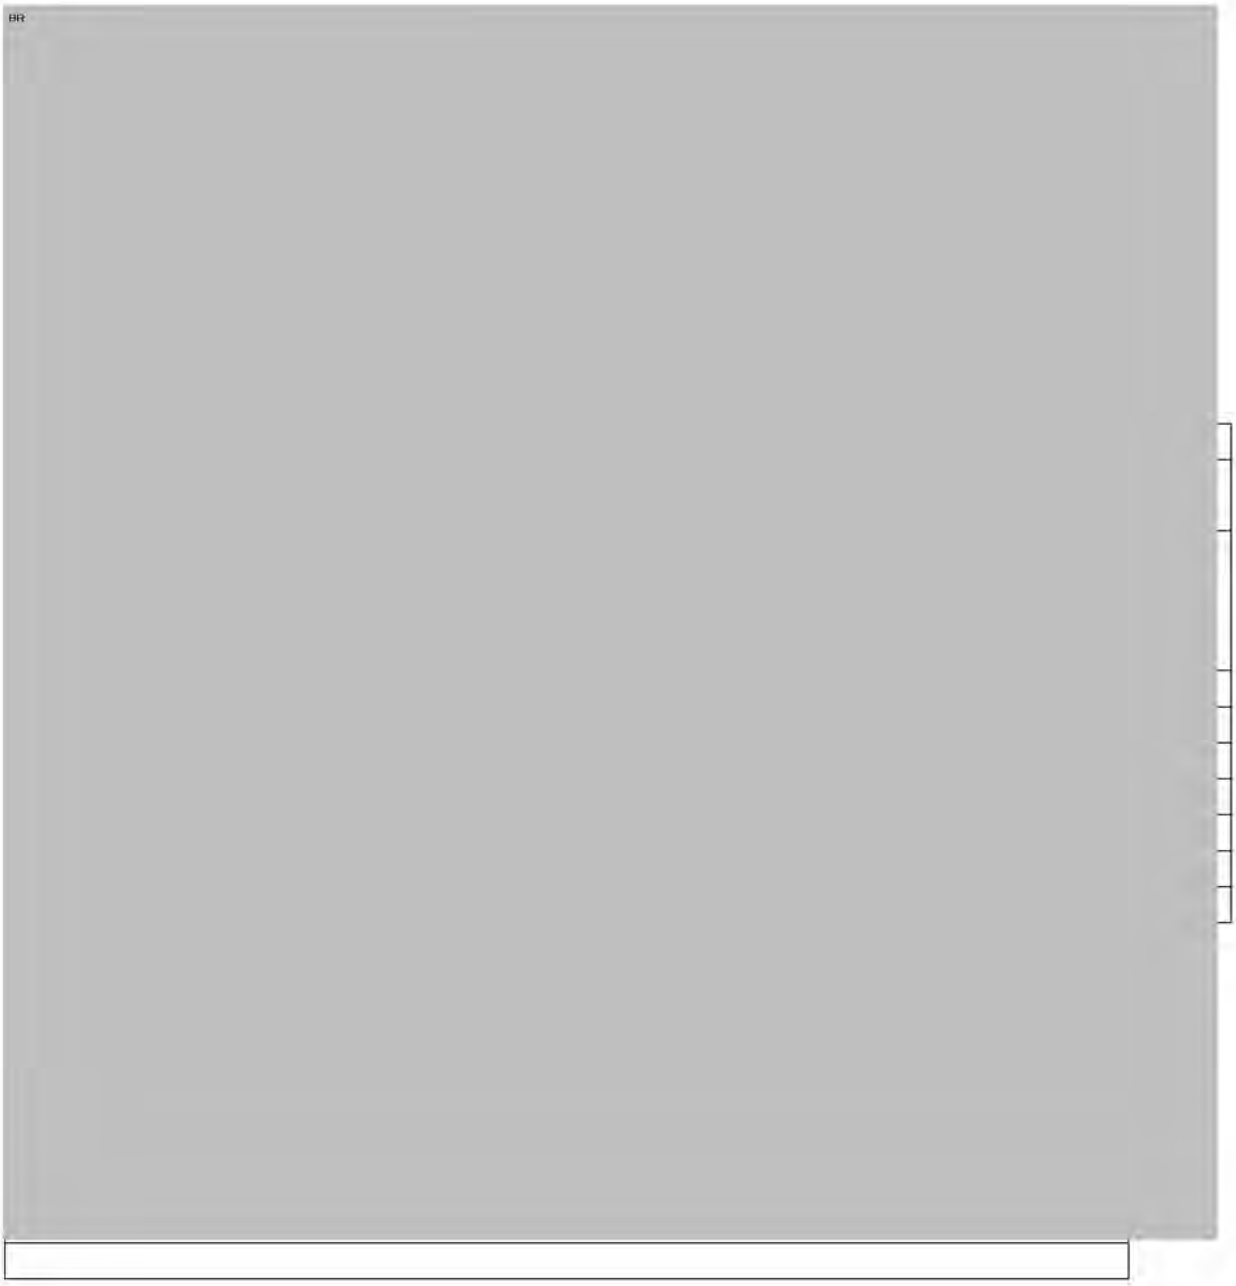
BR

# 5 Projectbeheersing

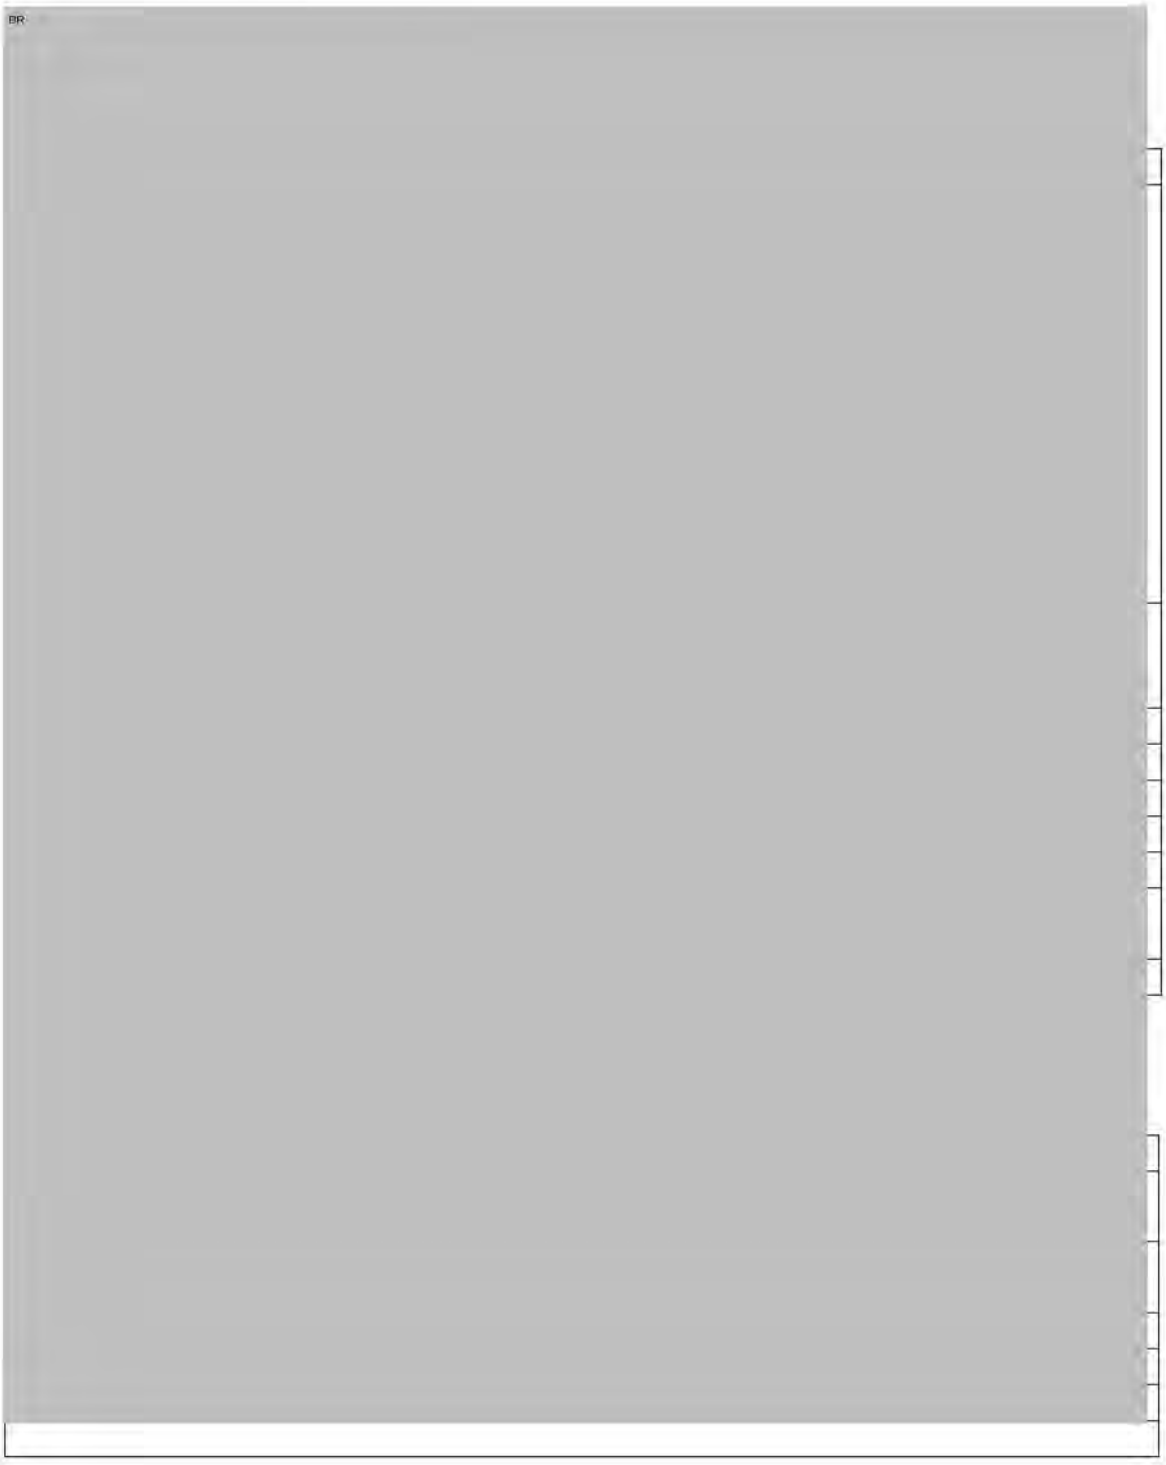

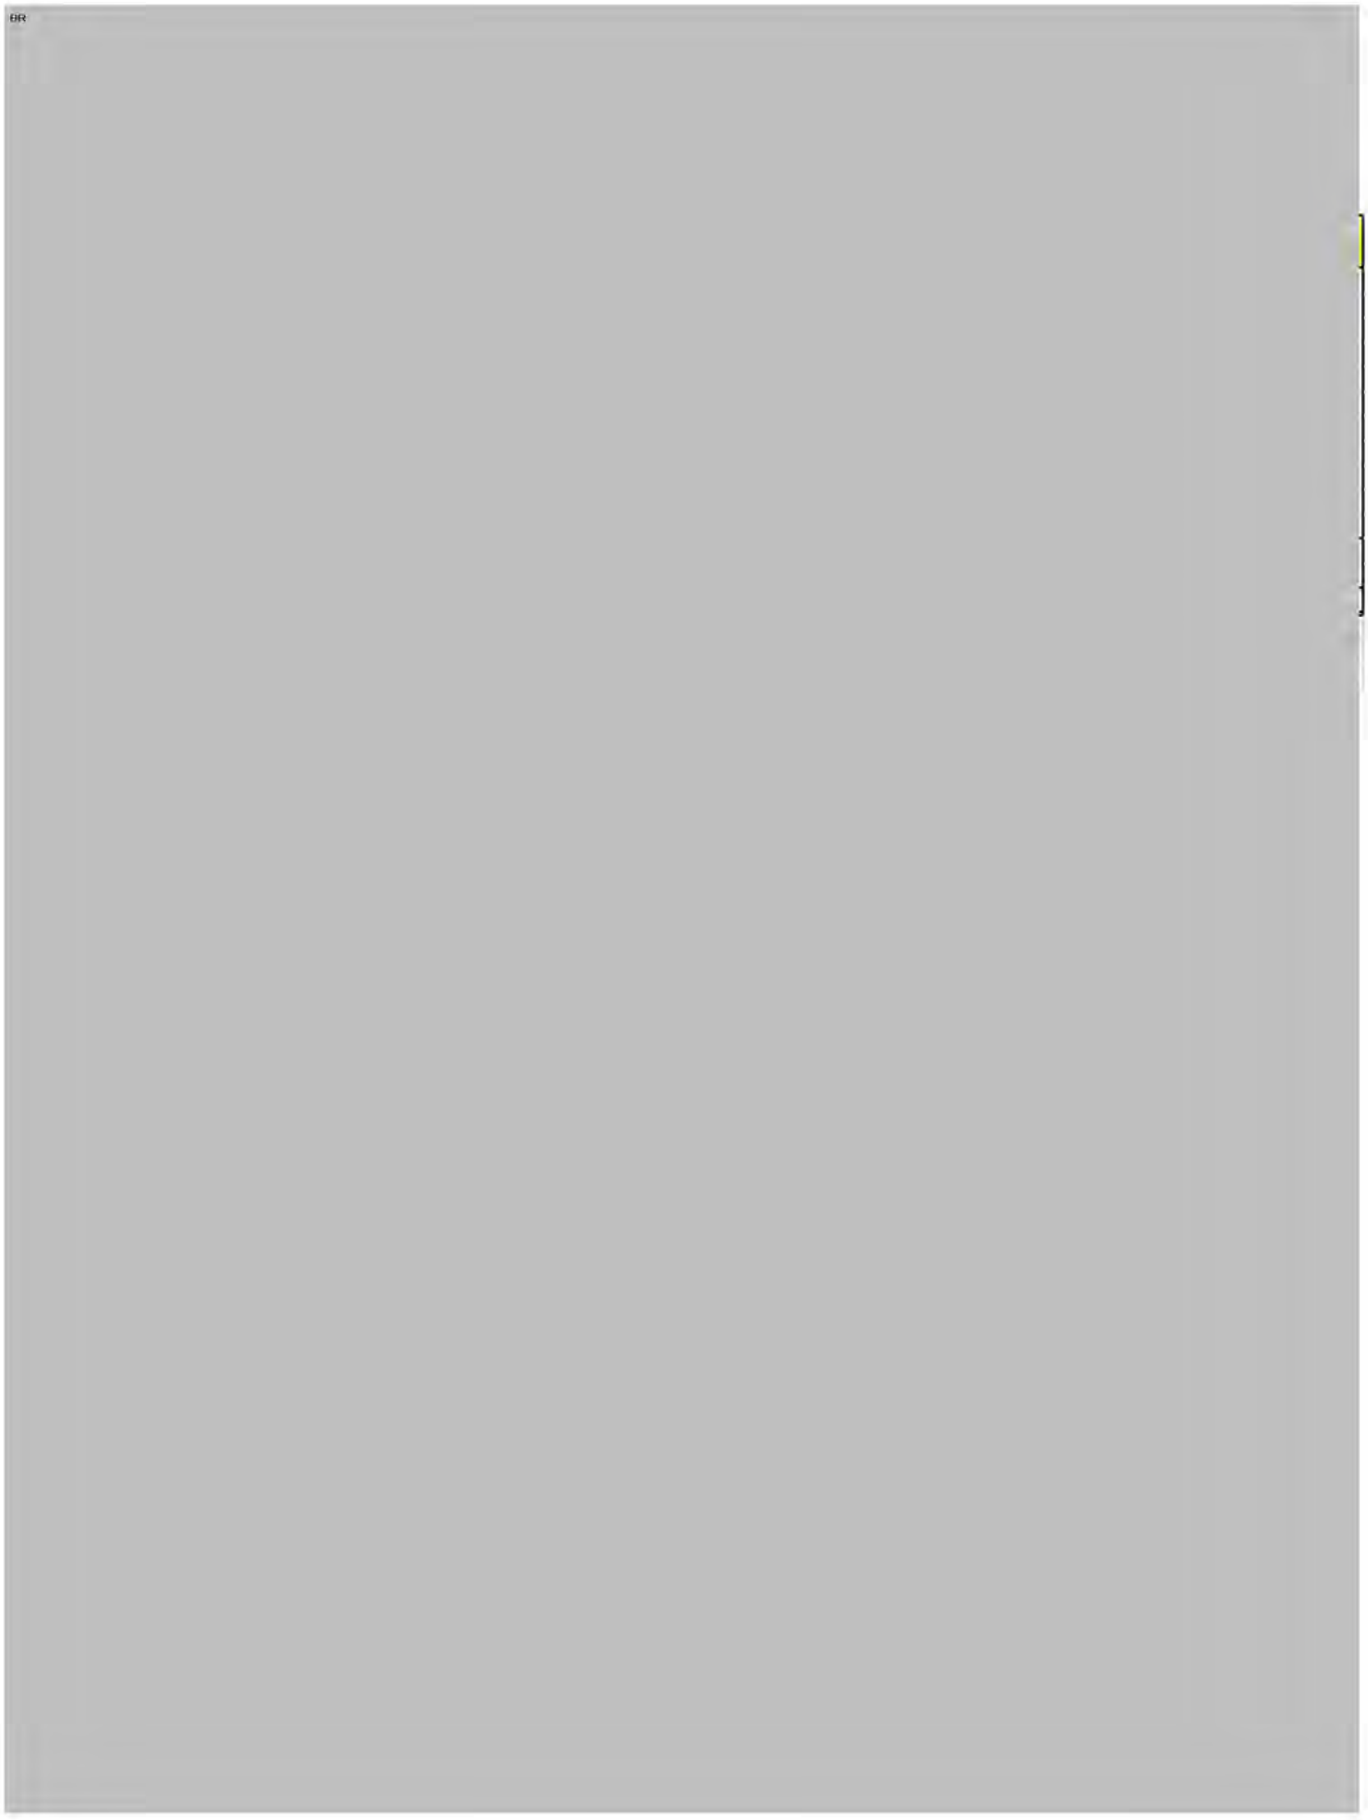

### 5.2.2 Dekkingen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delftland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | **2.725.000** | 2.725.000 |

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland

Er zijn in het eerste kwartaal 2017 geen mutaties geweest. Wel heeft er in het eerste kwartaal 2017 een gesprek plaatsgevonden met de "Landschapstafel". De Landschapstafel is een zelfstandige entiteit welke namens de Provincie Zuid-Holland de financiële bijdragen aan landschappelijke projecten beoordeeld. De Landschapstafel neemt een subsidieaanvraag voor de inrichting van het Molenvlietpark in behandeling en heeft vooralsnog in haar programma een bedrag van € 0,5 mln. ten behoeve van Molenvlietpark gereserveerd.

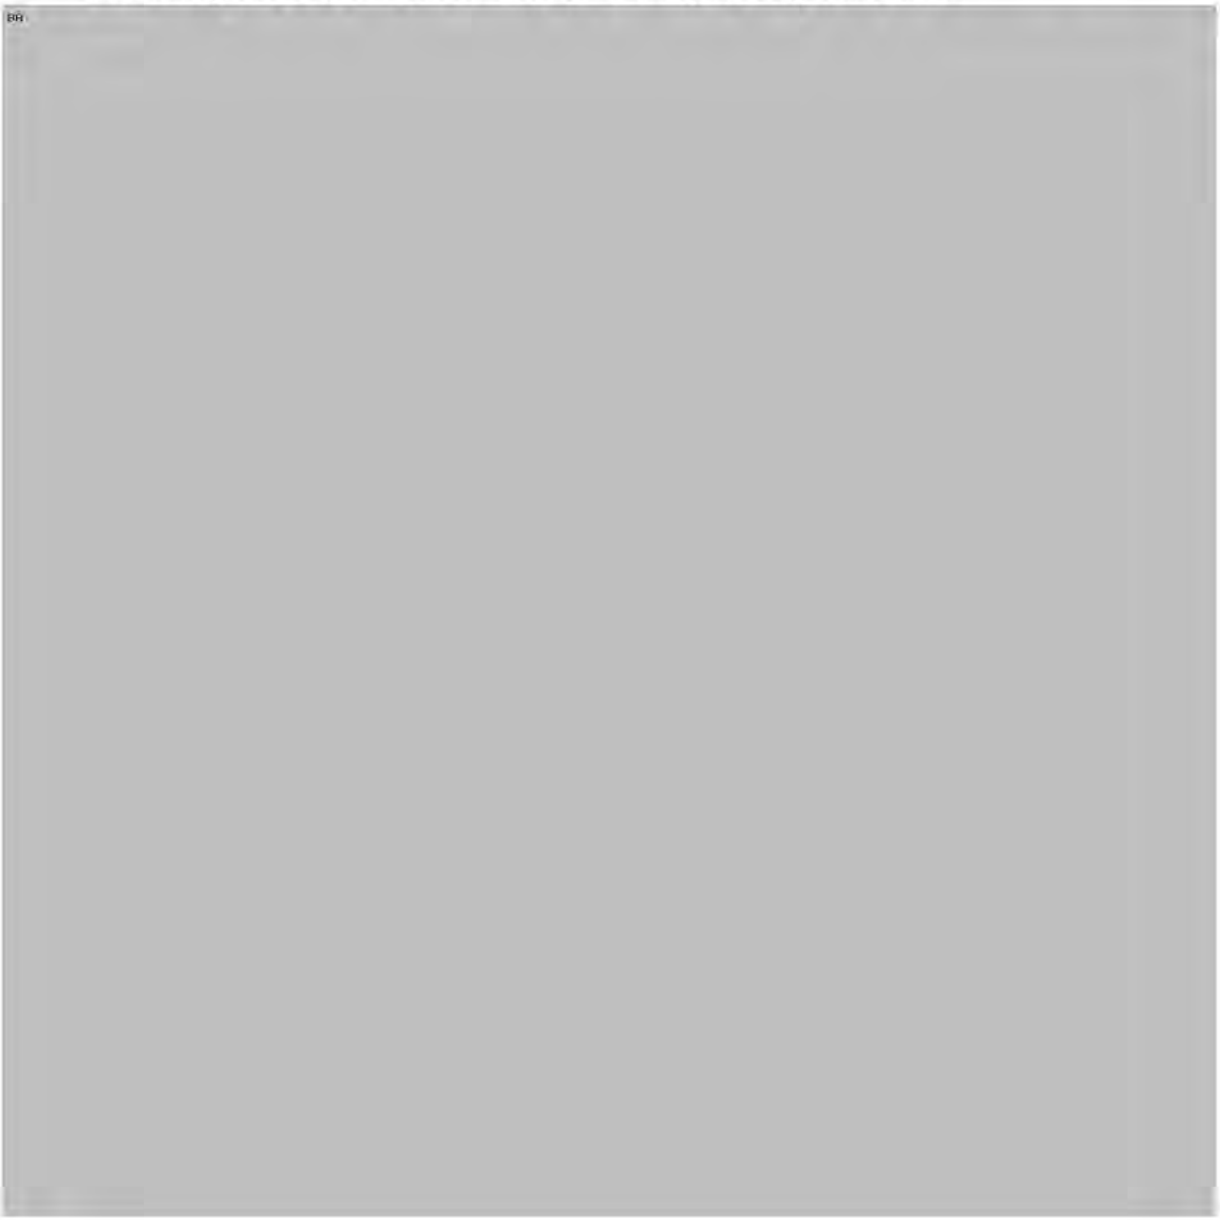

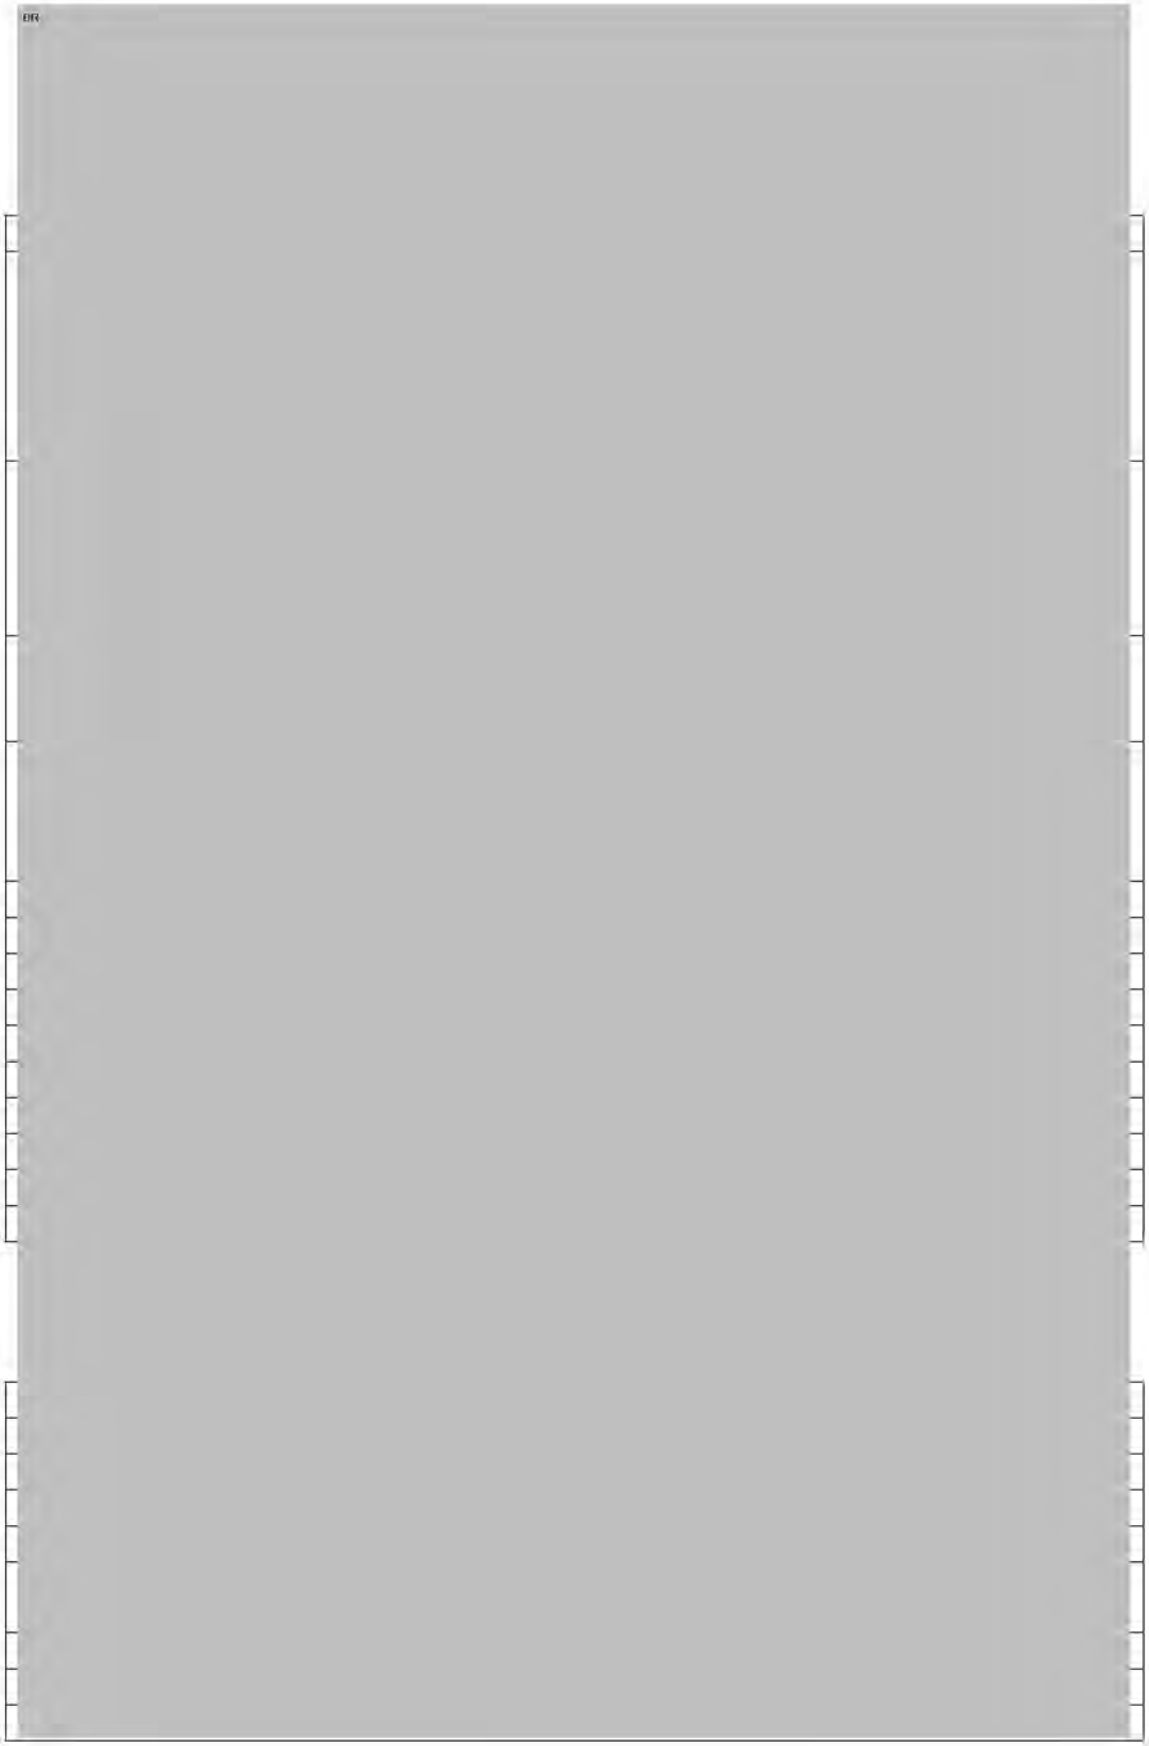

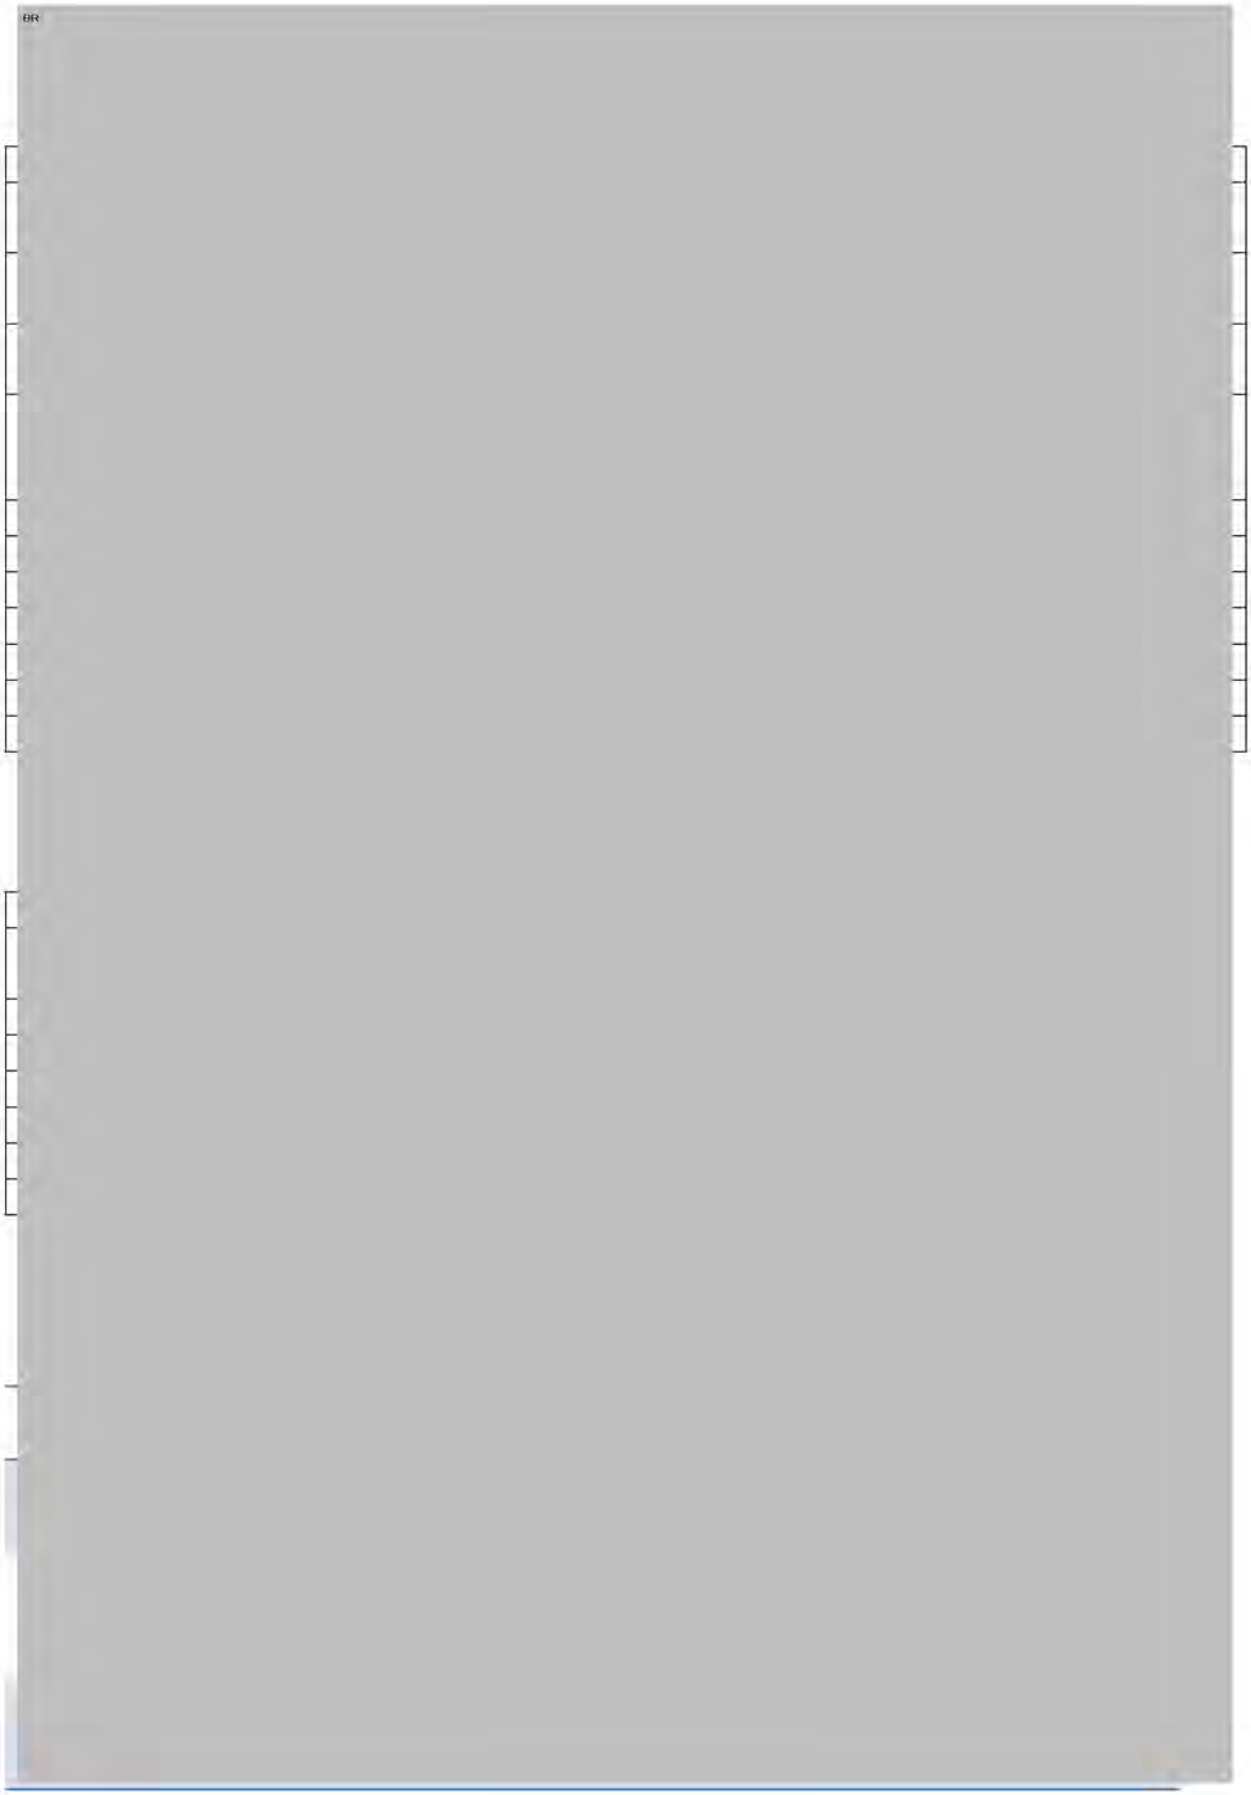

## Buiten de top gevallen risico's:

| Omschrijving | Reden wegvallen uit top | Vorig rang |
|---|---|---|
| **Vastgestelde BP wijzigingen (Binckhorstlaan-zuid, Molenvlietpark) veroorzaken een verzoek tot wijziging van CRB.** | In z'n algemeenheid wordt alert opgetreden en kritisch getoetst op ingediende verzoeken tot wijziging. | 9 |

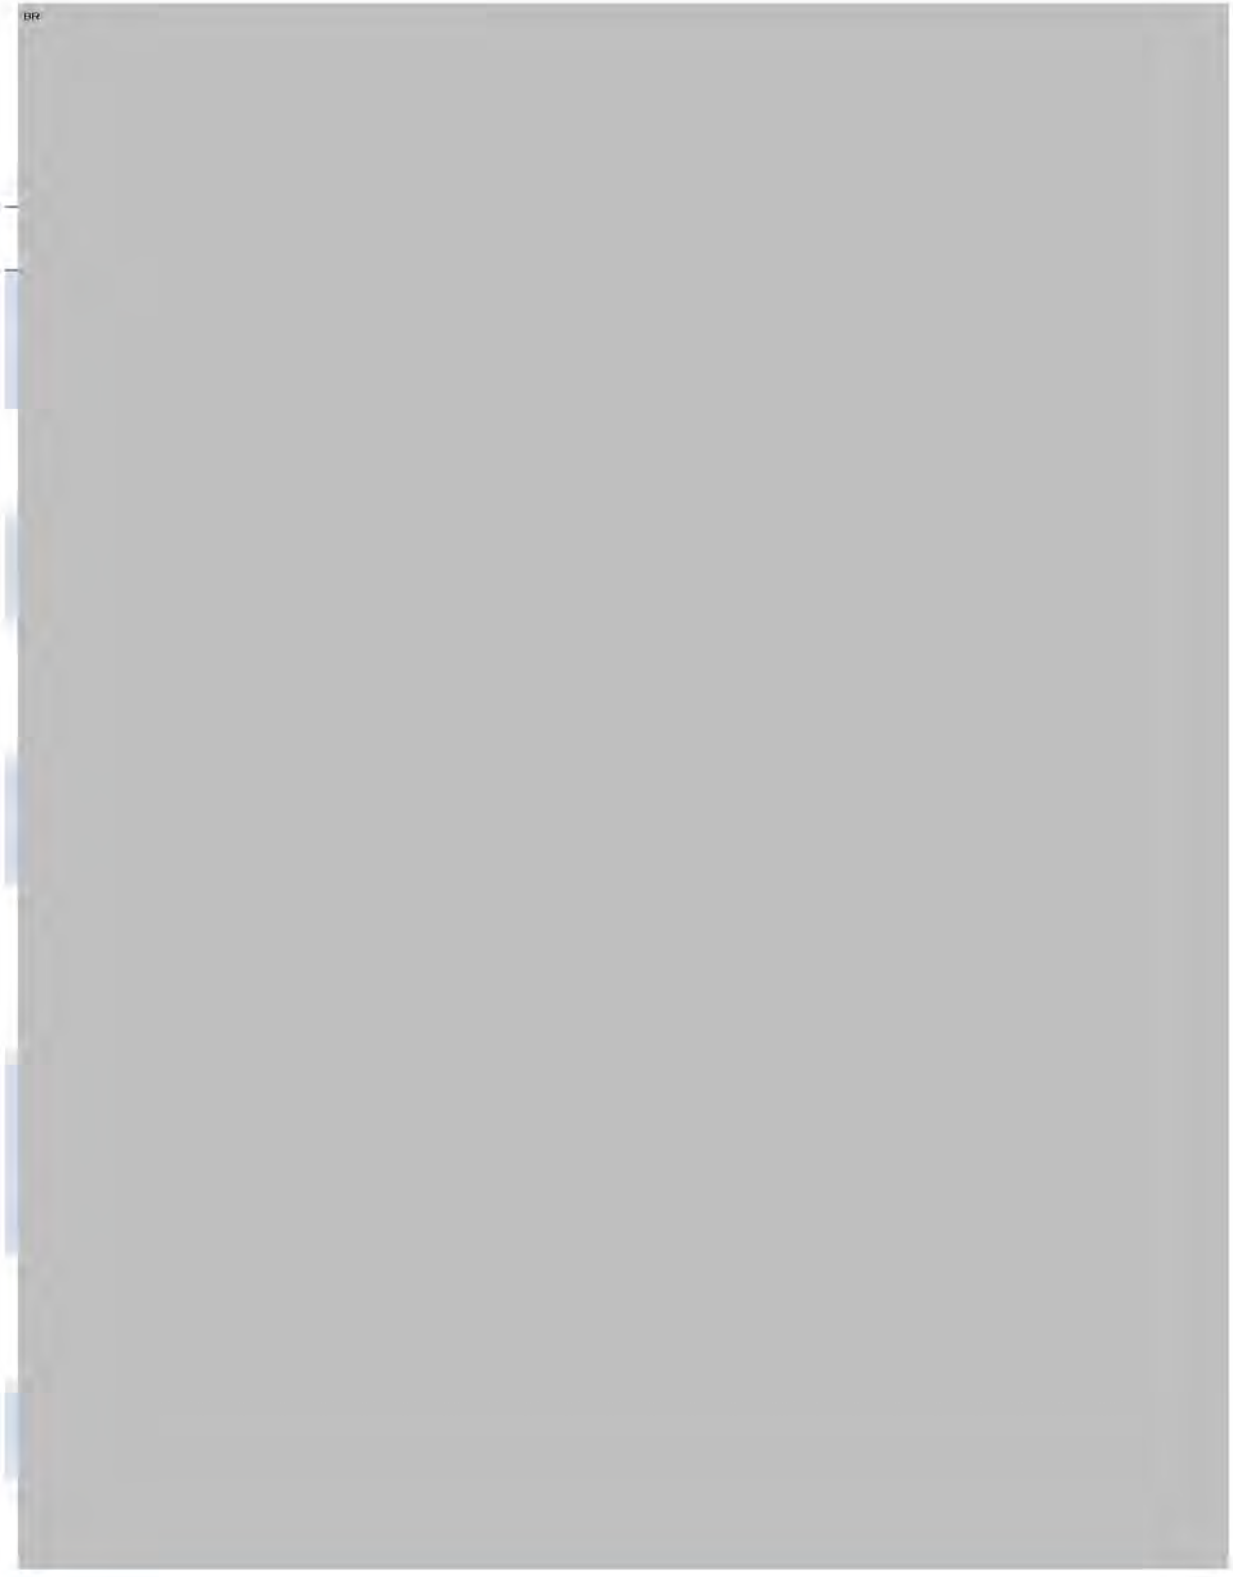

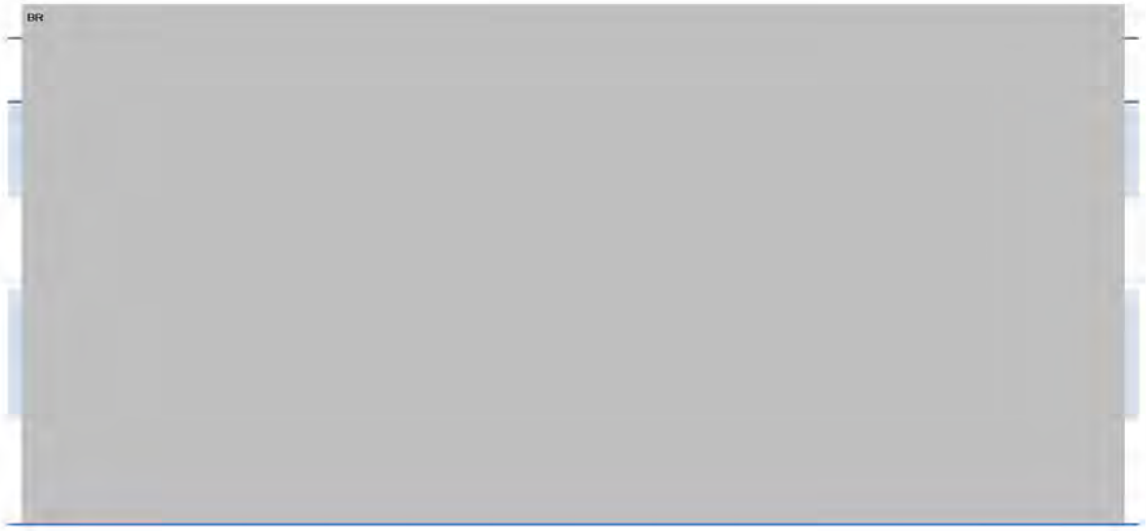
BR

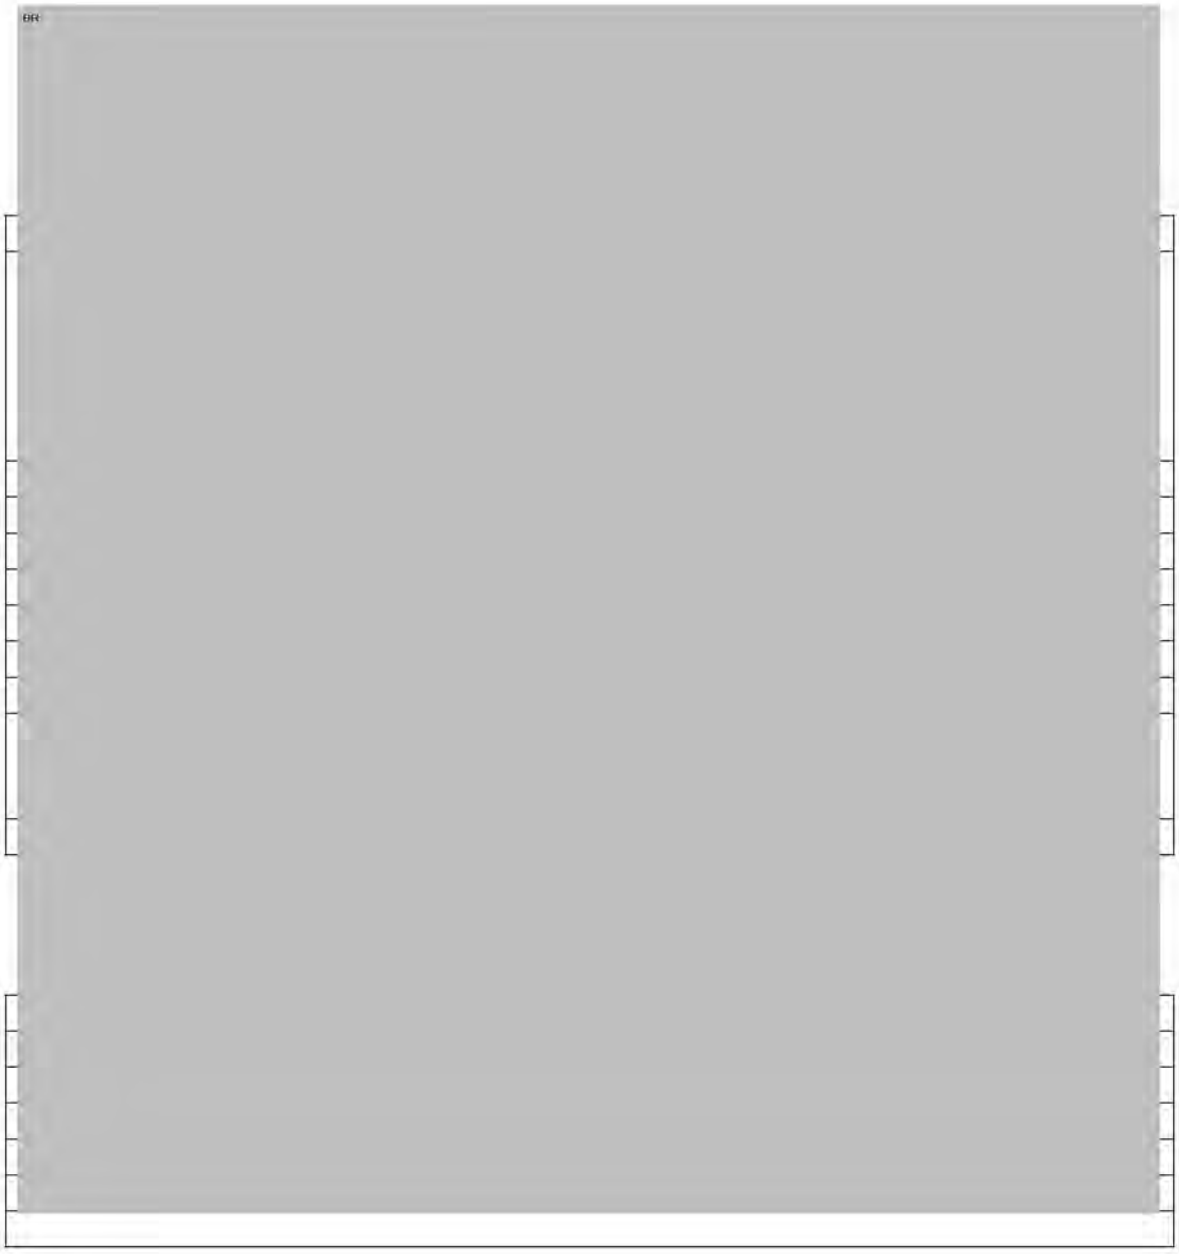

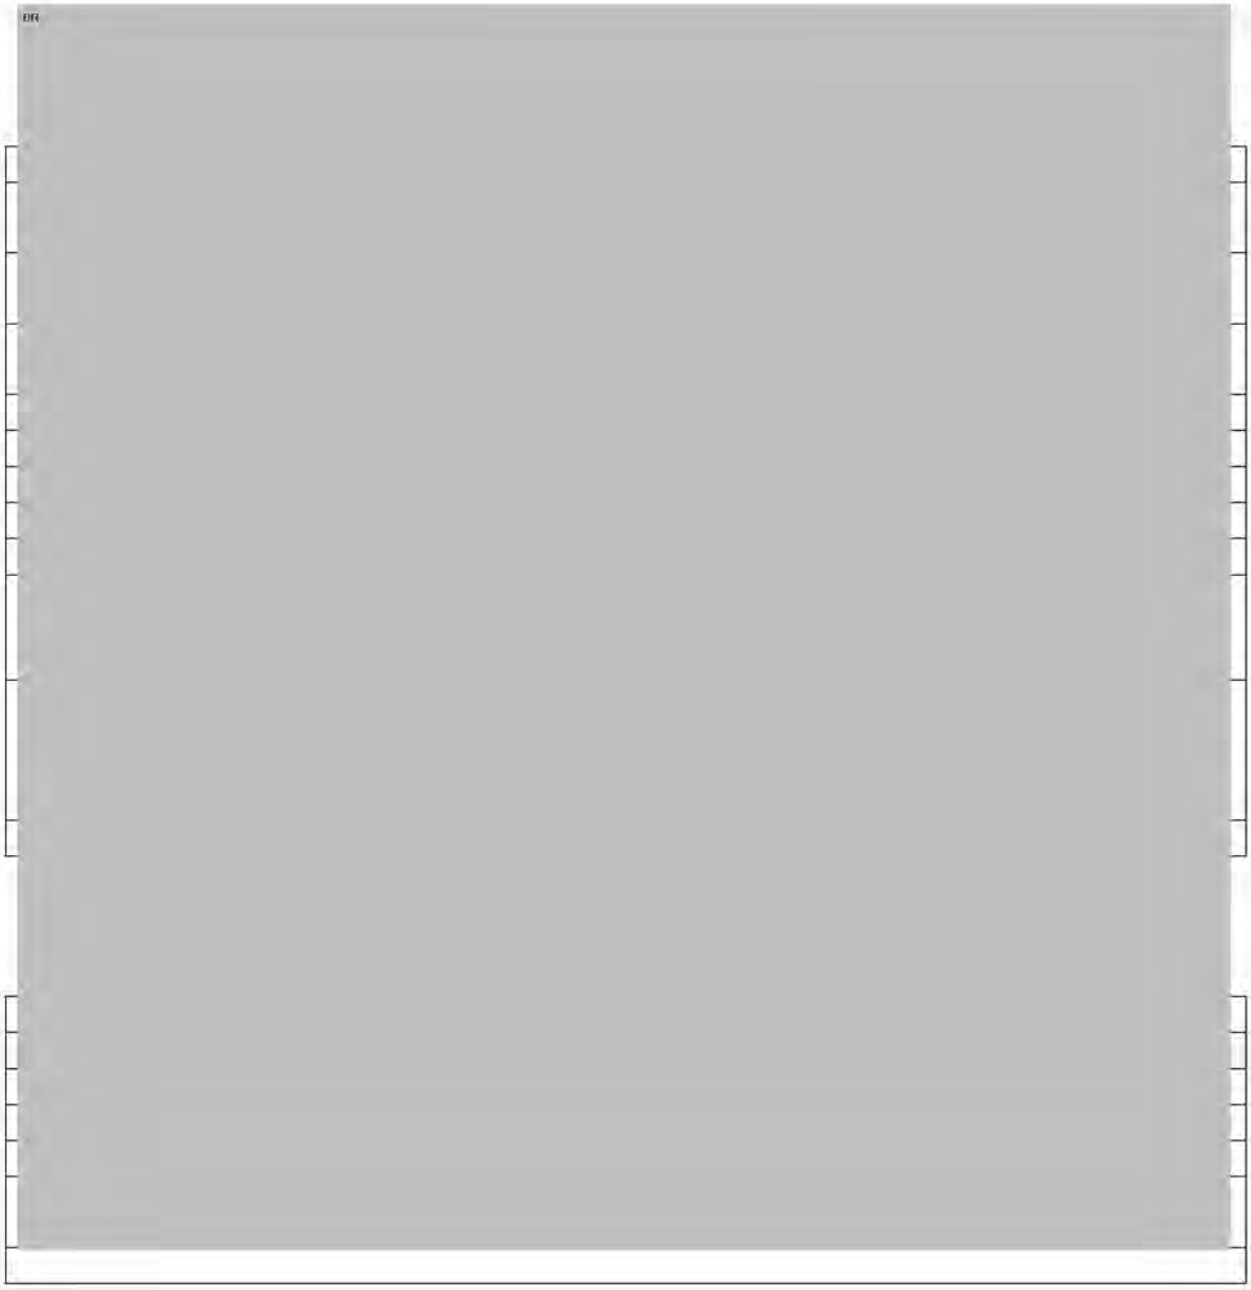

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM REFERENTIE-PLANNING (REVISIE C) | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-PLANNING (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|
| BR | | | | |
| **13** | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 2 | Als gevolg van nadere uitwerking en verlaging boorsnelheid. |
| BR | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen binnen het projectgebied**

5.1.2.e

Docnr14

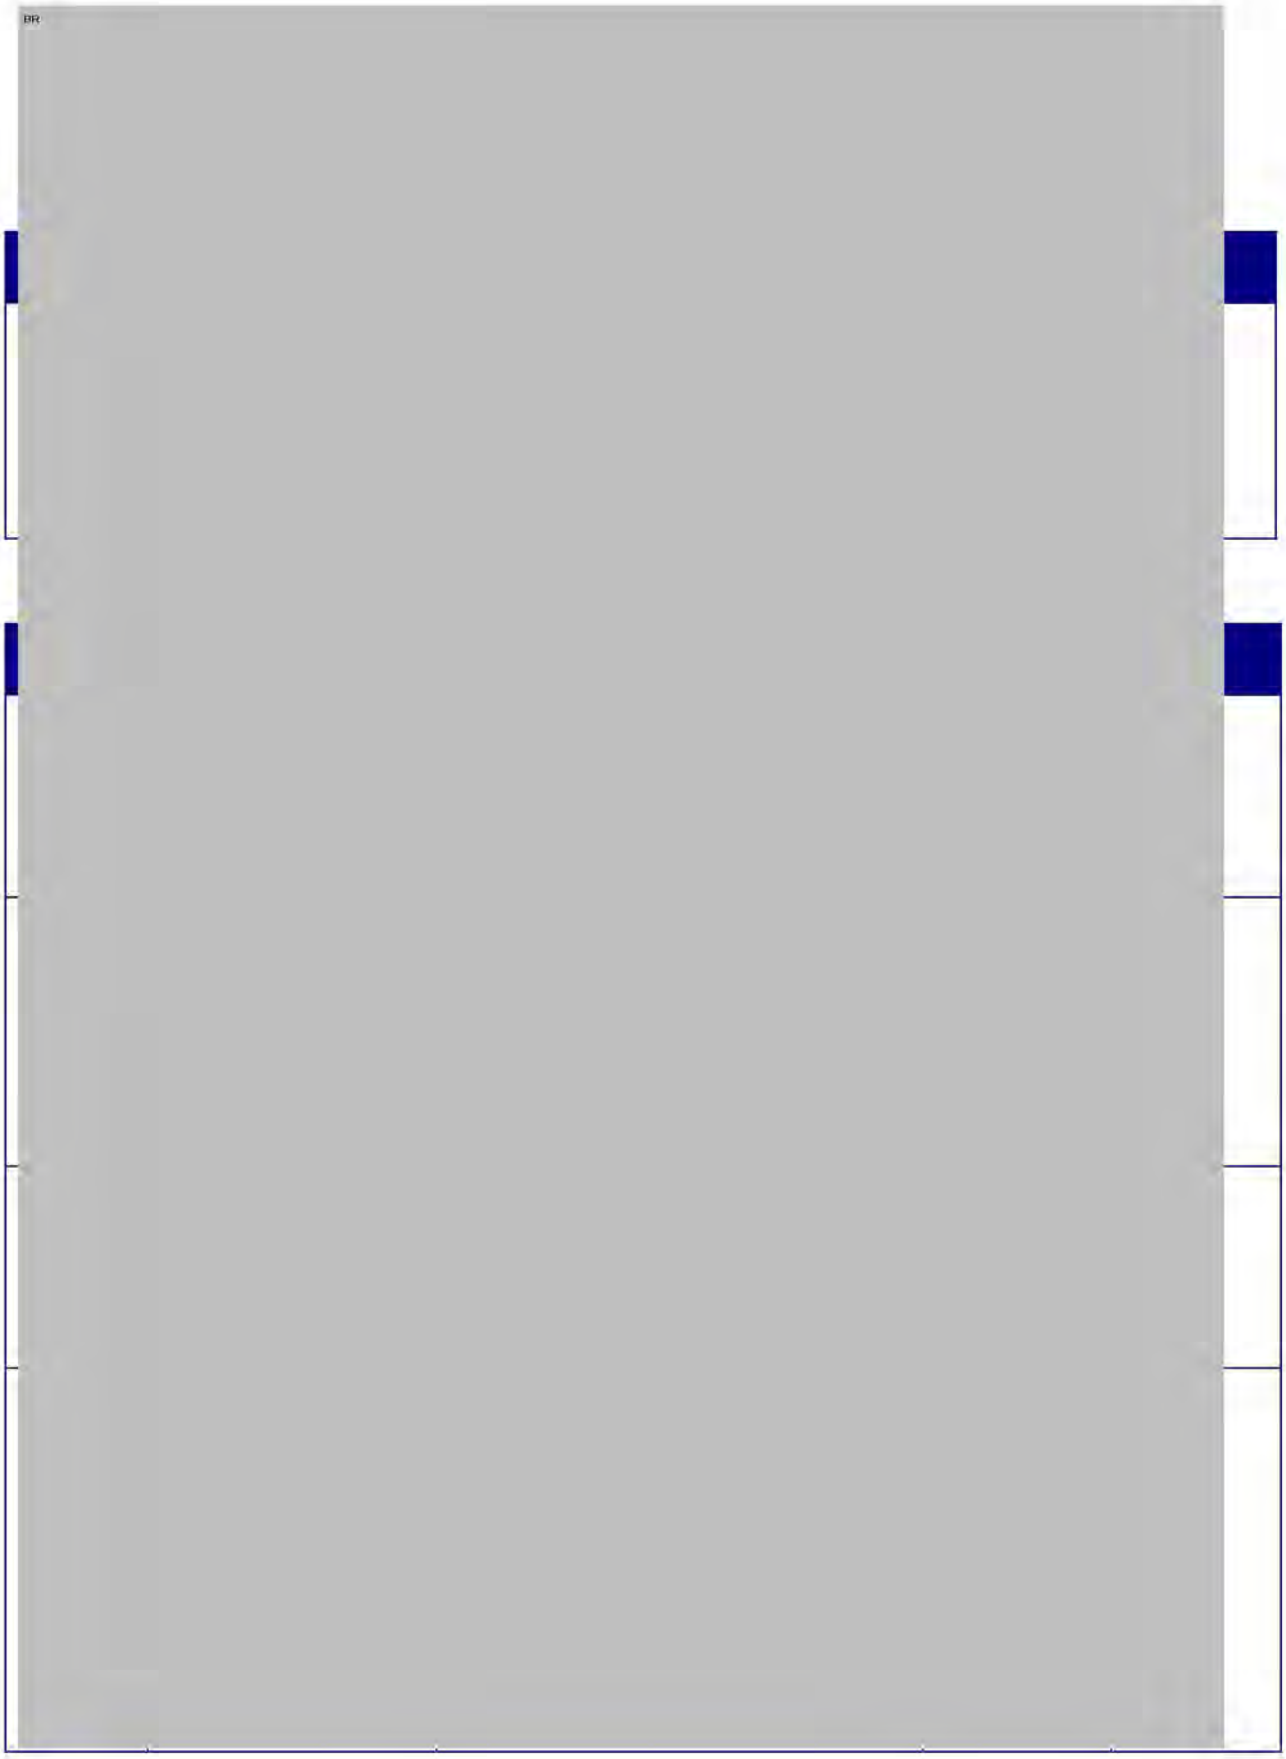

BR

Docnr14



Docnr15

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 2e kwartaal 2017

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 24 augustus 2017**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

Docnr15

Docnr15



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 2e kwartaal 2017
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004400

| **Opgesteld:** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>31 juli 2017 | Versie 1.0<br>2 augustus 2017 | Versie 2.0<br>18 augustus 2017 | Versie 2.0<br>24 augustus 2017 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder BSKB / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

# Inhoudsopgave

1 Managementsamenvatting 5

*1.1 Financien* 7

*1.2 Planning* 7

*1.3 Risico's* 7

*1.4 Bestuurlijke besluitvorming komende periode* 7

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* 8
2.1.1 Afgelopen kwartaal 8
2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie en Vergunningen* 10
2.2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2.2 Komende kwartaal 10

*2.3 Verwervingen* 11
2.3.1 Afgelopen kwartaal 11
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Overeenkomsten* 12
2.4.1 Afgelopen kwartaal 12
2.4.2 Komende kwartaal 12

*2.5 Communicatie* 13
2.5.1 Afgelopen kwartaal 13
2.5.2 Komende kwartaal 14
2.5.3 Diversen 14

3 Projectvoortgang 15

*3.1 Aanbesteden en contracteren* 15
3.1.1 Afgelopen kwartaal 15
3.1.2 Komende kwartaal 15

*3.2 Vormgeving* 16
3.2.1 Afgelopen kwartaal 16
3.2.2 Komende kwartaal 16

*3.3 Monitoring* 17
3.3.1 Afgelopen kwartaal 17
3.3.2 Komende kwartaal 17

*3.4 Inpassing Binckhorst* 18
3.4.1 Afgelopen kwartaal 18
3.4.2 Komende kwartaal 18

*3.5 Inpassing Vlietzone* 20
3.5.1 Afgelopen kwartaal 20
3.5.2 Komende kwartaal 21

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* 23
3.6.1 Afgelopen kwartaal 23
3.6.2 Komende kwartaal 23

*3.7 Boortunnel en toeritten* 26~~25~~
3.7.1 Afgelopen kwartaal 26~~25~~
3.7.2 Komende kwartaal 27~~26~~

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* 28~~27~~
3.8.1 Afgelopen kwartaal 28~~27~~
3.8.2 Komende kwartaal 28~~27~~

*3.9 Installaties* 30~~29~~
3.9.1 Afgelopen kwartaal 30~~29~~
3.9.2 Komende kwartaal 30~~29~~

*3.10 Veiligheid en gezondheid* 31~~30~~
3.10.1 Afgelopen kwartaal 31~~30~~
3.10.2 Komende kwartaal 31~~30~~

*3.11 Uitvoeringskwaliteit* 32~~31~~
3.11.1 Afgelopen kwartaal 32~~31~~
3.11.2 Komende kwartaal 32~~31~~

*3.12 Contractmanagement* 33~~32~~
3.12.1 Afgelopen kwartaal 33~~32~~
3.12.2 Komende kwartaal 33~~32~~

4 Overdracht en openstelling 34~~33~~

*4.1 Tunnelveiligheid* 34~~33~~
4.1.1 Afgelopen kwartaal 34~~33~~
4.1.2 Komende kwartaal 34~~33~~

*4.2 Overdracht aan beheerders* 35~~34~~
4.2.1 Afgelopen kwartaal 35~~34~~
4.2.2 Komende kwartaal 35~~34~~

*4.3 Beheer en onderhoud* 36~~35~~
4.3.1 Afgelopen kwartaal 36~~35~~
4.3.2 Komende kwartaal 36~~35~~

5 Projectbeheersing 37~~36~~

*5.1 Scope* 37~~36~~
5.1.1 Afgelopen kwartaal 37~~36~~
5.1.2 Komende kwartaal 37~~36~~

*5.2 Financien* 38~~37~~
5.2.1 Kostenstructuur 38~~37~~
5.2.2 Dekkingen 39~~38~~

*5.3 Planning* 41~~40~~
5.3.1 Afgelopen kwartaal 41~~40~~
5.3.2 Komende kwartaal 41~~40~~

*5.4 Risico's* 42~~41~~
5.4.1 Afgelopen kwartaal 42~~41~~
5.4.2 Komende kwartaal 42~~41~~
5.4.3 Financiële toprisico's 42~~41~~
5.4.4 Toprisico's planning 43~~42~~

*5.5 Interne kwaliteit* 45~~44~~

5.5.1 Afgelopen kwartaal 4544
5.5.2 Komende kwartaal 4544

*5.6 Informatiebeheer* 4645
5.6.1 Afgelopen kwartaal 4645
5.6.2 Komende kwartaal 4645

*5.7 Organisatie* 4746
5.7.1 Afgelopen kwartaal 4746
5.7.2 Komende kwartaal 4746

6 Bijlage: Uitvoeringsmijlpalen 4847

7 Bijlage: Contractmijlpalen en Trendanalyse 4948

8 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 5251

9 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 5453

# 1 Managementsamenvatting

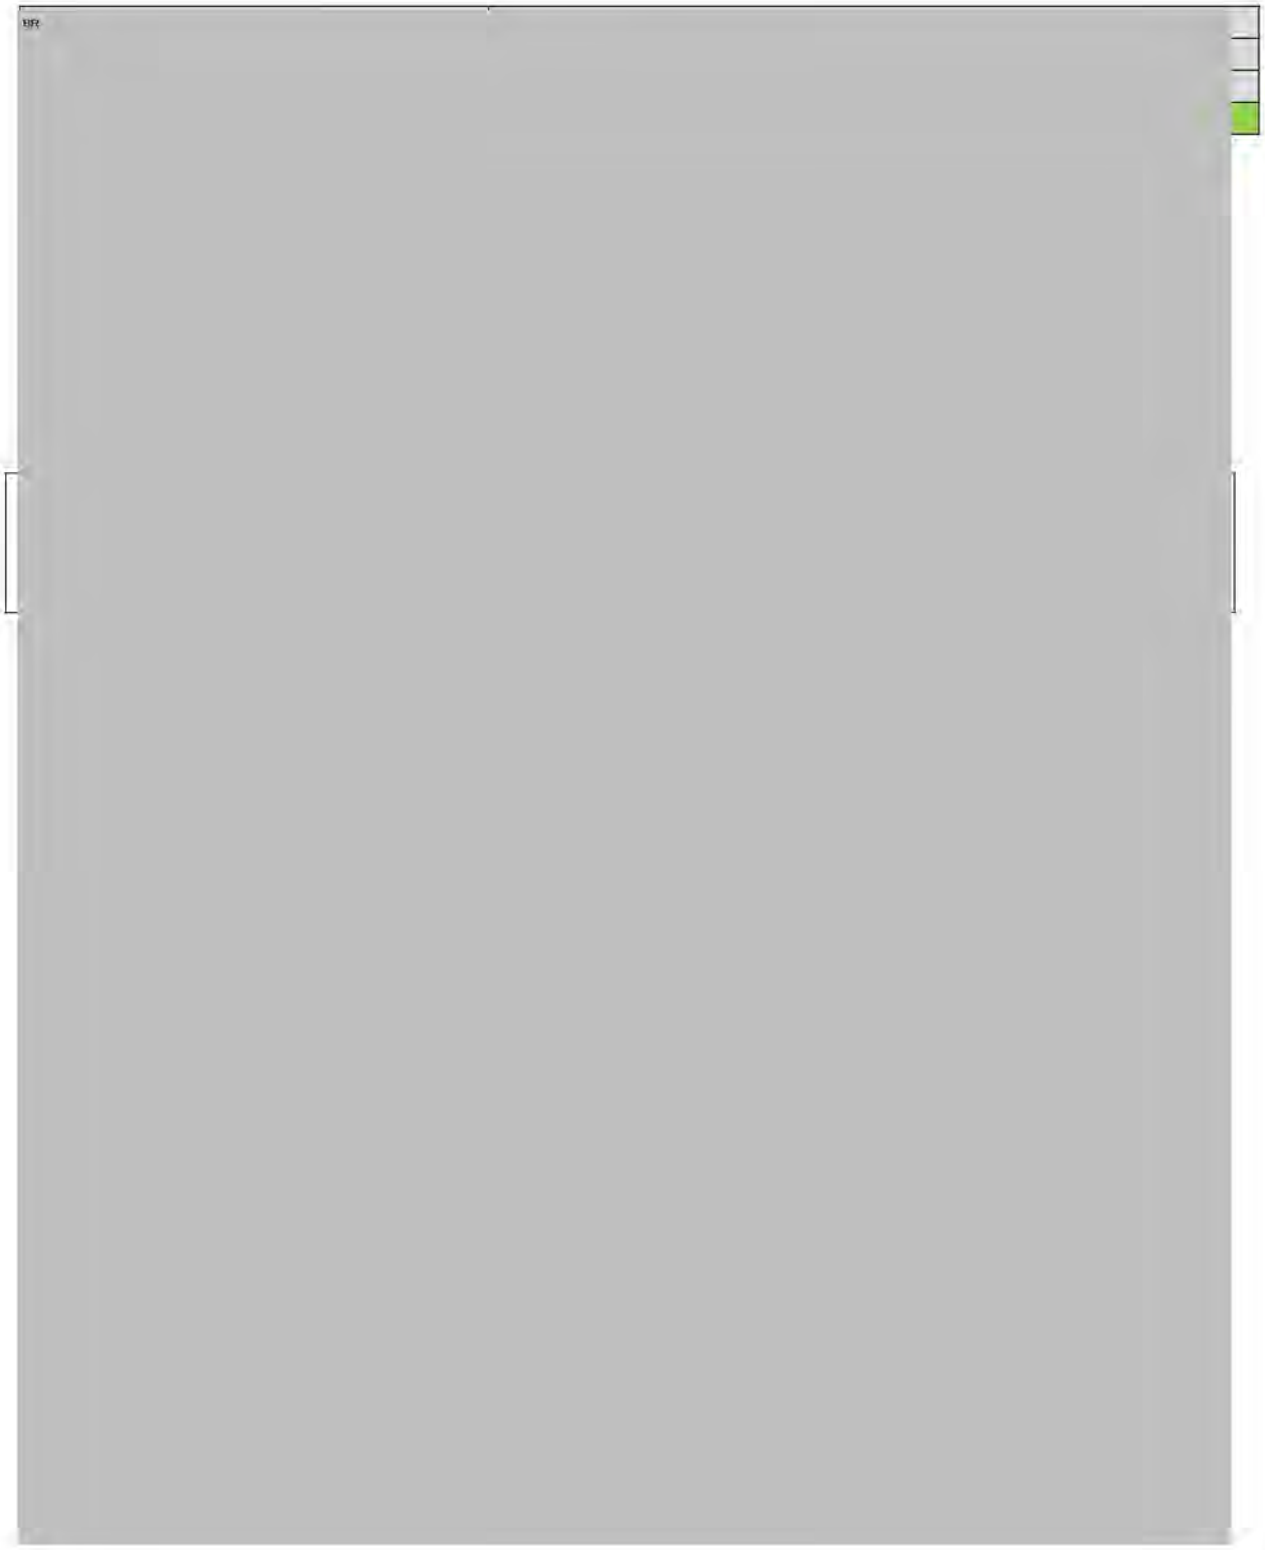

- DSO heeft een concept PUK herontwikkeling Vredenoord derde fase opgesteld. Dit PUK biedt de mogelijkheid om de waterinlaat naar het Molenvlietpark al dan niet via het perceel van Vredenoord te realiseren. Parallel daaraan zijn twee varianten voor de waterinlaat buiten het perceel van Vredenoord onderzocht. Eén variant is afgevallen en de andere variant wordt nader op haalbaarheid onderzocht.

## 1.4 Bestuurlijke besluitvorming komende periode

Indien er overeenstemming bereikt wordt tussen 5.1.2e en de gemeente Den Haag over de door de gemeente gewenste waterinlaat naar het bergingsgebied in het Molenvlietpark, zal het College verzocht worden in te stemmen met een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Continueren overleg met stakeholders in bijzonder gericht op uitvoeringsaspecten en relatiebeheer in samenwerking met en afgestemd met omgevingsmanager CRB. | Dit betreft een doorlopend proces. Afgelopen kwartaal zijn er weer gesprekken gevoerd met diverse bewoners, bedrijven en organisaties, waaronder:<br>BR<br>5.1.2.e Team-Roba is met de familie 5.1.2.e in overleg i.h.k.v. de waterinlaat naar het bergingsgebied. De concept- SOK is opgesteld en met 5.1.2.e en zijn advocaat besproken. Wegens de relatie met het PUK voor zijn particuliere initiatief van de herontwikkeling Nieuw Vredenoord derde fase (die een variant met en zonder waterinlaat mogelijk maakt) is het proces om te komen tot een SOK met de familie 5.1.2.e "on hold" gezet in afwachting van de keuze voor de variant van de waterinlaat. |
| BR | |

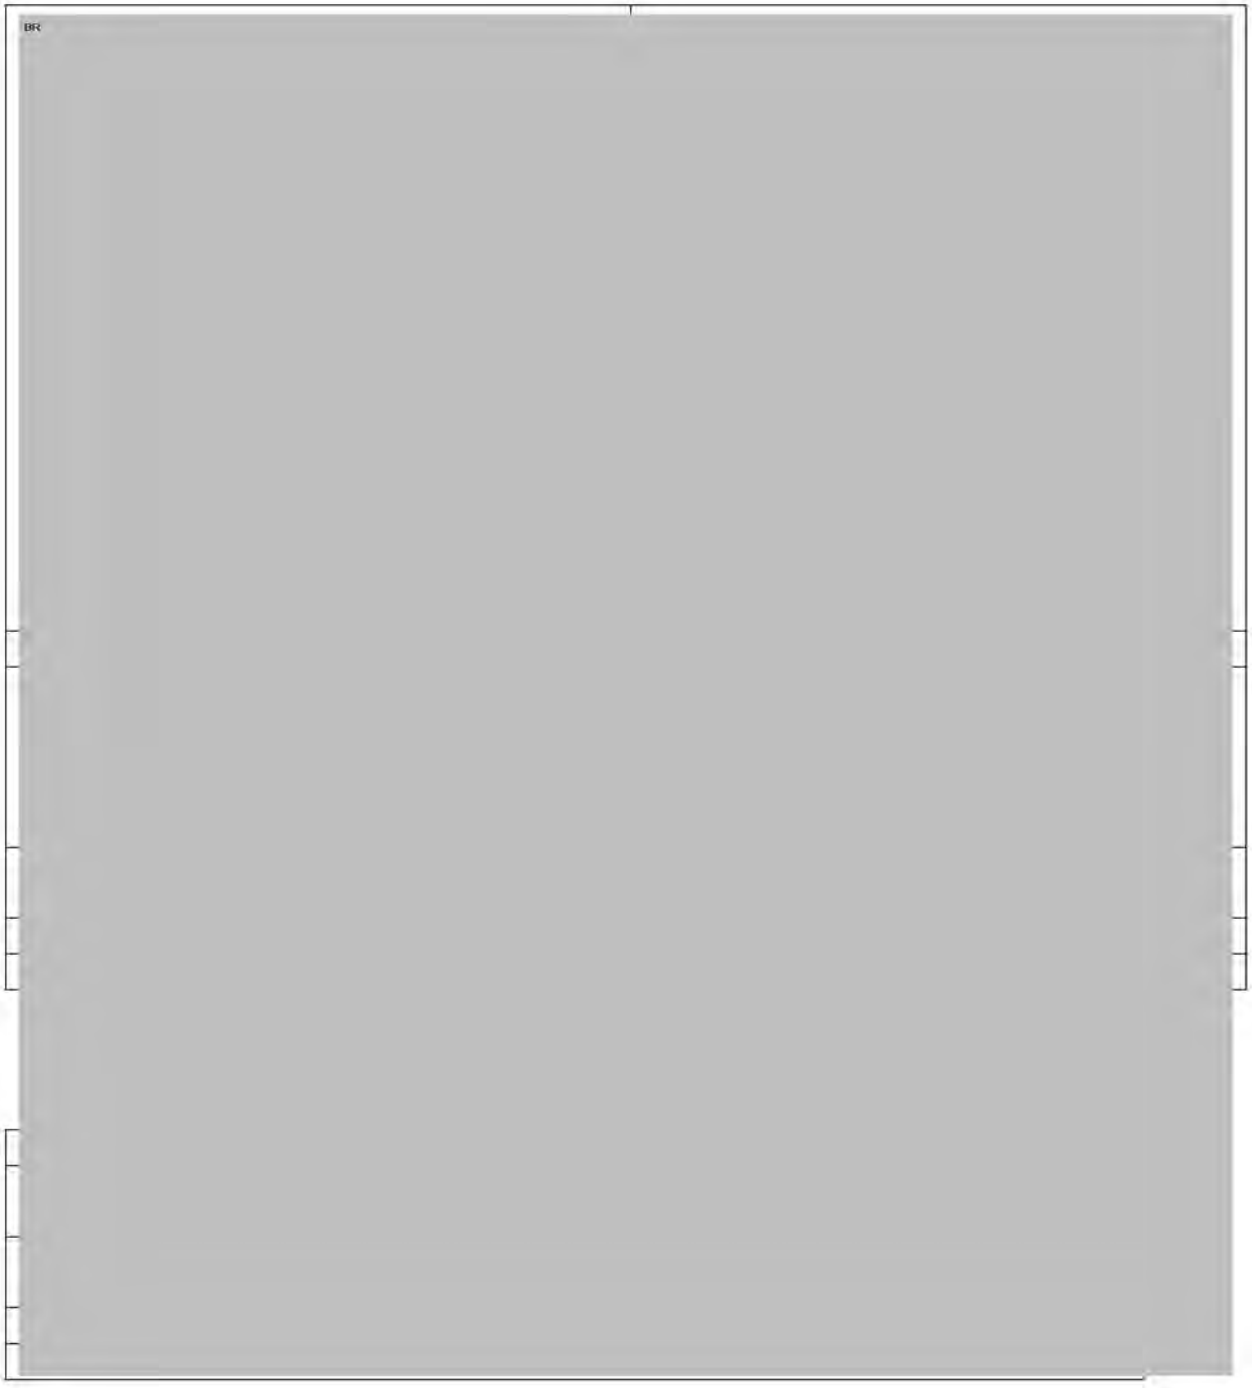
BR

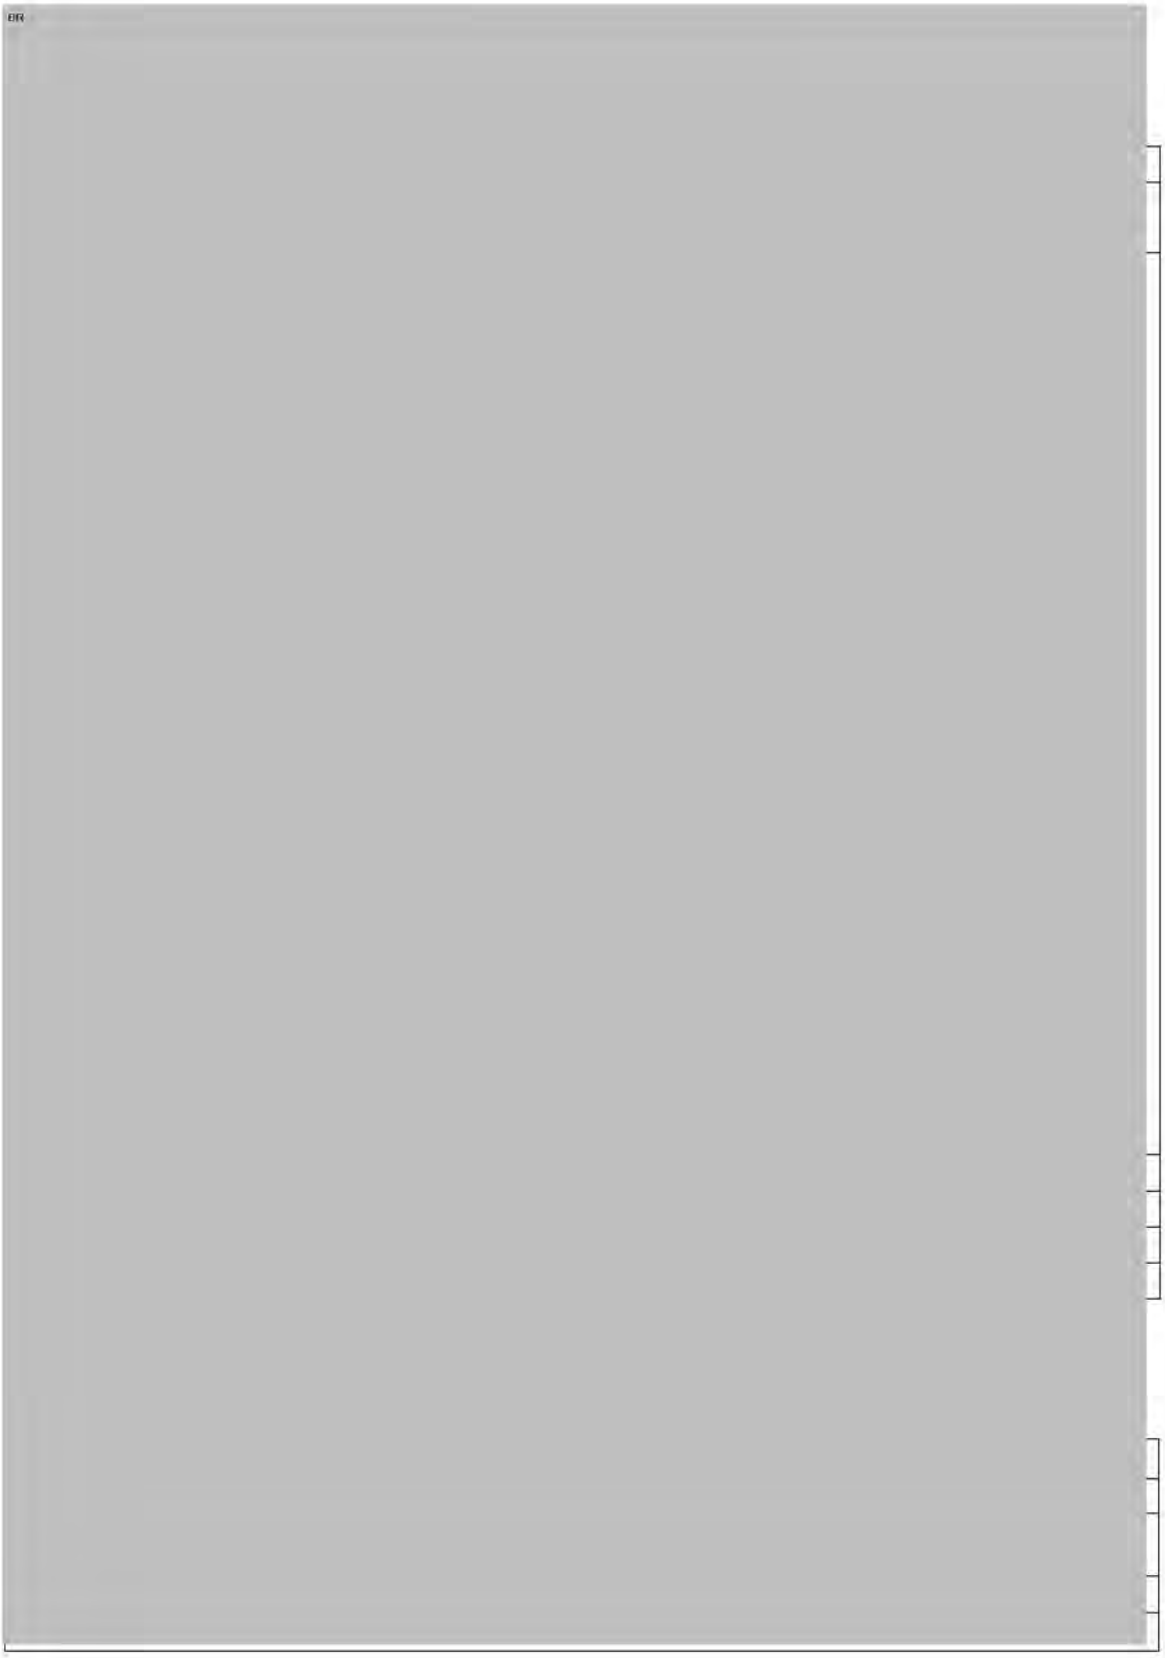
BR

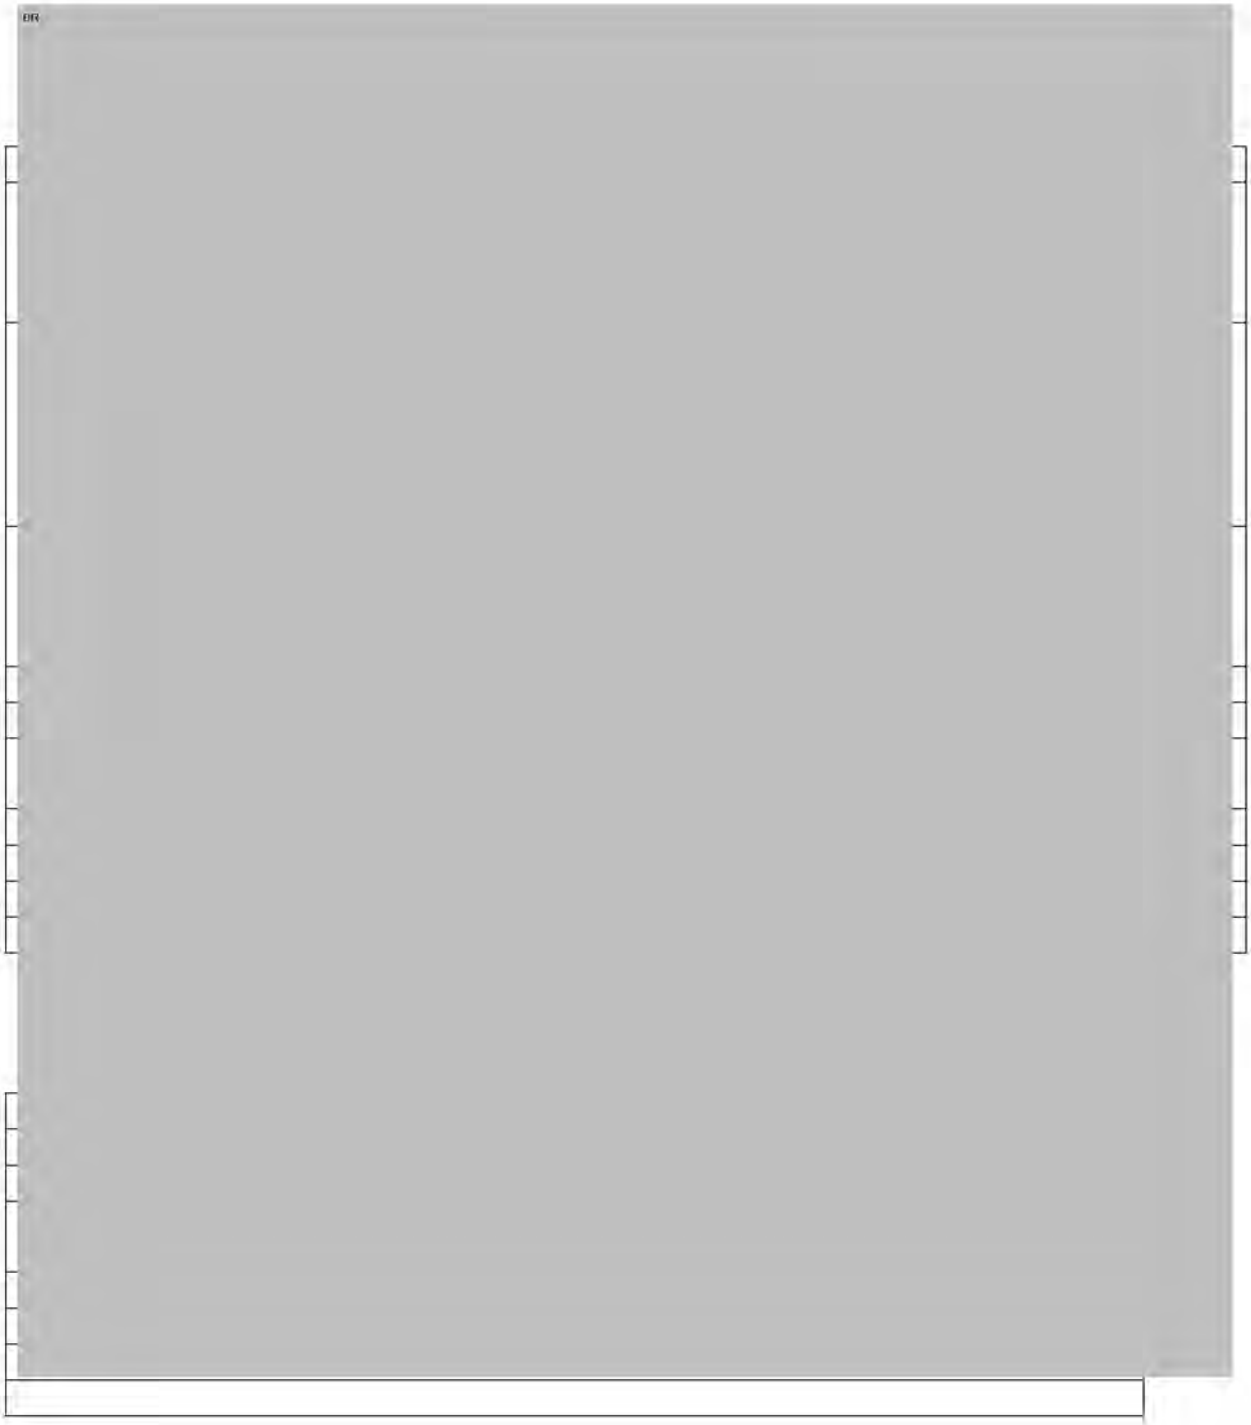

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Parallel aan het door DSO opstellen van het PUK herontwikkeling Vredenoord derde fase wordt er door DSB naar gestreefd de SOK ten behoeve van de waterinlaat naar het bergingsgebied af te ronden. | De concept PUK herontwikkeling Vredenoord derde fase van DSO biedt de mogelijkheid om al dan niet de waterinlaat via het perceel van 5.1.2.e te realiseren.<br>Parallel daaraan zijn twee varianten voor de waterinlaat buiten het perceel van de familie 5.1.2.e voor de waterinlaat onderzocht. Eén variant is afgevallen en de andere wordt nader onderzocht. Hiervoor wordt een schetsontwerp gemaakt en vervolgens afgestemd met het Hoogheemraadschap. |
| T.a.v. de waterinlaat naar het bergingsgebied in het Molenvlietpark zal het overleg met 5.1.2.e hervat worden. | 5.1.2.e<br>5.1.2.e In april en mei 2017 hebben gesprekken plaatsgevonden met de erven 5.1.2.e Zij hebben aangegeven de woning te verkopen. De eigendom van het perceel is voor beide varianten van de waterinlaat benodigd. DSO heeft dan ook het verwervingsproces in gang gezet. |
| [redacted] | |

| Overige/extra verrichte werkzaamheden | |
|---|---|
| Geen | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Samenwerkingsovereenkomst met dhr. 5.1.2.e t.a.v. waterinlaat naar het bergingsgebied | De SOK is afgelopen kwartaal nog niet afgerond. Werkzaamheden worden komend kwartaal voortgezet. |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Werkzaamheden m.b.t. afspraken rondom realisatie waterinlaat. |
| Vervolg verwervingsproces met erven 5.1.2.e |
| [redacted] |
| **Besluiten** |
| Samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e t.a.v. waterinlaat naar het bergingsgebied |

## 2.5 Communicatie

### 2.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Vervolgoverleg met Leidschendam-Voorburg en de Haagse afdeling Archeologie. | Op 1 juni was er een vervolgoverleg. Hierin zijn afspraken gemaakt om een voorstel uit te werken voor een archeologisch geïnspireerde wandelroute tussen Forum Hadriani en het toekomstig Molenvlietpark. In dit voorstel wordt ook het idee voor een kunstwerk in het Molenvlietpark verder uitgewerkt. |
| [redacted] | |
| | |

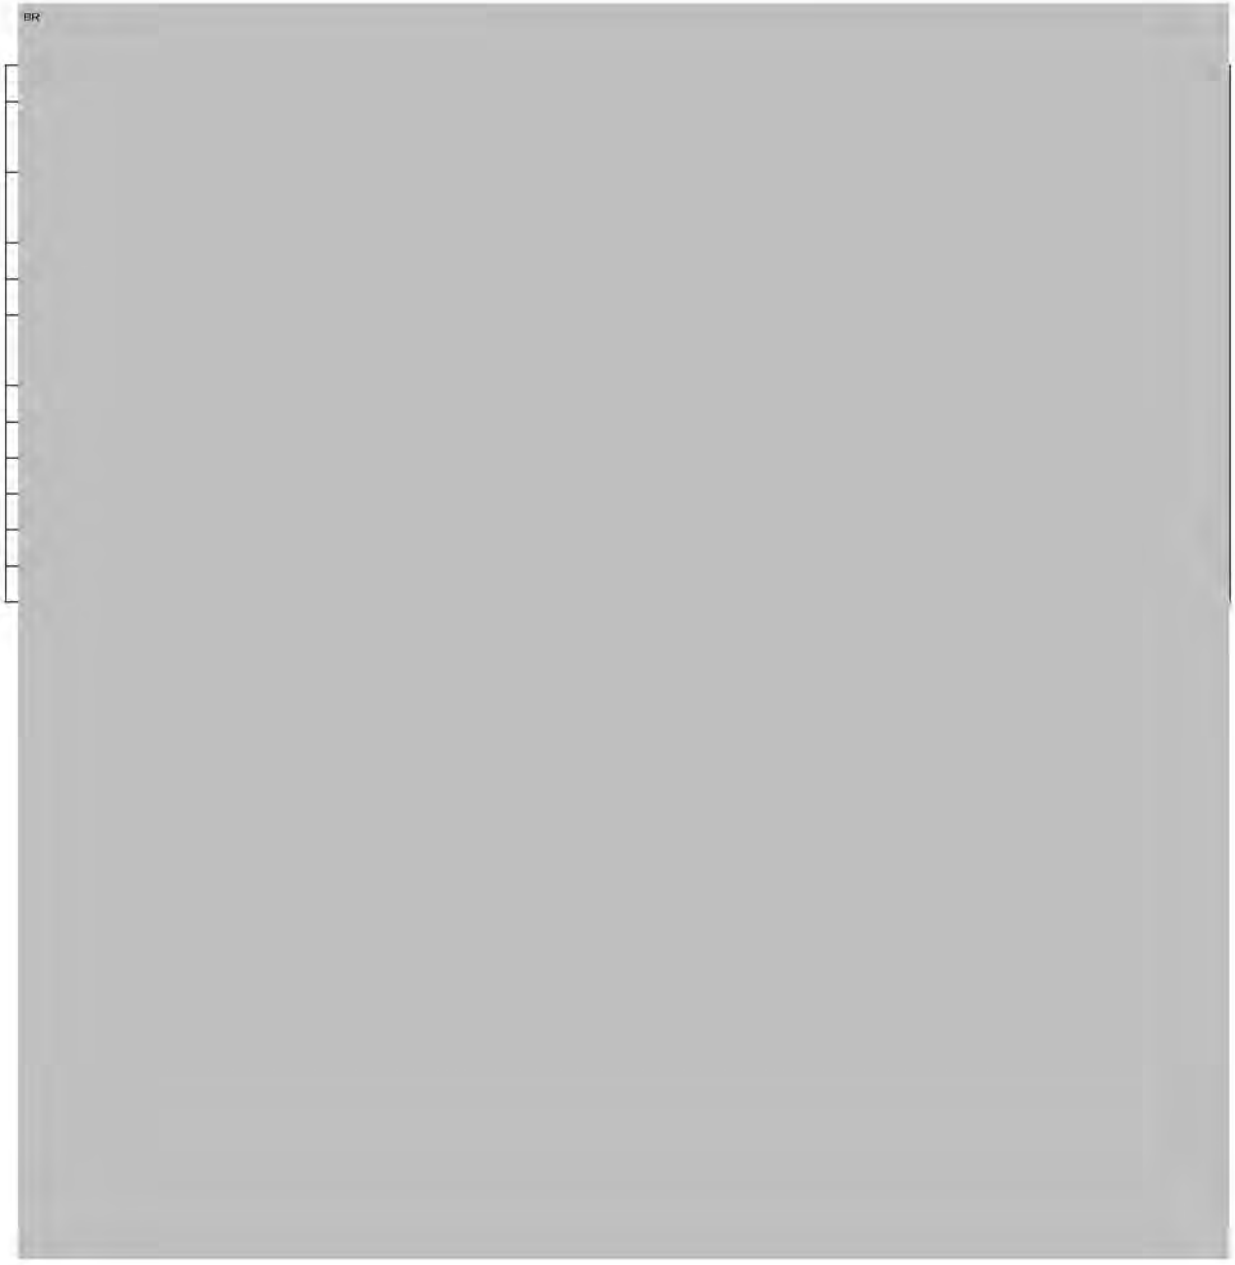
BR

# 3 Projectvoortgang

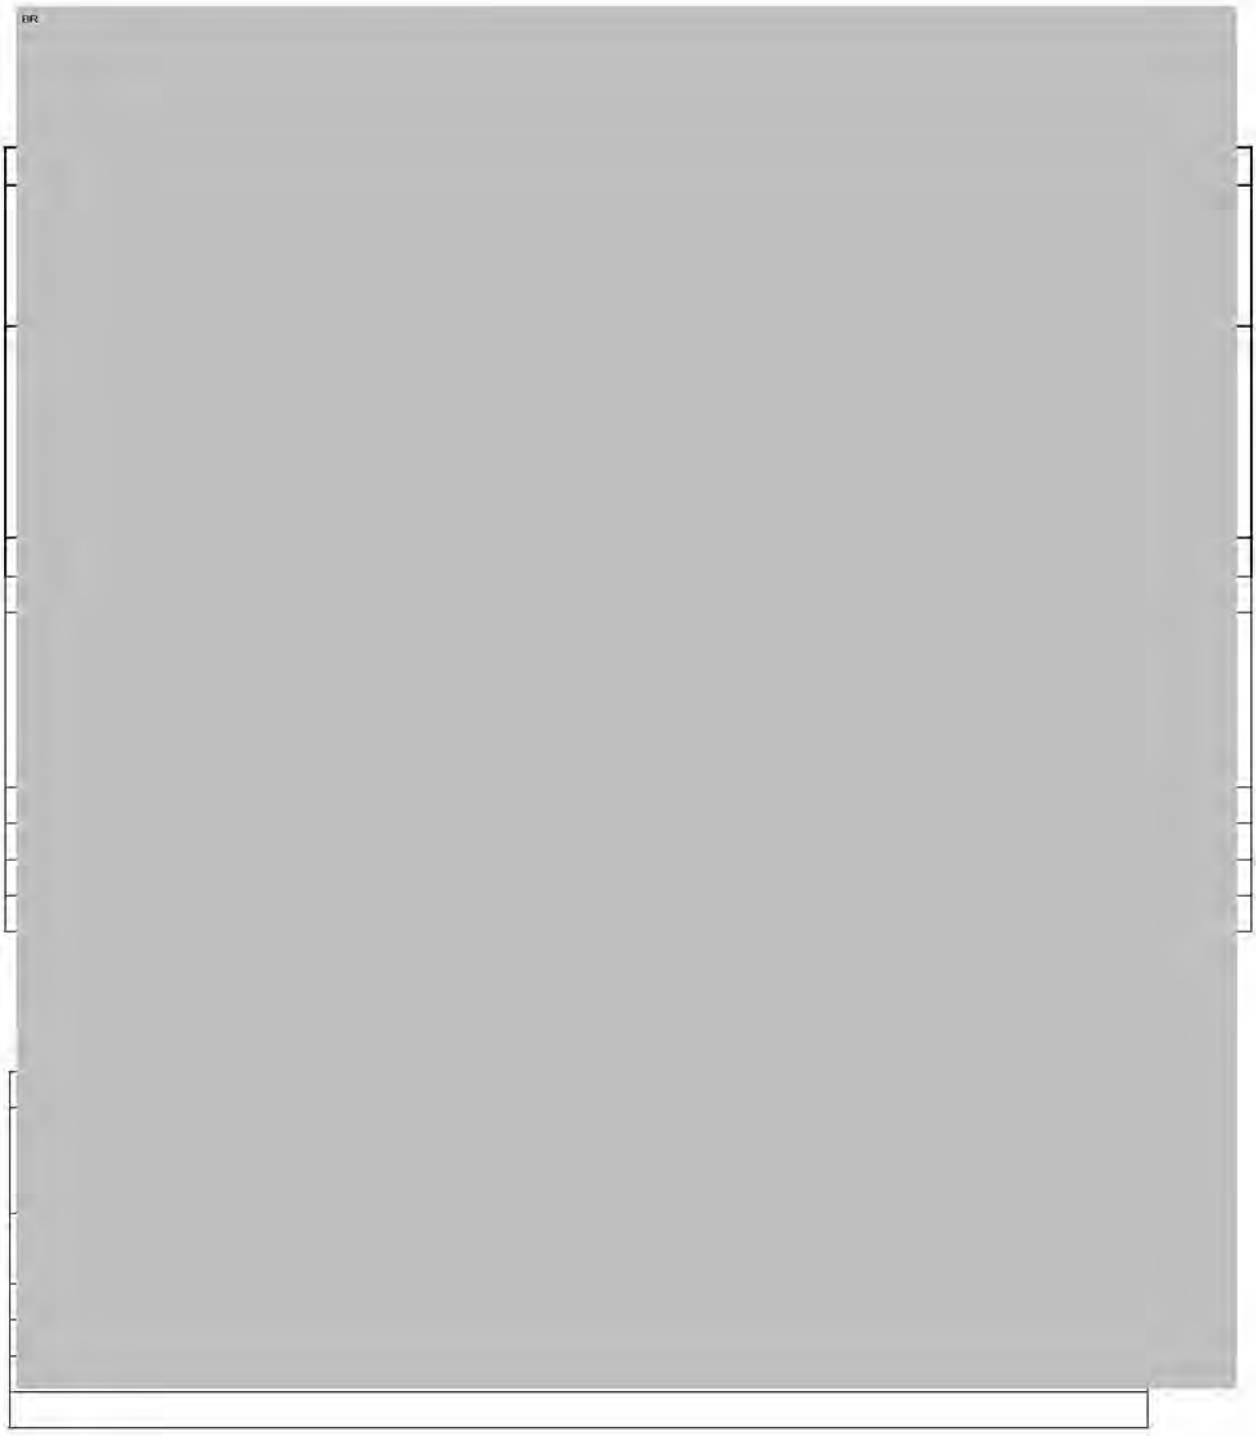

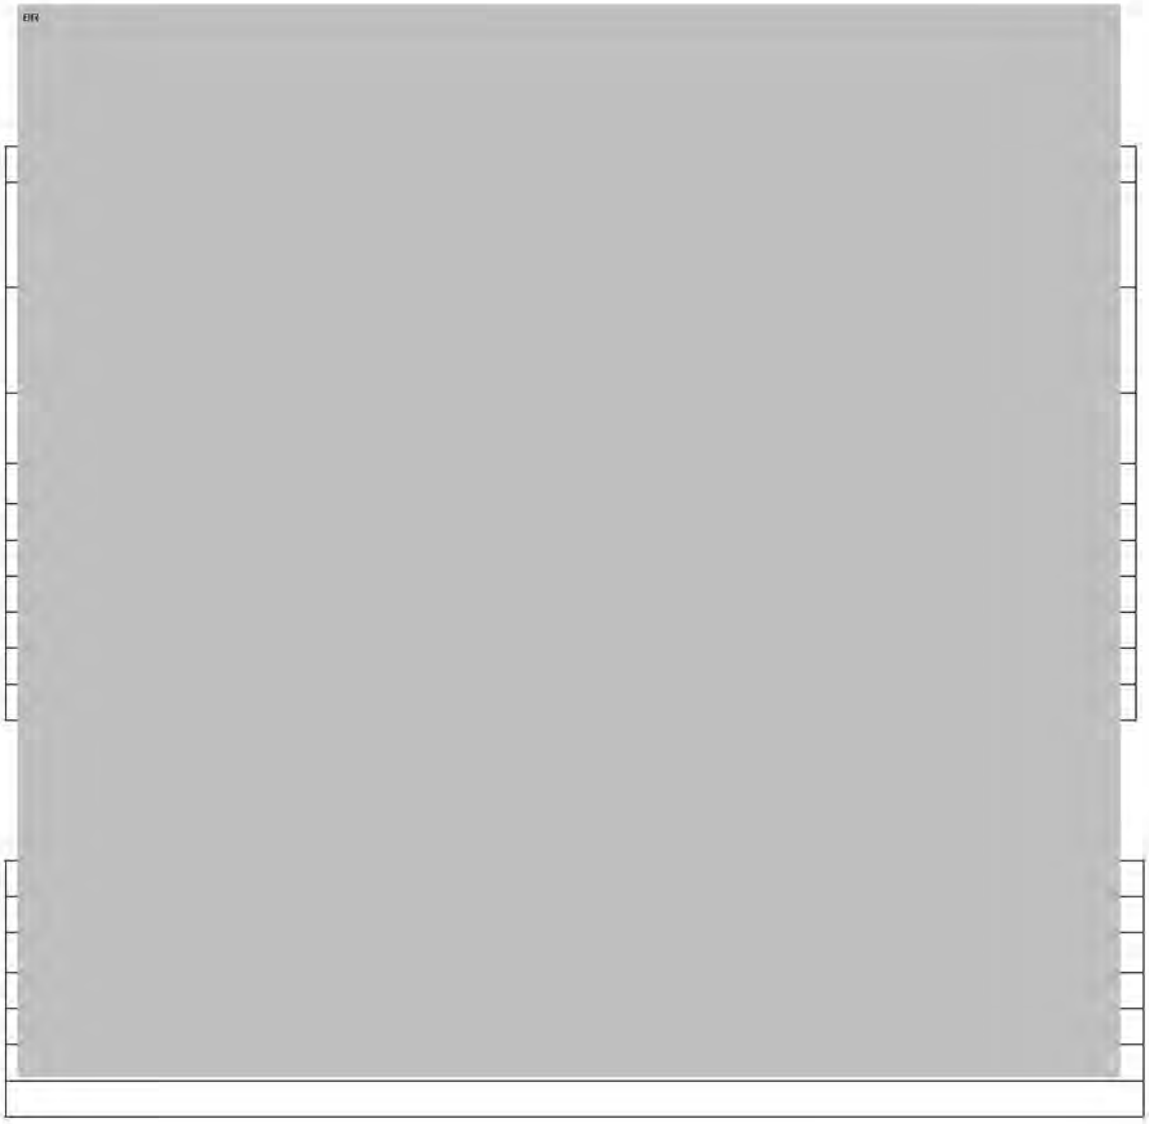
BR

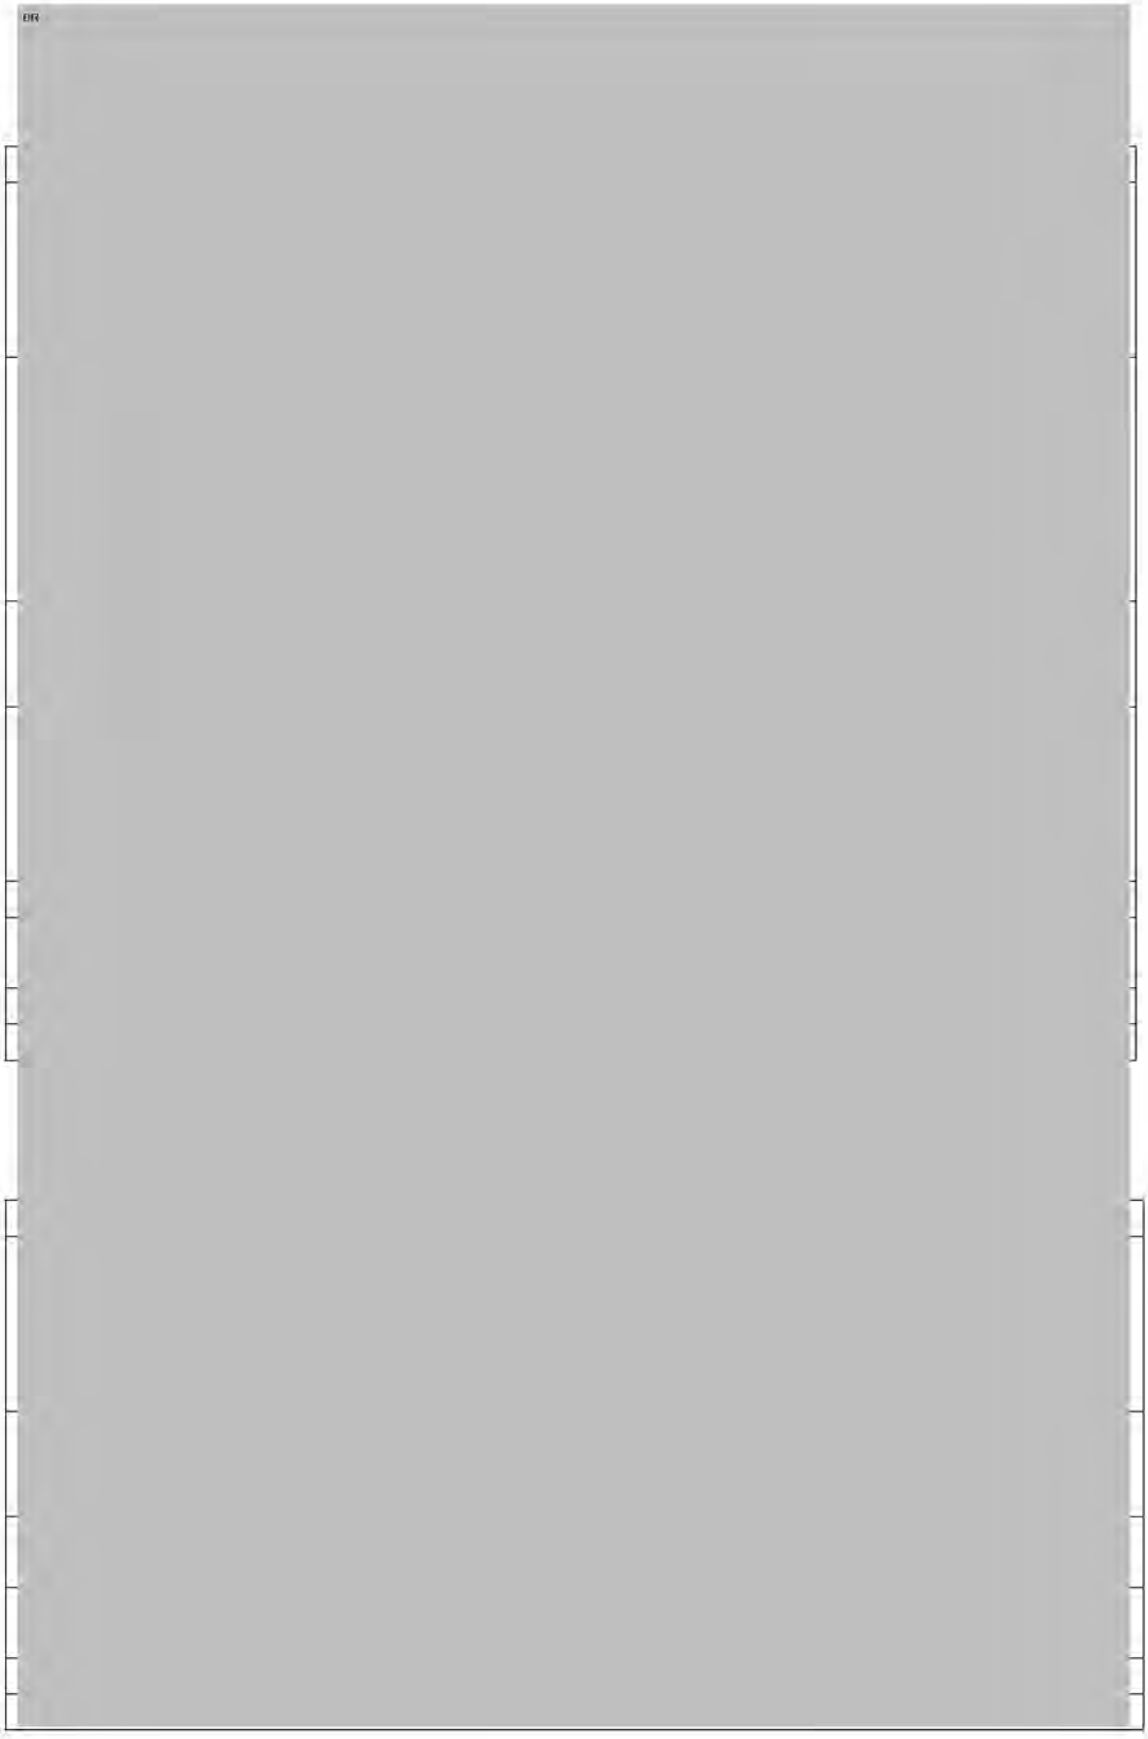

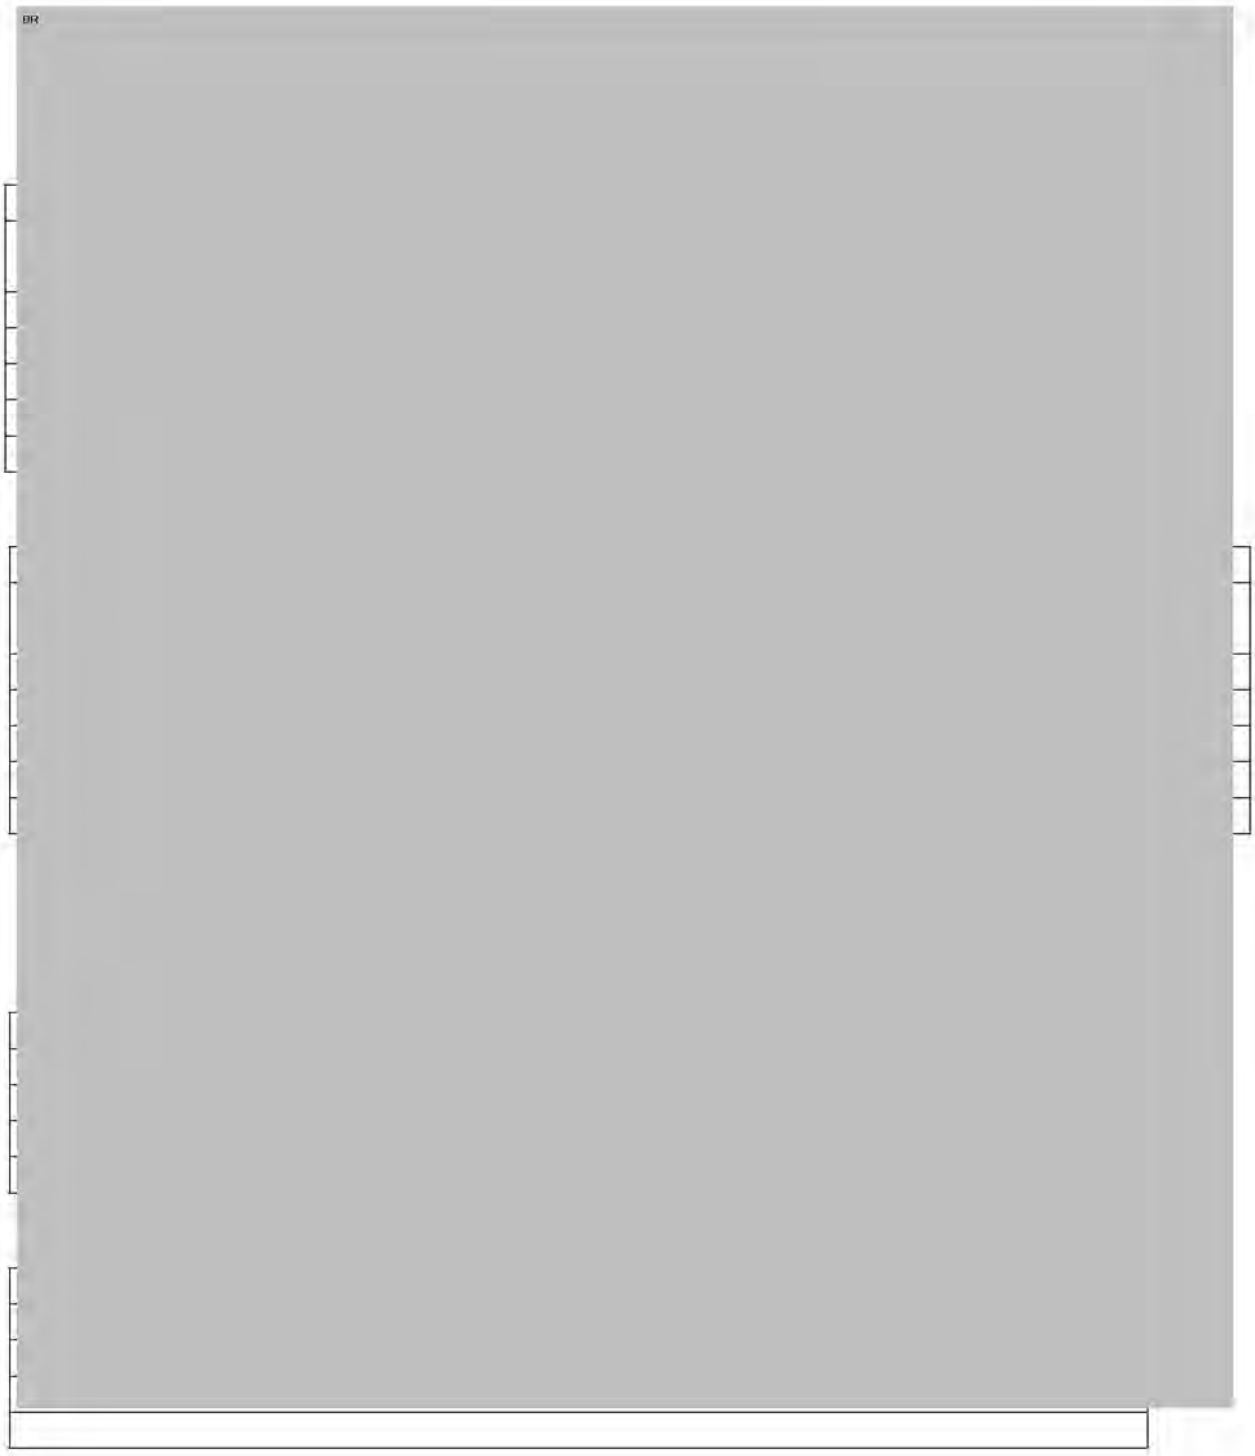
BR


BR

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

**Conditionering**

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Voorzetten gesprekken Hoogheemraadschap over watertoevoer Molenvlietpark | De gesprekken met het Hoogheemraadschap worden komend kwartaal voortgezet. |
| Voorzetten gesprekken kabel- en leidingbeheerders over watertoevoer Molenvlietpark | Afstemmingsoverleg met Tennet moet nog plaatsvinden. Dit wordt georganiseerd door CRB. |
| | |
| [redacted] | |

**Hoofdcontract**

| | |
|---|---|
| [redacted] | |
| Aanleggen kade Molenvlietpark. | De werkzaamheden zijn gestart in week 27. |
| [redacted] | |

| Werkzaamheden |
| --- |
| Voortzetten overleg met HHD en K&L-beheerders over het Molenvlietpark. |
| |
| BR |
| |
| |

**Hoofdcontract**

| Werkzaamheden |
| --- |
| BR |
| Dichtmaken duiker Molensloot t.h.v. A4 en realiseren hemelwaterafvoer A4. |
| Aanleggen kades Molenvlietpark (West). |
| BR |
| |
| |
| |
| |

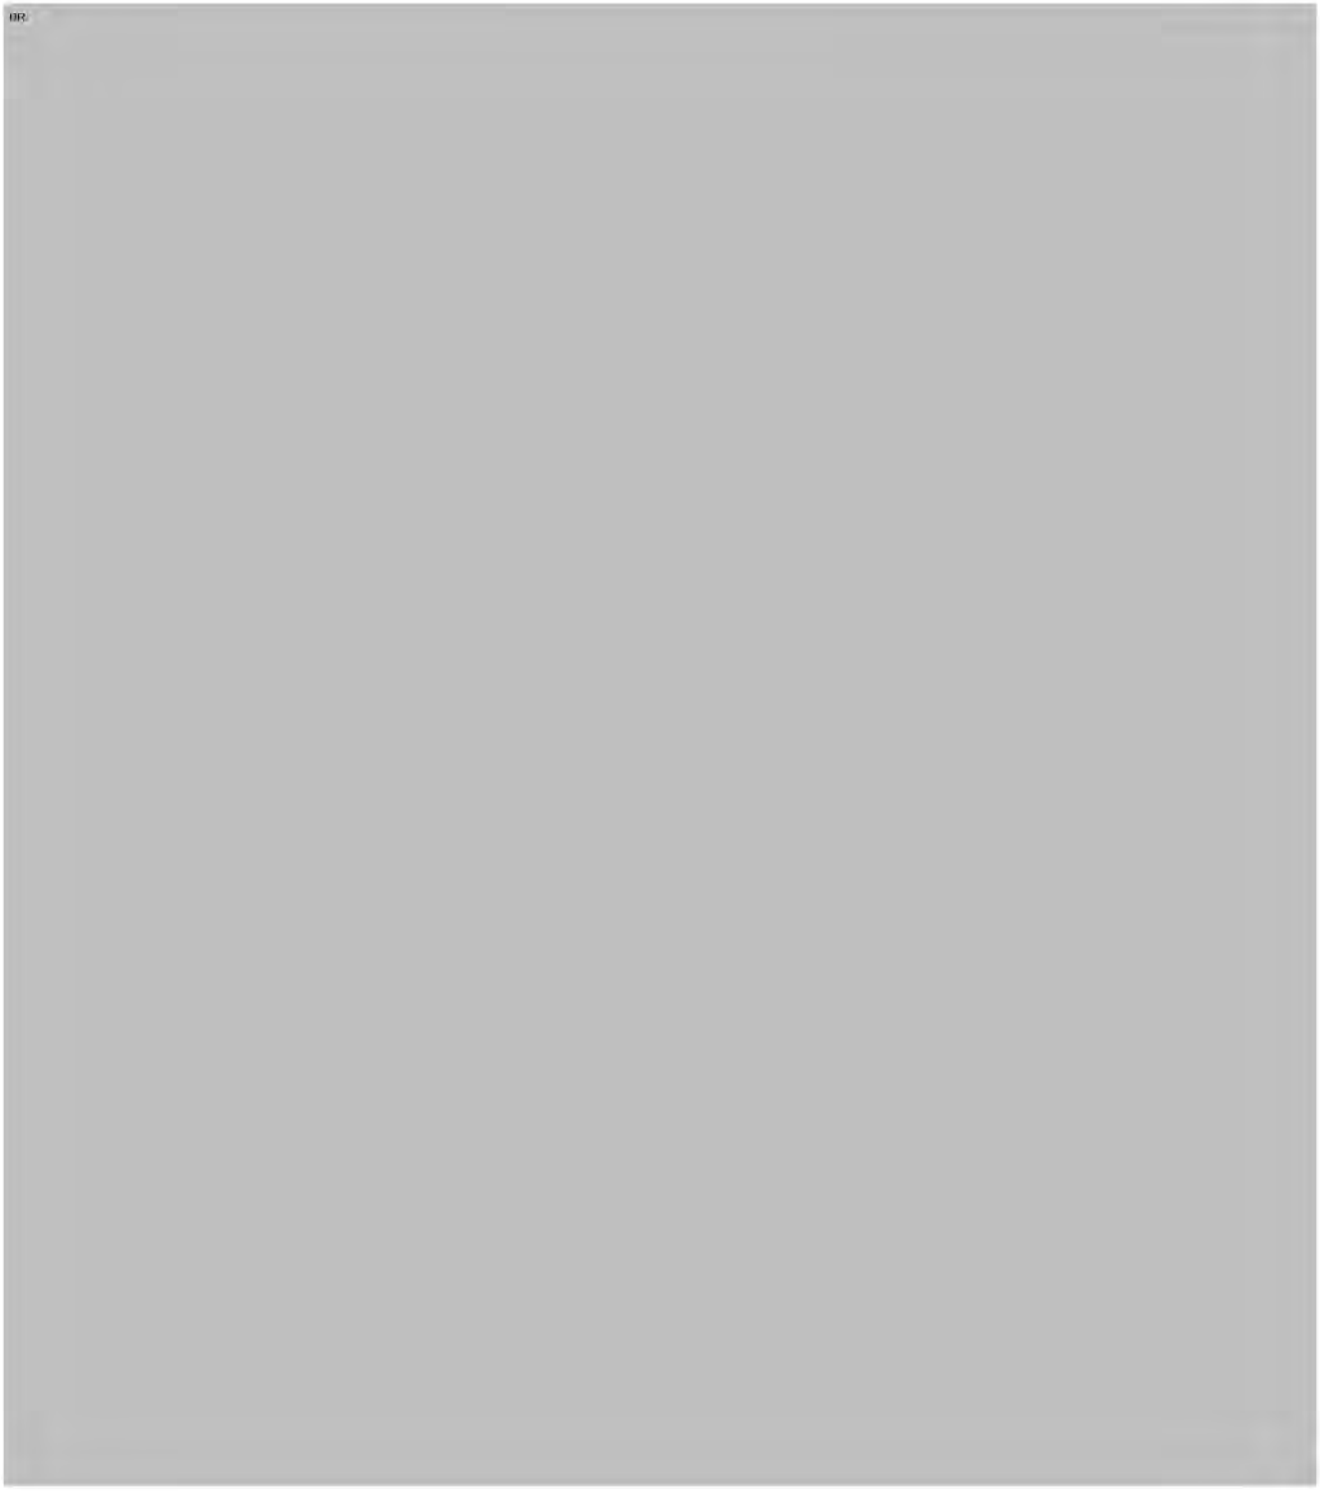

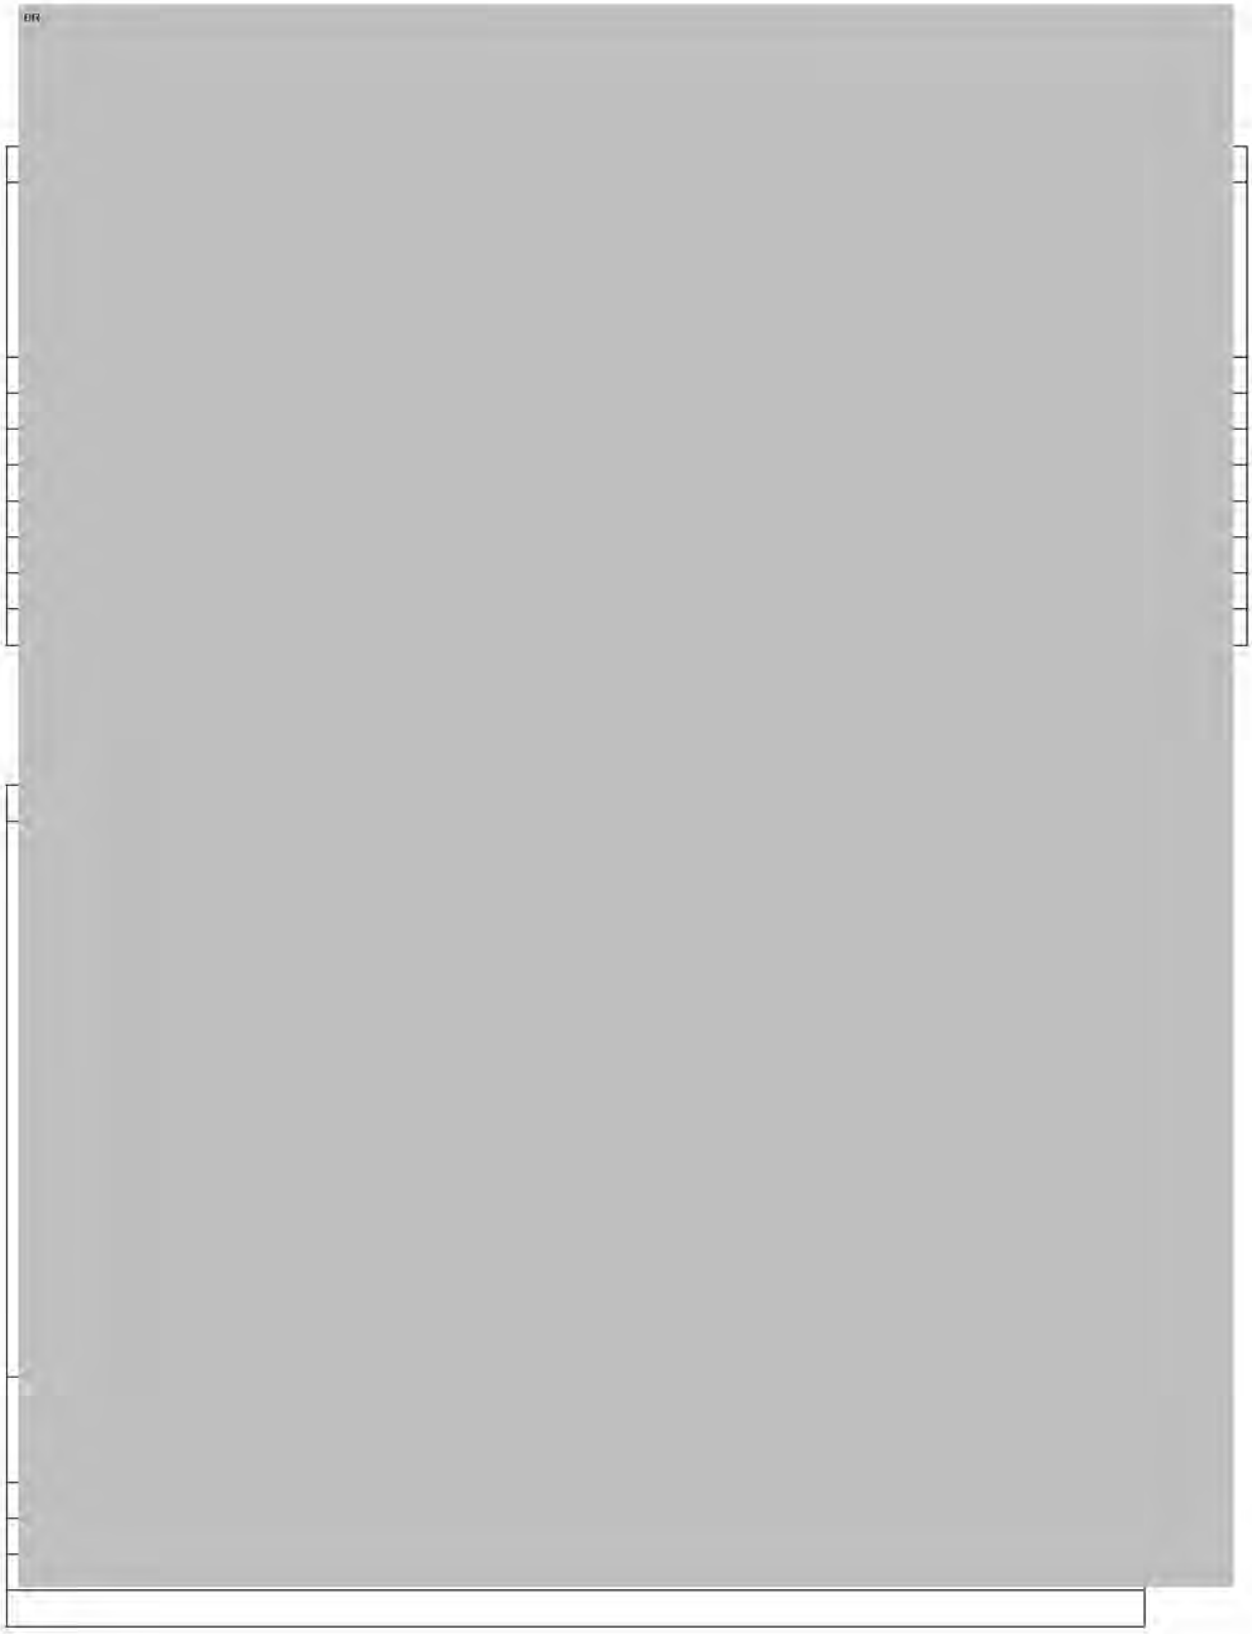

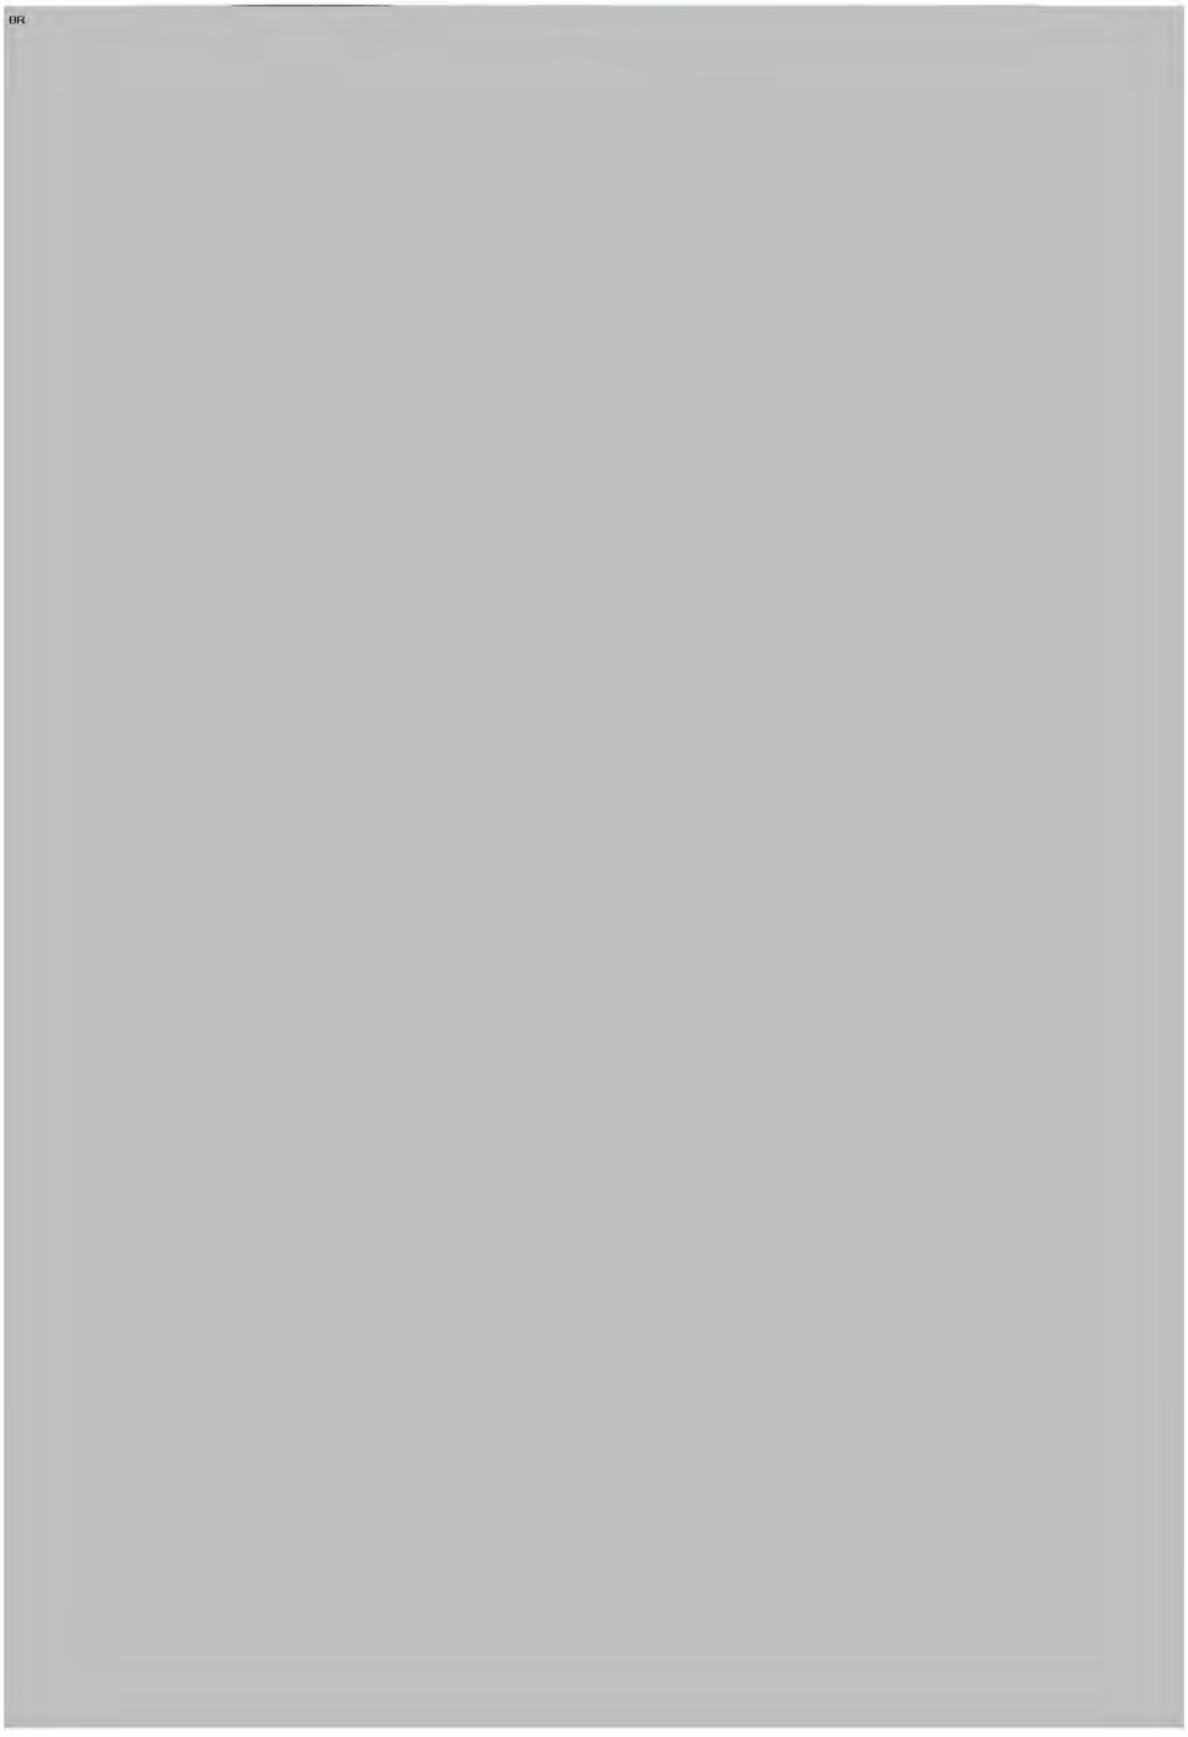
BR

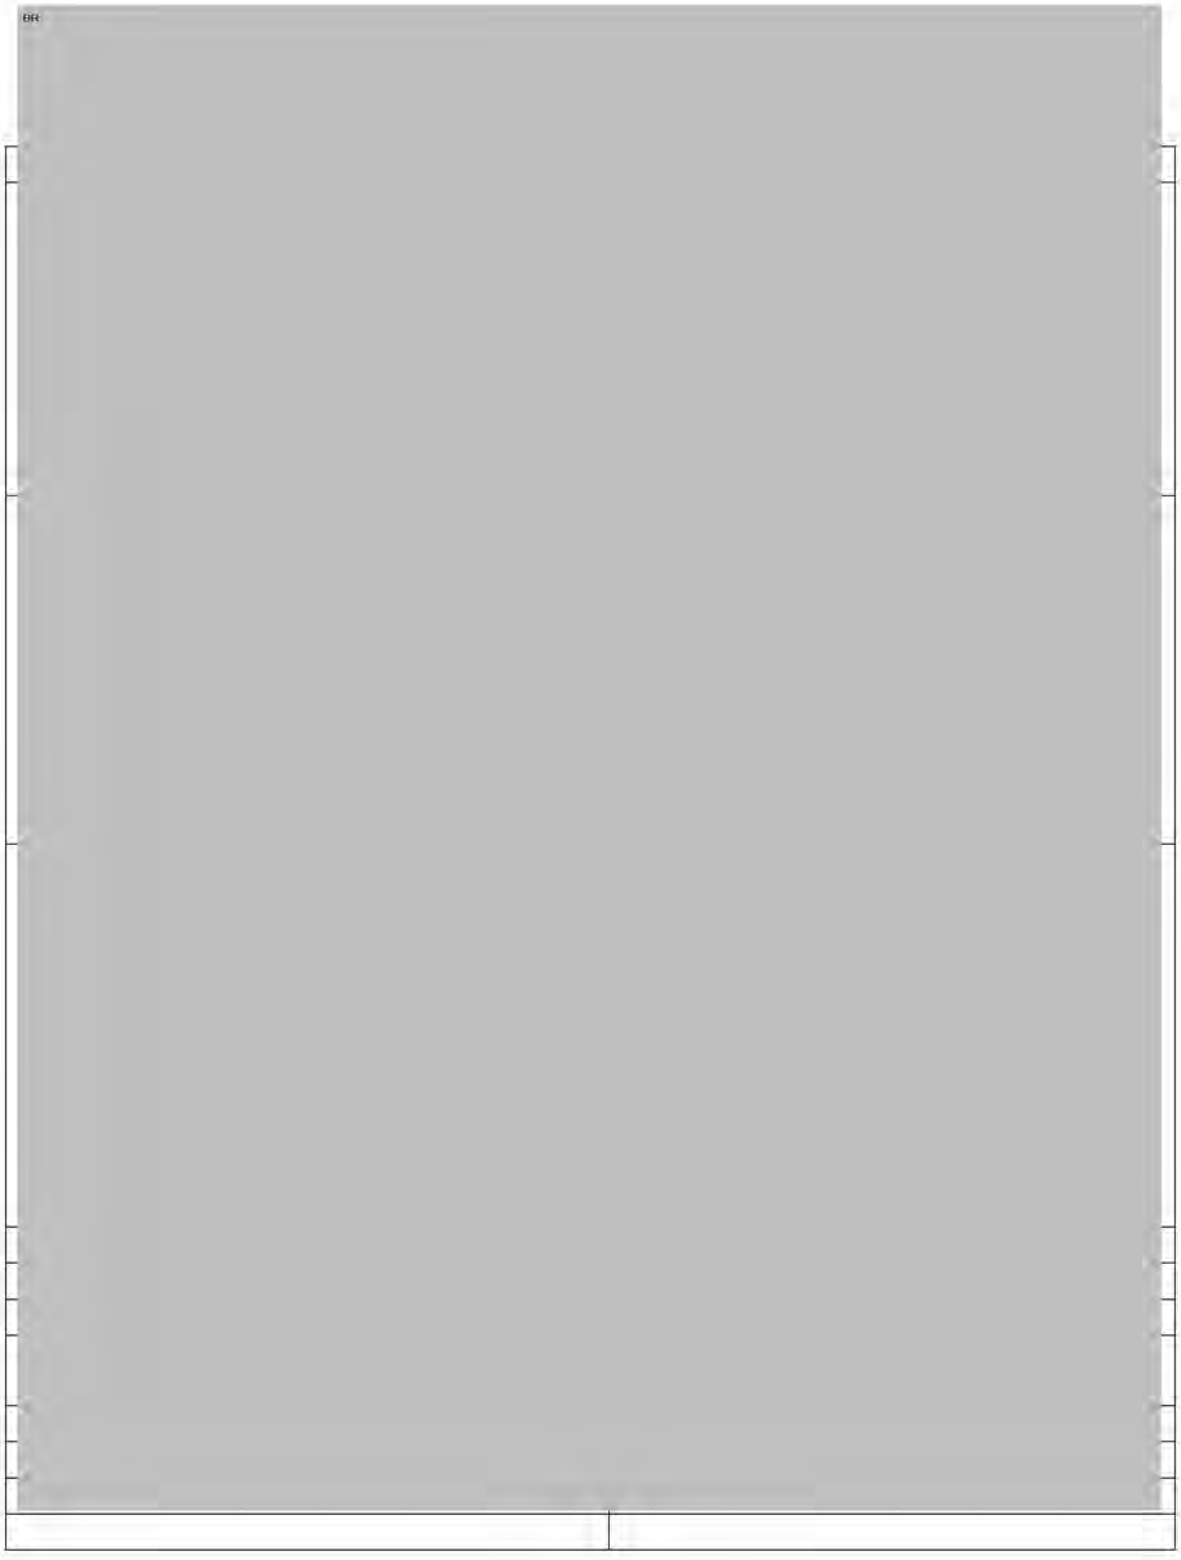

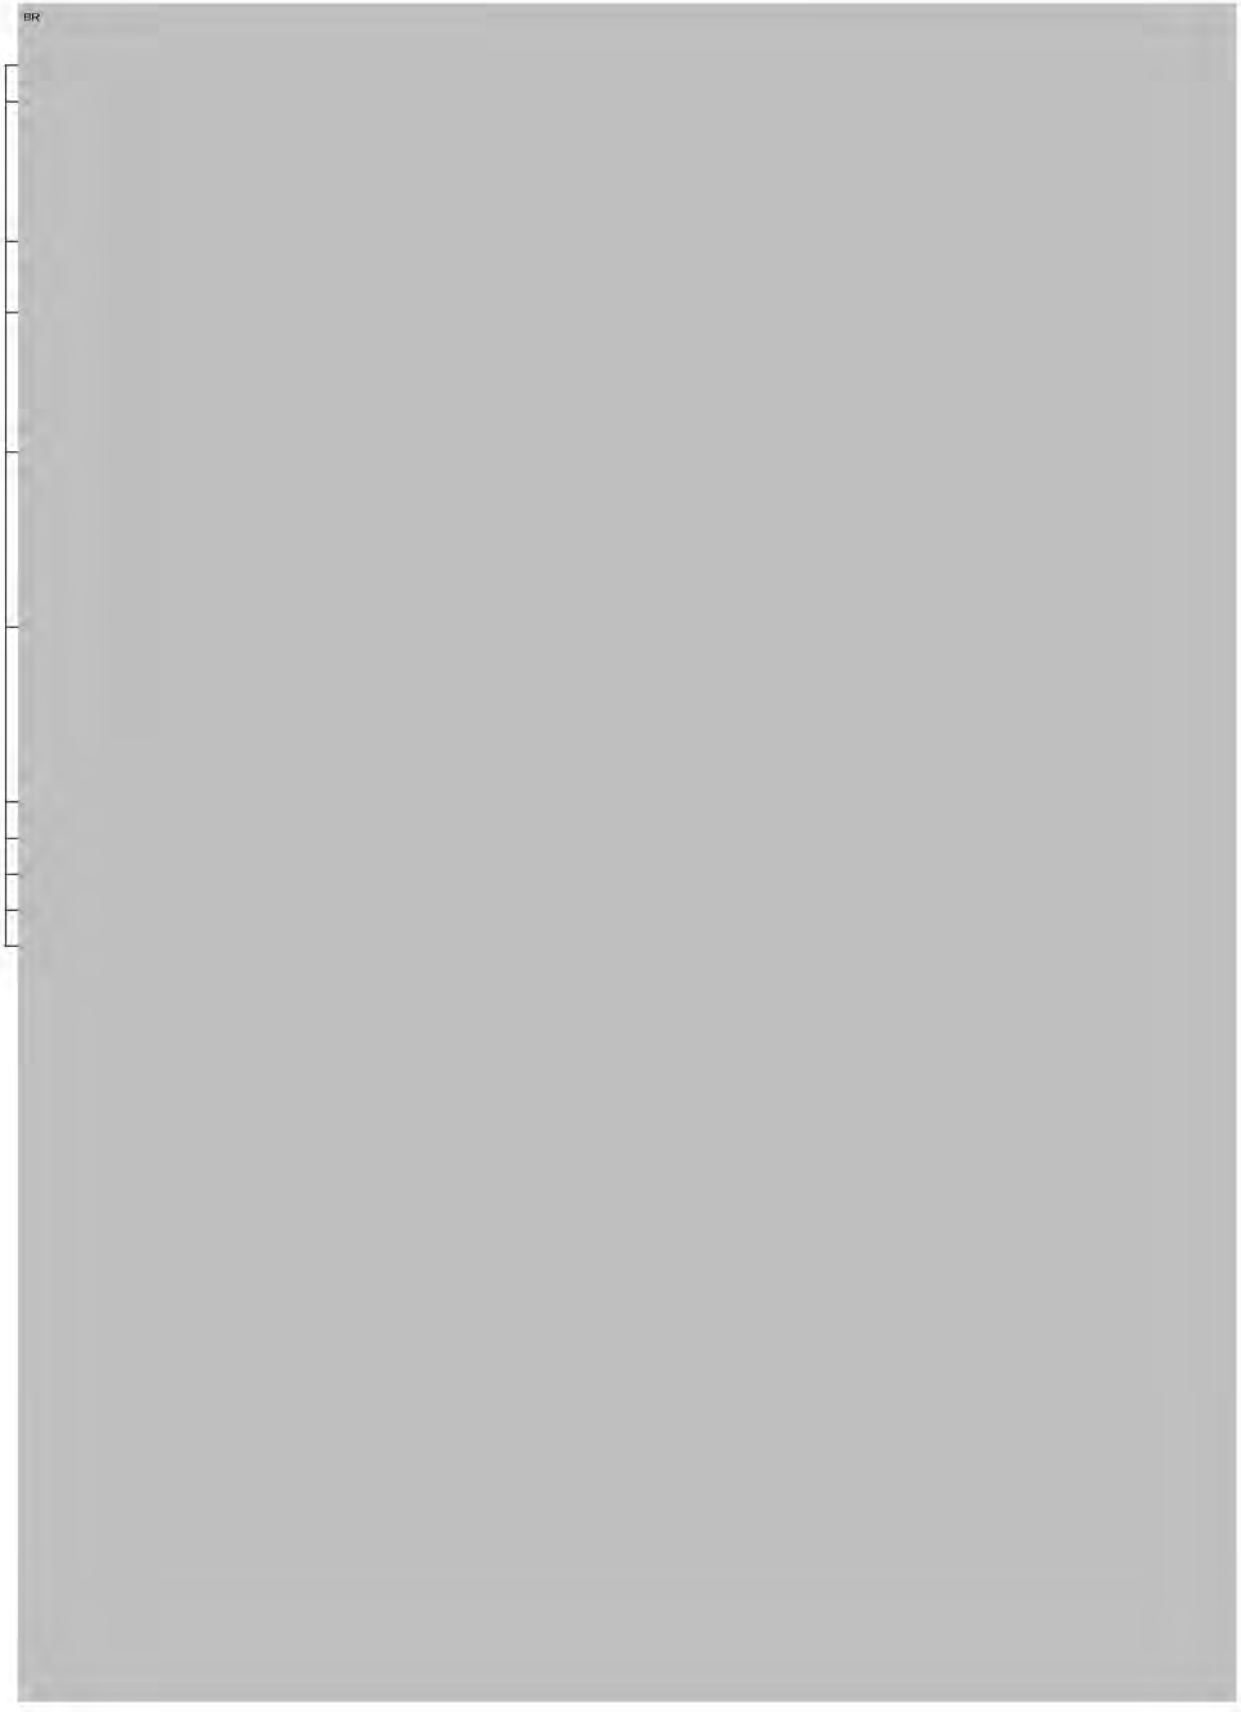

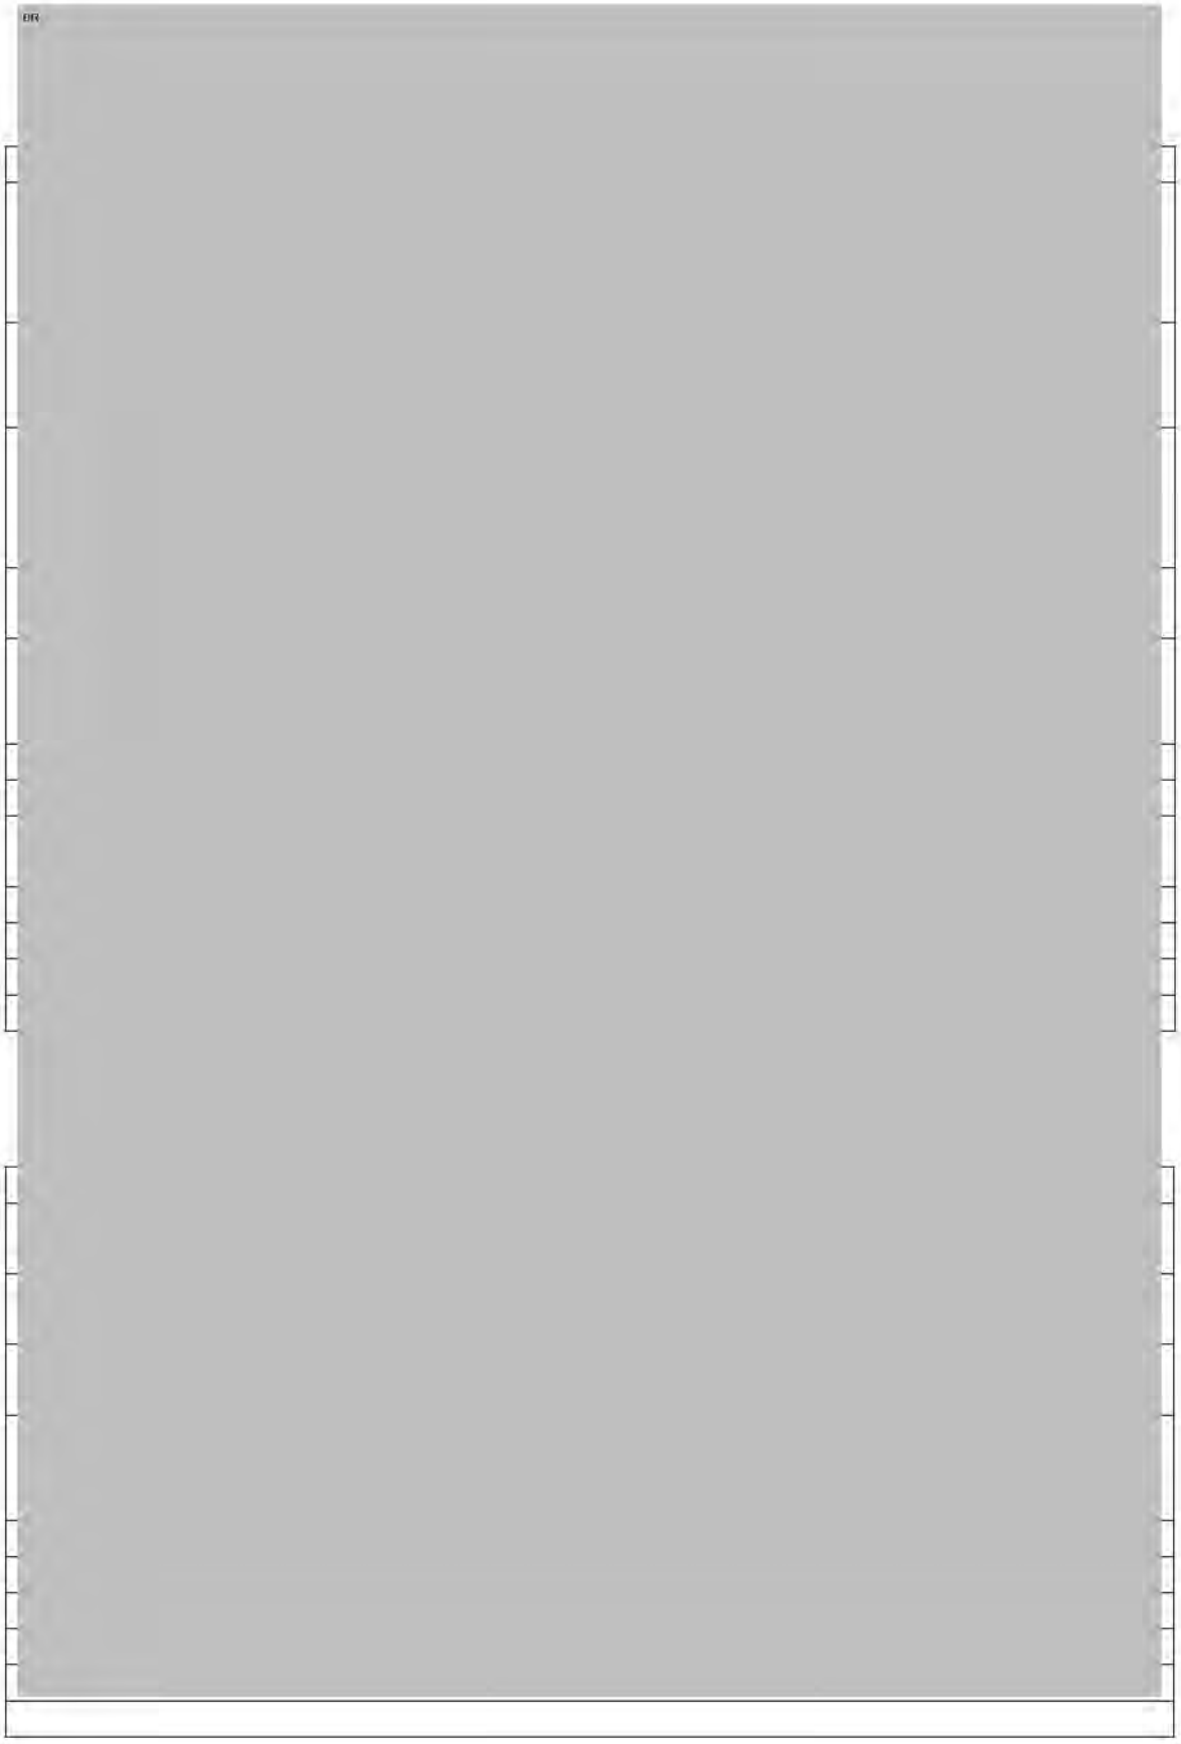

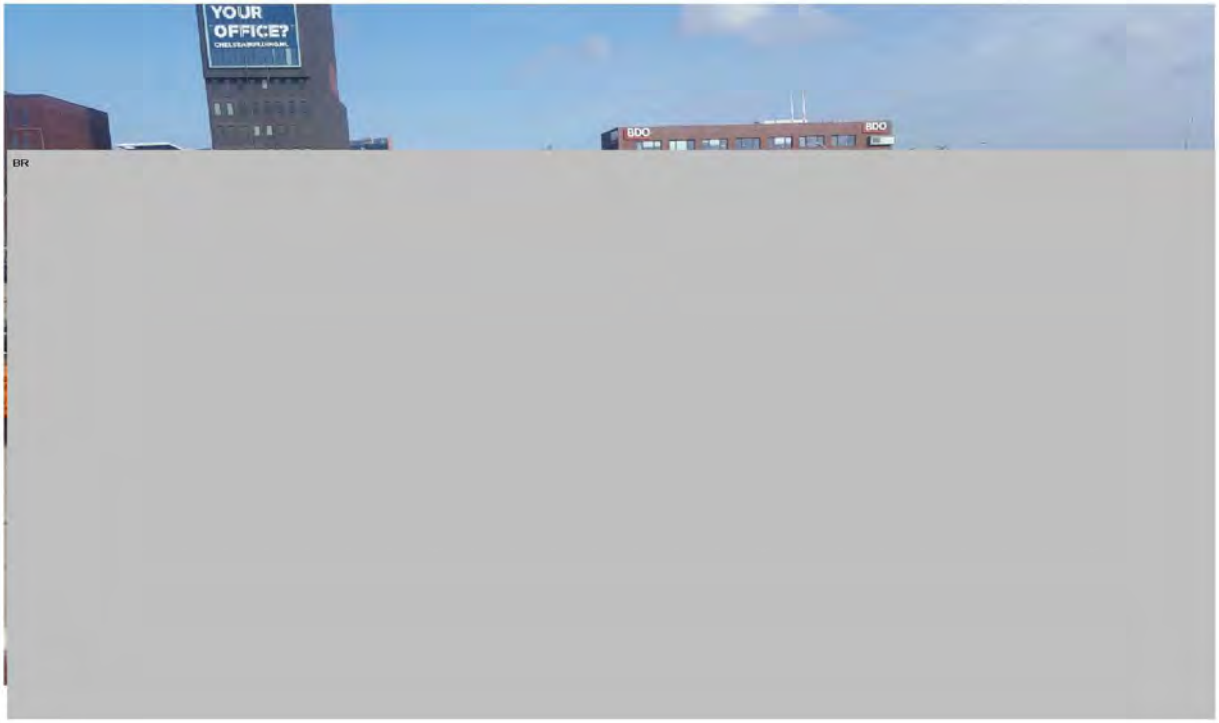
YOUR
OFFICE?
BDO
BDO
BR

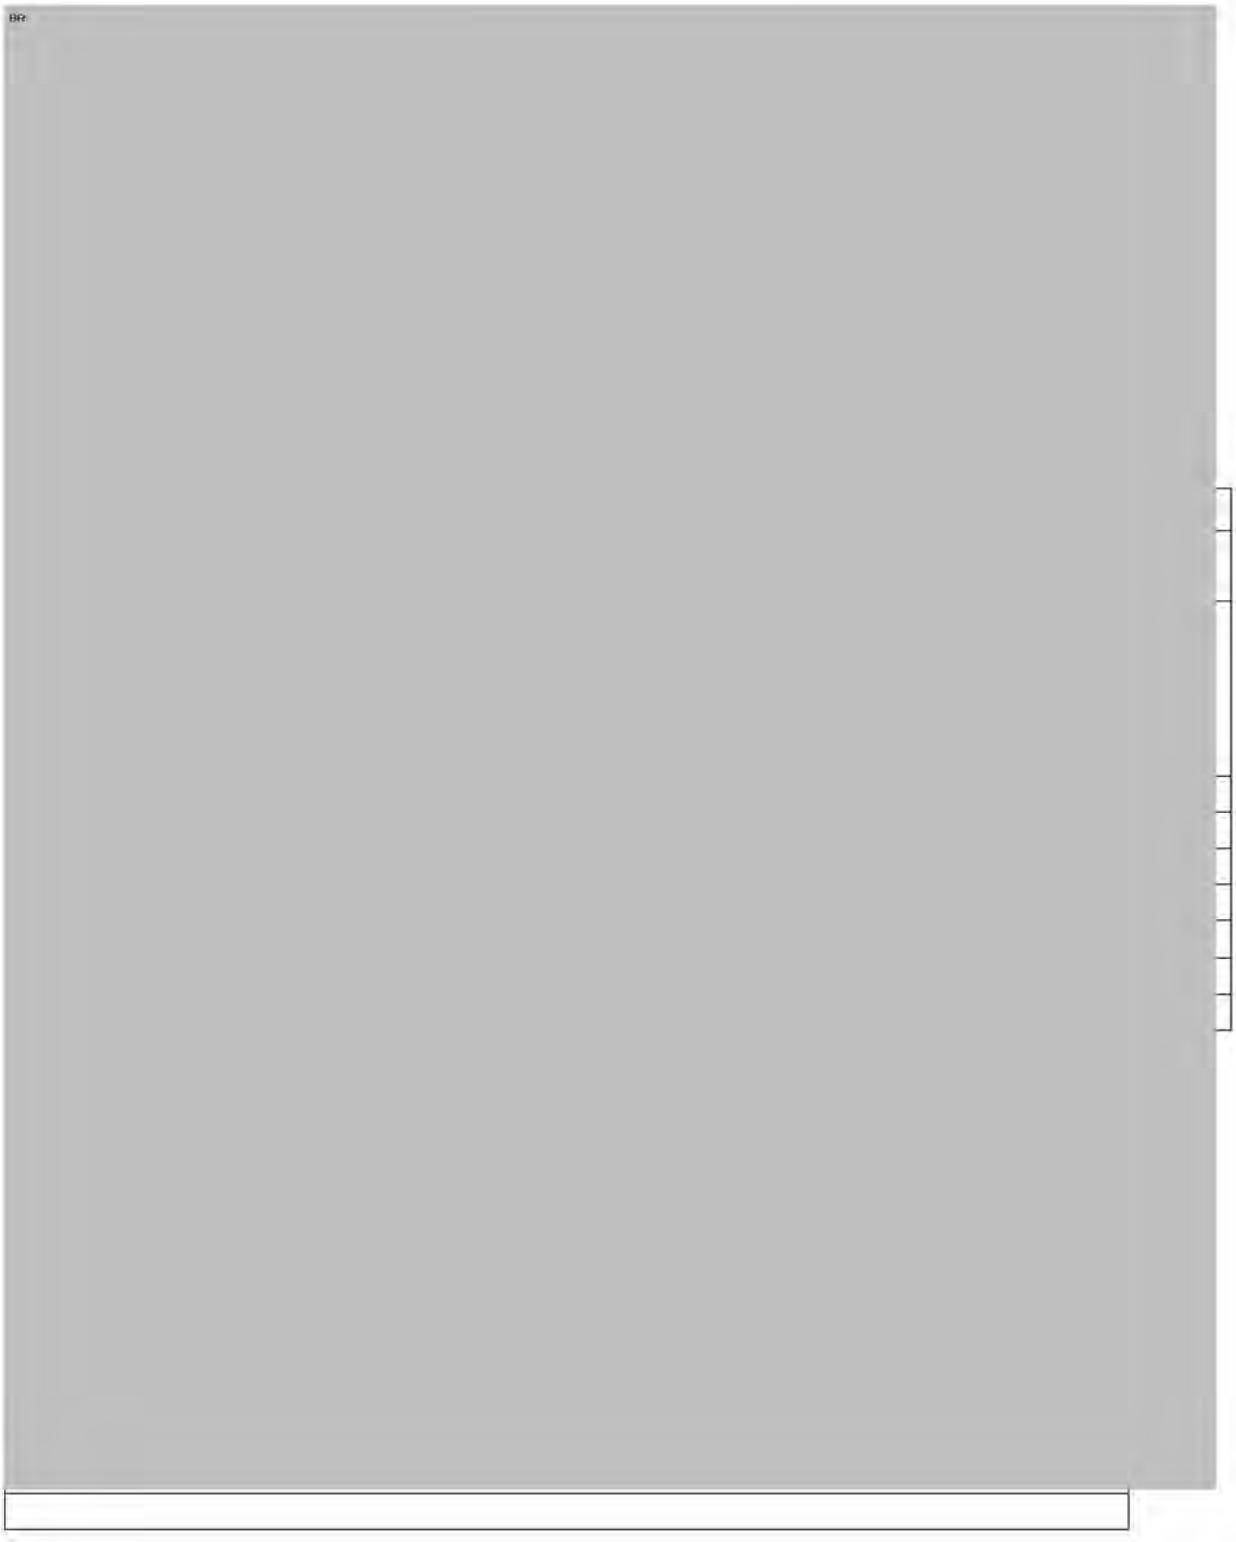
BR

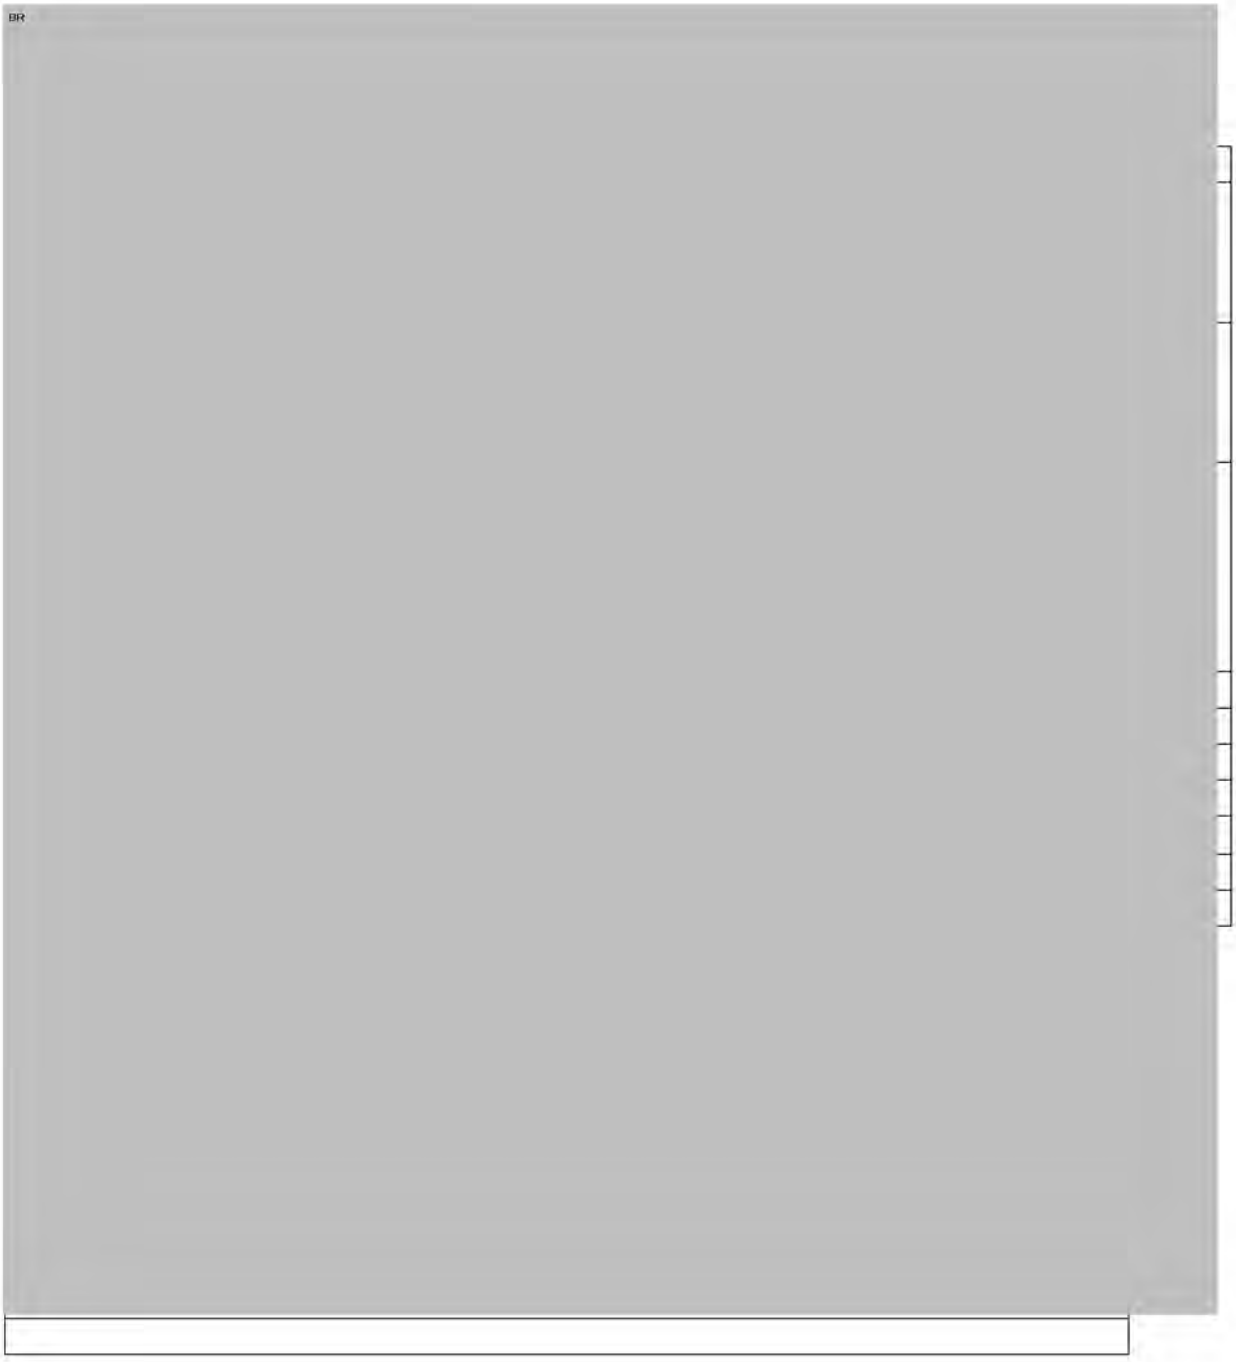
BR

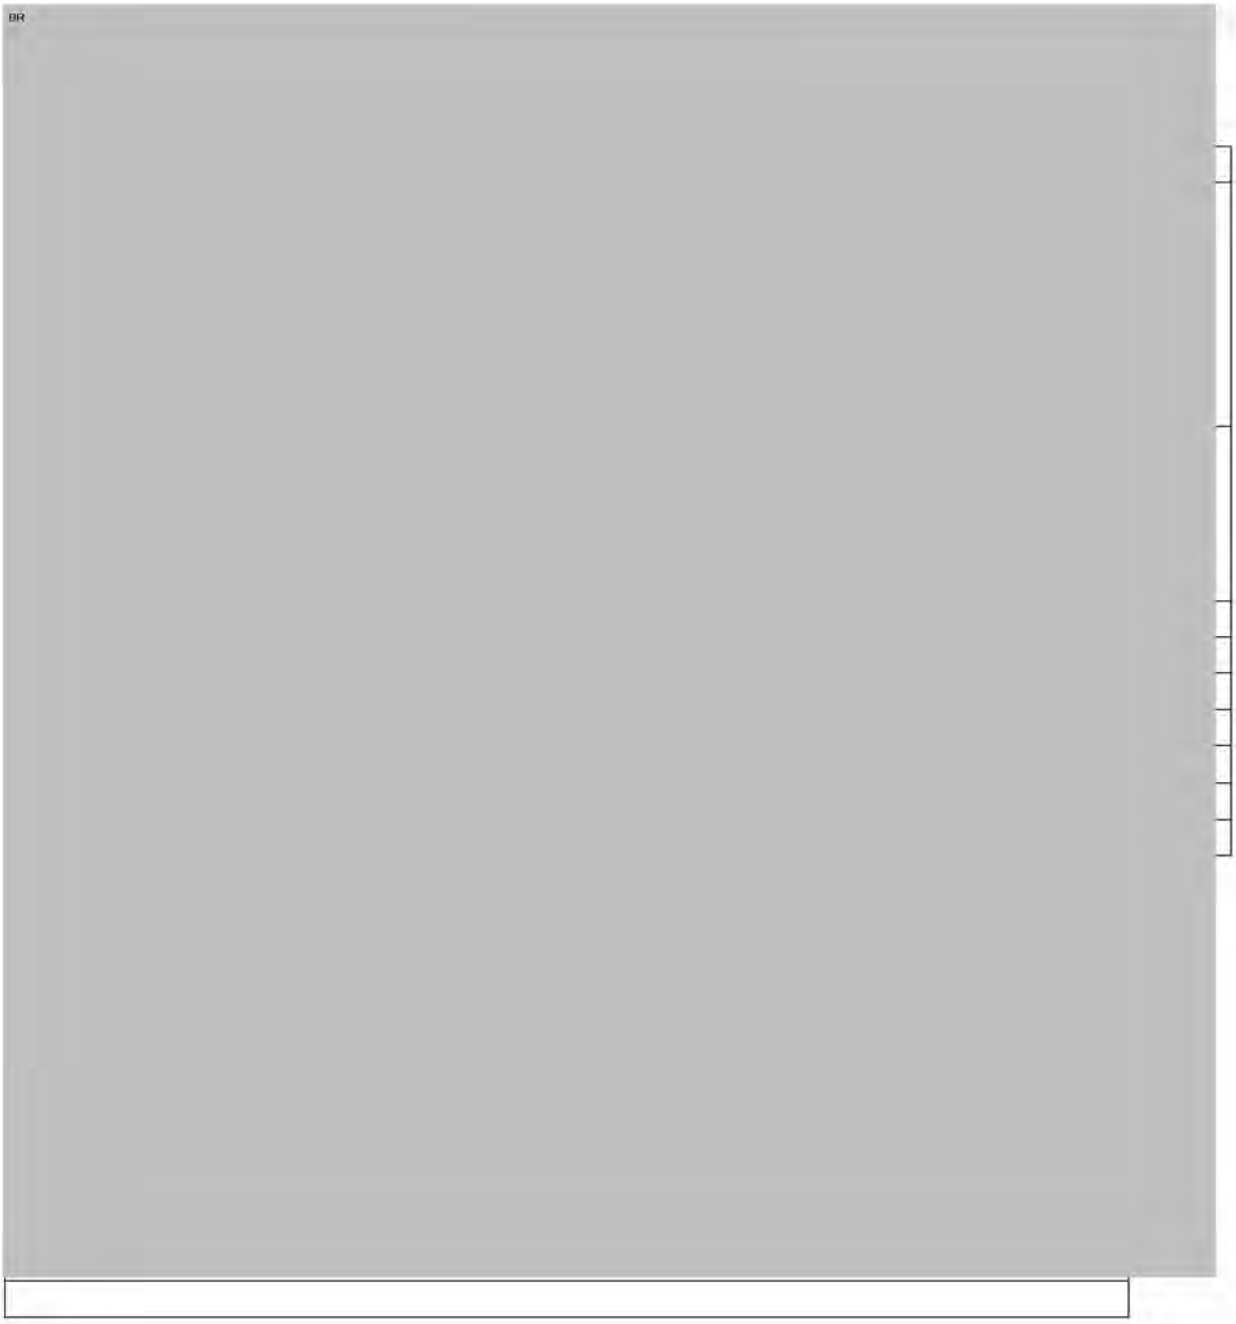

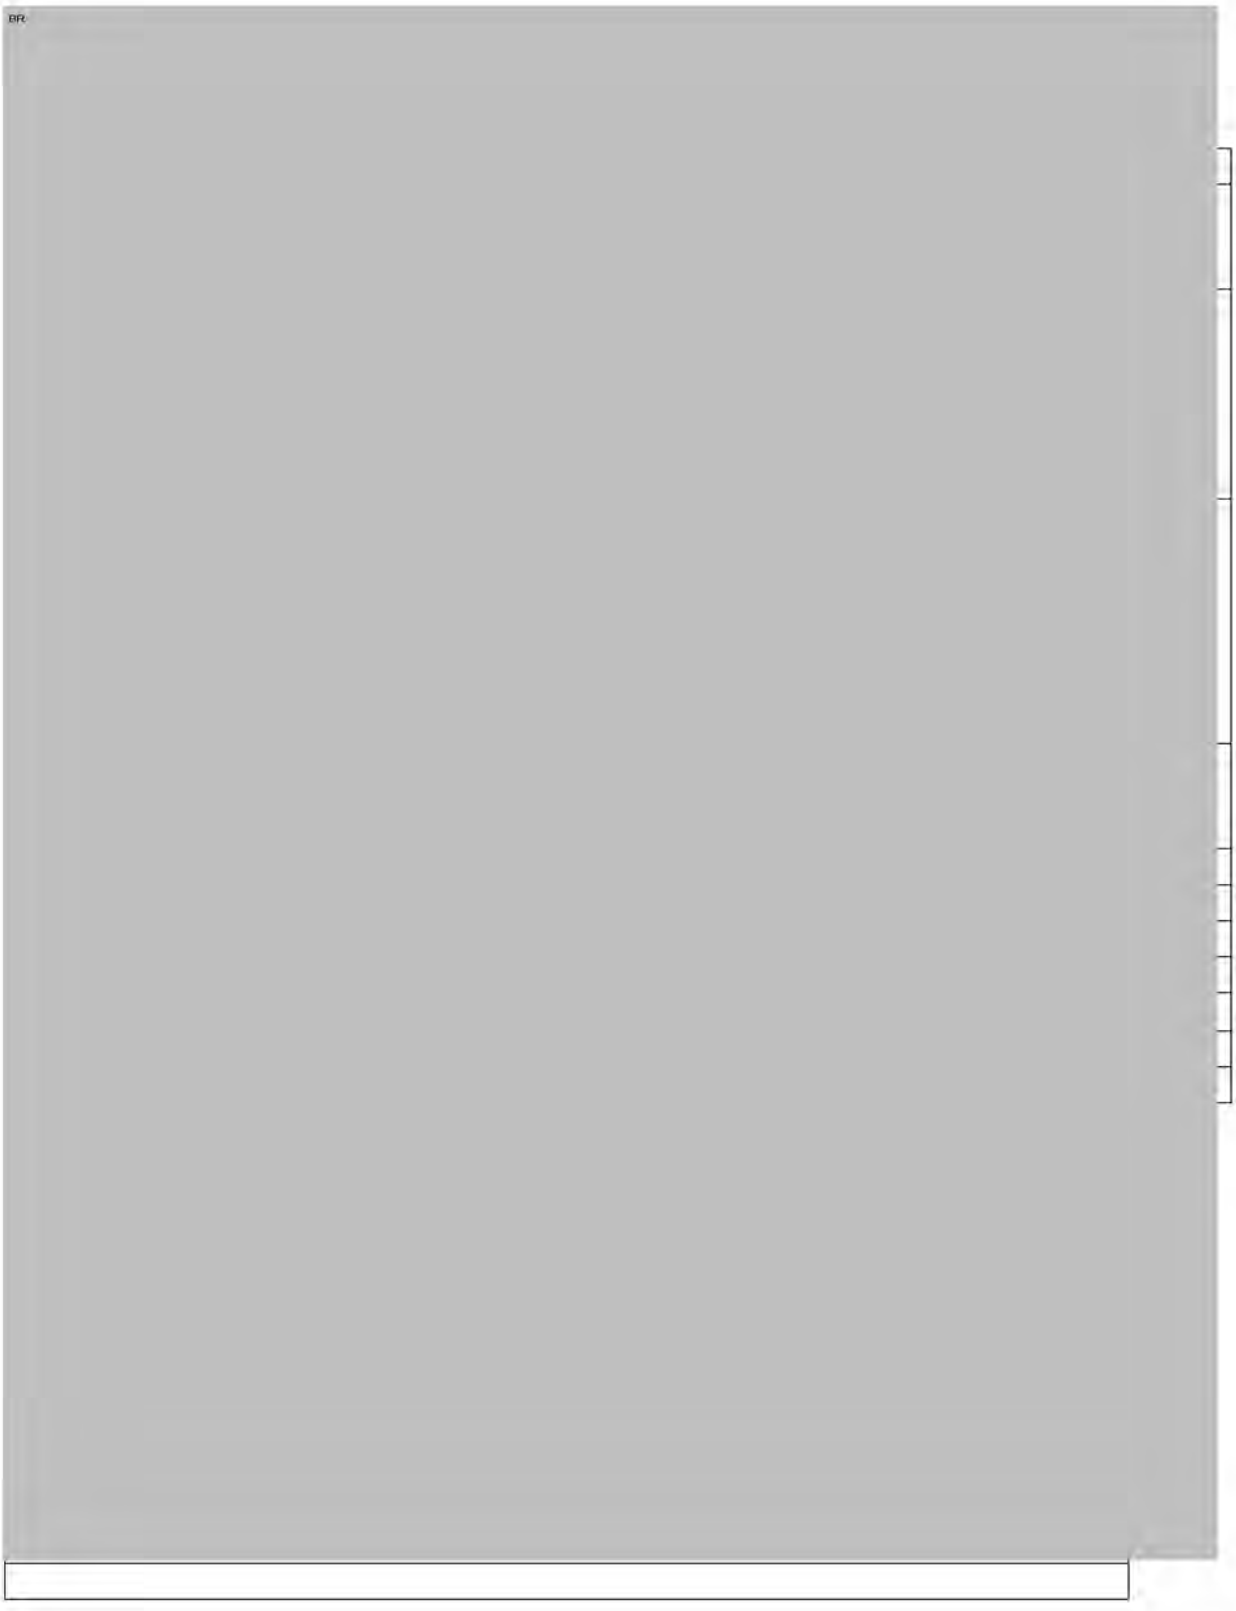

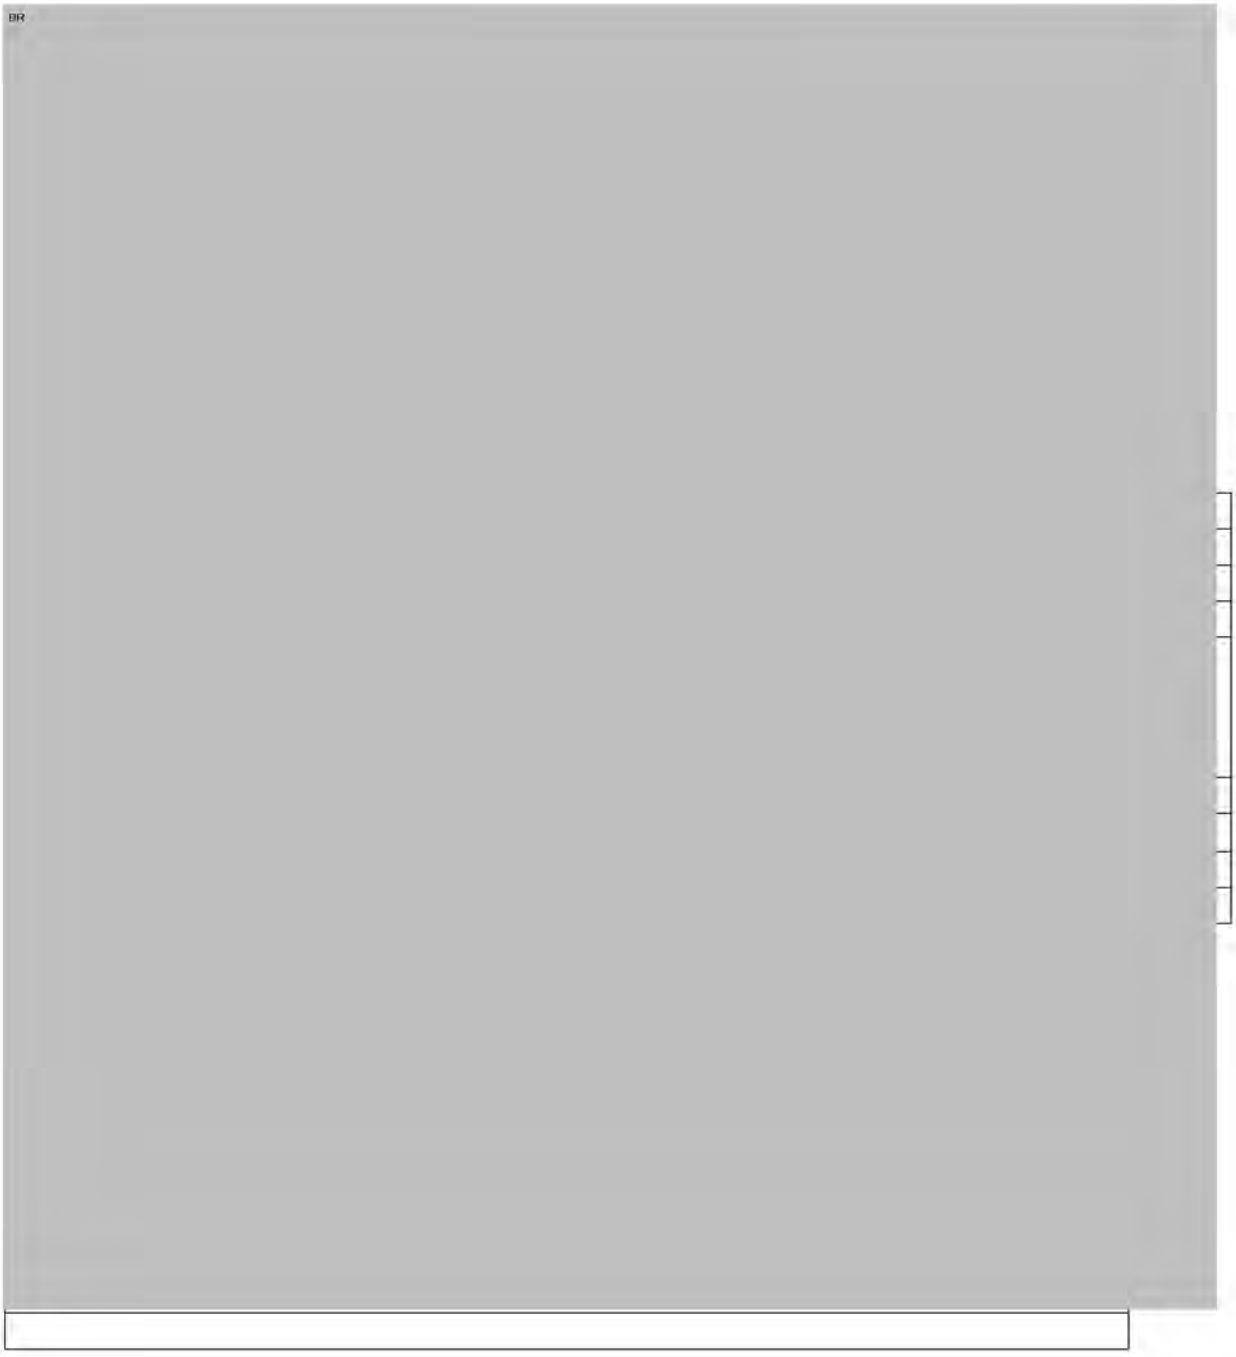

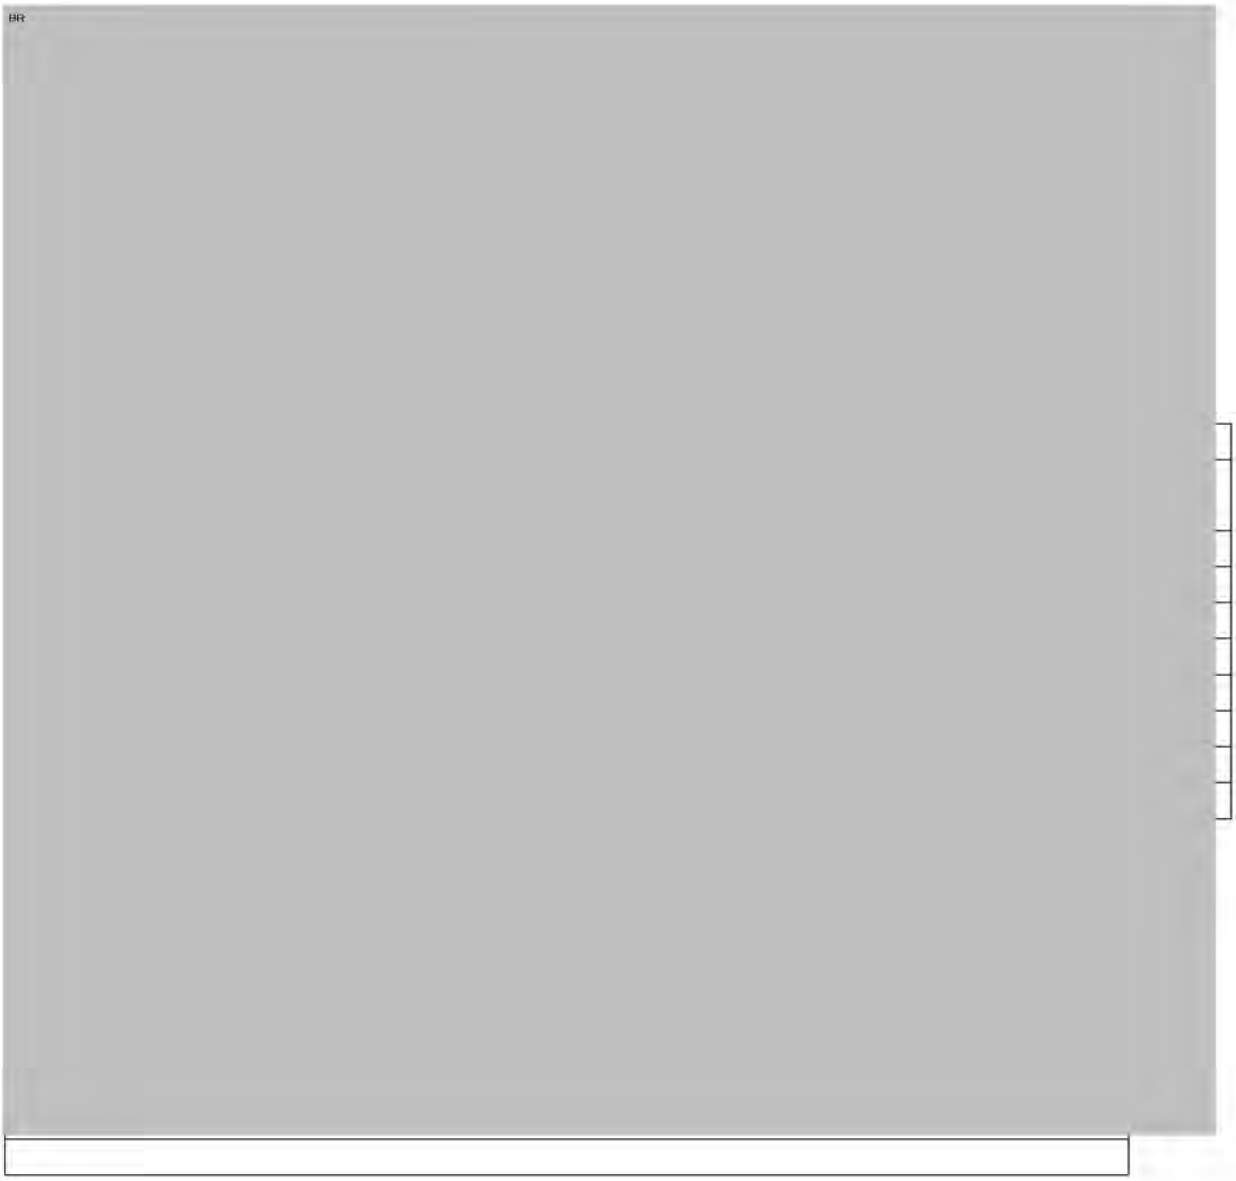
BR

# 5 Projectbeheersing

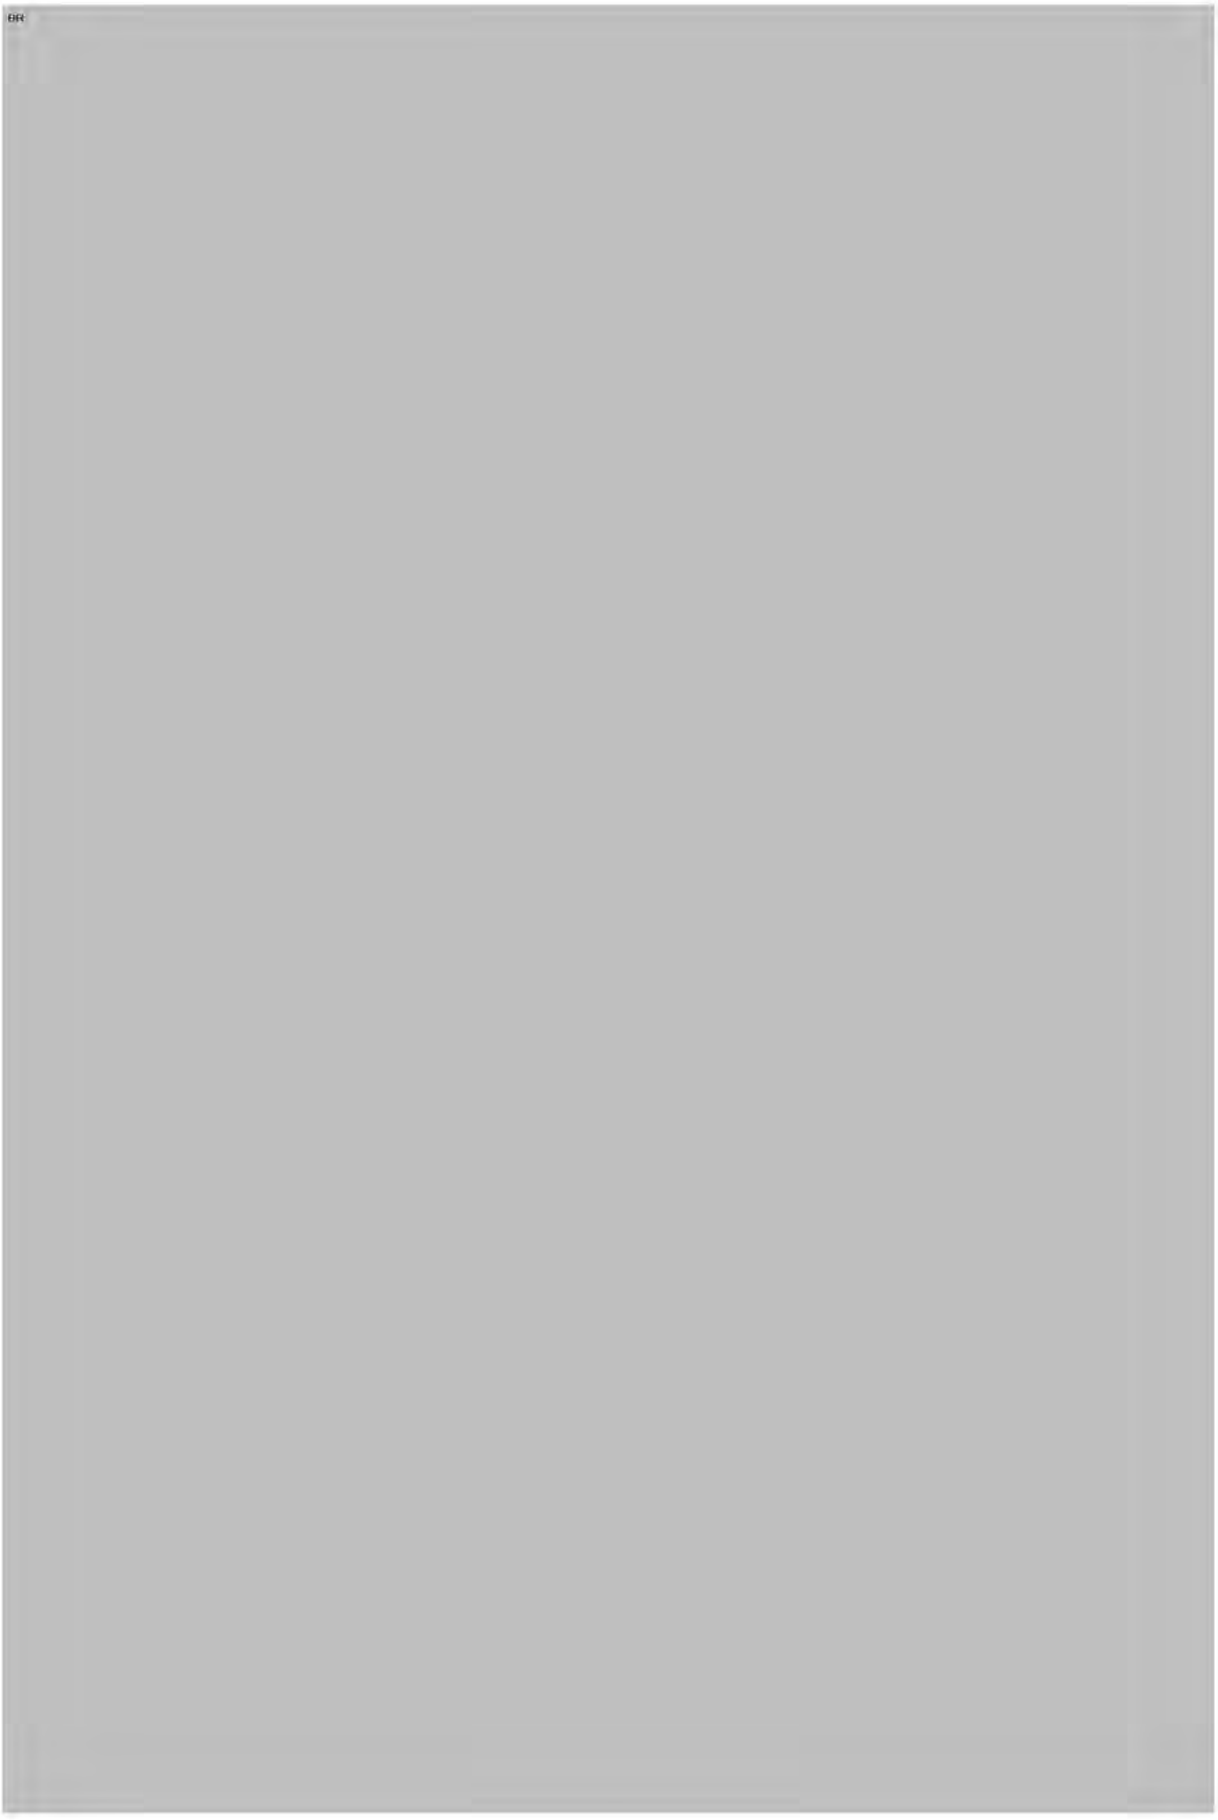

### 5.2.2 Dekkingen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | **2.725.000** | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | pm | pm | 0 | **0** | 0 |

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland

Er zijn in het tweede kwartaal 2017 geen mutaties geweest. De Landschapstafel neemt een subsidie aanvraag voor de inrichting Molenvlietpark in behandeling.

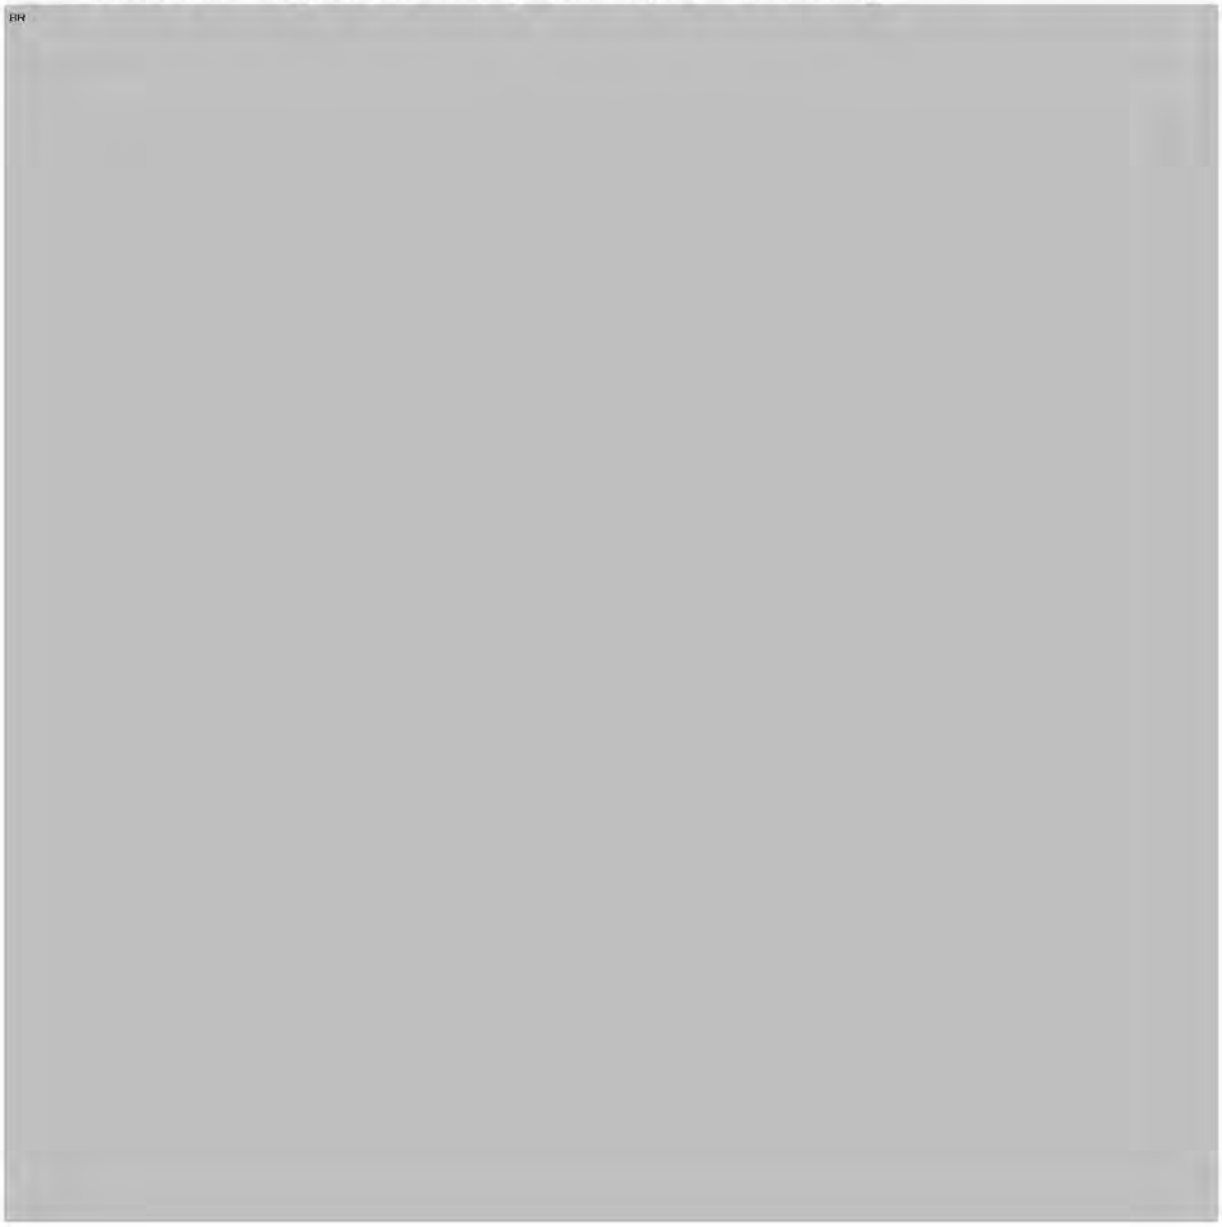

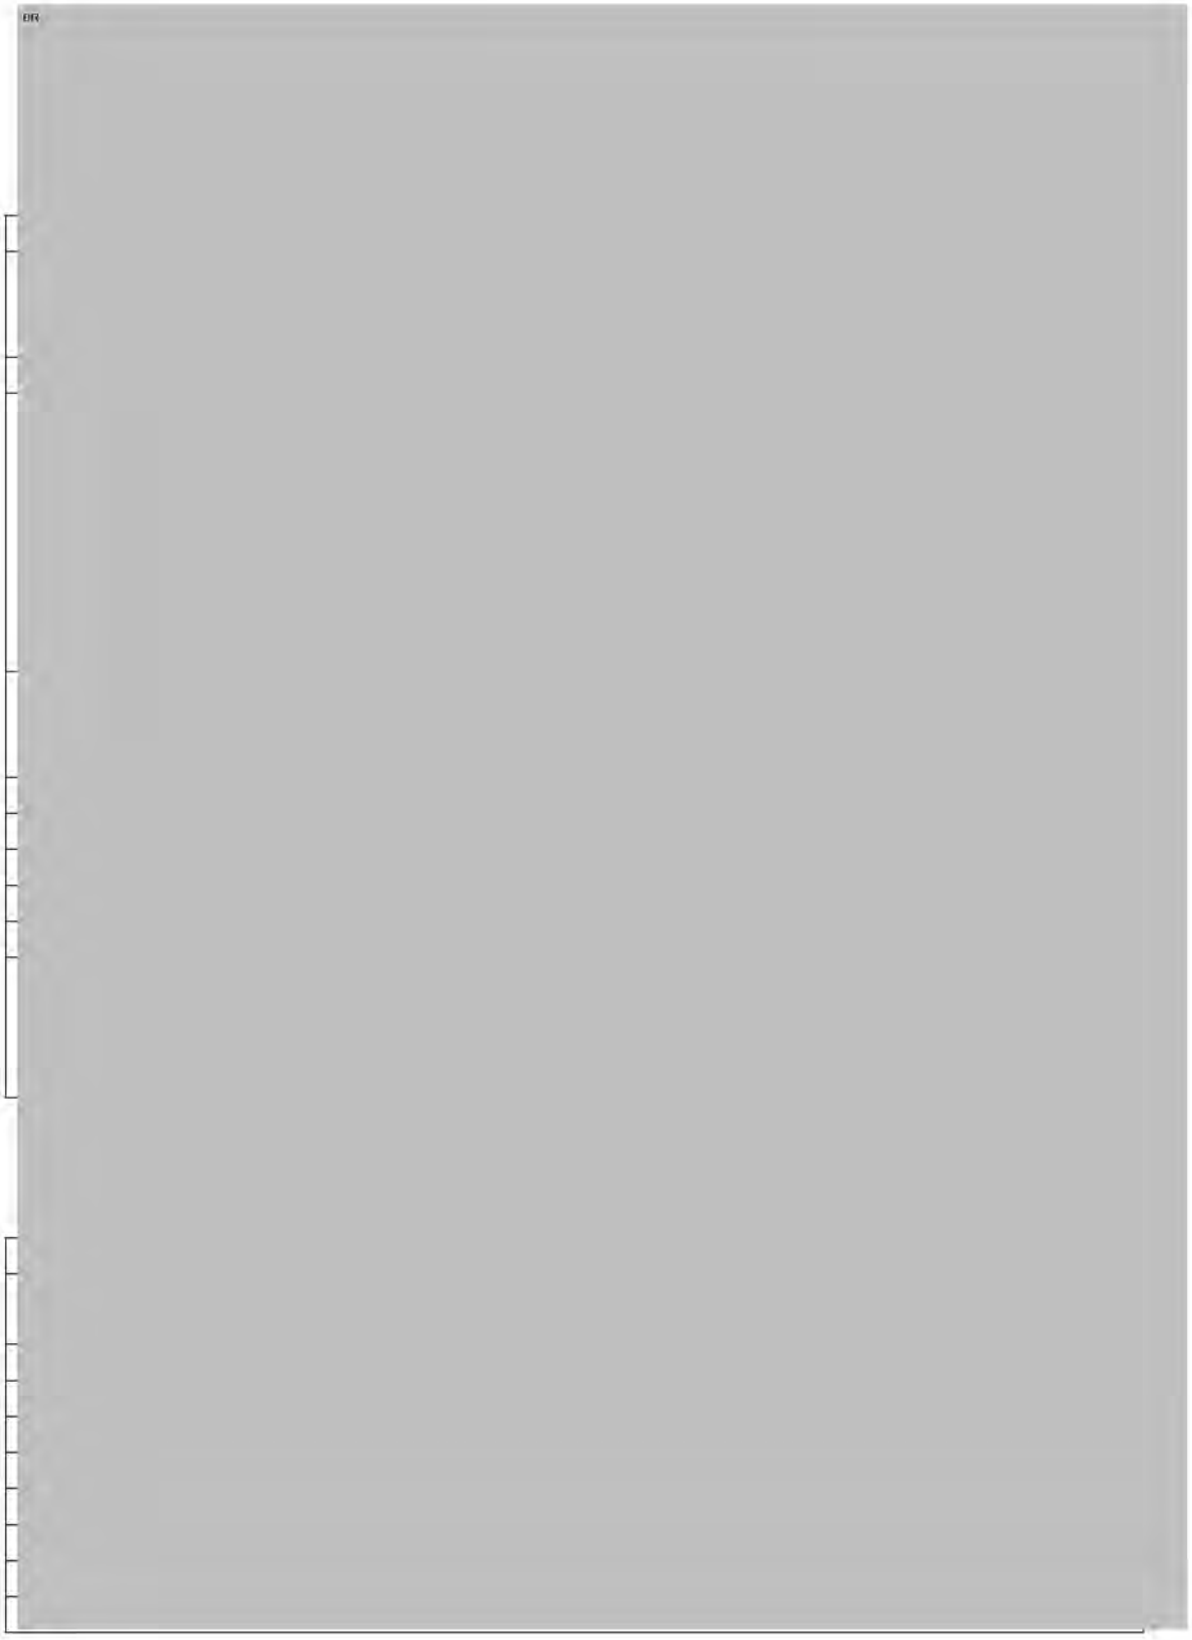

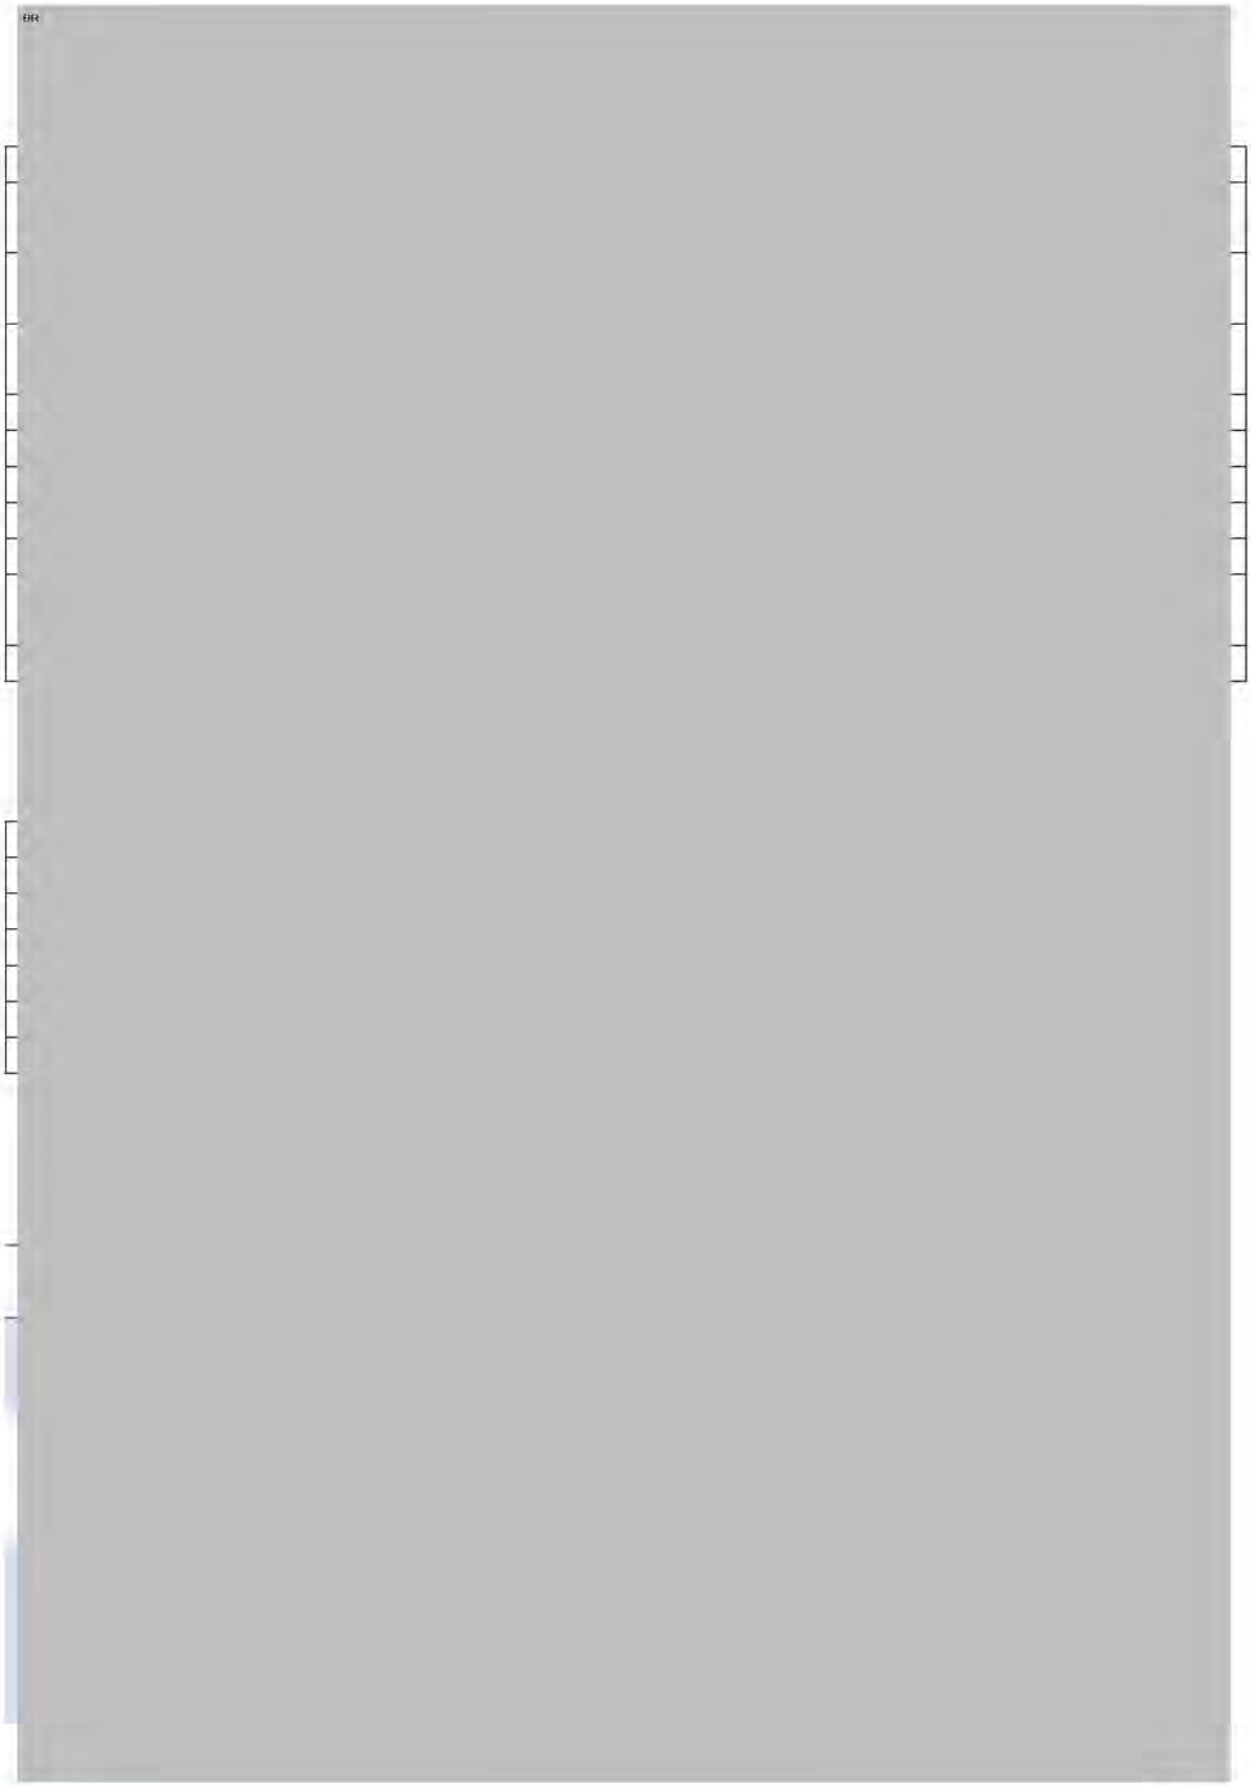

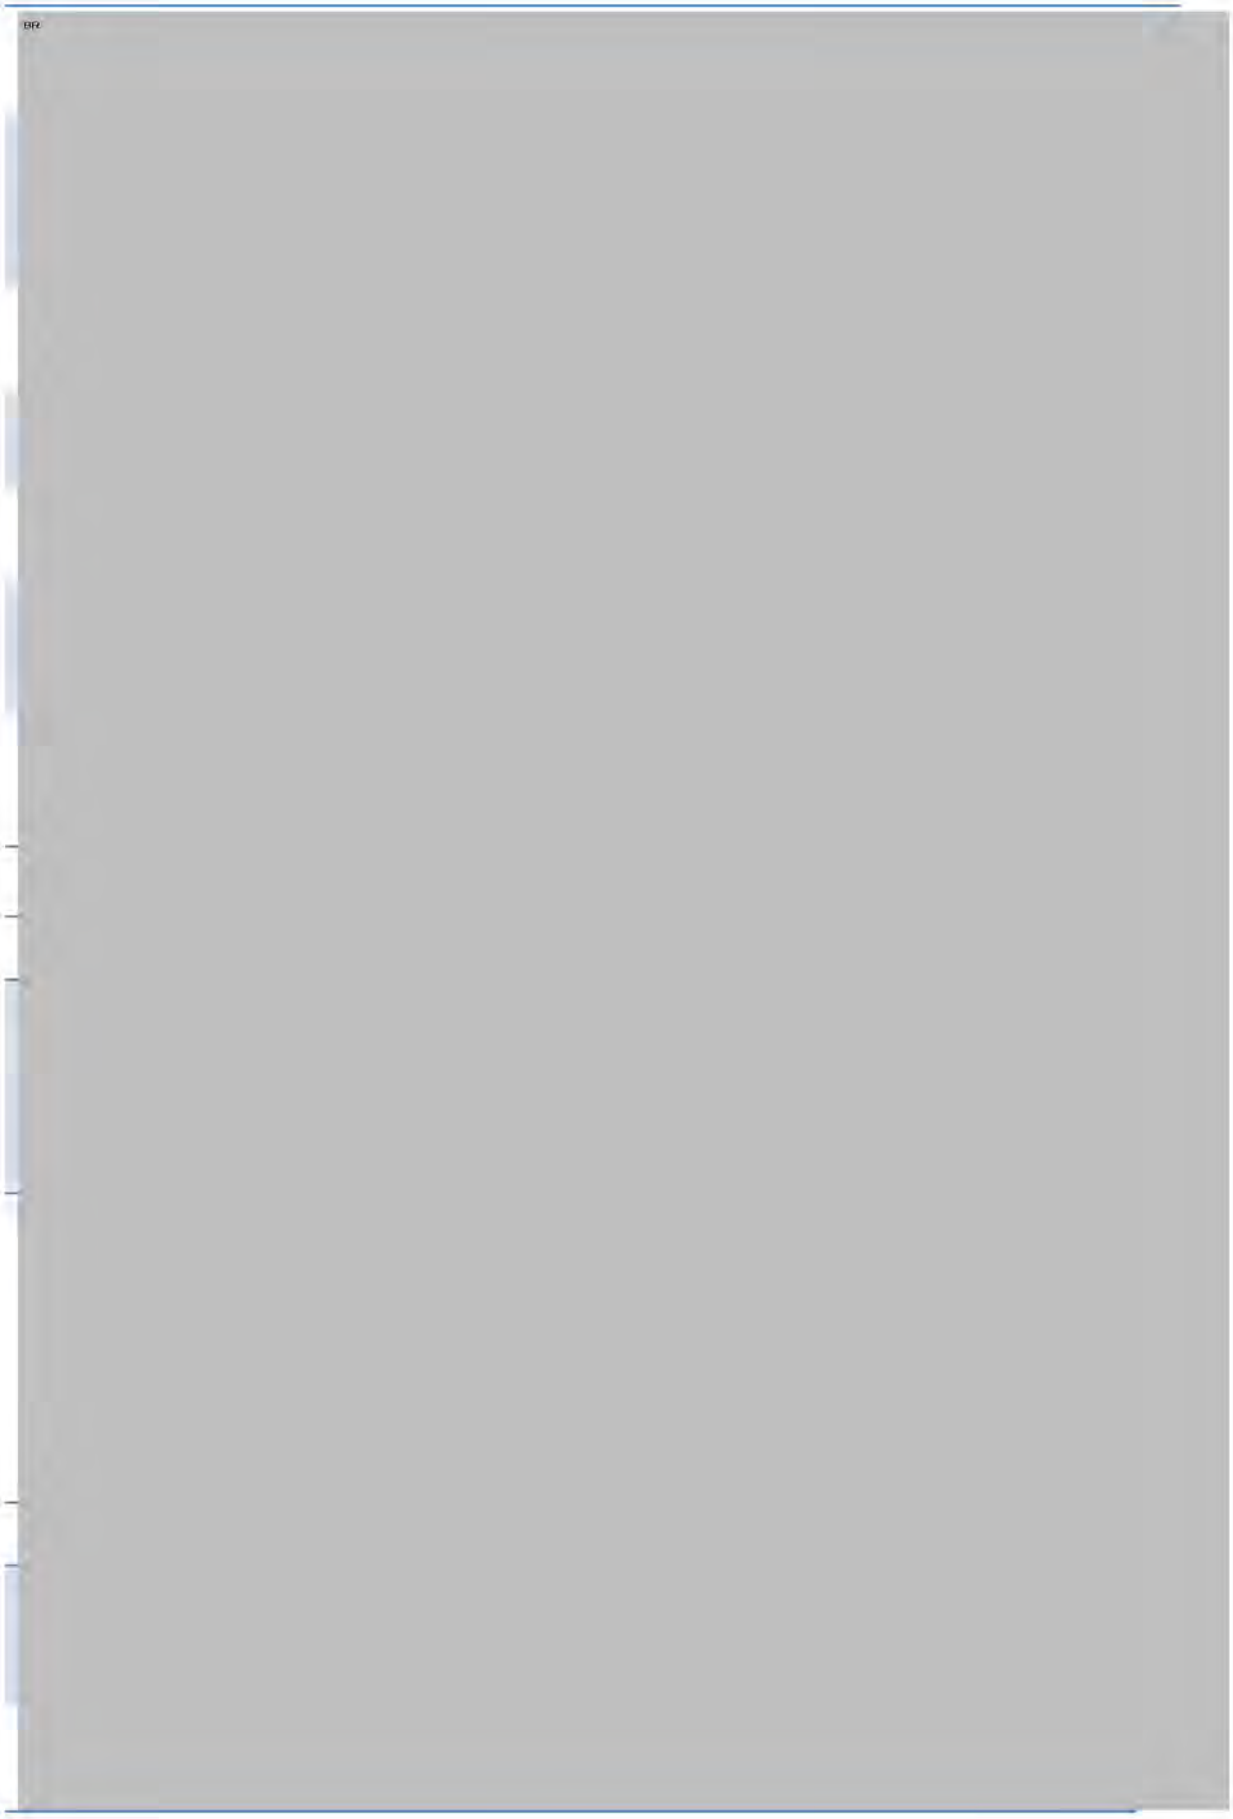
BR

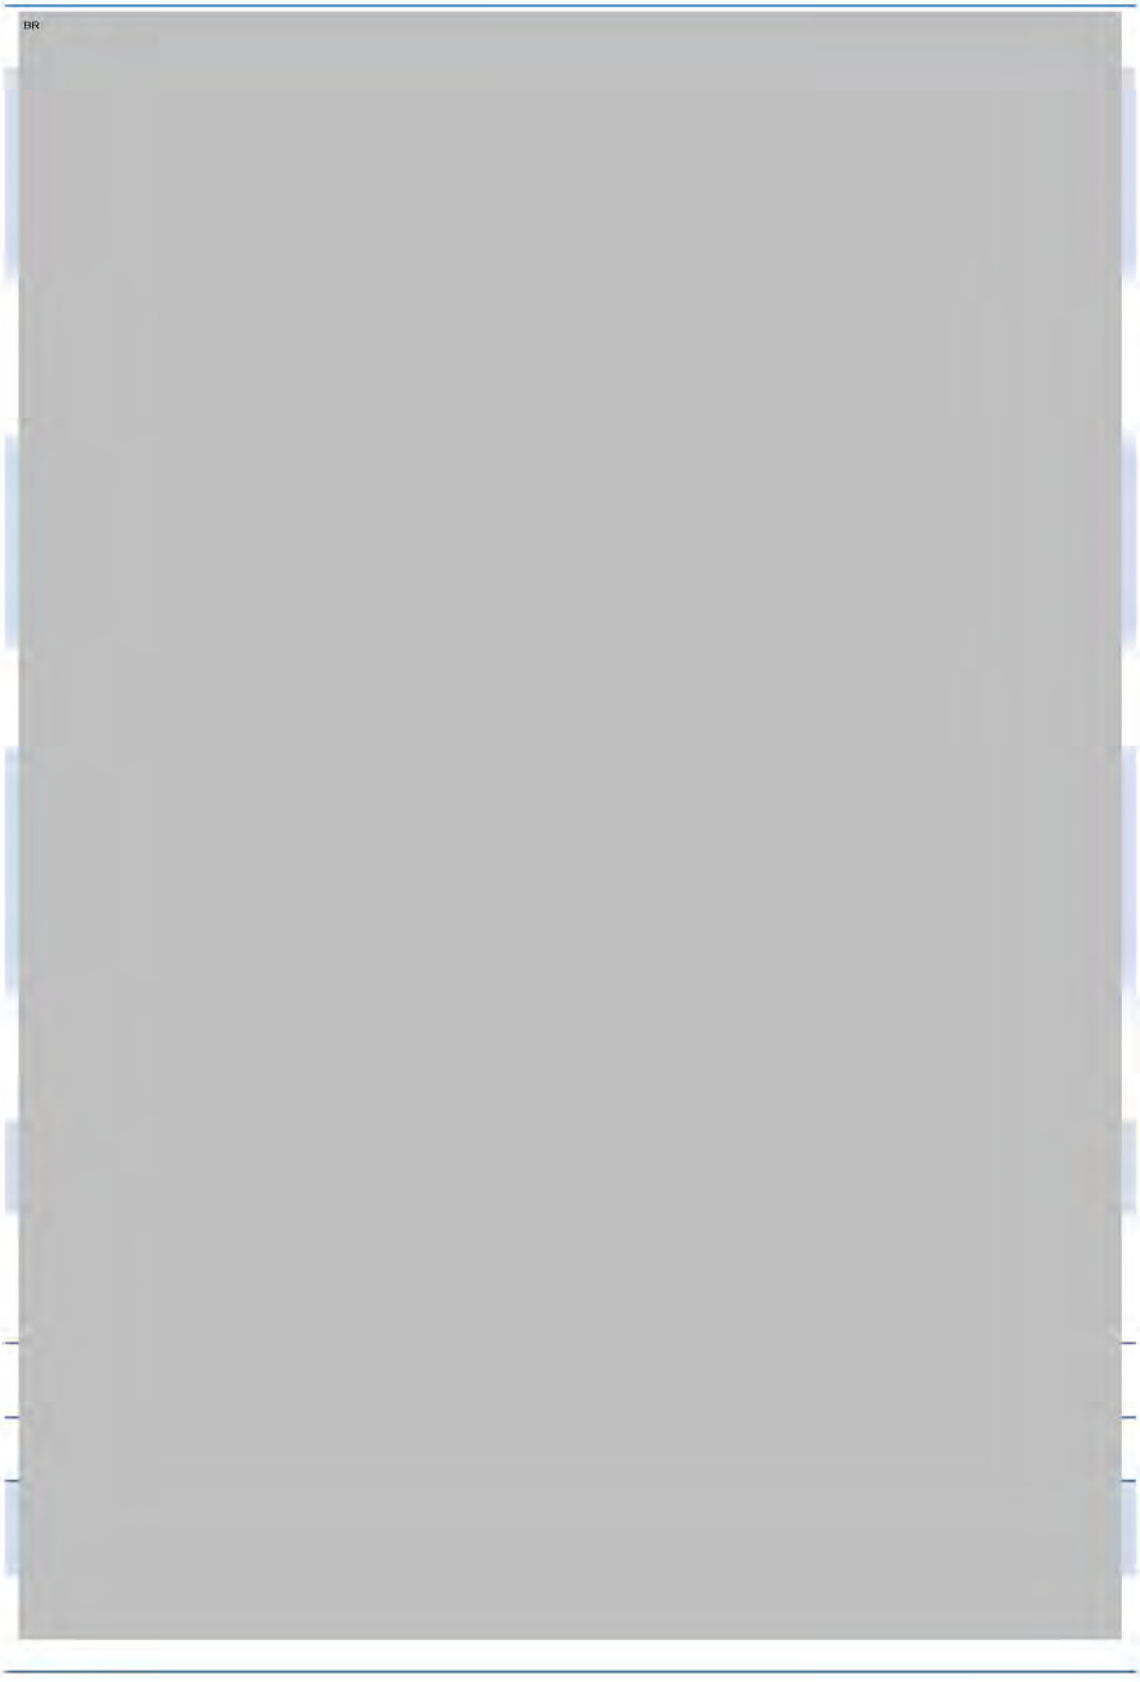
BR

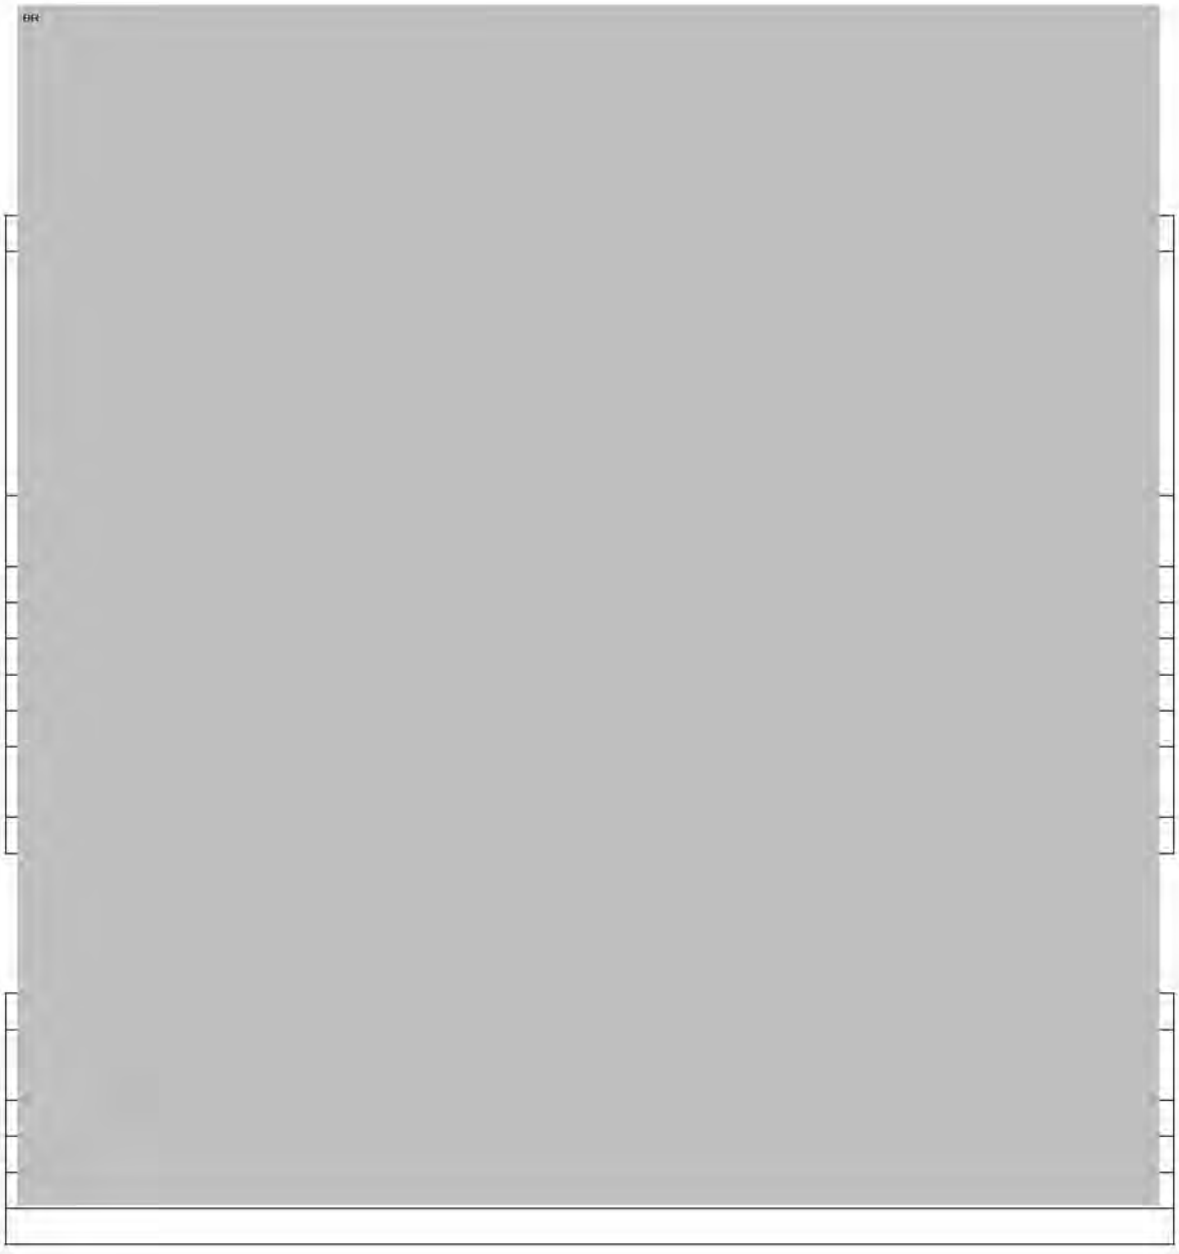

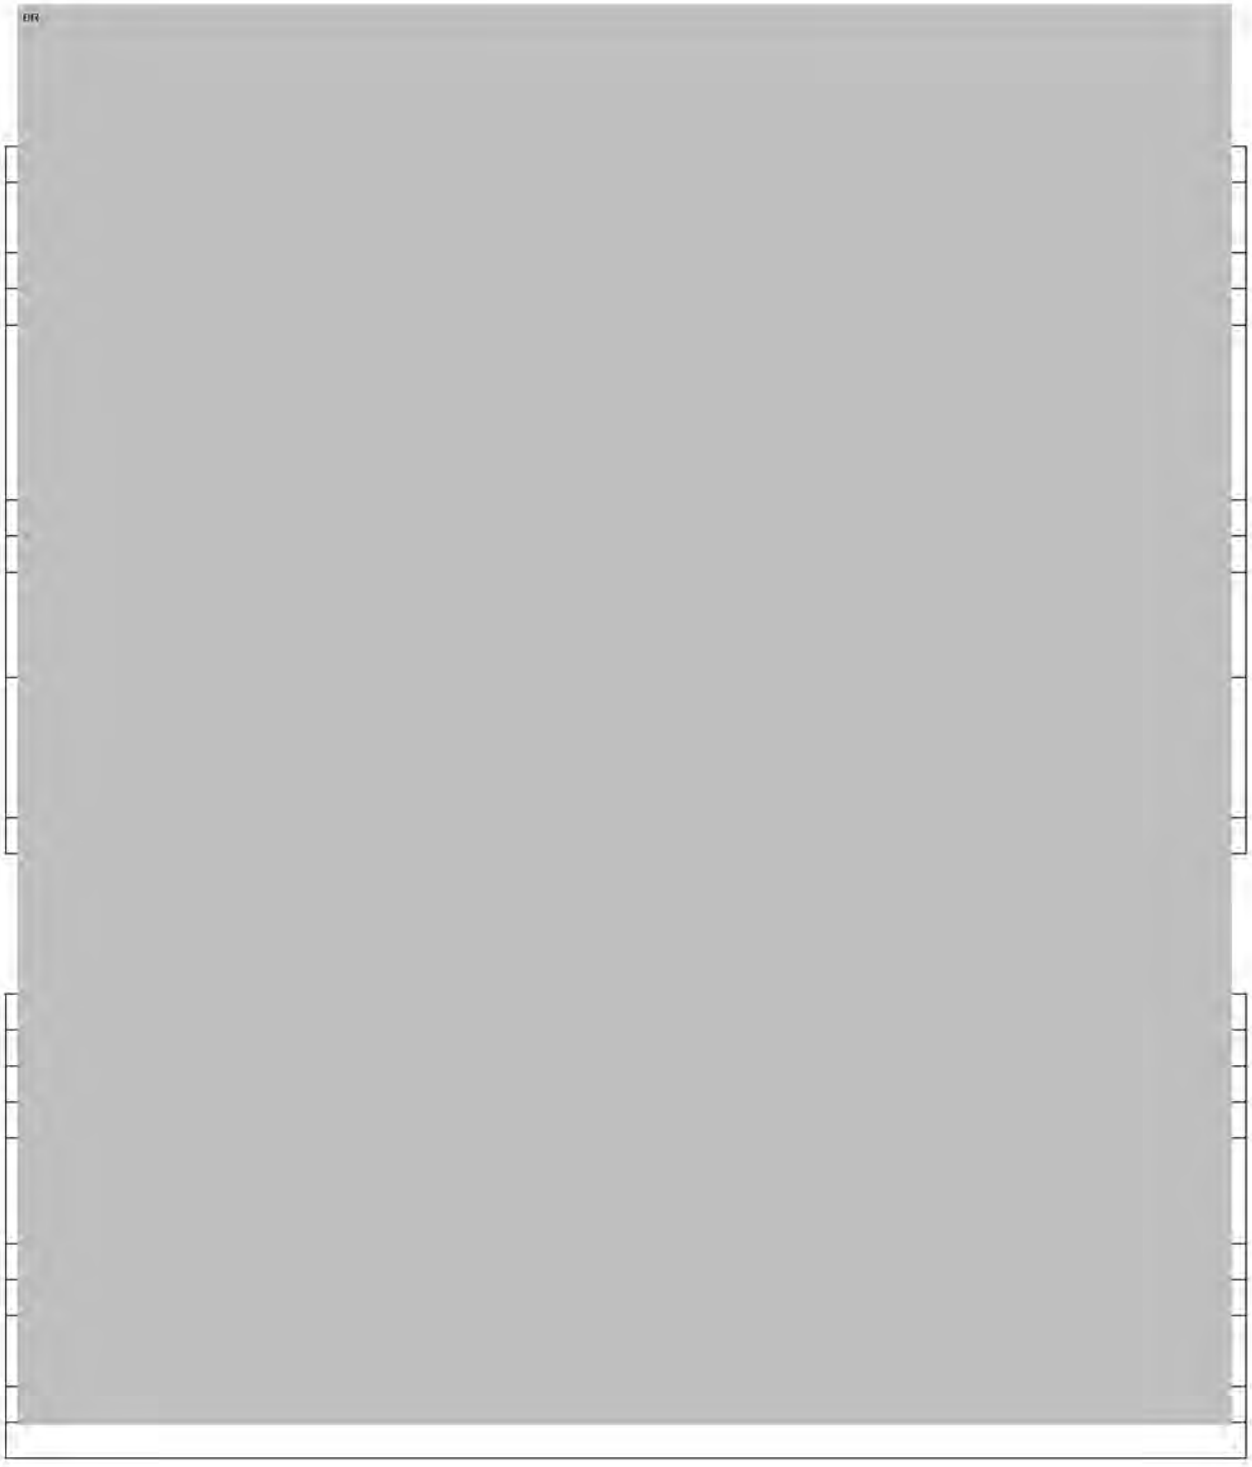

# 6 Bijlage: Uitvoeringsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen uitvoering**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM REFERENTIE-PLANNING (REVISIE C) | MIJLPAAL-DATUM PER 30 JUN 2017 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-PLANNING (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 28-nov-19 | 2 | Gevolg van conservatievere aanname gemiddelde boorsnelheid en nadere uitwerking planning. |

* positief = weken achterstand, negatief = weken voorsprong

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

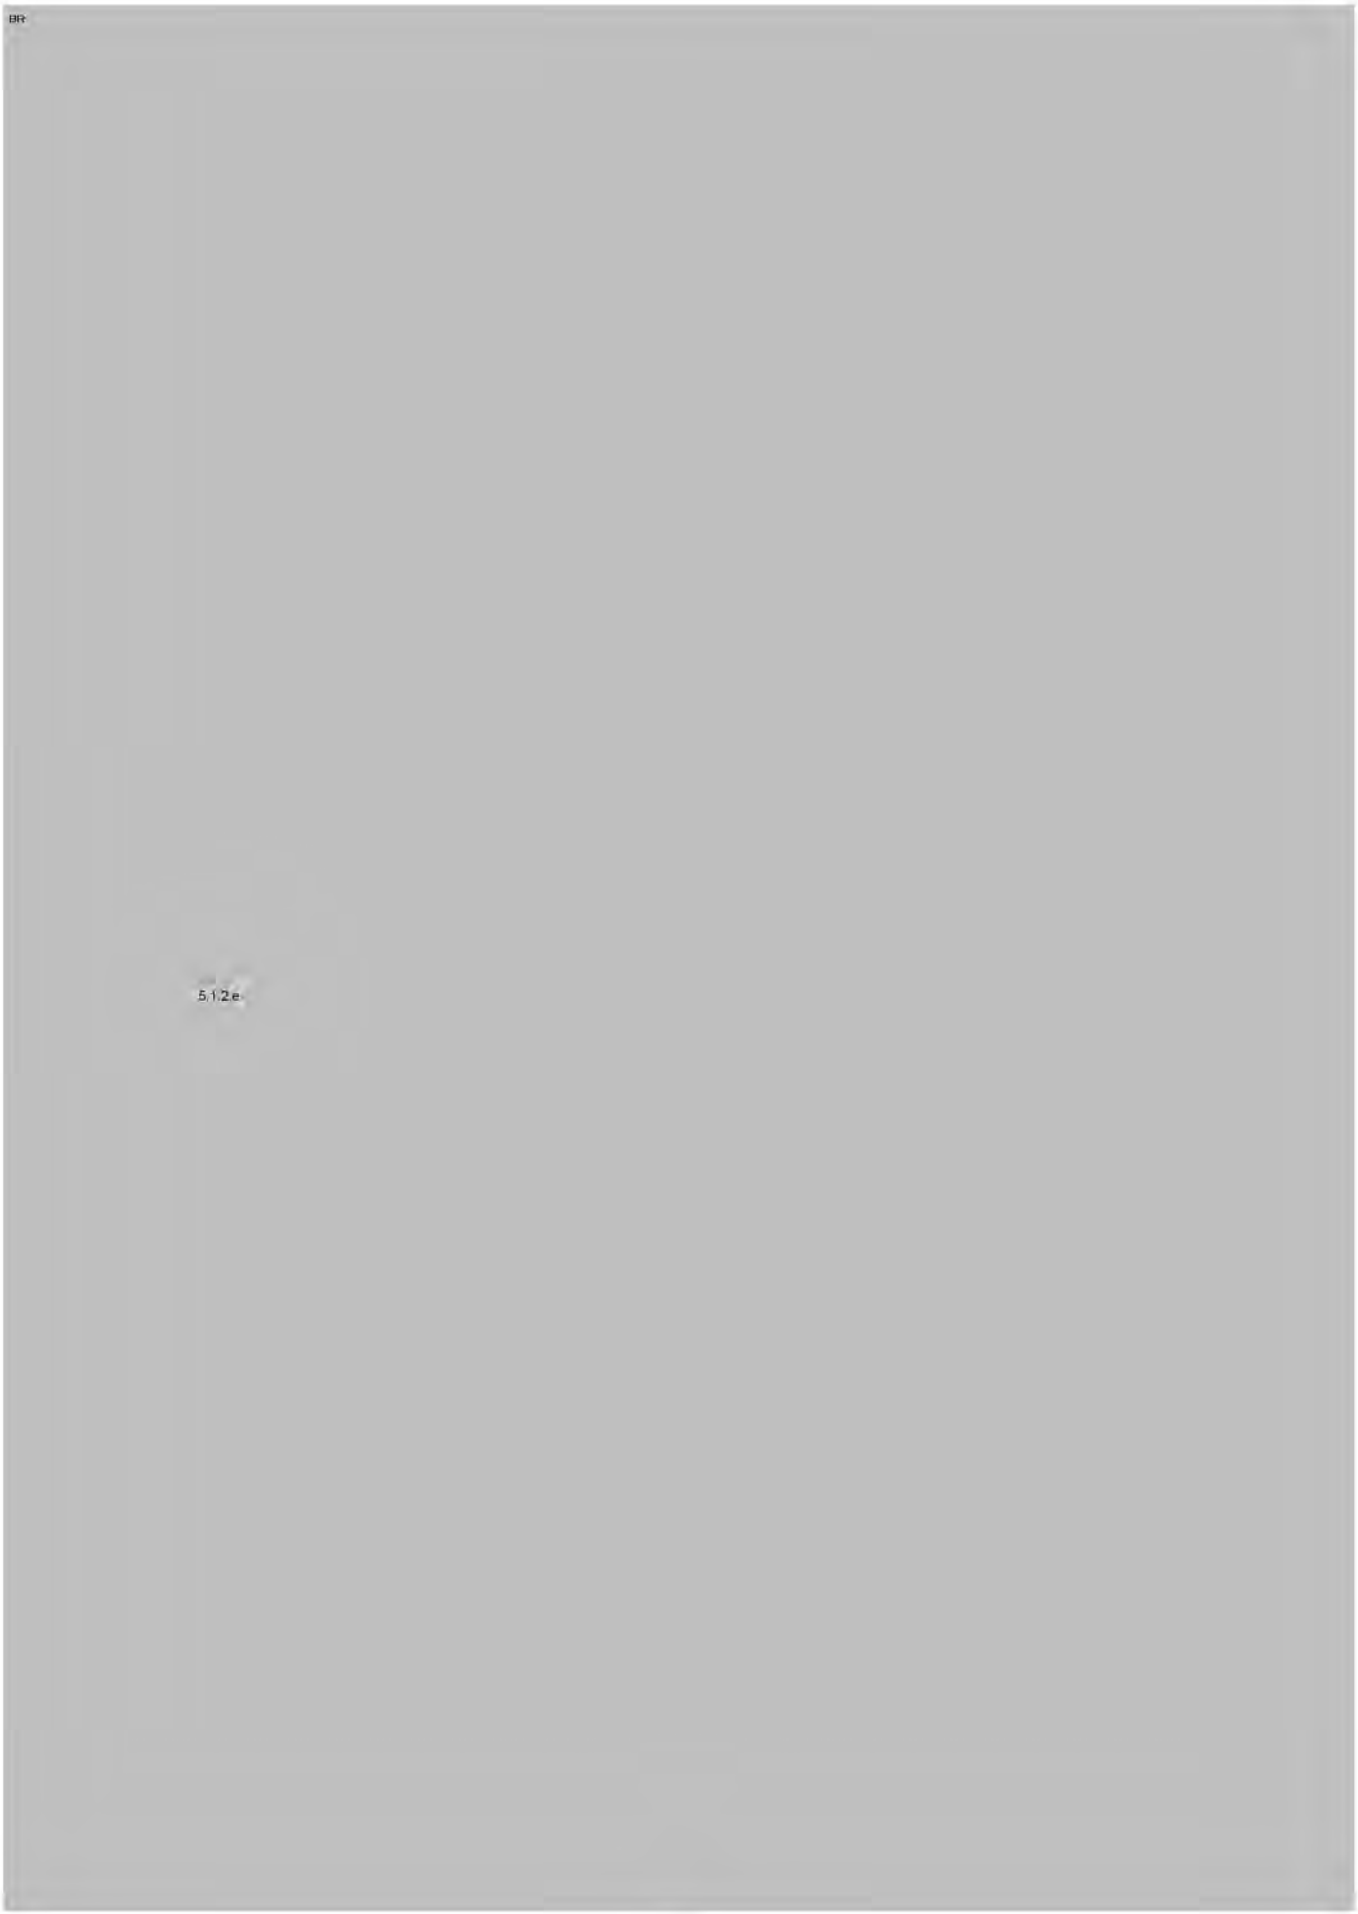
BR
5.1.2.e

Docnr15

Docnr15

BR

Docnr15



Docnr16

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 3e kwartaal 2017

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 23 november 2017**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 3.0**

Docnr16

Docnr16



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 3e kwartaal 2017
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004415

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>10 oktober 2017 | Versie 0.1<br>12 oktober 2017 | Versie 1.0<br>24 oktober 2017 | Versie 2.0<br>15 november 2017 | Versie 3.0<br>23 november 2017 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder BSKB / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

# Inhoudsopgave

1 Managementsamenvatting 5

*1.1 Financiën* 6

*1.2 Planning* 7

*1.3 Risico's* 7

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* 8
2.1.1 Afgelopen kwartaal 8
2.1.2 Komende kwartaal 8

*2.2 Planologie en Vergunningen* 9
2.2.1 Afgelopen kwartaal 9
2.2.2 Komende kwartaal 9

*2.3 Verwervingen* 10
2.3.1 Afgelopen kwartaal 10
2.3.2 Komende kwartaal 10

*2.4 Overeenkomsten* 11
2.4.1 Afgelopen kwartaal 11
2.4.2 Komende kwartaal 11

*2.5 Communicatie* 12
2.5.1 Afgelopen kwartaal 12
2.5.2 Komende kwartaal 13
2.5.3 Diversen 13

3 Projectvoortgang 14

*3.1 Aanbesteden en contracteren* 14
3.1.1 Afgelopen kwartaal 14
3.1.2 Komende kwartaal 14

*3.2 Vormgeving* 15
3.2.1 Afgelopen kwartaal 15
3.2.2 Komende kwartaal 15

*3.3 Monitoring* 16
3.3.1 Afgelopen kwartaal 16
3.3.2 Komende kwartaal 16

*3.4 Inpassing Binckhorst* 17
3.4.1 Afgelopen kwartaal 17
3.4.2 Komende kwartaal 17

*3.5 Inpassing Vlietzone* 18
3.5.1 Afgelopen kwartaal 18
3.5.2 Komende kwartaal 19

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* 21
3.6.1 Afgelopen kwartaal 21
3.6.2 Komende kwartaal 21

*3.7 Boortunnel en toeritten* 23

Docnr16




3.7.1 Afgelopen kwartaal 23
3.7.2 Komende kwartaal 24

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *25*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 25
3.8.2 Komende kwartaal 25

*3.9 Installaties* *27*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 27
3.9.2 Komende kwartaal 28

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *29*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 29
3.10.2 Komende kwartaal 29

*3.11 Uitvoeringskwaliteit* *30*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 30
3.11.2 Komende kwartaal 30

*3.12 Contractmanagement* *31*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 31
3.12.2 Komende kwartaal 31

**4 Overdracht en openstelling** **32**

*4.1 Tunnelveiligheid* *32*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 32
4.1.2 Komende kwartaal 32

*4.2 Overdracht aan beheerders* *33*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 33
4.2.2 Komende kwartaal 33

*4.3 Beheer en onderhoud* *34*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 34
4.3.2 Komende kwartaal 34

**5 Projectbeheersing** **35**

*5.1 Scope* *35*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 35
5.1.2 Komende kwartaal 35

*5.2 Financien* *36*
5.2.1 Kostenstructuur 36
5.2.2 Dekkingen 37

*5.3 Planning* *39*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 39
5.3.2 Komende kwartaal 39

*5.4 Risico's* *40*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 40
5.4.2 Komende kwartaal 40
5.4.3 Financiële toprisico's 40
5.4.4 Toprisico's planning 41

*5.5 Interne kwaliteit* *43*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 43

Docnr16



5.5.2 Komende kwartaal 43

*5.6 Informatiebeheer* *44*

5.6.1 Afgelopen kwartaal 44

5.6.2 Komende kwartaal 44

*5.7 Organisatie* *45*

5.7.1 Afgelopen kwartaal 45

5.7.2 Komende kwartaal 45

6 Bijlage: Uitvoeringsmijlpalen 46

7 Bijlage: Contractmijlpalen en Trendanalyse 47

8 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 49

9 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 51

# 1 Managementsamenvatting

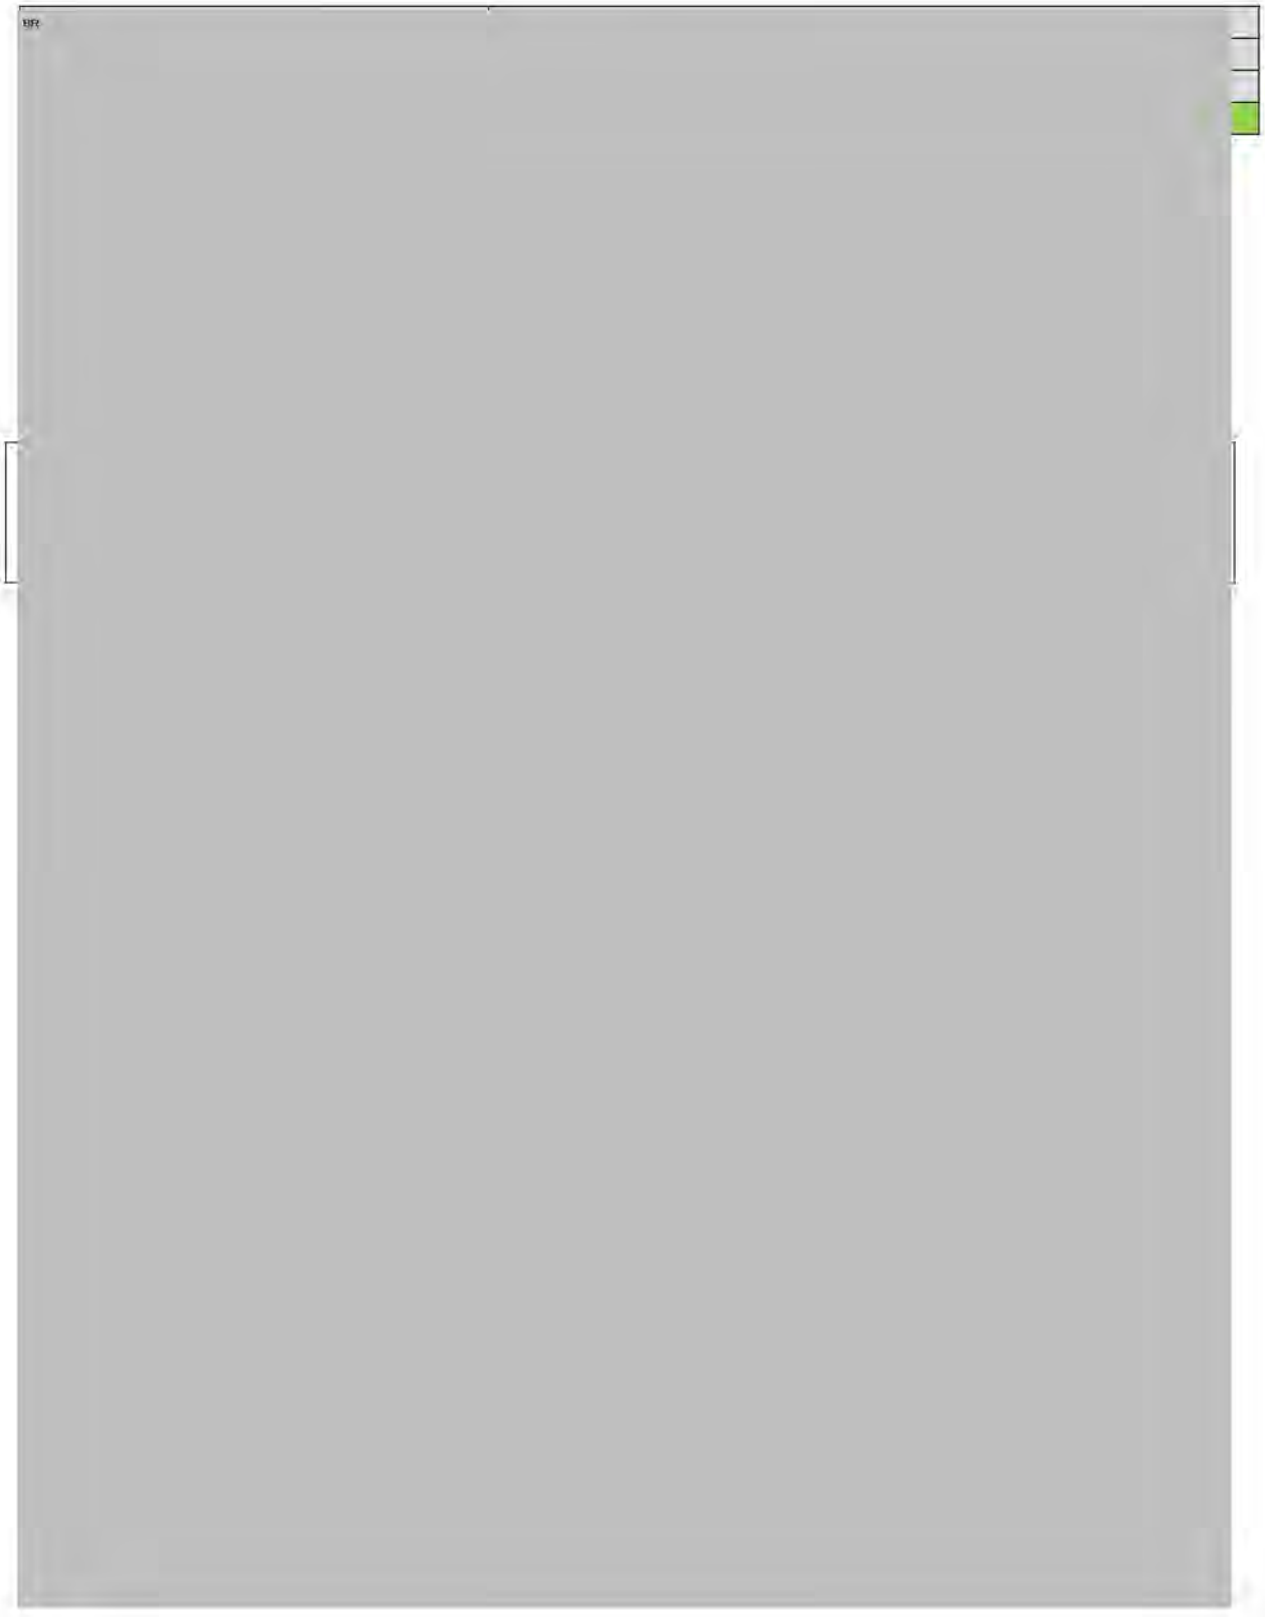

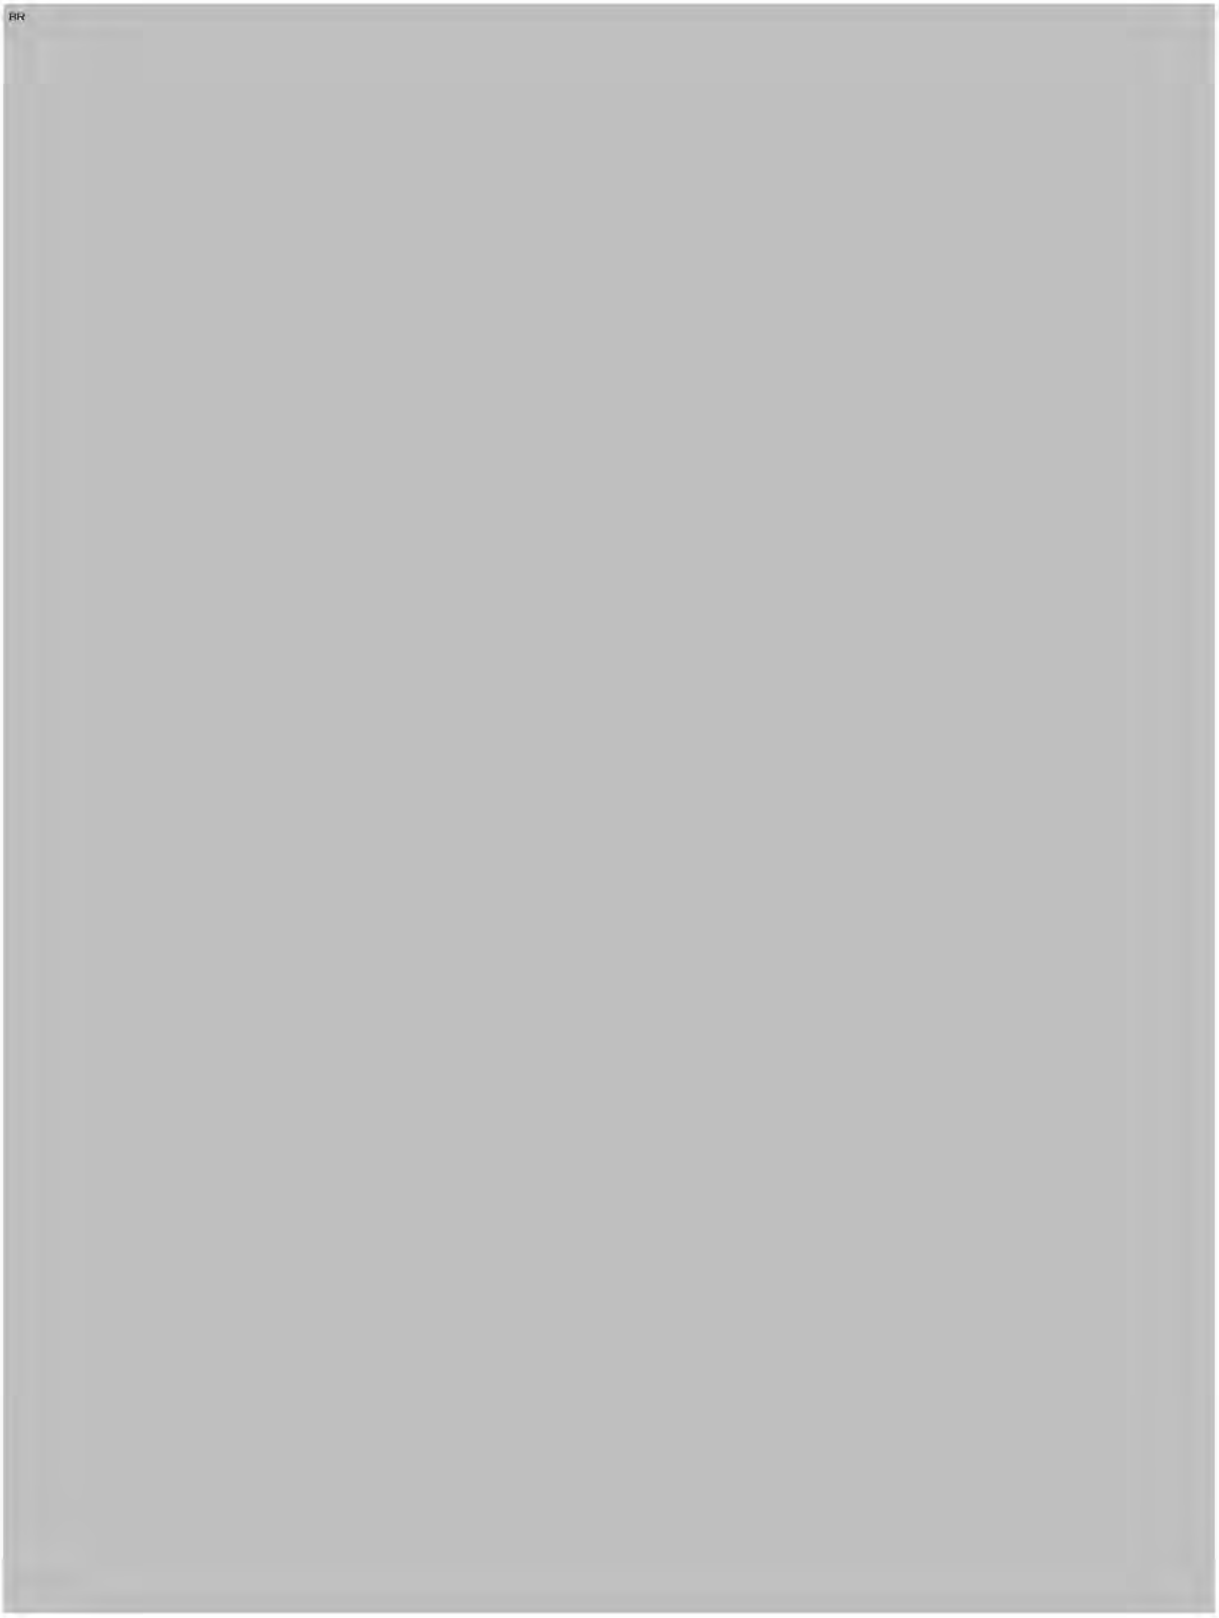
RR

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Alternatievenonderzoek waterinlaat richting bergingsgebied in het Molenvlietpark. | Dossier is in afwachting van het locatiebezoek door wethouder, 5.1.2.e (PUK Nieuw Vredenoord) en 5.1.2.e 5.1.2.e (Roba/waterinlaat) aan 5.1.2.e In afwachting van de uitkomsten van dit overleg is het proces om te komen tot een SOK voor de waterinlaat met de familie 5.1.2.e "on hold" gezet. |
| BR | |

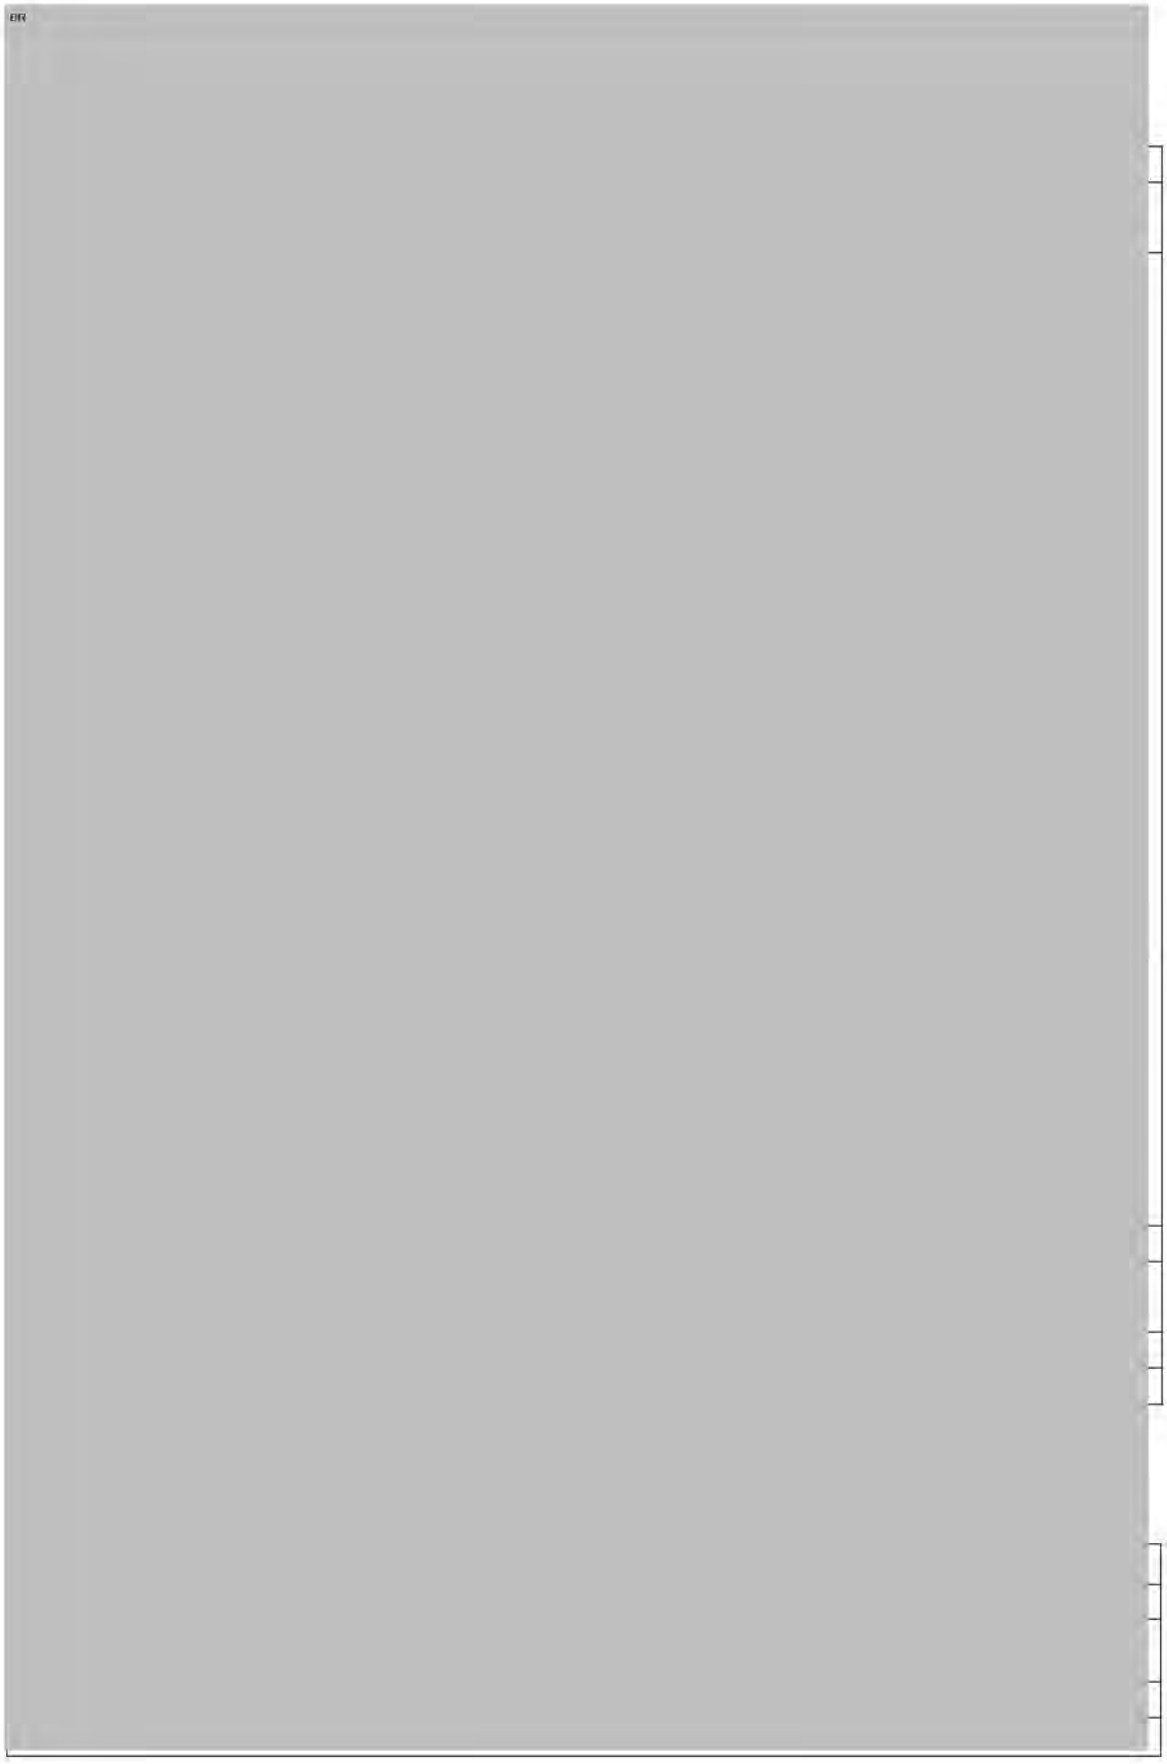
BR

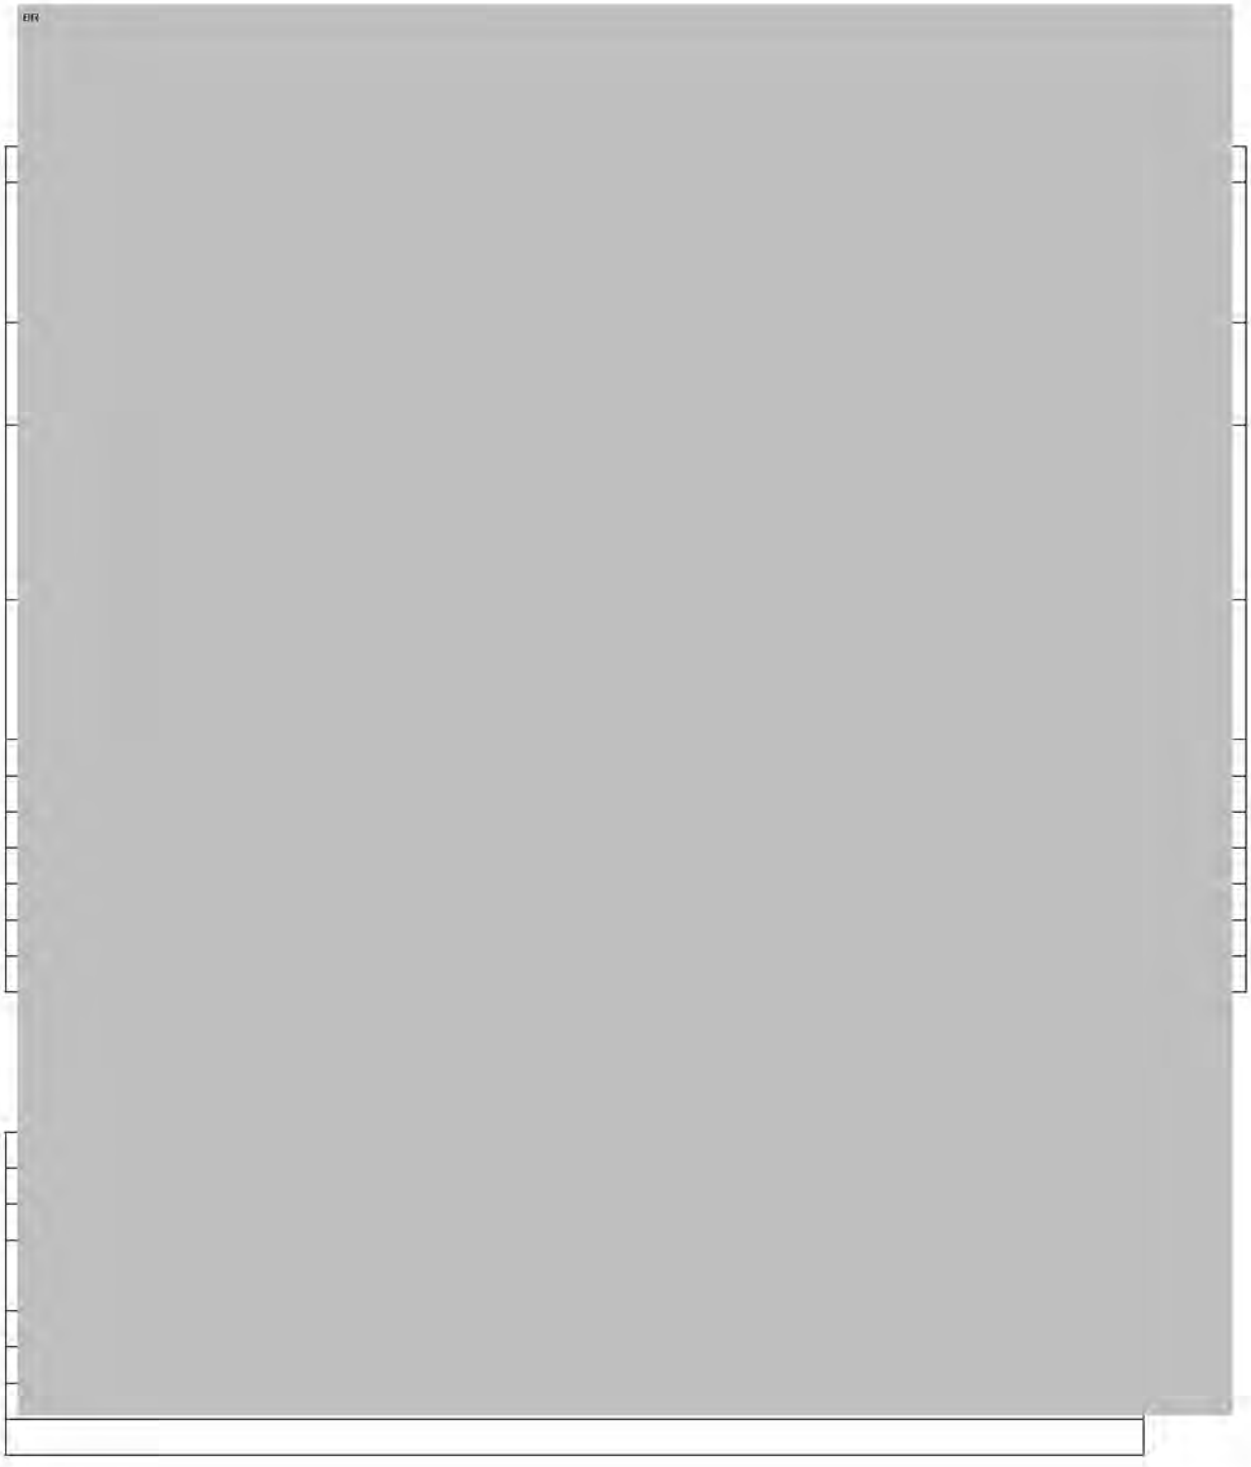
BR

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Bereiken overeenstemming t.a.v. ontwerpoplossing (incl. locatiekeuze) voor de waterinlaat naar het bergingsgebied in het Molenvlietpark. | Er zijn twee ontwerpvarianten voor de waterinlaat. Eén via het perceel van de familie 5.1.2.e en één buiten dit perceel langs de bestaande Molensloot. Ten behoeve van beide varianten is de gemeente met erven 5.1.2.e in overleg over aankoop van de woning. Eén en ander wordt met partijen besproken en nader onderzocht. Uiteindelijk zal het voorkeursontwerp worden afgestemd met het Hoogheemraadschap. |
| BR | |
| DSO heeft het verwervingsproces voor aankoop van het perceel van de erven 5.1.2.e in gang gezet. | Loopt. |
| BR | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Bereiken overeenstemming t.a.v. de ontwerpoplossing (incl. locatiekeuze) voor de waterinlaat naar het bergingsgebied in het Molenvlietpark en de afspraken vastleggen in een overeenkomst. |
| BR |

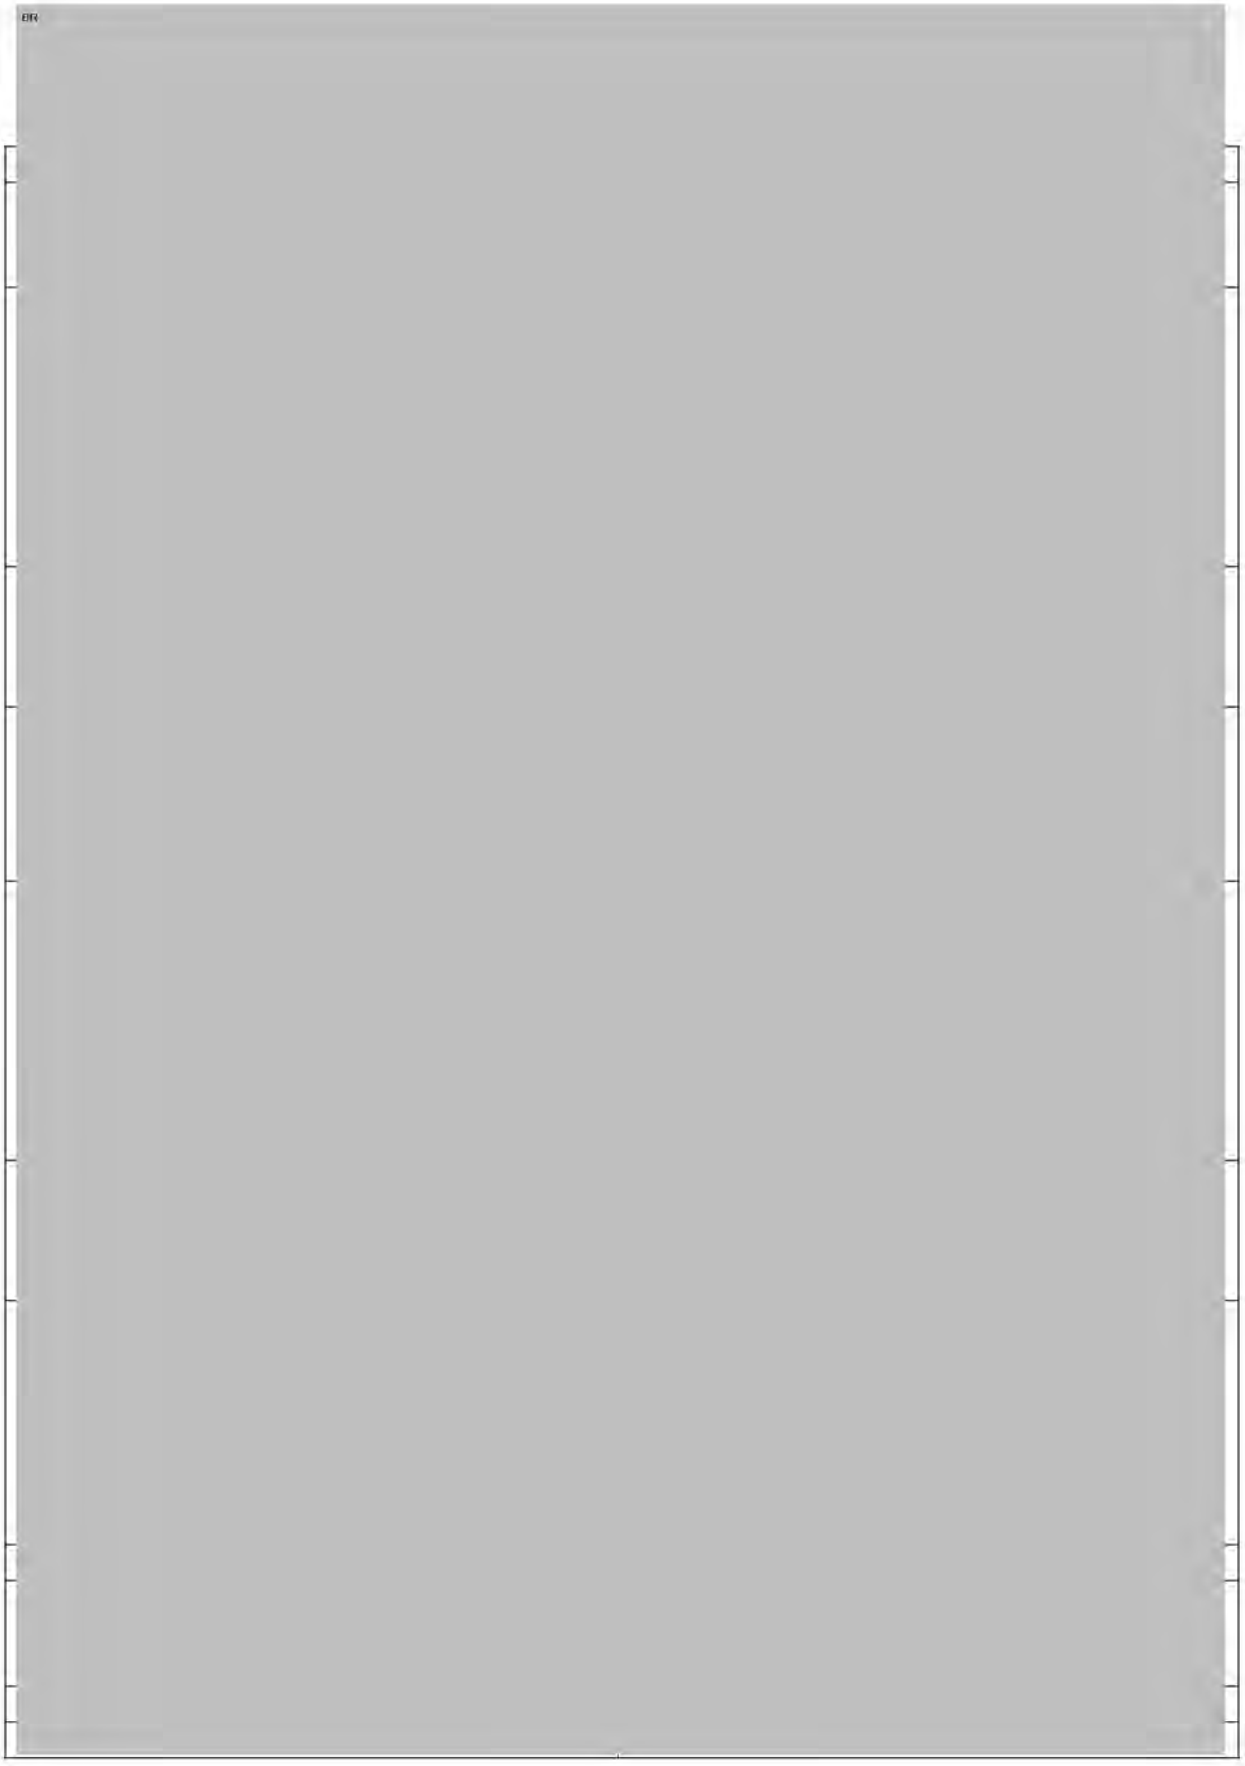
BR

BR'

# 3 Projectvoortgang

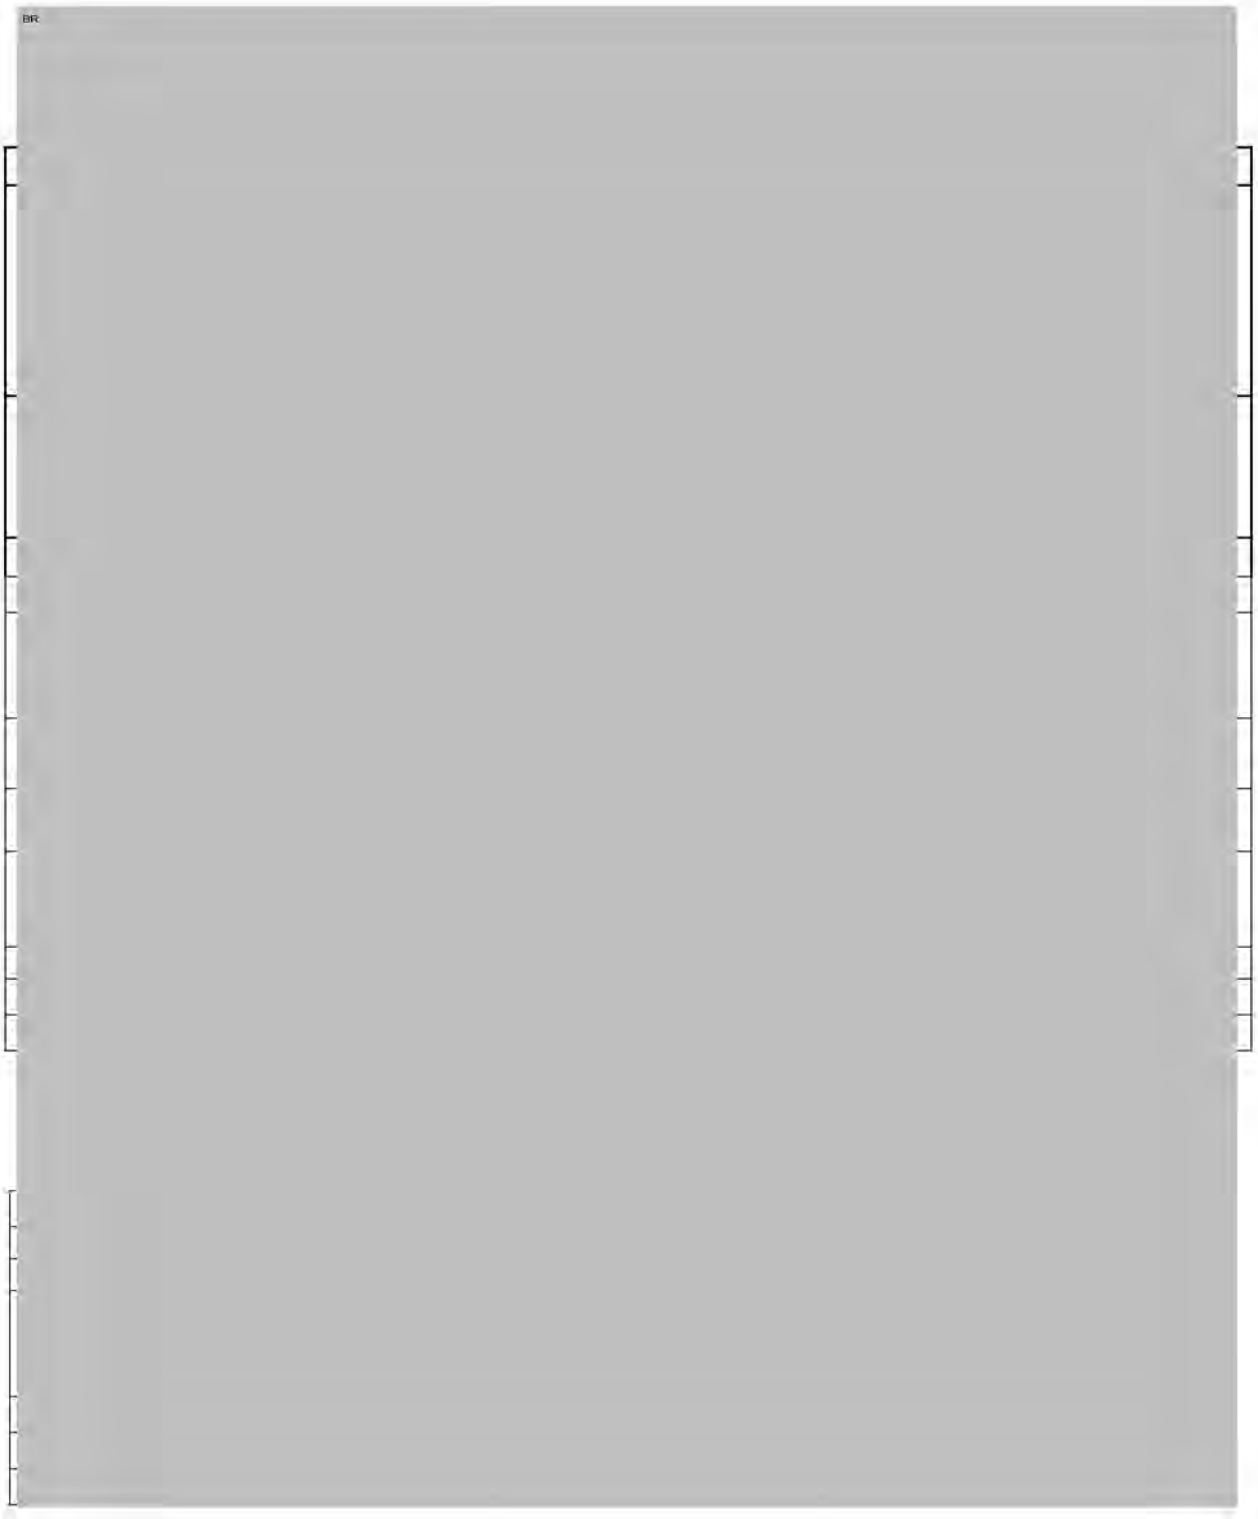

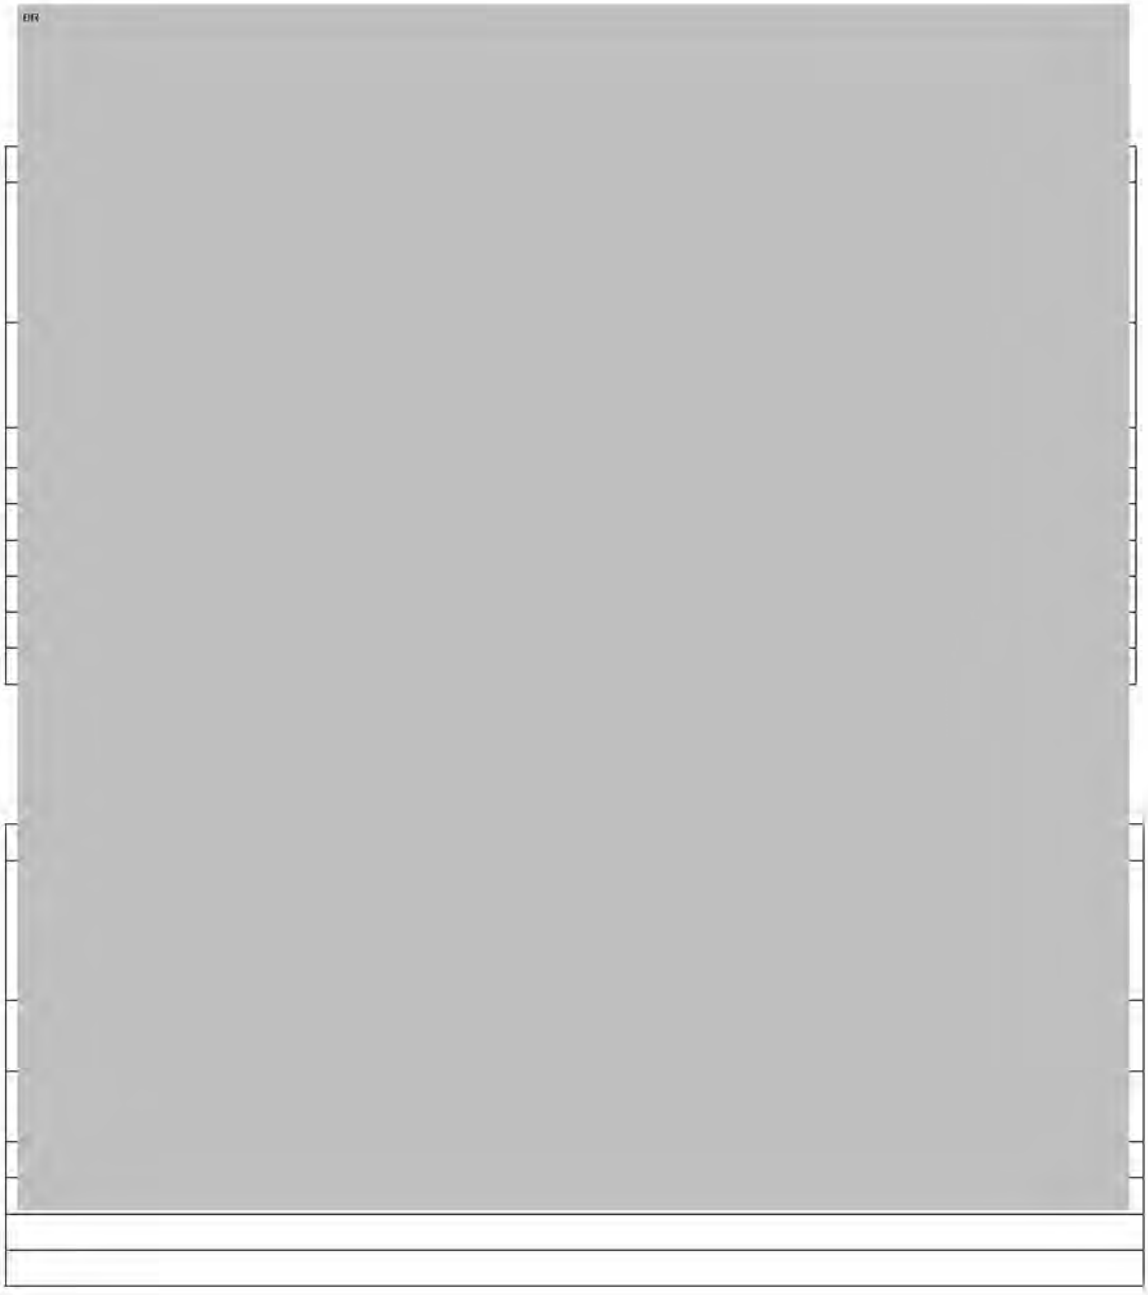
DR

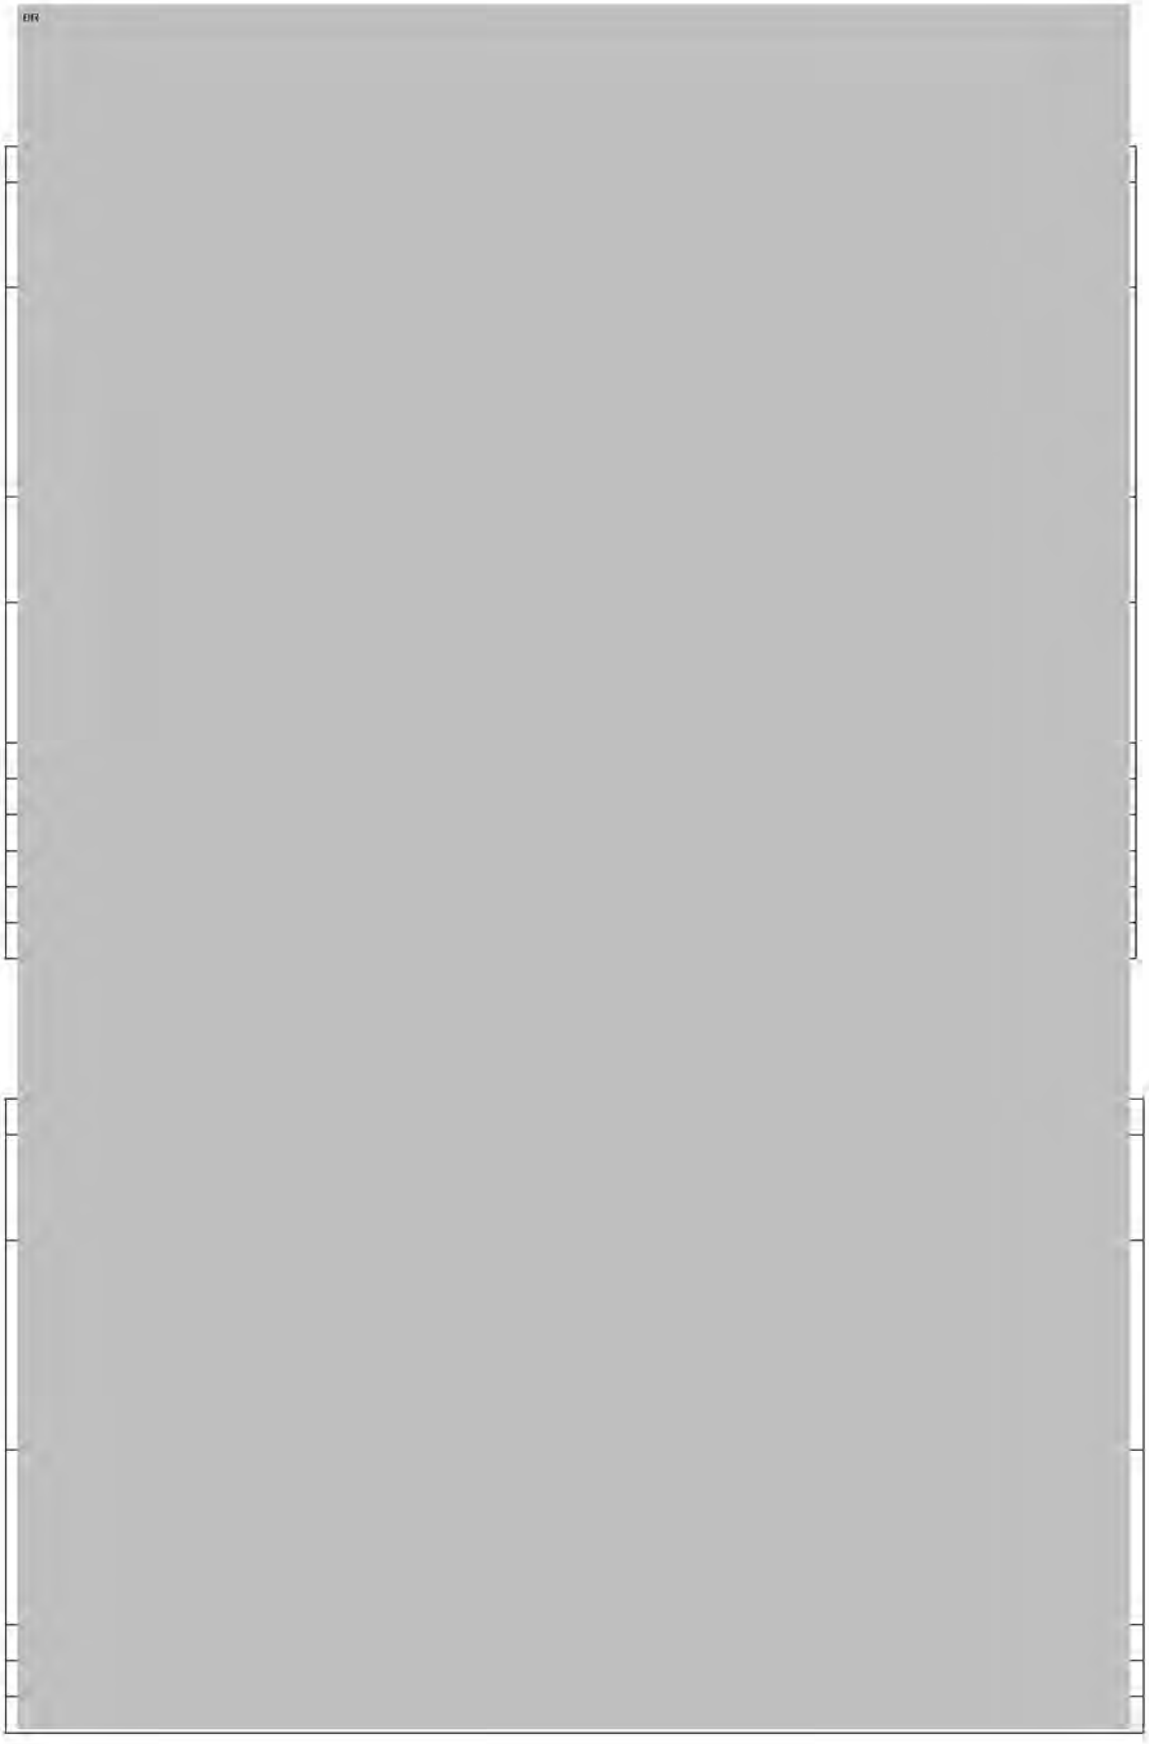

BR

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

| | |
|---|---|
| BR | |
| | |

**Hoofdcontract**

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Aanleggen kades Molenvlietpark (West). | De zandkern van de kade is deels gerealiseerd. De waterstand, waterspanning en zetting worden gemonitoord. |
| BR | |
| | |

| |
|---|
| BR<br> |

**Hoofdcontract**

| **Werkzaamheden** |
|---|
| BR |
| Molenvlietpark: Afronden kade, afronden zandkern, aanbrengen dijkklei en bekleden met gebiedseigen grond. |
| BR<br> |

Foto: Realiseren zandkern kade Molenvlietpark

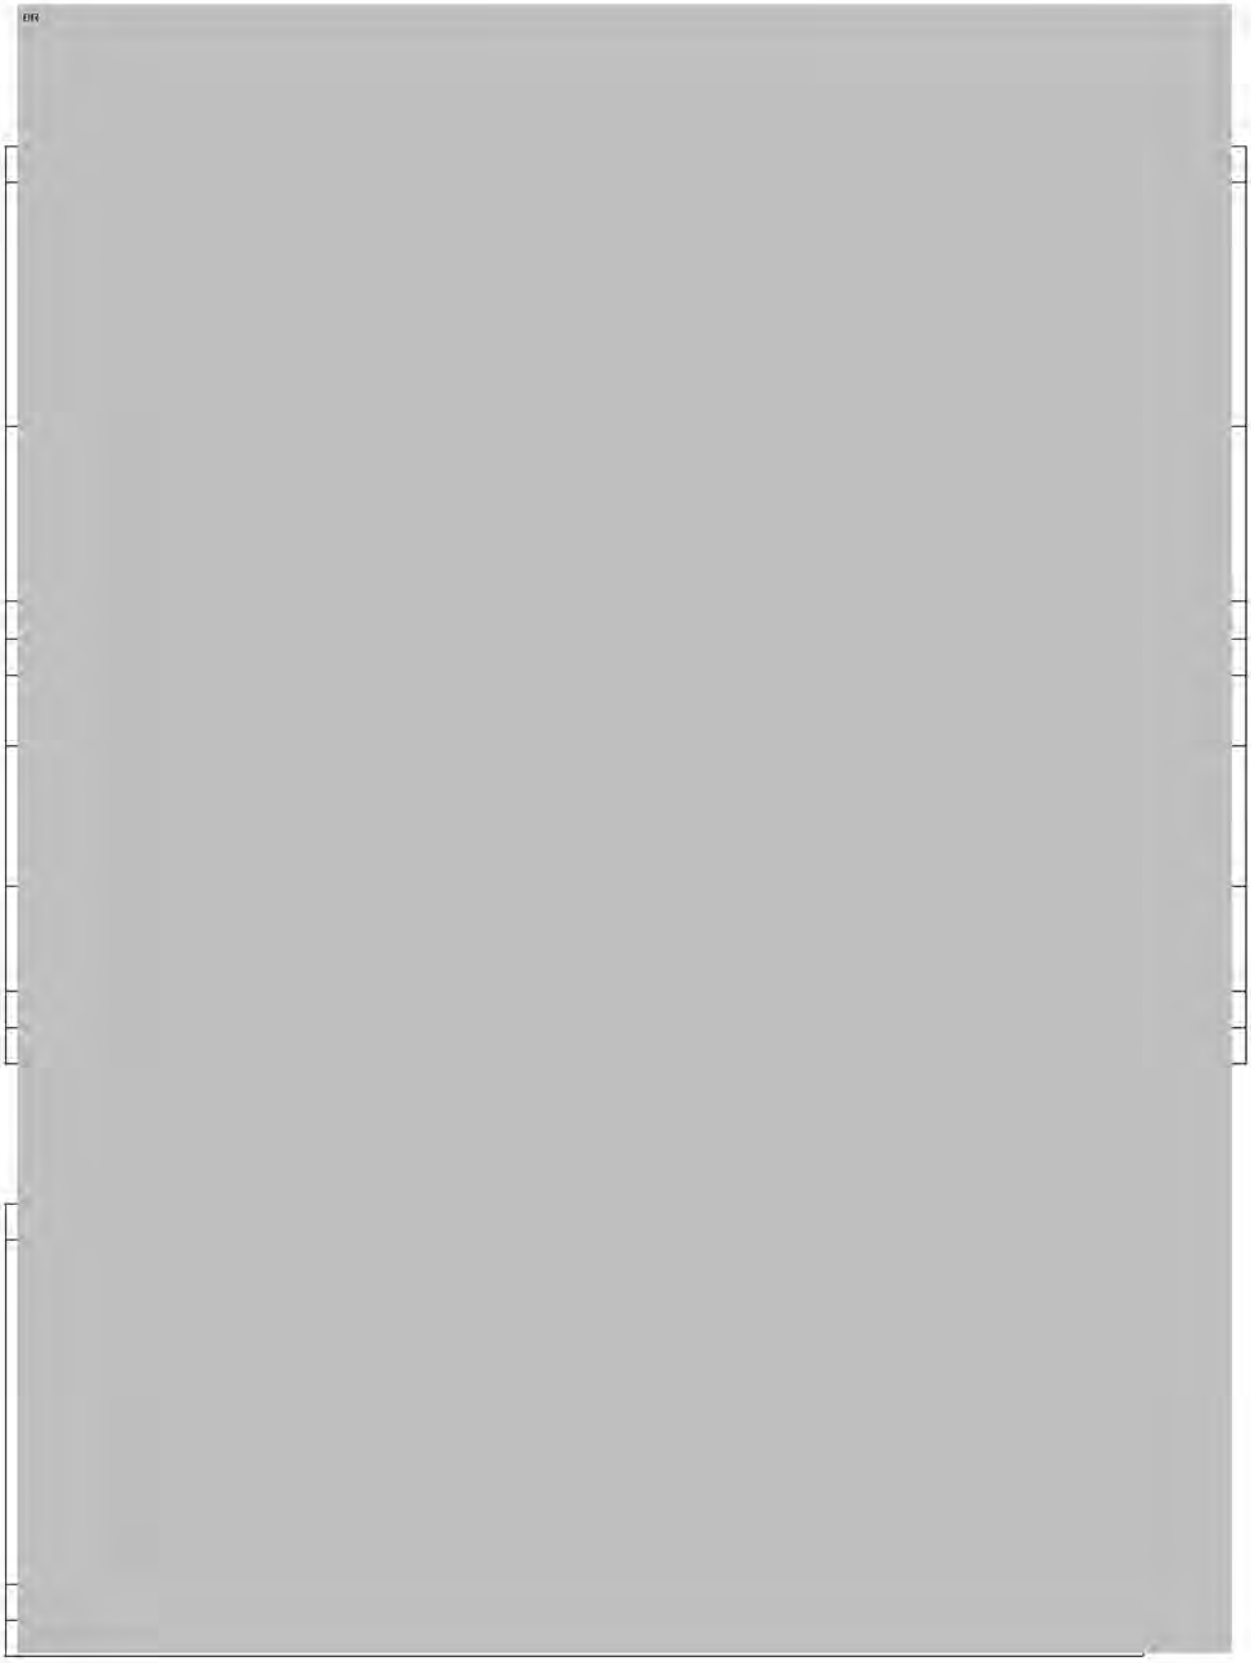

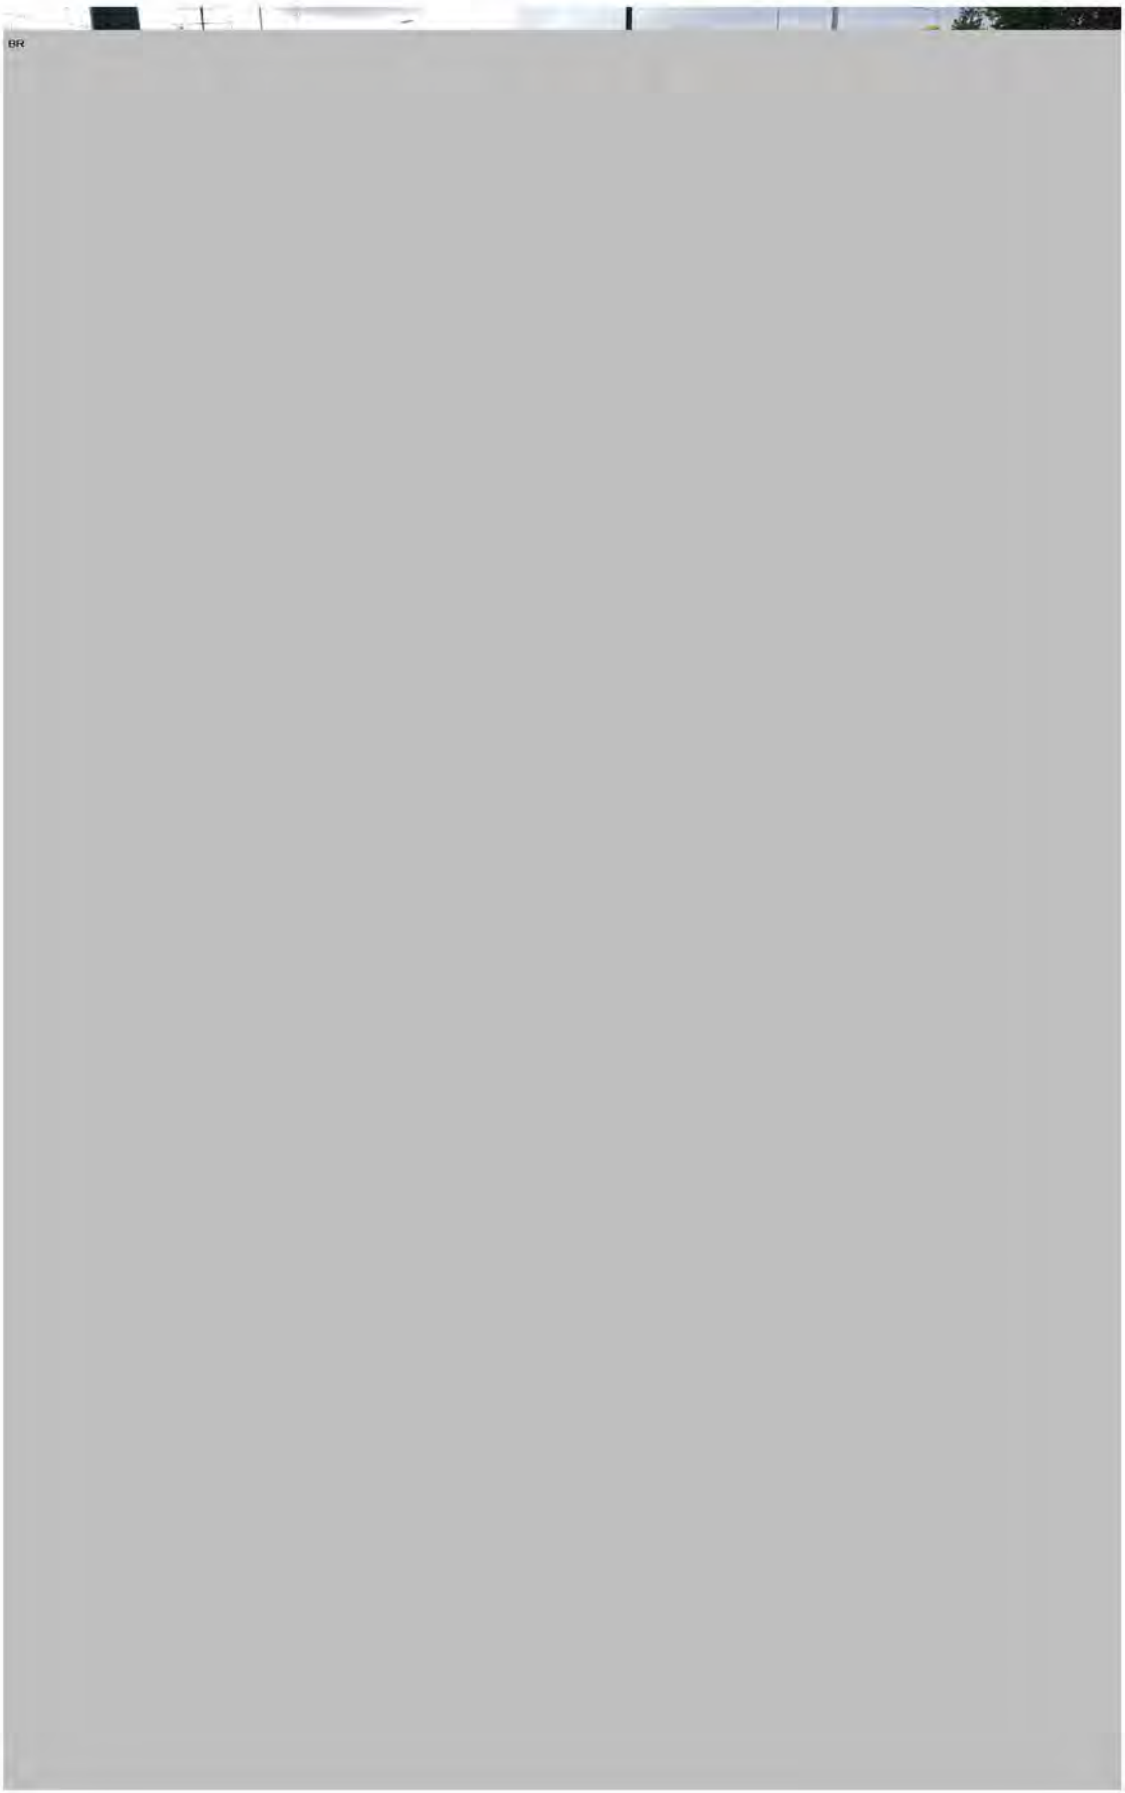
BR

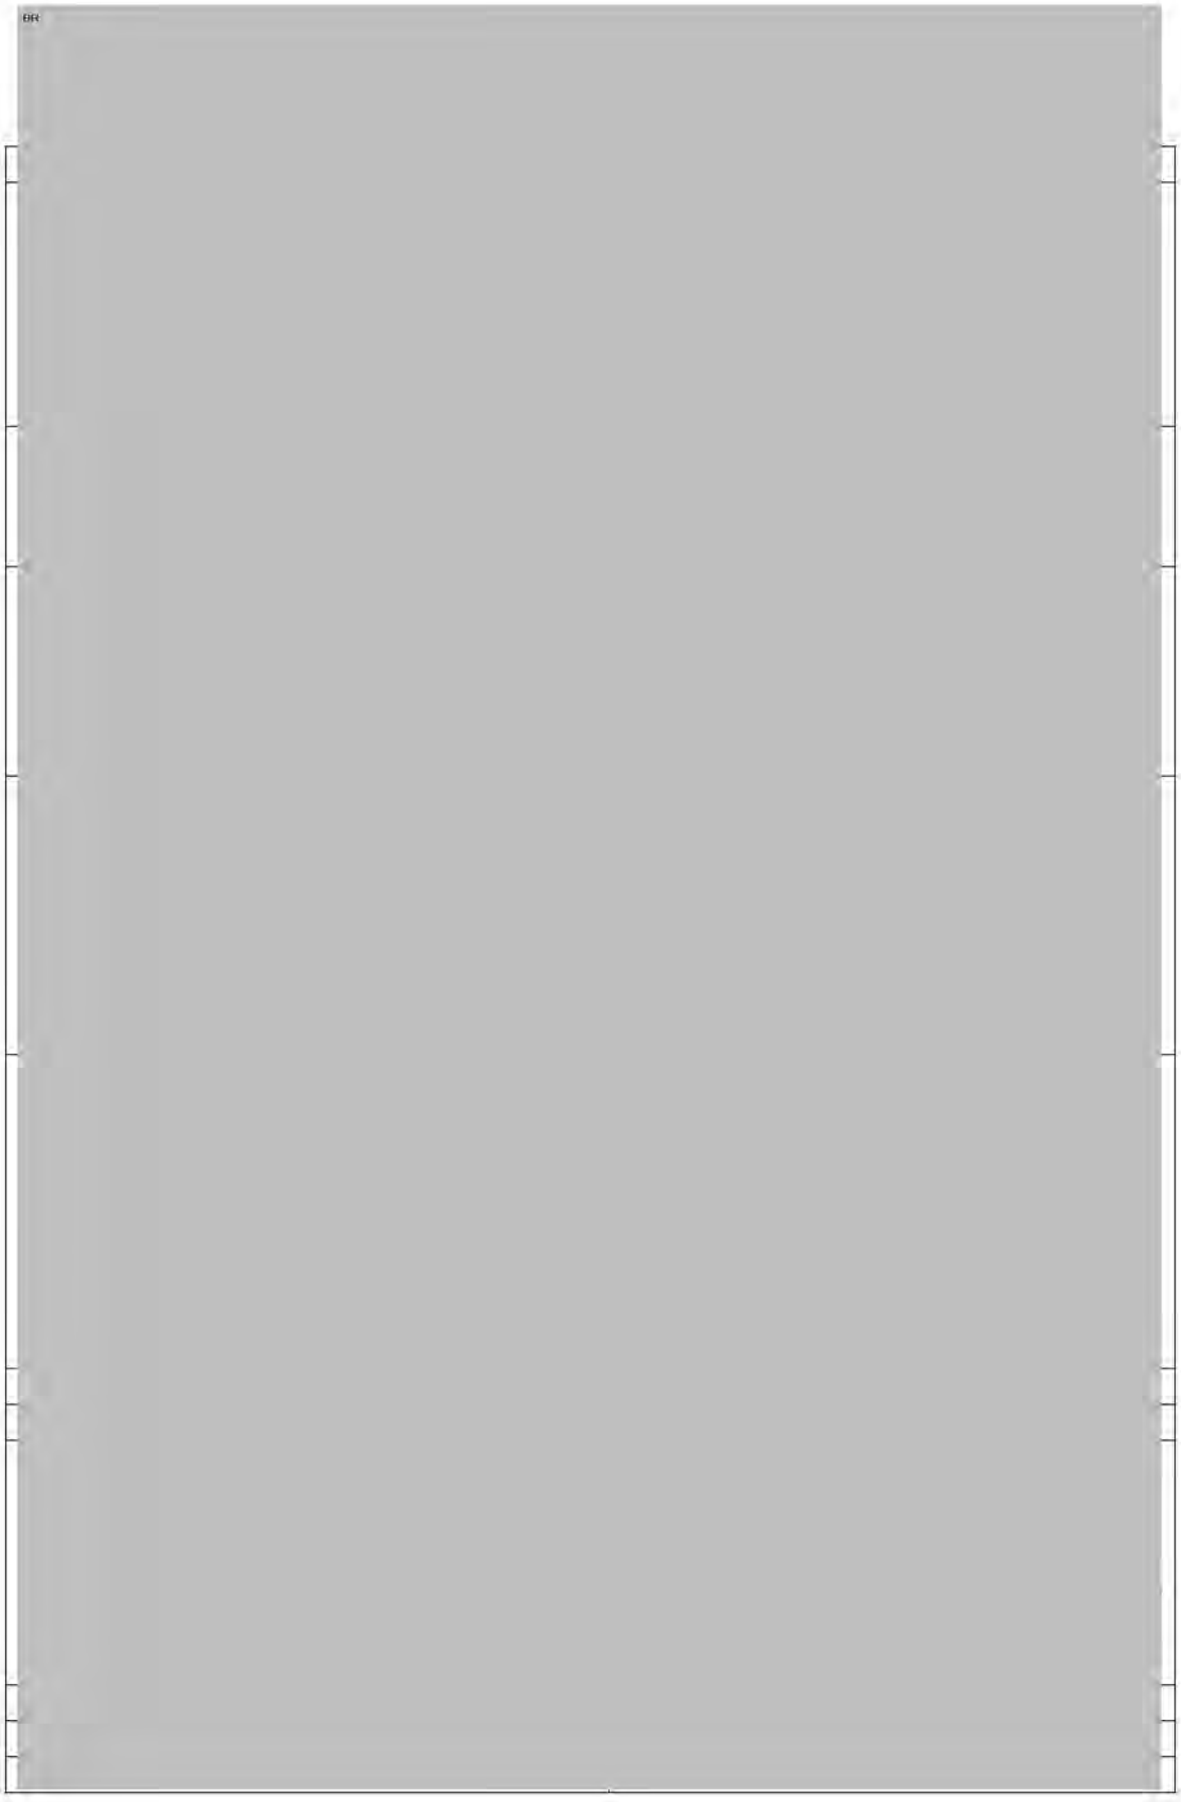
BR

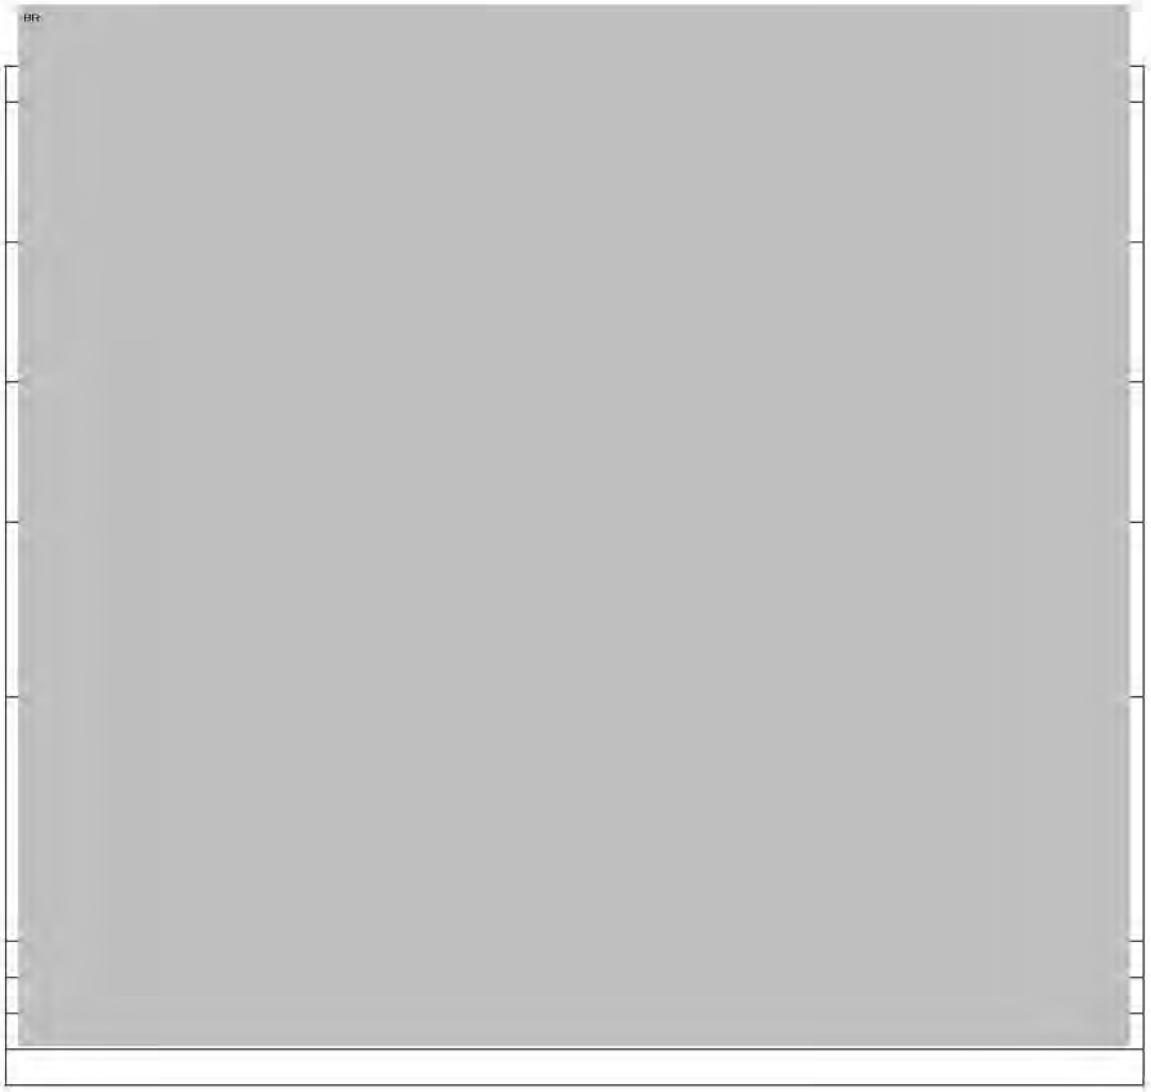

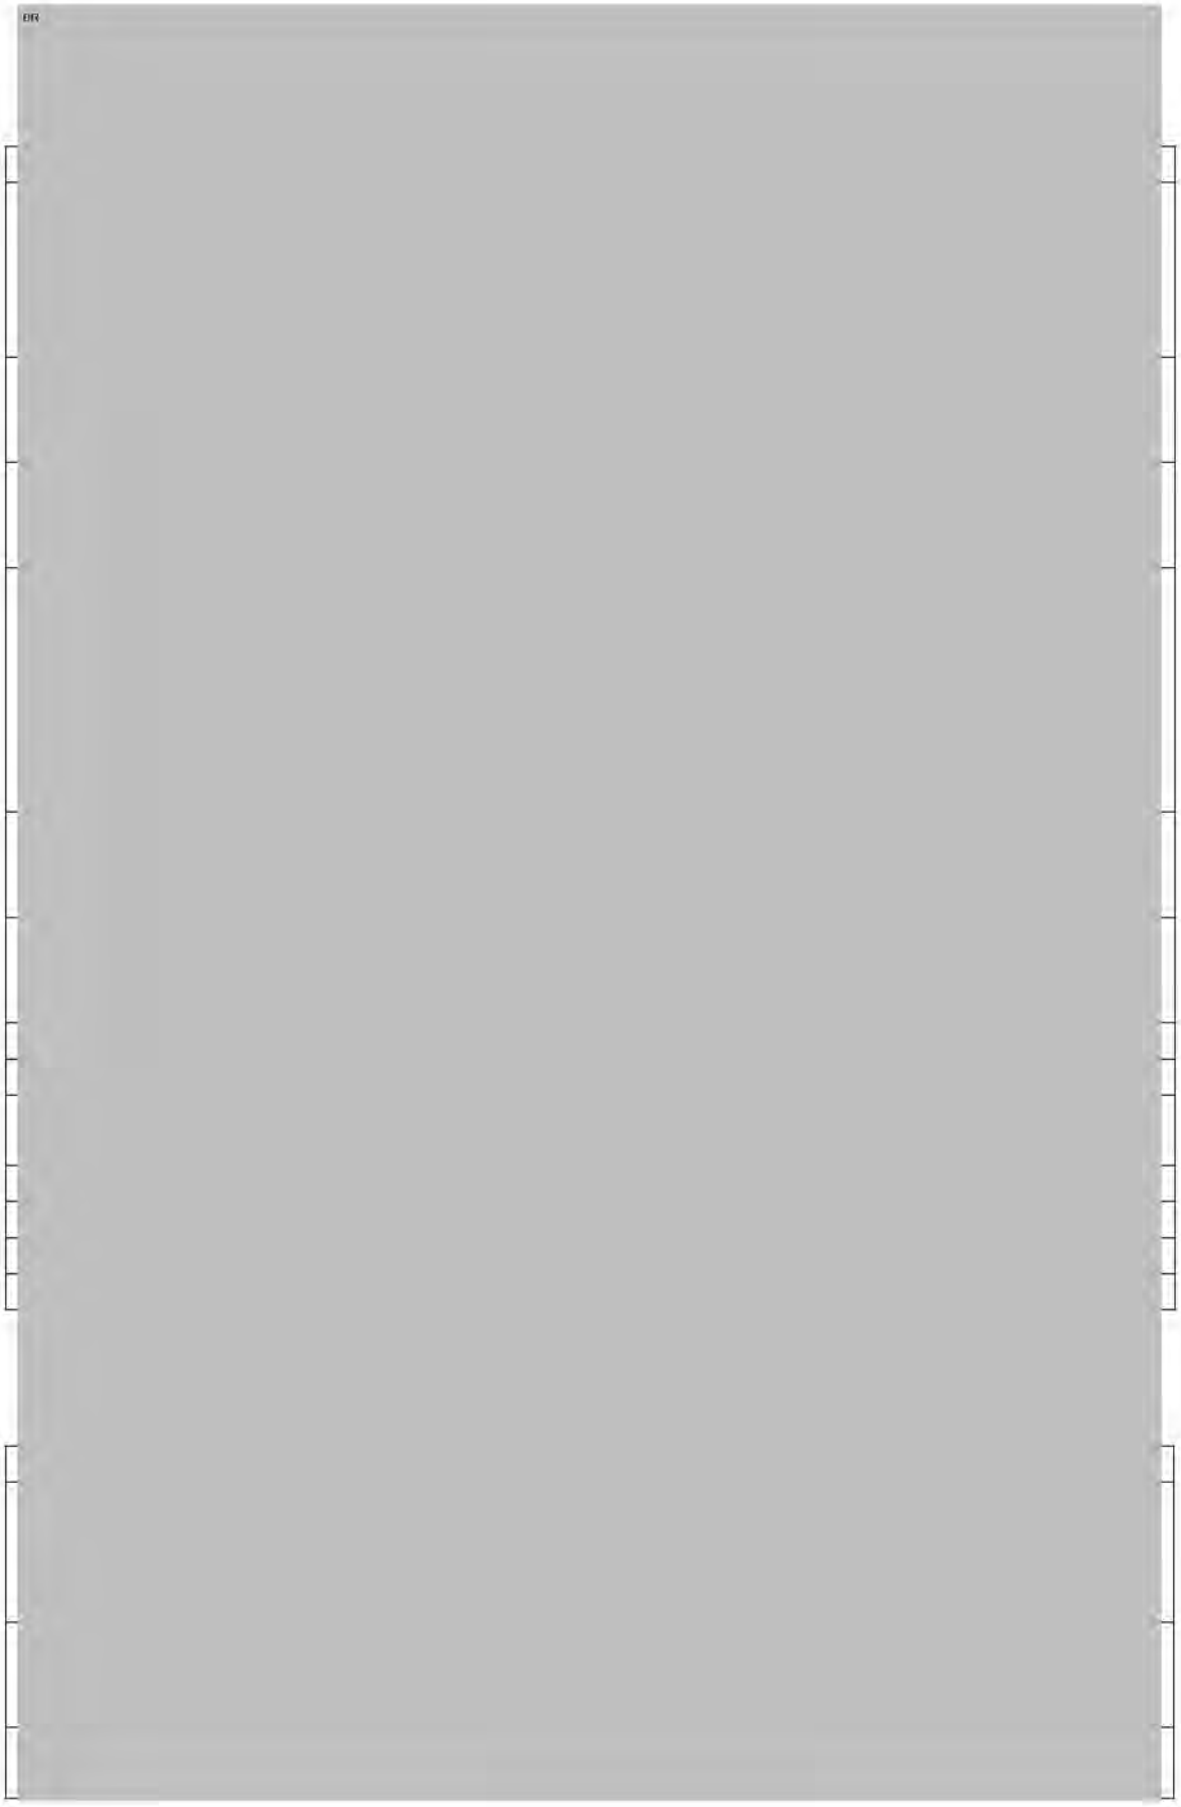

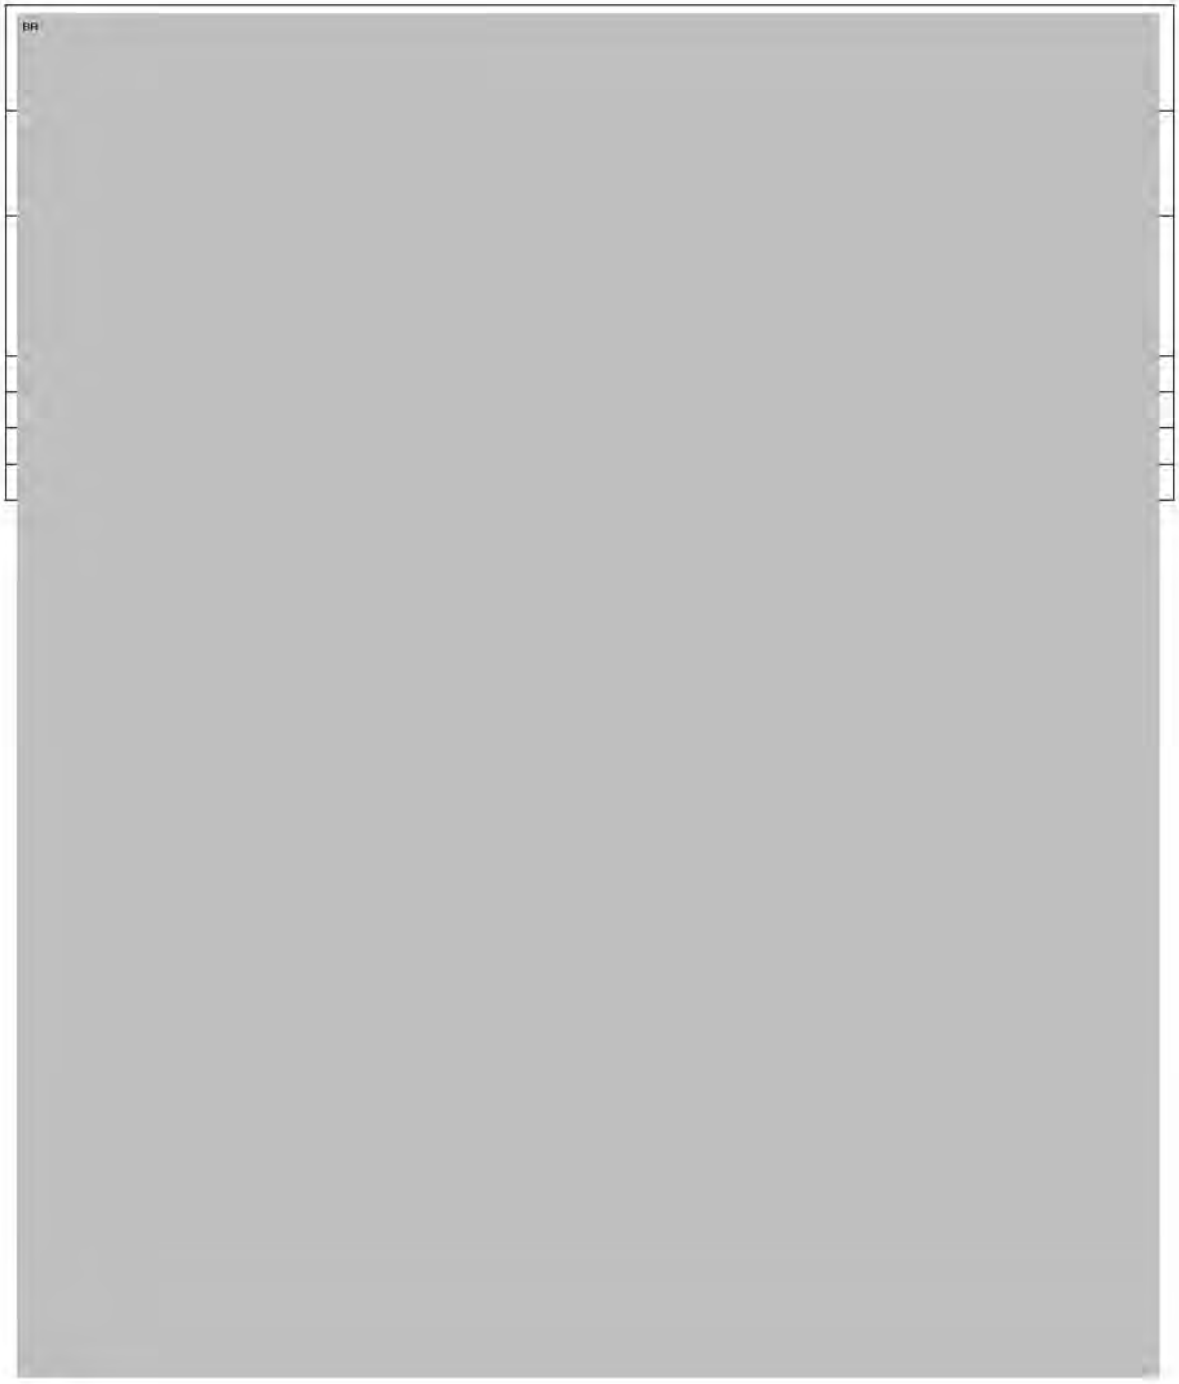
BR

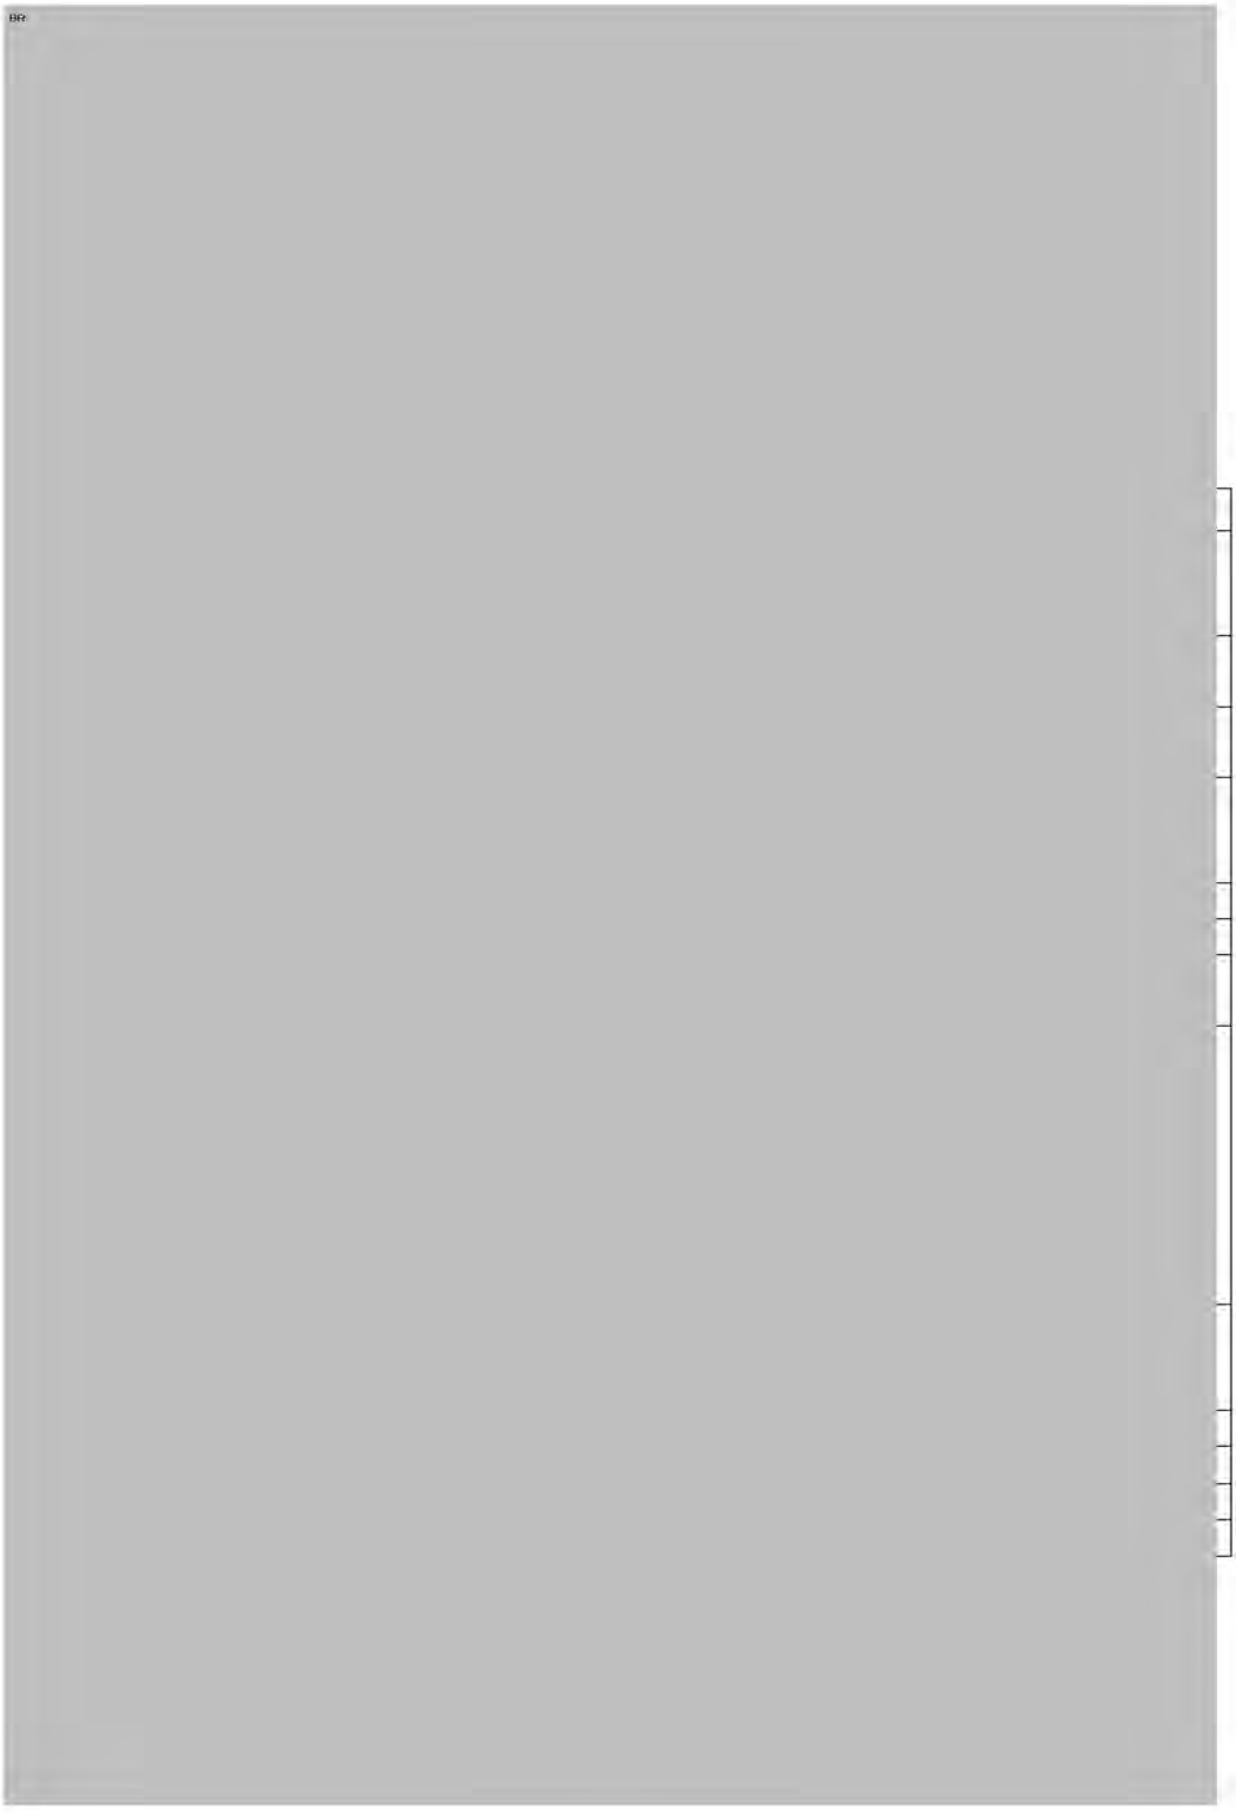

BR

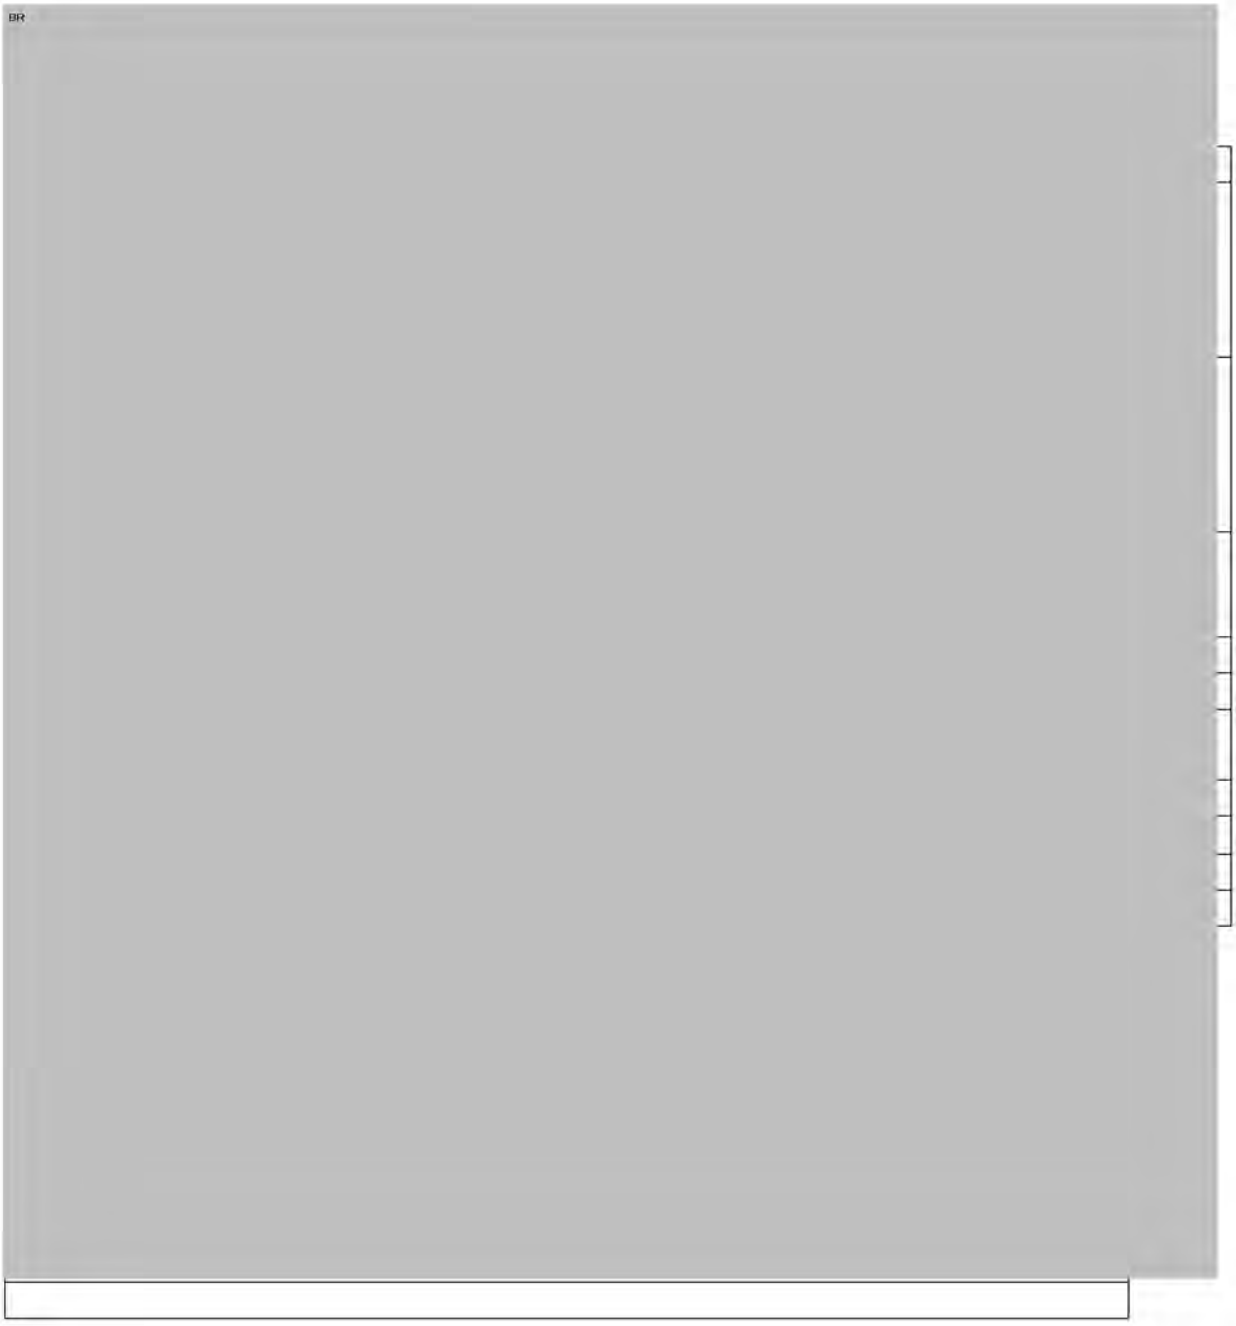
BR

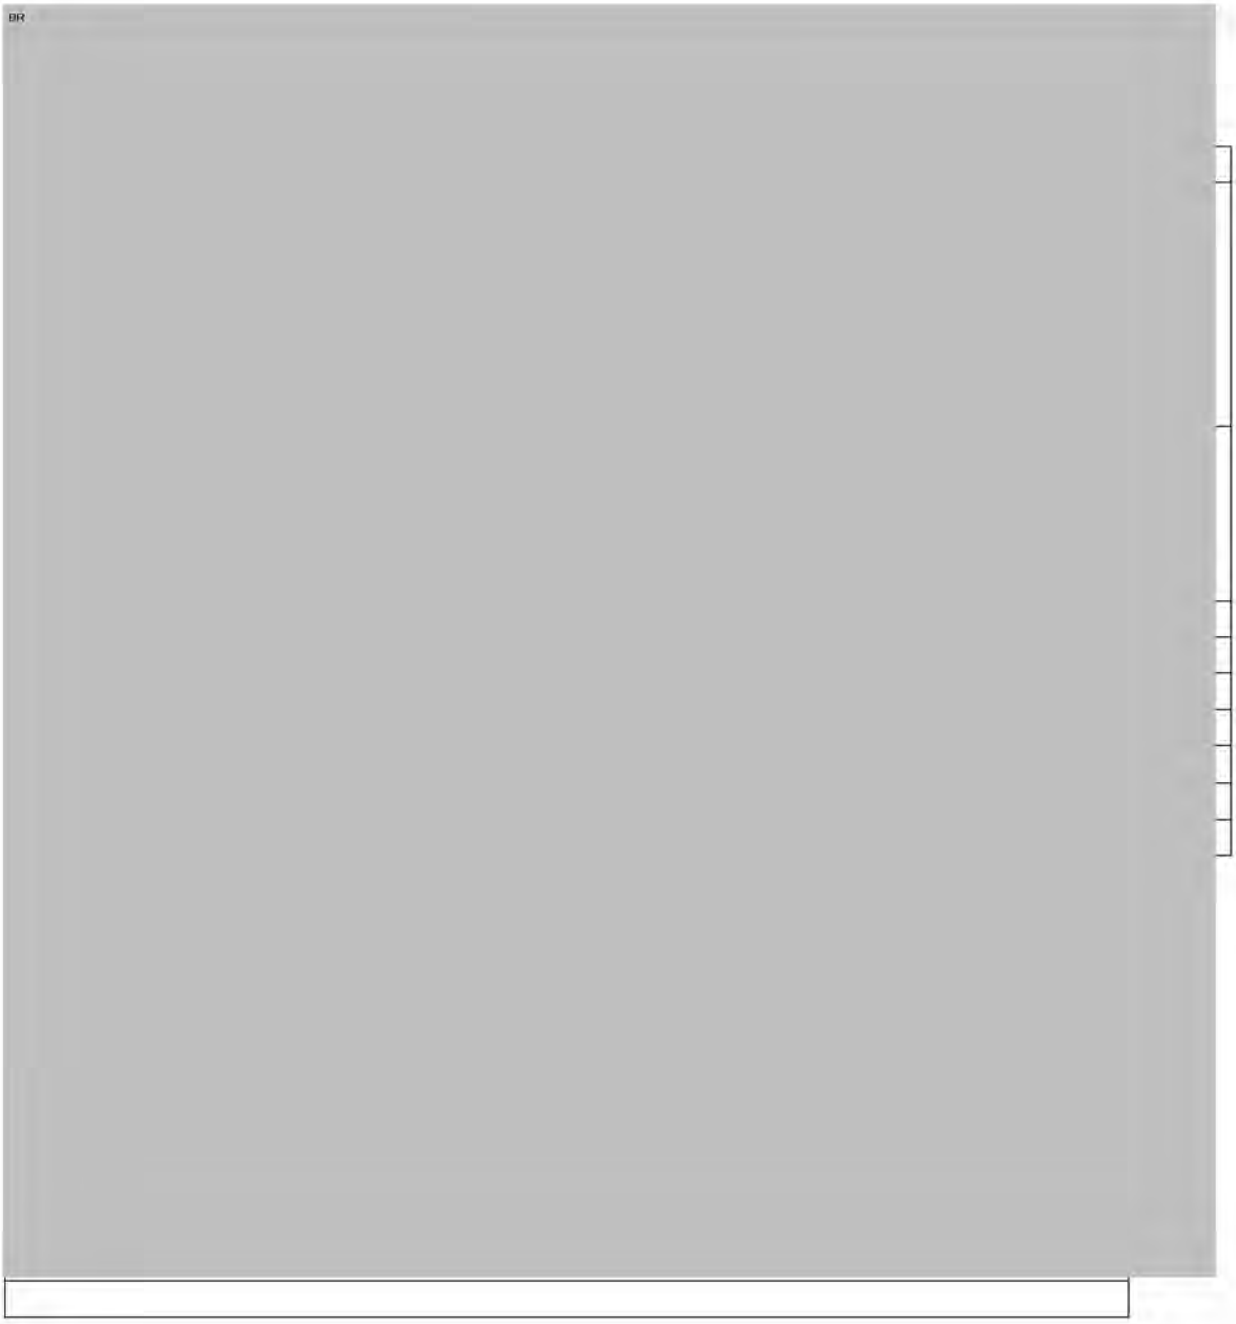

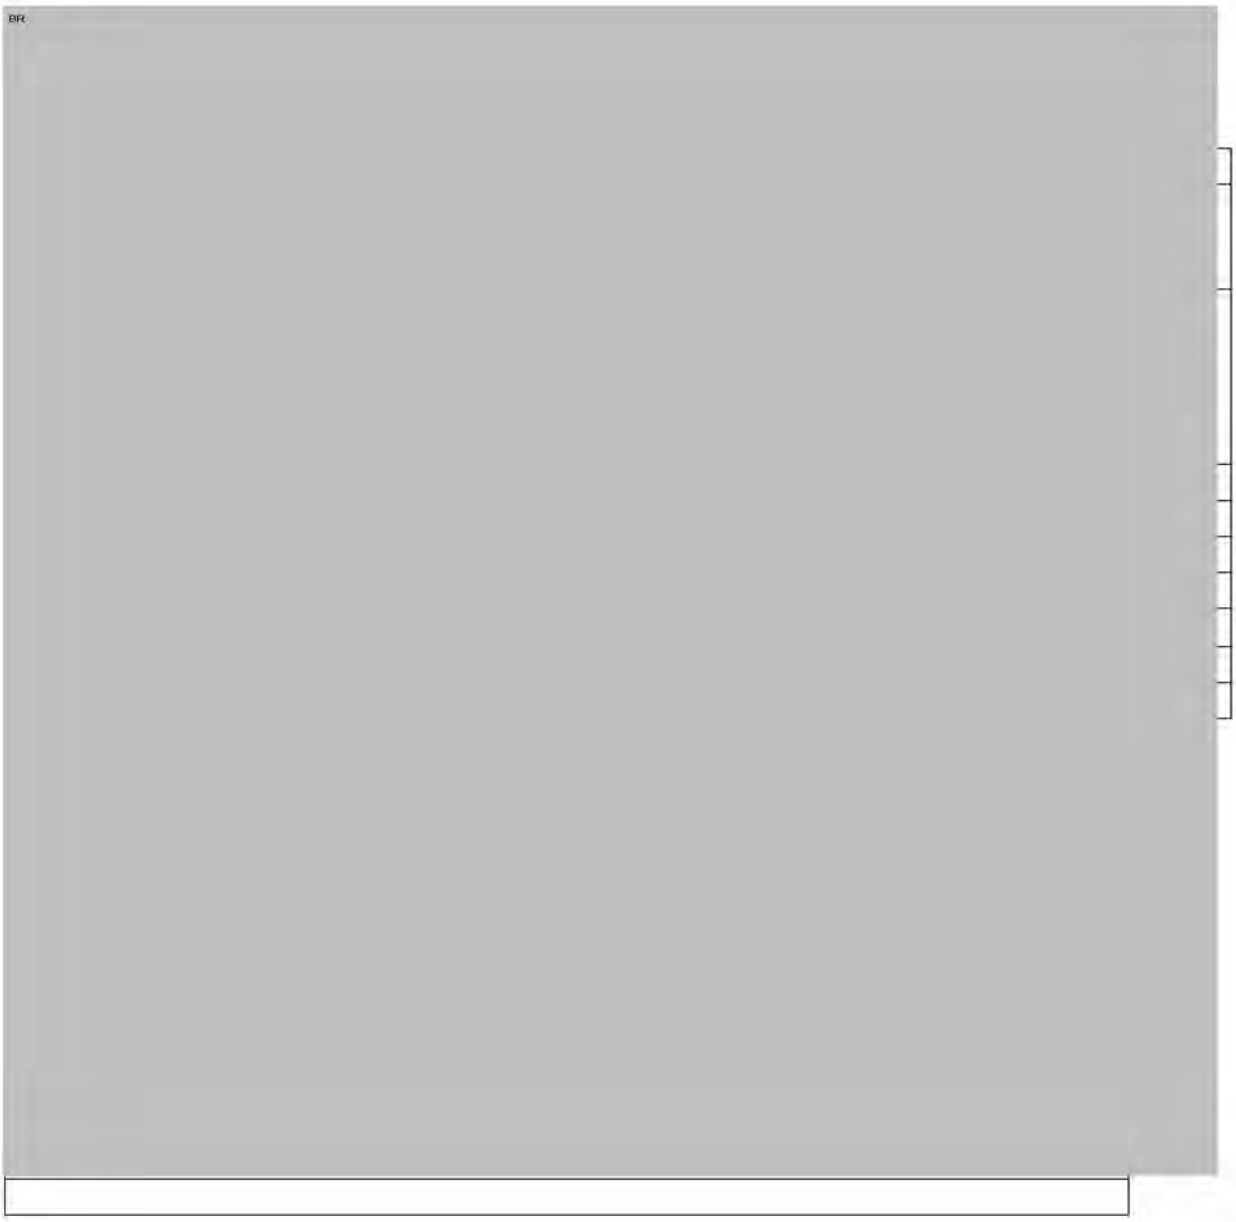

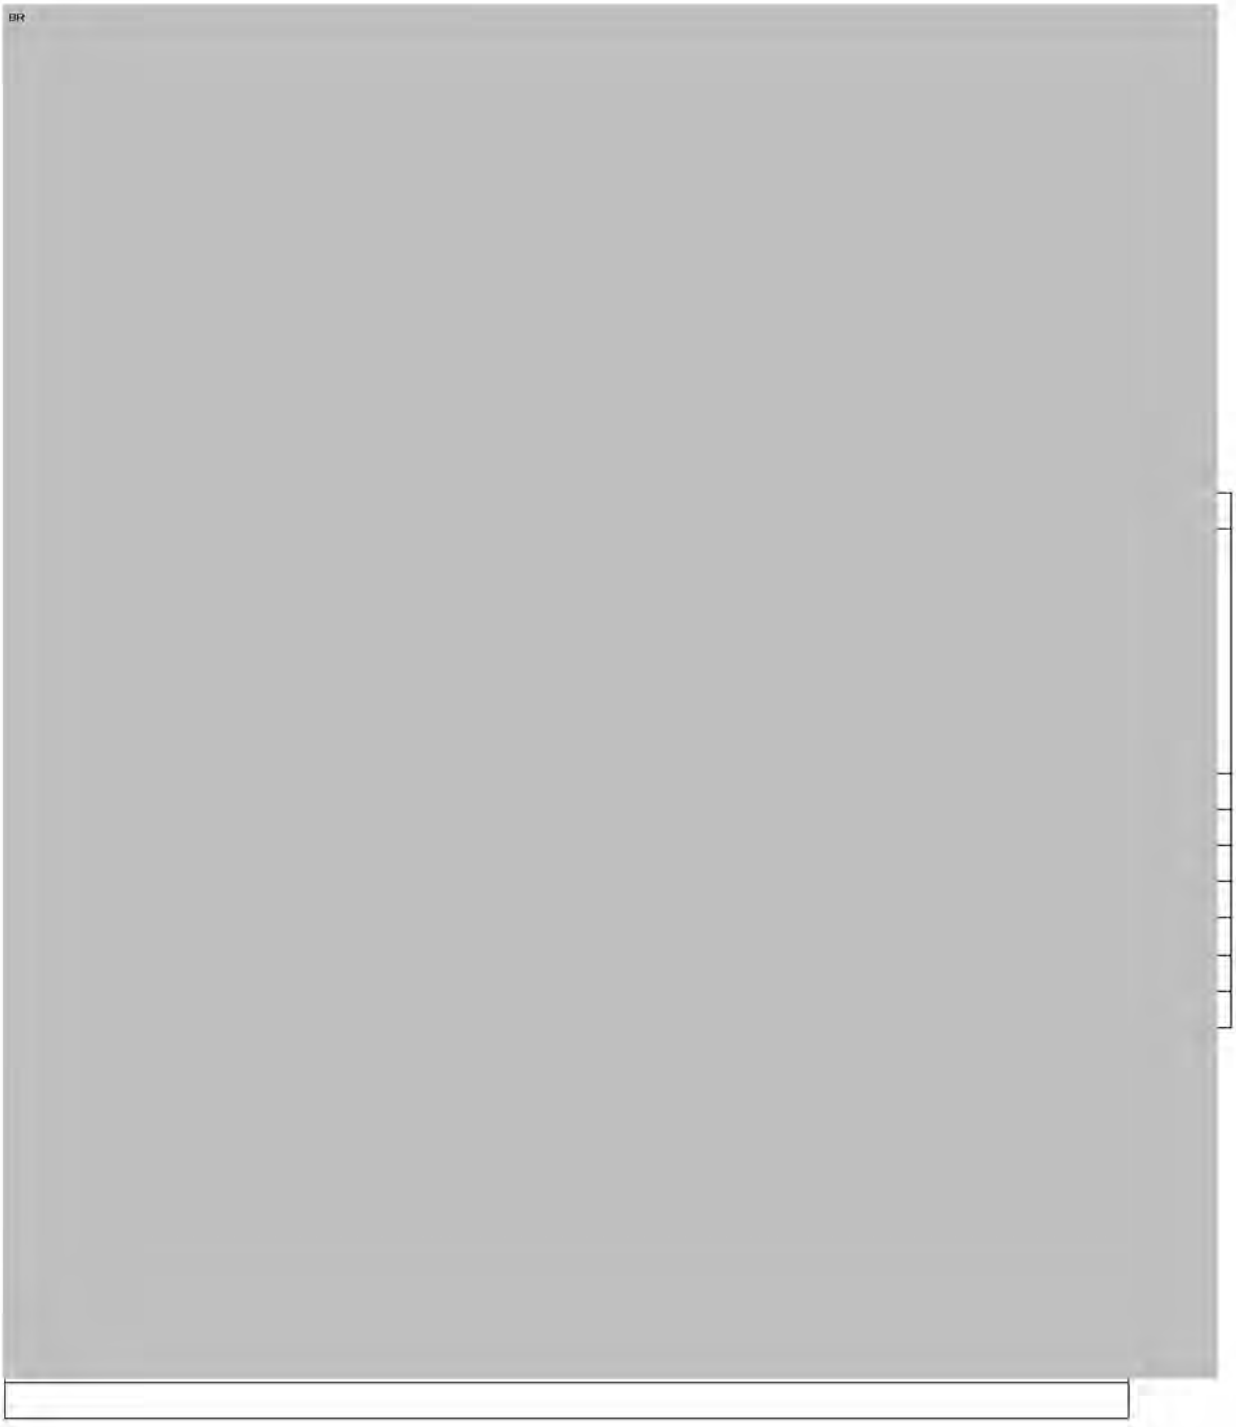
BR

BR

# 5 Projectbeheersing

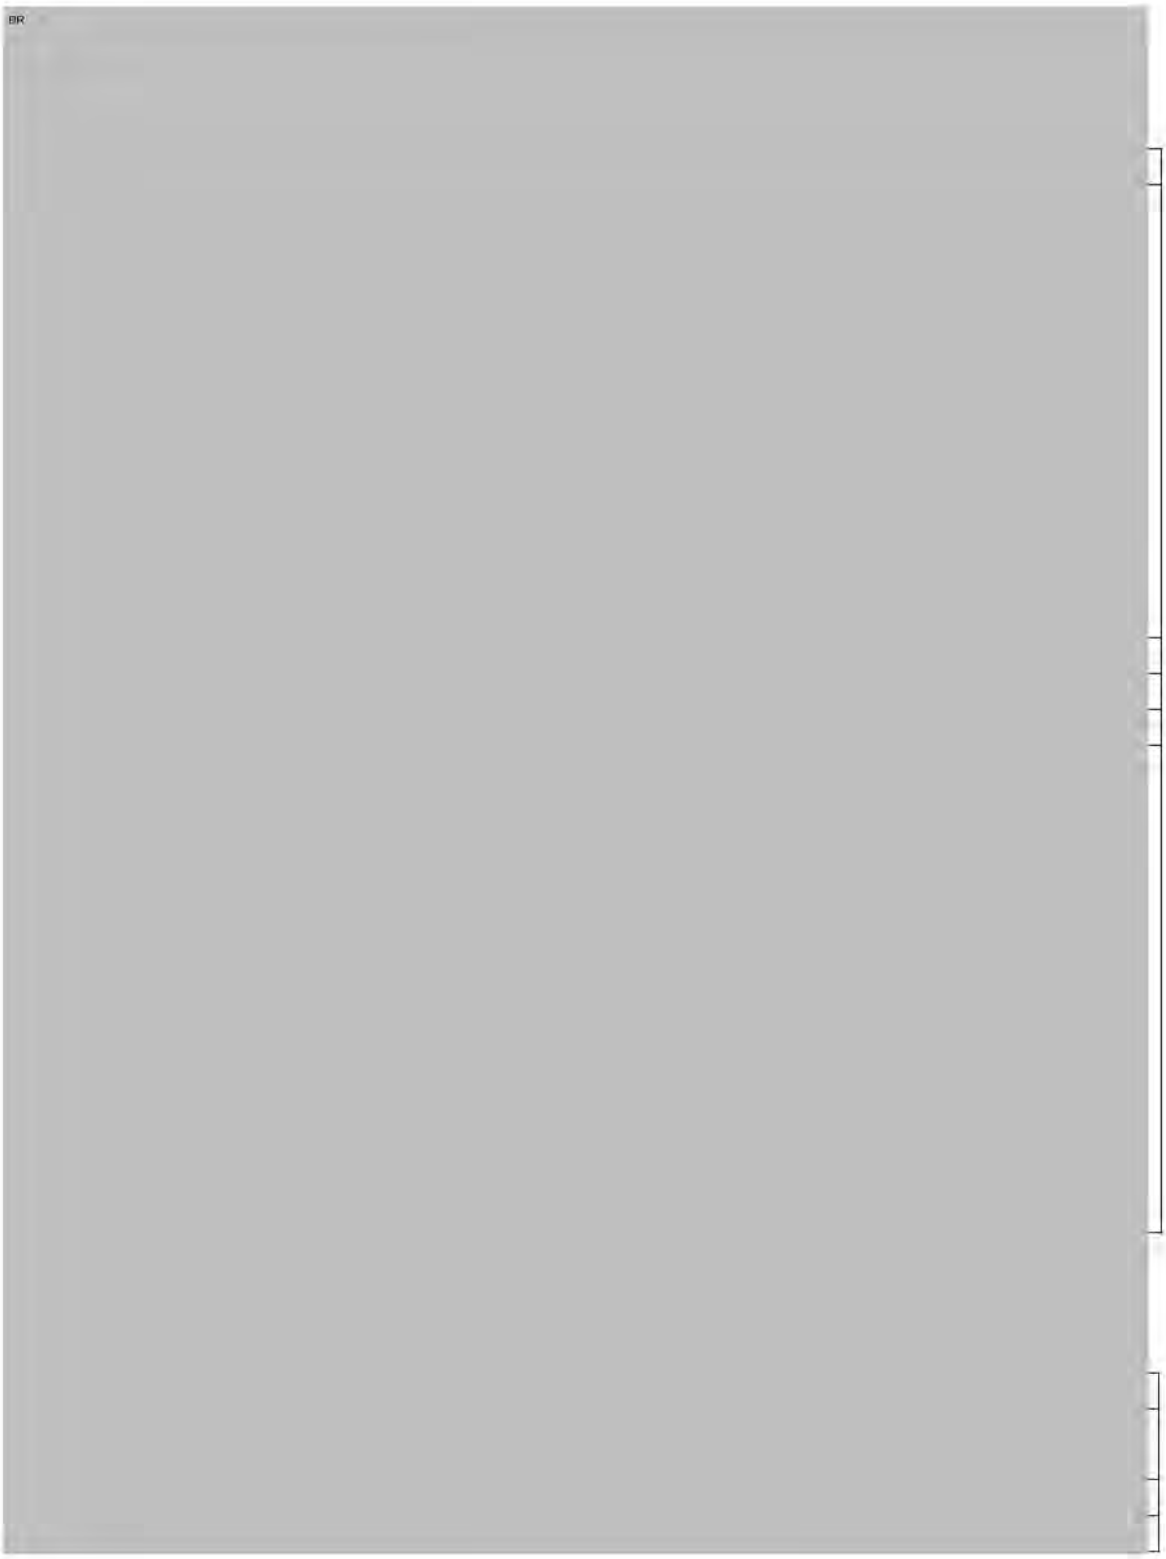

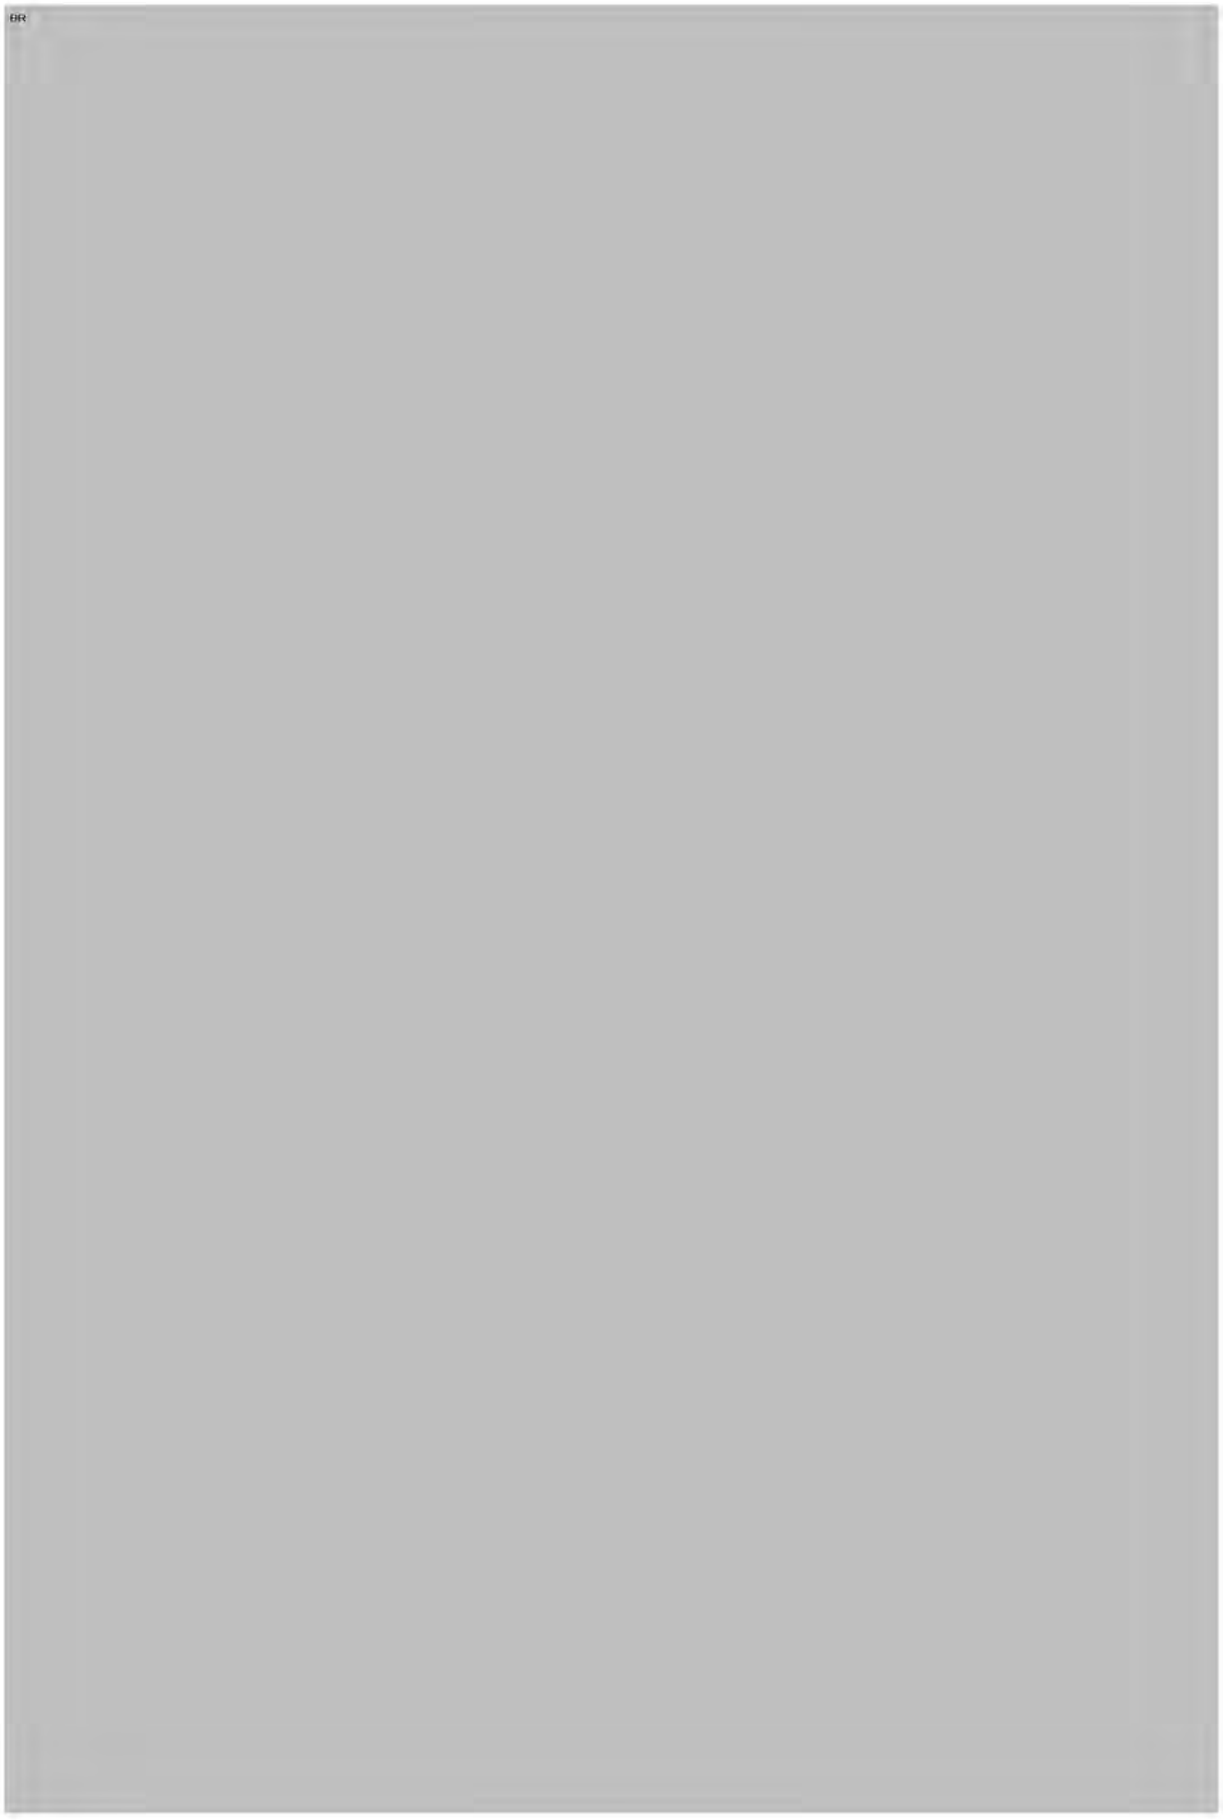

### 5.2.2 Dekkingen

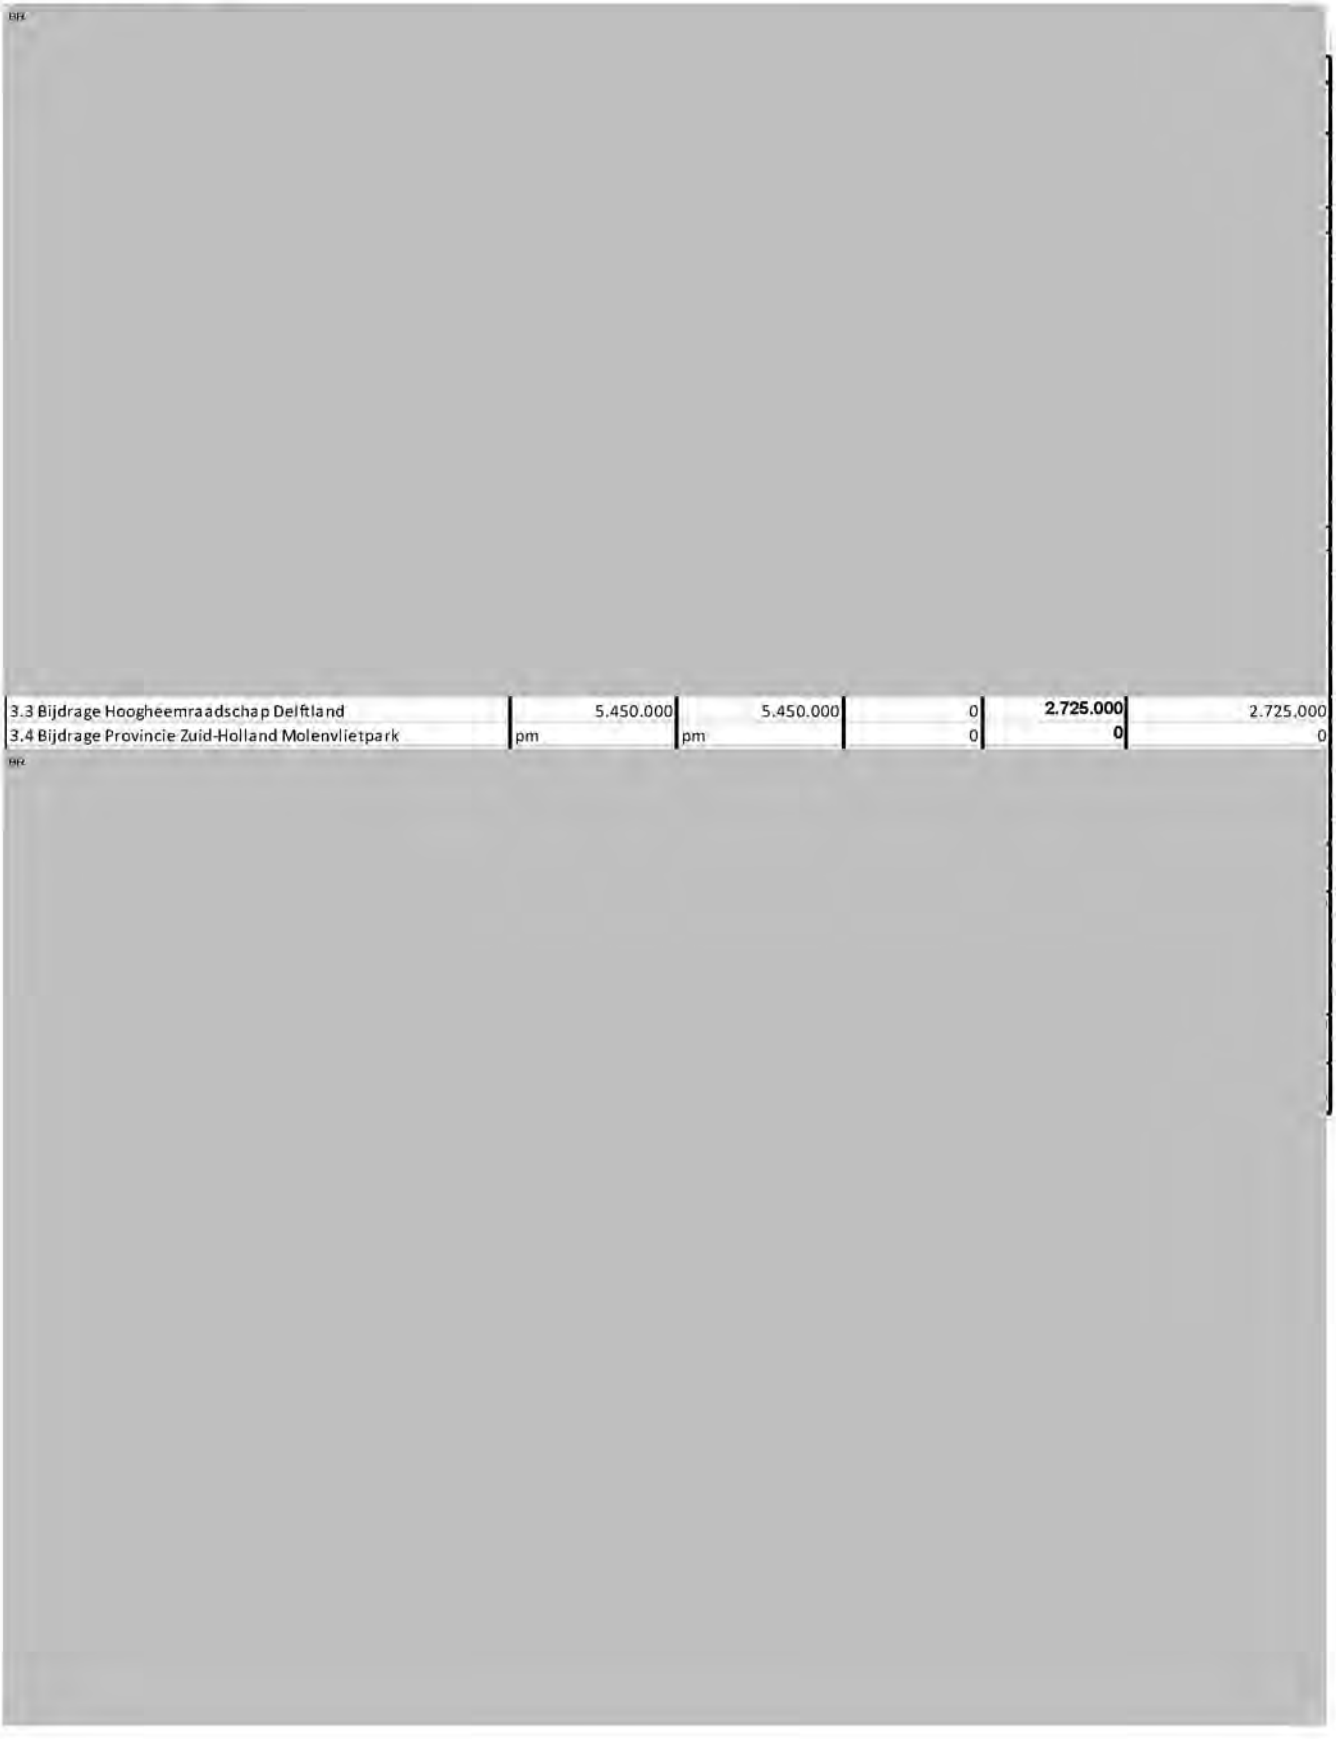

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | **2.725.000** | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | pm | pm | 0 | **0** | 0 |

[redacted]

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland

Er zijn in het derde kwartaal 2017 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland

Er zijn in het derde kwartaal 2017 geen mutaties geweest. De Landschapstafel is voornemens een subsidiebijdrage voor de inrichting van het Molenvlietpark te leveren.

[redacted]

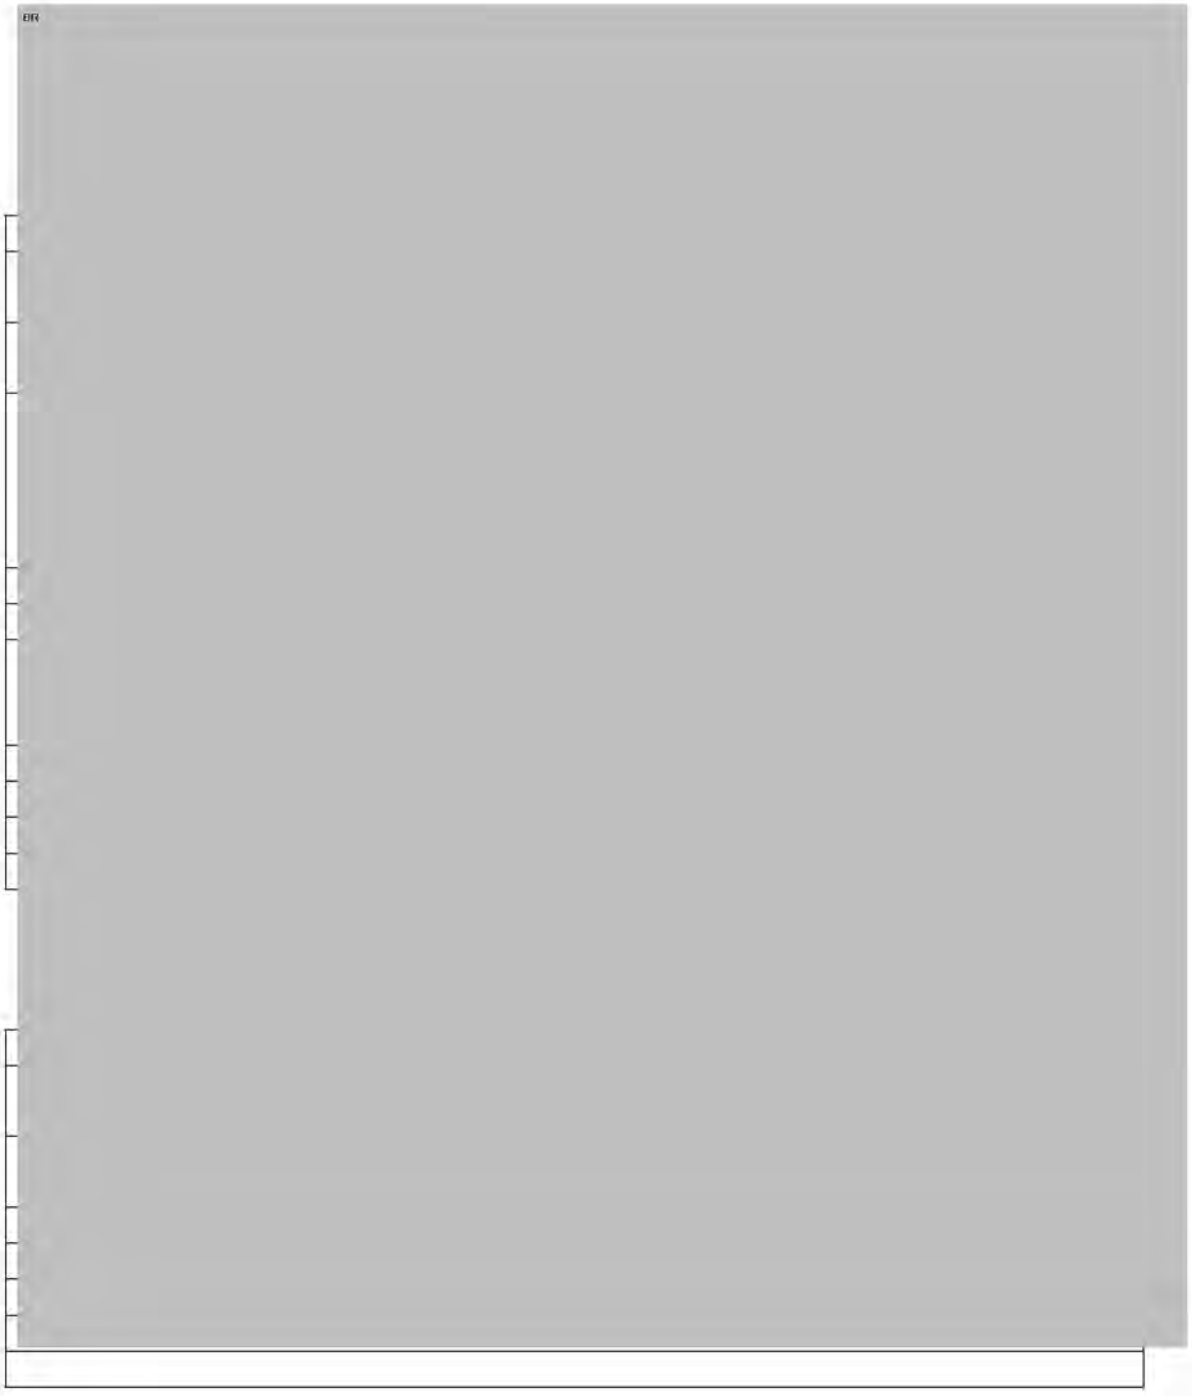
BR

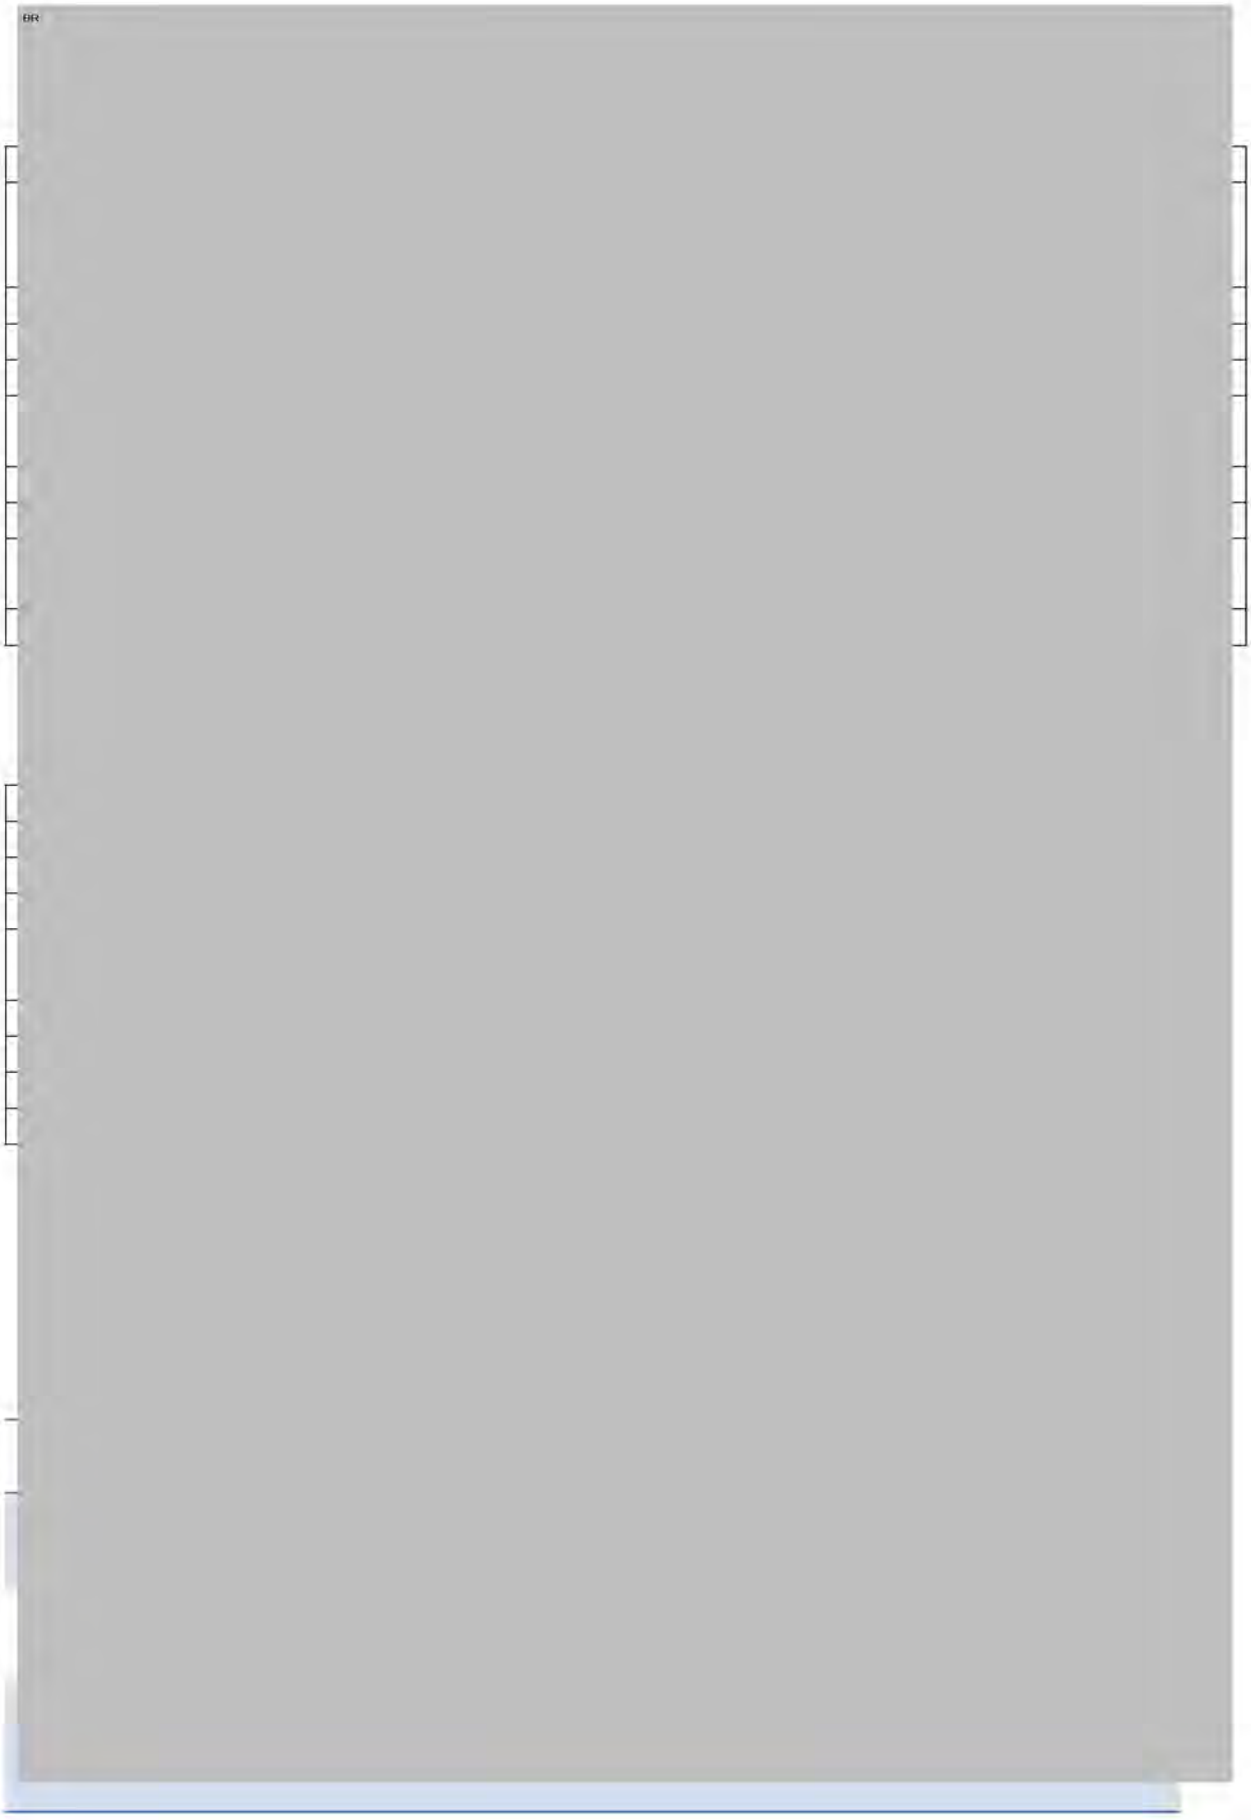

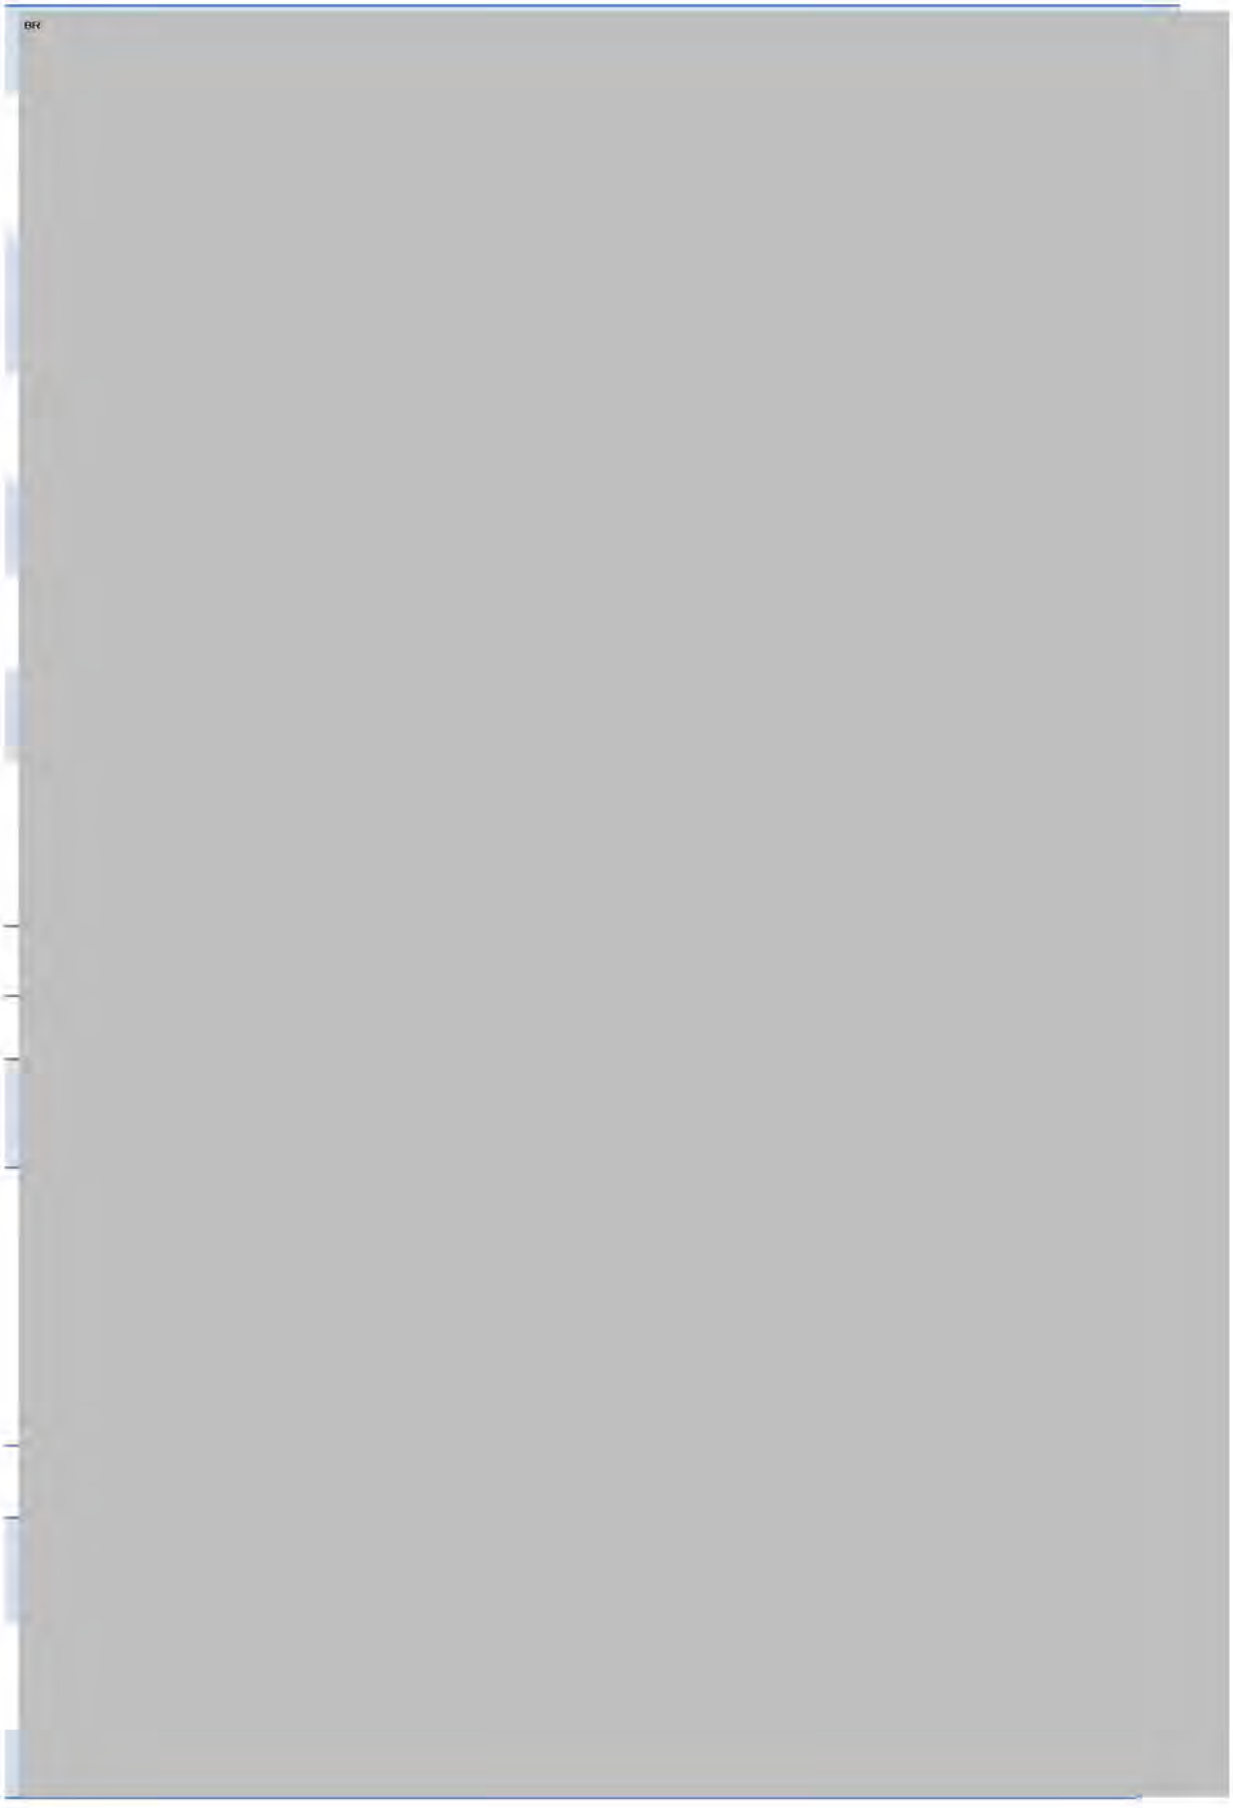
BR

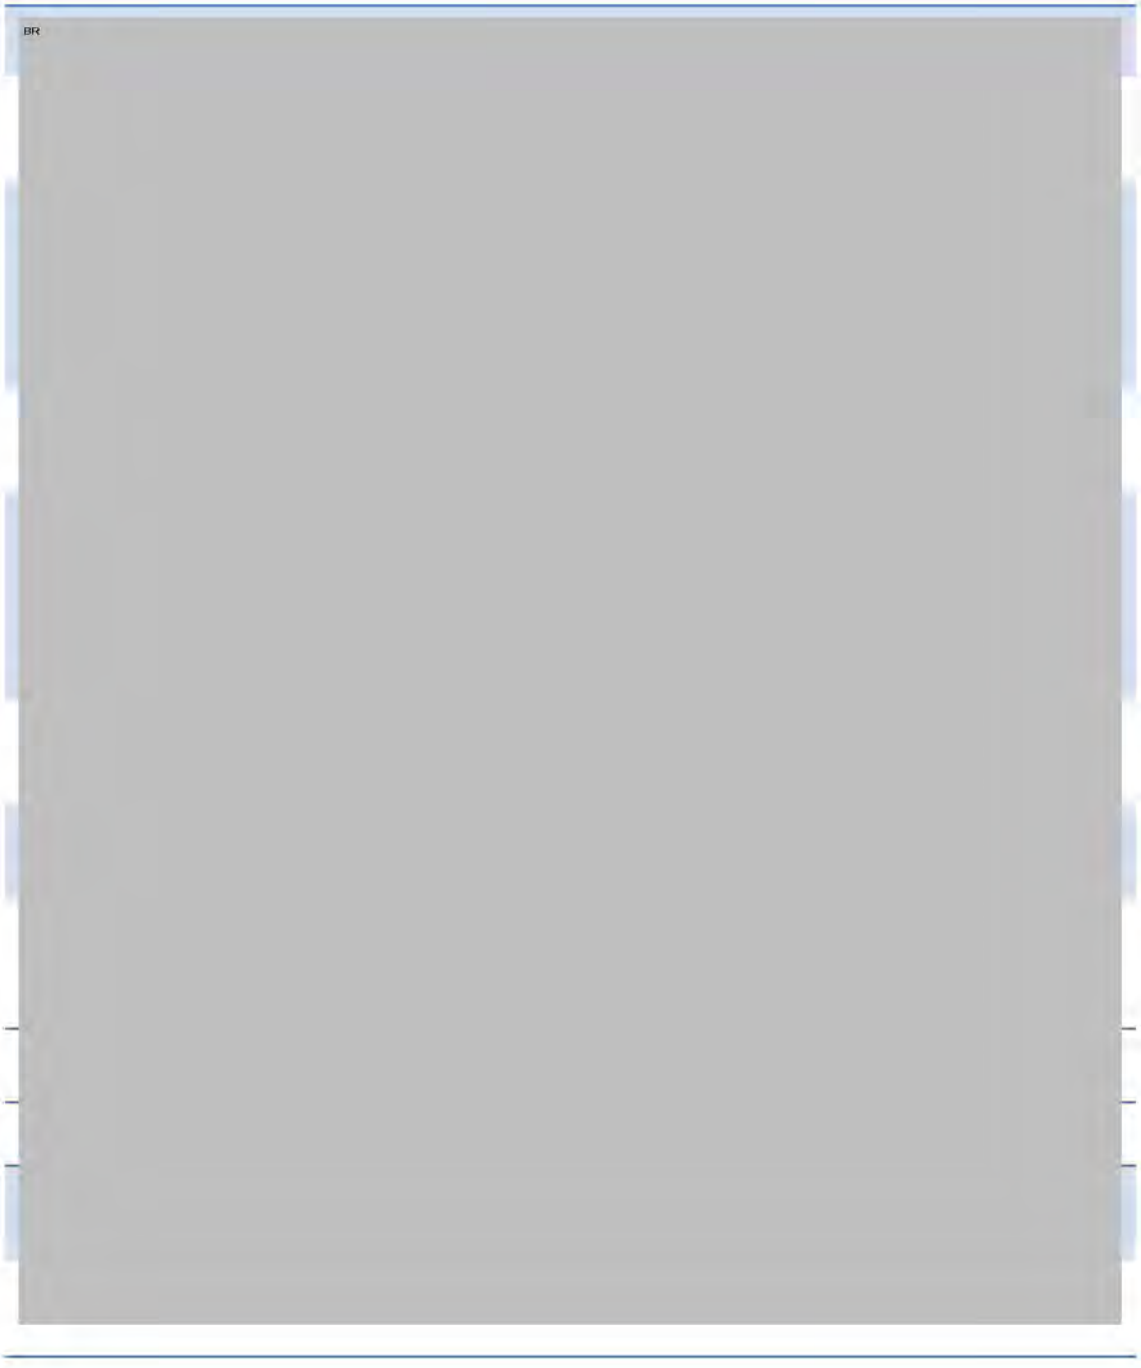
BR

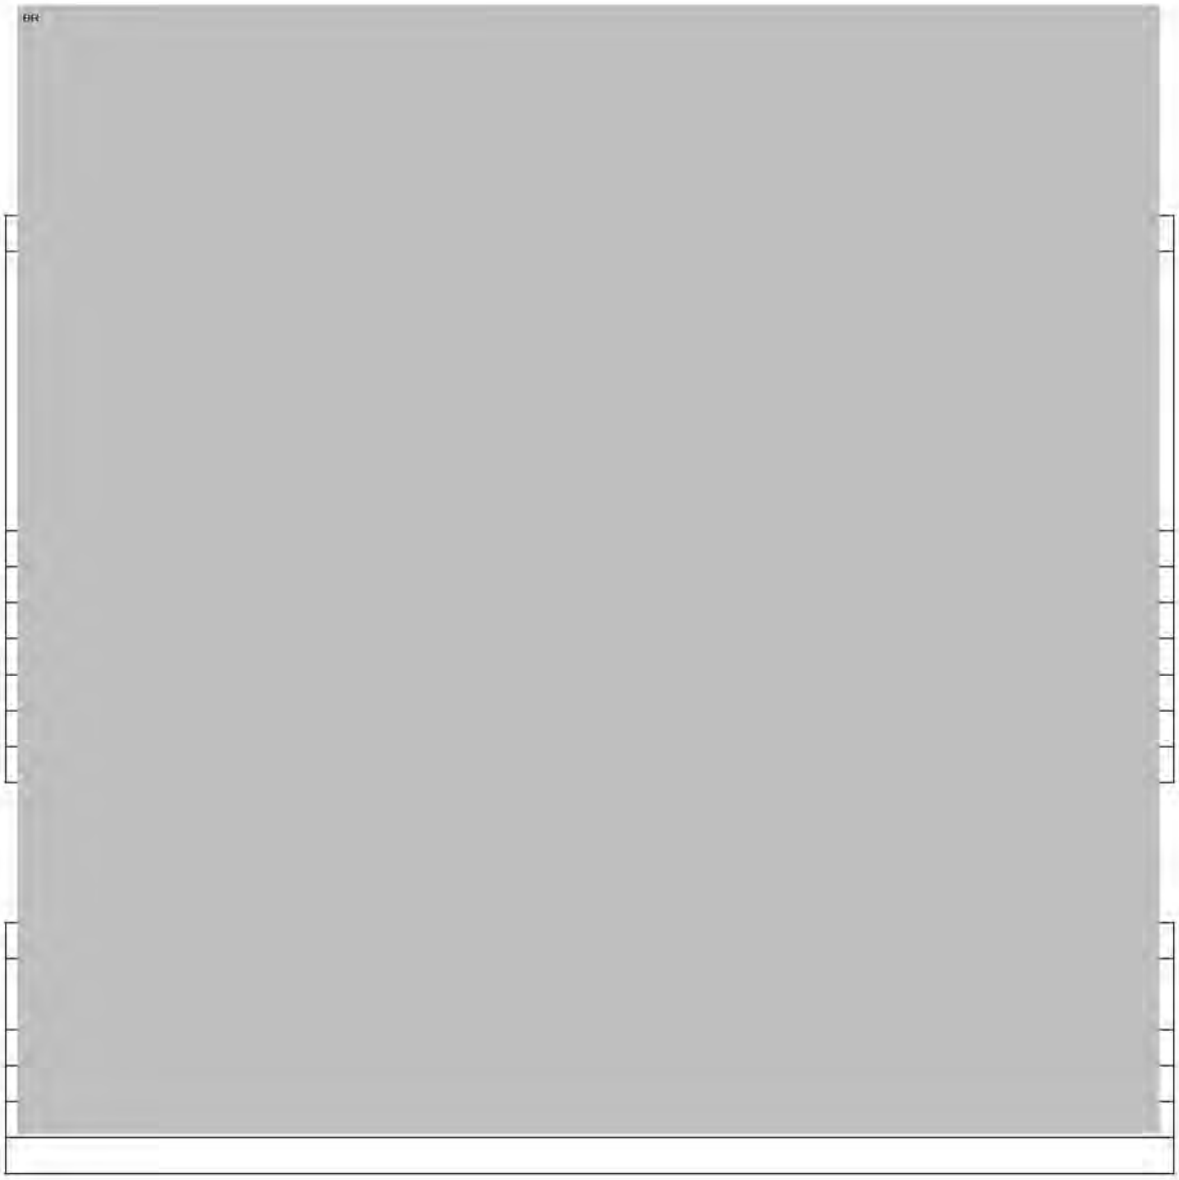

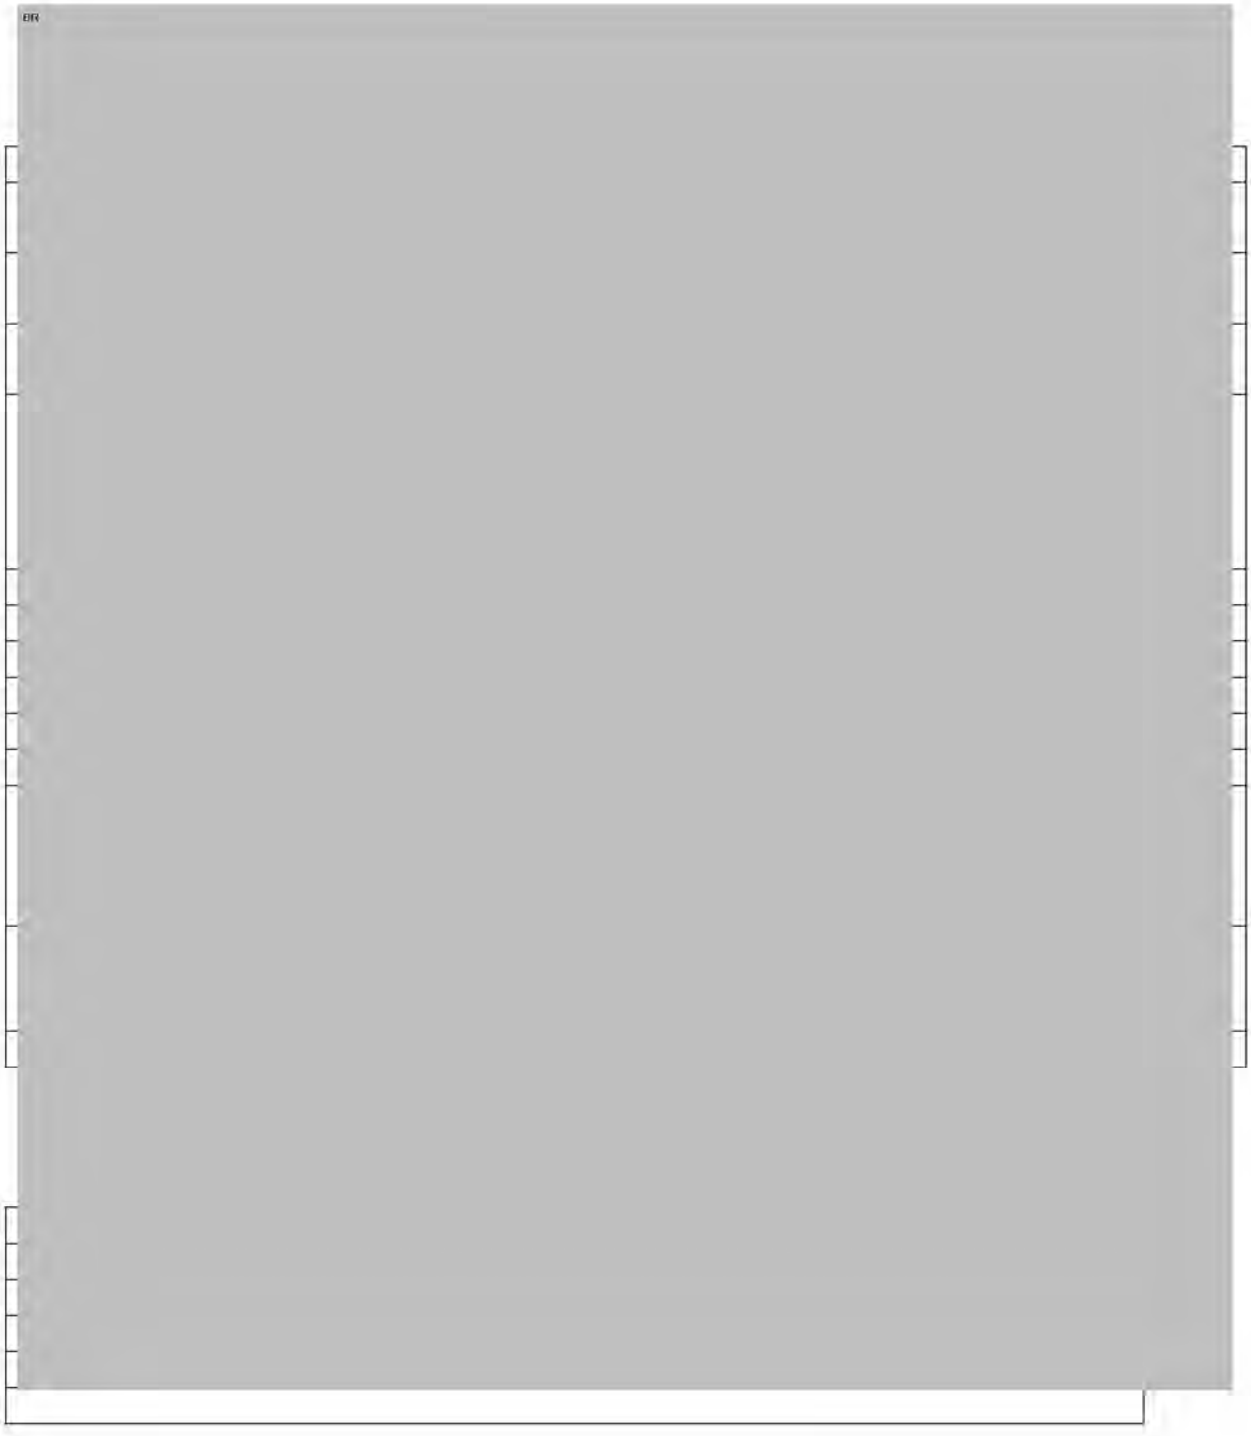

# 6 Bijlage: Uitvoeringsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen uitvoering**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM REFERENTIE-PLANNING (REVISIE C) | MIJLPAAL-DATUM PER 30 SEP 2017 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-PLANNING (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 28-nov-19 | 2 | Gevolg van conservatievere aanname gemiddelde boorsnelheid. |

* positief = weken achterstand, negatief = weken voorsprong

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

BR

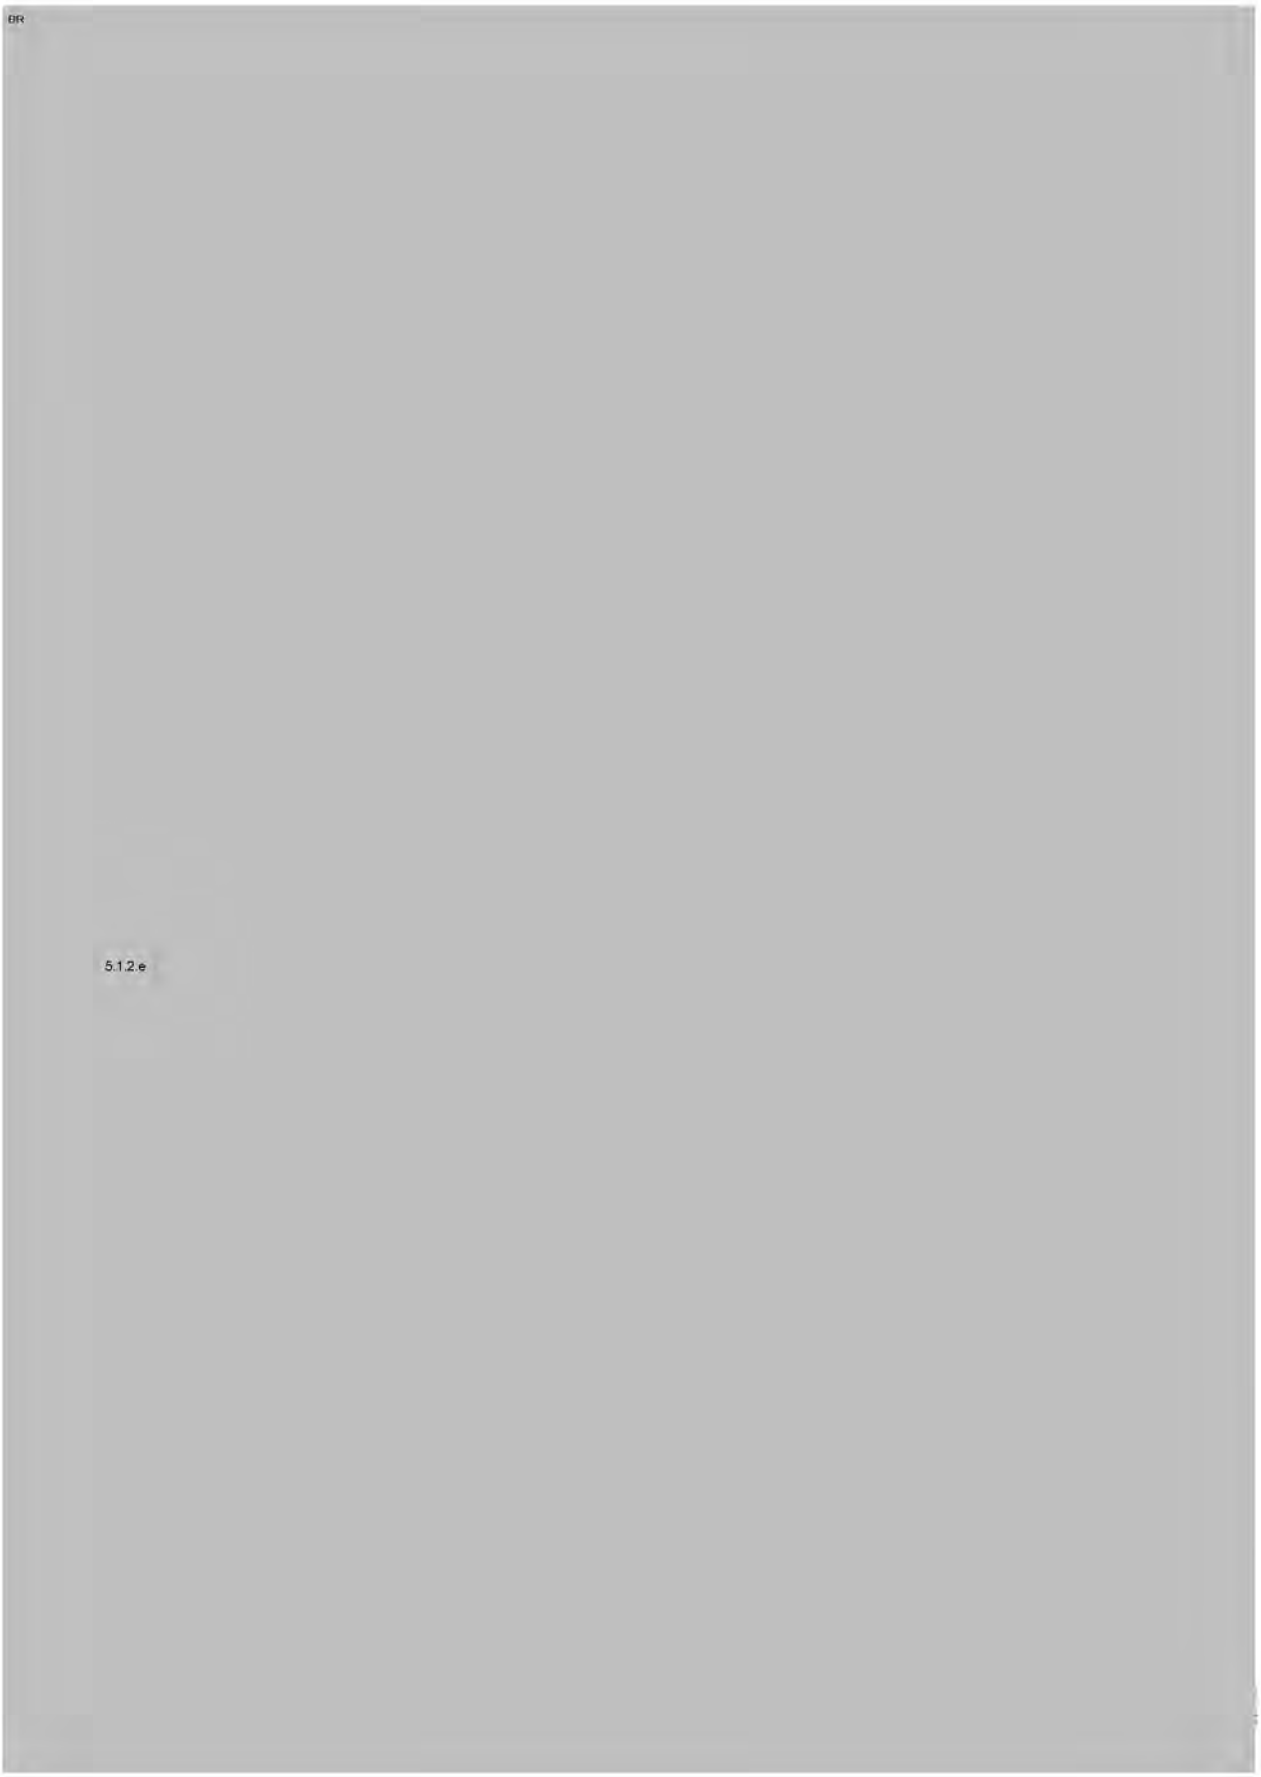
BR
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

BR

Docnr16



Docnr17

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 4e kwartaal 2017

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 18 januari 2017**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

Docnr17

Docnr17



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 4e kwartaal 2017
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004428

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>10 januari 2018 | Versie 0.1<br>10 januari 2018 | Versie 1.0<br>16 januari 2018 | Versie 2.0<br>18 januari 2018 | Versie 2.0<br>1 februari 2018 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder BSKB / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr17



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

*1.1 Financiën* 7

*1.2 Planning* 7

*1.3 Risico's* 7

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* 8
2.1.1 Afgelopen kwartaal 8
2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie en Vergunningen* 10
2.2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2.2 Komende kwartaal 10

*2.3 Verwervingen* 11
2.3.1 Afgelopen kwartaal 11
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Overeenkomsten* 12
2.4.1 Afgelopen kwartaal 12
2.4.2 Komende kwartaal 12

*2.5 Communicatie* 13
2.5.1 Afgelopen kwartaal 13
2.5.2 Komende kwartaal 13
2.5.3 Diversen 13

3 Projectvoortgang 15

*3.1 Aanbesteden en contracteren* 15
3.1.1 Afgelopen kwartaal 15
3.1.2 Komende kwartaal 15

*3.2 Vormgeving* 16
3.2.1 Afgelopen kwartaal 16
3.2.2 Komende kwartaal 16

*3.3 Monitoring* 17
3.3.1 Afgelopen kwartaal 17
3.3.2 Komende kwartaal 17

*3.4 Inpassing Binckhorst* 18
3.4.1 Afgelopen kwartaal 18
3.4.2 Komende kwartaal 18

*3.5 Inpassing Vlietzone* 19
3.5.1 Afgelopen kwartaal 19
3.5.2 Komende kwartaal 20

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* 21
3.6.1 Afgelopen kwartaal 21
3.6.2 Komende kwartaal 21

*3.7 Boortunnel en toeritten* 22

Docnr17




3.7.1 Afgelopen kwartaal 22
3.7.2 Komende kwartaal 23

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *24*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 24
3.8.2 Komende kwartaal 25

*3.9 Installaties* *26*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 26
3.9.2 Komende kwartaal 26

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *27*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 27
3.10.2 Komende kwartaal 27

*3.11 Uitvoeringskwaliteit* *28*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 28
3.11.2 Komende kwartaal 28

*3.12 Contractmanagement* *29*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 29
3.12.2 Komende kwartaal 29

**4 Overdracht en openstelling** **30**

*4.1 Tunnelveiligheid* *30*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 30
4.1.2 Komende kwartaal 30

*4.2 Overdracht aan beheerders* *31*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 31
4.2.2 Komende kwartaal 31

*4.3 Beheer en onderhoud* *32*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 32
4.3.2 Komende kwartaal 32

**5 Projectbeheersing** **33**

*5.1 Scope* *33*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 33
5.1.2 Komende kwartaal 33

*5.2 Financien* *34*
5.2.1 Kostenstructuur 34
5.2.2 Dekkingen 35

*5.3 Planning* *38*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 38
5.3.2 Komende kwartaal 38

*5.4 Risico's* *39*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 39
5.4.2 Komende kwartaal 39
5.4.3 Financiële toprisico's 39
5.4.4 Toprisico's planning 40

*5.5 Interne kwaliteit* *42*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 42

Docnr17



5.5.2 Komende kwartaal 42

*5.6 Informatiebeheer* *43*

5.6.1 Afgelopen kwartaal 43

5.6.2 Komende kwartaal 43

5.6.3 Kennisdeling 43

*5.7 Organisatie* *45*

5.7.1 Afgelopen kwartaal 45

5.7.2 Komende kwartaal 45

**6 Bijlage: Uitvoeringsmijlpalen 46**

**7 Bijlage: Contractmijlpalen en Trendanalyse 47**

**8 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 49**

**9 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 51**

# 1 Managementsamenvatting

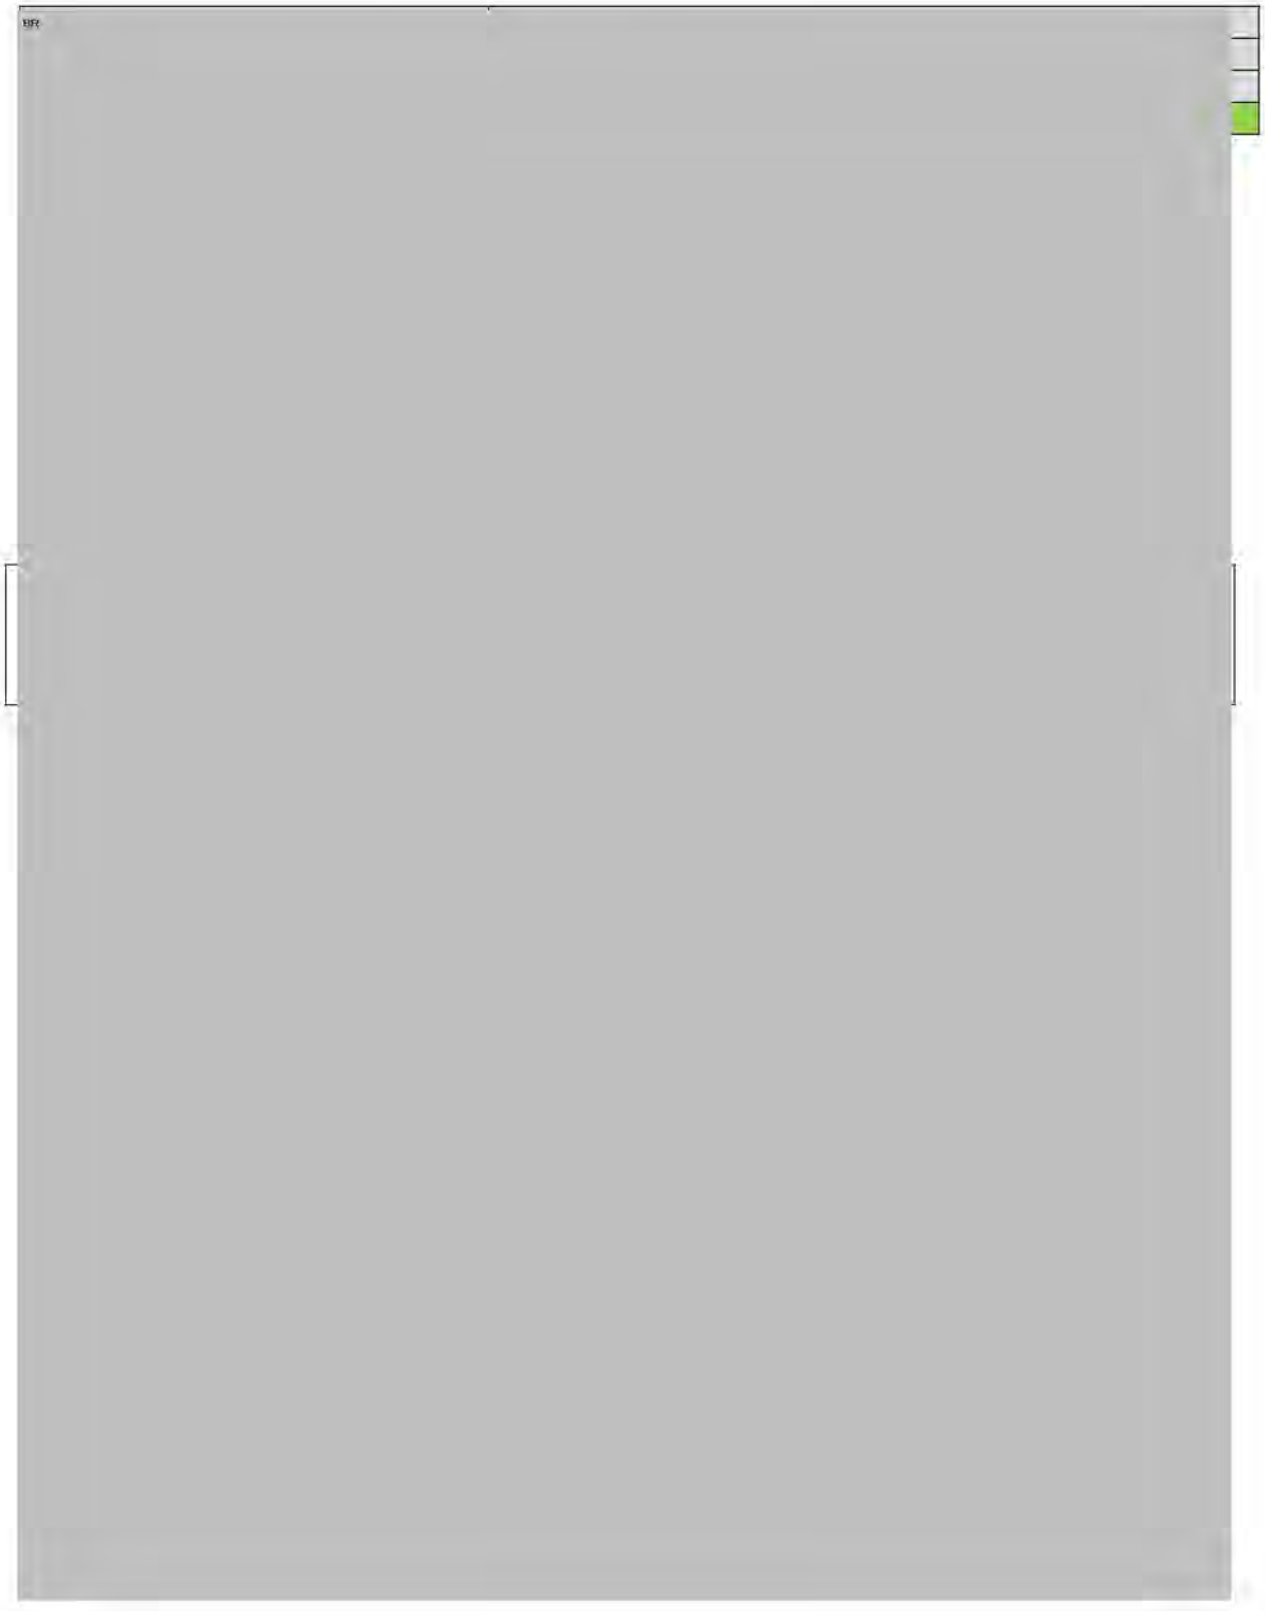

- Op 11 oktober 2017 is aan de begeleidingscommissie het ontwerp voor het Molenvlietpark gepresenteerd. Het ontwerp is positief ontvangen;

- In het toekomstige Molenvlietpark zijn de eerste kades (langs Molensloot en Vredenoord) aangelegd welke t.z.t. dienst doen voor het bergingsgebied;

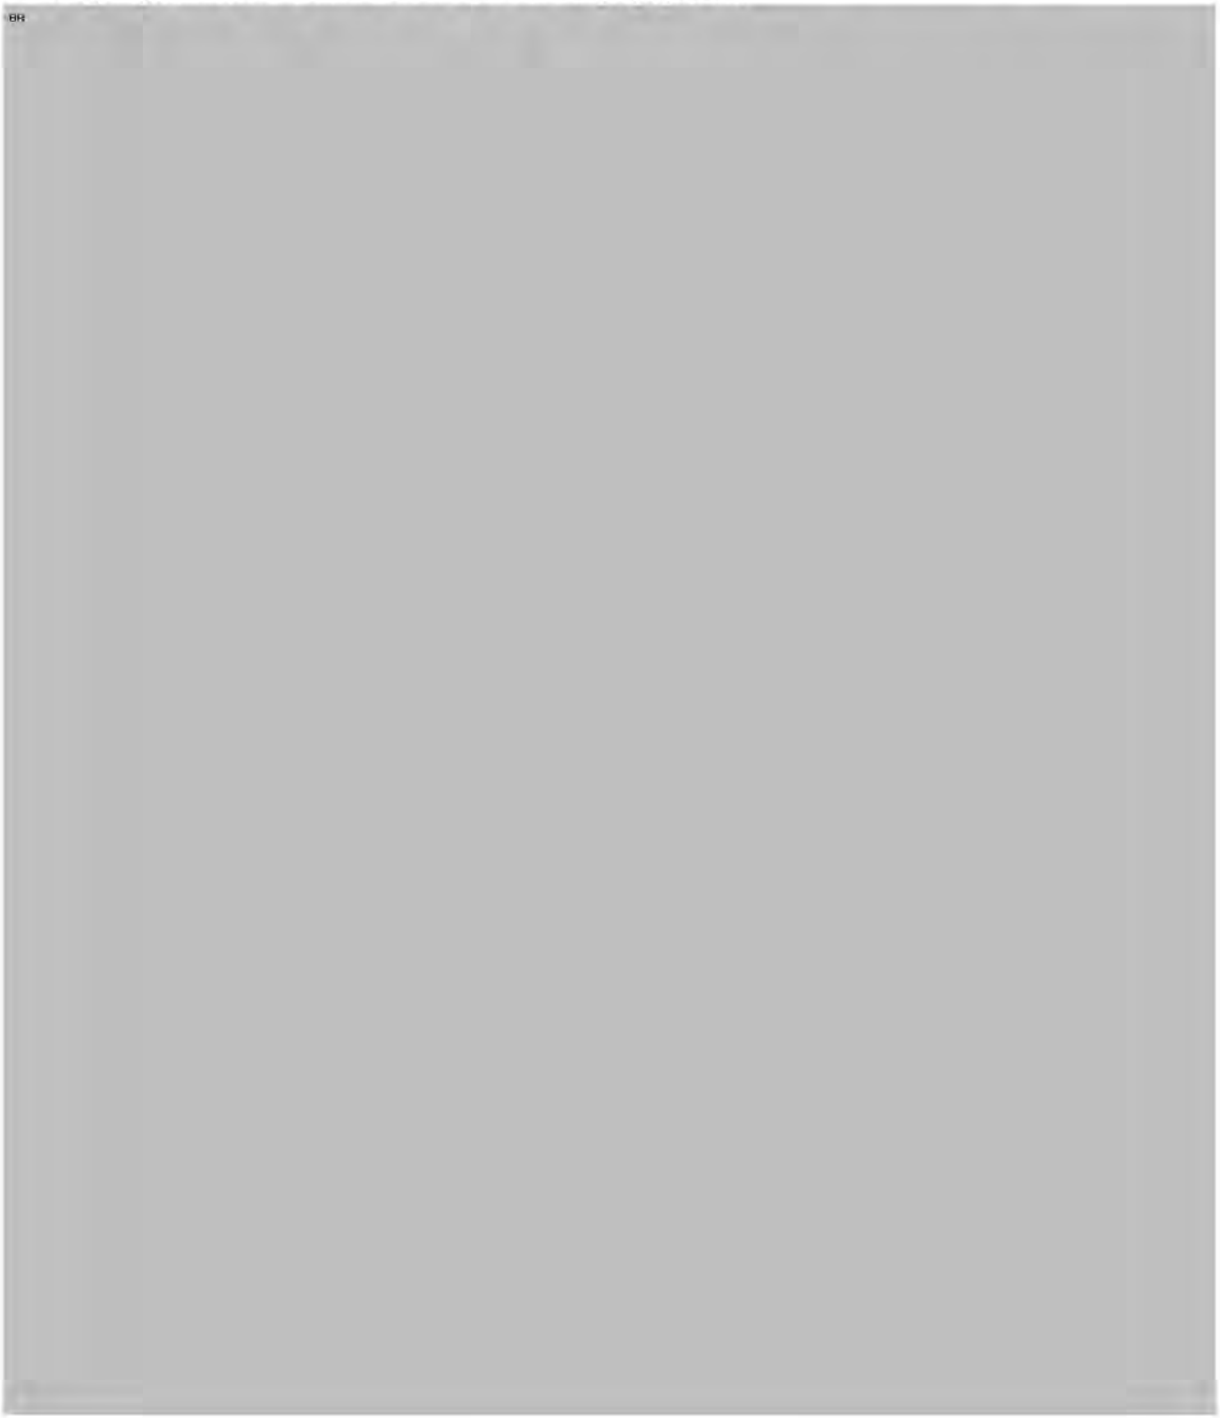

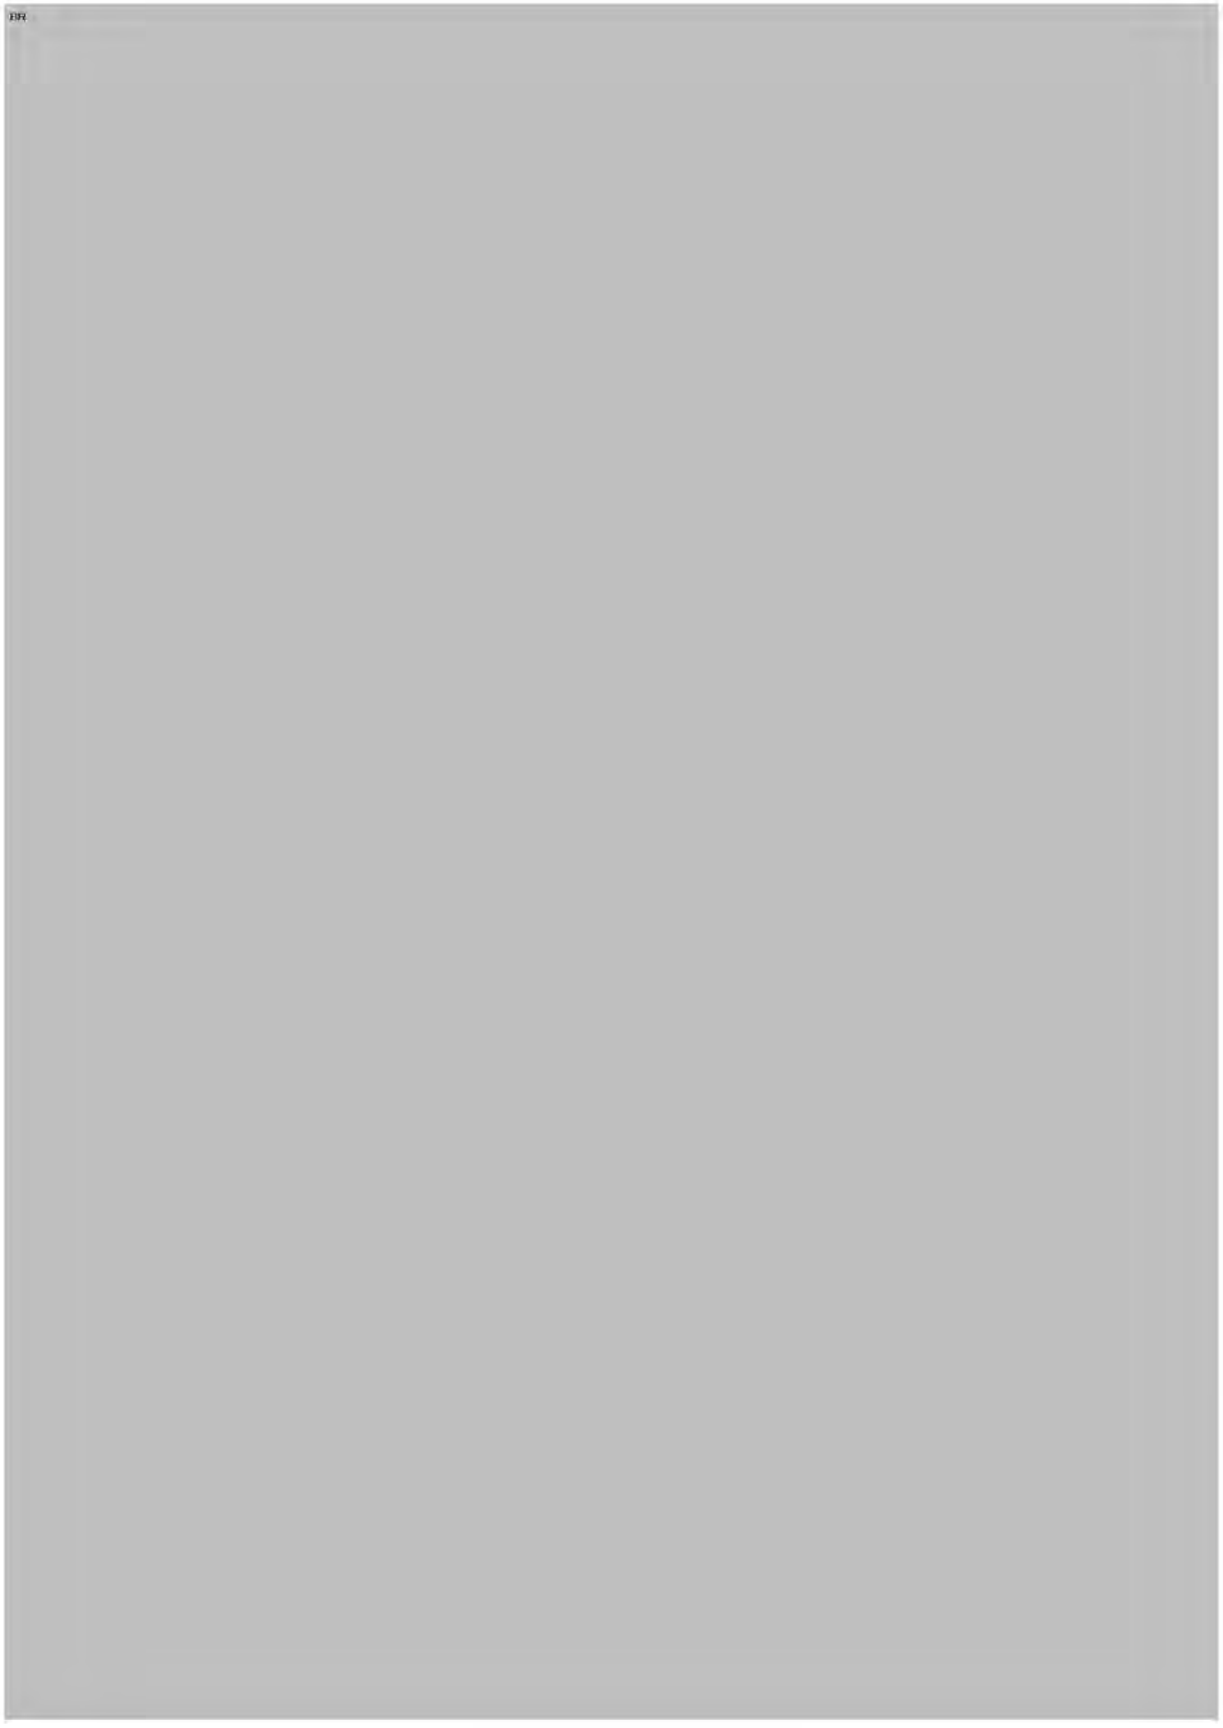

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| In het kader van de noodzakelijke waterinlaat richting bergingsgebied in het Molenvlietpark zullen de heren Revis, 5.1.2.e (PUK Nieuw Vredenoord) en 5.1.2.e (Roba / waterinlaat) een locatiebezoek brengen aan 5.1.2.e | Op 13 oktober hebben de heren Revis, 5.1.2.e en 5.1.2.e een locatiebezoek gebracht aan dhr. en mw. 5.1.2.e Hierna is een concept planuitwerkingskader (PUK) Nieuw Vredenoord opgesteld en met dhr. en mw. 5.1.2.e besproken. Hierna heeft intensief contact plaatsgevonden tussen PMDH en de familie 5.1.2.e om tot een voor beide partijen acceptabele PUK te komen. Dit proces wordt in het nieuwe jaar voortgezet. |
| | |
| **Overige / extra verrichte werkzaamheden** | |
| Op 11 oktober 2017 is aan de begeleidingscommissie het ontwerp voor het Molenvlietpark gepresenteerd. Het ontwerp is positief ontvangen. | |
| [redacted] | |
| Er zijn diverse contactmomenten met diverse stakeholders geweest. Tezamen met CRB is bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan enkele bewoners van Park Hoornwijck. Op hun verzoek en na overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland, is duidelijk geworden dat een voorziene brug in het Molenvlietpark vlak achter de desbetreffende woningen vervangen kan worden door een duiker. Dit komt het toekomstige uitzicht vanuit de woningen ten goede. | |
| [redacted] | |

| |
|---|
| BR |
| |
| |
| |

### 2.1.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
|---|
| Diverse stakeholders spreken, in ieder geval BR 5.1.2 e BR BR |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |

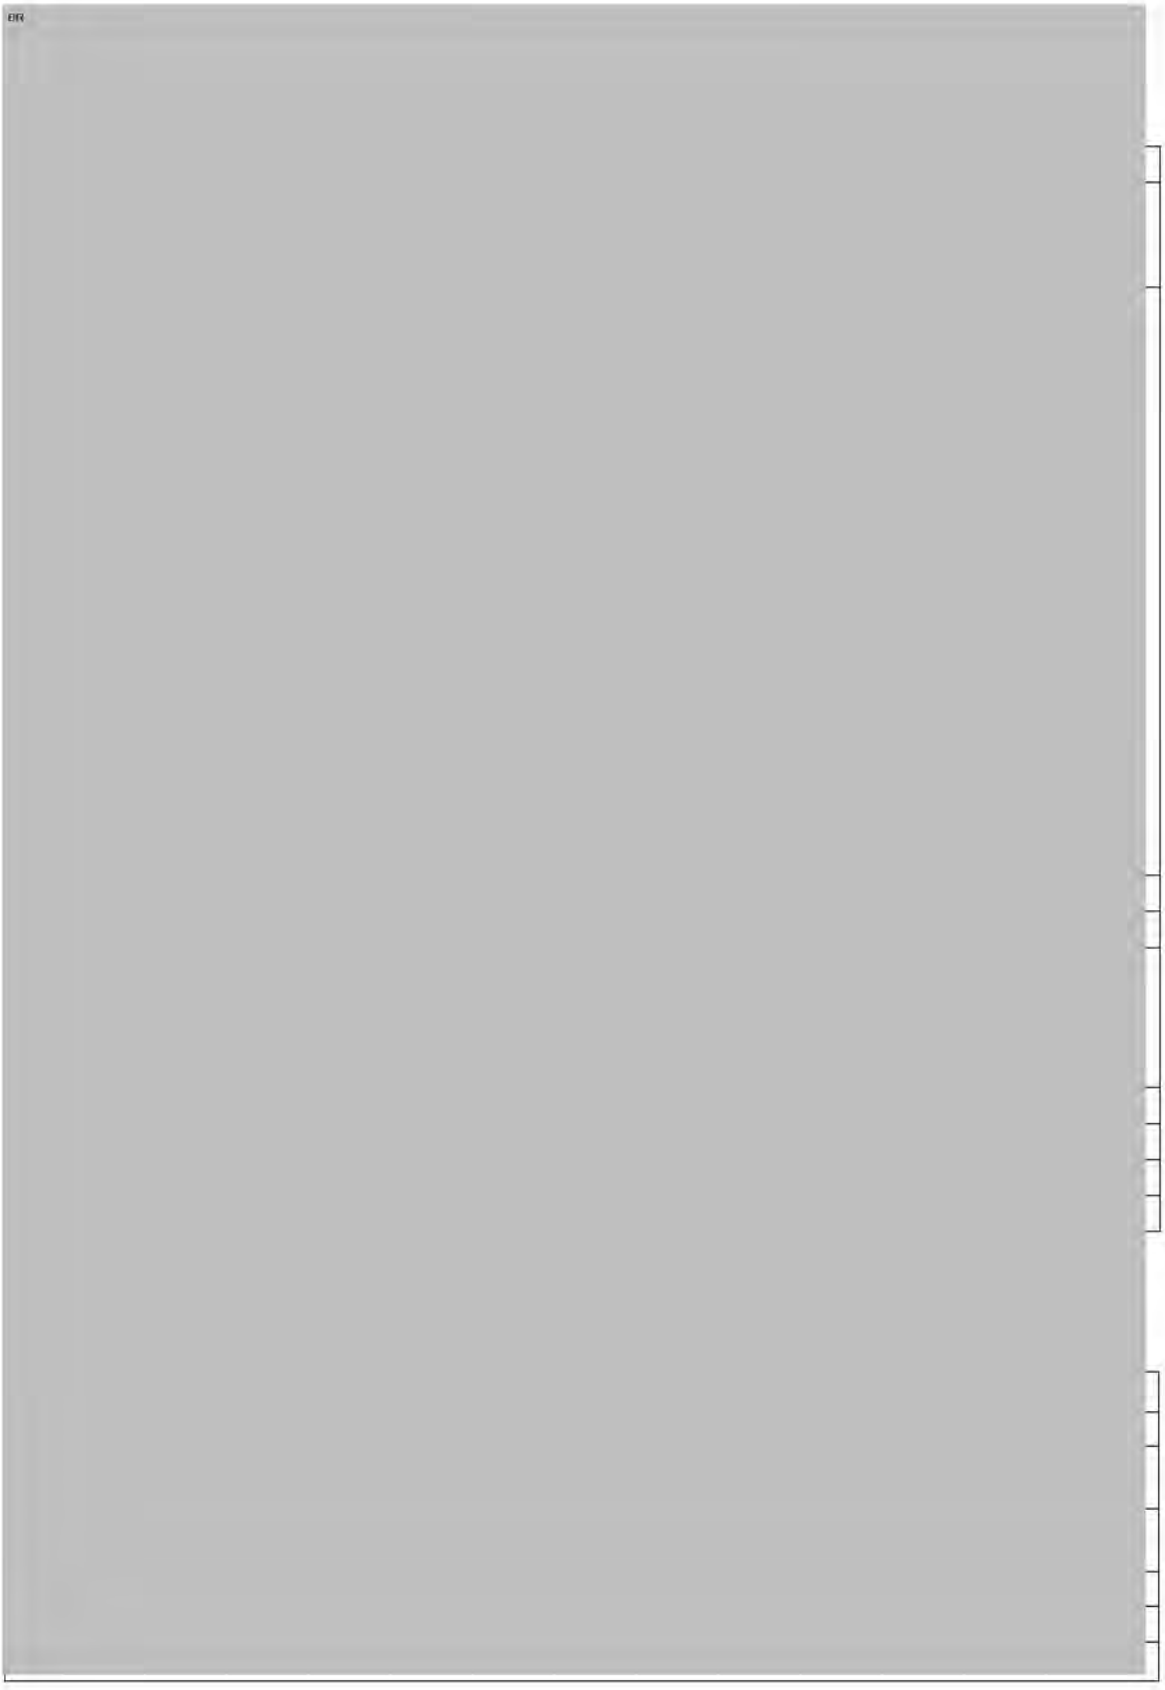

## 2.3 Verwervingen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| |
|---|
| 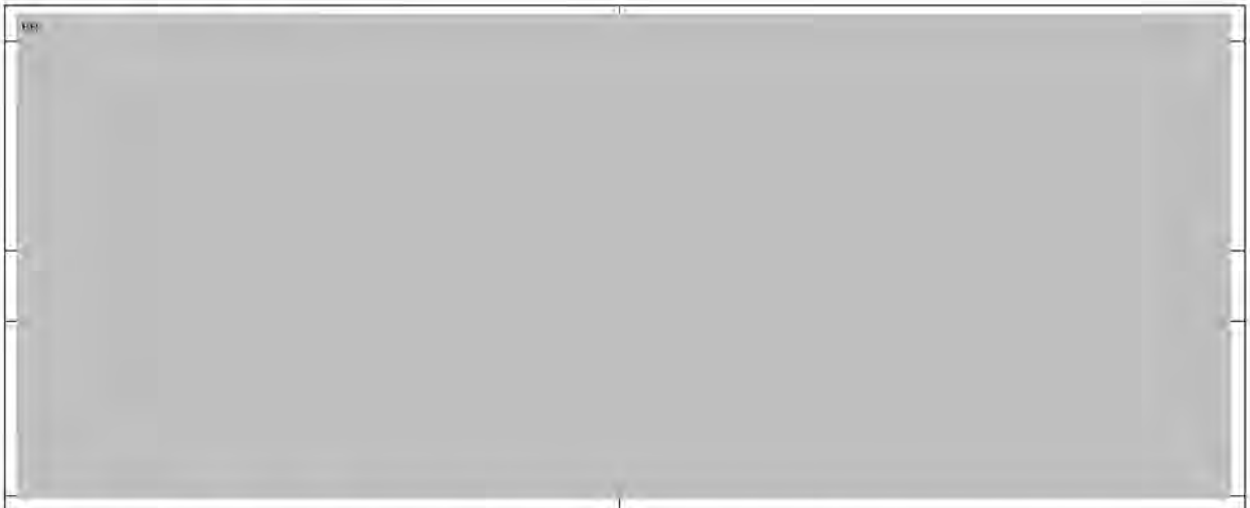 |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** |
| Den Haag heeft een aankooptraject gestart voor het perceel aan de Jan Thijssenweg 8 in Den Haag ten behoeve van de tweede toevoer naar het bergingsgebied in het Molenvlietpark. Eind december 2017 hebben de verkopers het finale aanbod van Den Haag afgewezen en het pand verkocht aan een particulier. |
| Geen |

| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
|---|---|
| Geen | Geen |

| |
|---|
| |

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Bereiken overeenstemming t.a.v. de ontwerpoplossing (incl. locatiekeuze) voor de waterinlaat naar het bergingsgebied in het Molenvlietpark en de afspraken vastleggen in een overeenkomst. | Gesprekken zijn voortgezet. Doel is om februari 2018 afspraken/uitgangspunten overeen te komen en nadien een samenwerkingsovereenkomst verder uit te werken. |
| [redacted] | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| [redacted] |
| Samenwerkingsovereenkomst opstellen en formaliseren t.b.v. de waterinlaat vanuit de Vliet naar het bergingsgebied in het Molenvlietpark. |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |

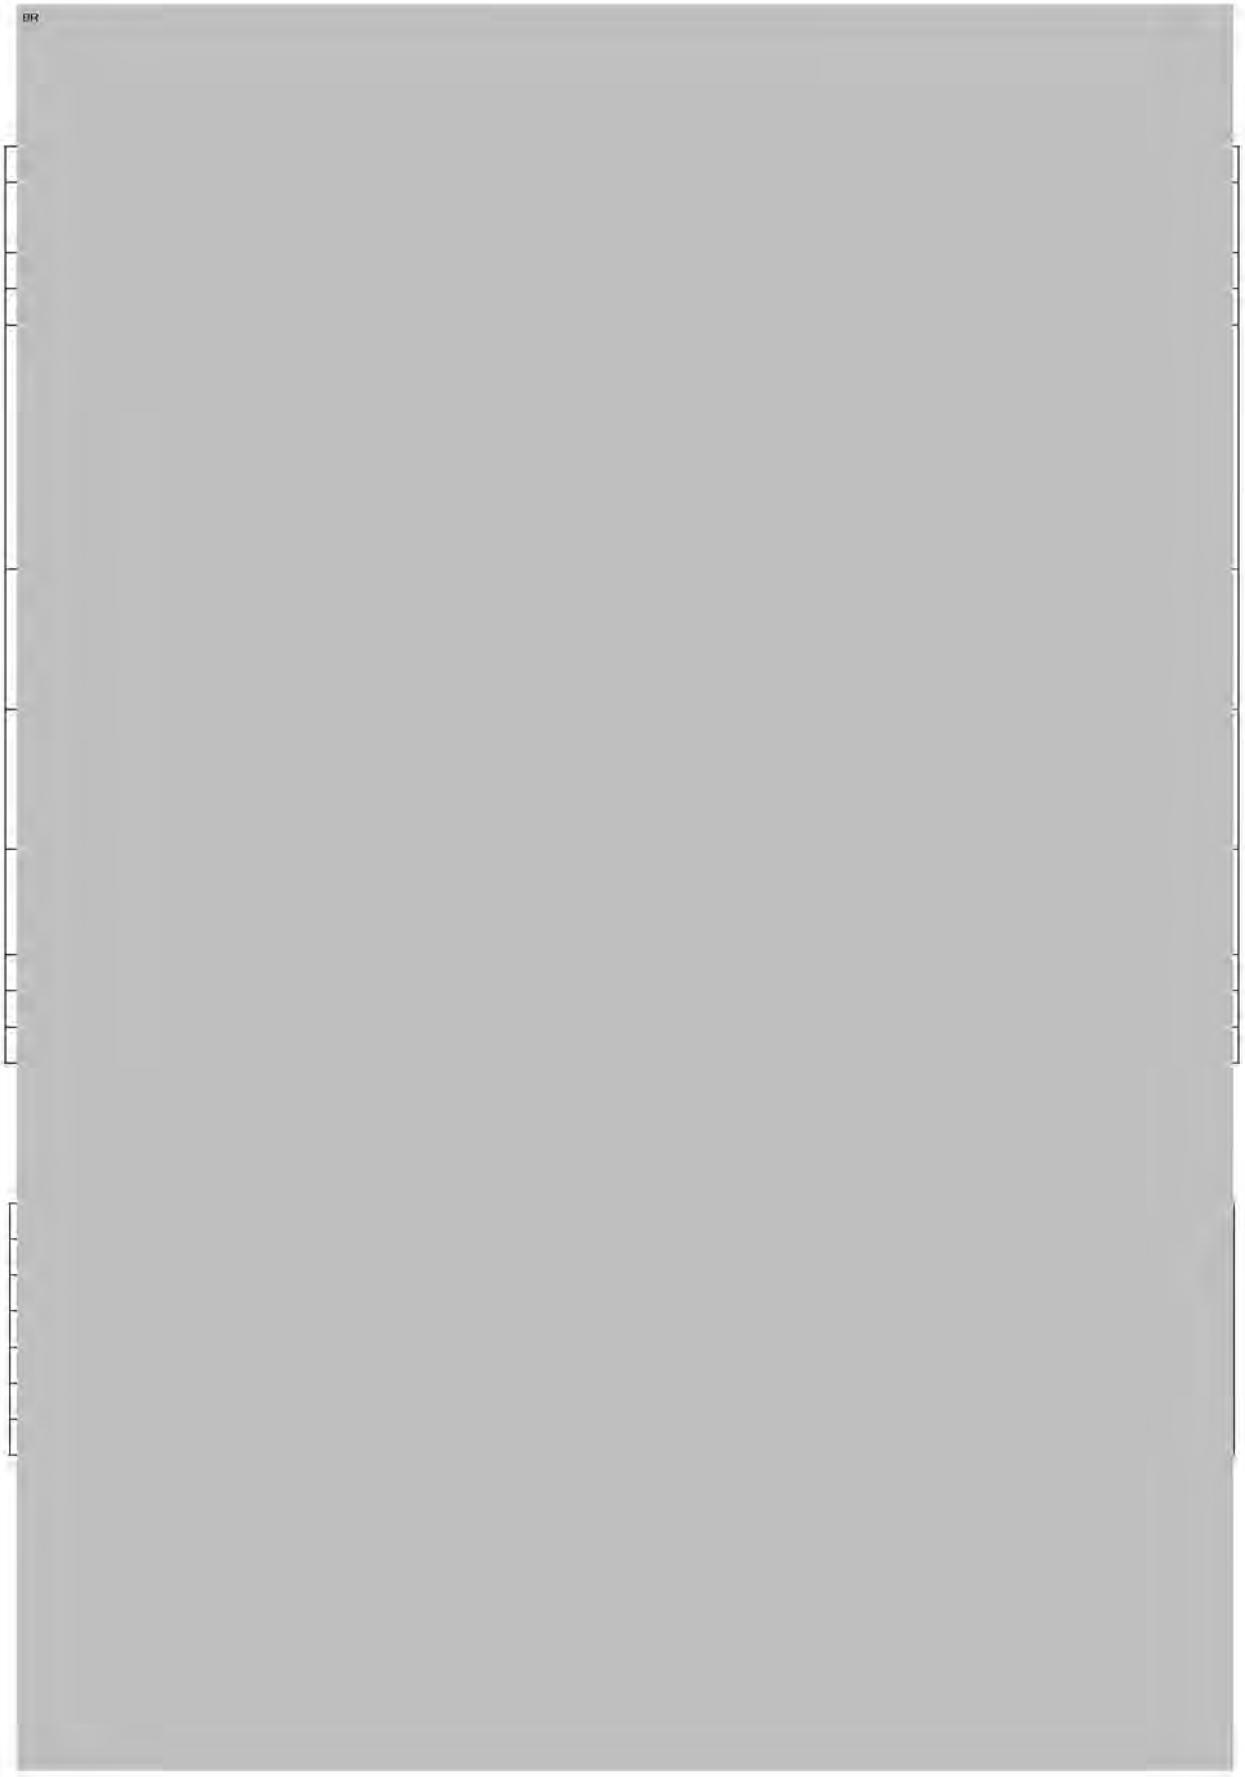
BR

BR

Docnr17



# 3 Projectvoortgang

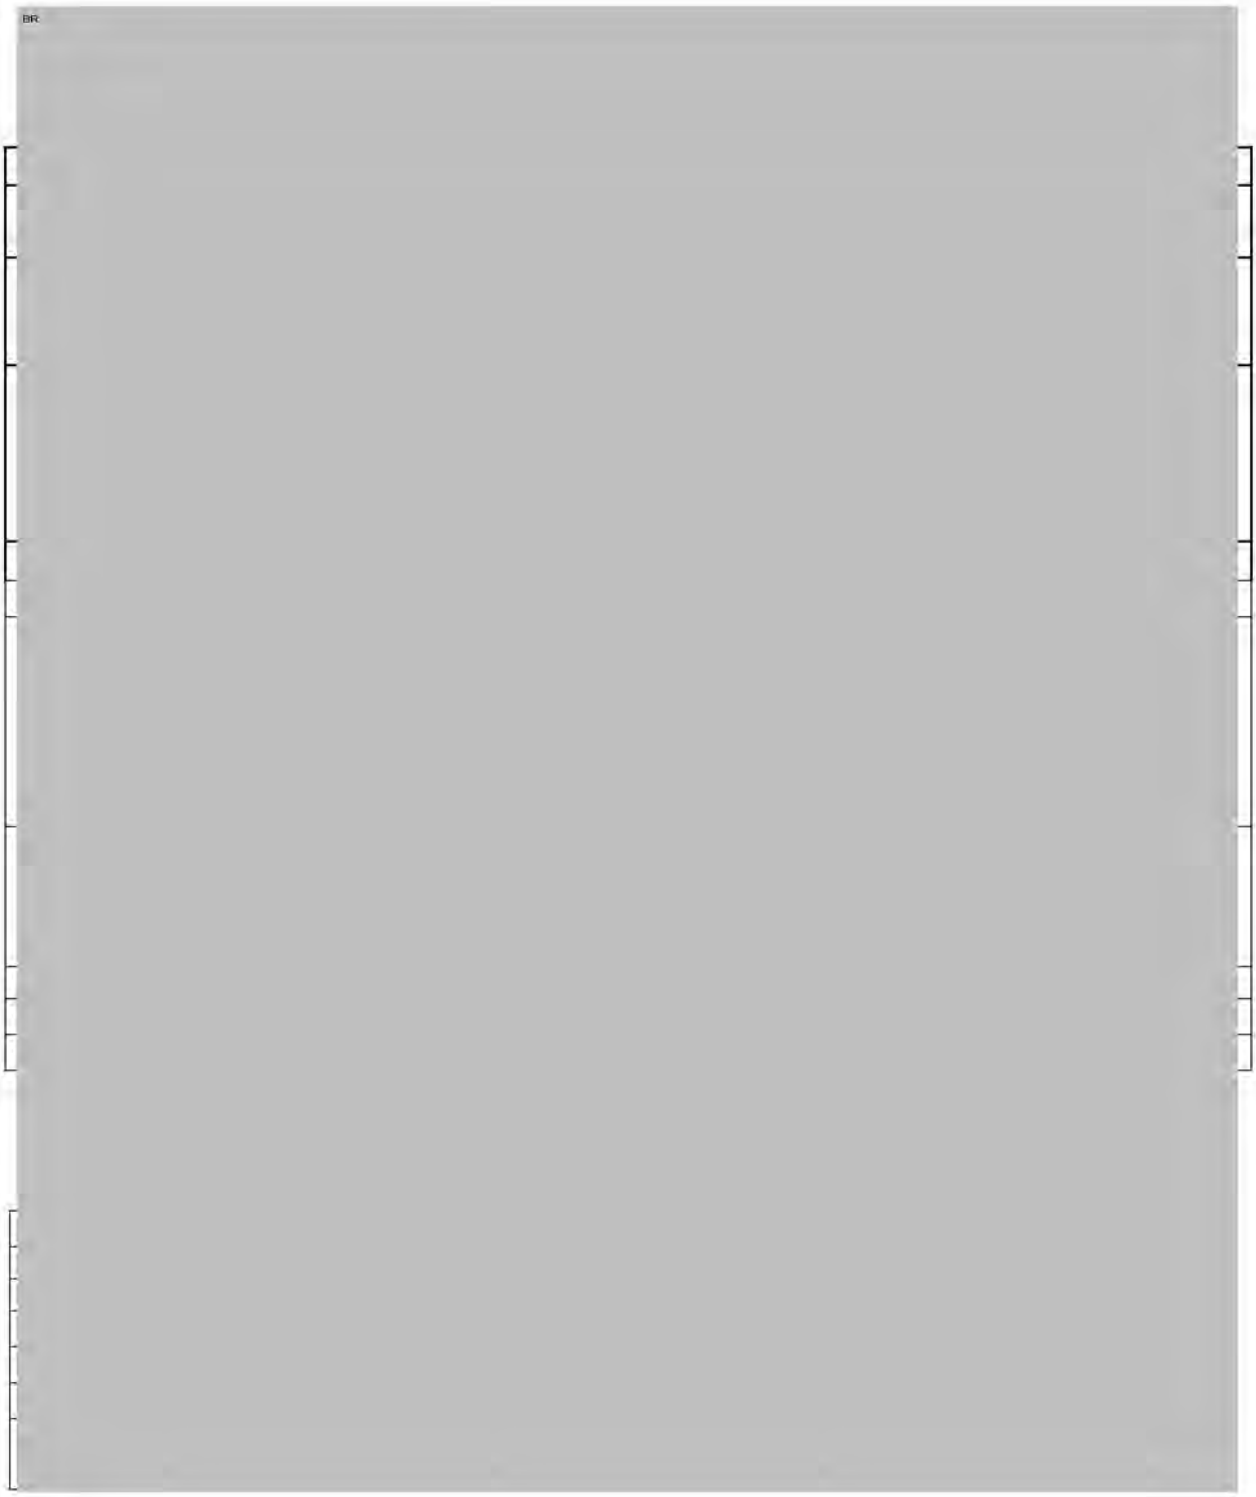

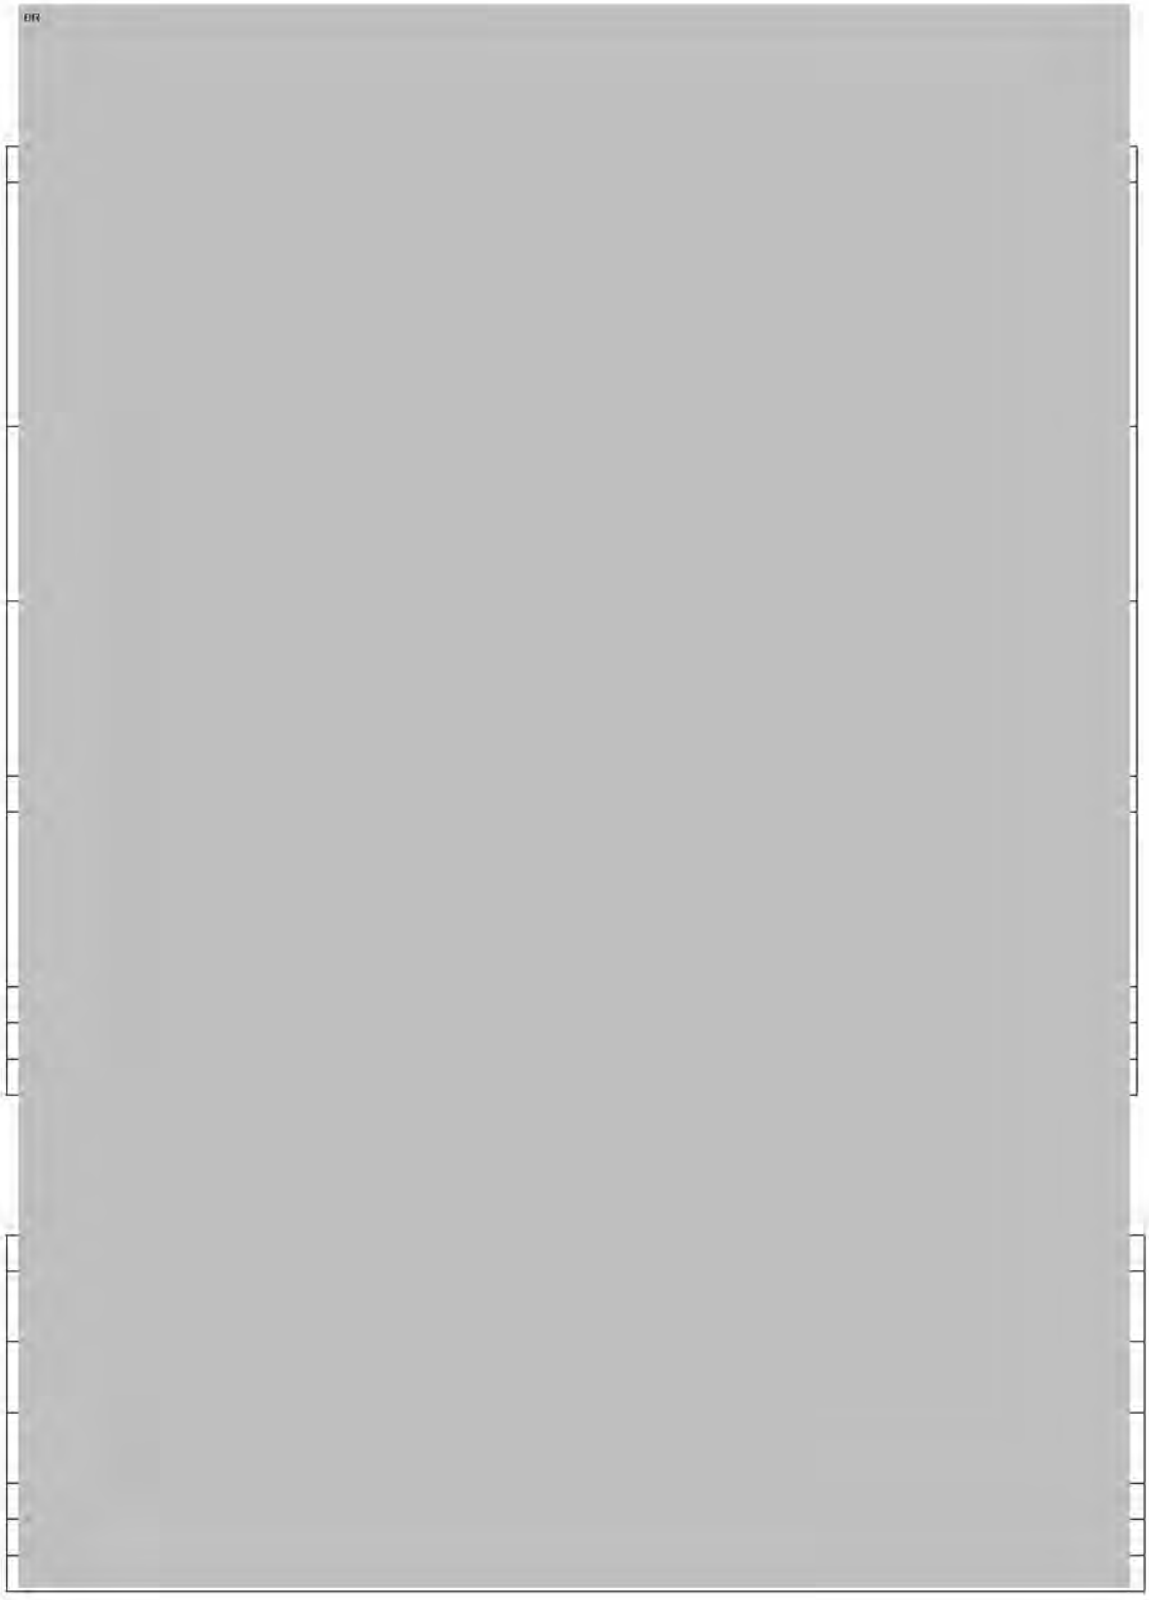

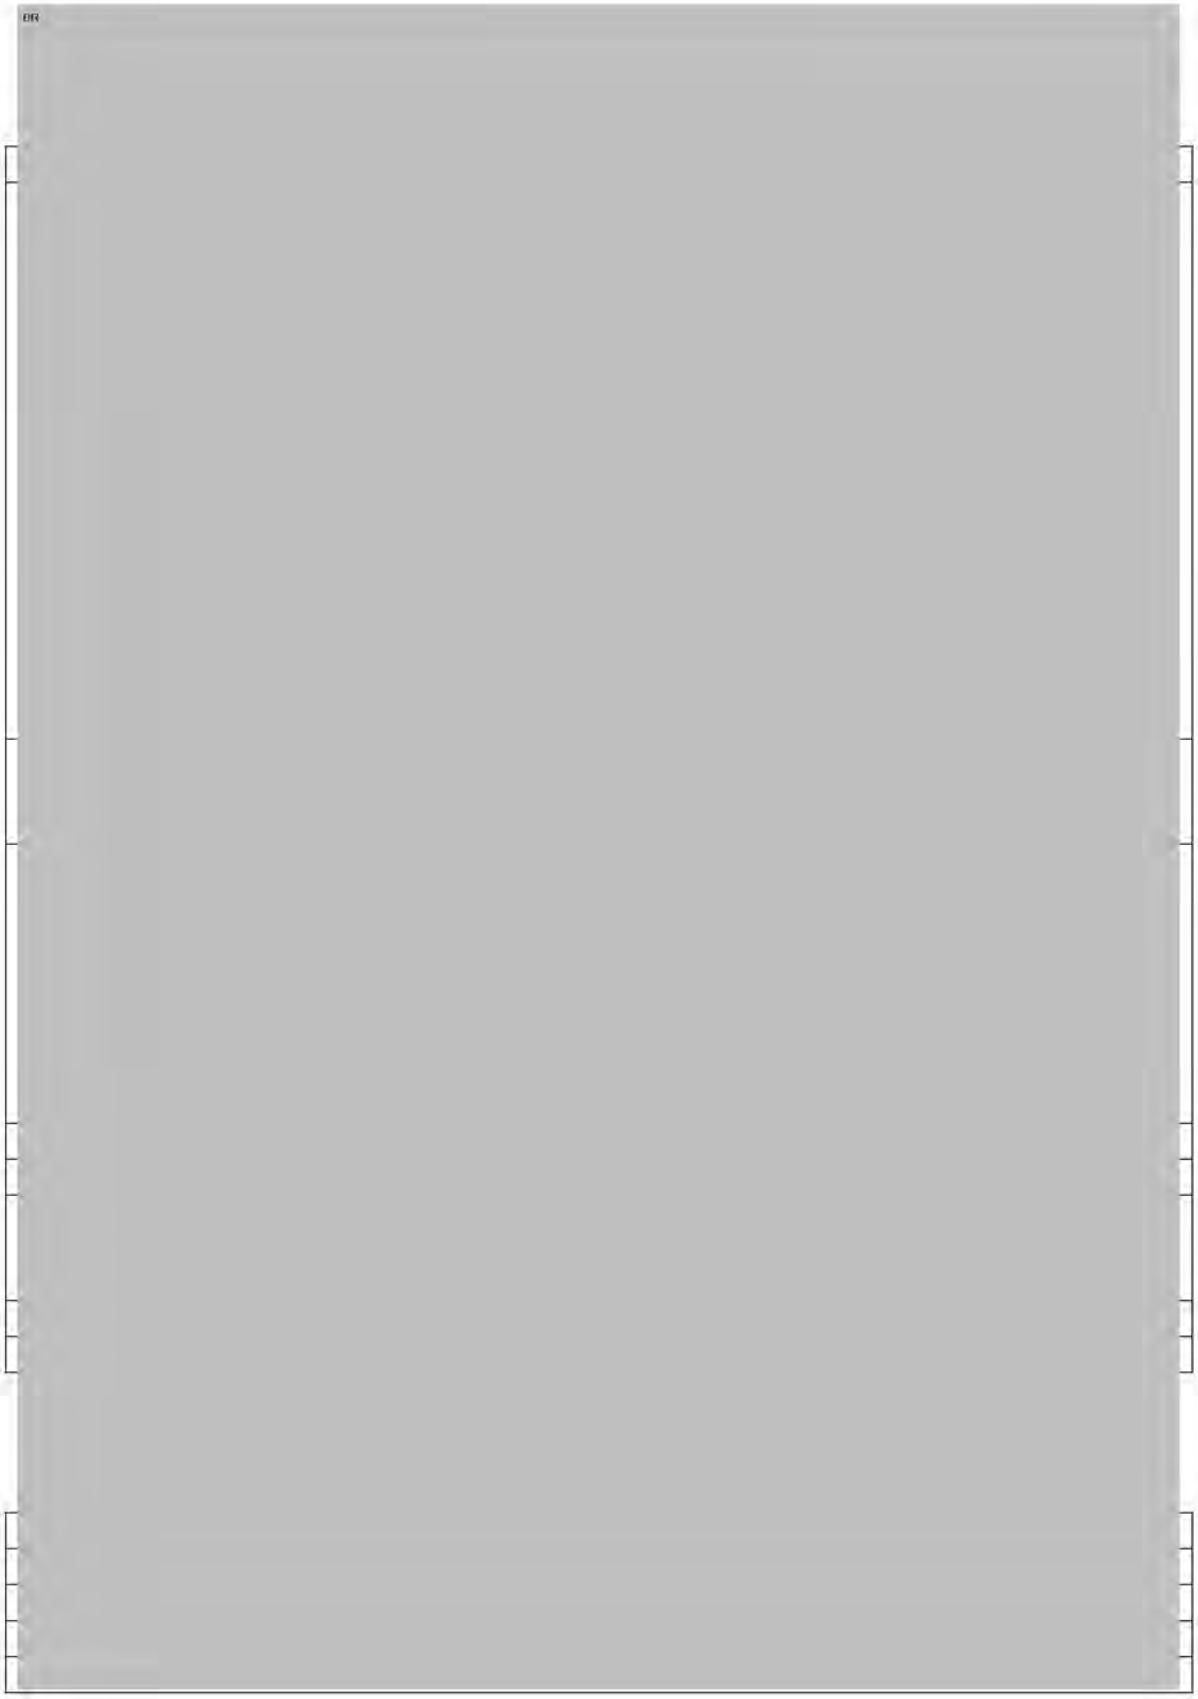

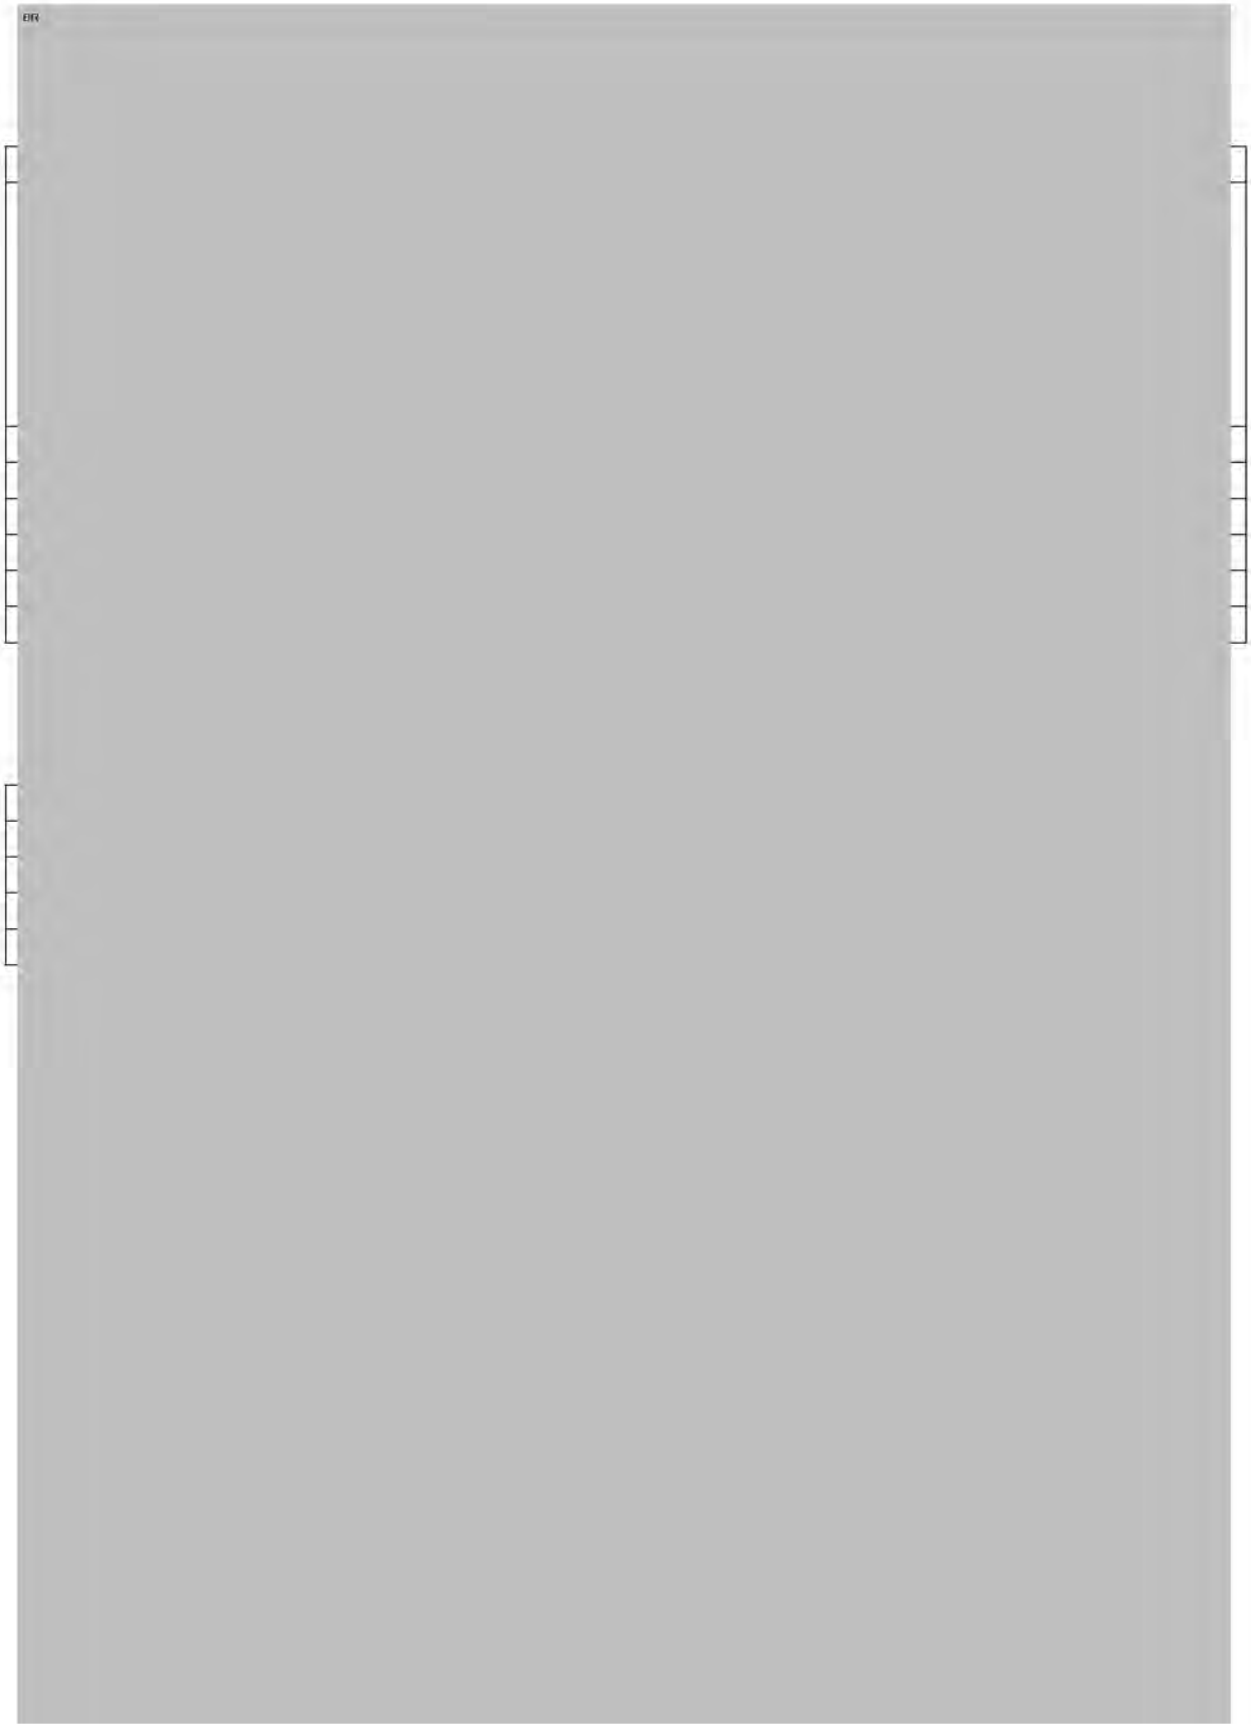

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

**Hoofdcontract**

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| | |
| Molenvlietpark: Afronden kade, afronden zandkern, aanbrengen dijkklei en bekleden met gebiedseigen grond. | Kades (langs Molensloot en Vredenoord) zijn aangelegd en worden bekleed met gebiedseigen grond. |
| | |

| |
|---|
| BR |

**Hoofdcontract**

| **Werkzaamheden** |
|---|
| Molenvlietpark: Bomenkap na verlenen aanvullende kapvergunning zodat de nieuwe boezemkade op de bestaande kade kan worden aangesloten. Aanbrengen bovengrond op de nieuwe kade. |
| BR |

Aanleg boezemkade Molenvlietpark

BR

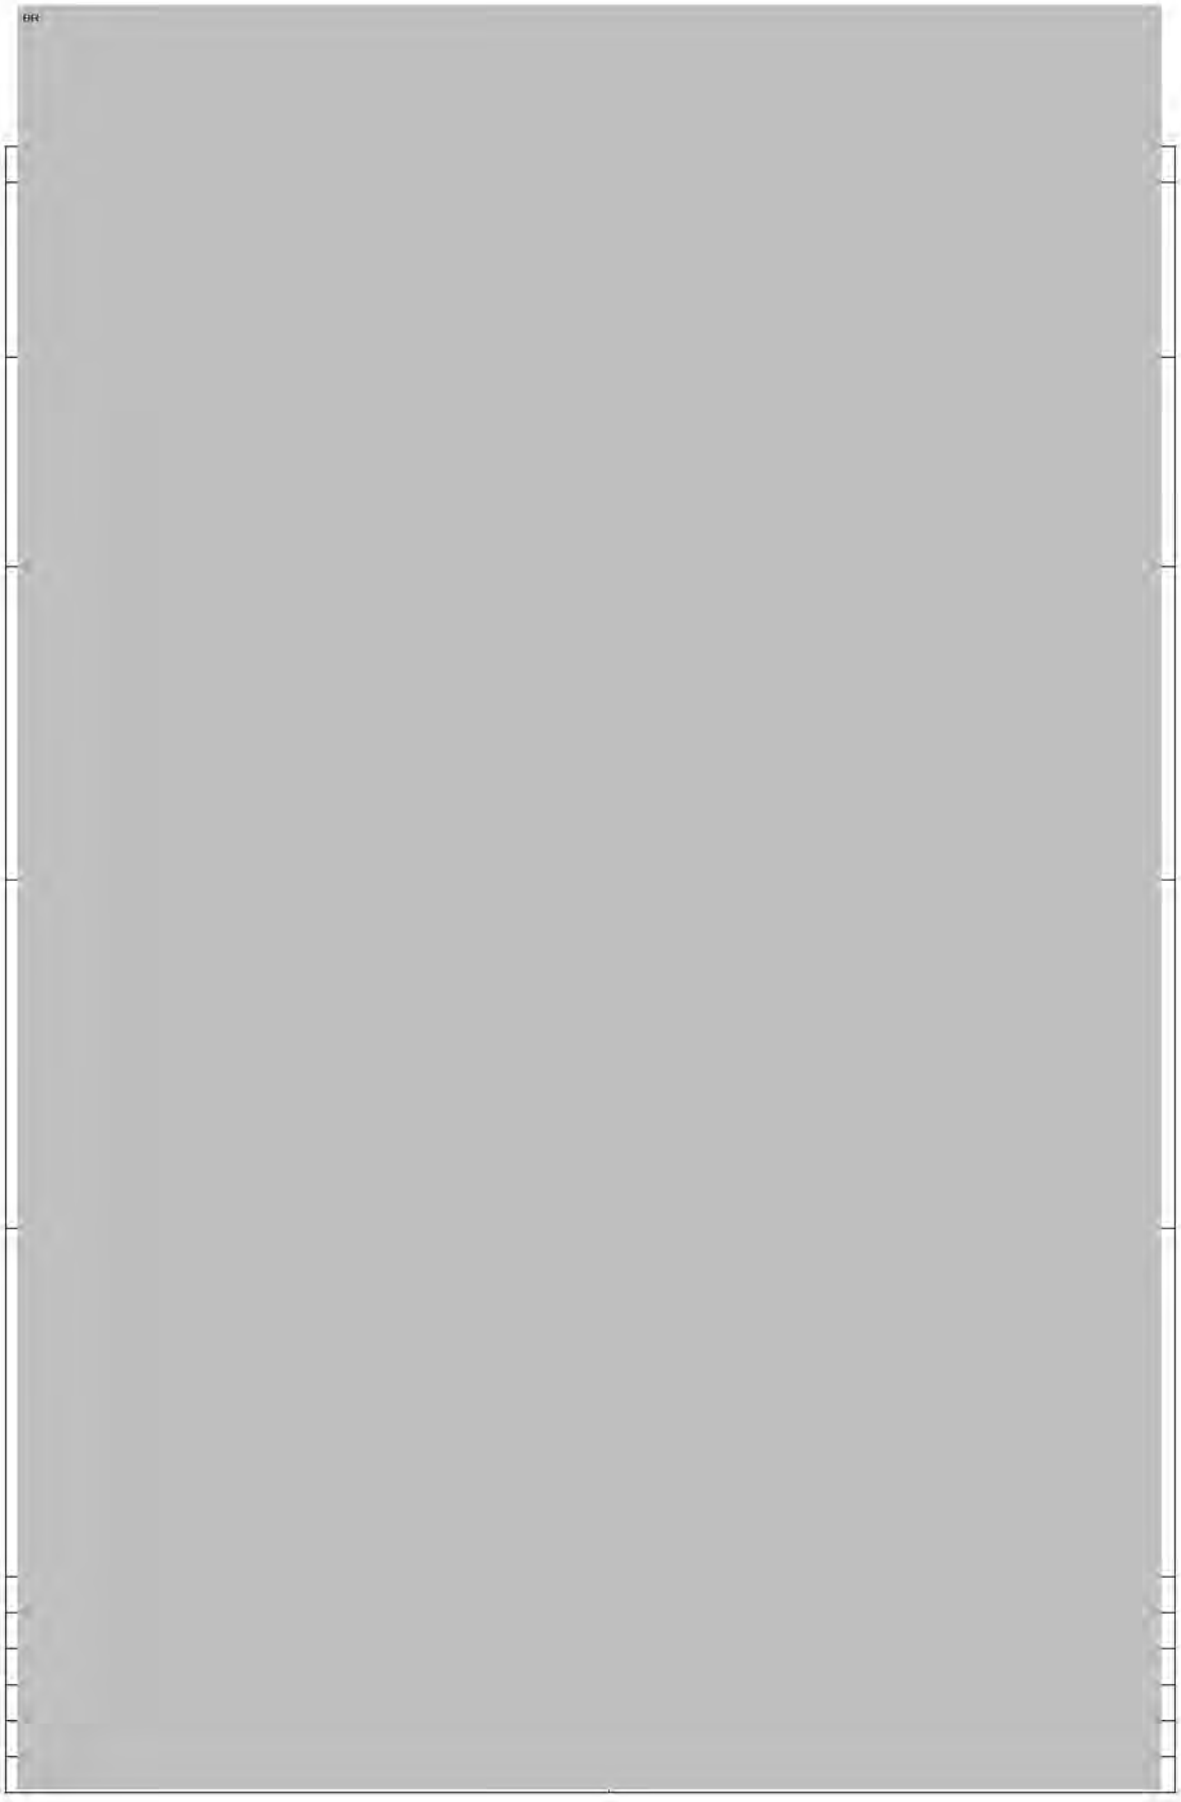
BR

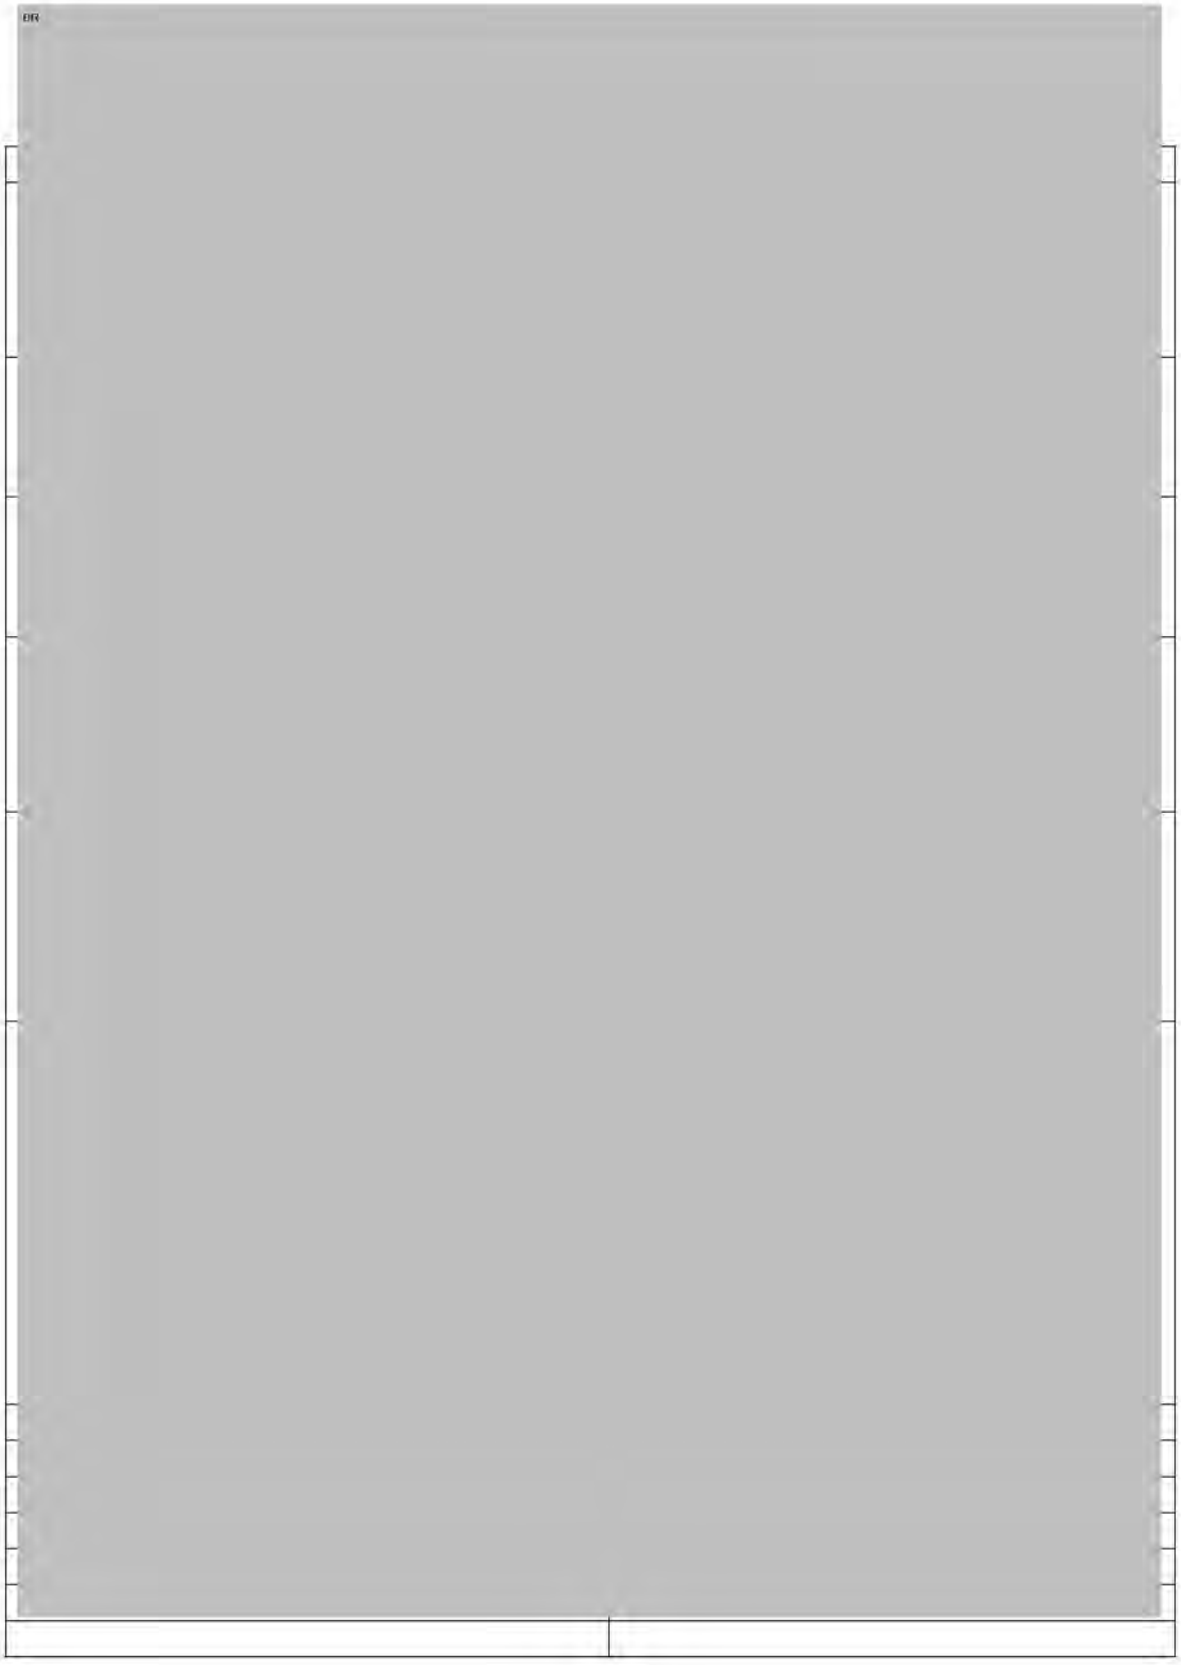

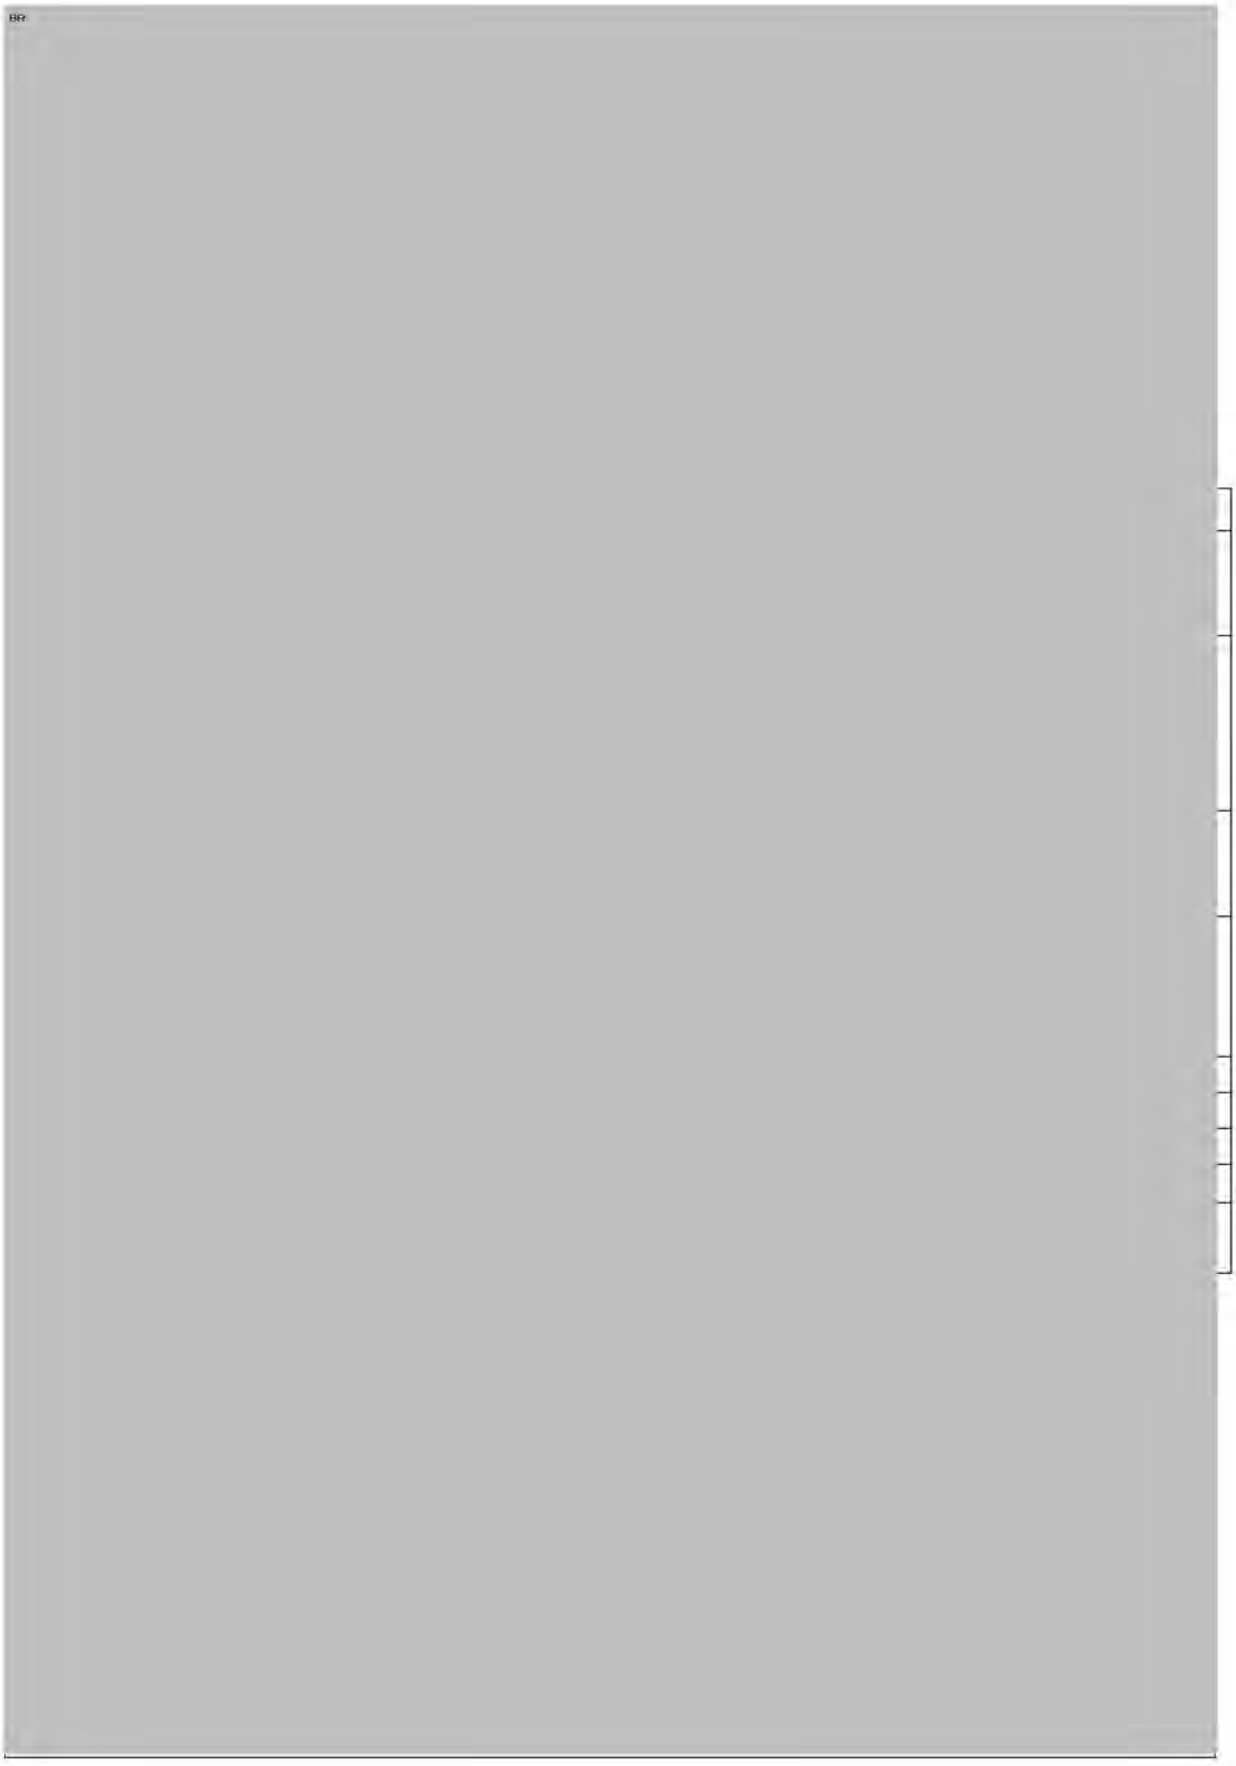

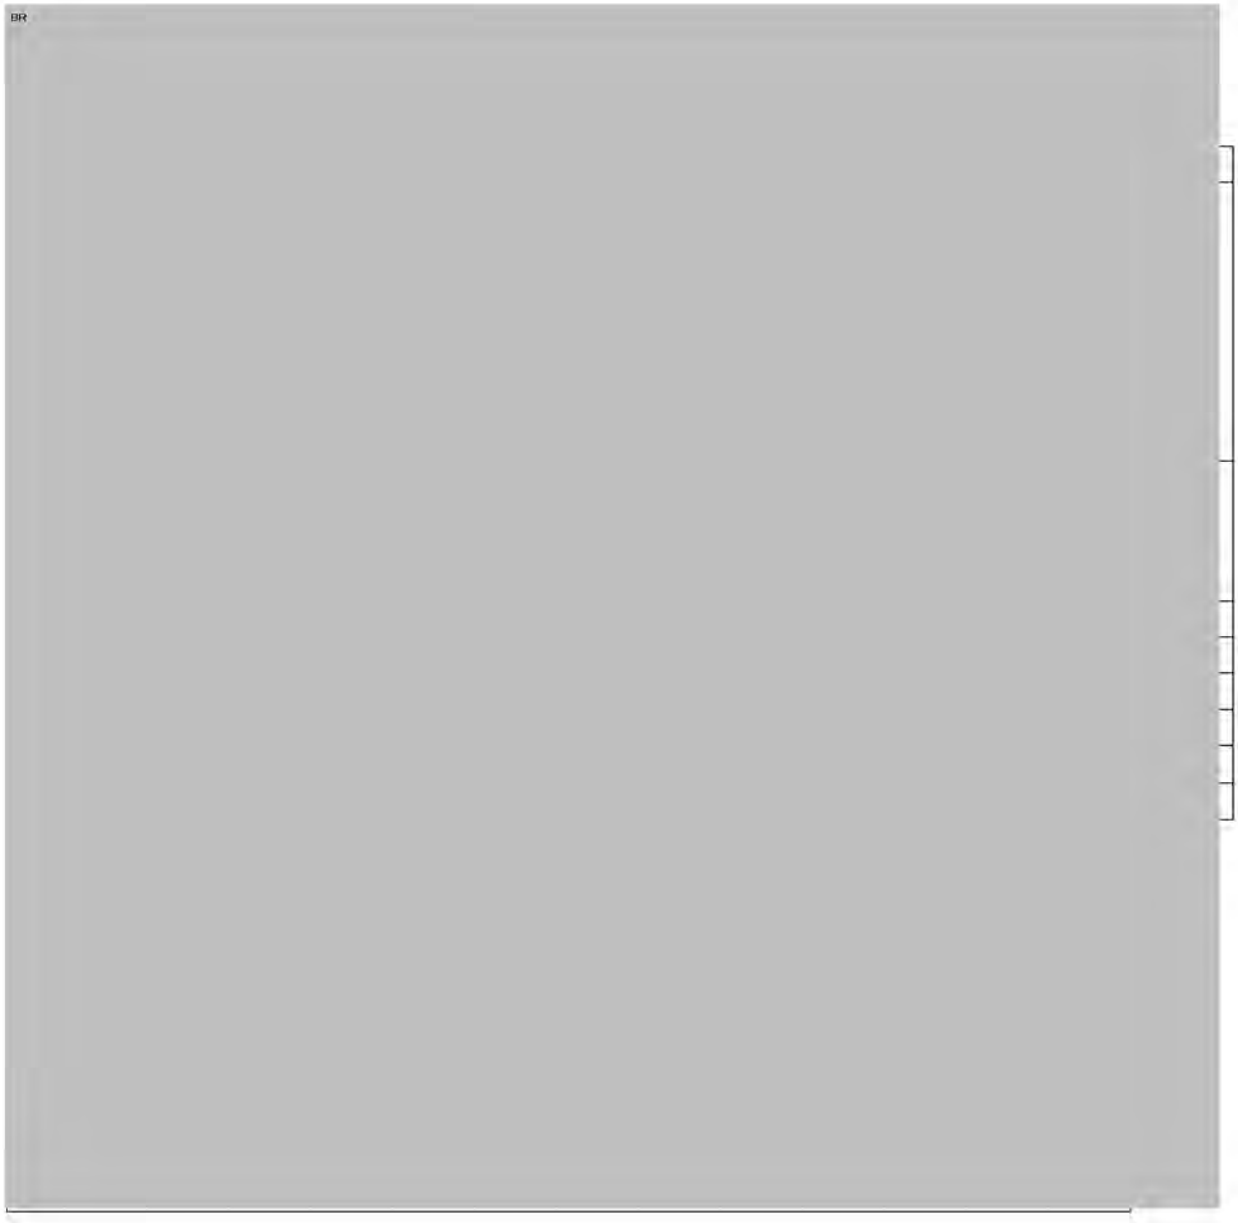
BR

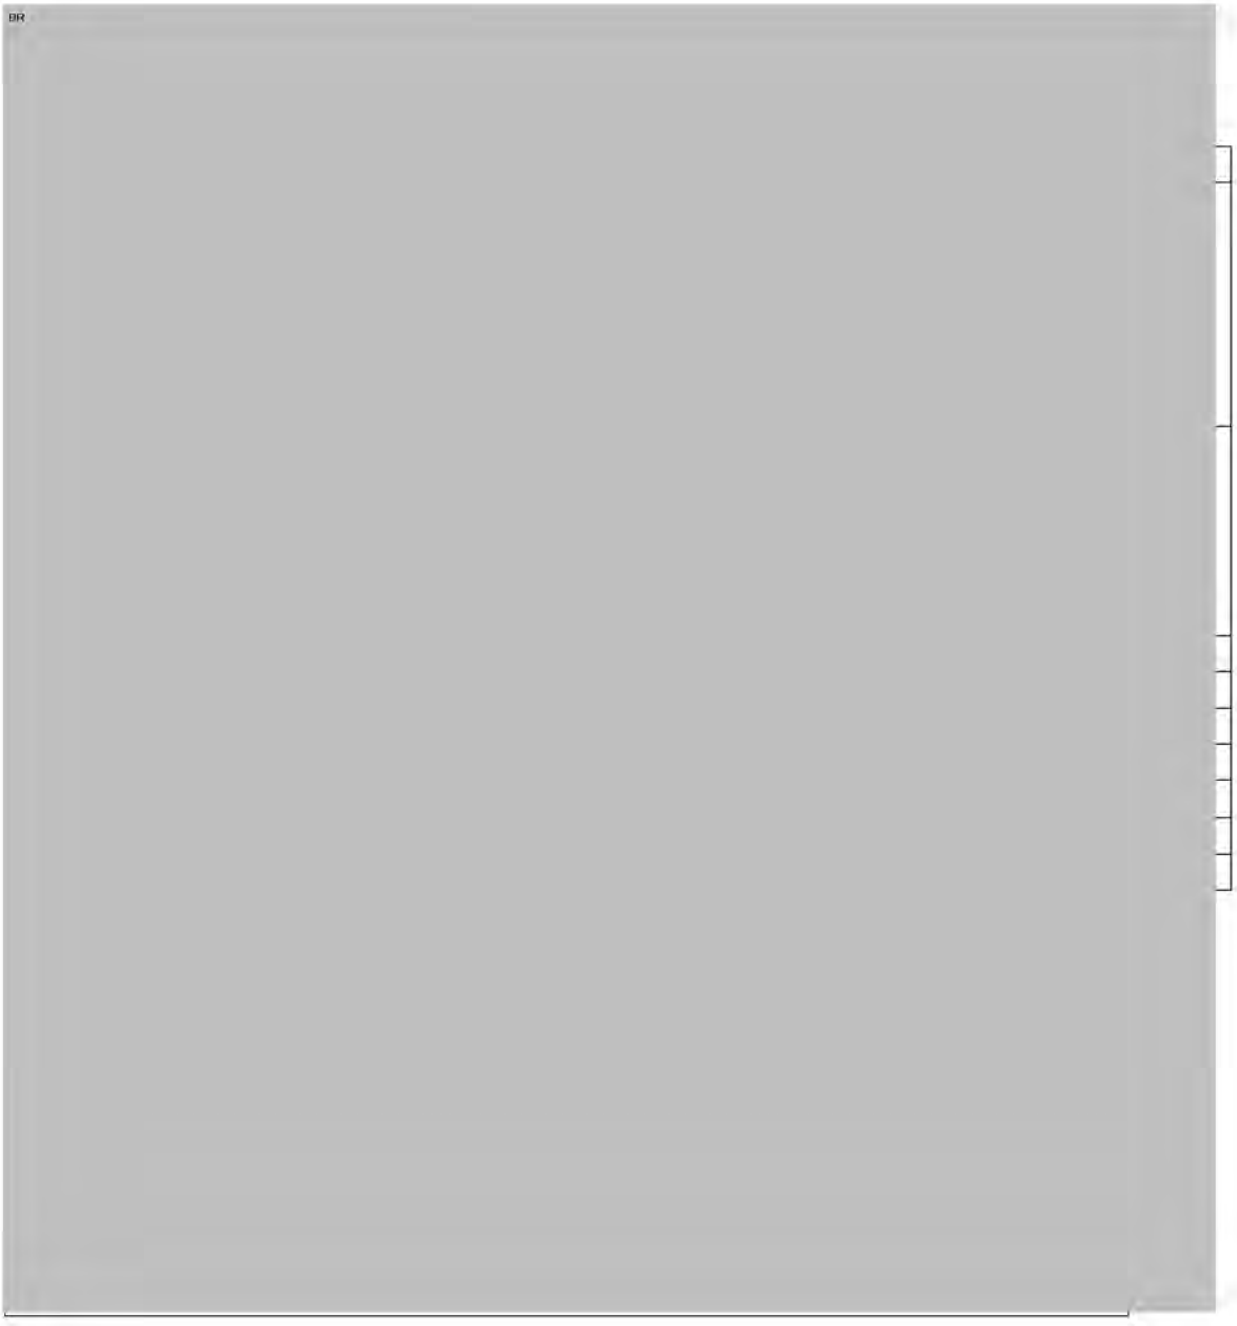

Docnr17



# 4 Overdracht en openstelling

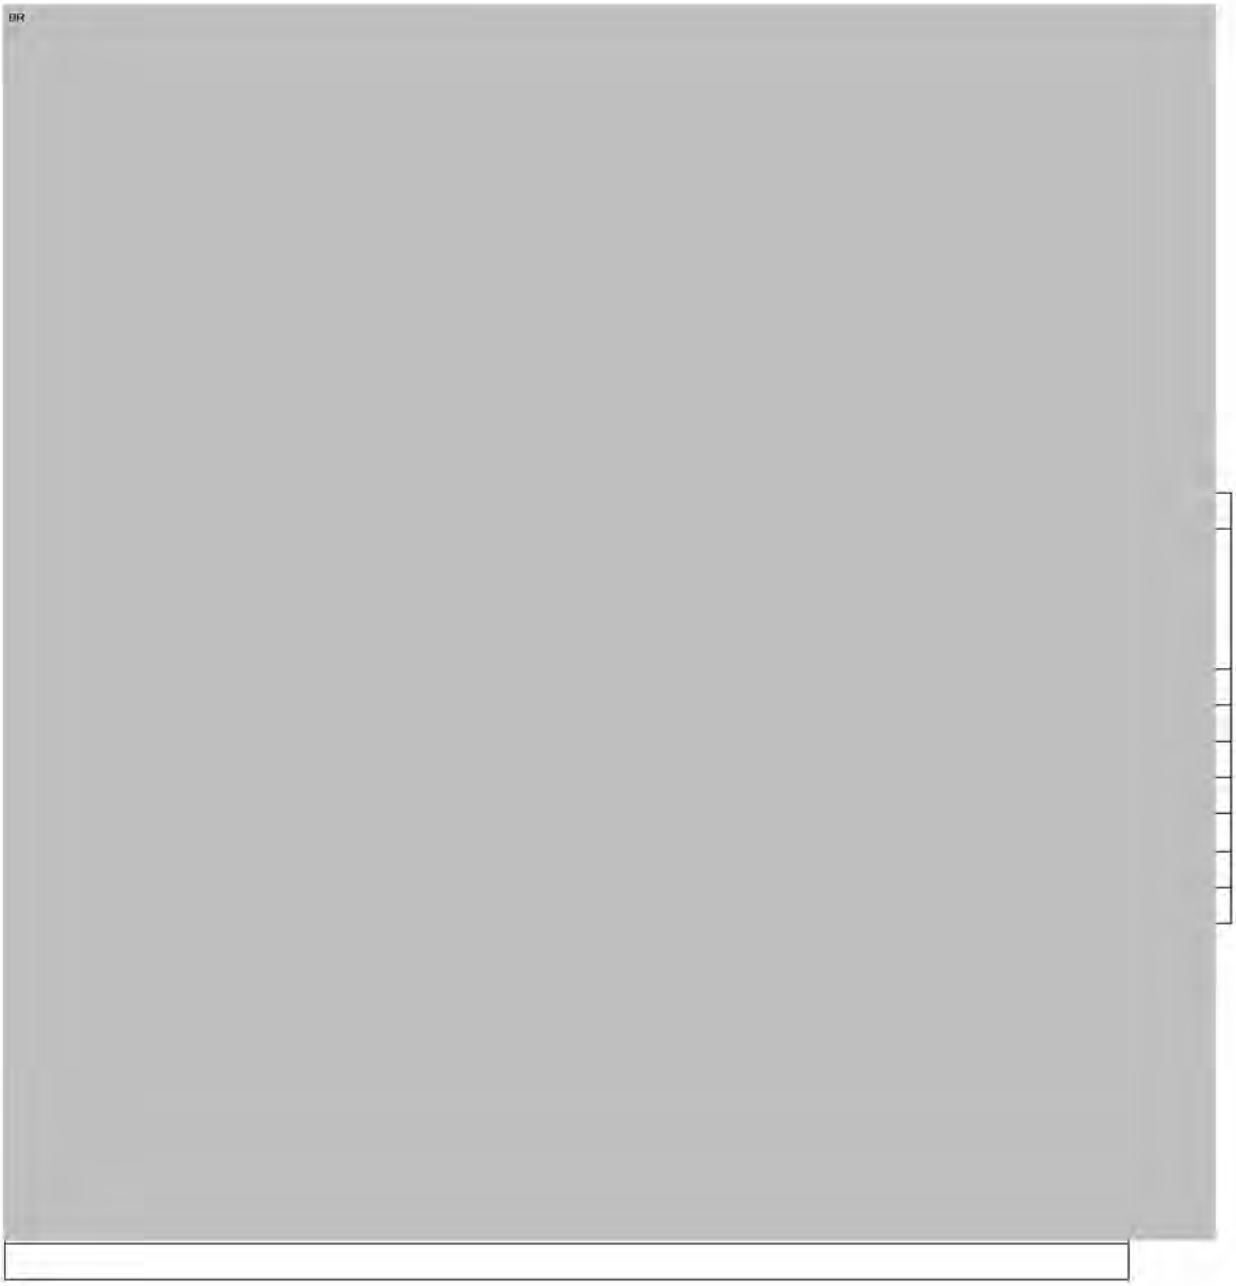

# 5 Projectbeheersing

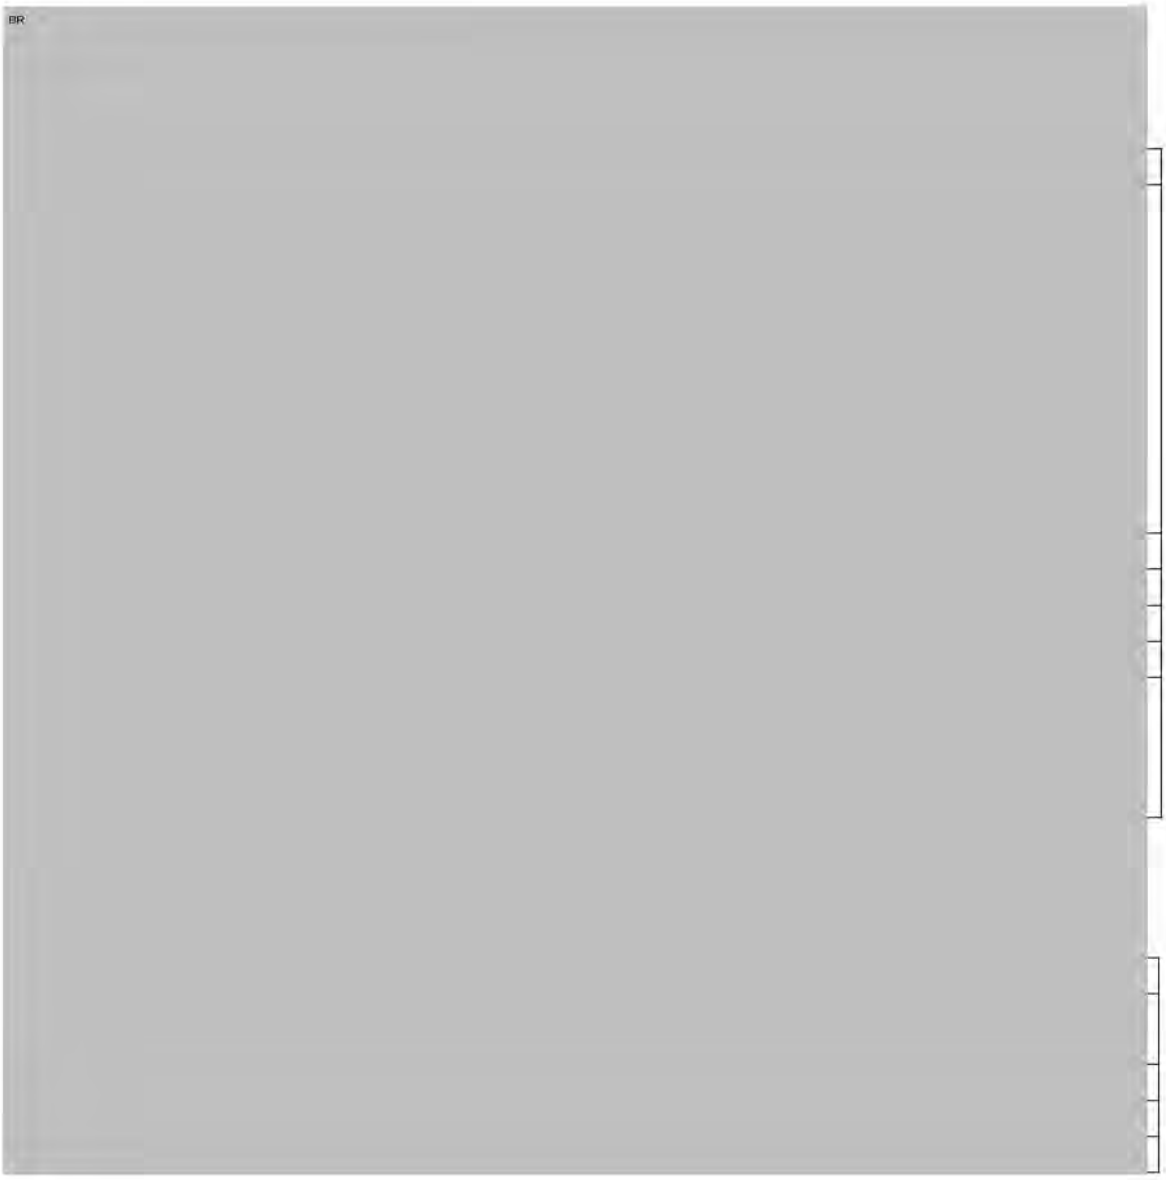

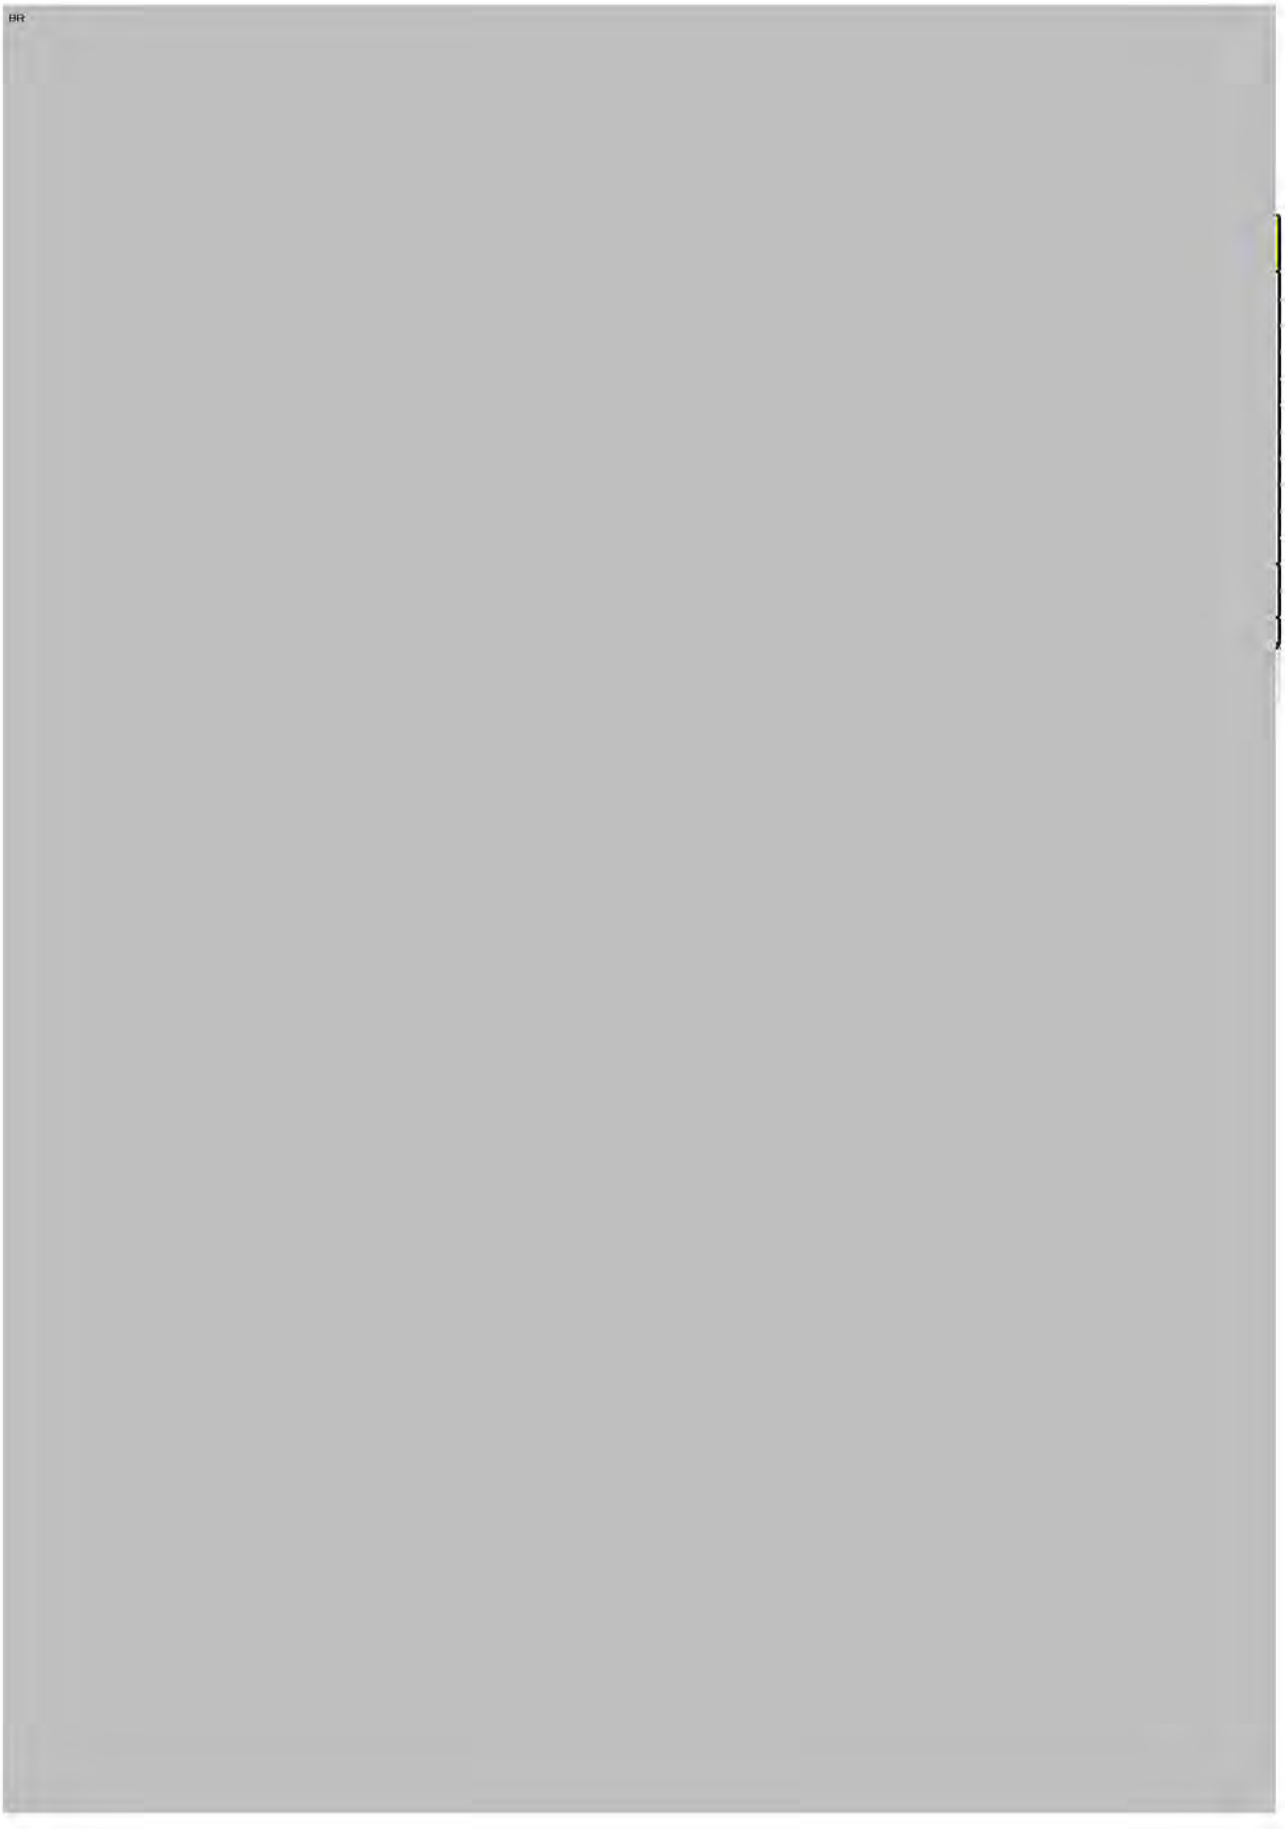

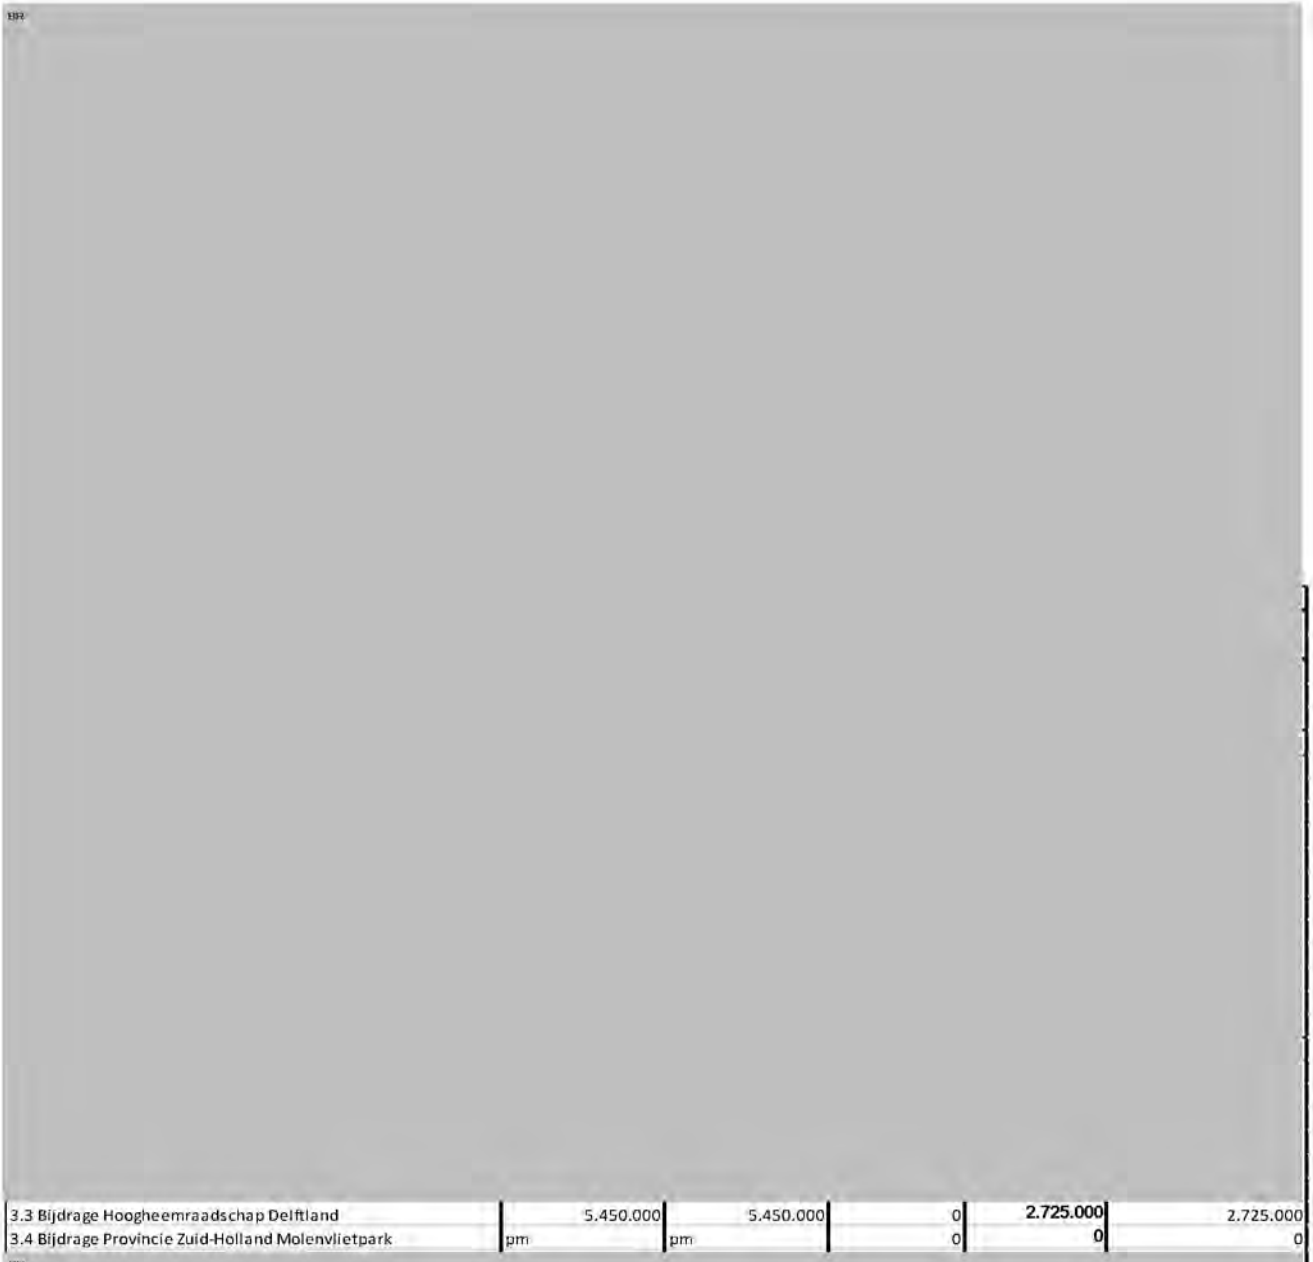

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delftland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | **2.725.000** | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | pm | pm | 0 | **0** | 0 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland

Er zijn in het vierde kwartaal 2017 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland

Er zijn in het vierde kwartaal 2017 geen mutaties geweest. De Landschapstafel is voornemens een subsidiebijdrage voor de inrichting van het Molenvlietpark te leveren.

BR

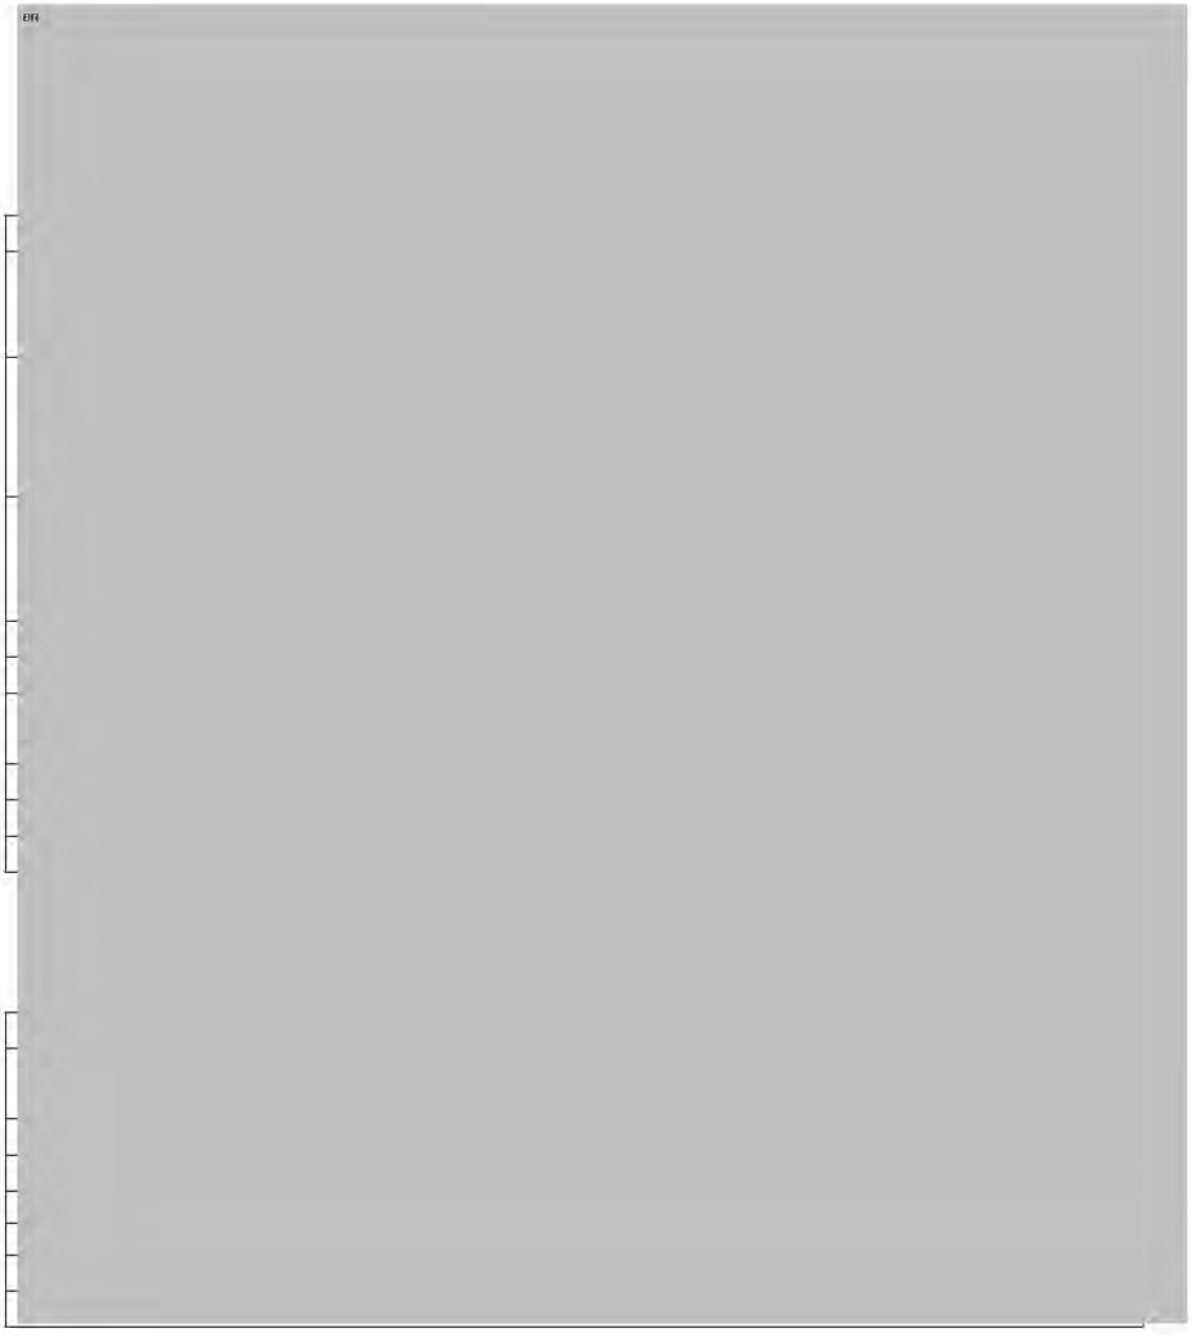
BR

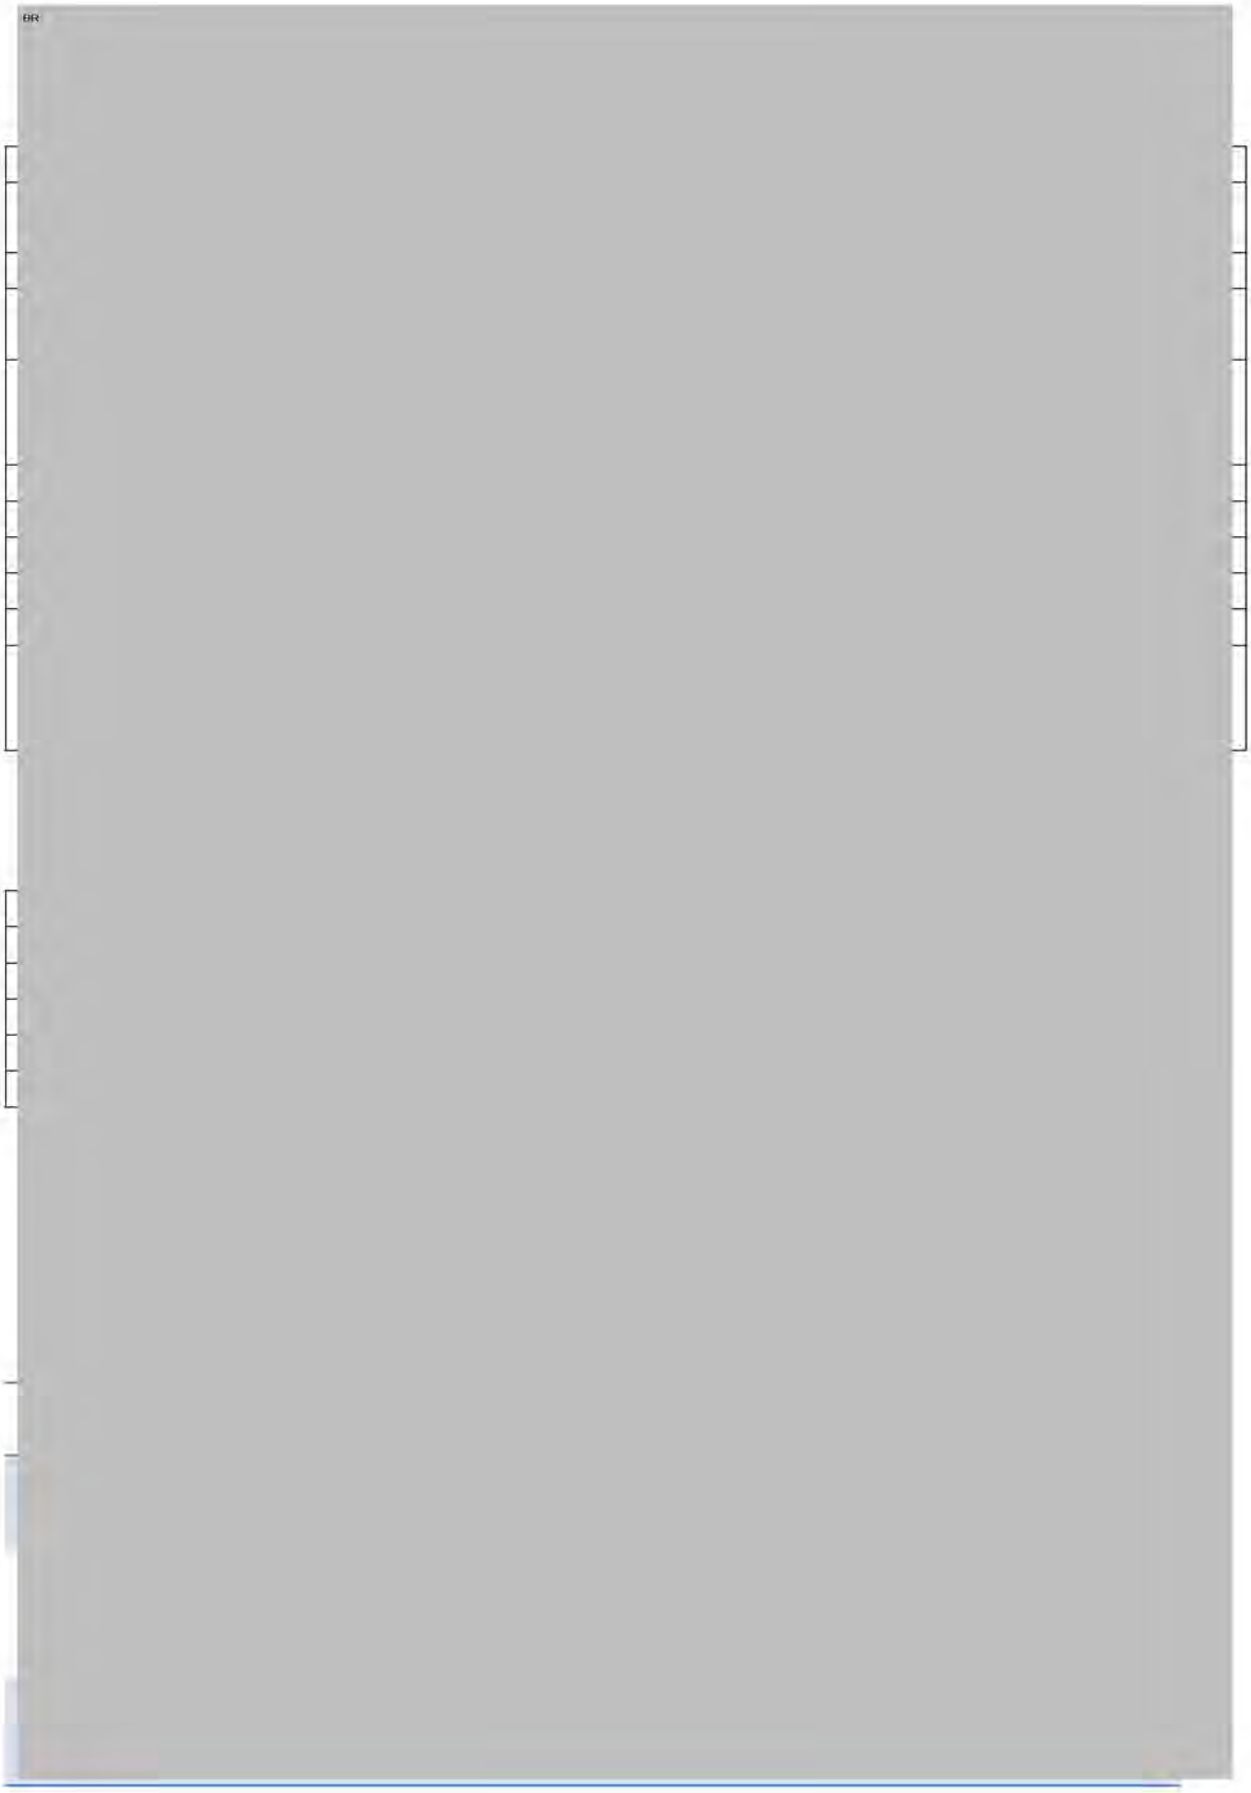

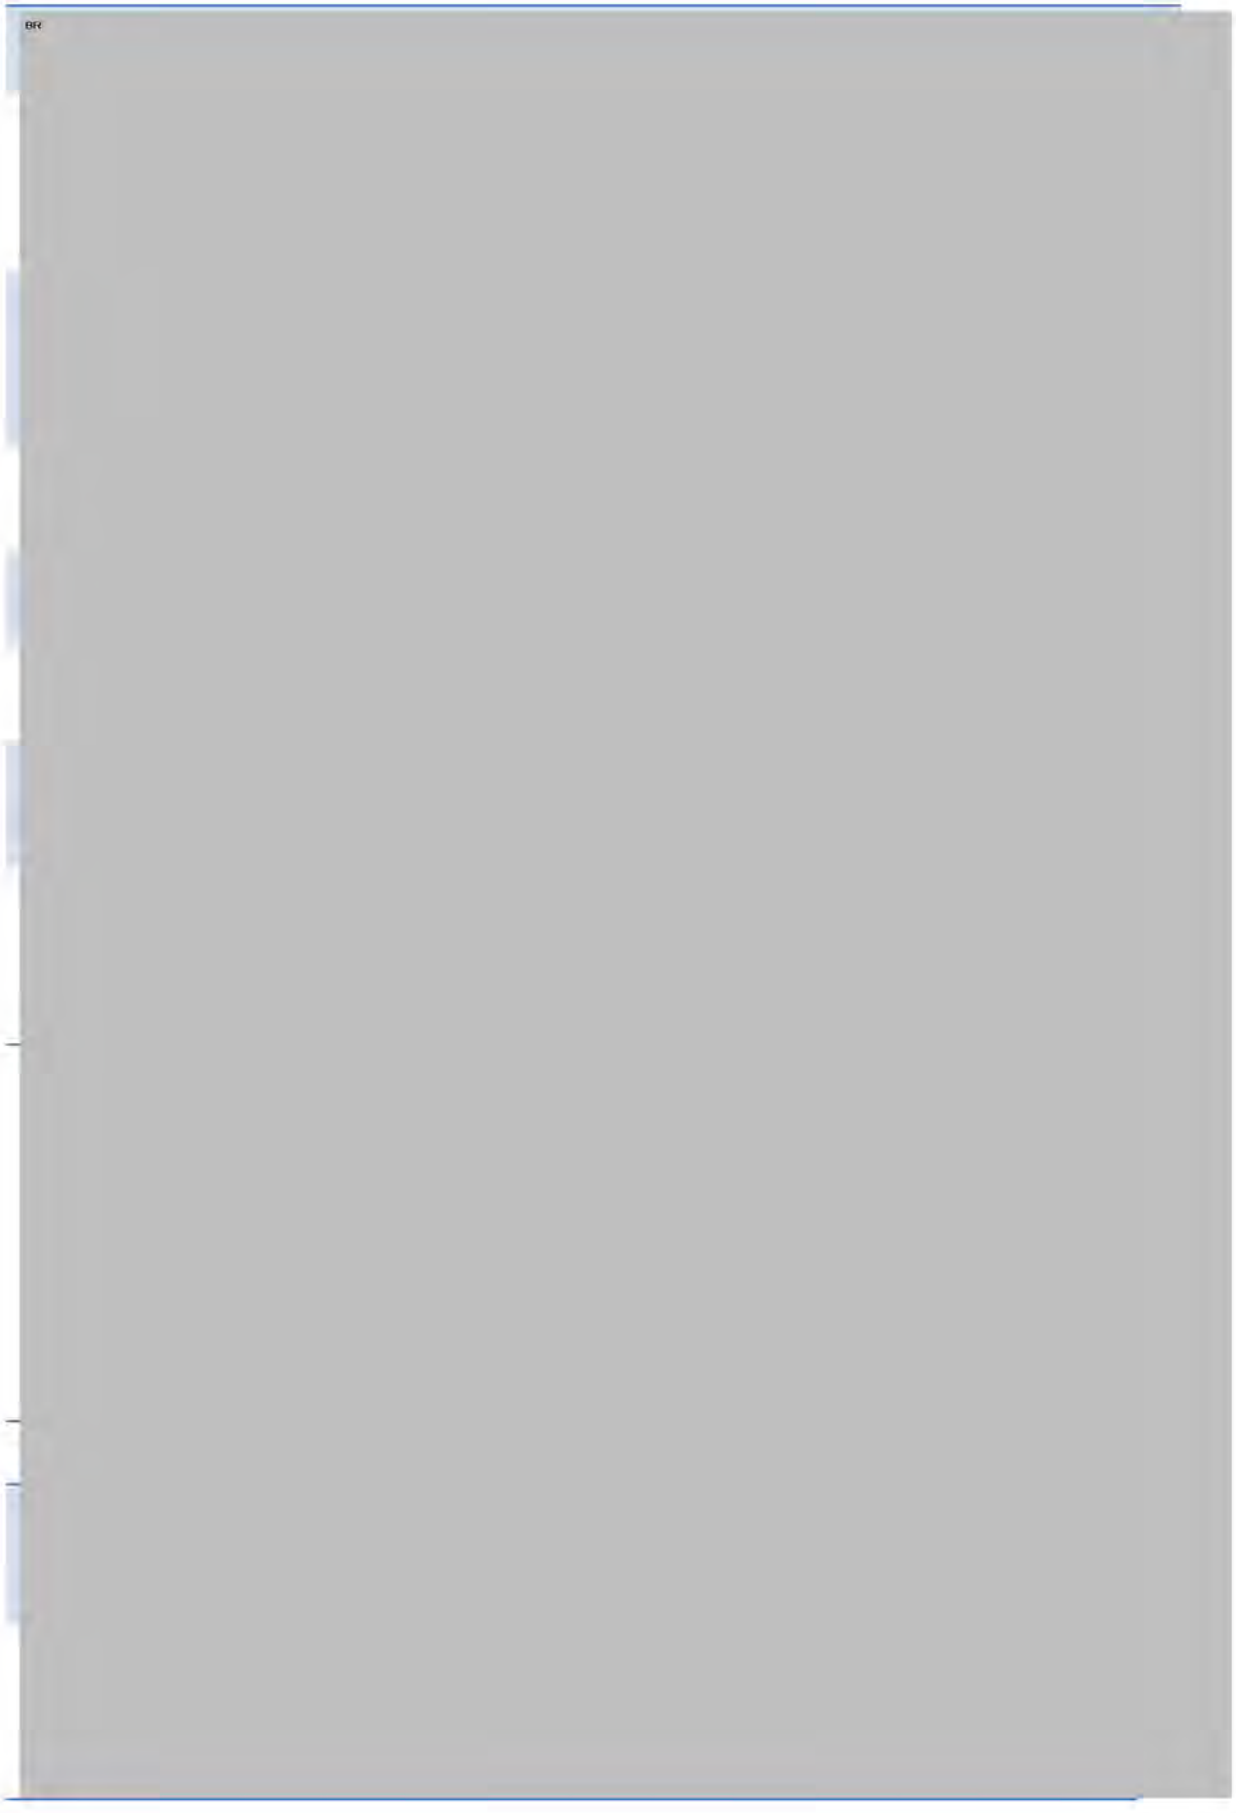
BR

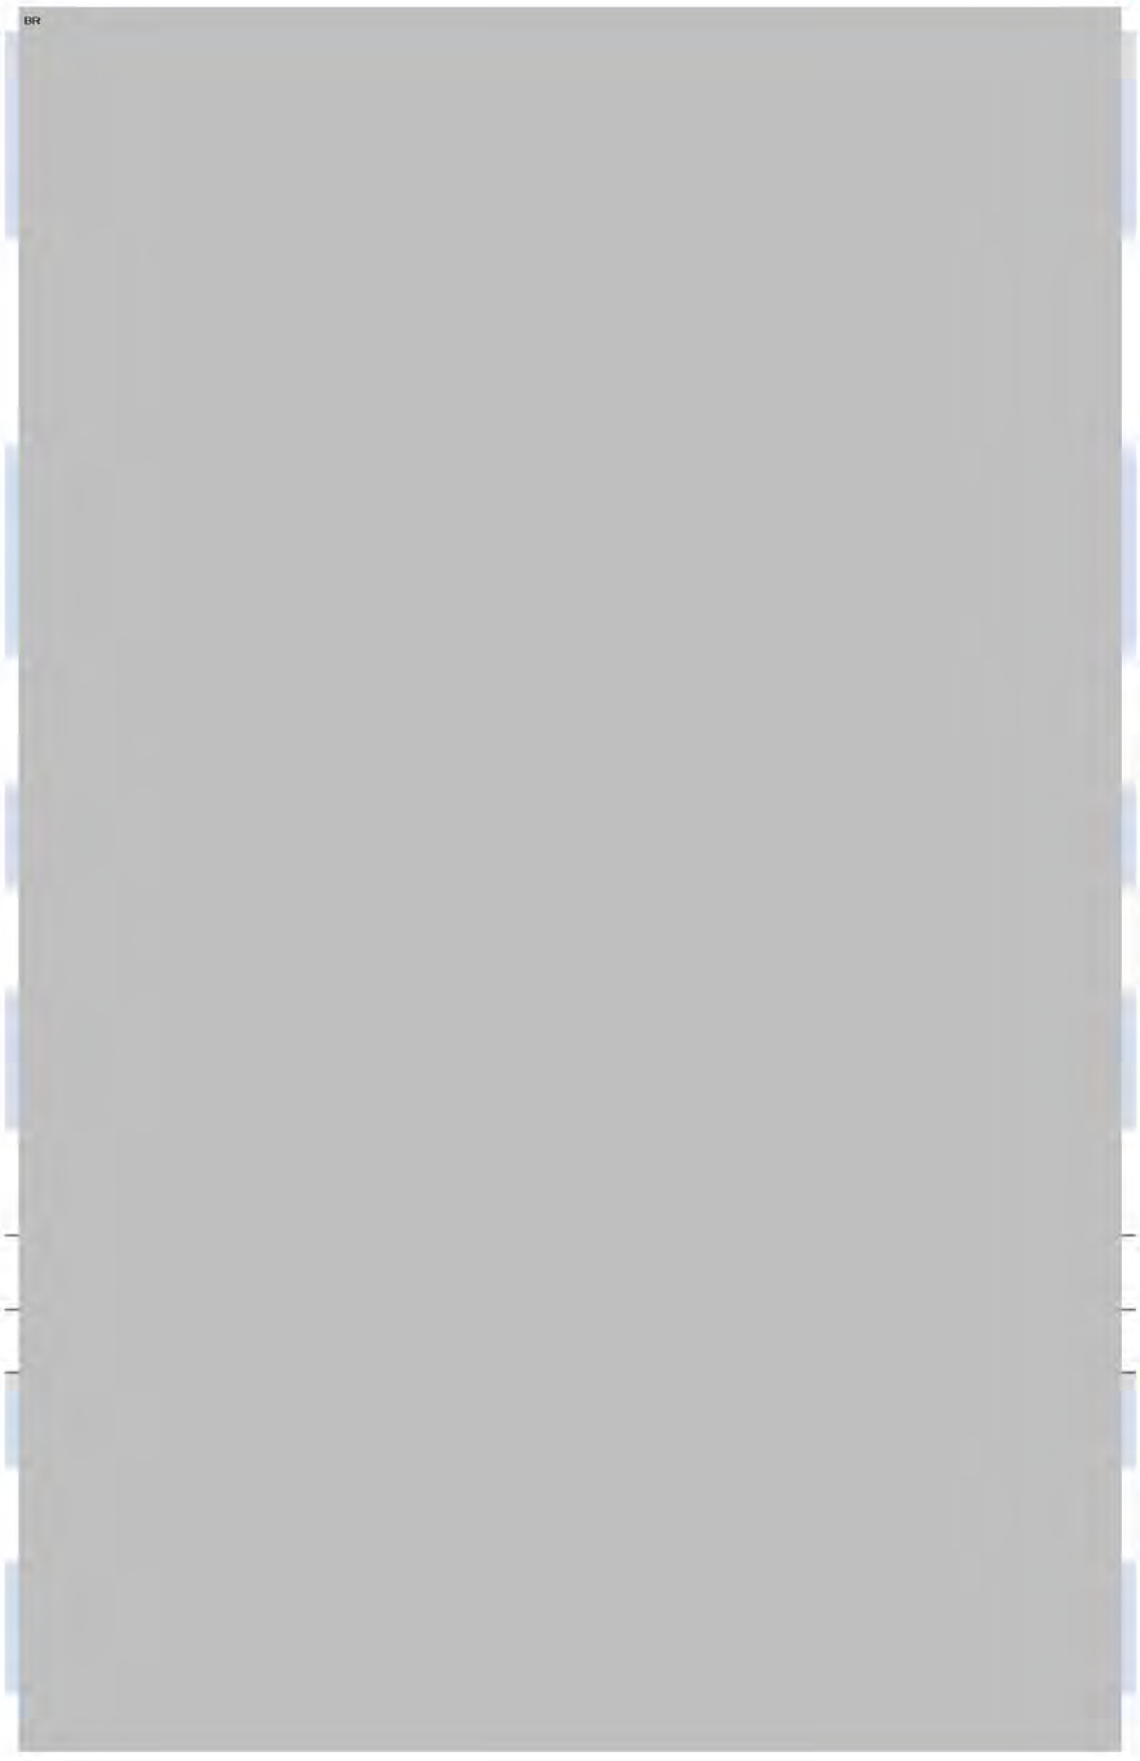
BR

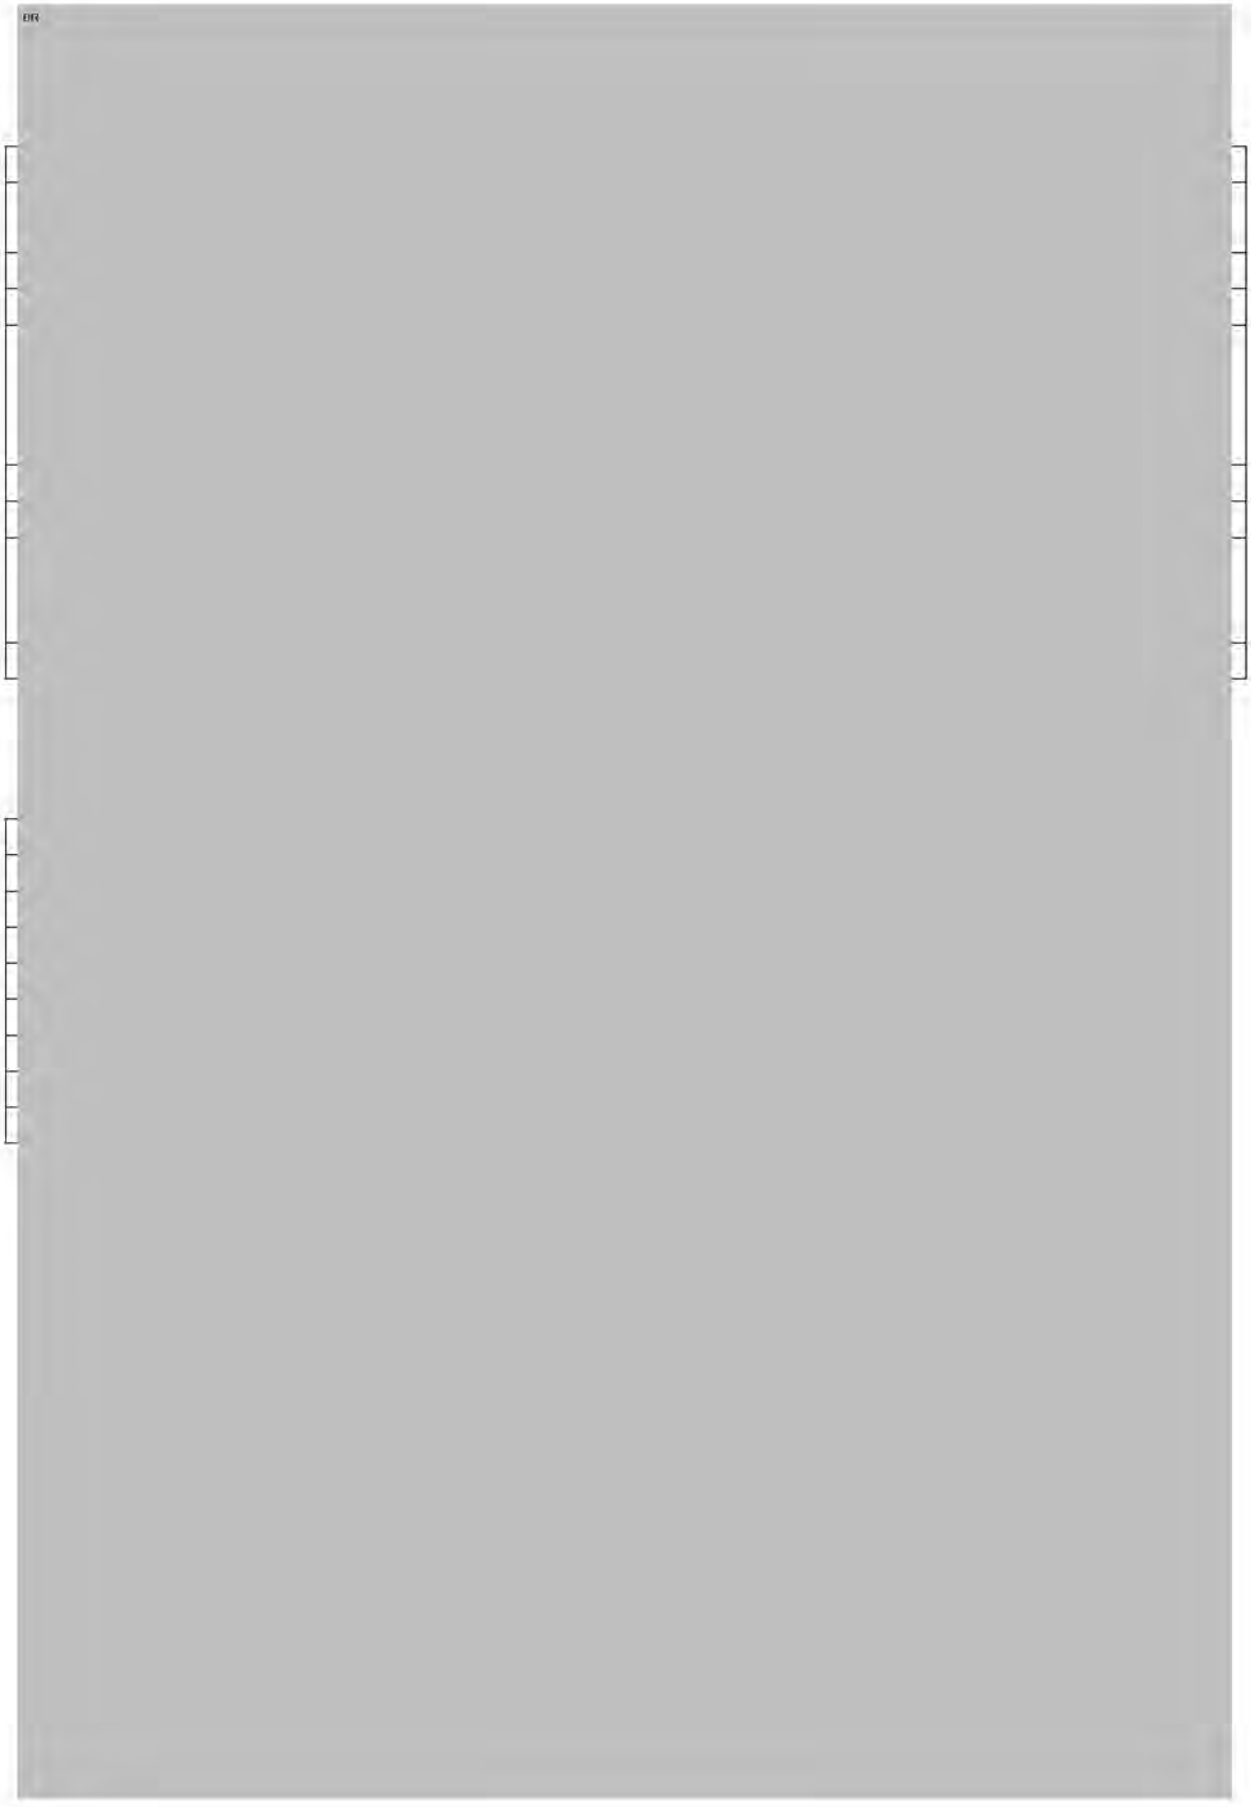

# 6 Bijlage: Uitvoeringsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen uitvoering**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM REFERENTIE-PLANNING (REVISIE C) | MIJLPAAL-DATUM PER 31 DEC 2017 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-PLANNING (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 28-nov-19 | 2 | Gevolg van conservatievere aanname gemiddelde boorsnelheid. |

* positief = weken achterstand, negatief = weken voorsprong

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

BR

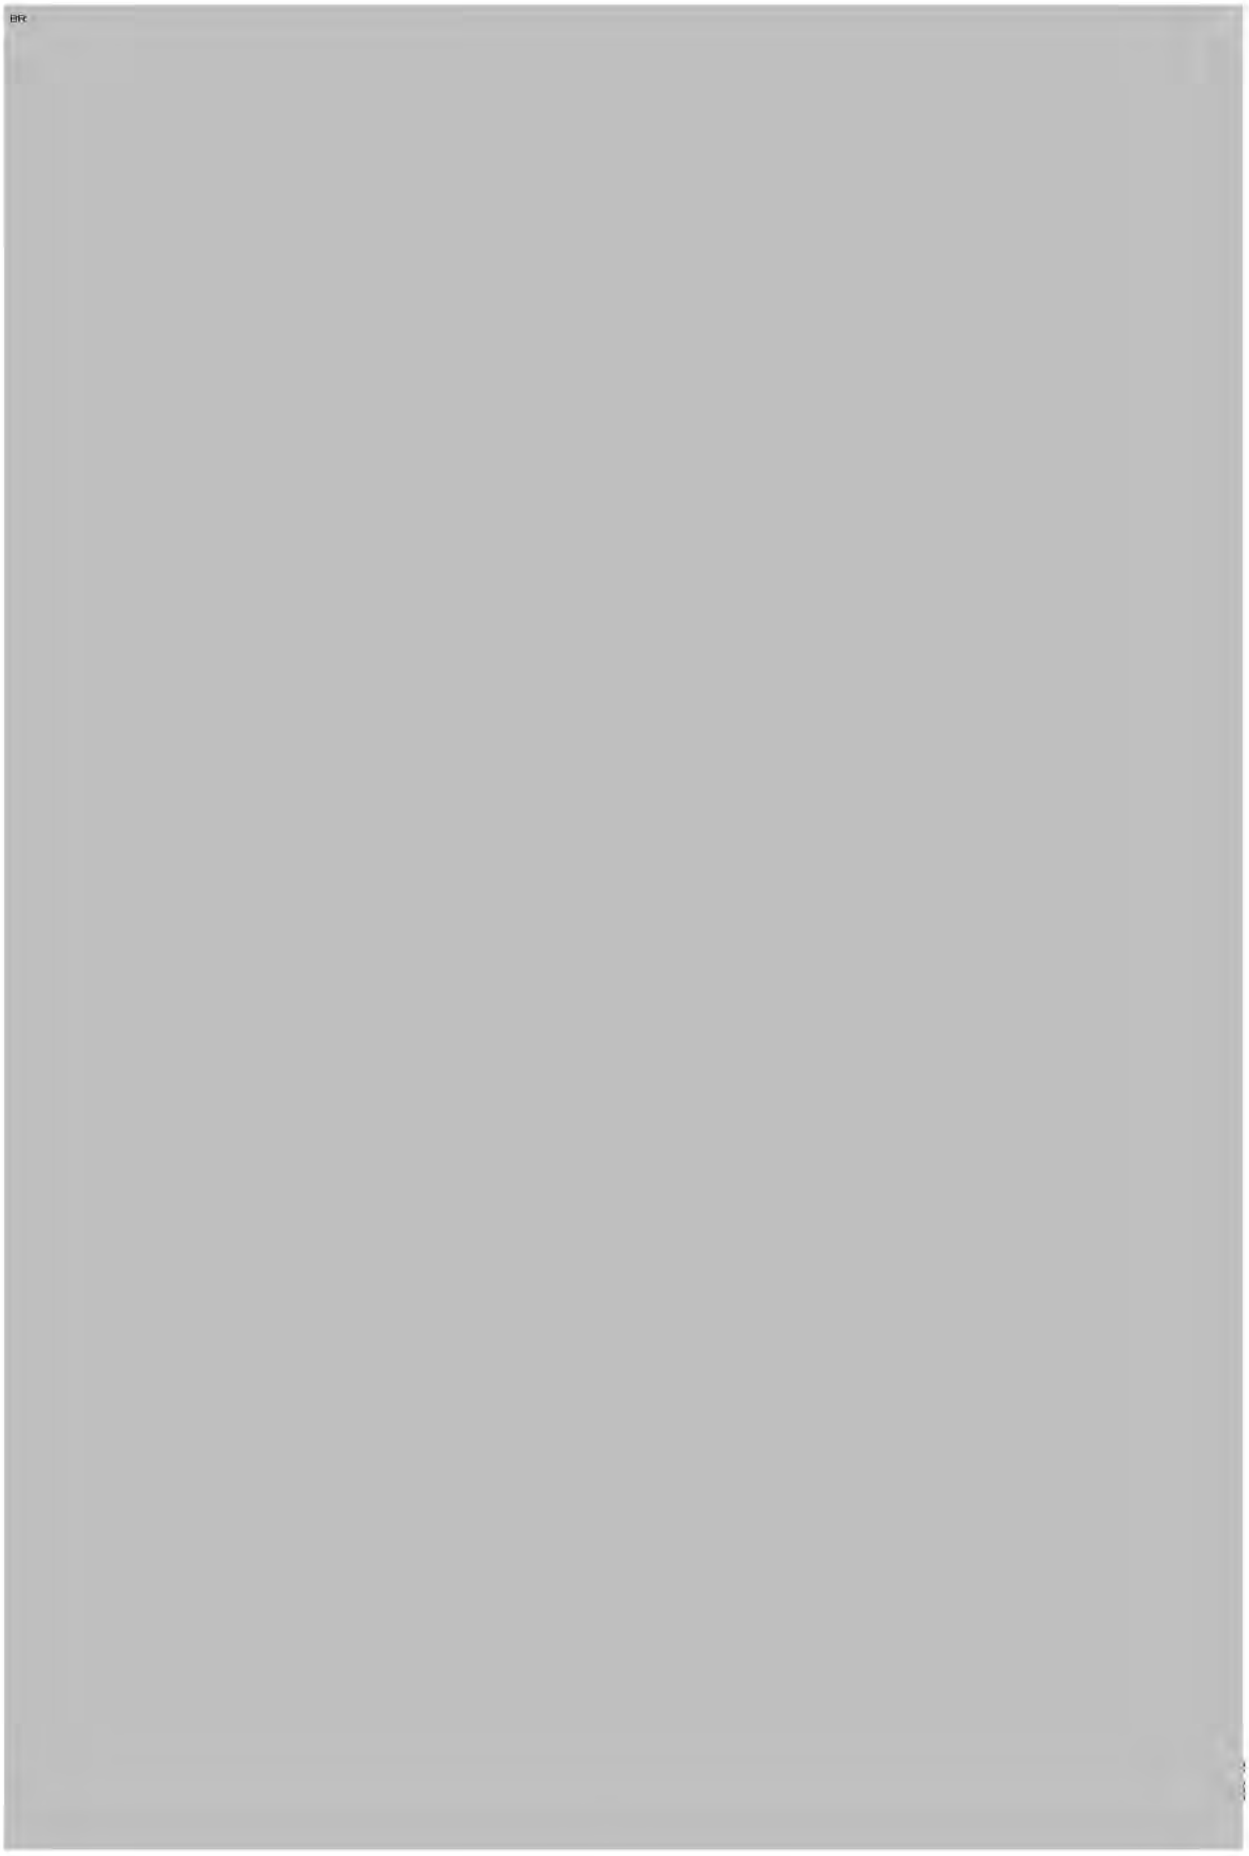

5.1.2.e

5.1.2.e

BR

Docnr17



Docnr18

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 1e kwartaal 2018

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 26 april 2018**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

Docnr18

Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 1e kwartaal 2018
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004440

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>4 april 2018 | Versie 0.1<br>5 april 2018 | Versie 1.0<br>11 april 2018 | Versie 2.0<br>26 april 2018 | Versie 2.0<br>17 mei 2018 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder BSKB / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr18



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

*1.1 Financiën* 6

*1.2 Planning* 7

*1.3 Risico's* 7

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* 8
2.1.1 Afgelopen kwartaal 8
2.1.2 Komende kwartaal 8

*2.2 Planologie en Vergunningen* 9
2.2.1 Afgelopen kwartaal 9
2.2.2 Komende kwartaal 9

*2.3 Verwervingen* 10
2.3.1 Afgelopen kwartaal 10
2.3.2 Komende kwartaal 10

*2.4 Overeenkomsten* 11
2.4.1 Afgelopen kwartaal 11
2.4.2 Komende kwartaal 11

*2.5 Communicatie* 12
2.5.1 Afgelopen kwartaal 12
2.5.2 Komende kwartaal 13
2.5.3 Diversen 13

3 Projectvoortgang 14

*3.1 Aanbesteden en contracteren* 14
3.1.1 Afgelopen kwartaal 14
3.1.2 Komende kwartaal 15

*3.2 Vormgeving* 16
3.2.1 Afgelopen kwartaal 16
3.2.2 Komende kwartaal 16

*3.3 Monitoring* 17
3.3.1 Afgelopen kwartaal 17
3.3.2 Komende kwartaal 17

*3.4 Inpassing Binckhorst* 18
3.4.1 Afgelopen kwartaal 18
3.4.2 Komende kwartaal 18

*3.5 Inpassing Vlietzone* 19
3.5.1 Afgelopen kwartaal 19
3.5.2 Komende kwartaal 19

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* 21
3.6.1 Afgelopen kwartaal 21
3.6.2 Komende kwartaal 21

*3.7 Boortunnel en toeritten* 22

Docnr18




3.7.1 Afgelopen kwartaal 22
3.7.2 Komende kwartaal 23

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *24*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 24
3.8.2 Komende kwartaal 25

*3.9 Installaties* *26*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 26
3.9.2 Komende kwartaal 26

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *27*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 27
3.10.2 Komende kwartaal 27

*3.11 Bediencentrale* *28*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 28
3.11.2 Komende kwartaal 28

*3.12 Uitvoeringskwaliteit* *29*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 29
3.12.2 Komende kwartaal 29

*3.13 Contractmanagement* *30*
3.13.1 Afgelopen kwartaal 30
3.13.2 Komende kwartaal 30

**4 Overdracht en openstelling** **31**

*4.1 Tunnelveiligheid* *31*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 31
4.1.2 Komende kwartaal 31

*4.2 Overdracht aan beheerders* *32*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 32
4.2.2 Komende kwartaal 32

*4.3 Beheer en onderhoud* *33*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 33
4.3.2 Komende kwartaal 33

**5 Projectbeheersing** **34**

*5.1 Scope* *34*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 34
5.1.2 Komende kwartaal 34

*5.2 Financien* *35*
5.2.1 Kostenstructuur 35
5.2.2 Dekkingen 36

*5.3 Planning* *38*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 38
5.3.2 Komende kwartaal 38

*5.4 Risico's* *39*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 39
5.4.2 Komende kwartaal 39
5.4.3 Financiële toprisico's 39

Docnr18



5.4.4 Toprisico's planning 41

*5.5 Interne kwaliteit* *42*

5.5.1 Afgelopen kwartaal 42

5.5.2 Komende kwartaal 42

*5.6 Informatiebeheer* *43*

5.6.1 Afgelopen kwartaal 43

5.6.2 Komende kwartaal 43

5.6.3 Kennisdeling 43

*5.7 Organisatie* *45*

5.7.1 Afgelopen kwartaal 45

5.7.2 Komende kwartaal 45

6 Bijlage: Uitvoeringsmijlpalen 46

7 Bijlage: Contractmijlpalen en Trendanalyse 47

8 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 49

9 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 51

# 1 Managementsamenvatting

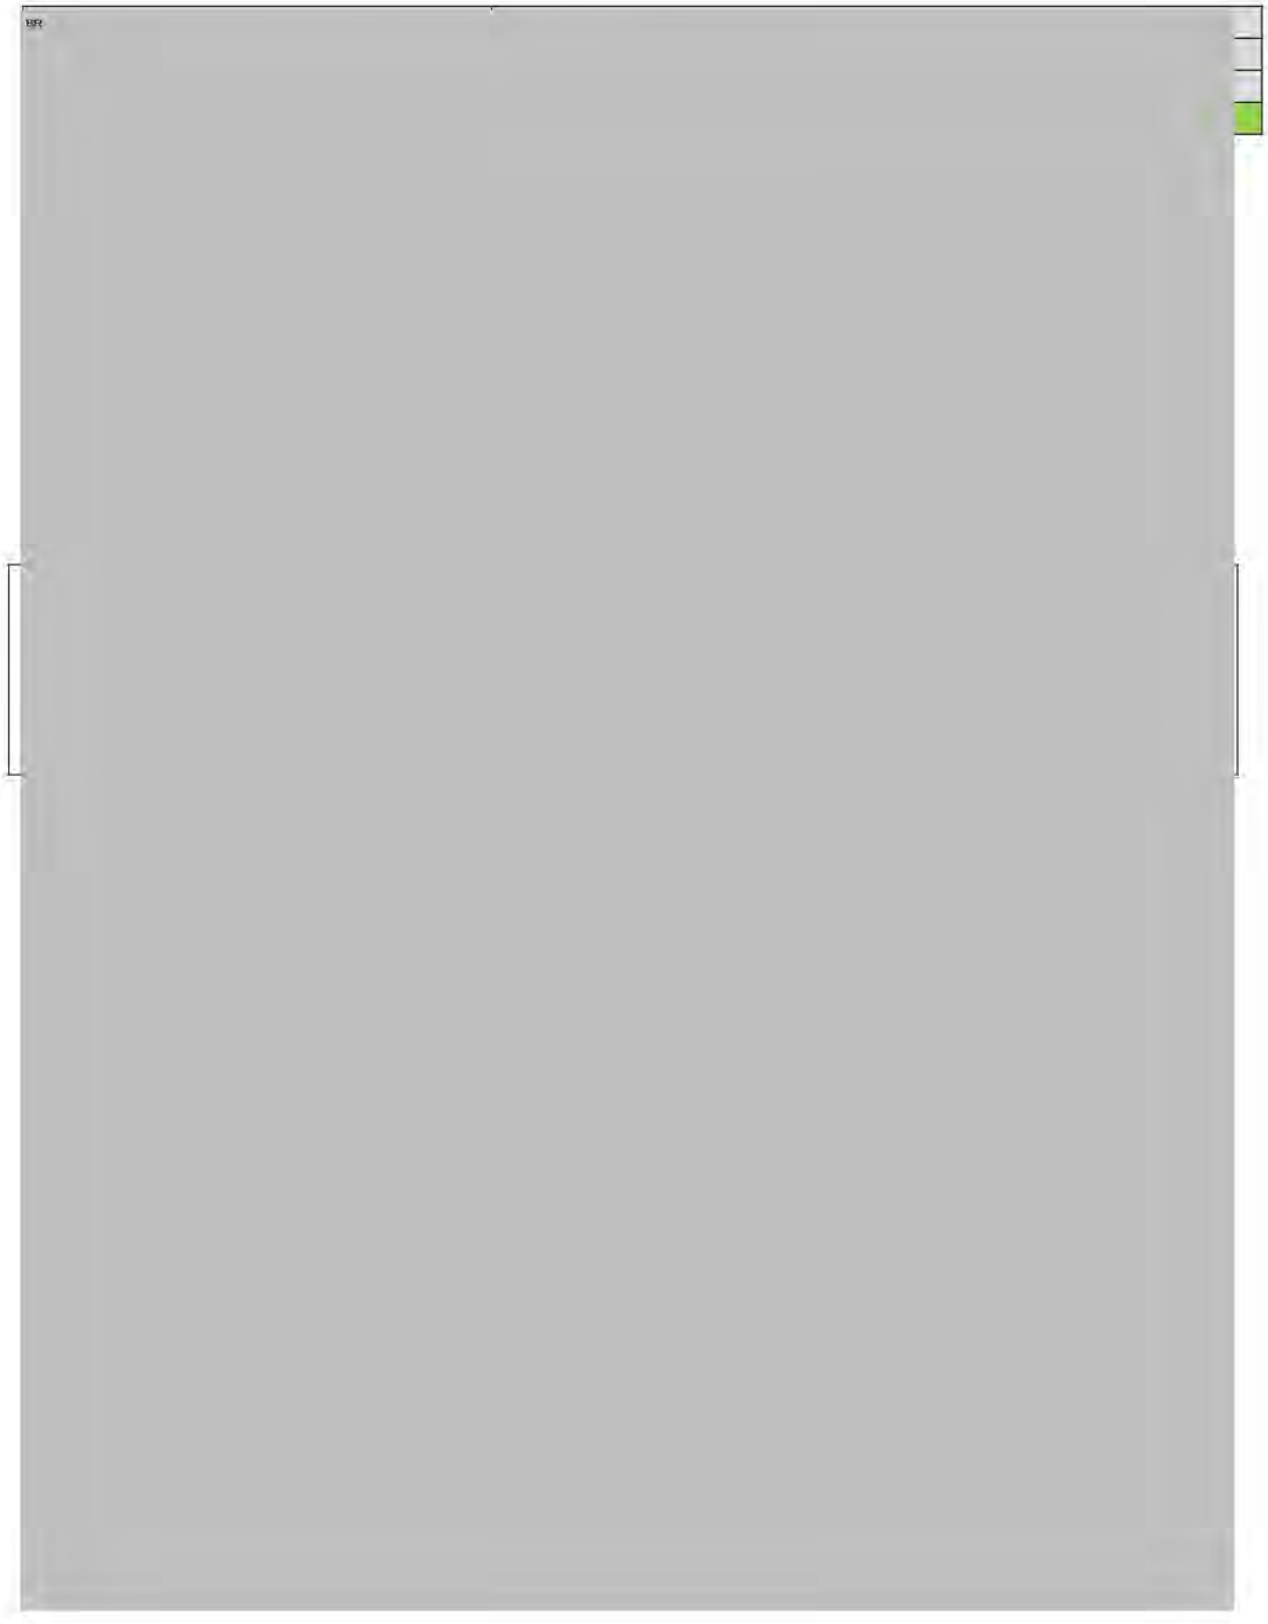

- Met de Provincie Zuid-Holland vinden gesprekken plaats in het kader van een samenwerkingsovereenkomst te behoeve van vervanging oeverconstructie om uiteindelijk een tweede toevoer naar de calamiteitenberging in het Molenvlietpark te realiseren;

- Het Hoogheemraadschap van Delfland zal de projectplanprocedure starten ter realisatie van de tweede toevoer vanuit de Vliet naar het Molenvlietpark;

BR

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Diverse stakeholders gesproken. | Er is met bewoners van Park Hoornwijck gesproken over het ontwerp van de geplande voetgangersburg naar het Molenvlietpark. De voetgangersbrug gaat aan de ene kant langs een woning en aan de andere kant langs een bedrijf. Ter beperking van hinder voor de omgeving zal de brug worden voorzien van fietswerende voorzieningen en beplanting rondom.<br><br>Den Haag heeft overleg gevoerd met de nieuwe eigenaar van het perceel aan de Jan Thijssenweg 8 in Den Haag ten behoeve van de realisatie van de tweede toevoer voor het bergingsgebied.<br><br>CRB, de projectorganisatie en het Schadebureau hebben diverse malen contact gehad met een familie uit Park Hoornwijck, die hinder ervaart van de bouwwerkzaamheden. CRB voert een aanvullende geluidsmeting uit om uitsluitsel over de klachten te verkrijgen. |
| | |
| [redacted] | |

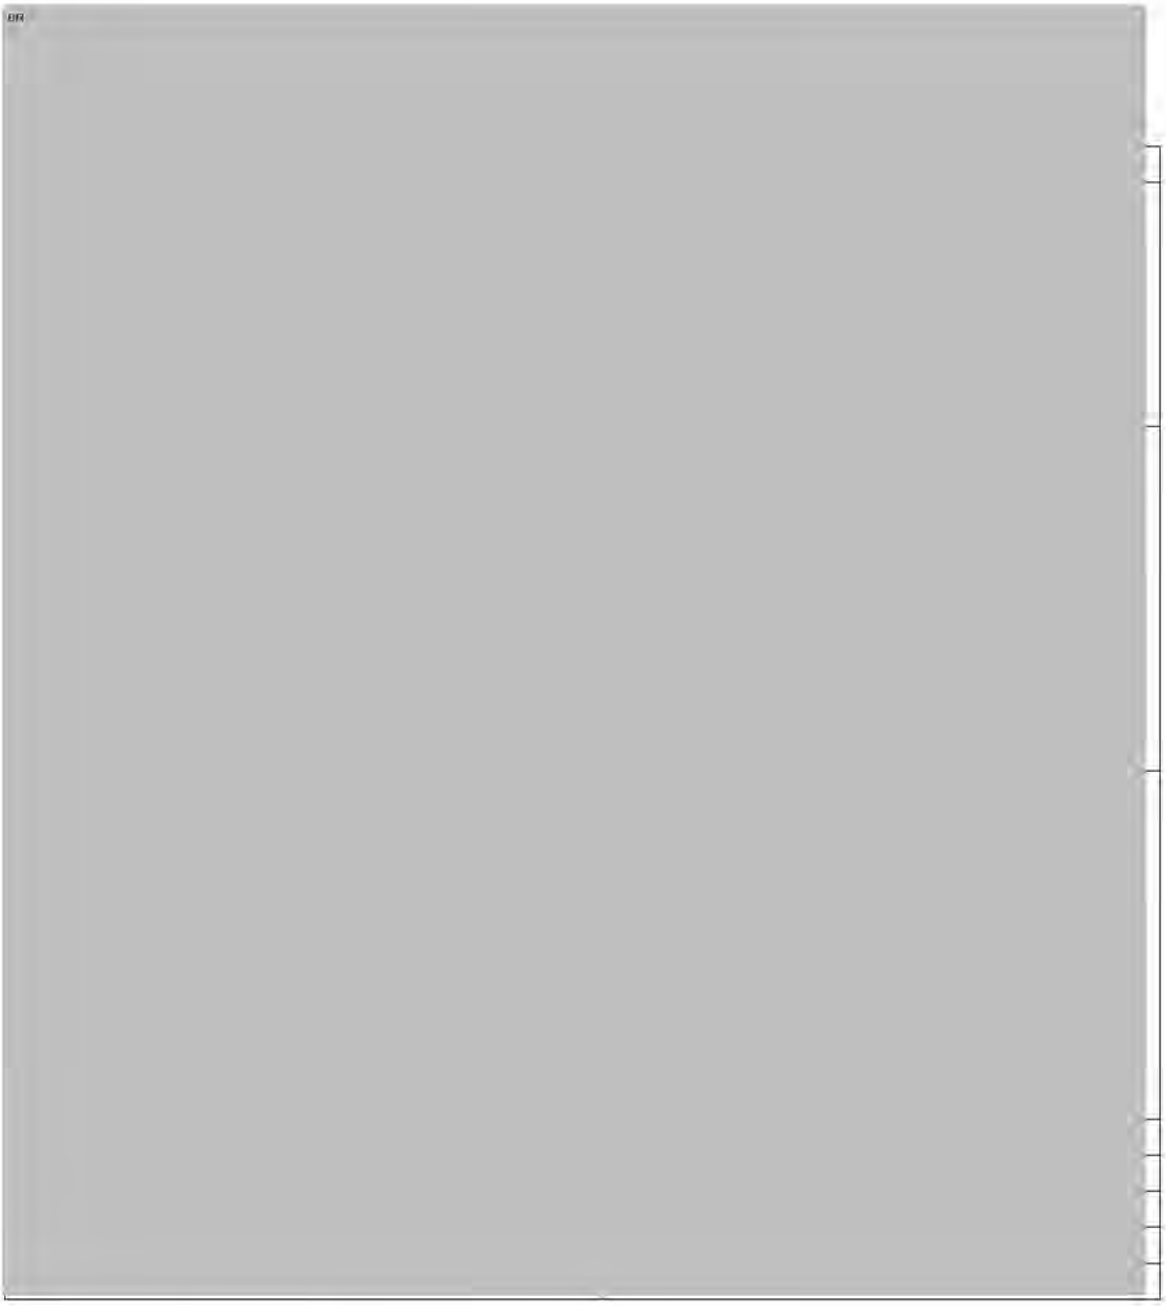


### 2.2.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| BR |
| Het Hoogheemraadschap van Delfland zal de projectplanprocedure starten ter realisatie van de tweede toevoer vanuit de Vliet naar het Molenvlietpark. |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |

BR

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Samenwerkingsovereenkomst opstellen en formaliseren t.b.v. de waterinlaat vanuit de Vliet naar het bergingsgebied in het Molenvlietpark. | Na het collegebesluit op 20 maart 2018 over het Planuitwerkingskader Buitenplaats Nieuw Vredendoord (verzorgd door DSO) zijn de grondeigenaar en de projectorganisatie verder in gesprek getreden over een Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Vooruitlopend op de beoogde SOK heeft de perceeleigenaar aan de gemeente zijn medewerking gegeven voor nader ecologisch onderzoek en nadere bomeninventarisatie. |
| | |
| [redacted] | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| [redacted] |
| Samenwerkingsovereenkomst opstellen en formaliseren t.b.v. de waterinlaat vanuit de Vliet naar het bergingsgebied in het Molenvlietpark. |
| [redacted] |

## 2.5 Communicatie

### 2.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Voorbereidingen en uitvoering open dag Rotterdamsebaan op zaterdag 13 januari 2018. | Zaterdag 13 januari was er een uitgebreide open dag. In de ochtend konden werknemers van het project hun familie rondleiden op het werkterrein in de Vlietzone. In de middag waren de werkterreinen in de Vlietzone en in de Binckhorst open voor het publiek. Ook het Trefpunt kon bezocht worden. Ruim 11.000 mensen namen een kijkje bij de boormachine en op de werkterreinen. Ruim 5.000 liepen ook binnen bij het Trefpunt. Bij het werkterrein in de Vlietzone konden bezoekers ook meer te weten komen over het archeologisch onderzoek en het Molenvlietpark. |
| BR | |

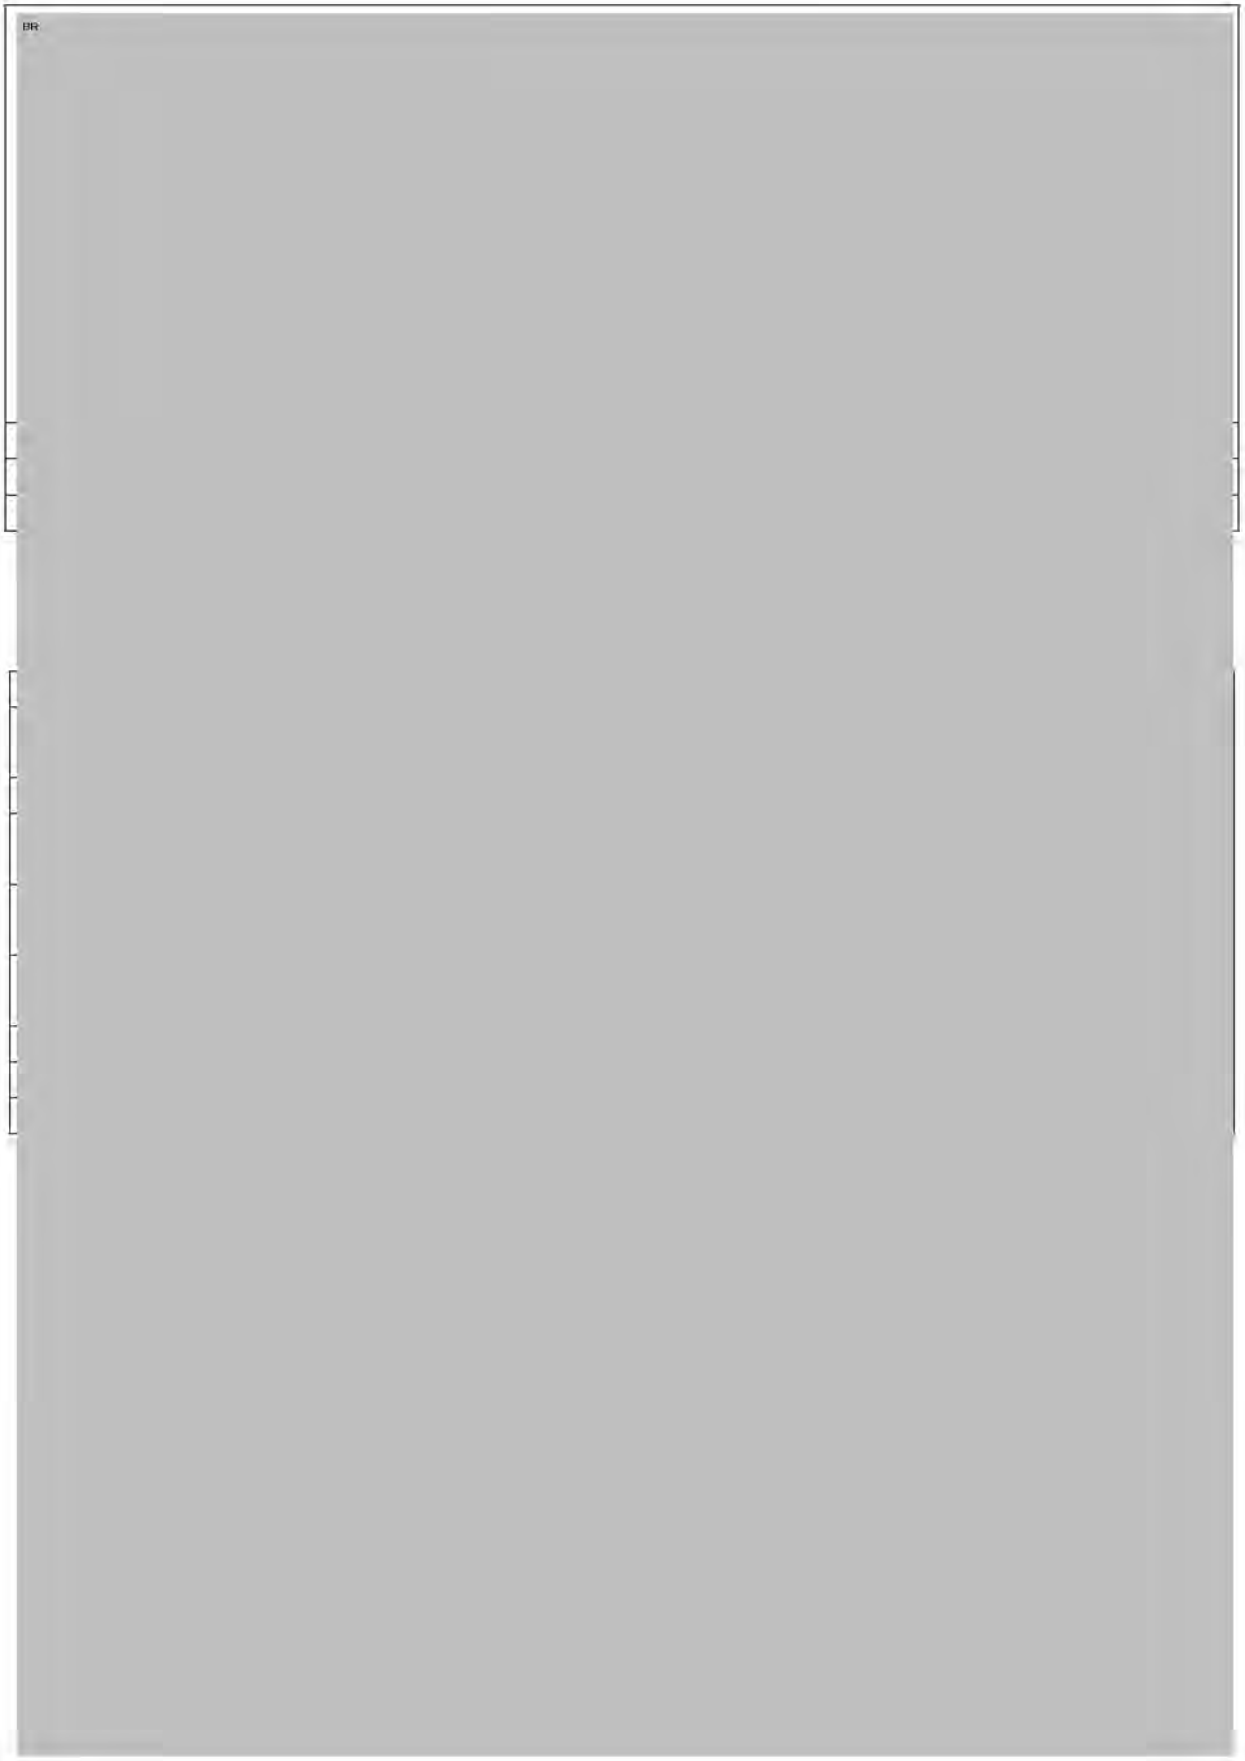
BR

# 3 Projectvoortgang

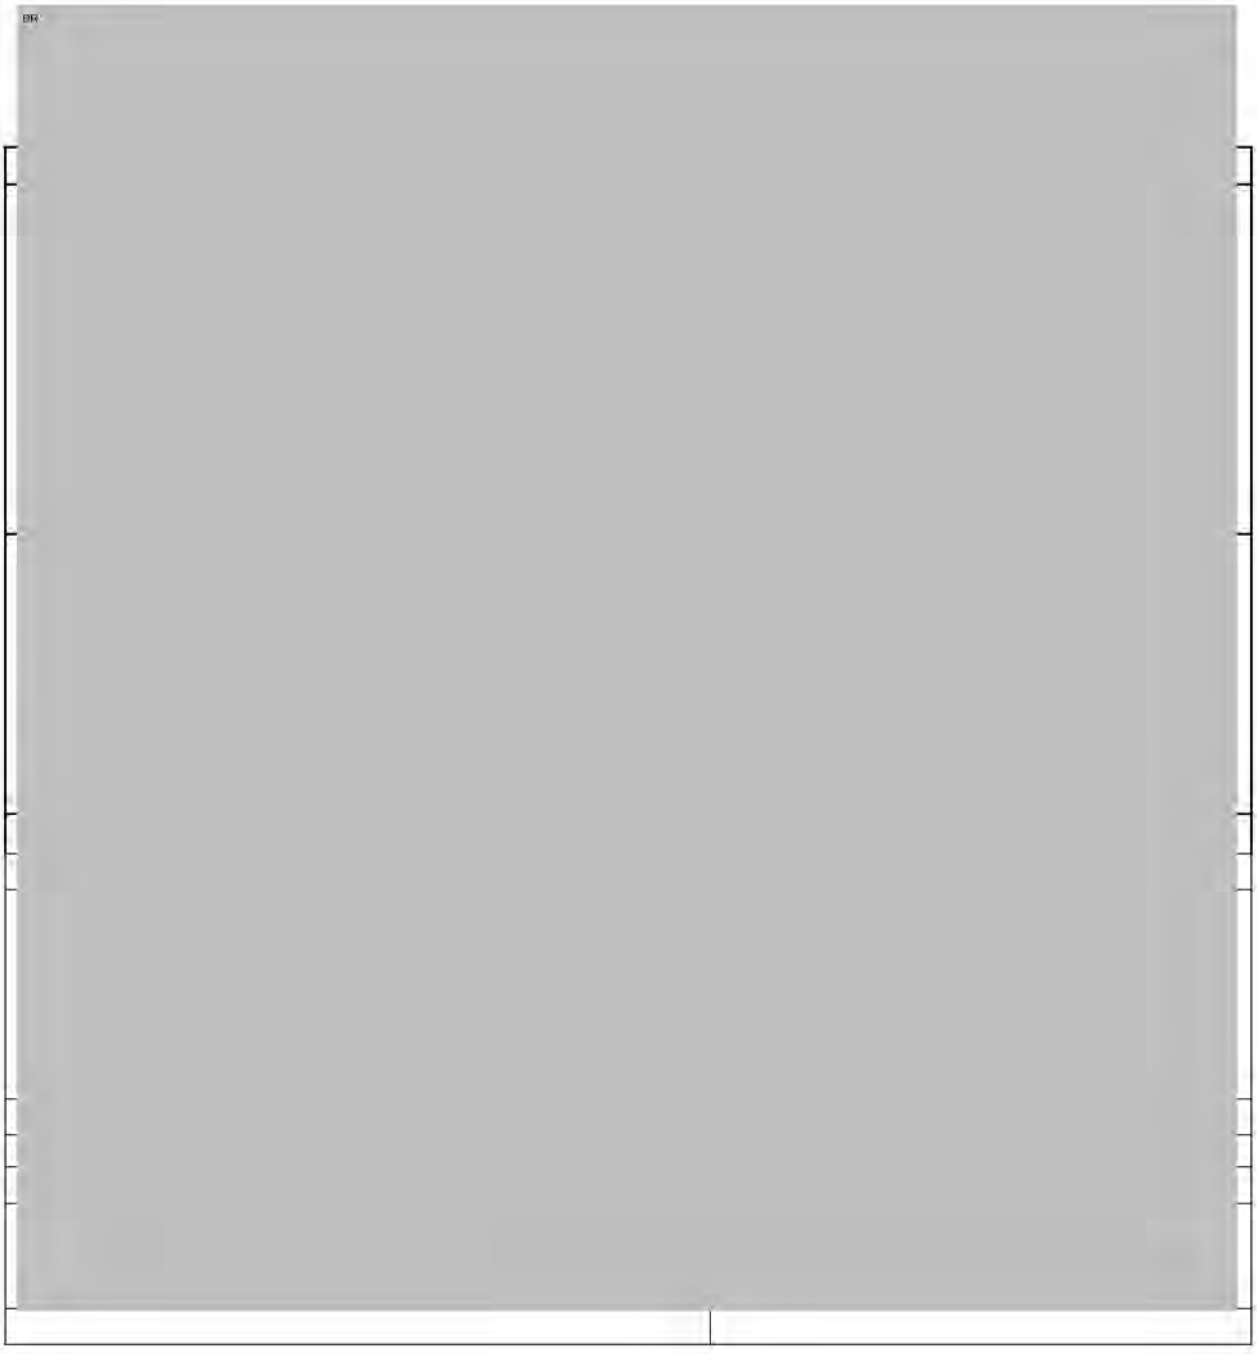

### 3.1.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| BR |

| |
|---|
| BR |
| Voorbereiding contractering en aanbesteding deelproject Tweede Toevoer zal gestart worden. |
| |
| BR |
| |
| |

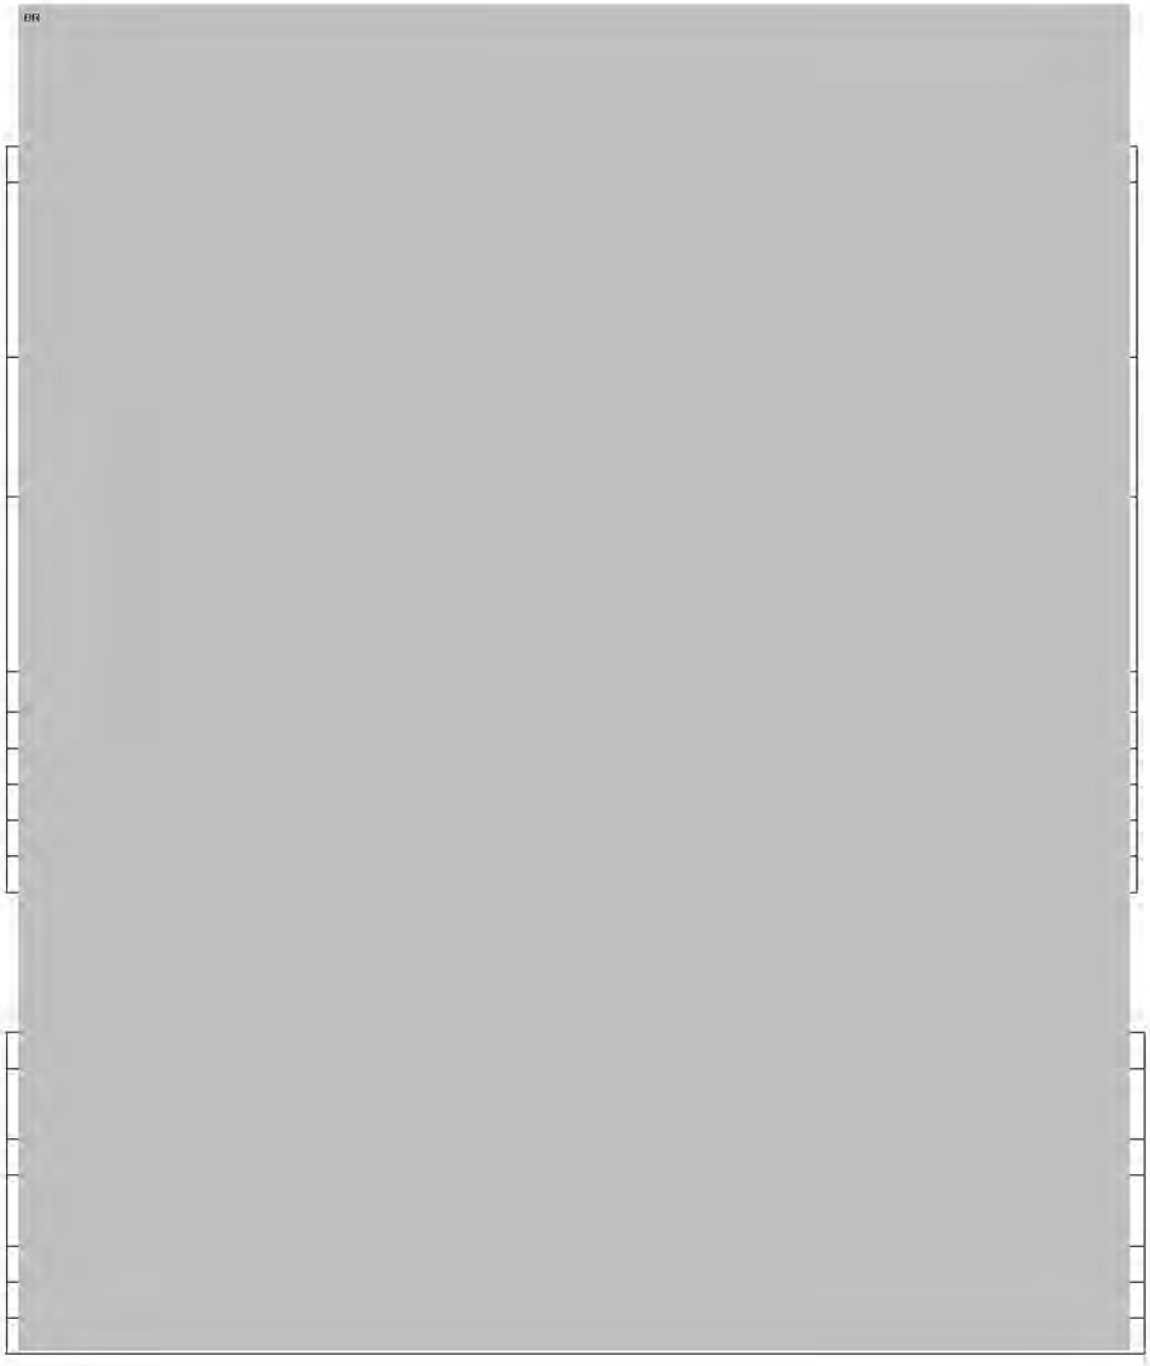

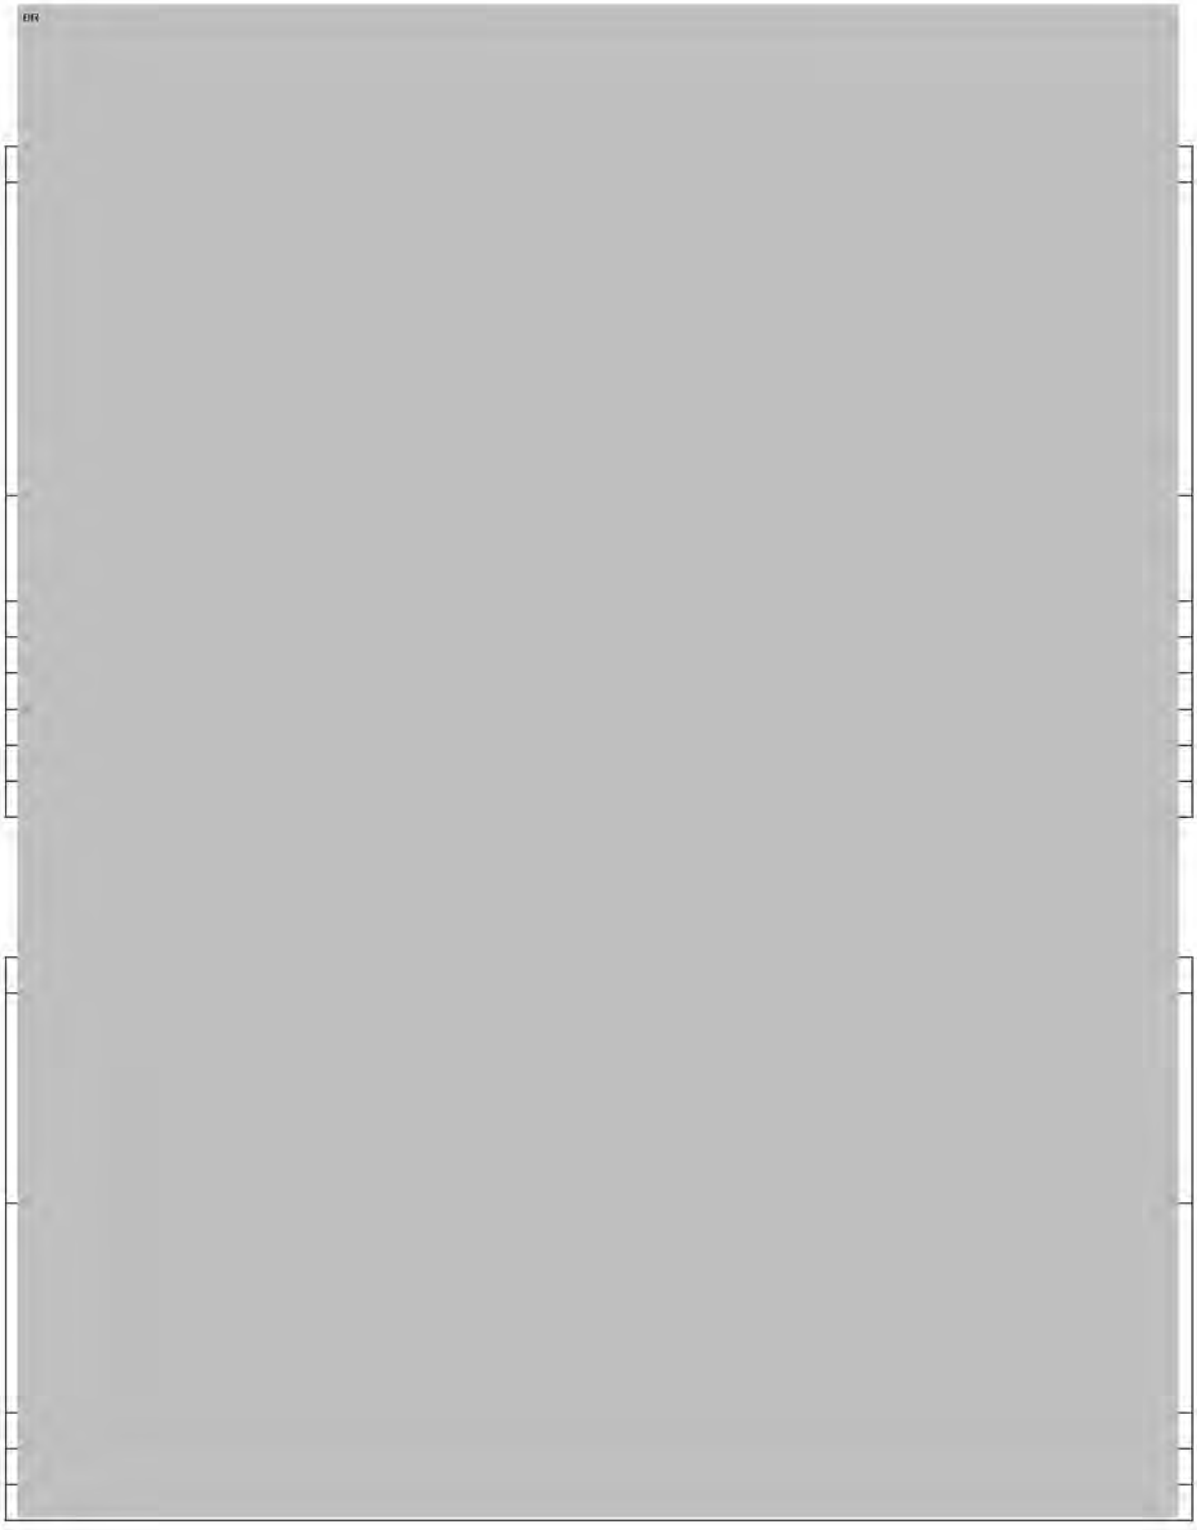

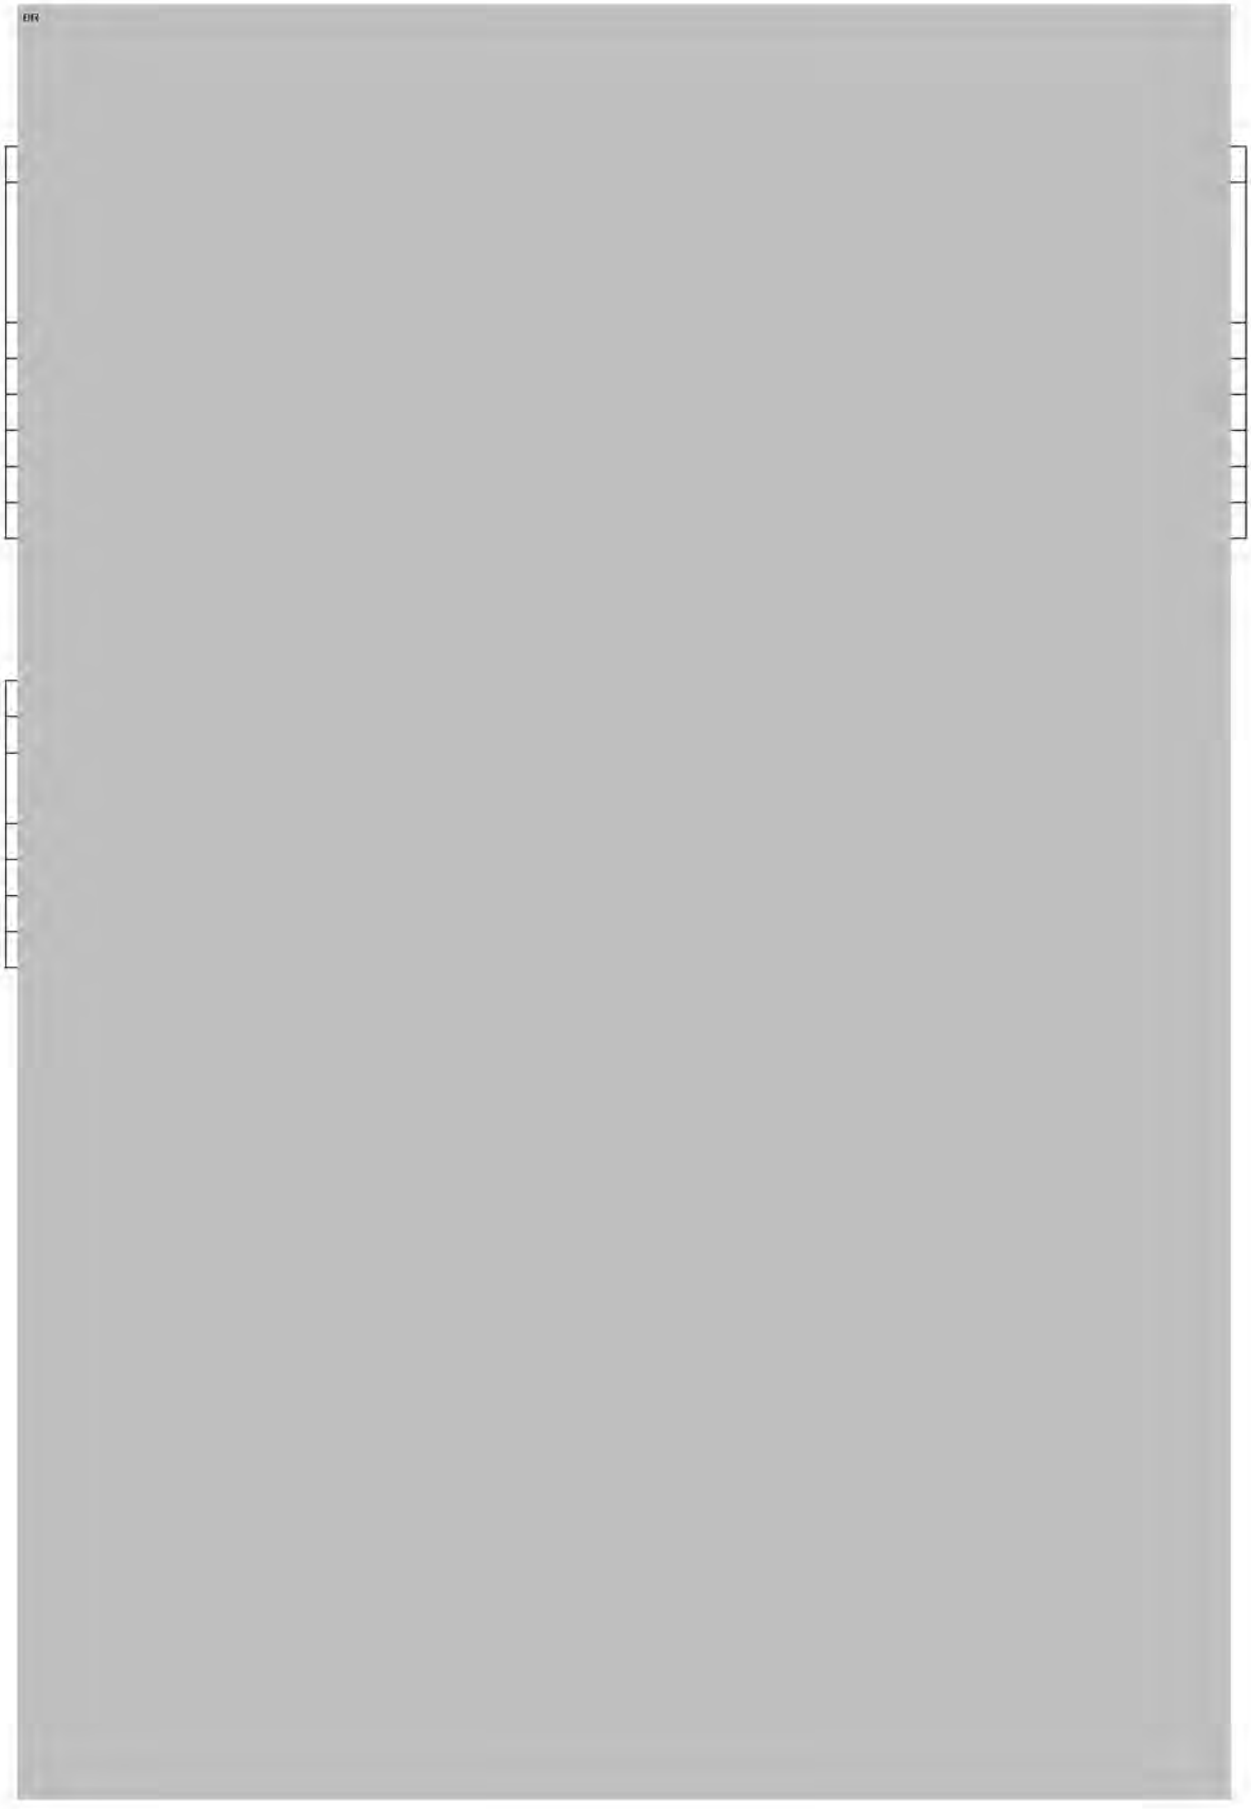

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Molenvlietpark: Bomenkap na verlenen aanvullende kapvergunning zodat de nieuwe boezemkade op de bestaande kade kan worden aangesloten. Aanbrengen bovengrond op de nieuwe kade. | De bomen zijn gekapt en de boezemkade is verder aangesloten op de bestaande kade. Alle bovengrond is verwerkt. |
| BR | |

### 3.5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Planten 18 Canadese populieren in het Molenvlietpark. |
| BR |
| Aanpassen waterhuishouding Molenvlietpark (stap 9). |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |

Foto: Boezemkade Molenvlietpark

Foto: Vrijkomend materiaal scheidingsinstallatie

BR

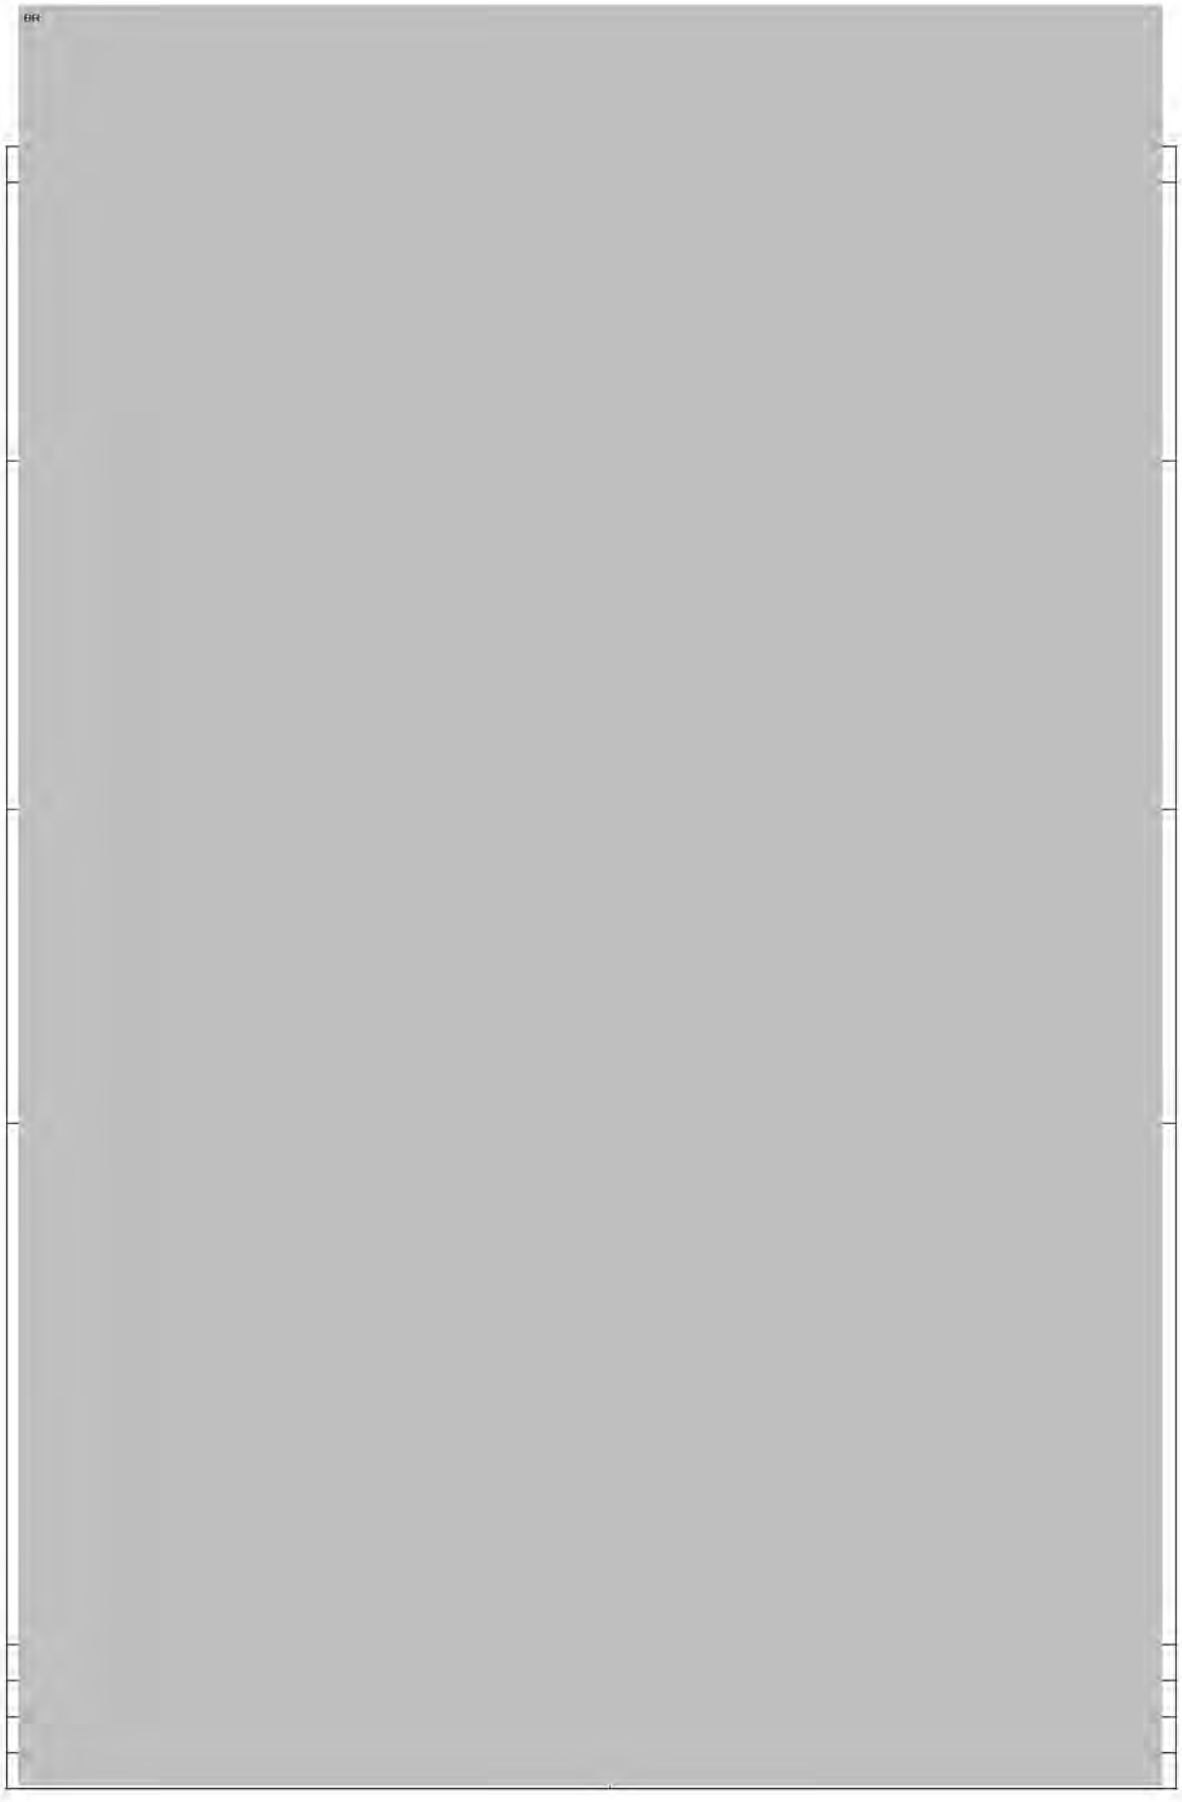

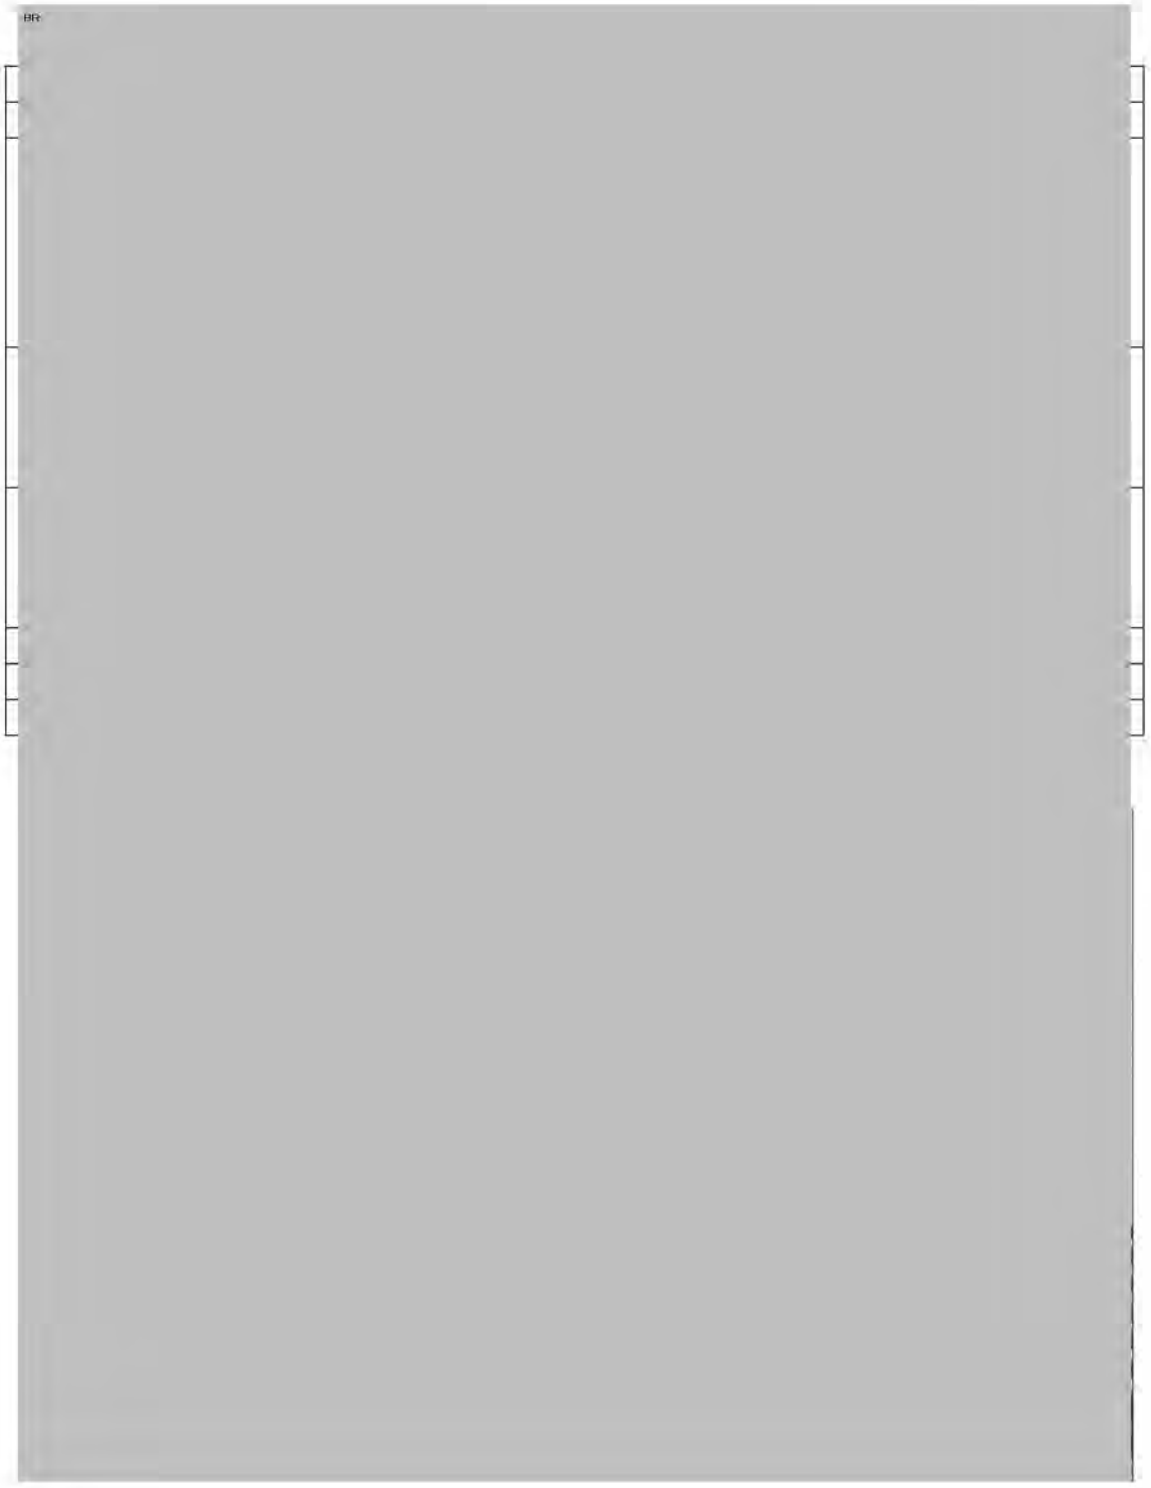

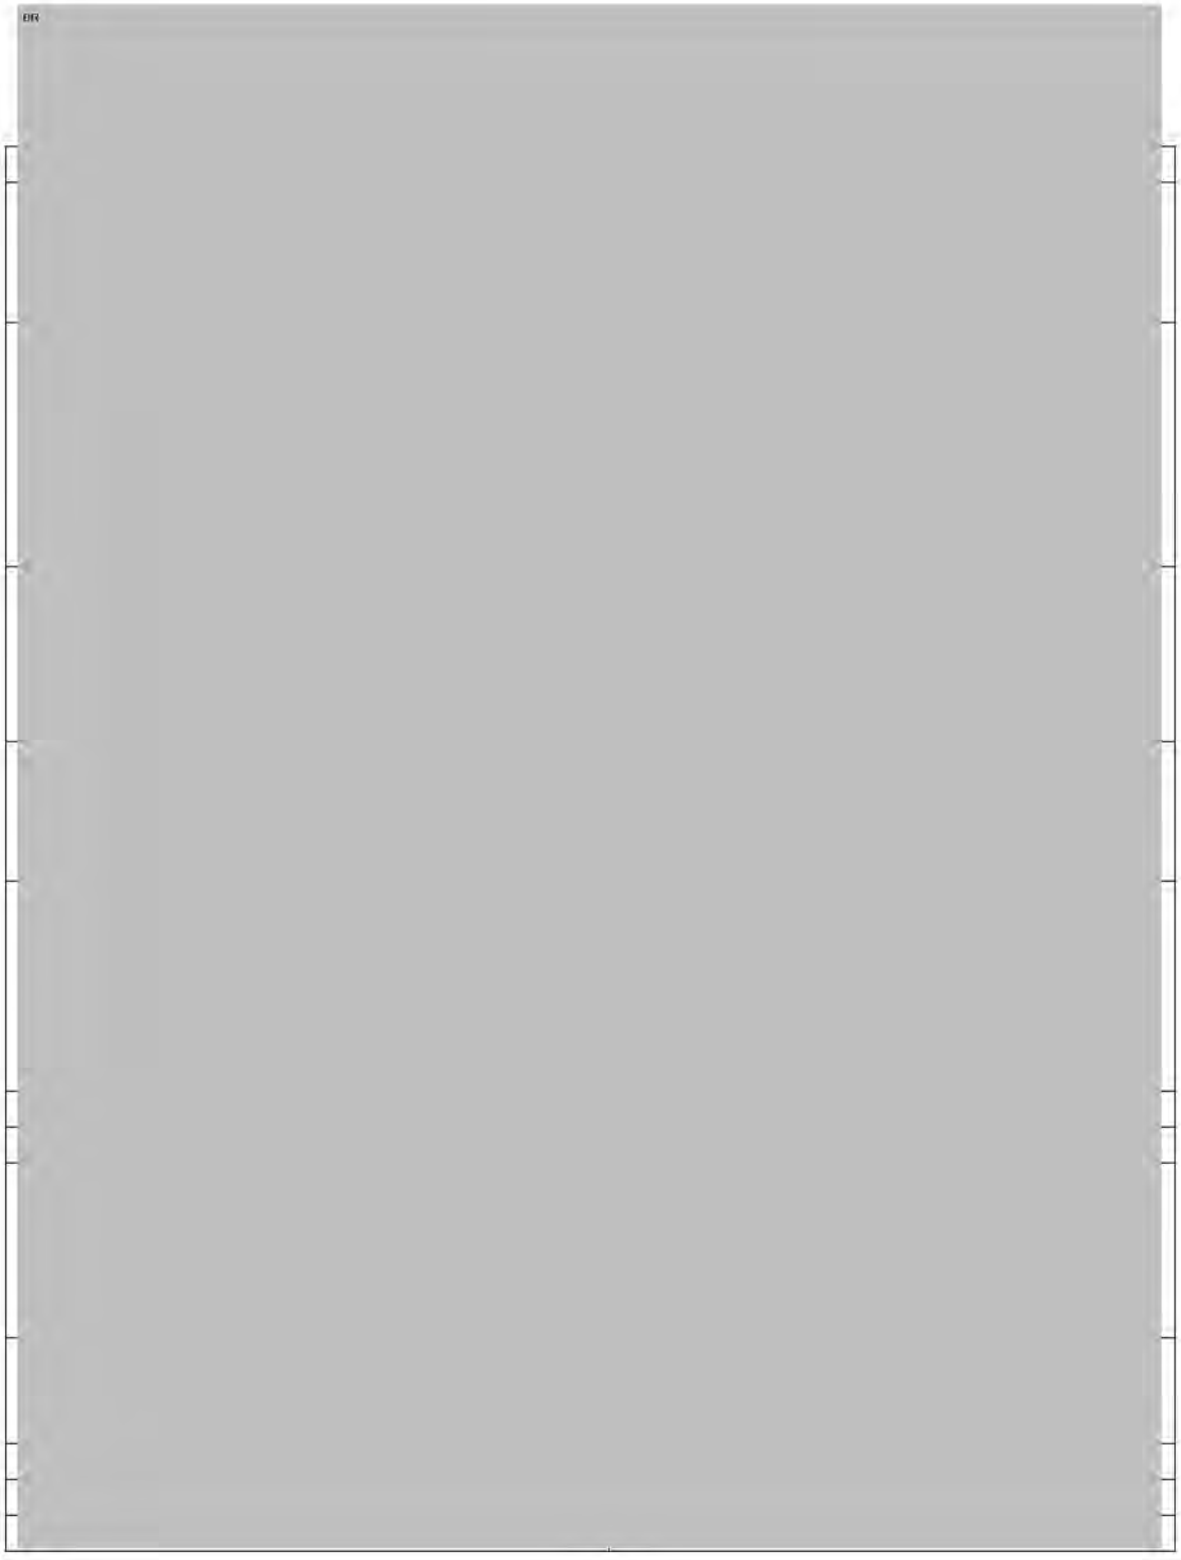

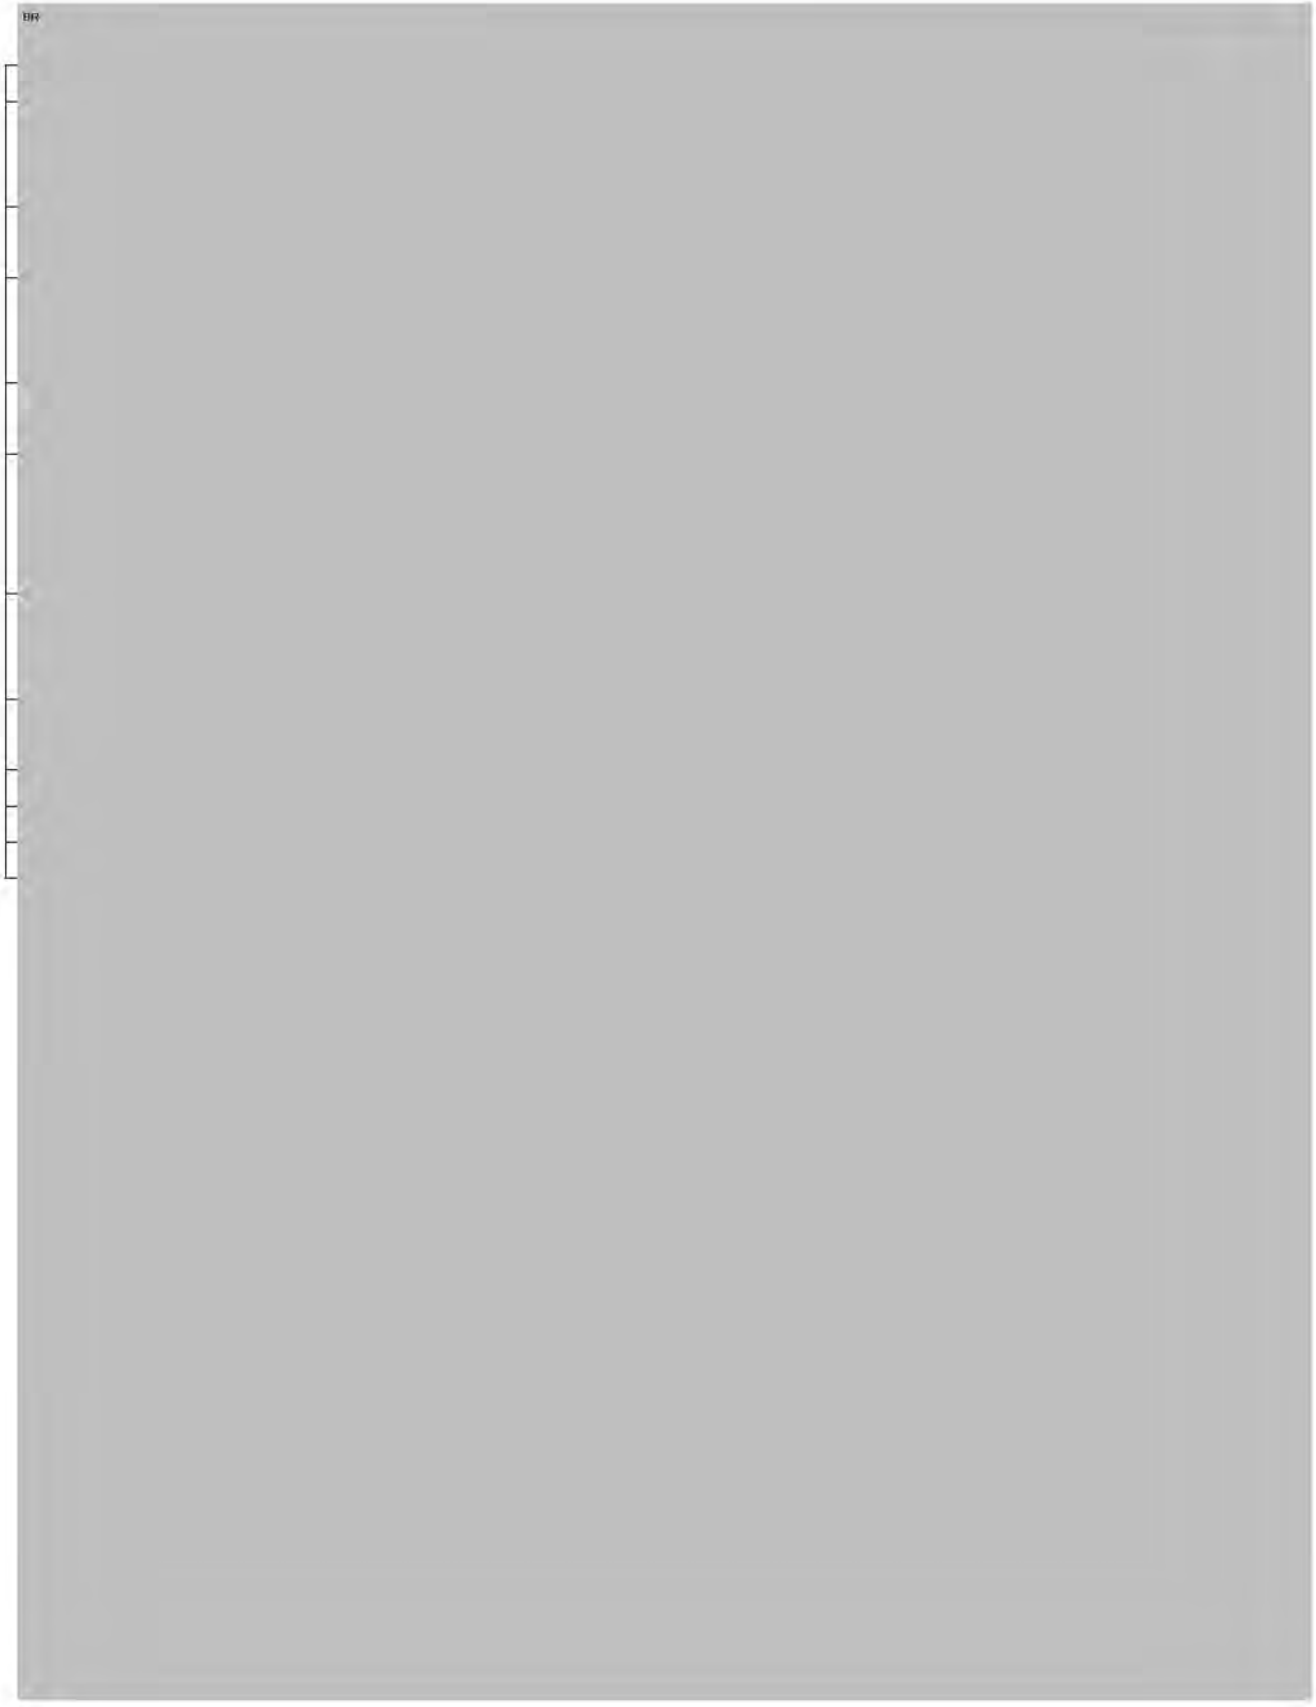

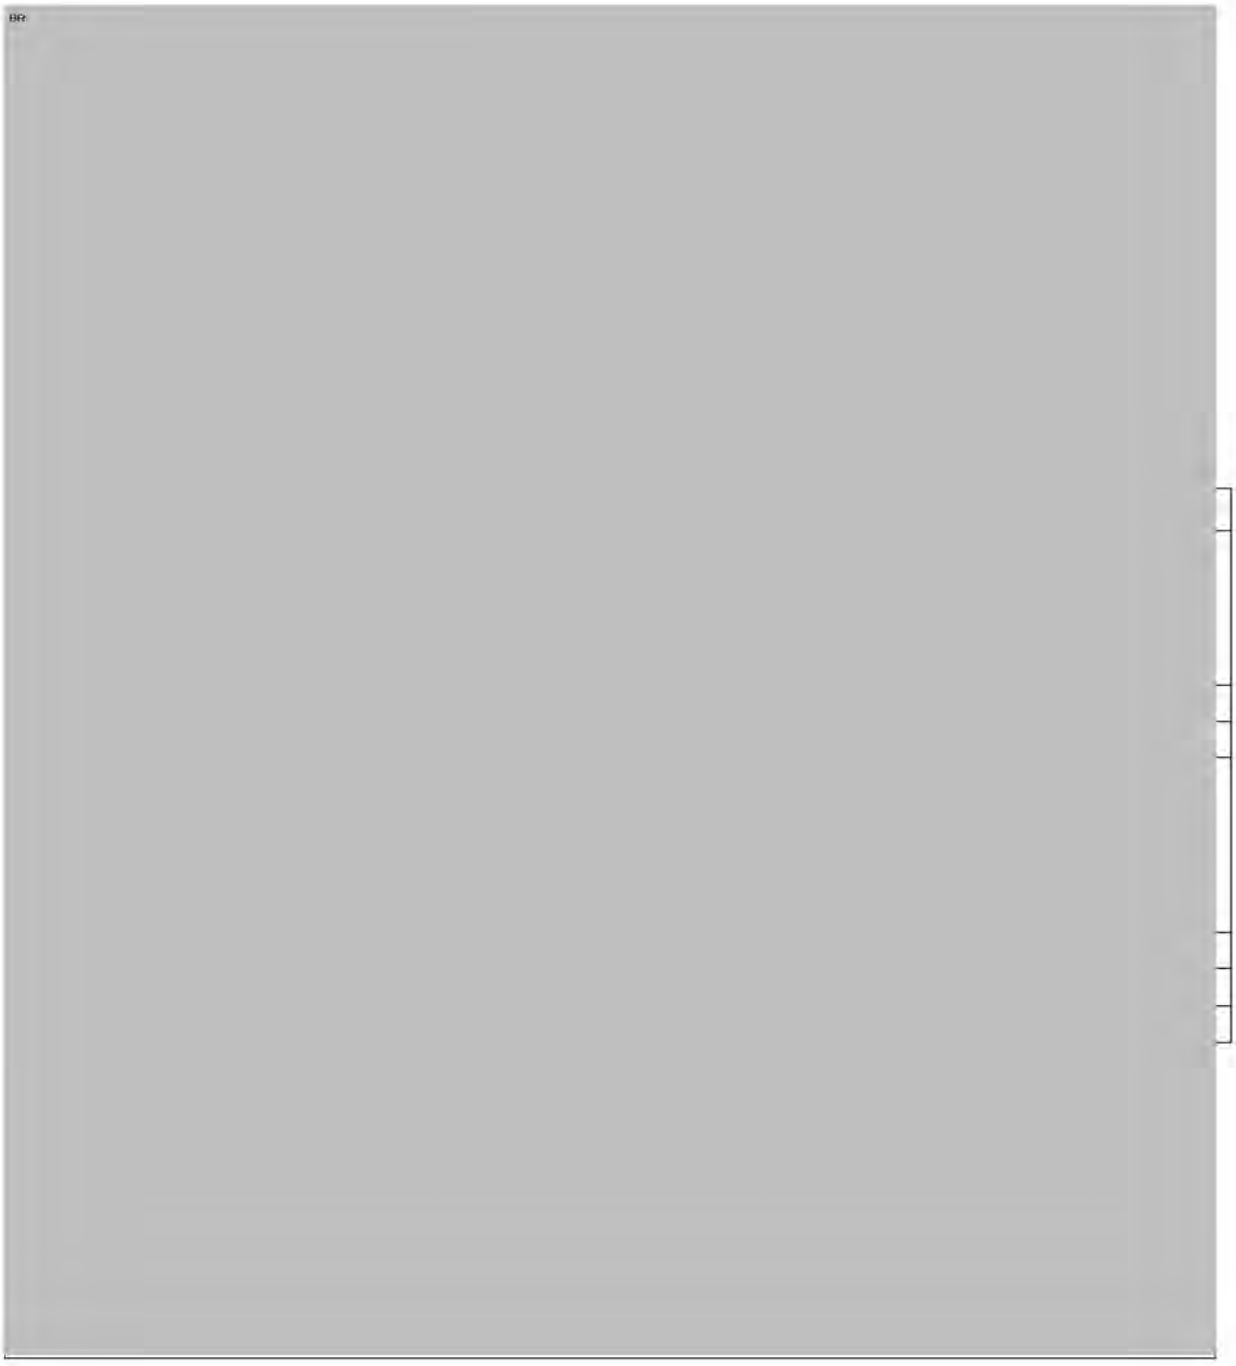

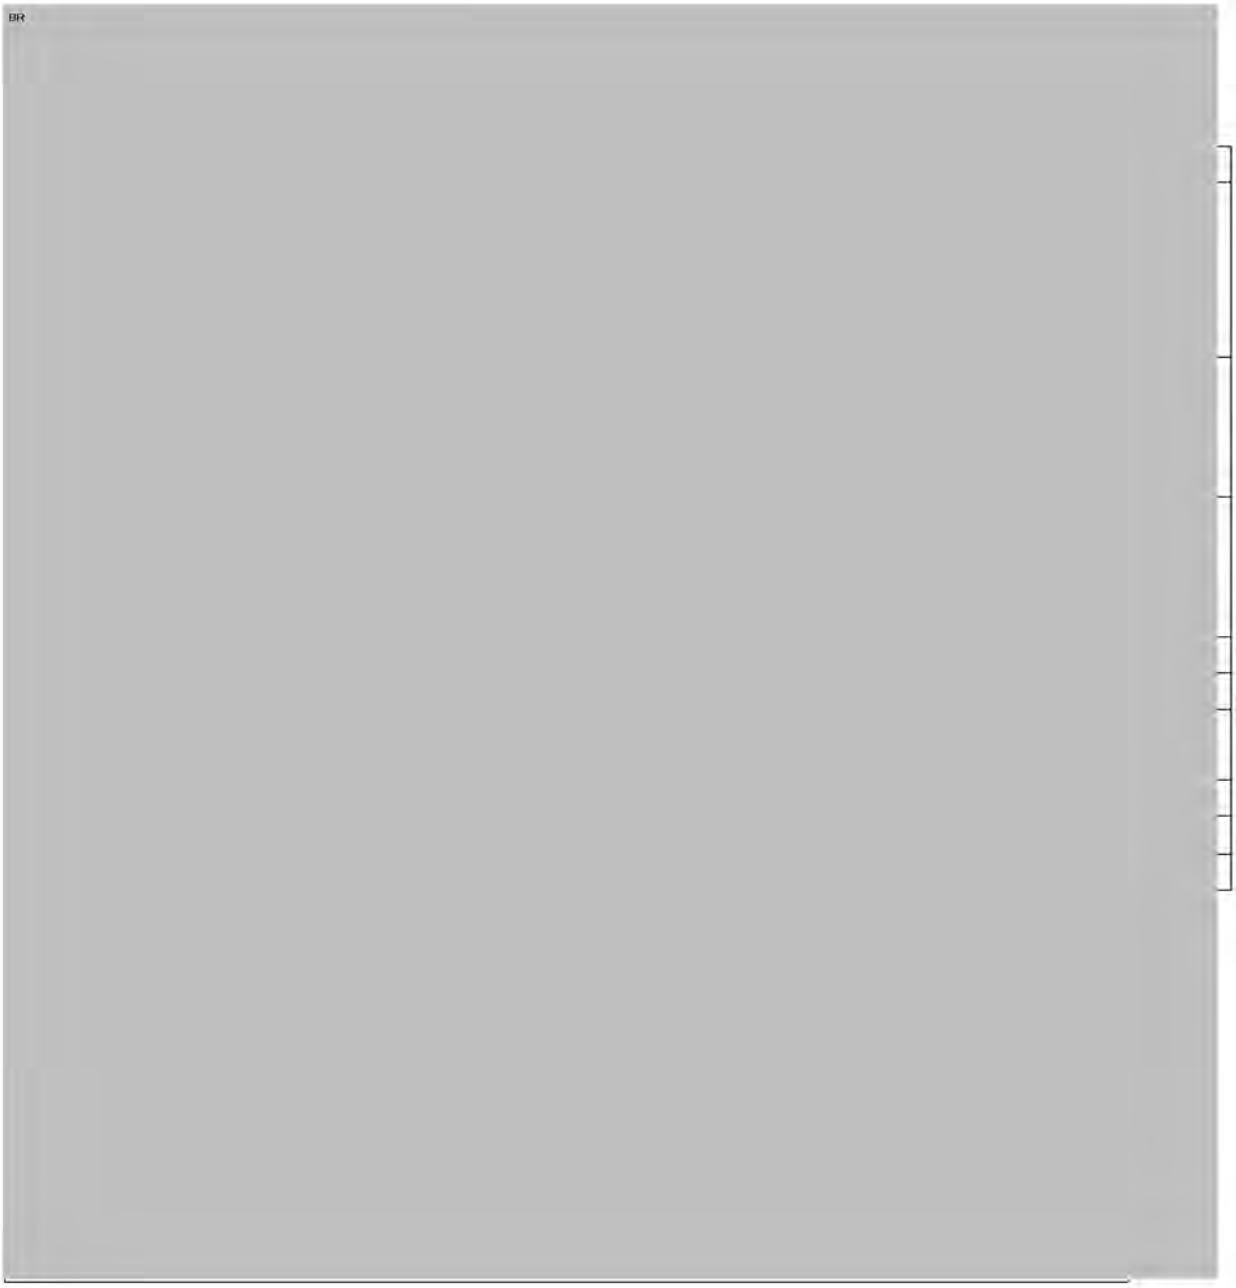
BR

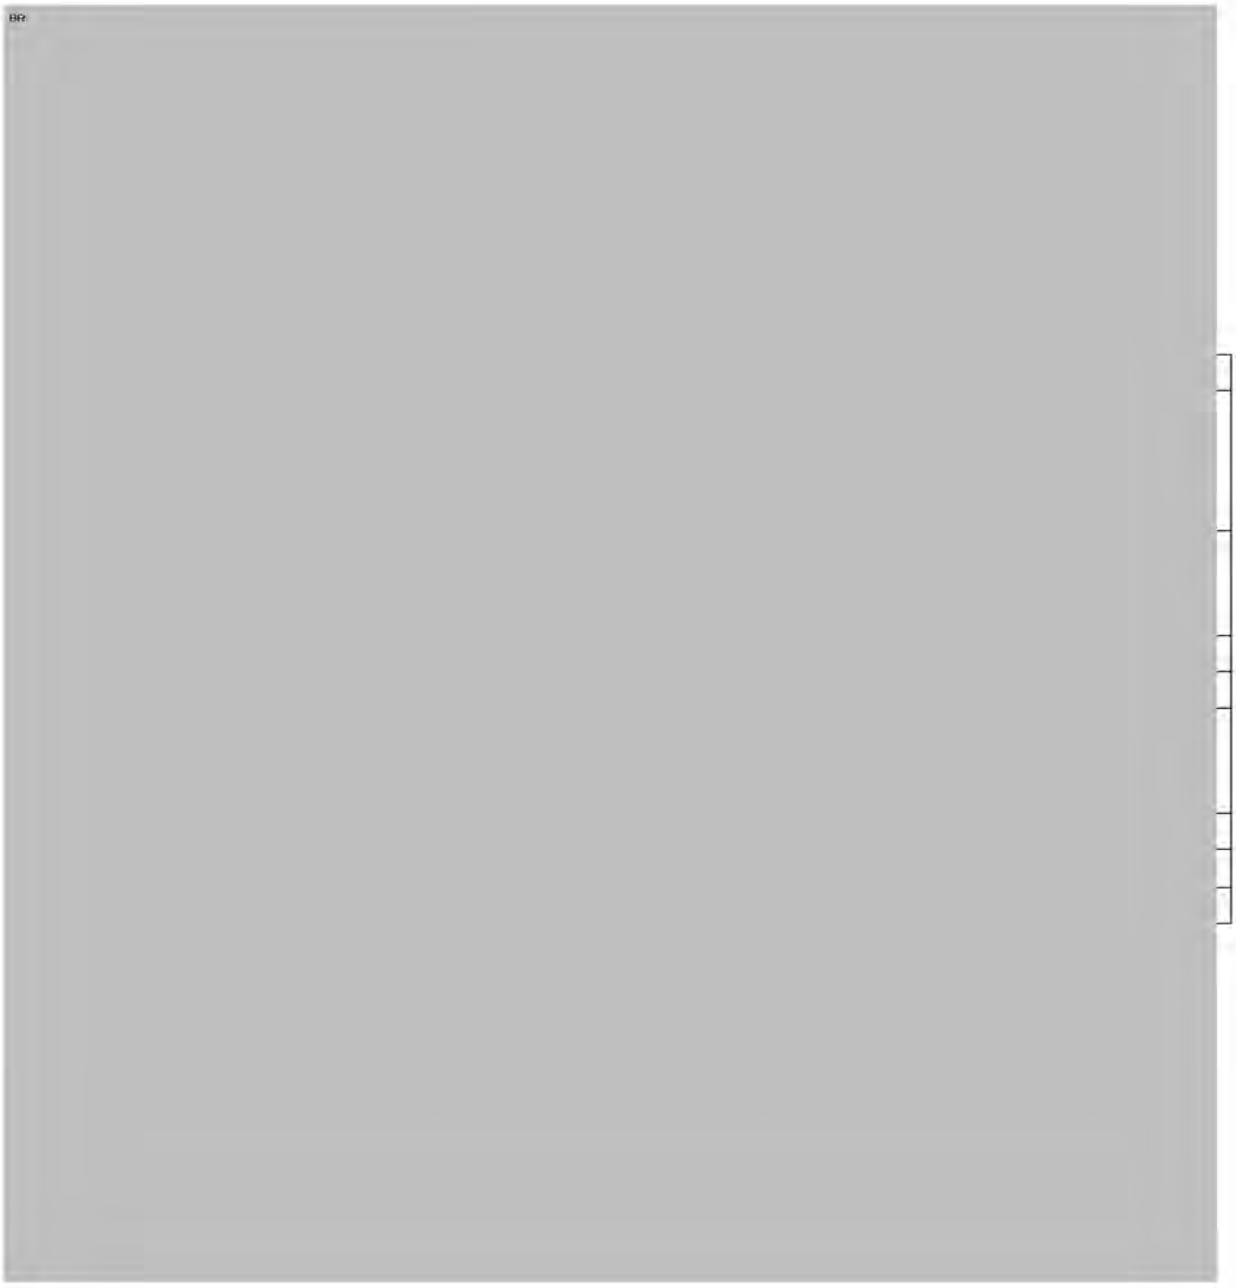

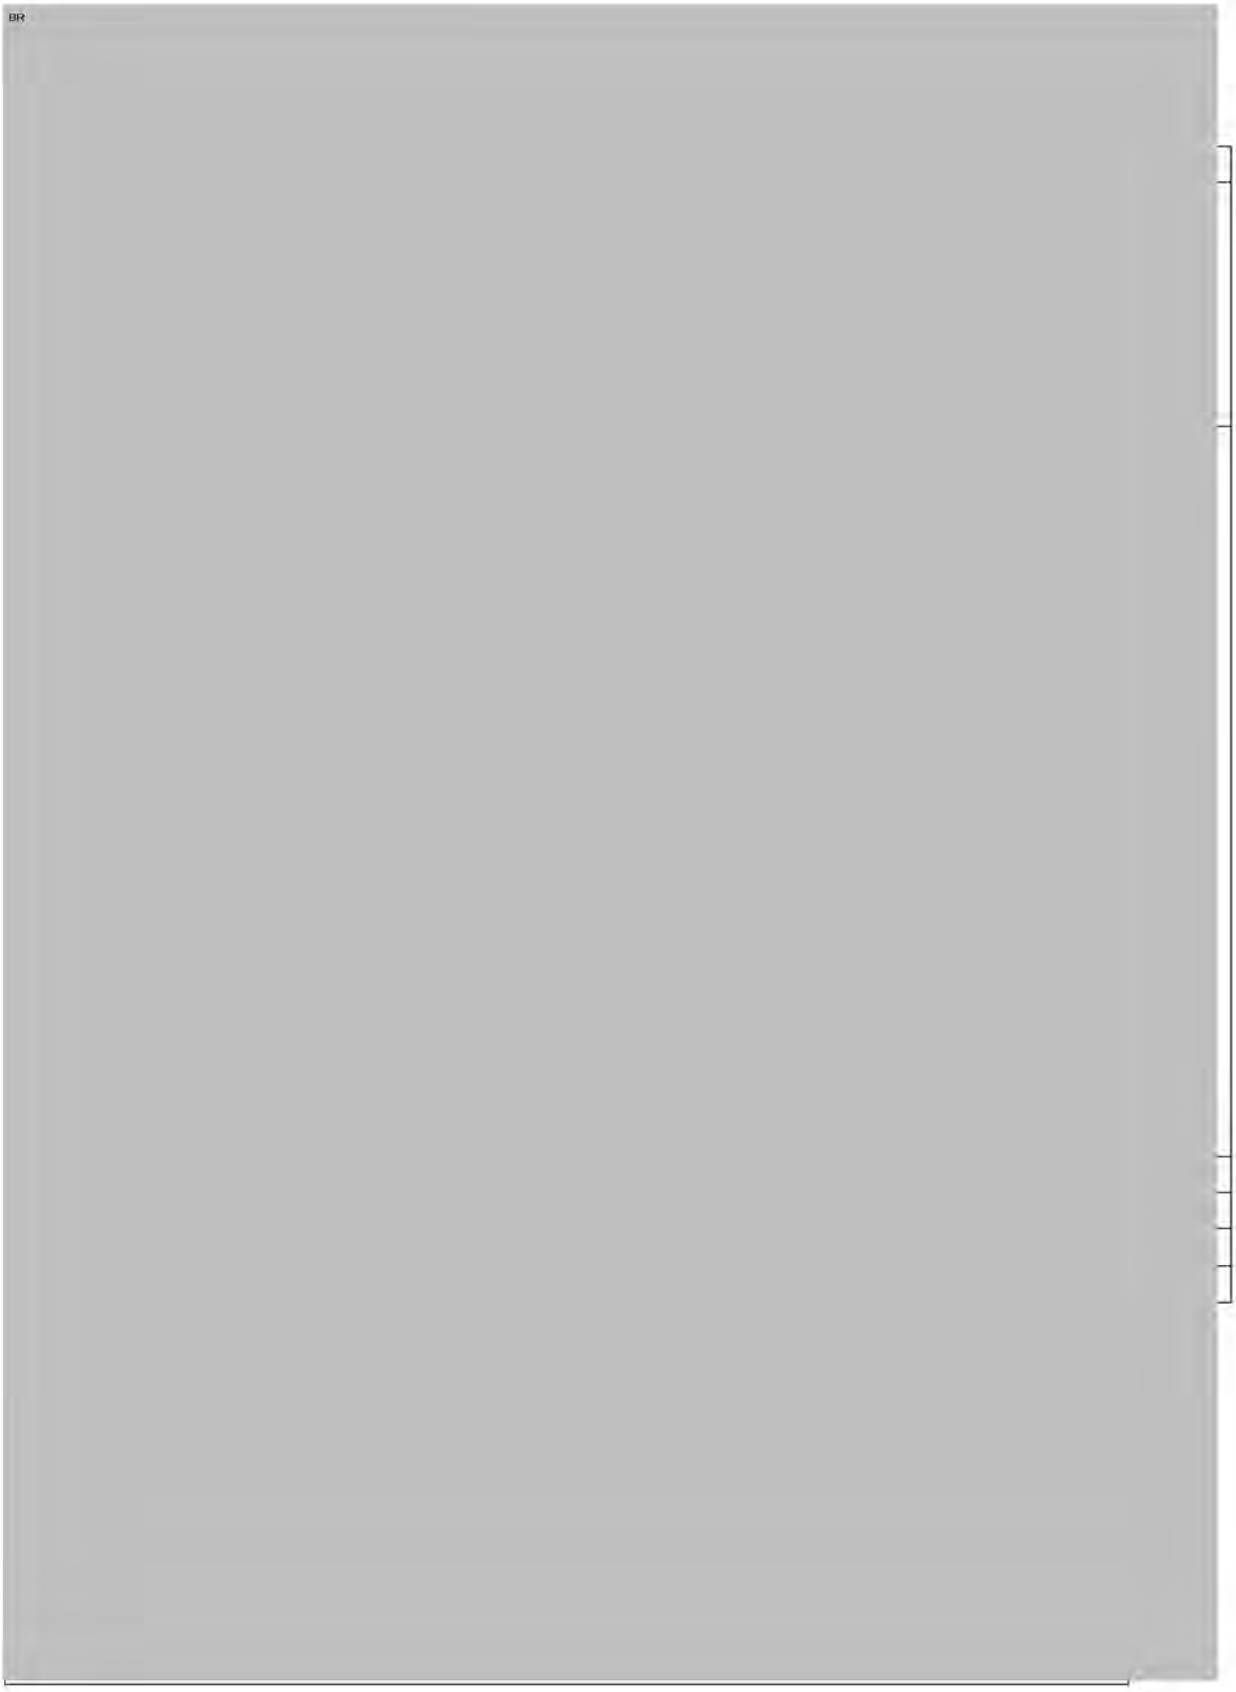

# 4 Overdracht en openstelling

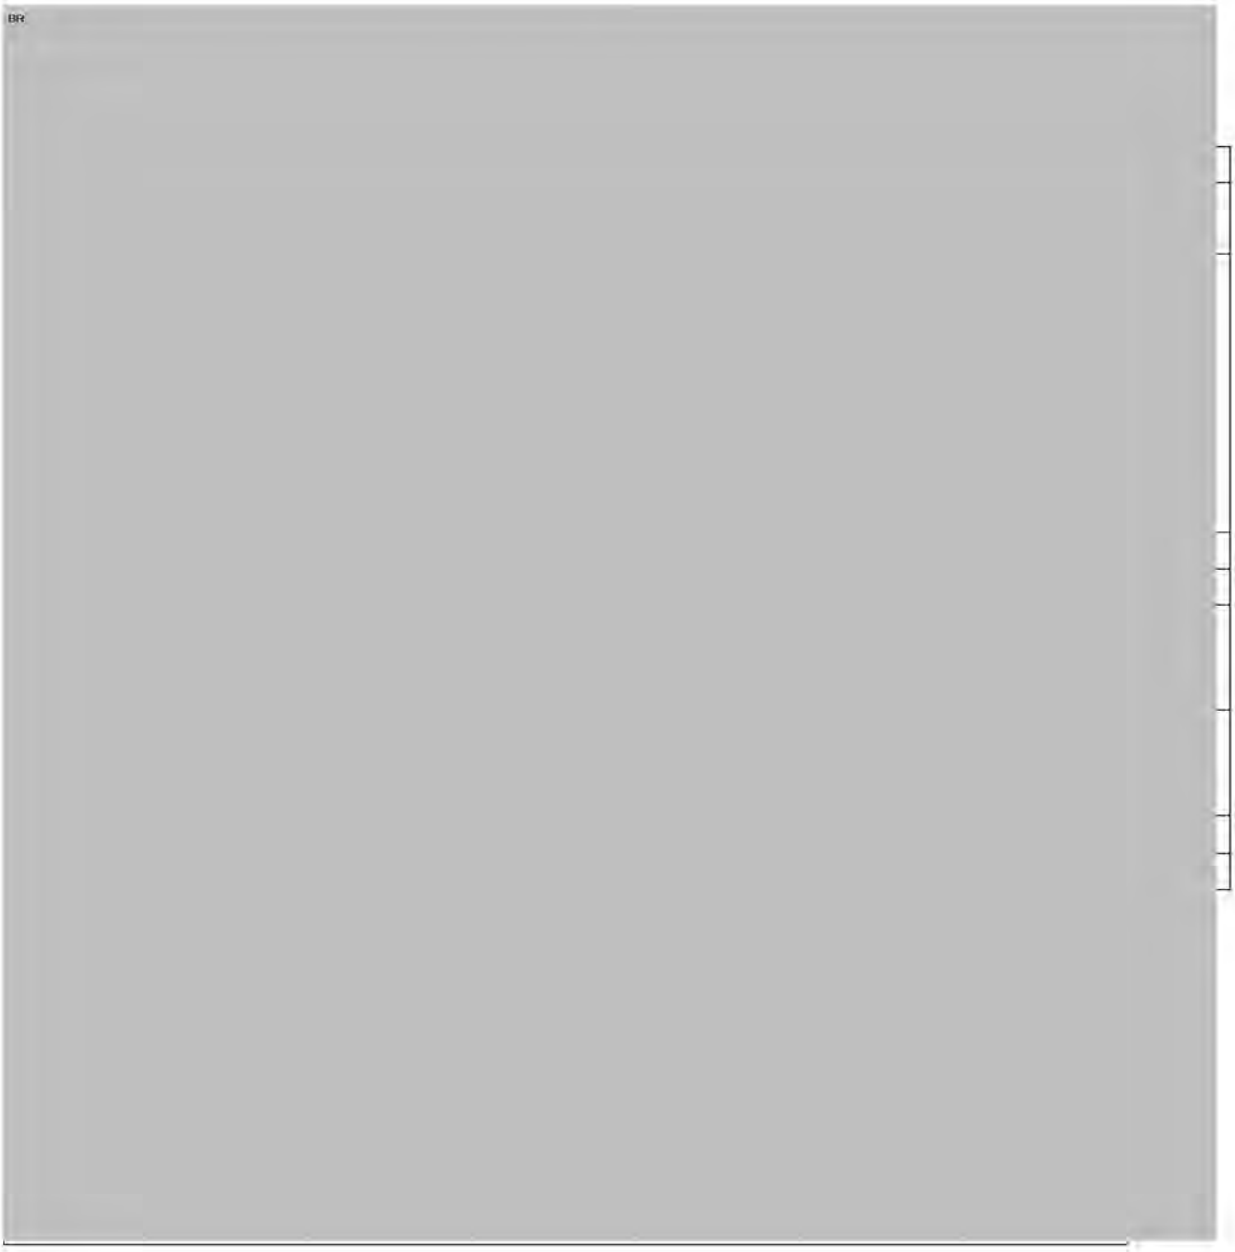

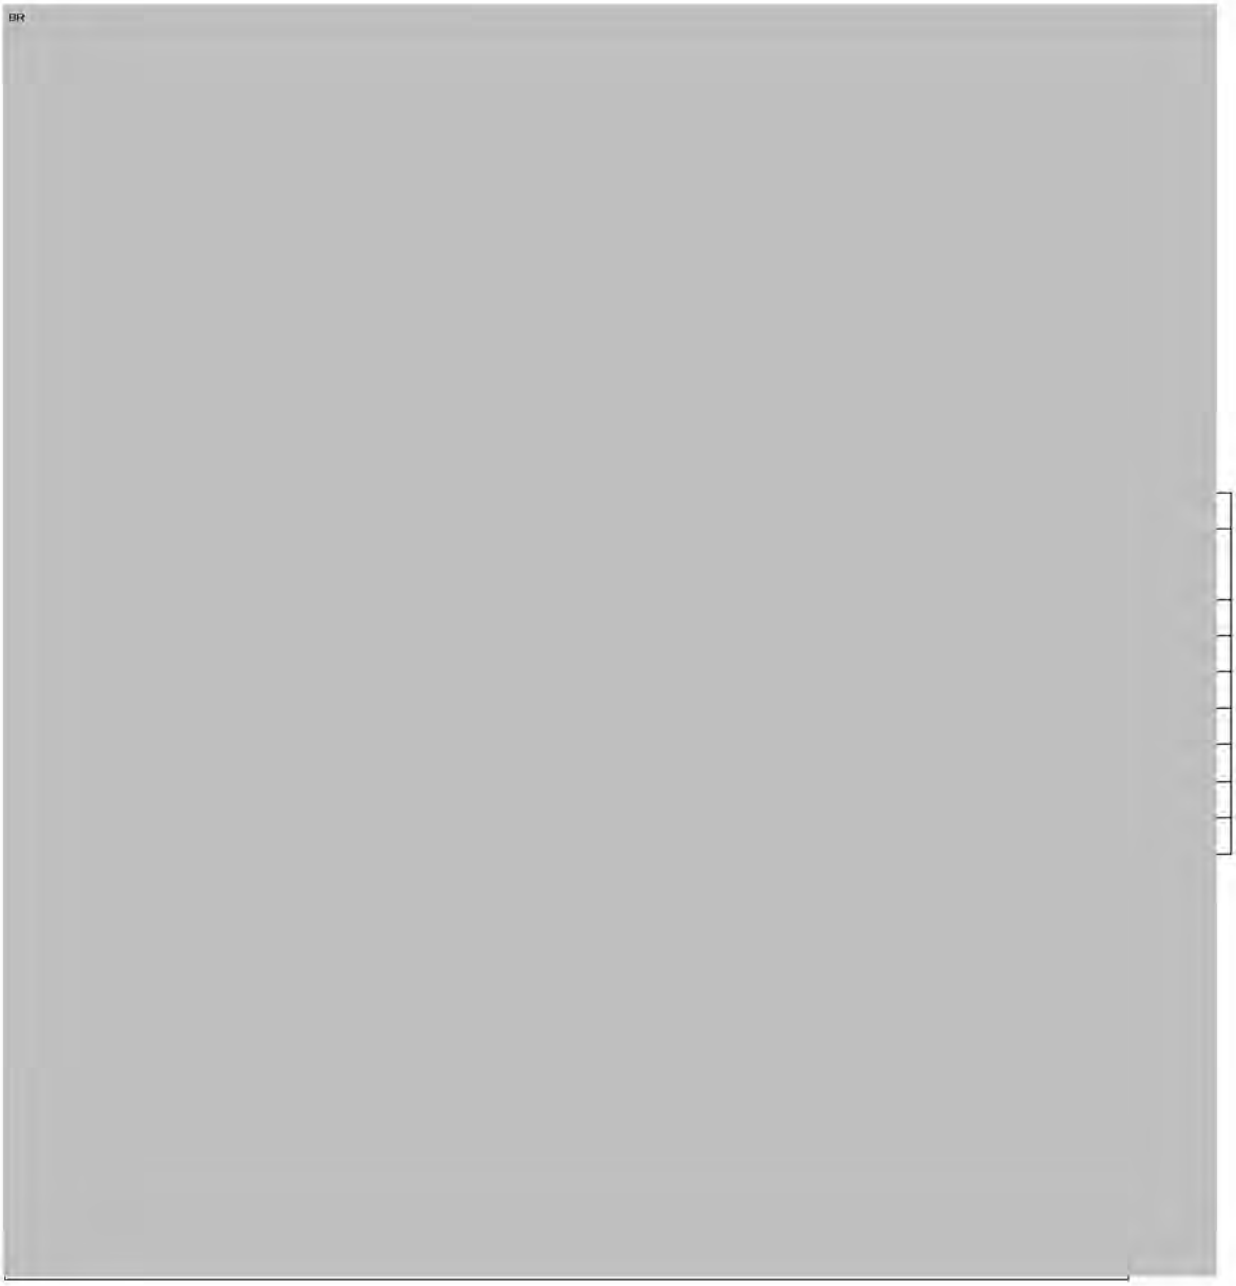
BR

# 5 Projectbeheersing

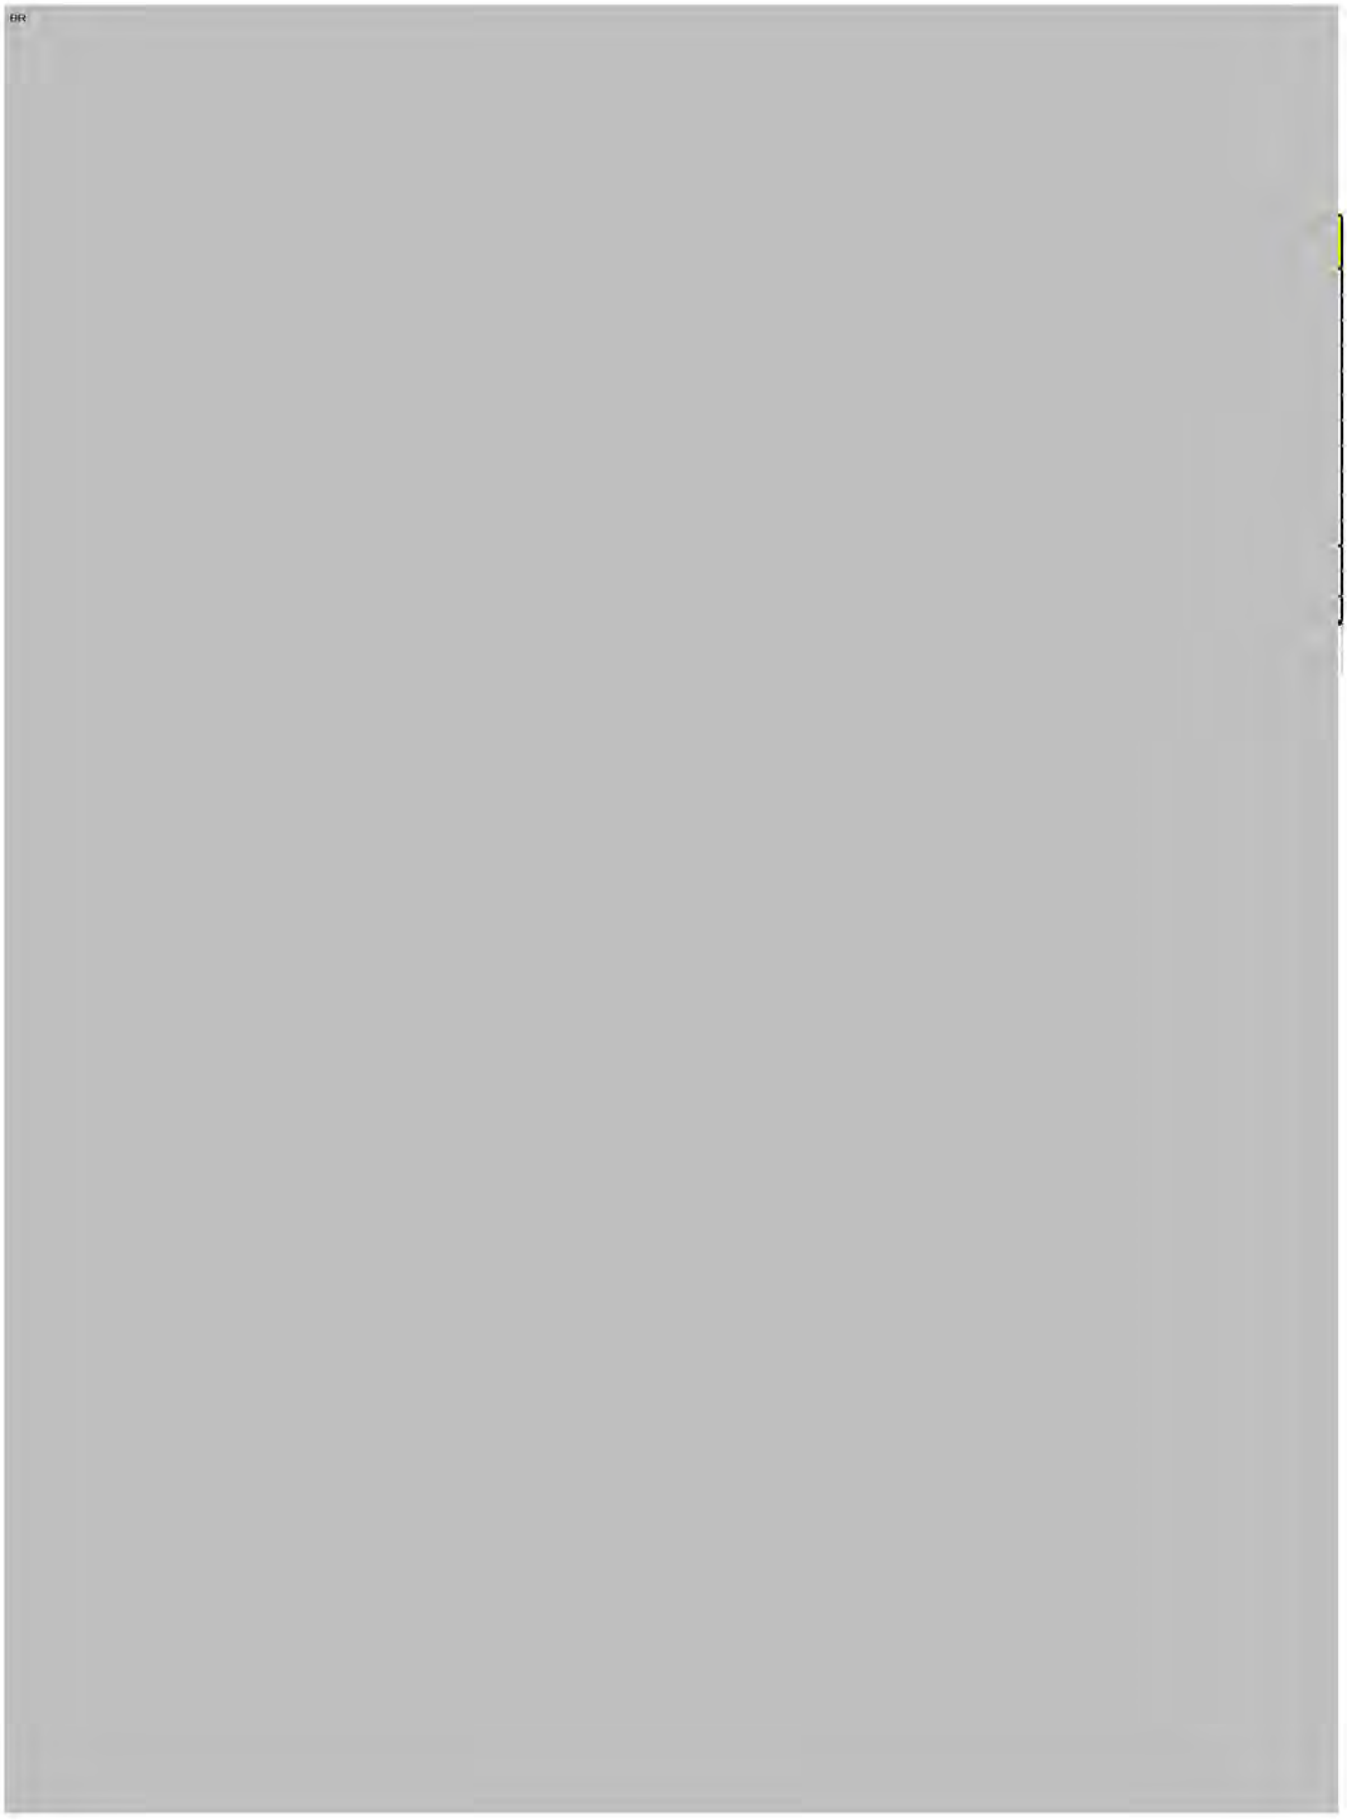

### 5.2.2 Dekkingen

Tabel : Overzicht toegezegde dekkingen Rotterdamsebaan, Euro's prijspeil 2016-2017 (excl. BTW)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delftland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | **2.725.000** | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | pm | pm | 0 | **0** | 0 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland
Er zijn in het eerste kwartaal 2018 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland
Er zijn in het eerste kwartaal 2018 geen mutaties geweest. De Landschapstafel is voornemens een subsidiebijdrage voor de inrichting van het Molenvlietpark te leveren.

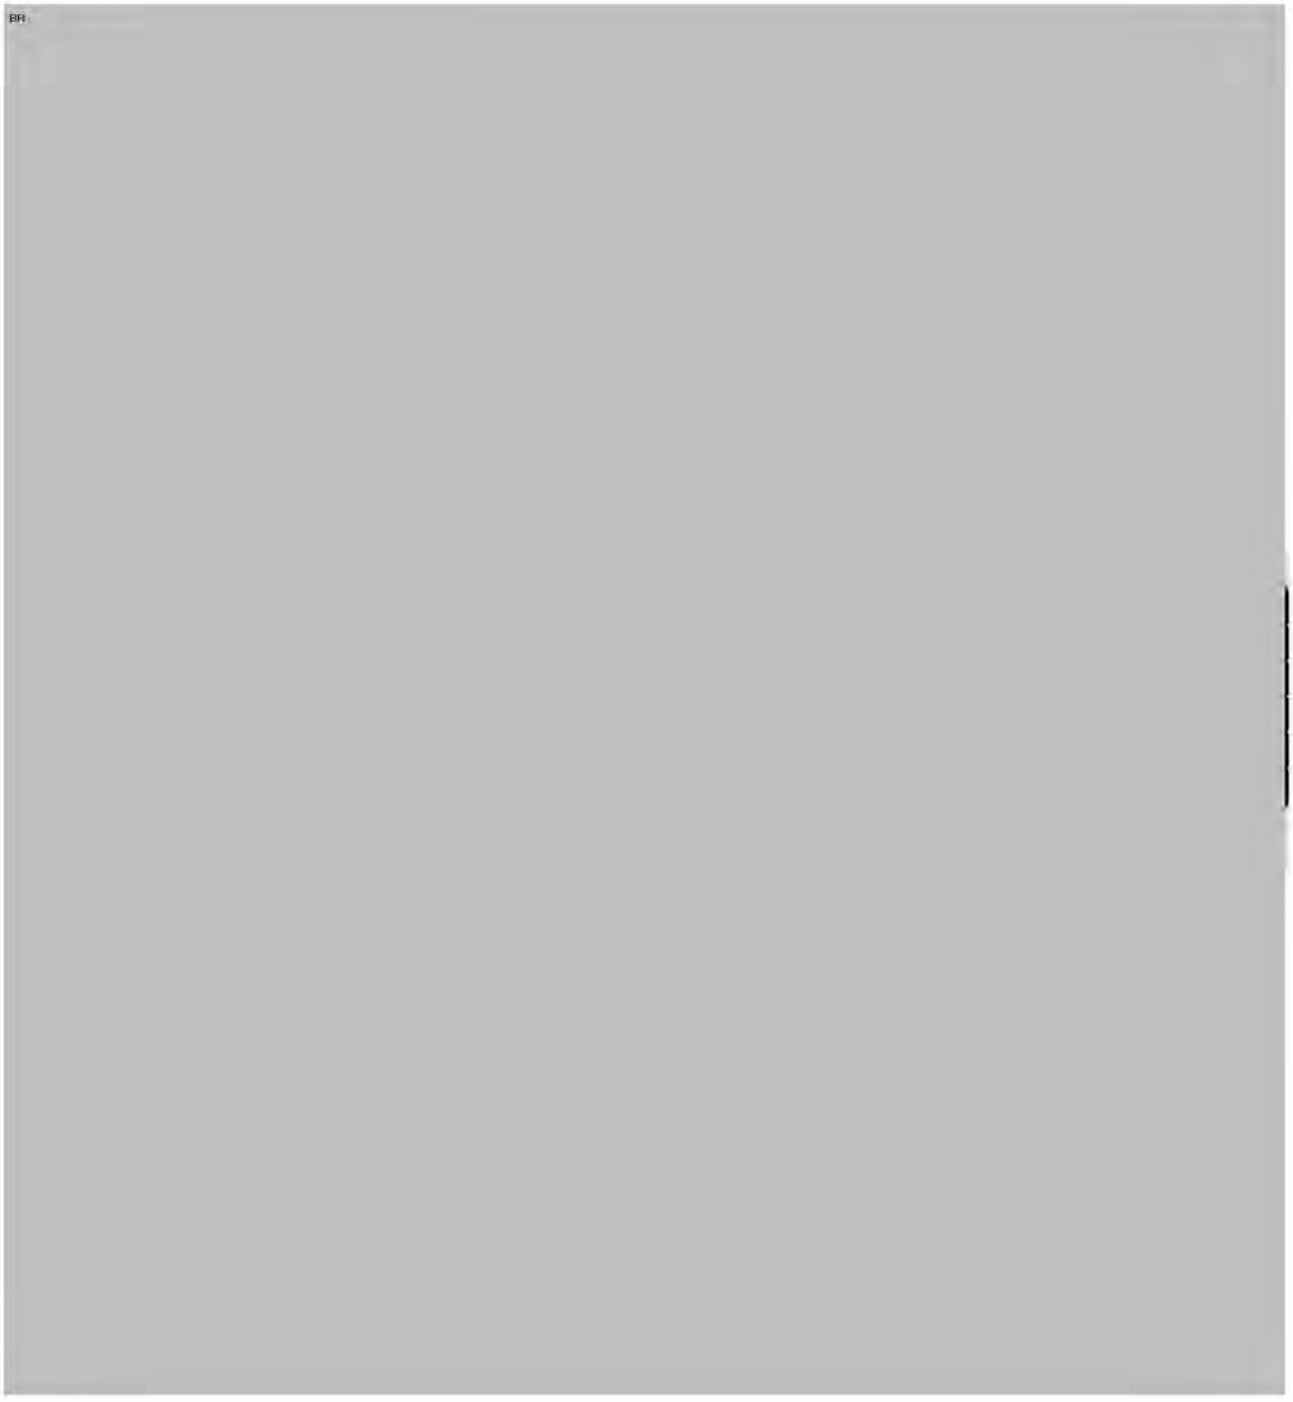
BR

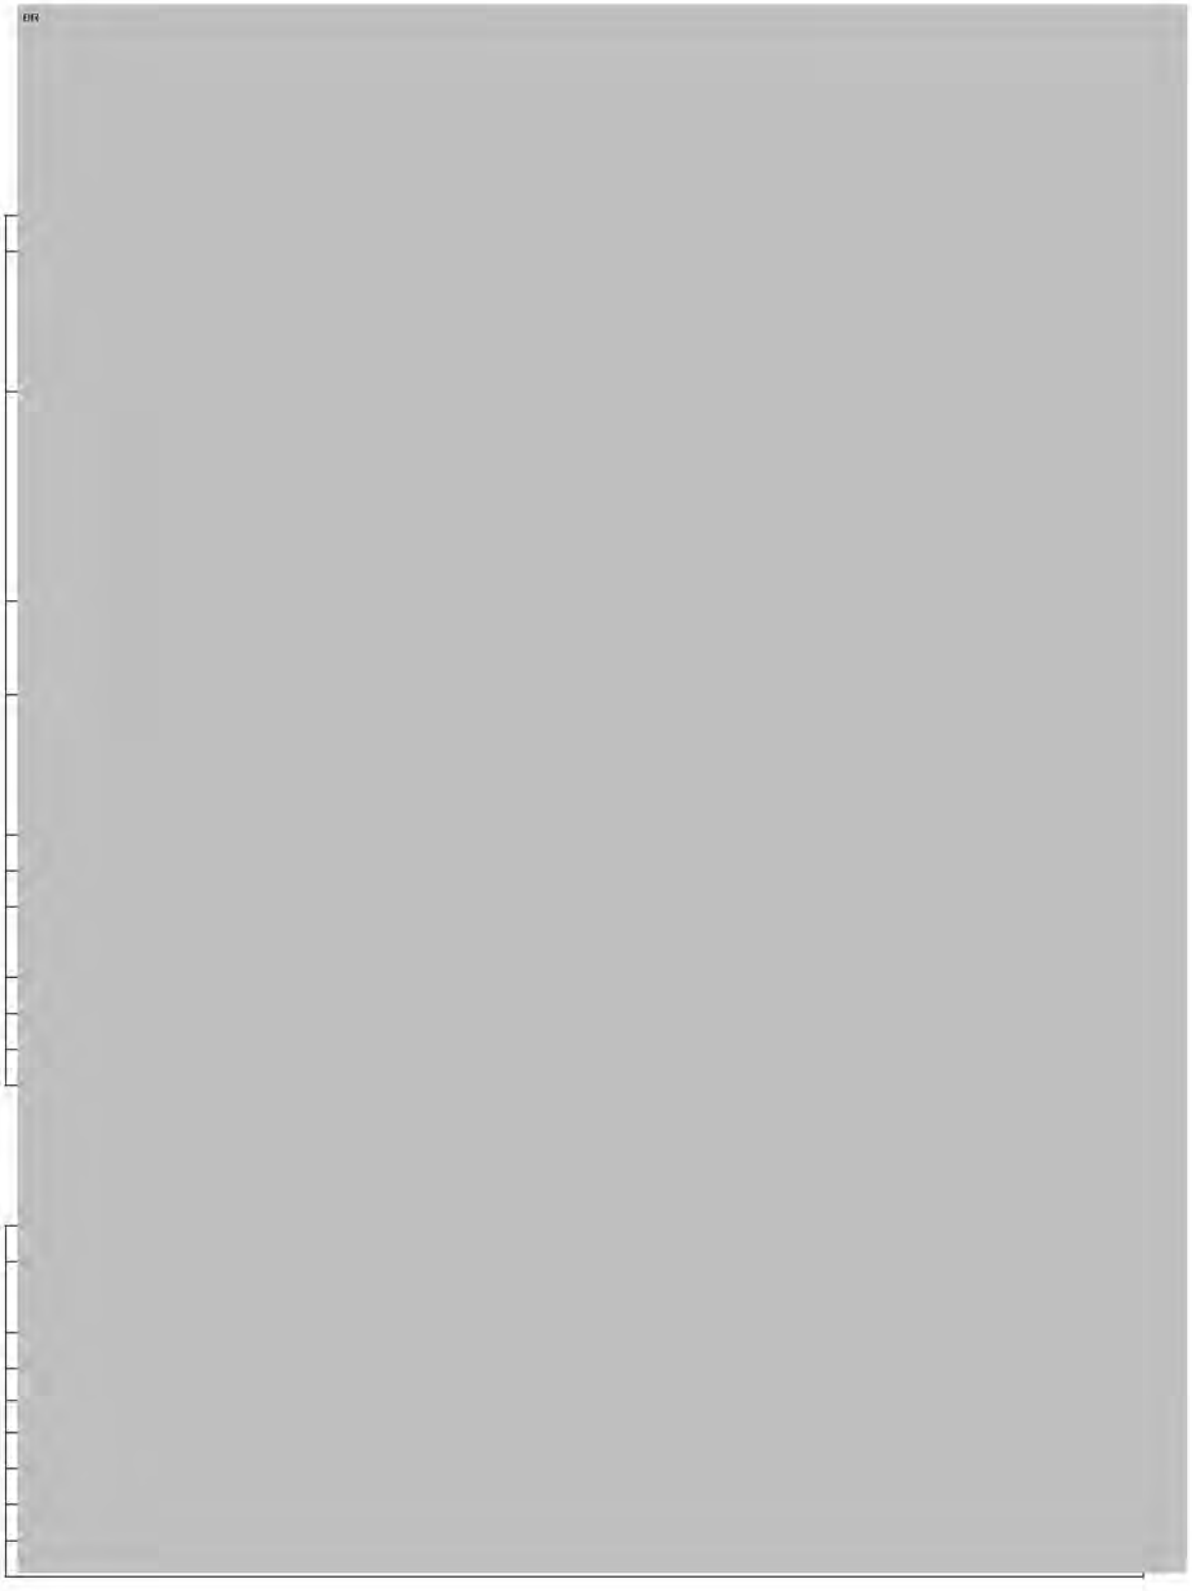

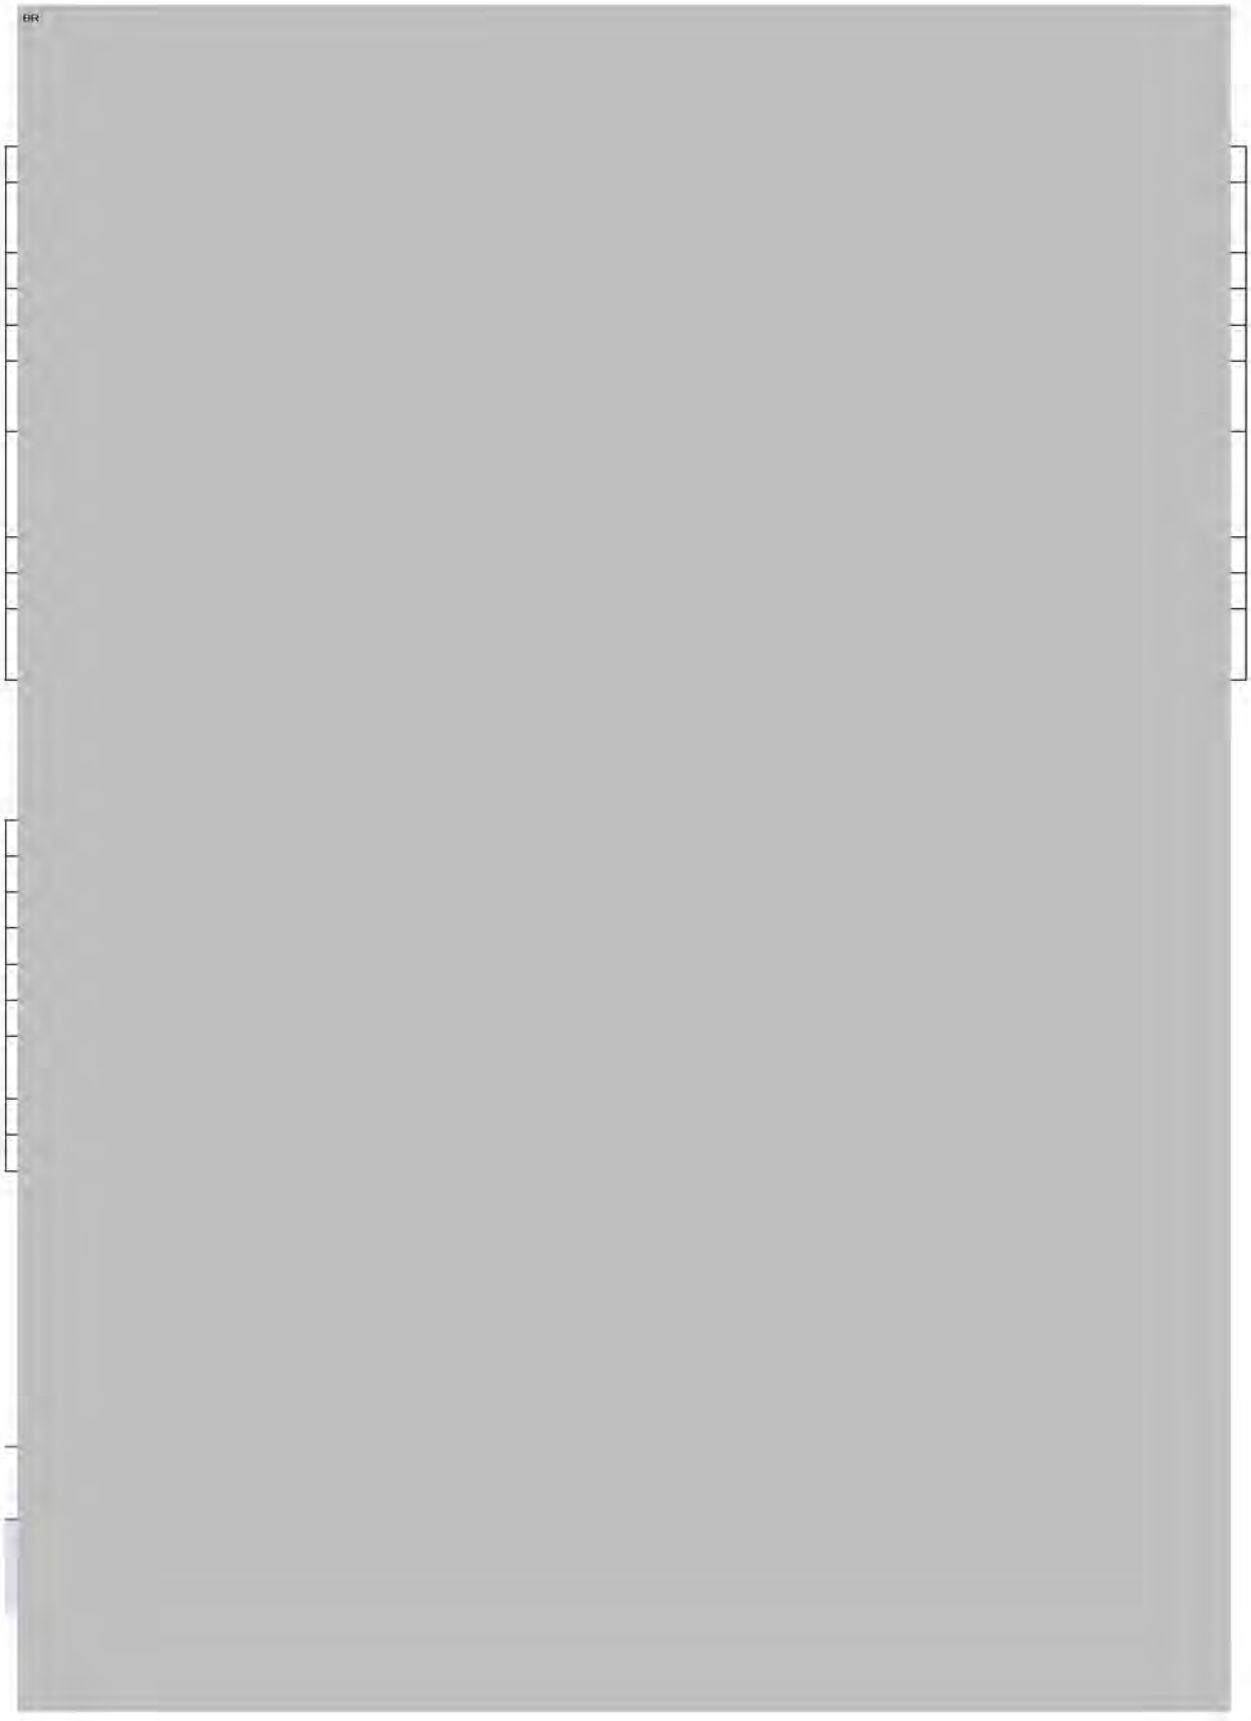

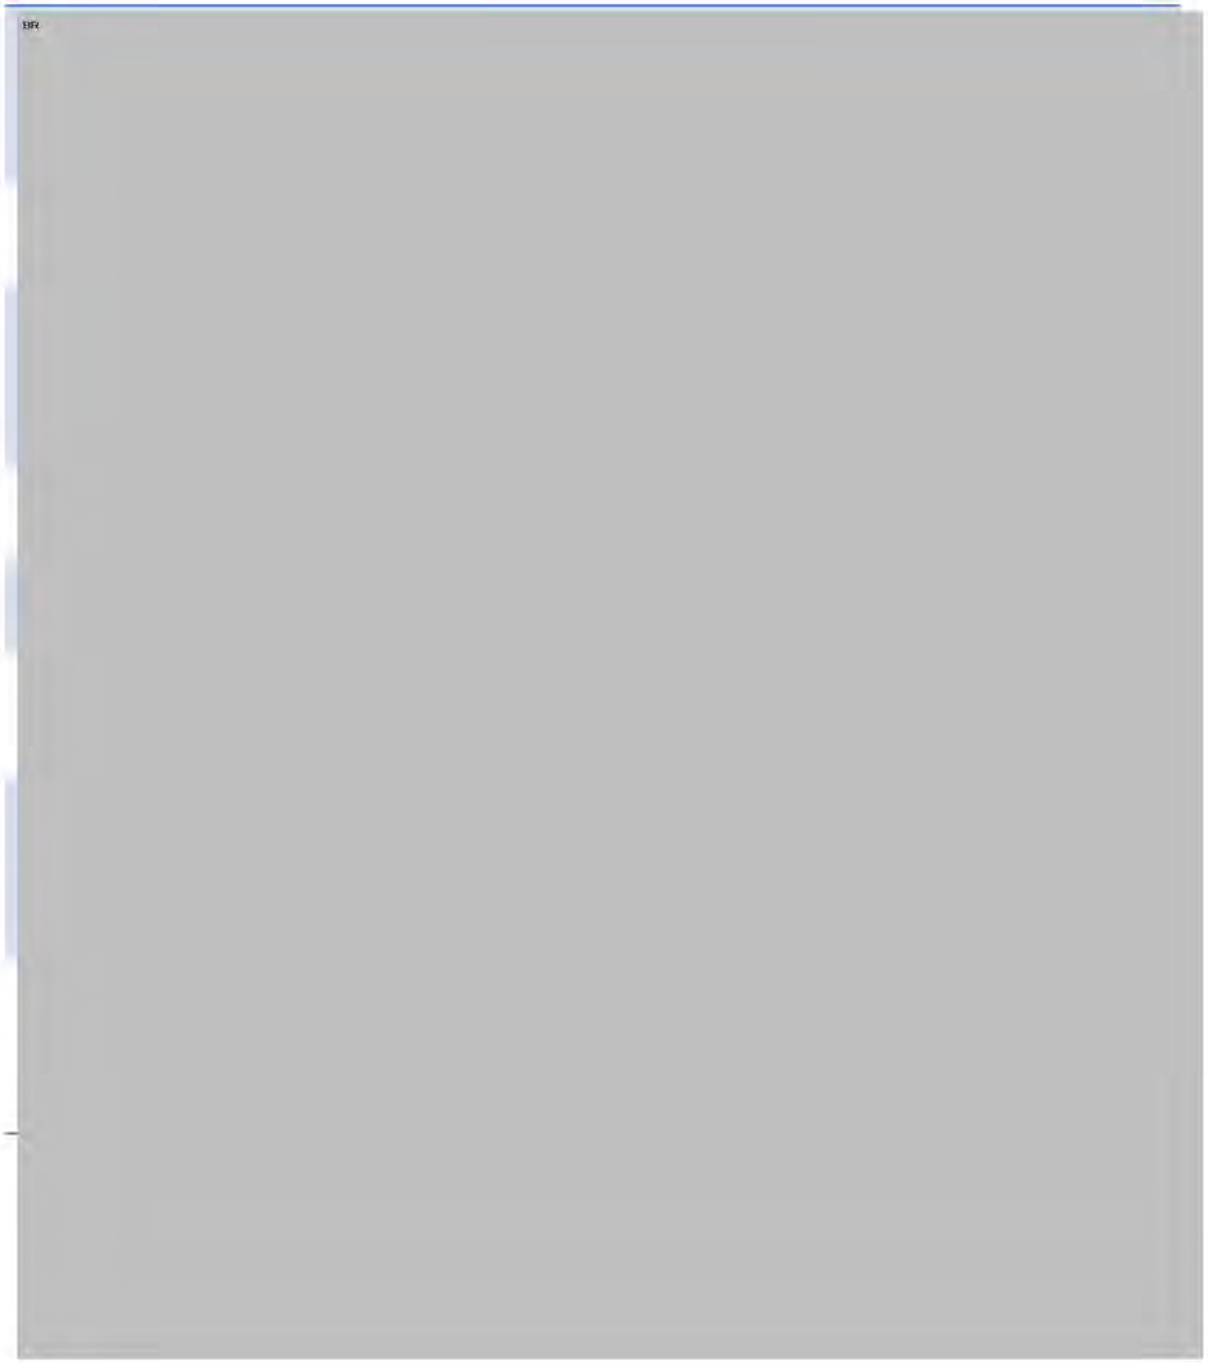

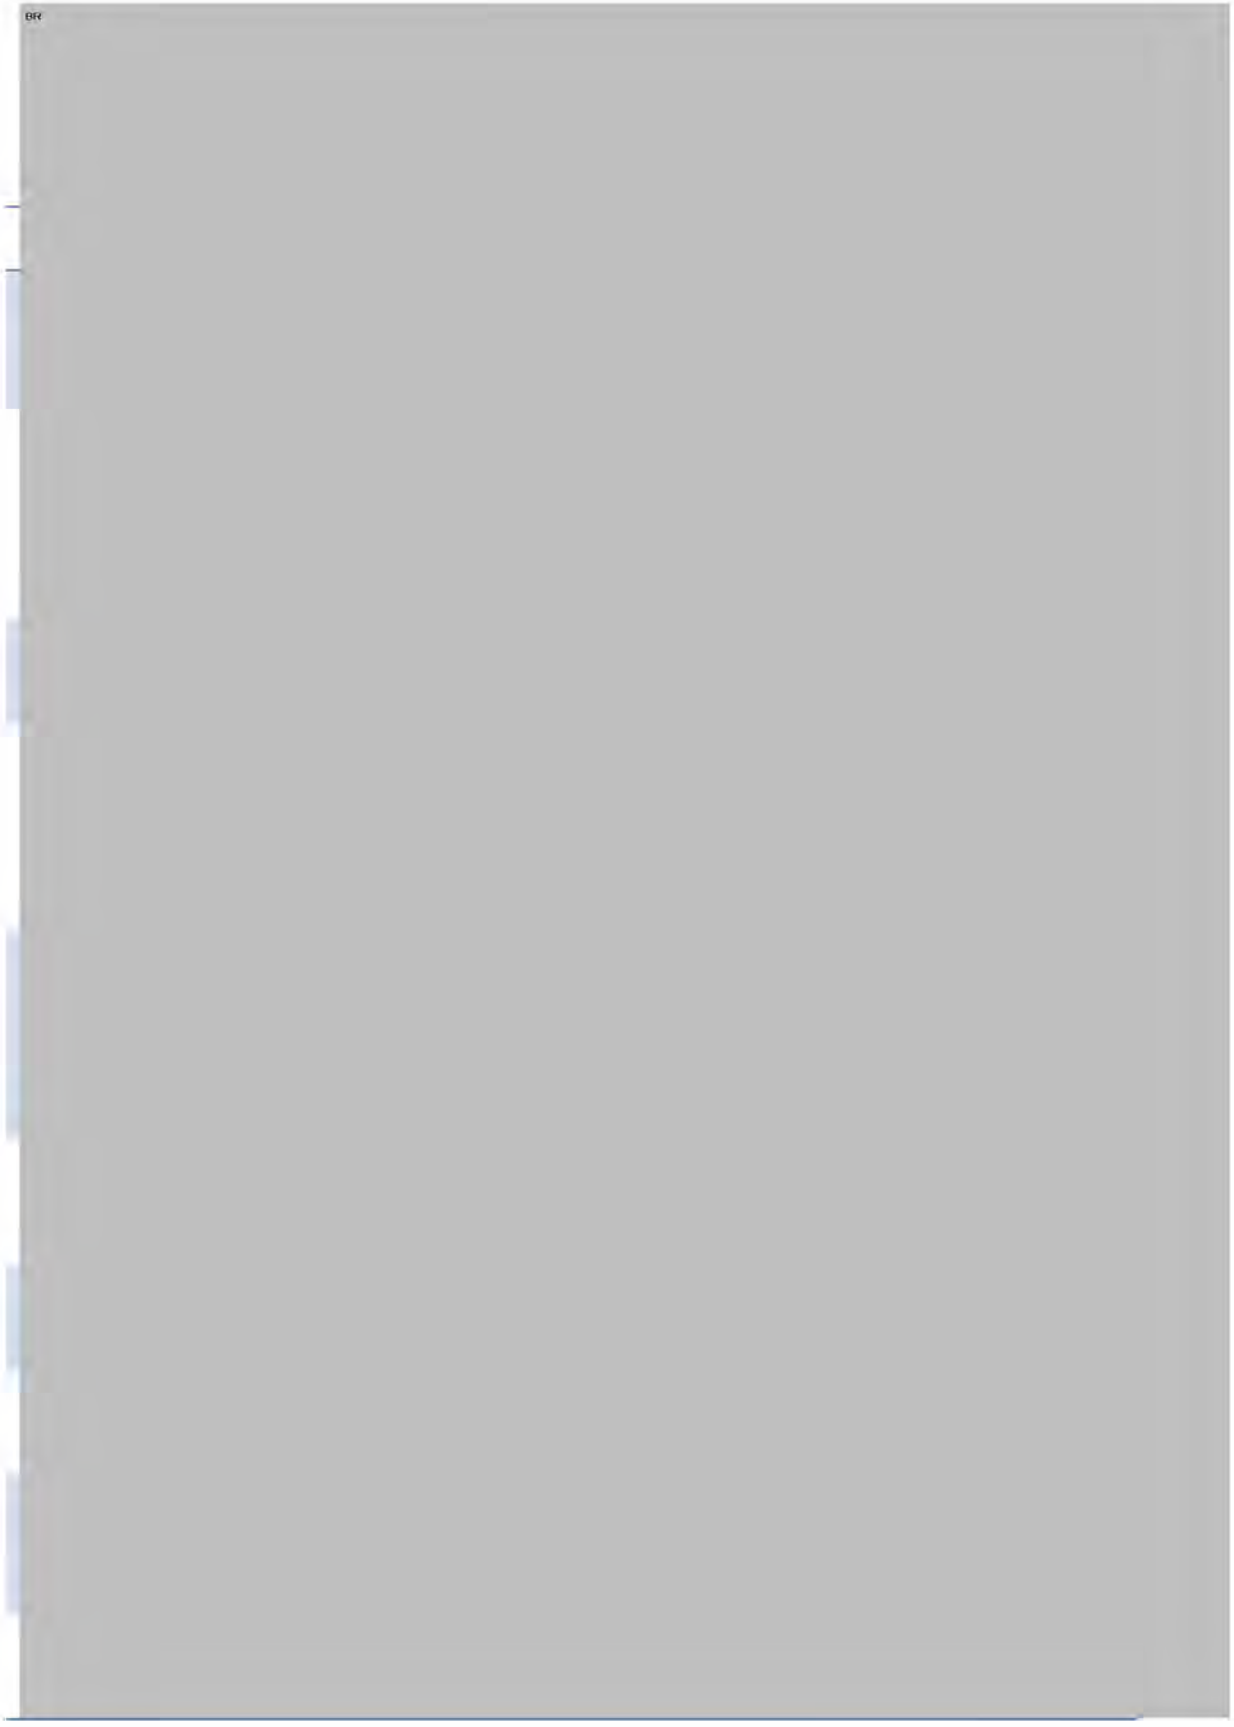
BR

BR

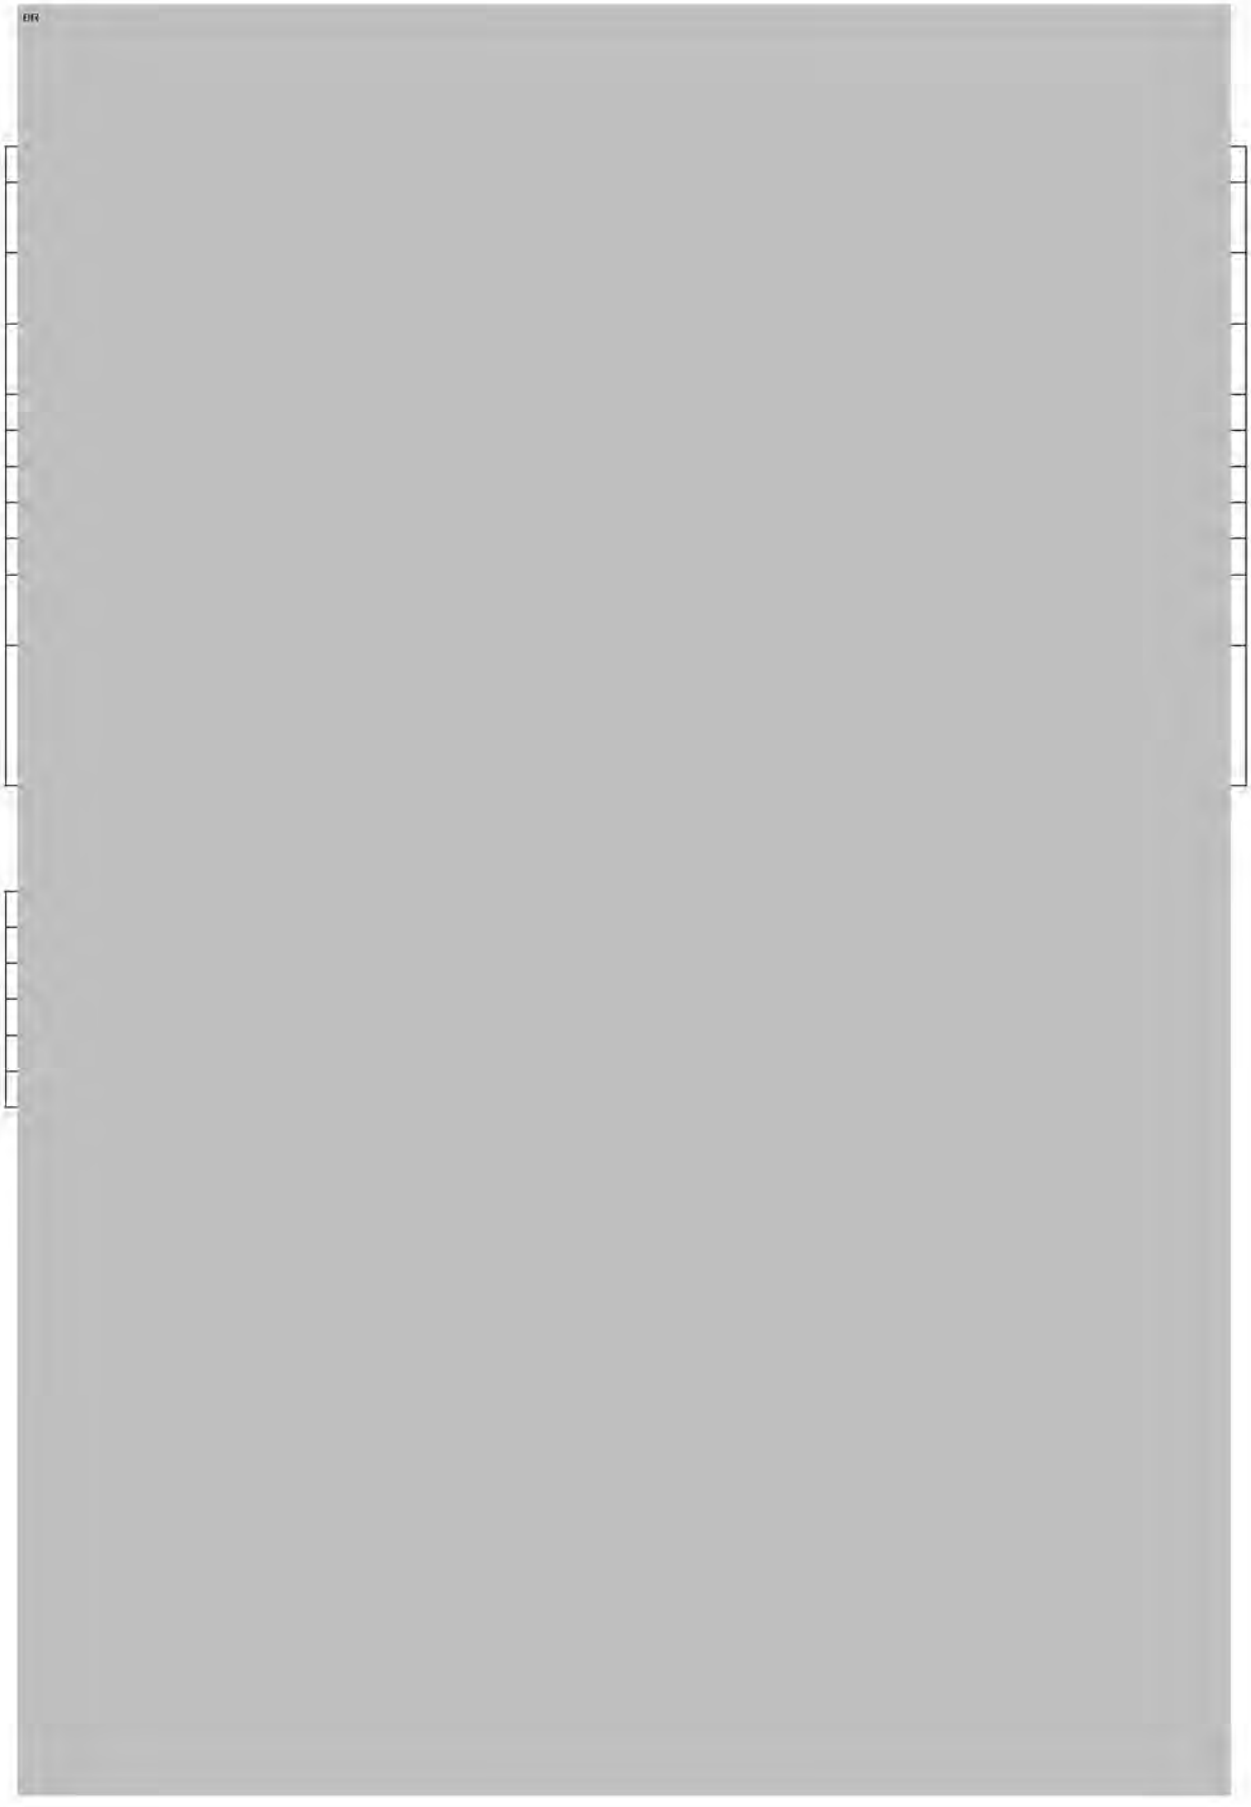

BR

# 6 Bijlage: Uitvoeringsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen uitvoering**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM REFERENTIE-PLANNING (REVISIE C) | MIJLPAAL-DATUM PER 31 MRT 2018 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-PLANNING (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 9-jan-20 | 8 | Gevolg van lagere gemiddelde boorsnelheid bij opstarten boorproces. |

* positief = weken achterstand, negatief = weken voorsprong

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

BR

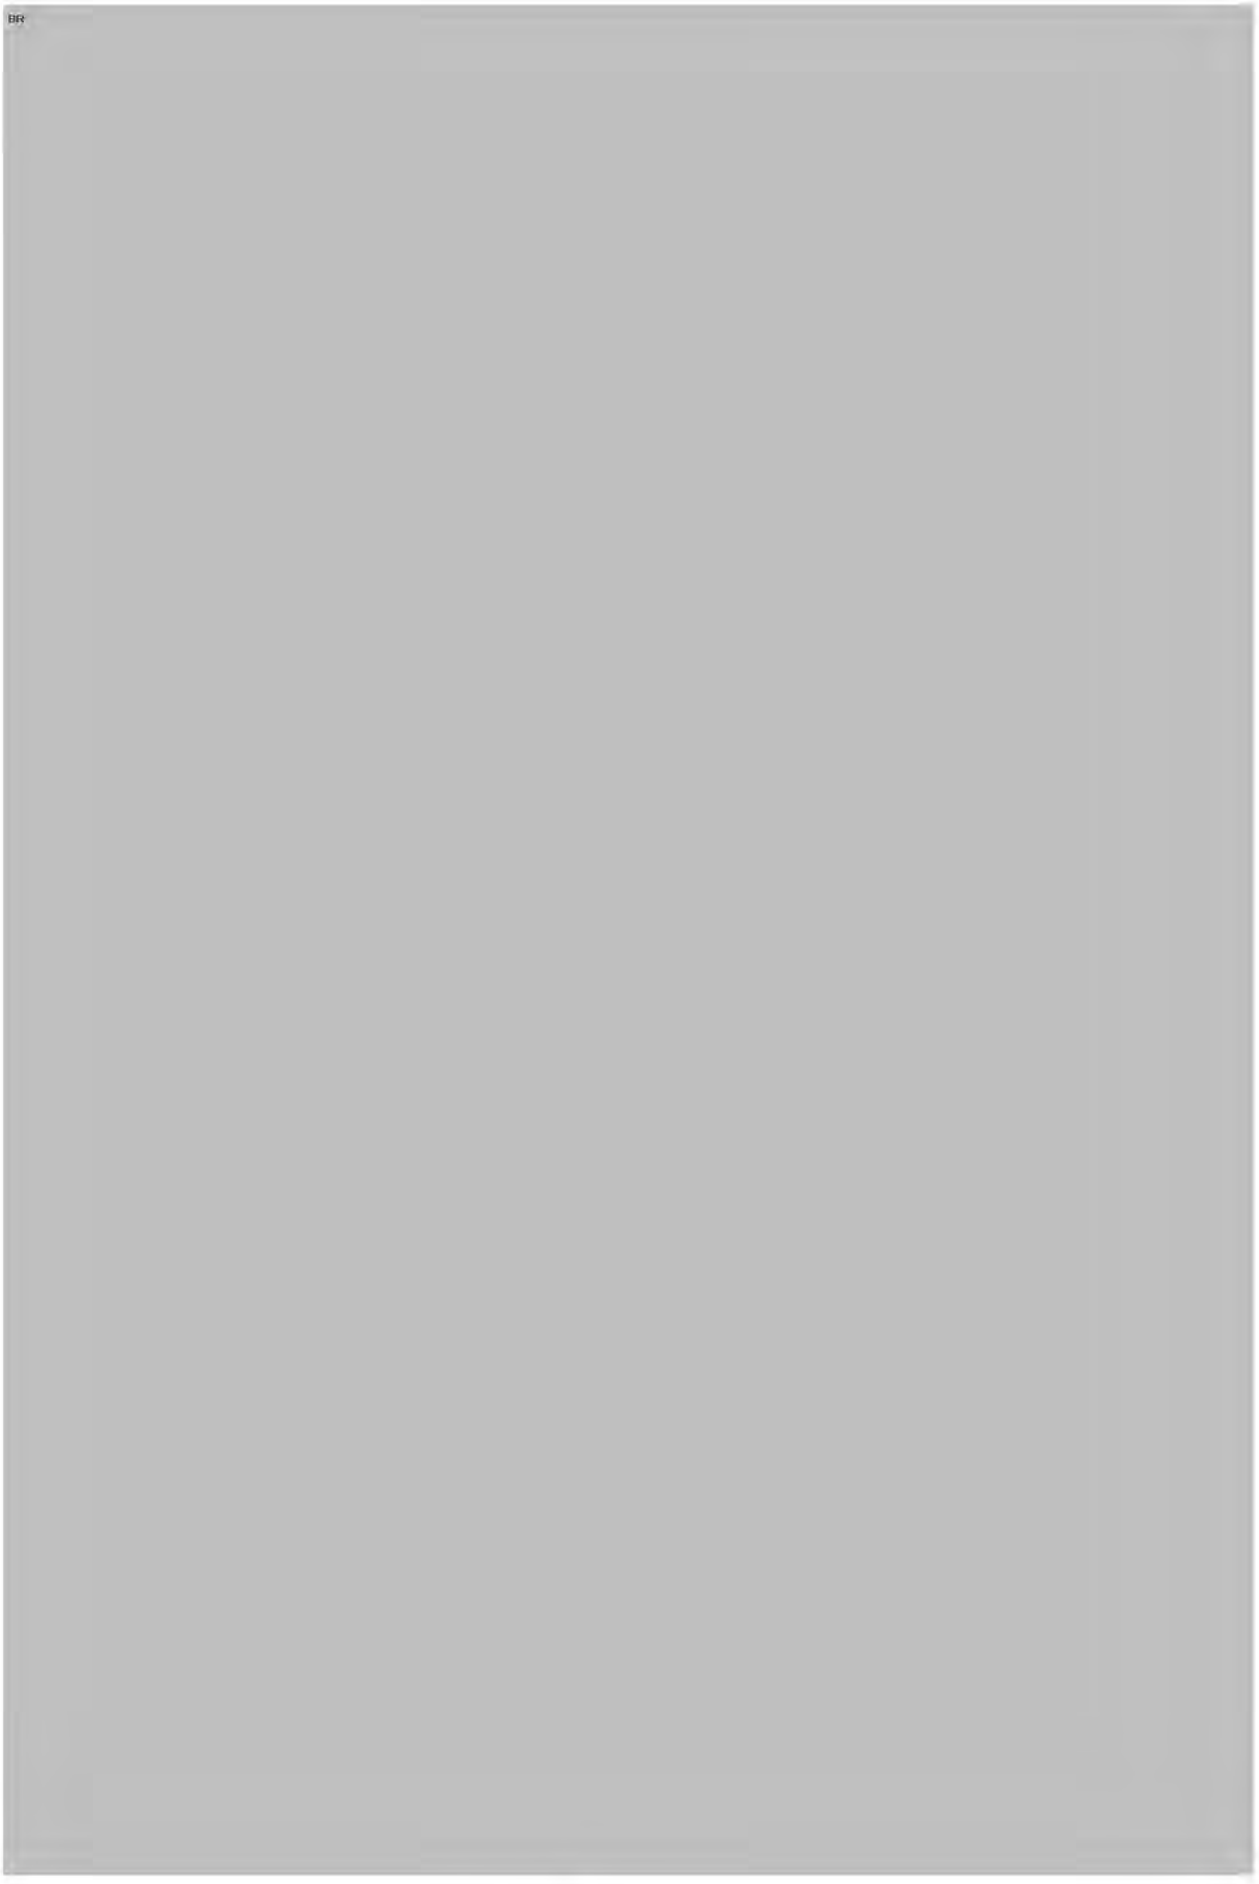
BR

5.1.2.e

5.1.2.e

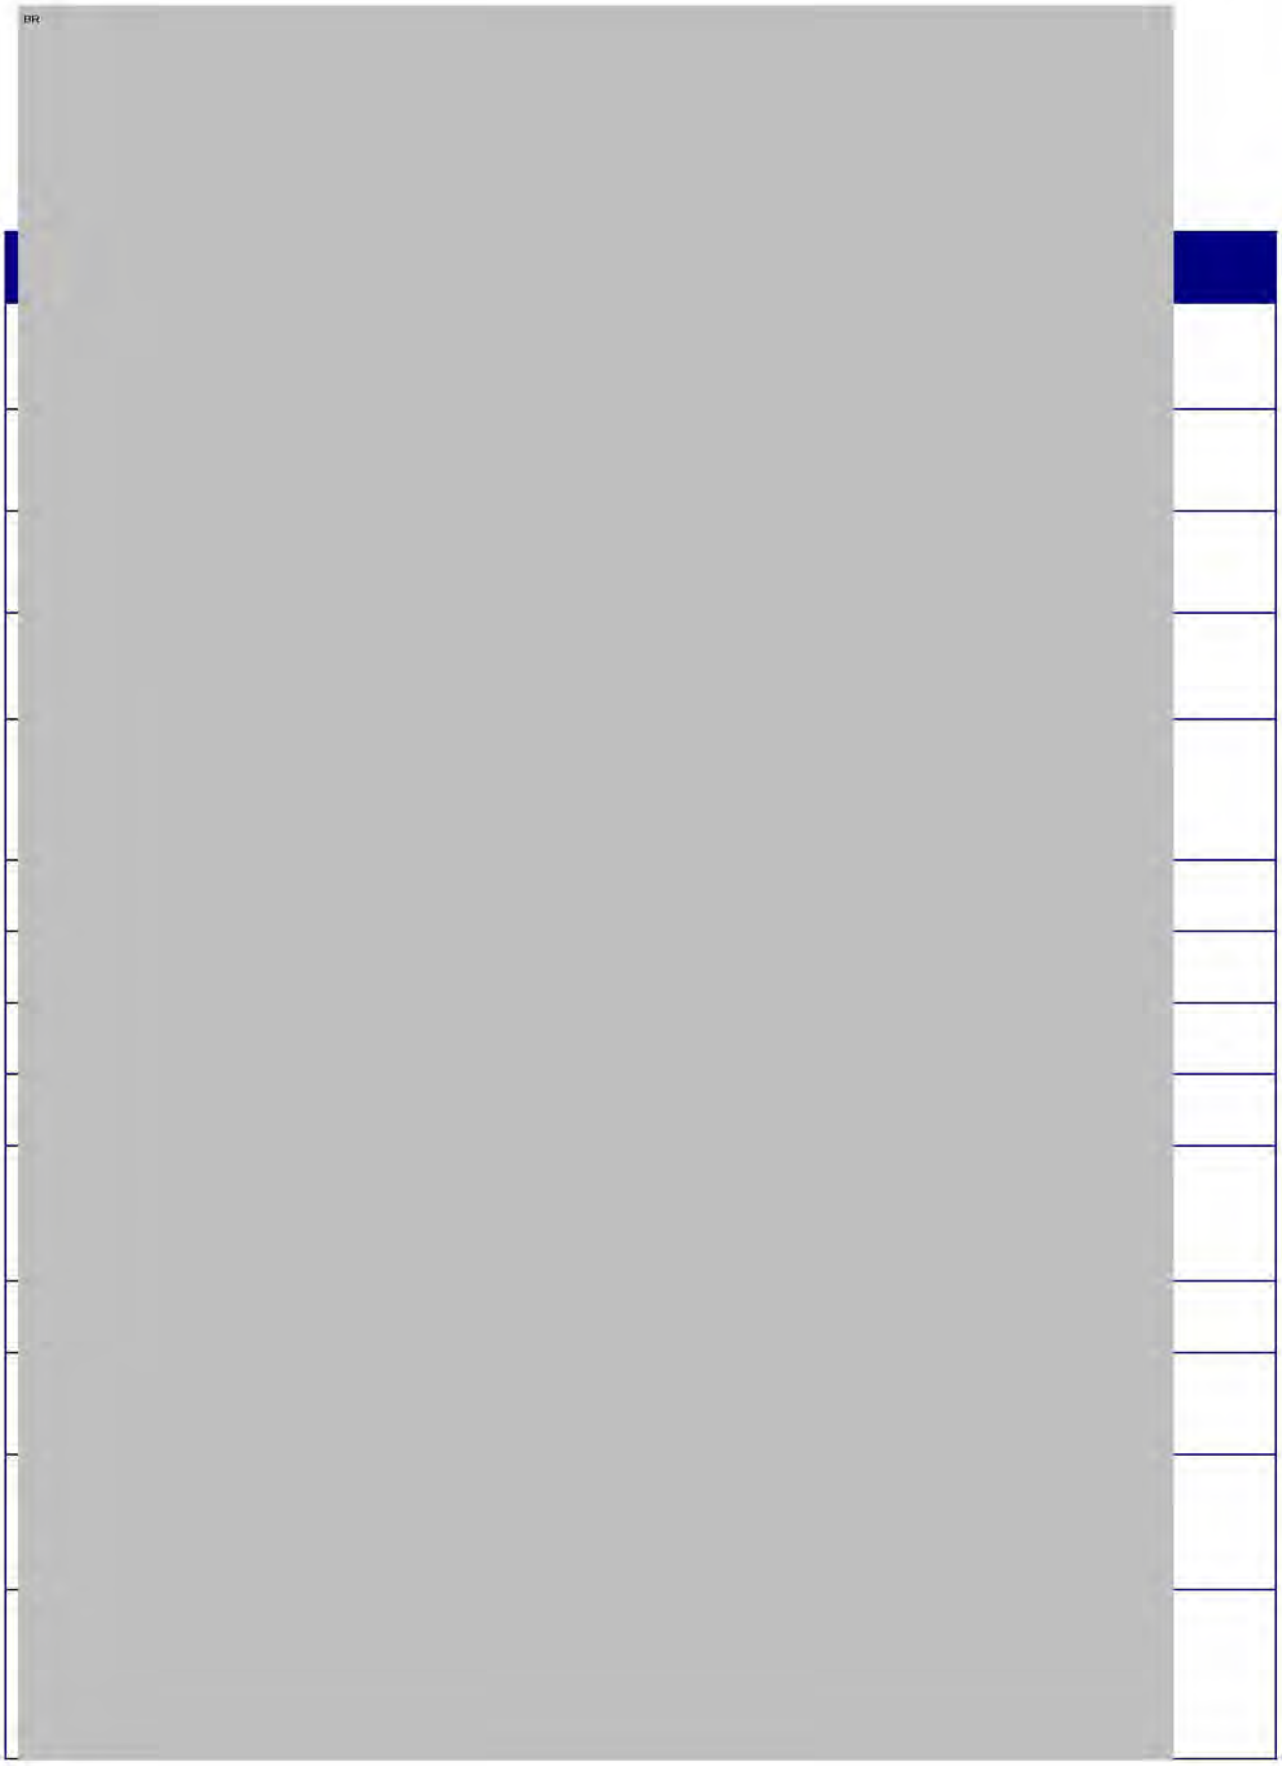

BR

Docnr18

Docnr18



Docnr19

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 2e kwartaal 2018

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 29 augustus 2018**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

Docnr19

Docnr19



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 2e kwartaal 2018
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004456

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>6 juli 2018 | Versie 0.1<br>10 juli 2018 | Versie 1.0<br>18 juli 2018 | Versie 2.0<br>29 aug 2018 | Versie 2.0<br>7 sept 2018 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr19



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

*1.1 Financiën* 6

*1.2 Planning* 7

*1.3 Risico's* 7

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* 8
2.1.1 Afgelopen kwartaal 8
2.1.2 Komende kwartaal 8

*2.2 Planologie en Vergunningen* 9
2.2.1 Afgelopen kwartaal 9
2.2.2 Komende kwartaal 9

*2.3 Verwervingen* 10
2.3.1 Afgelopen kwartaal 10
2.3.2 Komende kwartaal 10

*2.4 Overeenkomsten* 11
2.4.1 Afgelopen kwartaal 11
2.4.2 Komende kwartaal 11

*2.5 Communicatie* 12
2.5.1 Afgelopen kwartaal 12
2.5.2 Komende kwartaal 13
2.5.3 Diversen 13

3 Projectvoortgang 14

*3.1 Aanbesteden en contracteren* 14
3.1.1 Afgelopen kwartaal 14
3.1.2 Komende kwartaal 14

*3.2 Vormgeving* 15
3.2.1 Afgelopen kwartaal 15
3.2.2 Komende kwartaal 15

*3.3 Monitoring* 16
3.3.1 Afgelopen kwartaal 16
3.3.2 Komende kwartaal 16

*3.4 Inpassing Binckhorst* 17
3.4.1 Afgelopen kwartaal 17
3.4.2 Komende kwartaal 17

*3.5 Inpassing Vlietzone* 19
3.5.1 Afgelopen kwartaal 19
3.5.2 Komende kwartaal 19

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* 21
3.6.1 Afgelopen kwartaal 21
3.6.2 Komende kwartaal 21

*3.7 Boortunnel en toeritten* 23

Docnr19




3.7.1 Afgelopen kwartaal 23
3.7.2 Komende kwartaal 24

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *25*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 25
3.8.2 Komende kwartaal 26

*3.9 Installaties* *27*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 27
3.9.2 Komende kwartaal 27

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *28*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 28
3.10.2 Komende kwartaal 28

*3.11 Bediencentrale* *29*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 29
3.11.2 Komende kwartaal 30

*3.12 Uitvoeringskwaliteit* *31*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 31
3.12.2 Komende kwartaal 31

*3.13 Contractmanagement* *32*
3.13.1 Afgelopen kwartaal 32
3.13.2 Komende kwartaal 32

**4 Overdracht en openstelling** **33**

*4.1 Tunnelveiligheid* *33*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 33
4.1.2 Komende kwartaal 33

*4.2 Overdracht aan beheerders* *34*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 34
4.2.2 Komende kwartaal 34

*4.3 Beheer en onderhoud* *35*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 35
4.3.2 Komende kwartaal 35

**5 Projectbeheersing** **36**

*5.1 Scope* *36*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 36
5.1.2 Komende kwartaal 36

*5.2 Financien* *37*
5.2.1 Kostenstructuur 37
5.2.2 Dekkingen 38

*5.3 Planning* *40*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 40
5.3.2 Komende kwartaal 40

*5.4 Risico's* *41*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 41
5.4.2 Komende kwartaal 41
5.4.3 Financiële toprisico's 41

Docnr19



5.4.4 Toprisico's planning 42

*5.5 Interne kwaliteit* *44*

5.5.1 Afgelopen kwartaal 44

5.5.2 Komende kwartaal 44

*5.6 Informatiebeheer* *45*

5.6.1 Afgelopen kwartaal 45

5.6.2 Komende kwartaal 45

5.6.3 Kennisdeling 45

*5.7 Organisatie* *46*

5.7.1 Afgelopen kwartaal 46

5.7.2 Komende kwartaal 46

6 Bijlage: Planningsmijlpalen 47

7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 48

8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 50

# 1 Managementsamenvatting

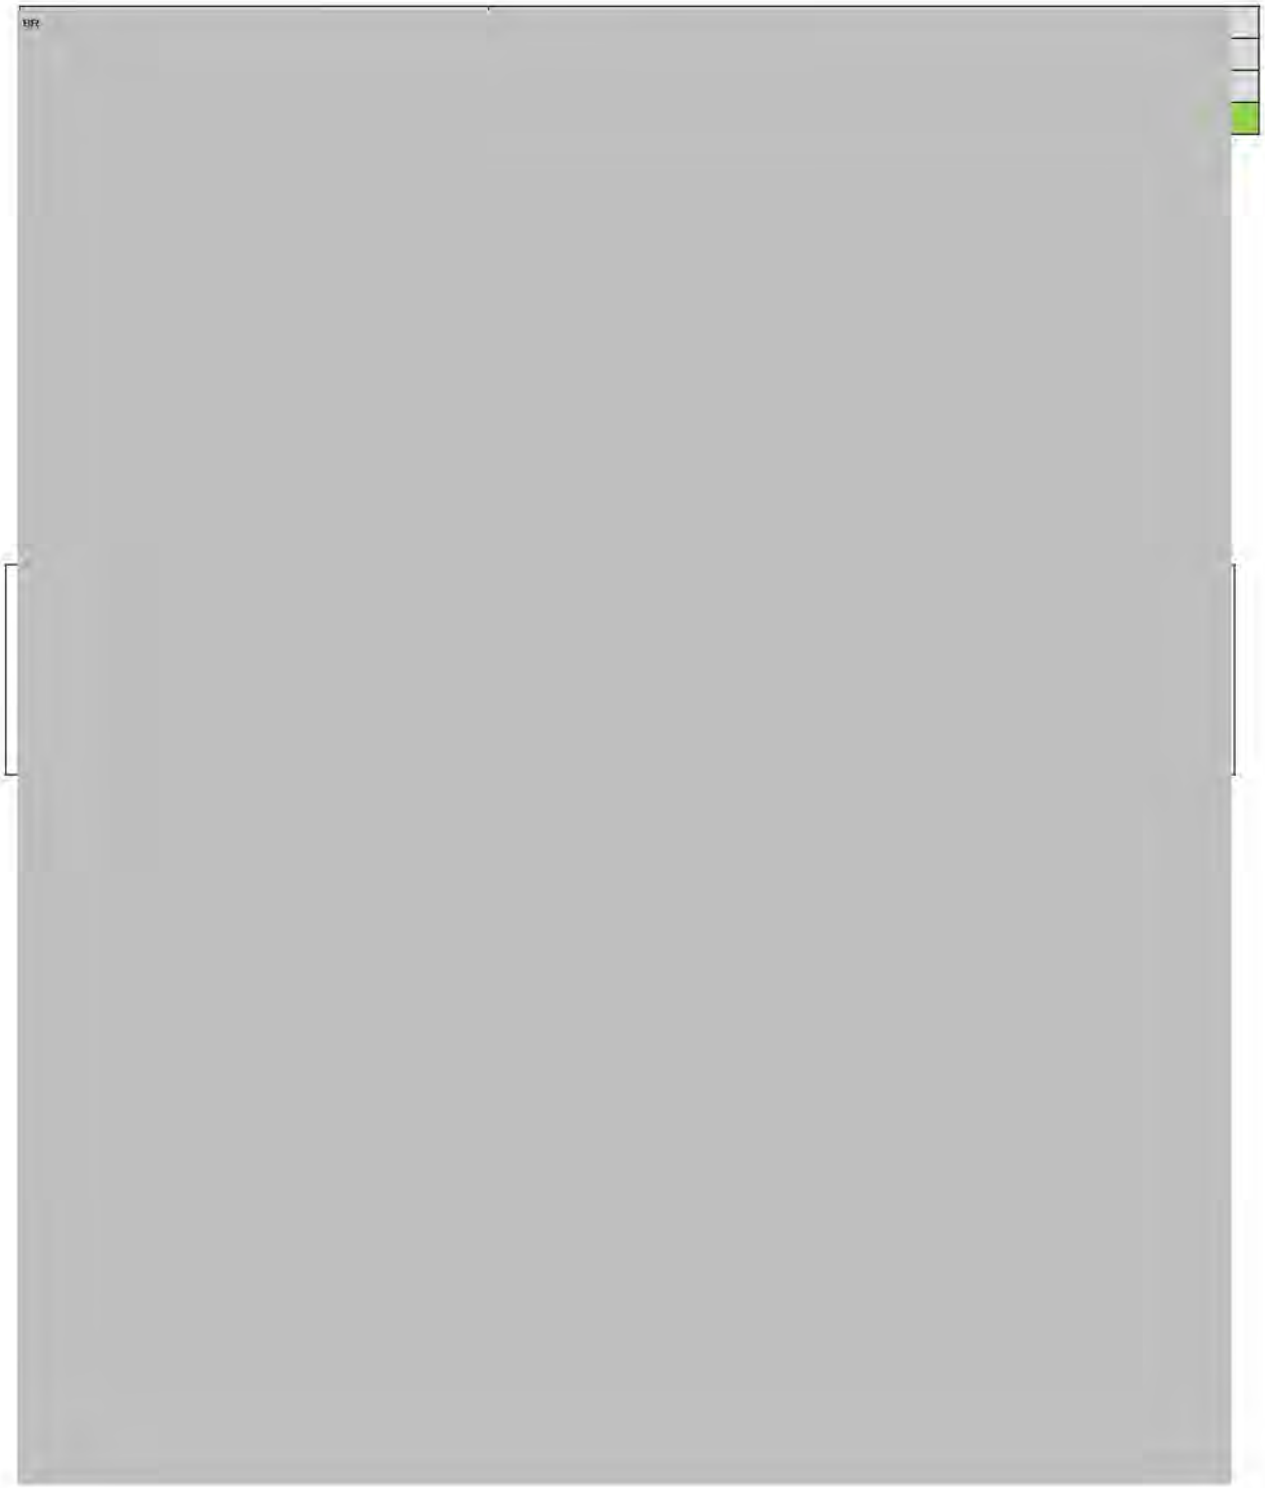

## 5. VERWACHTING KOMEND KWARTAAL

- Het Hoogheemraadschap van Delfland zal de projectplanprocedure starten ter realisatie van de tweede toevoer vanuit de Vliet naar het Molenvlietpark;

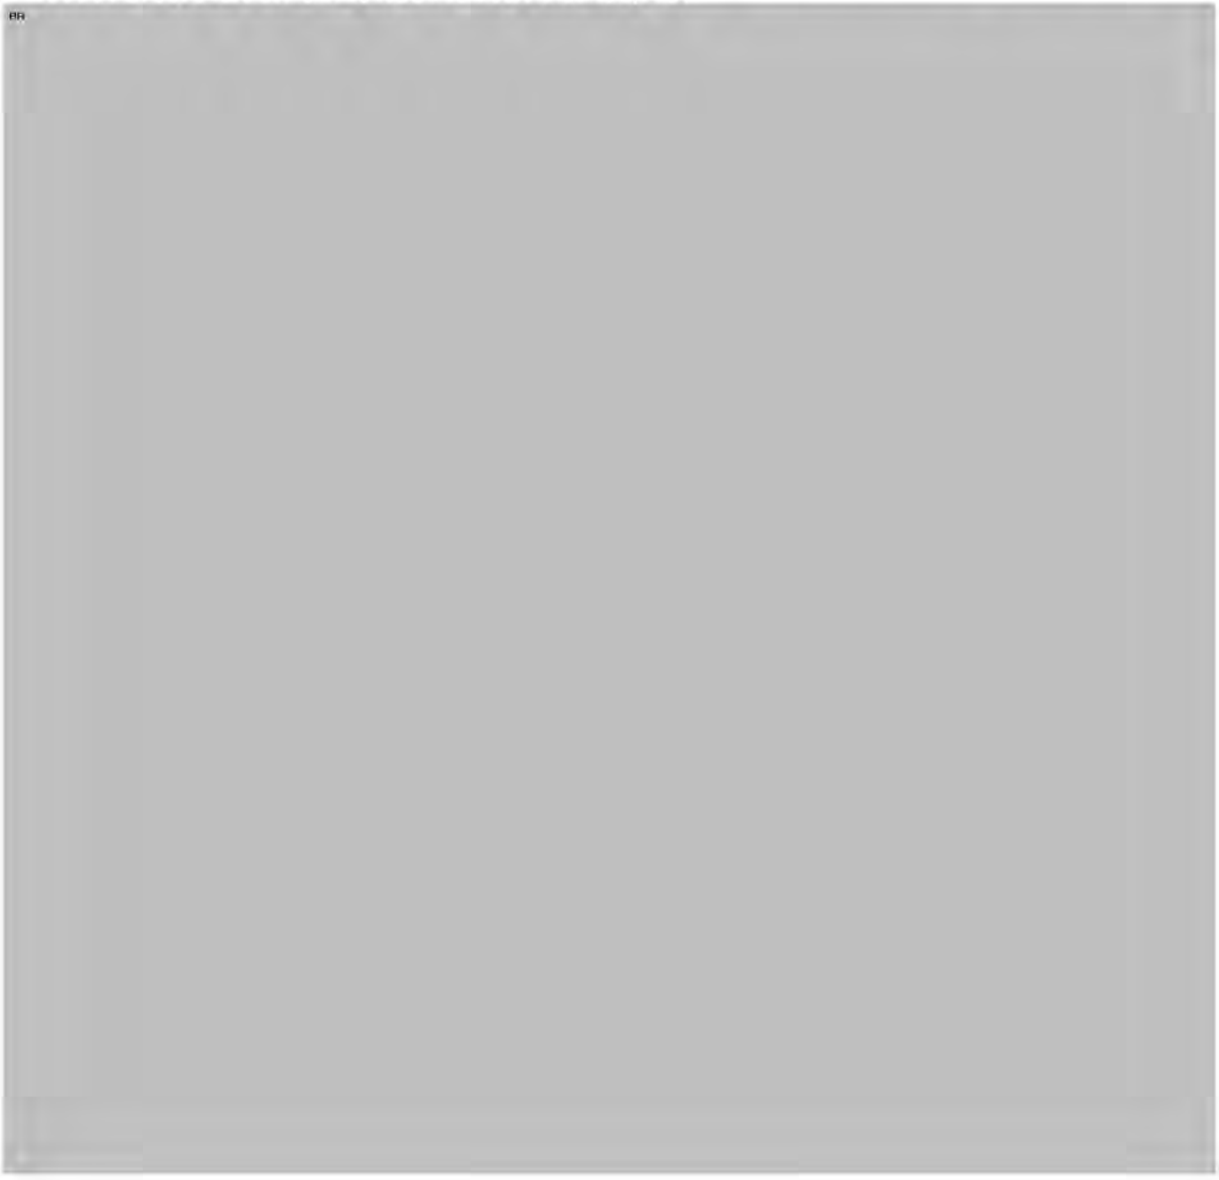

BR

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

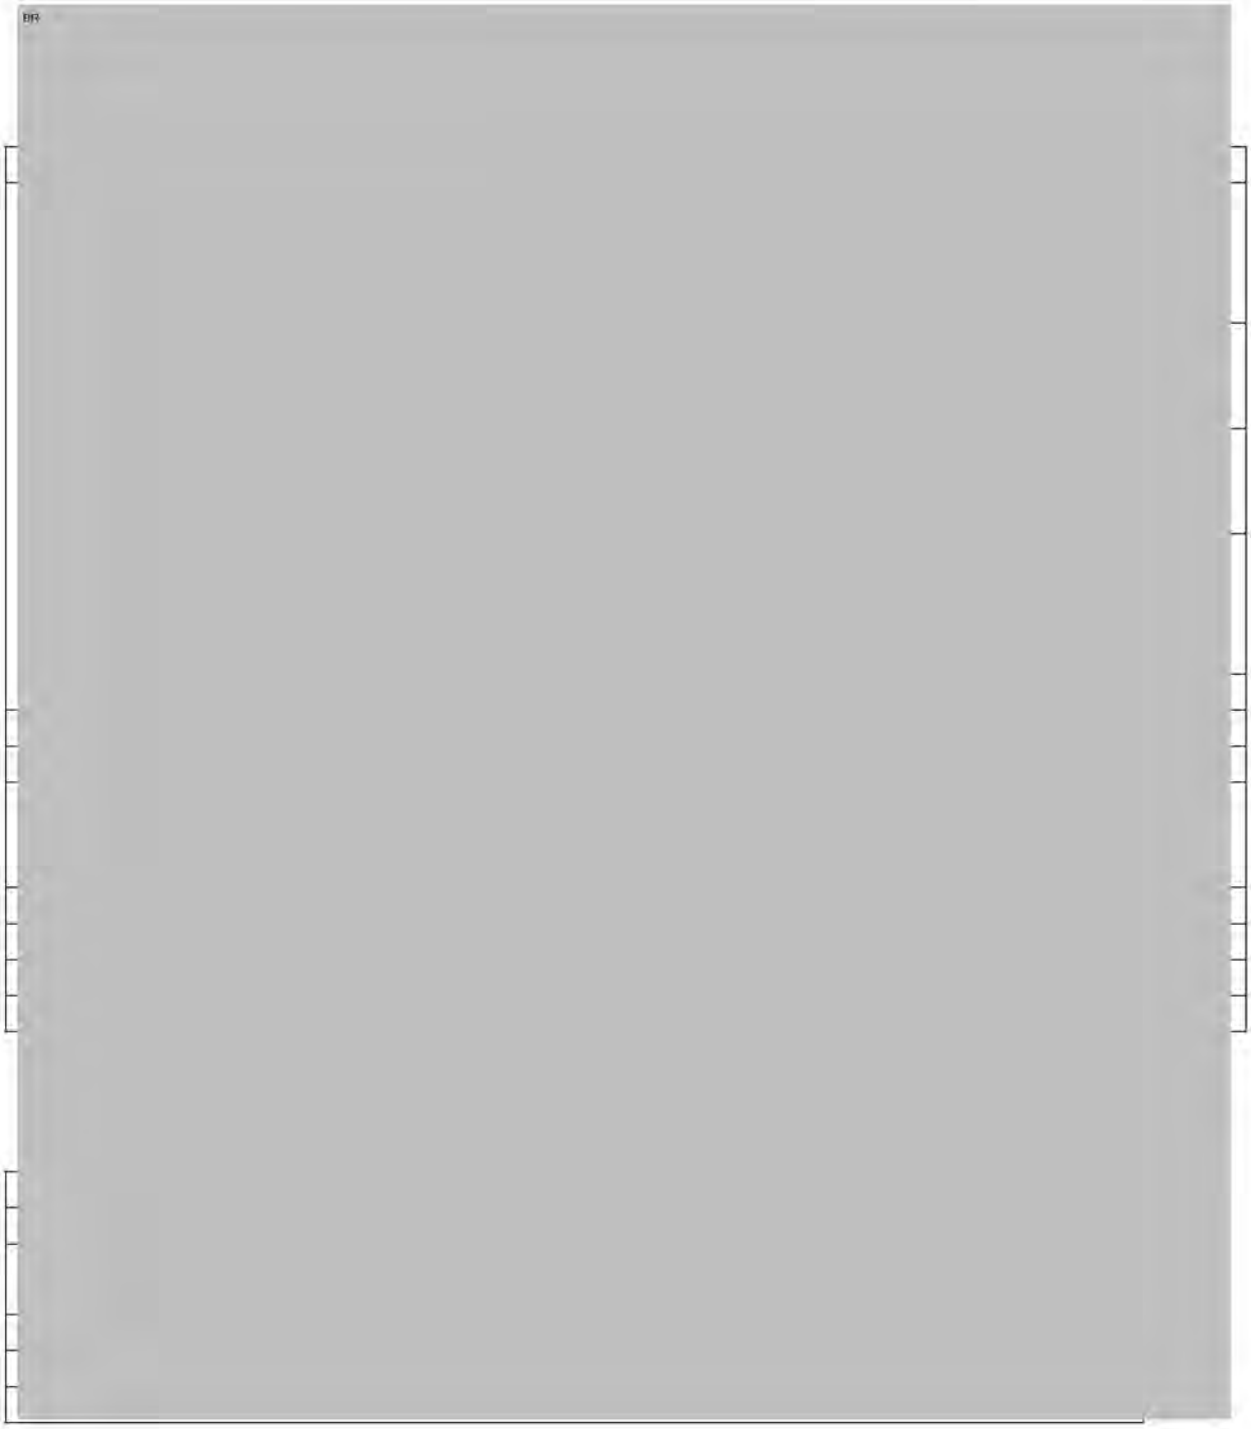

## 2.2 Planologie en Vergunningen

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Het Hoogheemraadschap van Delfland zal de projectplanprocedure starten ter realisatie van de tweede watertoevoer vanuit de Vliet naar het bergingsgebied in het Molenvlietpark. | Het Hoogheemraadschap van Delfland zal na de zomer de projectplanprocedure starten. De projectorganisatie Rotterdamsebaan zal in juli 2018 de kapvergunning ten behoeve van de aanleg van de tweede watertoevoer aanvragen. |
| [redacted] | |

### 2.2.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| [redacted] |
| Faciliteren van de projectplanprocedure van het Hoogheemraadschap van Delfland voor de tweede watertoevoer. |
| **Besluiten** |
| Geen |

## 2.3 Verwervingen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| |
|---|
| [redacted] |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** |
| [redacted] |
| In samenwerking met DSO/Grondzaken gesprekken gevoerd met de eigenaar van het pand aan de Jan Thijssenweg 8 te Den Haag t.b.v. grondverkoop t.b.v. landschappelijke inpassing en afspraken omtrent o.a. verplaatsing inrit en aanleg drainage. |

| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
|---|---|
| Geen | Geen |

### 2.3.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
|---|
| [redacted] |
| Koopovereenkomst met voorwaarden opstellen t.b.v. eigenaar van het pand aan de Jan Thijssenweg 8 te Den Haag. |
| **Besluiten** |
| Geen |

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Samenwerkingsovereenkomst opstellen en formaliseren t.b.v. de tweede watertoevoer vanuit de Vliet naar het bergingsgebied in het Molenvlietpark. | DSO/Grondzaken en de projectorganisatie Rotterdamsebaan hebben gezamenlijk een concept Samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld en ter bespreking aan de grondeigenaren aangeboden. Hierop heeft een bespreking plaatsgevonden waarin is afgesproken dat beide partijen nadere studie doen naar diverse onderwerpen en de SOK wordt aangepast en aangevuld. |
| [redacted] | |

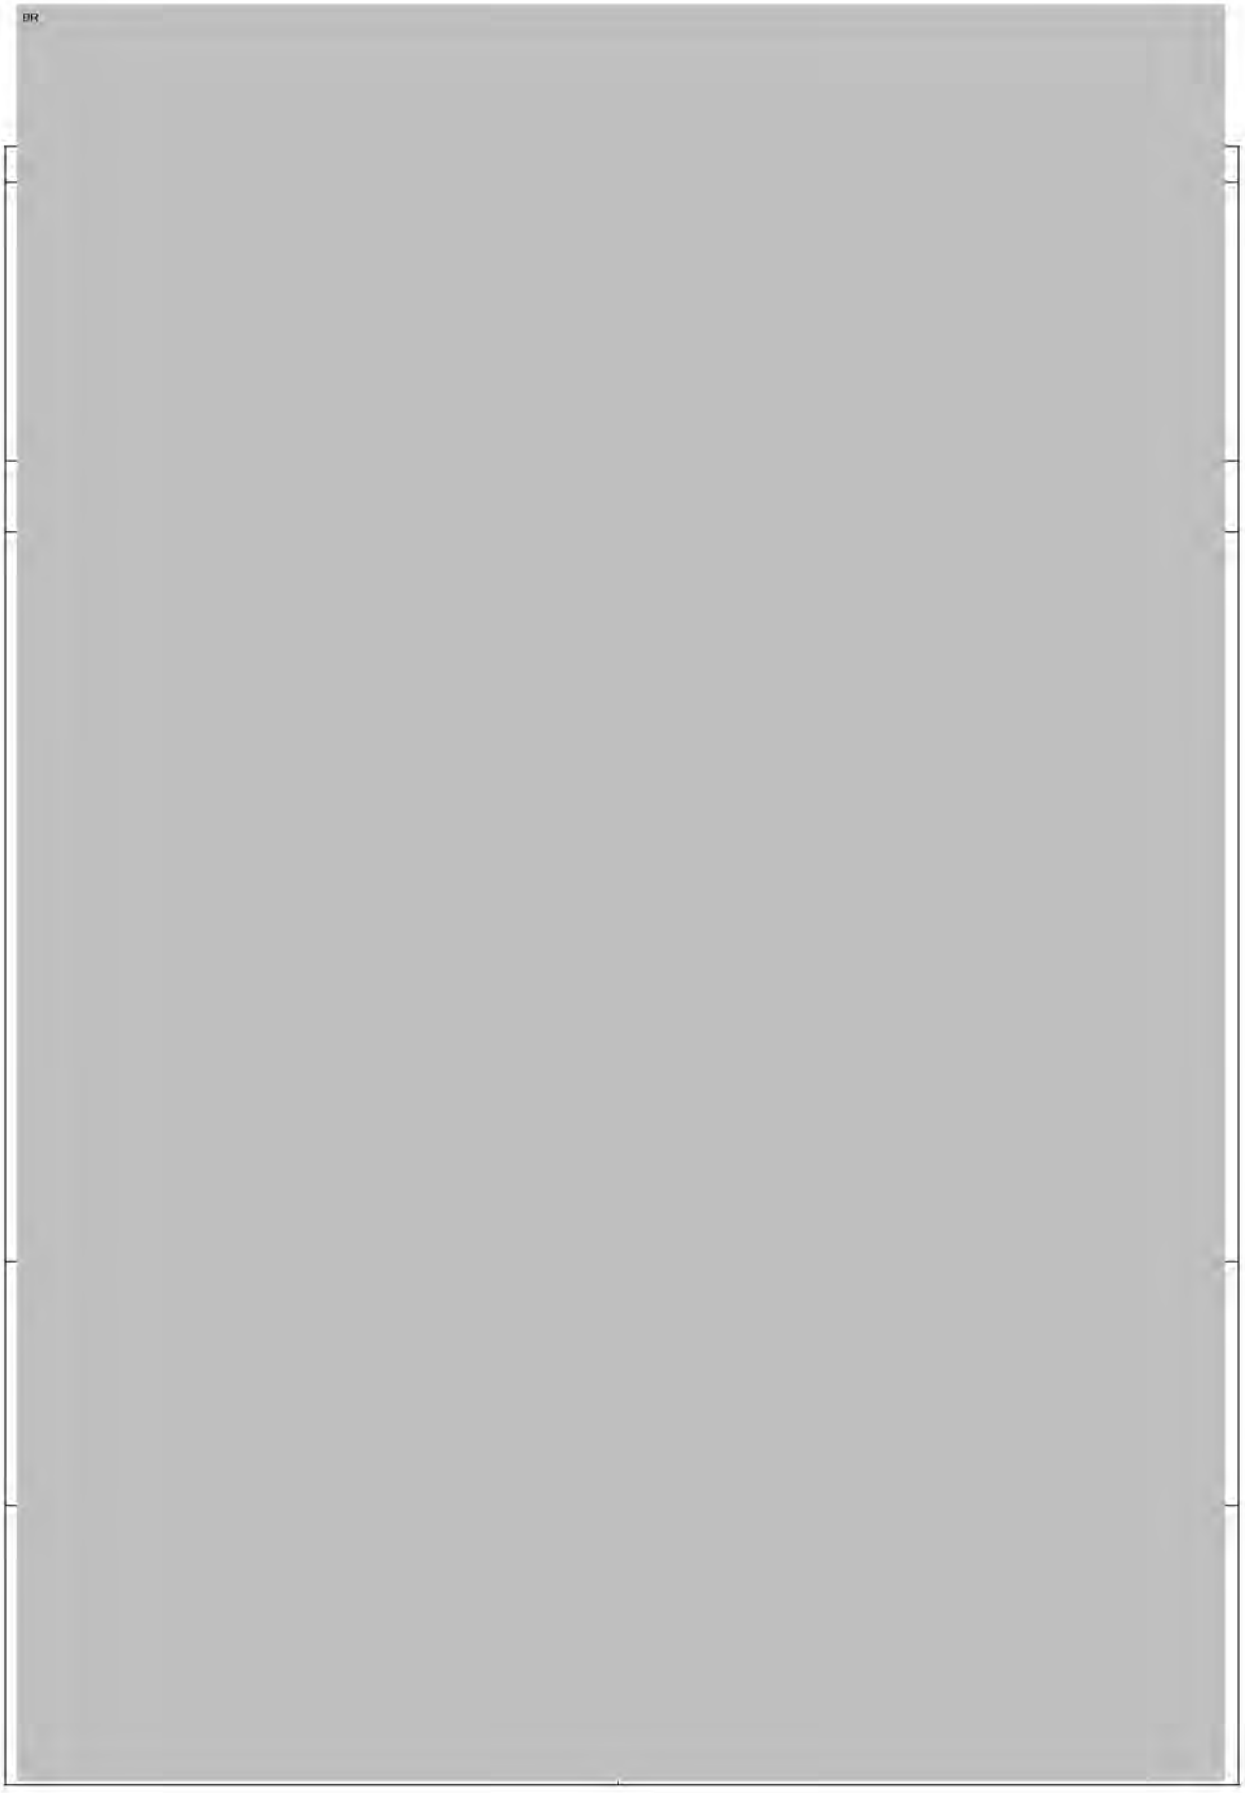
BR

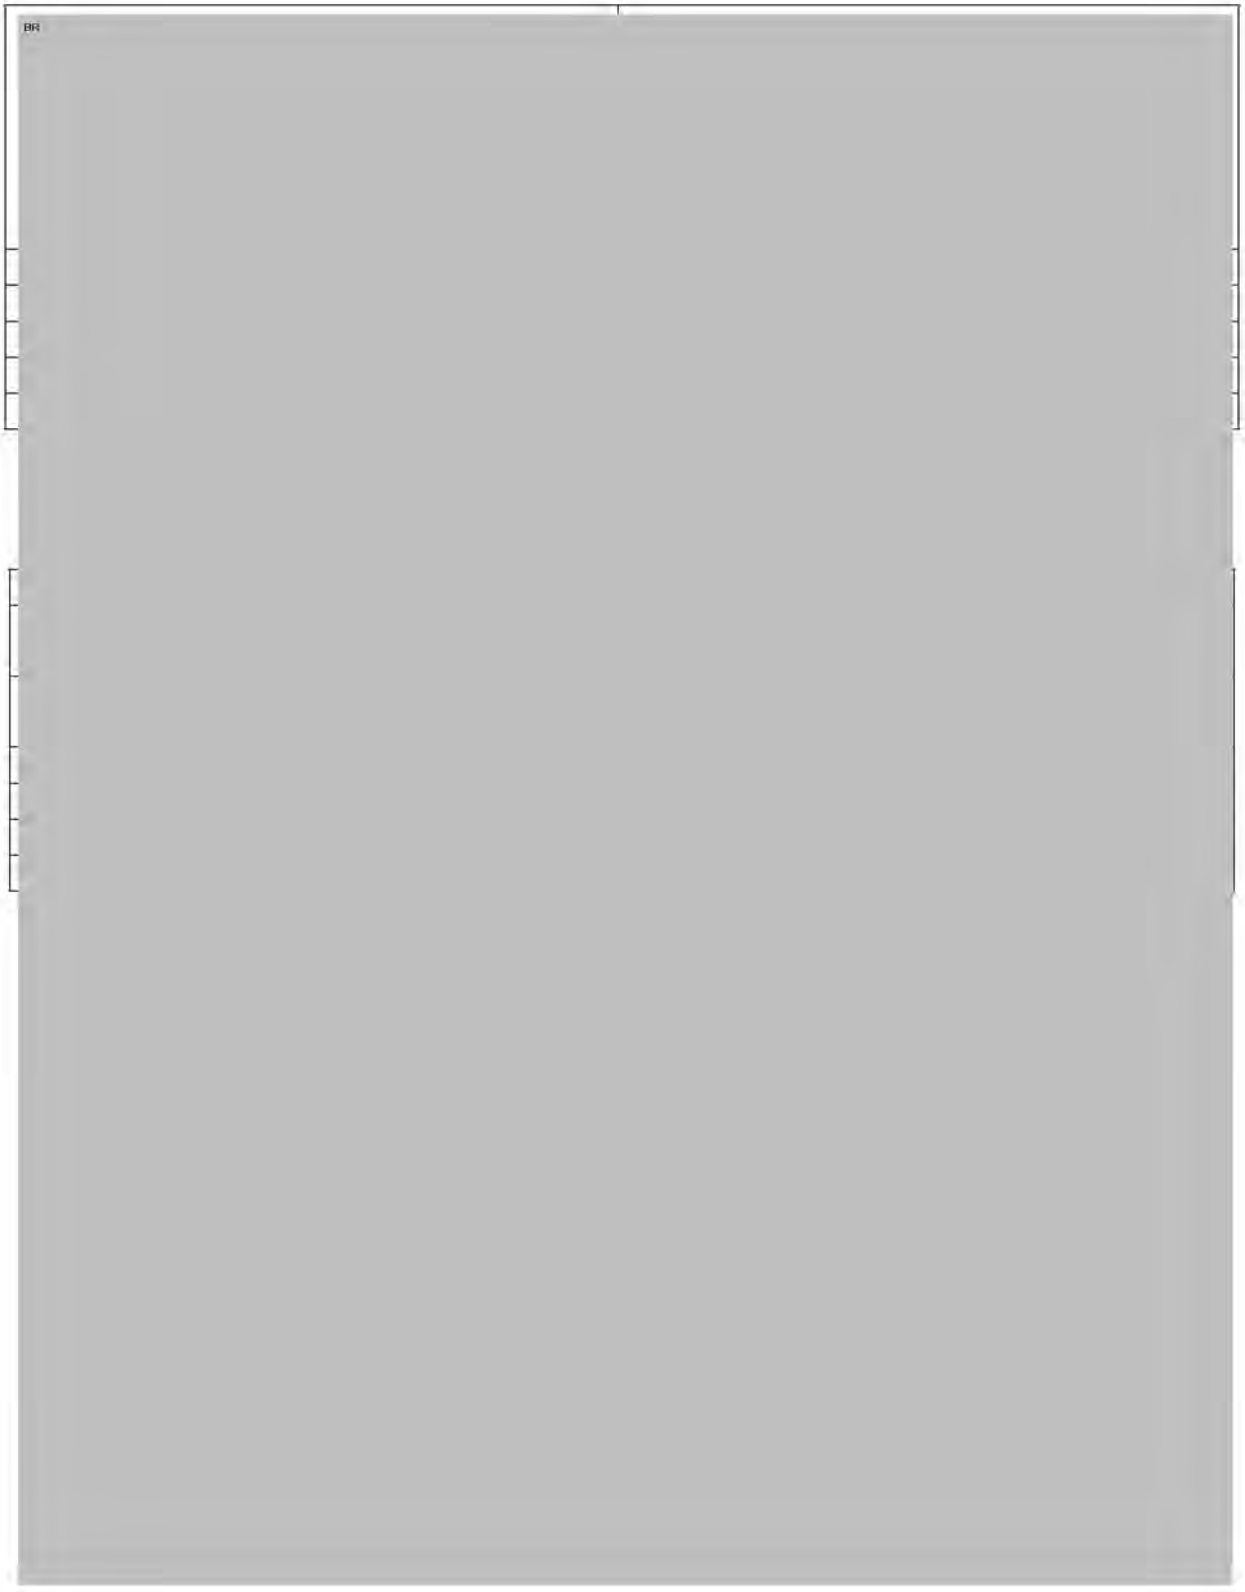
BR

# 3 Projectvoortgang

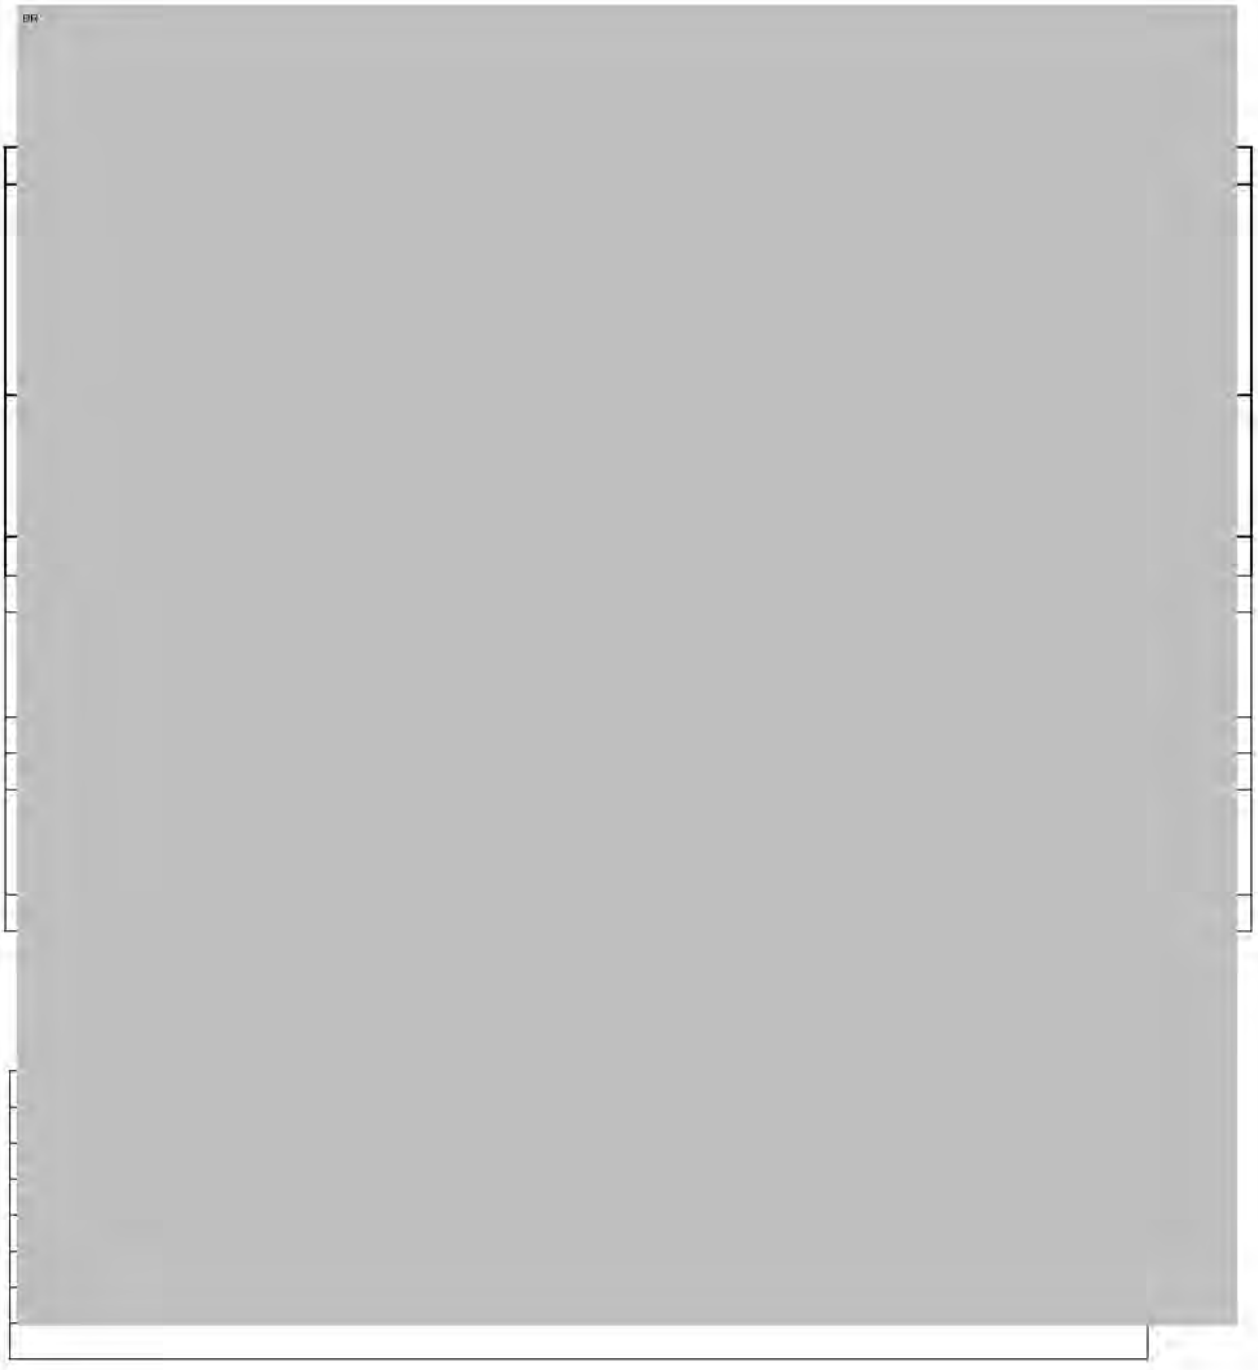

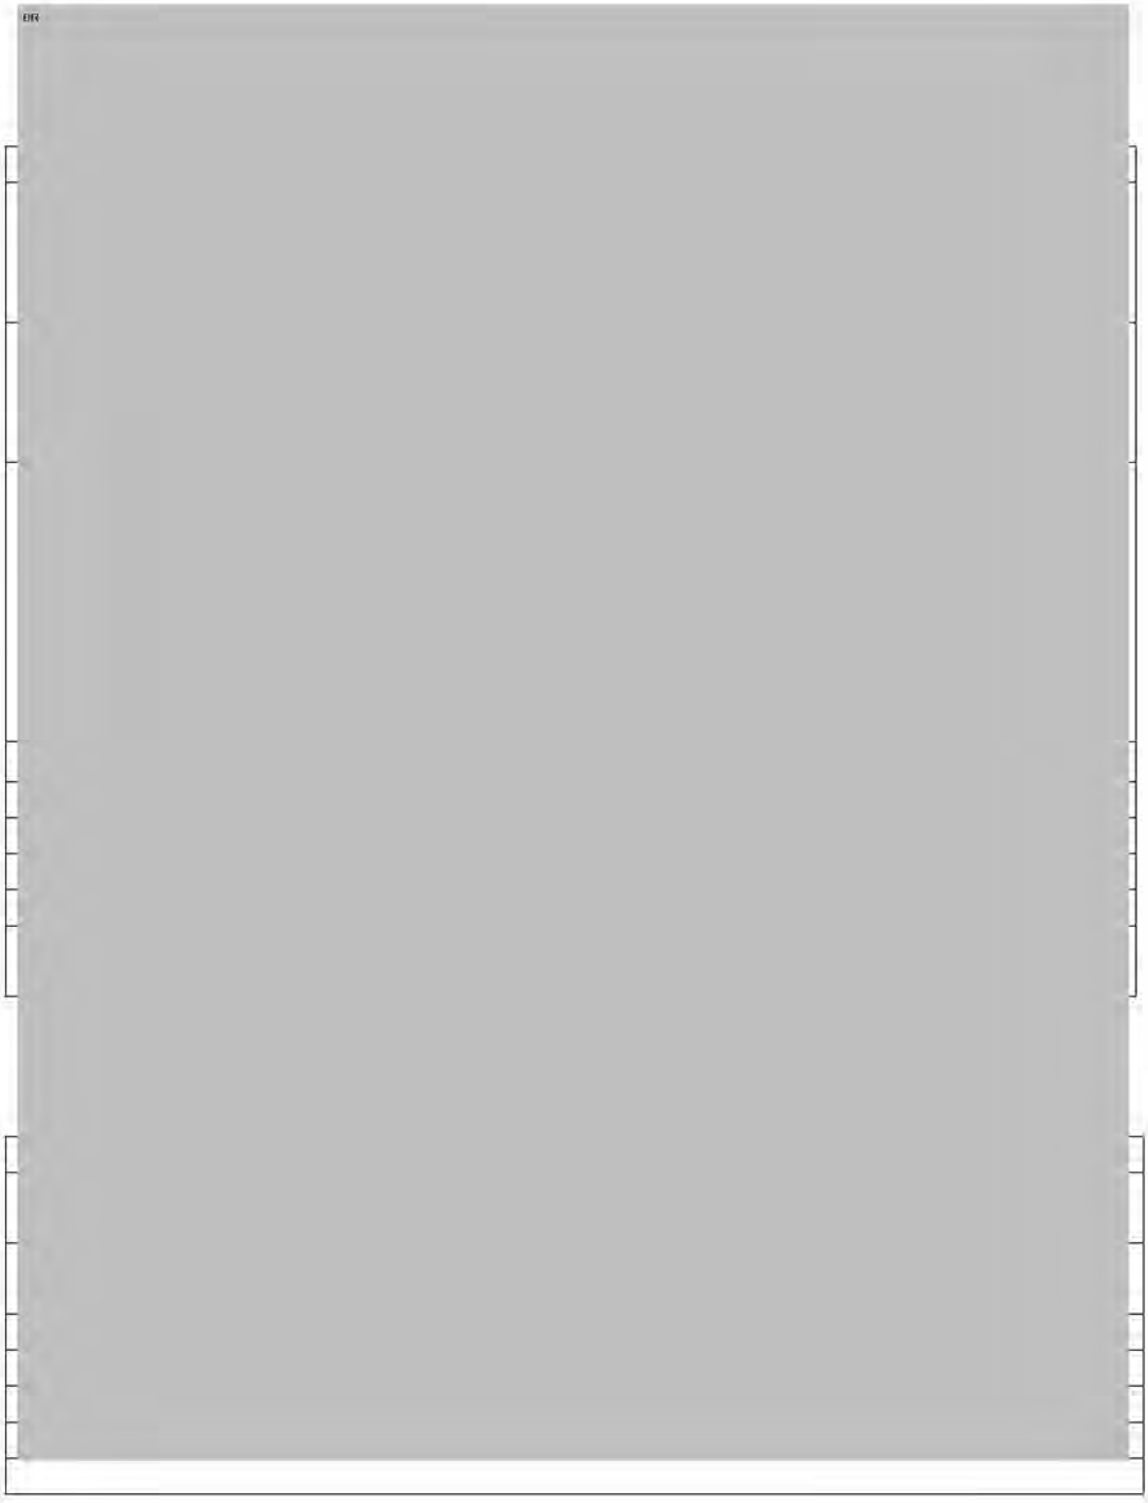

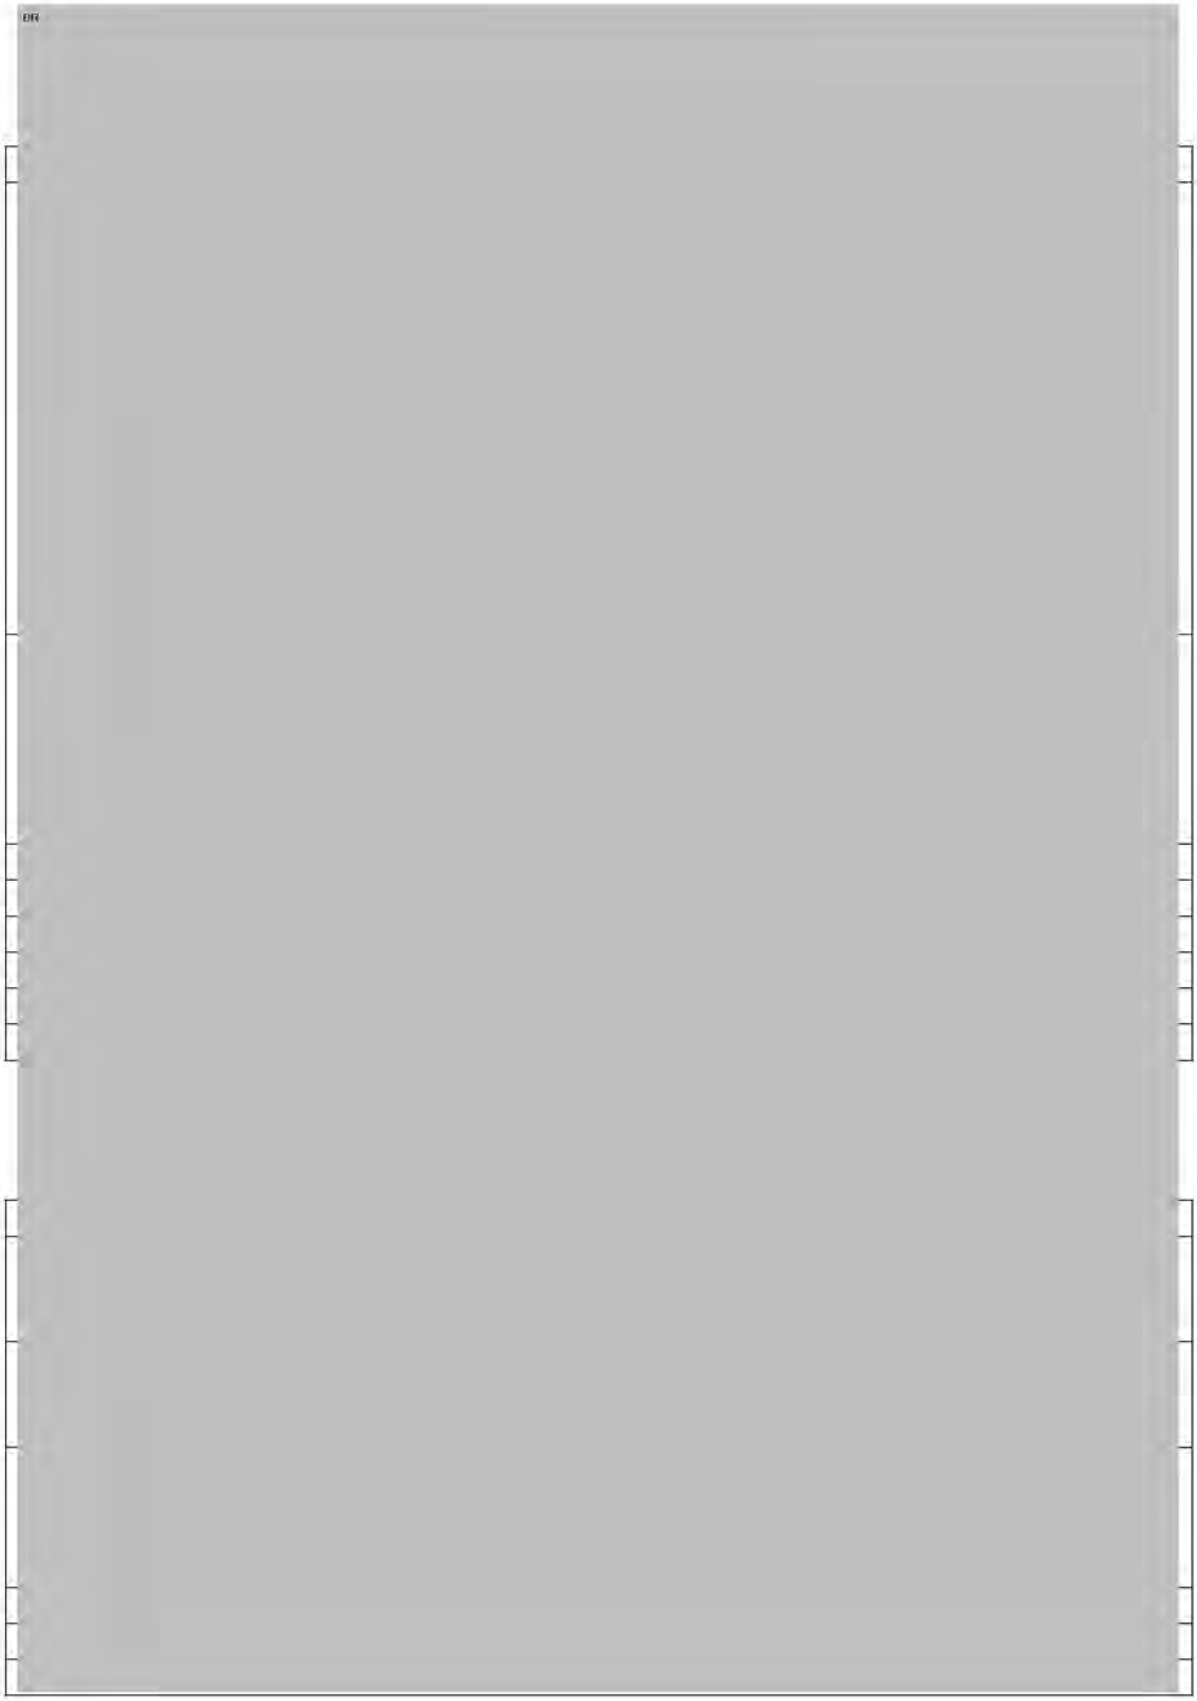

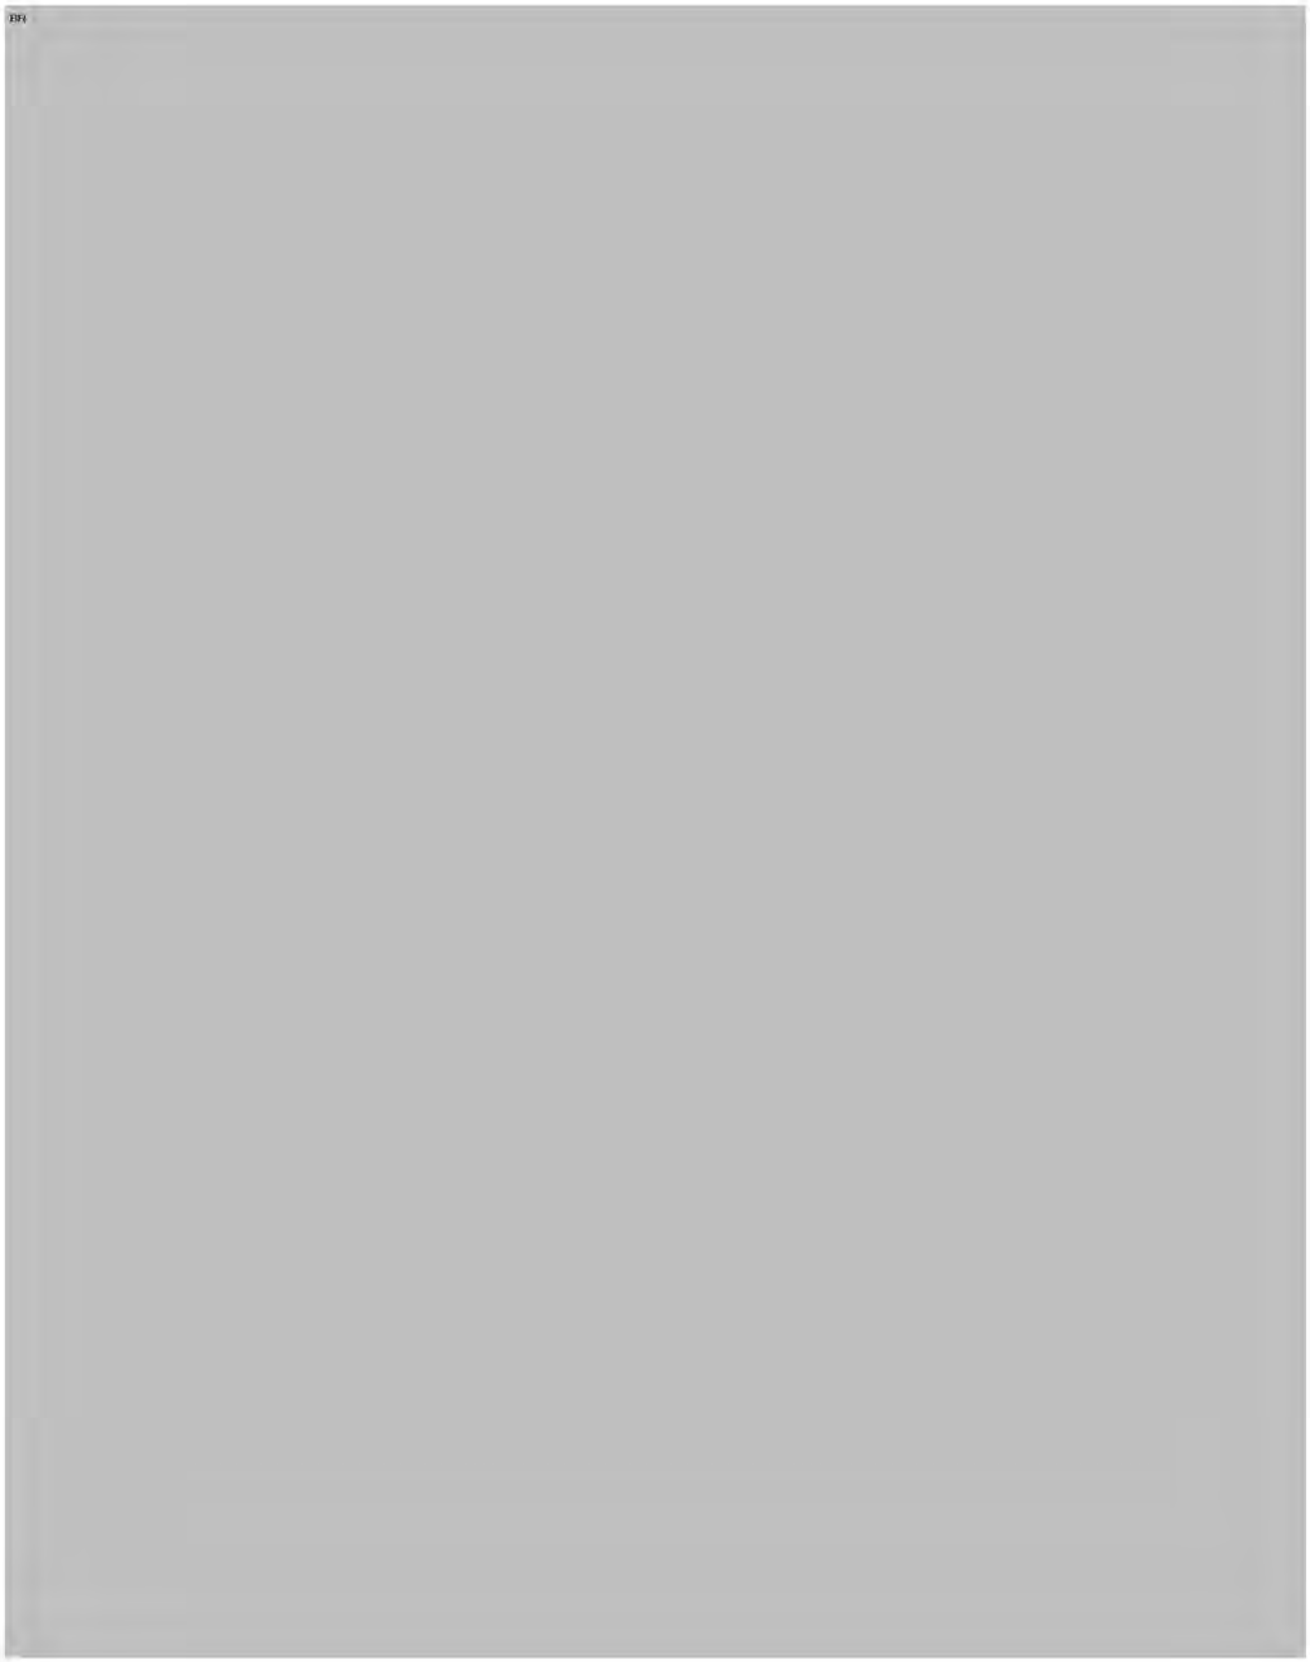

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Planten 18 Canadese populieren in het Molenvlietpark. | Bomen zijn in april geplant. |
| [redacted] | |
| Aanpassen waterhuishouding Molenvlietpark (stap 9). | Waterpartij naast de boorterp is de afgelopen periode gedempt en wordt als opslagterrein voor het boorzand gebruikt. |
| | |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| [redacted] | |
| Movares is gevraagd om een VO te maken voor de te vervangen oeverbescherming van de Vliet, op basis van het bestek van de provincie. Movares richt zich daarom vooral op het deel dat aangepast moet worden door de ophoging van de Jan Thijsenweg. | |
| | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen | Geen |
| | |

### 3.5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| voorbereiden aanleg van bruggen en kleine kunstwerken Molenvlietpark (waaronder de aflaat), testen waterkering en openstellen Molenvlietpark West. |
| [redacted] |
| |

Luchtfoto: Vlietzone, april 2018

Foto: Canadese popelieren geplant in het Molenvlietpark langs Drievliet, april 2018

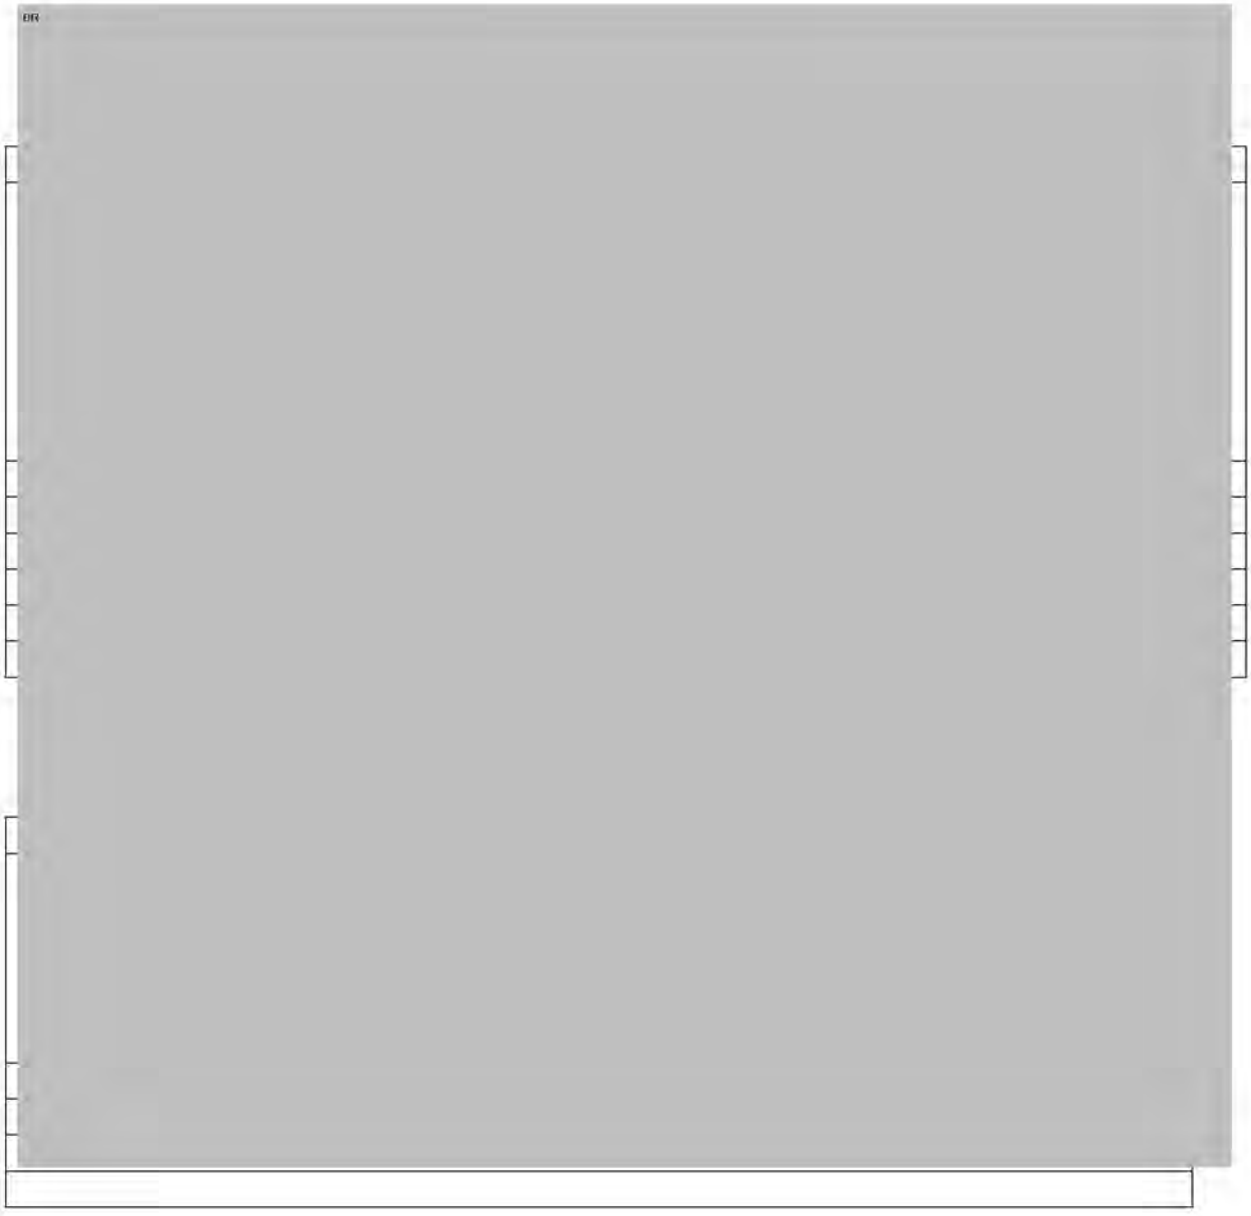

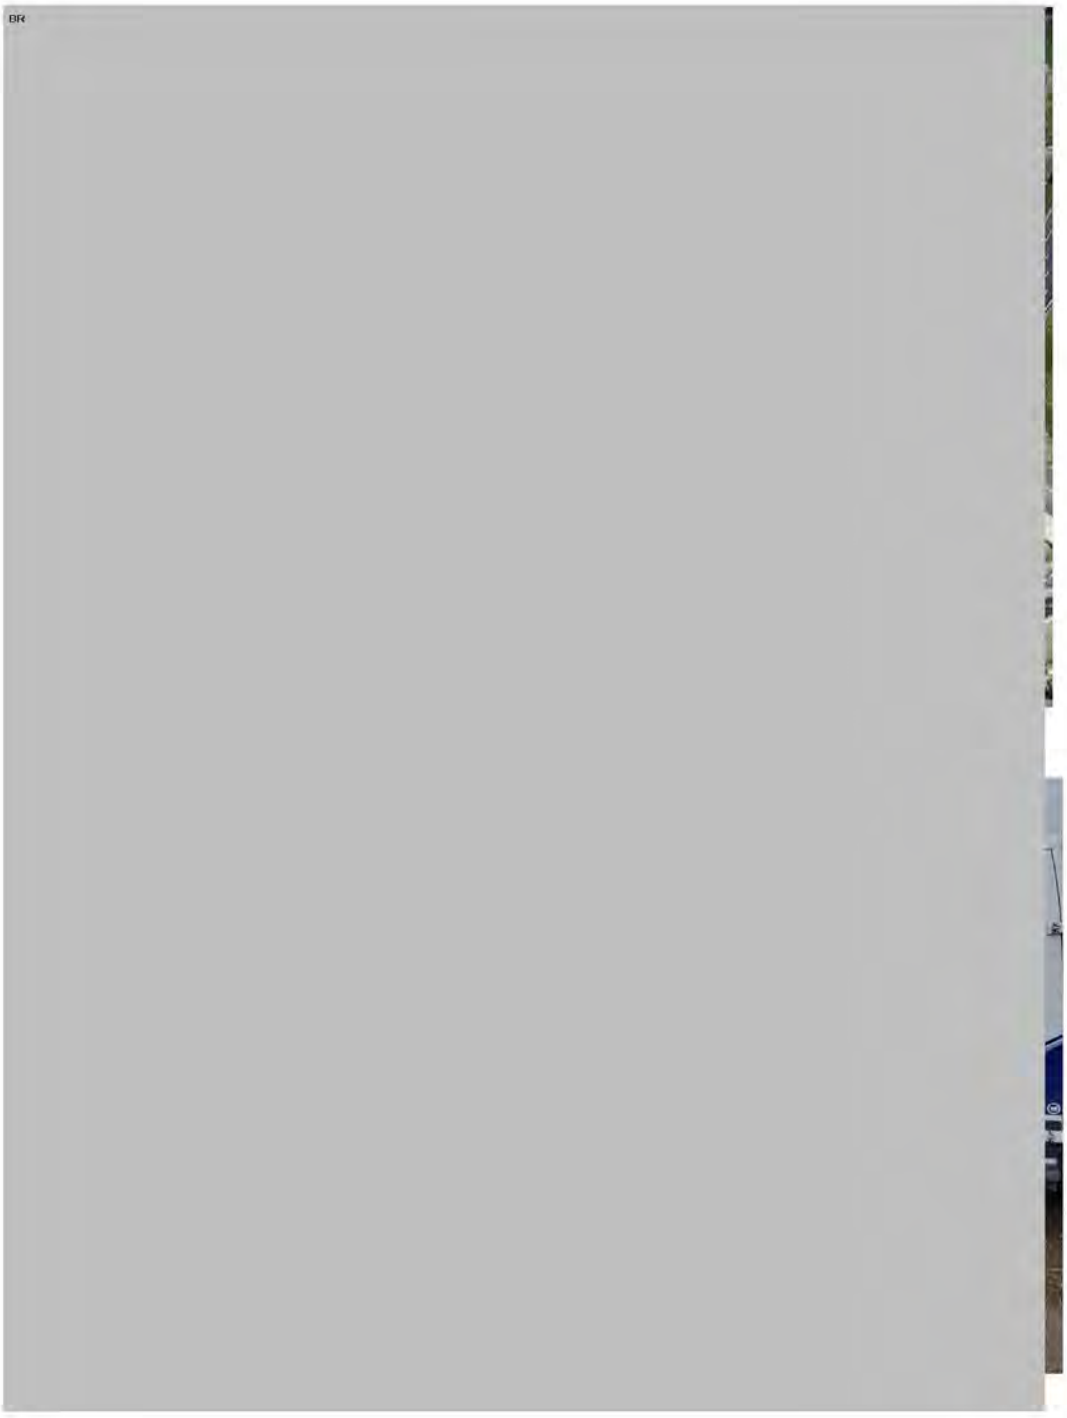

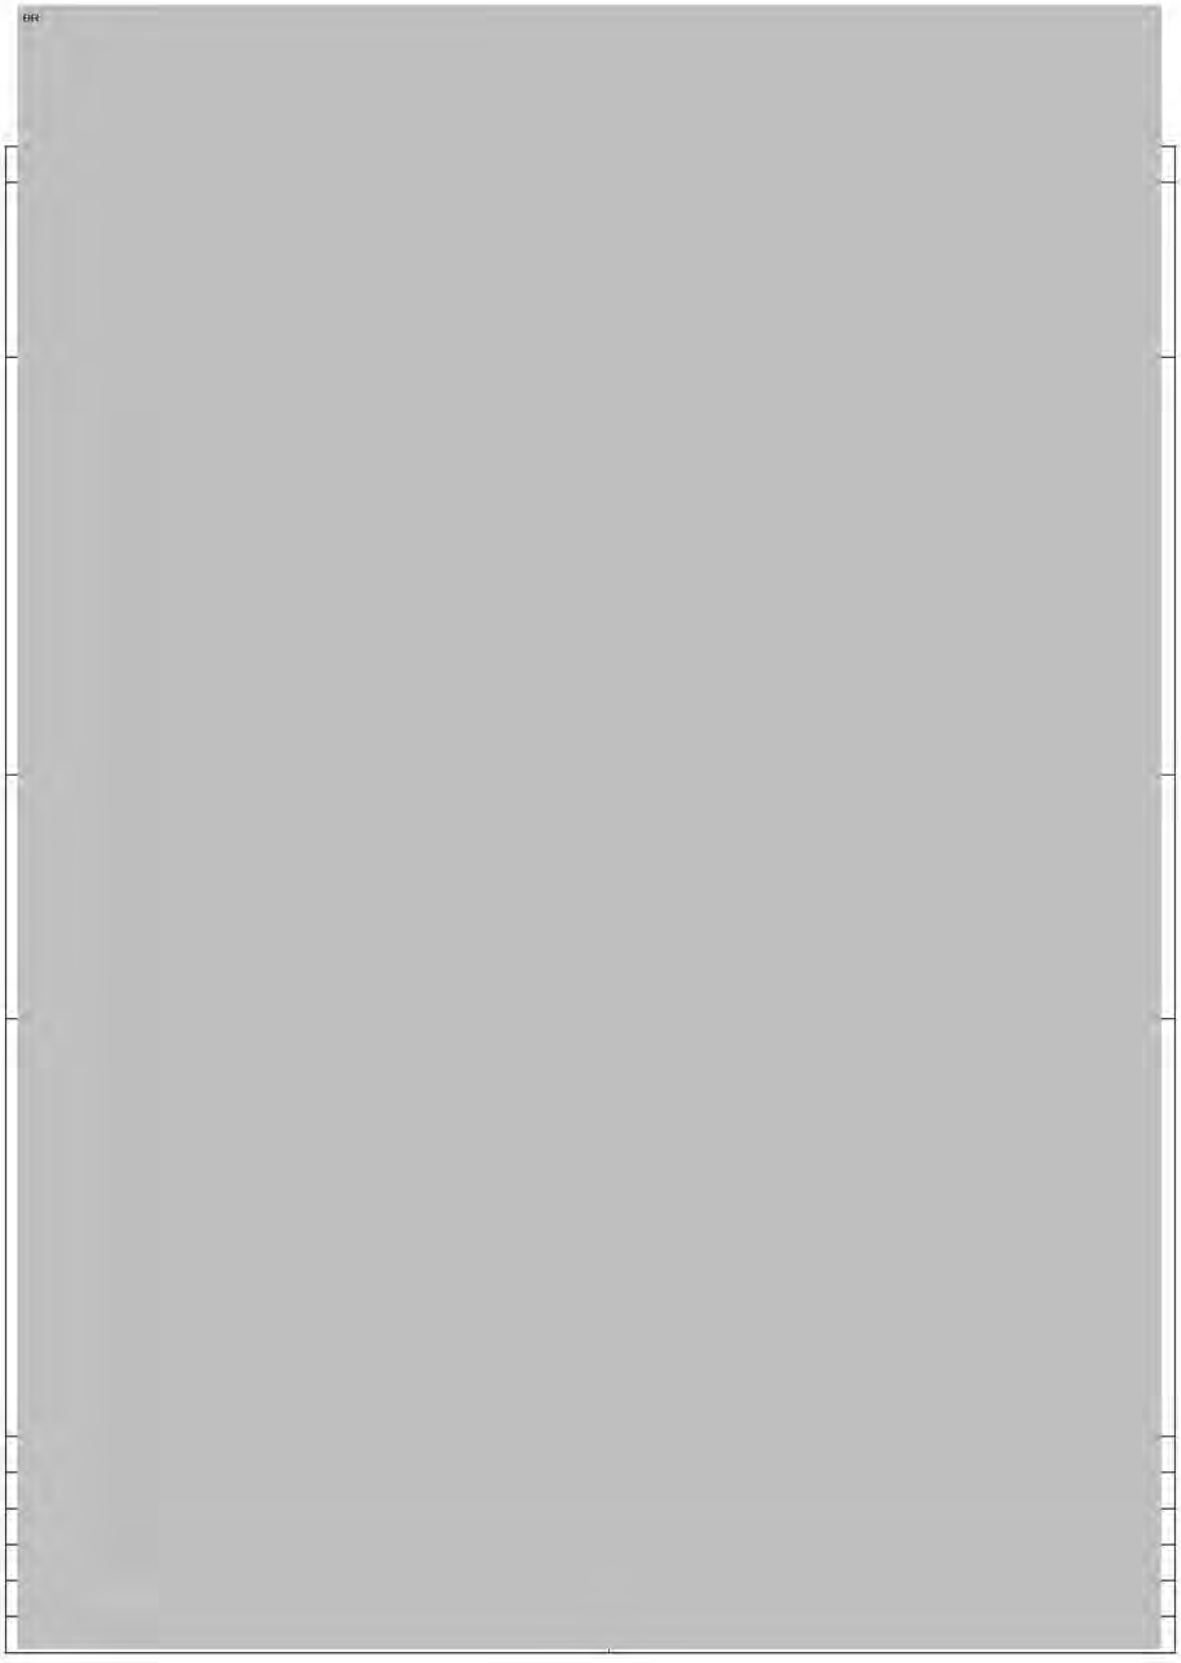

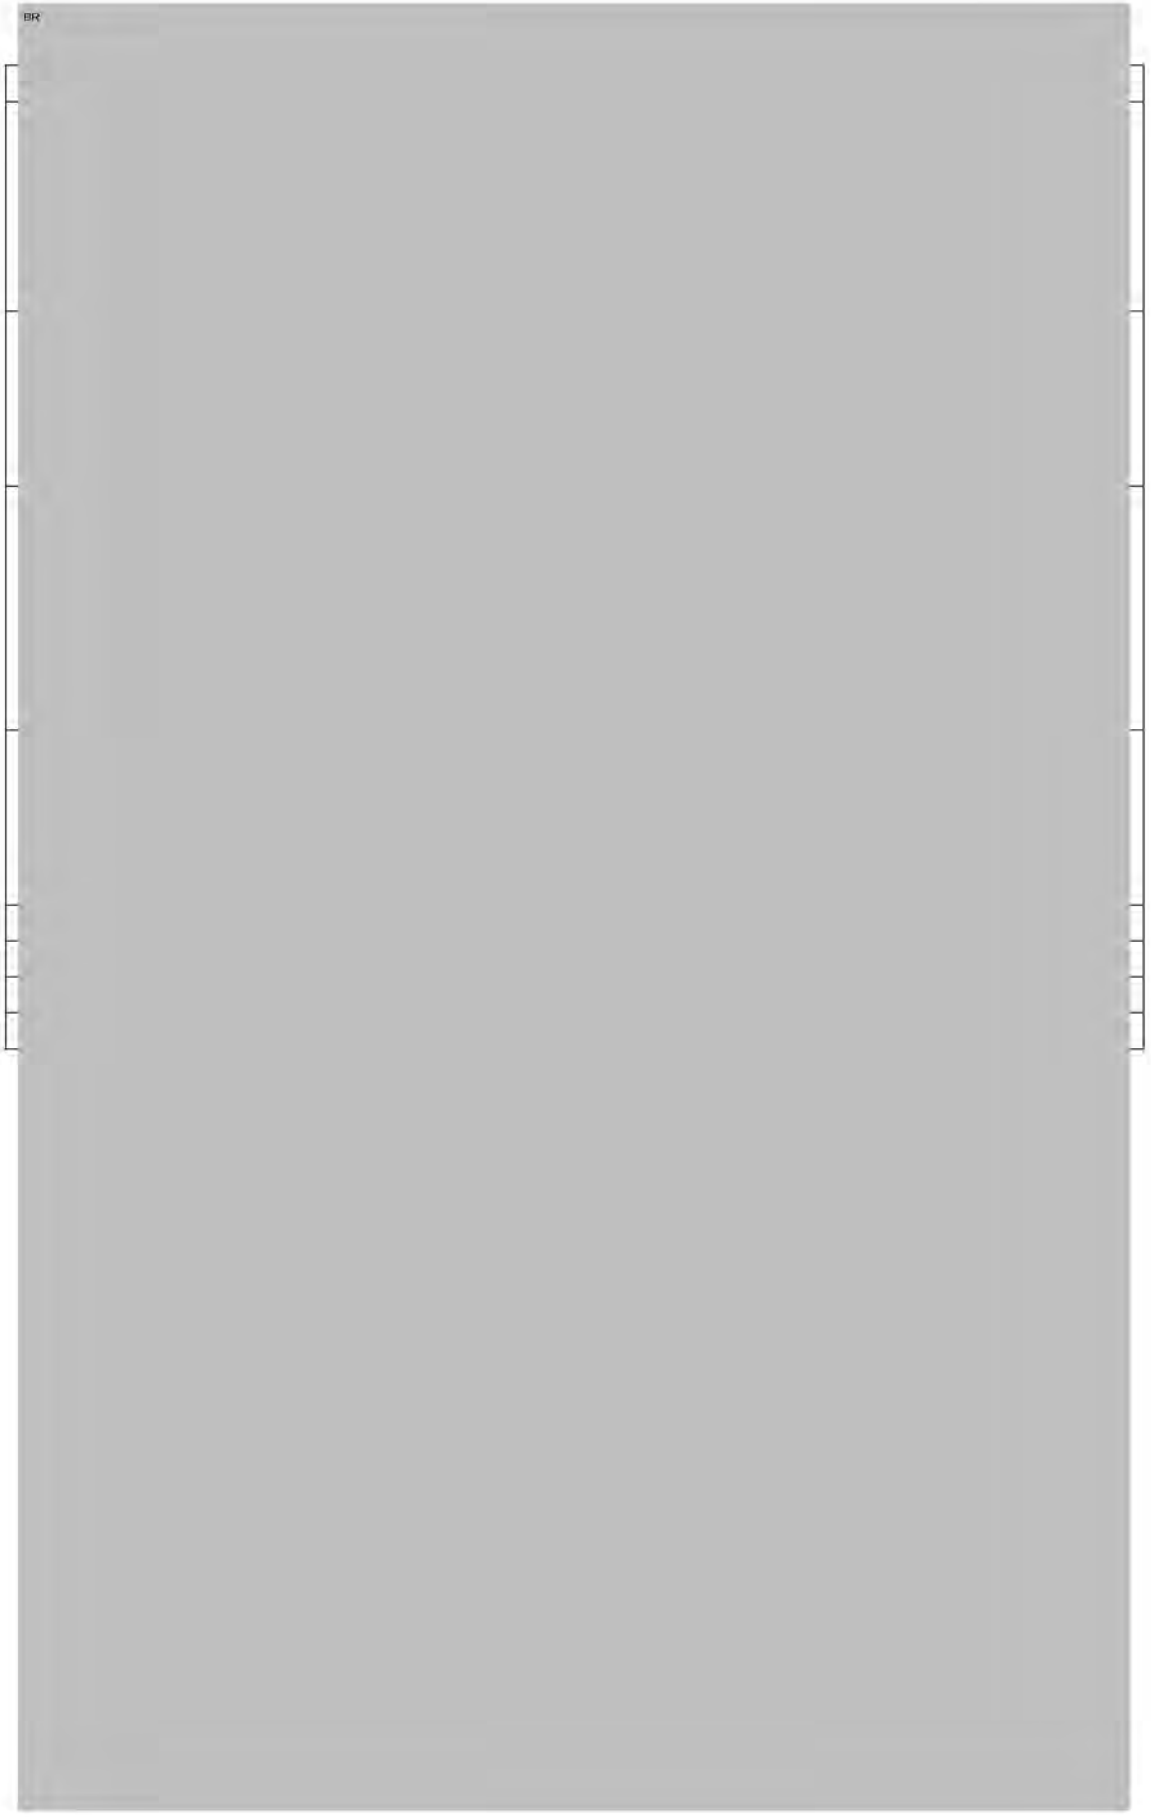
BR

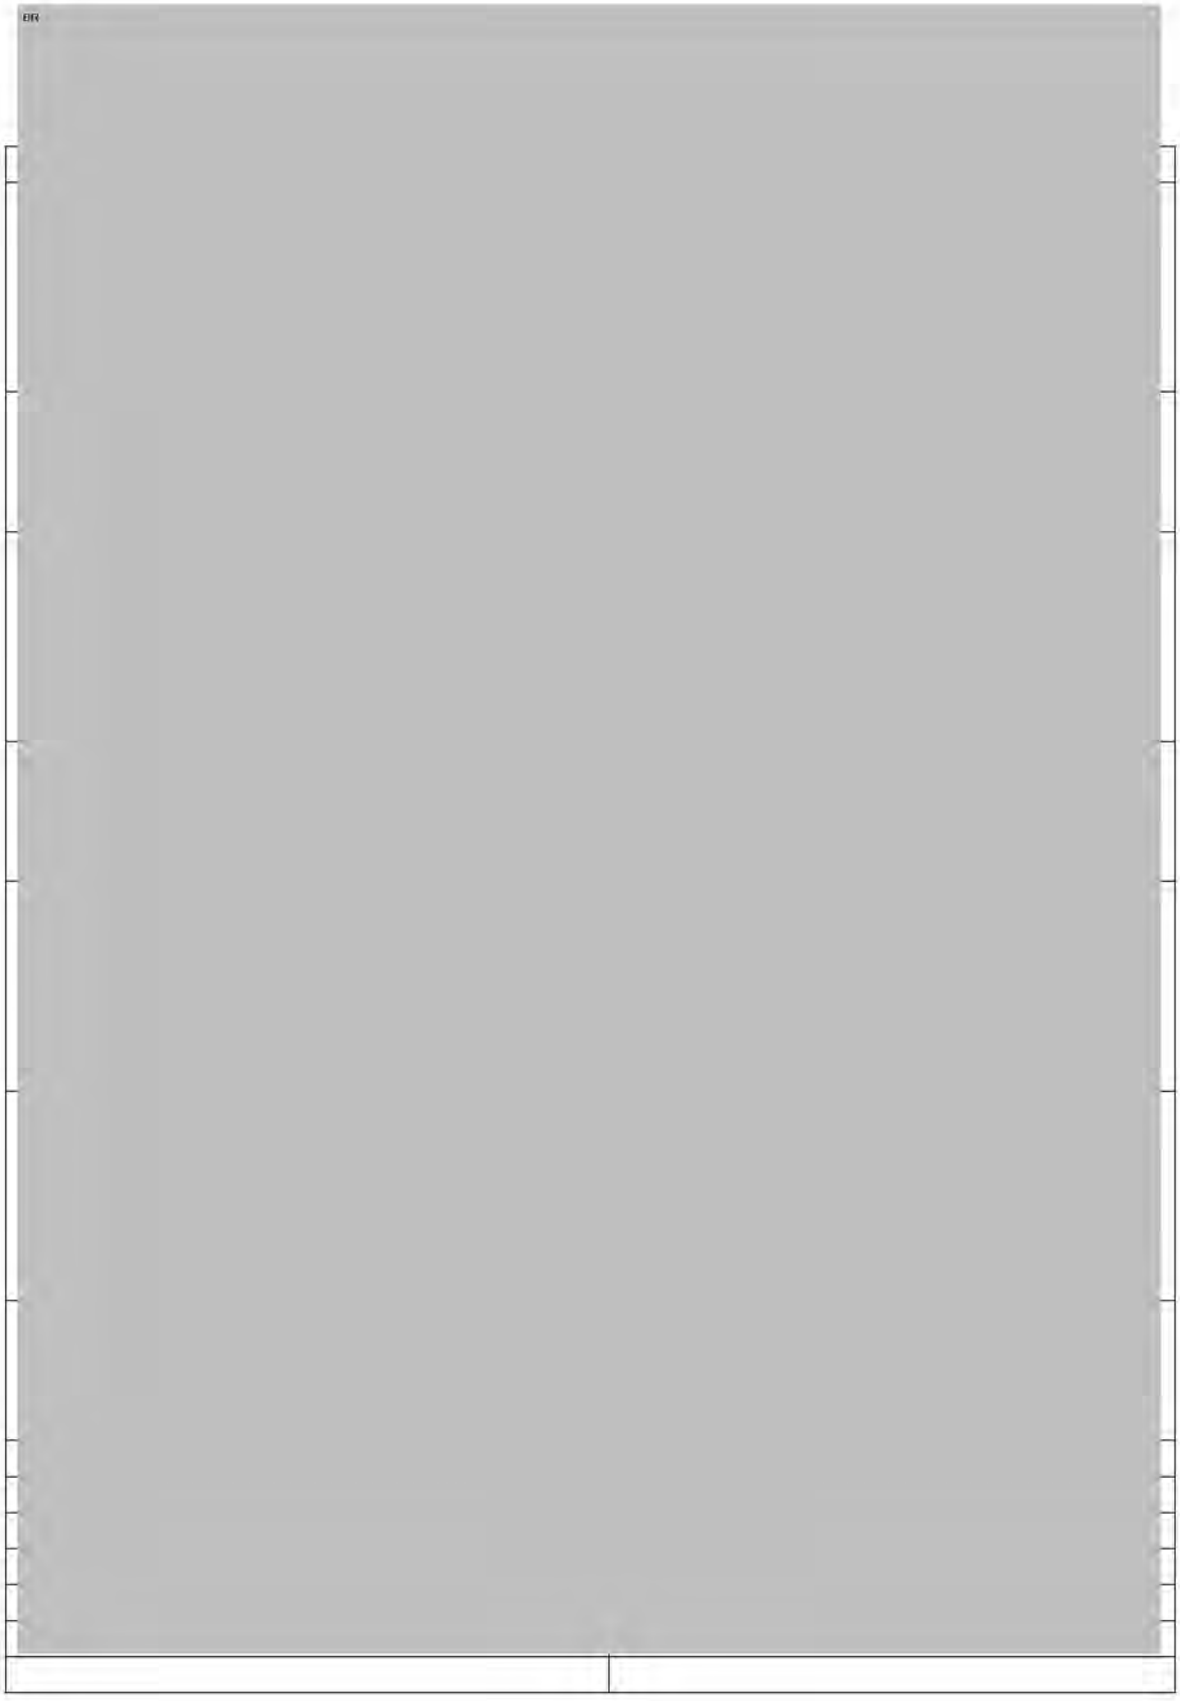
BR

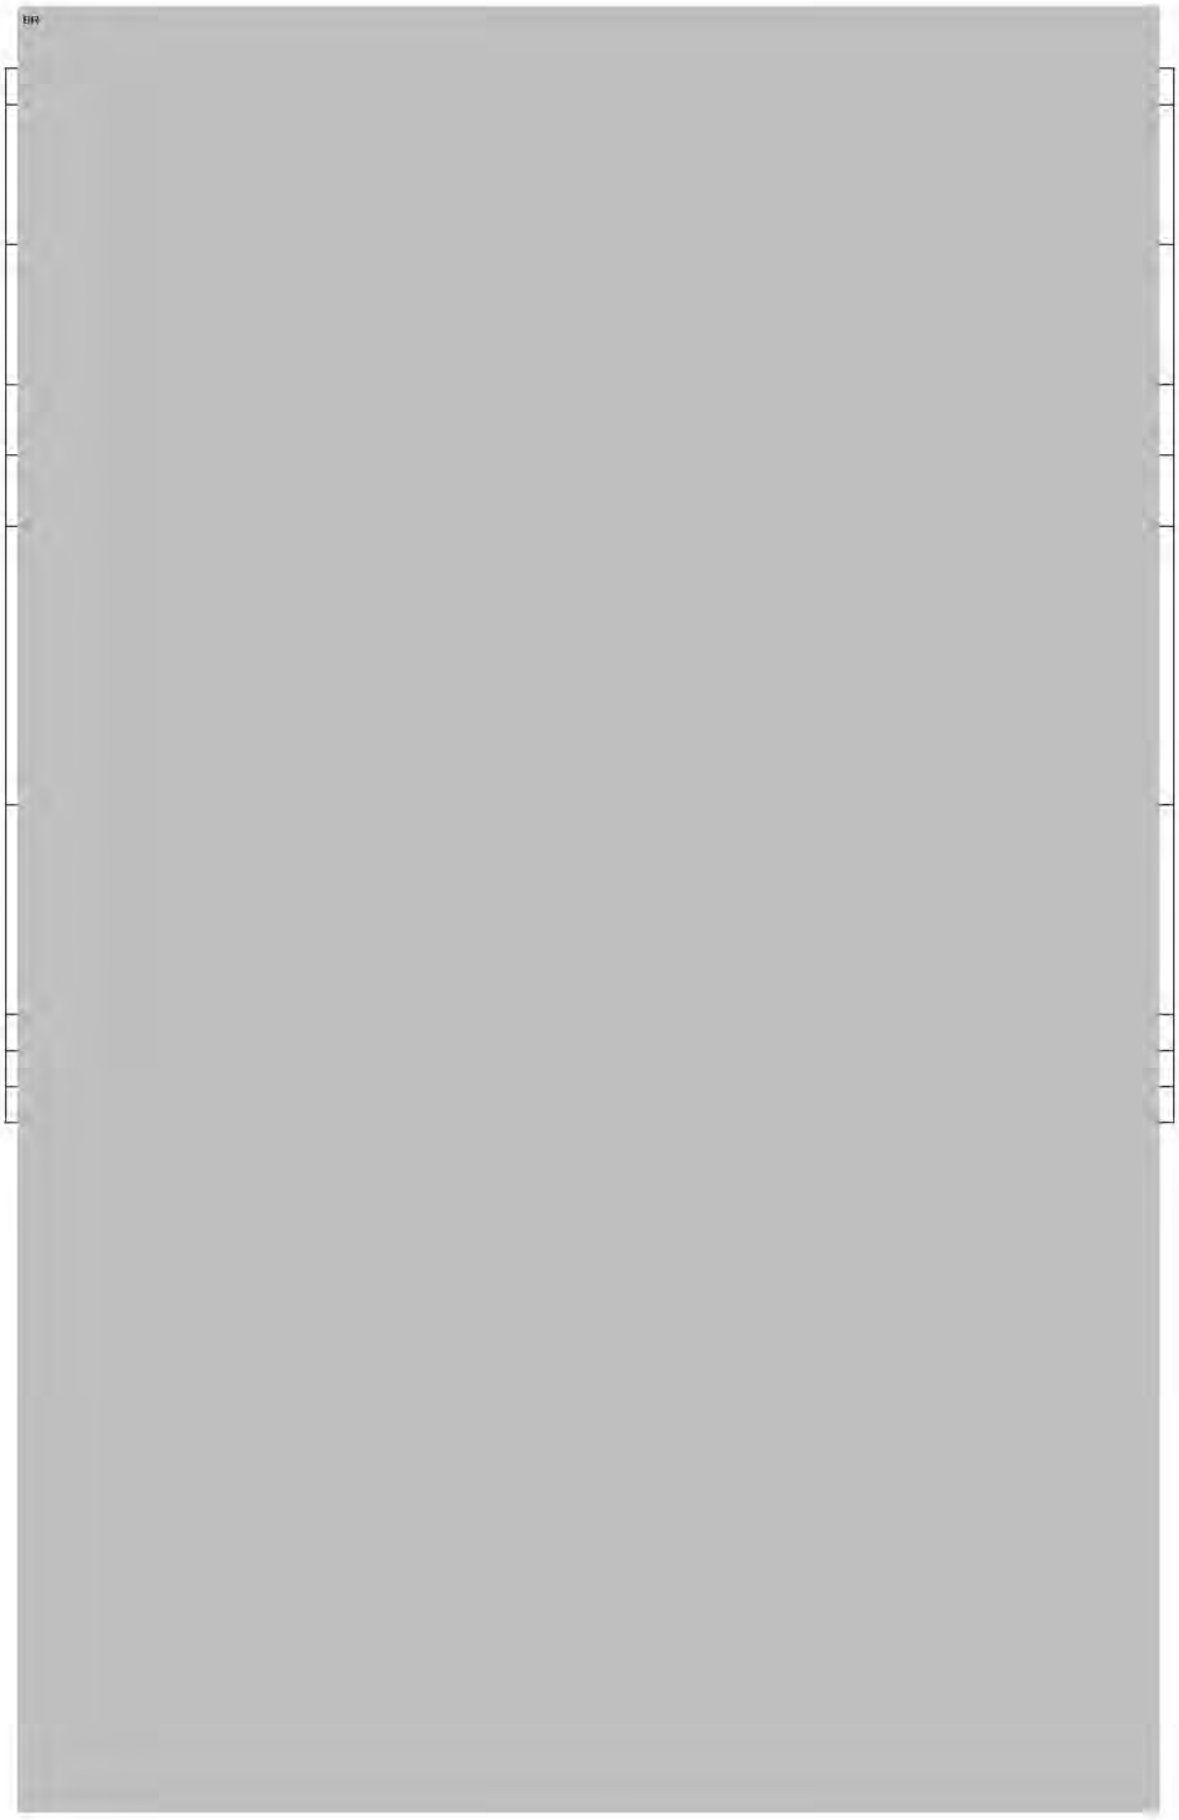

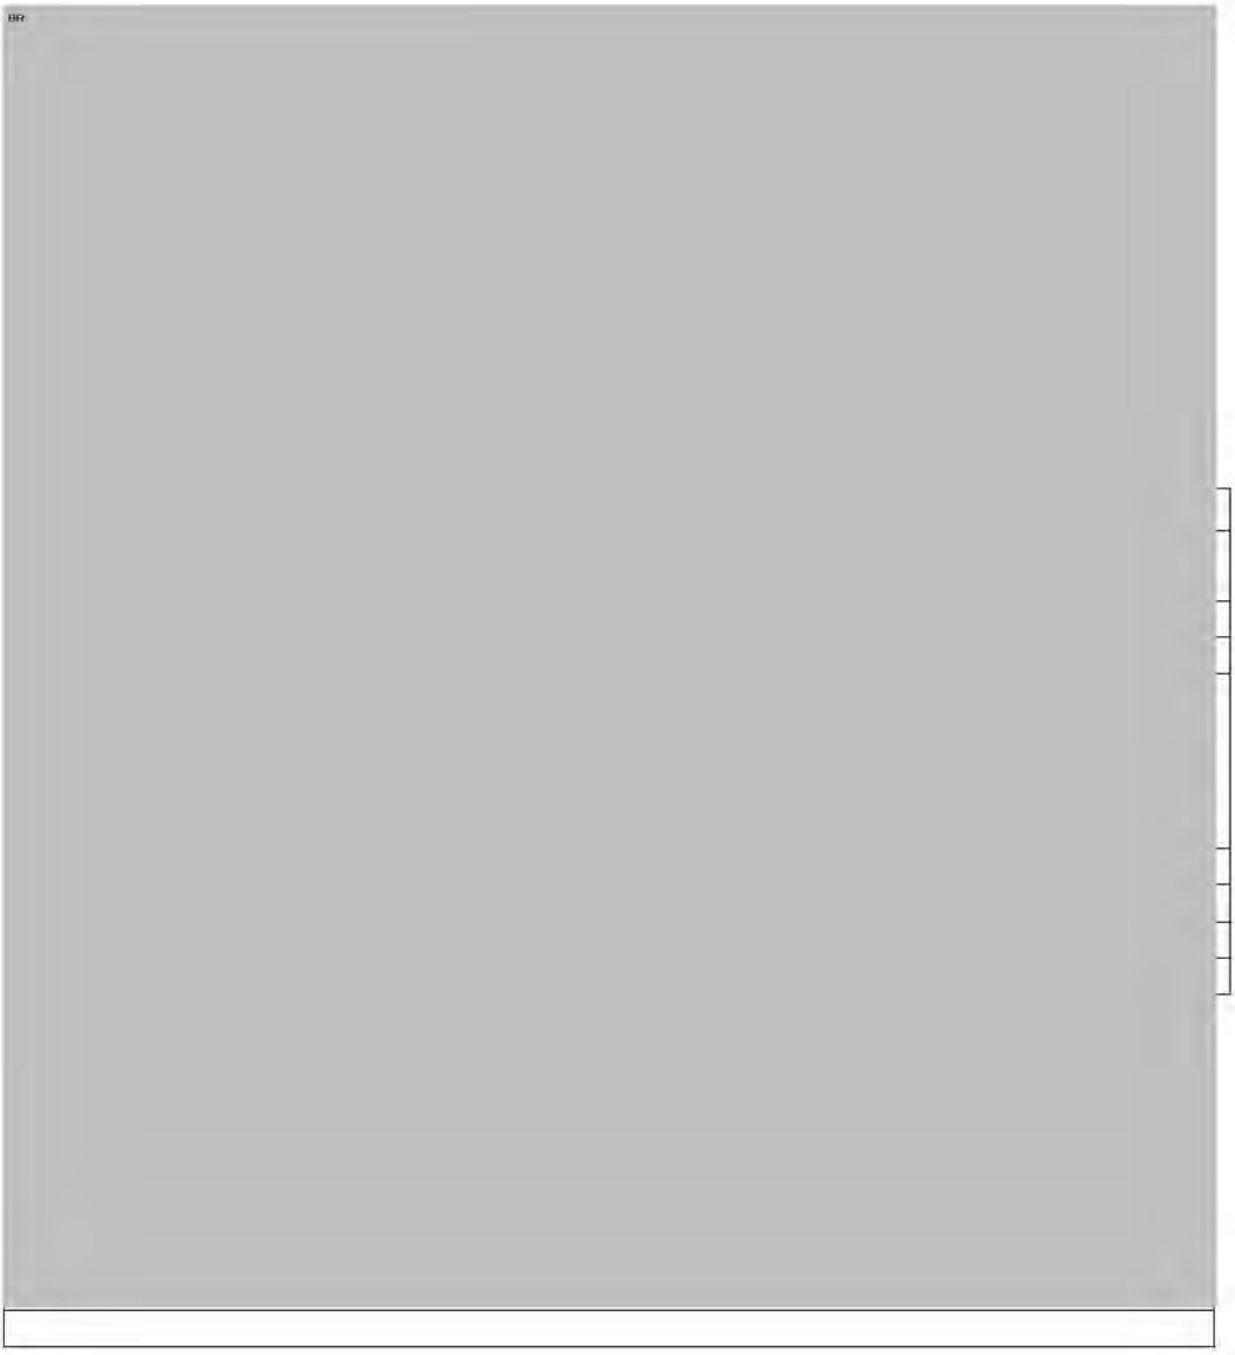

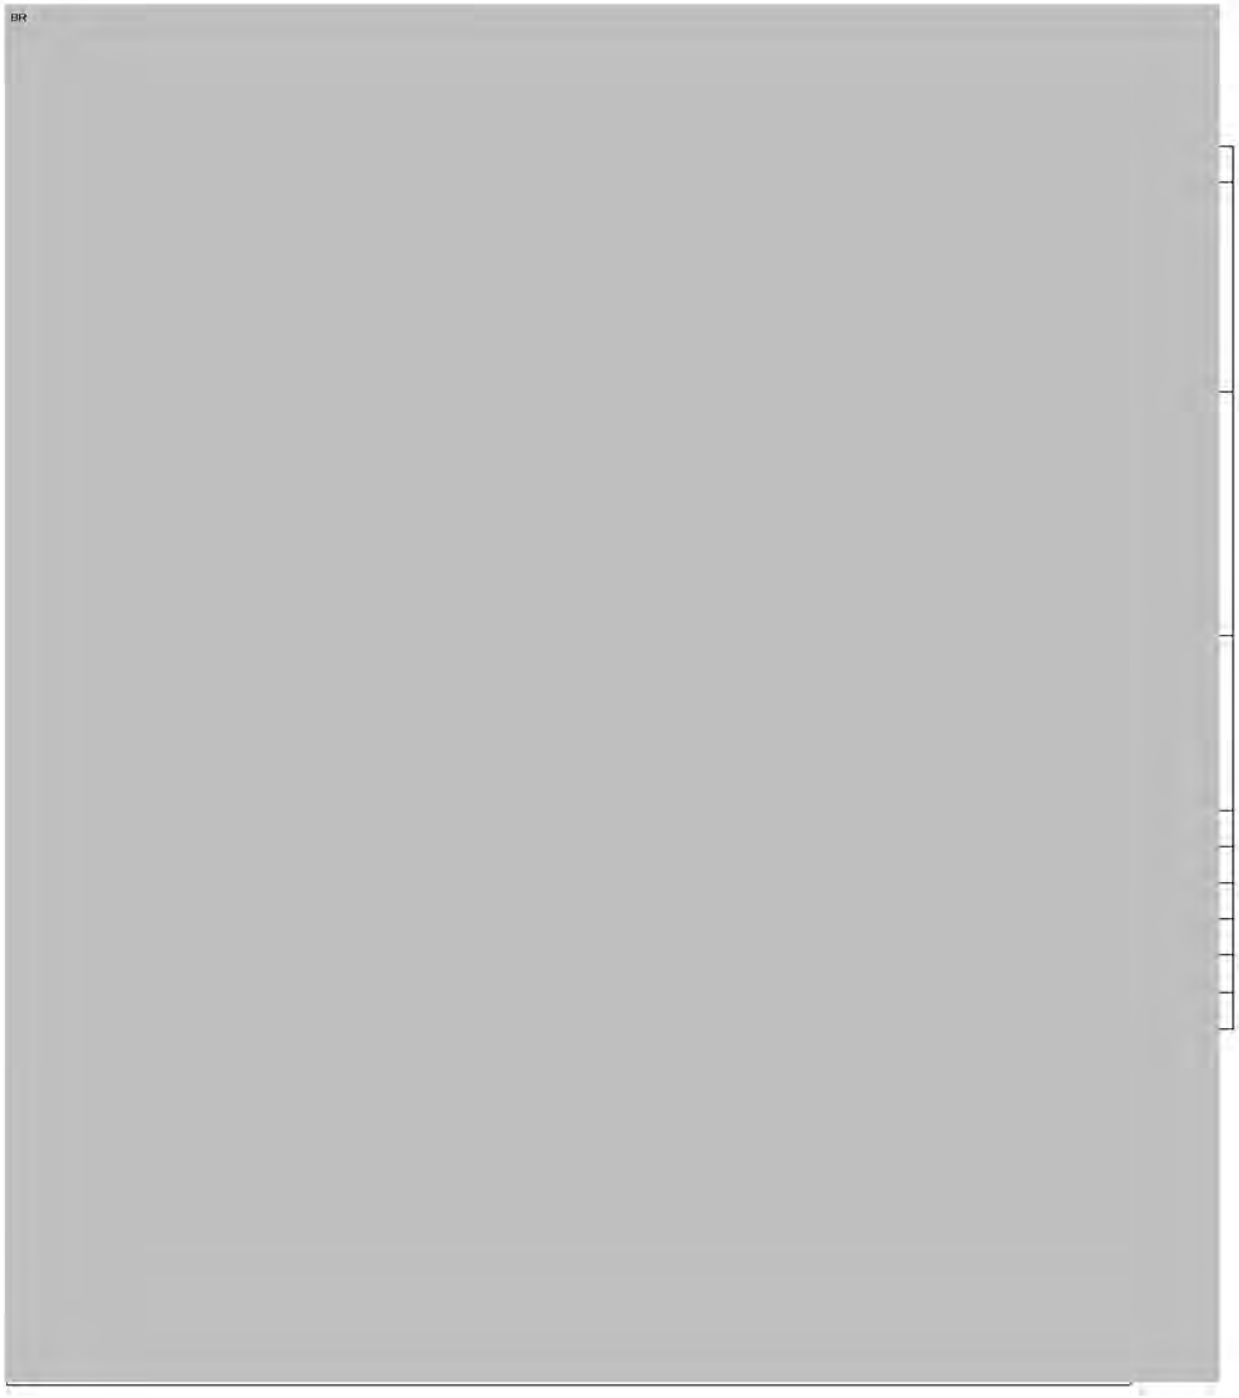

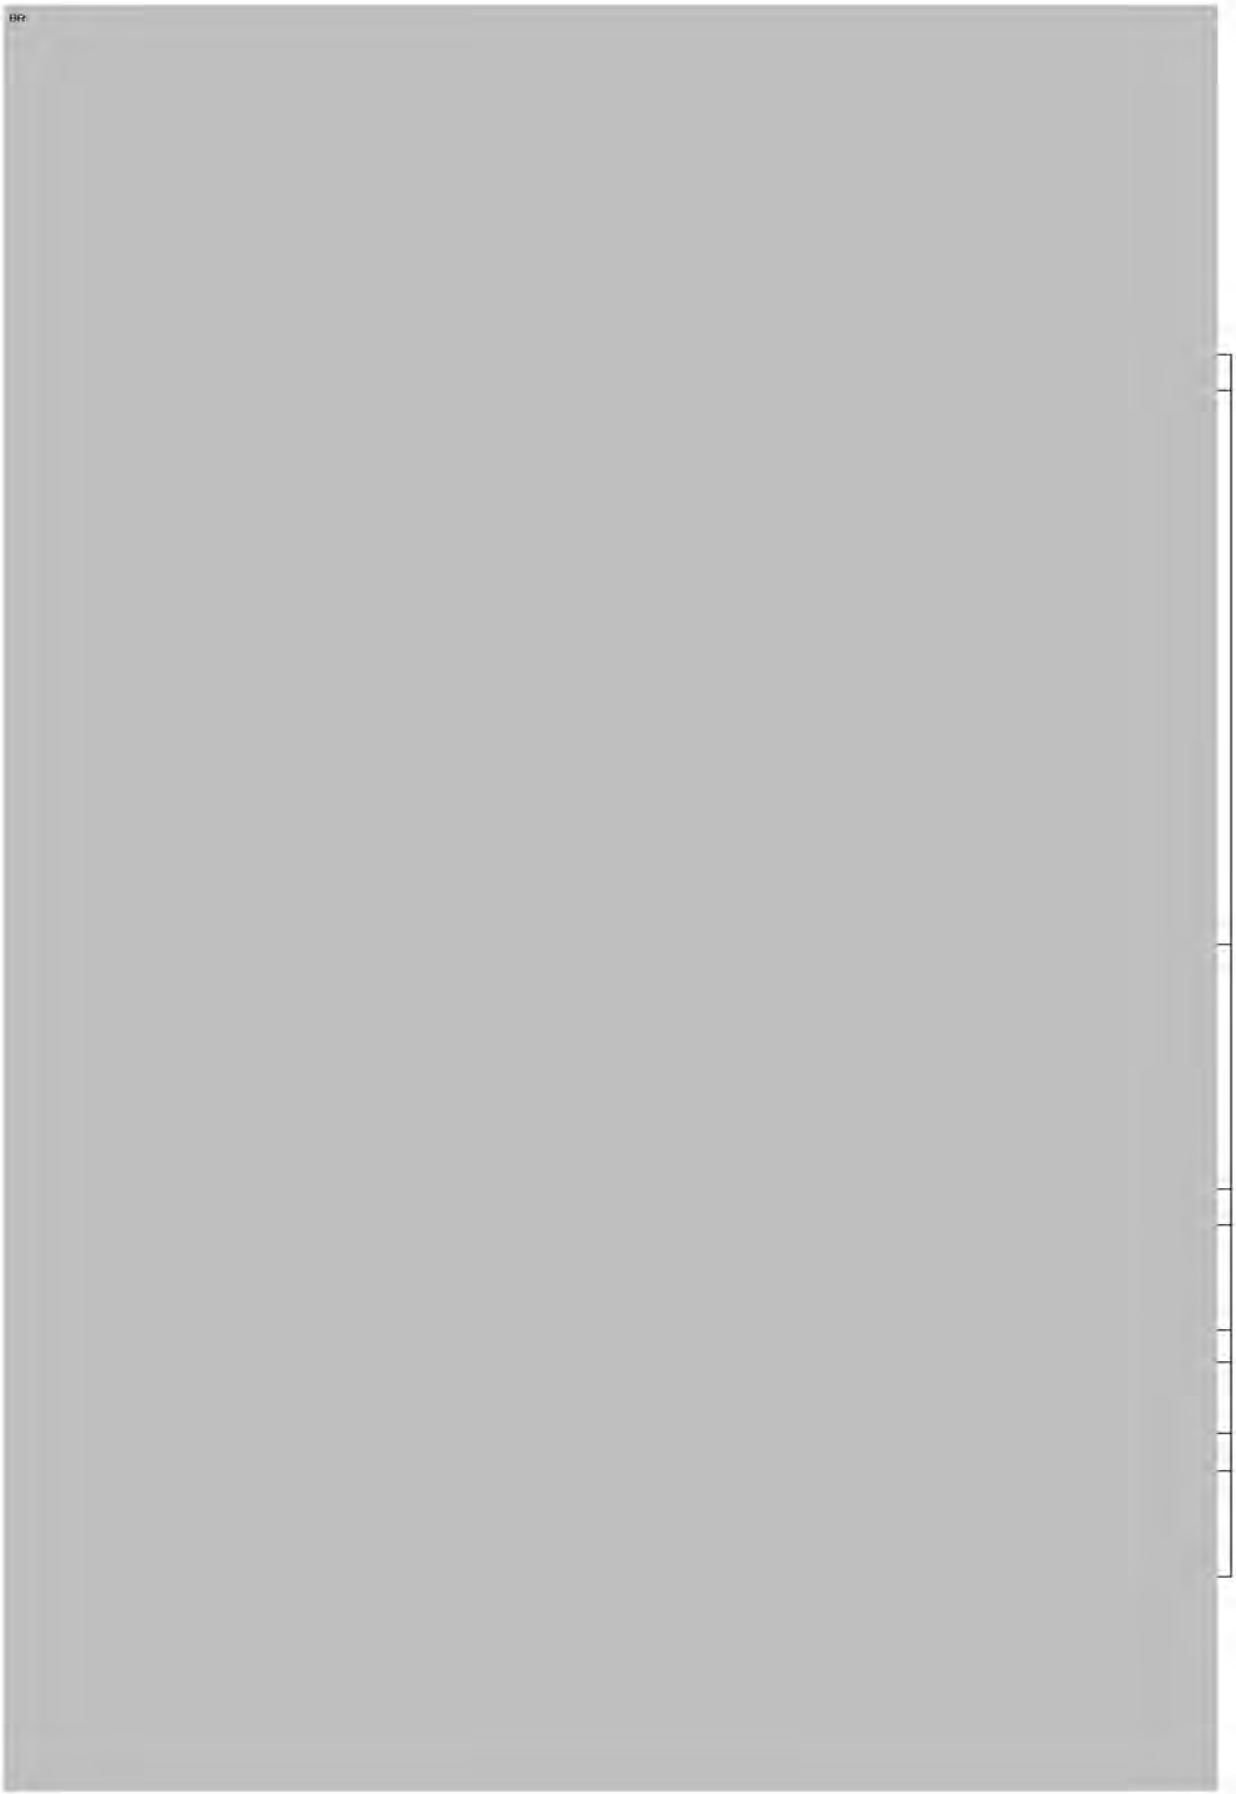
BR

BR

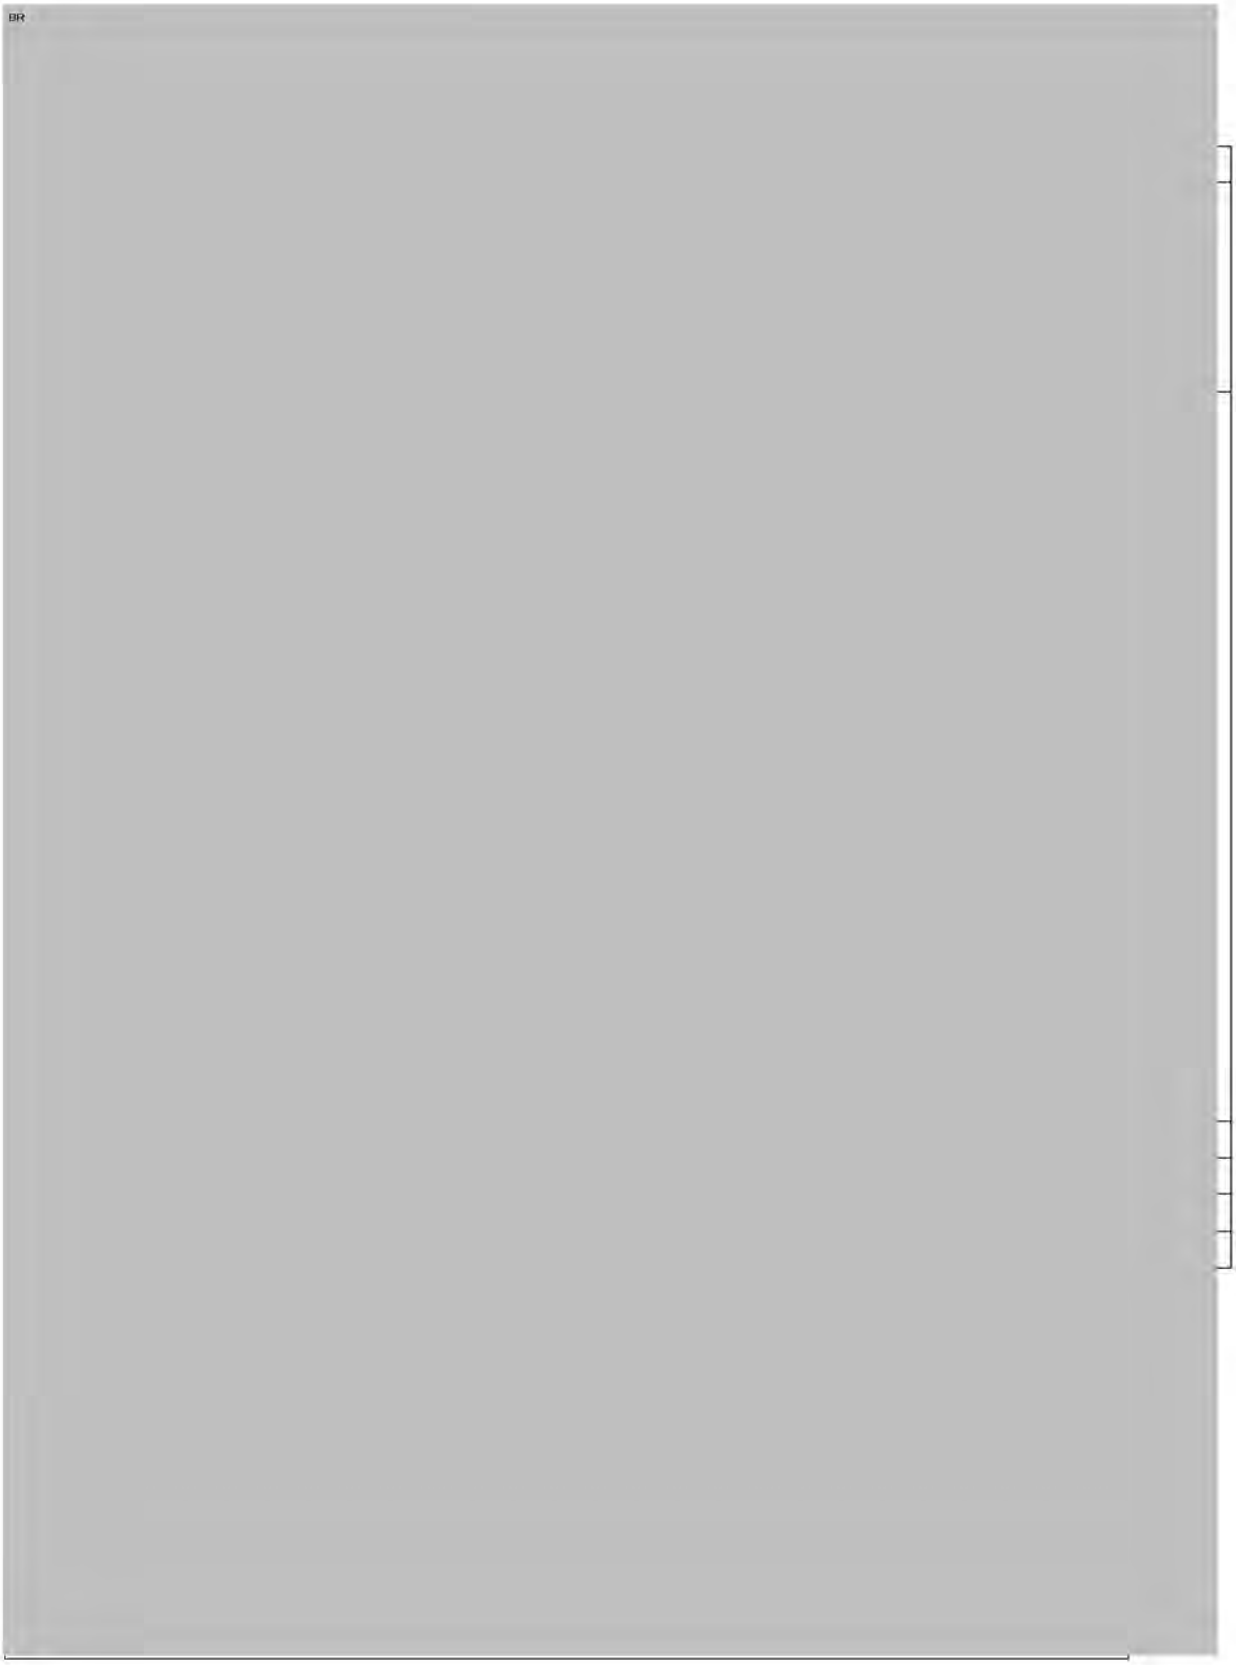

# 4 Overdracht en openstelling

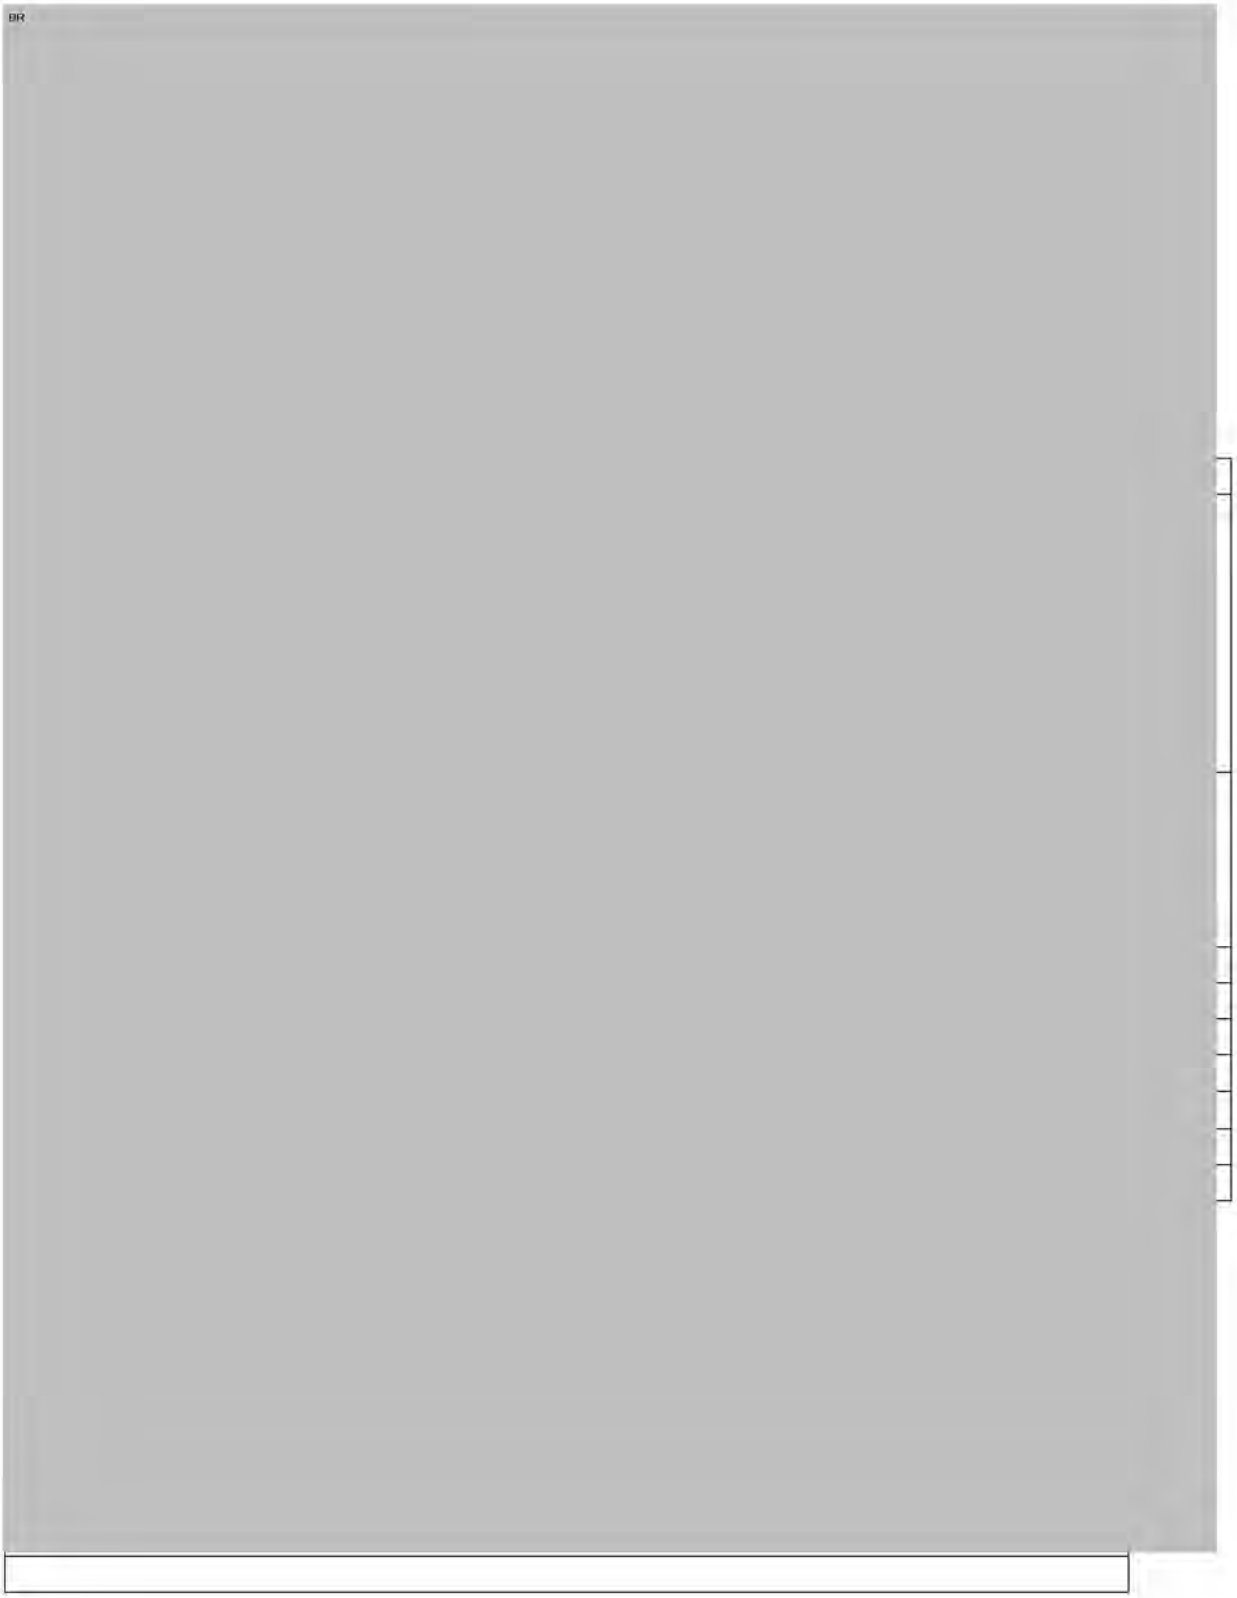

BR

Docnr19



# 5 Projectbeheersing

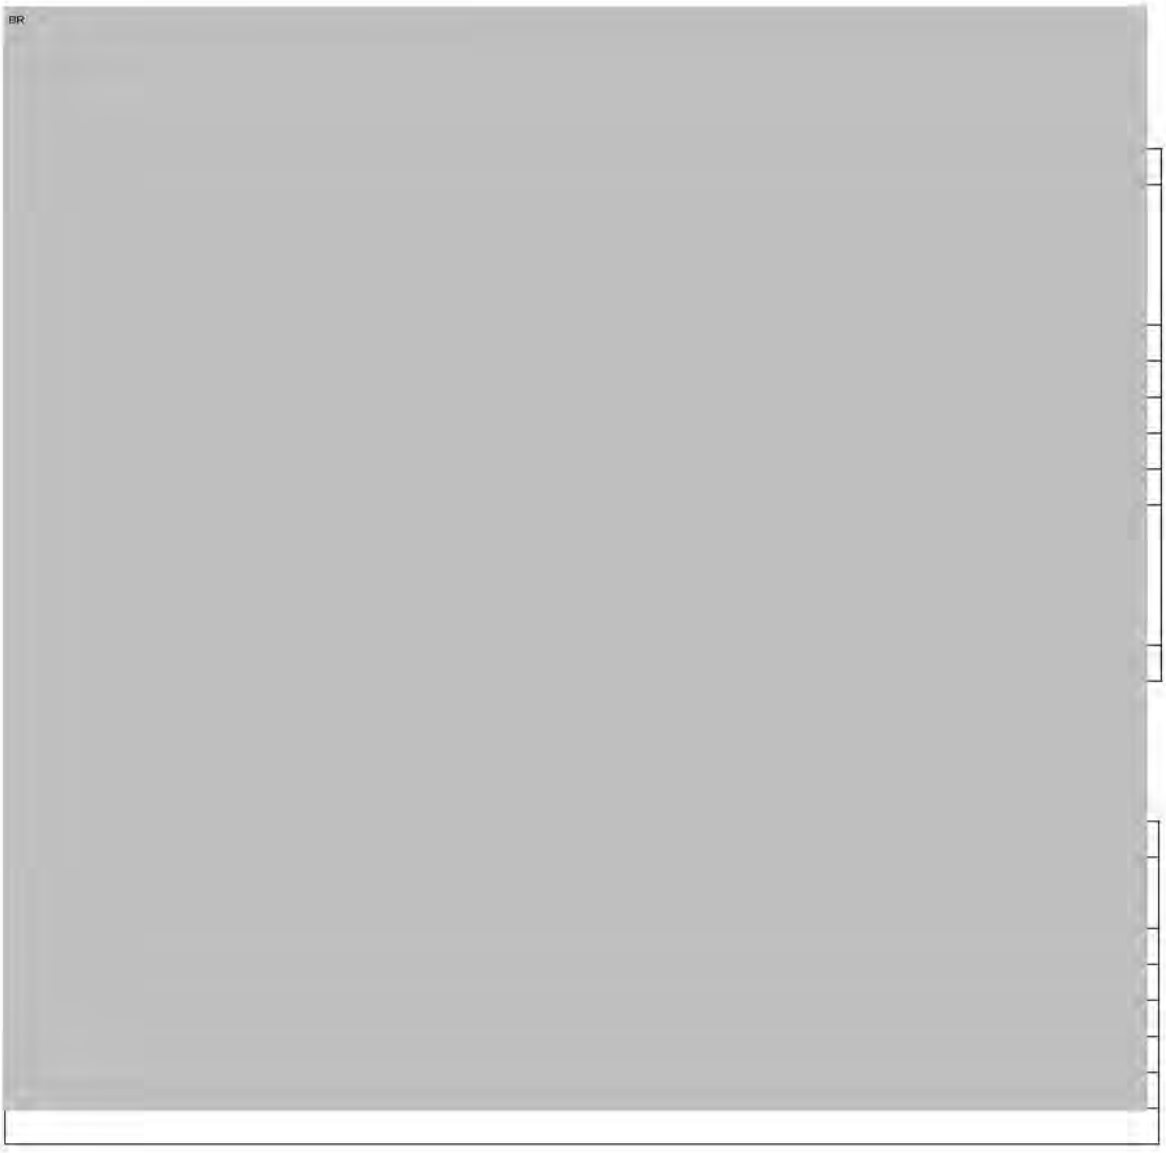

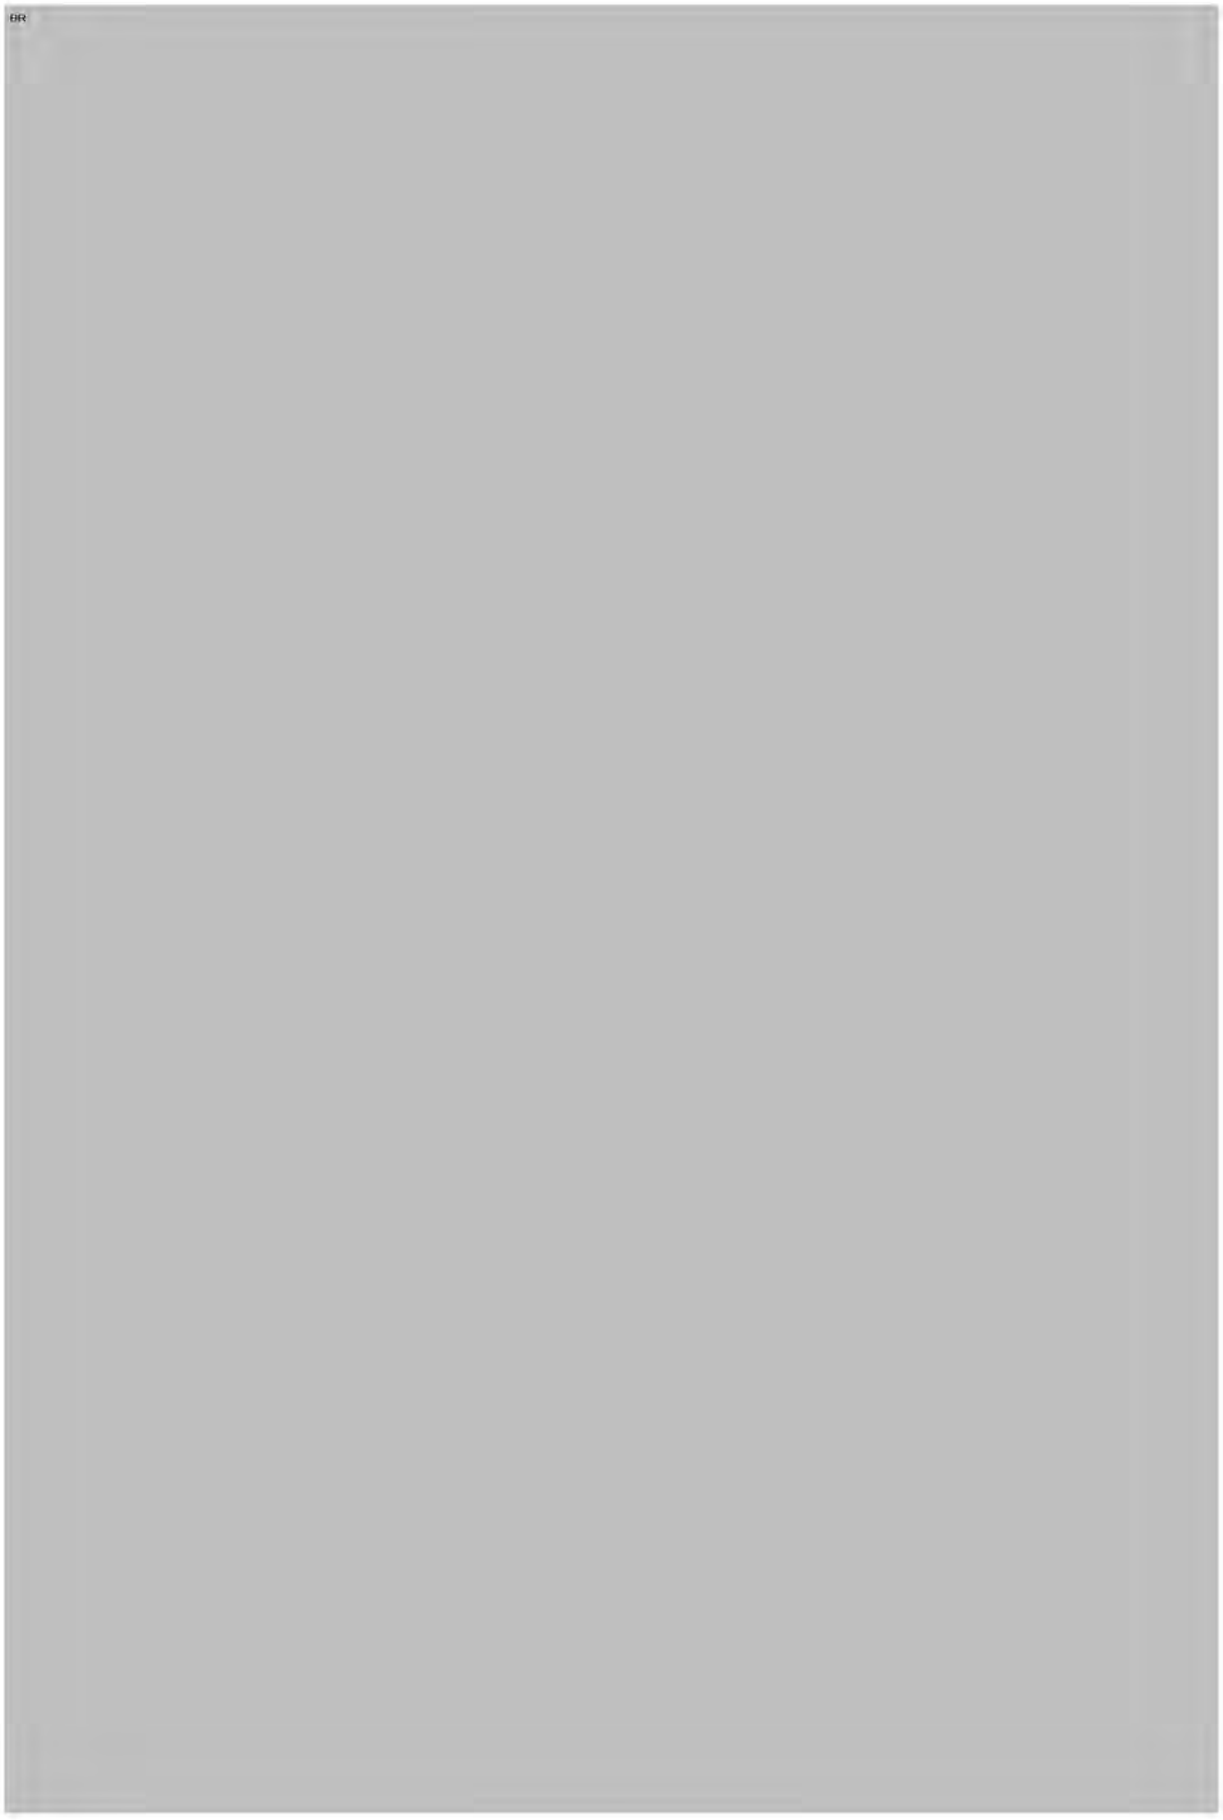
BR

### 5.2.2 Dekkingen

Tabel : Overzicht toegezegde dekkingen Rotterdamsebaan, Euro's prijspeil 2016-2017 (excl. BTW)

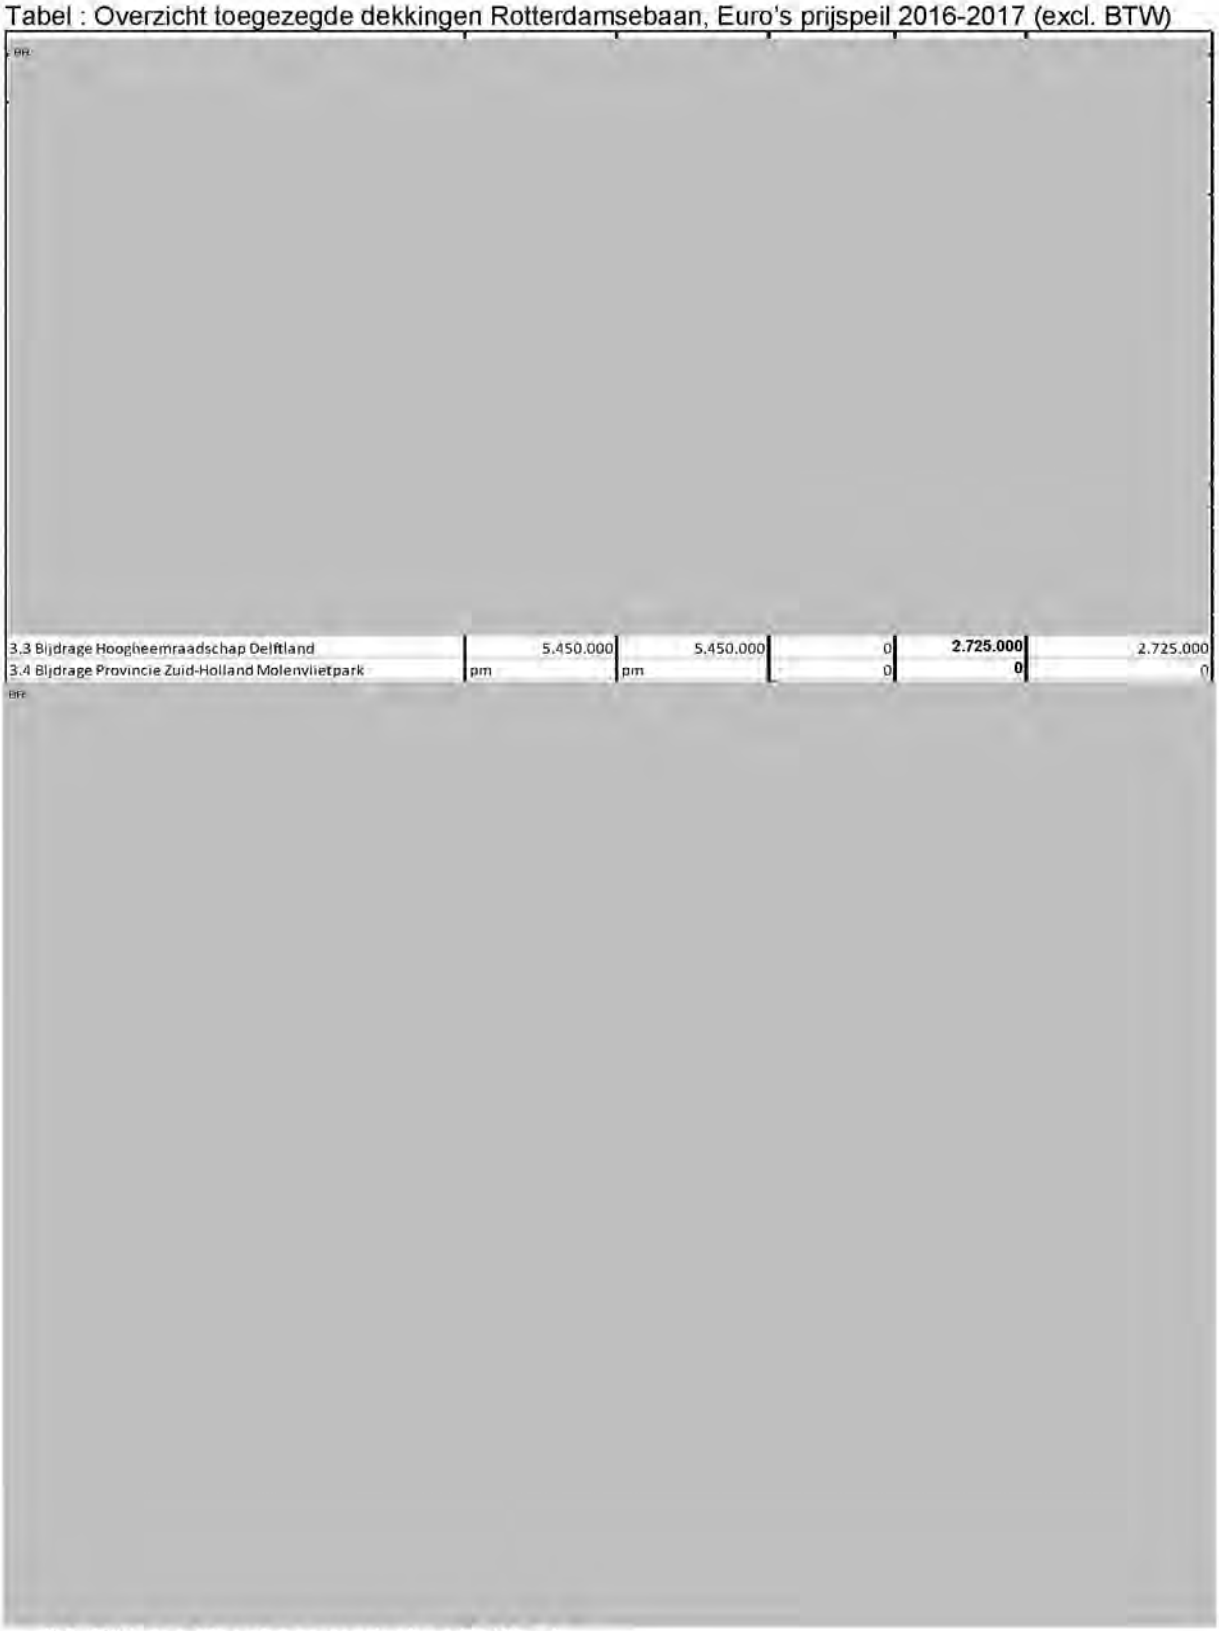

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delftland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | **2.725.000** | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | pm | pm | 0 | **0** | 0 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland
Er zijn in het tweede kwartaal 2018 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland

Er zijn in het tweede kwartaal 2018 geen mutaties geweest. De Landschapstafel is voornemens een subsidiebijdrage voor de inrichting van het Molenvlietpark te leveren. De definitieve beschikking wordt verwacht in het derde kwartaal 2018.

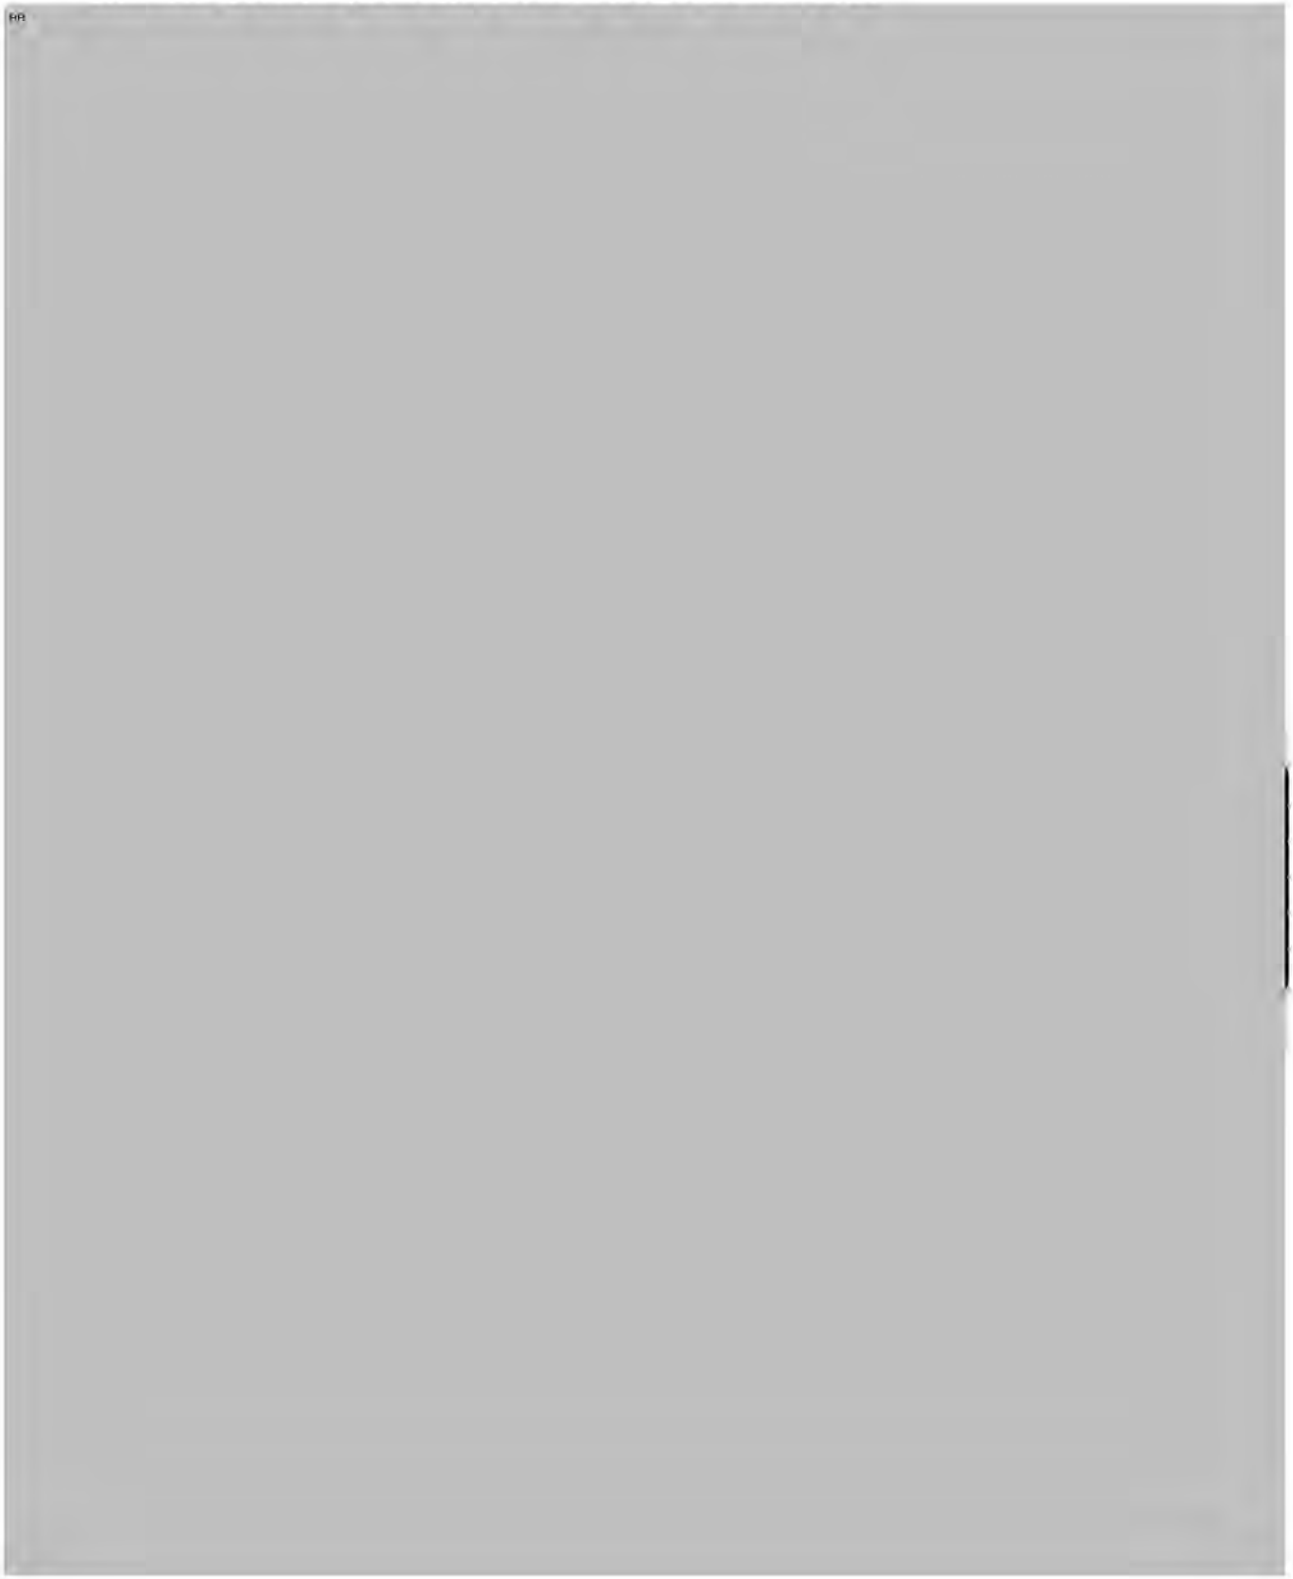

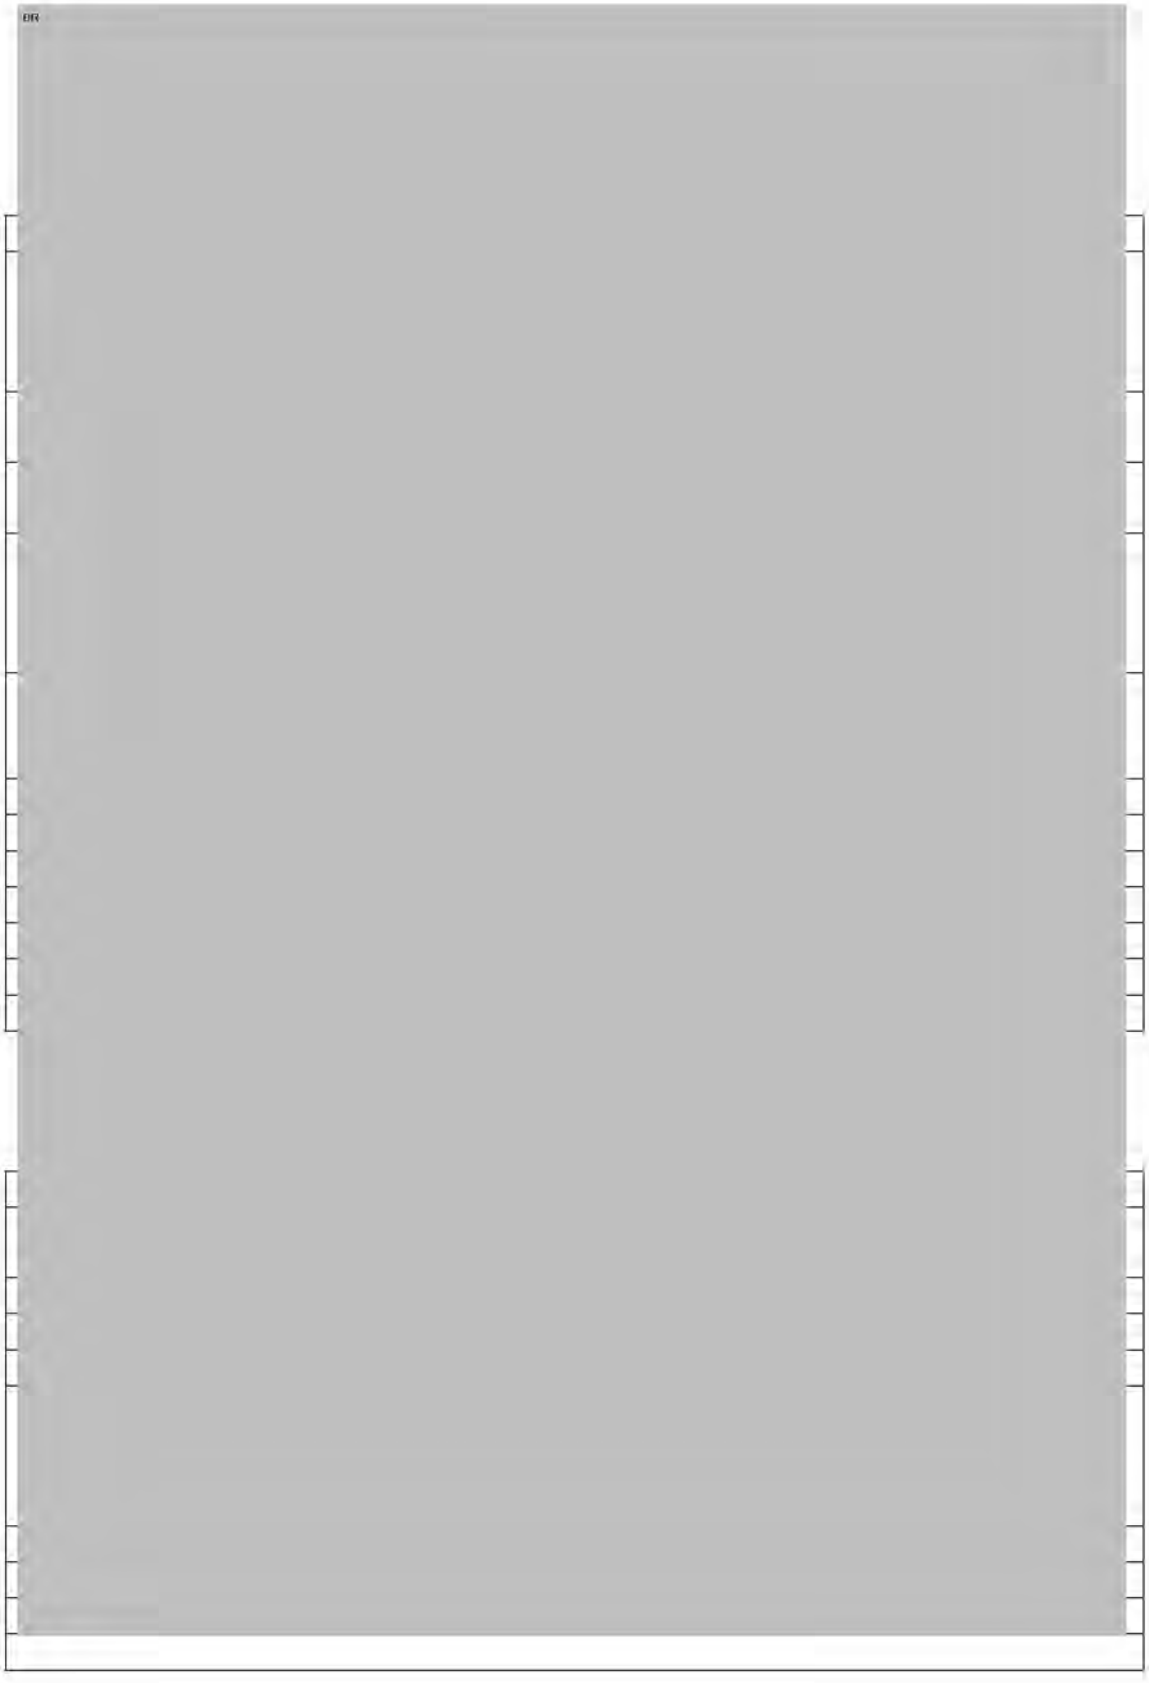

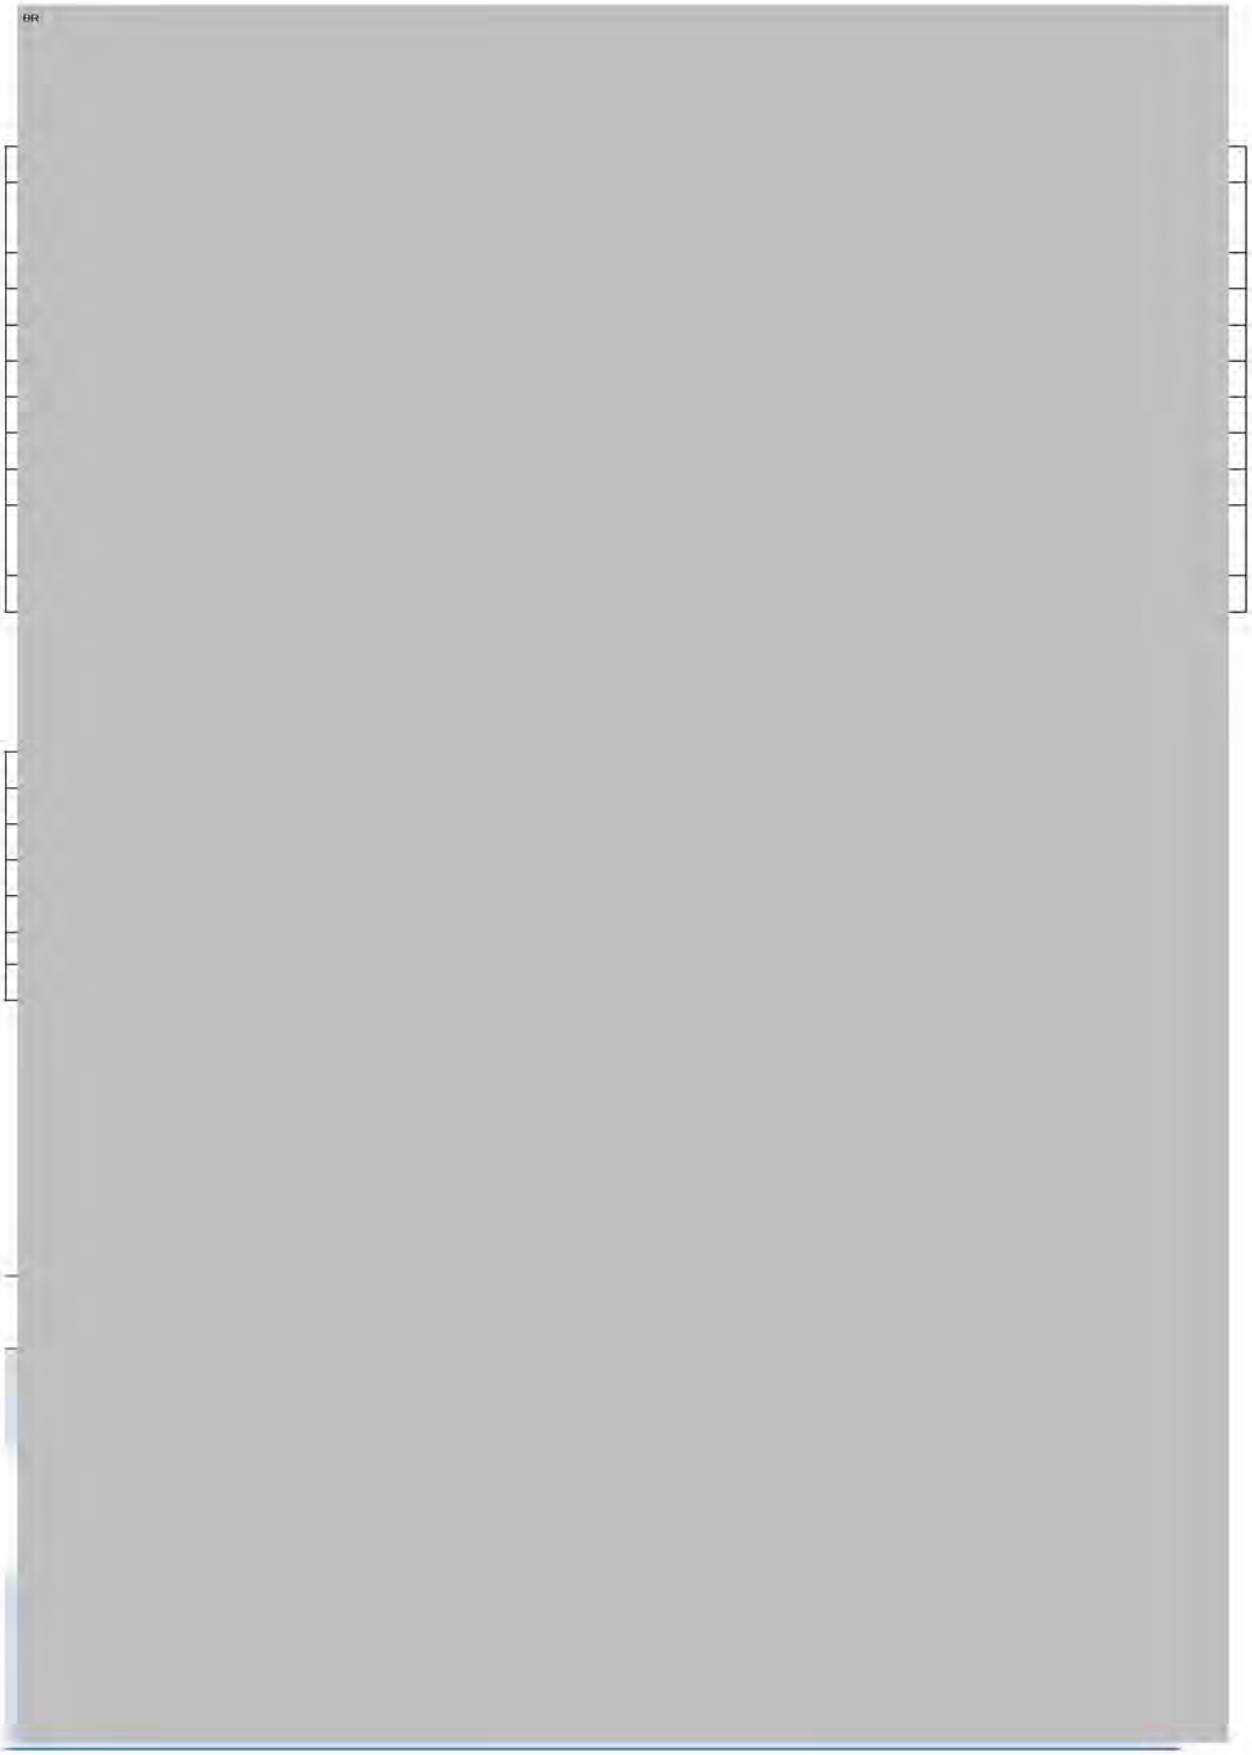

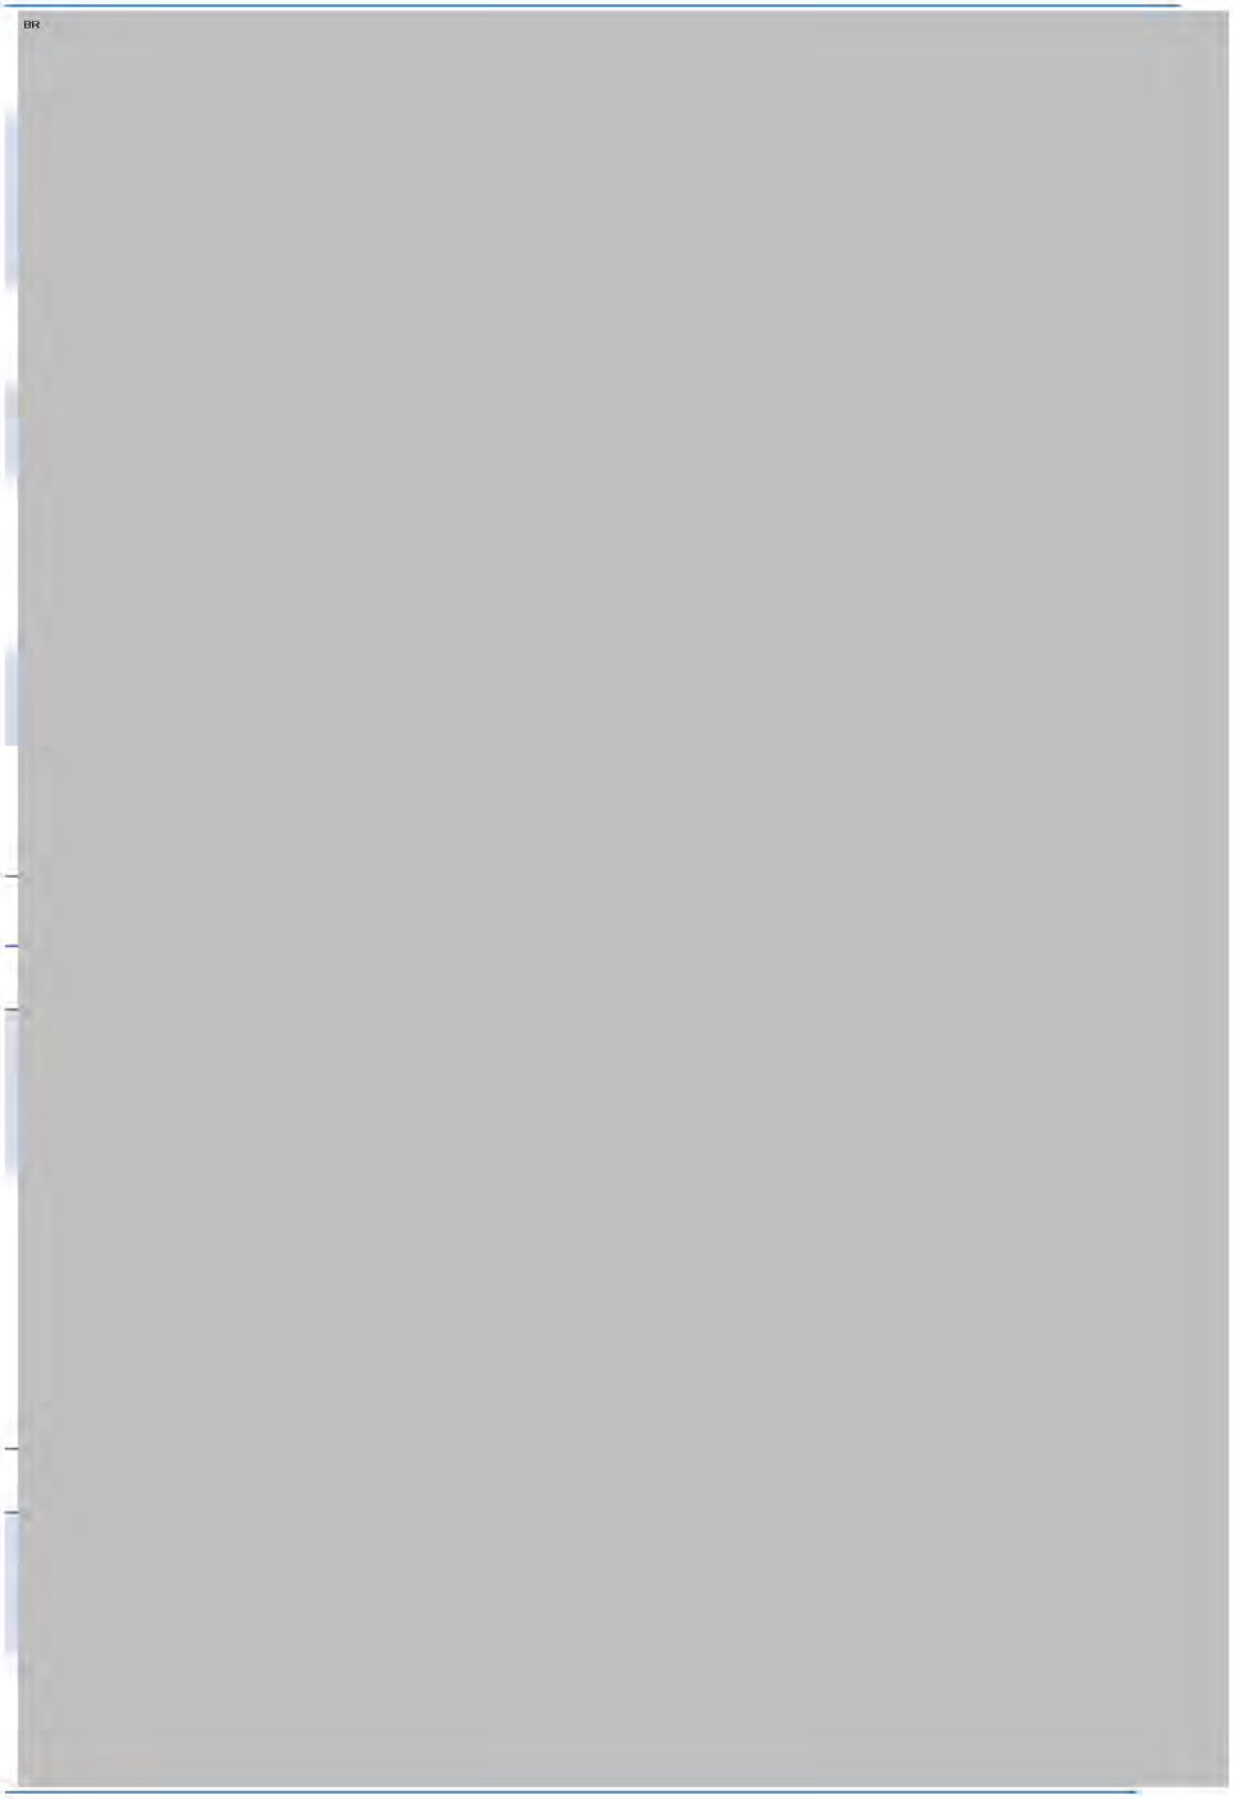
BR

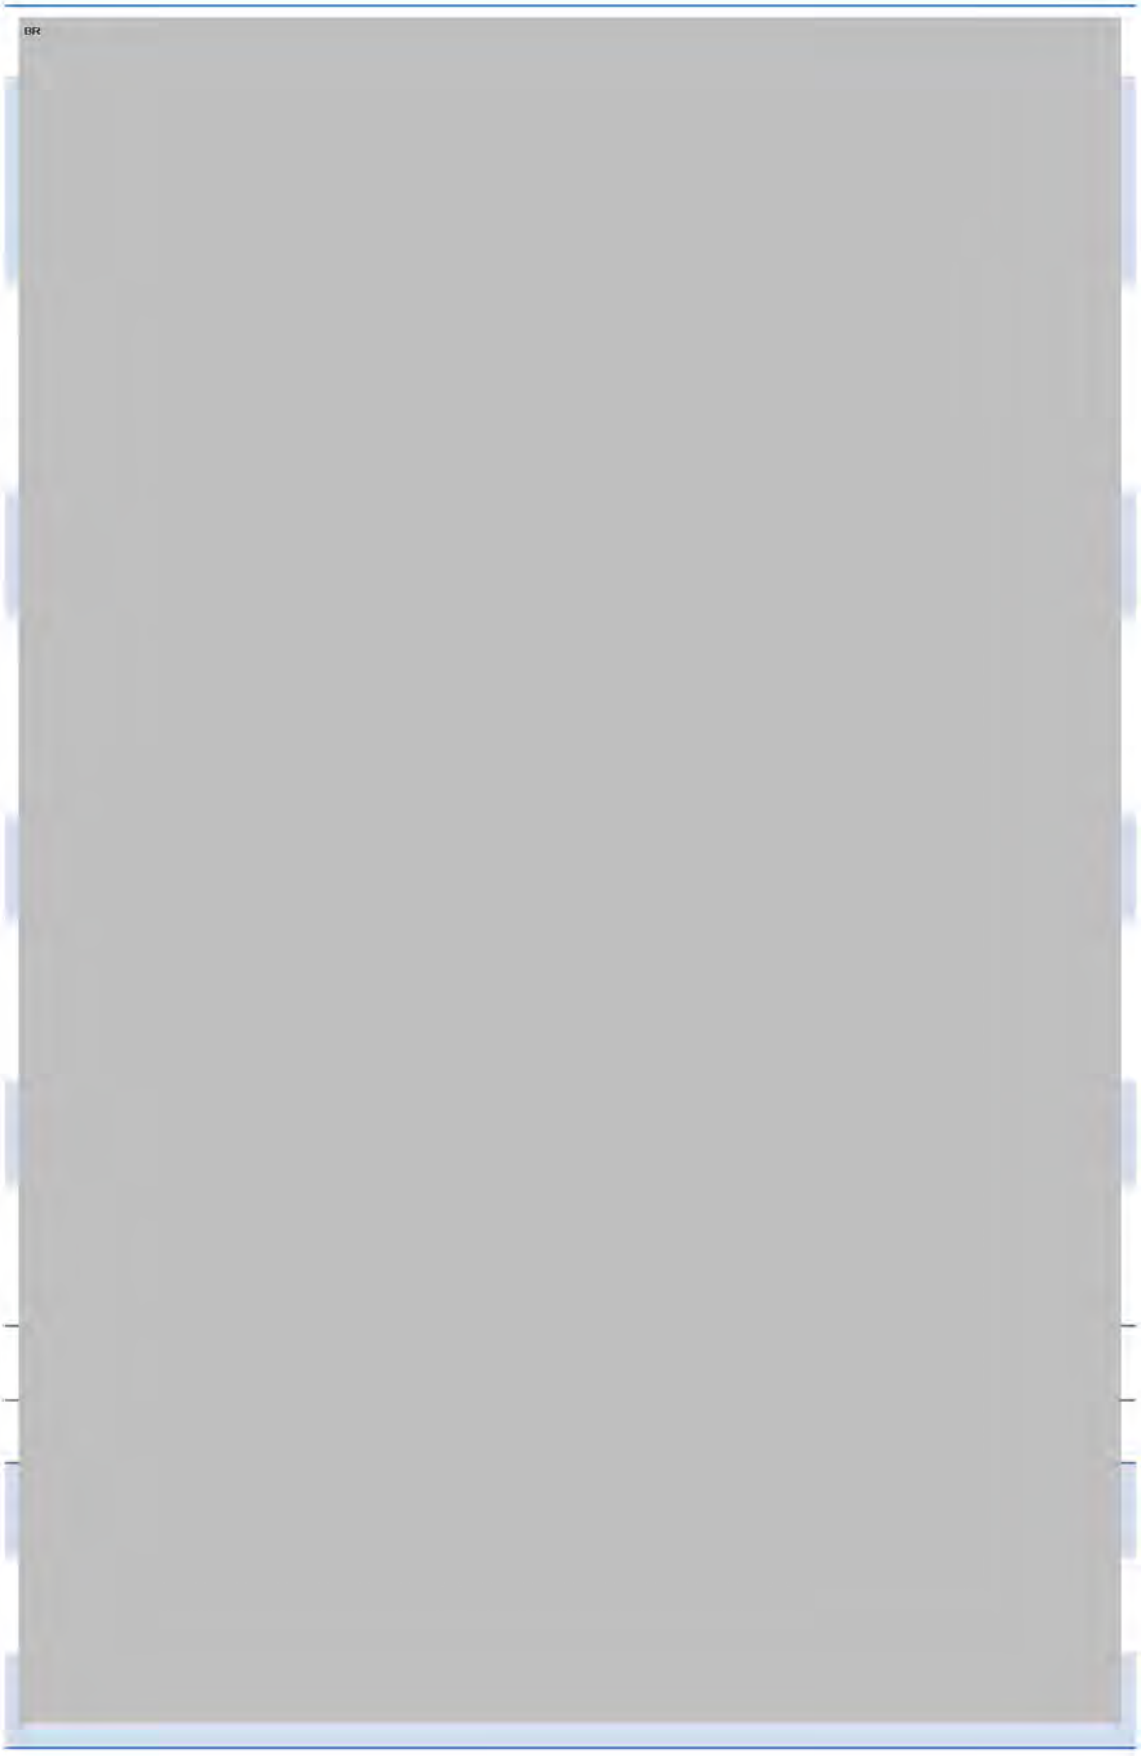
BR

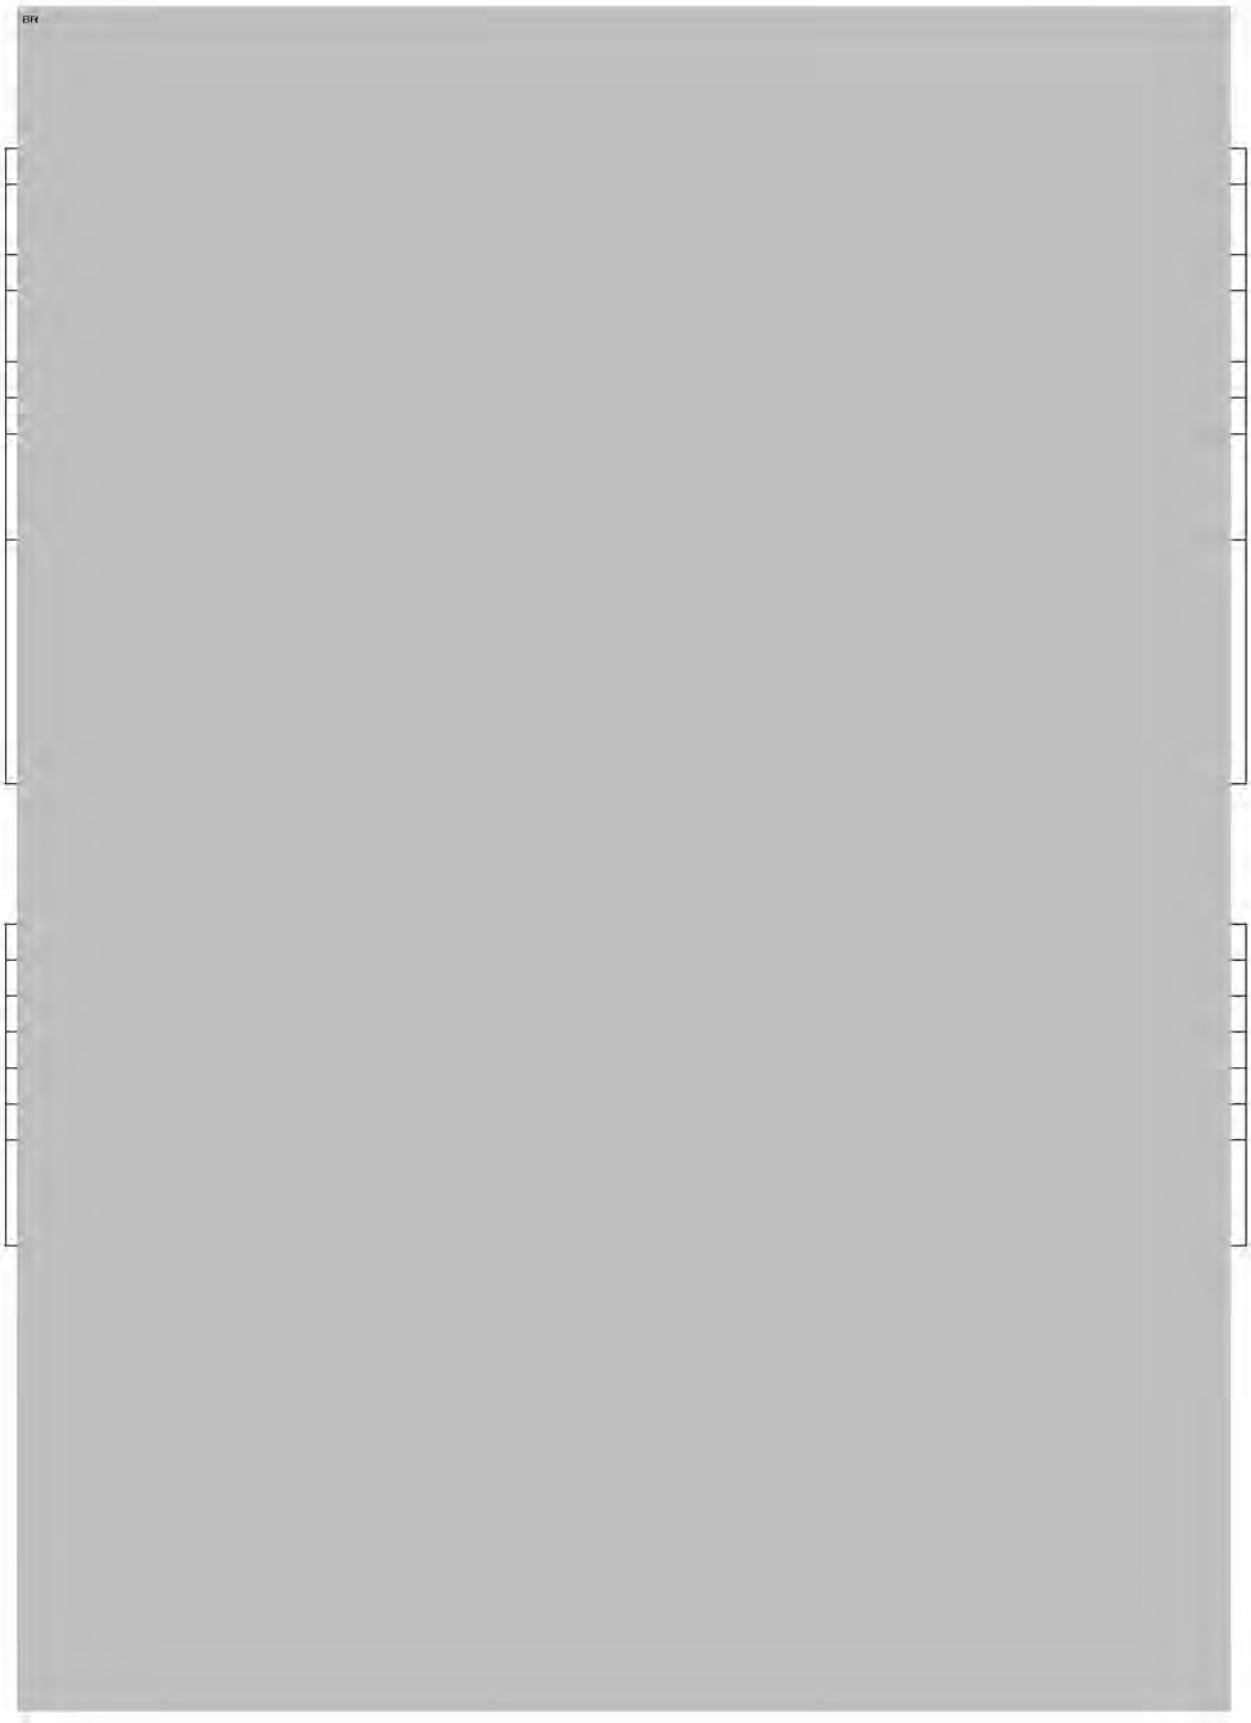

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 30 JUN 2018 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 6-jan-20 | 8 | Gevolg van lagere gemiddelde boorsnelheid bij opstarten boorproces. |
| BR | | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

5.1.2.e

Docnr19

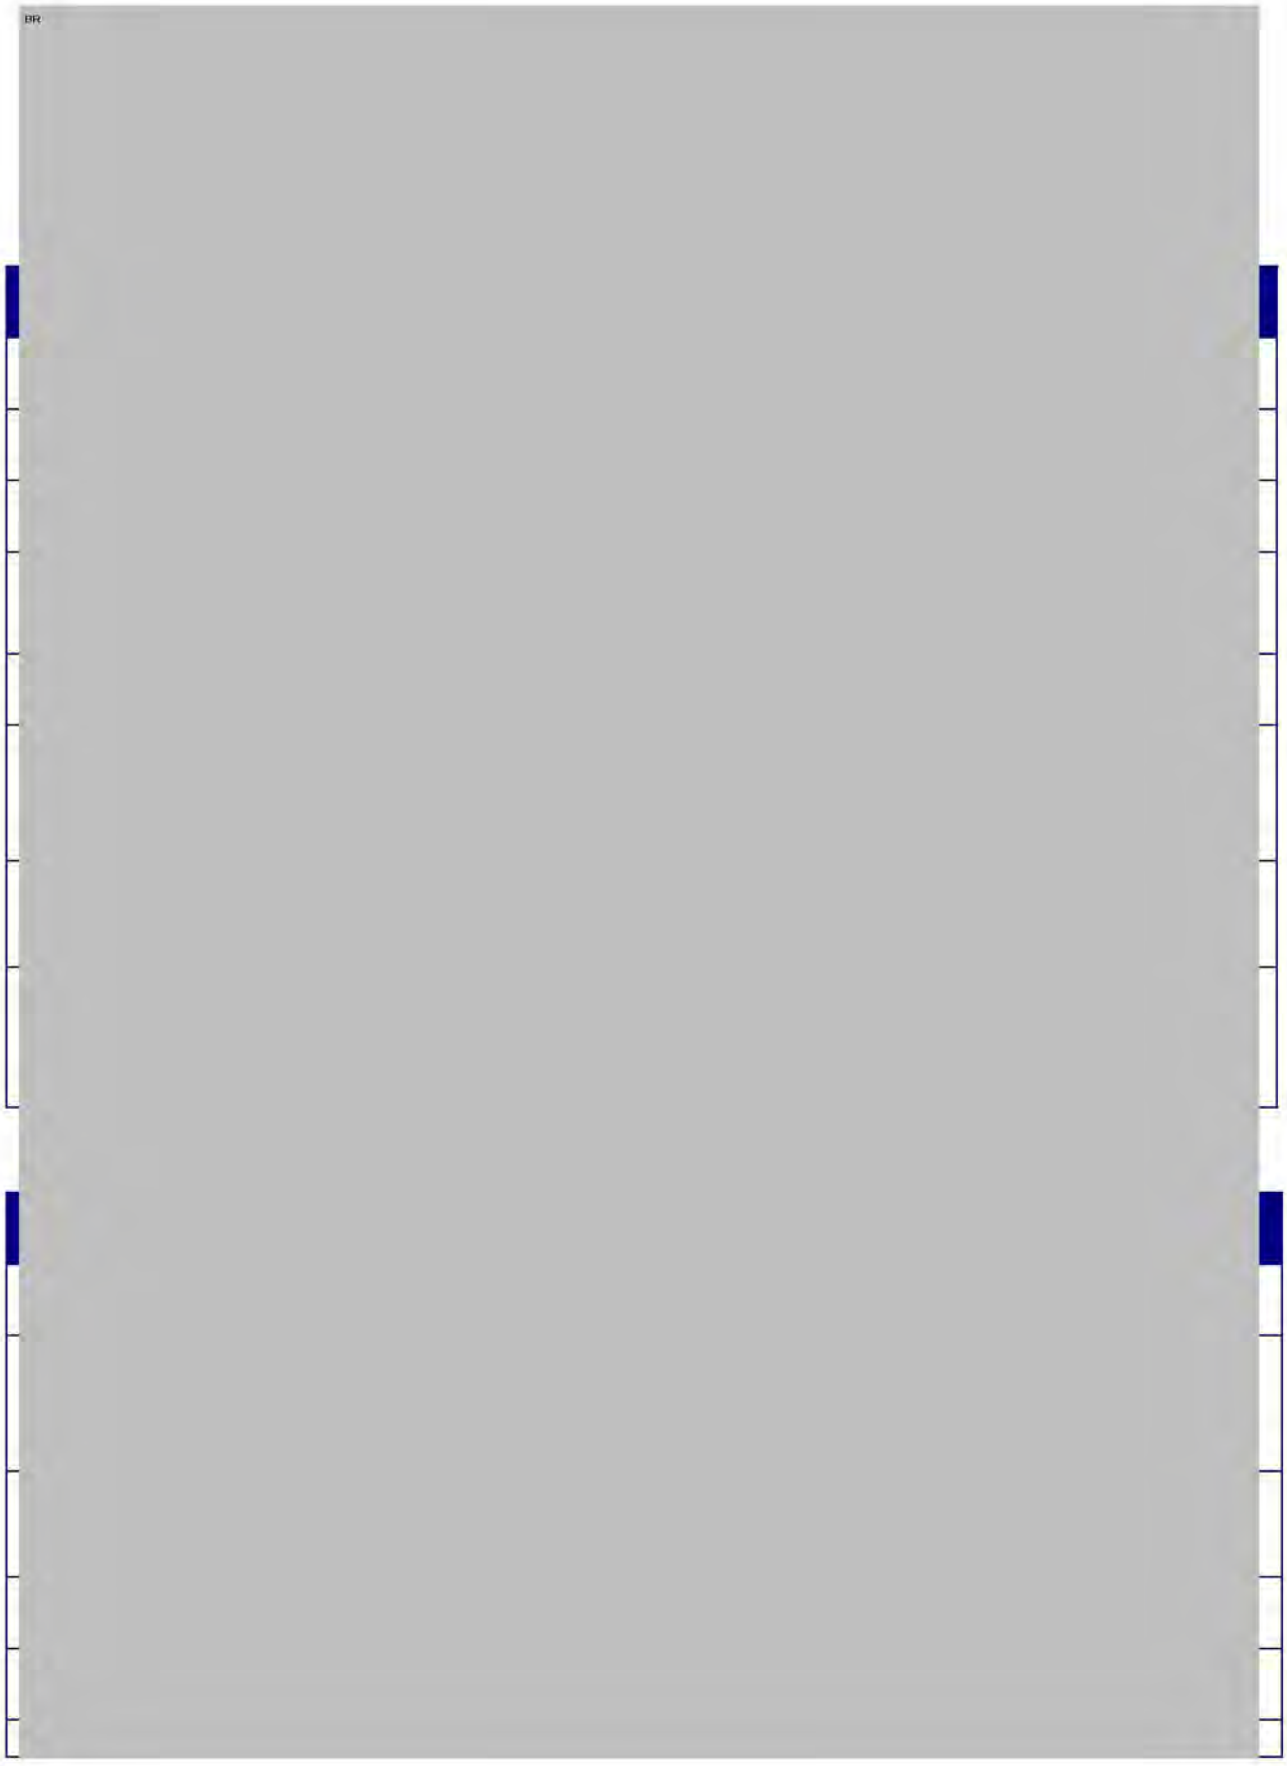
BR

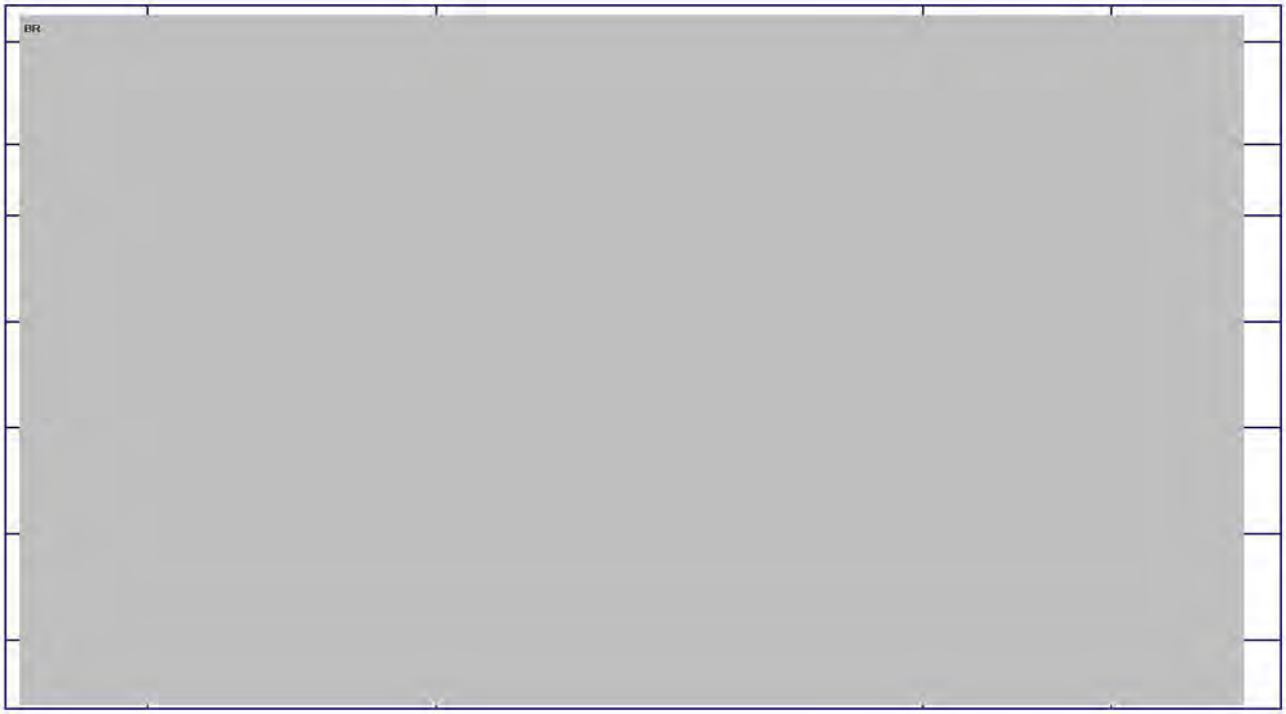
BR

Docnr19



Docnr20

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 3e kwartaal 2018

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 10 oktober 2018**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 1.0**

Docnr20

Docnr20



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 3e kwartaal 2018
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004469

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Aangeboden:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>4 oktober 2018 | Versie 0.1<br>8 oktober 2018 | Versie 1.0<br>10 oktober 2018 | Versie 1.0<br>18 oktober | Versie 1.0<br>2 november 2018 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr20



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

*1.1 Financiën* 6

*1.2 Planning* 7

*1.3 Risico's* 7

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* 8
2.1.1 Afgelopen kwartaal 8
2.1.2 Komende kwartaal 8

*2.2 Planologie en Vergunningen* 9
2.2.1 Afgelopen kwartaal 9
2.2.2 Komende kwartaal 9

*2.3 Verwervingen* 10
2.3.1 Afgelopen kwartaal 10
2.3.2 Komende kwartaal 10

*2.4 Overeenkomsten* 11
2.4.1 Afgelopen kwartaal 11
2.4.2 Komende kwartaal 11

*2.5 Communicatie* 12
2.5.1 Afgelopen kwartaal 12
2.5.2 Komende kwartaal 12
2.5.3 Diversen 13

3 Projectvoortgang 14

*3.1 Aanbesteden en contracteren* 14
3.1.1 Afgelopen kwartaal 14
3.1.2 Komende kwartaal 14

*3.2 Vormgeving* 15
3.2.1 Afgelopen kwartaal 15
3.2.2 Komende kwartaal 15

*3.3 Monitoring* 16
3.3.1 Afgelopen kwartaal 16
3.3.2 Komende kwartaal 16

*3.4 Inpassing Binckhorst* 17
3.4.1 Afgelopen kwartaal 17
3.4.2 Komende kwartaal 17

*3.5 Inpassing Vlietzone* 18
3.5.1 Afgelopen kwartaal 18
3.5.2 Komende kwartaal 18

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* 19
3.6.1 Afgelopen kwartaal 19
3.6.2 Komende kwartaal 19

*3.7 Boortunnel en toeritten* 20

Docnr20




3.7.1 Afgelopen kwartaal 20
3.7.2 Komende kwartaal 21

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *23*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 23
3.8.2 Komende kwartaal 24

*3.9 Installaties* *25*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 25
3.9.2 Komende kwartaal 25

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *26*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 26
3.10.2 Komende kwartaal 26

*3.11 Bediencentrale* *27*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 27
3.11.2 Komende kwartaal 28

*3.12 Uitvoeringskwaliteit* *29*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 29
3.12.2 Komende kwartaal 29

*3.13 Contractmanagement* *30*
3.13.1 Afgelopen kwartaal 30
3.13.2 Komende kwartaal 30

**4 Overdracht en openstelling** **31**

*4.1 Tunnelveiligheid* *31*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 31
4.1.2 Komende kwartaal 31

*4.2 Overdracht aan beheerders* *32*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 32
4.2.2 Komende kwartaal 32

*4.3 Beheer en onderhoud* *33*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 33
4.3.2 Komende kwartaal 33

**5 Projectbeheersing** **34**

*5.1 Scope* *34*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 34
5.1.2 Komende kwartaal 34

*5.2 Financien* *35*
5.2.1 Kostenstructuur 35
5.2.2 Dekkingen 36

*5.3 Planning* *38*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 38
5.3.2 Komende kwartaal 38

*5.4 Risico's* *39*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 39
5.4.2 Komende kwartaal 39
5.4.3 Financiële toprisico's 39

Docnr20



5.4.4 Toprisico's planning 40

*5.5 Interne kwaliteit* *42*

5.5.1 Afgelopen kwartaal 42

5.5.2 Komende kwartaal 42

*5.6 Informatiebeheer* *43*

5.6.1 Afgelopen kwartaal 43

5.6.2 Komende kwartaal 43

5.6.3 Kennisdeling 43

*5.7 Organisatie* *44*

5.7.1 Afgelopen kwartaal 44

5.7.2 Komende kwartaal 44

**6 Bijlage: Planningsmijlpalen 45**

**7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 46**

**8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 48**

# 1 Managementsamenvatting

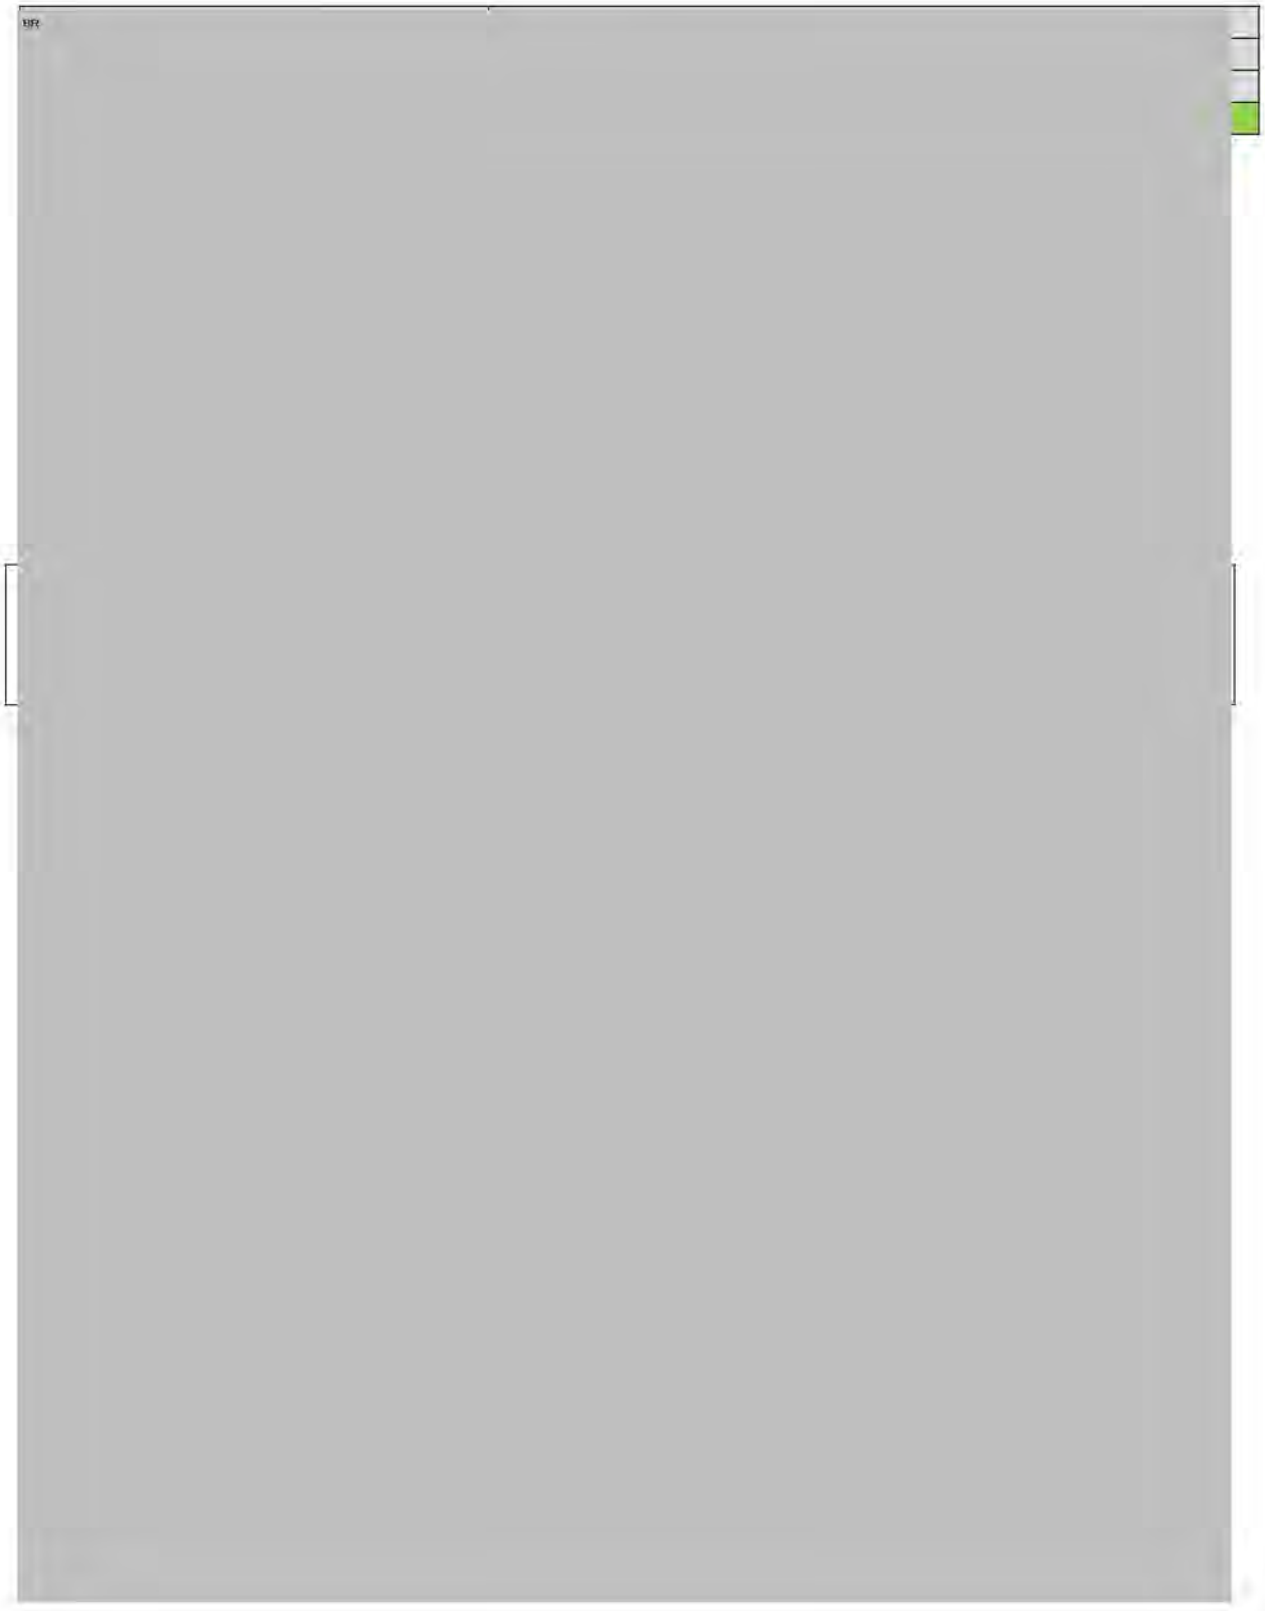

## 5. VERWACHTING KOMEND KWARTAAL

Komende kwartaal wordt er onder andere gewerkt aan:

- Het Hoogheemraadschap van Delfland zal de projectplanprocedure starten ter realisatie van de tweede toevoer vanuit de Vliet naar het Molenvlietpark;

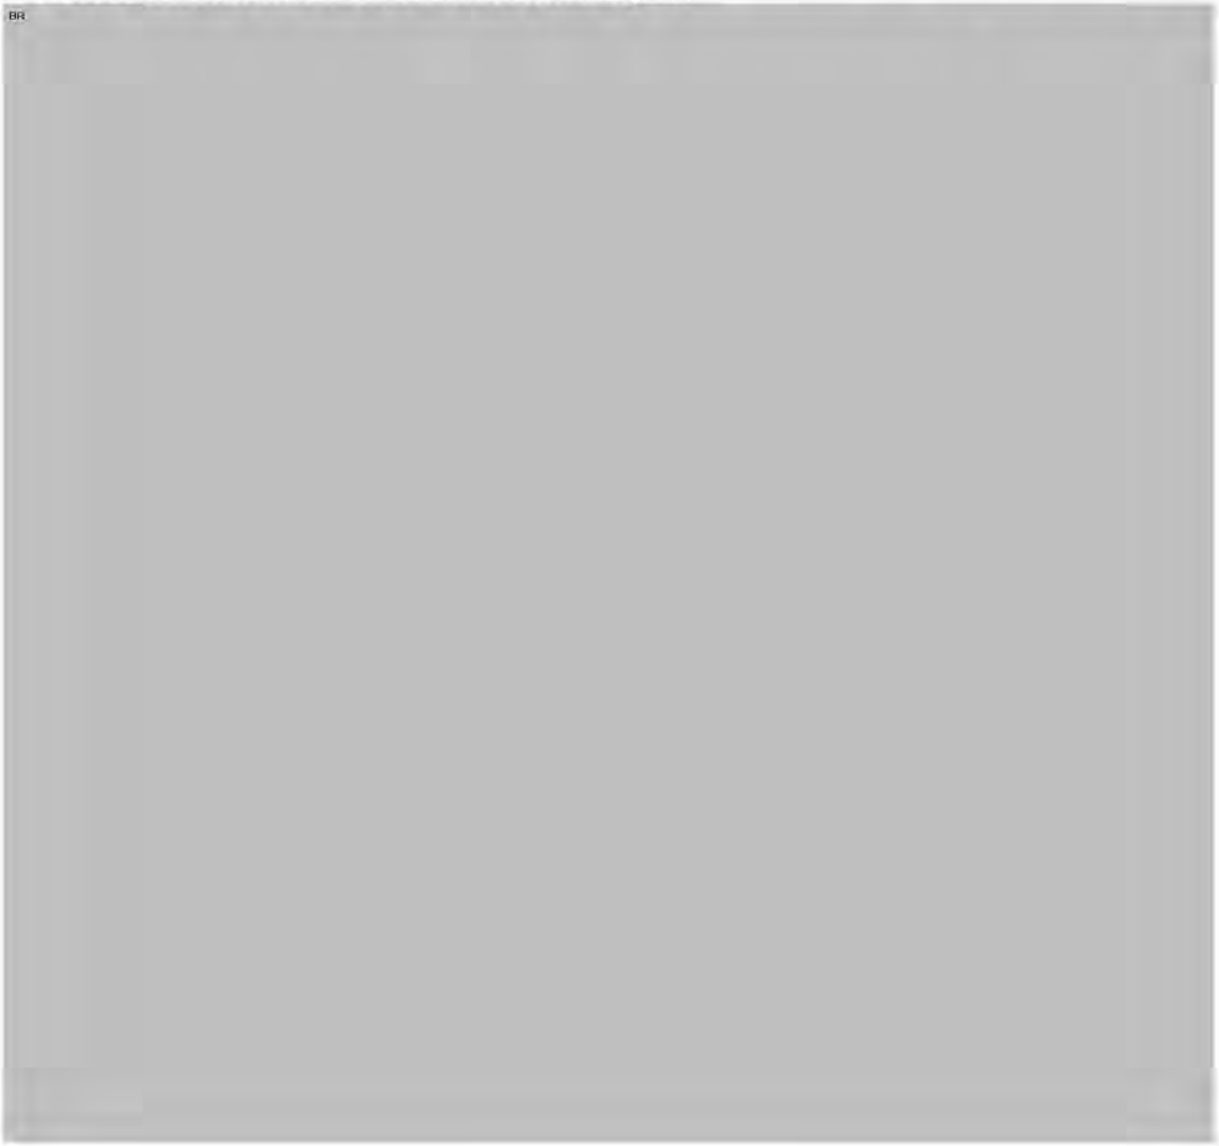

BR

Docnr20



# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

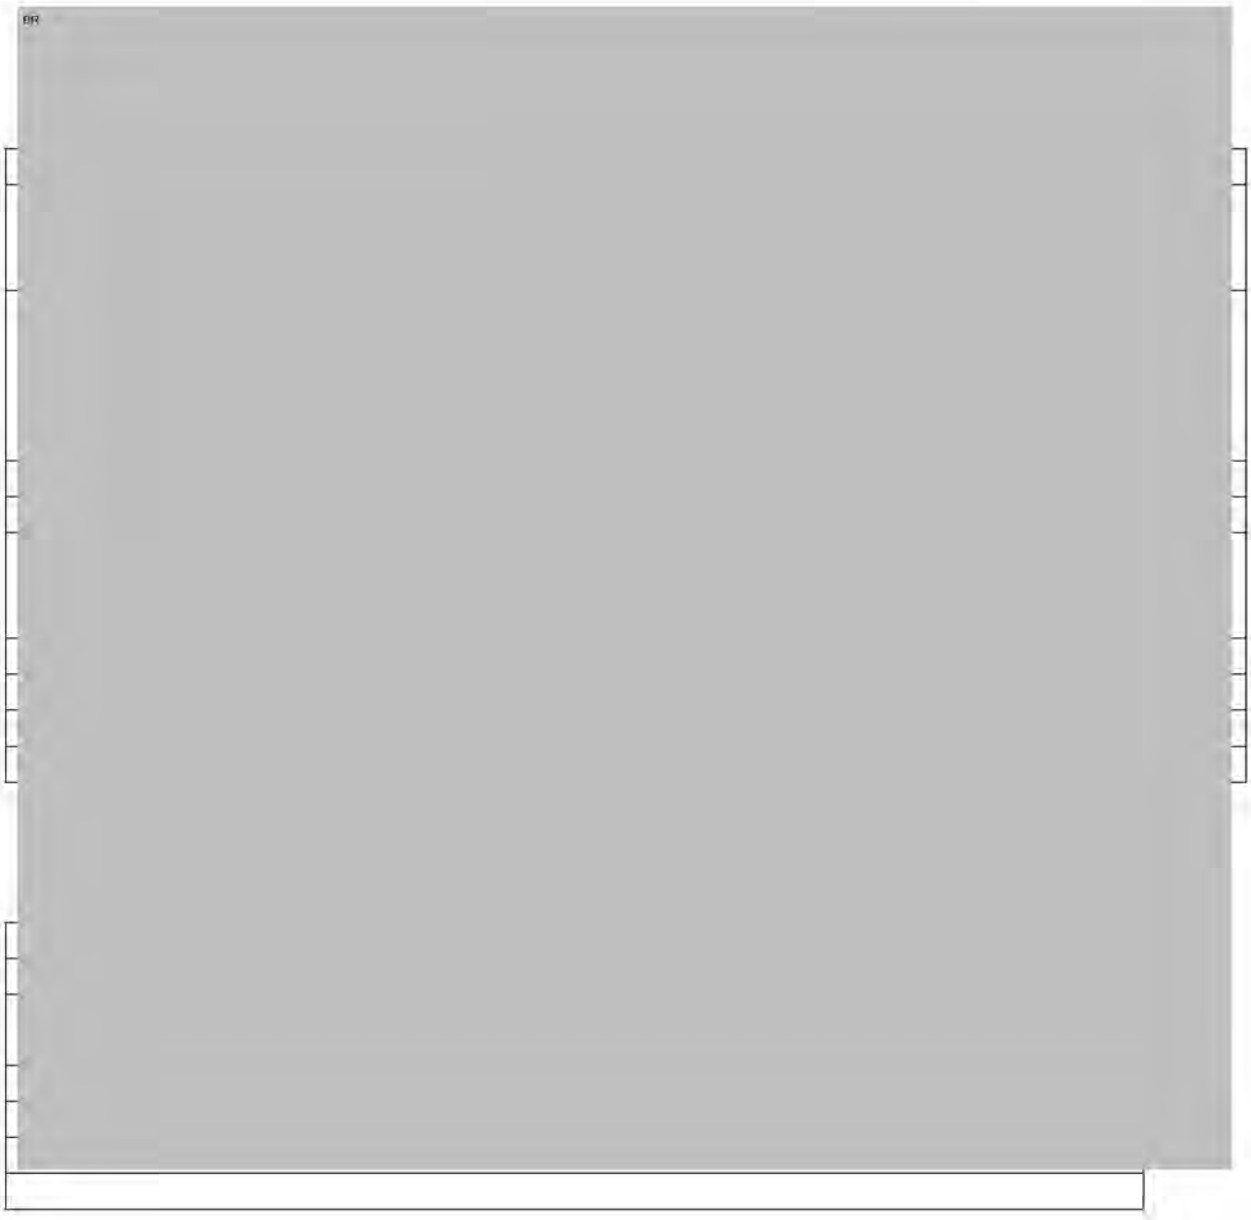

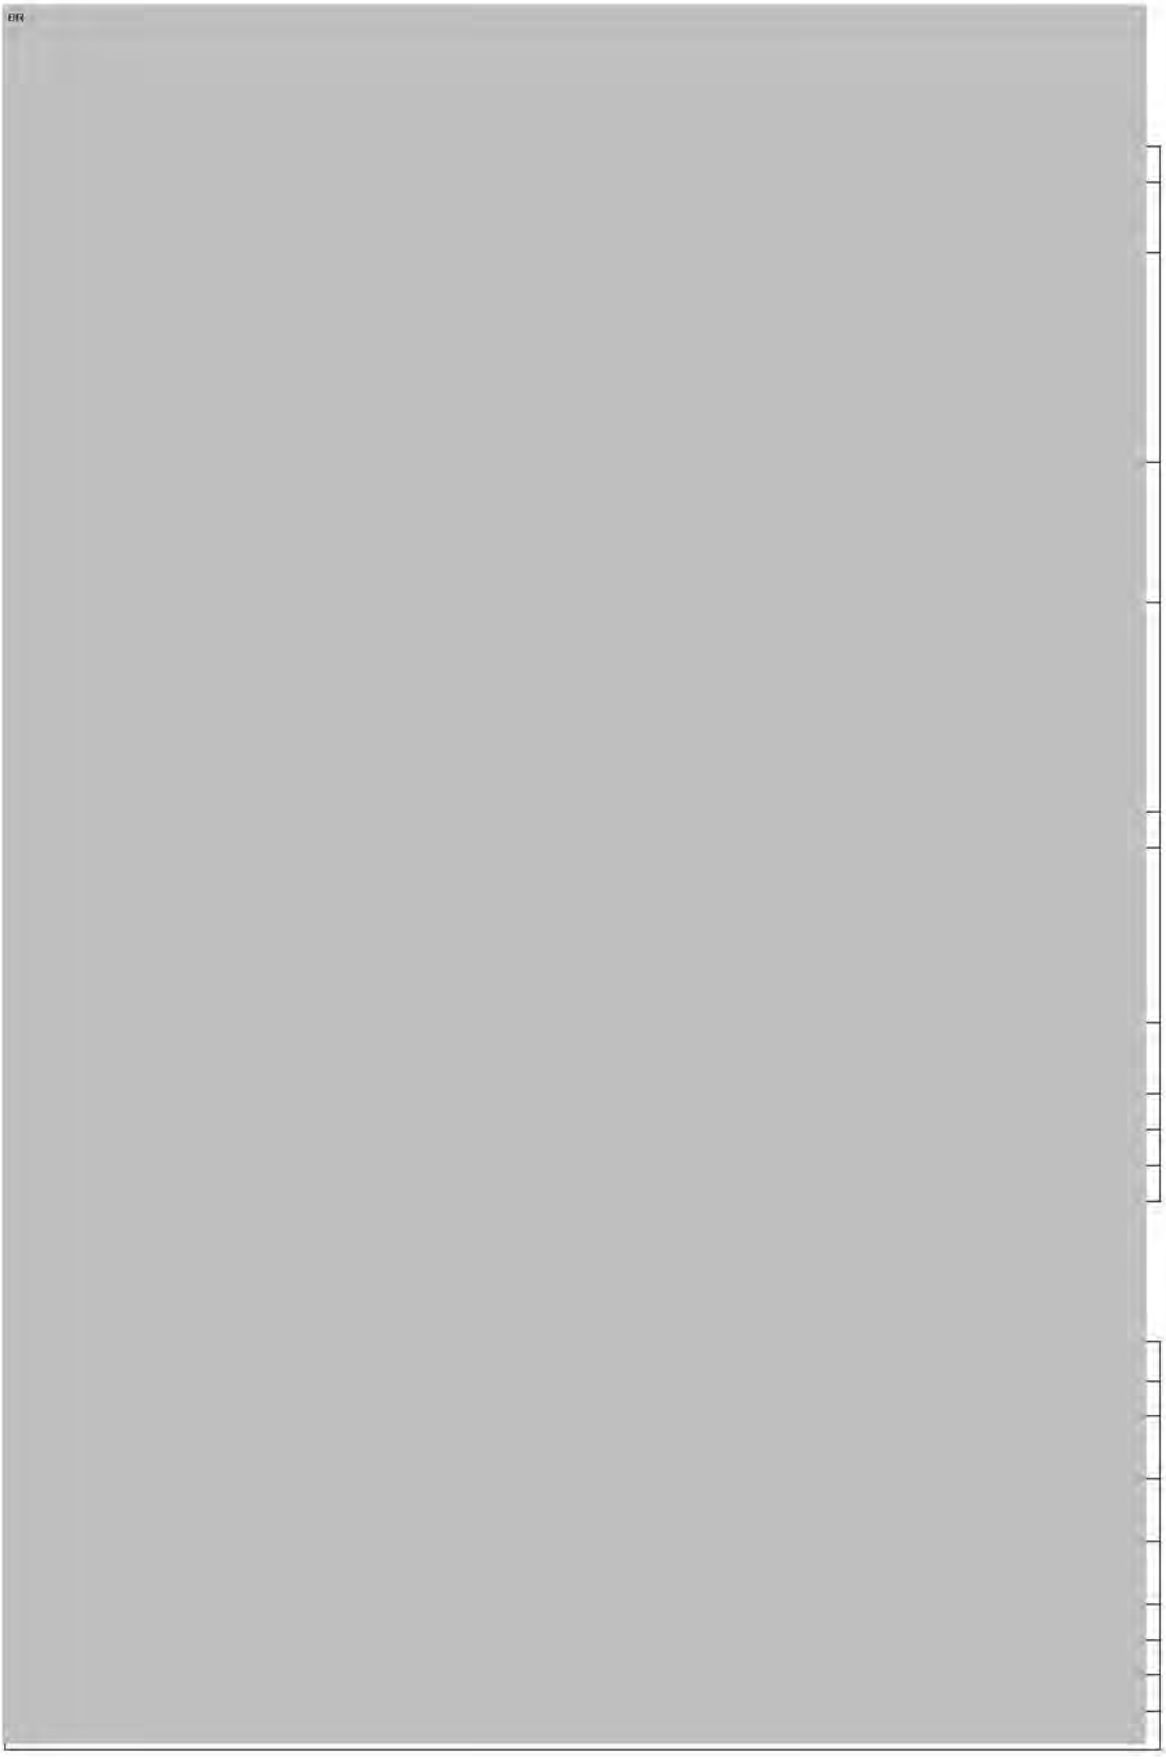
BR

## 2.3 Verwervingen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Koopovereenkomst met voorwaarden opstellen t.b.v. eigenaar van het pand aan de Jan Thijssenweg 8 te Den Haag voor de verkoop van een stuk grond t.b.v. landschappelijke inpassing en afspraken omtrent o.a. verplaatsing inrit en aanleg drainage. | Concept verkoopovereenkomst is aan de eigenaar van het pand Jan Thijssenweg 8 voorgelegd. Begin vierde kwartaal zal een overleg plaatsvinden met de eigenaar over de koopovereenkomst. |
| | |
| [redacted] | |
| Overleg met de eigenaar van Jan Thijssenweg 8 over de verkoopovereenkomst. | |
| [redacted] | |

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Samenwerkingsovereenkomst opstellen en formaliseren t.b.v. de tweede watertoevoer via het particuliere perceel. | Er is grotendeels overeenstemming over de samenwerkingsovereenkomst. Begin vierde kwartaal staat een gesprek gepland om overeenstemming te bereiken over de laatste openstaande punten. Naar verwachting kan deze overeenkomst en de daarbij behorende notariële akte spoedig hierna worden afgerond. |
| Overeenstemming bereiken over inhoud samenwerkingsovereenkomst met Provincie t.a.v. vervanging oeverconstructie. | Er wordt met de provincie Zuid Holland nog samengewerkt aan de SOK Zuid Holland. |
| | |
| [redacted] | |

| Geplande besluiten | Genomen besluiten |
|---|---|
| Indien inhoudelijke overeenstemming wordt bereikt over de op te stellen samenwerkingsovereenkomsten en de koopovereenkomst t.g.v. grondverkoop voor de Jan Thijssenweg 8 te Den Haag, dan zullen deze ter besluitvorming worden voorgelegd aan desbetreffende functionarissen. | Geen |
| | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Samenwerkingsovereenkomst opstellen en formaliseren t.b.v. de tweede watertoevoer via het particuliere perceel. |
| Overeenstemming over inhoud samenwerkingsovereenkomst met Provincie t.a.v. vervanging oeverconstructie. |
| [redacted] |
| |

## 2.5 Communicatie

### 2.5.1 Afgelopen kwartaal

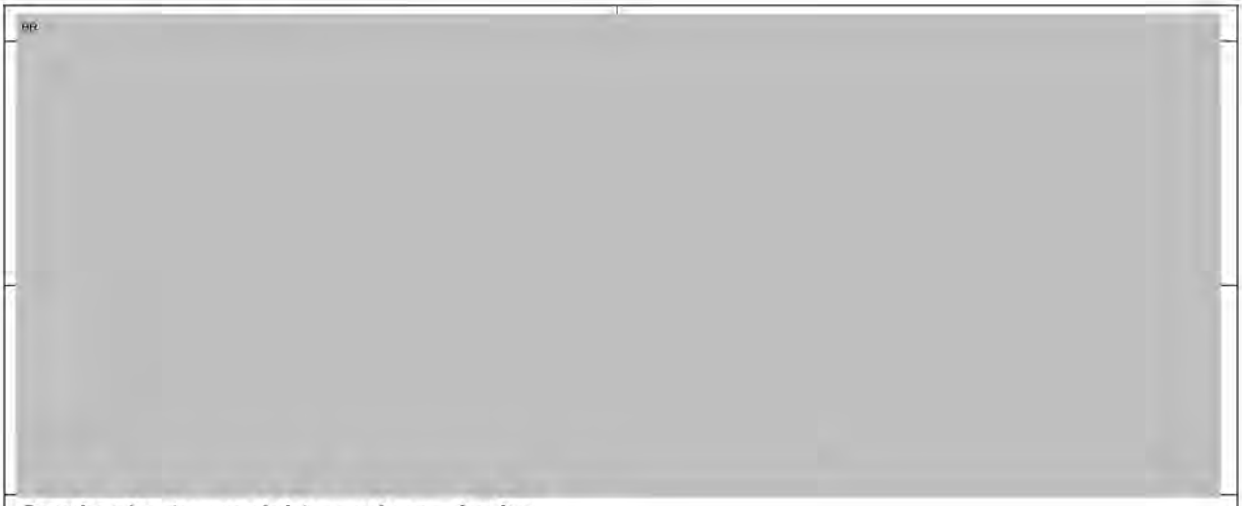

**Overige / extra verrichte werkzaamheden**

Begin juli werd een eerste informatiebijeenkomst gehouden over de aanleg van de tweede toevoer voor de waterberging in het Molenvlietpark. De bijeenkomst was drukbezocht, met name door bewoners en ondernemers uit omgeving Westvlietweg.

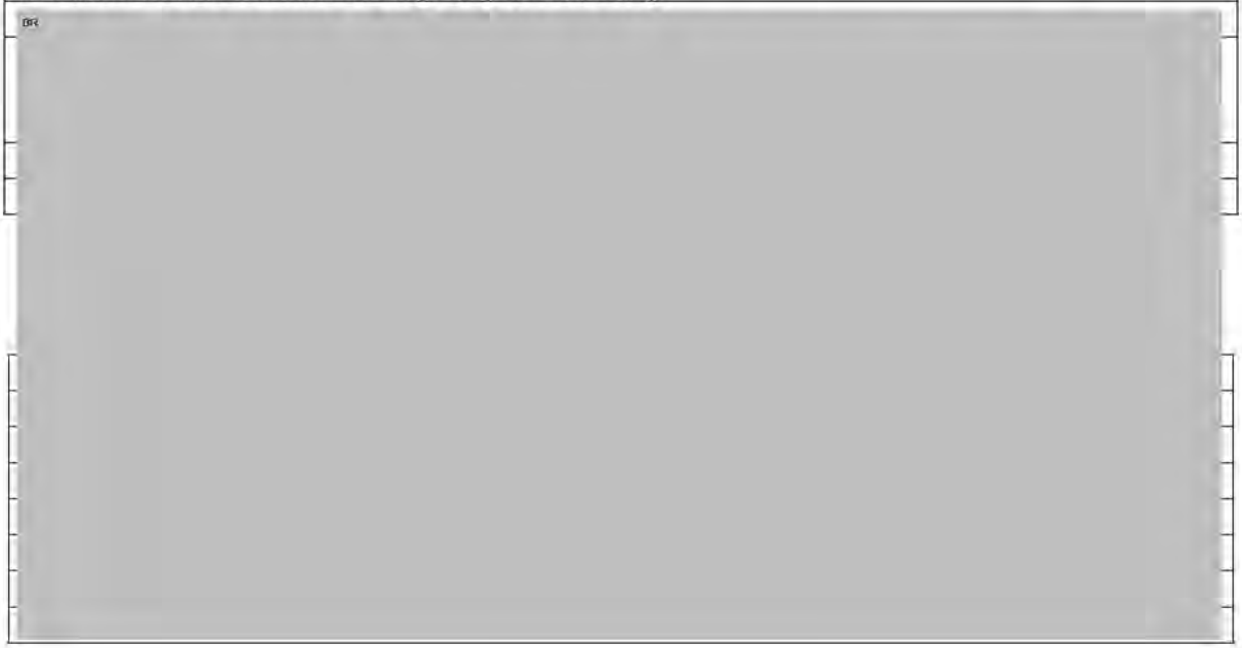

BR

# 3 Projectvoortgang

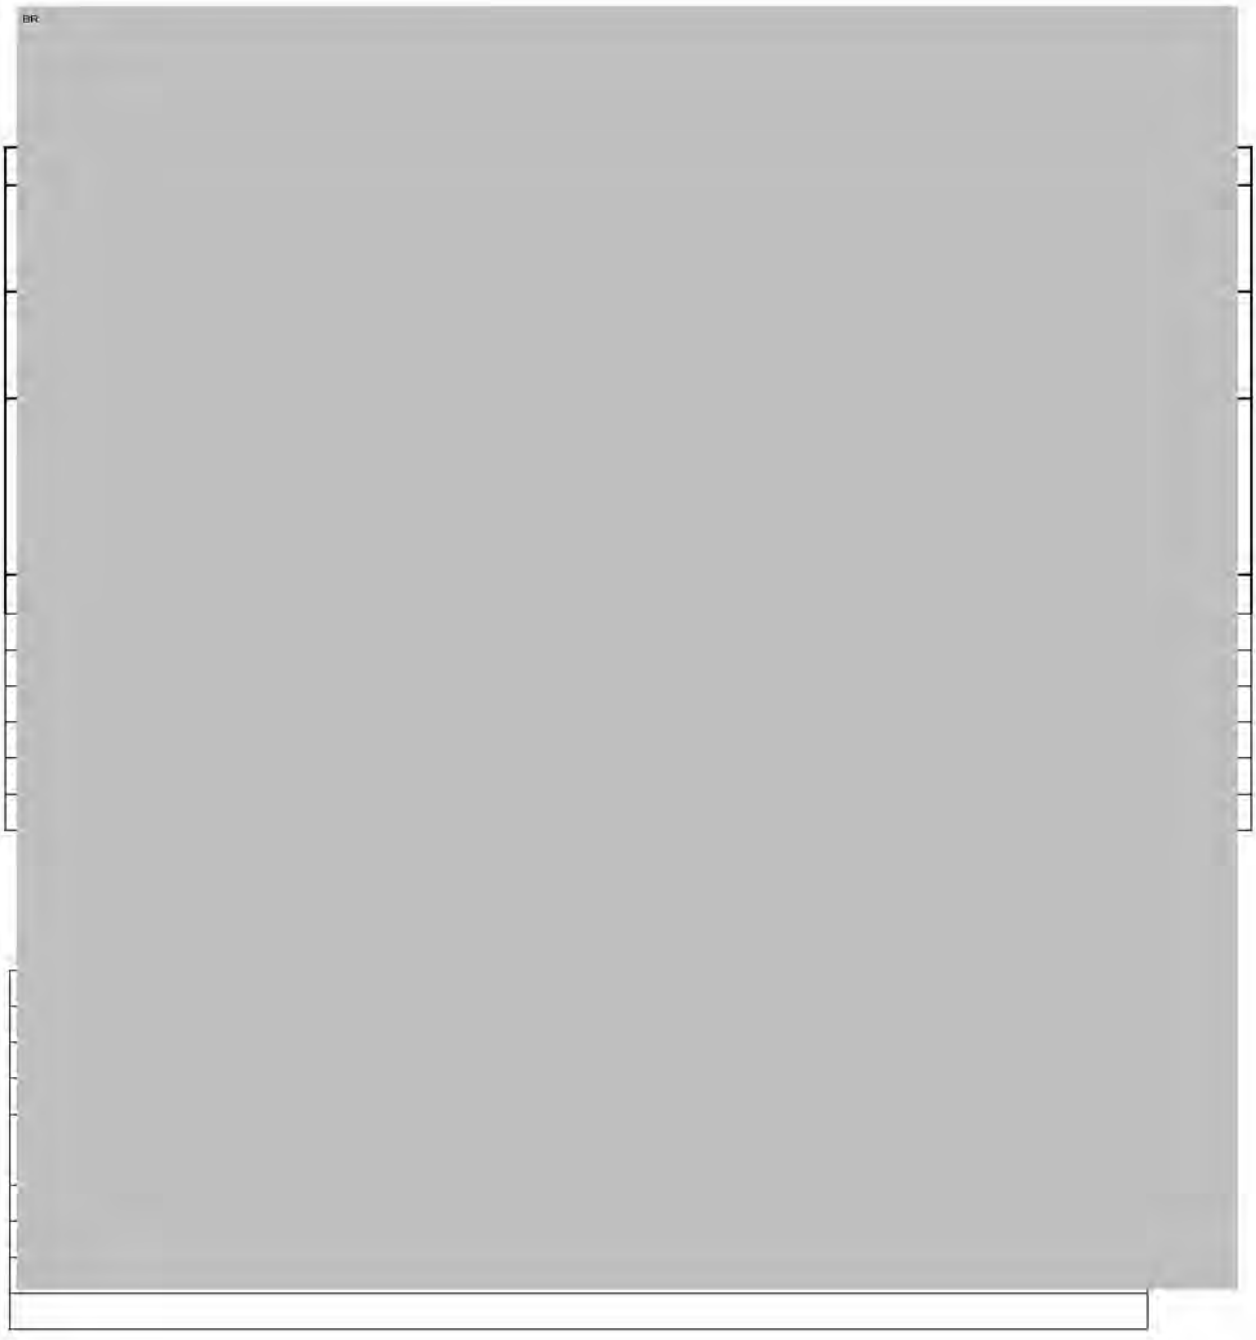

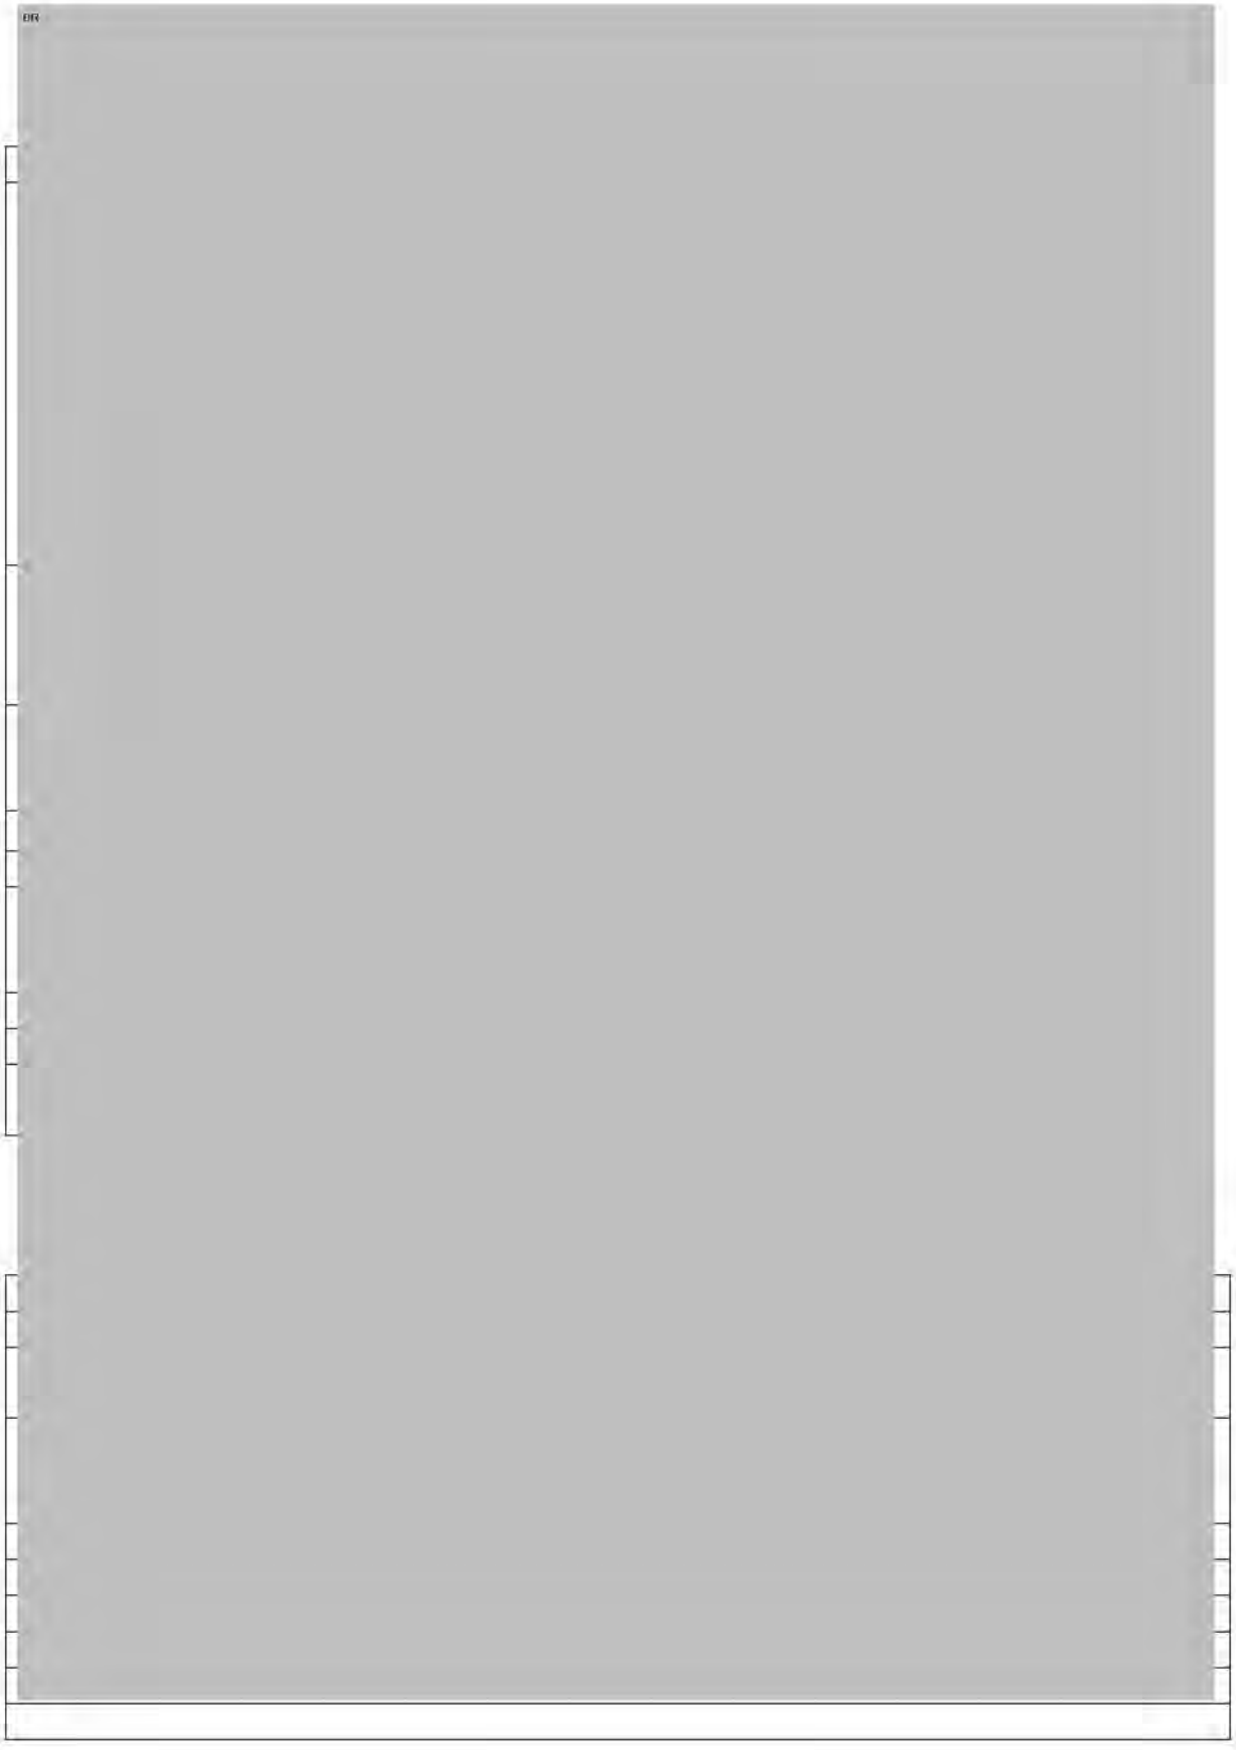
DR

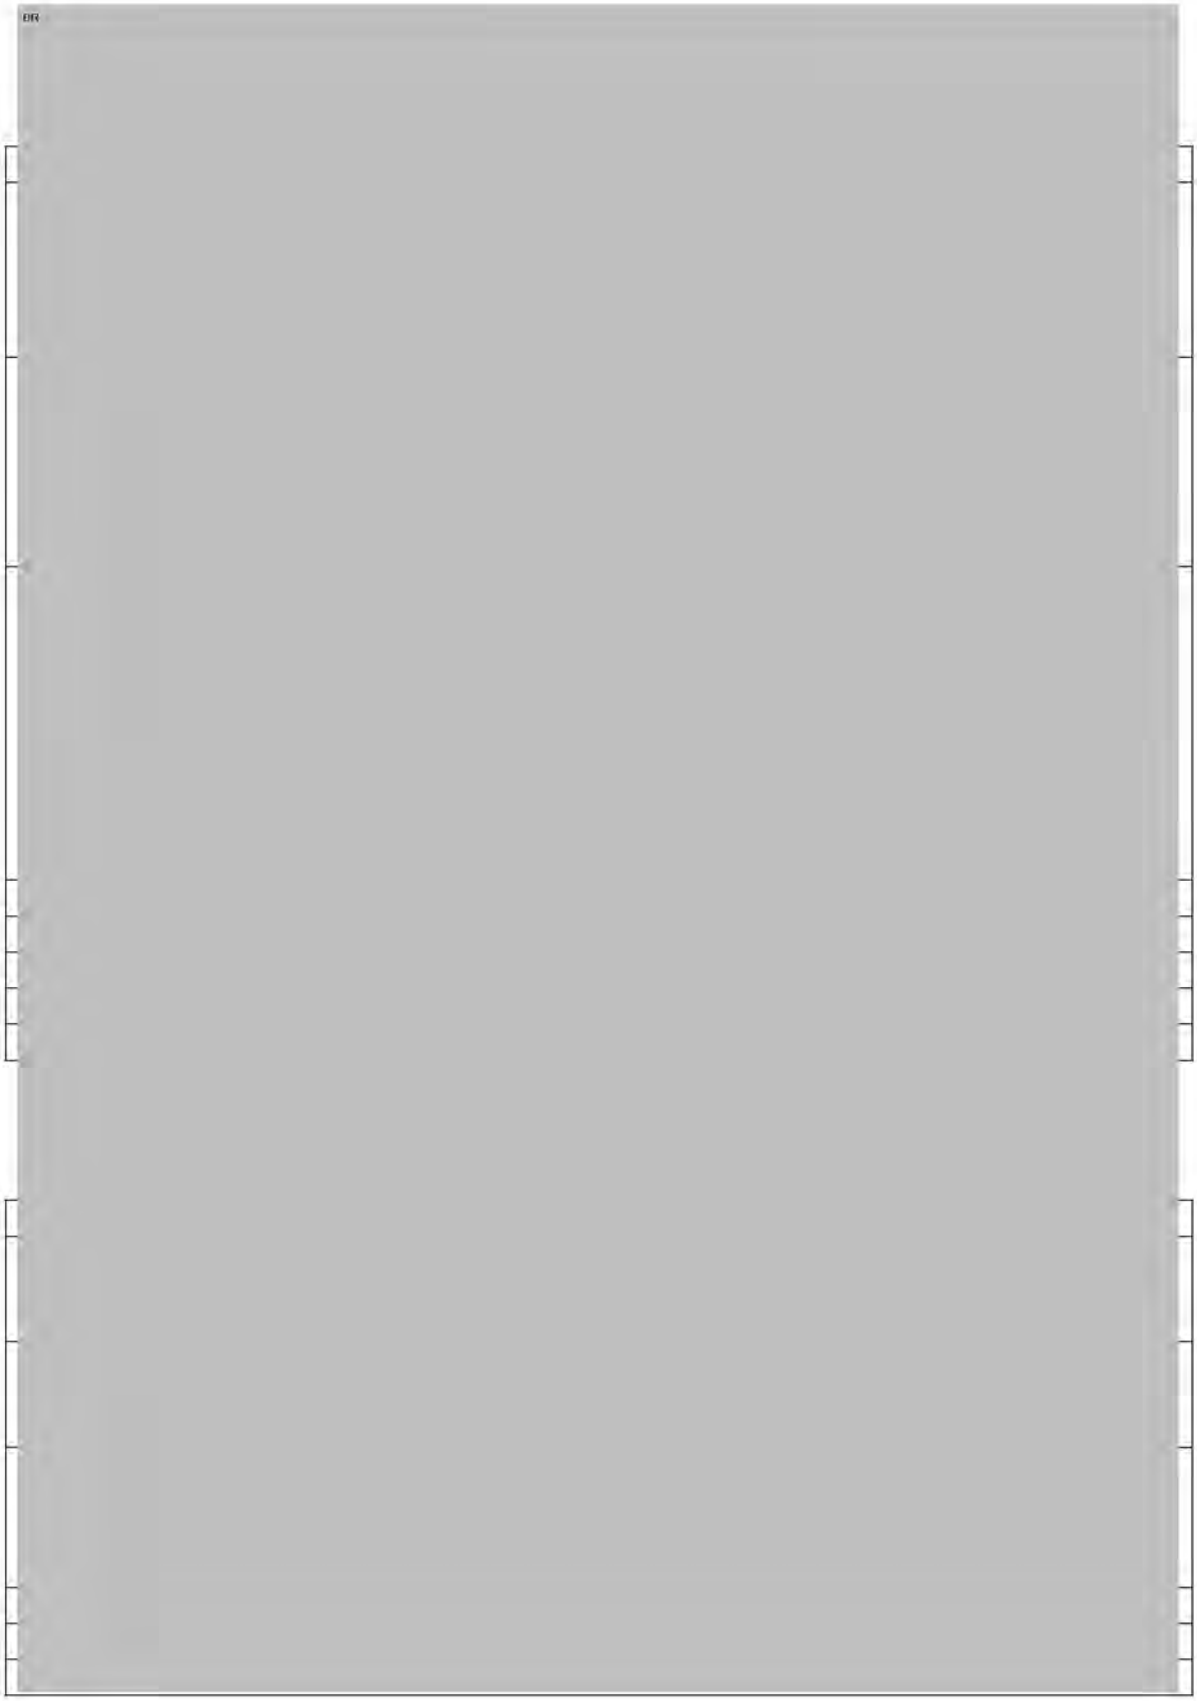

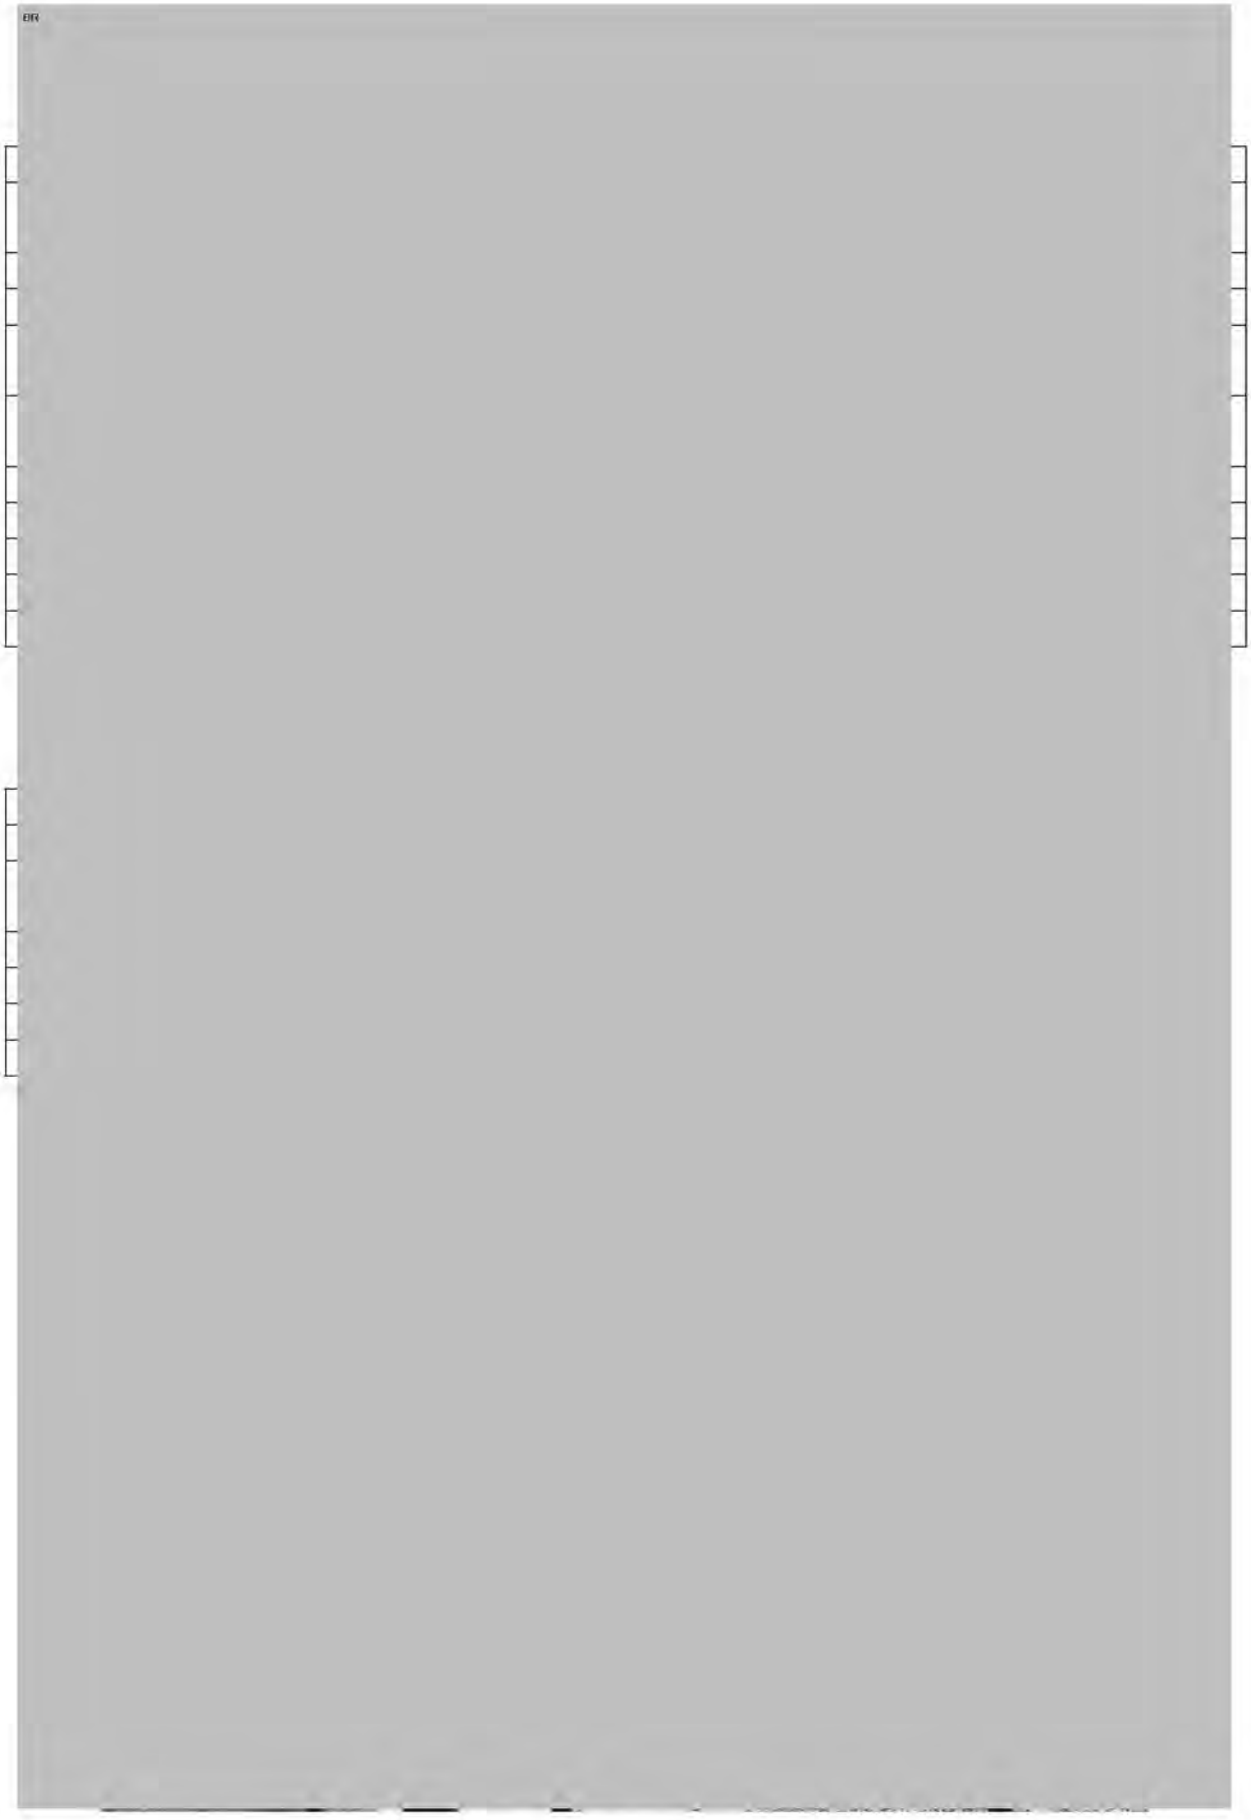

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Voorbereiden aanleg van bruggen en kleine kunstwerken Molenvlietpark (waaronder de aflaat). | De aflaatconstructie is besproken met het Hoogheemraadschap. Ontwerp is aangepast zodat de kleppen kunnen worden drooggezet t.b.v. het onderhoud. Binnenkort wordt vergunning bouwen aangevraagd.<br>Voorbereiding van de bruggen is gestart. |
| [redacted] | |
| In het komende kwartaal zal het VO voor het vervangen van de oeverbescherming van de Vliet worden afgerond. Het VO wordt vervolgens verfijnd tot DO/bestek niveau. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van het Programma van Eisen dat momenteel door de provincie (inclusief vaarwegbeheerder) wordt opgesteld. Aanbesteding gebeurt gelijk met de andere onderdelen van de tweede watertoevoer. | Het ontwerp van de oeverbescherming van de Vliet is opgenomen in het VO, alsook het Programma van Eisen van de provincie. |
| | |

| Overige/extra verrichte werkzaamheden | |
|---|---|
| Uitwerken van een plan voor kabels en leidingen voor de tweede watertoevoer en het maken van afspraken met leidingeigenaren en Delfland | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen | Geen |
| | |

### 3.5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Opstellen bestek voor de tweede watertoevoer op basis van het gemaakte VO. |
| Aanvragen kapvergunning voor tweede watertoevoer |
| CRB zal aanvragen vergunning bouwen eerste drie voetgangersbruggen en aflaat van Molenvlietpark. |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |
| |

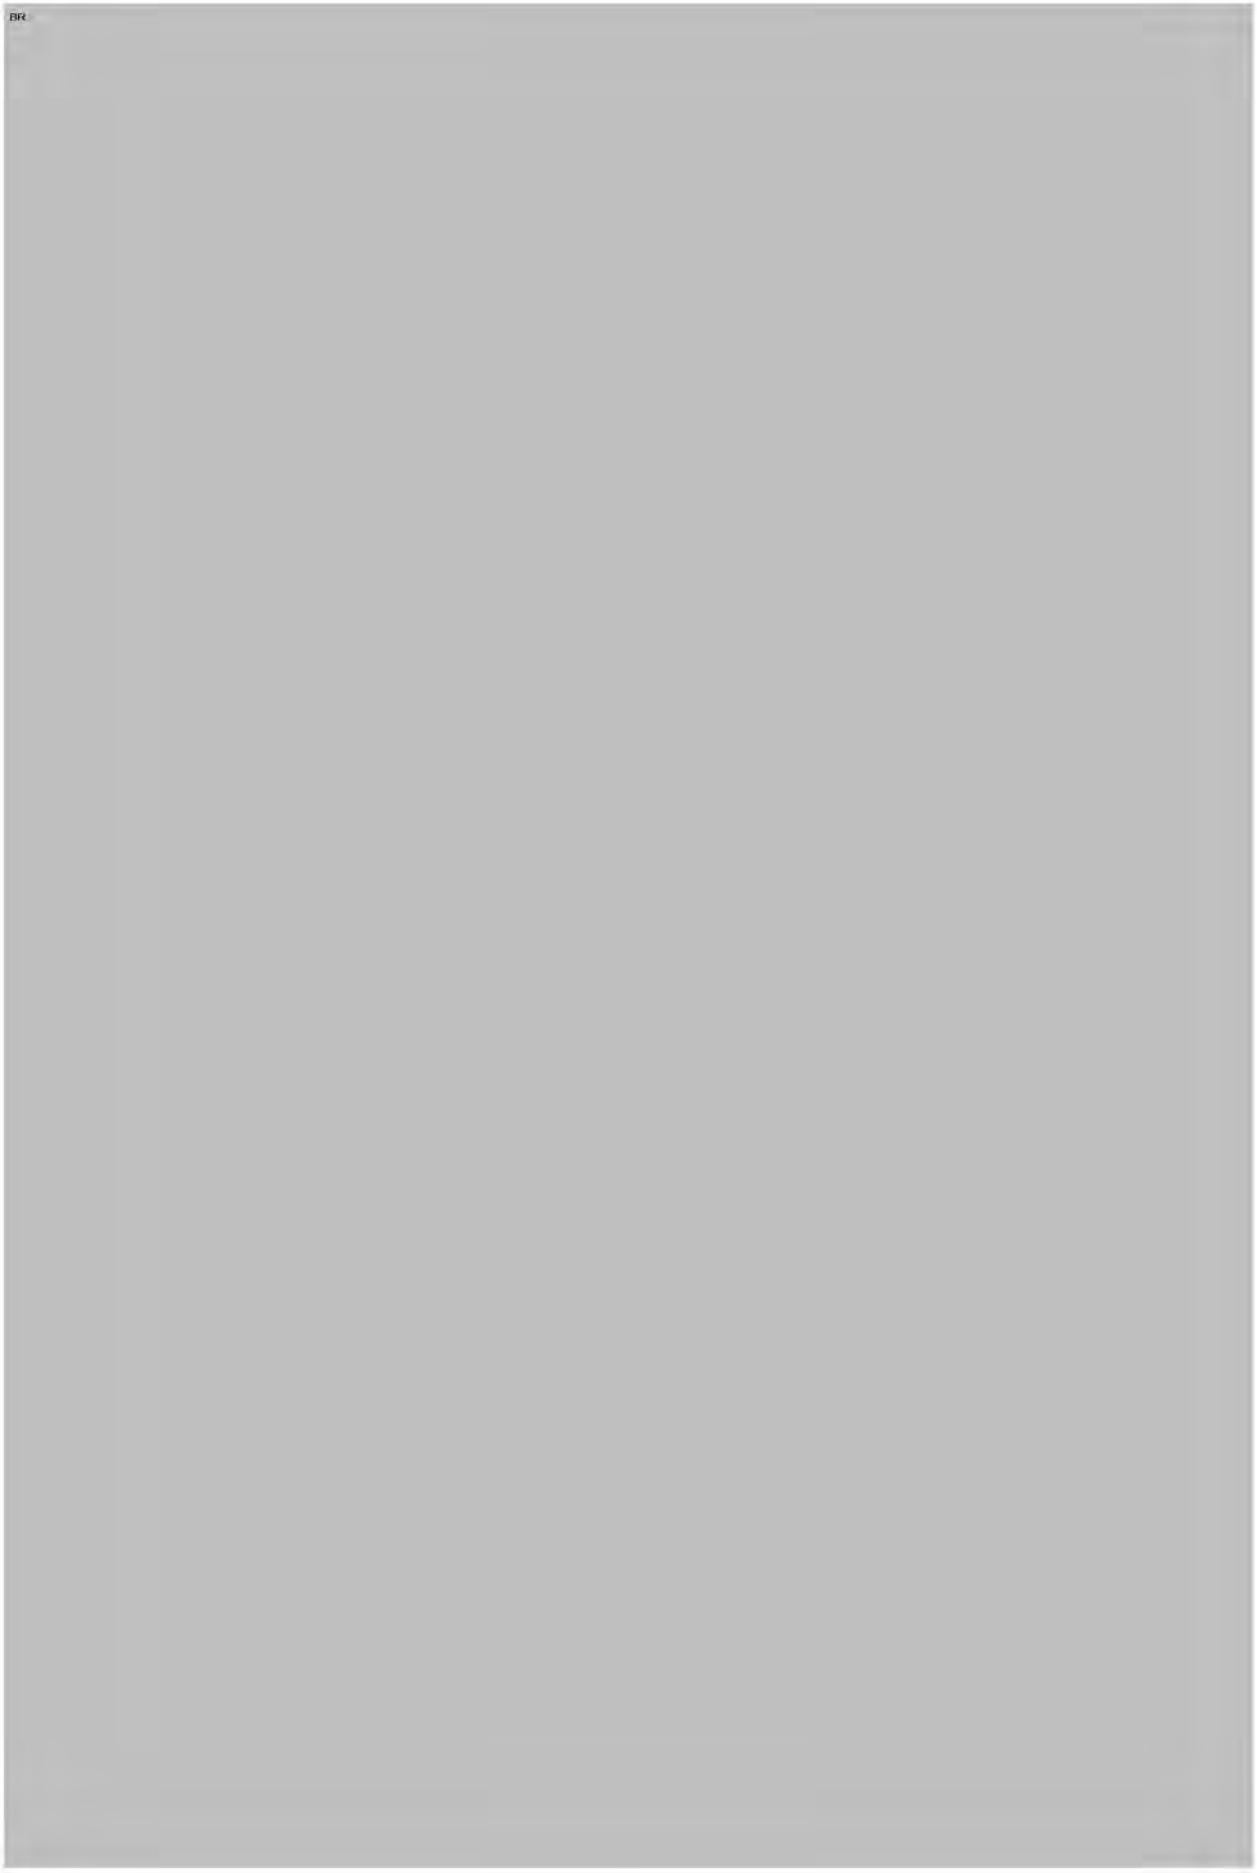
BR

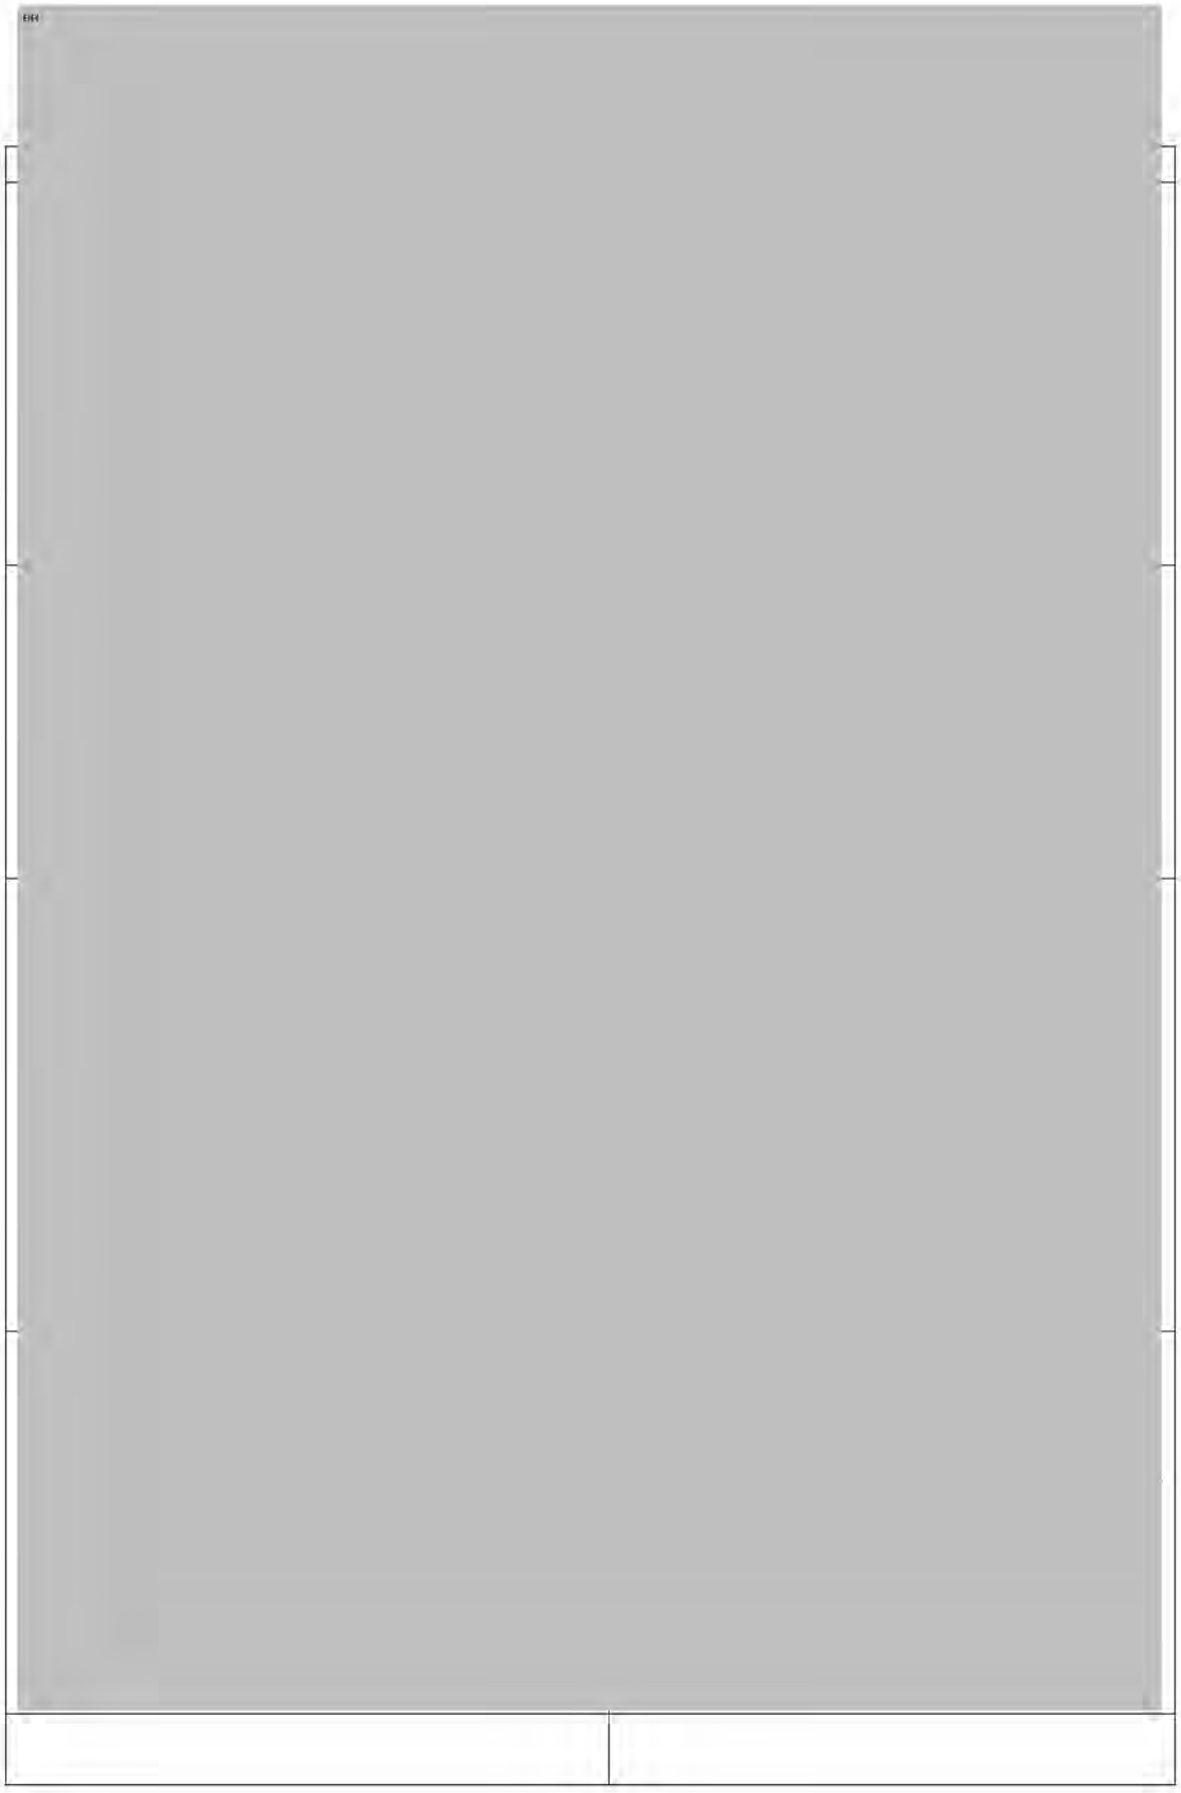

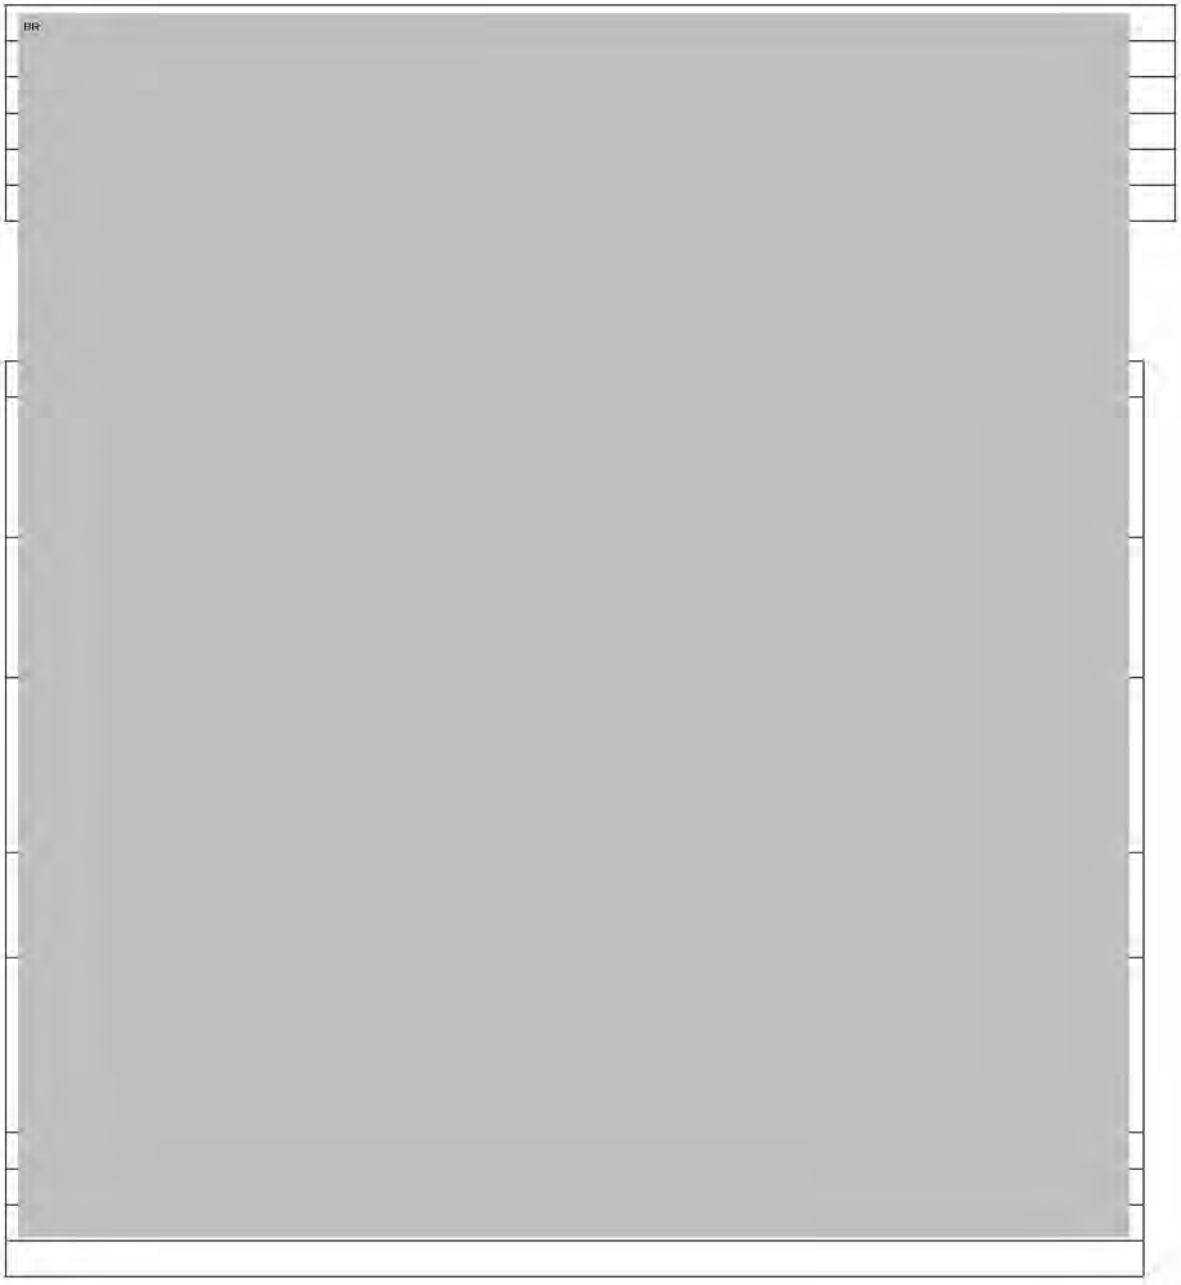
BR

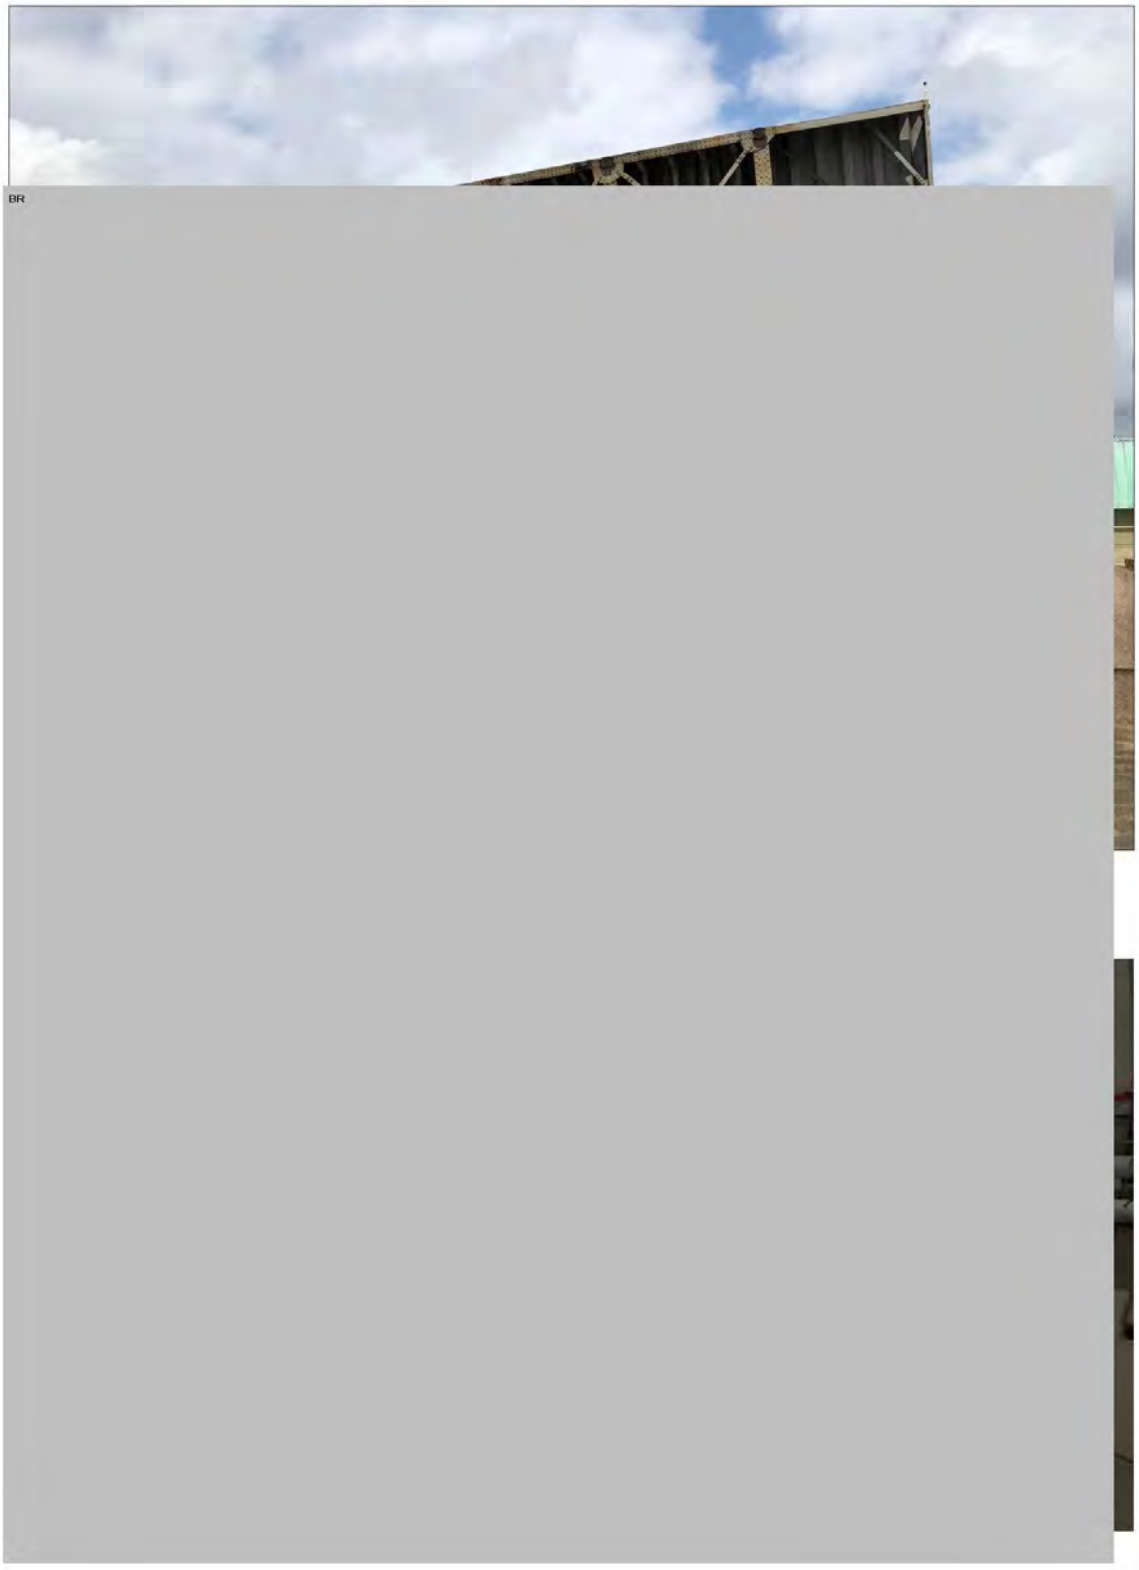
BR

Docnr20



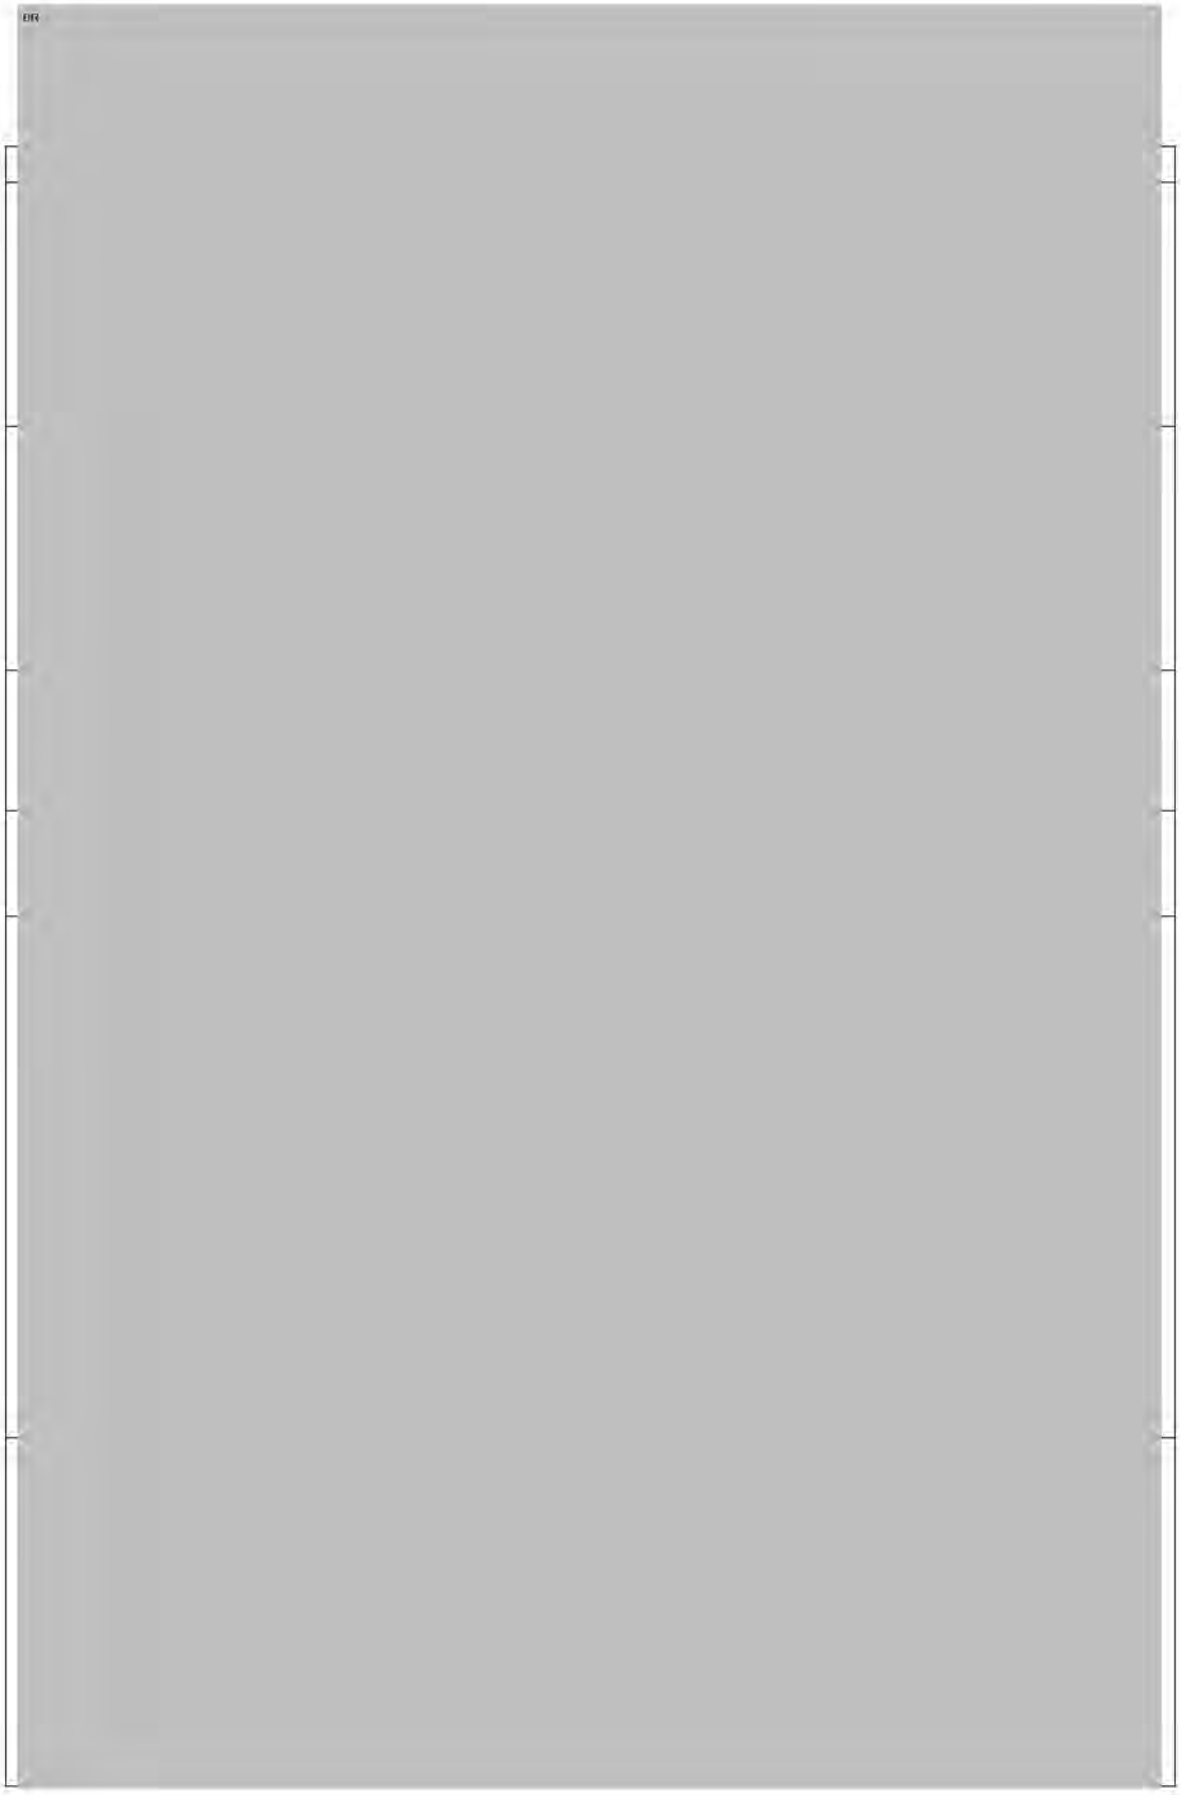

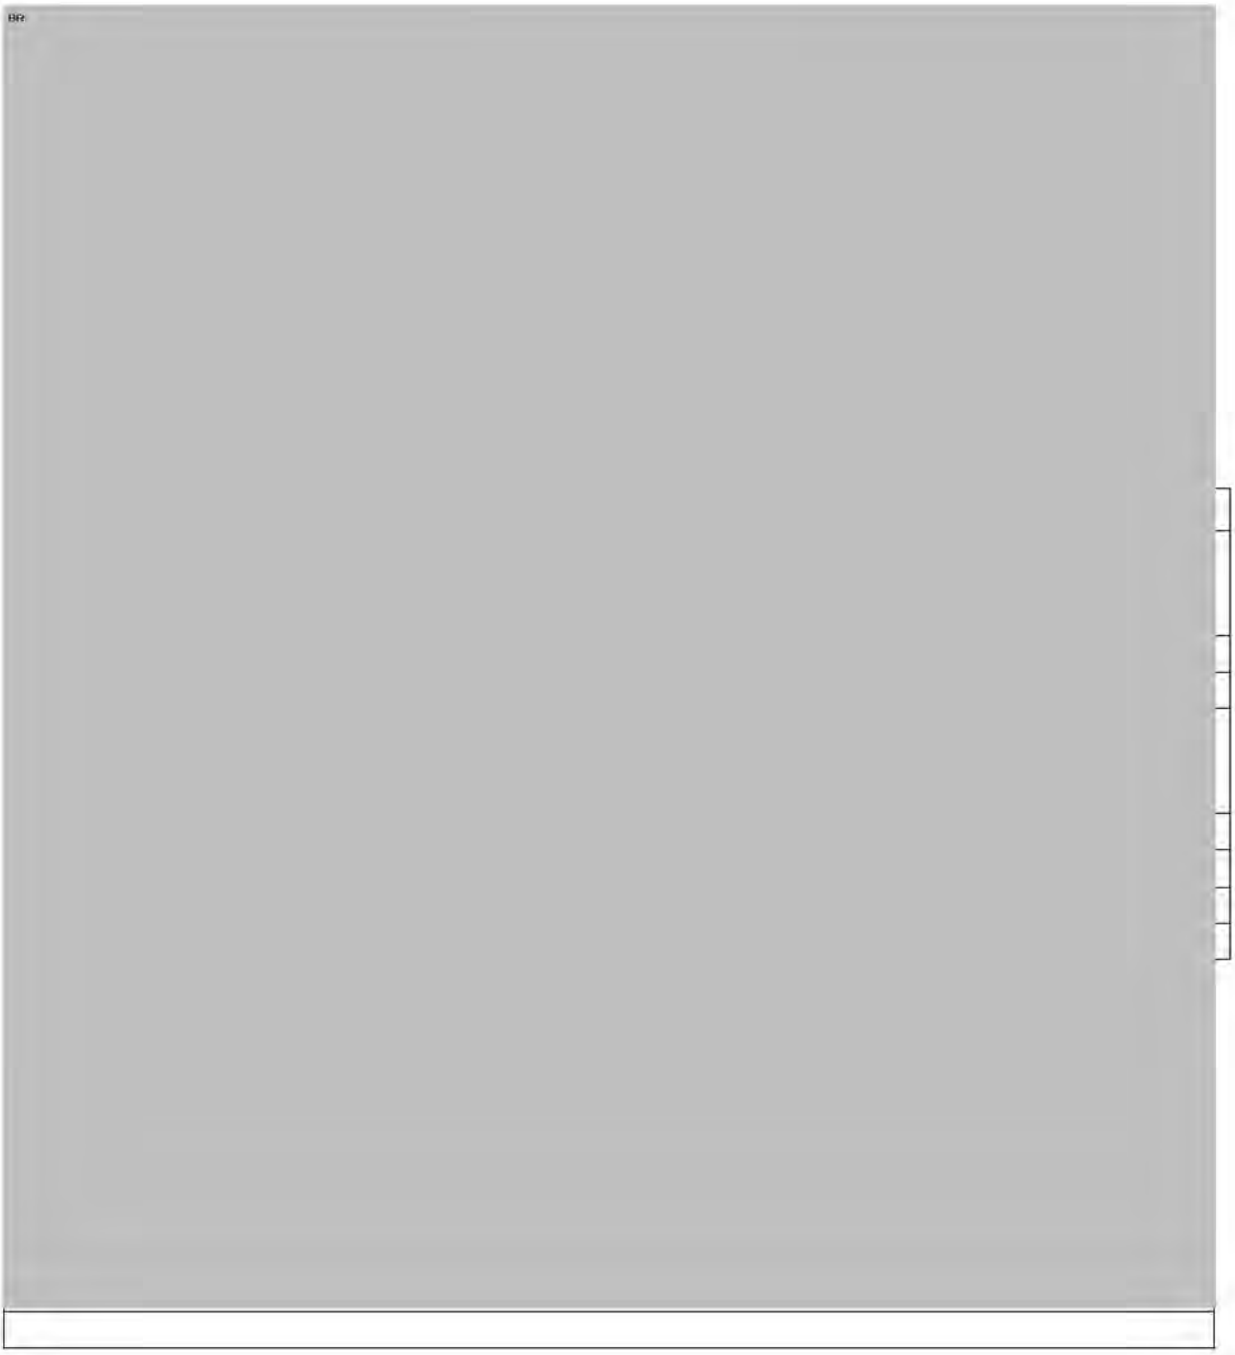

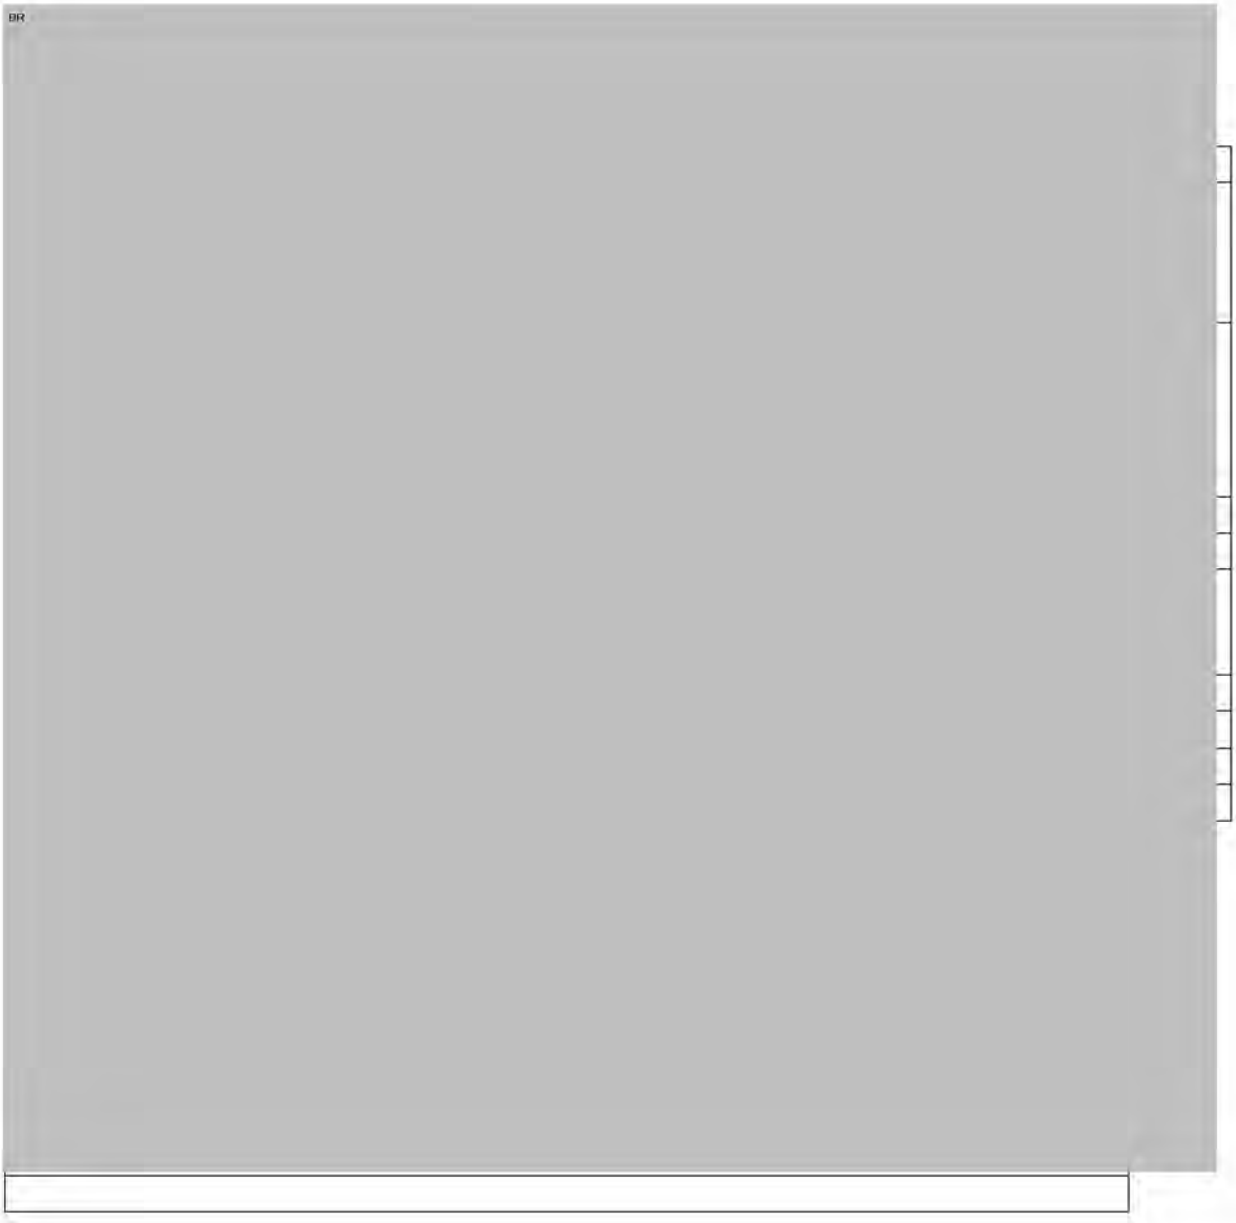
BR

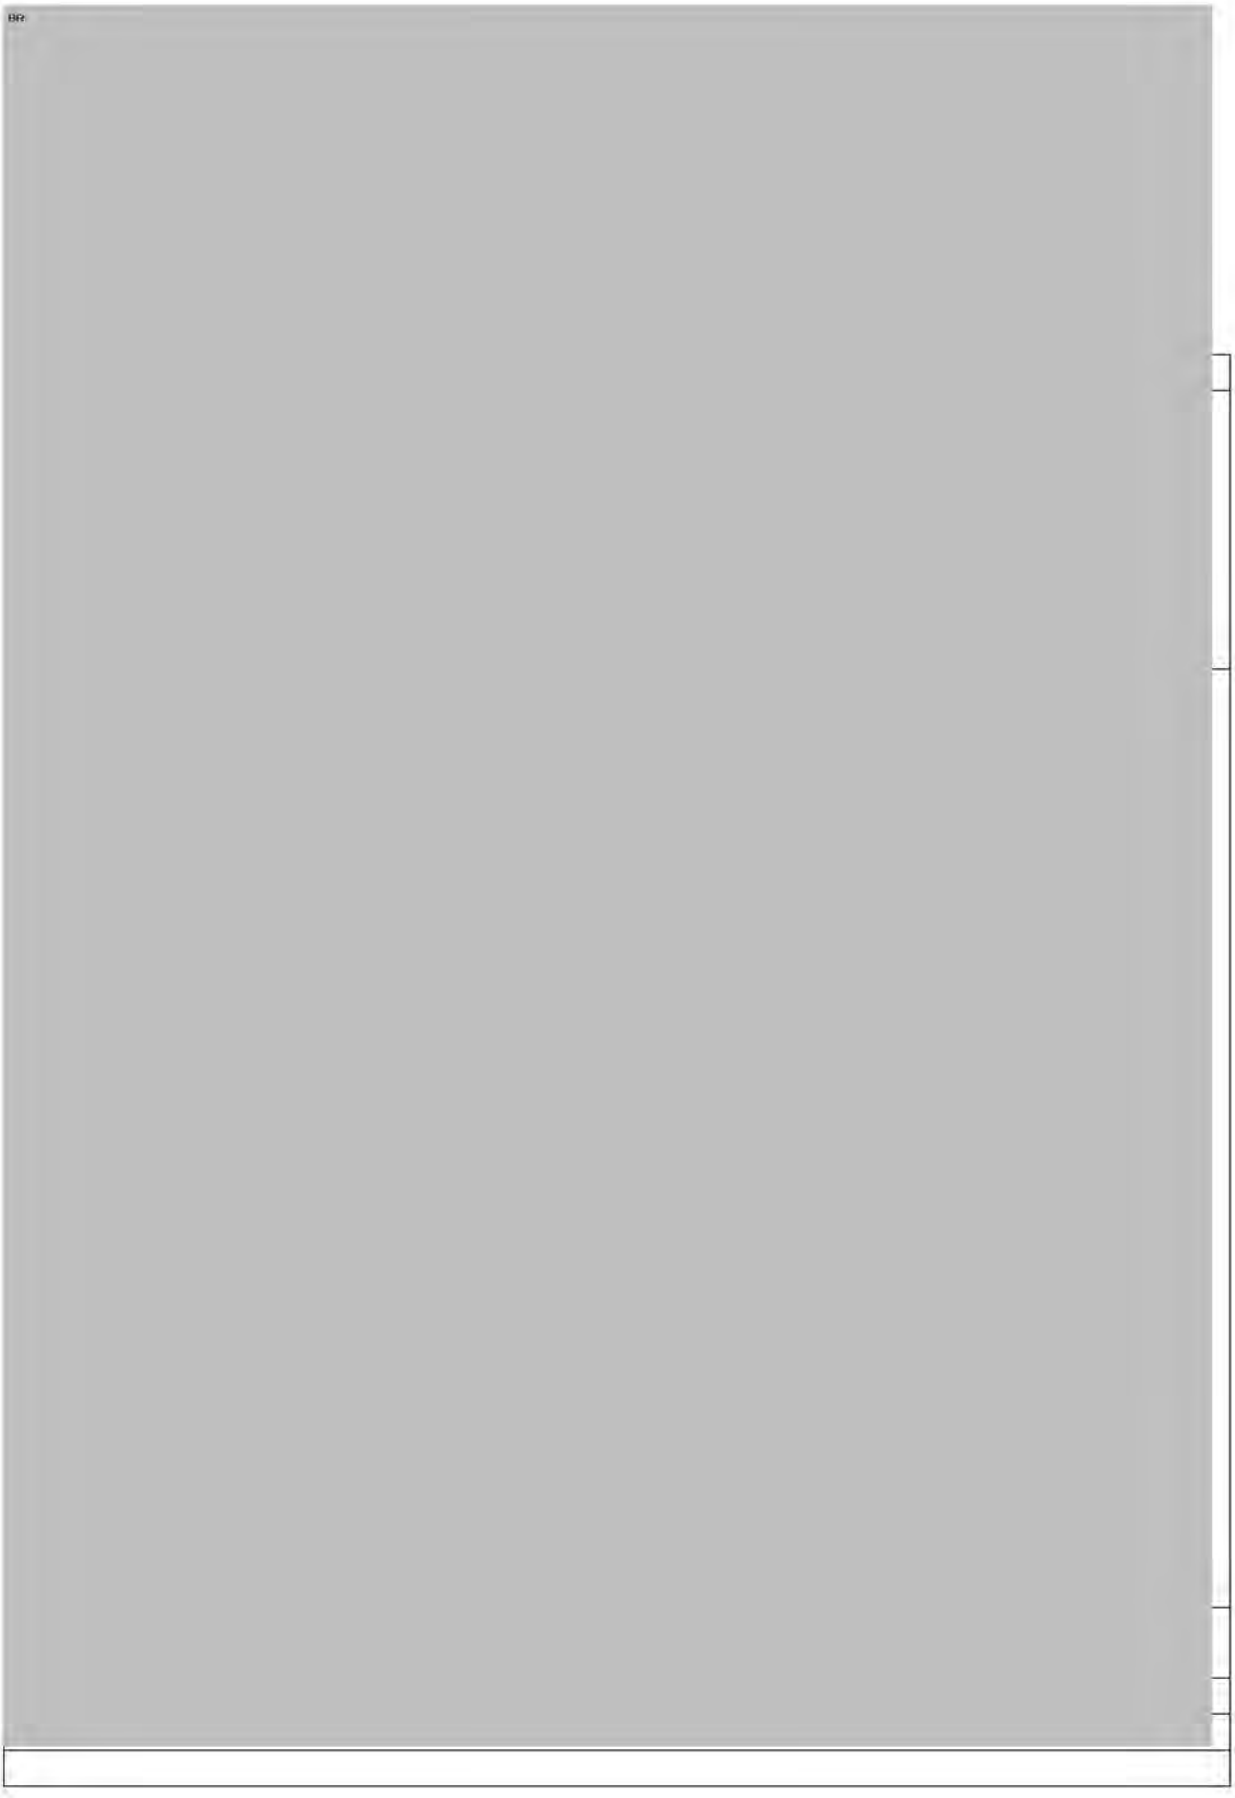

BR

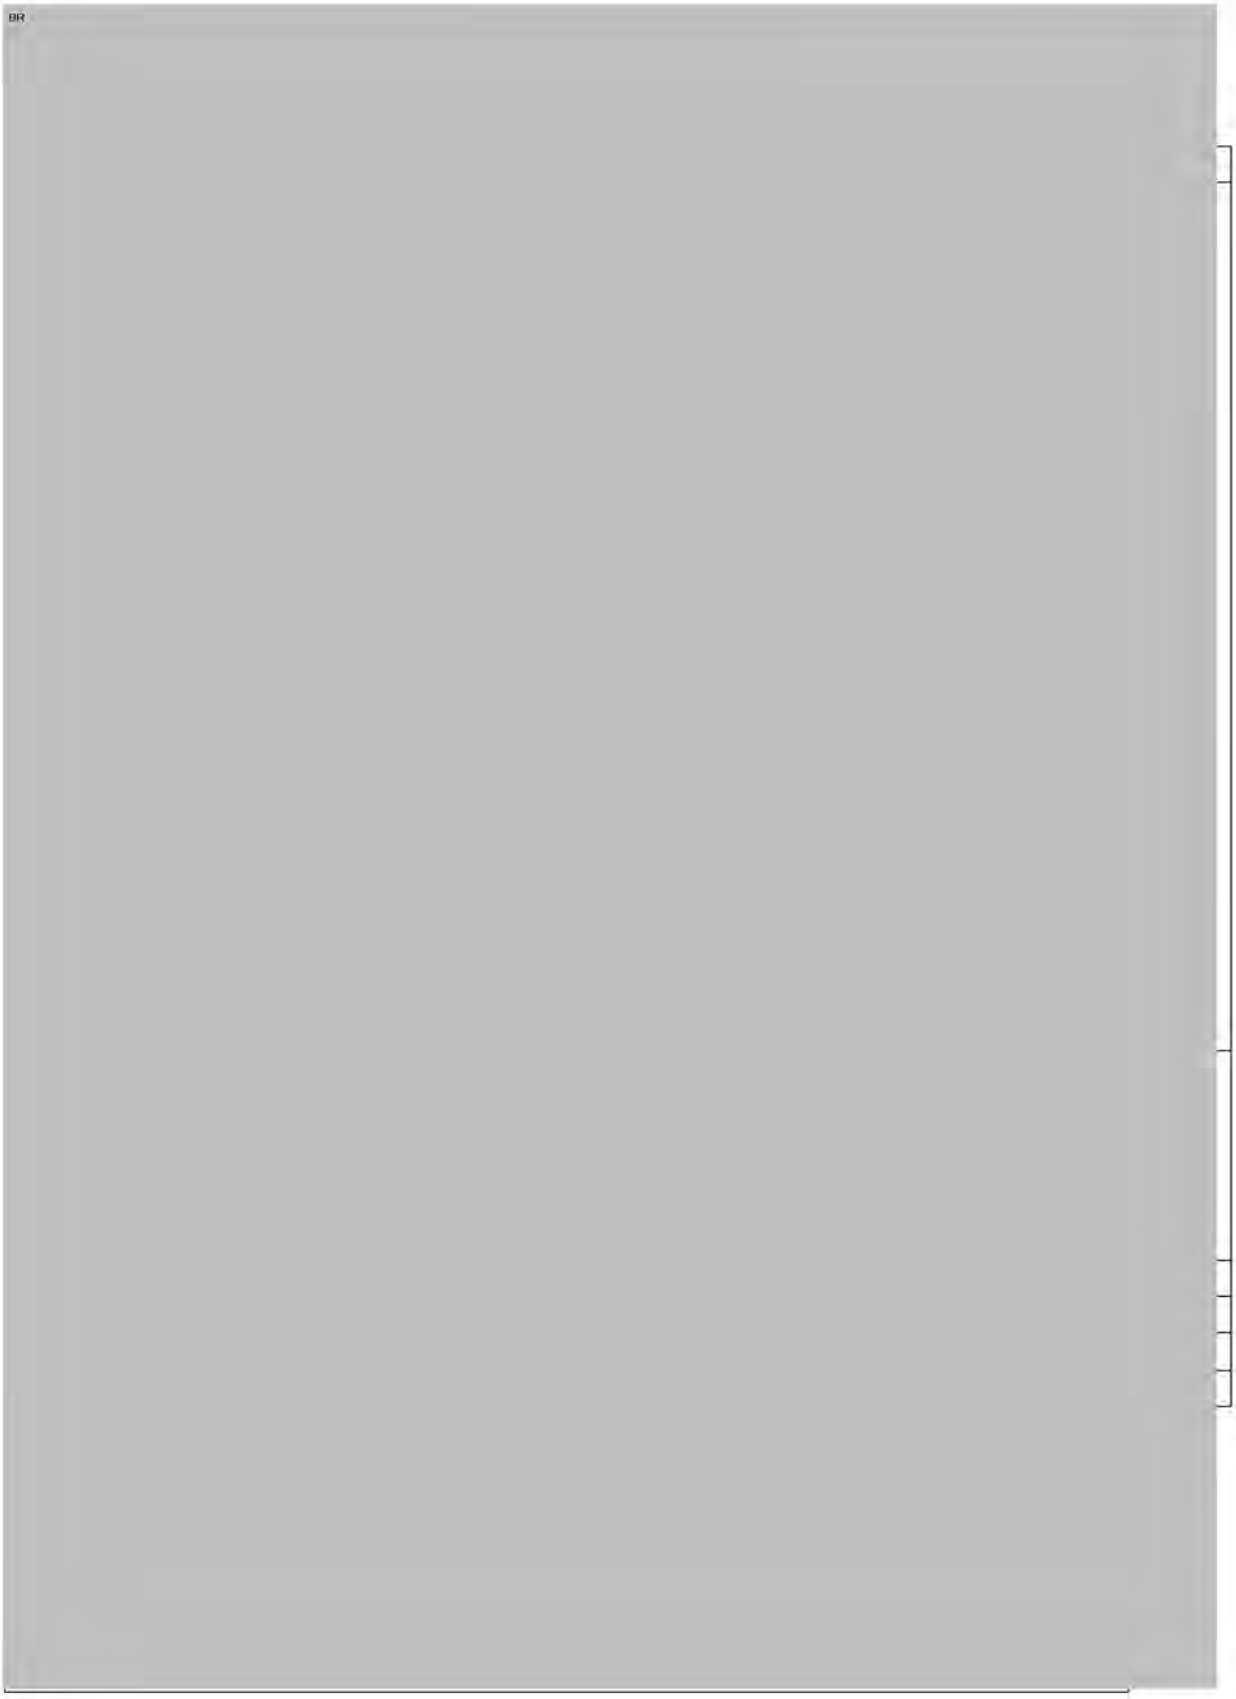

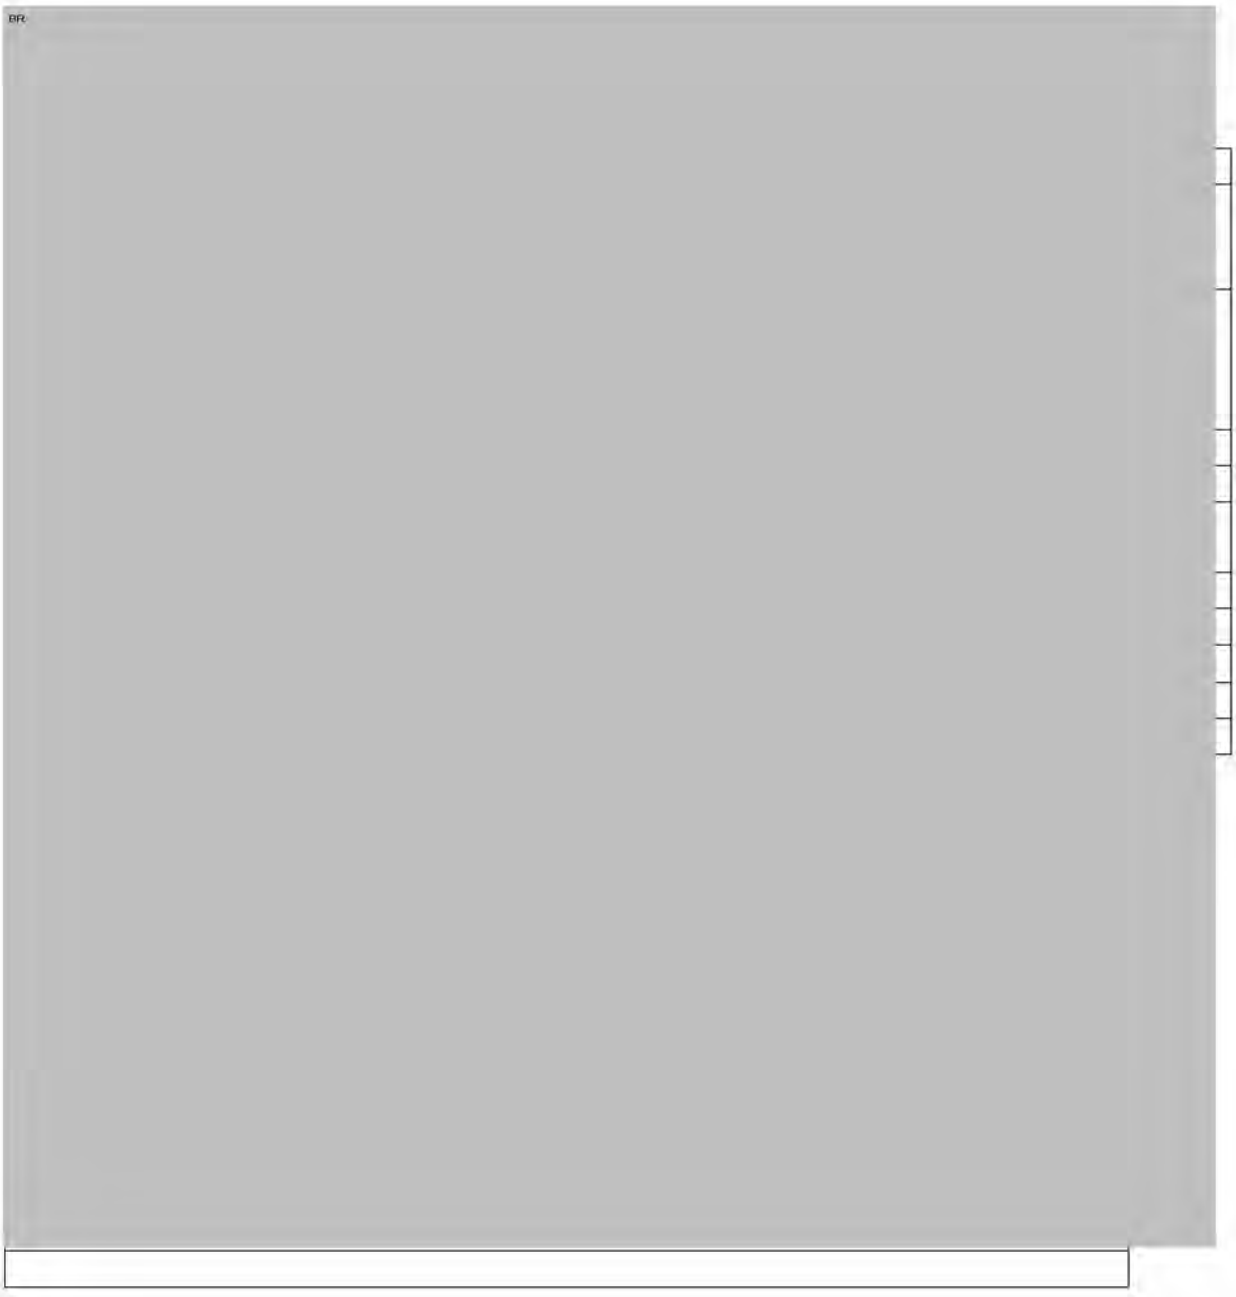

Docnr20



# 4 Overdracht en openstelling

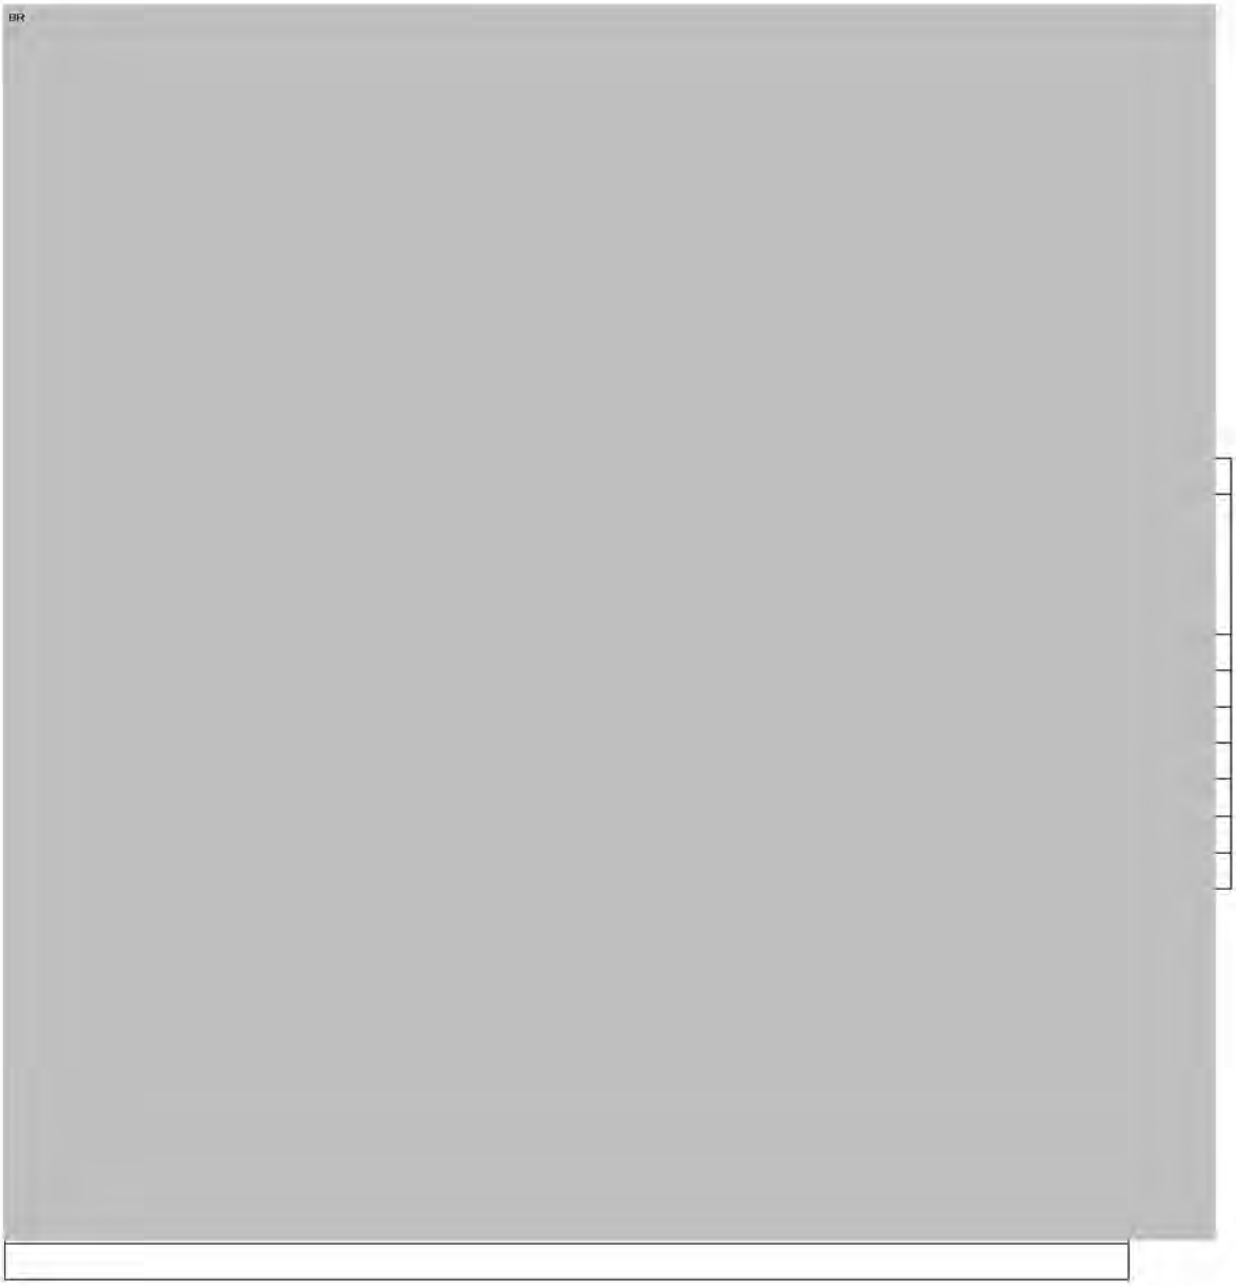
BR

BR

Docnr20



# 5 Projectbeheersing

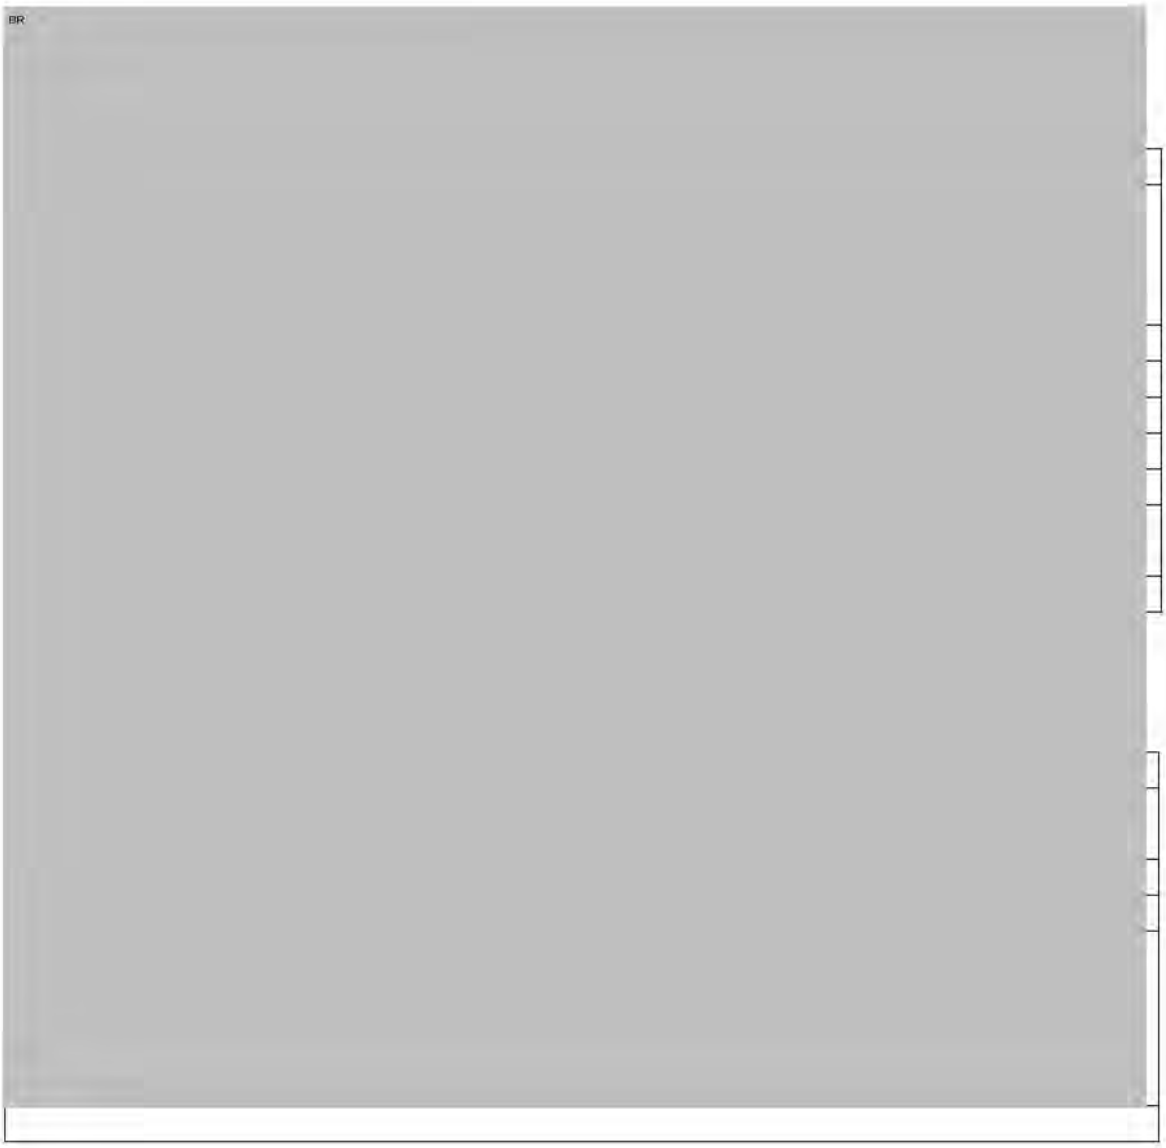

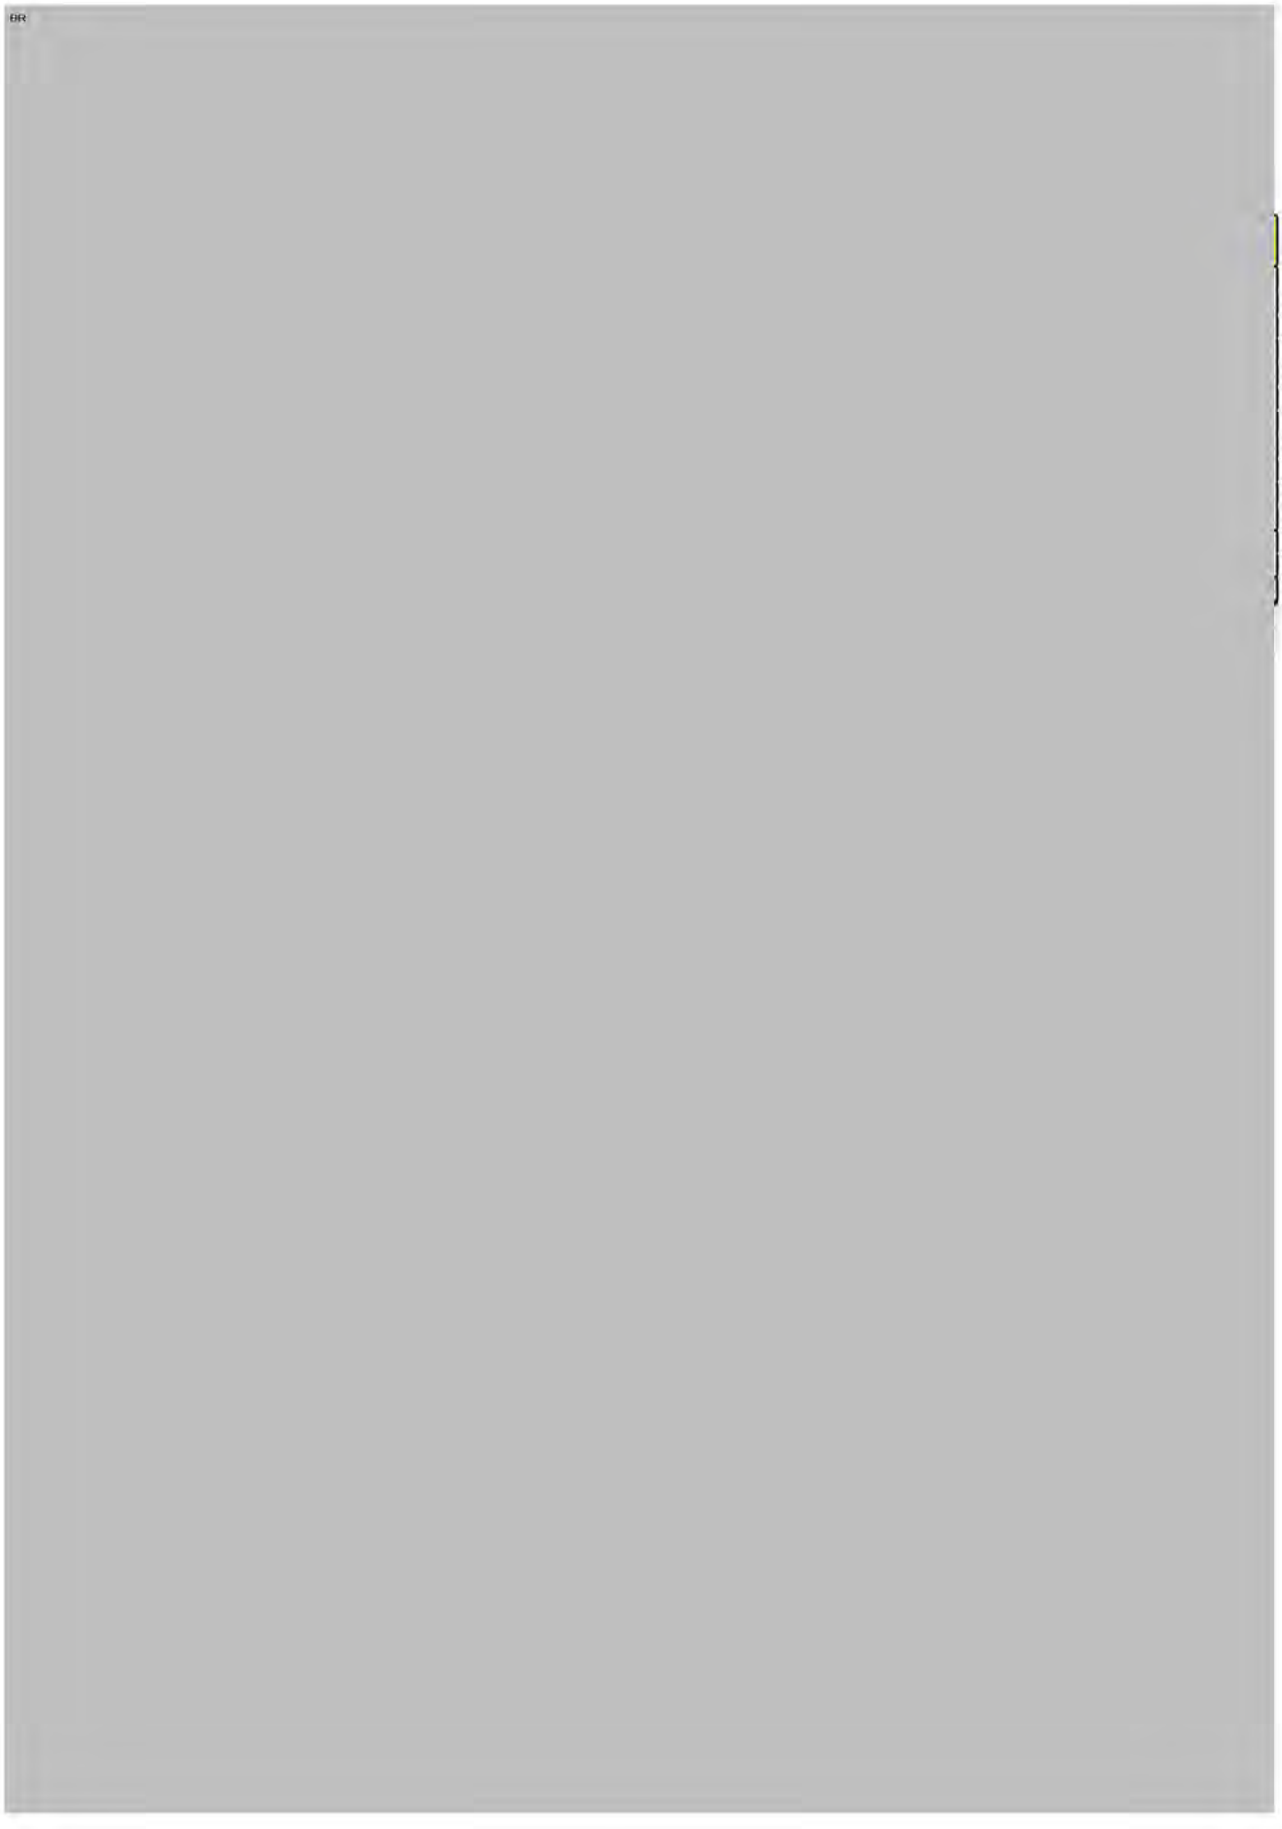

### 5.2.2 Dekkingen

Tabel : Overzicht toegezegde dekkingen Rotterdamsebaan, Euro's prijspeil 2018 (excl. BTW)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delftland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | **2.725.000** | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 0 | 500.000 | 500.000 | **400.000** | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland

Er zijn in het derde kwartaal 2018 geen mutaties geweest.

Docnr20



3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland

In het derde kwartaal is een beschikking ontvangen van € 0,5 mln. als bijdrage voor de realisatie van het Molenvlietpark. Van dit bedrag is in het derde kwartaal reeds € 0,4 mln. ontvangen.

## 5.3 Planning

Zie tevens de bijlage 'Planningsmijlpalen'.

BR

### 5.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| BR |
| Updaten van de detailplanning 2e toevoer Molenvlietpark. |
| BR |

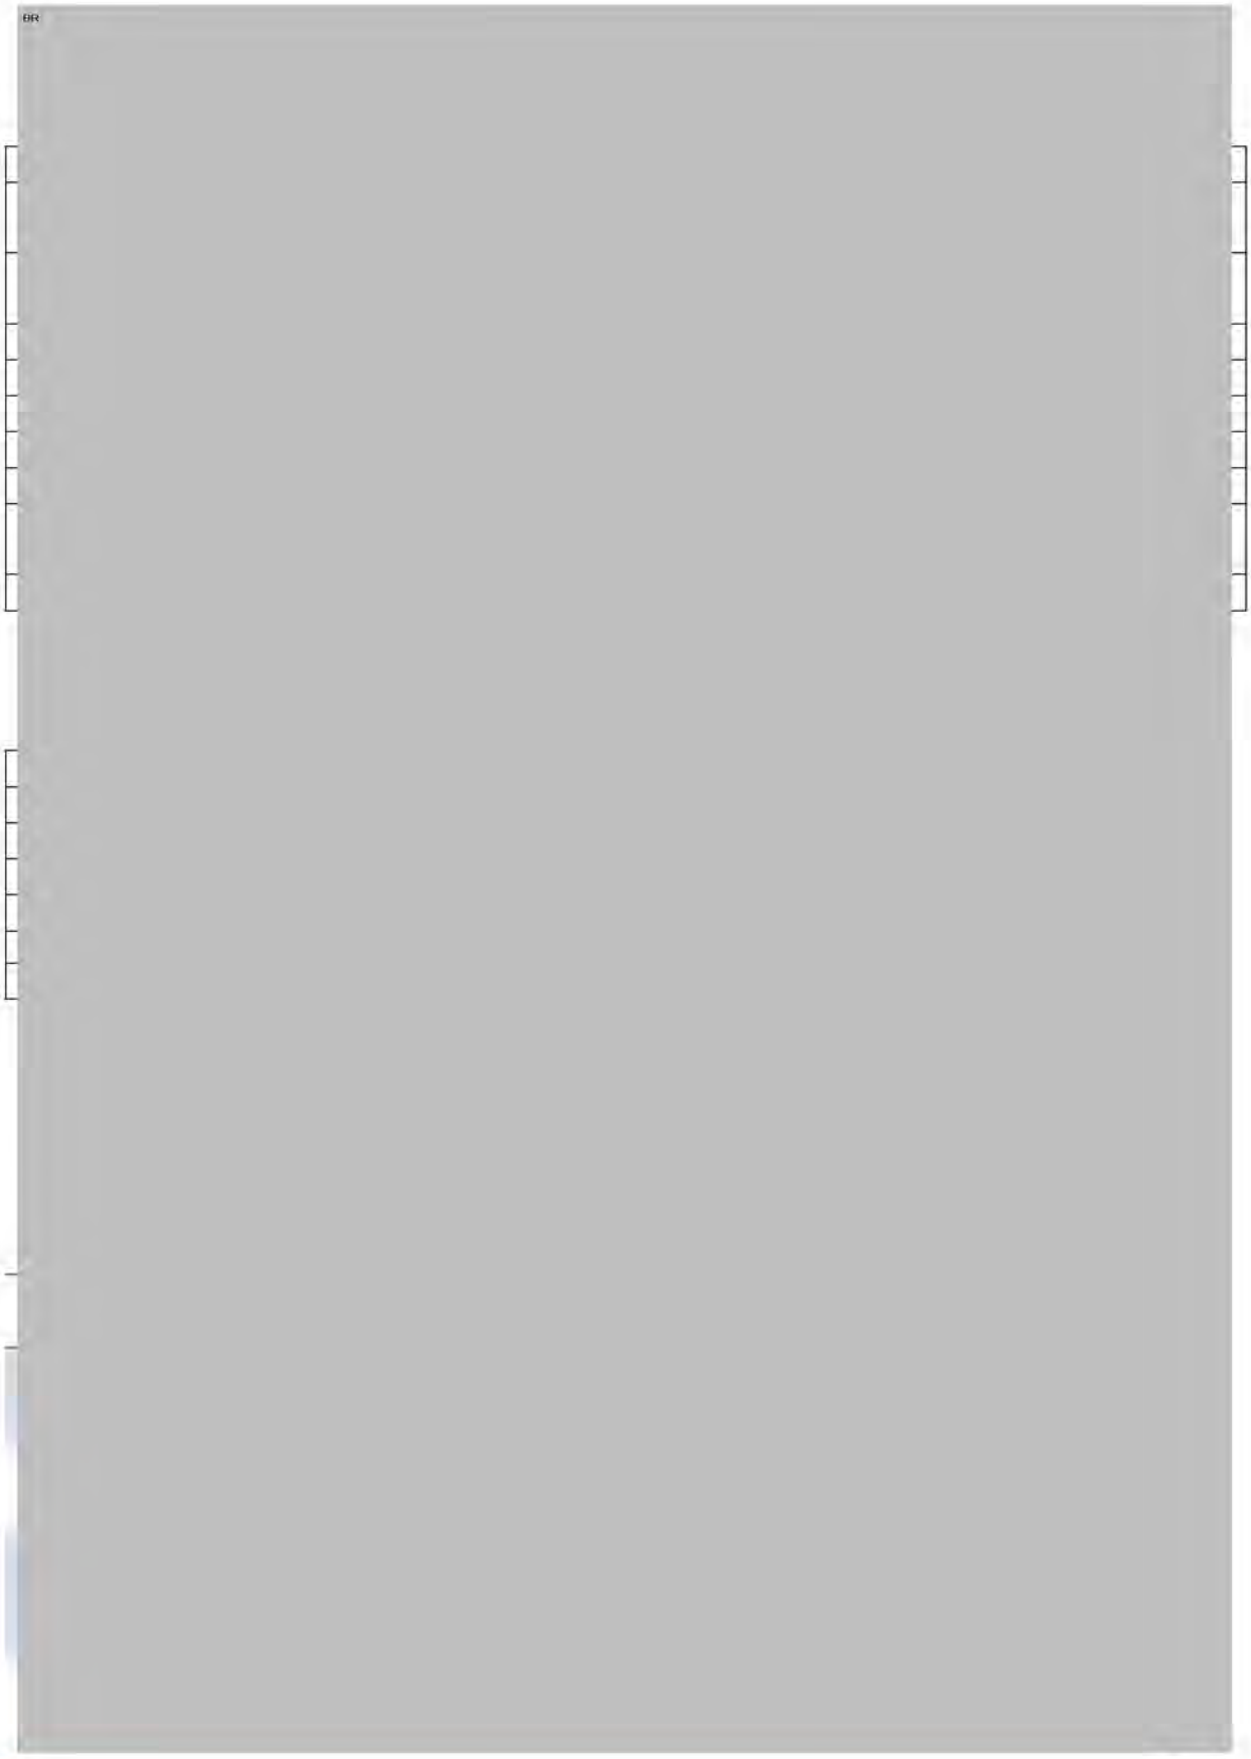

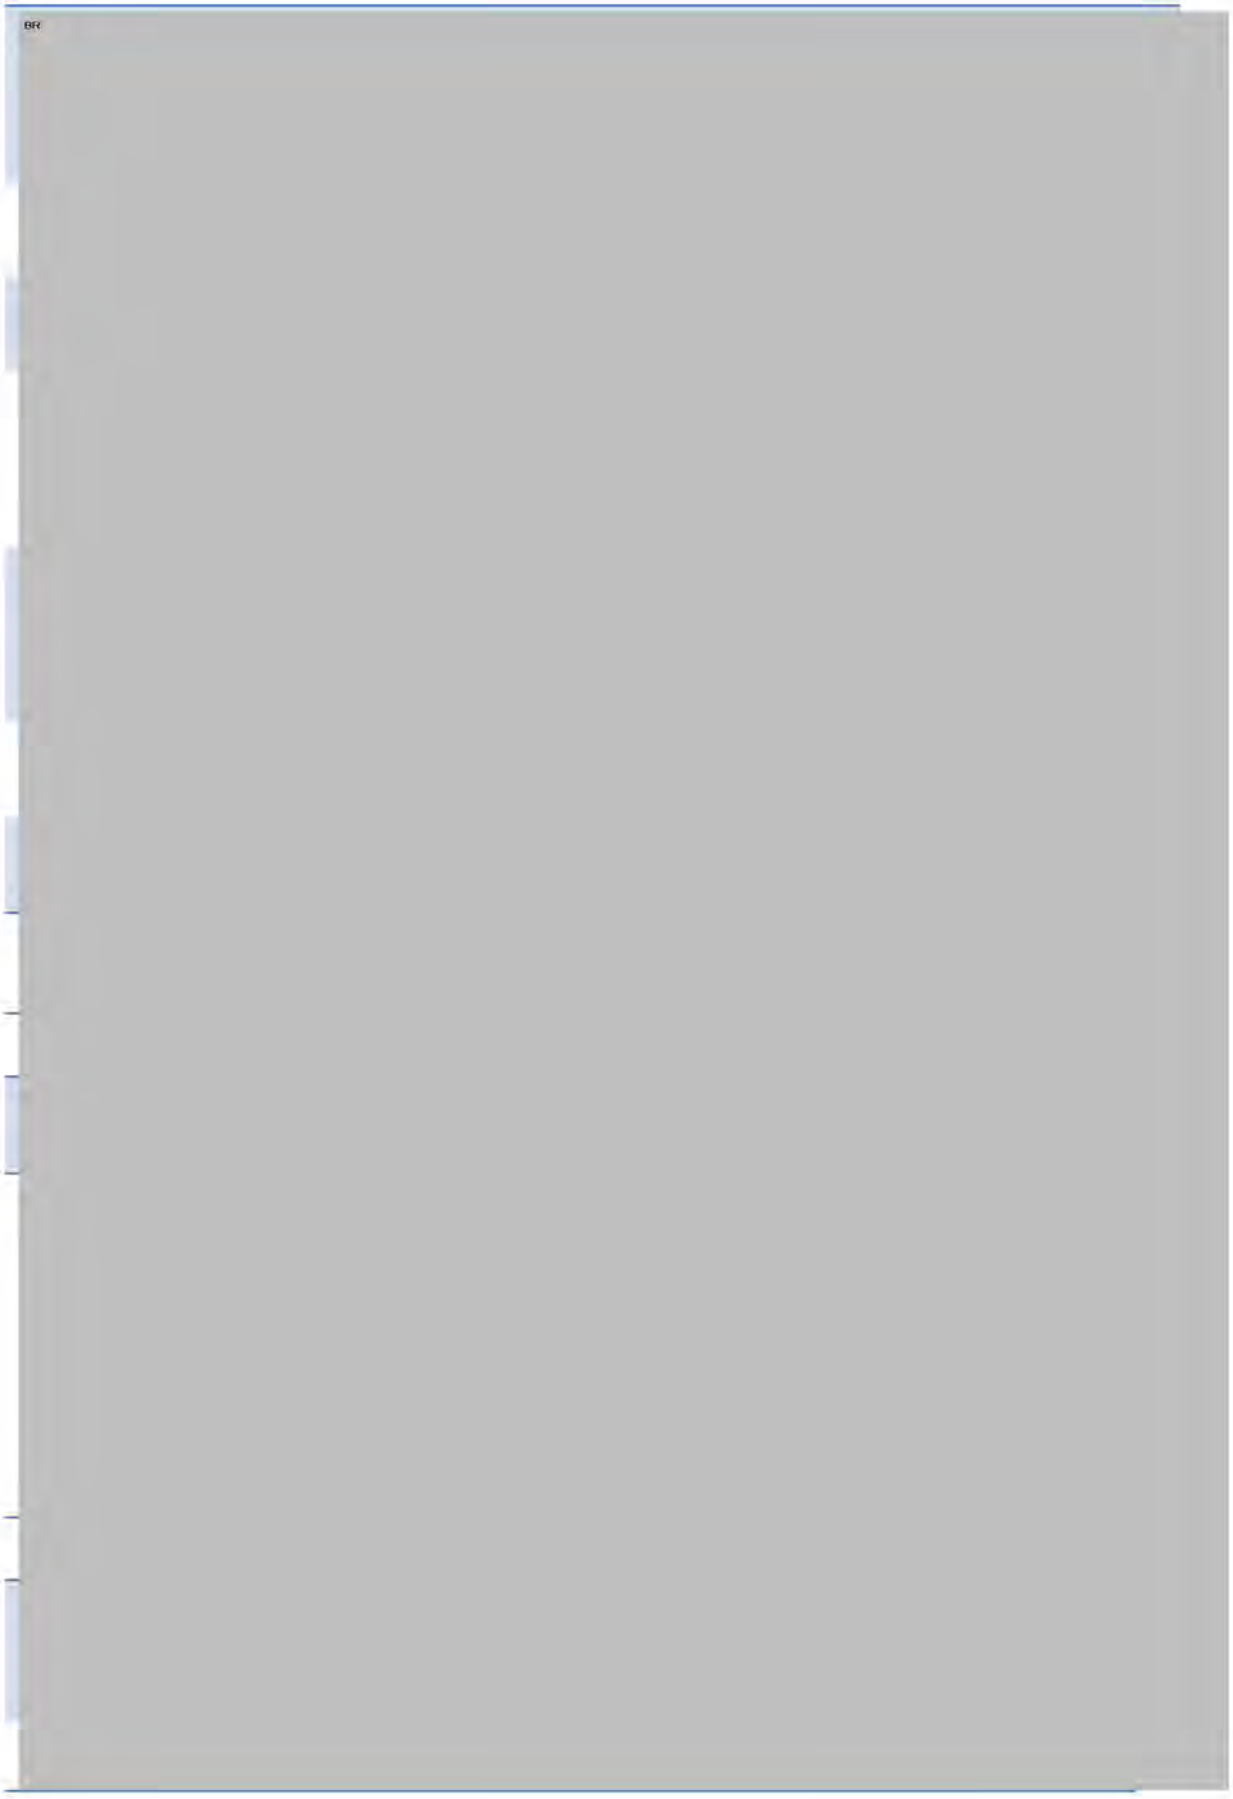
BR

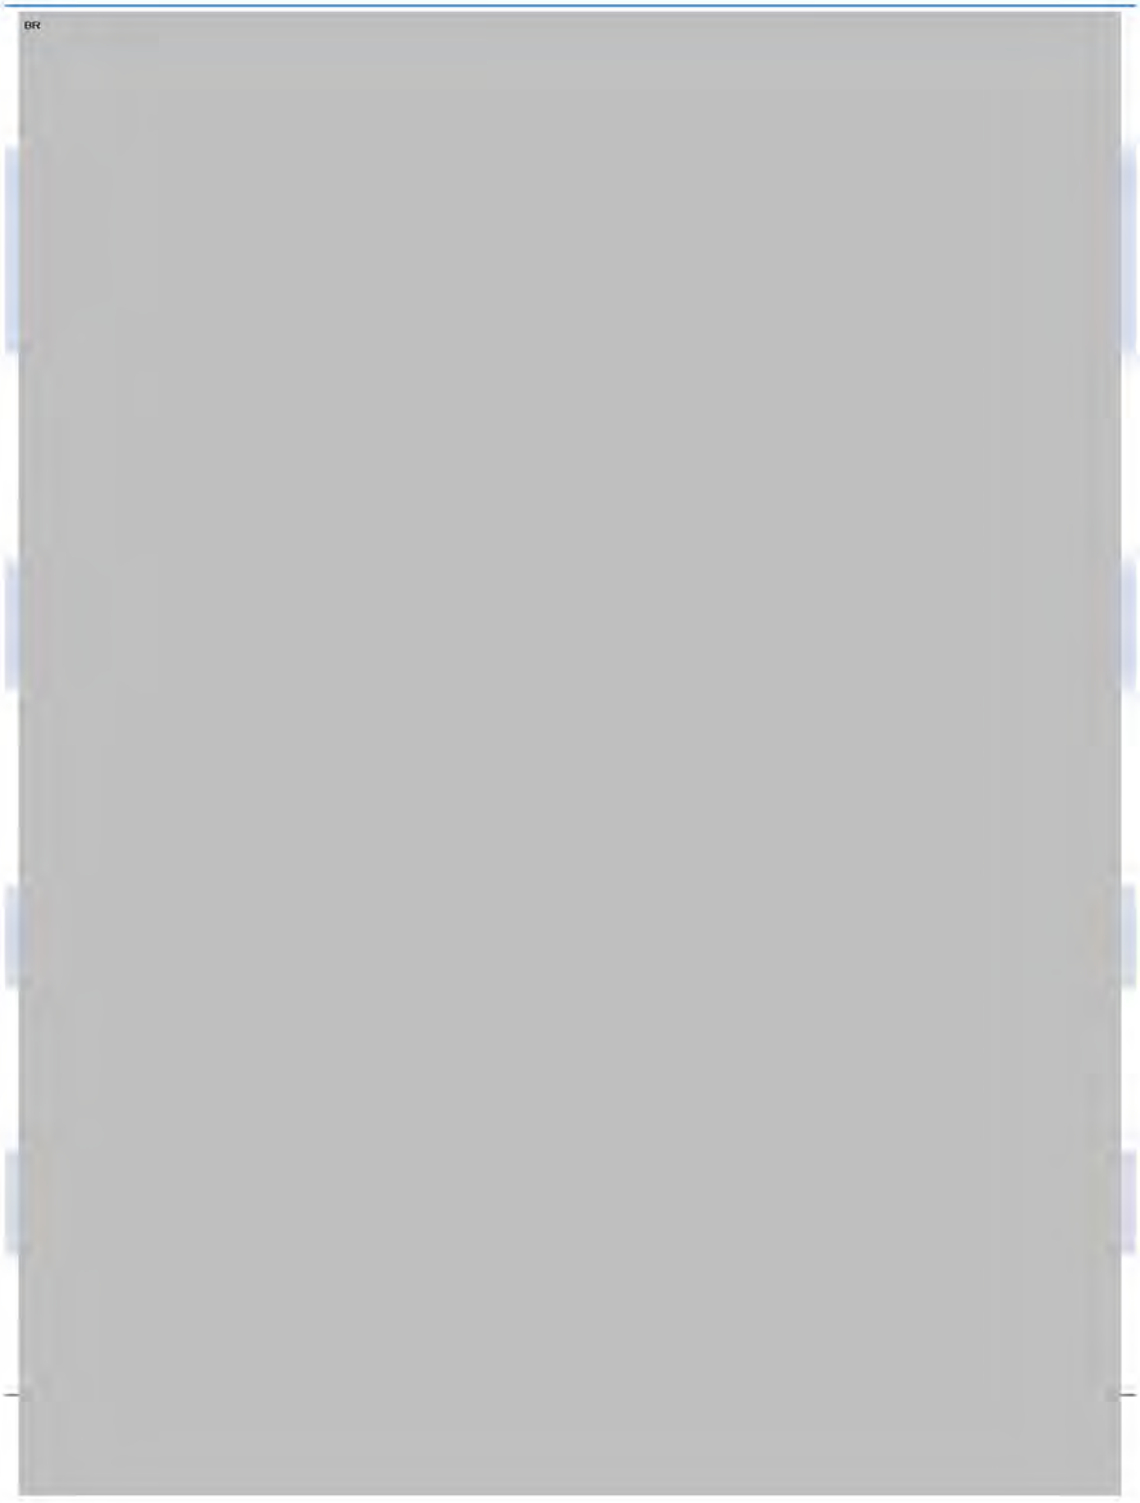
BR

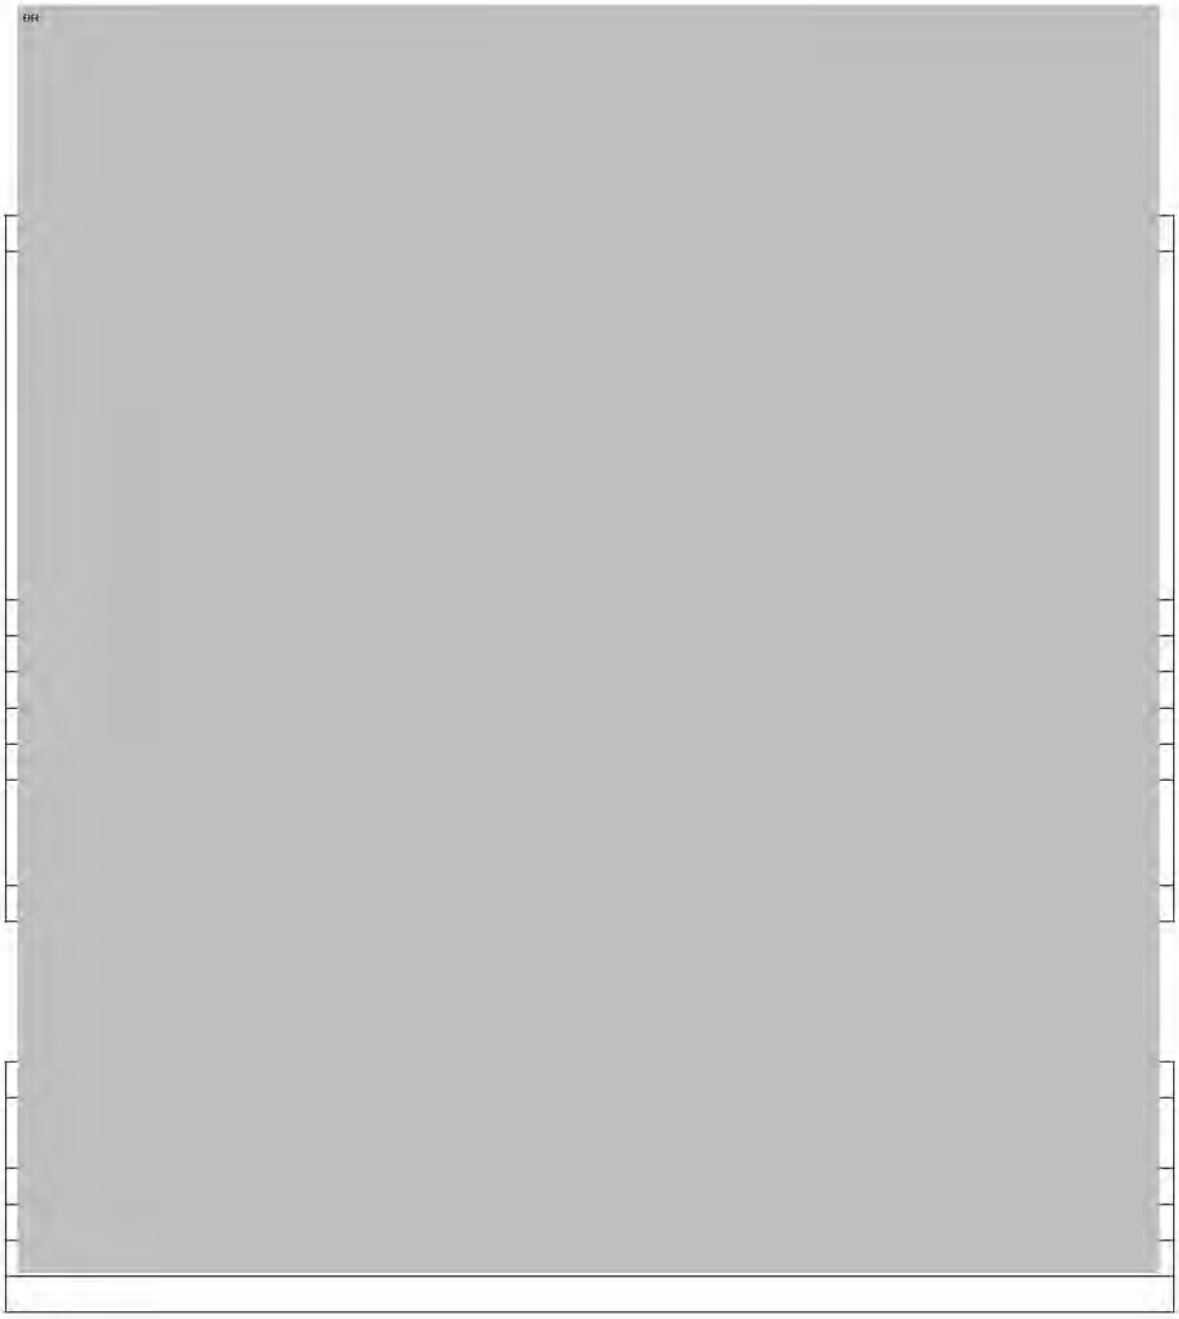

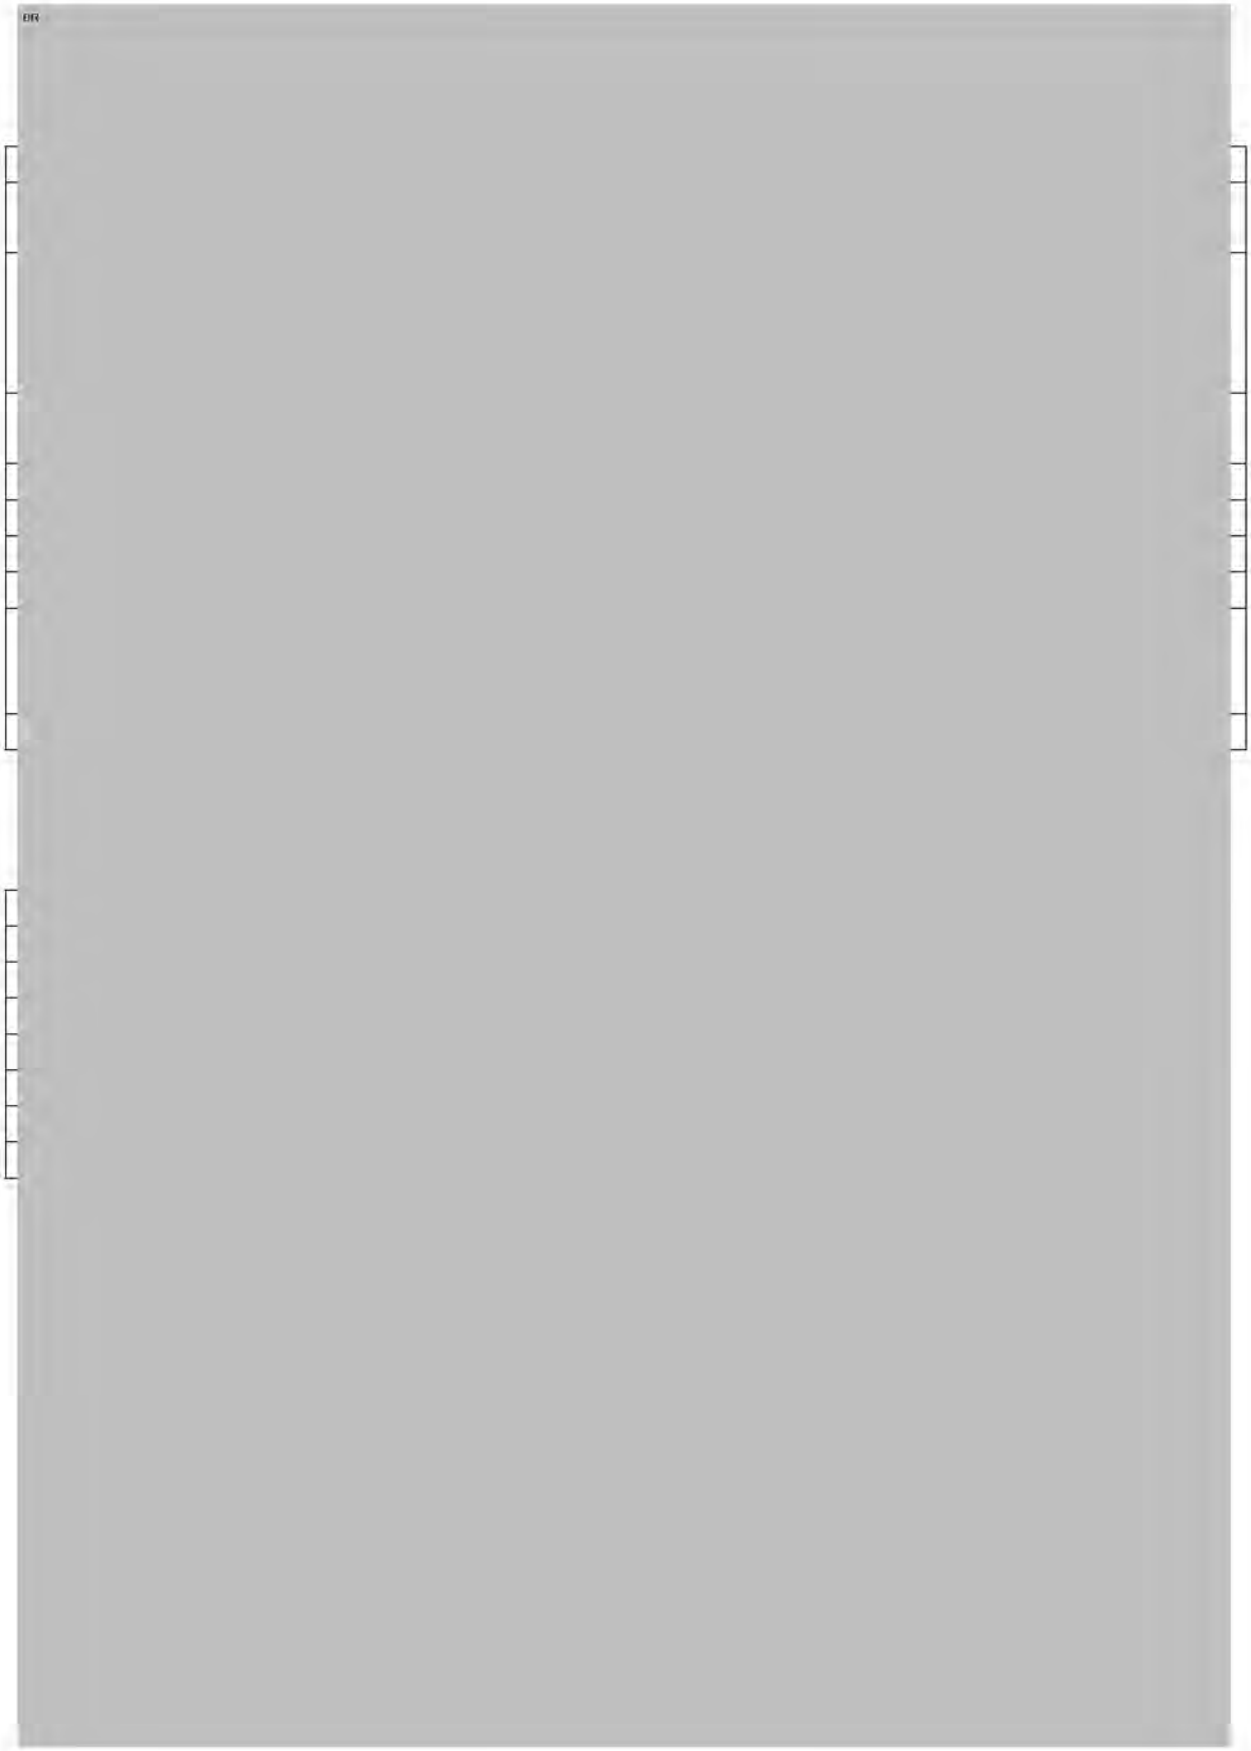

Docnr20

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 30 SEPT 2018 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 15-jan-20 | 9 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie vertraagd. |
| BR | | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

BR

BR

Docnr20

Docnr20



Docnr21

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 4e kwartaal 2018

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 7 februari 2019**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 3.0**

Docnr21

Docnr21



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 4e kwartaal 2018
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004479

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>9 januari 2019 | Versie 0.1<br>11 januari 2019 | Versie 1.0<br>16 januari 2019 | Versie 2.0<br>23 januari 2019 | Versie 3.0<br>7 februari 2019 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr21



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

*1.1 Financiën* 7

*1.2 Planning* 8

*1.3 Risico's* 8

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 9

*2.1 Omgevingsmanagement* 9
2.1.1 Afgelopen kwartaal 9
2.1.2 Komende kwartaal 10

*2.2 Planologie en Vergunningen* 11
2.2.1 Afgelopen kwartaal 11
2.2.2 Komende kwartaal 12

*2.3 Verwervingen* 13
2.3.1 Afgelopen kwartaal 13
2.3.2 Komende kwartaal 13

*2.4 Overeenkomsten* 14
2.4.1 Afgelopen kwartaal 14
2.4.2 Komende kwartaal 14

*2.5 Communicatie* 15
2.5.1 Afgelopen kwartaal 15

- *Er lagen vondsten van de Rotterdamsebaan.* 15

2.5.2 Komende kwartaal 16
2.5.3 Diversen 16

3 Projectvoortgang 17

*3.1 Aanbesteden en contracteren* 17
3.1.1 Afgelopen kwartaal 17
3.1.2 Komende kwartaal 18

*3.2 Vormgeving* 19
3.2.1 Afgelopen kwartaal 19
3.2.2 Komende kwartaal 19

*3.3 Monitoring* 21
3.3.1 Afgelopen kwartaal 21
3.3.2 Komende kwartaal 21

*3.4 Inpassing Binckhorst* 22
3.4.1 Afgelopen kwartaal 22
3.4.2 Komende kwartaal 22

*3.5 Inpassing Vlietzone* 23
3.5.1 Afgelopen kwartaal 23
3.5.2 Komende kwartaal 23

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* 24
3.6.1 Afgelopen kwartaal 24
3.6.2 Komende kwartaal 24

Docnr21



*3.7 Boortunnel en toeritten* 25
3.7.1 Afgelopen kwartaal 25
3.7.2 Komende kwartaal 26

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* 27
3.8.1 Afgelopen kwartaal 27
3.8.2 Komende kwartaal 27

*3.9 Installaties* 29
3.9.1 Afgelopen kwartaal 29
3.9.2 Komende kwartaal 29

*3.10 Veiligheid en gezondheid* 30
3.10.1 Afgelopen kwartaal 30
3.10.2 Komende kwartaal 30

*3.11 Bediencentrale* 31
3.11.1 Afgelopen kwartaal 31
3.11.2 Komende kwartaal 32

*3.12 Uitvoeringskwaliteit* 33
3.12.1 Afgelopen kwartaal 33
3.12.2 Komende kwartaal 33

*3.13 Contractmanagement* 34
3.13.1 Afgelopen kwartaal 34
3.13.2 Komende kwartaal 34

4 Overdracht en openstelling 35

*4.1 Tunnelveiligheid* 35
4.1.1 Afgelopen kwartaal 35
4.1.2 Komende kwartaal 35

*4.2 Overdracht aan beheerders* 36
4.2.1 Afgelopen kwartaal 36
4.2.2 Komende kwartaal 36

*4.3 Beheer en onderhoud* 37
4.3.1 Afgelopen kwartaal 37
4.3.2 Komende kwartaal 37

5 Projectbeheersing 38

*5.1 Scope* 38
5.1.1 Afgelopen kwartaal 38
5.1.2 Komende kwartaal 38

*5.2 Financien* 39
5.2.1 Kostenstructuur 39
5.2.2 Dekkingen 40

*5.3 Planning* 42
5.3.1 Afgelopen kwartaal 42
5.3.2 Komende kwartaal 42

*5.4 Risico's* 43
5.4.1 Afgelopen kwartaal 43
5.4.2 Komende kwartaal 43

Docnr21



5.4.3 Financiële toprisico's 43
5.4.4 Toprisico's planning 44

*5.5 Interne kwaliteit* *46*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 46
5.5.2 Komende kwartaal 46

*5.6 Informatiebeheer* *47*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 47
5.6.2 Komende kwartaal 47
5.6.3 Kennisdeling 48

*5.7 Organisatie* *49*
5.7.1 Afgelopen kwartaal 49
5.7.2 Komende kwartaal 49

6 Bijlage: Planningsmijlpalen 50

7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 51

8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 53

# 1 Managementsamenvatting

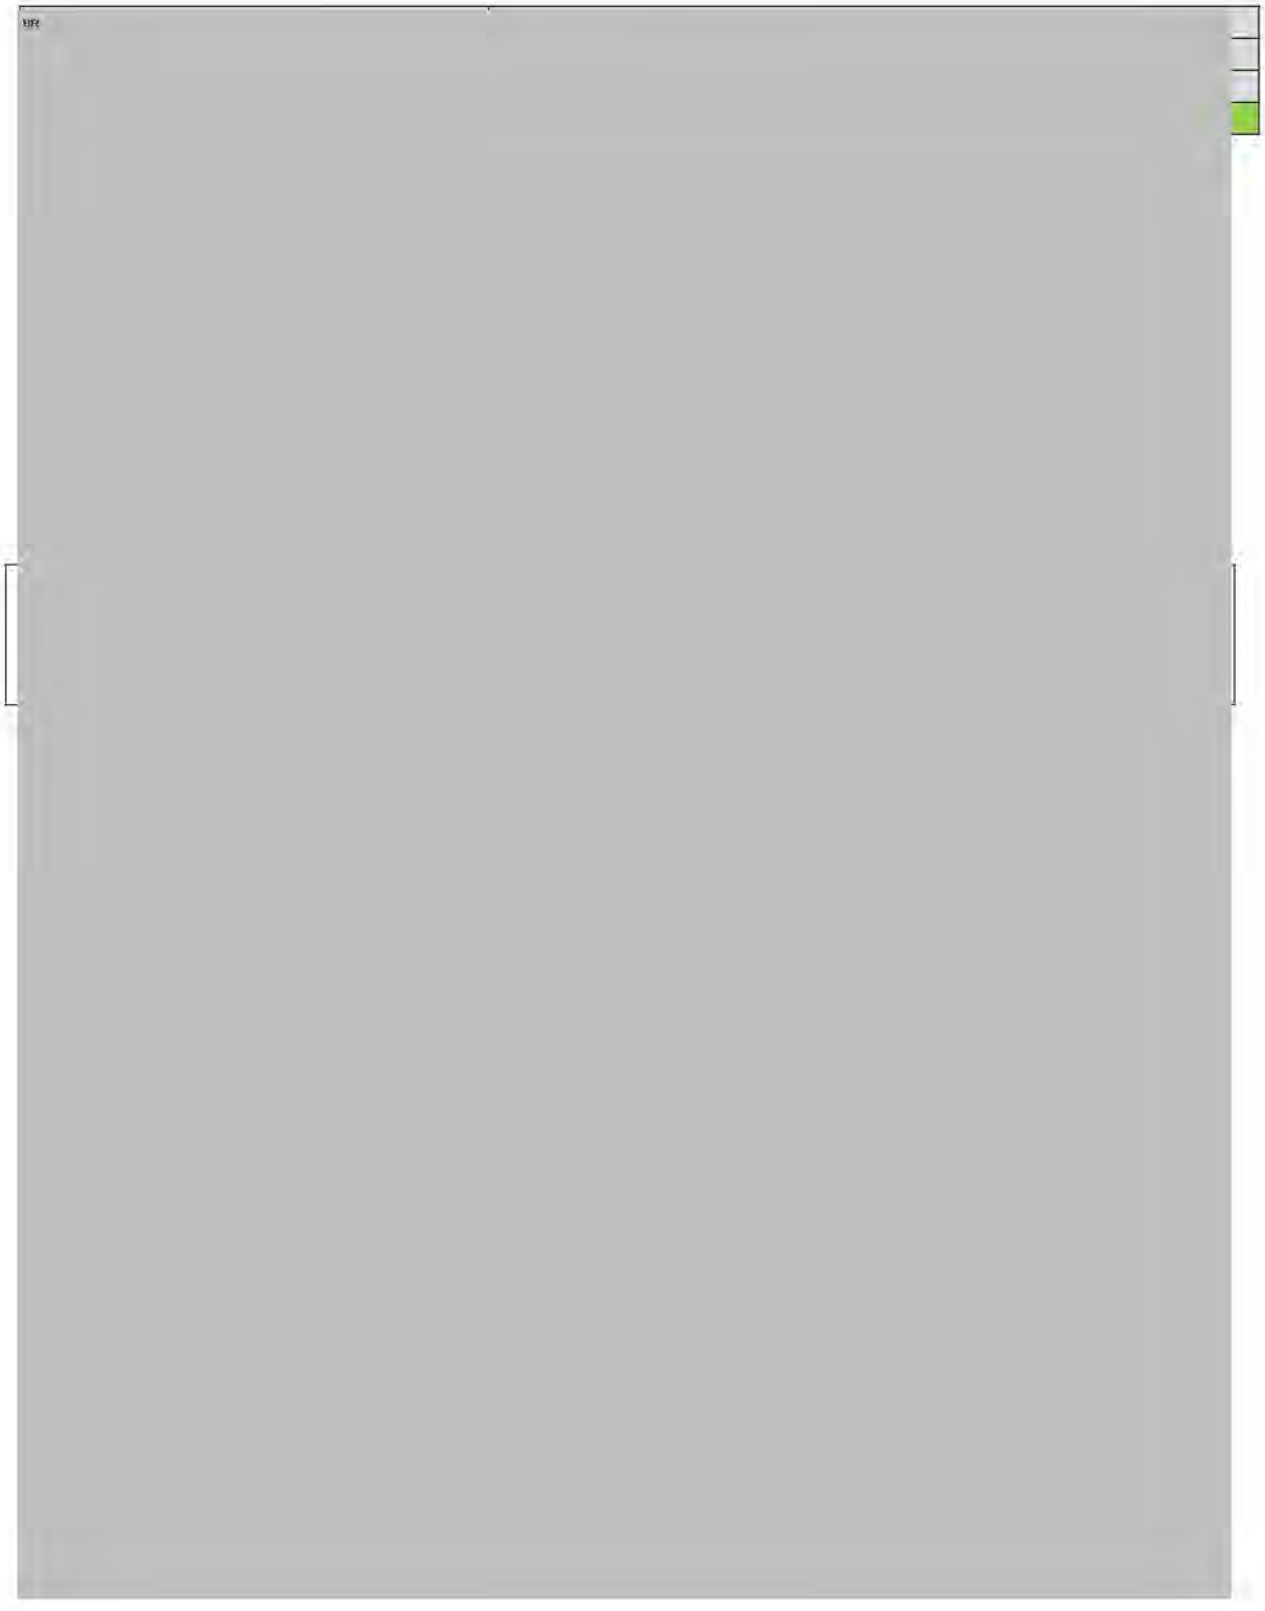

BR

## 4. TERUGBLIK AFGELOPEN KWARTAAL

Afgelopen kwartaal is er onder andere gewerkt aan:

BR

- Diverse stakeholders gesproken. Deels in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomsten of over het nader uitgewerkte ontwerp van projectonderdelen zoals het Molenvlietpark, de watertoevoer of voetgangersbrug met hellingbaan voor Drievliet;
- BR

[redacted]

## 5. VERWACHTING KOMEND KWARTAAL

Komende kwartaal wordt er onder andere gewerkt aan:

[redacted]

- Overeenstemming bereiken met particuliere grondeigenaar en provincie Zuid Holland t.b.v. de aanleg van de tweede watertoevoer;

[redacted]

- Realiseren van diverse onderdelen van het Molenvlietpark, waaronder recreatieve voetgangersbruggen, de aflaatconstructie en het fietspad tussen Laan van Hoornwijck en Drievliet;

[redacted]

BR

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Diverse stakeholders spreken. | Diverse stakeholders gesproken. Deels in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomsten of over het nader uitgewerkte ontwerp van projectonderdelen zoals het Molenvlietpark, de watertoevoer of voetgangersbrug met hellingbaan voor Drievliet.<br>Ook is er periodiek contact met het Schadebureau Rotterdamsebaan. |
| BR | |
| | |

| Overige / extra verrichte werkzaamheden |
|---|
| Op 31 oktober 2018 heeft een bijeenkomst van de begeleidingscommissie plaatsgevonden, waarin de inrichting van het Molenvlietpark is gepresenteerd. |
| Diverse stakeholders gesproken over de tijdelijke situatie op de Jan Thijssenweg, wanneer de duiker ten behoeve van de tweede toevoer wordt gemaakt. |
| BR |
| |

BR

## 2.2 Planologie en Vergunningen

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Coördineren vergunningen (o.a. binnen de projectorganisatie, maar ook d.m.v. regulier overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland en DSO). | De omgevingsvergunning voor de aflaatconstructie in het Molenvlietpark is verleend evenals de vergunning voor de fundatie van de loopbrug Drievliet en separaat voor de bovenbouw van de loopbrug Drievliet.<br>CRB heeft voor de bouw van de recreatieve bruggen I, II en III in het Molenvlietpark omgevingsvergunningen aangevraagd. |
| Faciliteren van de projectplanprocedure van het Hoogheemraadschap van Delfland voor de tweede watertoevoer. | Op 27 december 2018 heeft het Hoogheemraadschap van Delfland het ontwerp-projectplan voor de tweede toevoer ten behoeve van het bergingsgebied in de Vlietzone ter inzage gelegd. |
| De projectorganisatie Rotterdamsebaan zal de kapvergunning ten behoeve van de aanleg van de tweede watertoevoer aanvragen. | De kapvergunning voor de aanleg van de tweede watertoevoer is in het vierde kwartaal aangevraagd. De gemeentelijke vergunningverlener heeft de aanvraag in behandeling en voor advies voorgelegd aan de ODH. Omdat onderzoek niet kan uitsluiten dat verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan wordt de Wet natuurbescherming aangehaakt bij de procedure voor de kapvergunning. Hierdoor zal de uitgebreide voorbereidingsprocedure (26 wk) worden gevolgd. |
| [redacted] | |

### 2.2.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| BR |
| Faciliteren van de projectplanprocedure van het Hoogheemraadschap voor de tweede watertoevoer. |
| De gemeente Den Haag behandelt de kapvergunning ten behoeve van de aanleg van de tweede watertoevoer. De projectorganisatie zal een activiteitenplan ten behoeve van vleermuizen laten uitvoeren. |
| BR |

## 2.3 Verwervingen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Overleg met de eigenaar van Jan Thijssenweg 8 over de verkoopovereenkomst van een strook grond. | De voorgenomen verkoopovereenkomst wordt pas afgerond na inhoudelijke overeenstemming over de samenwerkingsovereenkomst met de buren ten behoeve van de tweede toevoer. |
| BR | |

### 2.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden komend kwartaal |
|---|
| BR |
| Indien inhoudelijke overeenstemming wordt bereikt over de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de tweede toevoer, de koopovereenkomst t.g.v. grondverkoop voor de Jan Thijssenweg 8 te Den Haag, aanpassen en afronden. |
| Verkoopovereenkomst afronden met eigenaar Jan Thijssenweg 8 (indien overeenstemming met de buren aangaande samenwerkingsovereenkomst tweede watertoevoer). |
| |
| BR |

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Samenwerkingsovereenkomst afronden t.b.v. de tweede watertoevoer via het particuliere perceel. | Er is grotendeels overeenstemming over de samenwerkingsovereenkomst. Er ligt een voorstel om overeenstemming te bereiken over de laatste openstaande punten. Een van de punten heeft veel nader onderzoek vereist. Naar verwachting kan deze overeenkomst in het volgende kwartaal afgerond worden. Daarna zullen spoedig de daarbij behorende notariële akten volgen. |
| [redacted] | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Samenwerkingsovereenkomst afronden met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. |
| [redacted] |

Docnr21



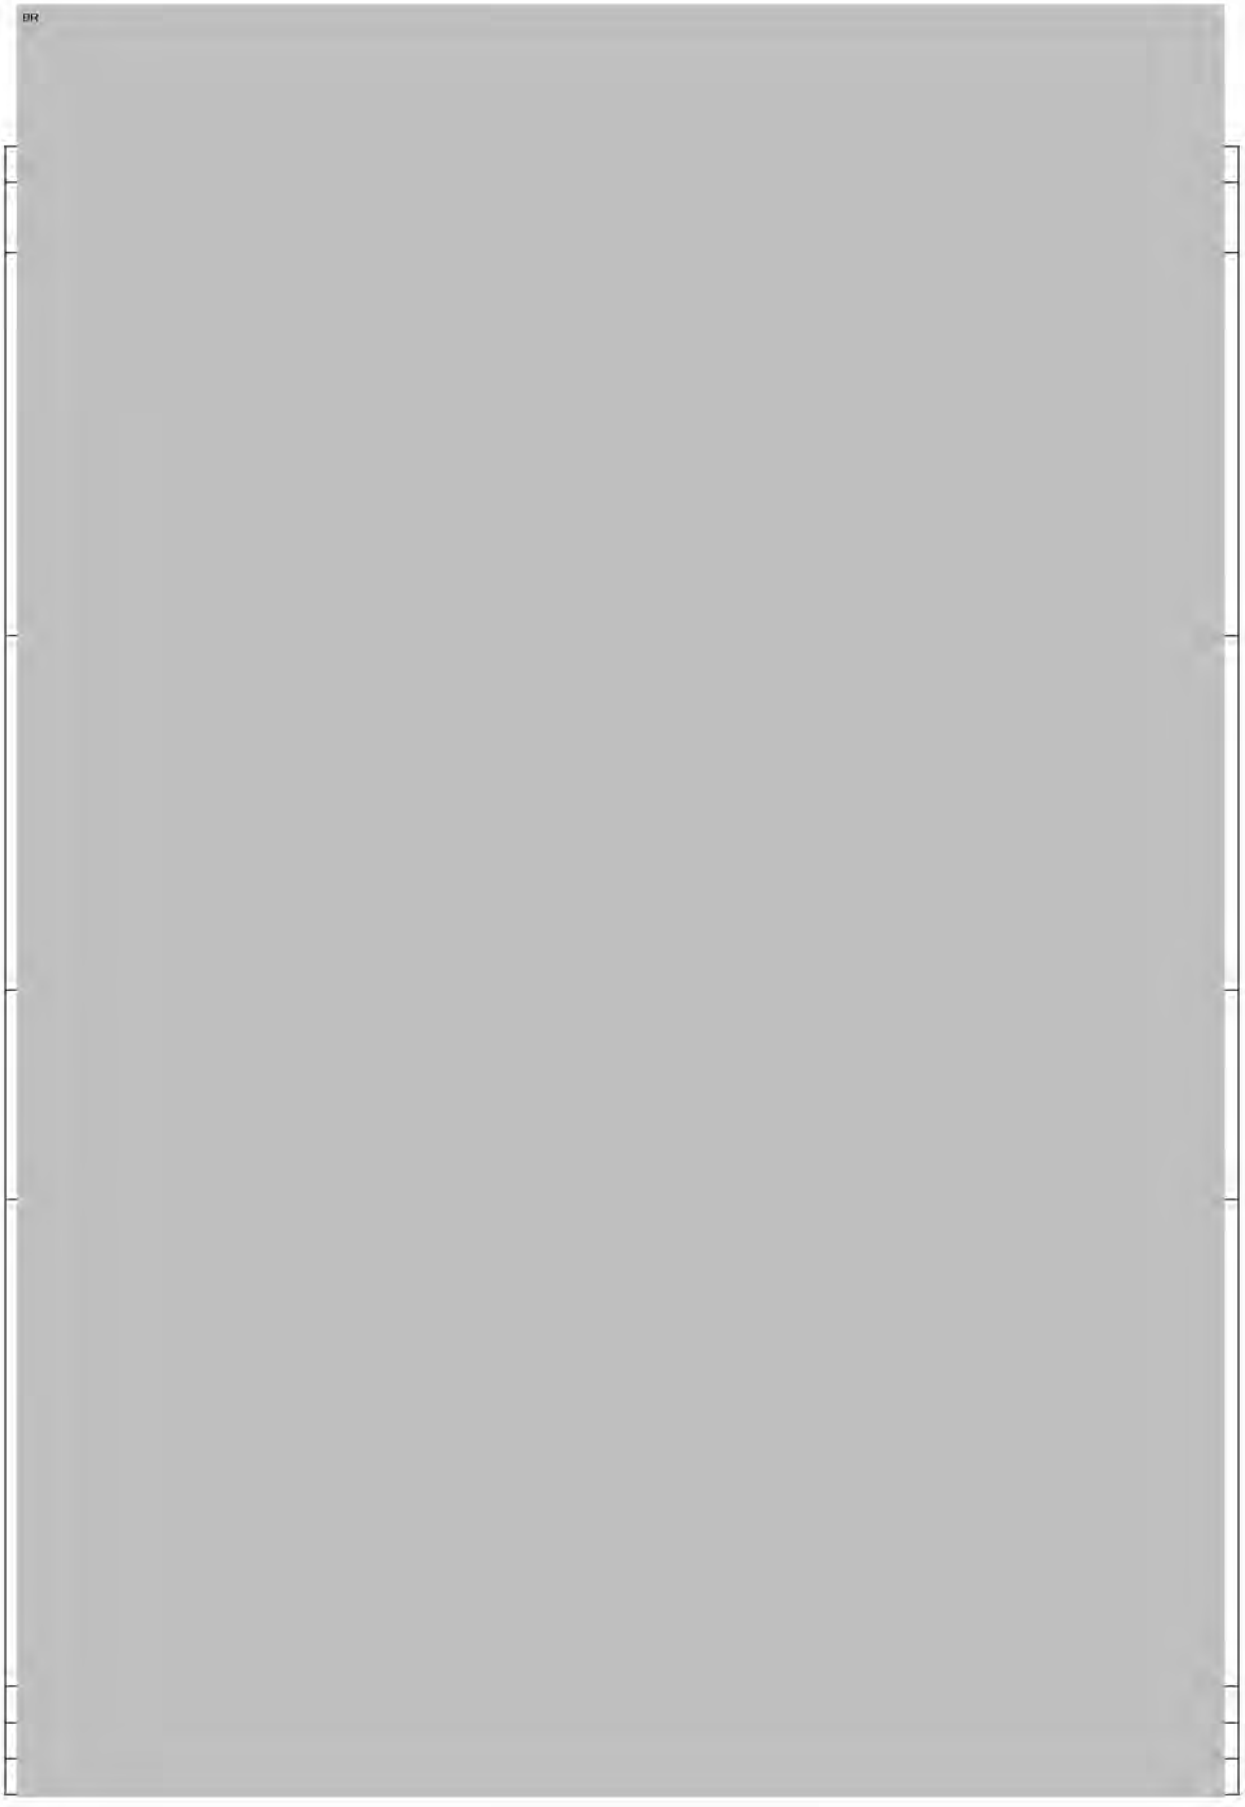

Docnr21



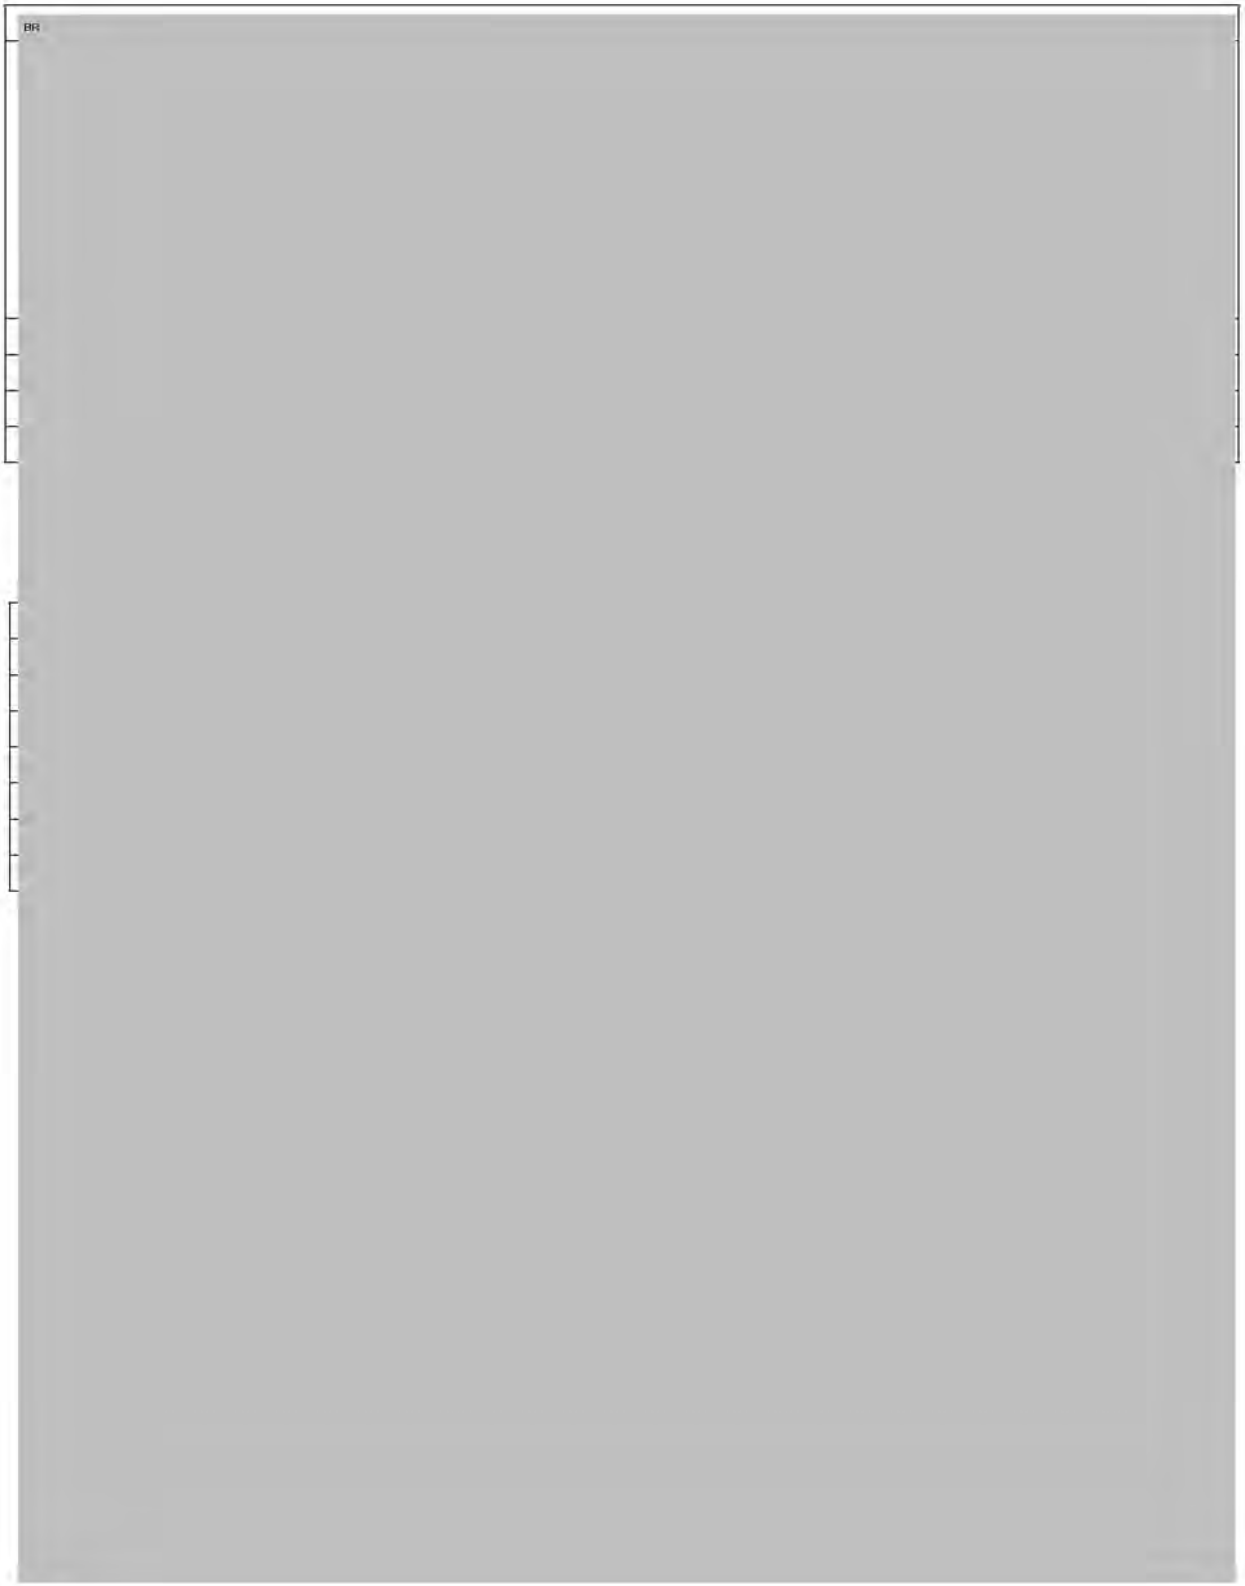

# 3 Projectvoortgang

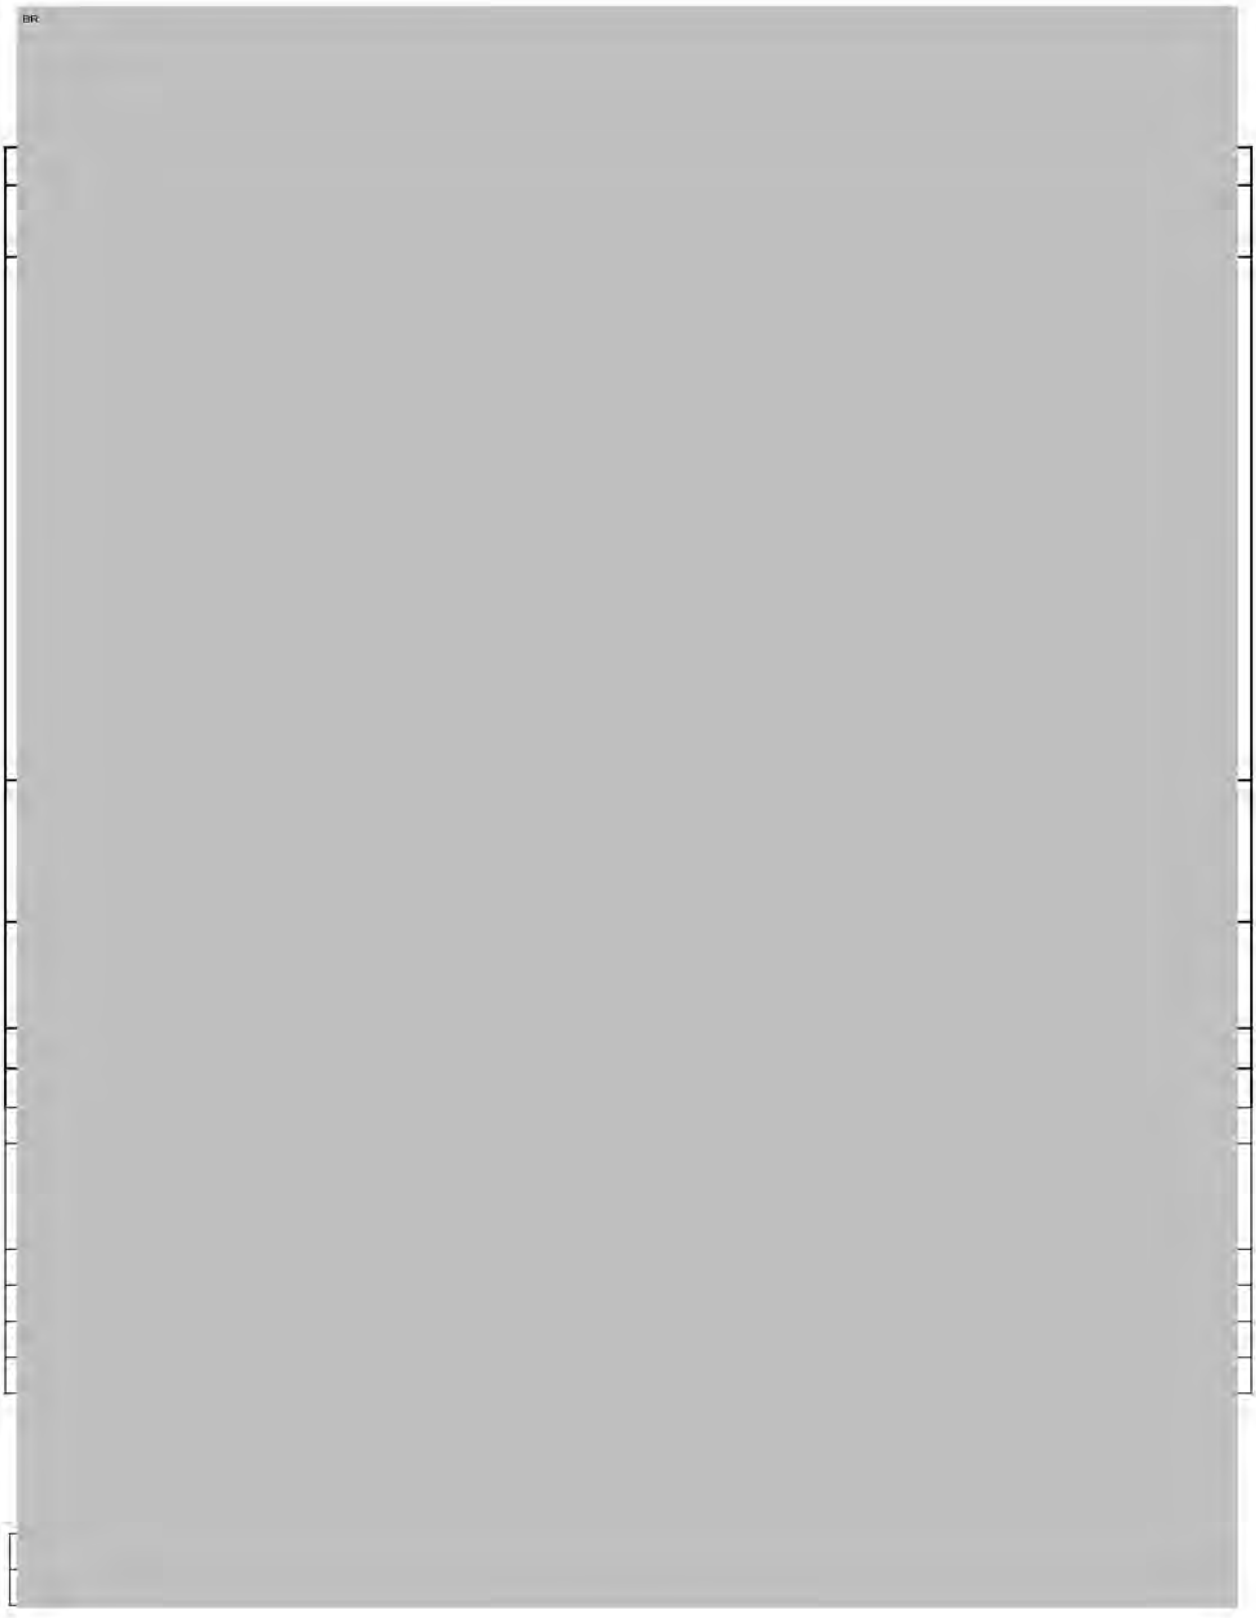

BR

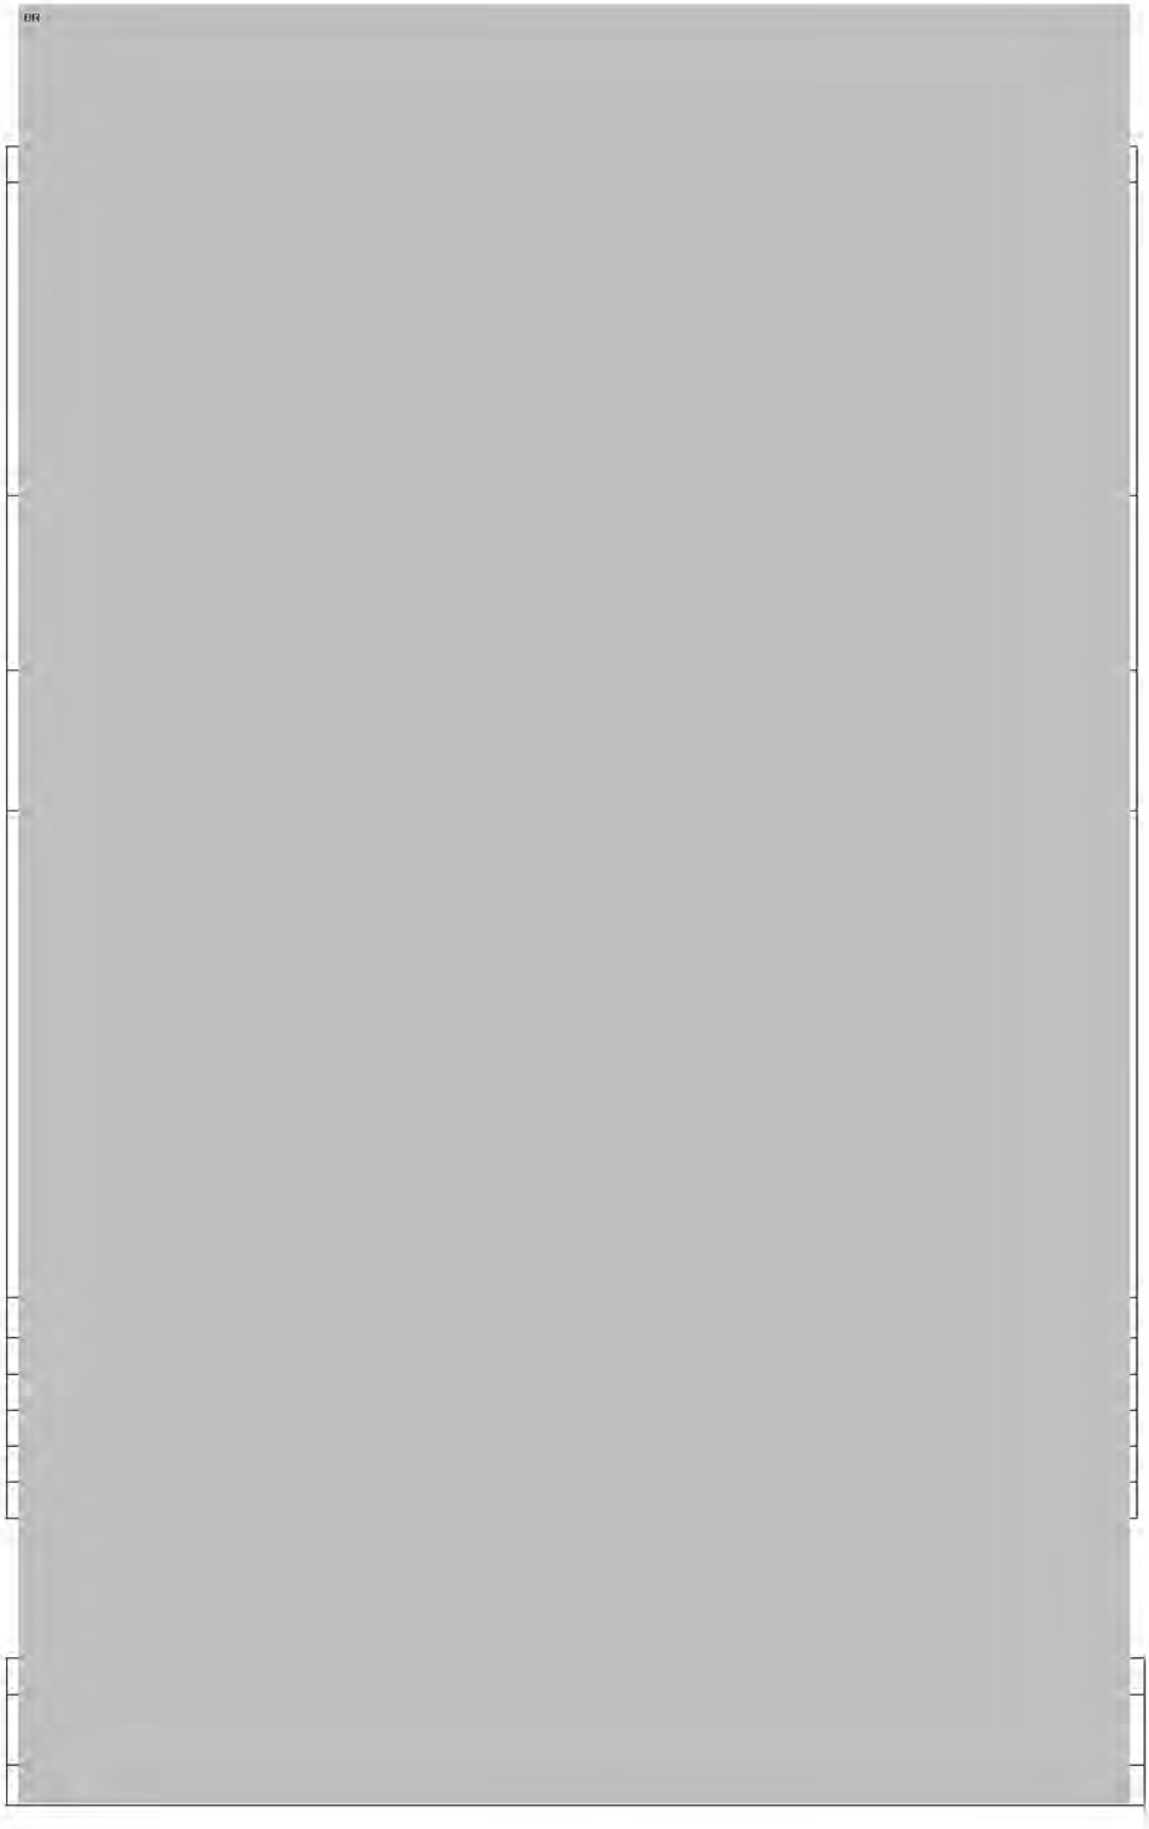

Docnr21

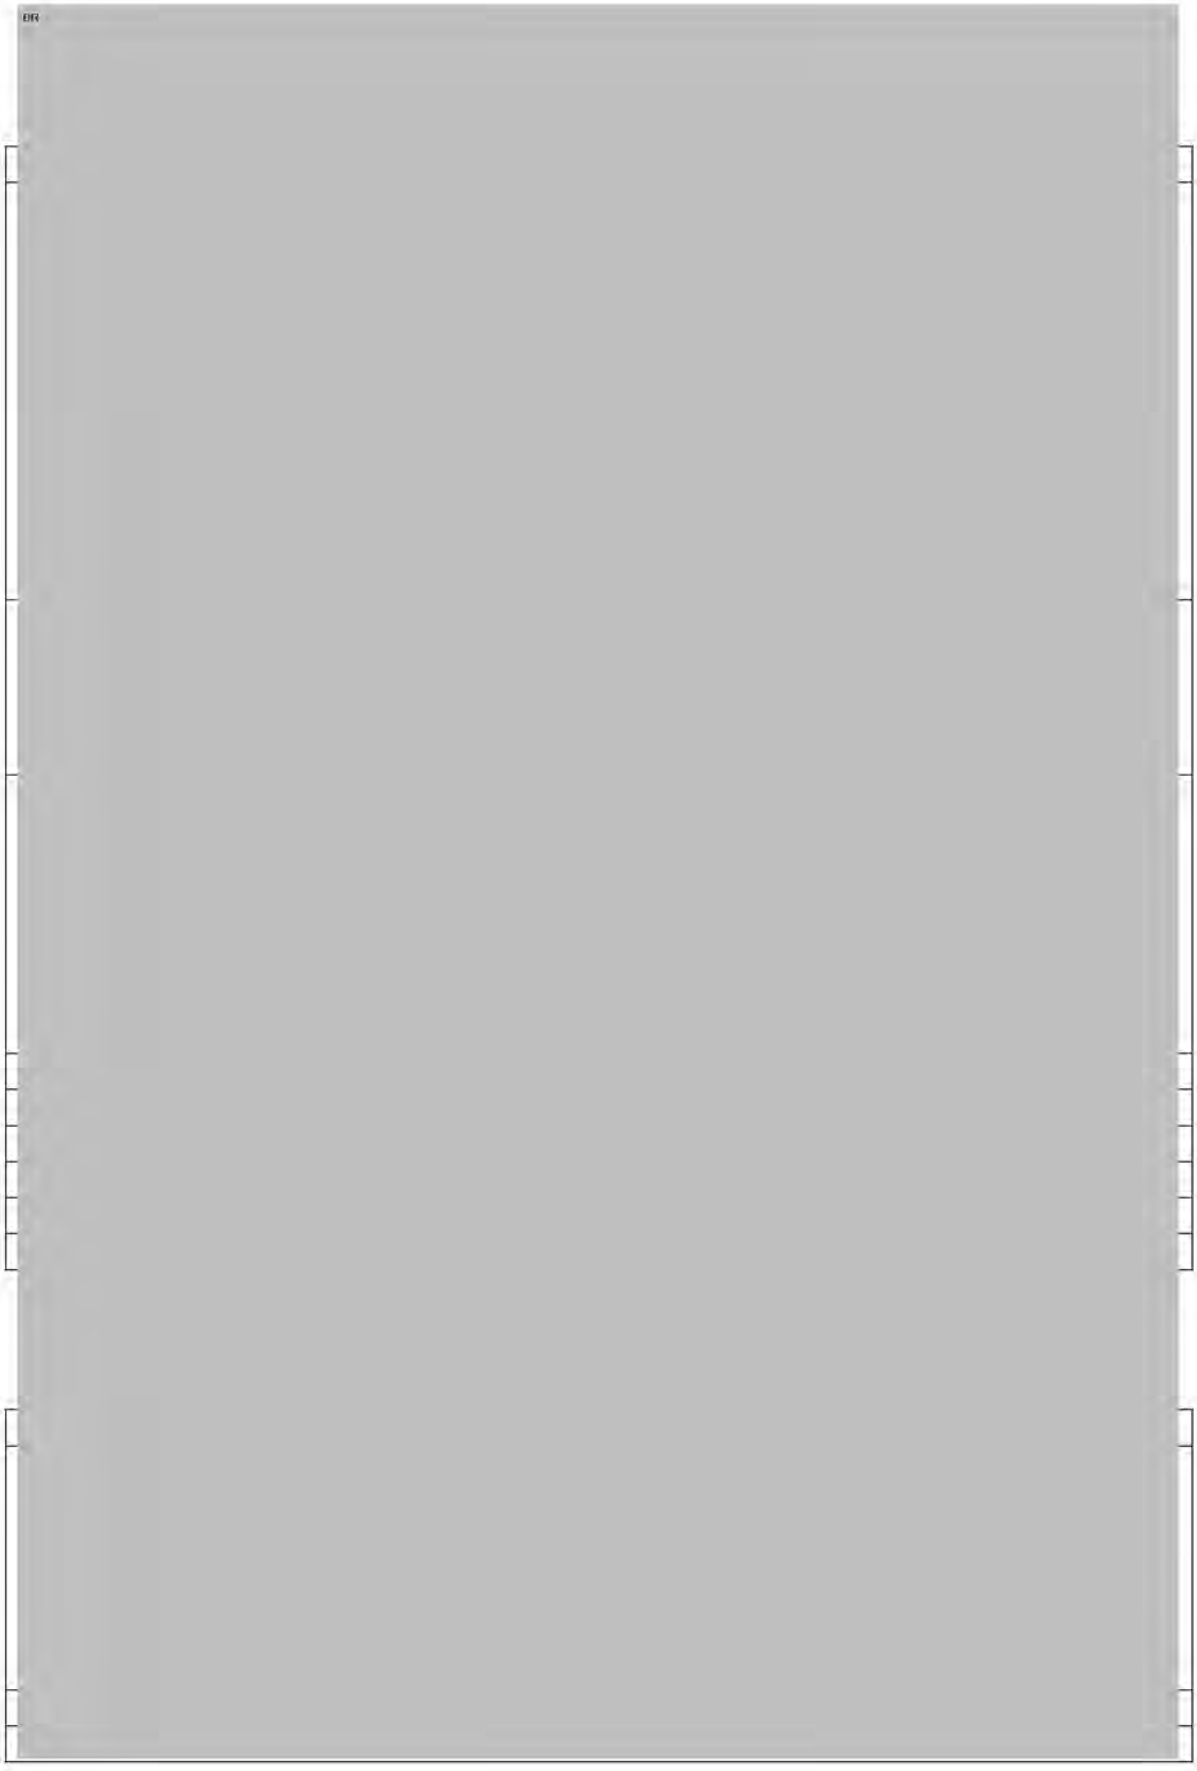

BR

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Opstellen bestek voor de tweede watertoevoer op basis van het gemaakte VO. | De onderhandelingen met de particuliere grondeigenaar (resulterend in een overeenkomst) zijn nog niet afgerond en daardoor is het ontwerp ook niet afgerond. |
| | |
| BR | |

### 3.5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Afronden ontwerp en opstellen bestek tweede toevoer. |
| BR |
| Realisatie fase 2 boezemkade Molenvlietpark |
| Realisatie recreatieve bruggen in Molenvlietpark |
| BR |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |
| |

BR

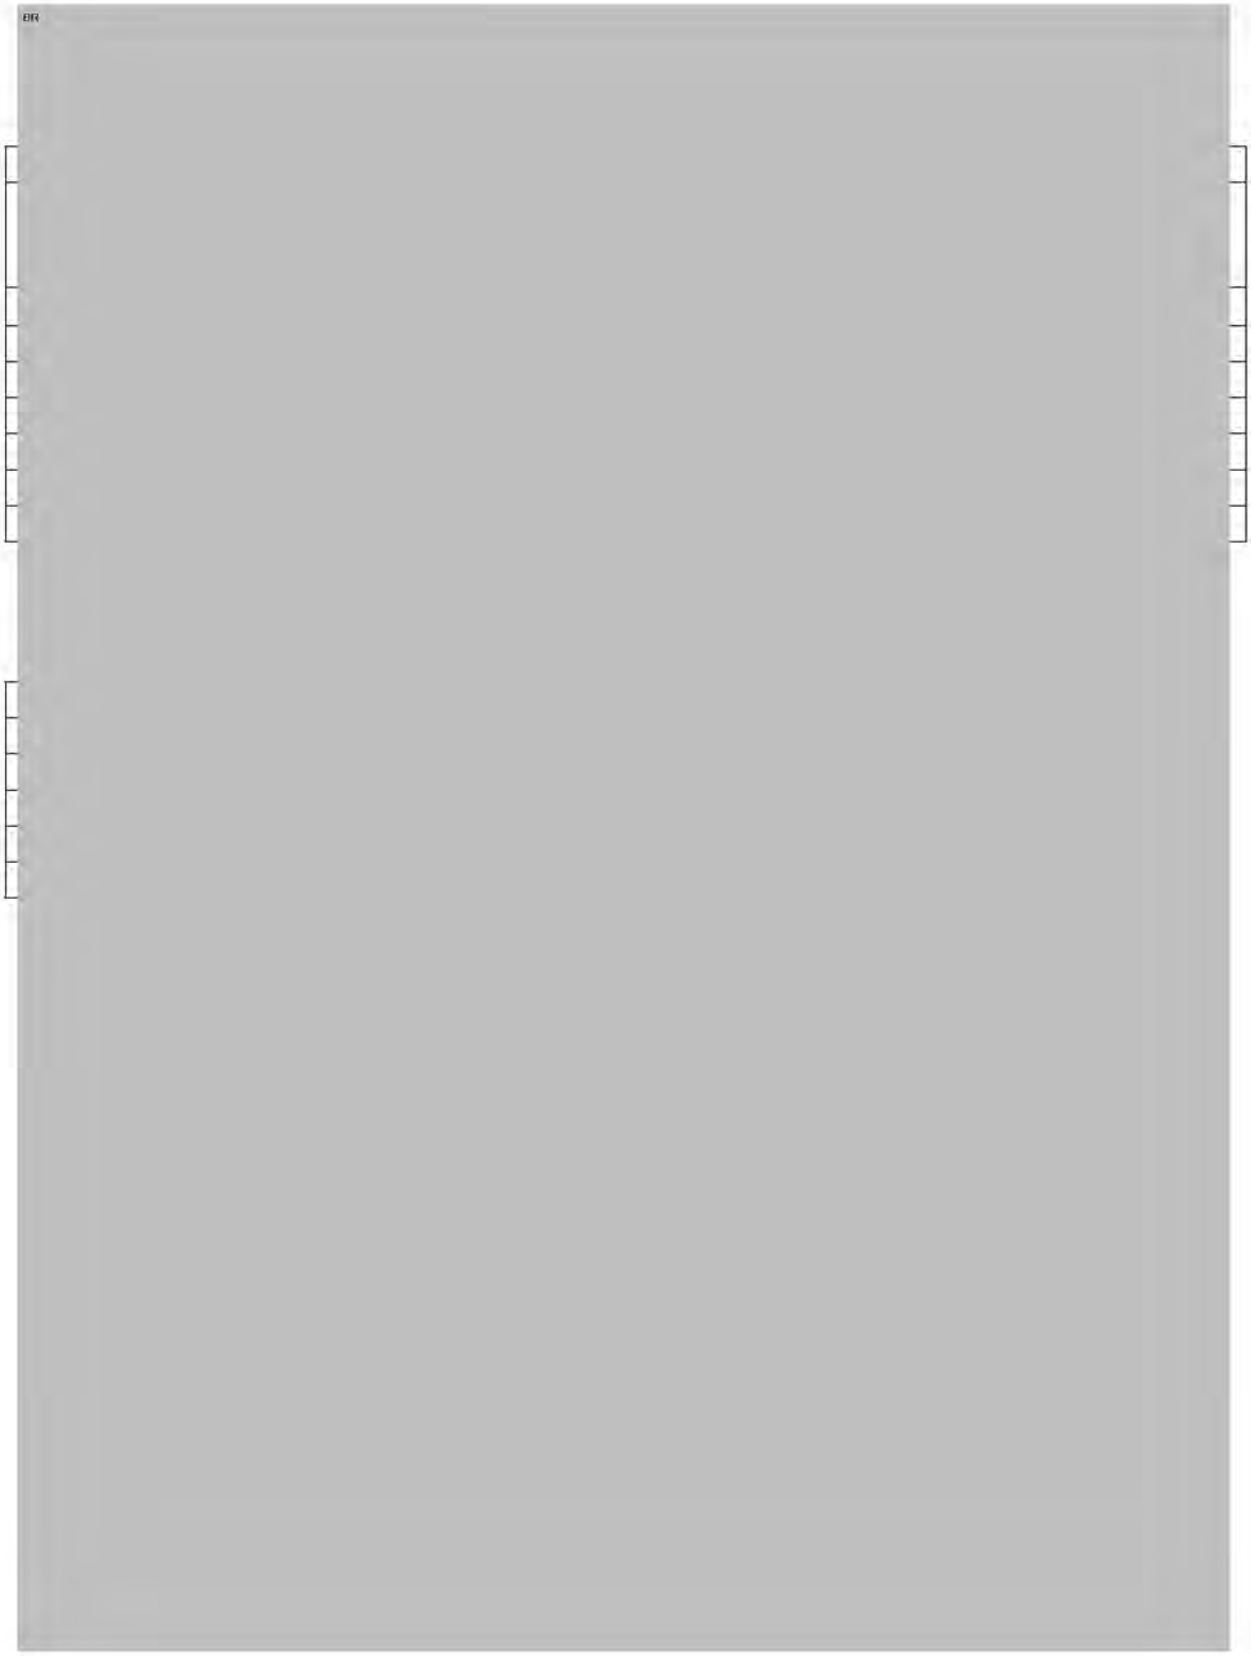
BR

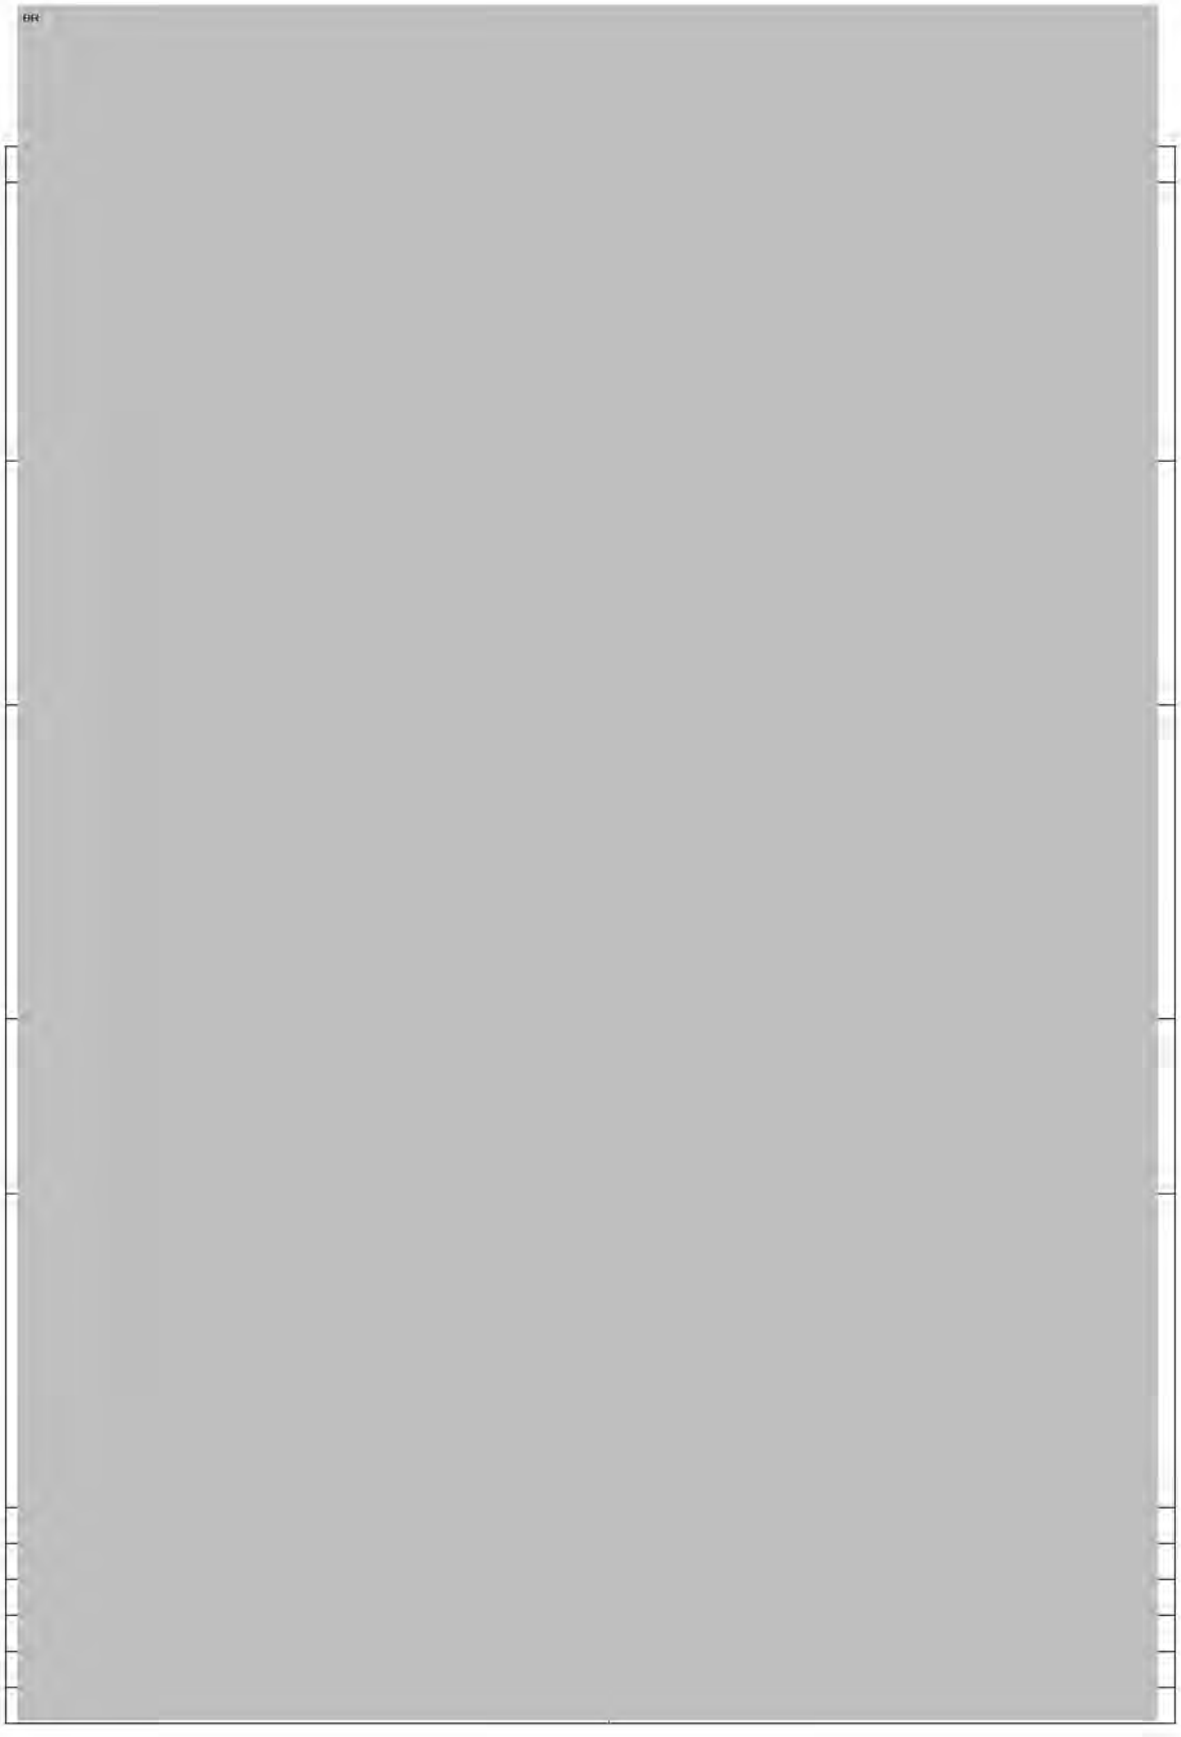

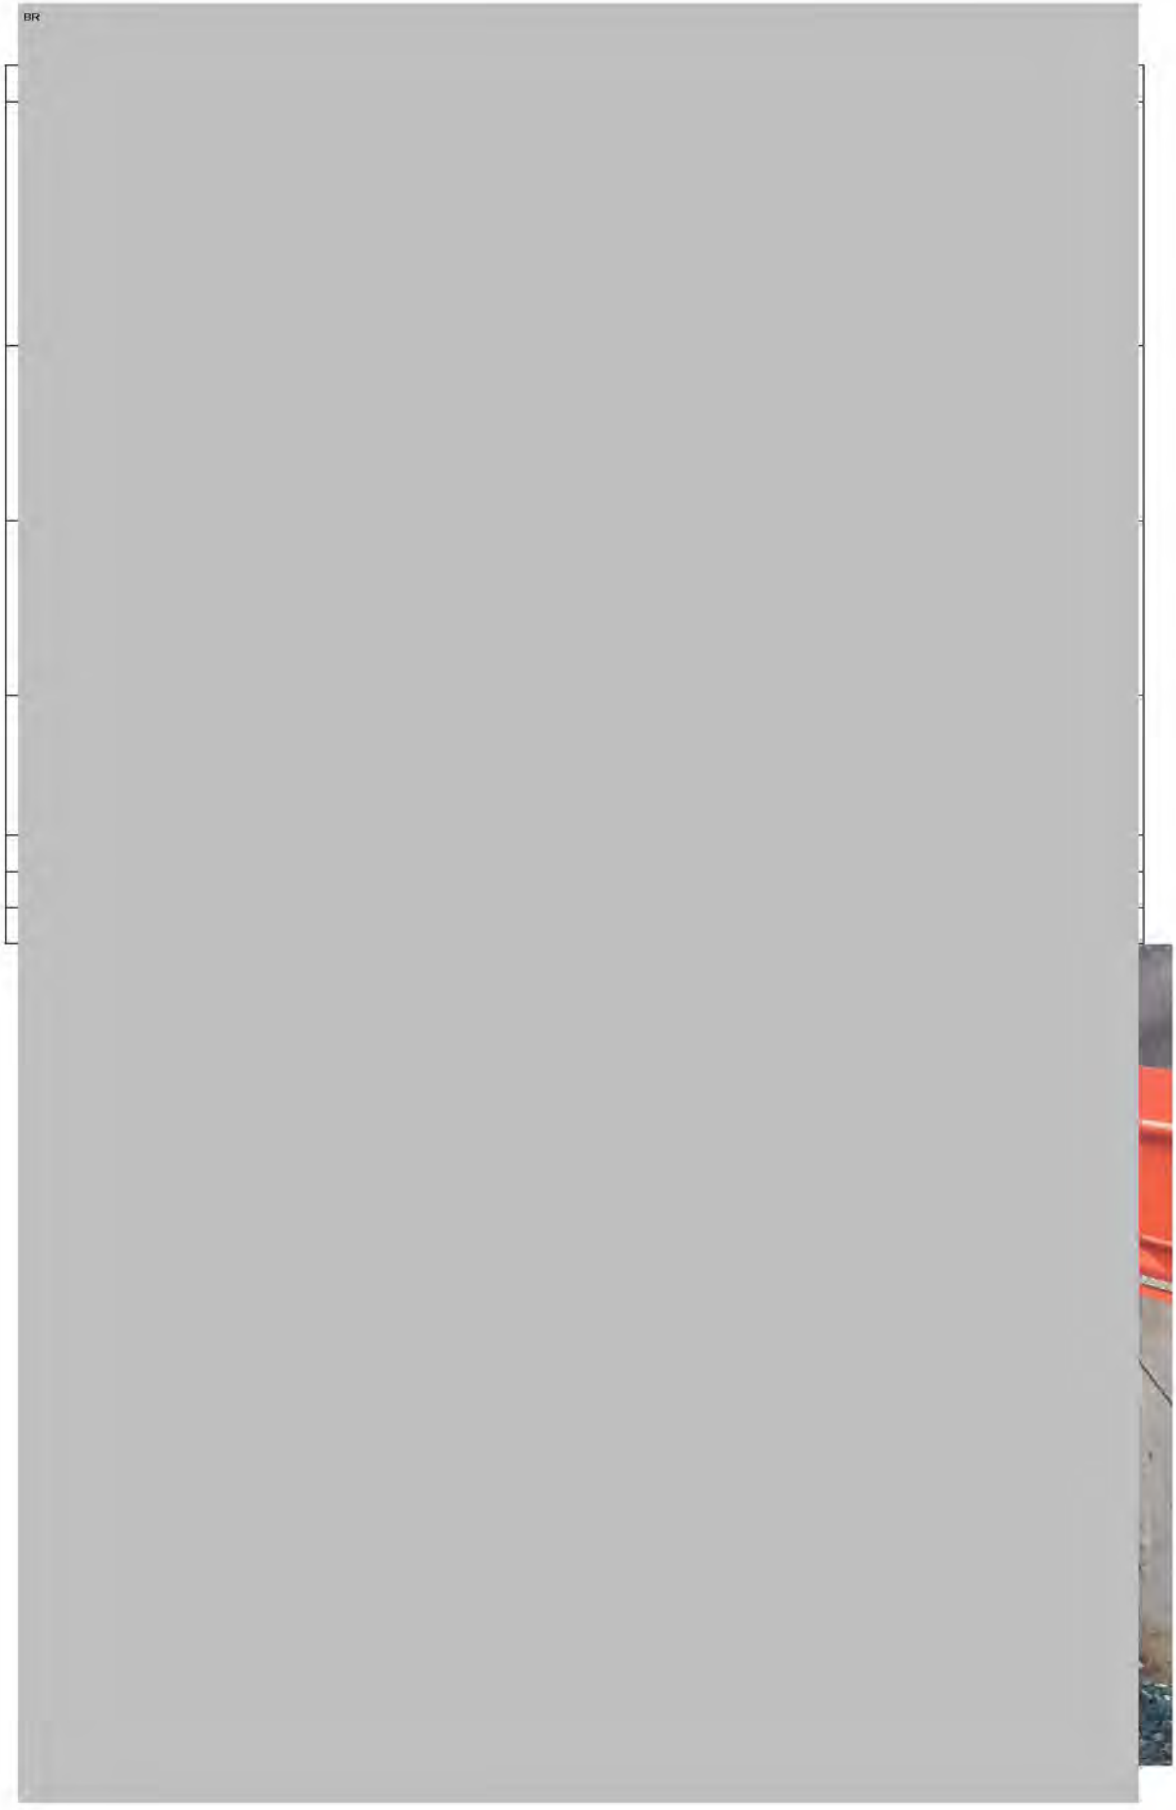
BR

Docnr21



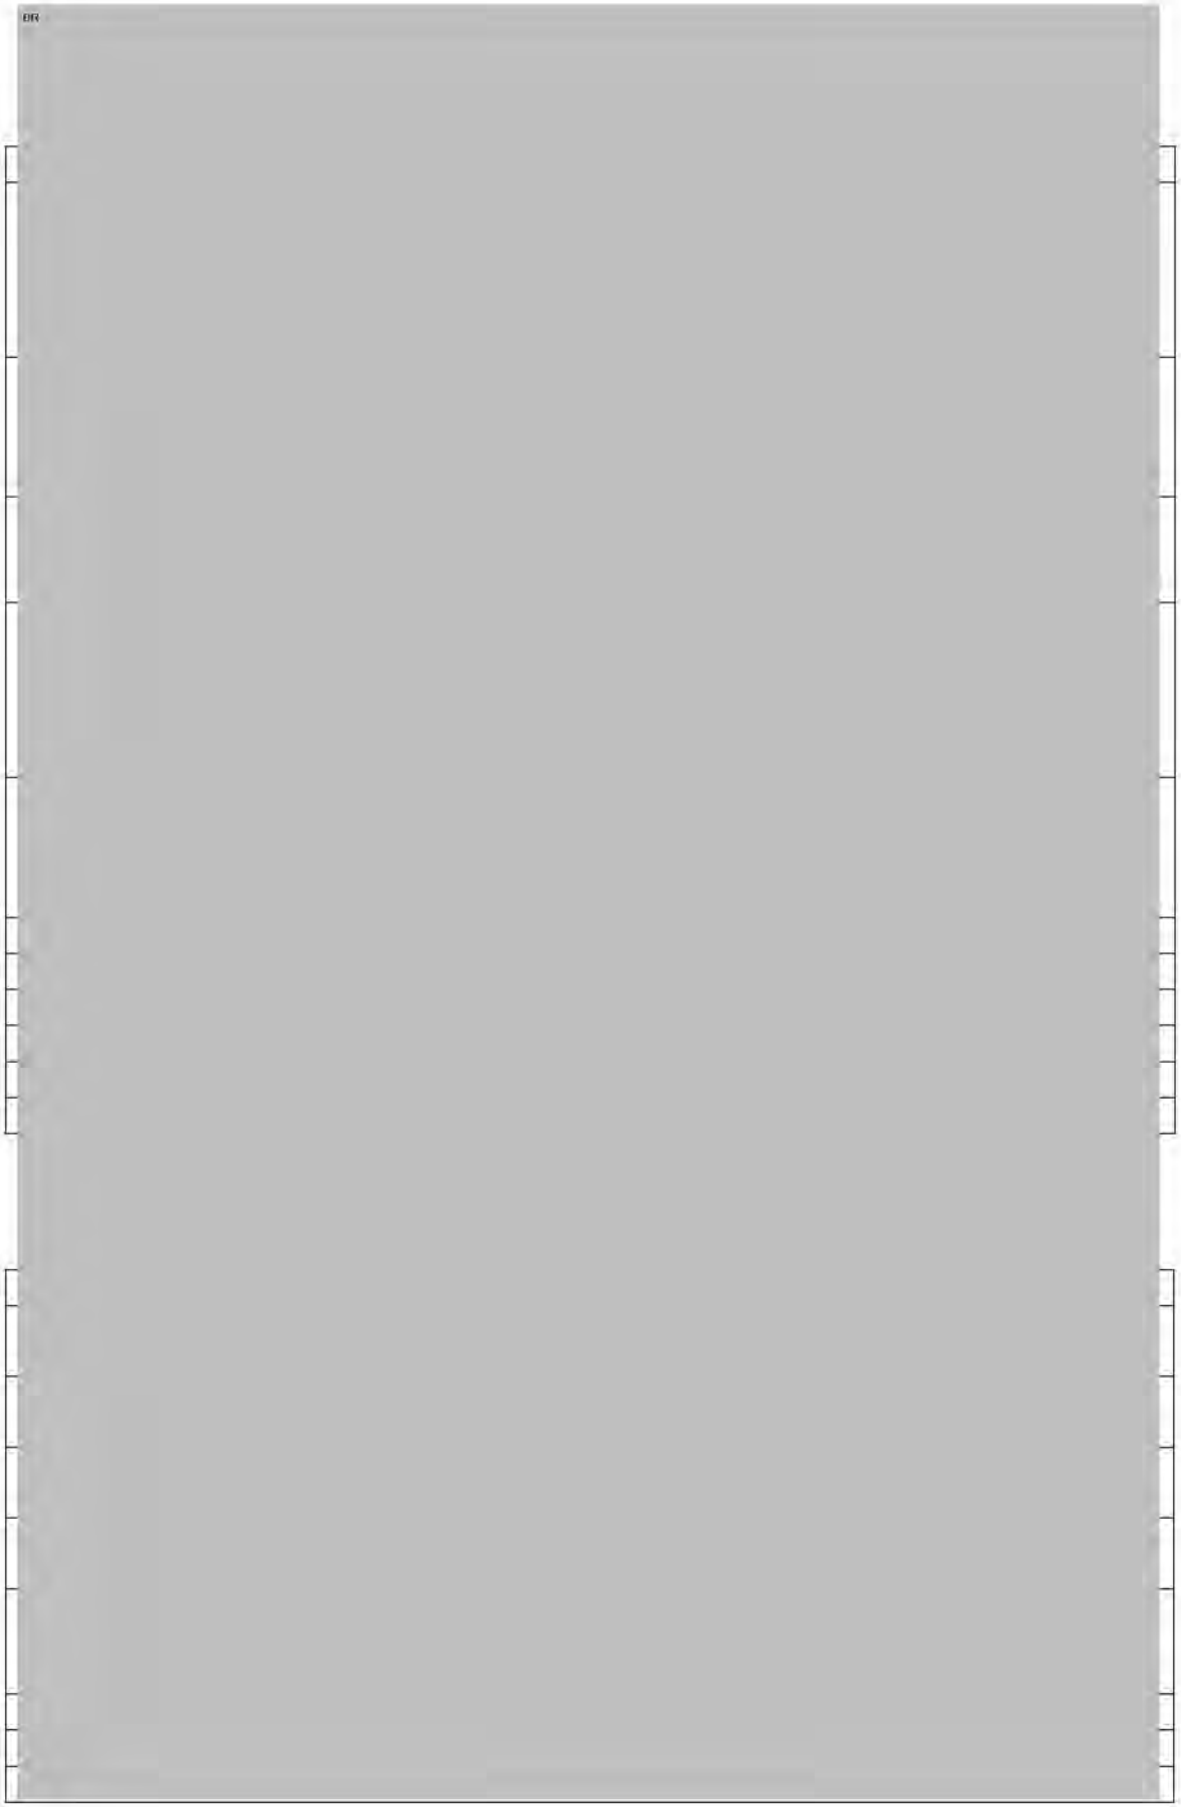

BR

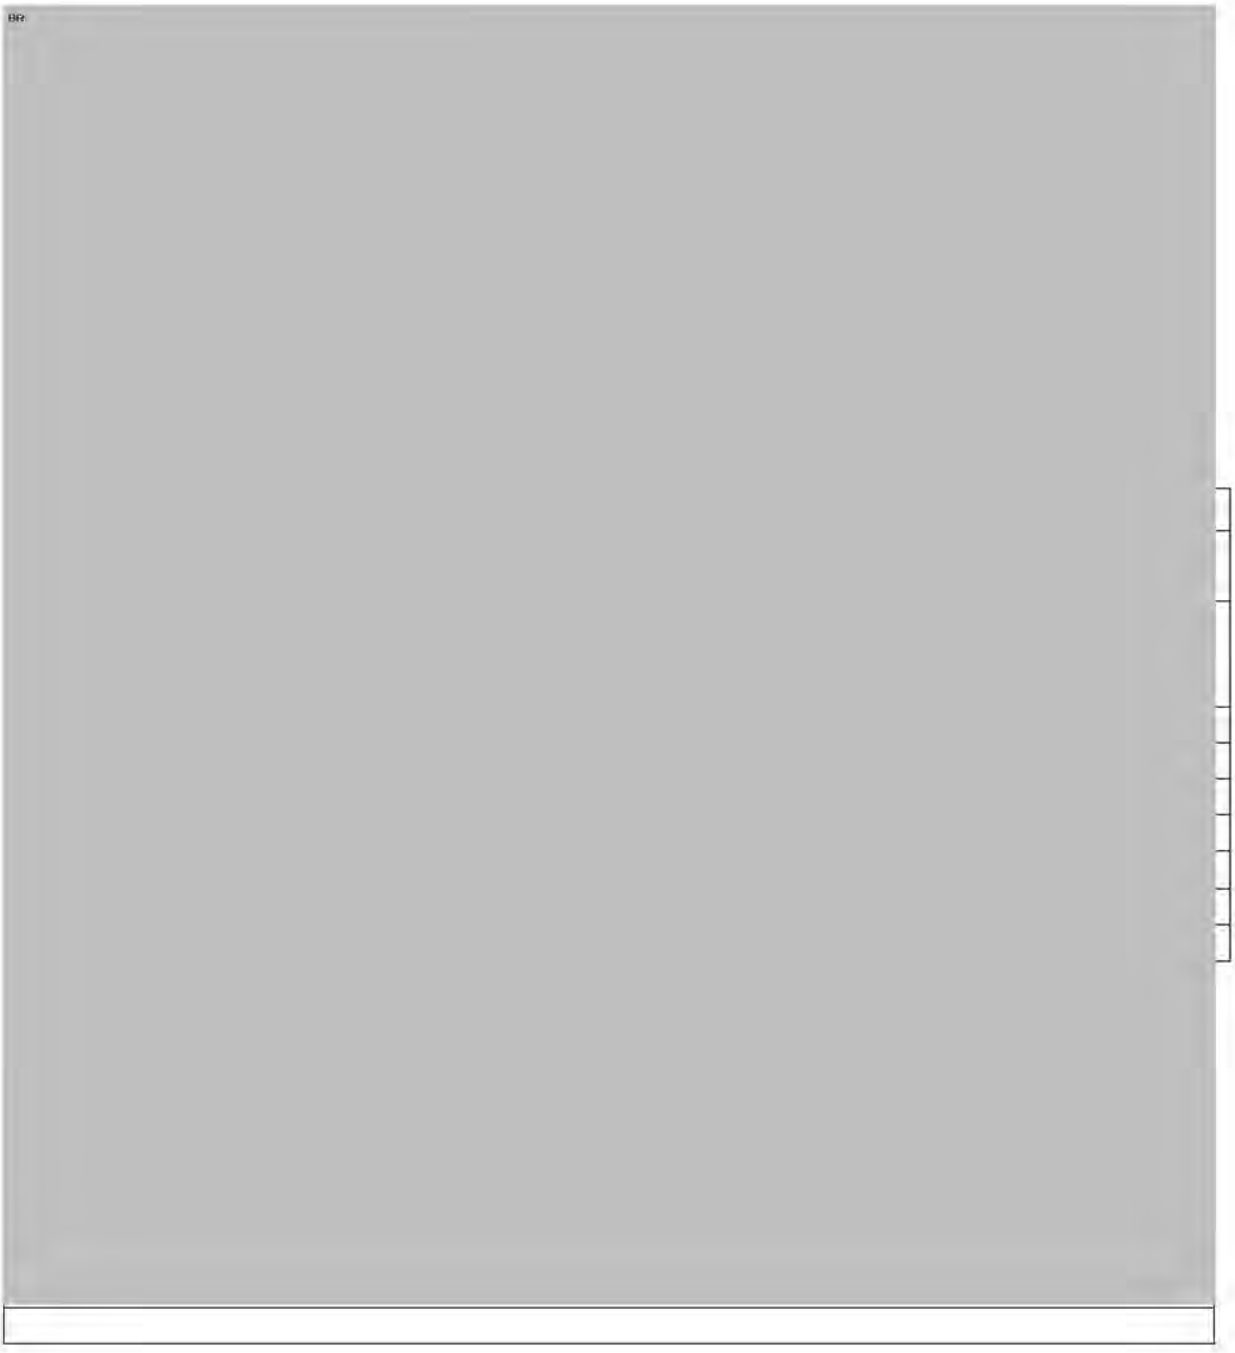

Docnr21



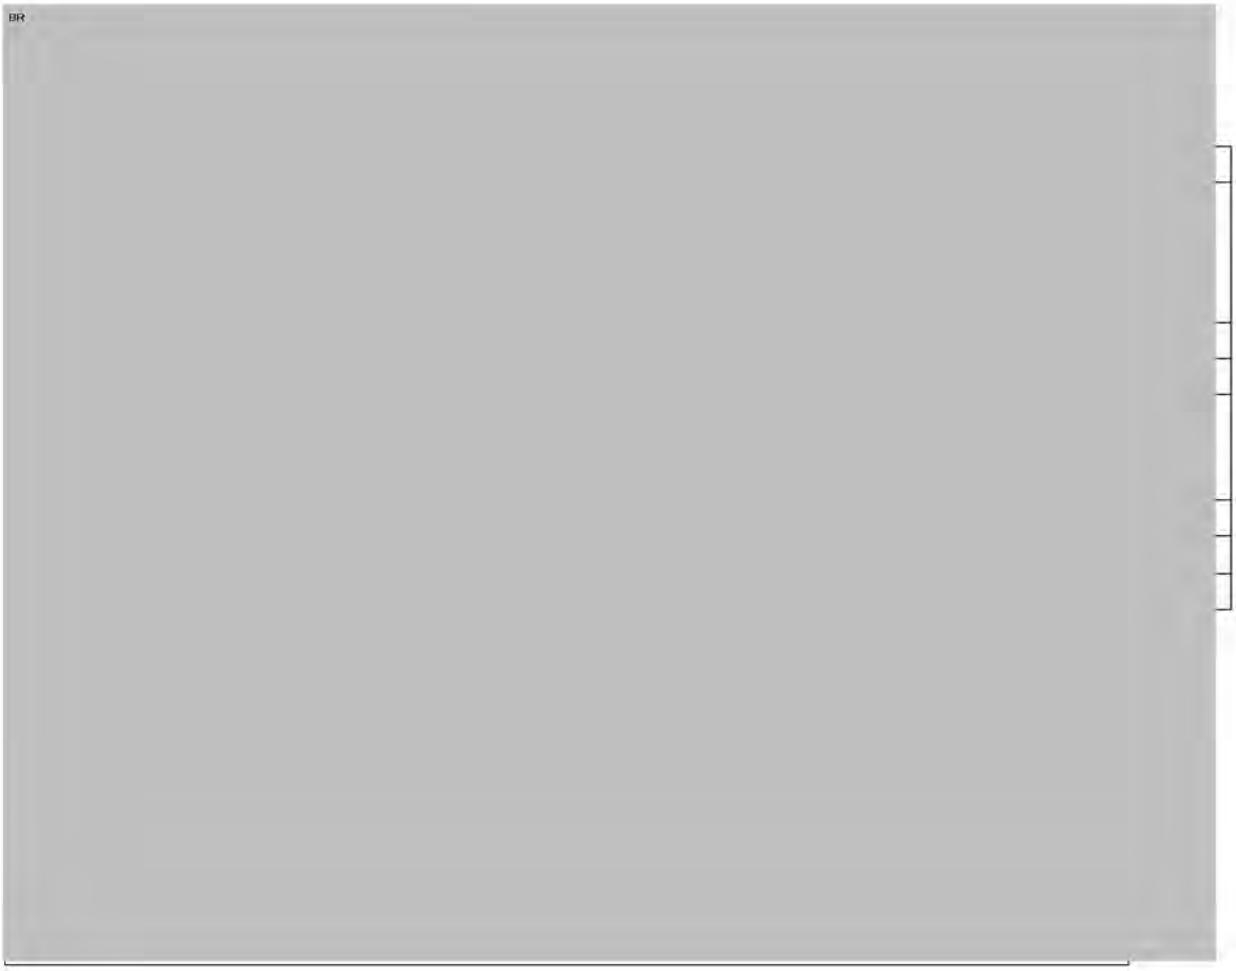

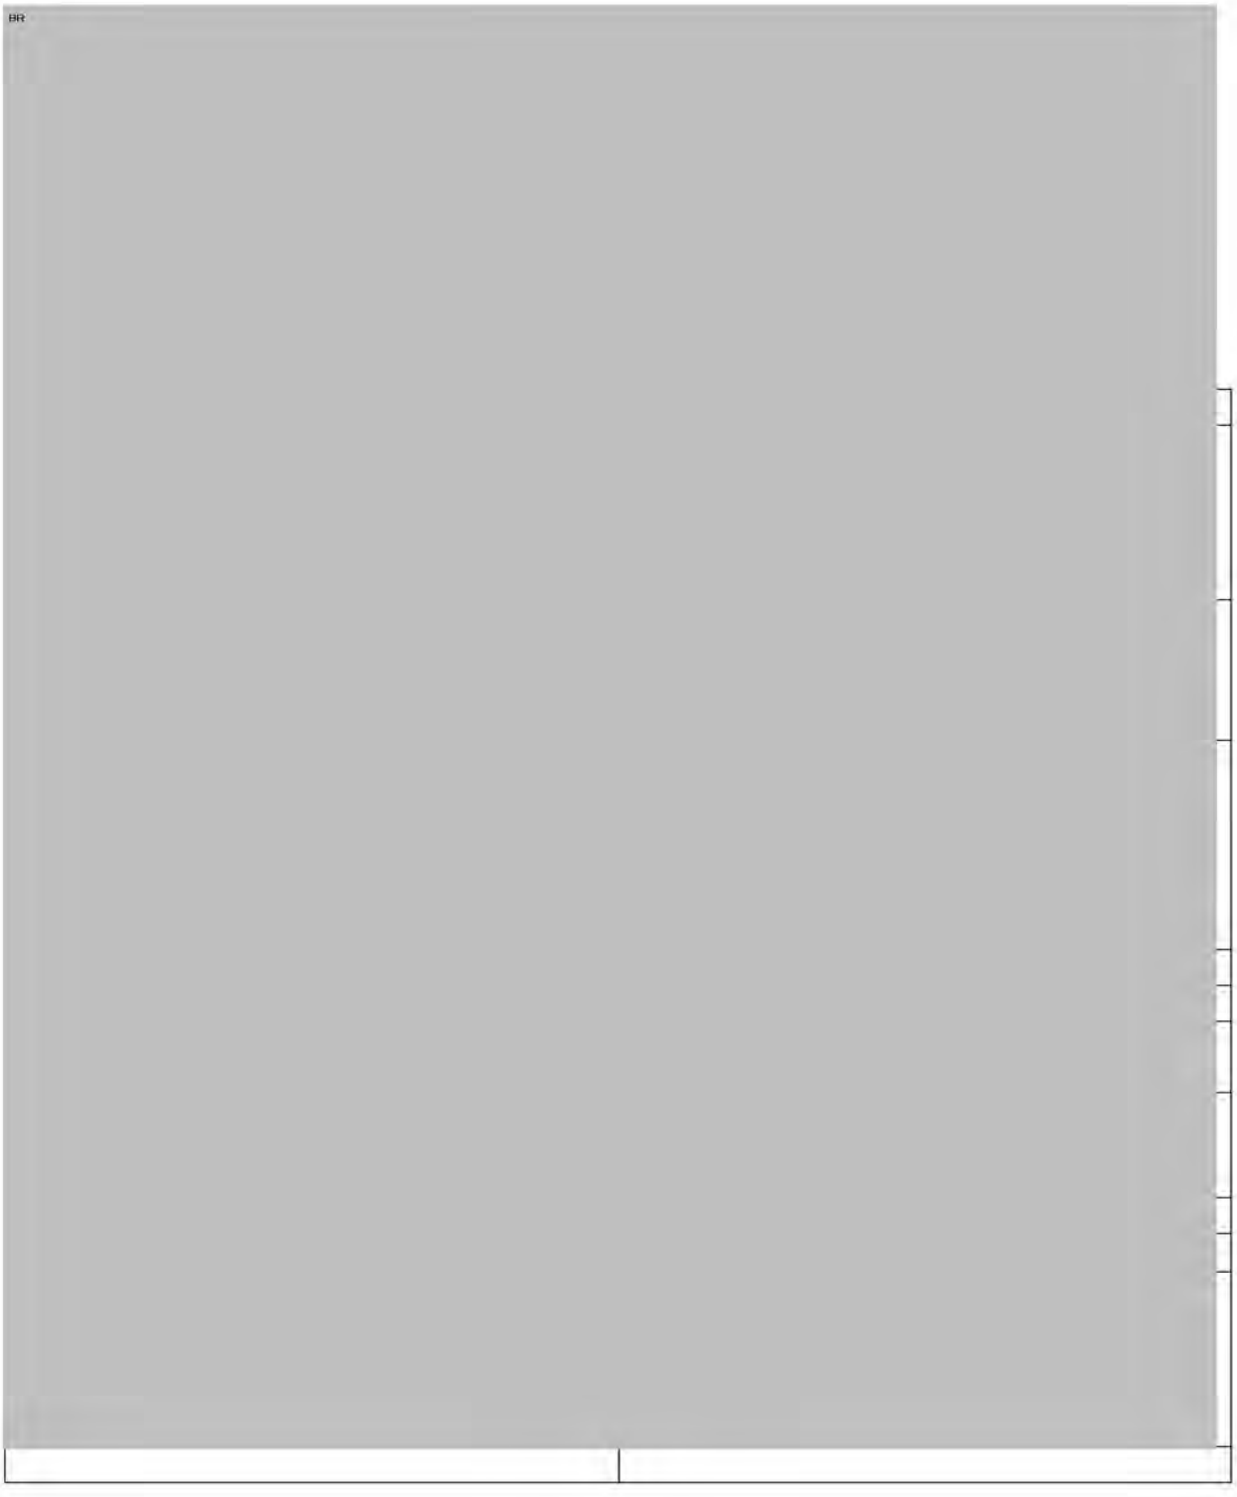
BR

BR

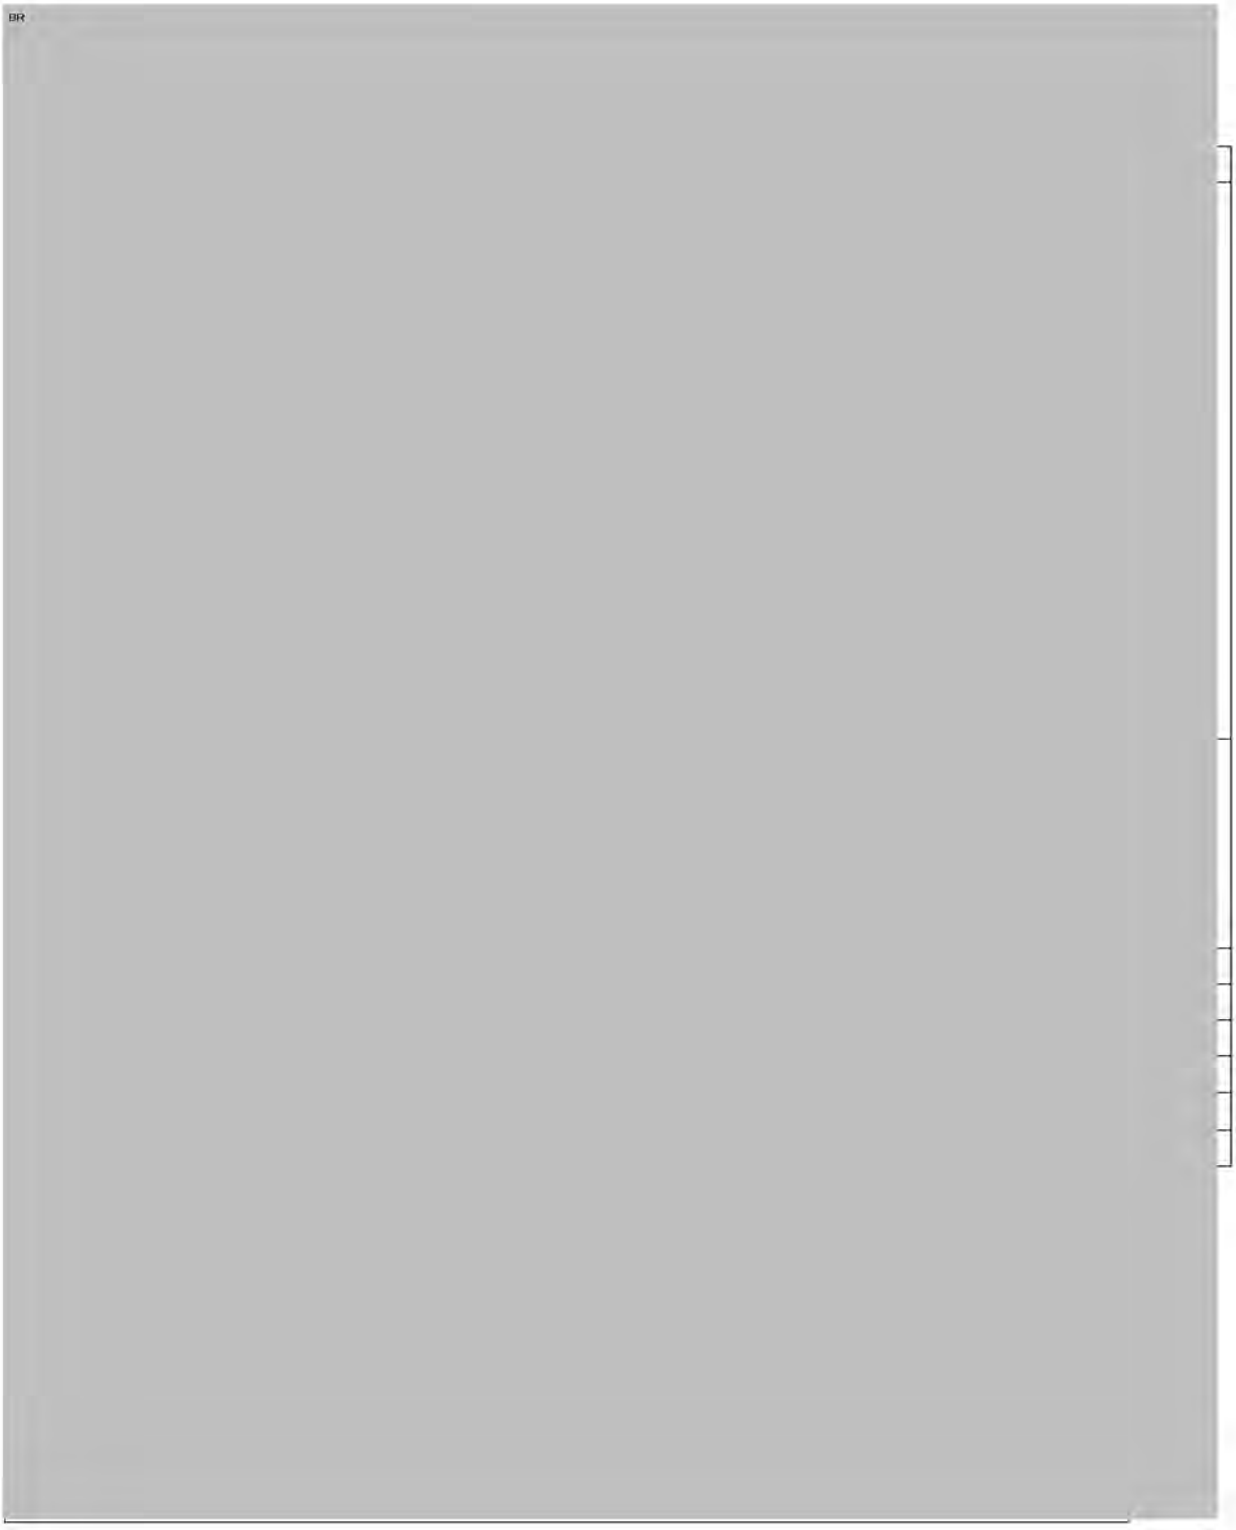

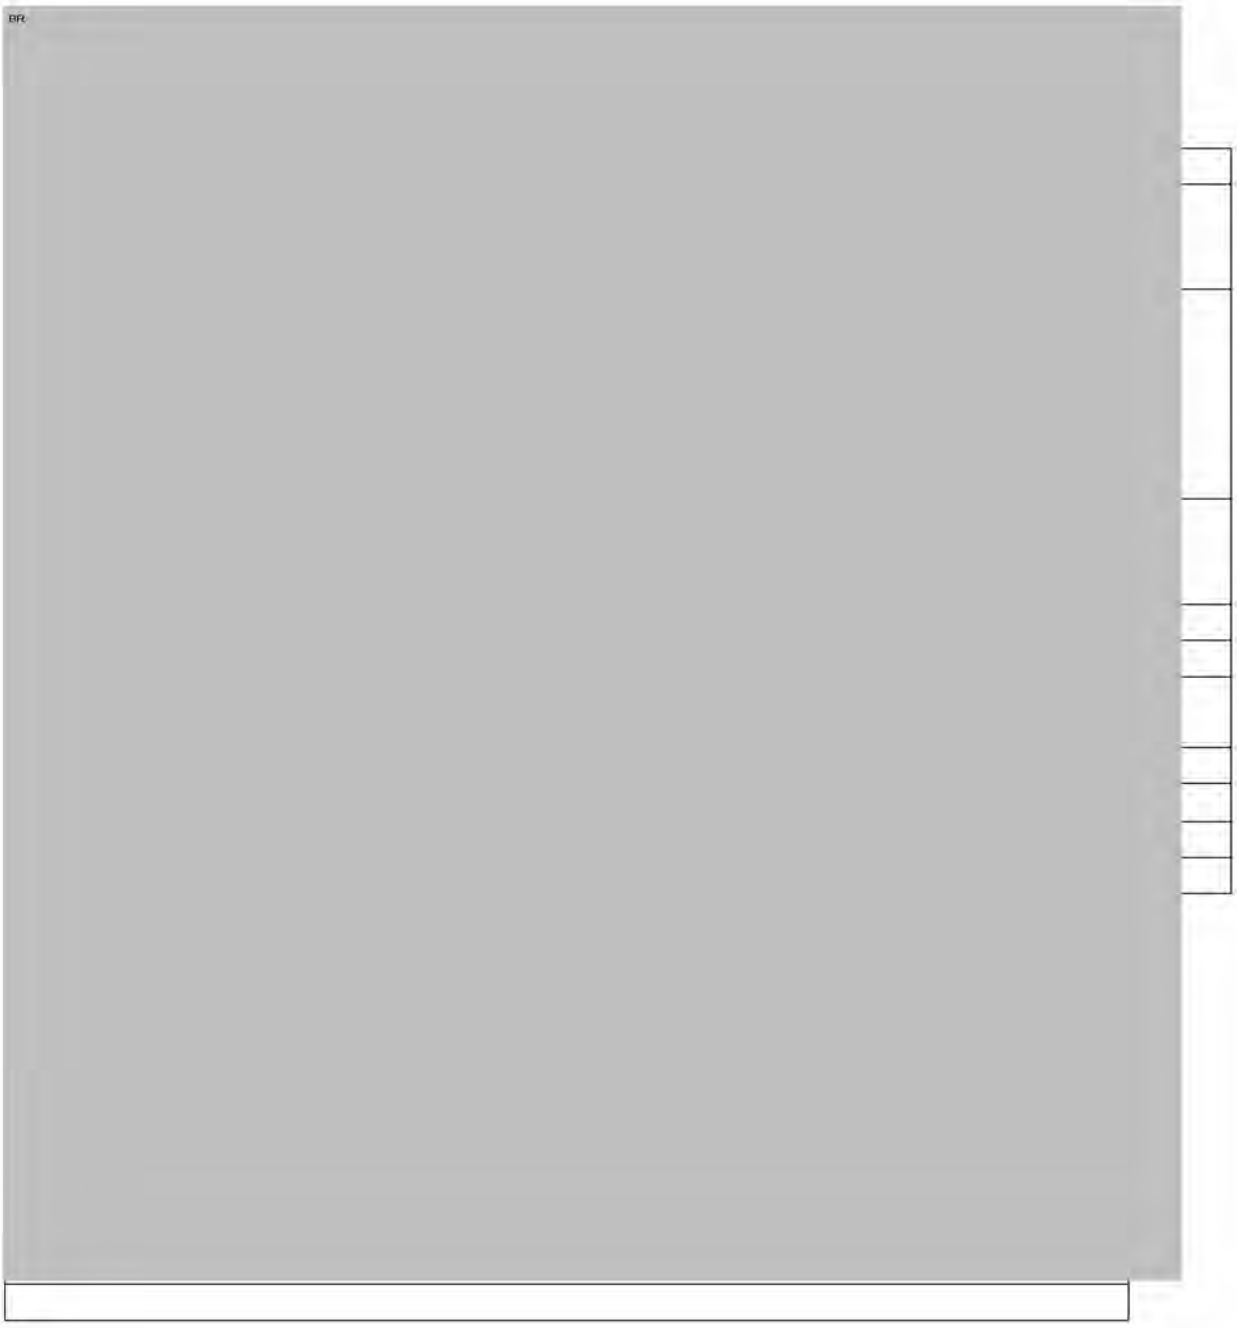

Docnr21



# 4 Overdracht en openstelling

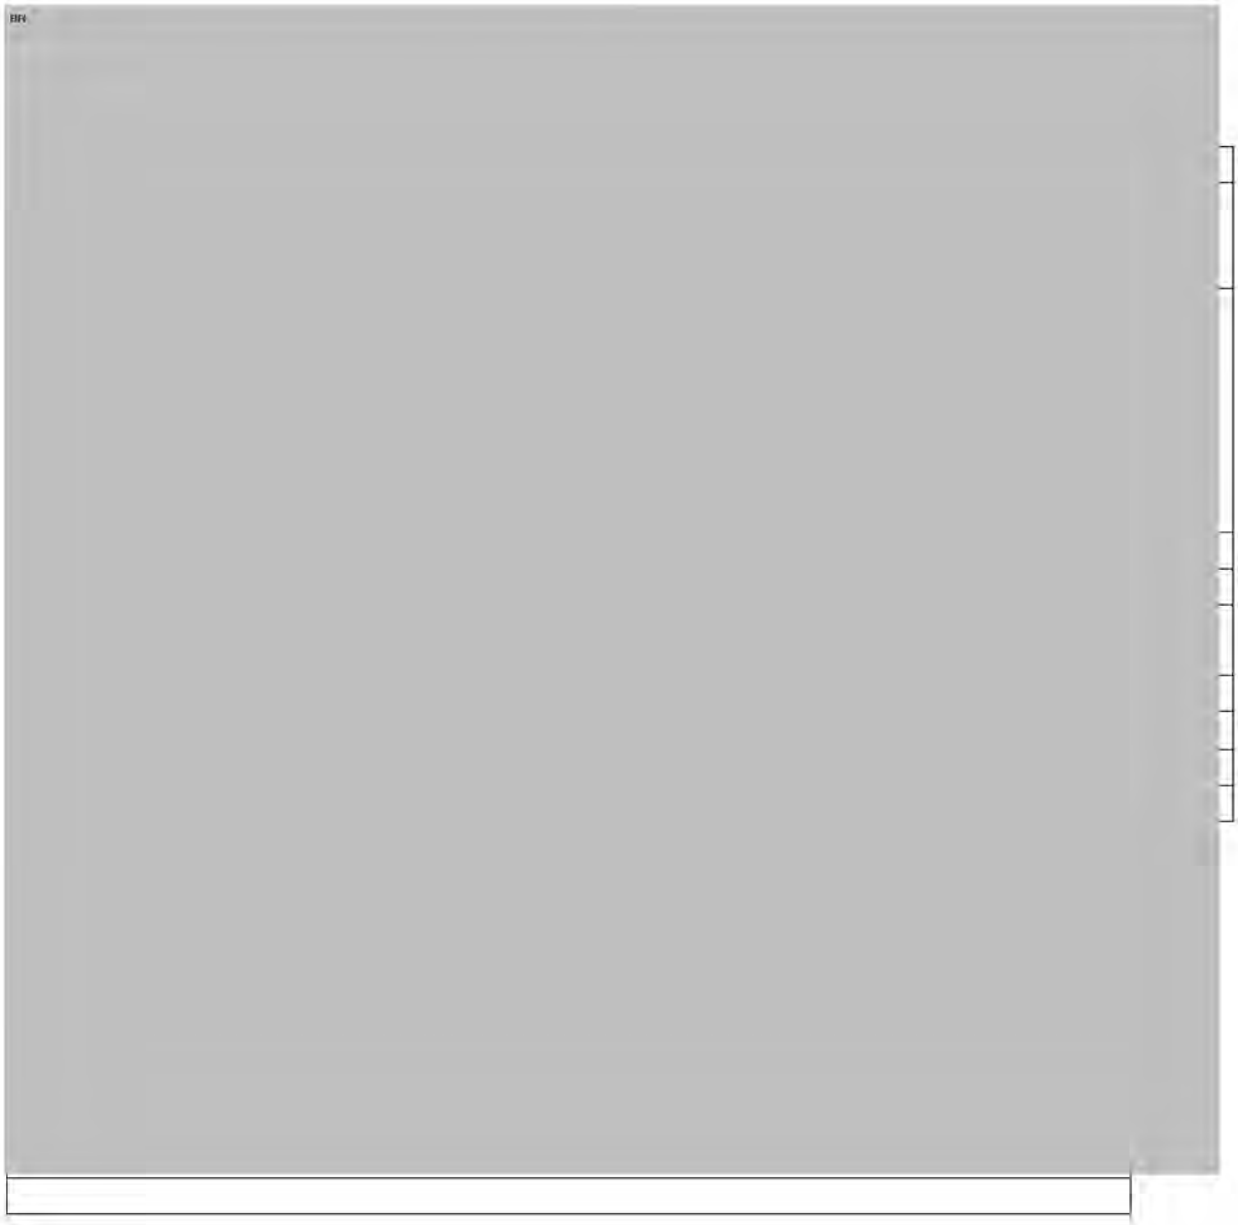

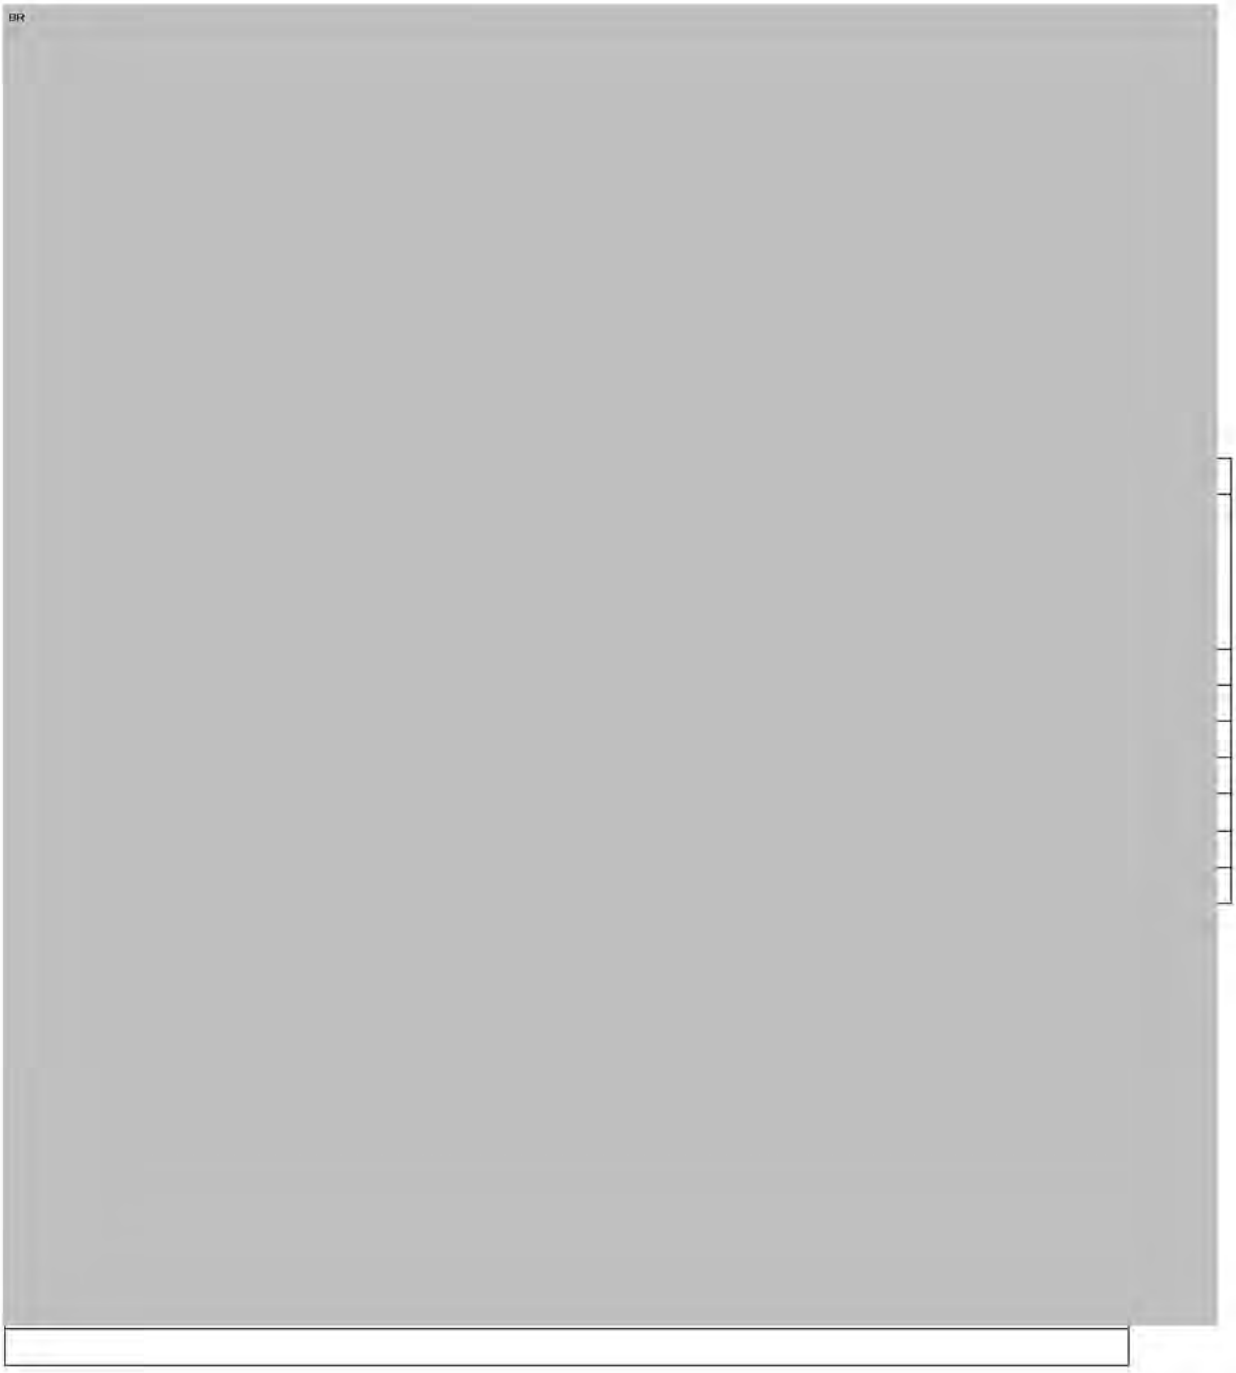
BR

BR

# 5 Projectbeheersing

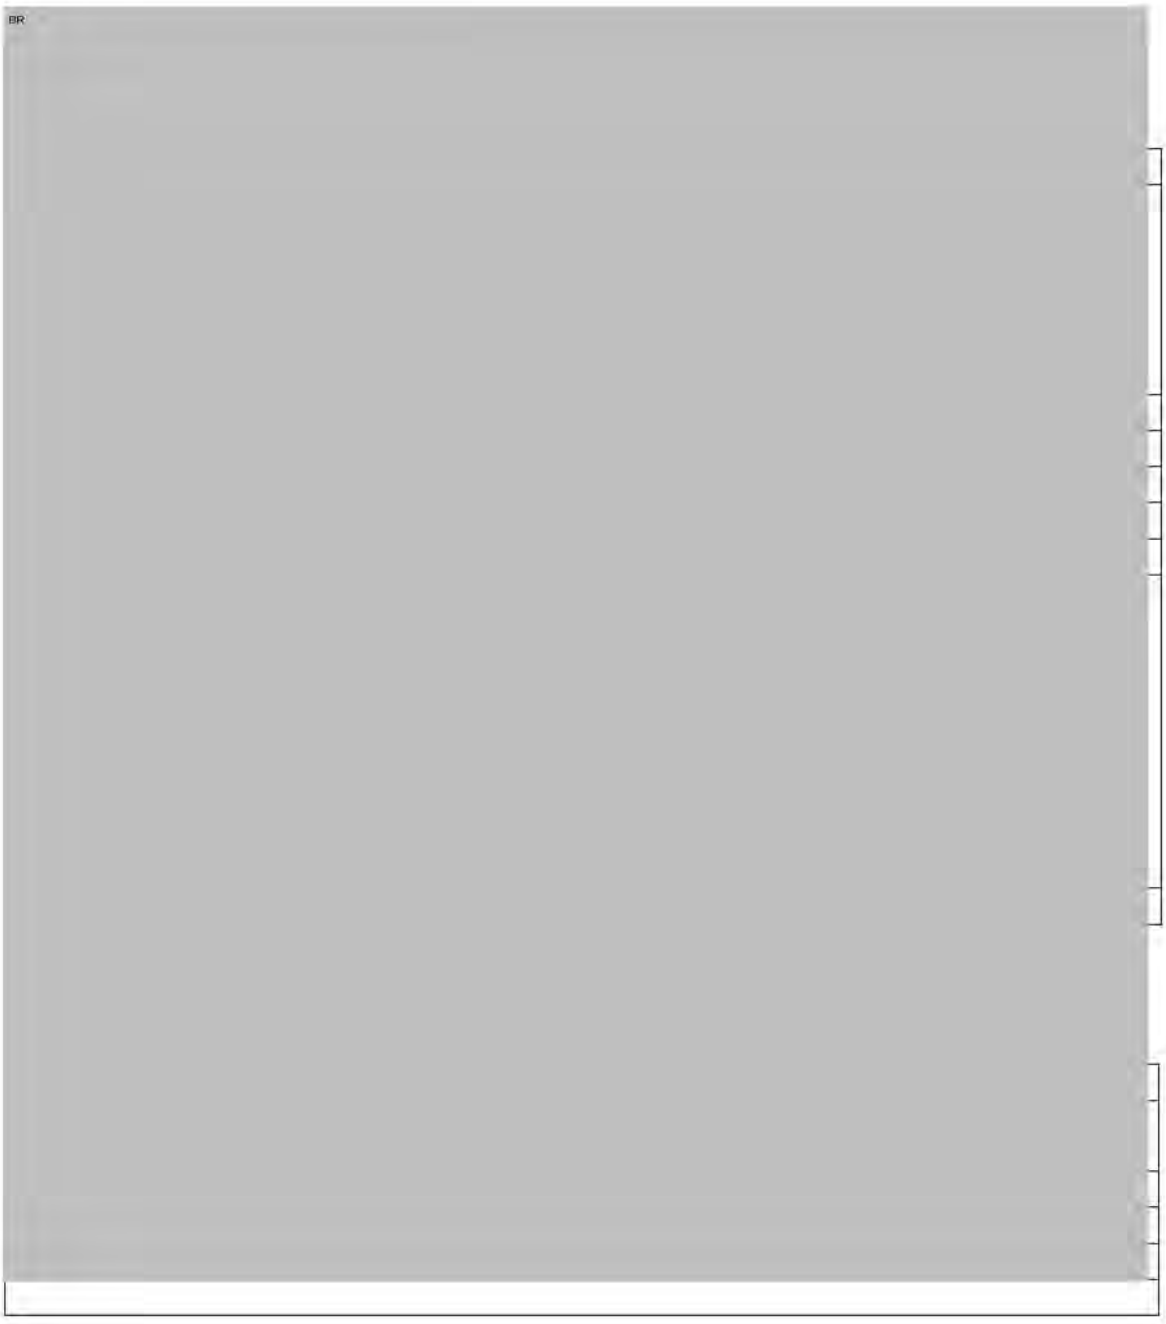

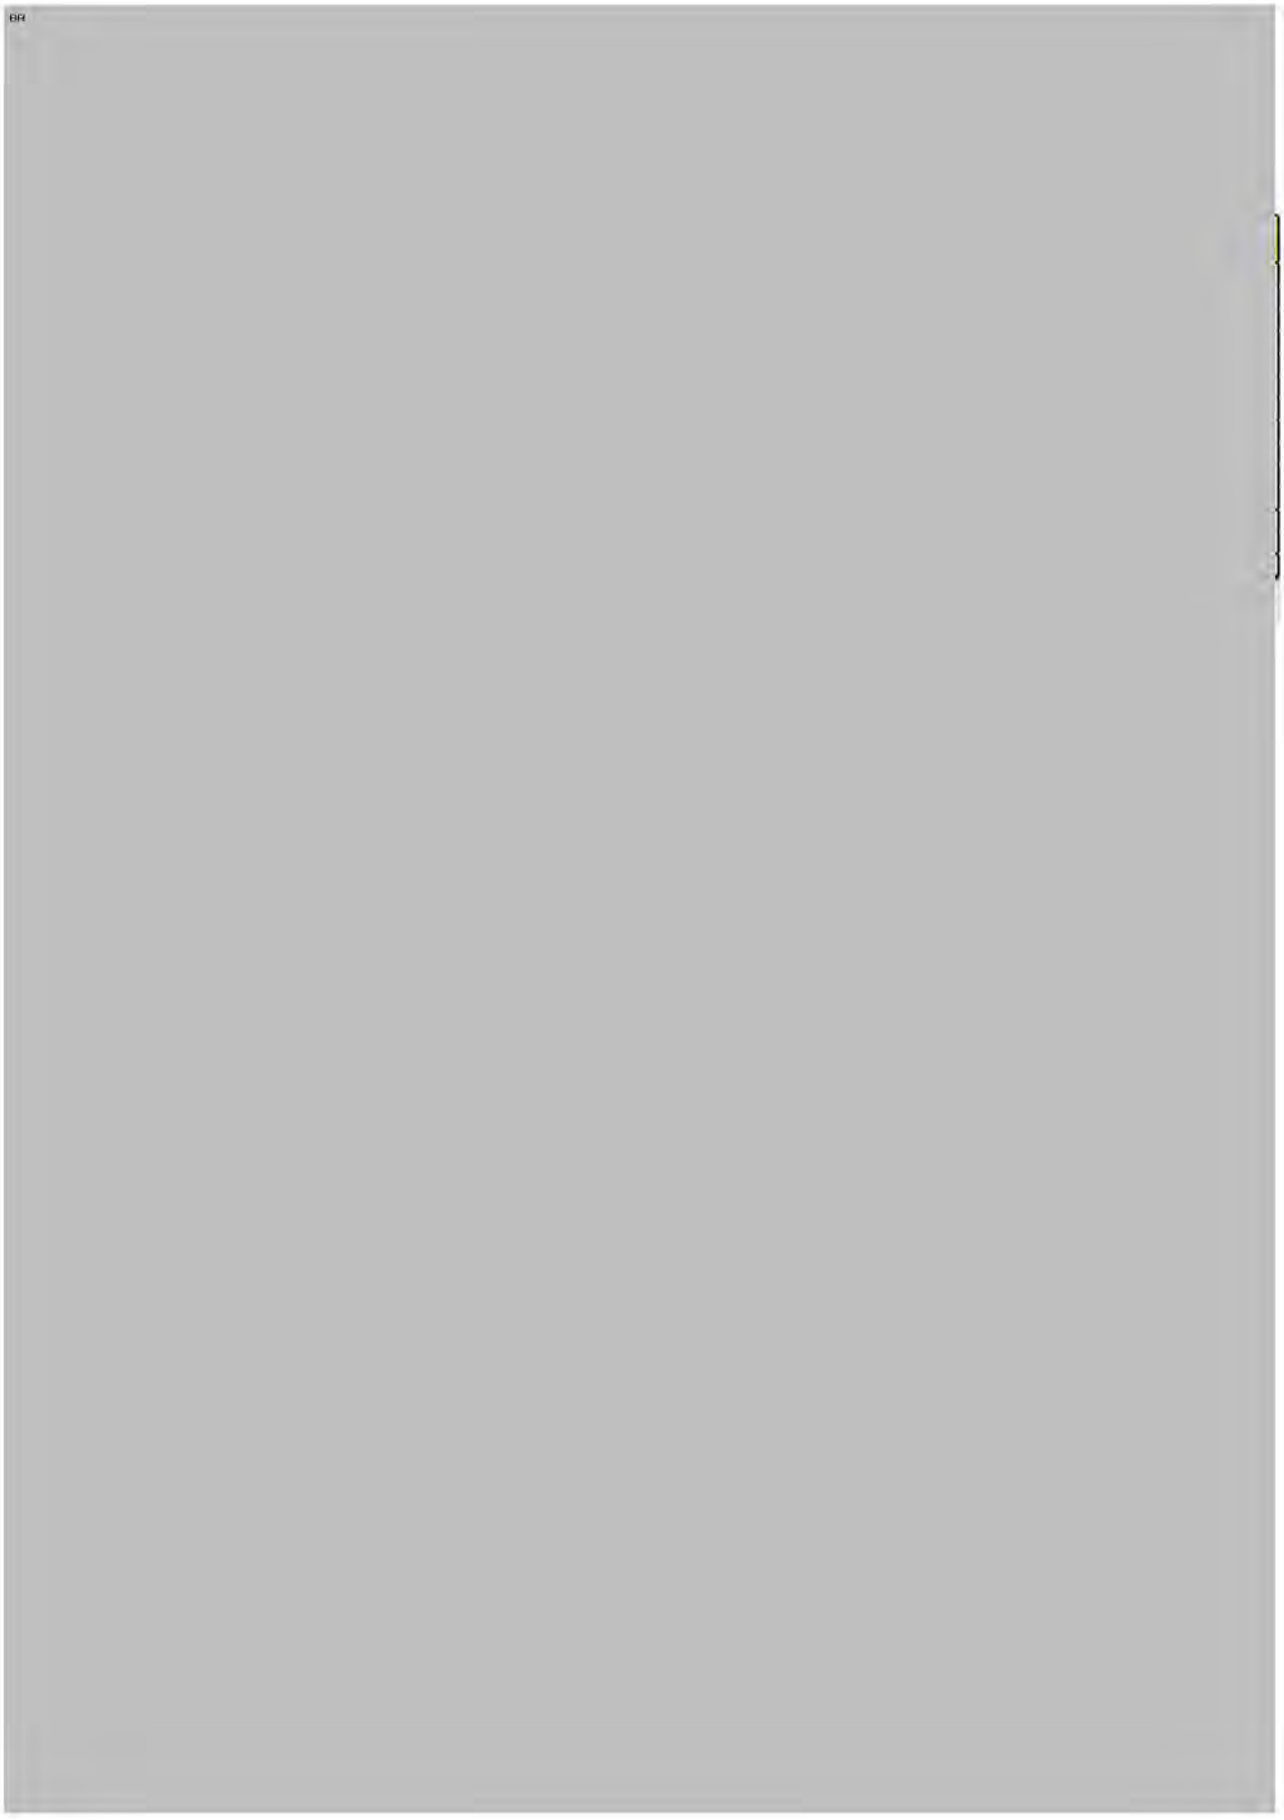

### 5.2.2 Dekkingen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | **2.725.000** | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | **400.000** | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland
Er zijn in het vierde kwartaal 2018 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland
Er zijn in het vierde kwartaal 2018 geen mutaties geweest.

BR

## 5.3 Planning

Zie tevens de bijlage 'Planningsmijlpalen'.

### 5.3.1 Afgelopen kwartaal

| | |
|---|---|
| BR | |
| Updaten van de detailplanning 2e toevoer Molenvlietpark. | Ten behoeve van de onzekerheidsanalyse is het model van de 2e watertoevoer opgesteld. De detailplanning wordt na overeenstemming bijgewerkt. |
| BR | |

### 5.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Updaten van de deelplanningen voor tweede watertoevoer en bediencentrale. |
| BR |

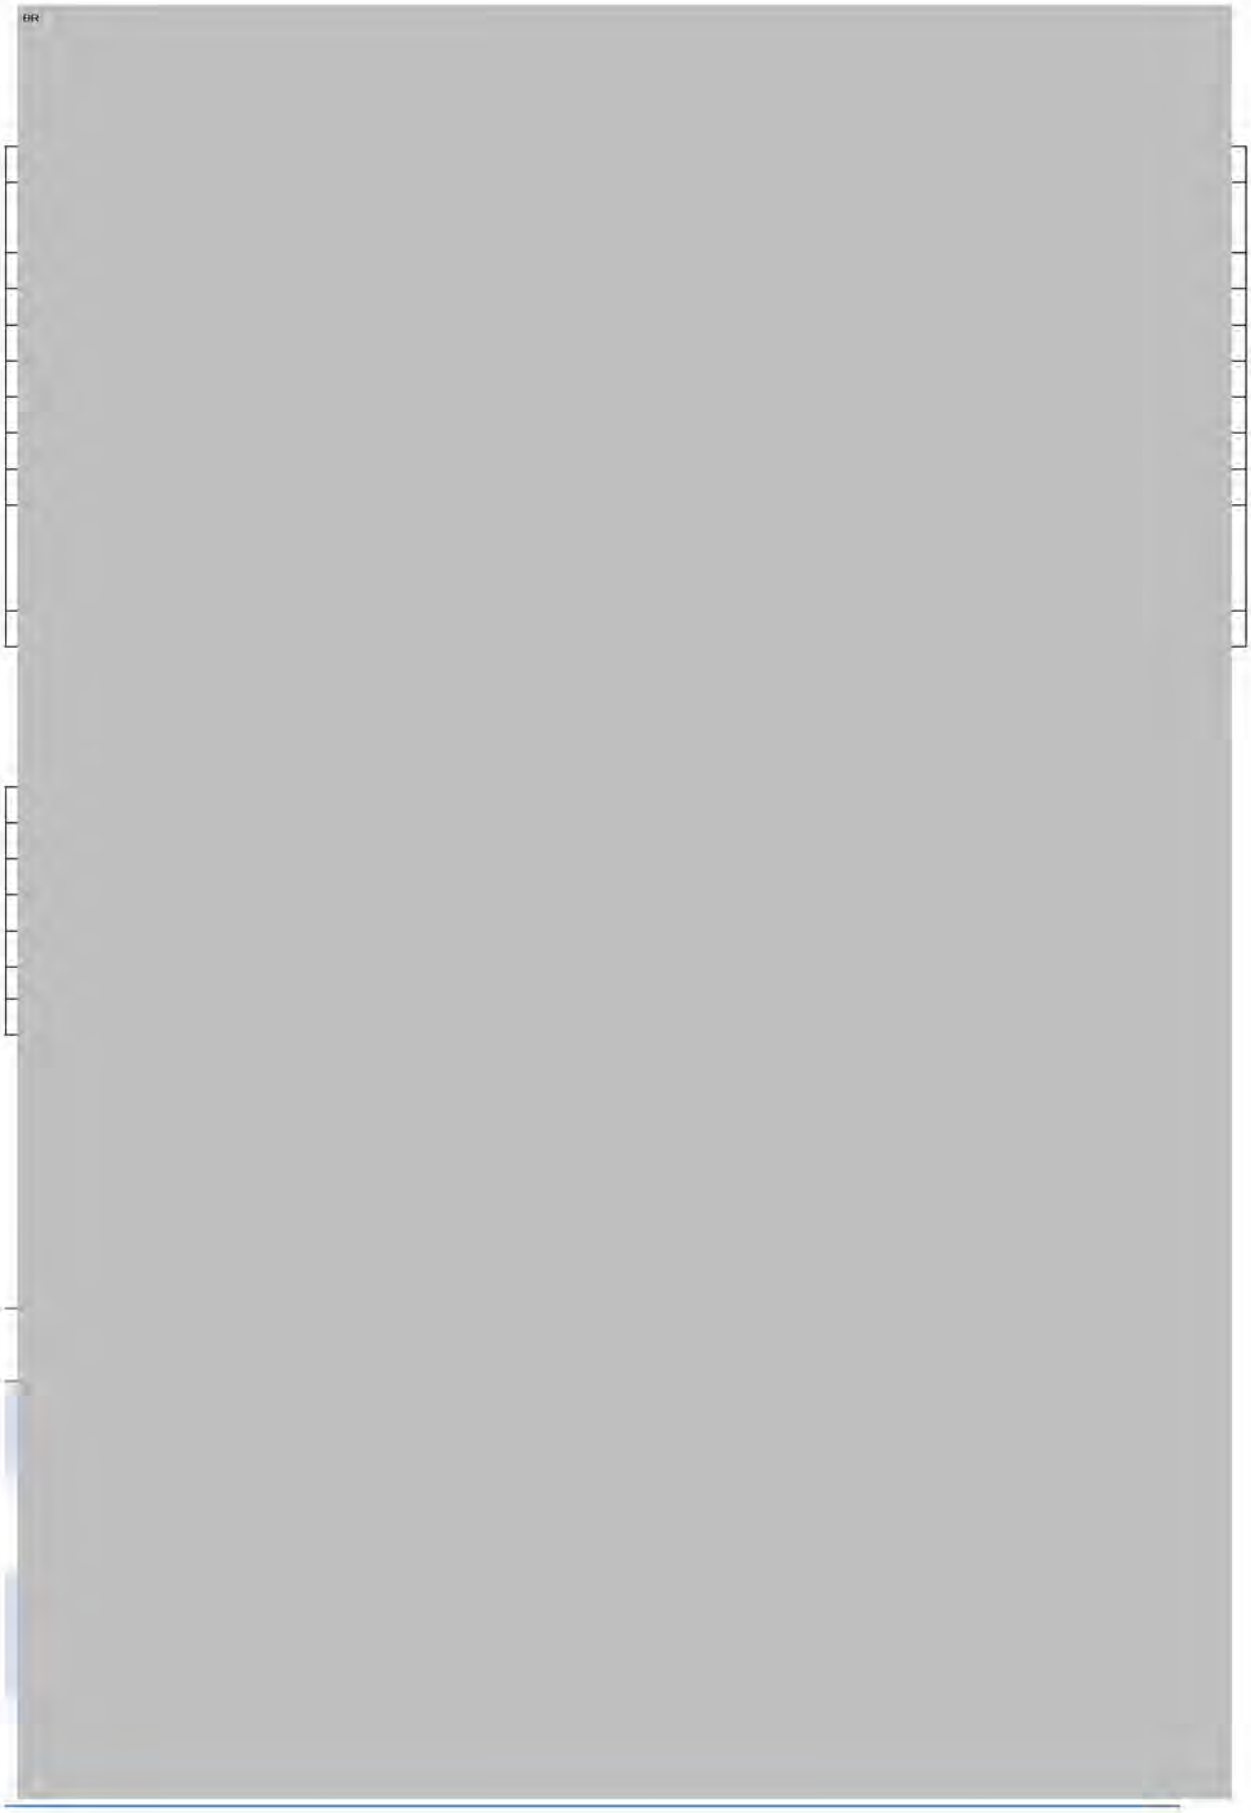

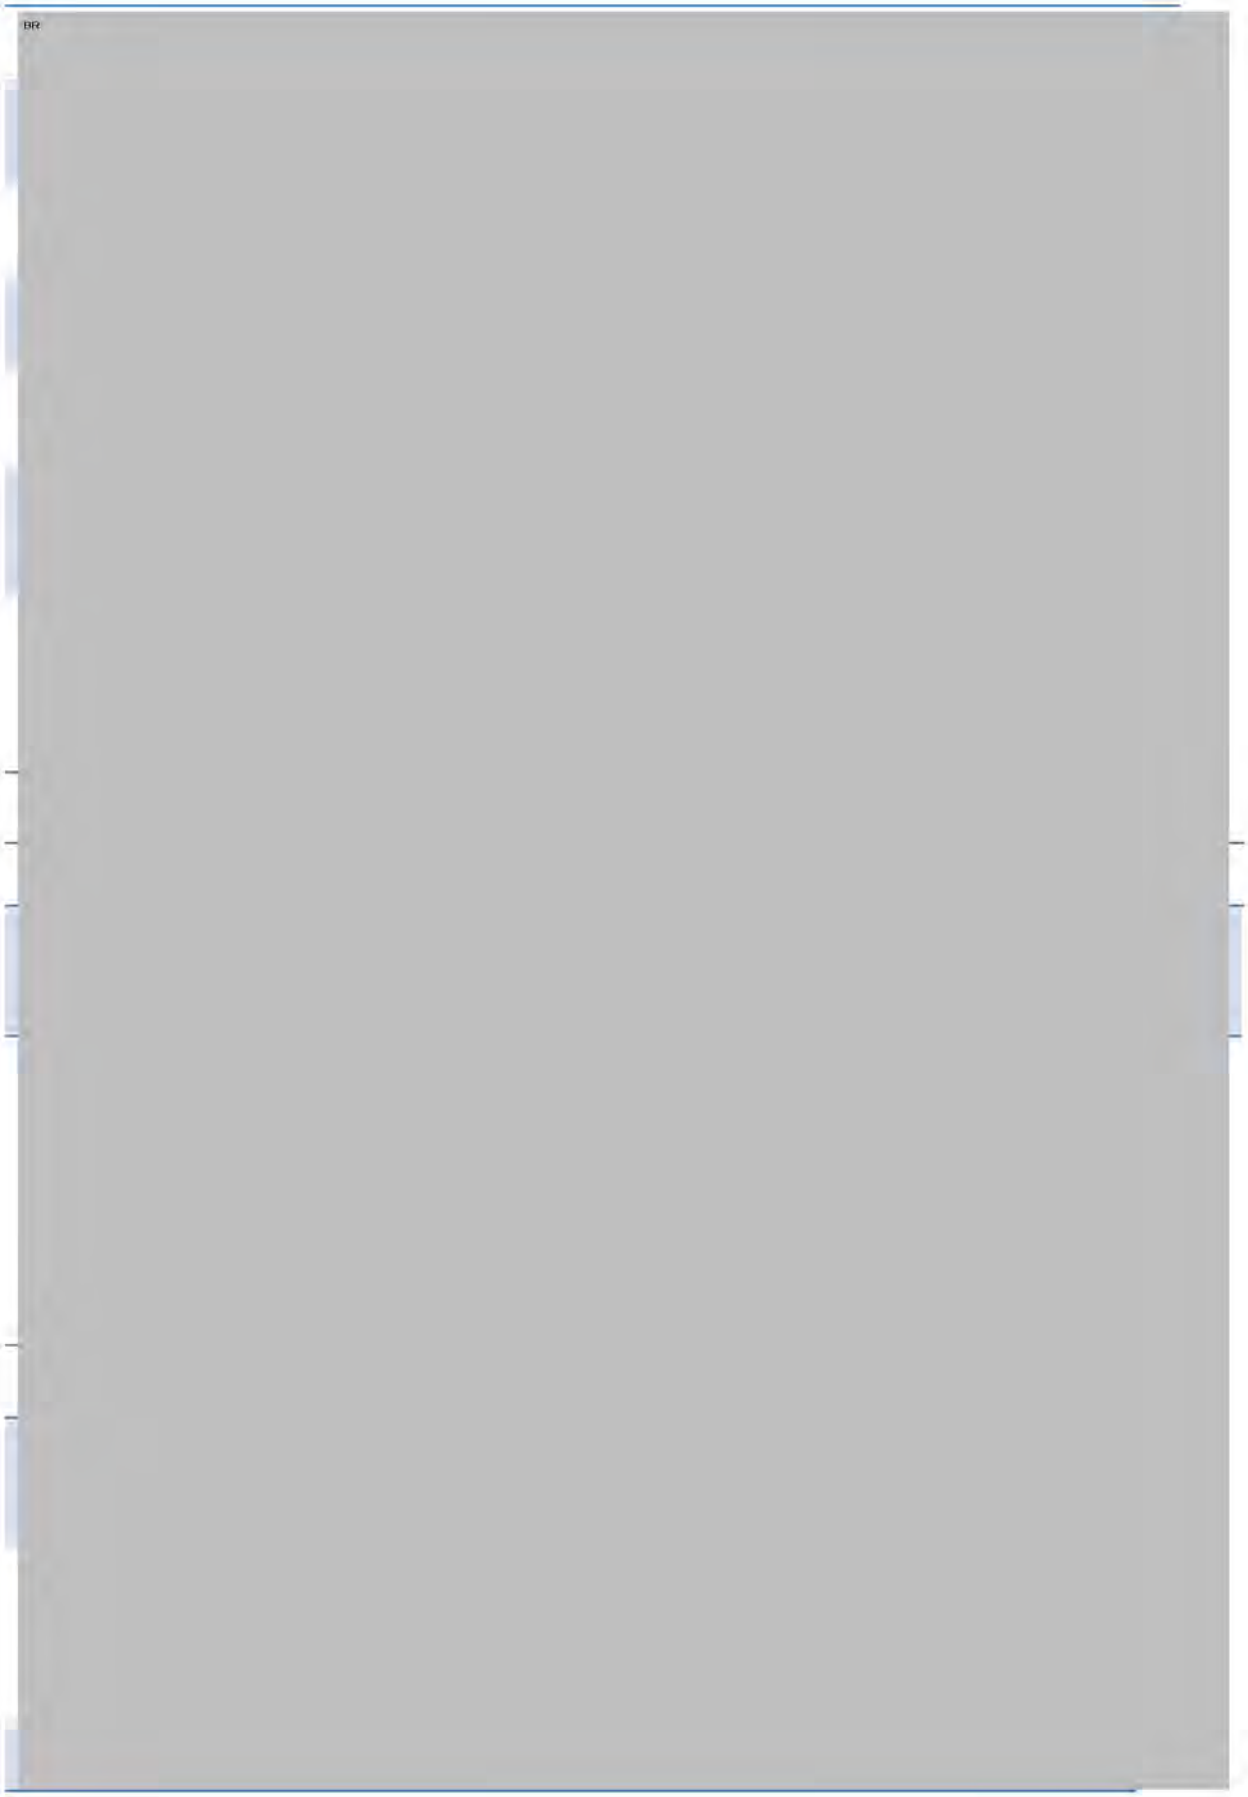
BR

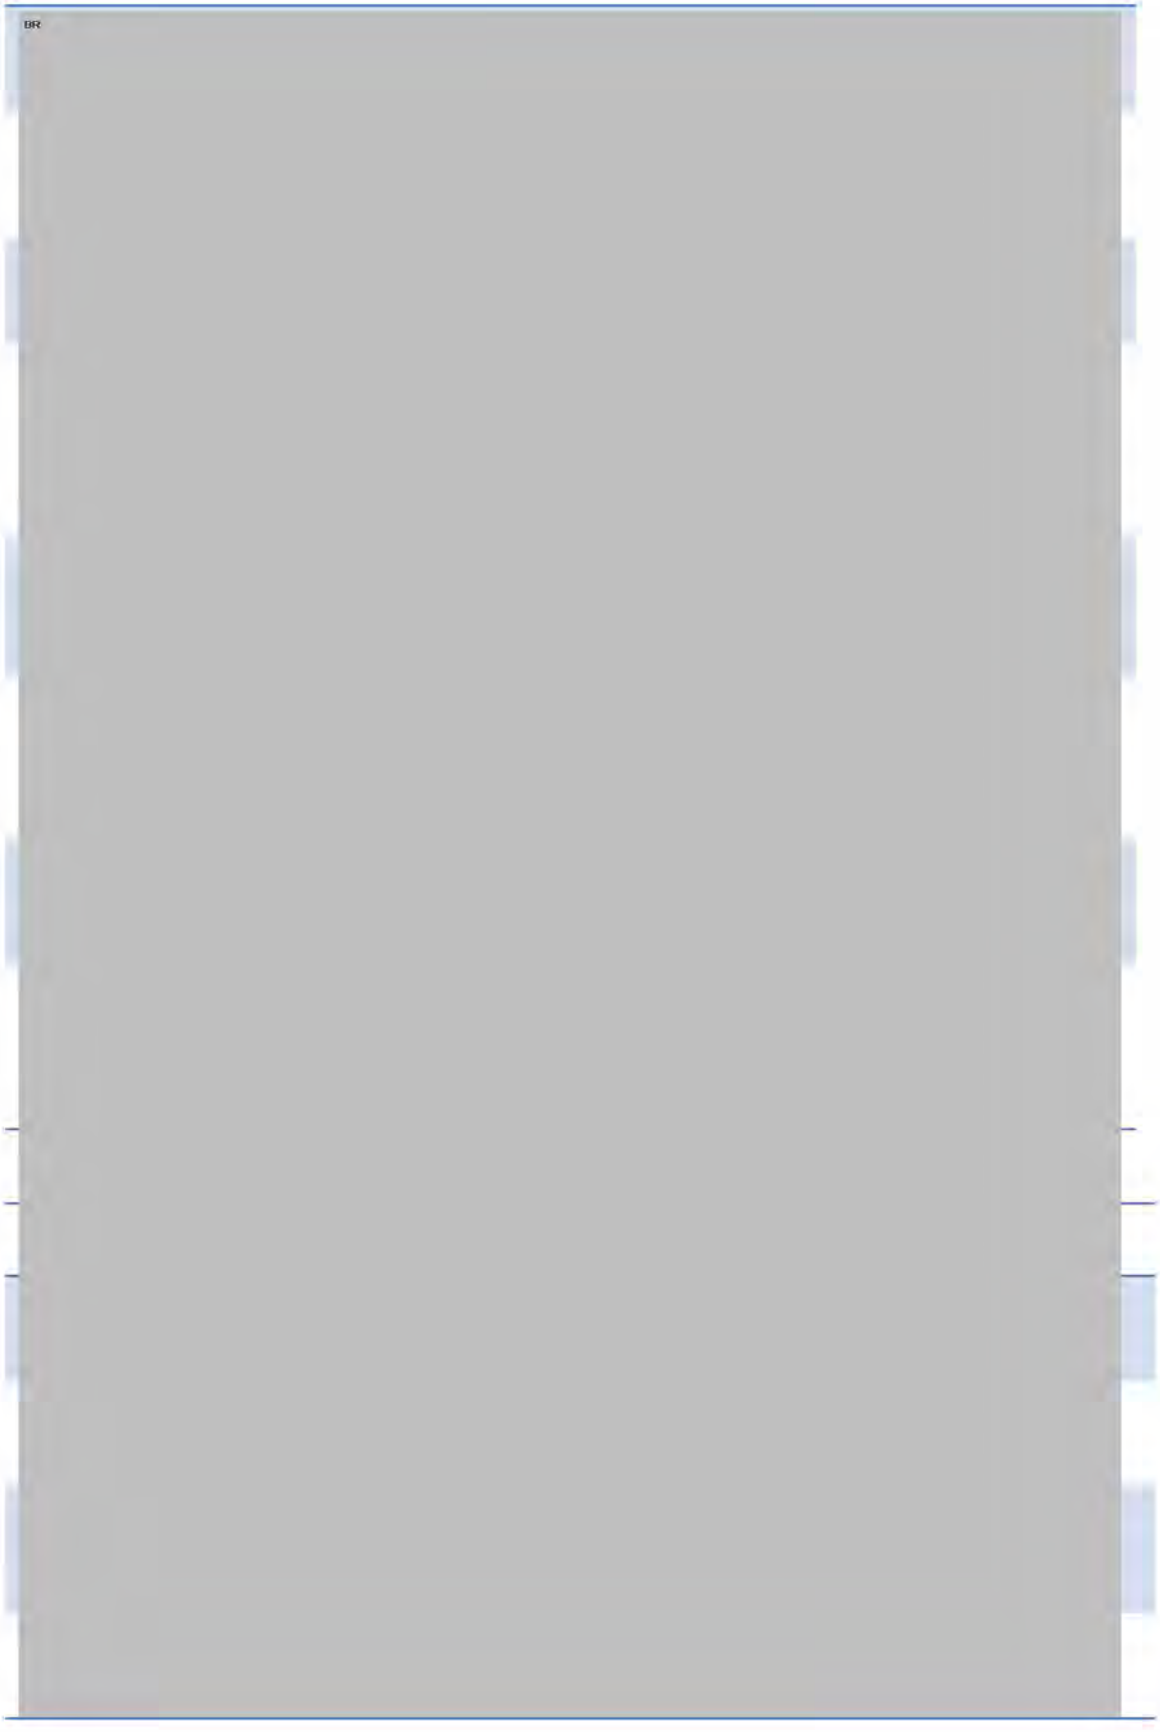
BR

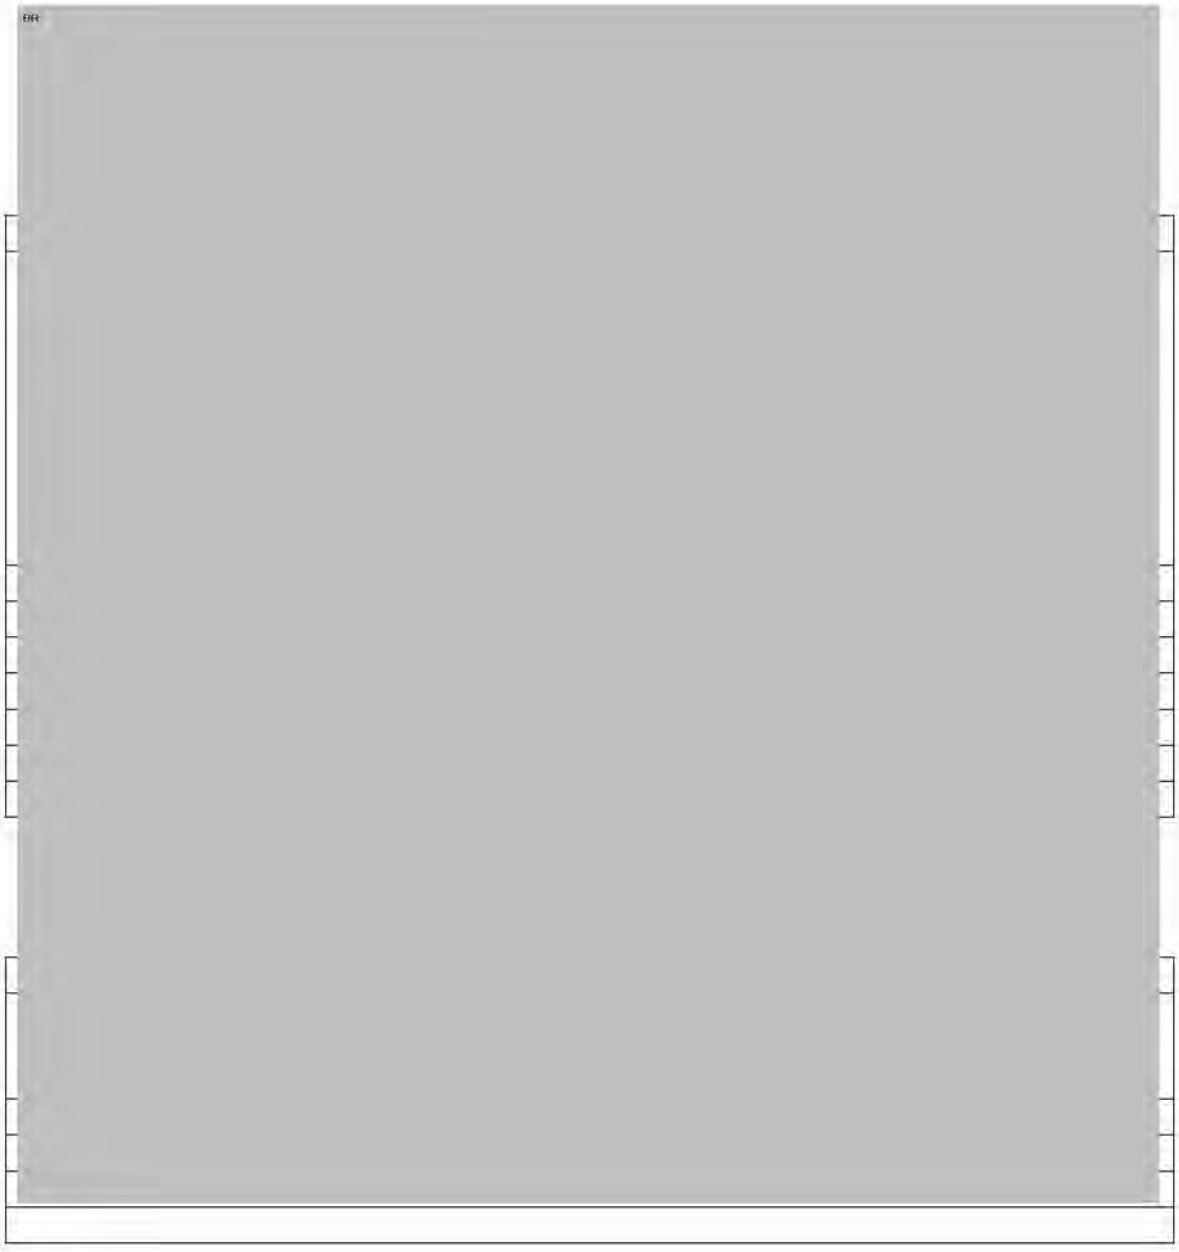

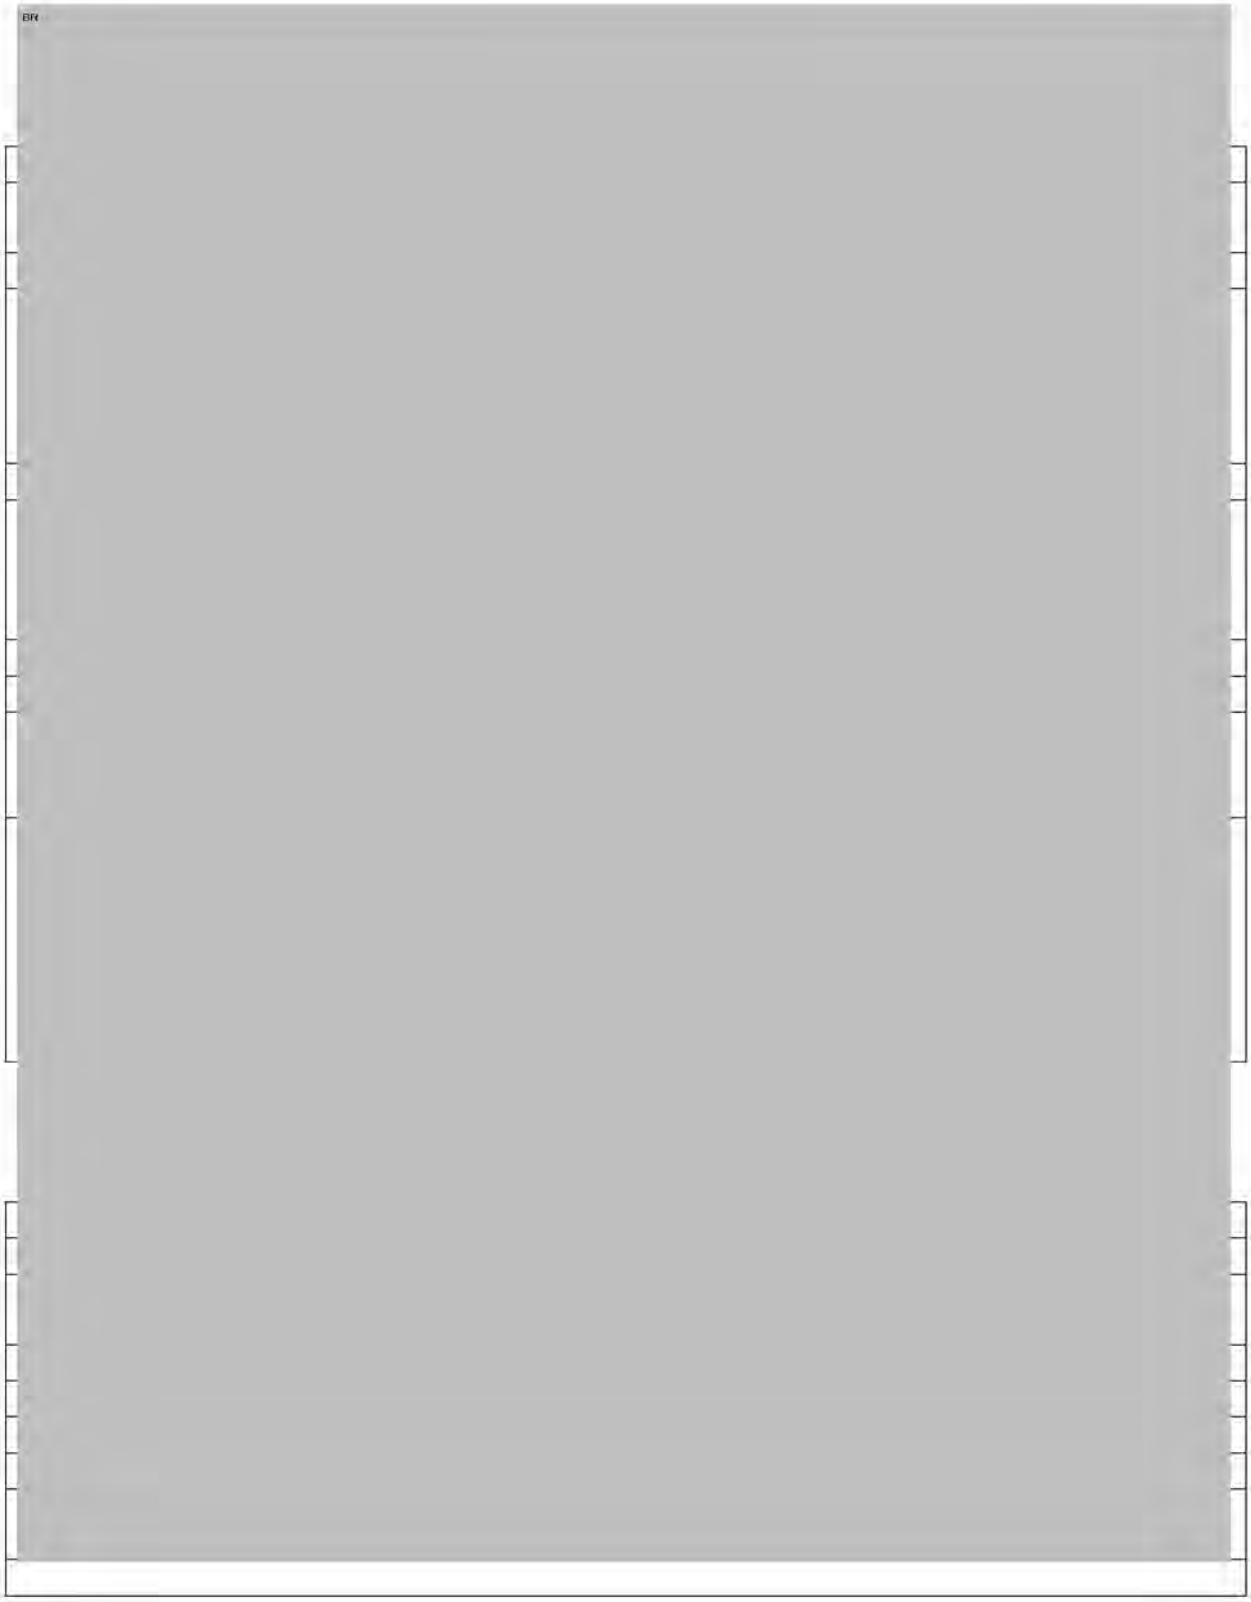

Docnr21



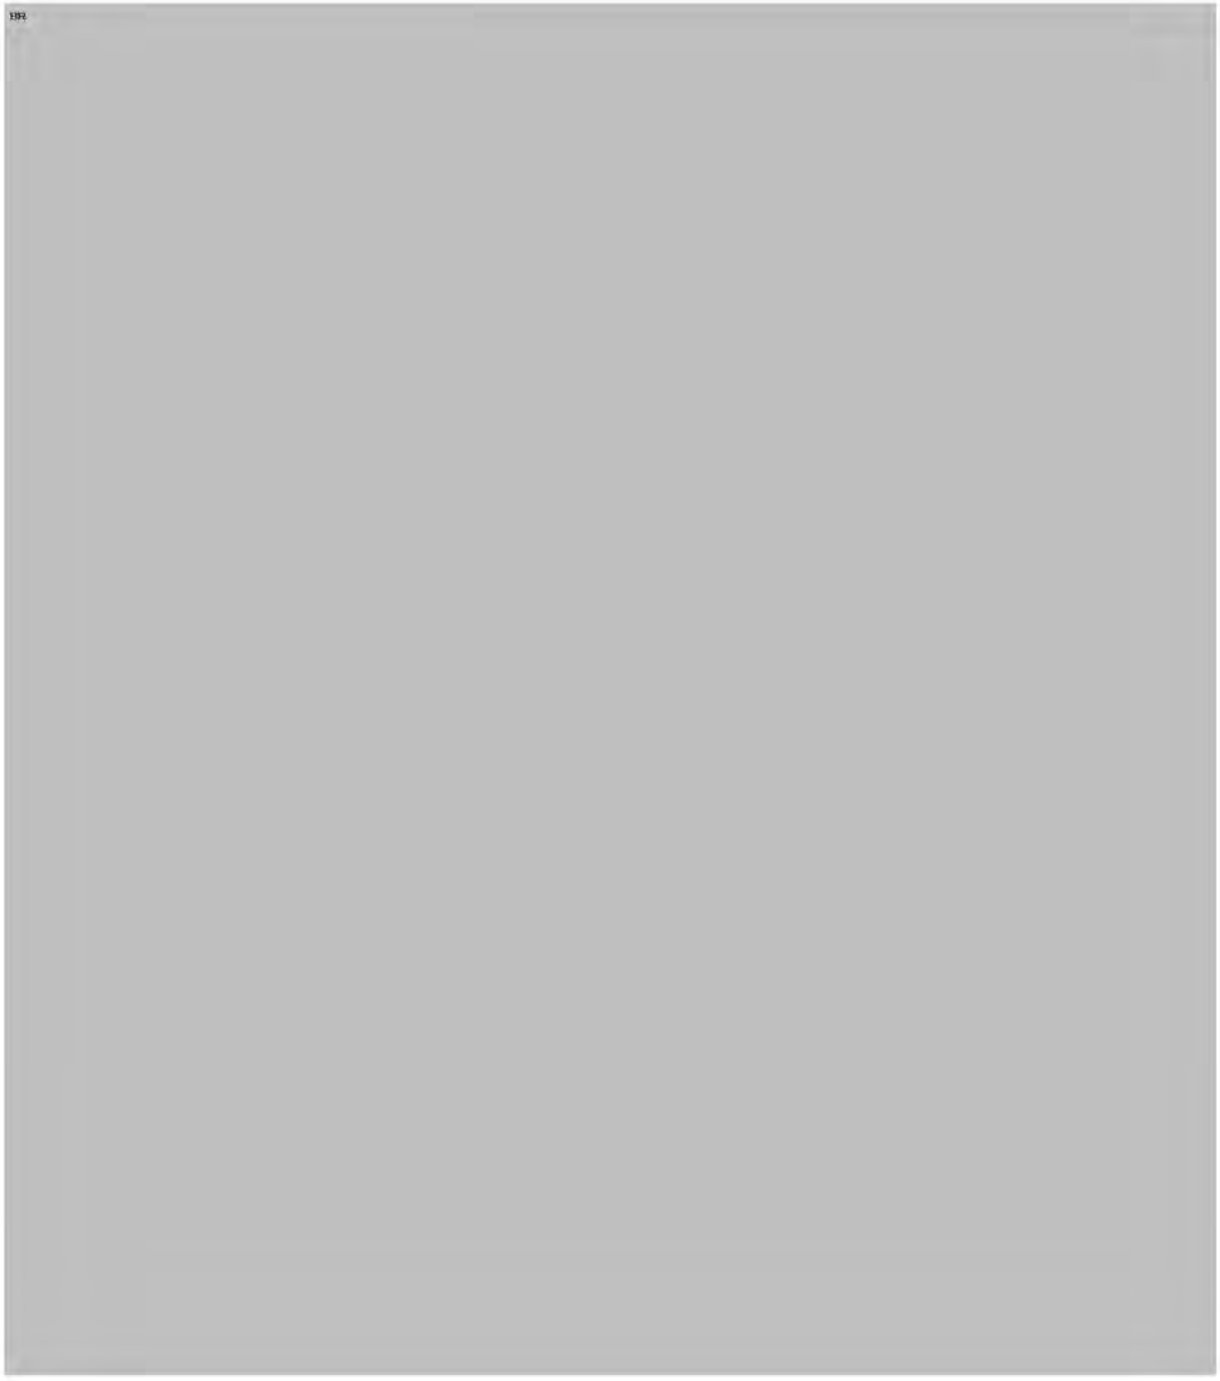

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 31 DEC 2018 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 18-apr-20 | 23 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie vertraagd. |
| BR | | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

Docnr21

Docnr21

Docnr21



Docnr22

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 1e kwartaal 2019

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 18 april 2019**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

Docnr22

Docnr22



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 1e kwartaal 2019
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004493

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>2 april 2019 | Versie 0.1<br>4 april 2019 | Versie 1.0<br>10 april 2019 | Versie 1.0<br>12 april 2019 | Versie 2.0<br>18 april 2019 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr22



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* *8*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 8
2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie en Vergunningen* *10*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2.2 Komende kwartaal 11

*2.3 Verwervingen* *12*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 12
2.3.2 Komende kwartaal 12

*2.4 Overeenkomsten* *13*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 13
2.4.2 Komende kwartaal 13

*2.5 Communicatie* *14*
2.5.1 Afgelopen kwartaal 14
2.5.2 Komende kwartaal 15
2.5.3 Diversen 15

3 Projectvoortgang 16

*3.1 Aanbesteden en contracteren* *16*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 16
3.1.2 Komende kwartaal 16

*3.2 Vormgeving* *17*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 17
3.2.2 Komende kwartaal 18

*3.3 Monitoring* *19*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 19
3.3.2 Komende kwartaal 19

*3.4 Inpassing Binckhorst* *20*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 20
3.4.2 Komende kwartaal 20

*3.5 Inpassing Vlietzone* *21*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 21
3.5.2 Komende kwartaal 21

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* *23*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 23
3.6.2 Komende kwartaal 23

*3.7 Boortunnel en toeritten* *24*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 24
3.7.2 Komende kwartaal 25

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *26*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 26

Docnr22



3.8.2 Komende kwartaal 26

*3.9 Installaties* *28*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 28
3.9.2 Komende kwartaal 29

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *30*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 30
3.10.2 Komende kwartaal 30

*3.11 Bediencentrale* *31*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 31
3.11.2 Komende kwartaal 32

*3.12 Uitvoeringskwaliteit* *33*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 33
3.12.2 Komende kwartaal 33

*3.13 Contractmanagement* *34*
3.13.1 Afgelopen kwartaal 34
3.13.2 Komende kwartaal 34

4 Overdracht en openstelling 35

*4.1 Tunnelveiligheid* *35*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 35
4.1.2 Komende kwartaal 35

*4.2 Overdracht aan beheerders* *36*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 36
4.2.2 Komende kwartaal 36

*4.3 Beheer en onderhoud* *37*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 37
4.3.2 Komende kwartaal 37

5 Projectbeheersing 38

*5.1 Scope* *38*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 38
5.1.2 Komende kwartaal 39

*5.2 Financien* *40*
5.2.1 Kostenstructuur 40
5.2.2 Dekkingen 41

*5.3 Planning* *43*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 43
5.3.2 Komende kwartaal 44

*5.4 Risico's* *45*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 45
5.4.2 Komende kwartaal 45
5.4.3 Financiële toprisico's 45
5.4.4 Toprisico's planning 46

*5.5 Interne kwaliteit* *49*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 49
5.5.2 Komende kwartaal 49

Docnr22



*5.6 Informatiebeheer* *50*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 50
5.6.2 Komende kwartaal 50
5.6.3 Kennisdeling 51
*5.7 Organisatie* *52*
5.7.1 Afgelopen kwartaal 52
5.7.2 Komende kwartaal 52

**6 Bijlage: Planningsmijlpalen 53**

**7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 54**

**8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 56**

# 1 Managementsamenvatting

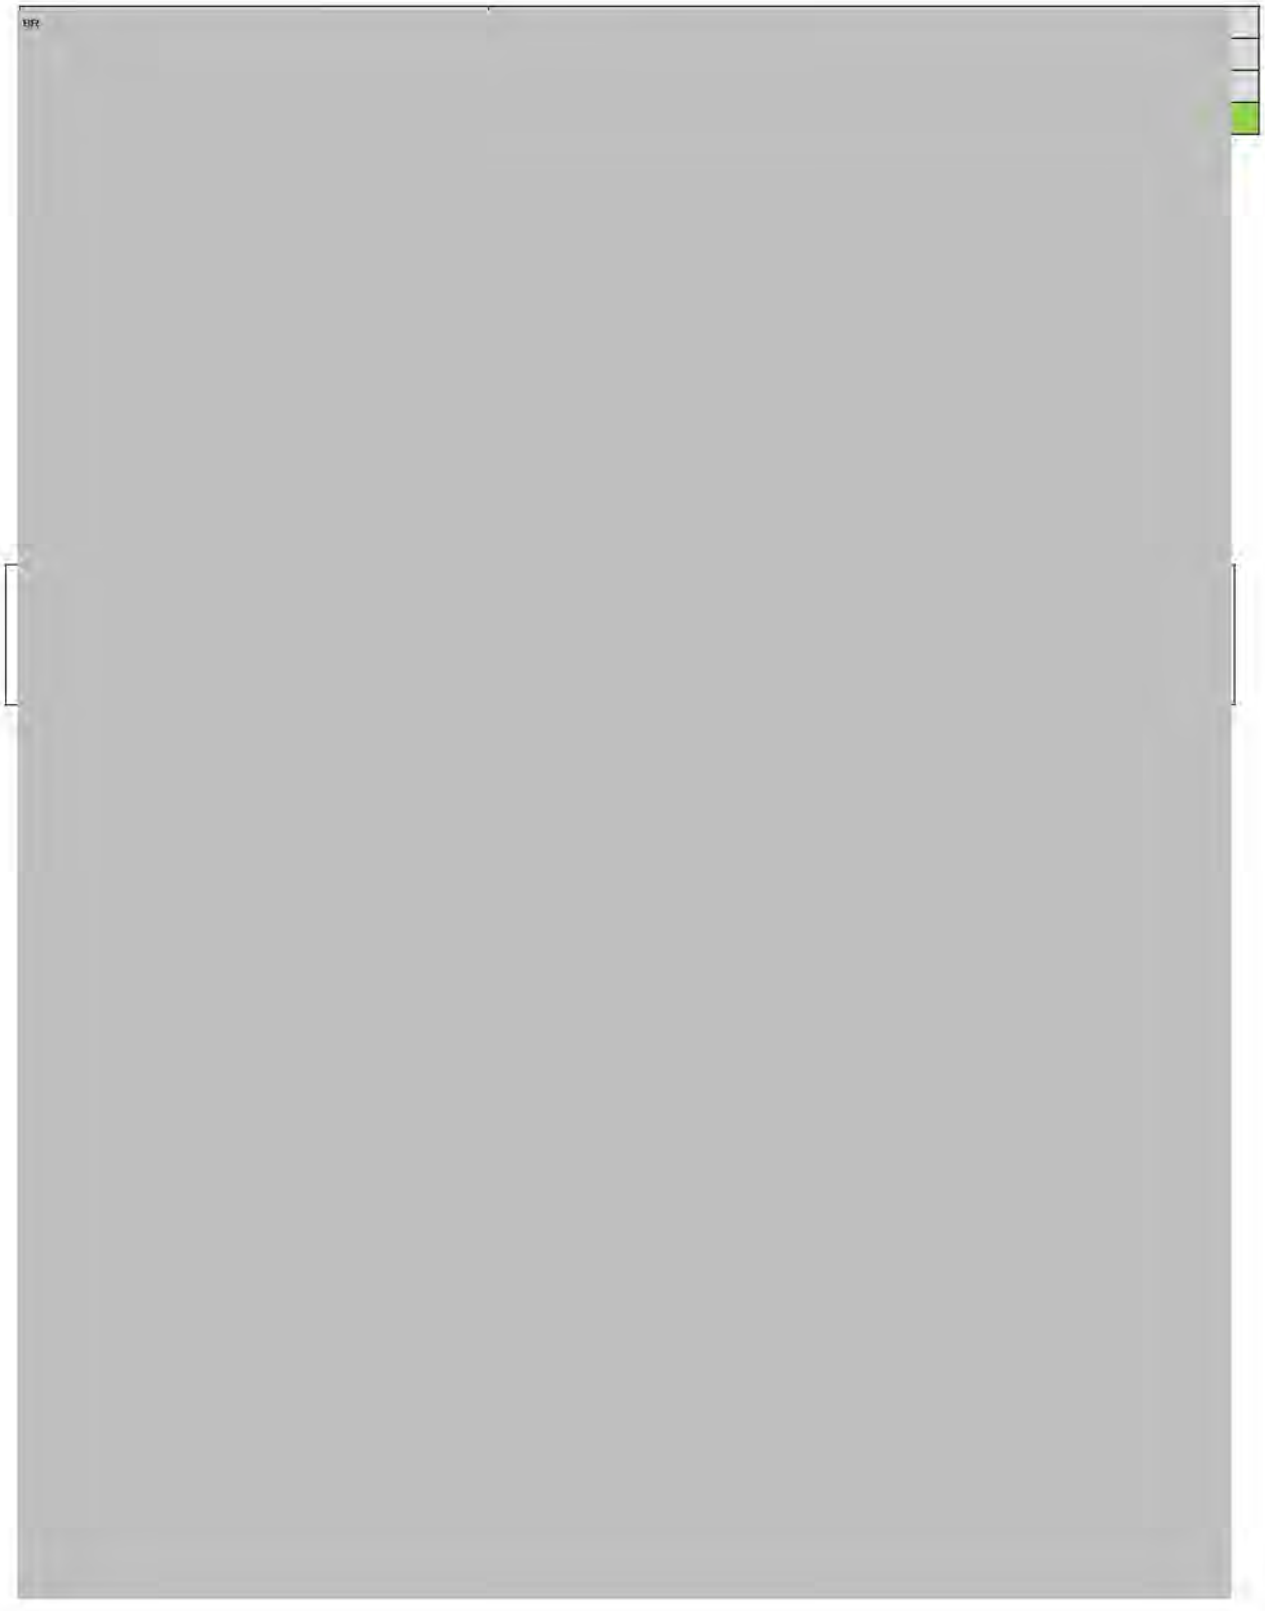

## 4. TERUGBLIK AFGELOPEN KWARTAAL

Afgelopen kwartaal is er onder andere gewerkt aan:

- Het realiseren van diverse onderdelen van het Molenvlietpark, waaronder fundering recreatieve voetgangersbrug, de aflaatconstructie en het fietspad tussen Laan van Hoornwijck en Drievliet;

- De Partij voor de Dieren heeft raadsvragen gesteld over de aangevraagde kapvergunning i.v.m. tweede watertoevoer. Deze vragen zijn door het College beantwoord;
- Ten behoeve van de aanleg van het Molenvlietpark is een aantal watervergunningen en omgevingsvergunningen verleend;

## 5. VERWACHTING KOMEND KWARTAAL

Komende kwartaal wordt er onder andere gewerkt aan:

- De Partij voor de Dieren heeft n.a.v. de beantwoording van haar raadsvragen een 2 minuten debat aangevraagd over bomenkap tweede watertoevoer;
- Het bereiken van overeenstemming bereiken met particuliere grondeigenaar en provincie Zuid Holland t.b.v. de aanleg van de tweede watertoevoer;

BR

- Het voortzetten van werkzaamheden voor de inrichting van het Molenvlietpark (o.a. aflaatconstructie en voetgangersbruggen;

## 7. Planning

De voorziene datum van de openstelling van de Rotterdamsebaan voor het verkeer is ongewijzigd gebleven:1 juli 2020. Daarna is er nog een aantal activiteiten (en dus kostenposten) voorzien, zoals: bediencentrale, kunsttrajecten, VAT en tweede watertoevoer.

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Diverse stakeholders spreken. | Diverse stakeholders gesproken: deels in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomsten of over het nader uitgewerkte ontwerp van projectonderdelen zoals het Molenvlietpark, de watertoevoer, tijdelijke en definitieve hellingbaan voor Drievliet en de gebiedsontwikkeling Binckhorst.<br>Ook is er periodiek contact met het Schadebureau Rotterdamsebaan over het proces van afhandelen van schademeldingen.<br>Met het Hoogheemraadschap van Delfland een bespreking gehad om de communicatiestrategie voor de waterberging en de tweede toevoer te bepalen. |
| BR | |
| | |

| Overige / extra verrichte werkzaamheden |
|---|
| BR |
| De Partij voor de Dieren heeft raadsvragen gesteld over de aangevraagde kapvergunning i.v.m. tweede watertoevoer. Deze vragen zijn door het College beantwoord waarna de Partij voor de Dieren een 2 minuten debat heeft aangevraagd. Dit debat met wethouder Revis zal op 9 mei plaatsvinden. |
| BR |
| |
| |
|

BR

## 2.2 Planologie en Vergunningen

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Coördineren vergunningen (o.a. binnen de projectorganisatie, maar ook d.m.v. regulier overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland en DSO). | Ten behoeve van de aanleg van het Molenvlietpark is een aantal water-vergunningen en omgevingsvergunningen verleend. Tegen de omgevingsvergunning voor oeververbinding 1 is bezwaar gemaakt. CRB zal komend kwartaal onder meer de omgevingsvergunning voor de tijdelijke hellingbaan t.b.v. de loopbrug Drievliet aanvragen. |
| Faciliteren van de projectplanprocedure van het Hoogheemraadschap van Delfland voor de tweede watertoevoer. | Het ontwerp-projectplan heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. |
| De gemeente Den Haag behandelt de kapvergunning ten behoeve van de aanleg van de tweede watertoevoer. De projectorganisatie zal een activiteitenplan ten behoeve van vleermuizen laten uitvoeren. | Er is een activiteitenplan opgesteld t.b.v. de aanvraag ontheffing Wet natuur-bescherming. Ook zijn er diverse vleermuizenkasten opgehangen. Inmiddels is (voortijdig) een zienswijze ingediend tegen de aanvraag van de kapvergunning en zijn bewonersvragen gesteld aan wethouder Revis. Vanwege de diverse vragen uit de omgeving volgt medio april een speciaal extra burenoverleg voor de direct betrokkenen. |
| [redacted] | |
| | |

### 2.2.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| BR |
| Speciaal extra burenoverleg omgeving tweede toevoer. |
| BR |
| |

## 2.3 Verwervingen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Indien inhoudelijke overeenstemming wordt bereikt over de samenwerkings-overeenkomst ten behoeve van de tweede toevoer, de koopovereenkomst t.g.v. grondverkoop voor de Jan Thijssenweg 8 te Den Haag, aanpassen en afronden. | In afwachting van samenwerkings-overeenkomst ten behoeve van de tweede toevoer. |
| BR | |

### 2.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden komend kwartaal |
|---|
| BR |
| Indien inhoudelijke overeenstemming wordt bereikt over de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de tweede toevoer, de koopovereenkomst t.g.v. grondverkoop voor de Jan Thijssenweg 8 te Den Haag, aanpassen en afronden. |
| |
| BR |

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Samenwerkingsovereenkomst afronden met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. | Een tweetal gesprekken met de particuliere grondeigenaar gevoerd. Nog een nadere uitwerking van de grondexperts nodig om concrete afspraken te kunnen maken. |
| [redacted] | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Samenwerkingsovereenkomst afronden met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. |
| [redacted] |

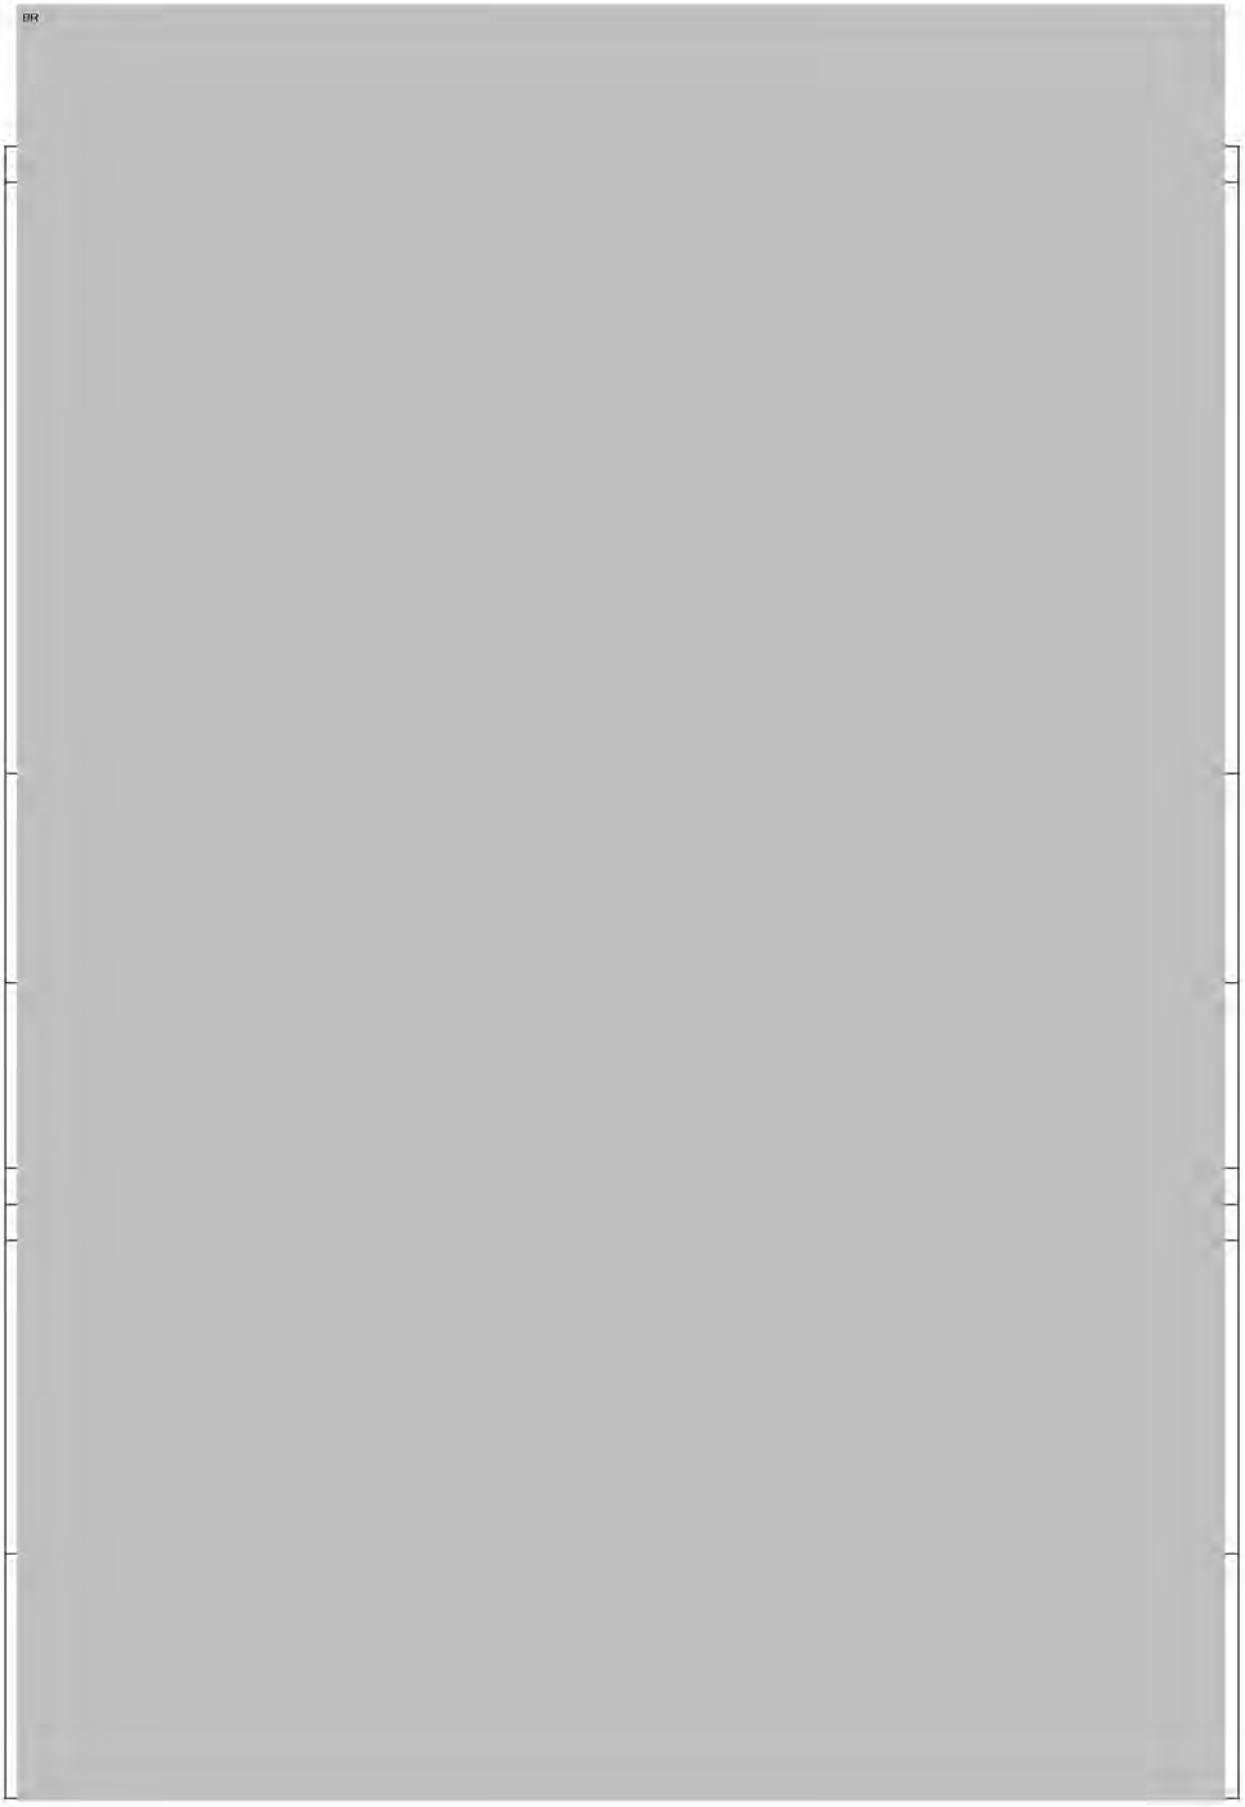
BR

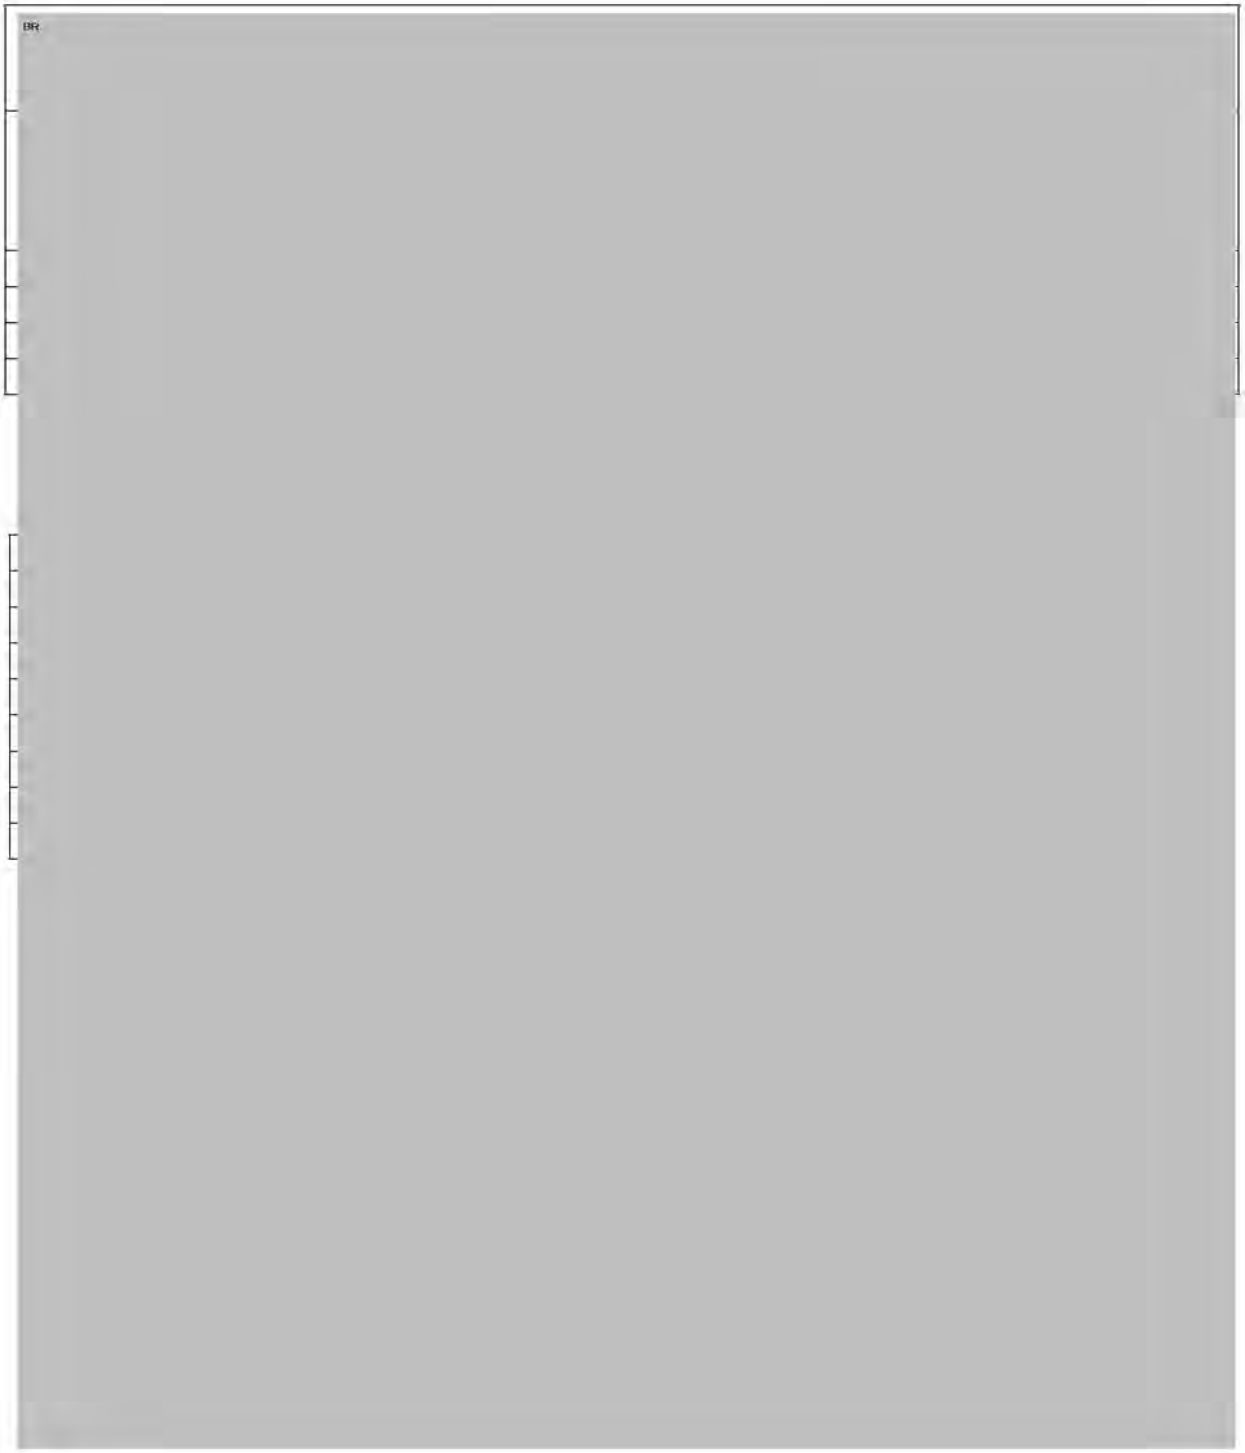
BR

# 3 Projectvoortgang

## 3.1 Aanbesteden en contracteren

### 3.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Contractmanagement DMZ. | Verloopt zoals gepland. Geen bijzonderheden te melden. |
| Verlengen inhuurcontracten diverse teamleden. | Verlengen medewerkers Rotterdamsebaan is in klein DB besproken en aangehouden voor een nadere bespreking. Ten aanzien van enkele medewerkers begint er wel een knelpunt te ontstaan. |
| Voorbereiding contractering en aanbesteding Tweede Toevoer. | Met betrekking tot de contractering en de aanbesteding is er geen voortgang te melden omdat we nog niet zijn gestart. De voorbereiding hiervan kan worden gestart op het moment dat er een definitieve keuze is genomen om hier een afzonderlijke opdracht van te maken en daarmee ook een aanbesteding noodzakelijk is. |
| Aanvulling op het evaluatierapport over de Aanbestedingsfase van het hoofdcontract in OGON bespreken. | Intern vinden daar nog de laatste aanvullingen plaats. |
| Wijzigingen | Het wijzigingsvoorstel is geaccepteerd m.b.t. het aanpassen van de bankgarantie die in het kader van de realisatie is verstrekt en is een voorstel gedaan voor het aanpassen van de bankgarantie m.b.t. de onderhoudsfase. |
| Er wordt een externe audit op het wijzingenproces gehouden. | De audit is geïnitieerd door DSB/Opdrachtgeving. Roba is hierin volgend. Er heeft op dit vlak nog geen vervolg op het eerste overleg plaatsgevonden. |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Geen. | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Klein DB: verlenging medewerkers project Roba | In het overleg is het voorstel aangehouden. |

### 3.1.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| DMZ: oplevering en overdracht van dit contract gaat plaatsvinden. |
| Wijzigingen is een continu proces |
| **Besluiten** |
| Geen. |

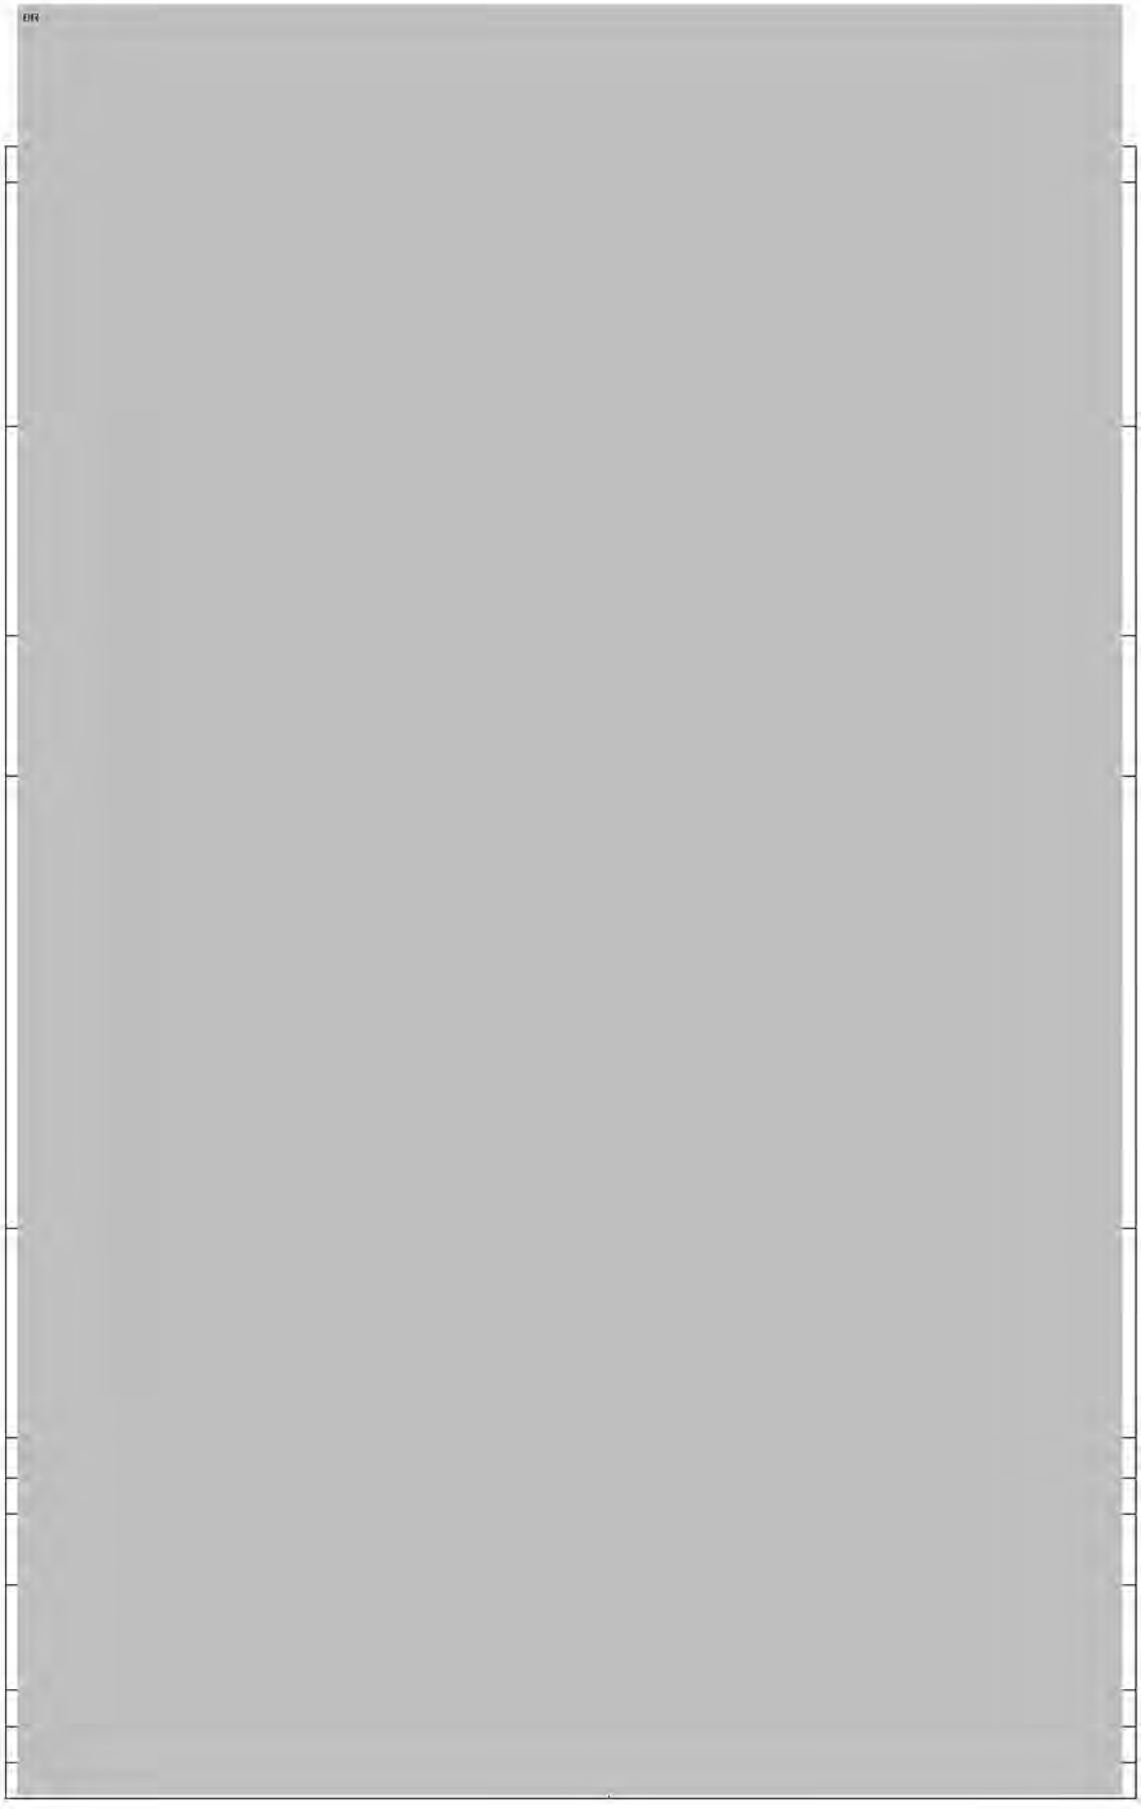

BR

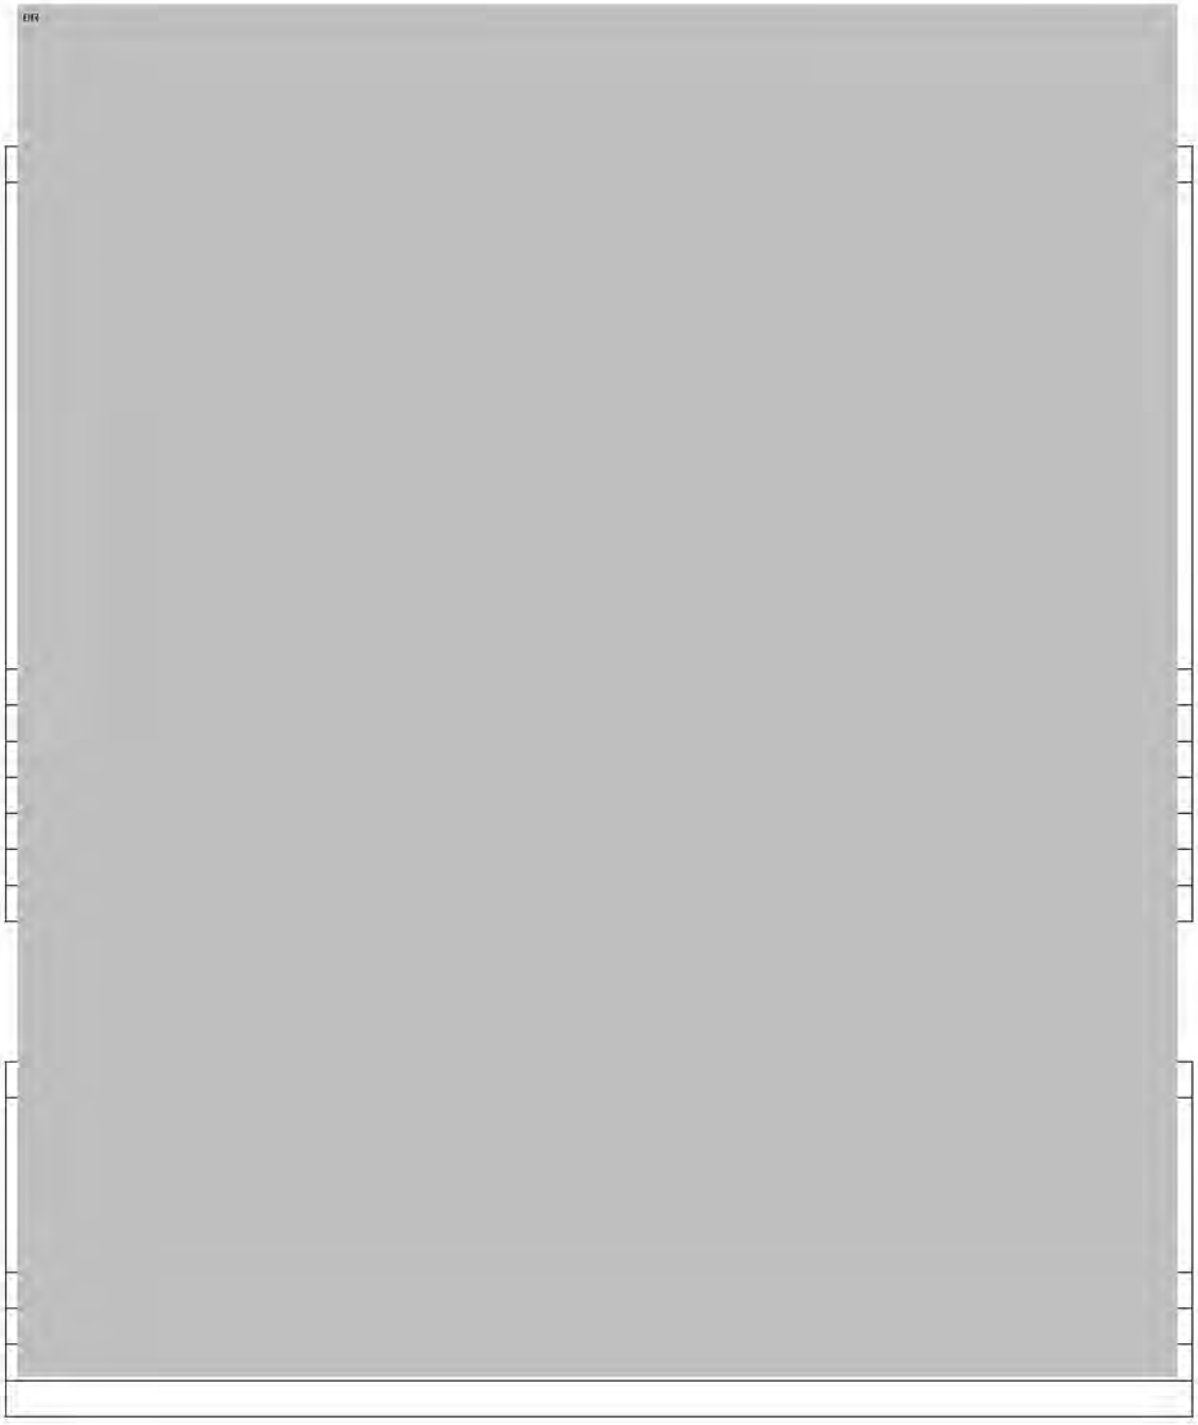

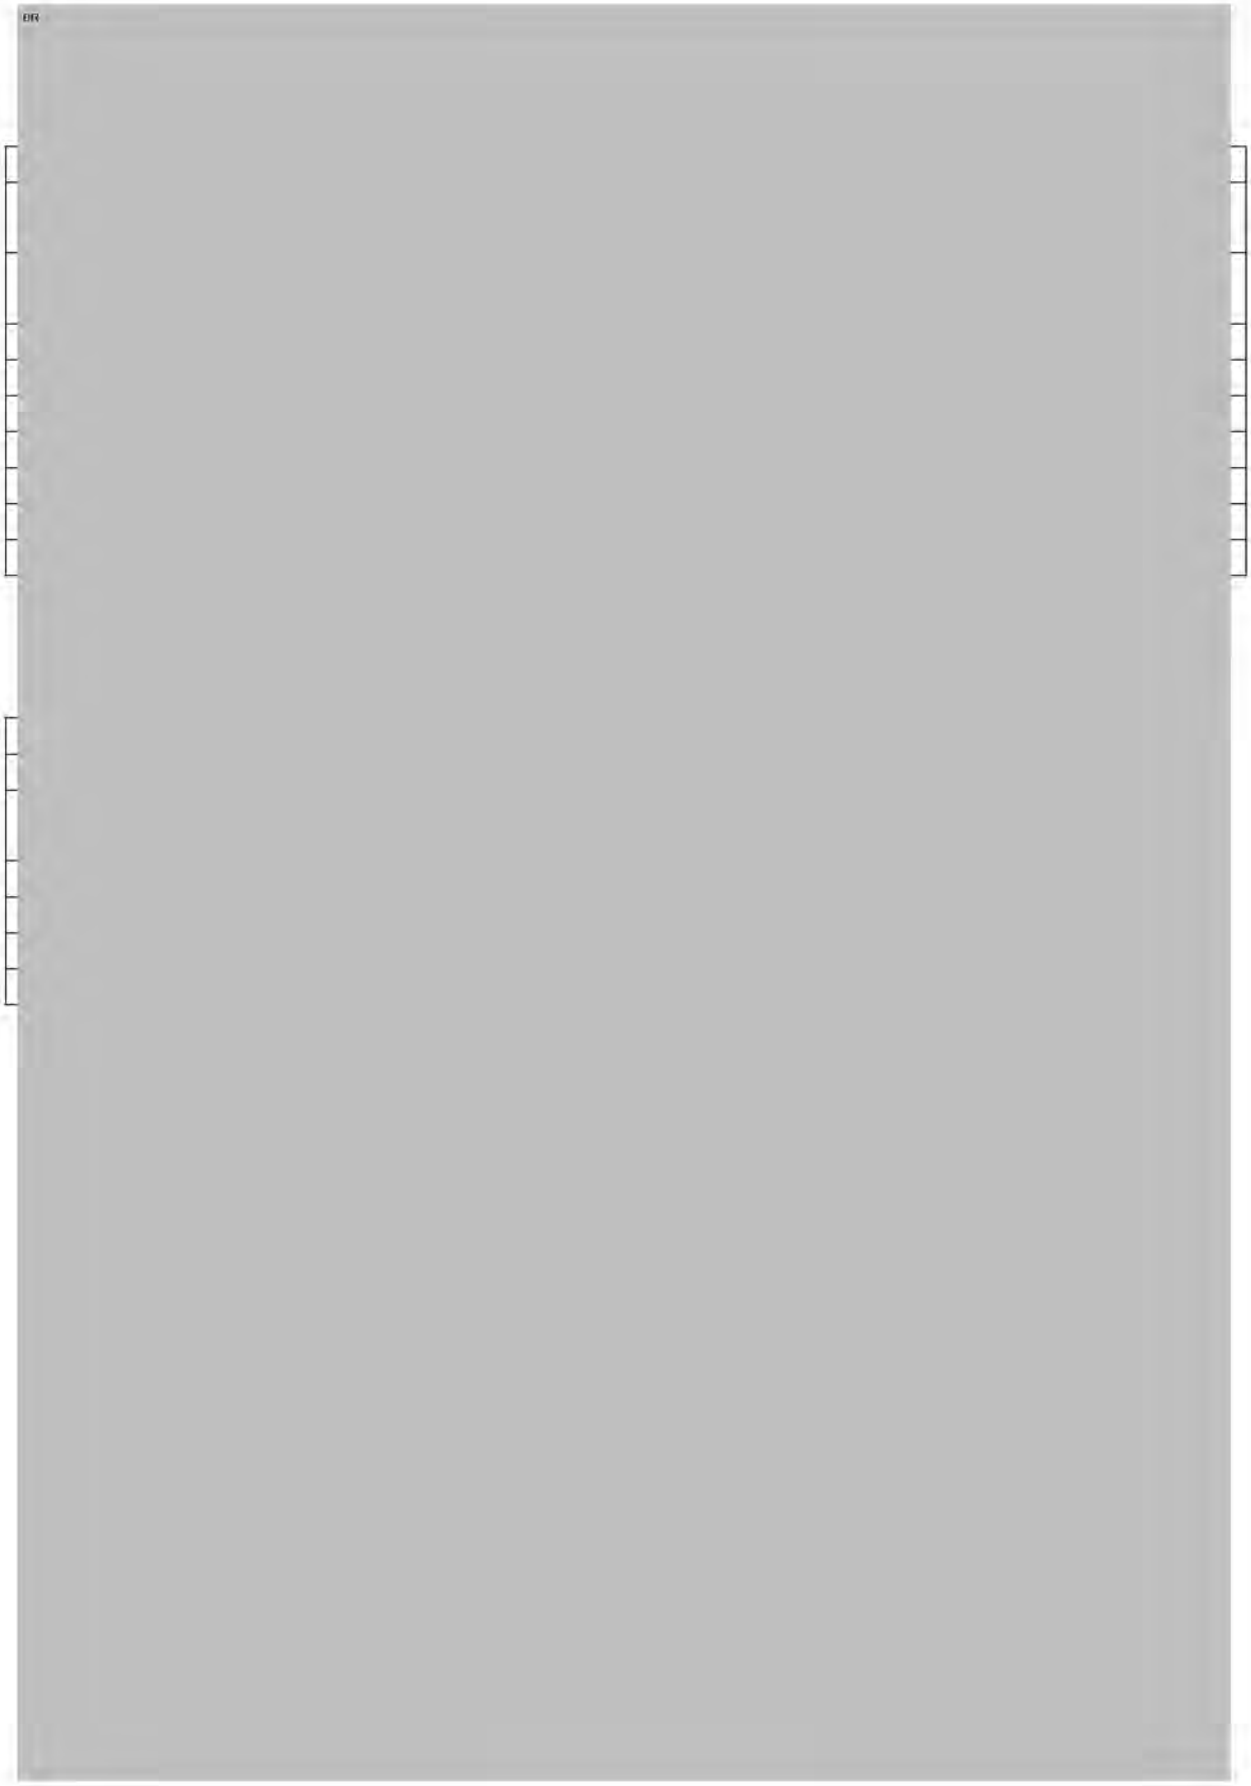

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Afronden ontwerp en opstellen bestek tweede toevoer. | Het Ontwerp (VO) is afgerond en wordt getoetst bij het Hoogheemraadschap. Het opstellen van het bestek is uitgesteld i.v.m. het nog niet ondertekenen van de SOK. |
| BR | |
| Realisatie fase 2 boezemkade Molenvlietpark | De realisatie van fase 2 is uitgesteld. |
| Realisatie recreatieve bruggen in Molenvlietpark | Realisatie fundering Brug 6 is opgestart. |
| BR | |
| | |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Aanvang inrichting Molenvlietpark. Aan de zijde van golfbaan Leeuwenbergh zijn 8 bomen geplant, waaronder eiken, beuken en zoete kers. Deze bomen hebben een stamomtrek van ca.20-25cm. Daarnaast wordt er ca. 4000 $m^2$ bosplantsoen aangelegd. In het bosplantsoen komen o.a. sleedoorn, sporkehout, Gelderse roos en krenteboompjes. | |
| | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen | Geen |
| | |

### 3.5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Opstellen bestek tweede toevoer (indien SOK getekend is). |
| BR |
| |
| |
| Werkzaamheden inrichting Molenvlietpark voortzetten. |
| Realisatie recreatieve bruggen in Molenvlietpark. |
| BR |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |
| |

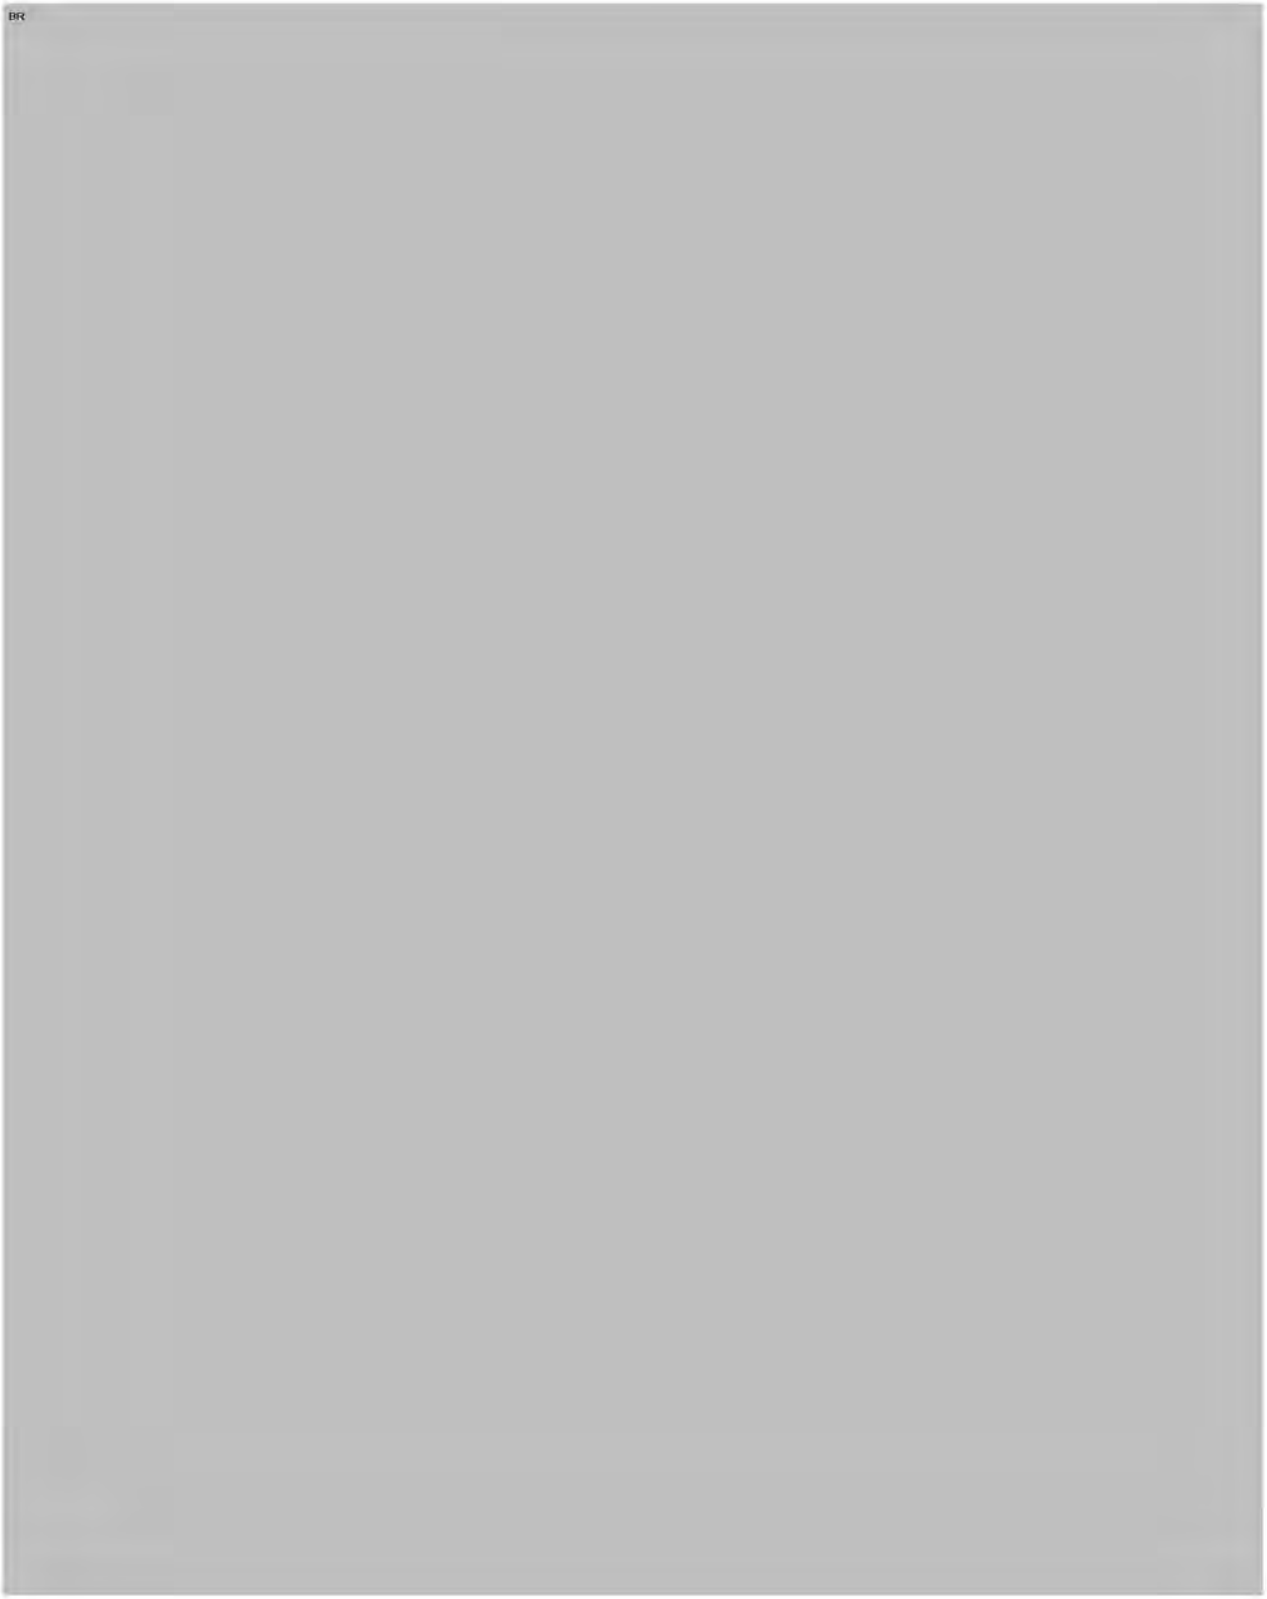
BR

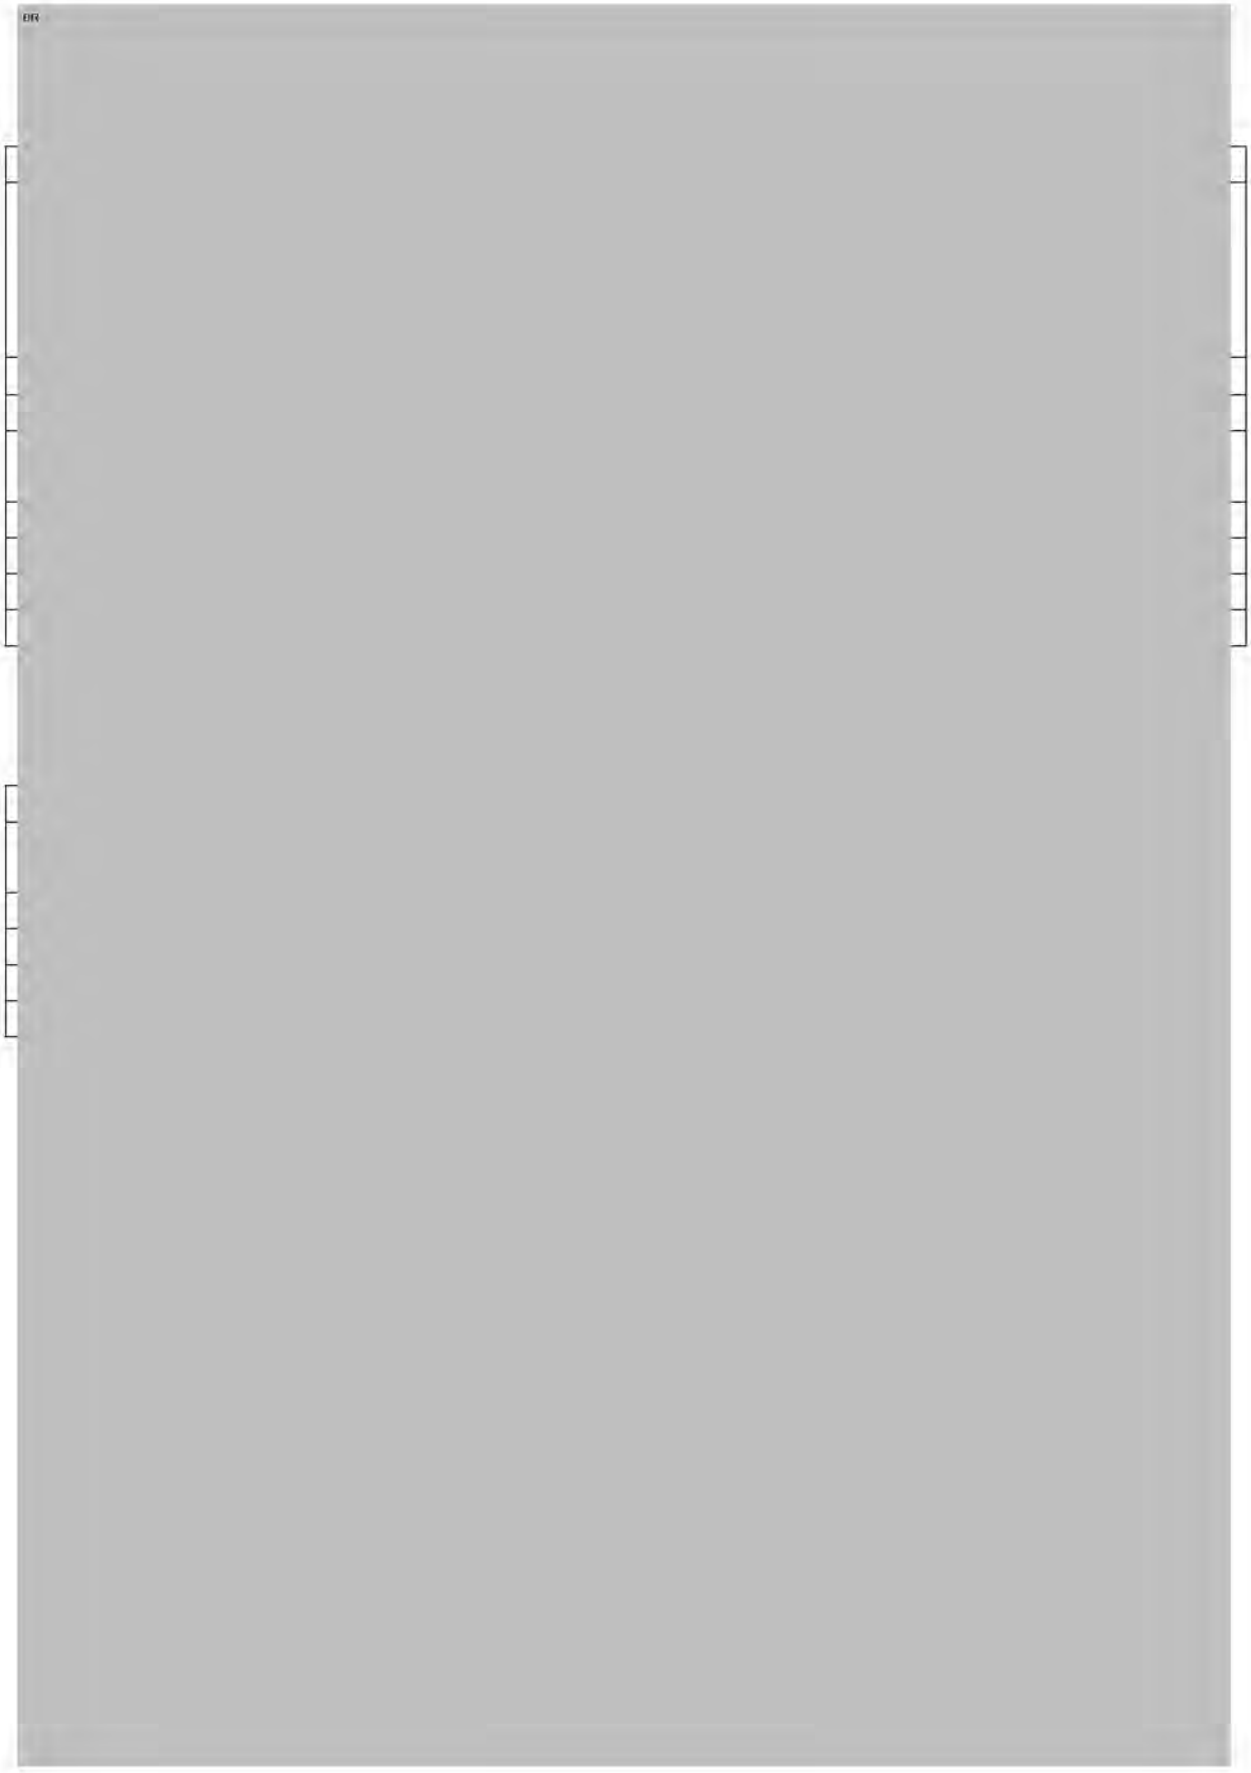

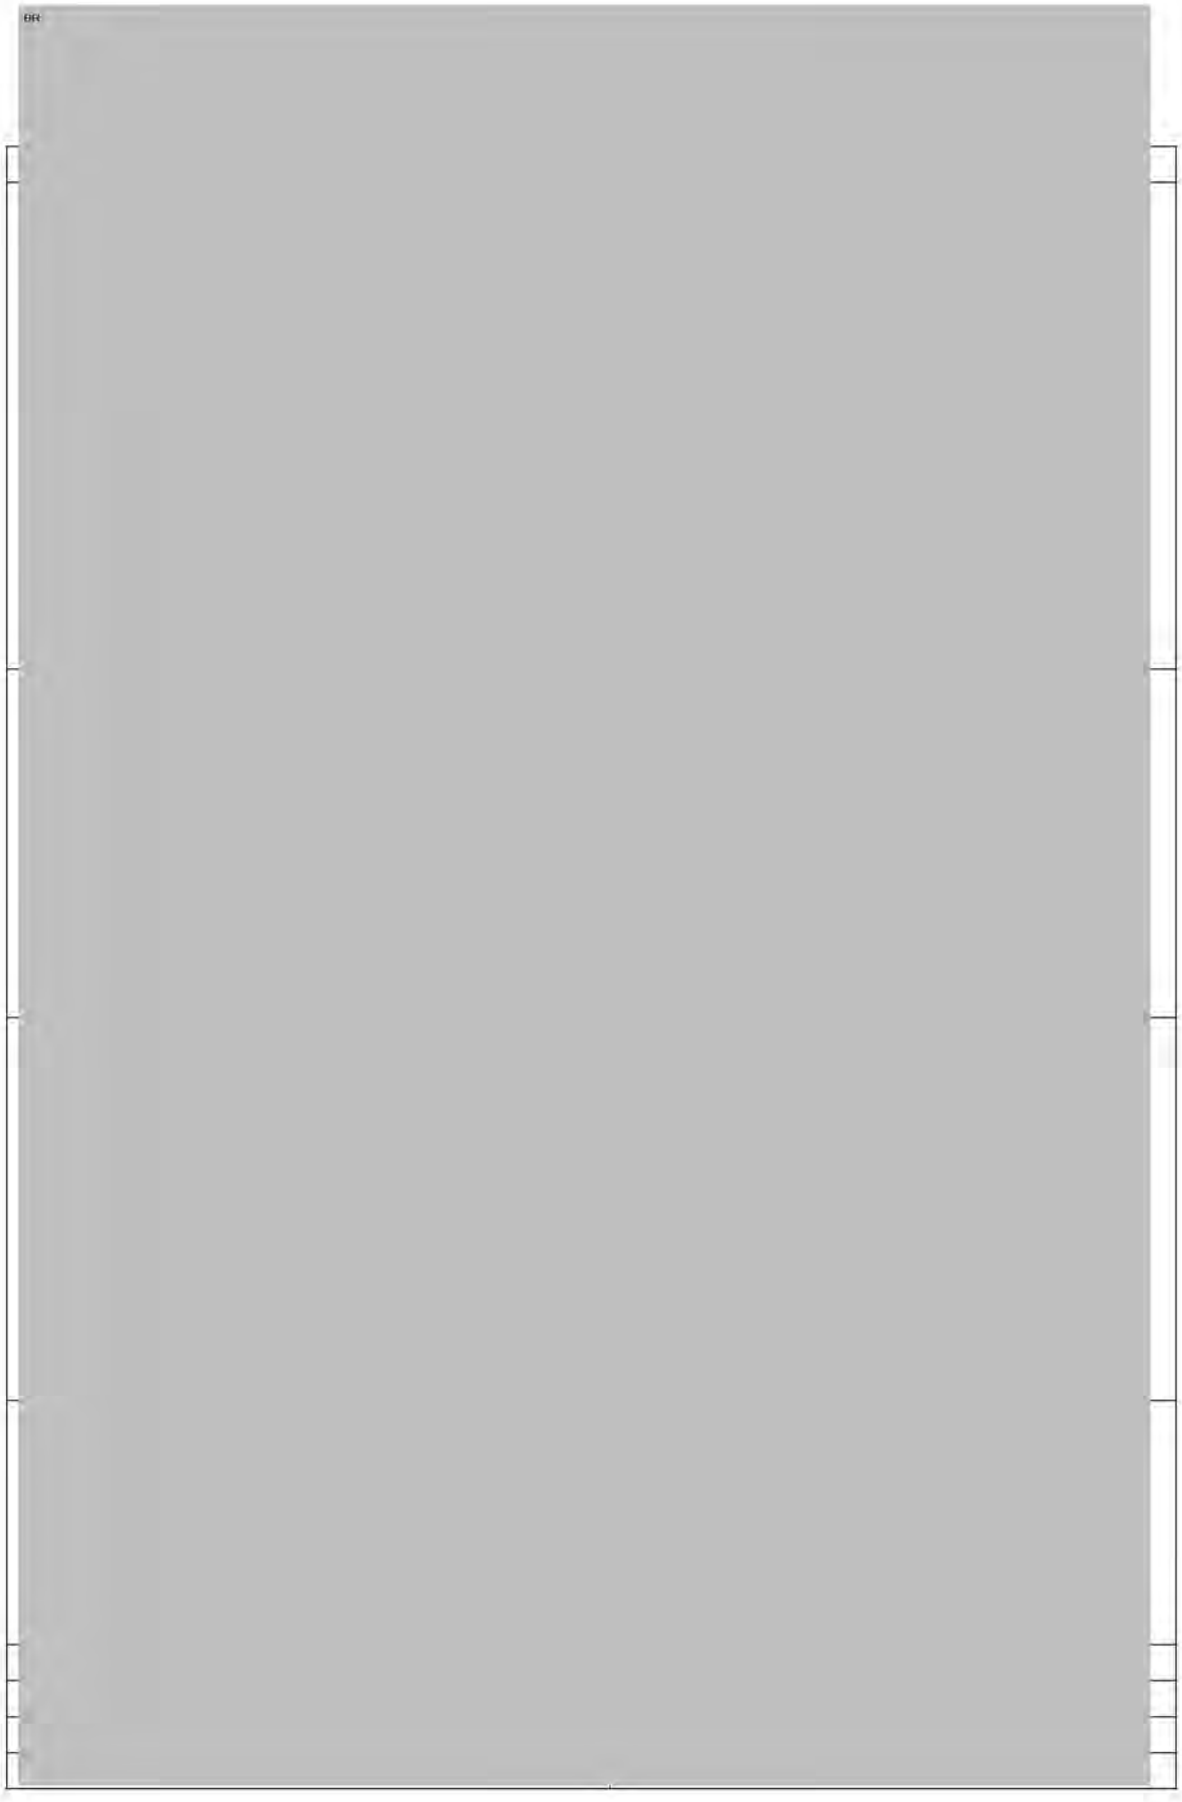

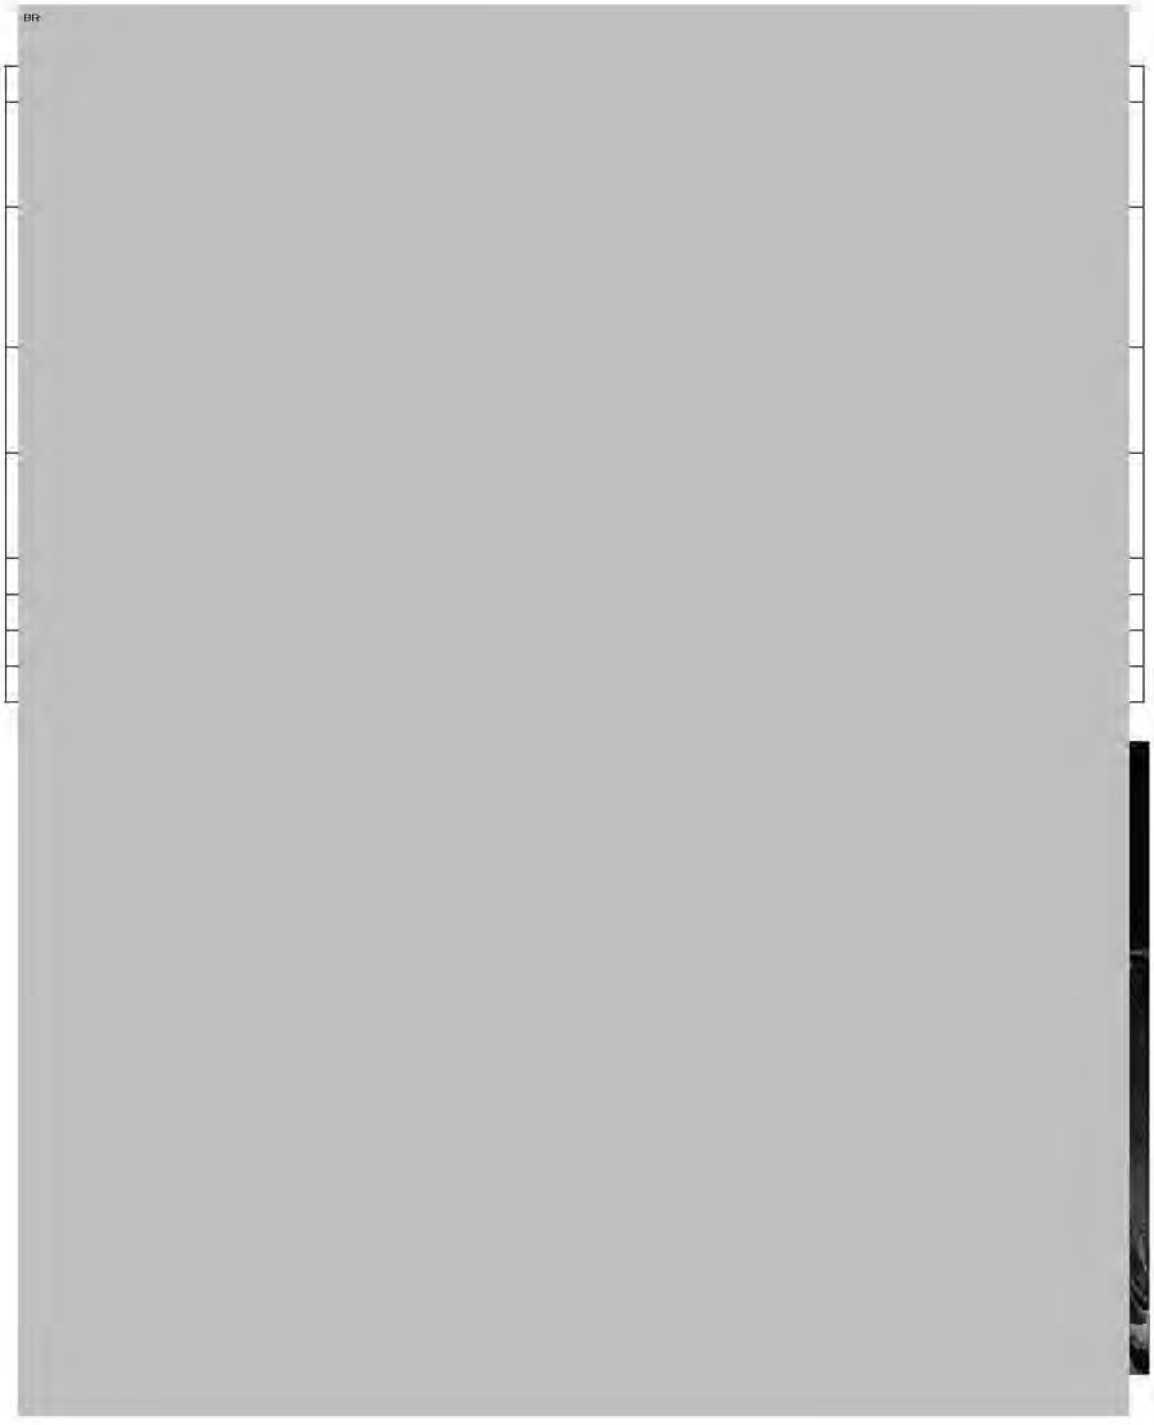

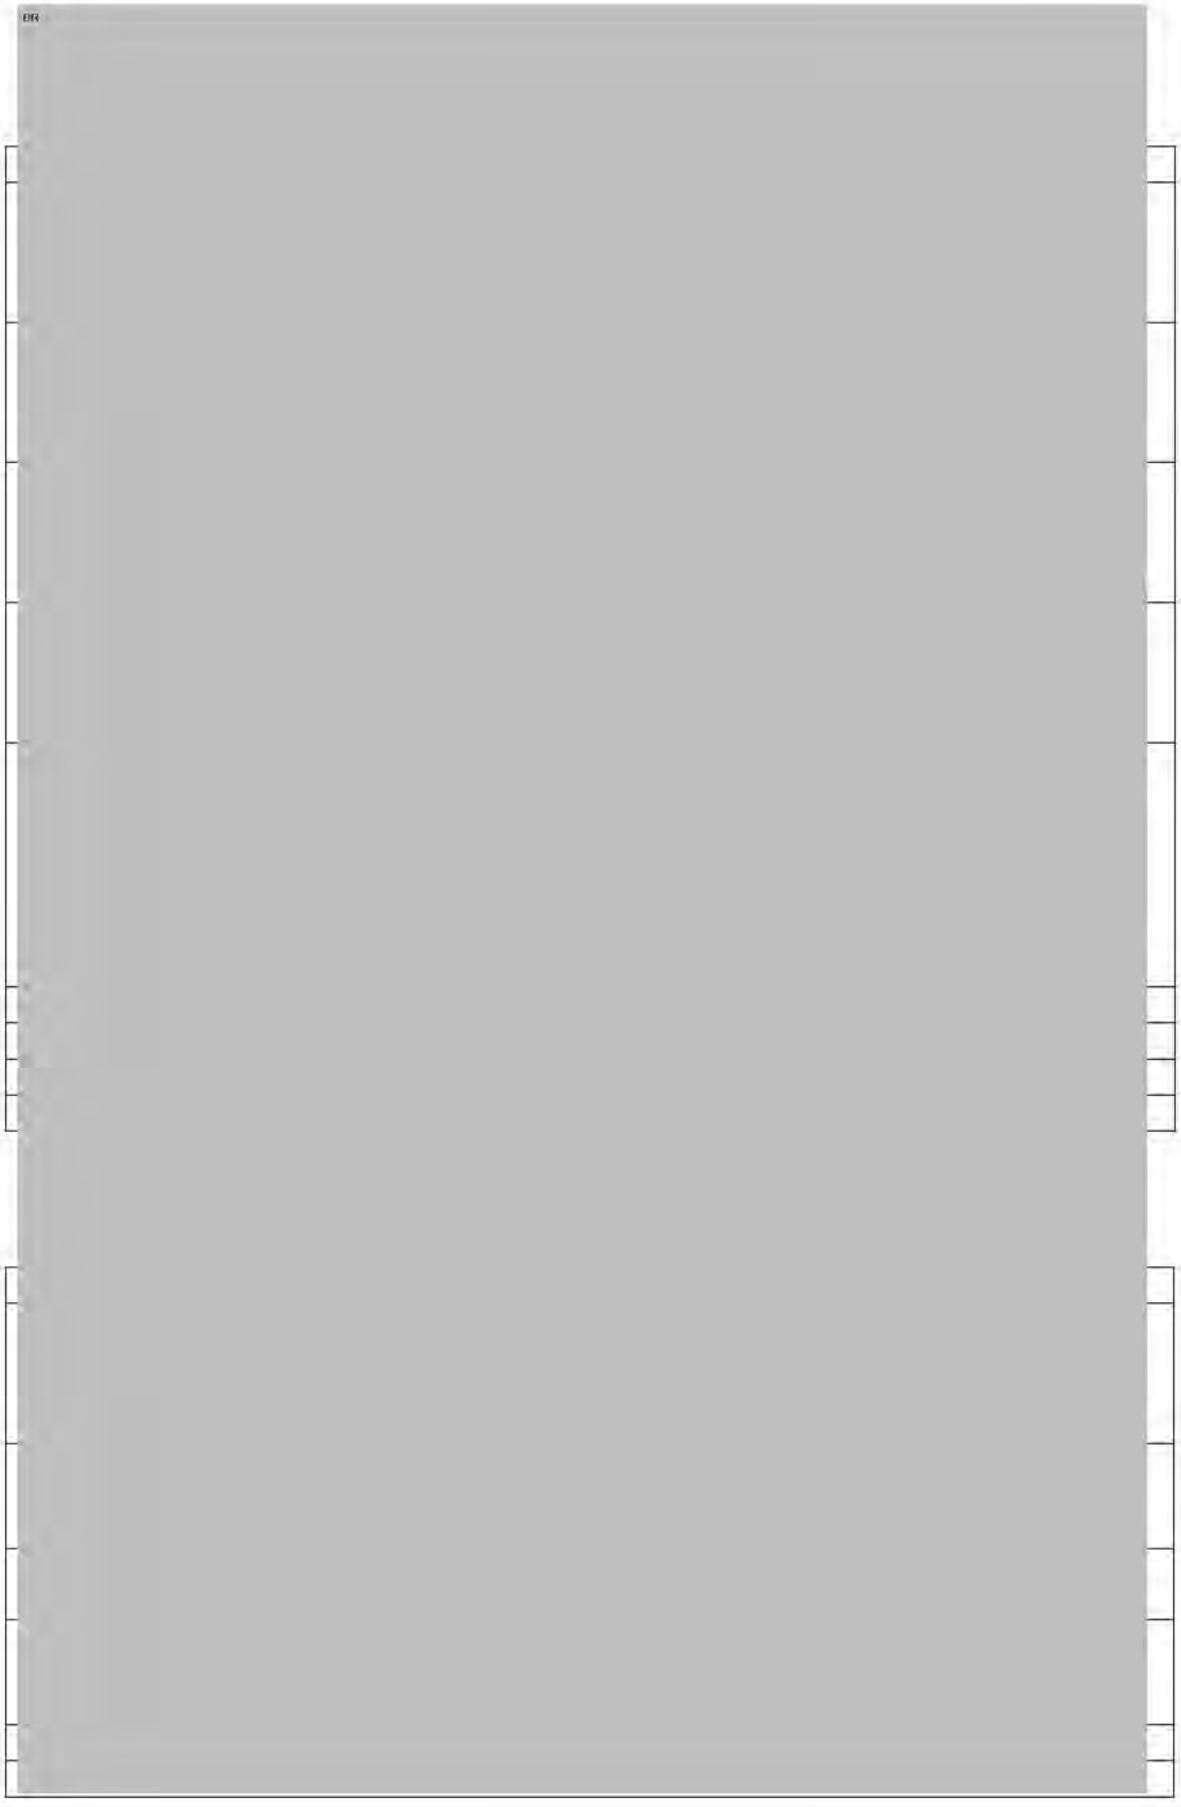

Docnr22

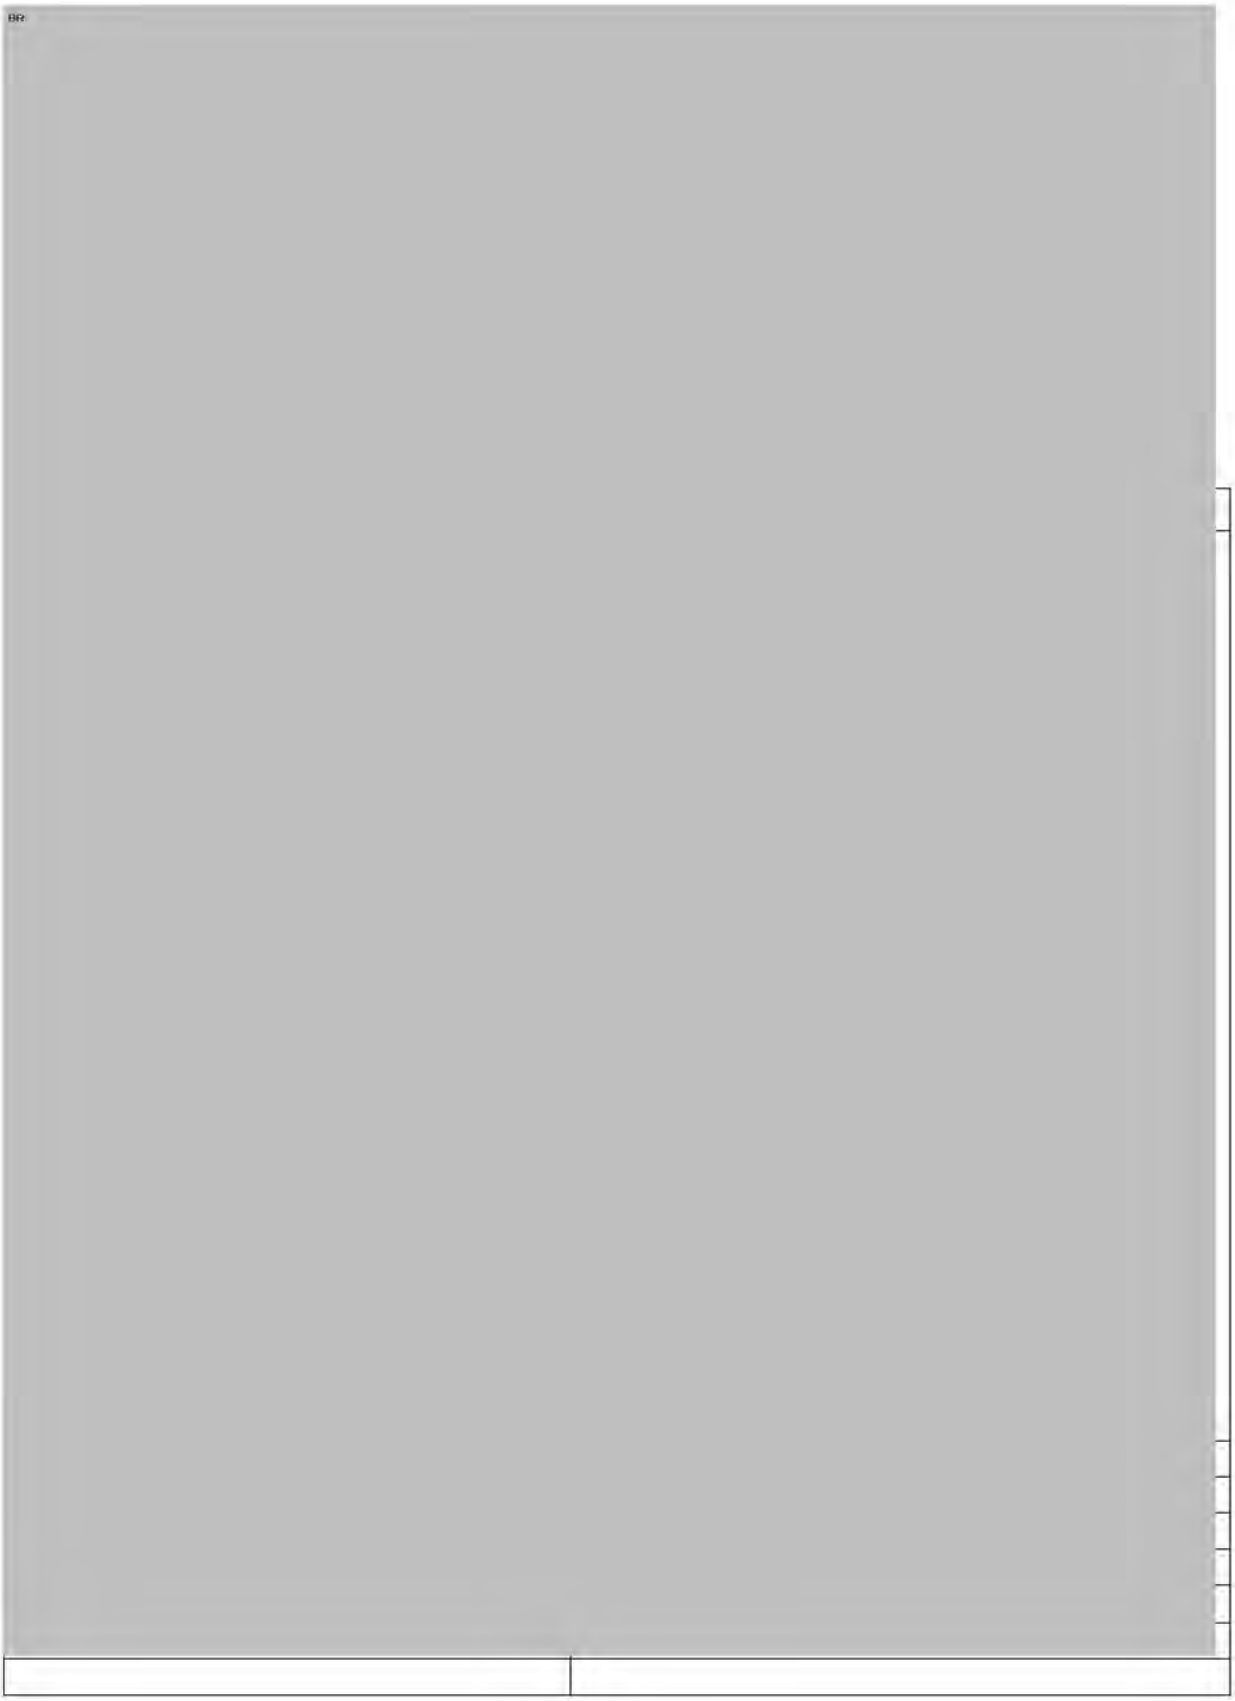
BR

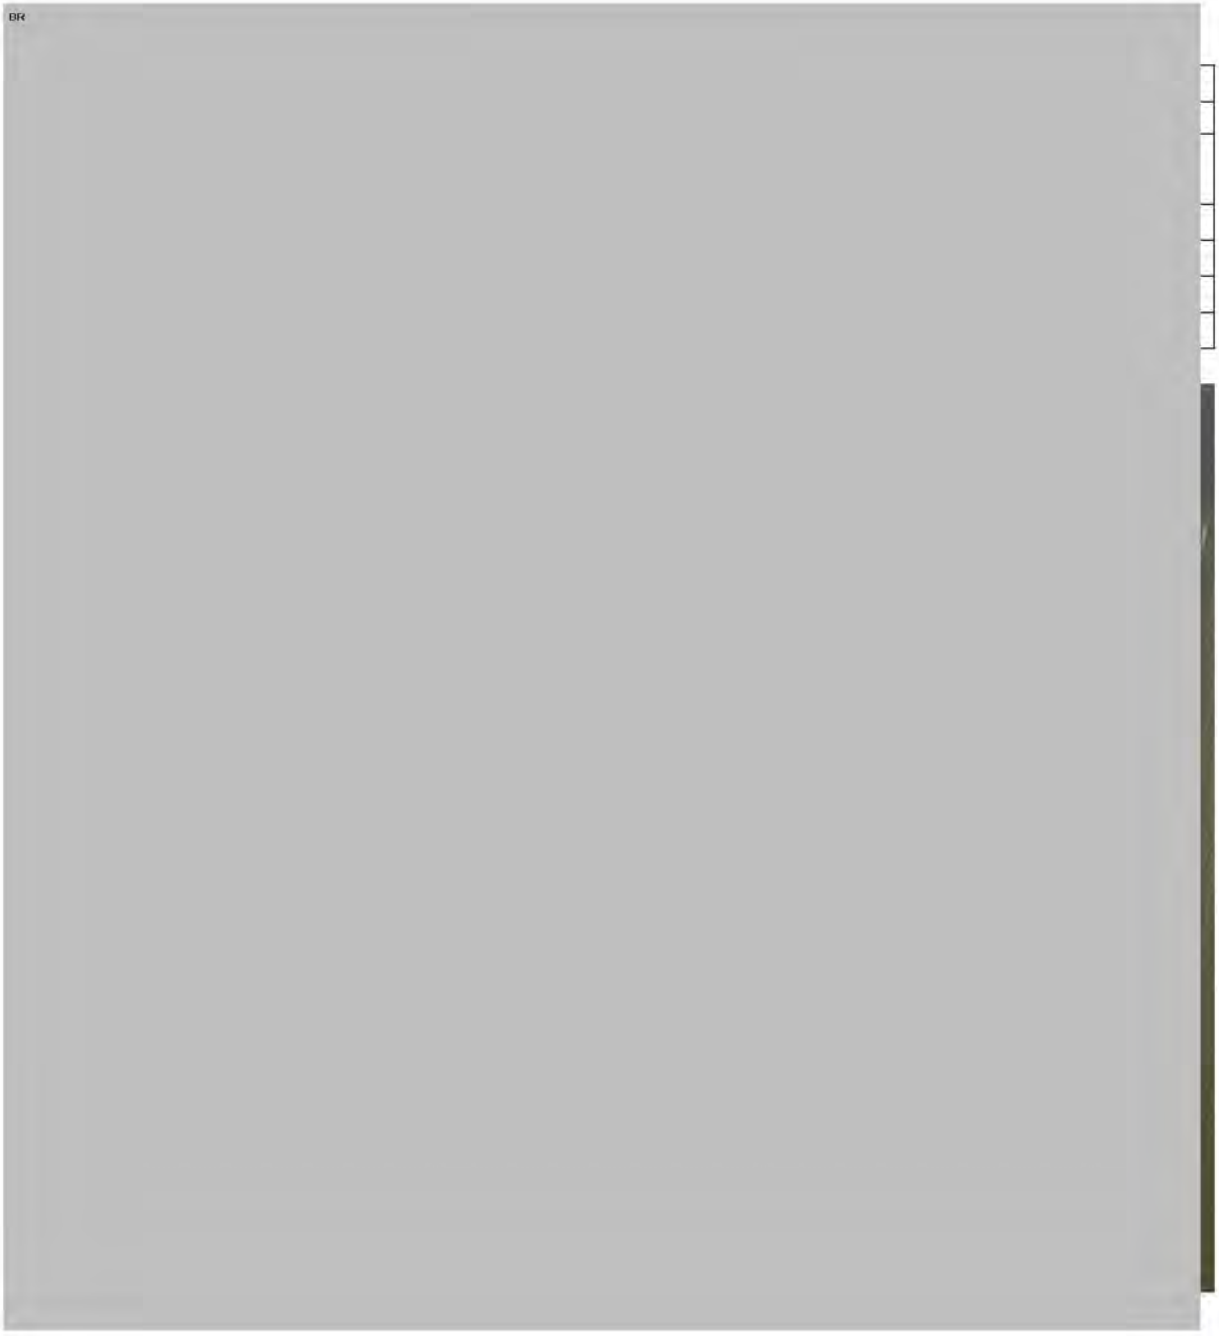

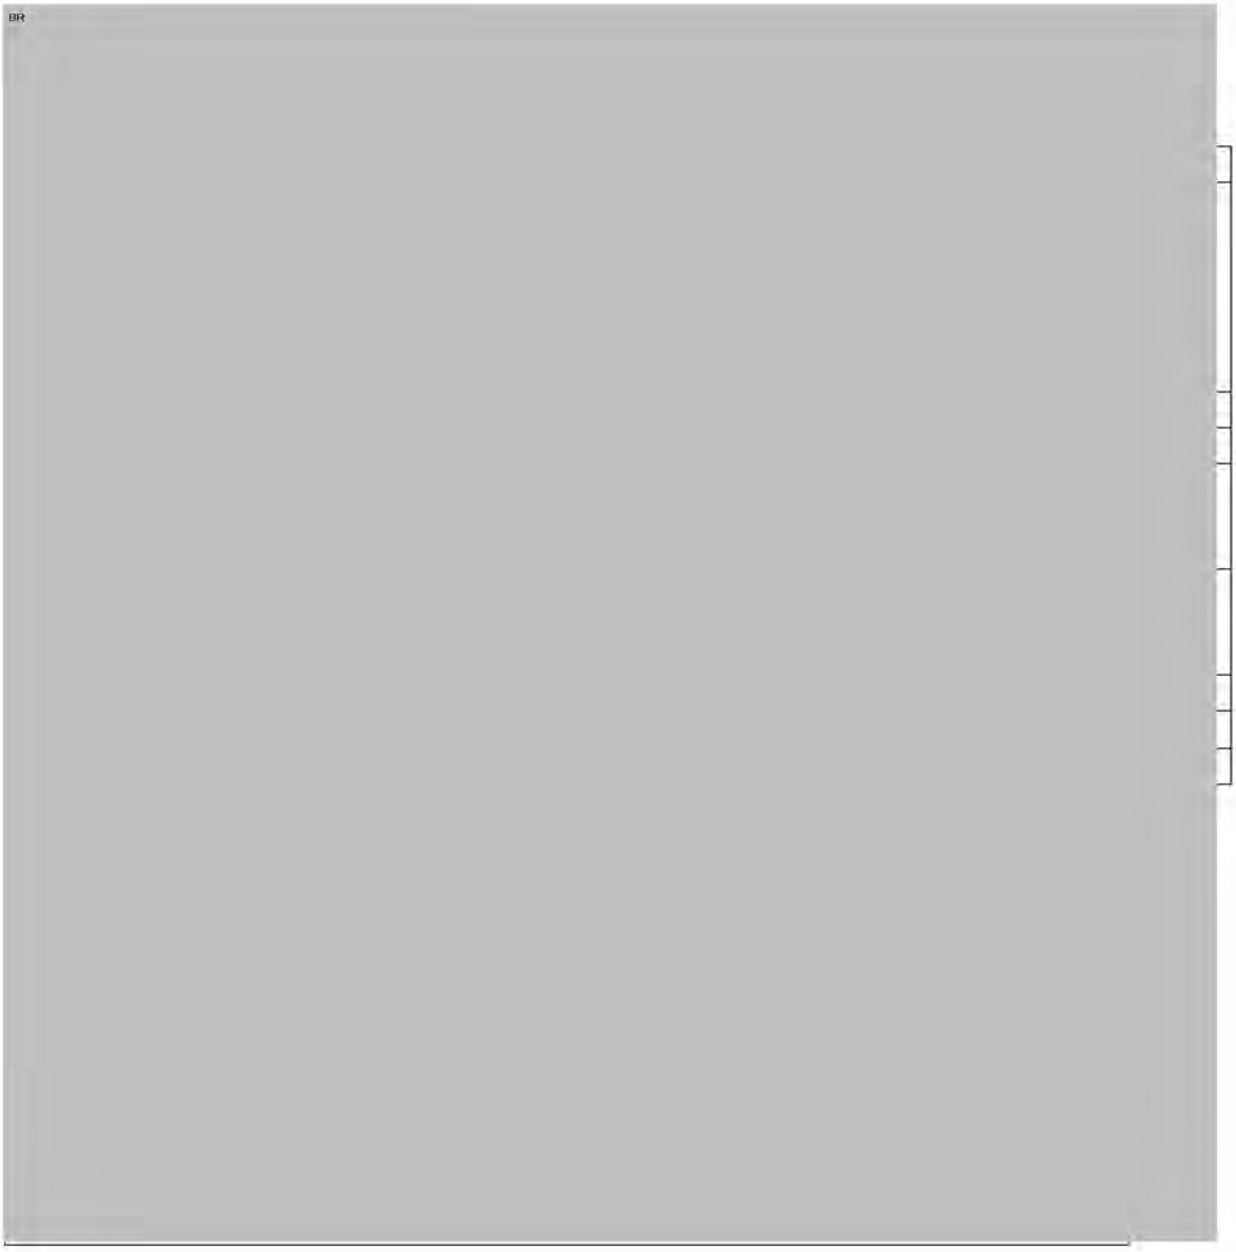
BR

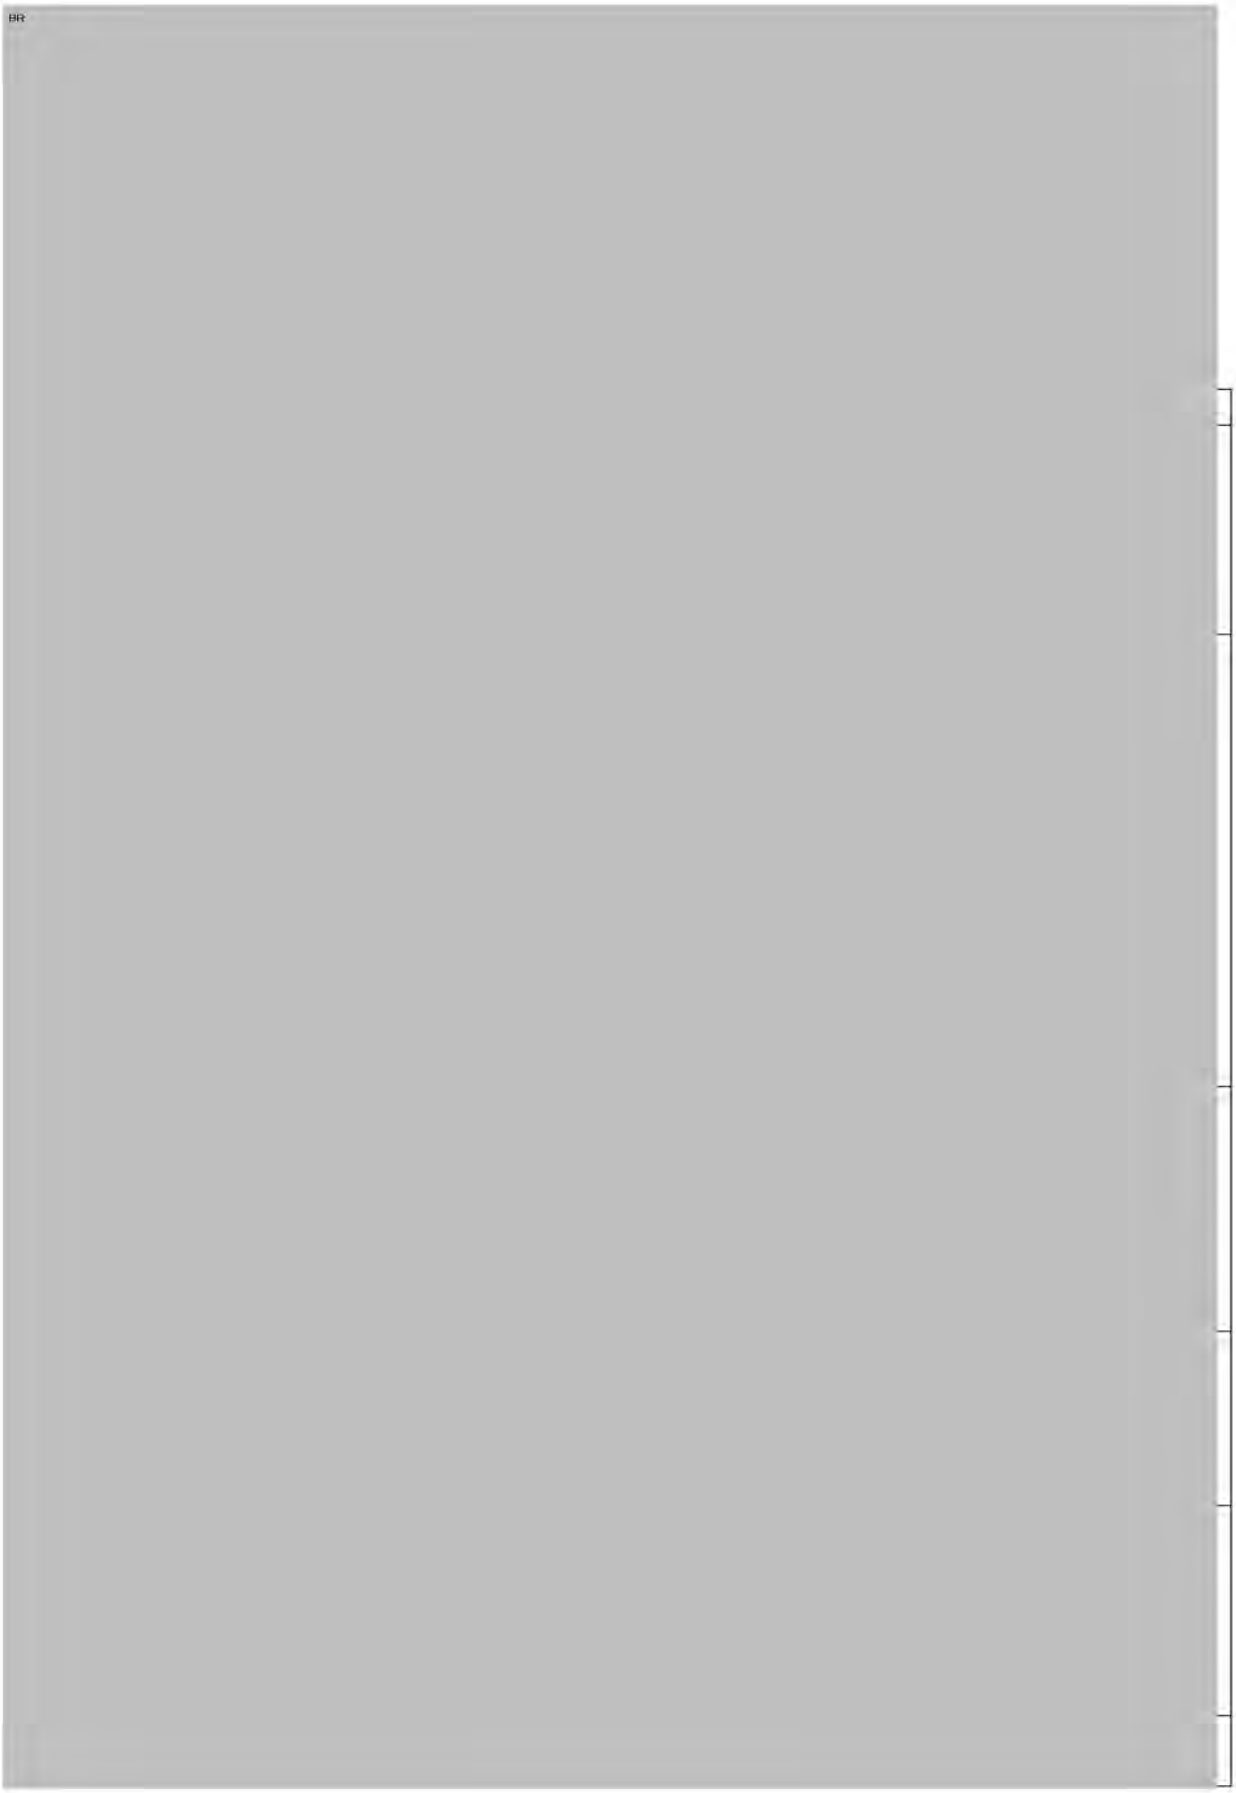

BR

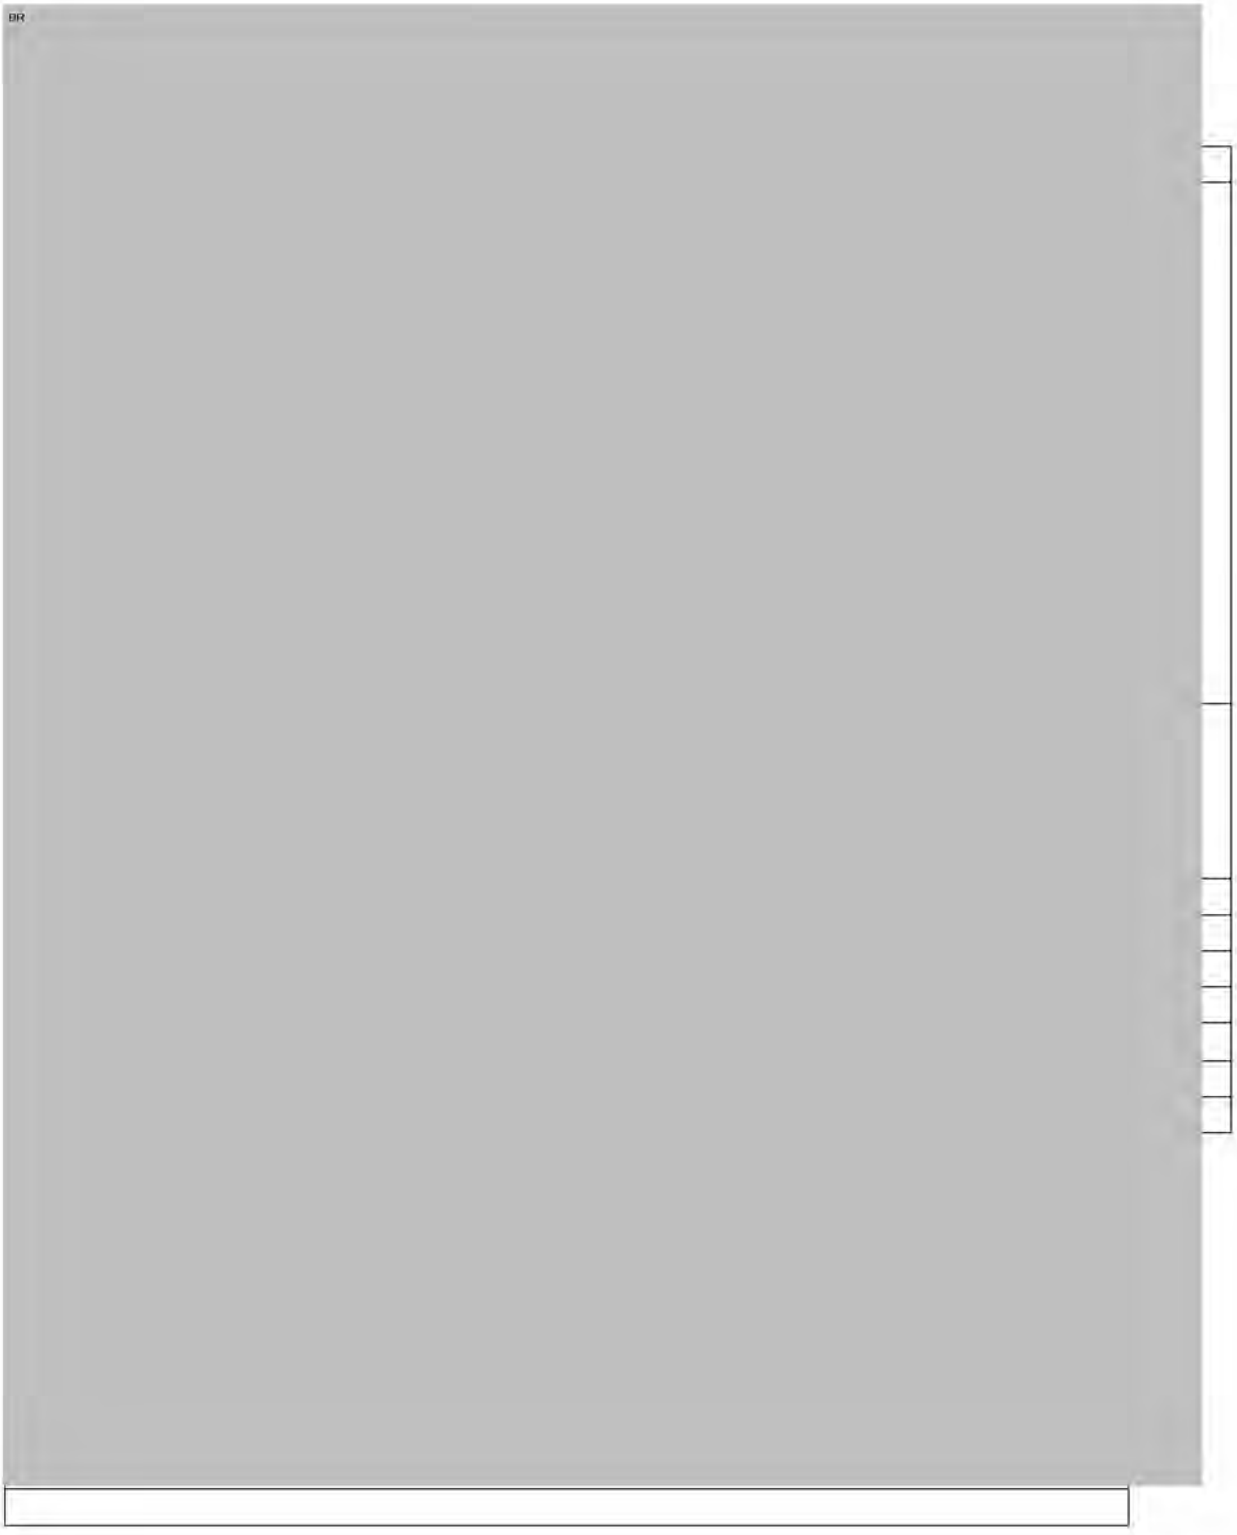

# 4 Overdracht en openstelling

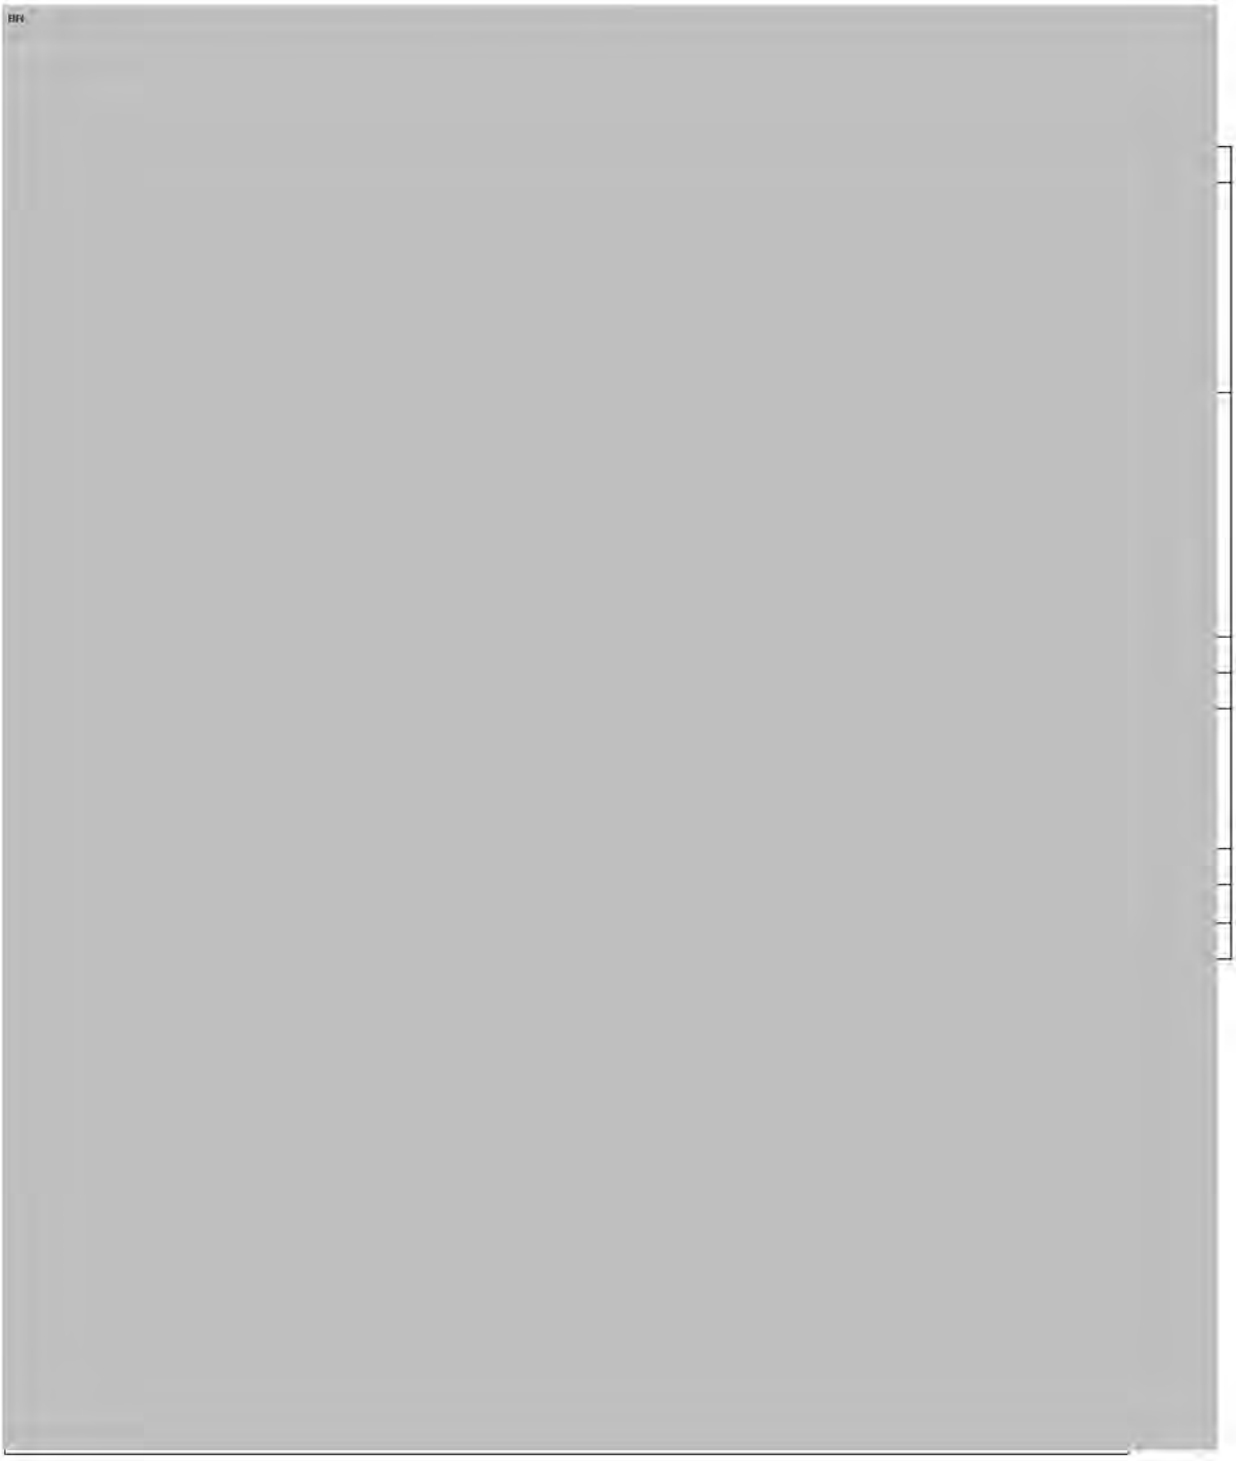

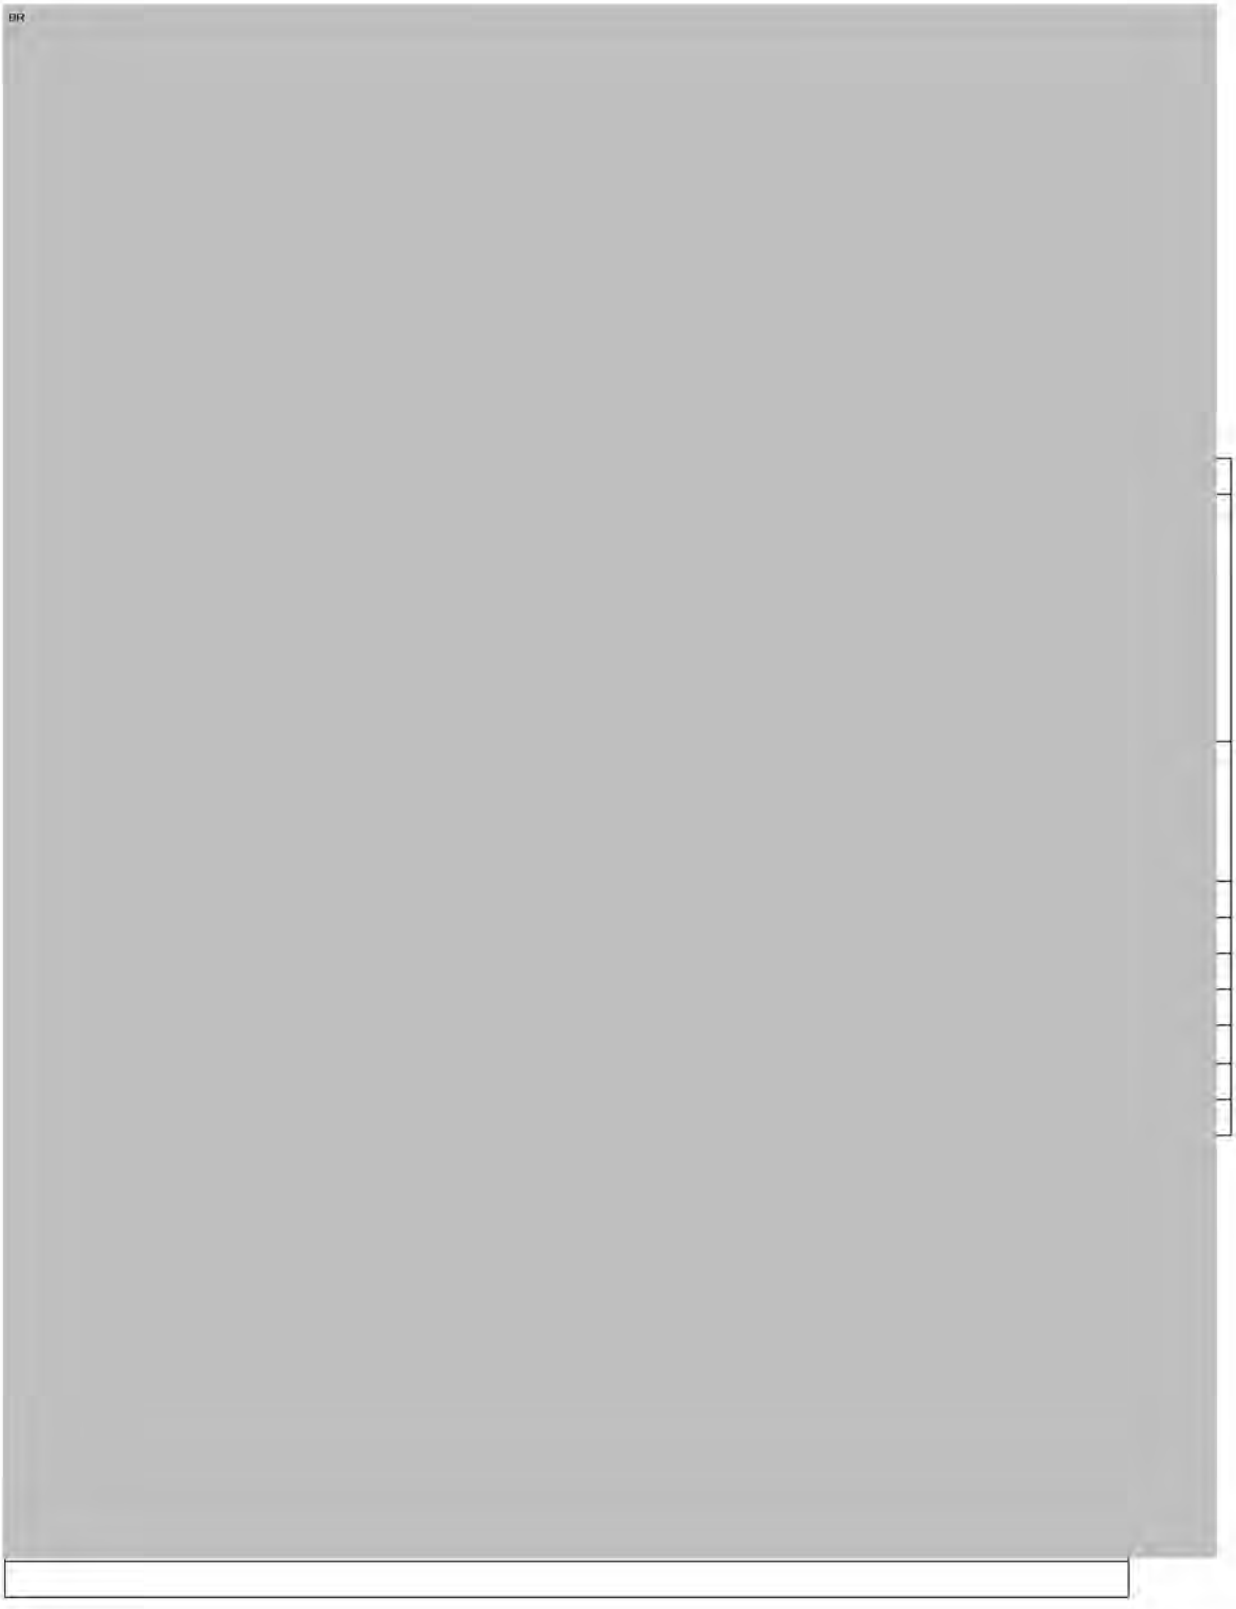
BR

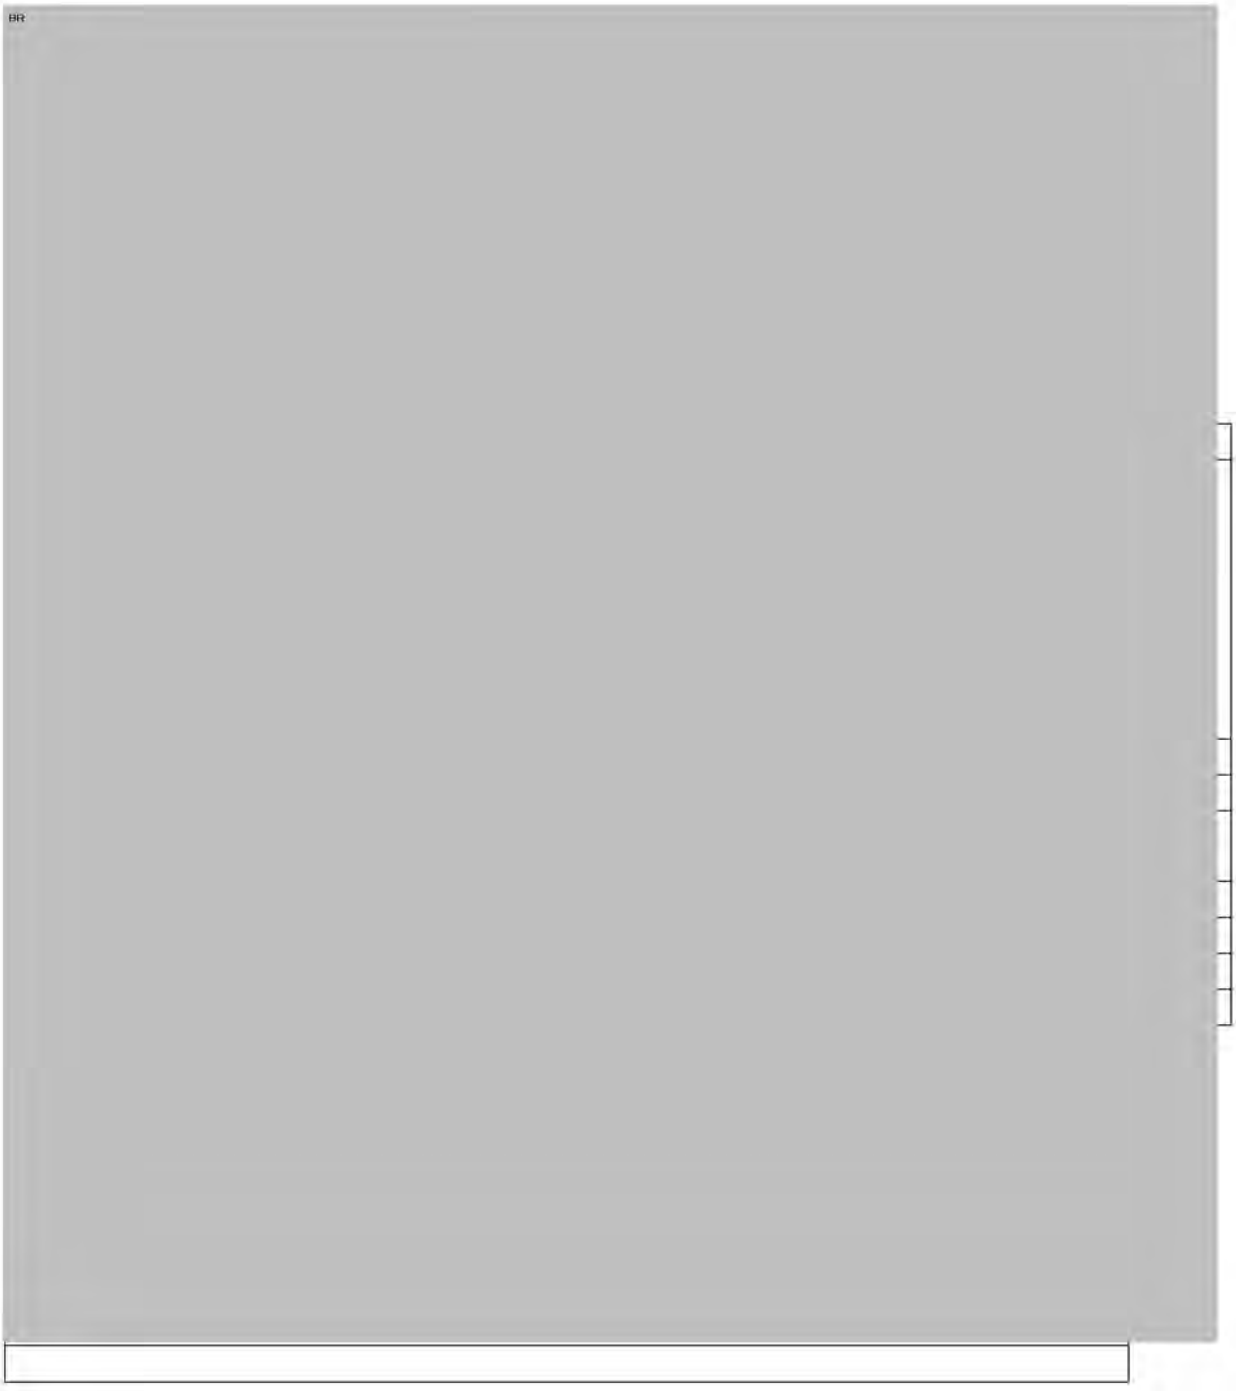
BR

# 5 Projectbeheersing

## 5.1 Scope

### 5.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Signaleren van wijzigingen in de projectscope en, naar aanleiding daarvan projectmutaties voorbereiden, beoordelen en ter besluitvorming agenderen. | Onderstaande projectmutaties zijn in behandeling/geïdentificeerd:<br>BR<br>- Prov. Z-H Oeverbescherming Jan Thijssenweg: werk-met-werk bij het aanbrengen van oeverbescherming langs de Vliet.<br>BR<br>- Watertoevoer extra activiteiten: uit de onderhandelingen grondeigenaar komen aanvullende werkzaamheden.<br>BR<br>- Fietspad-fietsdek 2e toevoer i.o.v. DSB/SB: nieuwe scope ten aanzien van het brugdek 2e toevoer.<br>- Asfalt fietspad 2e toevoer i.o.v. DSB/SB: nieuwe scope ten aanzien van asfalteringswerkzaamheden 2e toevoer. |
| BR | |

BR

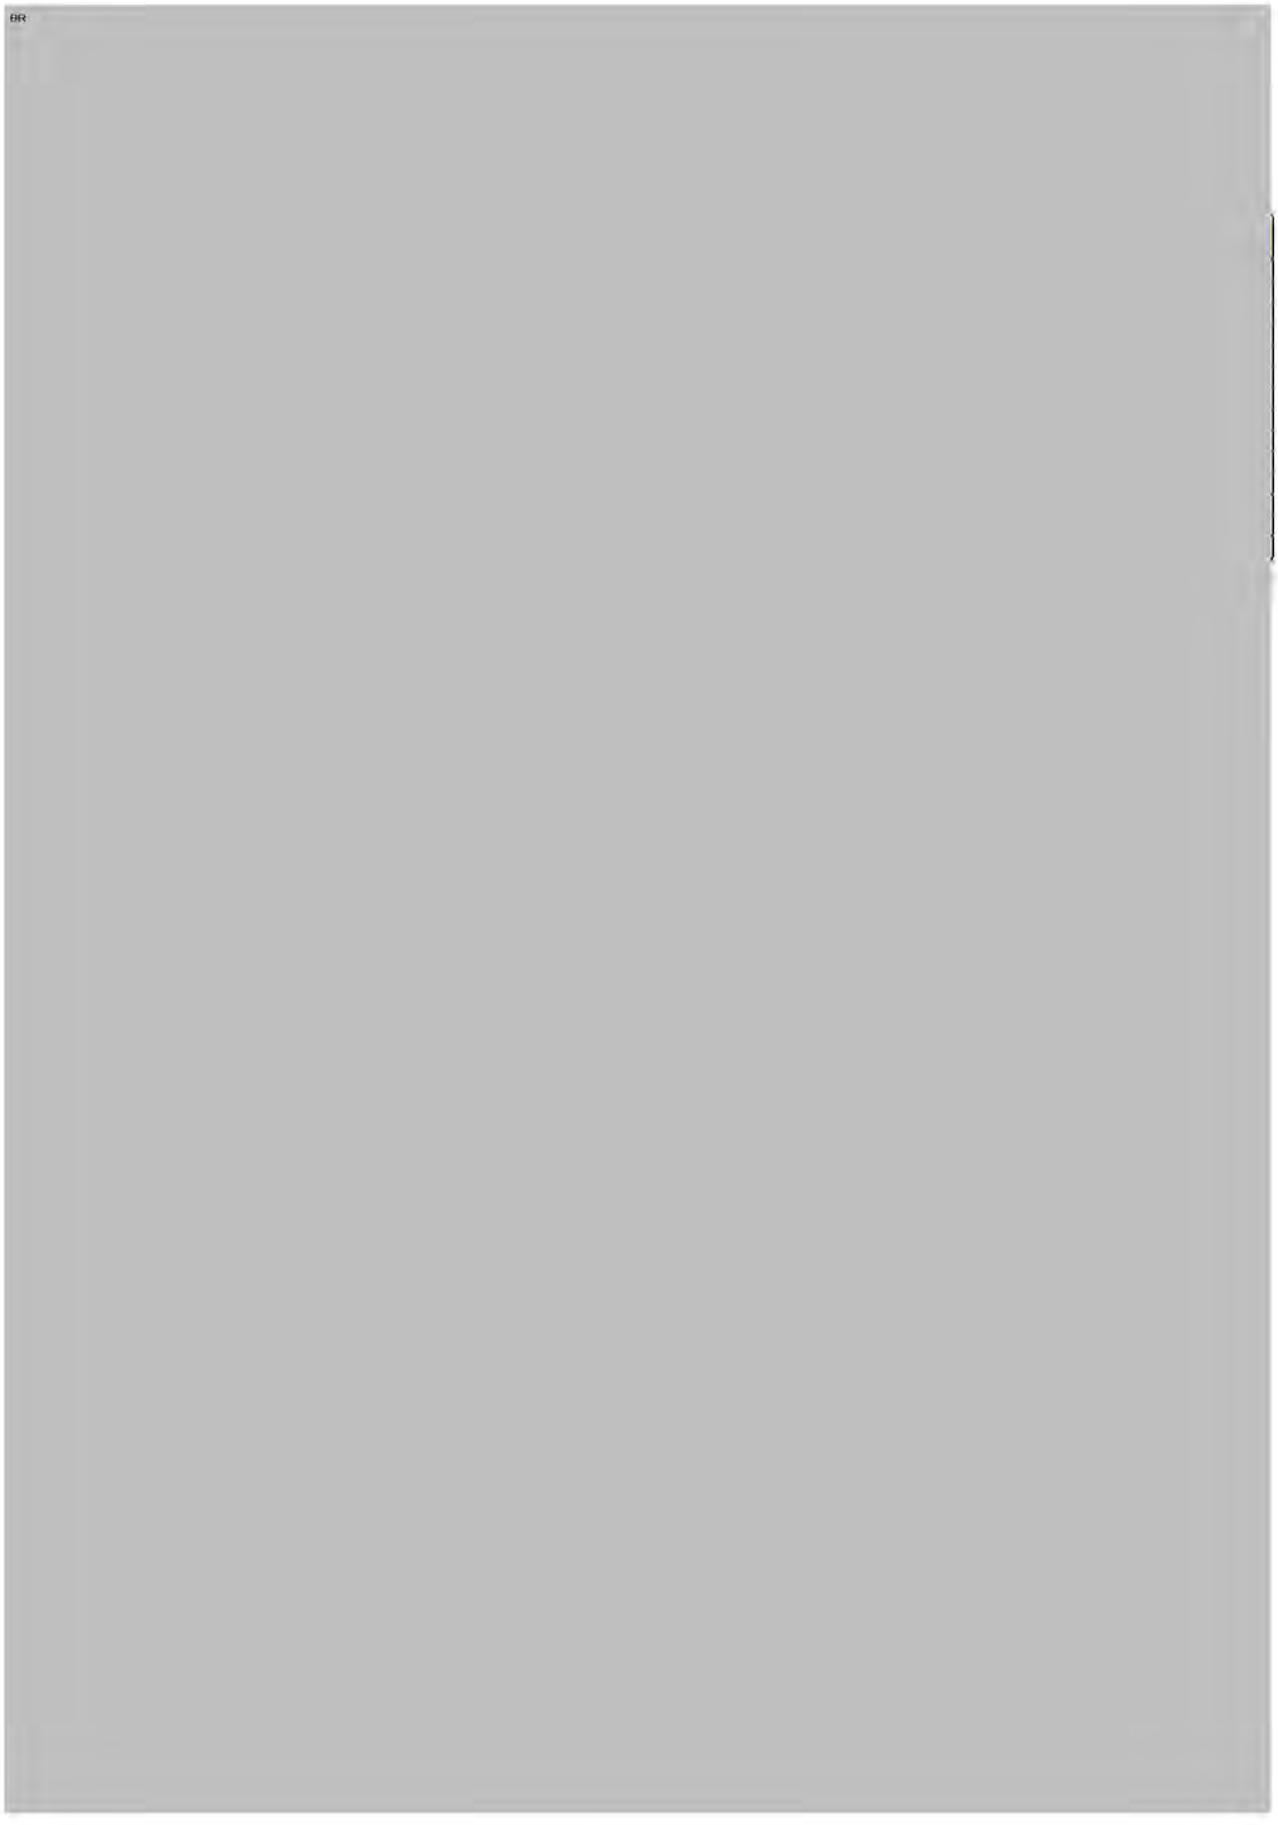
BR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | **2.725.000** | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | **400.000** | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland

Er zijn in het eerste kwartaal 2019 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland

Er zijn in het eerste kwartaal 2019 geen mutaties geweest.

## 5.3 Planning

Zie tevens de bijlage 'Planningsmijlpalen'.

### 5.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Updaten van de deelplanningen voor tweede watertoevoer en bediencentrale. | Heeft plaatsgevonden. |
| [redacted] | |

BR

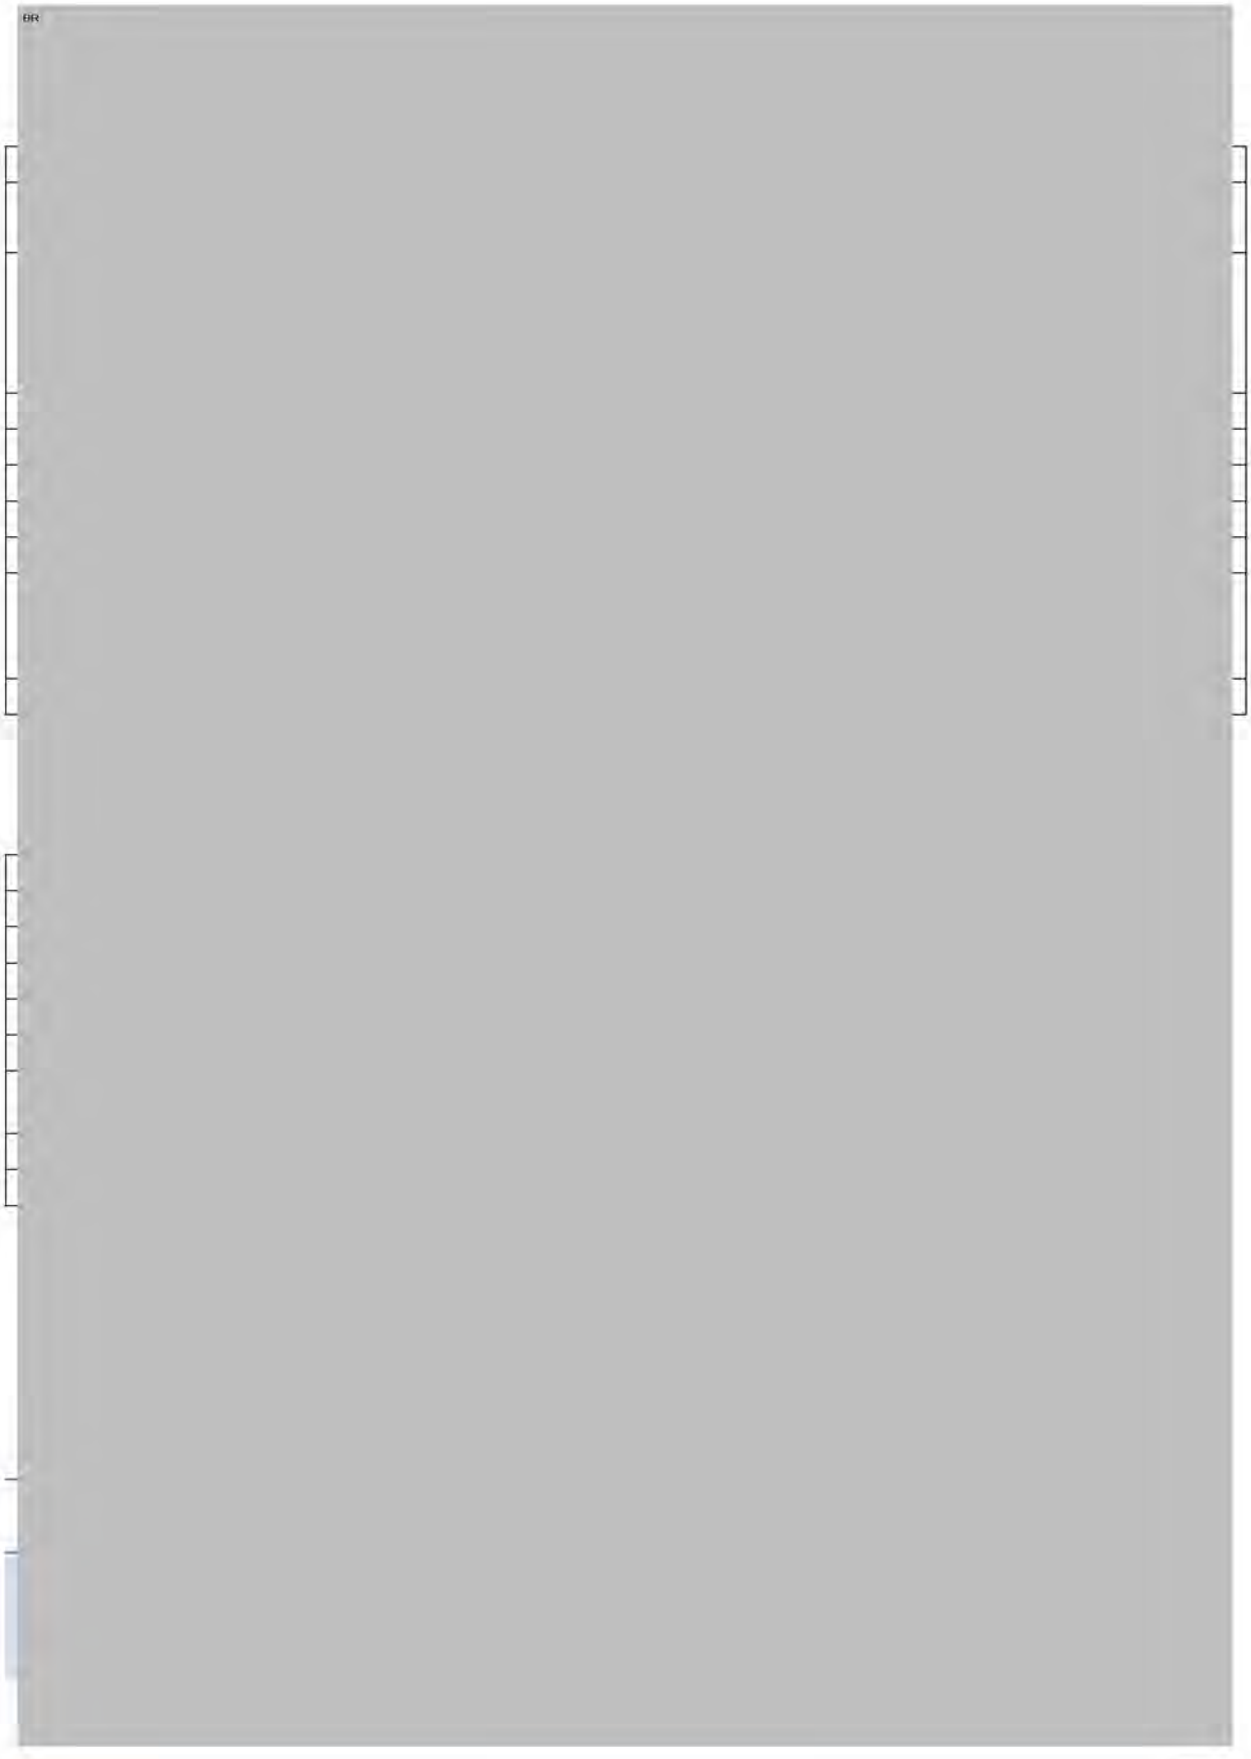

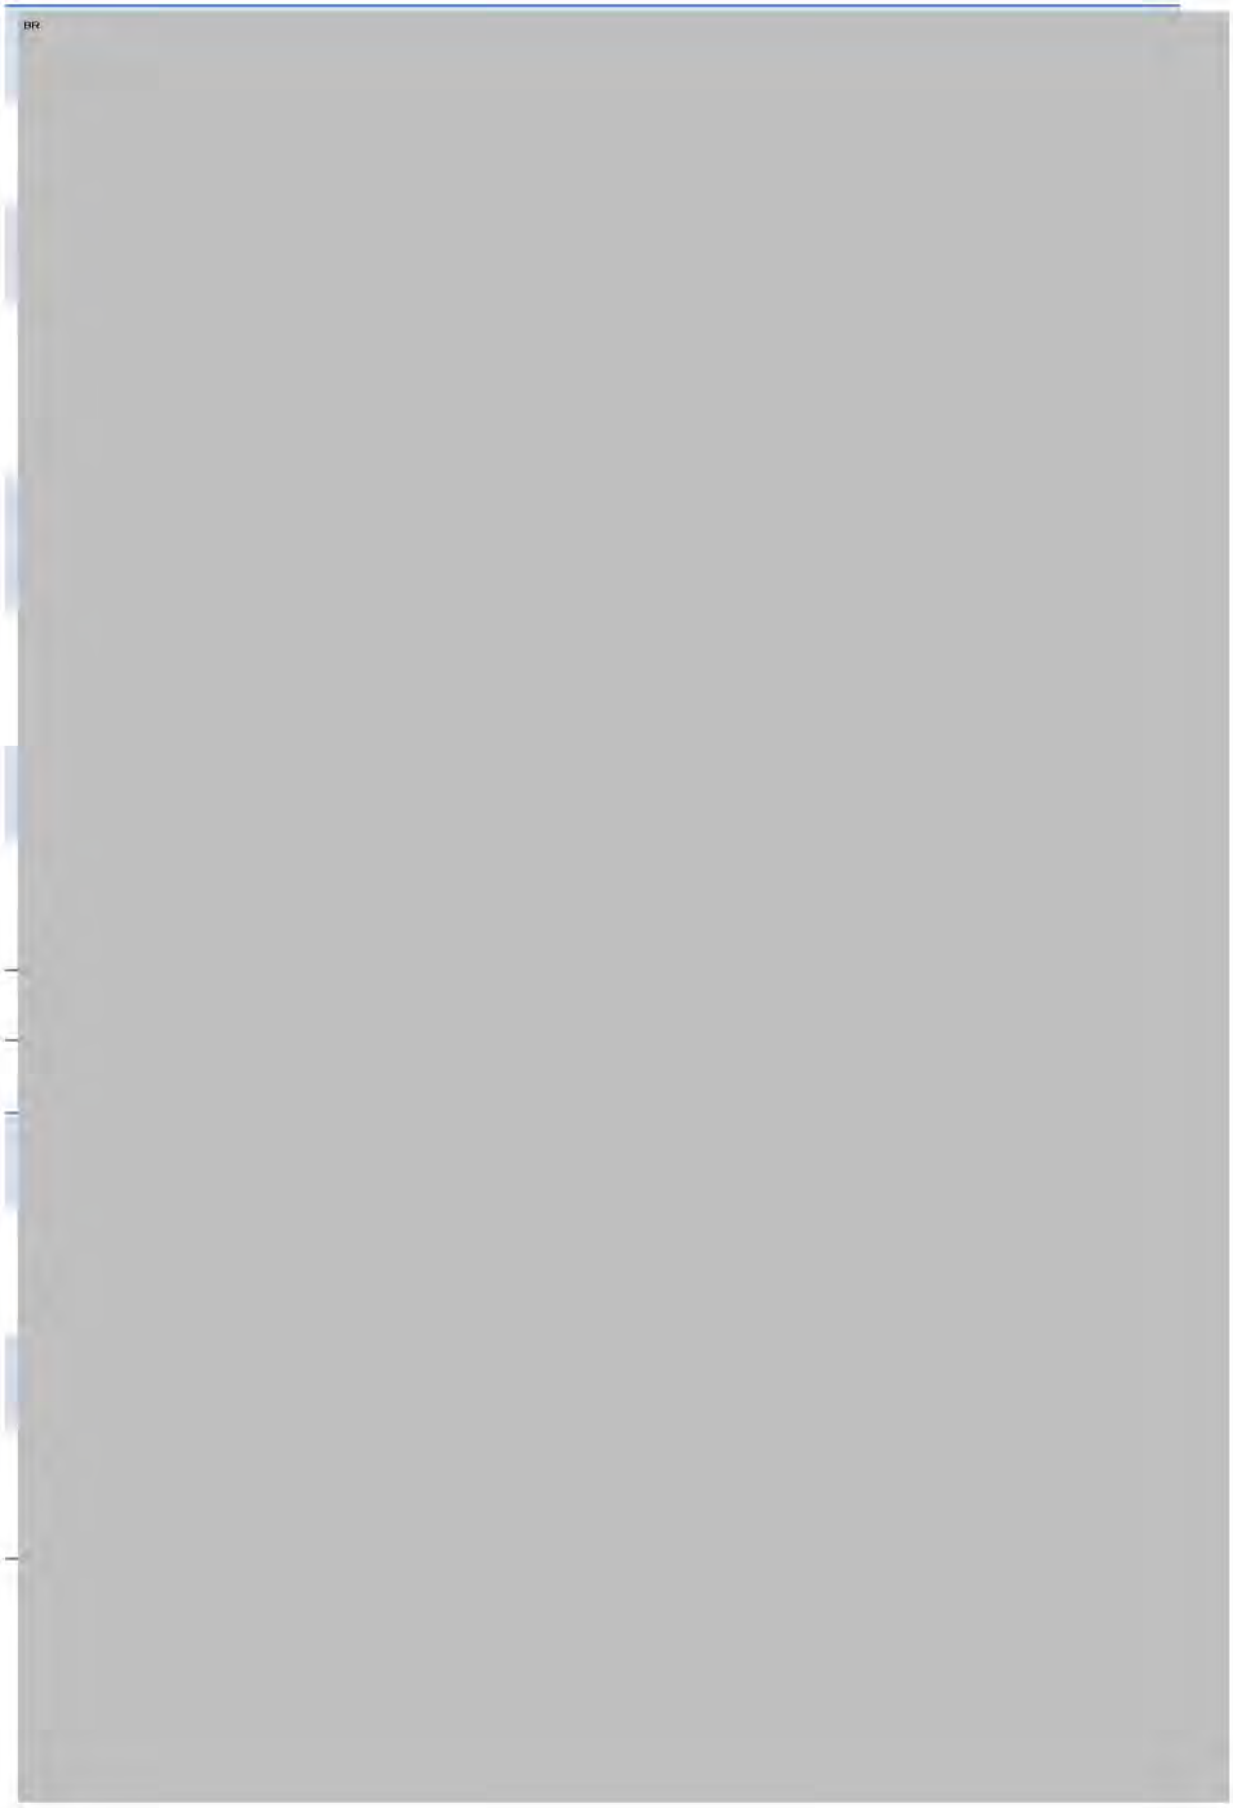
BR

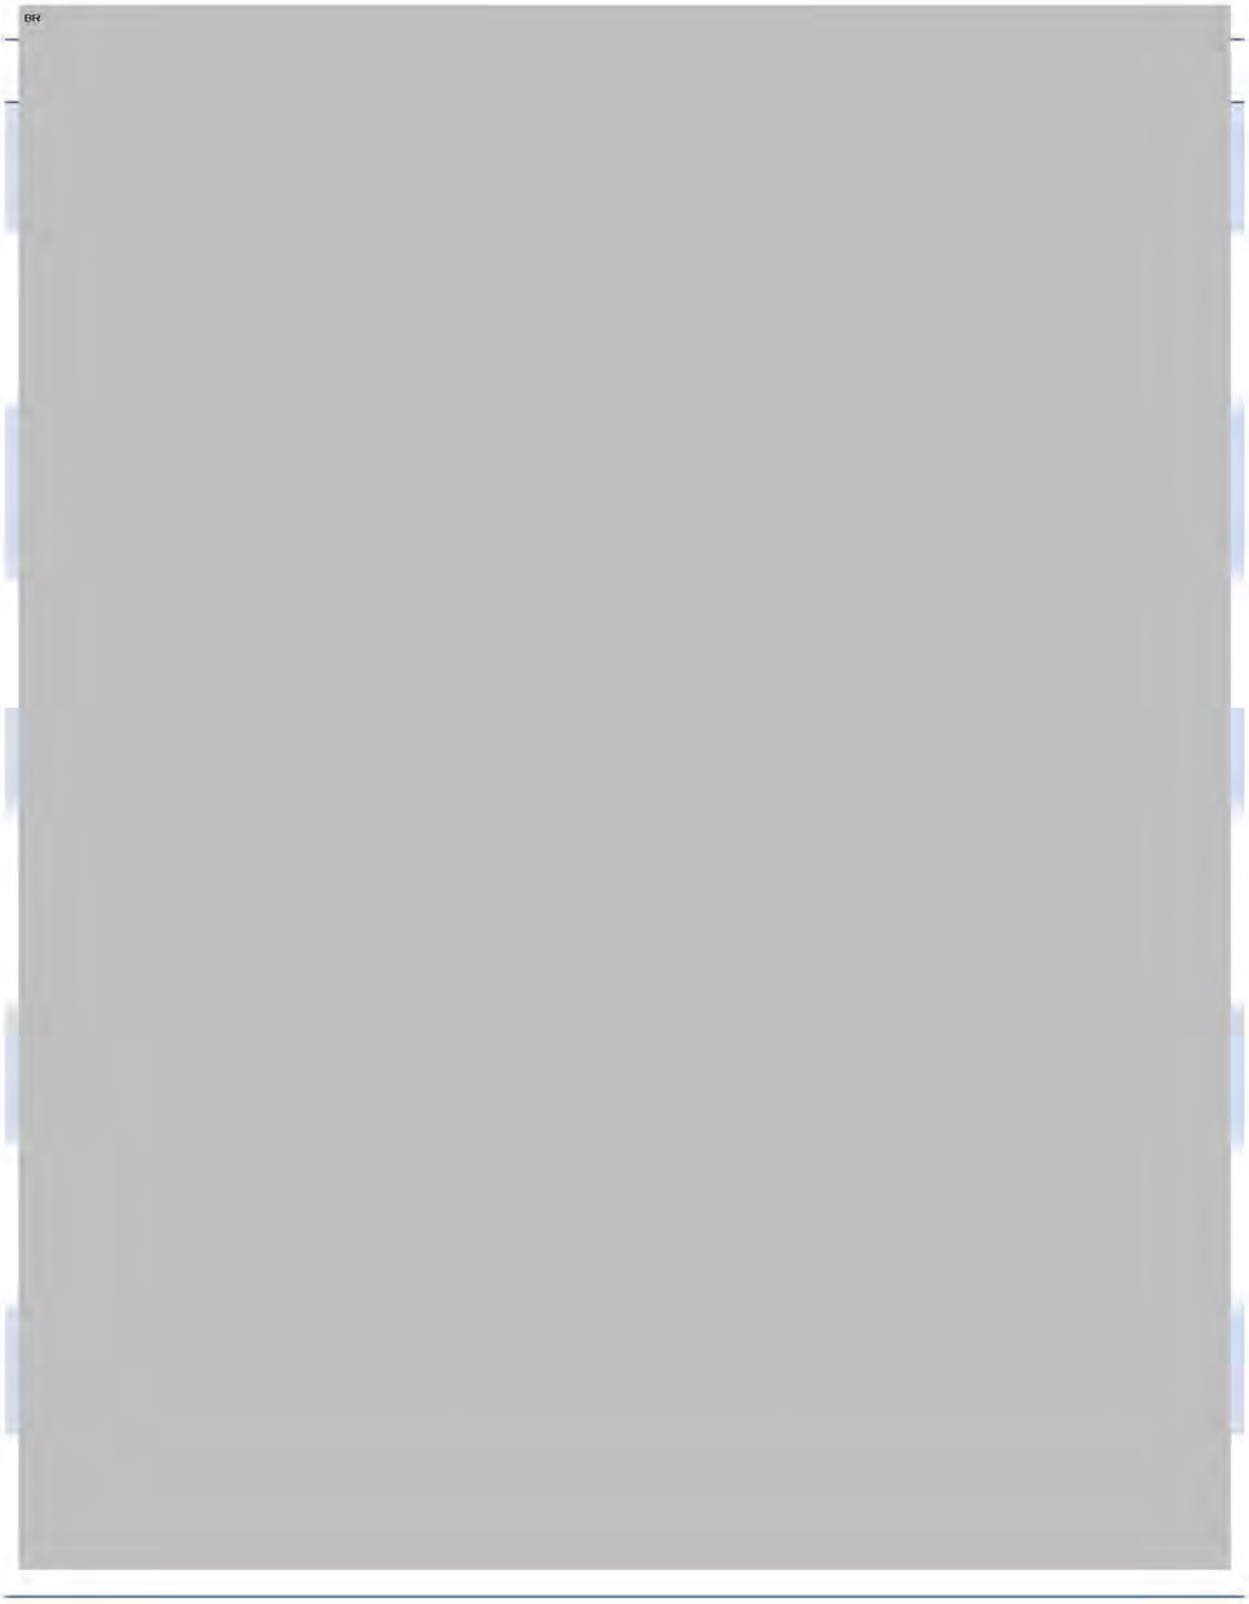
BR

BR

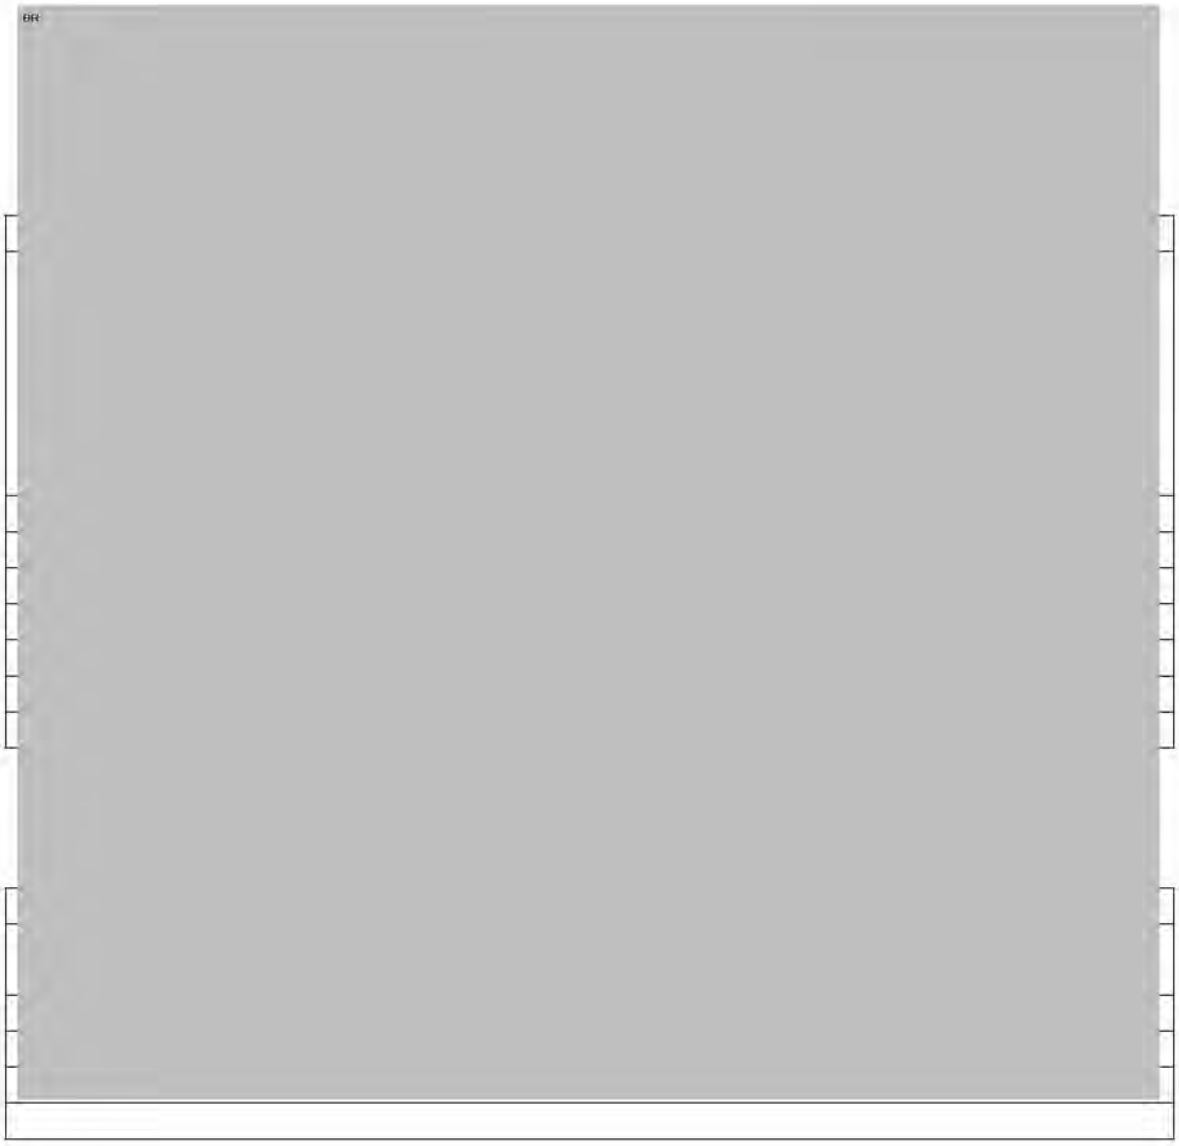

## 5.6 Informatiebeheer

### 5.6.1 Afgelopen kwartaal

| |
|---|
| [redacted] |
| **Overige / extra verrichte werkzaamheden** |
| De raadsvragen van de Partij voor de Dieren (11 jan) aangaande de bomenkap voor de tweede watertoevoer nabij Nieuw Vredenoord zijn door het College beantwoord (21 feb). |
| [redacted] |

## 5.7 Organisatie

### 5.7.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Geen bijzonderheden. | Geen bijzonderheden. |
| | |
| **Overige / extra verrichte werkzaamheden** | |
| 5.1.2e (secretaresse) heeft de projectorganisatie verlaten. Haar werkzaamheden zijn door 5.1.2e overgenomen.<br>BR (BR boorproces) heeft de projectorganisatie verlaten. Het grootste deel van zijn werkzaamheden is met het afronden van het boorproces vervallen. De resterende werkzaamheden zijn door bestaande teamleden overgenomen.<br>5.1.2e (adviseur contractzaken) heeft de projectorganisatie verlaten. Zijn werkzaamheden zijn door 5.1.2e overgenomen. | |
| | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen. | Geen. |
| | |

### 5.7.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Geen bijzonderheden. |
| |
| **Besluiten** |
| Geen. |
| |

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 31 MRT 2019 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 17-apr-20 | 23 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie vertraagd. |
| BR | | | | | |

*

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

Docnr22

5.1.2.e

BR

Docnr22

Docnr22



Docnr23

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 2e kwartaal 2019

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 17 juli 2019**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 1.0**

Docnr23

Docnr23



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 2e kwartaal 2019
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004511

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>5 juli 2019 | Versie 0.1<br>15 juli 2019 | Versie 1.0<br>17 juli 2019 | Versie 1.0<br>6 augustus 2019 | Versie 1.0<br>16 september 2019 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr23



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 9

*2.1 Omgevingsmanagement* *9*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 9
2.1.2 Komende kwartaal 10

*2.2 Planologie en Vergunningen* *11*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 11
2.2.2 Komende kwartaal 12

*2.3 Verwervingen* *13*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 13
2.3.2 Komende kwartaal 13

*2.4 Overeenkomsten* *14*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 14
2.4.2 Komende kwartaal 14

*2.5 Communicatie* *15*
2.5.1 Afgelopen kwartaal 15
2.5.2 Komende kwartaal 15
2.5.3 Diversen 16

3 Projectvoortgang 17

*3.1 Aanbesteden en contracteren* *17*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 17
3.1.2 Komende kwartaal 17

*3.2 Vormgeving* *18*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 18
3.2.2 Komende kwartaal 19

*3.3 Monitoring* *20*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 20
3.3.2 Komende kwartaal 20

*3.4 Inpassing Binckhorst* *21*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 21
3.4.2 Komende kwartaal 21

*3.5 Inpassing Vlietzone* *22*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 22
3.5.2 Komende kwartaal 22

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* *23*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 23
3.6.2 Komende kwartaal 23

*3.7 Boortunnel en toeritten* *24*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 24
3.7.2 Komende kwartaal 25

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *26*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 26

Docnr23




3.8.2 Komende kwartaal 26

*3.9 Installaties* *28*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 28
3.9.2 Komende kwartaal 29

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *30*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 30
3.10.2 Komende kwartaal 30

*3.11 Bediencentrale* *31*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 31
3.11.2 Komende kwartaal 32

*3.12 Uitvoeringskwaliteit* *33*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 33
3.12.2 Komende kwartaal 33

*3.13 Contractmanagement* *34*
3.13.1 Afgelopen kwartaal 34
3.13.2 Komende kwartaal 34

4 Overdracht en openstelling 35

*4.1 Tunnelveiligheid* *35*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 35
4.1.2 Komende kwartaal 35

*4.2 Overdracht aan beheerders* *36*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 36
4.2.2 Komende kwartaal 36

*4.3 Beheer en onderhoud* *37*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 37
4.3.2 Komende kwartaal 37

5 Projectbeheersing 38

*5.1 Scope* *38*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 38
5.1.2 Komende kwartaal 38

*5.2 Financien* *39*
5.2.1 Kostenstructuur 39
5.2.2 Dekkingen 40

*5.3 Planning* *42*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 42
5.3.2 Komende kwartaal 42

*5.4 Risico's* *44*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 44
5.4.2 Komende kwartaal 44
5.4.3 Financiële toprisico's 44
5.4.4 Toprisico's planning 45

*5.5 Interne kwaliteit* *47*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 47
5.5.2 Komende kwartaal 47

Docnr23



*5.6 Informatiebeheer* *48*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 48
5.6.2 Komende kwartaal 48
5.6.3 Kennisdeling 49
*5.7 Organisatie* *50*
5.7.1 Afgelopen kwartaal 50
5.7.2 Komende kwartaal 50

**6 Bijlage: Planningsmijlpalen** **51**

**7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan** **52**

**8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer** **54**

# 1 Managementsamenvatting

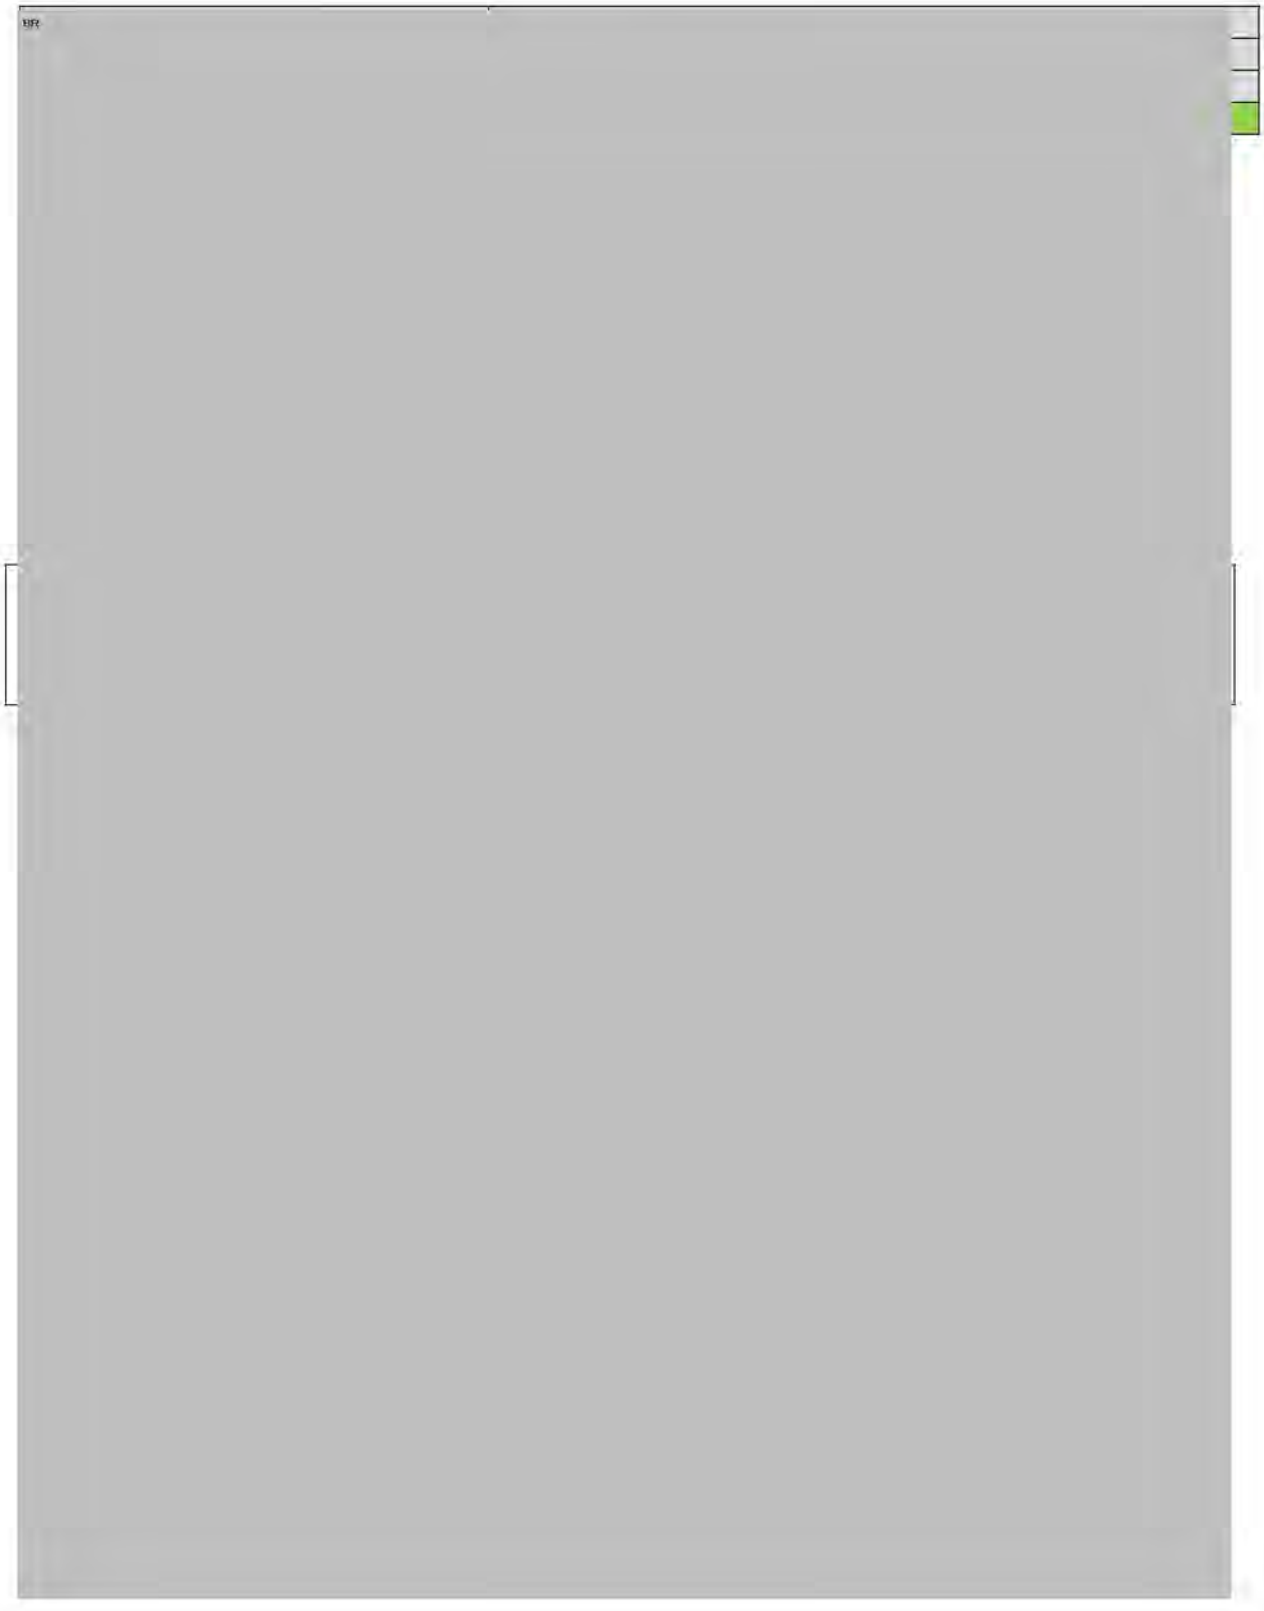

BR

## 4. TERUGBLIK AFGELOPEN KWARTAAL

Afgelopen kwartaal is er onder andere gewerkt aan:

BR

- 9 mei heeft er een 2-minutendebat plaatsgevonden tussen weth. Revis en de Partij voor de Dieren n.a.v. de beantwoording van haar raadsvragen over bomenkap tweede watertoevoer;

BR

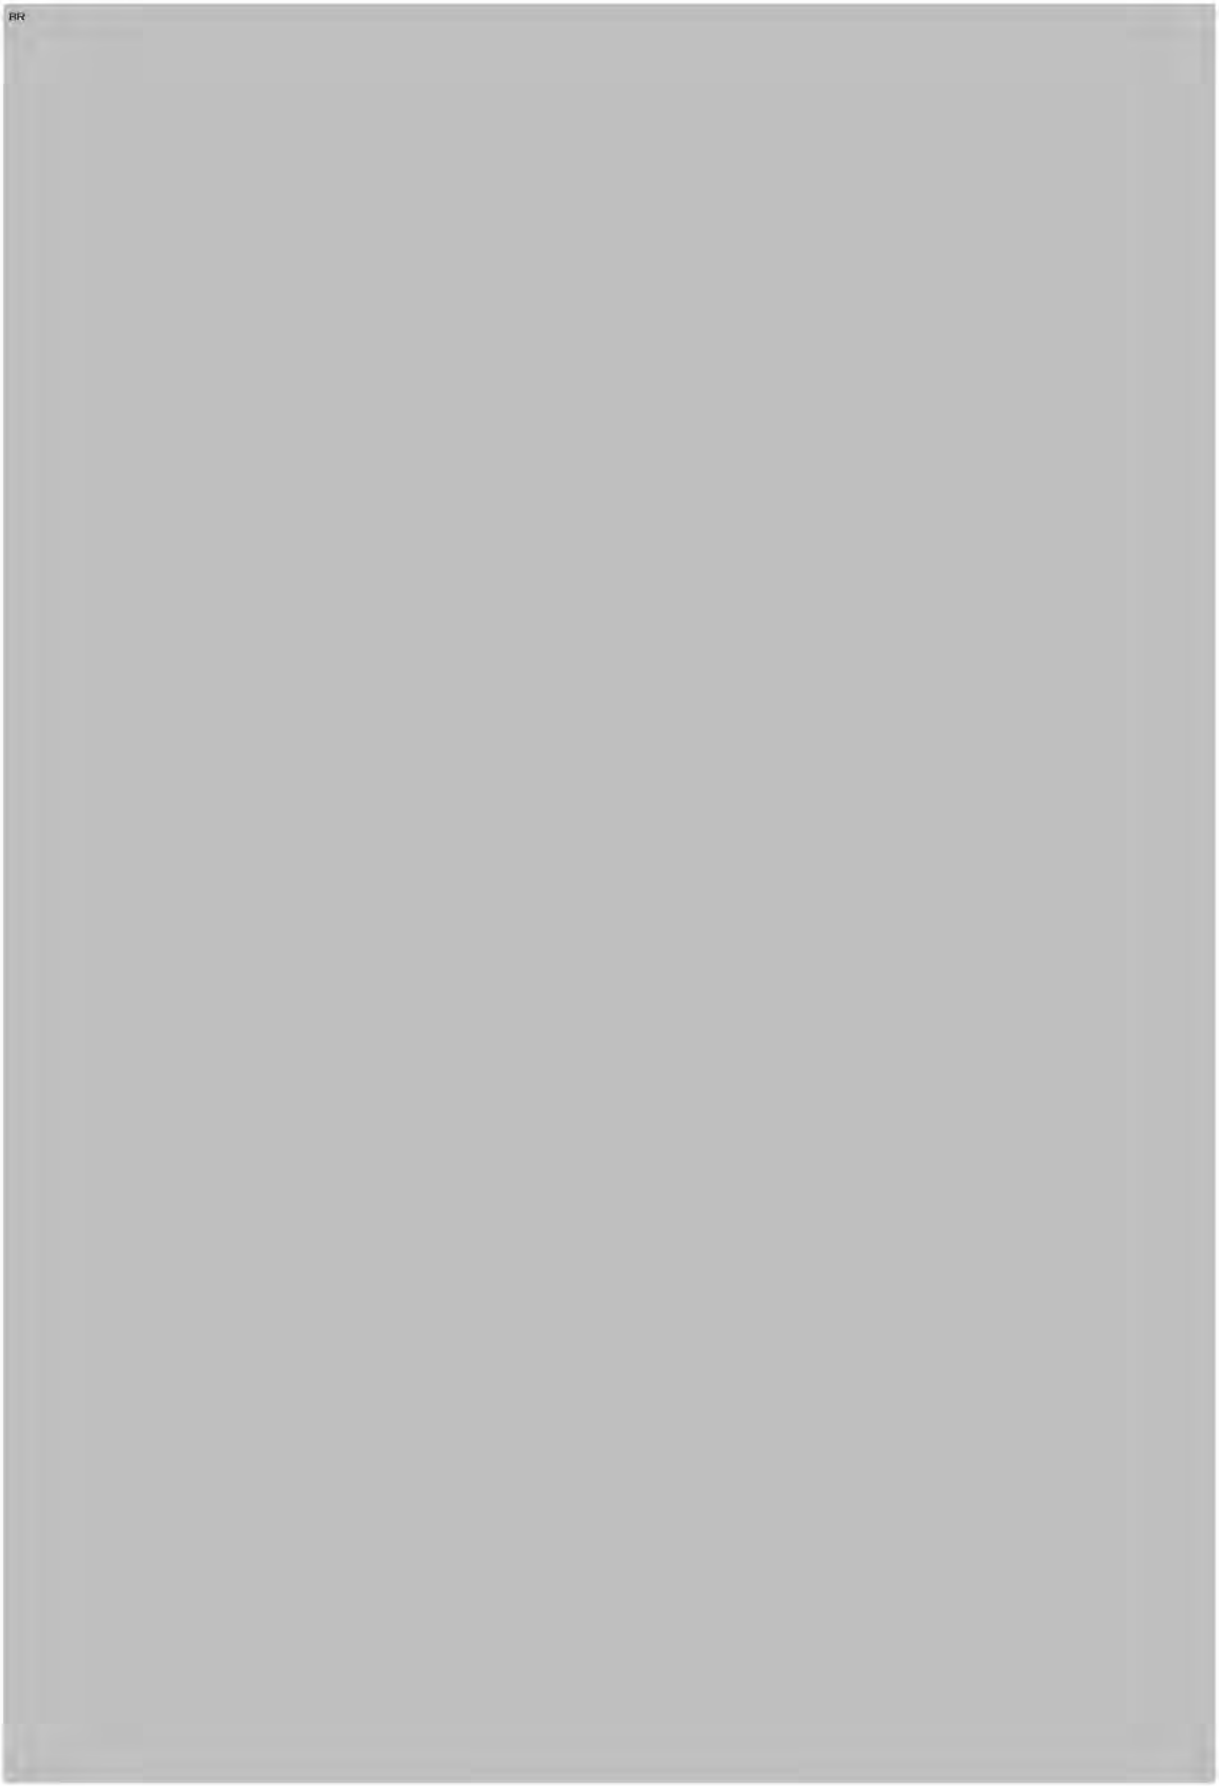

- Realisatiewerkzaamheden volgende fase van het Molenvlietpark gaan starten, bijvoorbeeld ter plaatse van het voormalige tijdelijke parkeerterrein van Drievliet.

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Diverse stakeholders spreken. | Diverse stakeholders gesproken: deels in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomsten of over het nader uitgewerkte ontwerp van projectonderdelen zoals het Molenvlietpark, de watertoevoer, tijdelijke en definitieve situatie voor Drievliet en de bediencentrale van Den Haag. |
| BR | |
| | |

| Overige / extra verrichte werkzaamheden |
|---|
| Op 9 mei heeft het 2 minuten debat plaatsgevonden dat de Partij voor de Dieren had aangevraagd n.a.v. de beantwoording van raadsvragen gesteld over de aangevraagde kapvergunning i.v.m. tweede watertoevoer. |
| BR |

Docnr23

## 2.2 Planologie en Vergunningen

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| In overleg met CRB en andere betrokkenen inzicht houden op het vergunningenproces. | Periodiek overleg gevoerd met zowel CRB, HHD als DSO Vergunningen & Toezicht. CRB heeft diverse vergunningen aangevraagd en verkregen. De meeste zien op de aanleg van het Molenvlietpark.<br>Op 26 juni 2019 is het ontwerp van de definitieve hellingbaan voor de loopbrug van Drievliet behandeld in ACOR en vooroverleg-Welstand. Tijdens beide behandelingen is aangegeven dat het ontwerp niet acceptabel is o.a. omdat een integraal beeld met de toekomstige hal door Drievliet ontbreekt.<br>De vergunning voor de tijdelijke hellingbaan voor de loopbrug van Drievliet is verleend voor een periode van drie jaar. |
| [redacted] | |
| Speciaal extra burenoverleg omgeving tweede toevoer. | De aan de vertegenwoordiger van VVE Park Hoornwijck aangeboden extra bijeenkomst voor bewoners van Park Hoornwijck (burenoverleg) over de tweede watertoevoer is niet geaccepteerd. Op verzoek heeft projectorganisatie hun vragen per email beantwoord. Er wordt op 16 juli aanstaande een informatiebijeenkomst t.b.v. de tweede toevoer georganiseerd. HHD zal hierbij ook aanwezig zijn. |
| De gemeente Den Haag behandelt de kapvergunning ten behoeve van de aanleg van de tweede watertoevoer. De projectorganisatie heeft een activiteitenplan opgesteld t.b.v. de aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming. Ook zijn er diverse vleermuizenkasten opgehangen. | De procedure loopt nog steeds. N.a.v. het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen van de Provincie Zuid-Holland heeft de ODH om aanvullende informatie gevraagd. Zekerheidshalve wordt ook nader vleermuizenonderzoek uitgevoerd. |
| [redacted] | |

### 2.2.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| BR |
| Besluit afwachten op kapaanvraag en aangevraagde ontheffing Wet natuurbescherming in verband met aanleg tweede watertoevoer. |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |
| |

## 2.3 Verwervingen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Indien inhoudelijke overeenstemming wordt bereikt over de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de tweede toevoer, de koopovereenkomst t.g.v. grondverkoop voor de Jan Thijssenweg 8 te Den Haag, aanpassen en afronden. | In afwachting van samenwerkings-overeenkomst met de grondeigenaar t.b.v. de tweede toevoer. |
| BR | |

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Samenwerkingsovereenkomst afronden met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. | Positieve besprekingen gehad, die ertoe moeten leiden dat de samenwerkingsovereenkomst dit kwartaal wordt afgerond. Partijen hebben op hoofdlijnen overeenstemming. Nadien worden de akten ook afgerond. |
| [redacted] | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Samenwerkingsovereenkomst afronden met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. |
| [redacted] |

## 2.5 Communicatie

### 2.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |

### 2.5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| [redacted] |
| Organisatie informatiebijeenkomst 'tweede toevoer' (i.r.t. de waterberging Molenvlietpark) |
| [redacted] |

BR

# 3 Projectvoortgang

## 3.1 Aanbesteden en contracteren

### 3.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Voorbereiding contractering en aanbesteding Tweede Toevoer. | De risicosessie heeft plaatsgevonden. Het VO is opgesteld. Onderzocht wordt hoe het werk het beste aanbesteed en gecontracteerd kan worden. |
| BR | |

### 3.1.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Voorbereiding contractering en aanbesteding Tweede Toevoer. |
| BR |

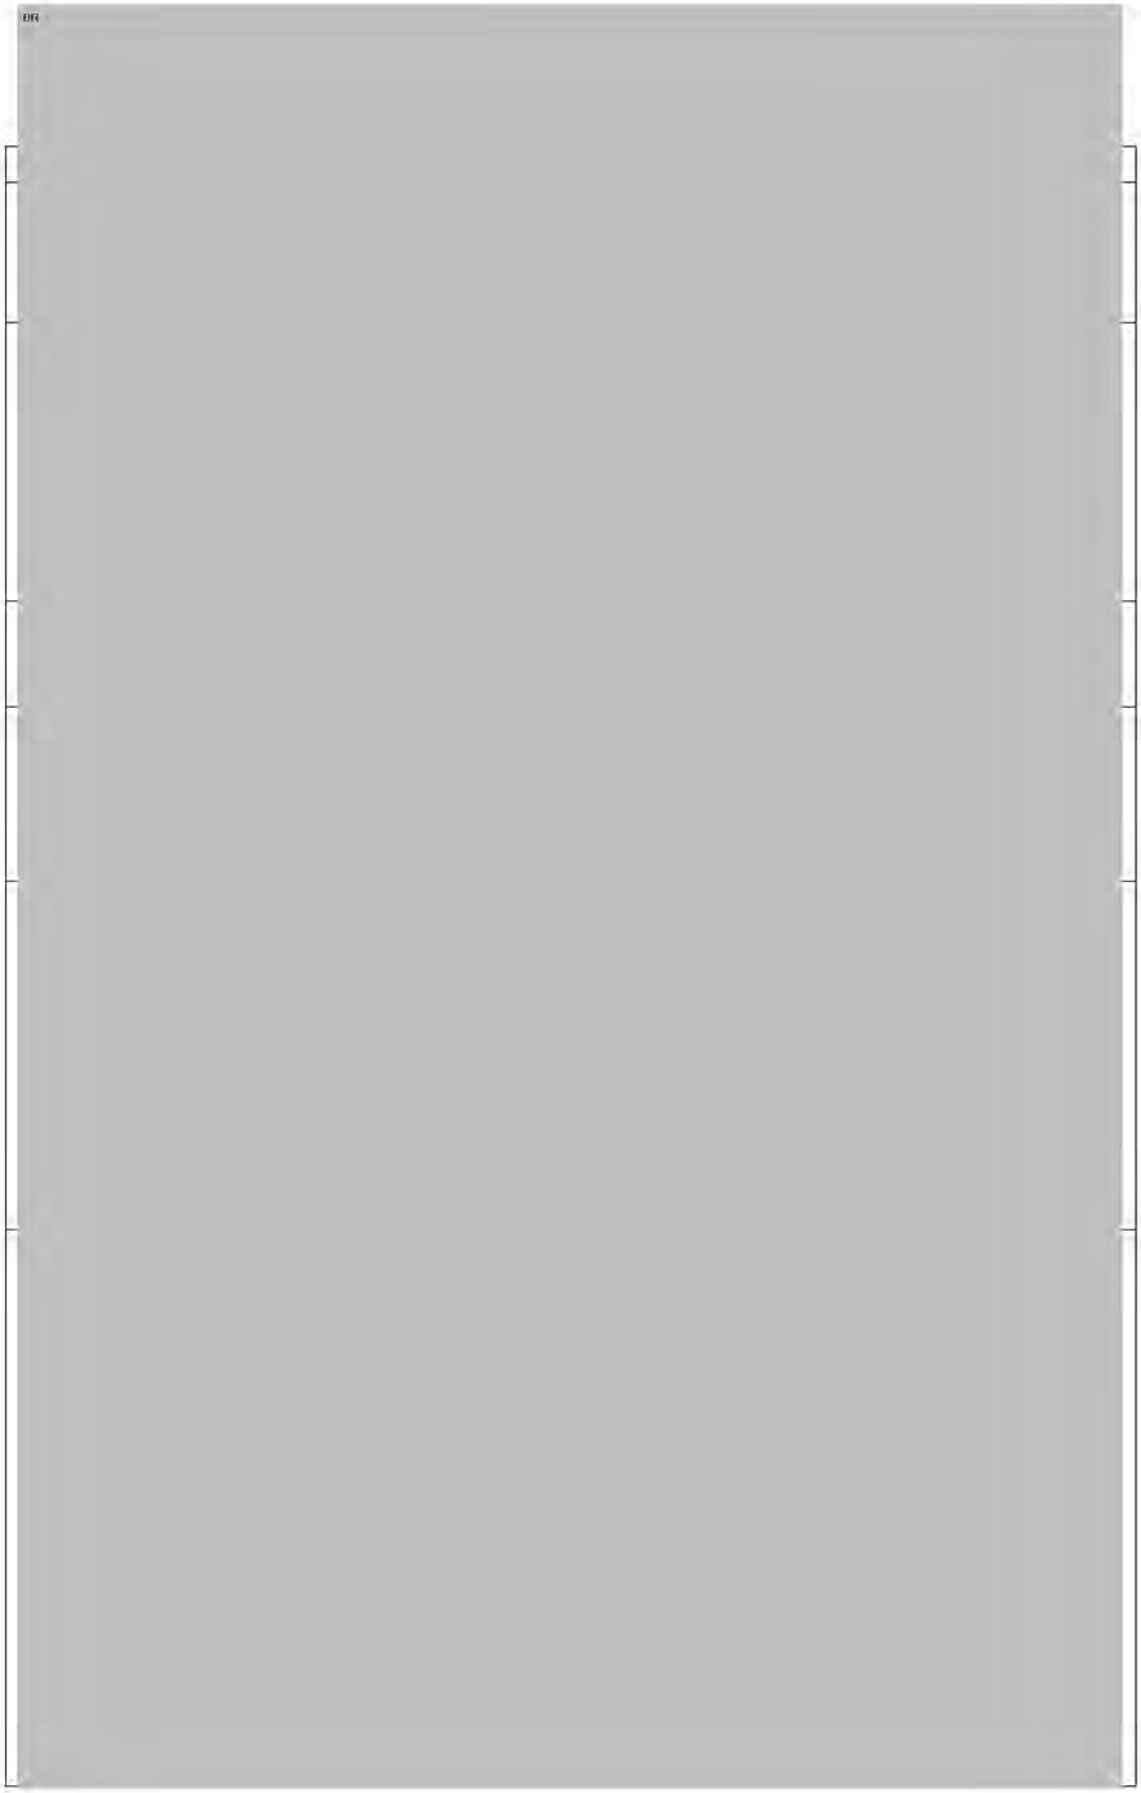

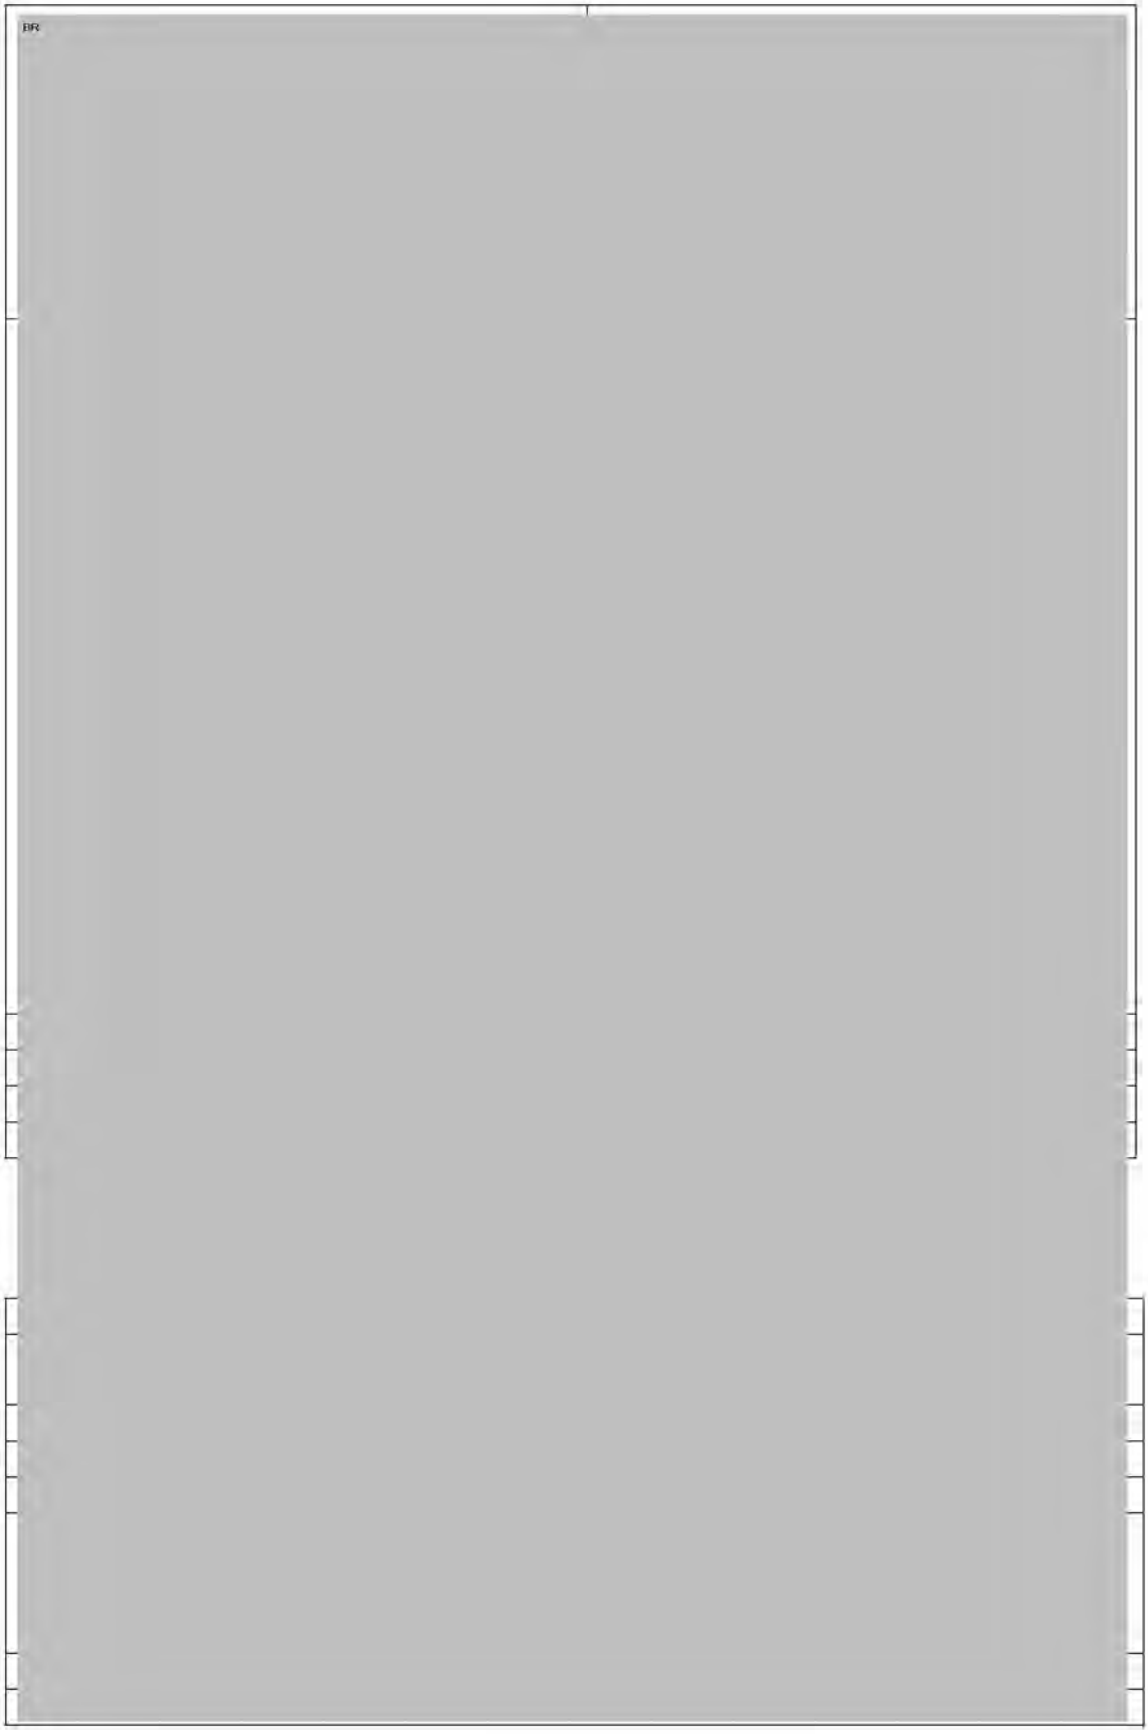

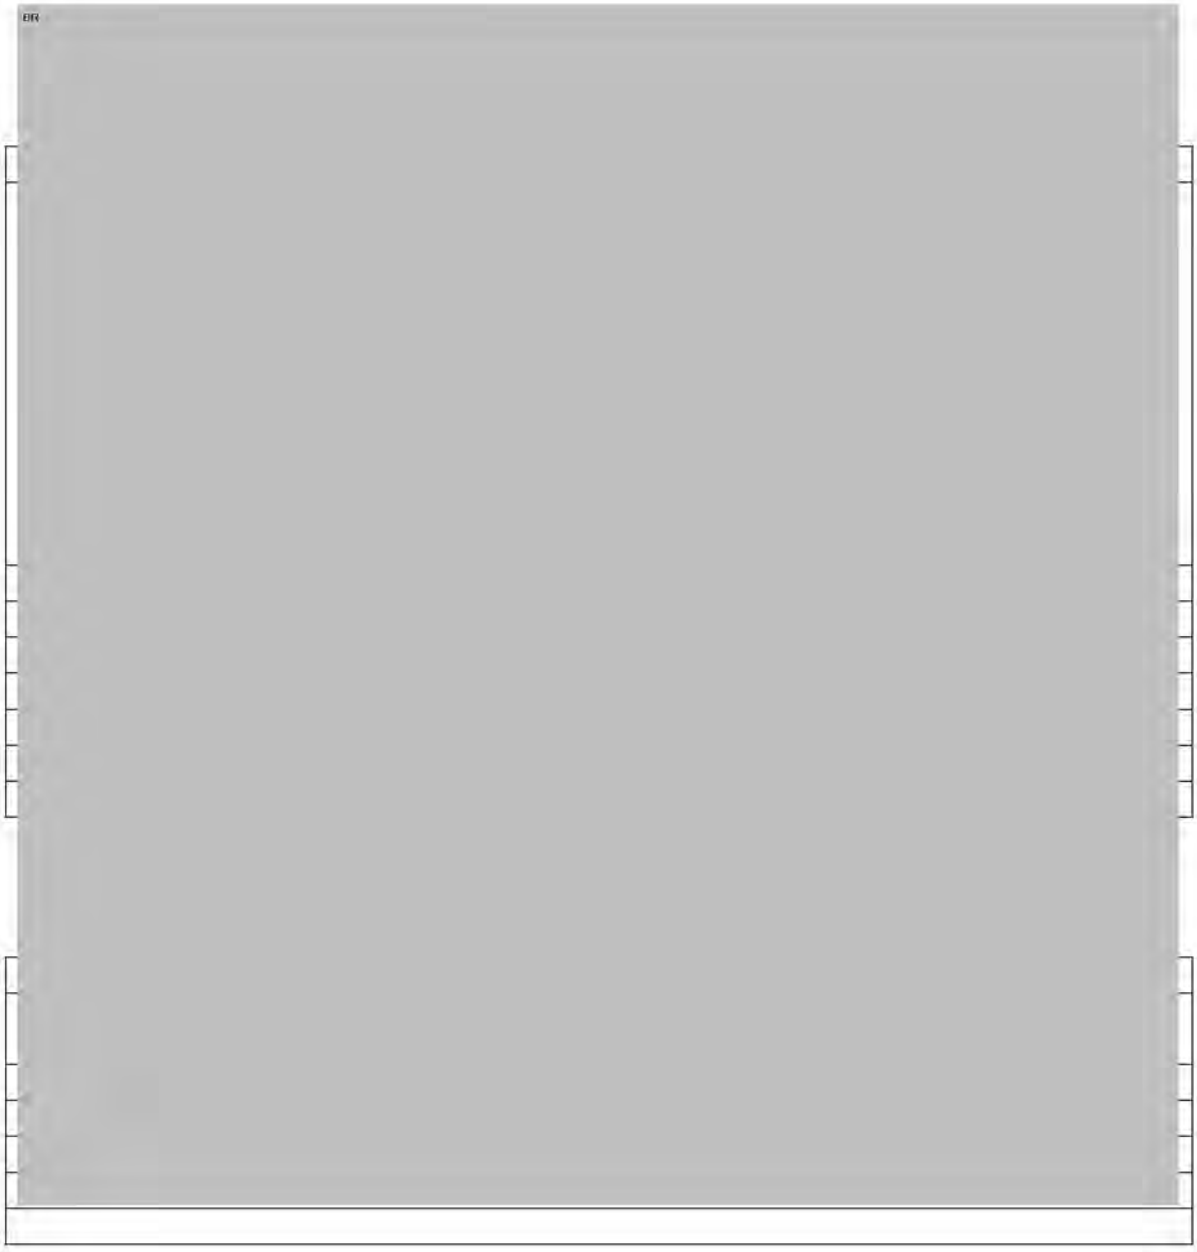

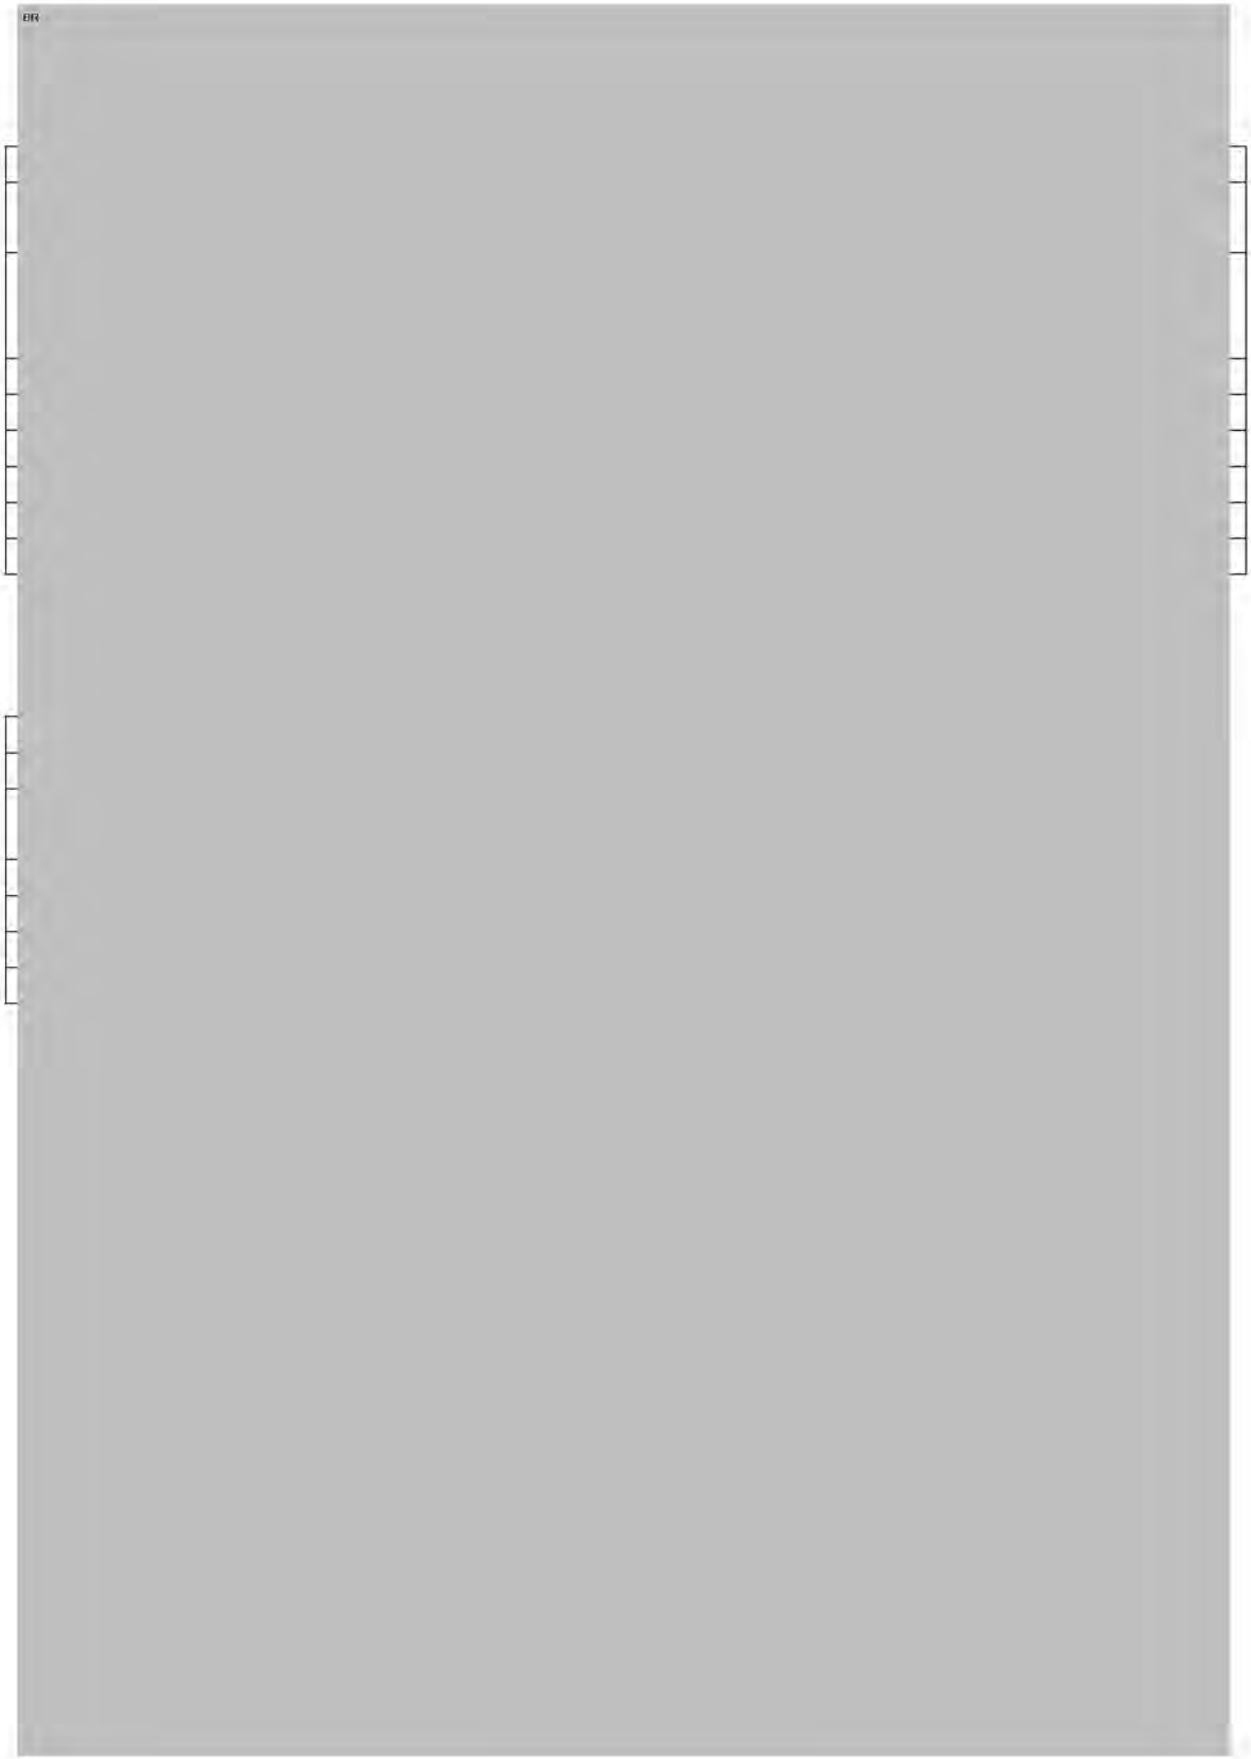

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Opstellen bestek tweede toevoer (indien SOK getekend is). | De werkzaamheden aan het DO en bestek zijn opgestart. |
| BR | |
| Werkzaamheden inrichting Molenvlietpark voortzetten. | Werkzaamheden voortgezet, diverse waterpartijen en eilanden zijn gegraven. |
| Realisatie recreatieve bruggen in Molenvlietpark. | De funderingen zijn, daar waar mogelijk i.v.m. vergunningverlening, aangebracht. |
| BR | |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Geen | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen | Geen |

### 3.5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Werkzaamheden inrichting Molenvlietpark voortzetten. |
| Realisatie recreatieve bruggen in Molenvlietpark. |
| BR |

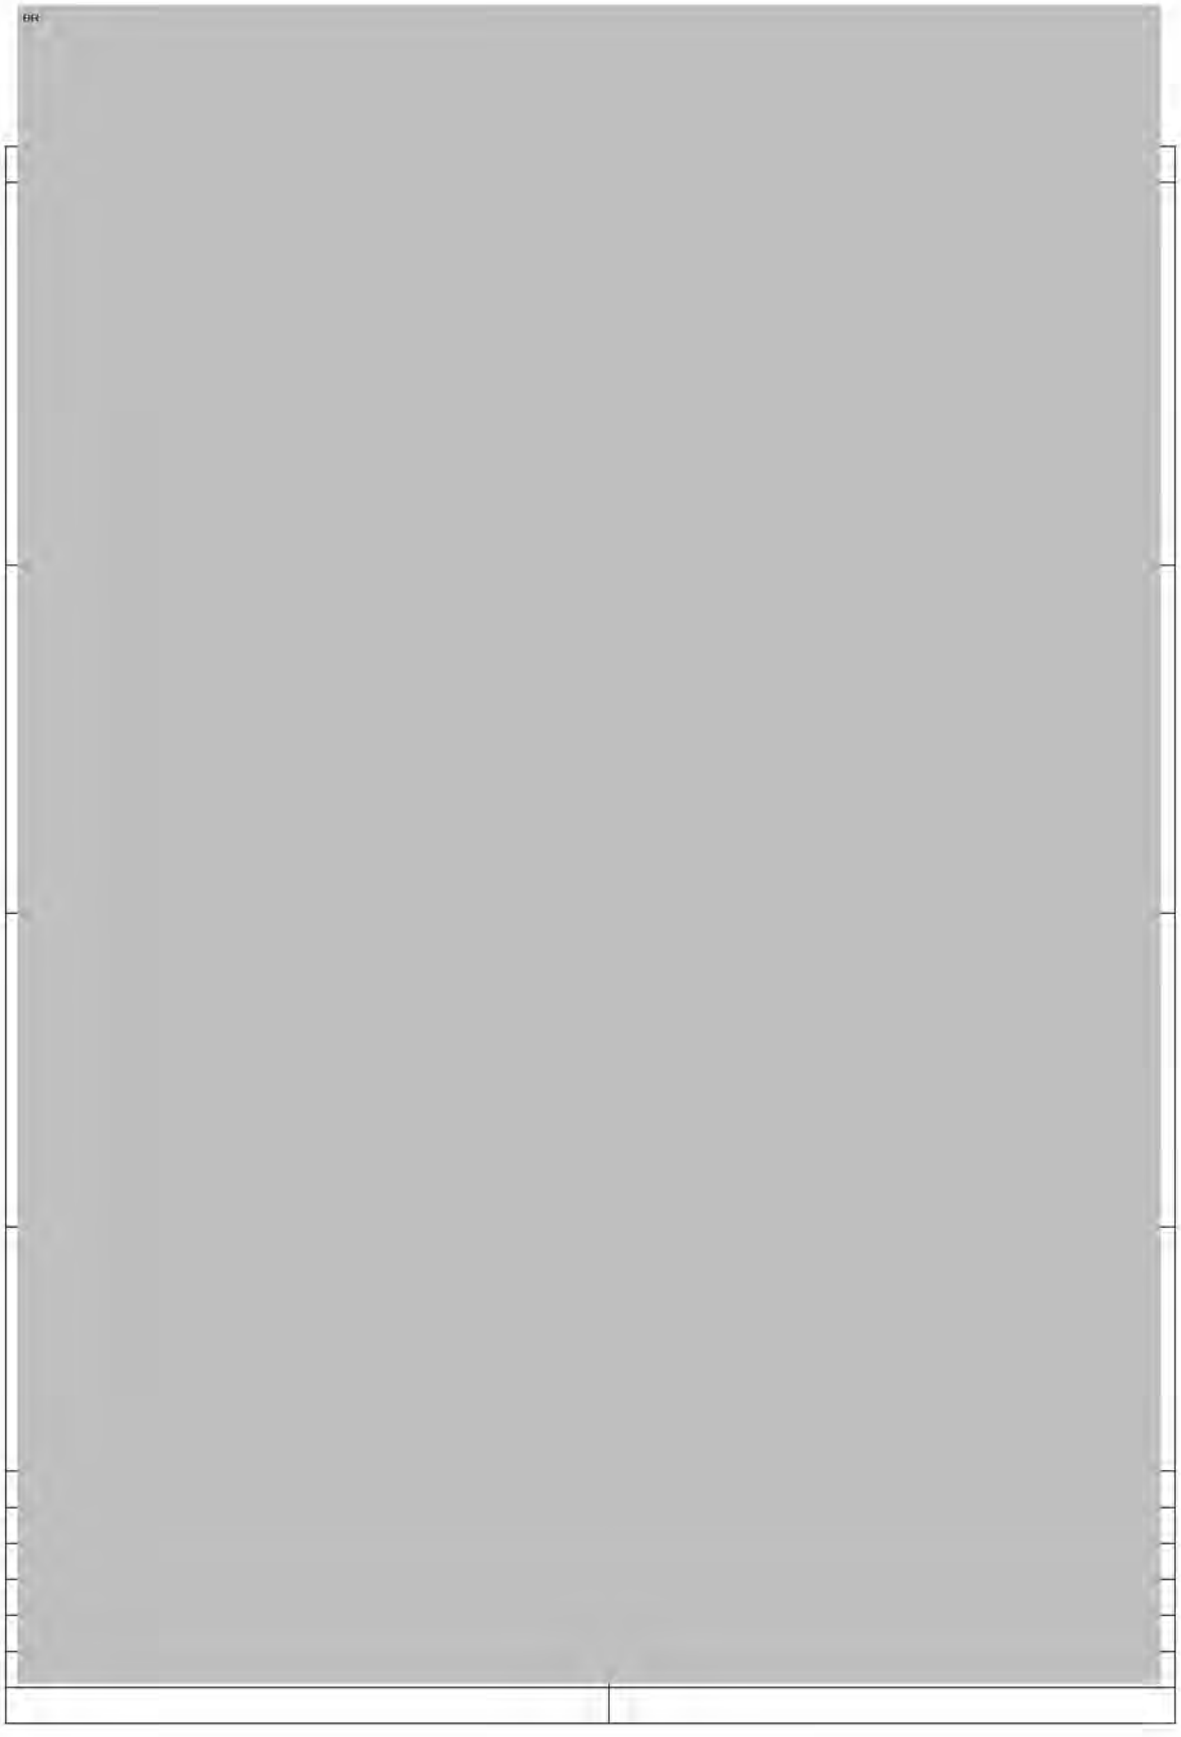

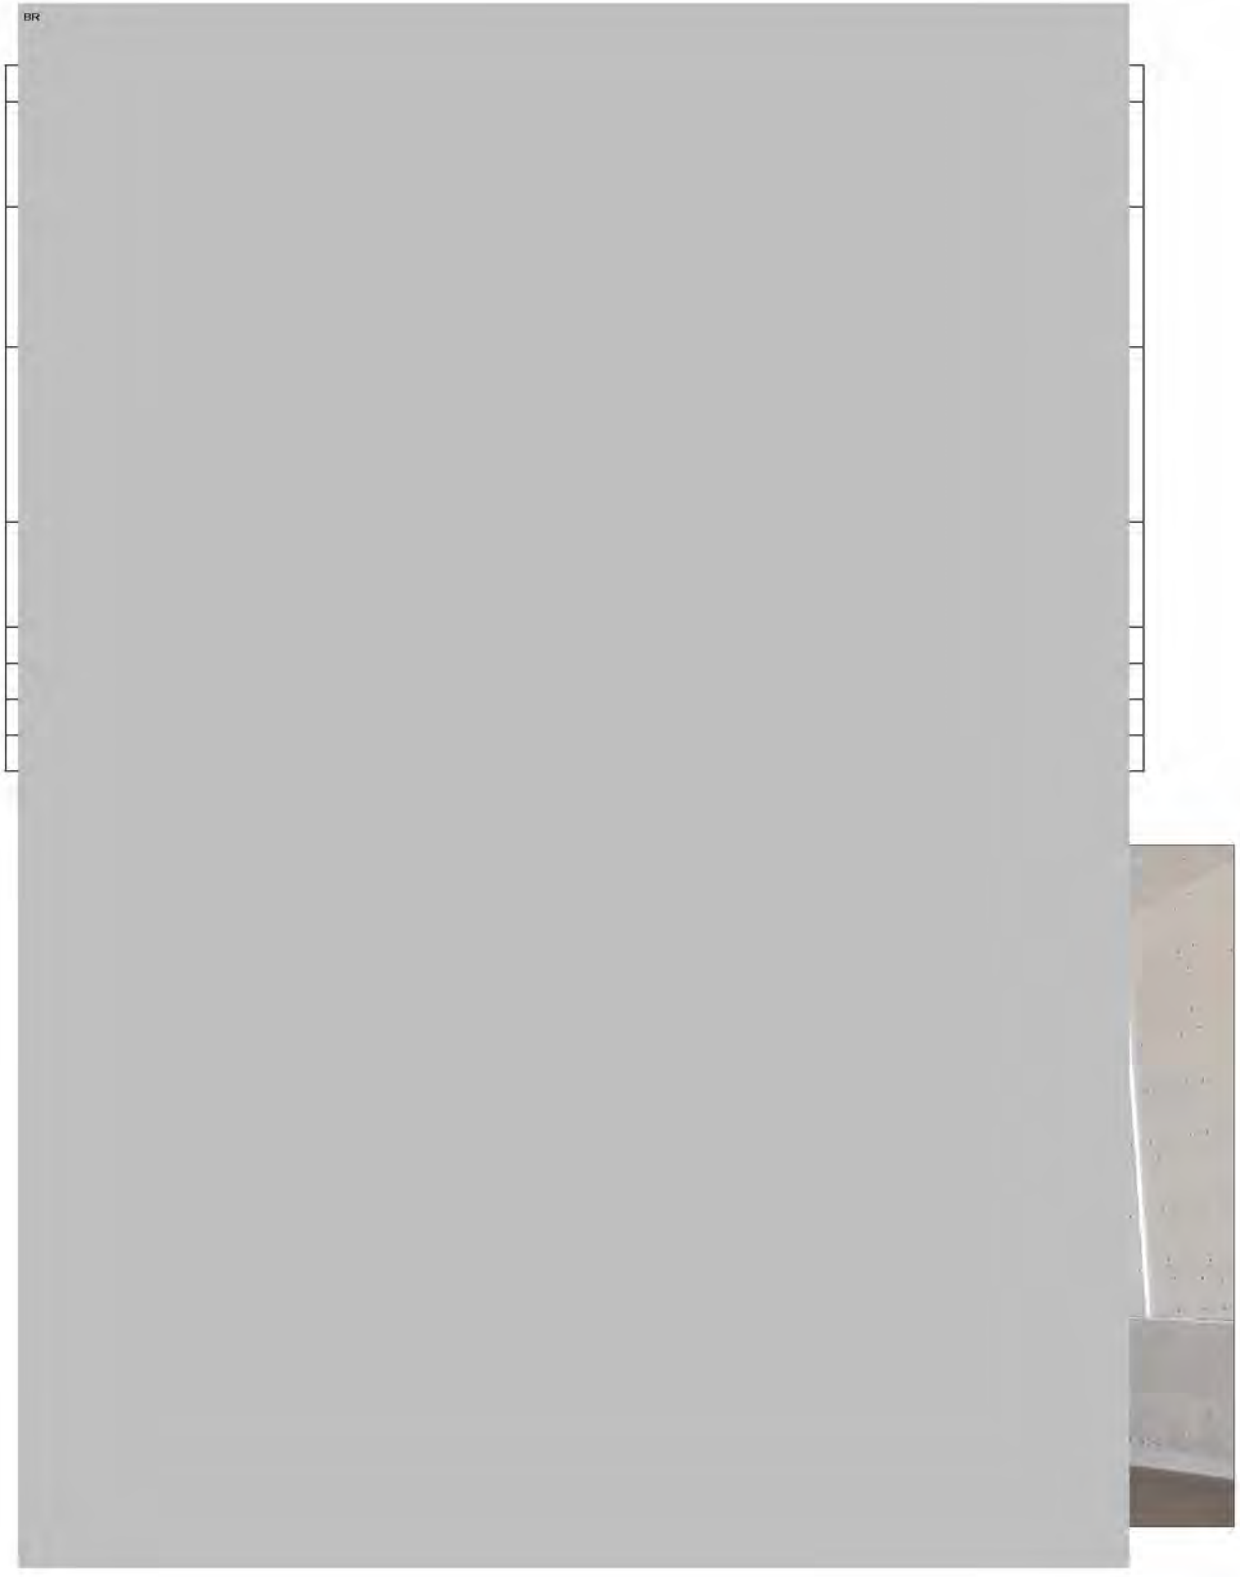
BR

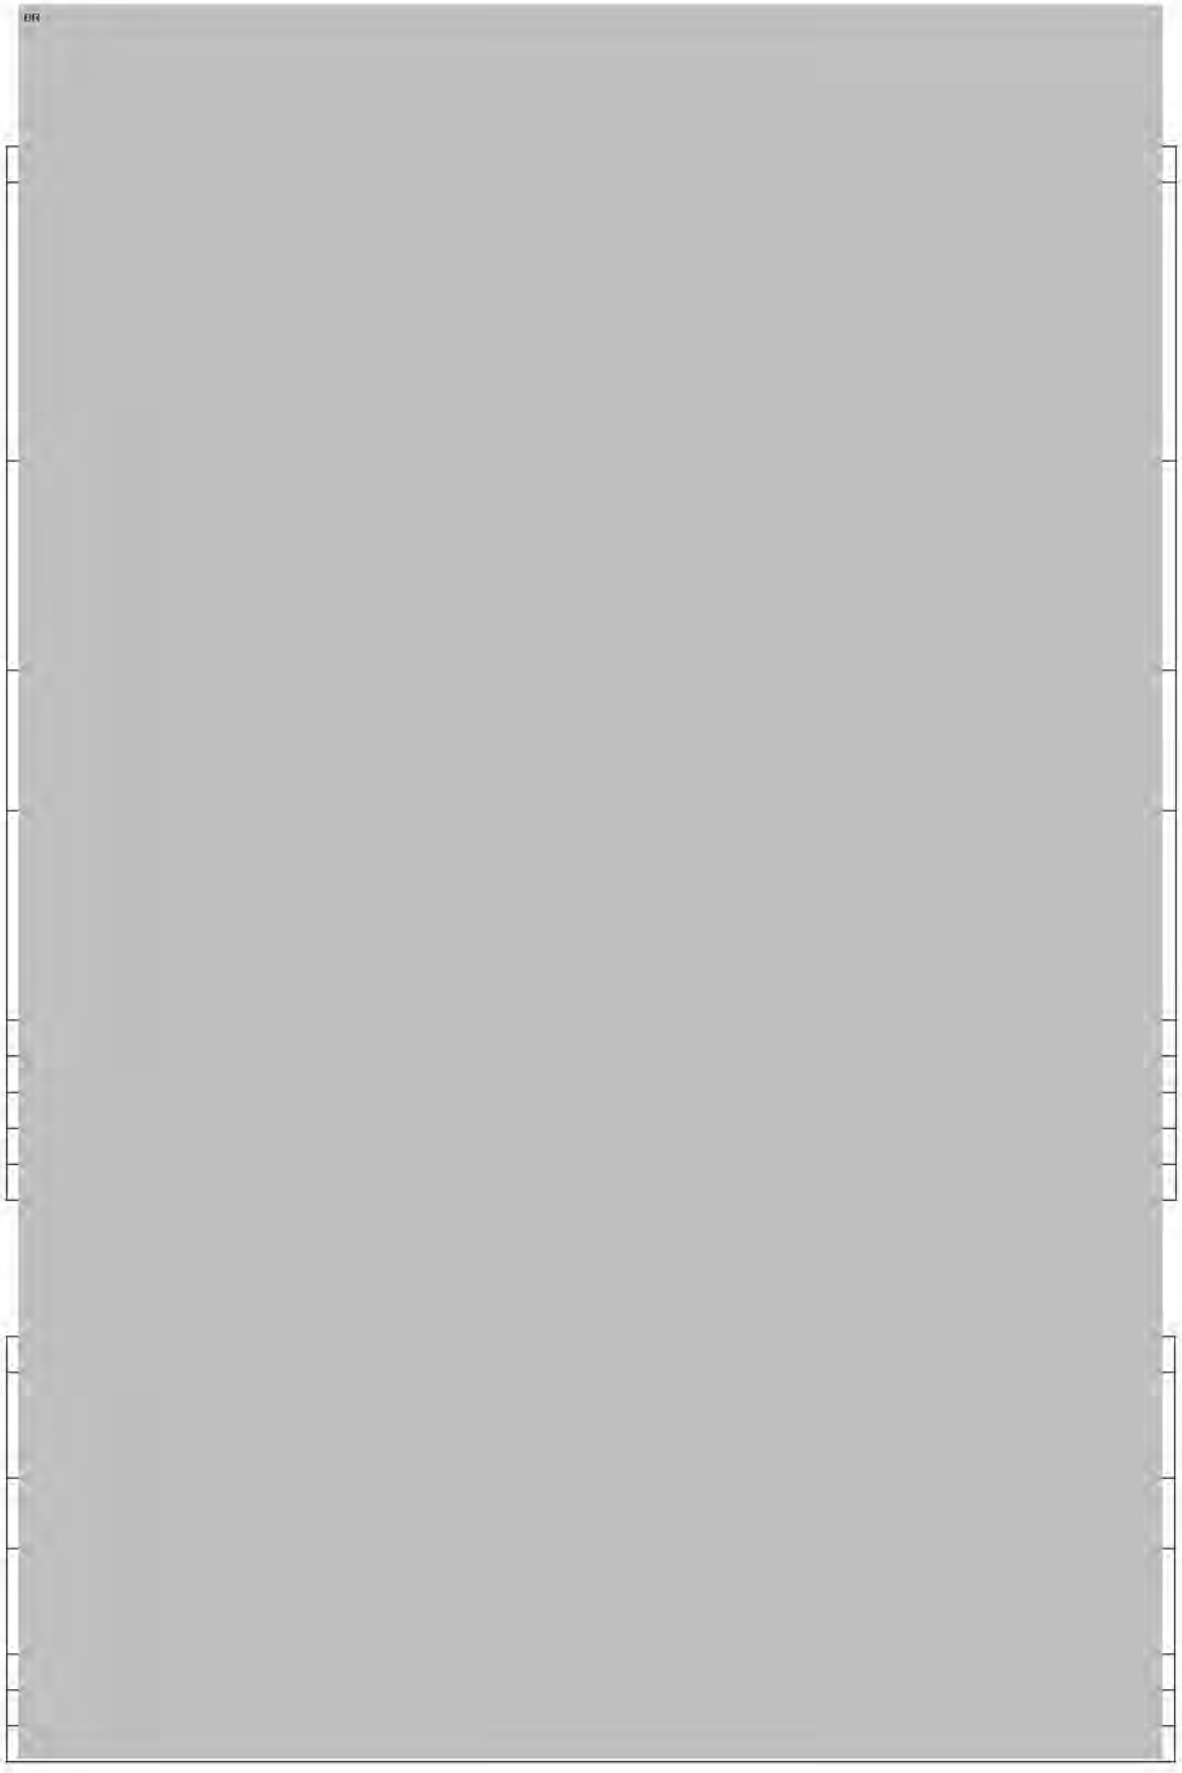

BR

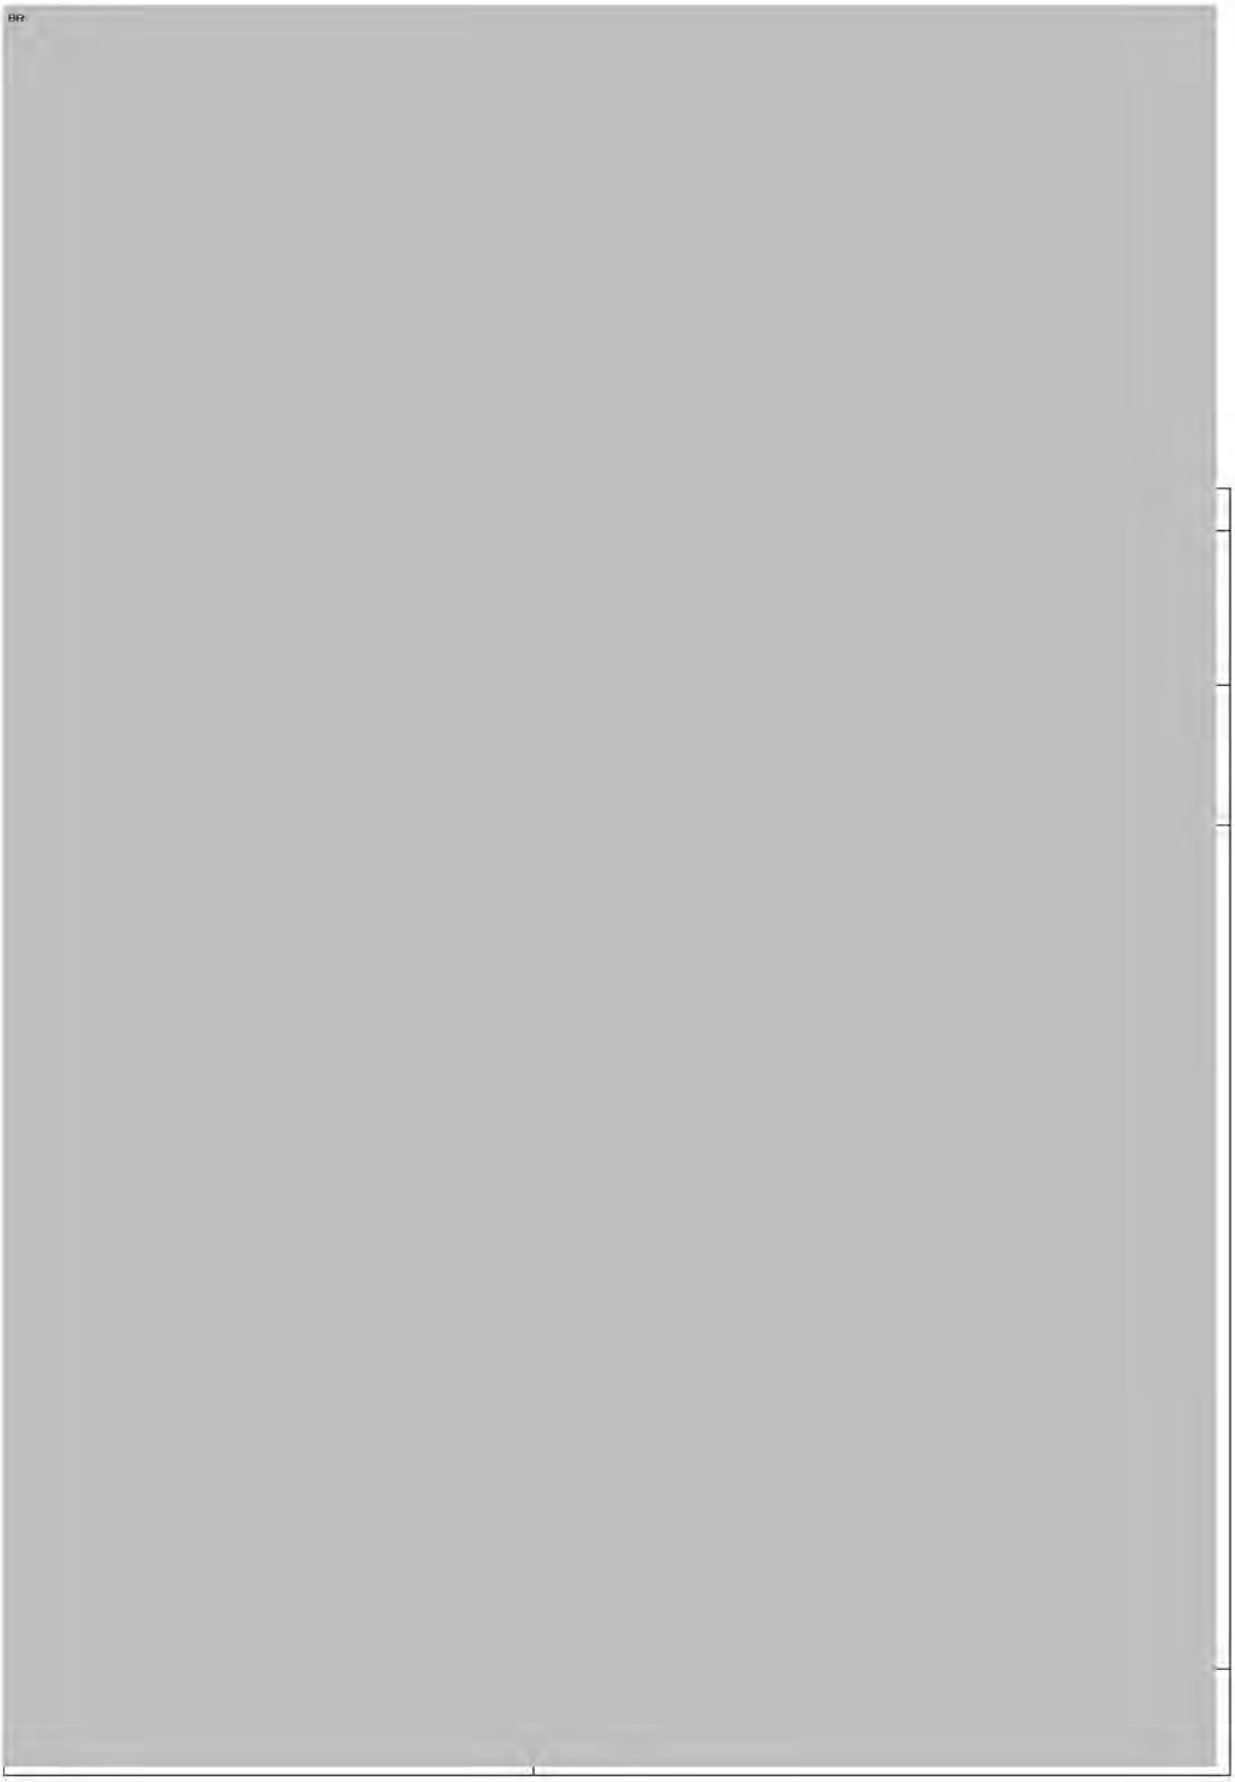

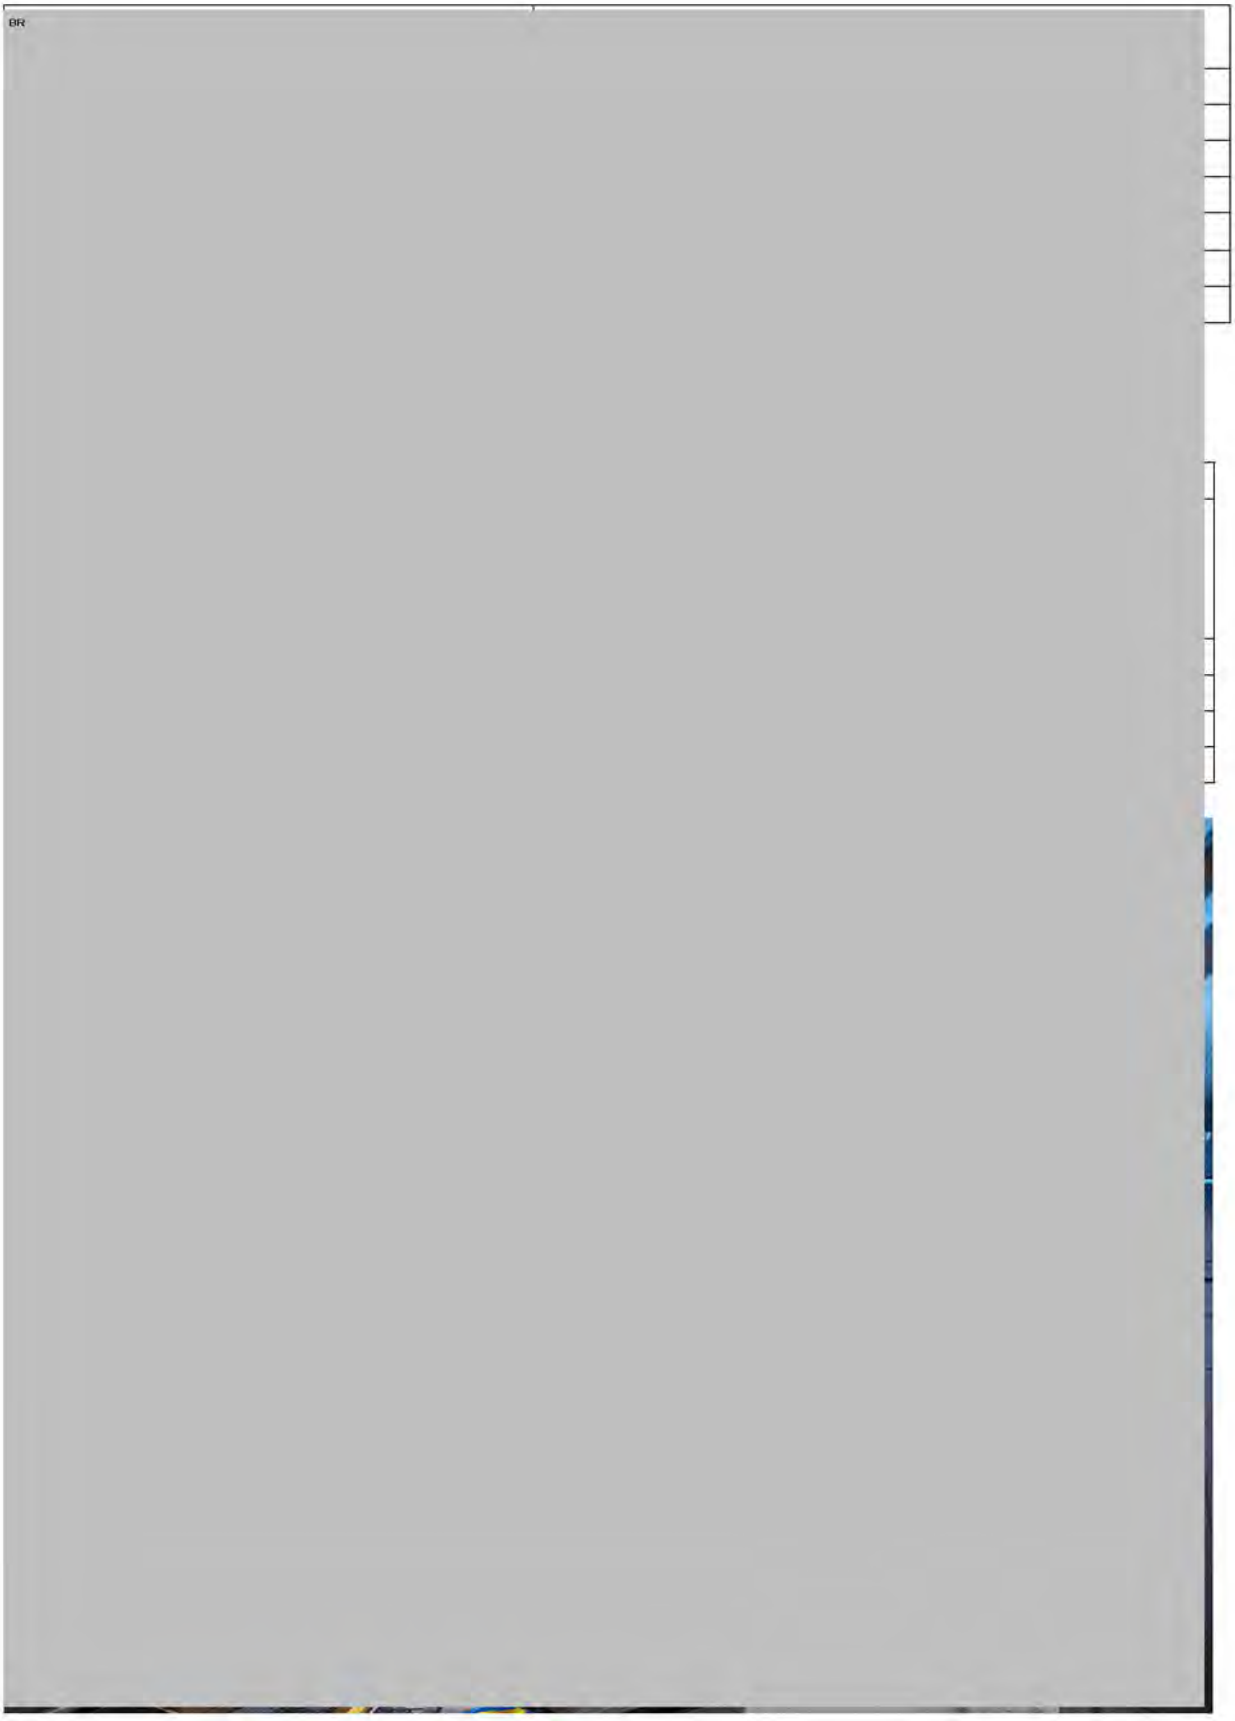
BR

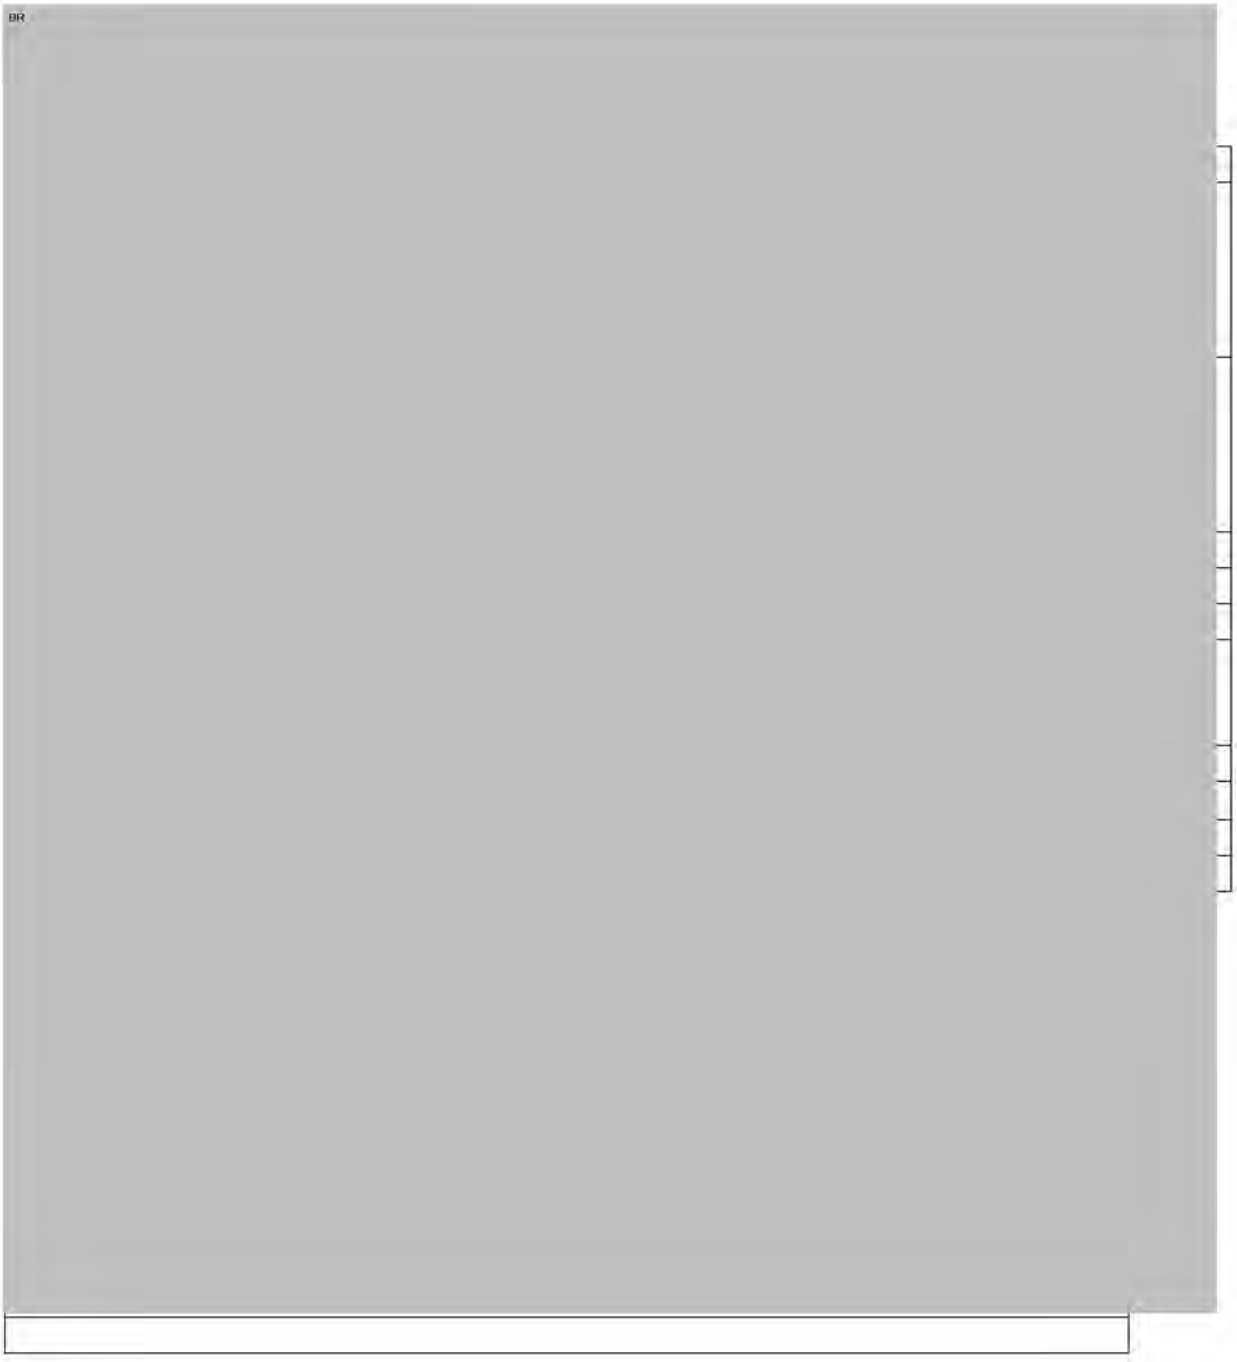

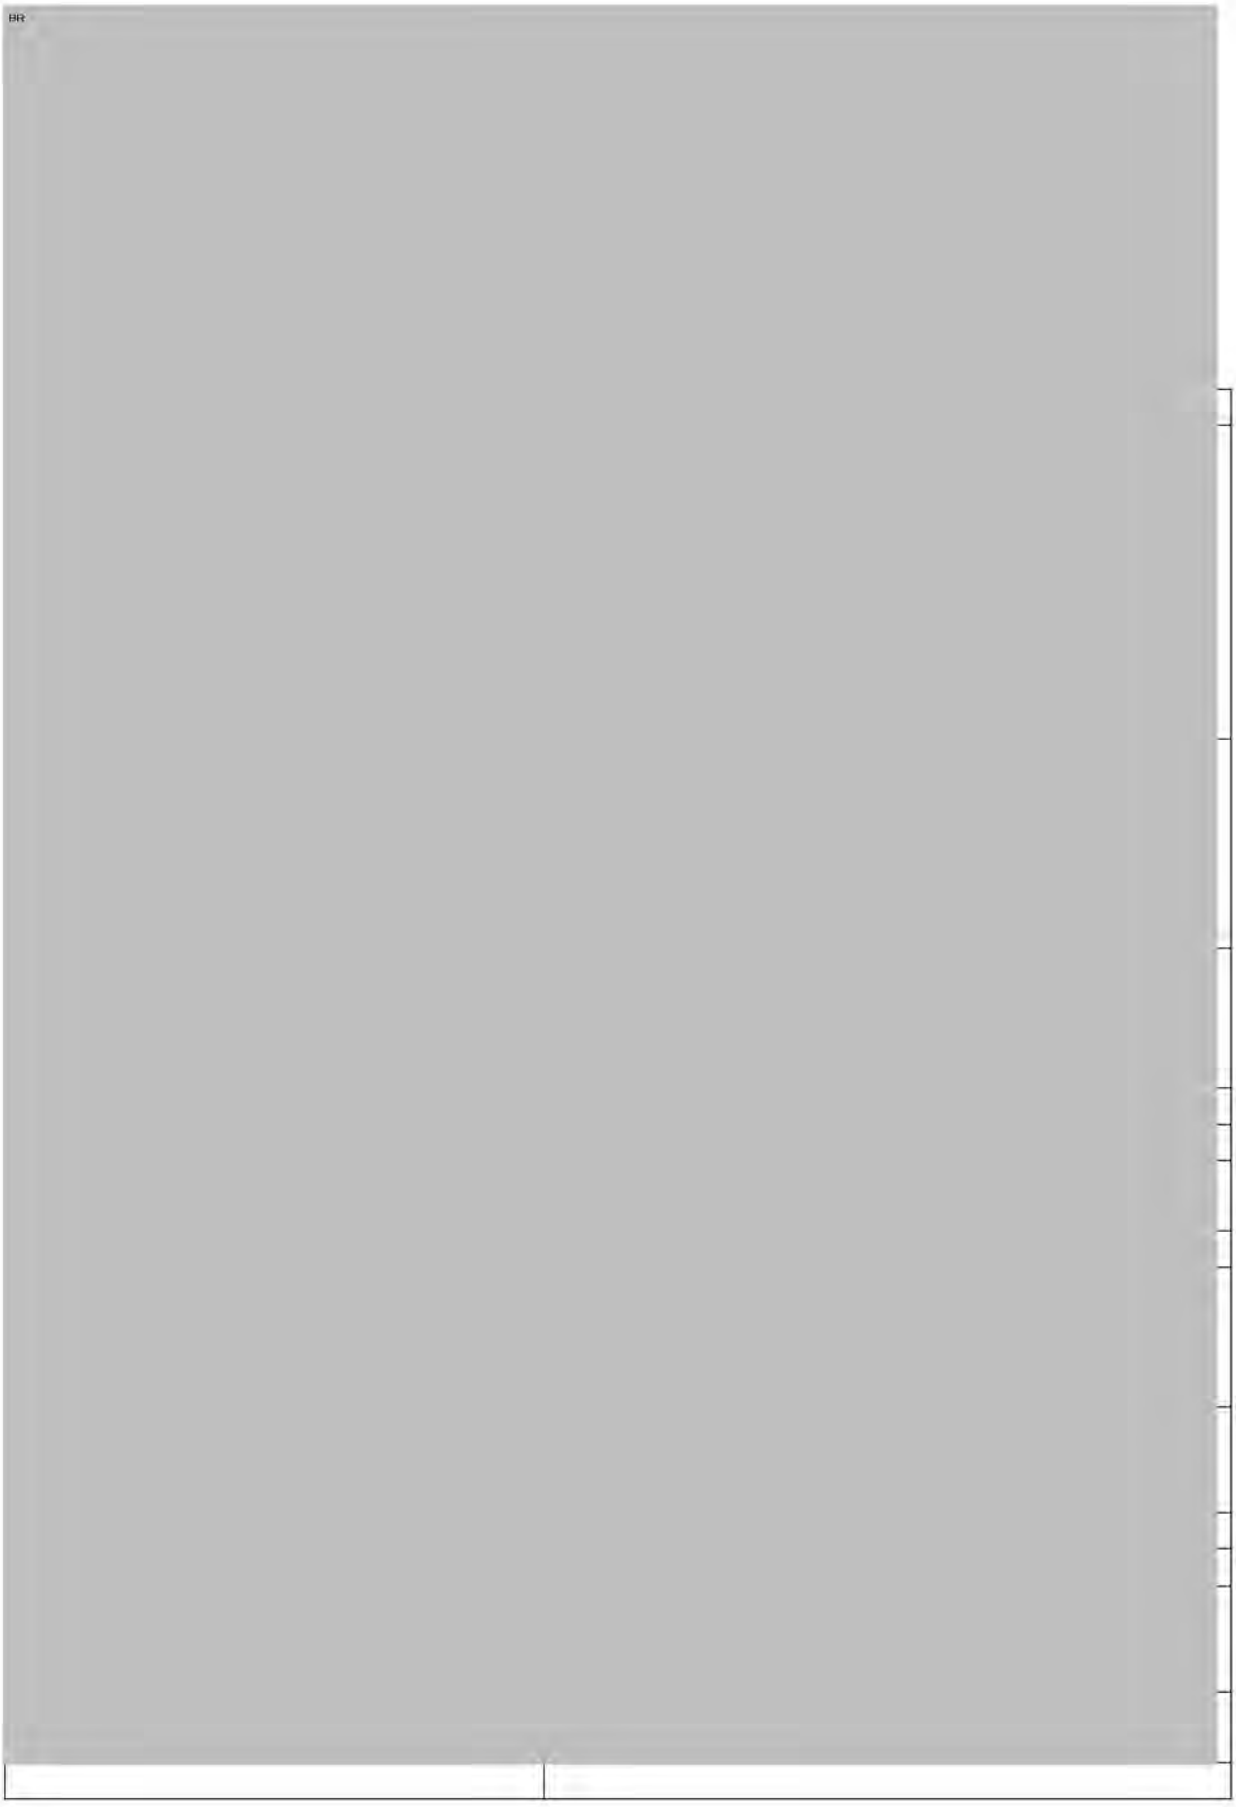
BR

BR

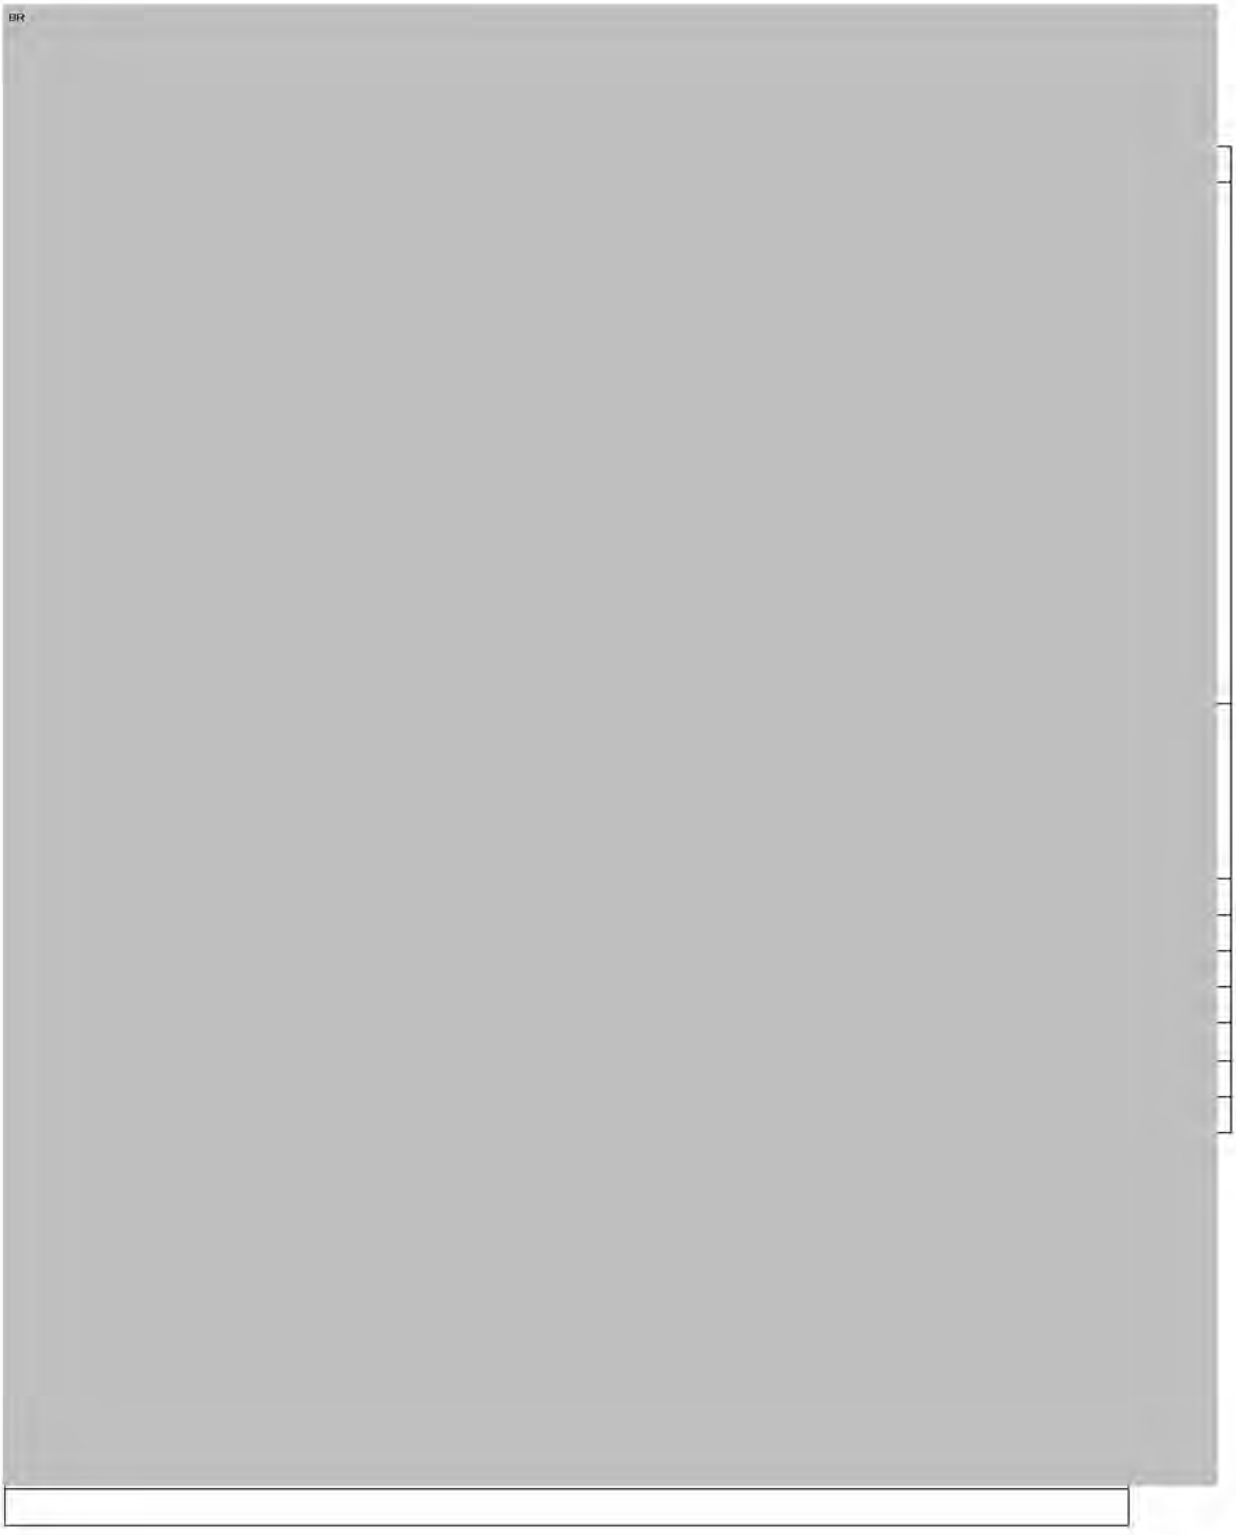
BR

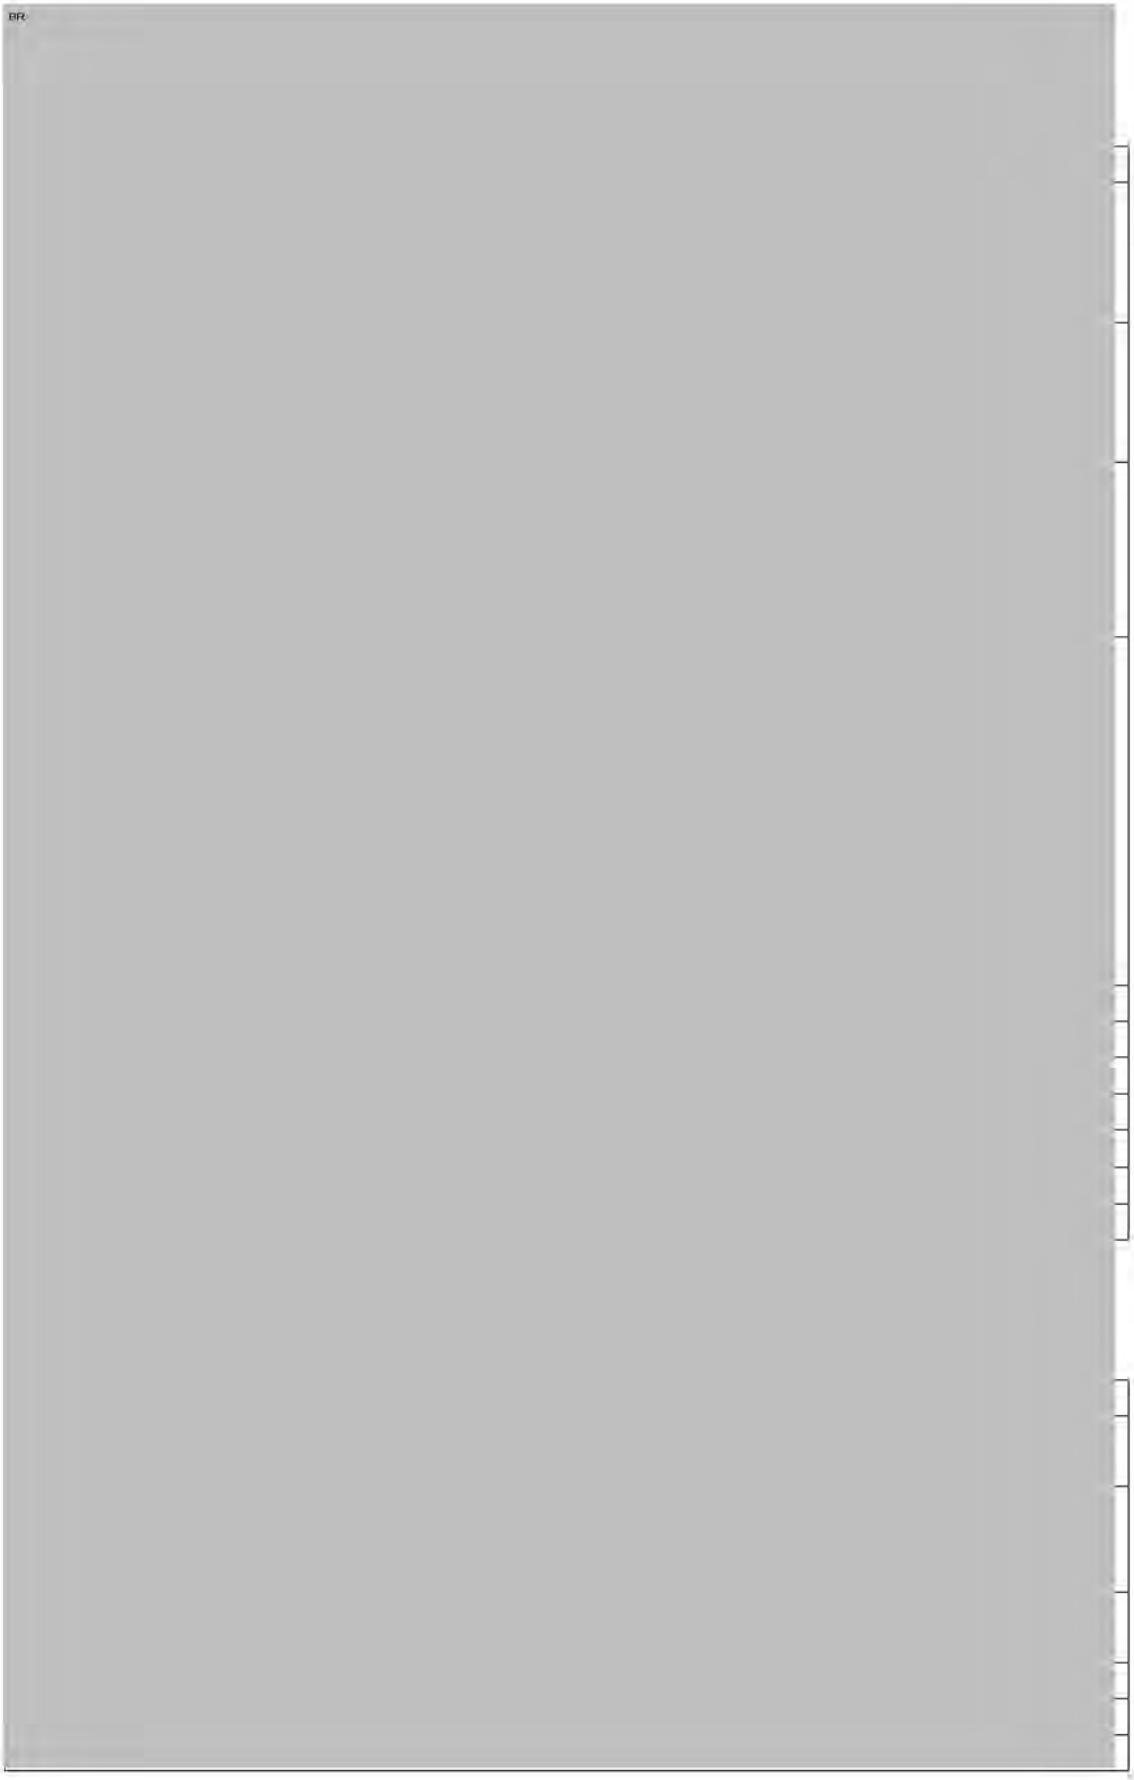

Docnr23



# 4 Overdracht en openstelling

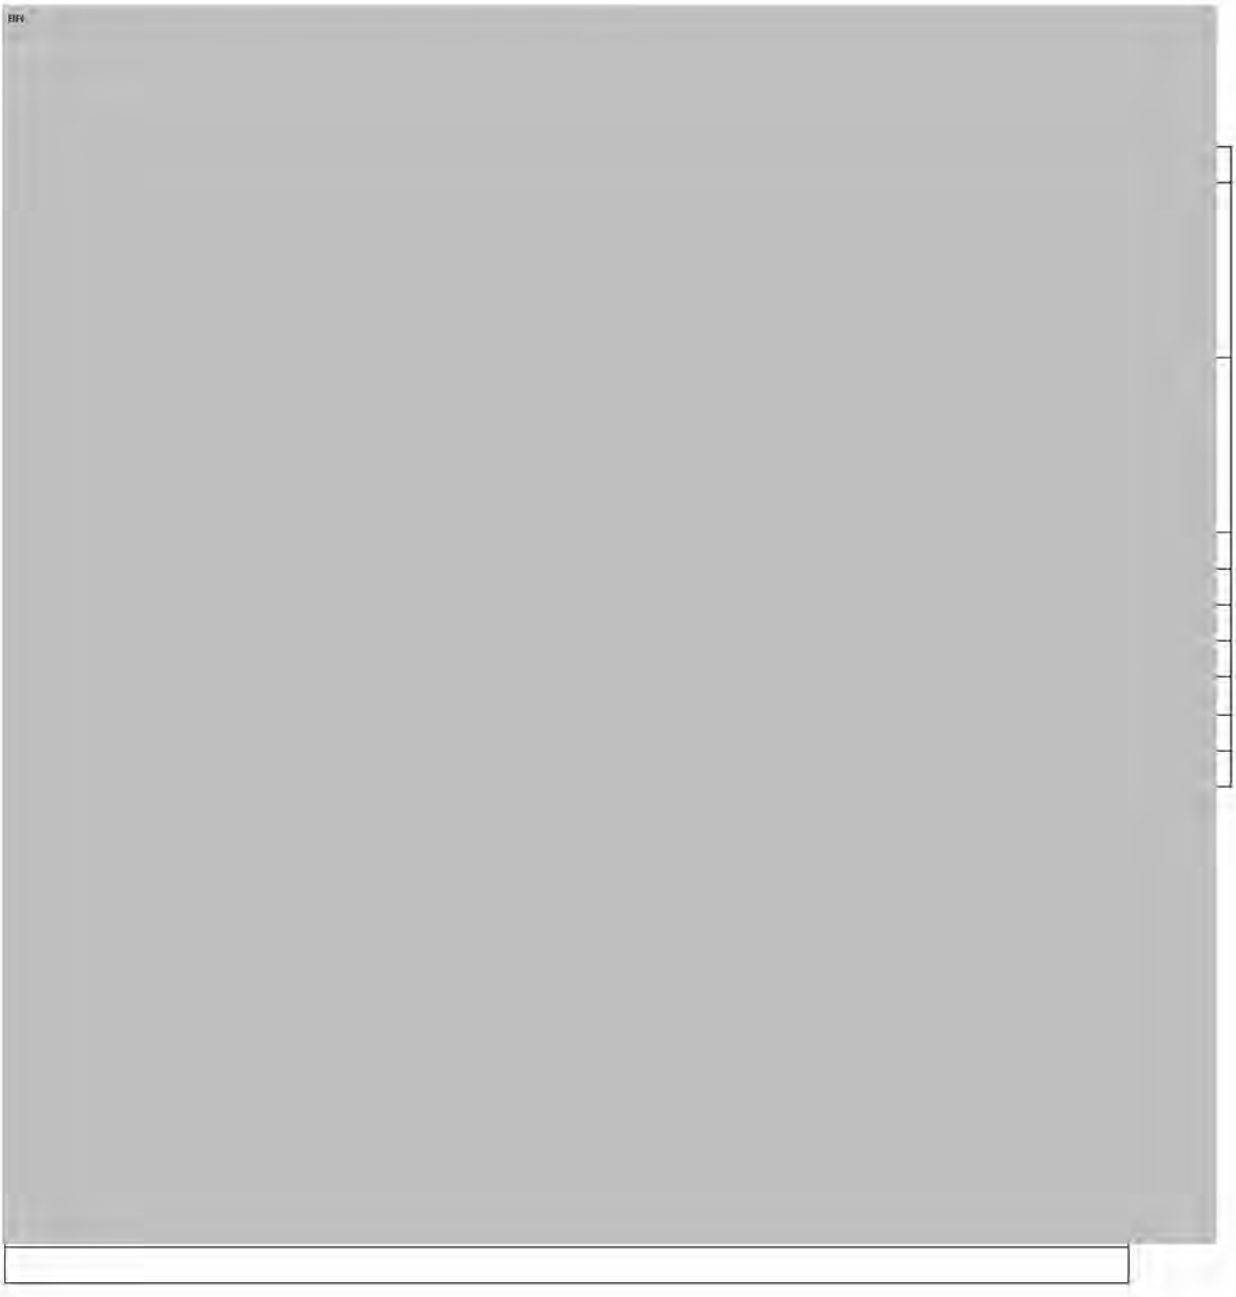

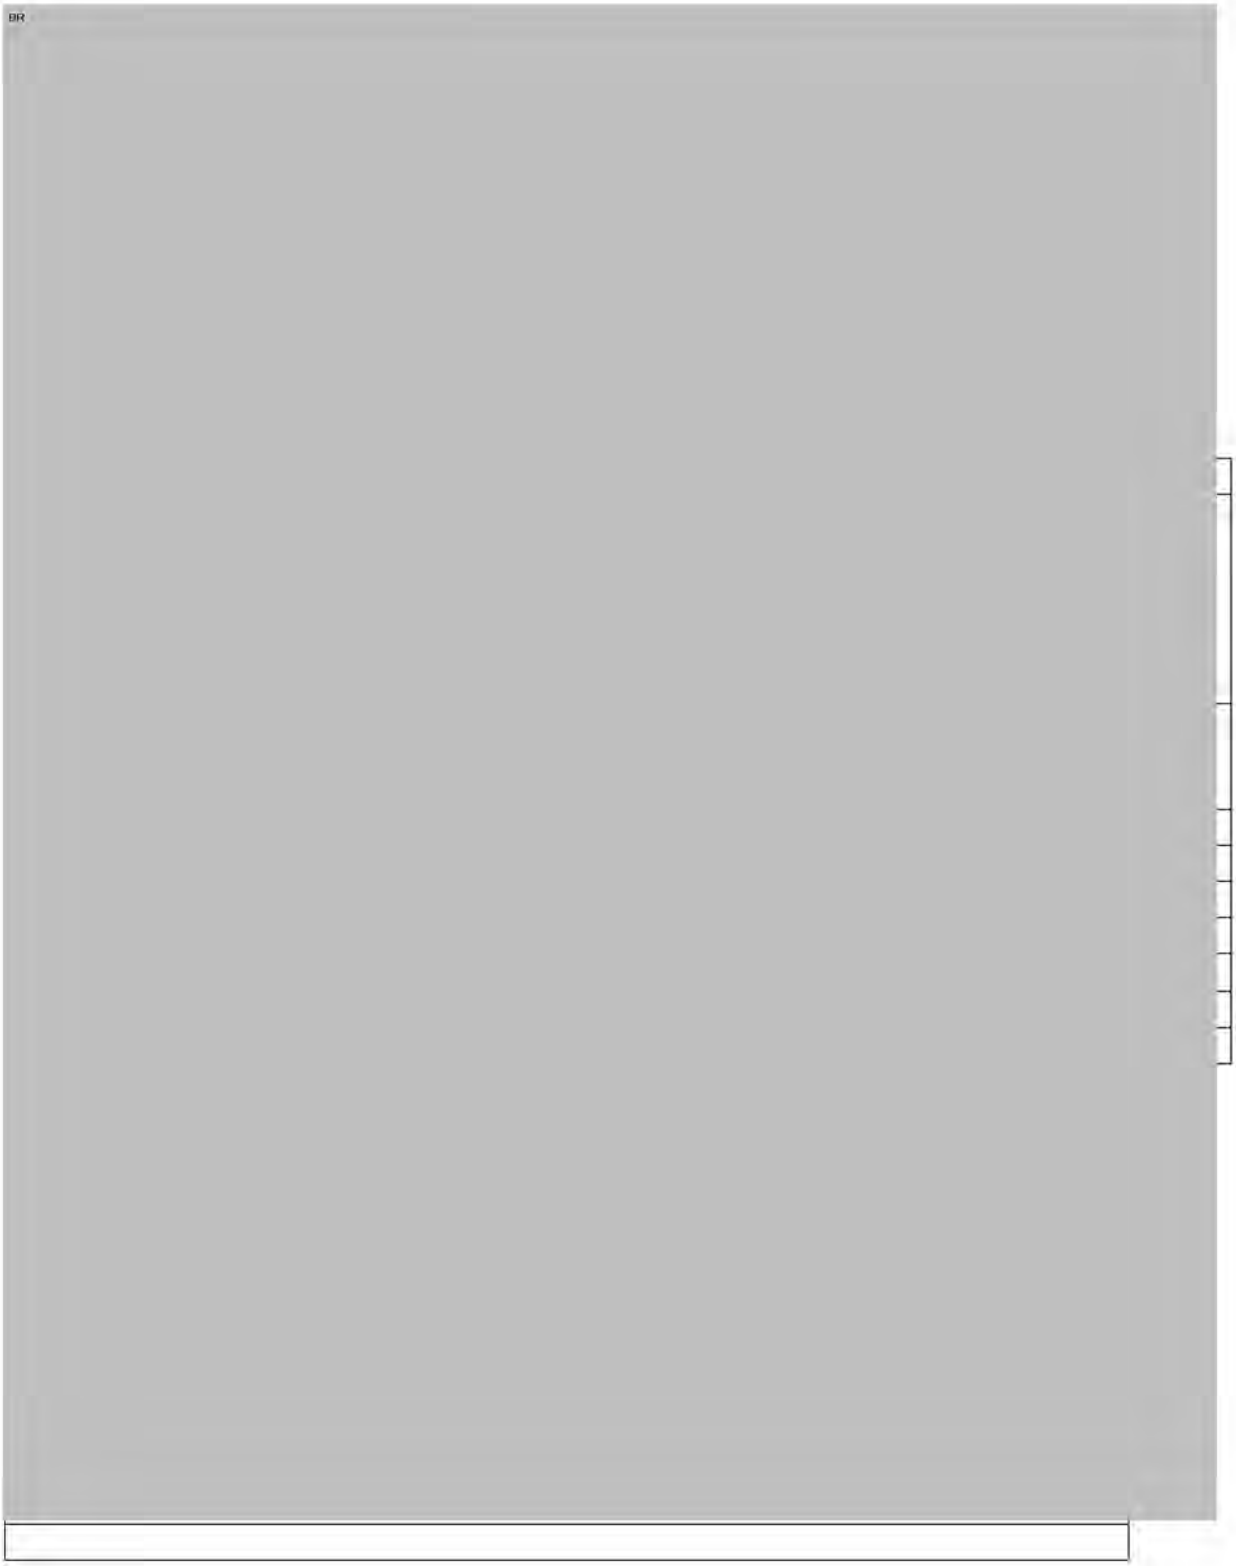

BR

Docnr23



# 5 Projectbeheersing

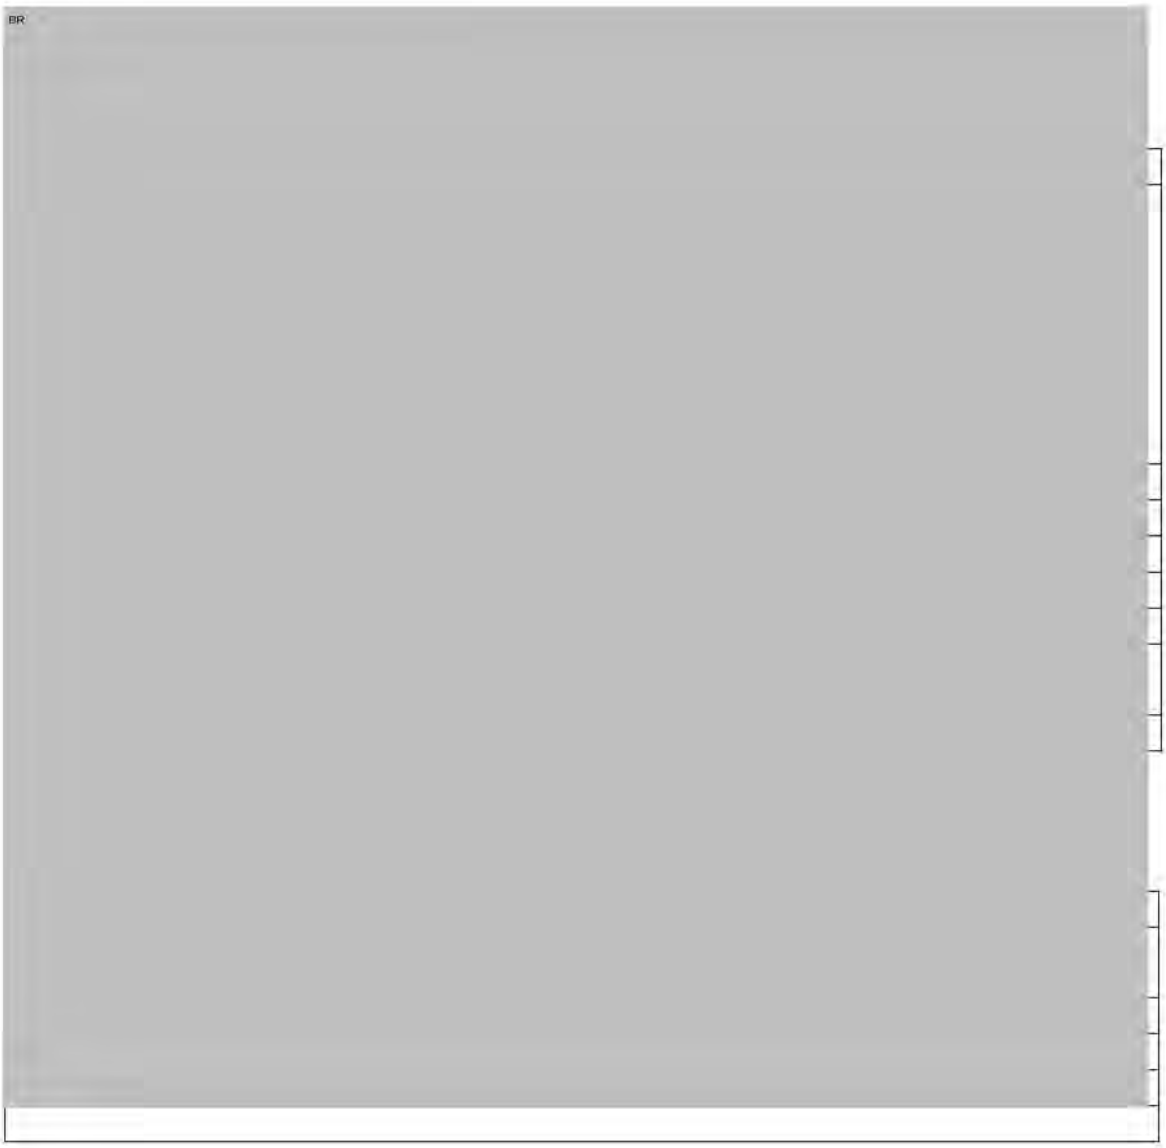

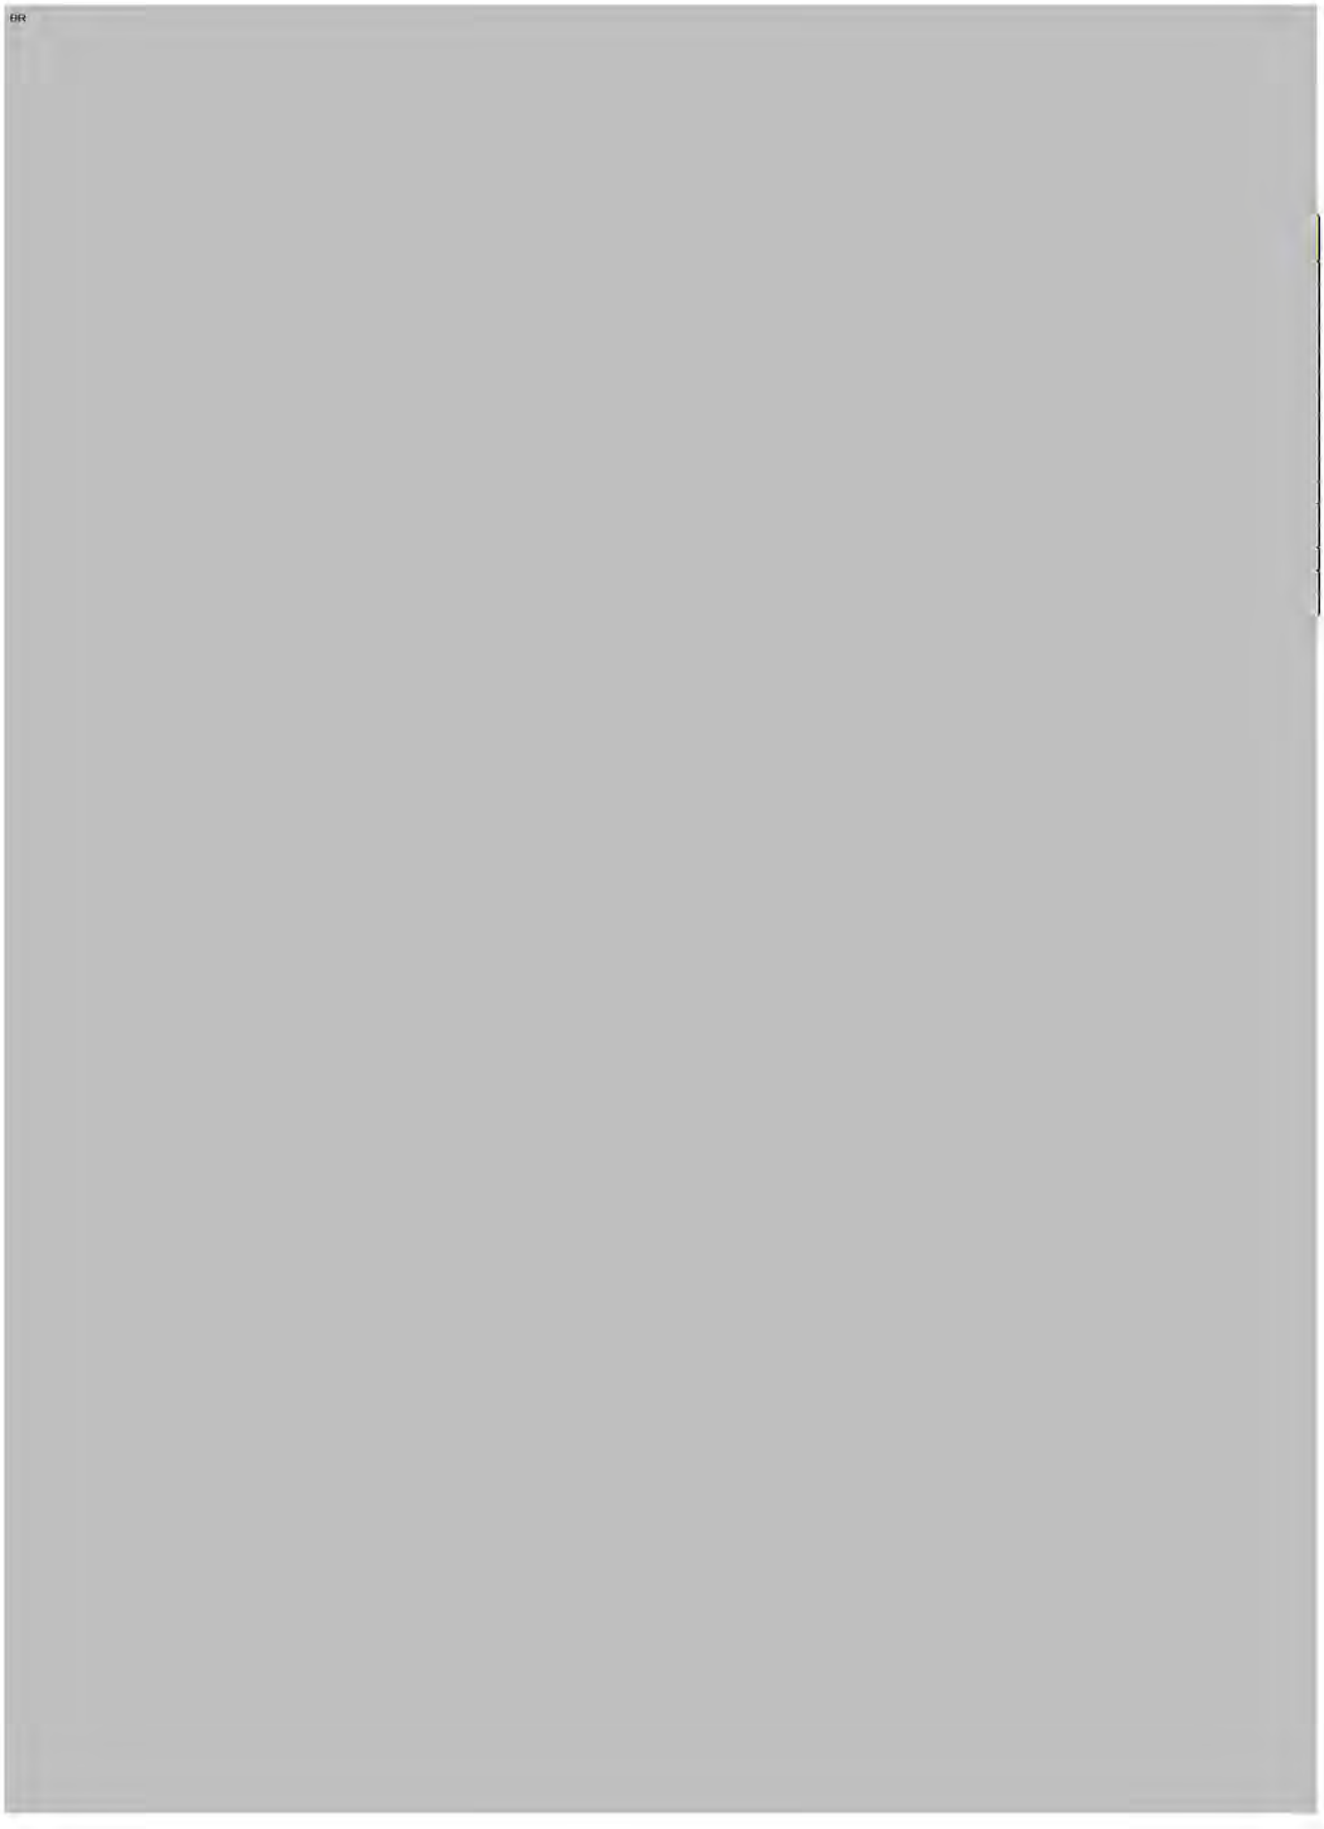

### 5.2.2 Dekkingen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland
Er zijn in het tweede kwartaal 2019 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland
Er zijn in het tweede kwartaal 2019 geen mutaties geweest.

BR

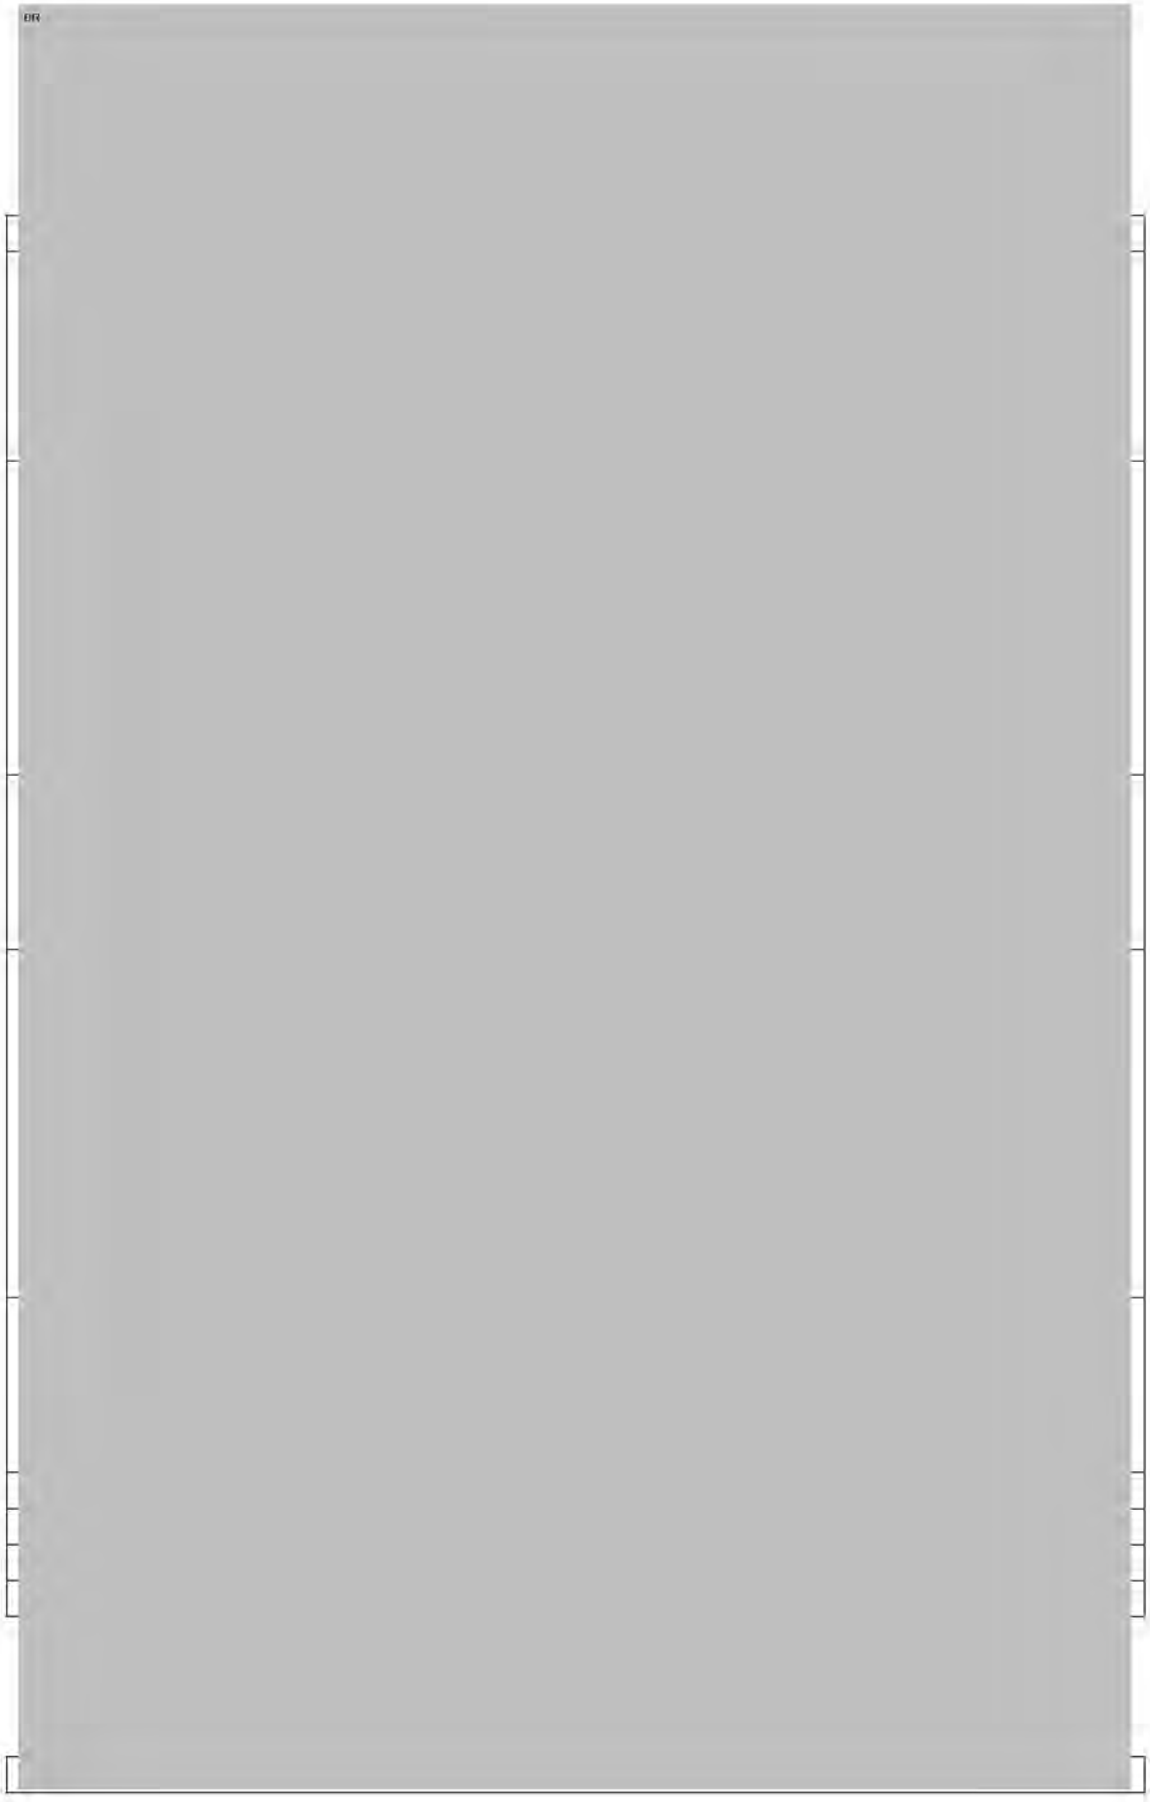

BR

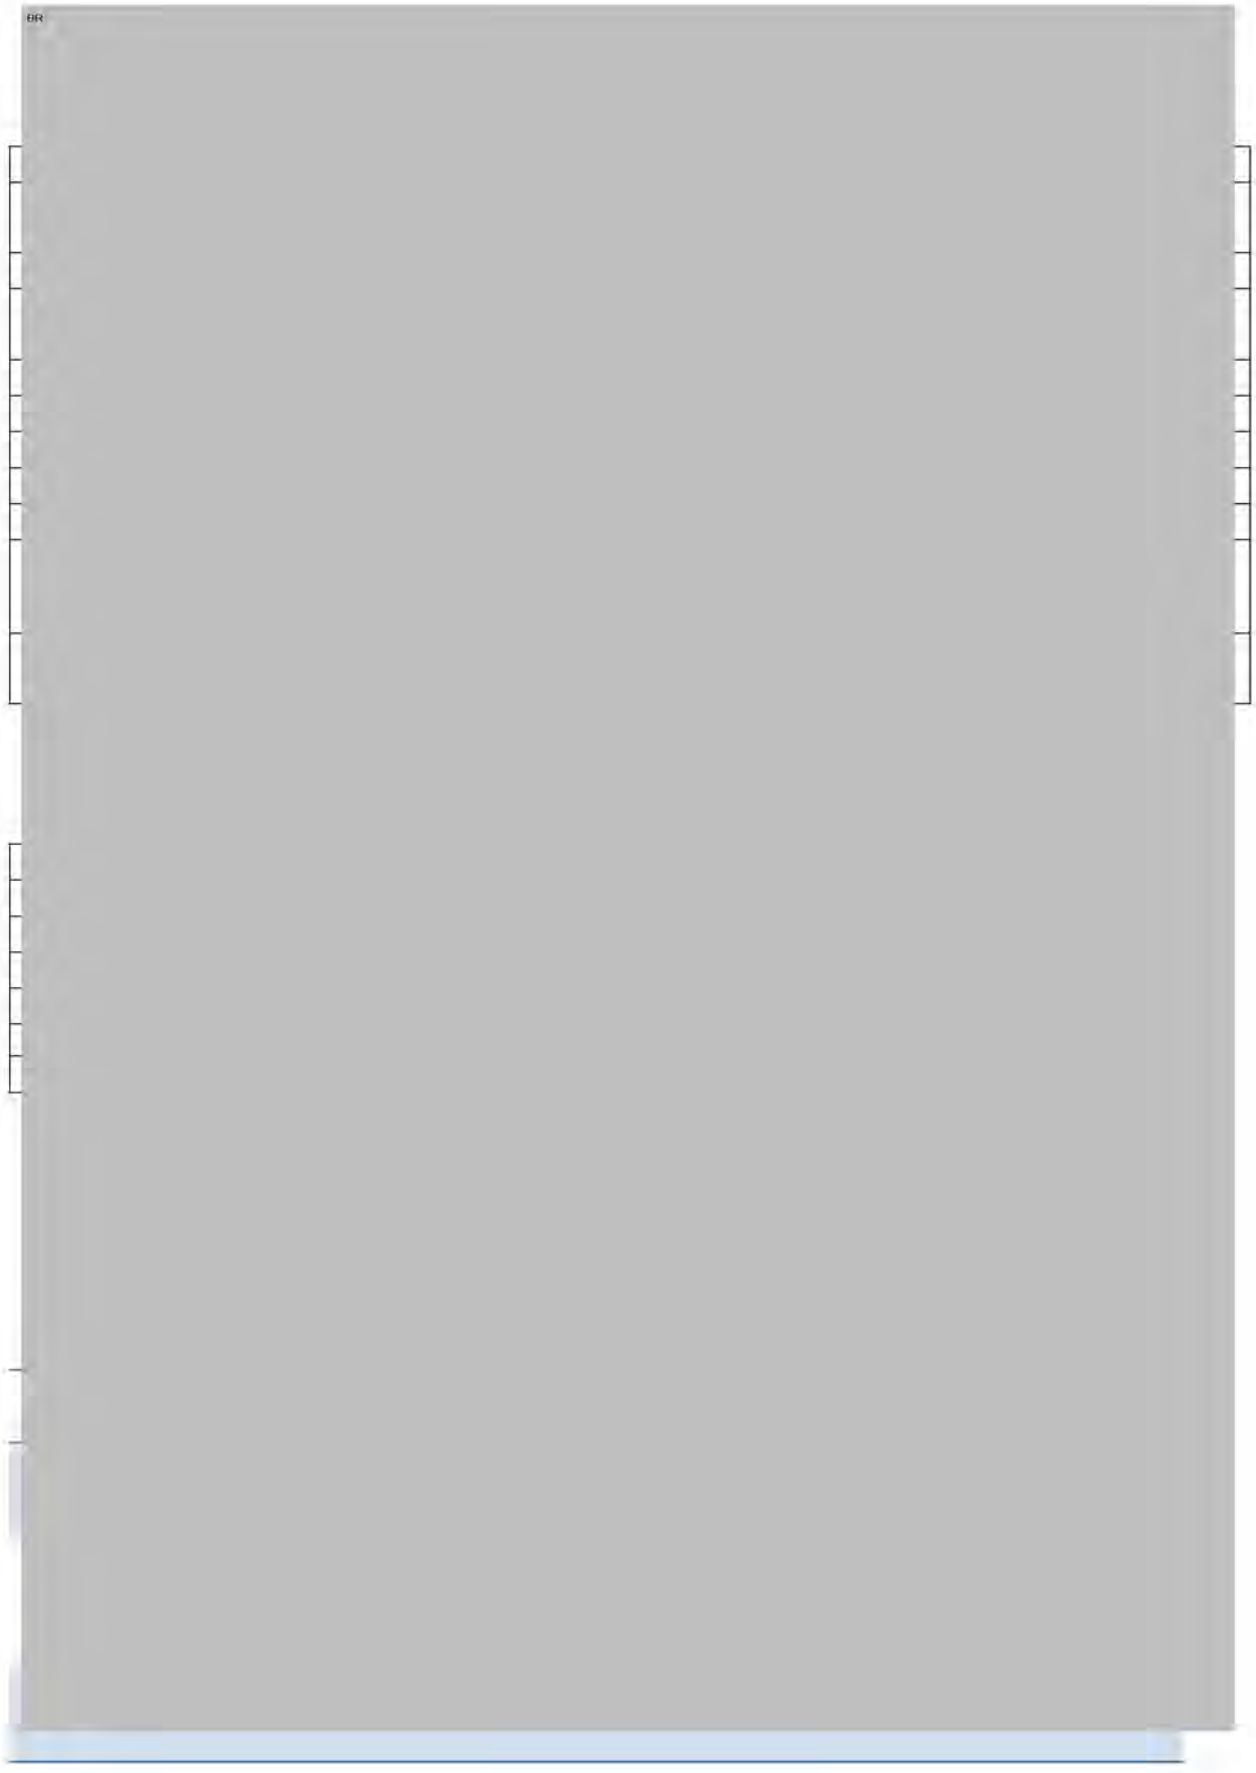

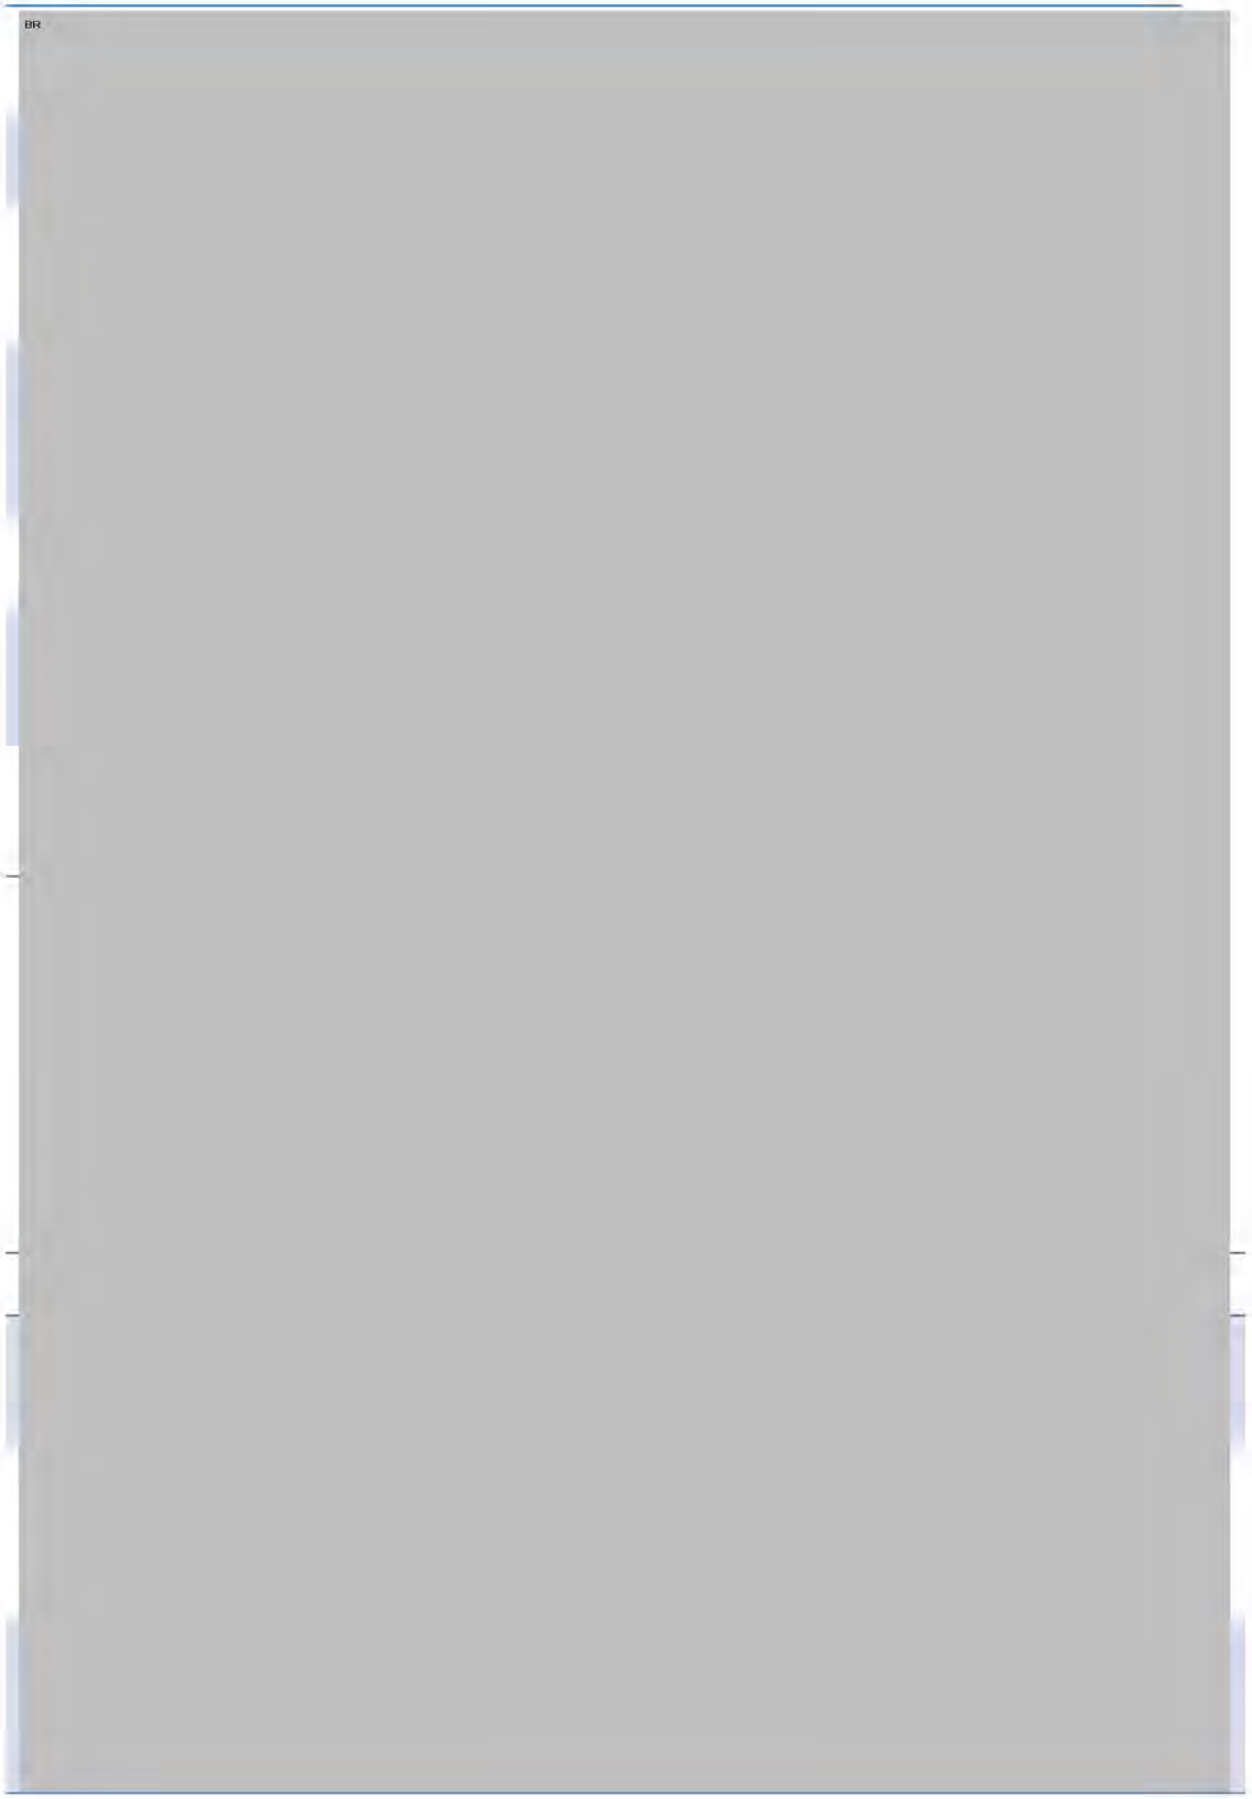
BR

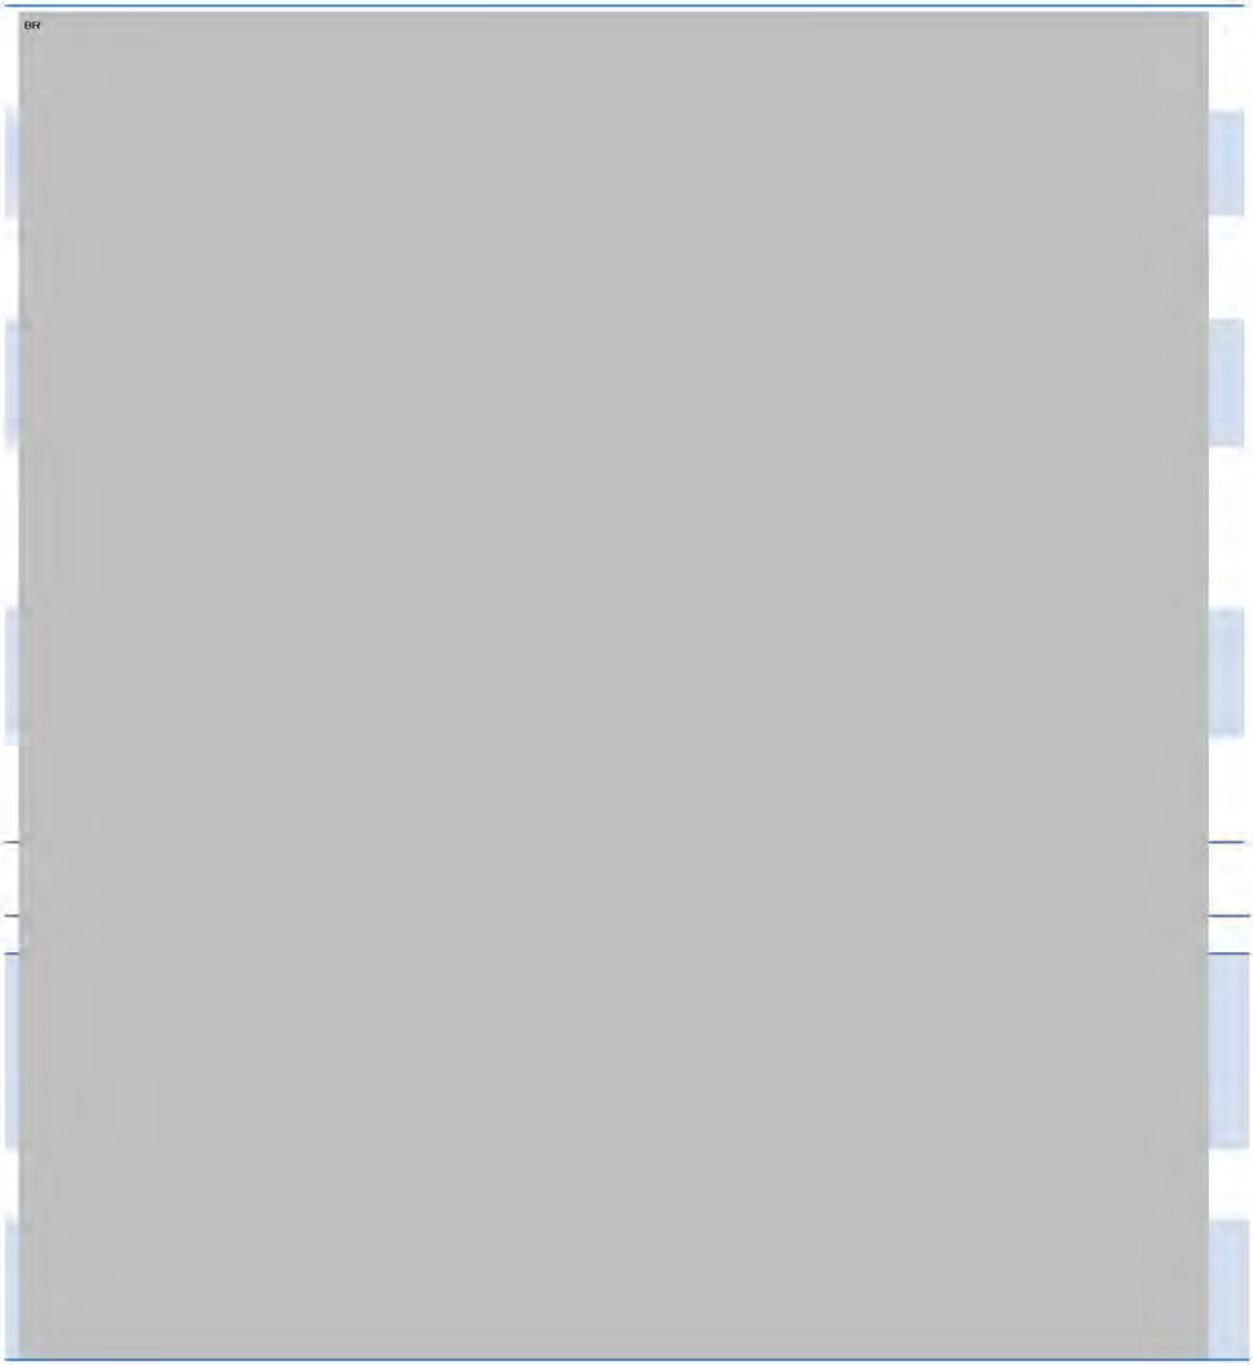
BR

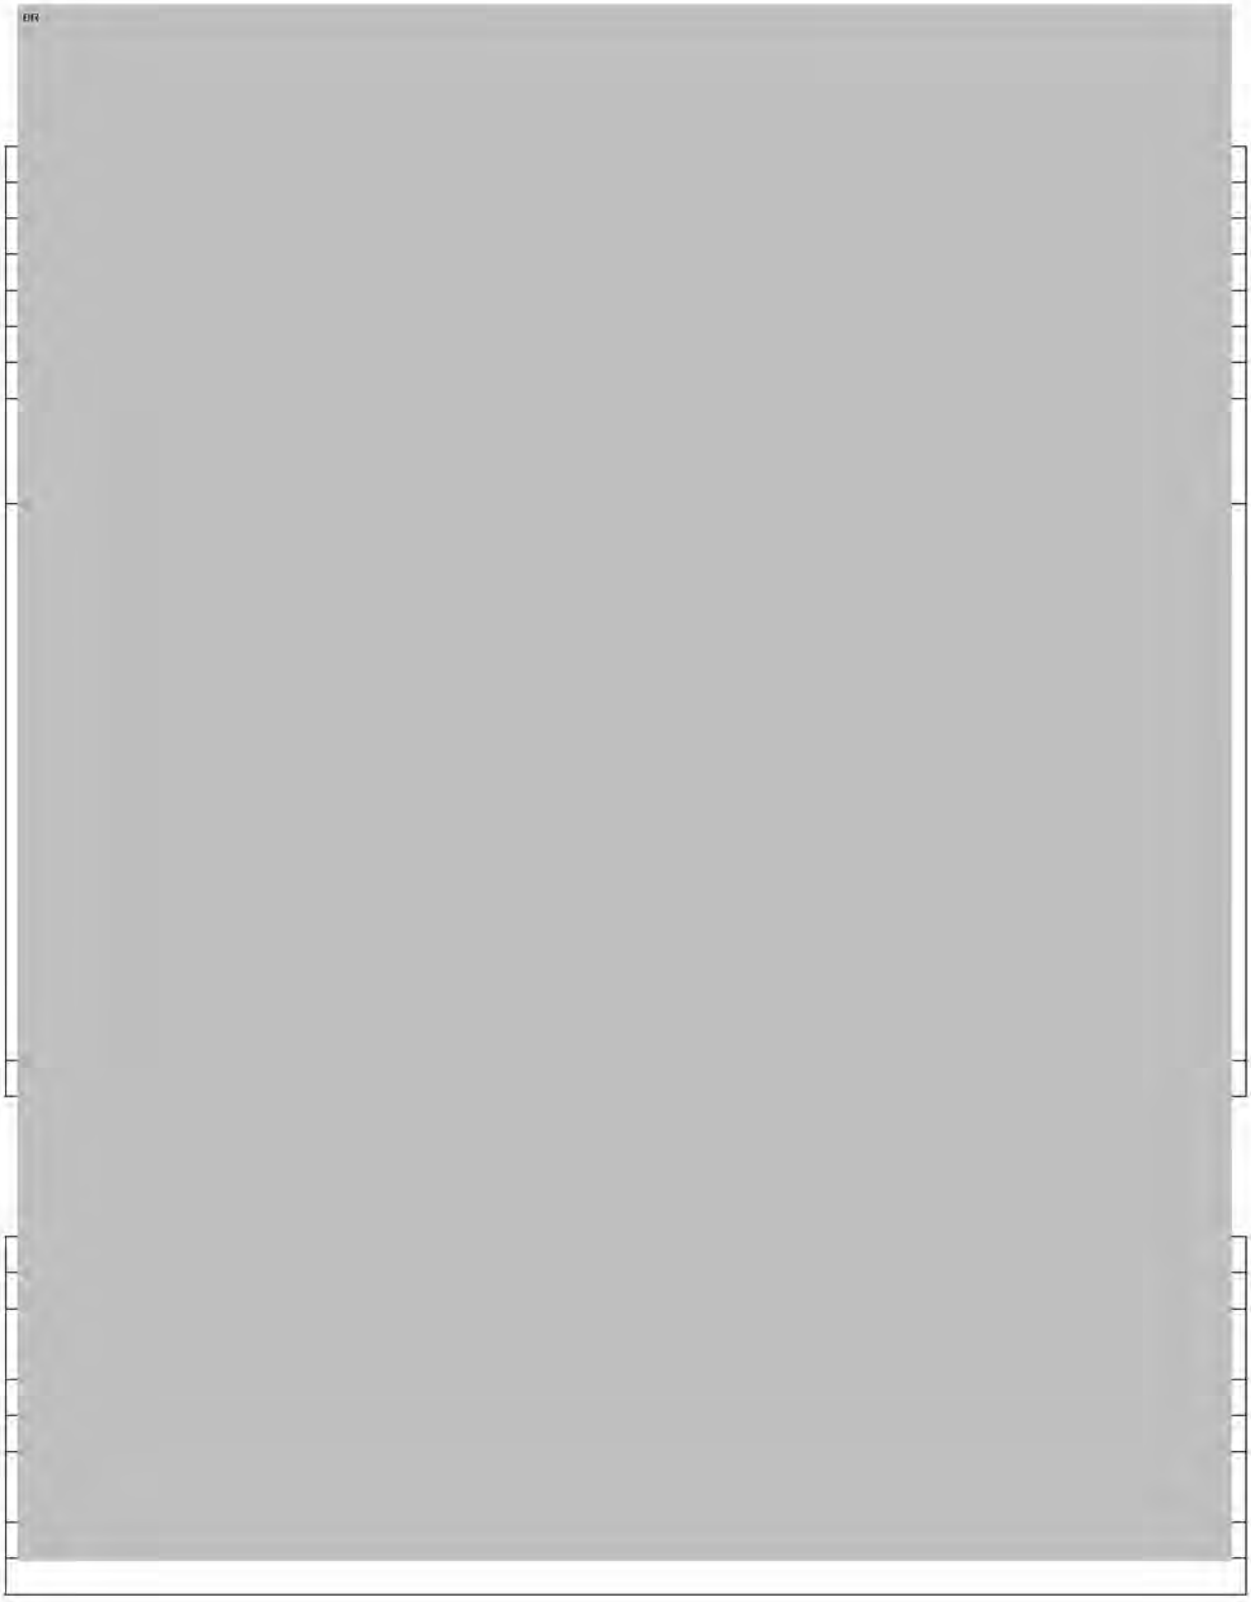

Docnr23

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 30 juni 2019 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 17-apr-20 | 23 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie vertraagd. |
| BR | | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

5.1.2.e

Docnr23

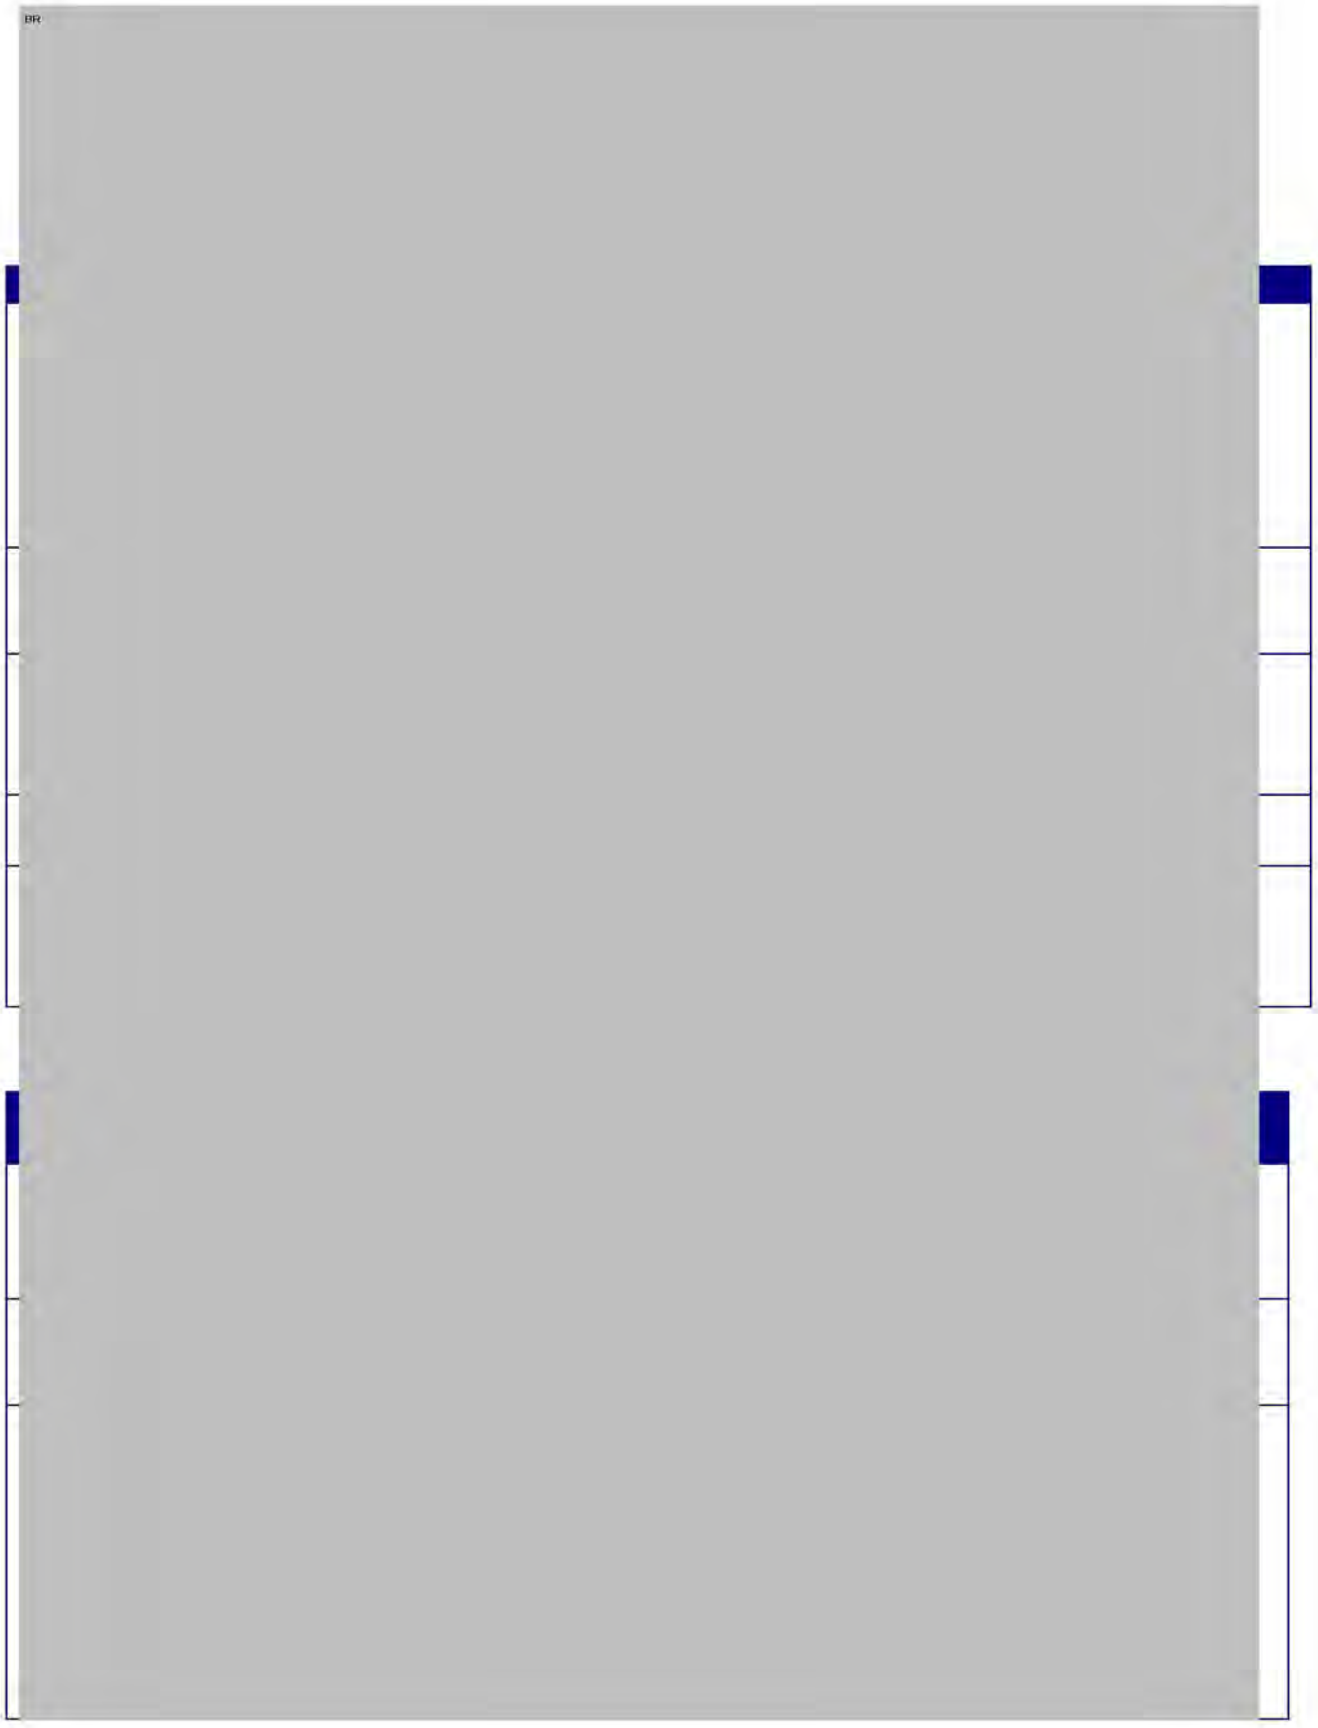

Docnr23



Docnr24

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 3e kwartaal 2019

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 23 oktober 2019**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 1.0**

Docnr24

Docnr24



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 3e kwartaal 2019
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004521

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>11 oktober 2019 | Versie 0.1<br>17 oktober 2019 | Versie 1.0<br>23 oktober 2019 | Versie 1.0<br>29 oktober 2019 | Versie 2.0<br>4 november 2019 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr24



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 9

*2.1 Omgevingsmanagement* *9*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 9
2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie en Vergunningen* *10*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2.2 Komende kwartaal 10

*2.3 Verwervingen* *11*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 11
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Overeenkomsten* *12*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 12
2.4.2 Komende kwartaal 12

*2.5 Communicatie* *13*
2.5.1 Afgelopen kwartaal 13
2.5.2 Komende kwartaal 13
2.5.3 Diversen 14

3 Projectvoortgang 15

*3.1 Aanbesteden en contracteren* *15*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 15
3.1.2 Komende kwartaal 15

*3.2 Vormgeving* *16*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 16
3.2.2 Komende kwartaal 17

*3.3 Monitoring* *18*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 18
3.3.2 Komende kwartaal 18

*3.4 Inpassing Binckhorst* *19*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 19
3.4.2 Komende kwartaal 19

*3.5 Inpassing Vlietzone* *21*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 21
3.5.2 Komende kwartaal 22

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* *23*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 23
3.6.2 Komende kwartaal 23

*3.7 Boortunnel en toeritten* *24*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 24
3.7.2 Komende kwartaal 25

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *26*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 26

Docnr24




3.8.2 Komende kwartaal 26

*3.9 Installaties* *28*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 28
3.9.2 Komende kwartaal 29

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *30*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 30
3.10.2 Komende kwartaal 30

*3.11 Bediencentrale* *31*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 31
3.11.2 Komende kwartaal 31

*3.12 Uitvoeringskwaliteit* *32*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 32
3.12.2 Komende kwartaal 32

*3.13 Contractmanagement* *33*
3.13.1 Afgelopen kwartaal 33
3.13.2 Komende kwartaal 33

**4 Overdracht en openstelling** **34**

*4.1 Tunnelveiligheid* *34*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 34
4.1.2 Komende kwartaal 34

*4.2 Overdracht aan beheerders* *35*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 35
4.2.2 Komende kwartaal 35

*4.3 Beheer en onderhoud* *36*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 36
4.3.2 Komende kwartaal 36

**5 Projectbeheersing** **37**

*5.1 Scope* *37*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 37
5.1.2 Komende kwartaal 37

*5.2 Financien* *38*
5.2.1 Kostenstructuur 38
5.2.2 Dekkingen 39

*5.3 Planning* *41*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 41
5.3.2 Komende kwartaal 41

*5.4 Risico's* *42*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 42
5.4.2 Komende kwartaal 42
5.4.3 Financiële toprisico's 42
5.4.4 Toprisico's planning 43

*5.5 Interne kwaliteit* *45*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 45
5.5.2 Komende kwartaal 45

Docnr24



*5.6 Informatiebeheer* *46*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 46
5.6.2 Komende kwartaal 46
5.6.3 Kennisdeling 46
*5.7 Organisatie* *47*
5.7.1 Afgelopen kwartaal 47
5.7.2 Komende kwartaal 47

**6 Bijlage: Planningsmijlpalen** **48**

**7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan** **49**

**8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer** **51**

# 1 Managementsamenvatting

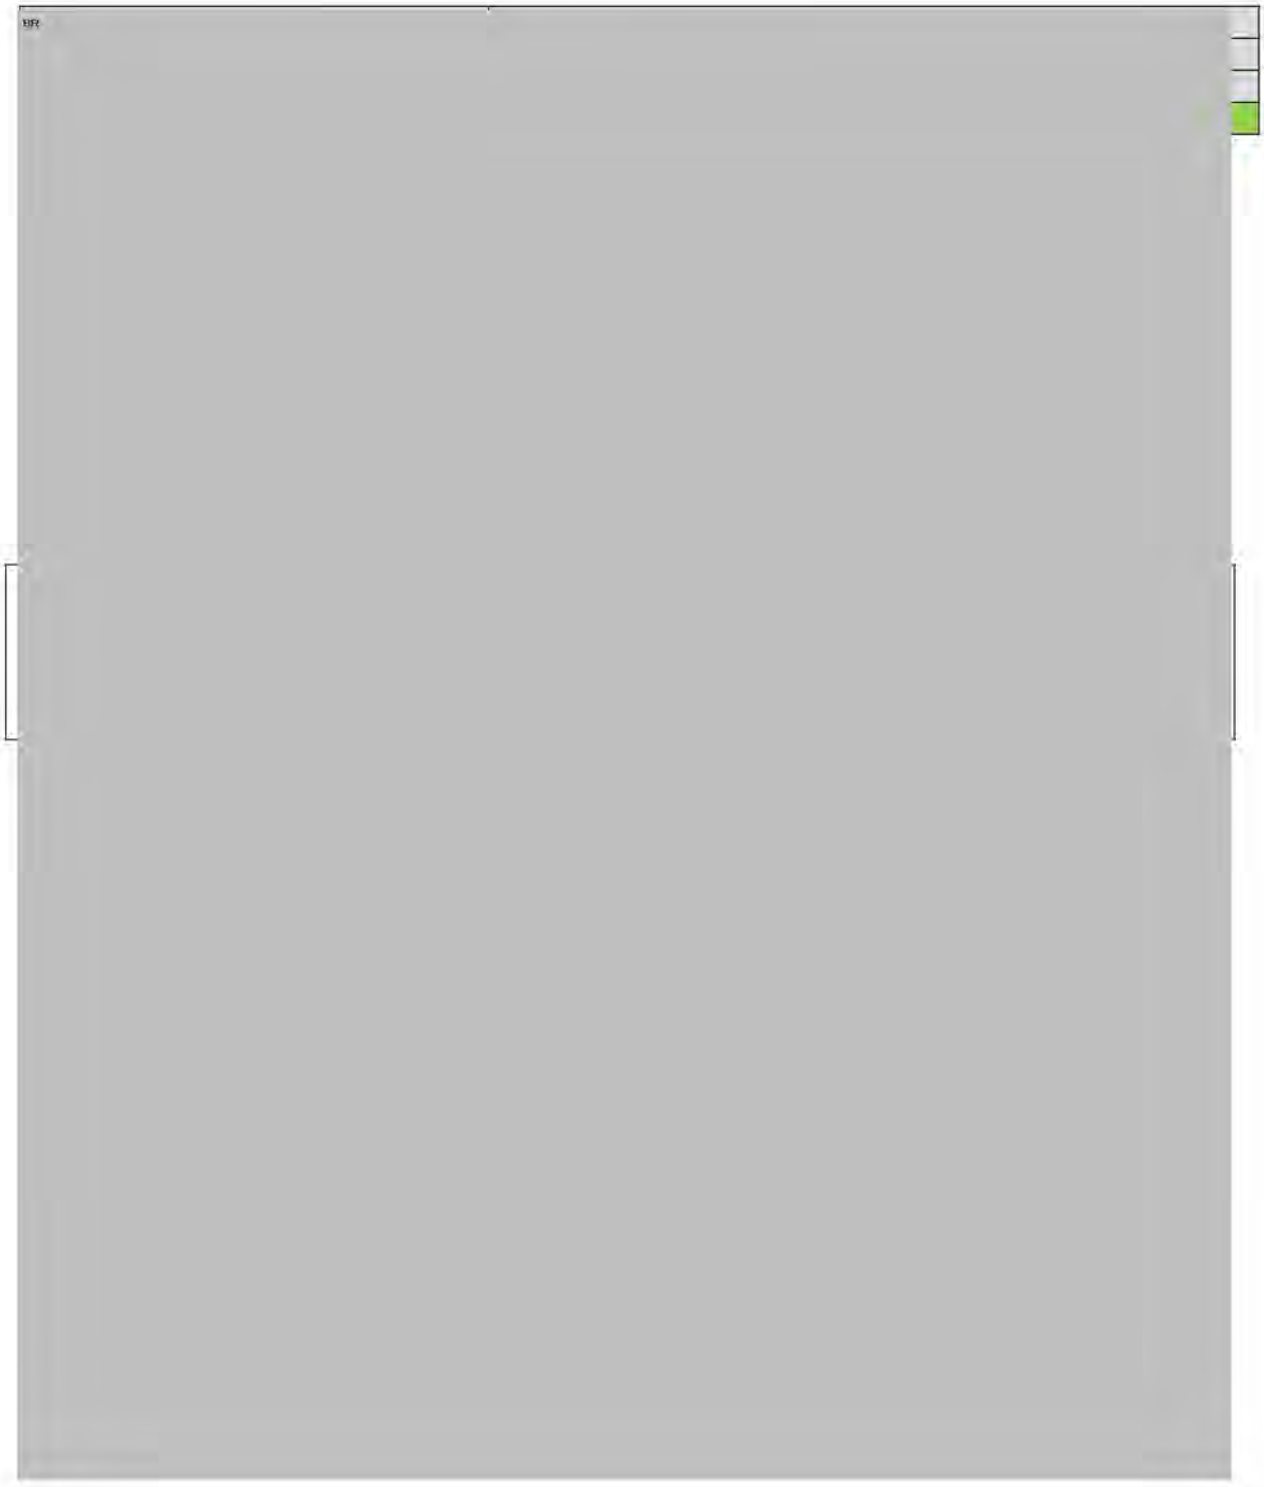

## 4. TERUGBLIK AFGELOPEN KWARTAAL

Afgelopen kwartaal is er onder andere gewerkt aan:

- Vlietzone: Het parkeerterrein Drievliet is ingericht en de loopbrug en tijdelijke hellingbaan zijn gerealiseerd. Begin juli 2019 zijn deze onderdelen aan Drievliet beschikbaar gesteld. De inrichting van het Molenvlietpark voortgezet, o.a. aanbrengen fundatiepalen voor diverse bruggen. Het voormalige parkeerterrein van Drievliet is verwijderd t.h.v. de calamiteitenberging. De watergang langs Drievliet is gegraven.

- De verwachting is dat in november 2019 de kapvergunning voor de tweede toevoer inclusief een verklaring van geen bedenkingen, die is aangehaakt in het kader van de Wet natuurbescherming, in procedure kan worden gebracht. De planning om in het eerste kwartaal 2020 (voor het broedseizoen) te kappen staat onder druk.

## 5. VERWACHTING KOMEND KWARTAAL

Komende kwartaal wordt er onder andere gewerkt aan:

- Vlietzone: Realiseren bruggen en kade in het Molenvlietpark. Uitvoeren resterende grondwerkzaamheden op de grondwal langs de golfbaan en aansluiten op het landhoofd van het trekfietsviaduct. Het resterende deel van het parkeerterrein Drievliet wordt ingericht, nadat het bouwterrein van het Trekfietsviaduct is opgeheven.

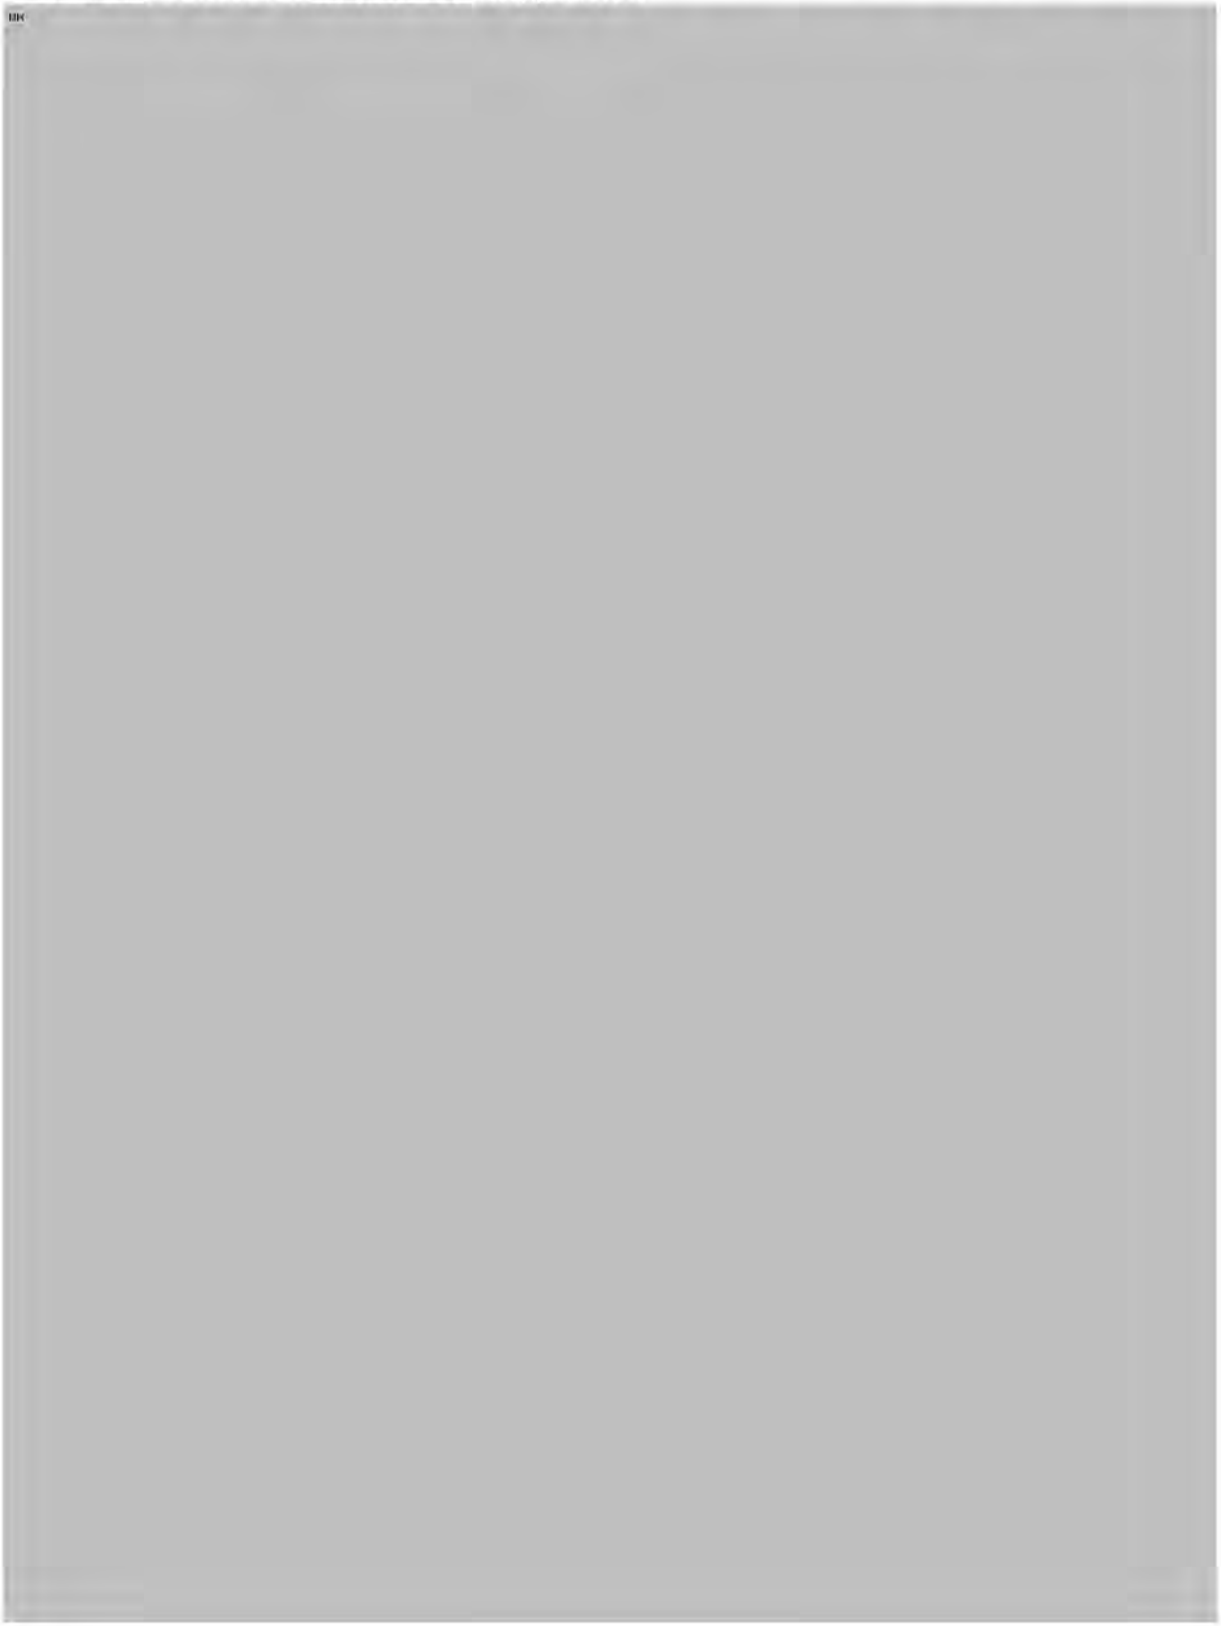

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

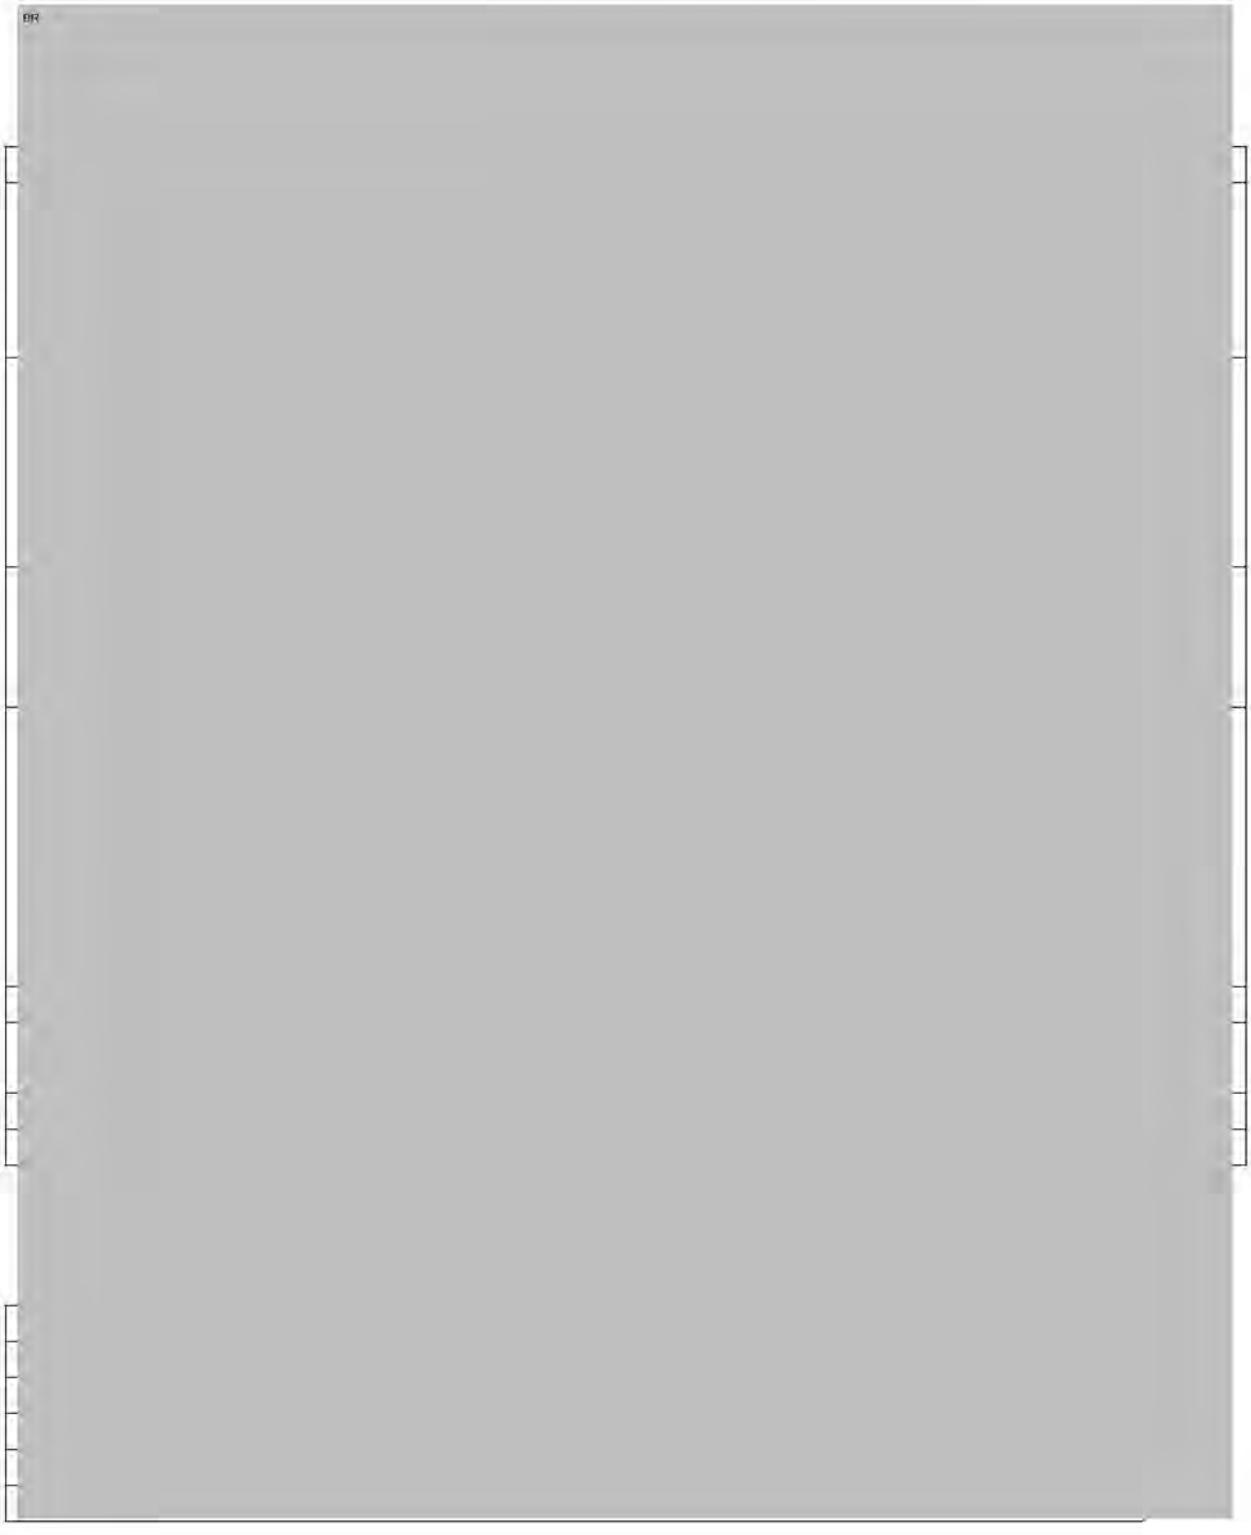

## 2.2 Planologie en Vergunningen

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| In overleg met CRB en andere betrokkenen inzicht houden op het vergunningenproces. | Periodiek overleg gevoerd met zowel CRB, HHD als DSO Vergunningen & Toezicht. CRB heeft diverse vergunningen verkregen. De meeste vergunningen zien op de kunstwerken in Molenvlietpark. Voor de vier portalen op Rijksgrond dient een Wbr-vergunning aangevraagd te worden (geen zakelijk recht nodig). |
| HHD zal het projectplan vaststellen wanneer Den Haag de SOK t.b.v. tweede toevoer een feit is. | In afwachting van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Den Haag en de particulier op wiens perceel de tweede toevoer wordt aangelegd. |
| De gemeente Den Haag behandelt de kapvergunning ten behoeve van de aanleg van de tweede watertoevoer. De procedure loopt nog steeds. De aanvullende vragen van de ODH zijn beantwoord. Zekerheidshalve is nader vleermuizenonderzoek uitgevoerd. | ODH heeft te kennen gegeven te wachten met een officiële reactie na het gereedkomen van de resultaten van het extra vleermuizenonderzoek.<br>De verwachting is dat in november 2019 de kapvergunning inclusief een verklaring van geen bedenkingen, die is aangehaakt in het kader van de Wet natuurbescherming, in procedure kan worden gebracht. De planning om in het eerste kwartaal 2020 (voor het broedseizoen) te kappen staat onder druk. |
| BR | |

### 2.2.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Besluit afwachten op kapaanvraag en aangevraagde ontheffing Wet natuurbescherming in verband met aanleg tweede watertoevoer. |
| BR |

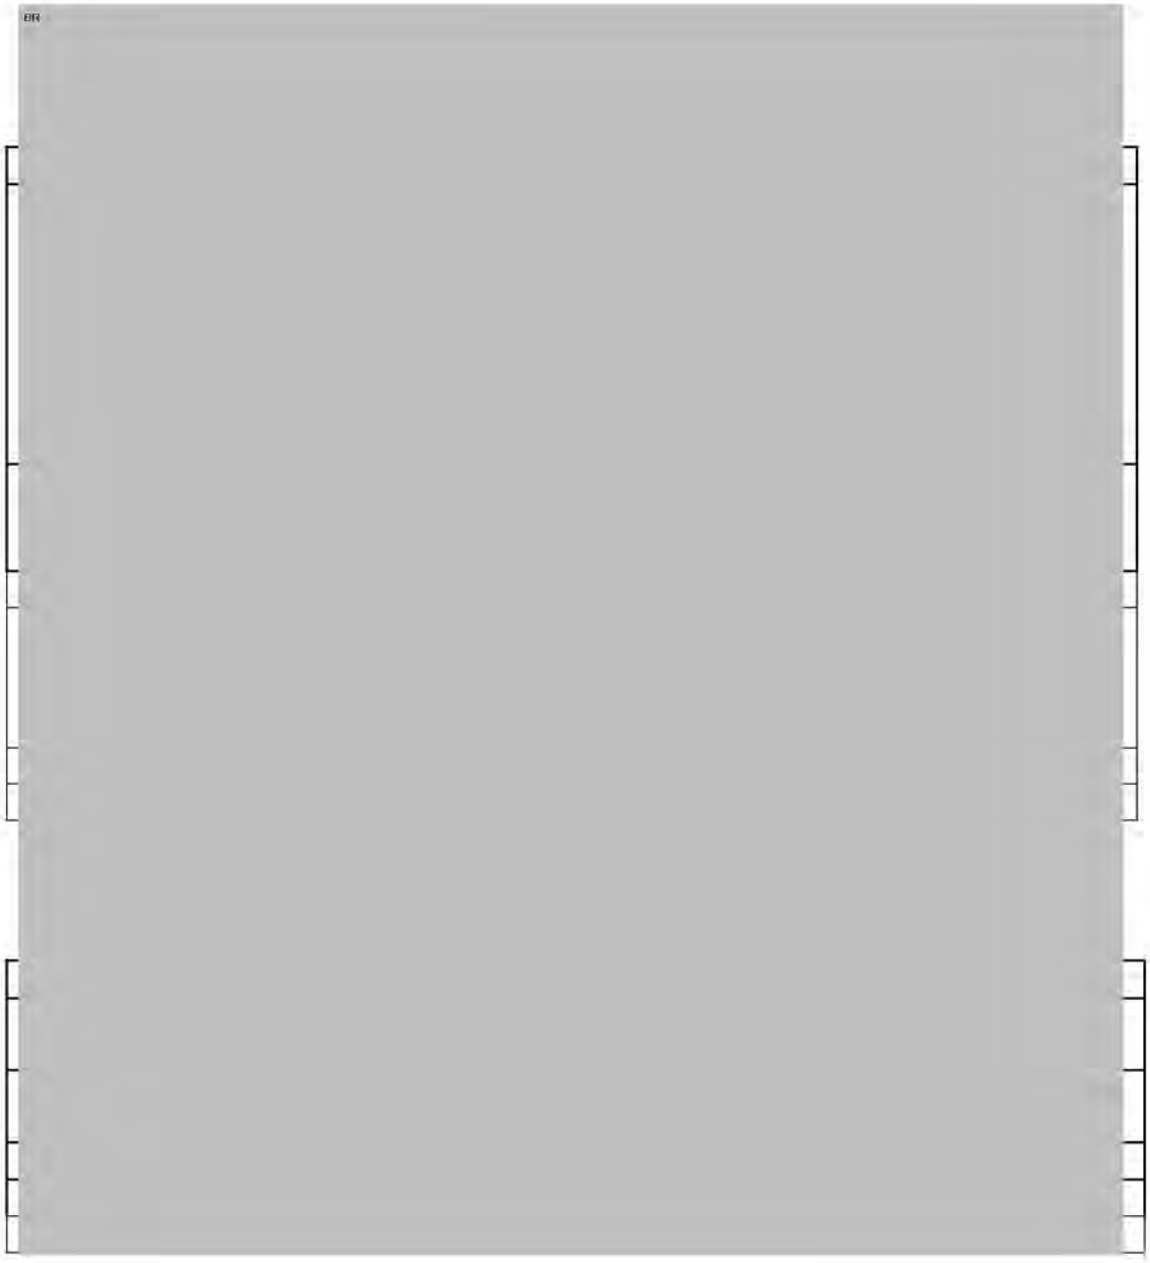
BR

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Samenwerkingsovereenkomst afronden met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. | Partijen hebben op hoofdlijnen overeenstemming over de samenwerkingsovereenkomst. Ook de akte voor grondruil en zakelijke rechten is opgesteld. Naar verwachting kan in het vierde kwartaal tot formele afronding overgegaan worden. |
| Samenwerkingsovereenkomst afronden met Provincie t.a.v. gedeeltelijke vervanging oeverconstructie langs Vliet. | De SOK tussen Den Haag en provincie Zuid Holland omtrent vervangen oeverconstructie is bijna gereed voor ondertekening. Over de financiën is al overeenstemming bereikt.<br>Vooruitlopend op de ondertekening van de overeenkomst vindt er al overleg plaats tussen de Provincie en Den Haag over het DO. |
| BR | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Samenwerkingsovereenkomst afronden met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. |
| Afronden samenwerkingsovereenkomst met Provincie t.a.v. gedeeltelijke vervanging oeverconstructie langs Vliet. |
| BR |

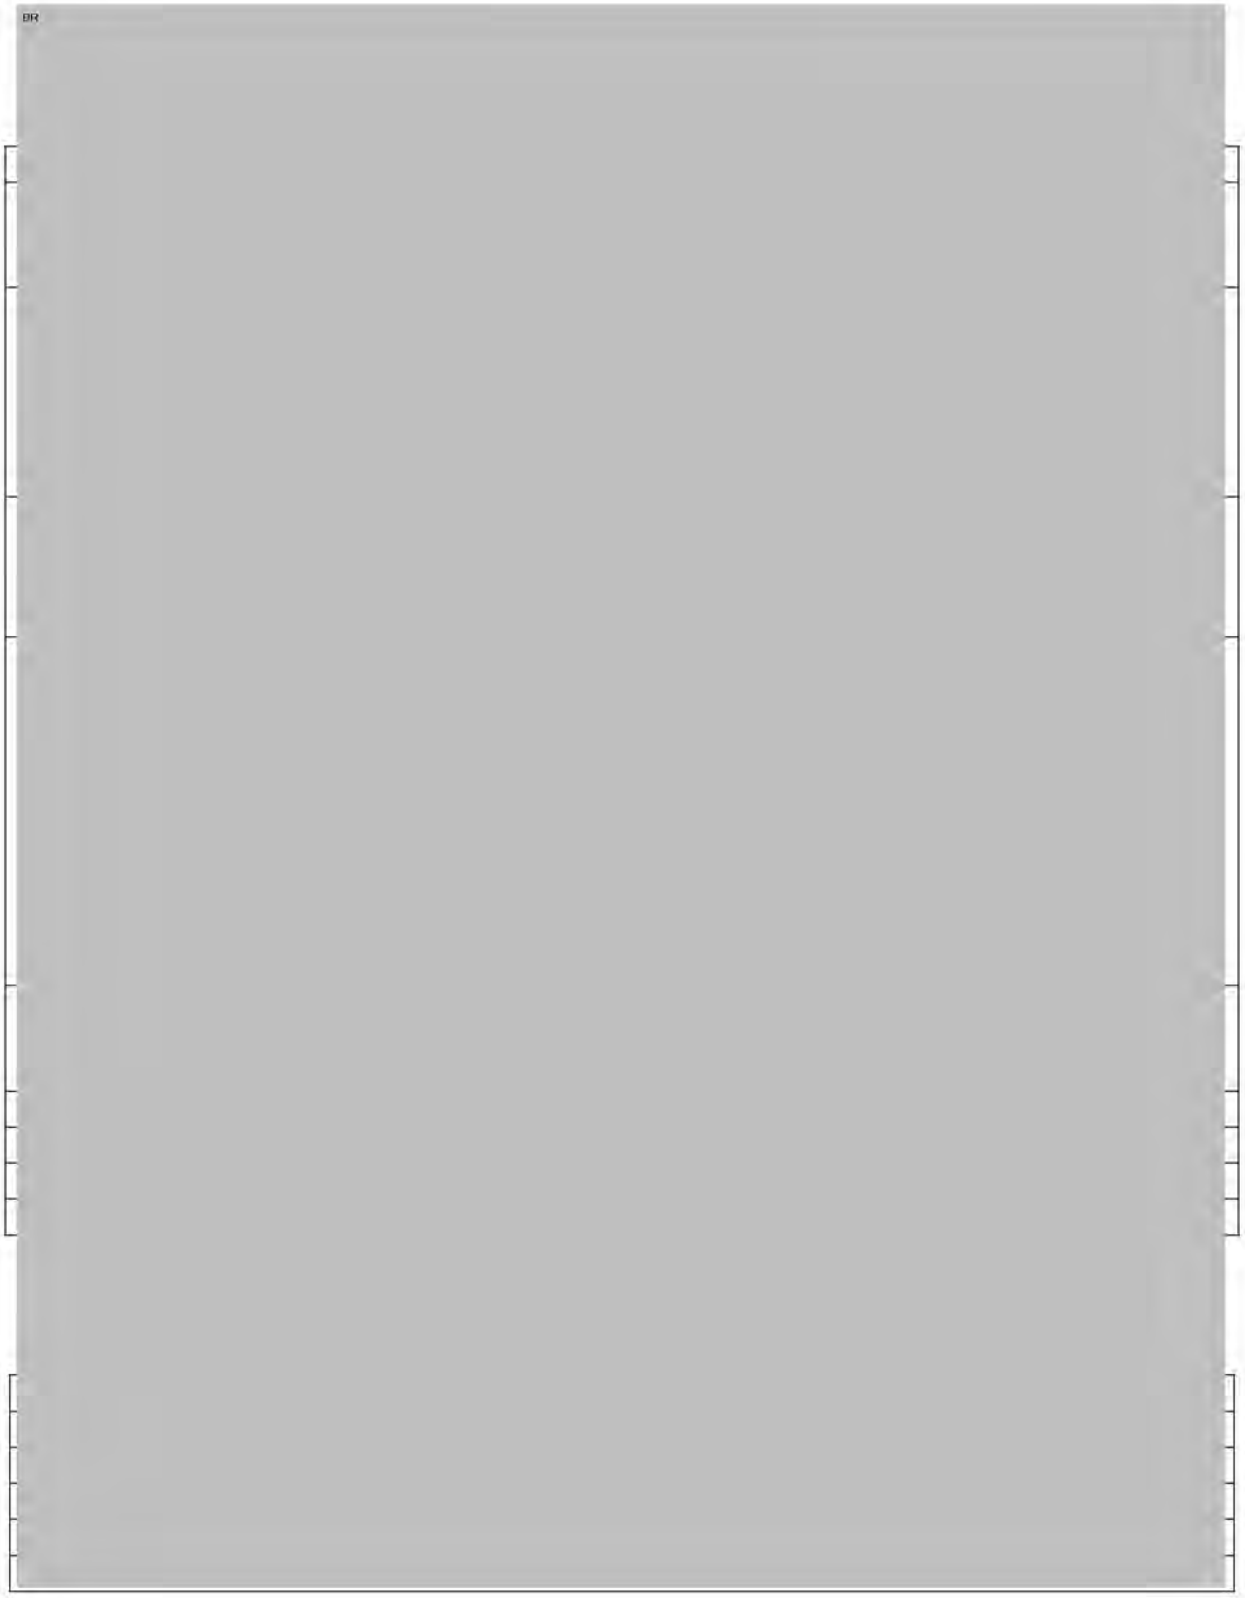
BR

BR

Docnr24



# 3 Projectvoortgang

## 3.1 Aanbesteden en contracteren

### 3.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Voorbereiding contractering en aanbesteding tweede watertoevoer. | Er zijn nog diverse issues uit te werken alvorens tot voorbereiding van de aanbesteding te komen startend met een aanbestedingsstrategie voor de Tenderboard. |
| [redacted] | |

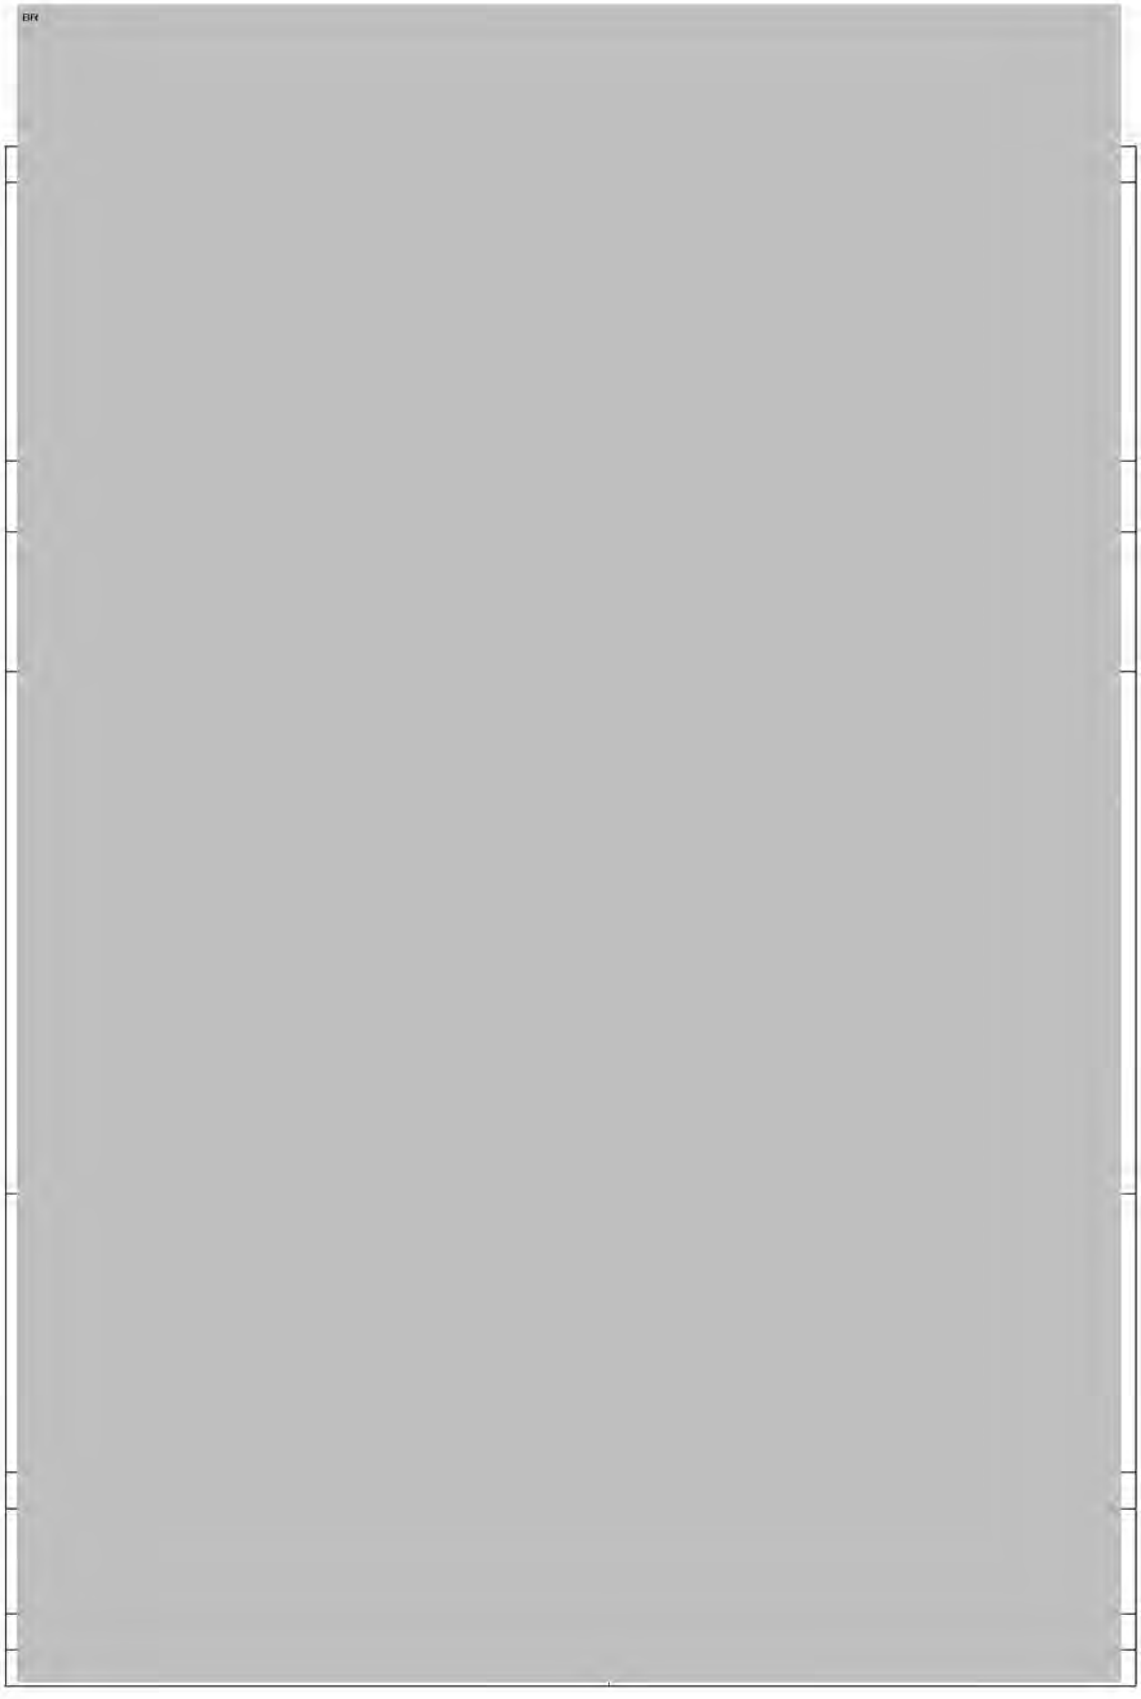
BR

BR

BR

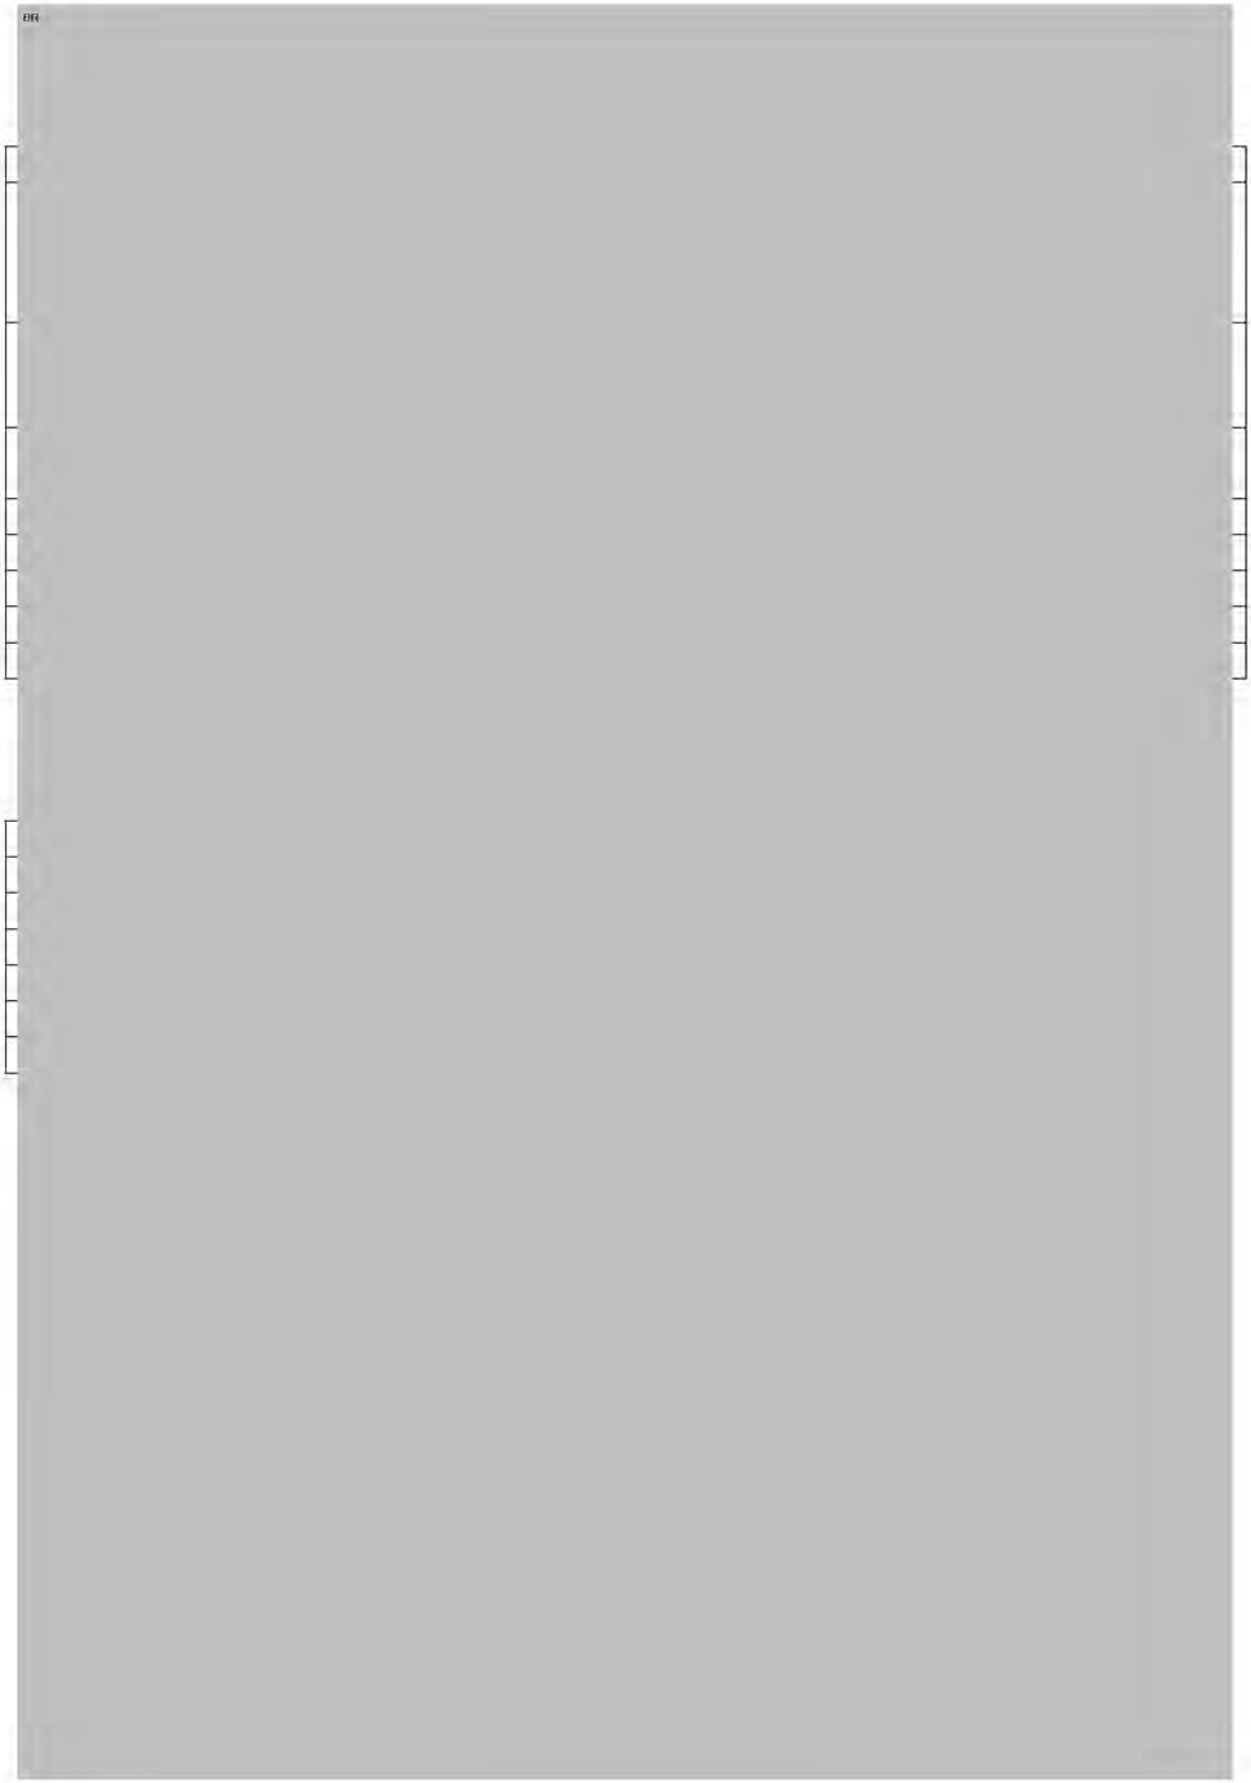
BR

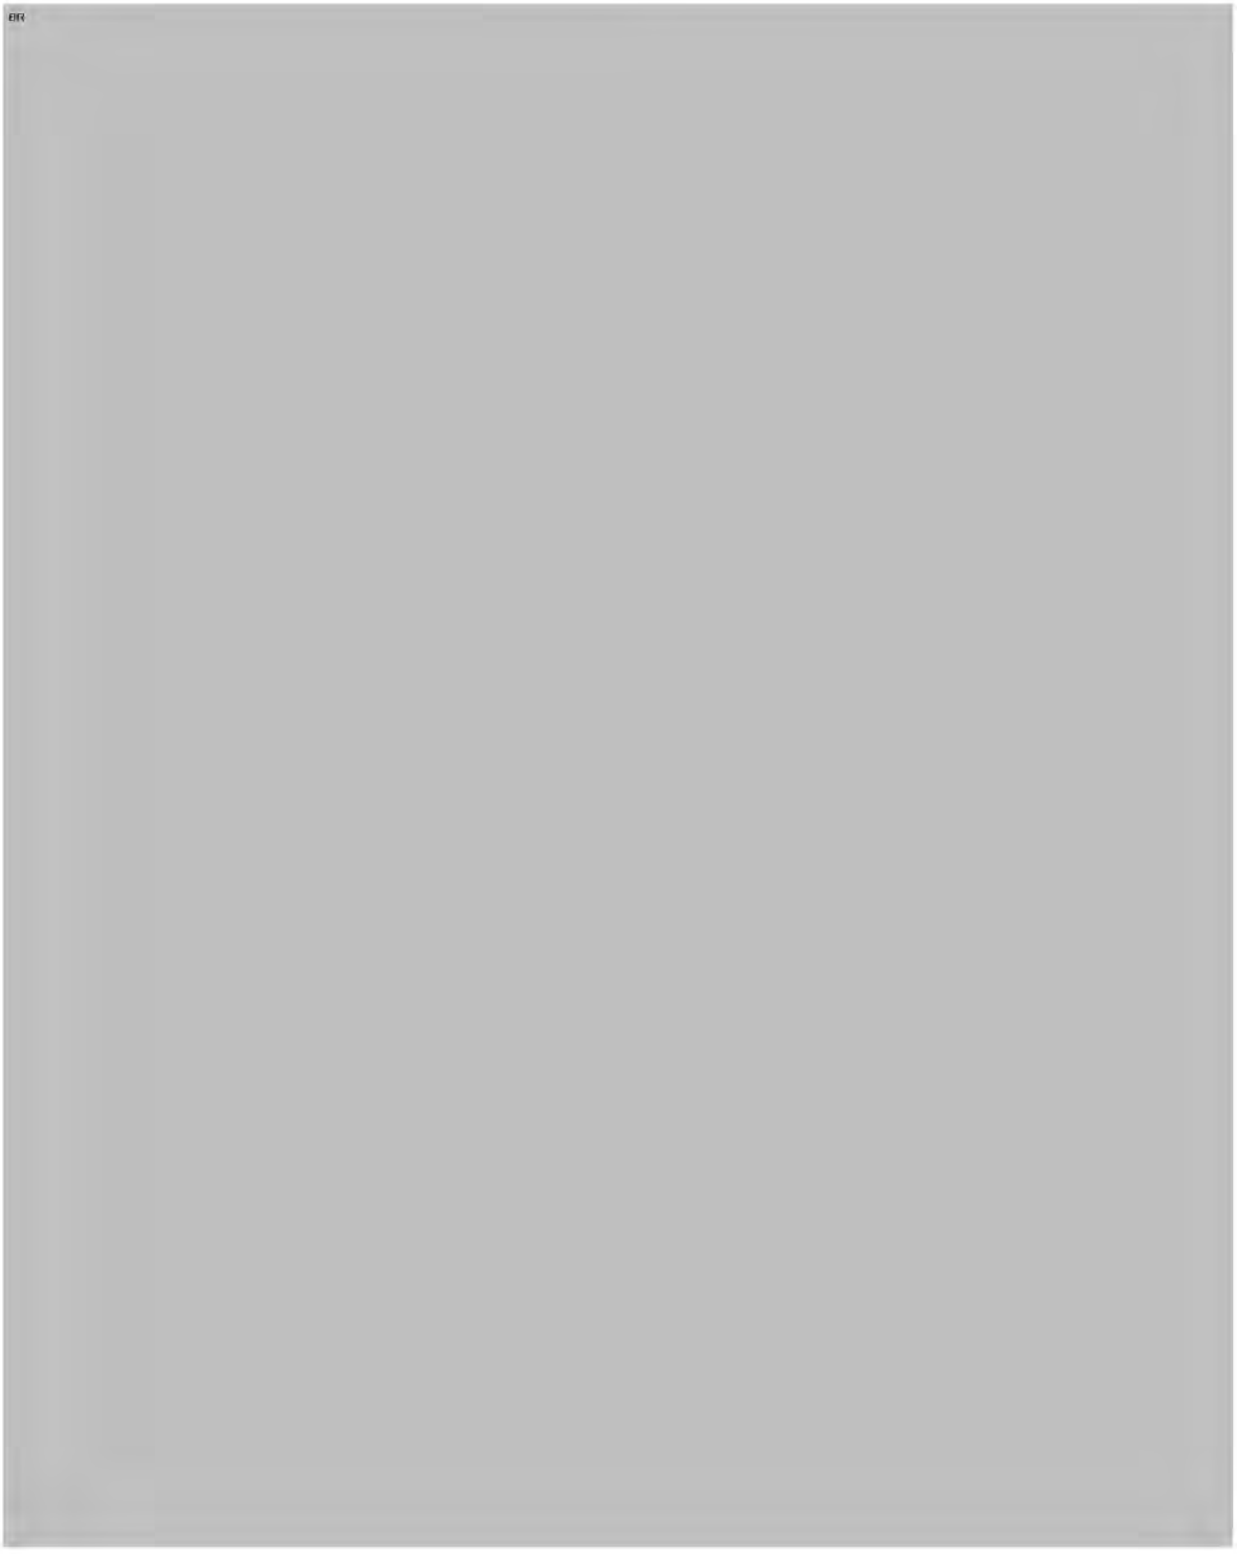

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Werkzaamheden inrichting Molenvlietpark voortzetten. | Rond de bouwvakperiode is de inrichting van het Molenvlietpark voortgezet. Het voormalige parkeerterrein van Drievliet is verwijderd t.h.v. de calamiteitenberging. De watergang langs Drievliet is gegraven. Op het moment van schrijven wordt de kade op het voormalige parkeerterrein aangelegd. |
| Realisatie recreatieve bruggen in Molenvlietpark. | De palen t.b.v. de fundaties van de bruggen zijn aangebracht in het afgelopen kwartaal. |
| Afbouwen aflaat constructie. | Na het uitvoeren van het betonwerk en plaatsen van de kantelstuwen in het vorige kwartaal, is in dit kwartaal duiker 8.2 geplaatst. Deze duiker maakt de toevoer van water vanuit de Molensloot richting het calamiteitengebied mogelijk. Verder is duiker 8.1 (een verbinding tussen de vispaaiplaats en de Molensloot) aangelegd. |
| [redacted] | |

### 3.5.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| Realiseren bruggen en kade in het Molenvlietpark. Vervolgens wordt rondom de kunstwerken het calamiteitengebied ingericht en afgewerkt. |
| BR |

Realisatie duiker 8.2 t.h.v. de aflaat in he Molenvlietpark

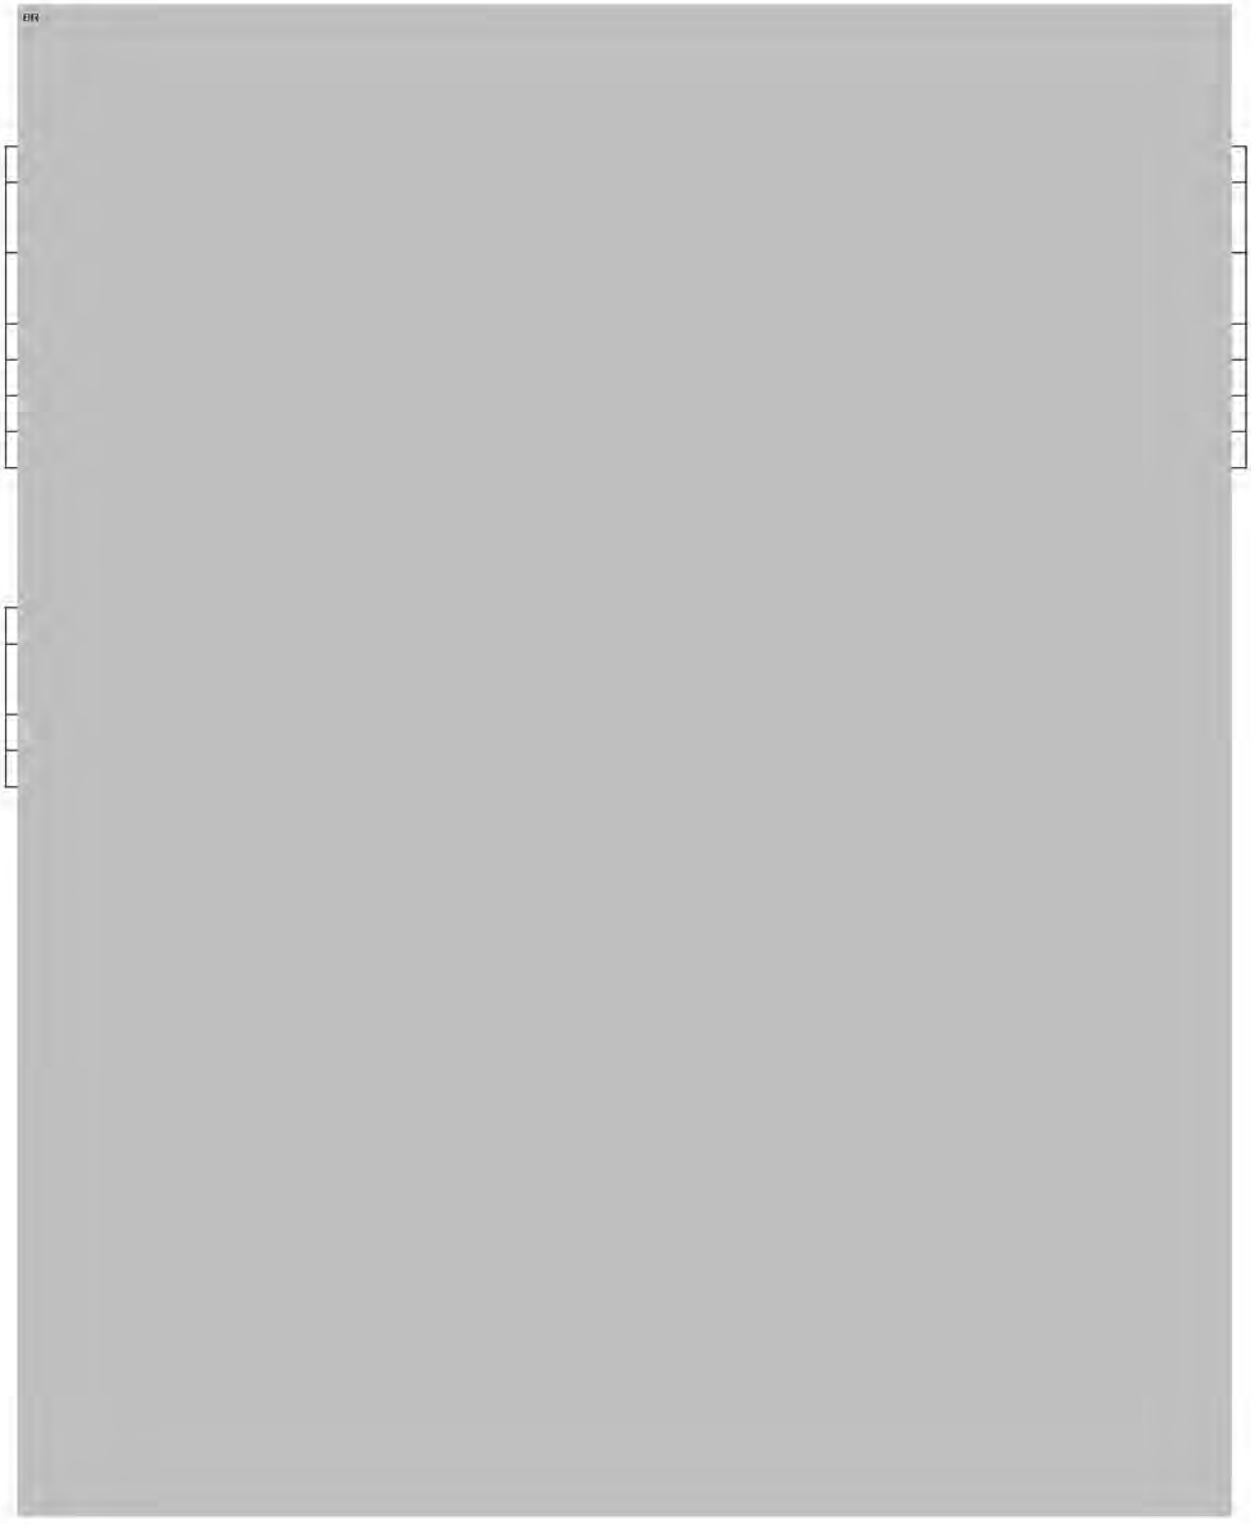

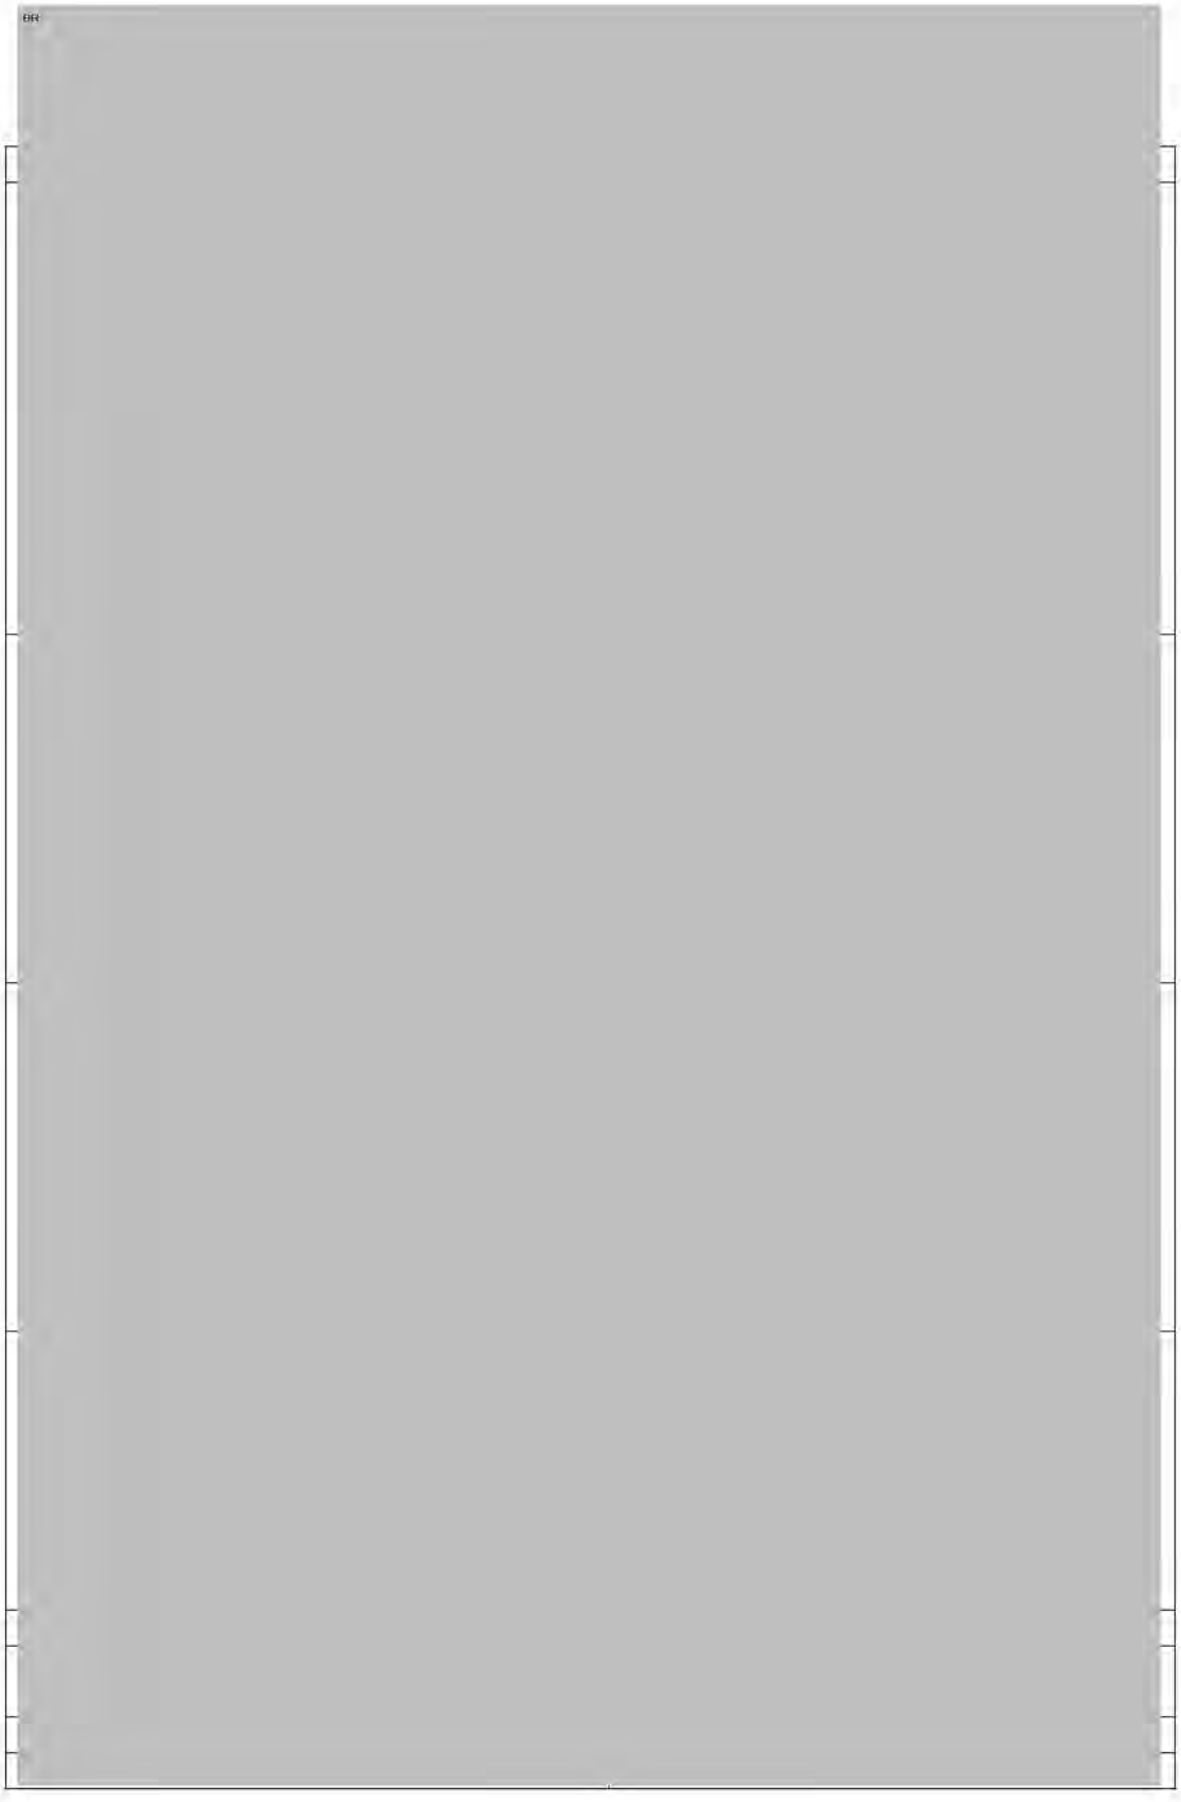

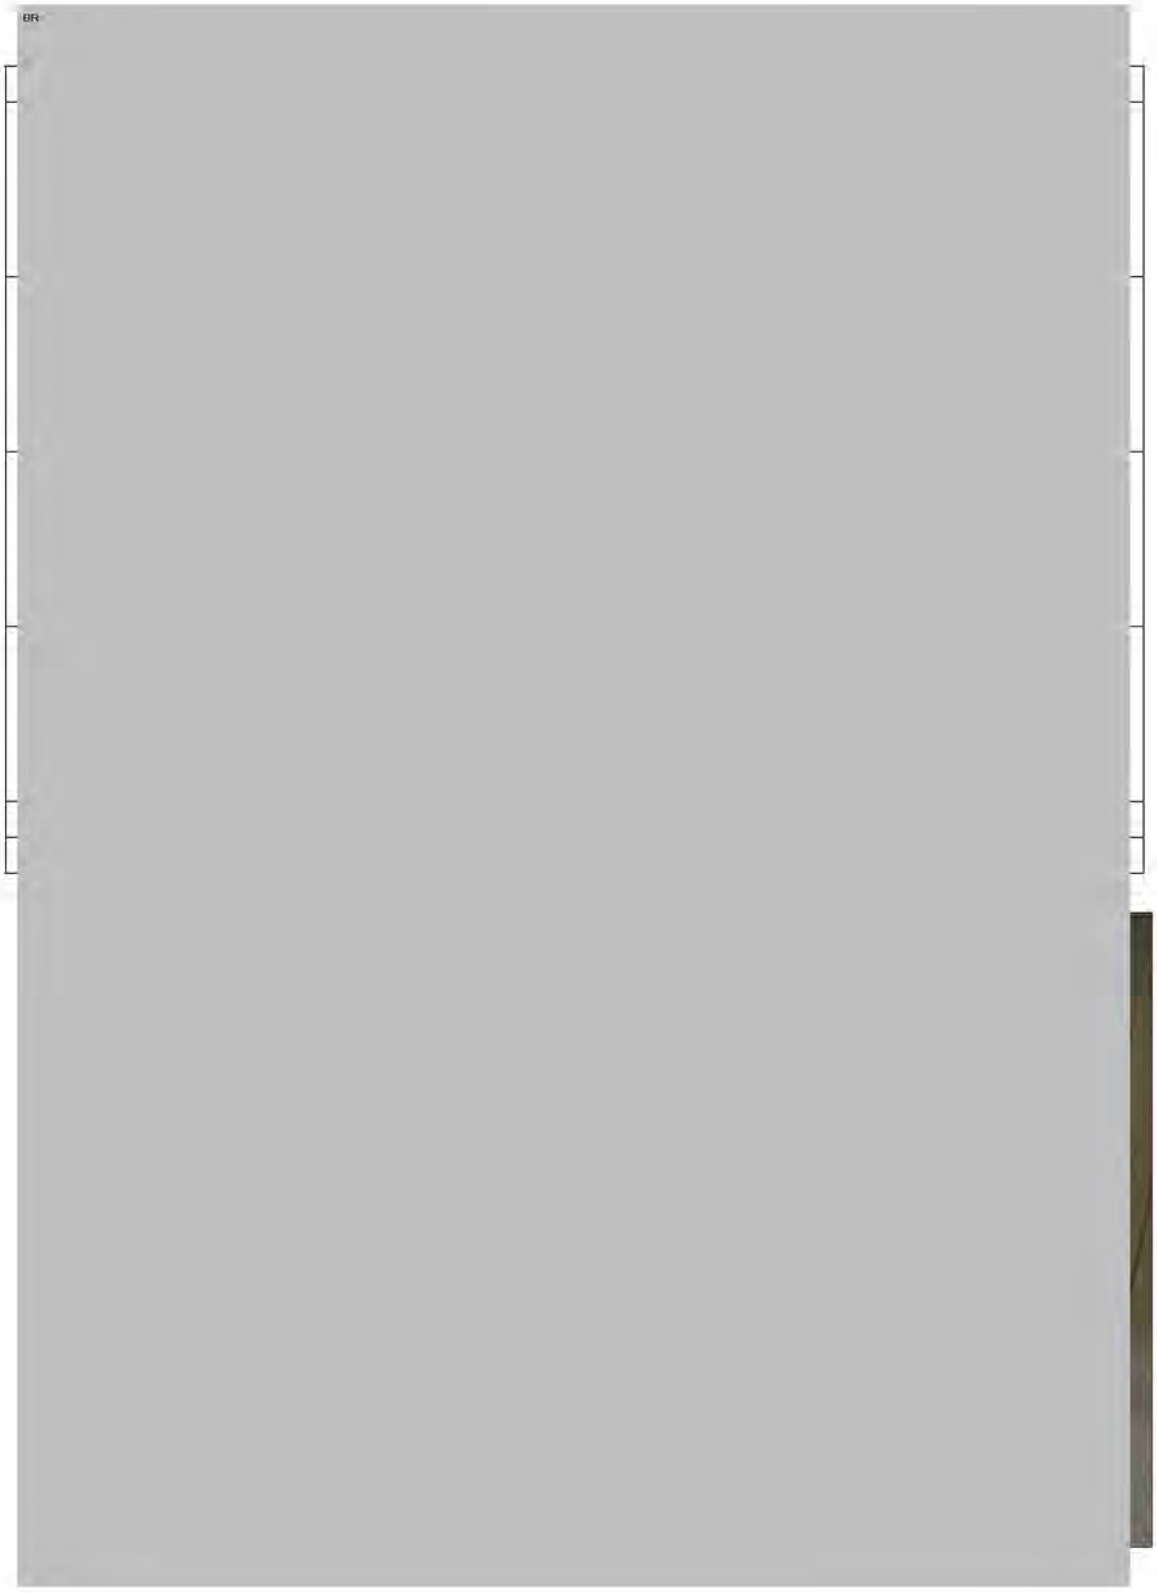

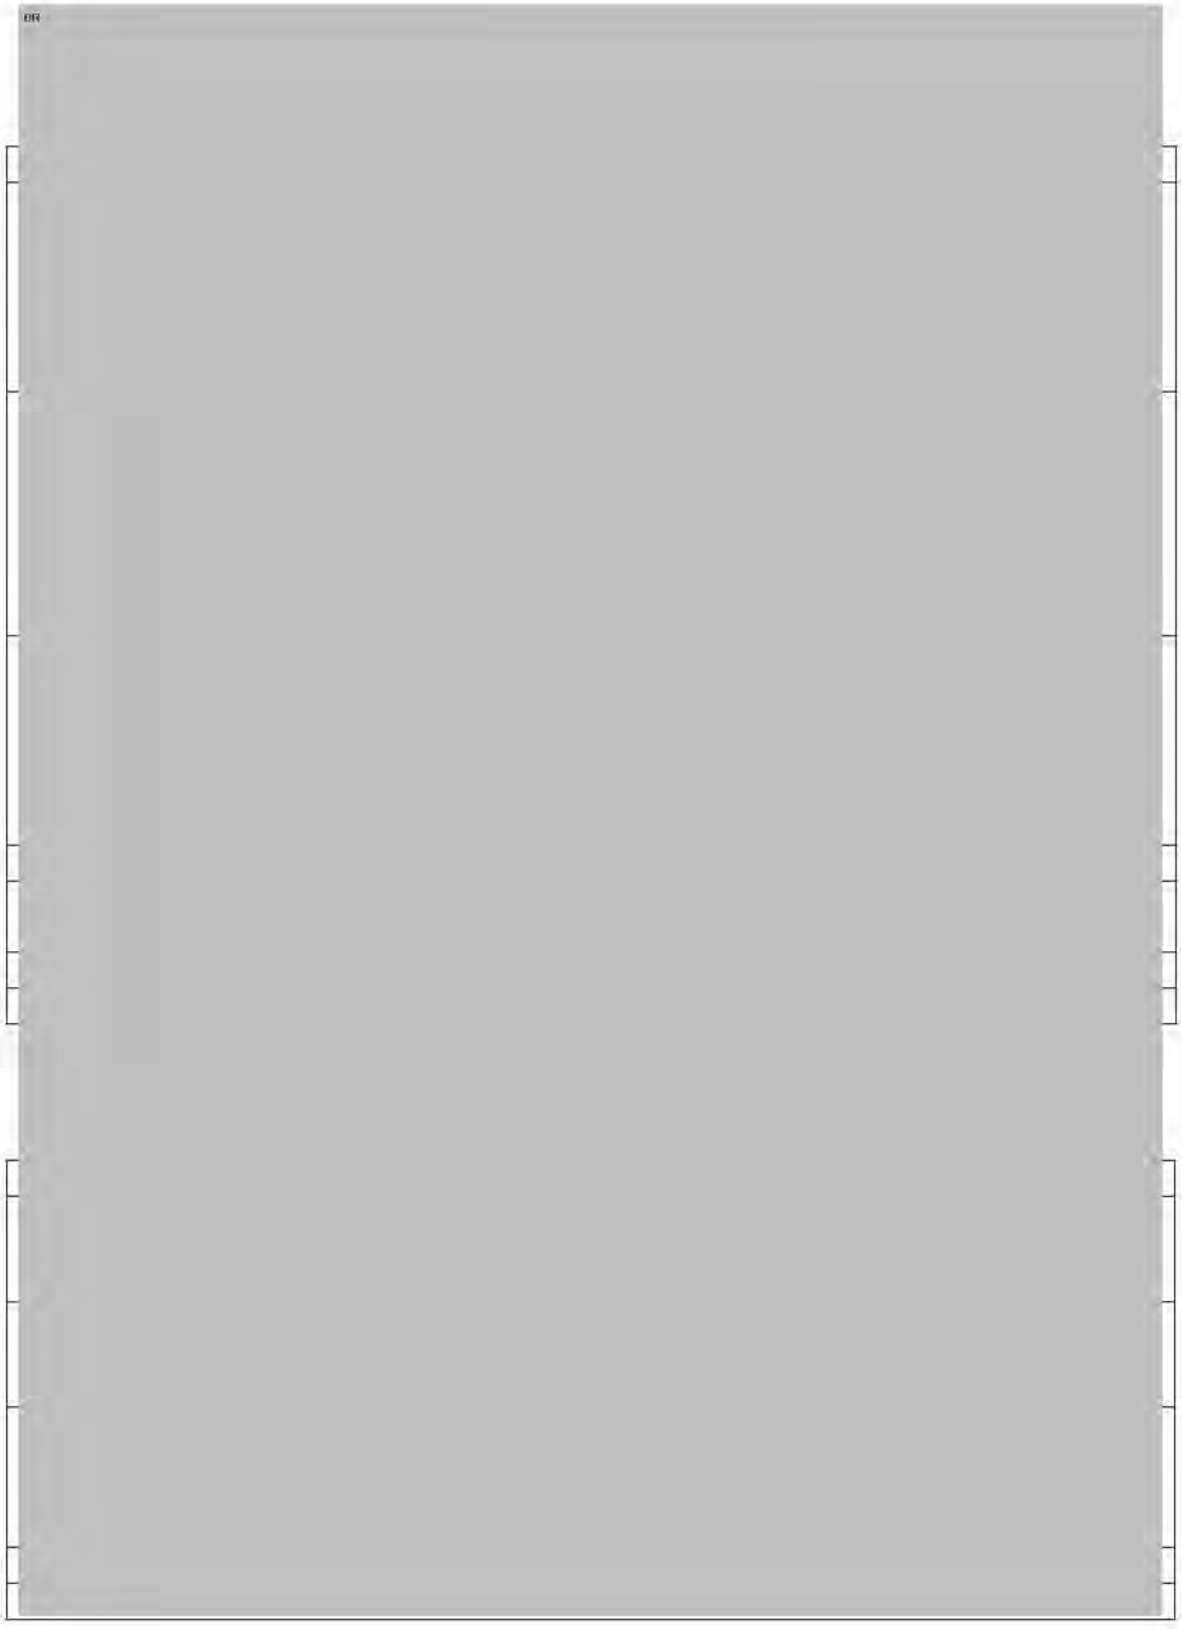

BR

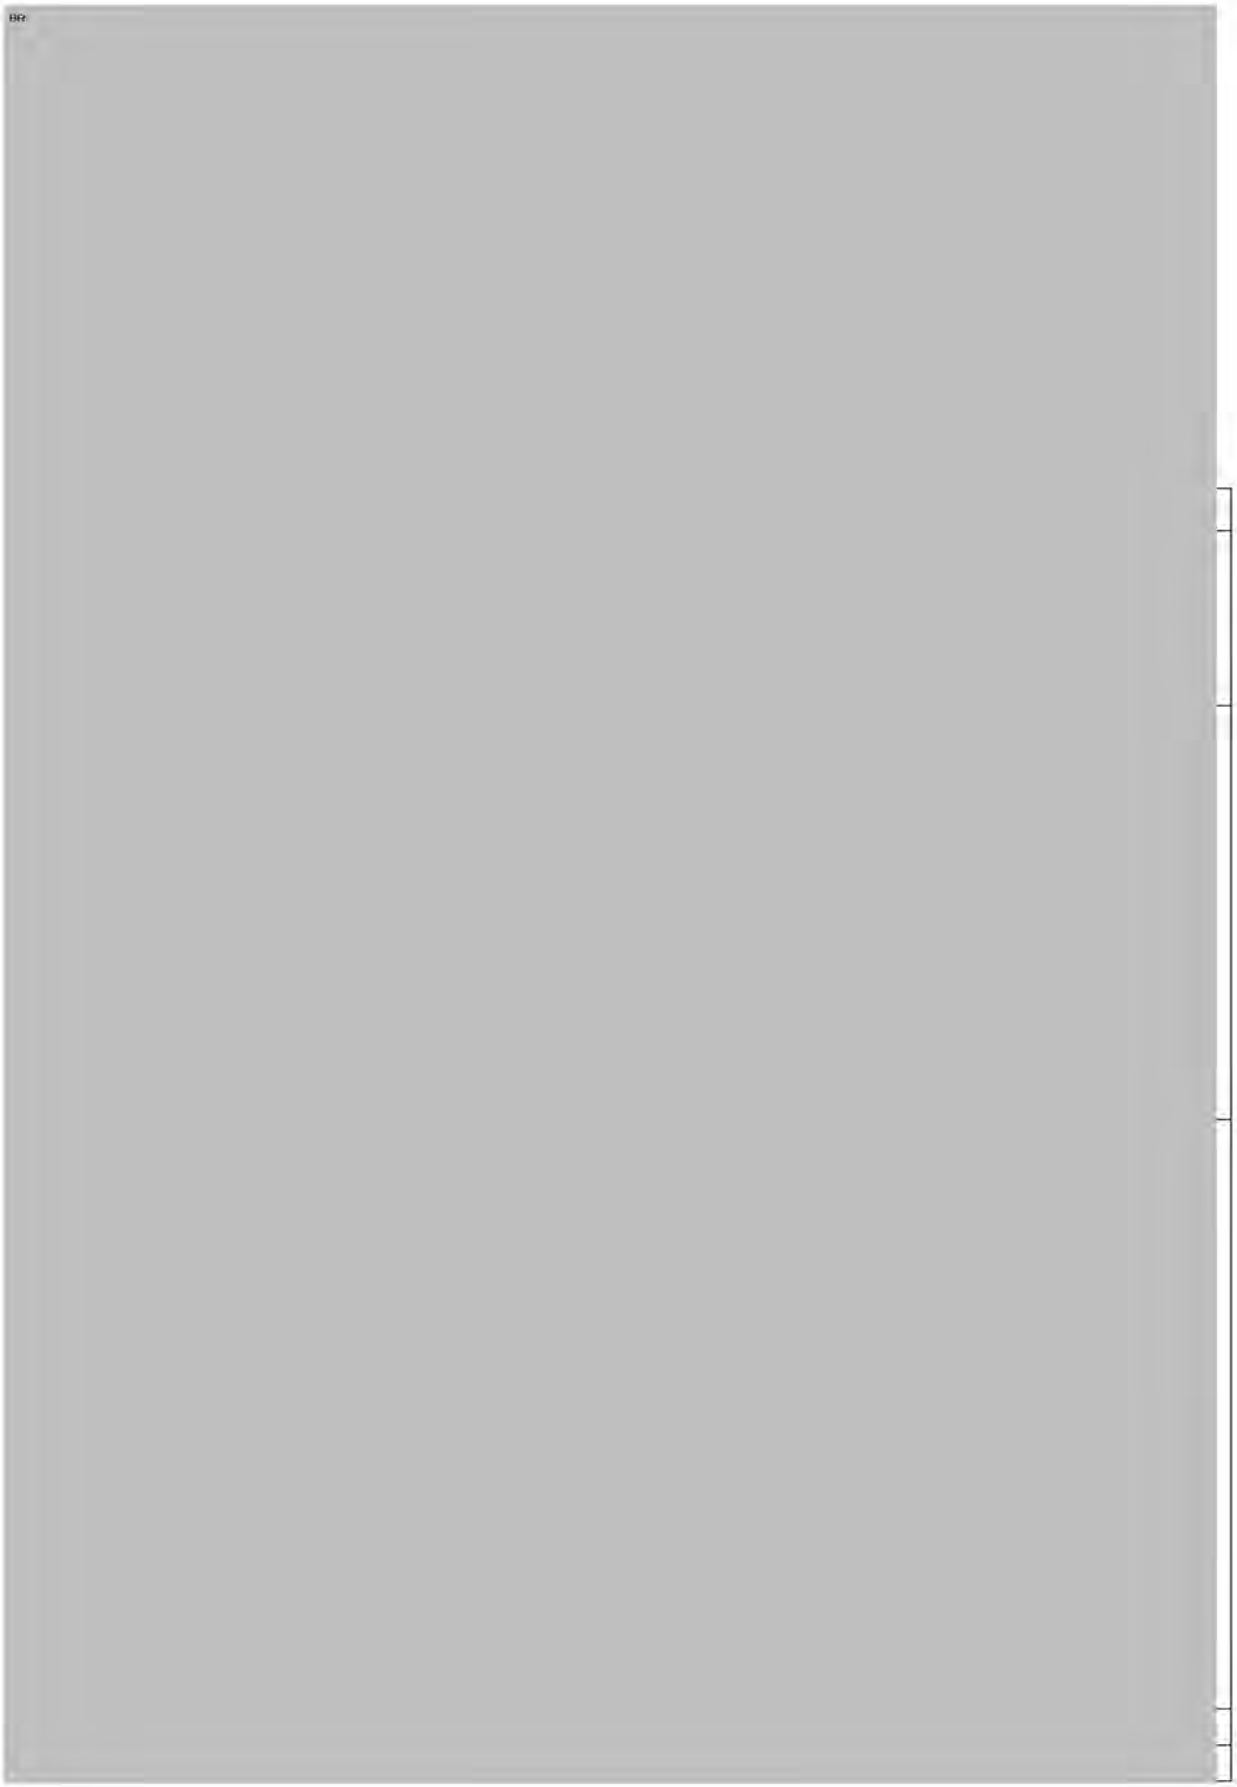

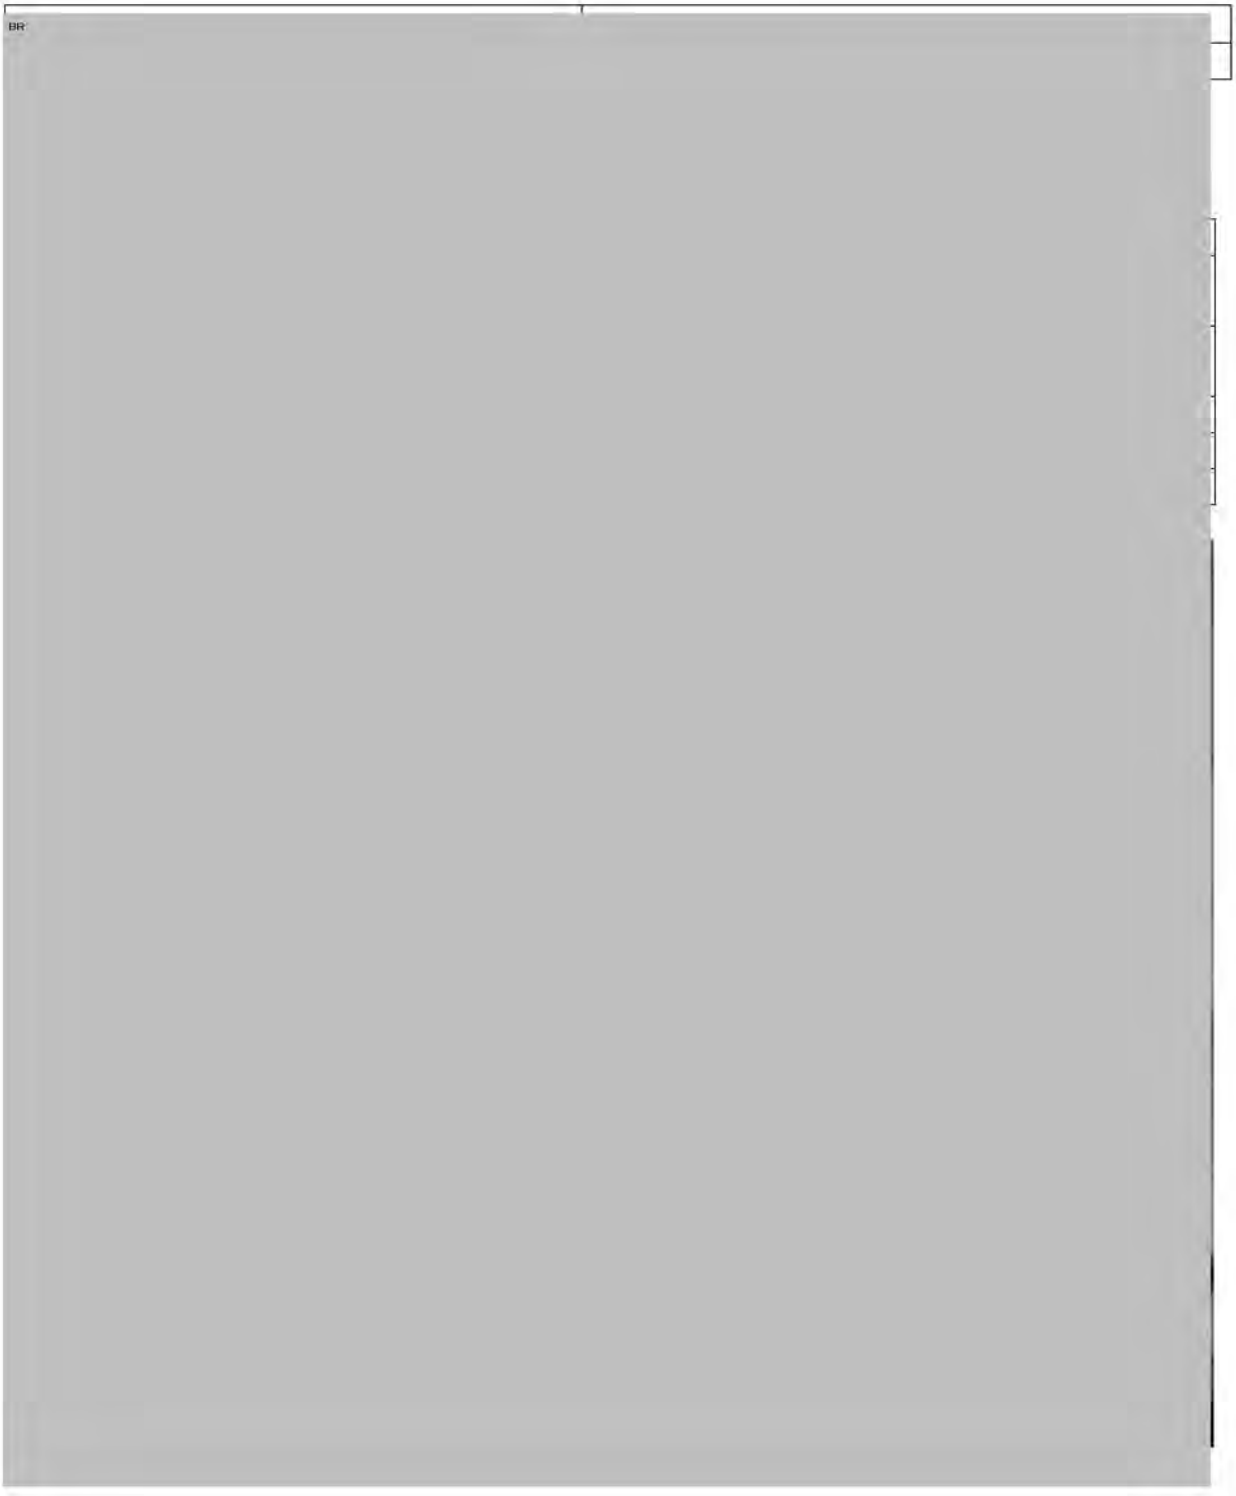
BR

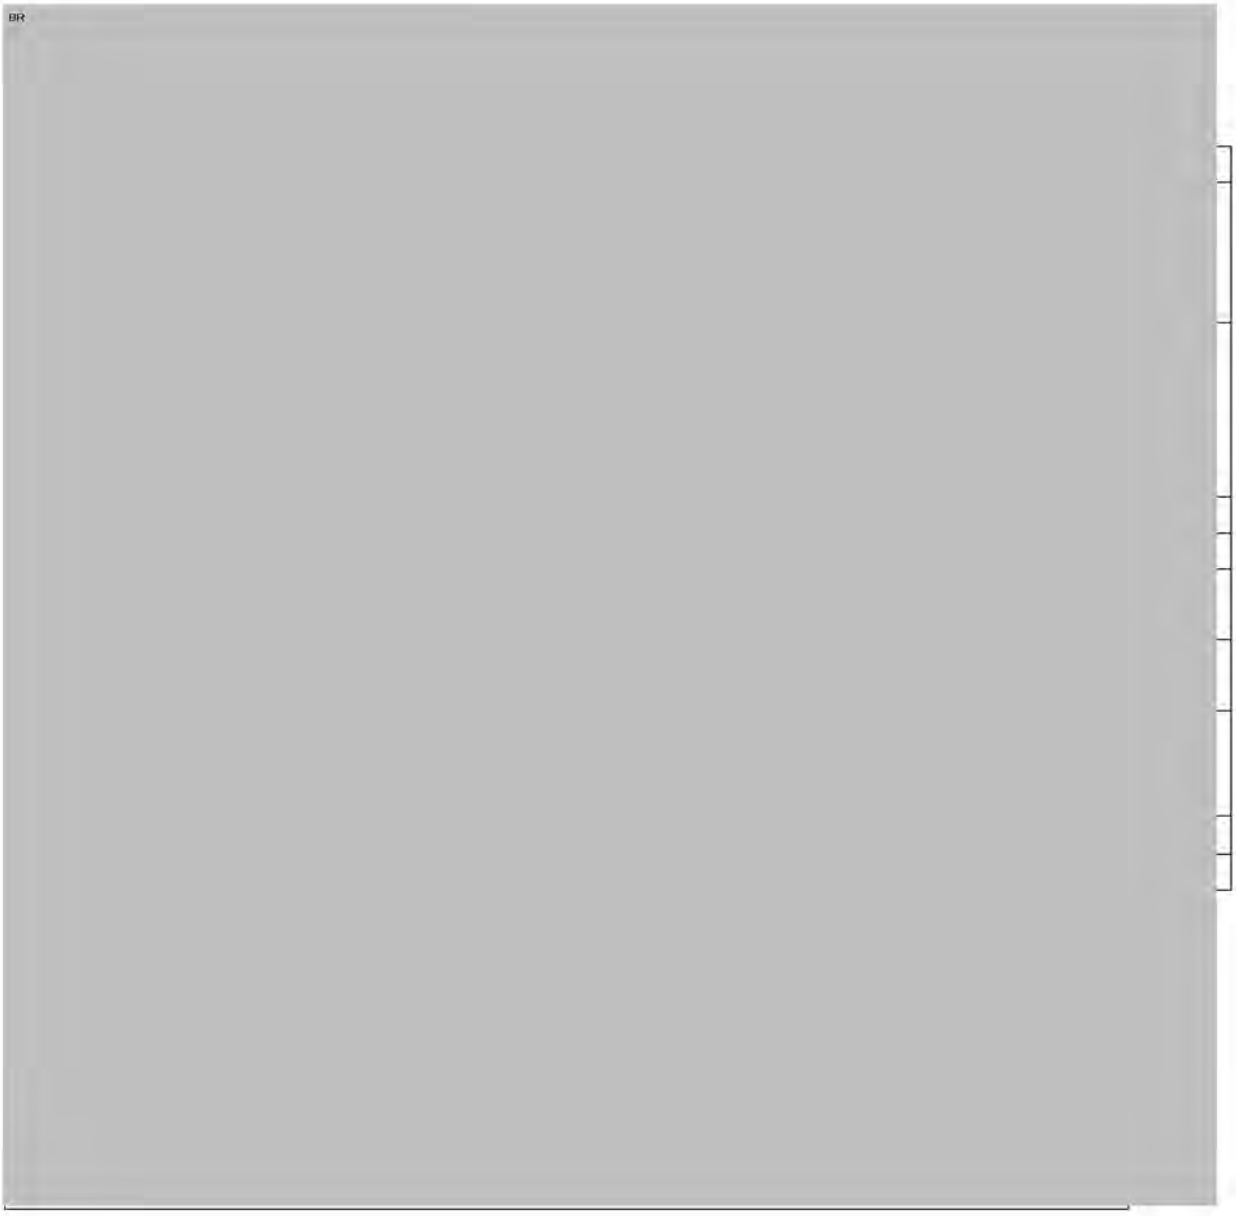
BR

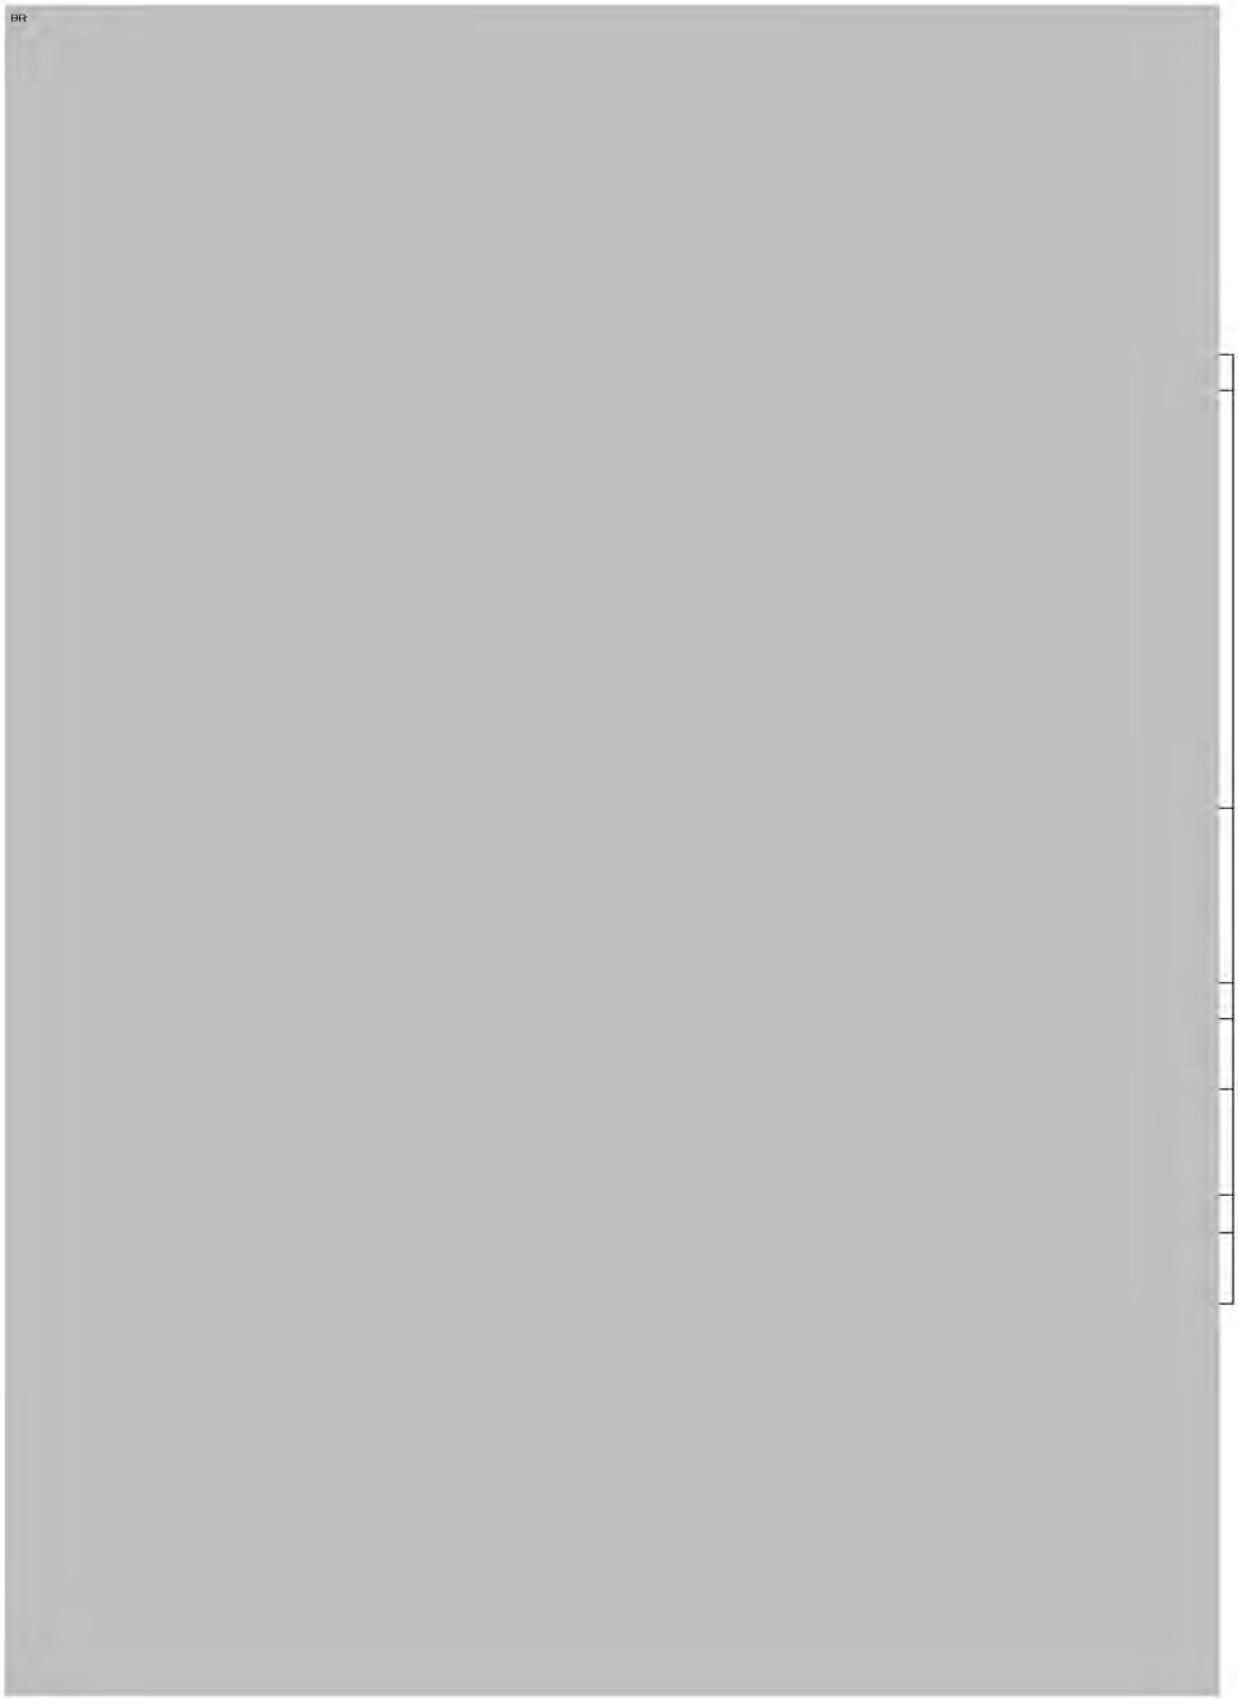
BR

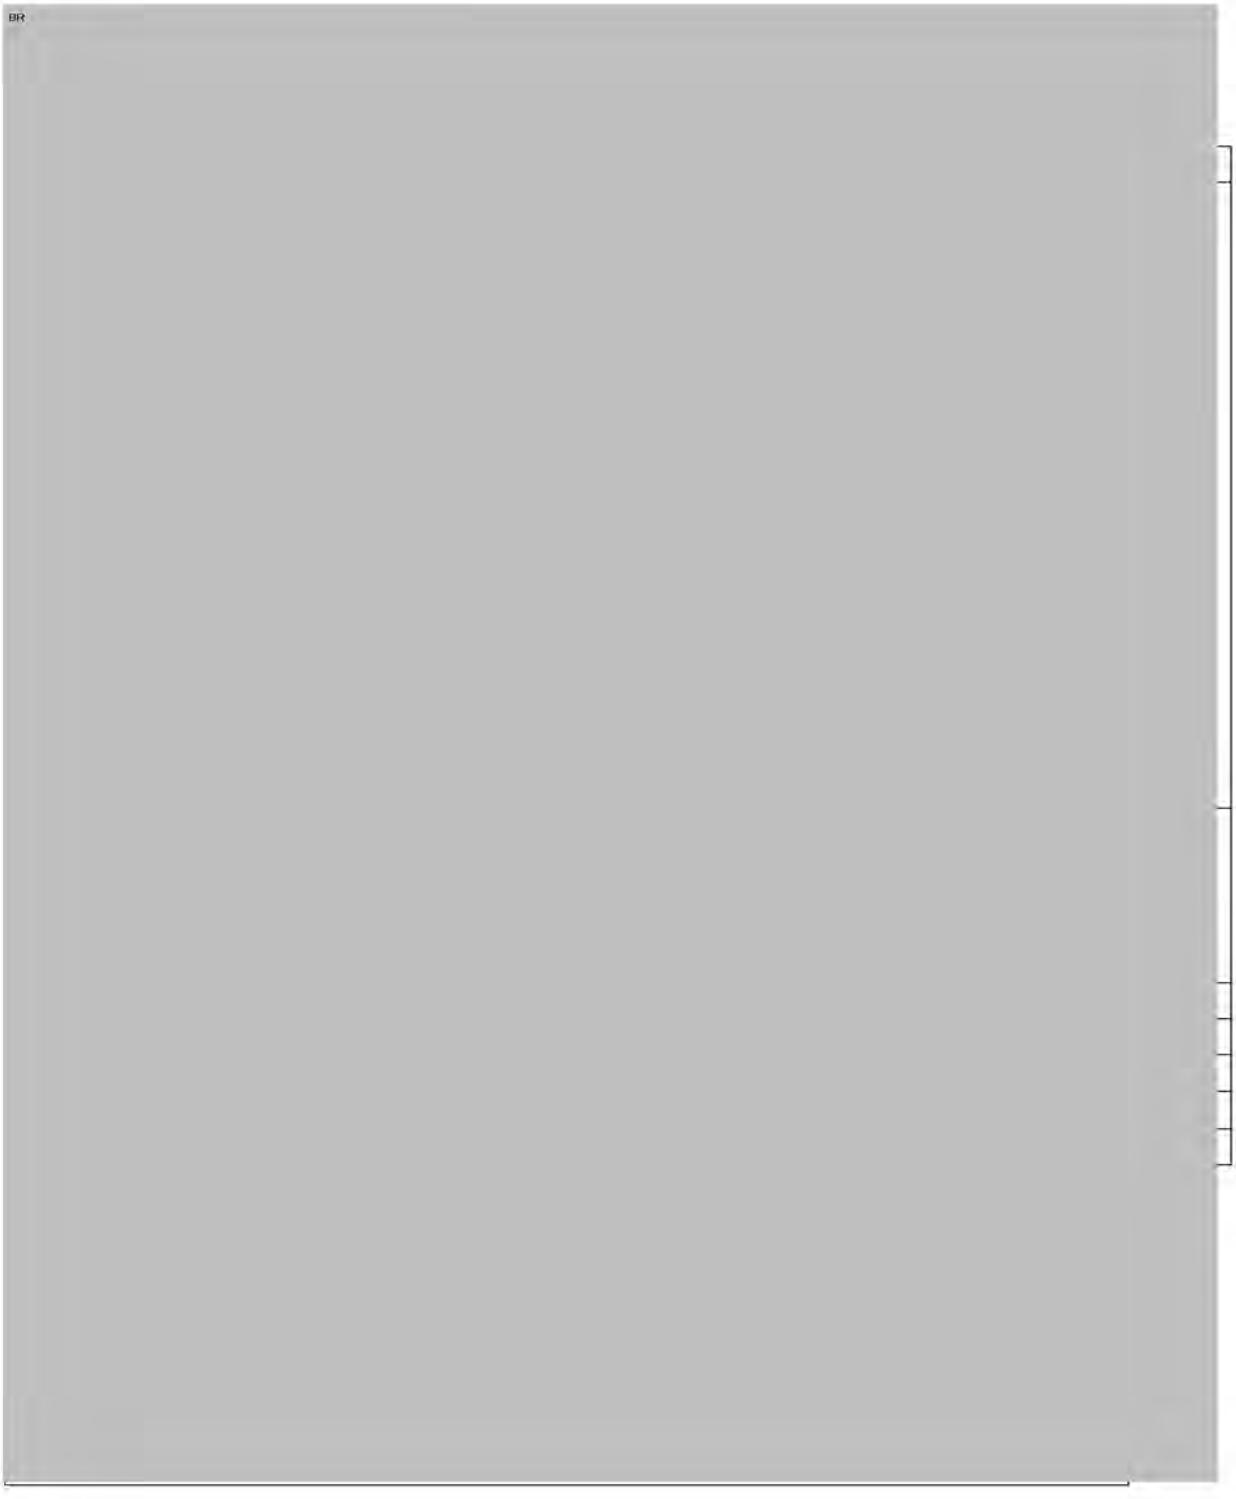
BR

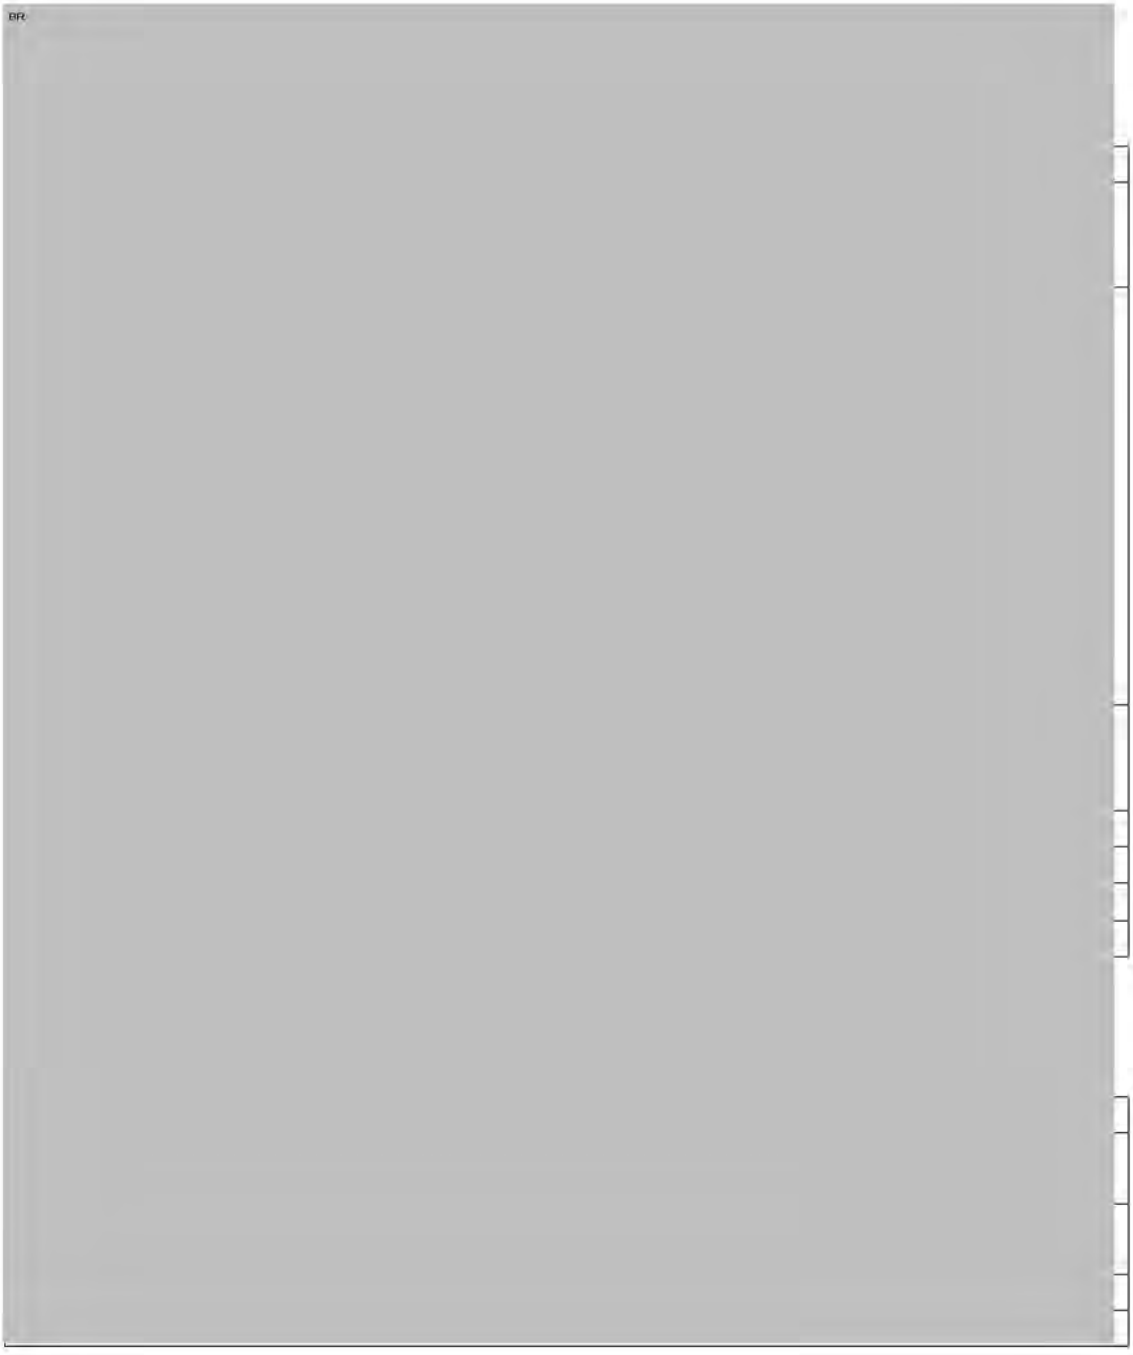

# 4 Overdracht en openstelling

Docnr24



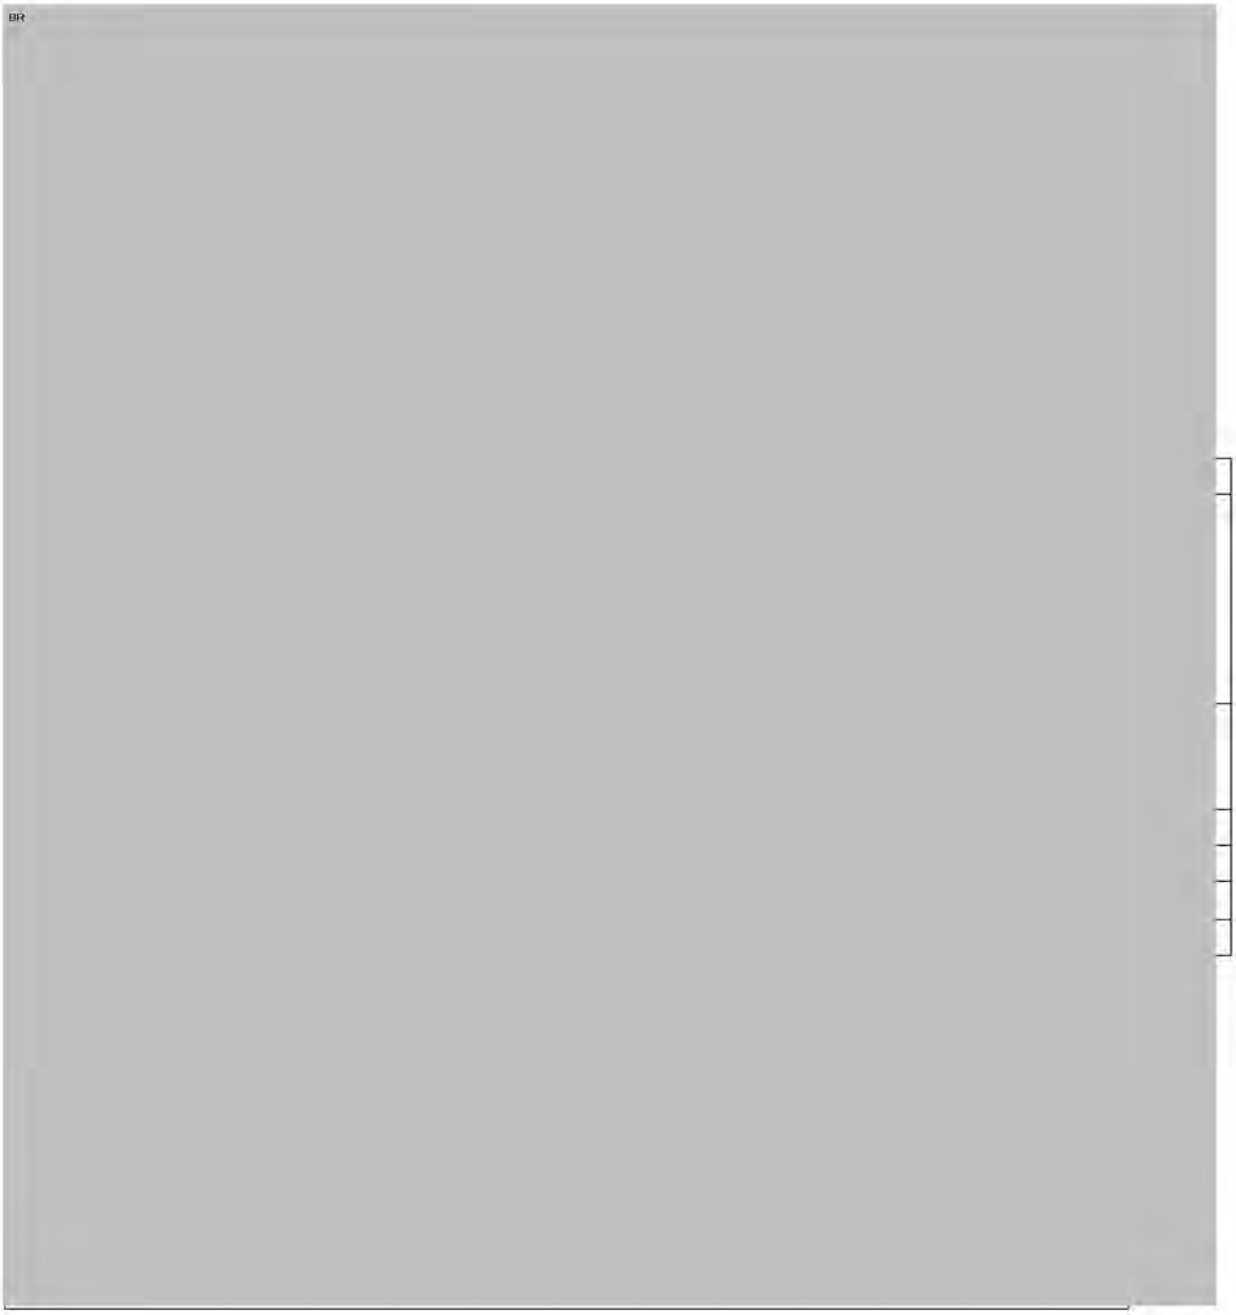

Docnr24



# 5 Projectbeheersing

Docnr24



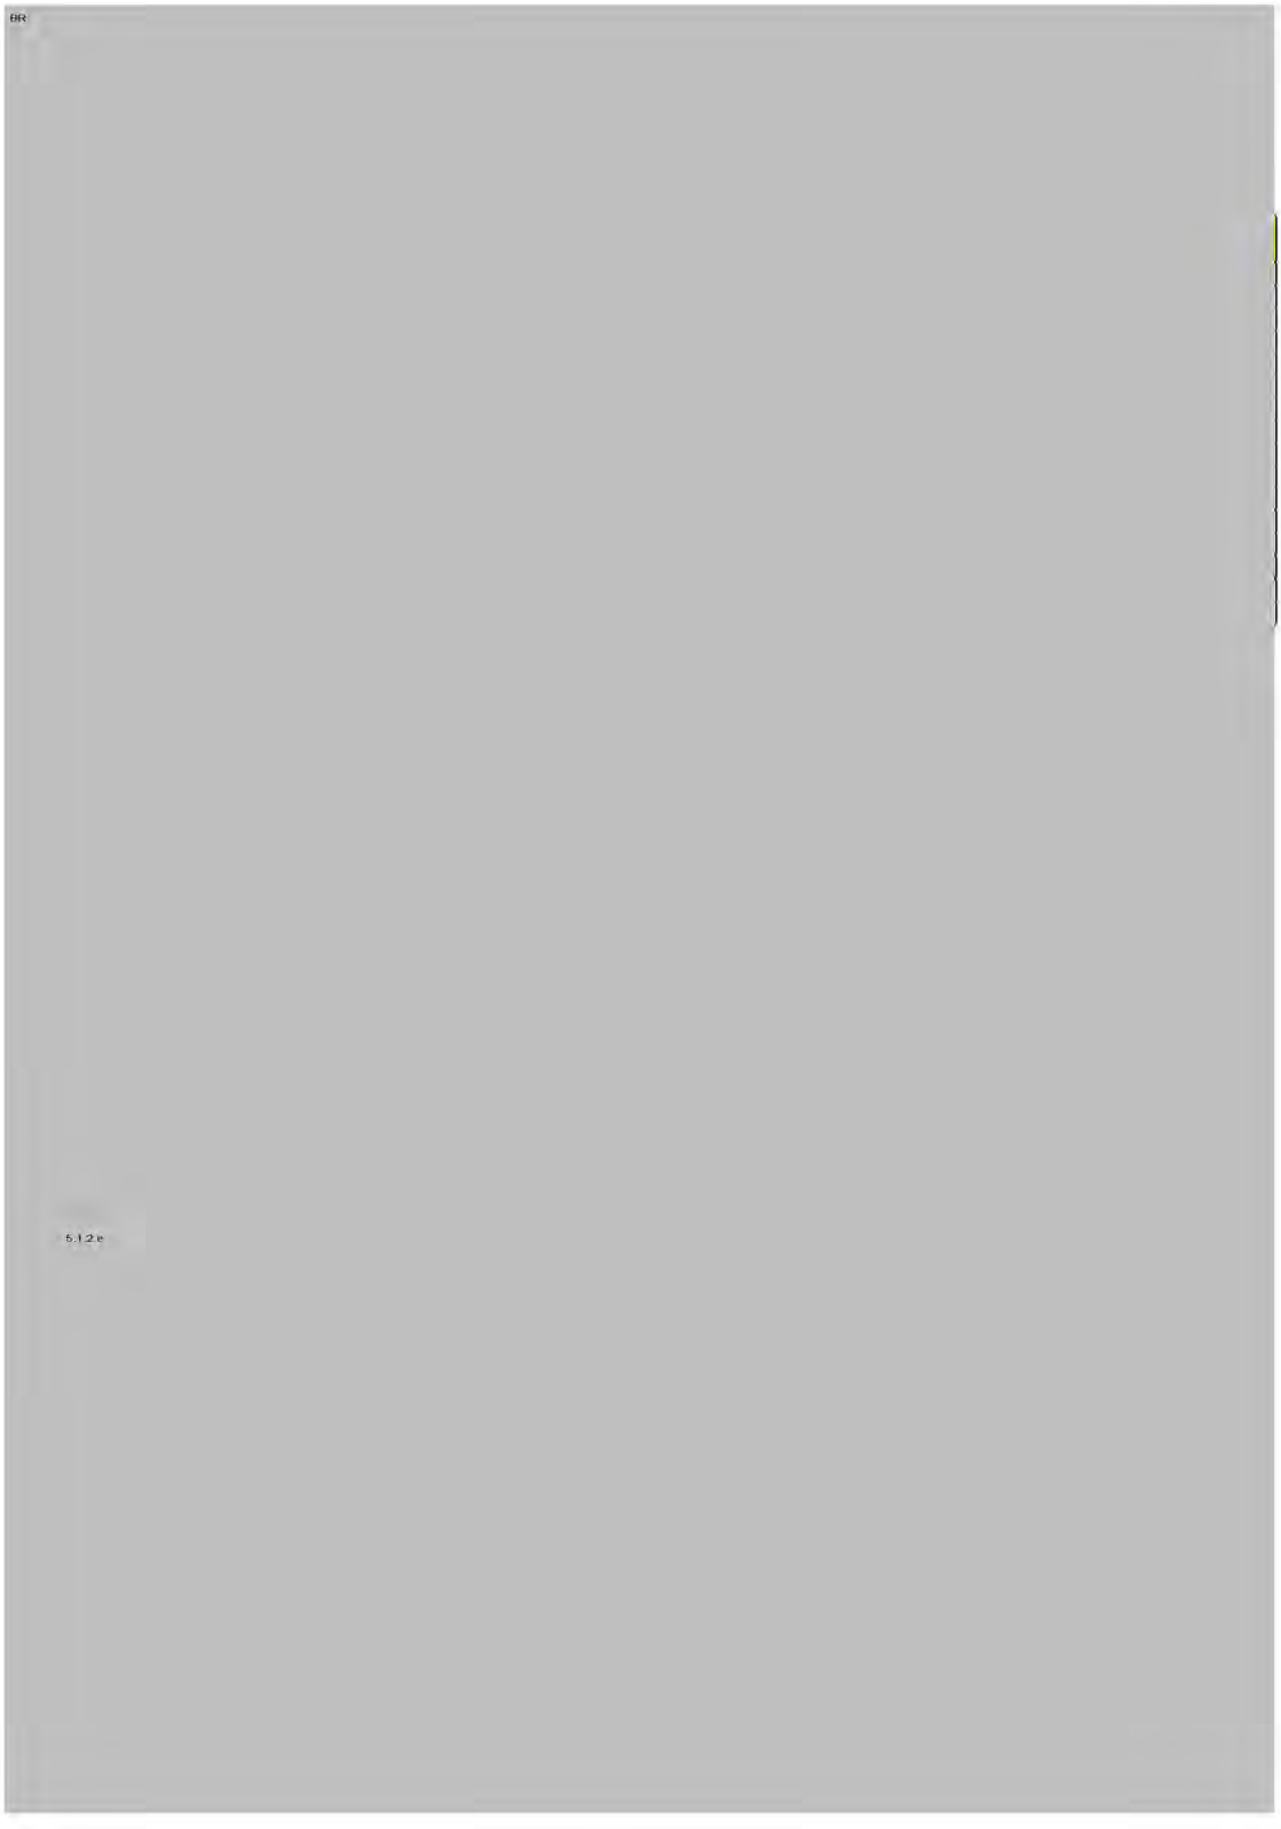

### 5.2.2 Dekkingen

Tabel : Overzicht toegezegde dekkingen Rotterdamsebaan, Euro's prijspeil 2019 (excl. BTW)

Overzicht toegezegde/verwachte dekkingen Rotterdamse Baan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delftland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland
Er zijn in het derde kwartaal 2019 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland

Er zijn in het derde kwartaal 2019 geen mutaties geweest.

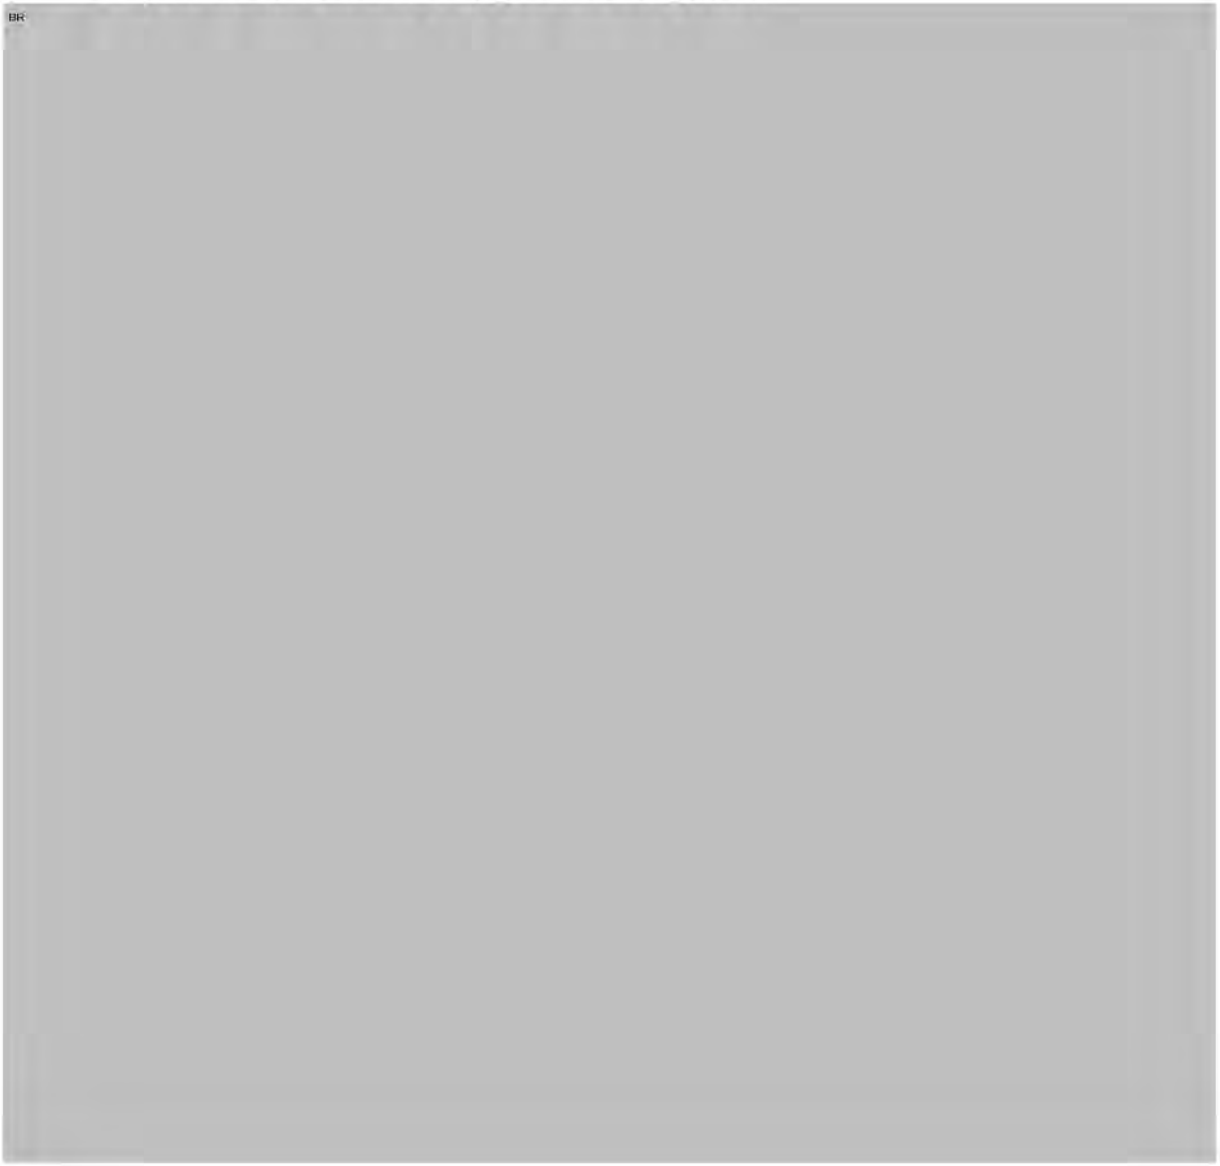

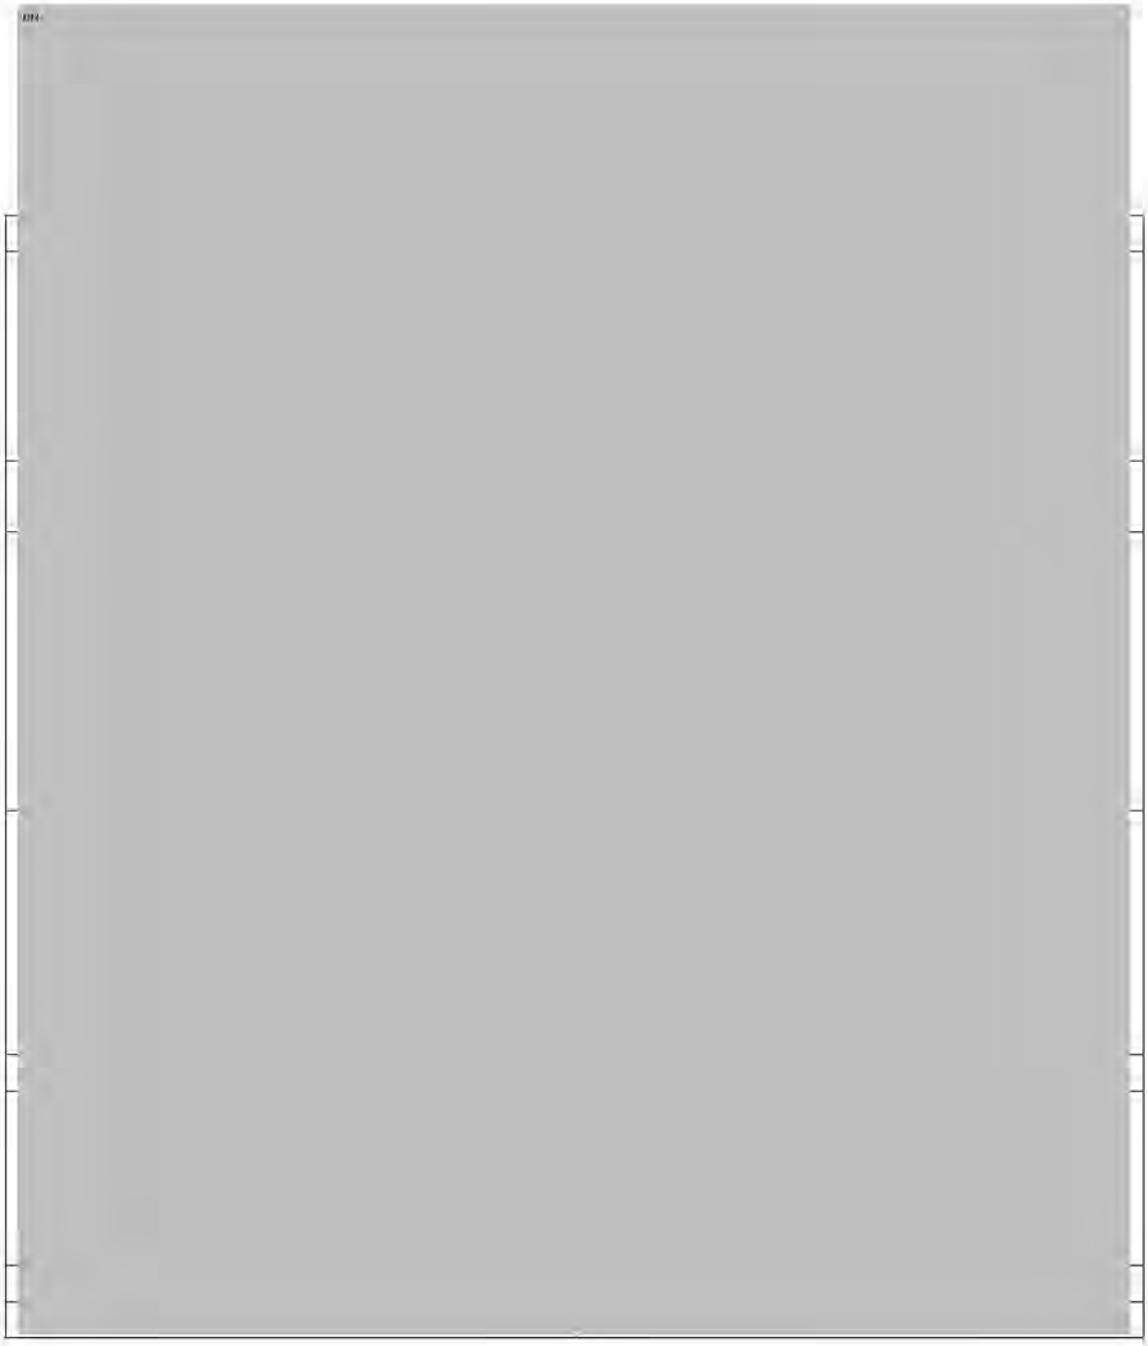

### 5.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| BR |
| Uitvoeren van een onzekerheidsanalyse op tijd en financiën voor de onderdelen Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e watertoevoer naar waterberging: |
| BR |

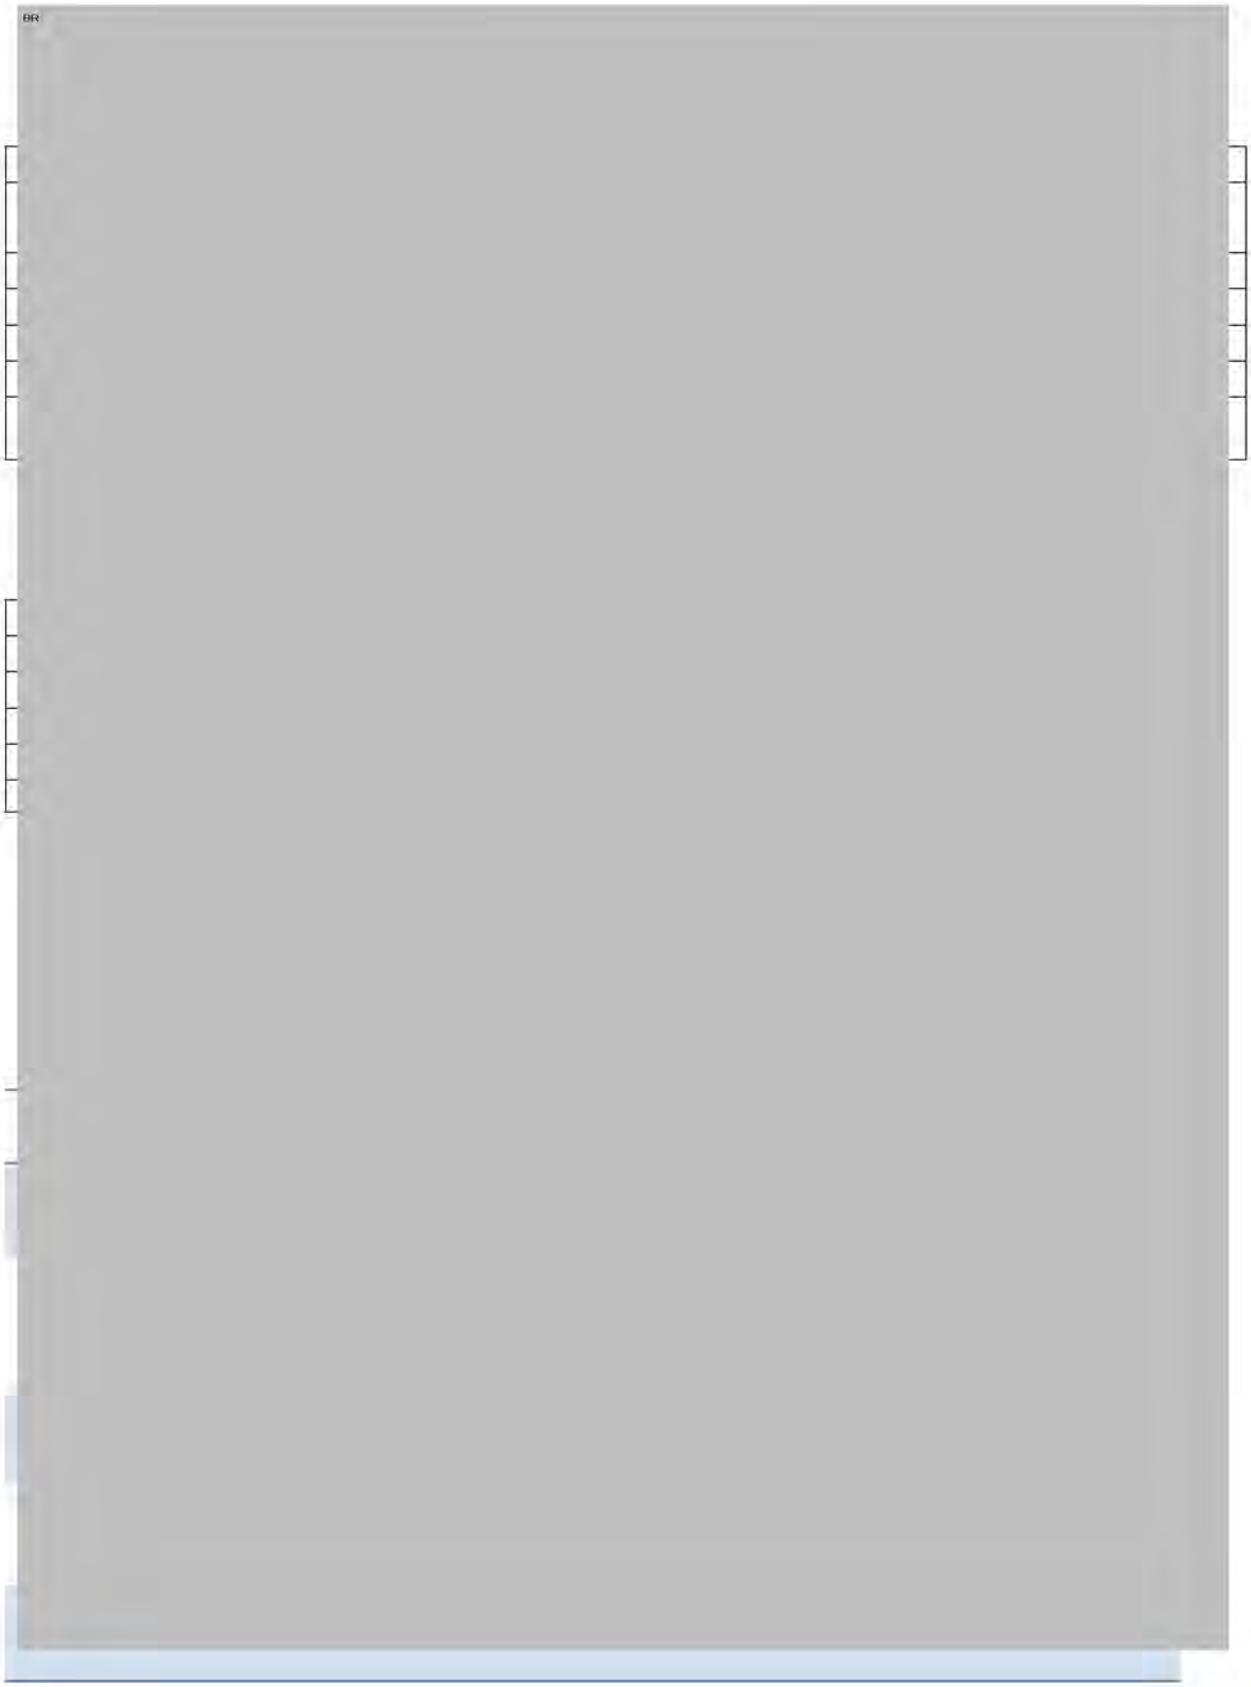

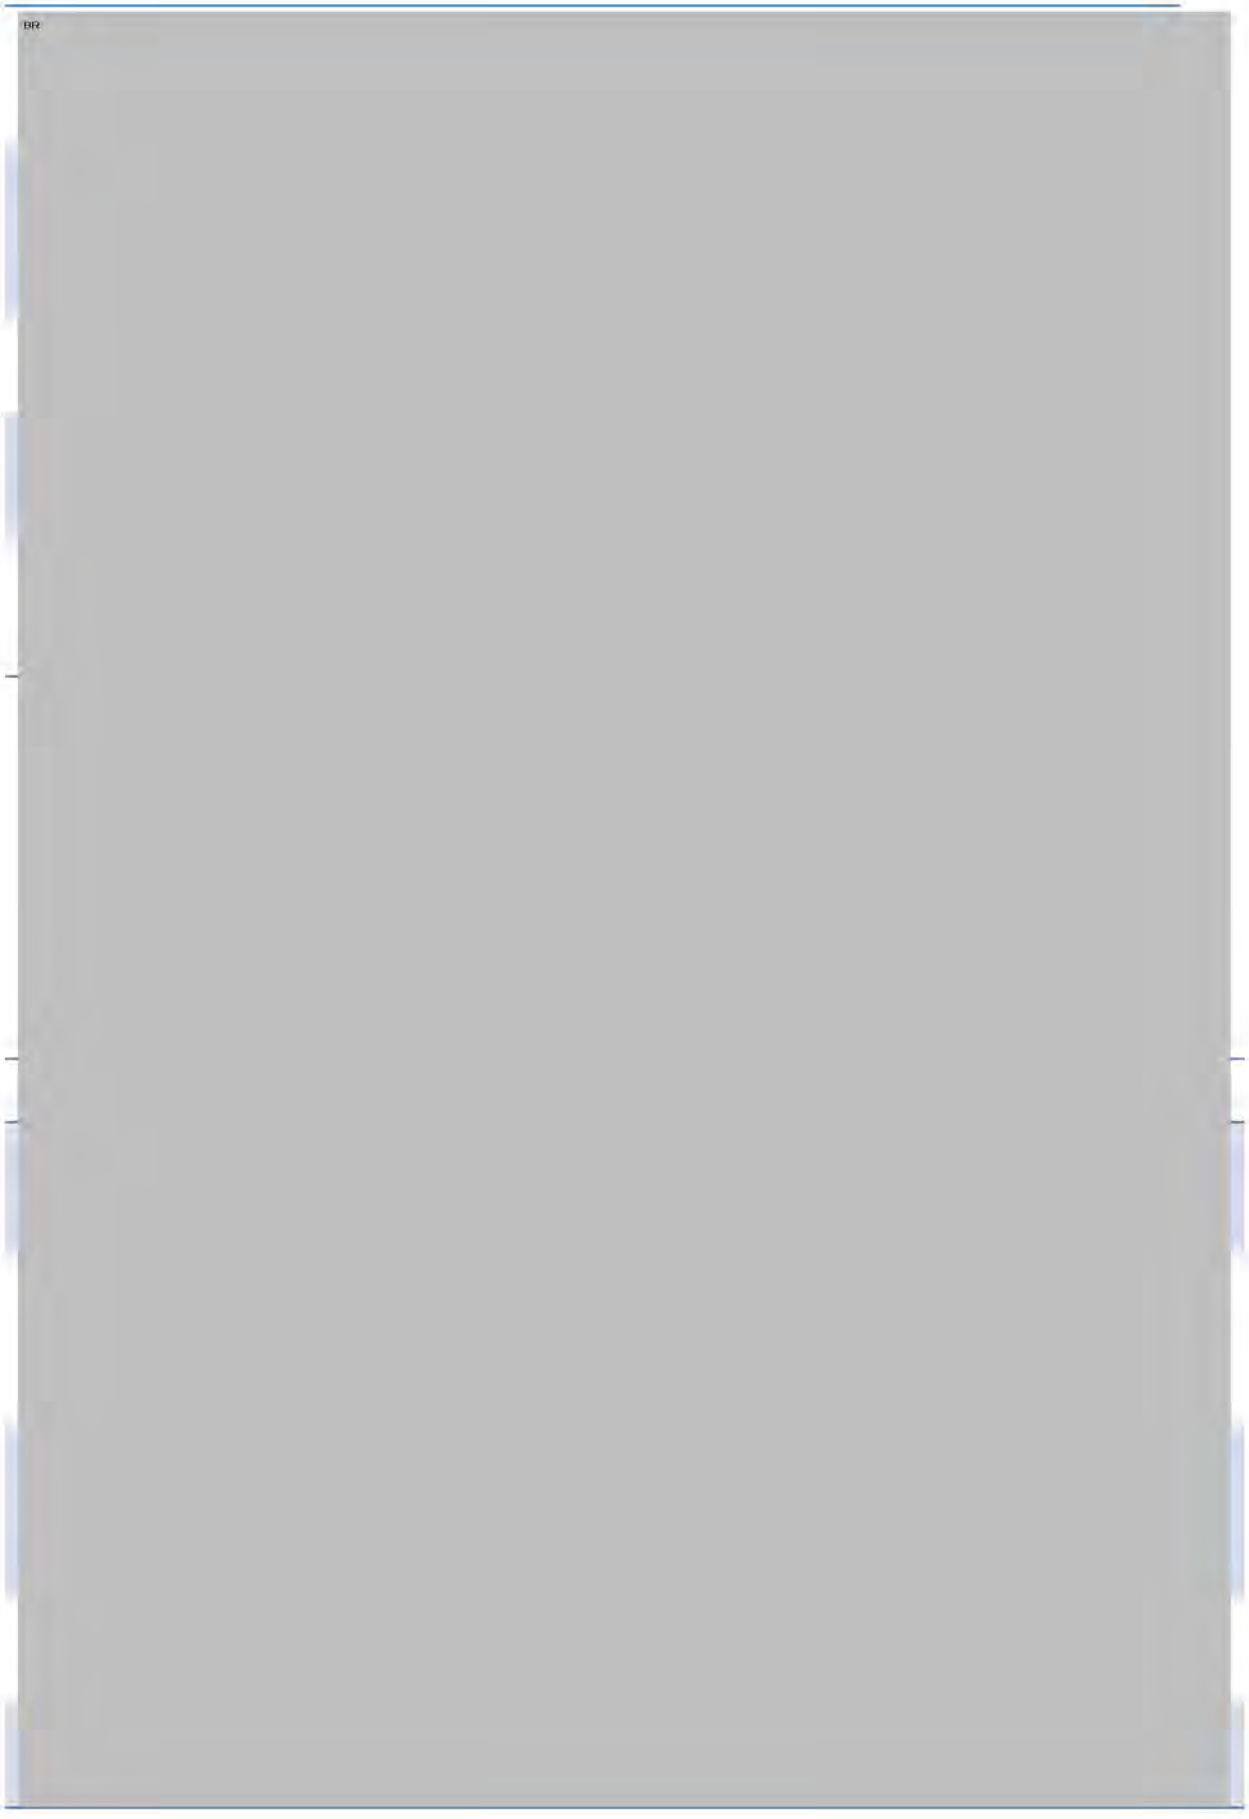
BR

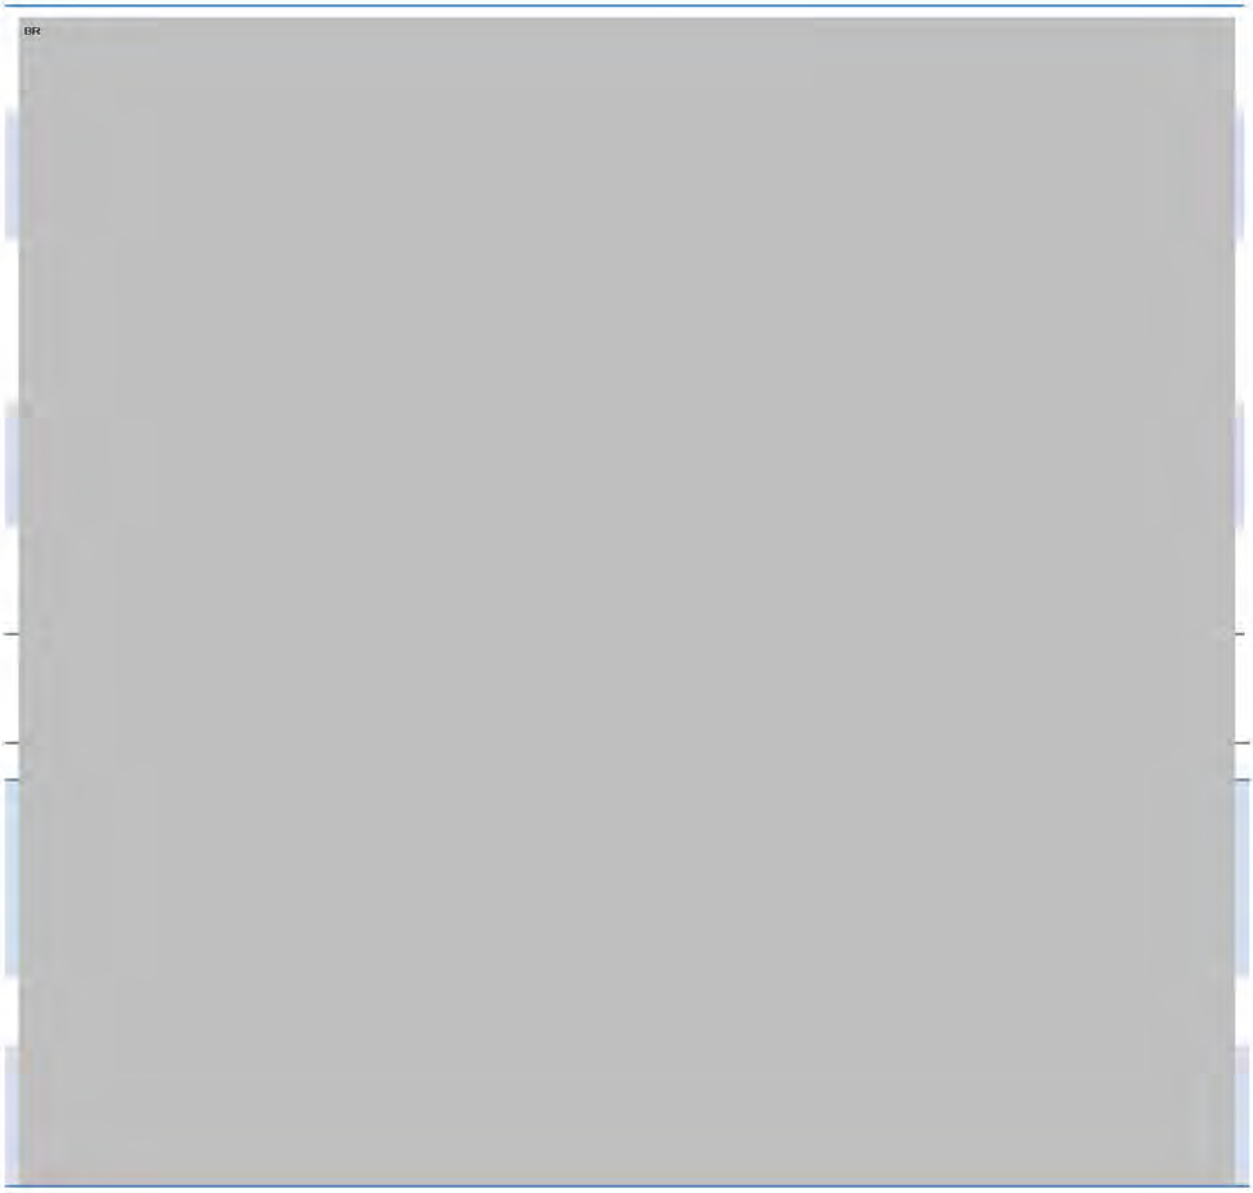
BR

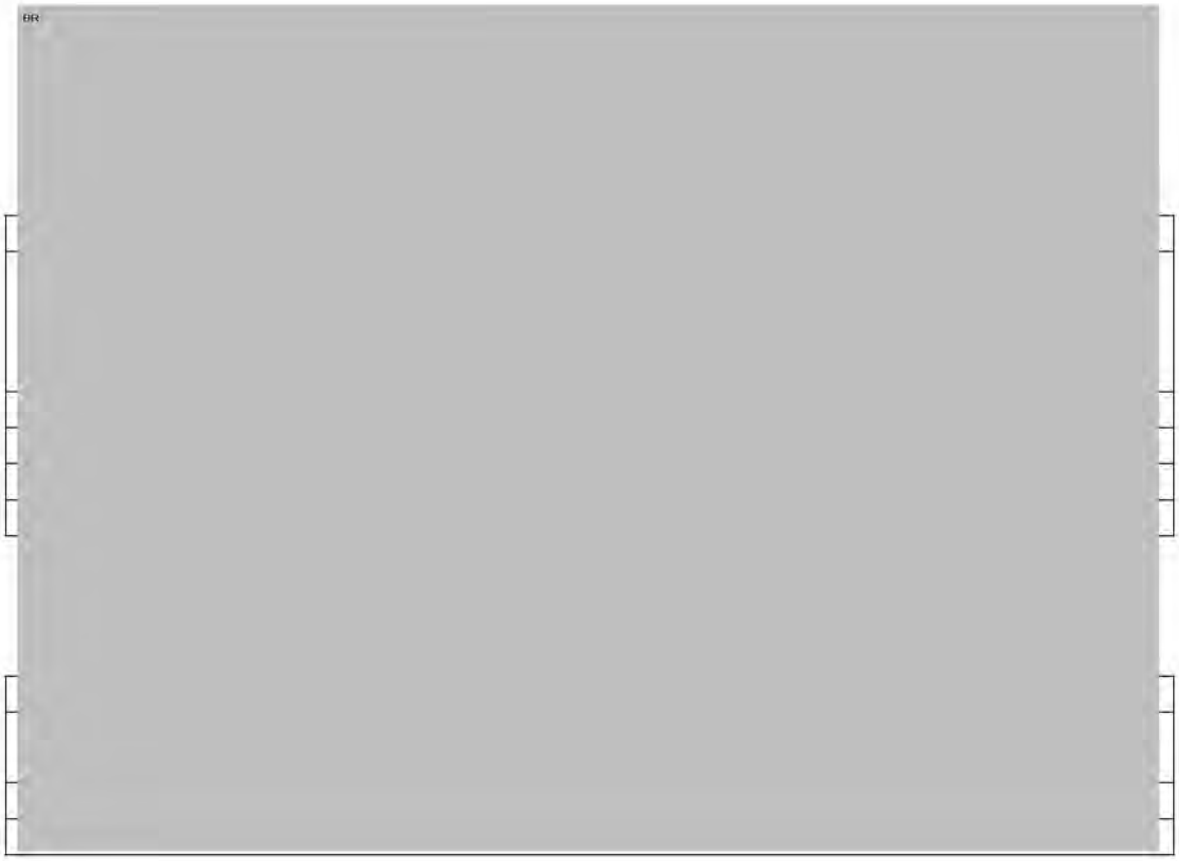

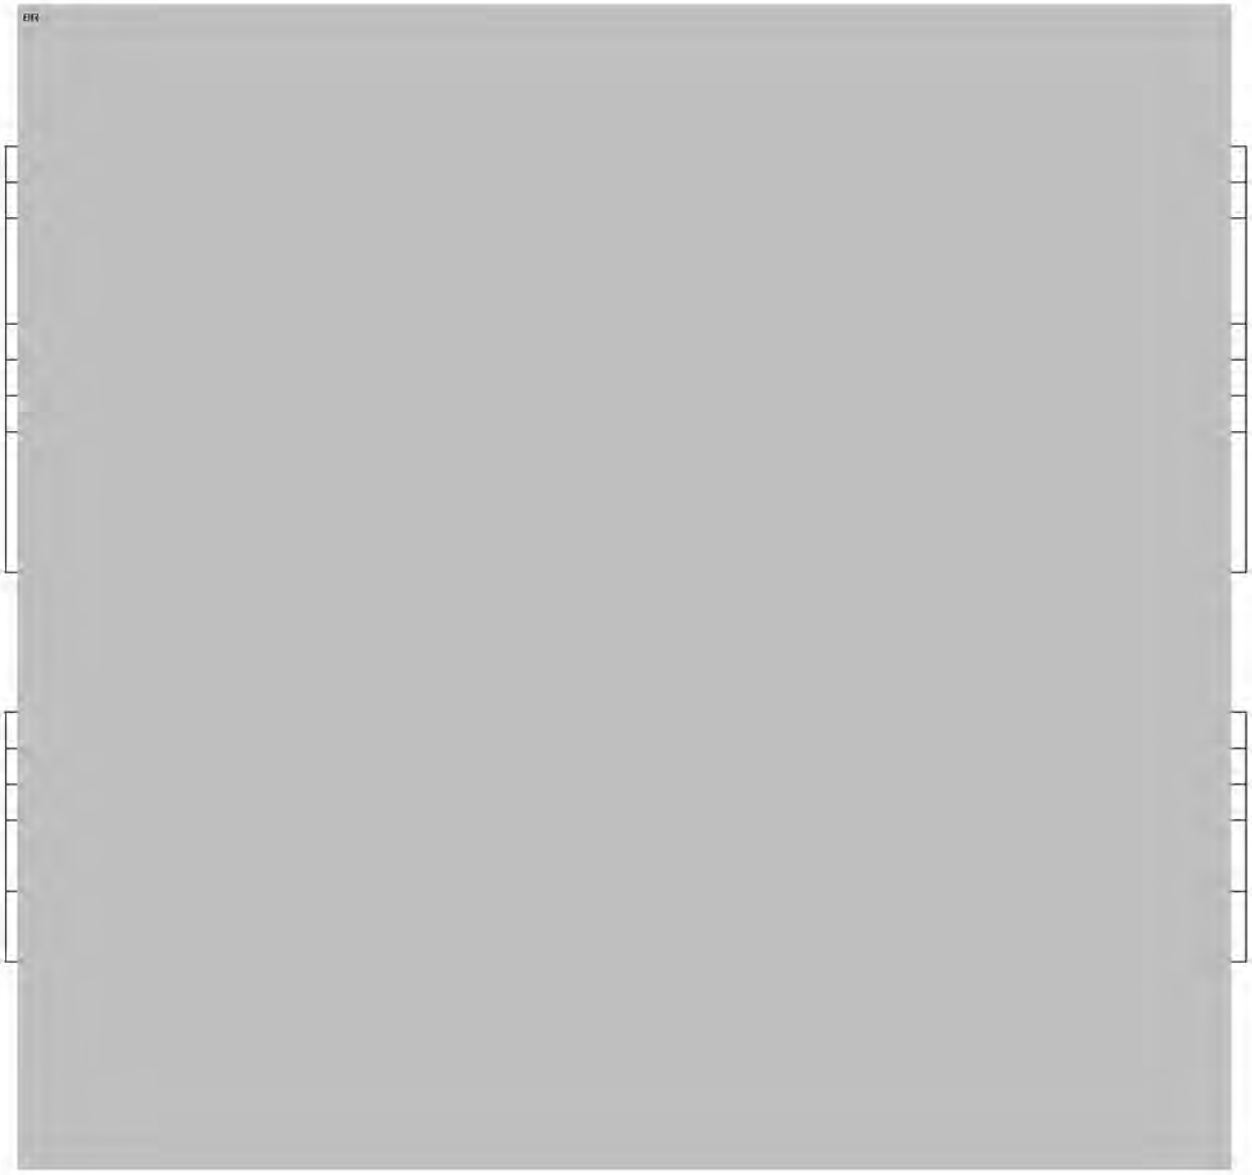

Docnr24



# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 30 sept 2019 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 17-apr-20 | 23 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie (incl. consolidatieperiode) vertraagd. |
| BR | | | | | |

*

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

5.1.2.e

Docnr24

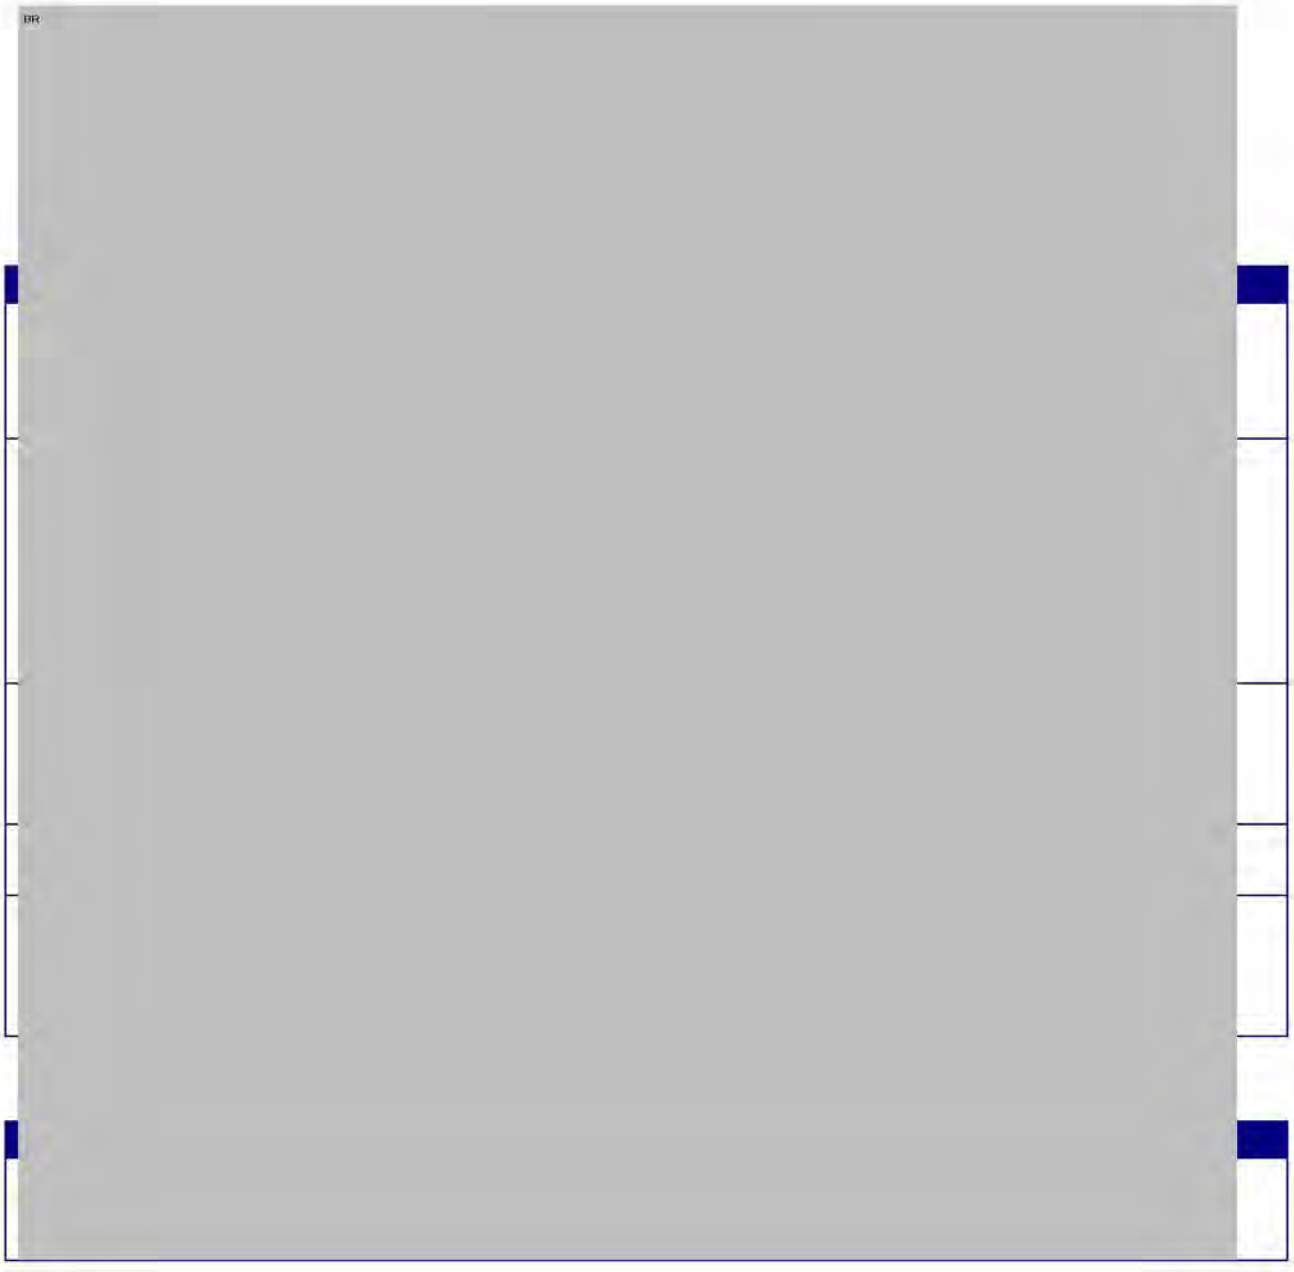
BR



Docnr24

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 3e kwartaal 2019

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 23 oktober 2019**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 1.0**

Docnr24

Docnr24



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 3e kwartaal 2019
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004521

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>11 oktober 2019 | Versie 0.1<br>17 oktober 2019 | Versie 1.0<br>23 oktober 2019 | Versie 1.0<br>29 oktober 2019 | Versie 2.0<br>4 november 2019 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr24



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 9

*2.1 Omgevingsmanagement* *9*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 9
2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie en Vergunningen* *10*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2.2 Komende kwartaal 10

*2.3 Verwervingen* *11*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 11
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Overeenkomsten* *12*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 12
2.4.2 Komende kwartaal 12

*2.5 Communicatie* *13*
2.5.1 Afgelopen kwartaal 13
2.5.2 Komende kwartaal 13
2.5.3 Diversen 14

3 Projectvoortgang 15

*3.1 Aanbesteden en contracteren* *15*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 15
3.1.2 Komende kwartaal 15

*3.2 Vormgeving* *16*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 16
3.2.2 Komende kwartaal 17

*3.3 Monitoring* *18*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 18
3.3.2 Komende kwartaal 18

*3.4 Inpassing Binckhorst* *19*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 19
3.4.2 Komende kwartaal 19

*3.5 Inpassing Vlietzone* *21*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 21
3.5.2 Komende kwartaal 22

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* *23*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 23
3.6.2 Komende kwartaal 23

*3.7 Boortunnel en toeritten* *24*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 24
3.7.2 Komende kwartaal 25

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *26*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 26

Docnr24




3.8.2 Komende kwartaal 26

*3.9 Installaties* *28*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 28
3.9.2 Komende kwartaal 29

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *30*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 30
3.10.2 Komende kwartaal 30

*3.11 Bediencentrale* *31*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 31
3.11.2 Komende kwartaal 31

*3.12 Uitvoeringskwaliteit* *32*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 32
3.12.2 Komende kwartaal 32

*3.13 Contractmanagement* *33*
3.13.1 Afgelopen kwartaal 33
3.13.2 Komende kwartaal 33

**4 Overdracht en openstelling** **34**

*4.1 Tunnelveiligheid* *34*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 34
4.1.2 Komende kwartaal 34

*4.2 Overdracht aan beheerders* *35*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 35
4.2.2 Komende kwartaal 35

*4.3 Beheer en onderhoud* *36*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 36
4.3.2 Komende kwartaal 36

**5 Projectbeheersing** **37**

*5.1 Scope* *37*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 37
5.1.2 Komende kwartaal 37

*5.2 Financien* *38*
5.2.1 Kostenstructuur 38
5.2.2 Dekkingen 39

*5.3 Planning* *41*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 41
5.3.2 Komende kwartaal 41

*5.4 Risico's* *42*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 42
5.4.2 Komende kwartaal 42
5.4.3 Financiële toprisico's 42
5.4.4 Toprisico's planning 43

*5.5 Interne kwaliteit* *45*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 45
5.5.2 Komende kwartaal 45

Docnr24



*5.6 Informatiebeheer* *46*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 46
5.6.2 Komende kwartaal 46
5.6.3 Kennisdeling 46
*5.7 Organisatie* *47*
5.7.1 Afgelopen kwartaal 47
5.7.2 Komende kwartaal 47

**6 Bijlage: Planningsmijlpalen** **48**

**7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan** **49**

**8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer** **51**

# 1 Managementsamenvatting

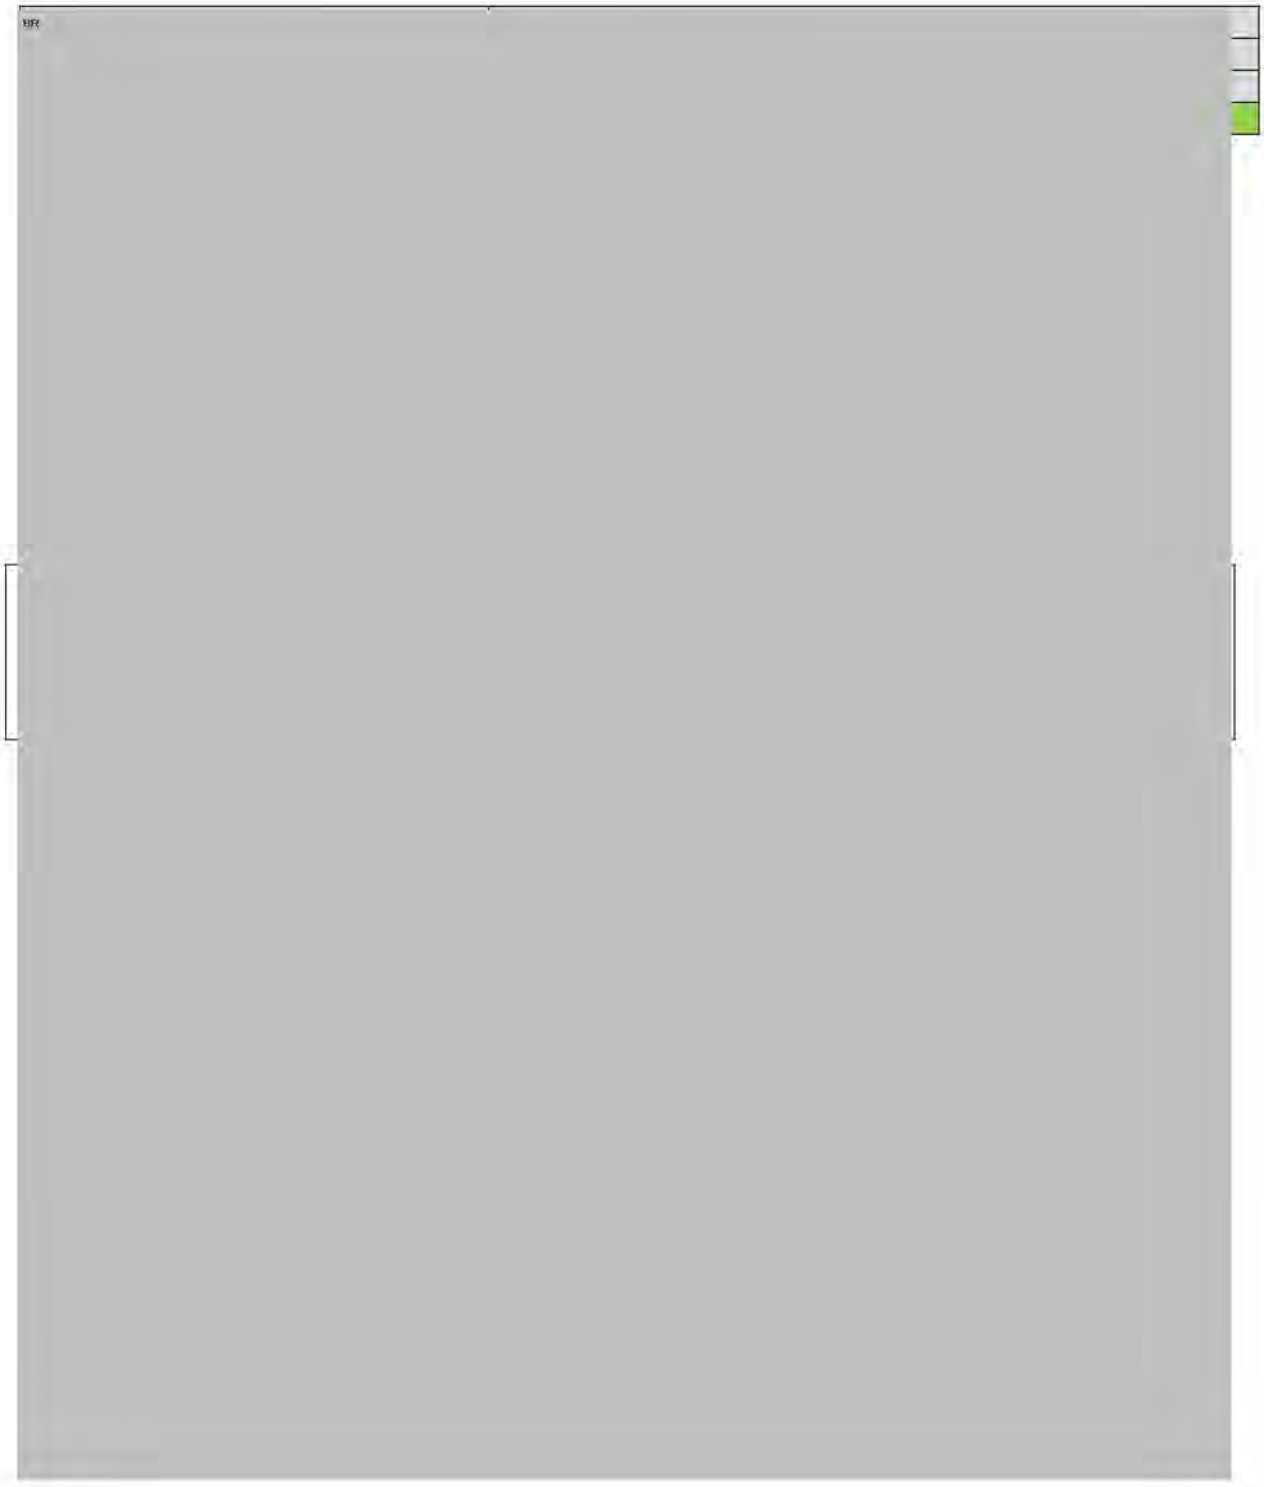

## 4. TERUGBLIK AFGELOPEN KWARTAAL

Afgelopen kwartaal is er onder andere gewerkt aan:

- Vlietzone: Het parkeerterrein Drievliet is ingericht en de loopbrug en tijdelijke hellingbaan zijn gerealiseerd. Begin juli 2019 zijn deze onderdelen aan Drievliet beschikbaar gesteld. De inrichting van het Molenvlietpark voortgezet, o.a. aanbrengen fundatiepalen voor diverse bruggen. Het voormalige parkeerterrein van Drievliet is verwijderd t.h.v. de calamiteitenberging. De watergang langs Drievliet is gegraven.

- De verwachting is dat in november 2019 de kapvergunning voor de tweede toevoer inclusief een verklaring van geen bedenkingen, die is aangehaakt in het kader van de Wet natuurbescherming, in procedure kan worden gebracht. De planning om in het eerste kwartaal 2020 (voor het broedseizoen) te kappen staat onder druk.

## 5. VERWACHTING KOMEND KWARTAAL

Komende kwartaal wordt er onder andere gewerkt aan:

- Vlietzone: Realiseren bruggen en kade in het Molenvlietpark. Uitvoeren resterende grondwerkzaamheden op de grondwal langs de golfbaan en aansluiten op het landhoofd van het trekfietsviaduct. Het resterende deel van het parkeerterrein Drievliet wordt ingericht, nadat het bouwterrein van het Trekfietsviaduct is opgeheven.

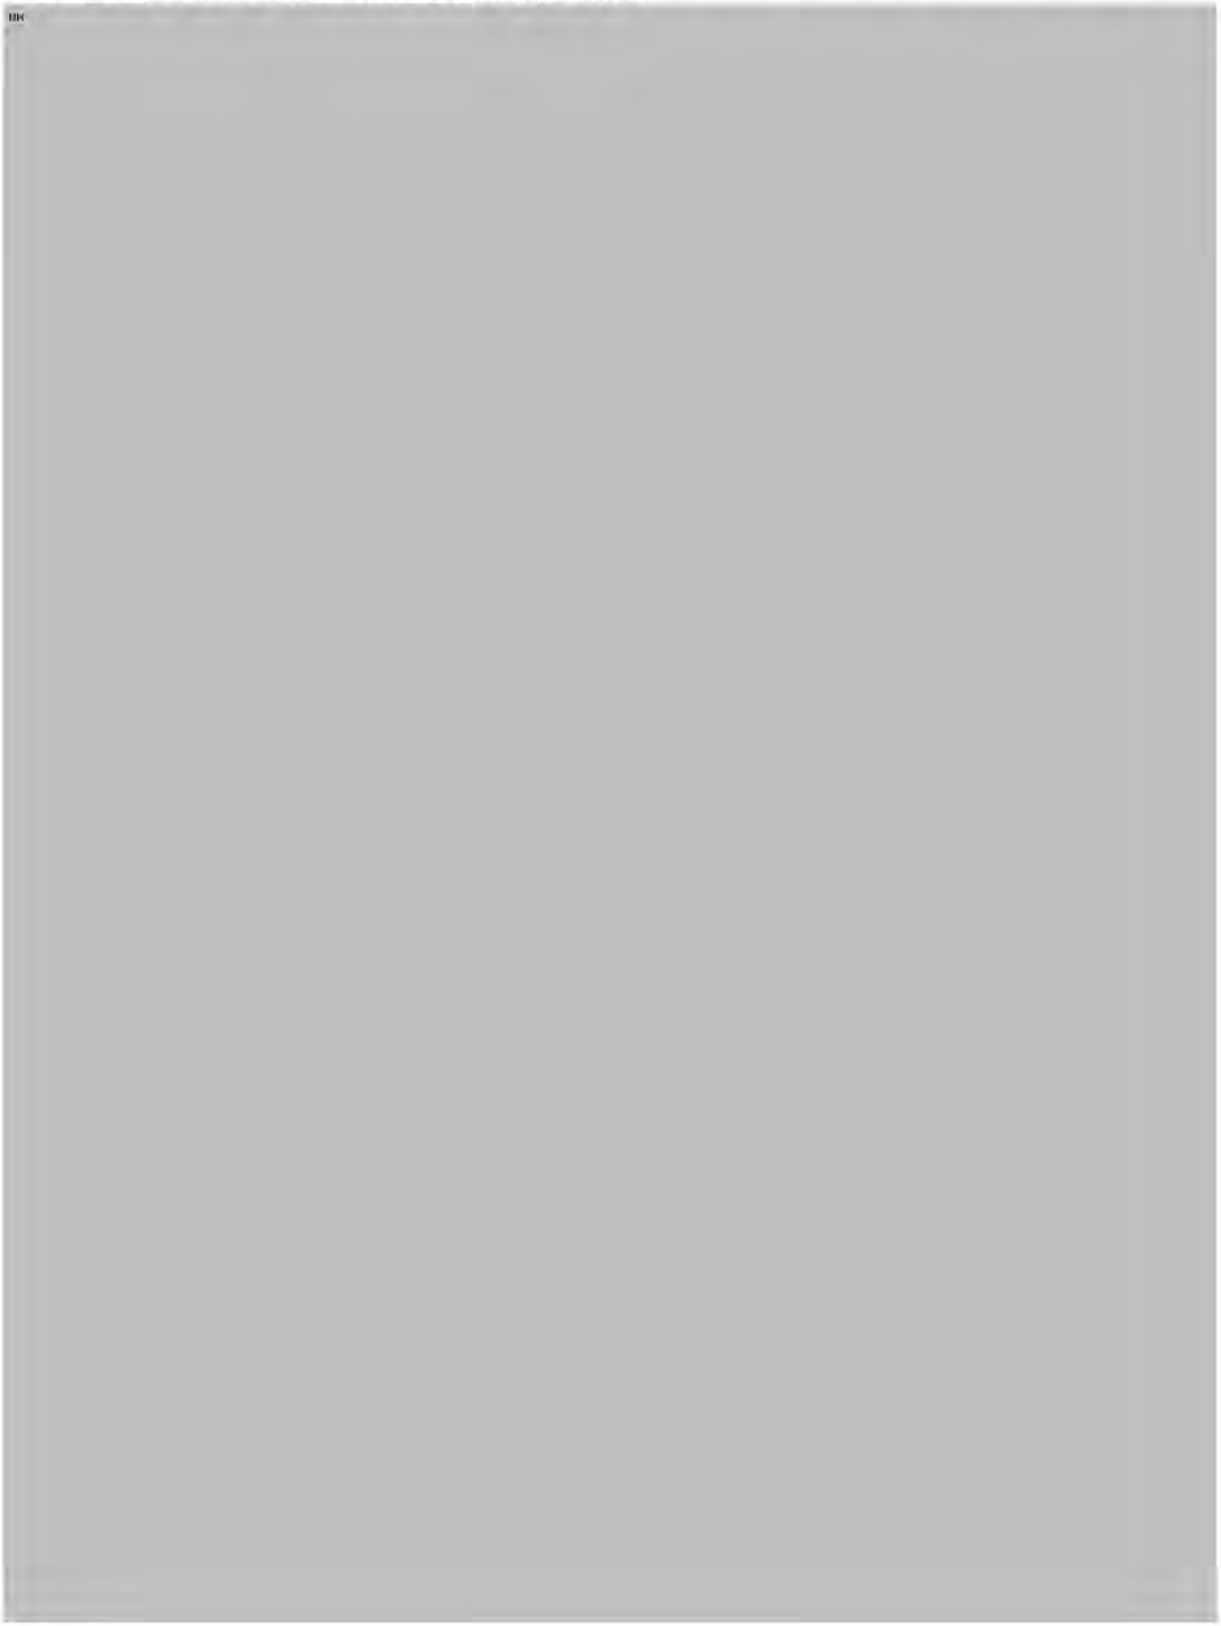

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

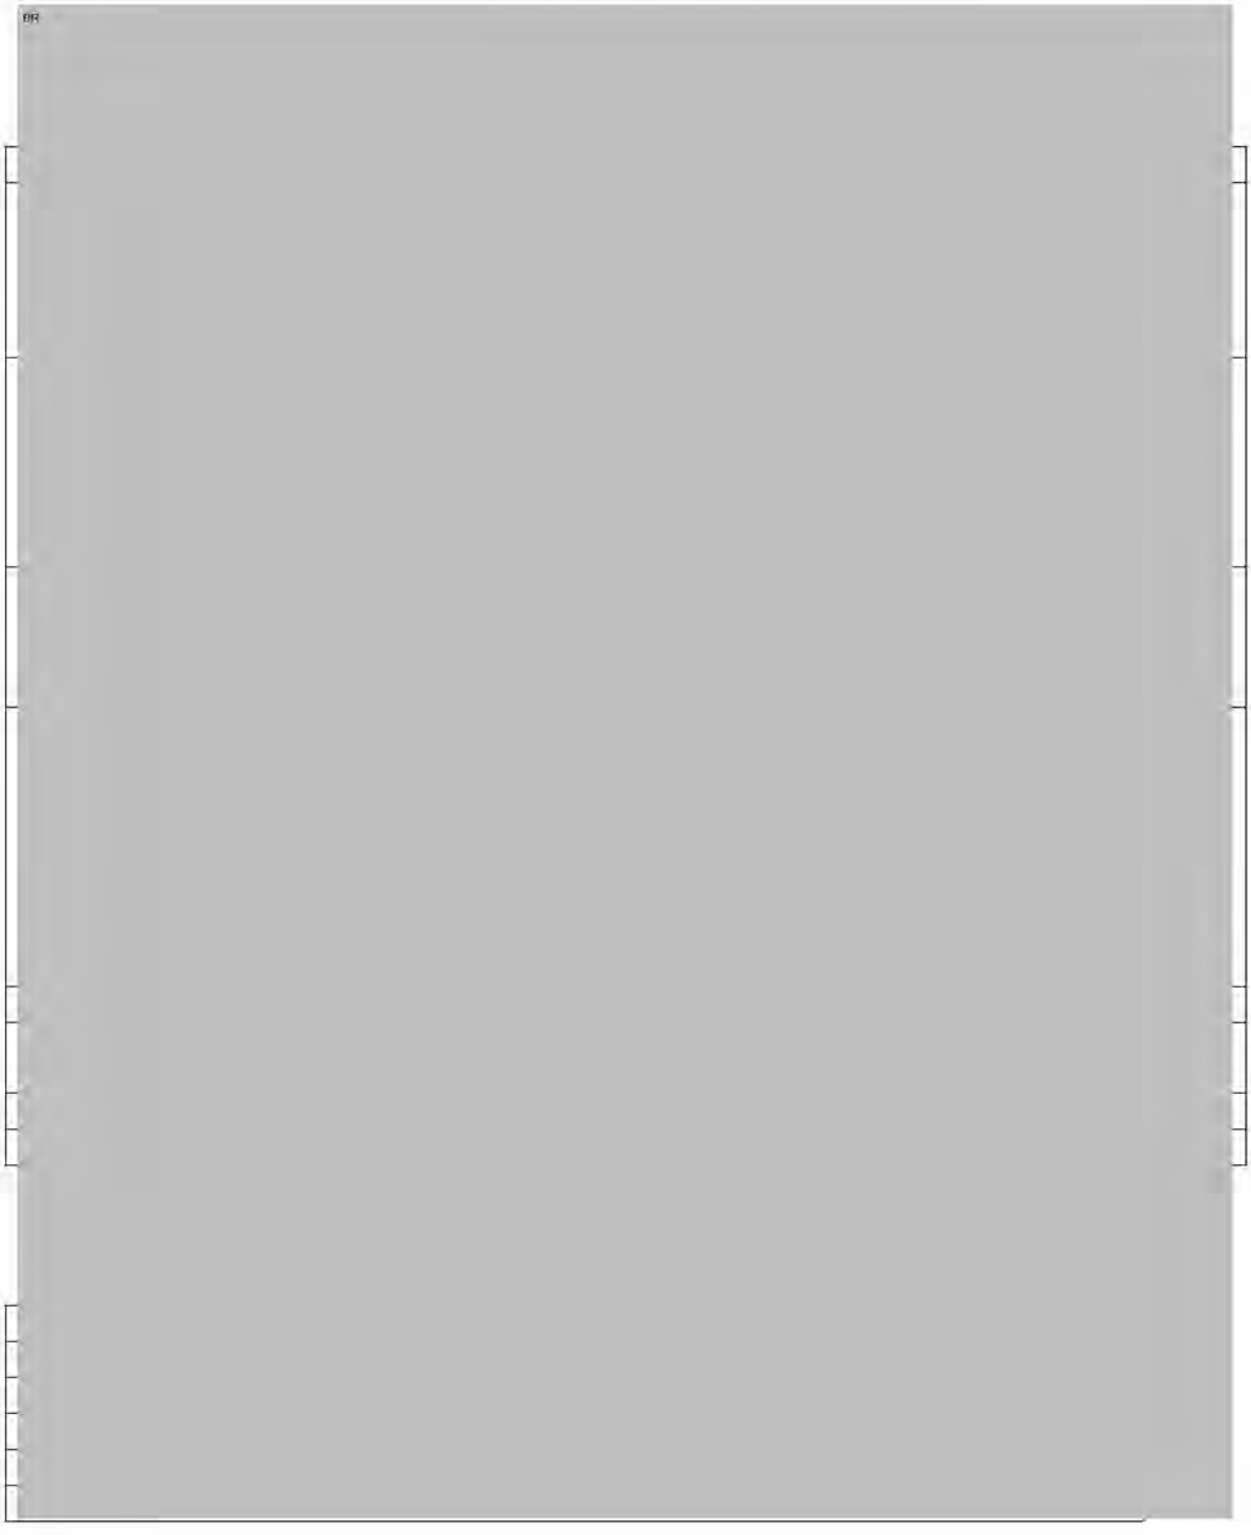

## 2.2 Planologie en Vergunningen

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| In overleg met CRB en andere betrokkenen inzicht houden op het vergunningenproces. | Periodiek overleg gevoerd met zowel CRB, HHD als DSO Vergunningen & Toezicht. CRB heeft diverse vergunningen verkregen. De meeste vergunningen zien op de kunstwerken in Molenvlietpark. Voor de vier portalen op Rijksgrond dient een Wbr-vergunning aangevraagd te worden (geen zakelijk recht nodig). |
| HHD zal het projectplan vaststellen wanneer Den Haag de SOK t.b.v. tweede toevoer een feit is. | In afwachting van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Den Haag en de particulier op wiens perceel de tweede toevoer wordt aangelegd. |
| De gemeente Den Haag behandelt de kapvergunning ten behoeve van de aanleg van de tweede watertoevoer. De procedure loopt nog steeds. De aanvullende vragen van de ODH zijn beantwoord. Zekerheidshalve is nader vleermuizenonderzoek uitgevoerd. | ODH heeft te kennen gegeven te wachten met een officiële reactie na het gereedkomen van de resultaten van het extra vleermuizenonderzoek.<br>De verwachting is dat in november 2019 de kapvergunning inclusief een verklaring van geen bedenkingen, die is aangehaakt in het kader van de Wet natuurbescherming, in procedure kan worden gebracht. De planning om in het eerste kwartaal 2020 (voor het broedseizoen) te kappen staat onder druk. |
| BR | |

### 2.2.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Besluit afwachten op kapaanvraag en aangevraagde ontheffing Wet natuurbescherming in verband met aanleg tweede watertoevoer. |
| BR |

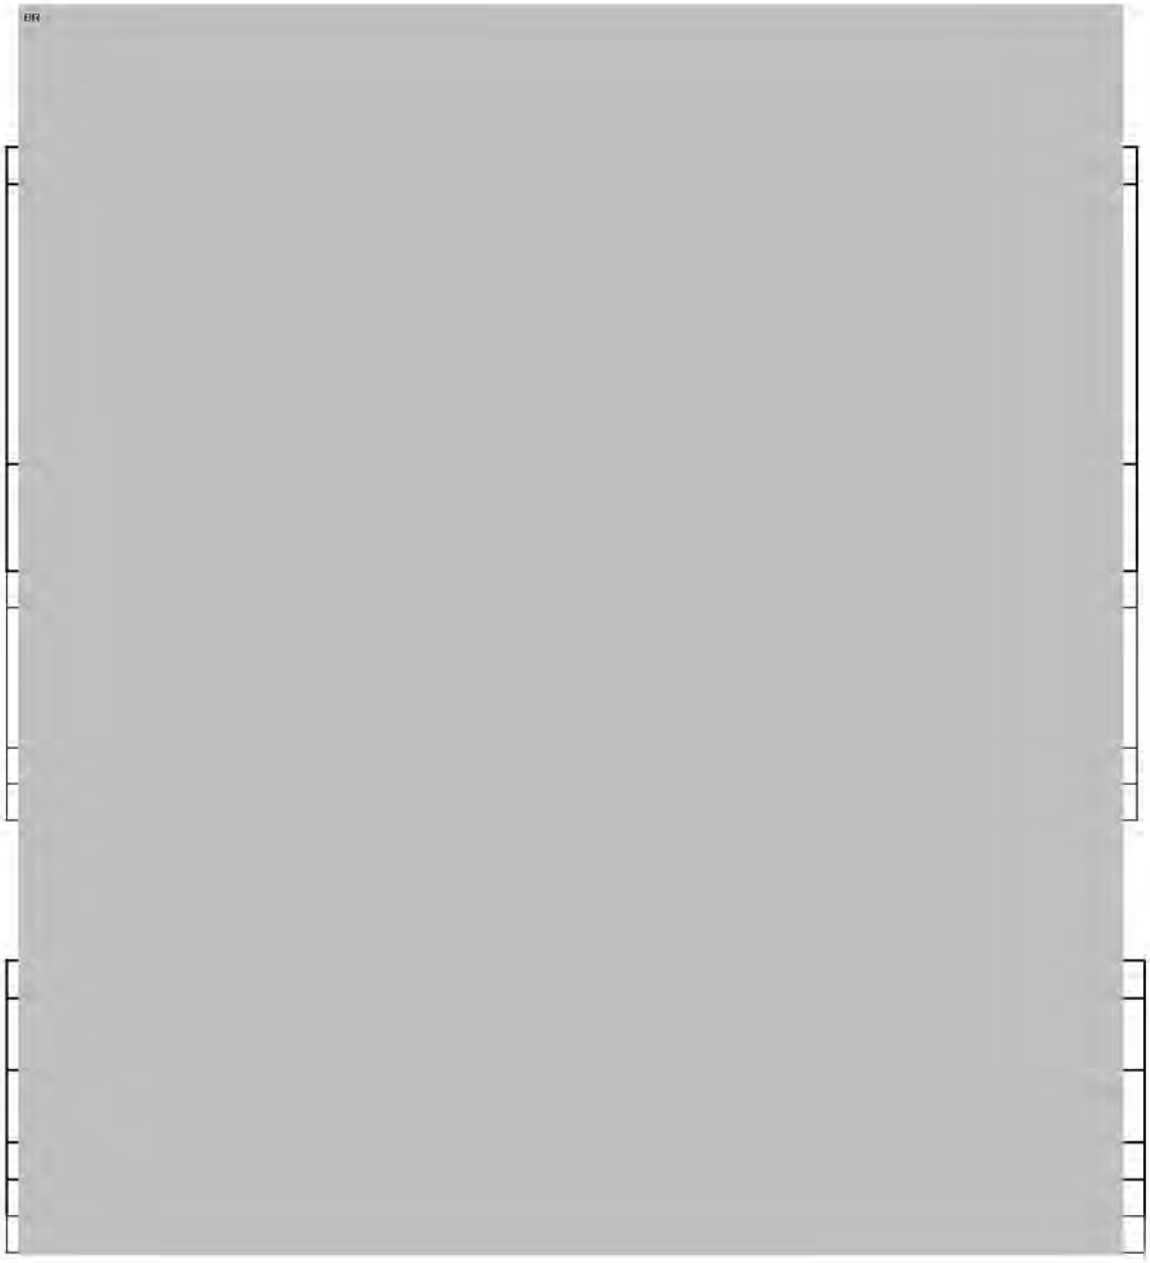
BR

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Samenwerkingsovereenkomst afronden met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. | Partijen hebben op hoofdlijnen overeenstemming over de samenwerkingsovereenkomst. Ook de akte voor grondruil en zakelijke rechten is opgesteld. Naar verwachting kan in het vierde kwartaal tot formele afronding overgegaan worden. |
| Samenwerkingsovereenkomst afronden met Provincie t.a.v. gedeeltelijke vervanging oeverconstructie langs Vliet. | De SOK tussen Den Haag en provincie Zuid Holland omtrent vervangen oeverconstructie is bijna gereed voor ondertekening. Over de financiën is al overeenstemming bereikt.<br>Vooruitlopend op de ondertekening van de overeenkomst vindt er al overleg plaats tussen de Provincie en Den Haag over het DO. |
| BR | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Samenwerkingsovereenkomst afronden met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. |
| Afronden samenwerkingsovereenkomst met Provincie t.a.v. gedeeltelijke vervanging oeverconstructie langs Vliet. |
| BR |

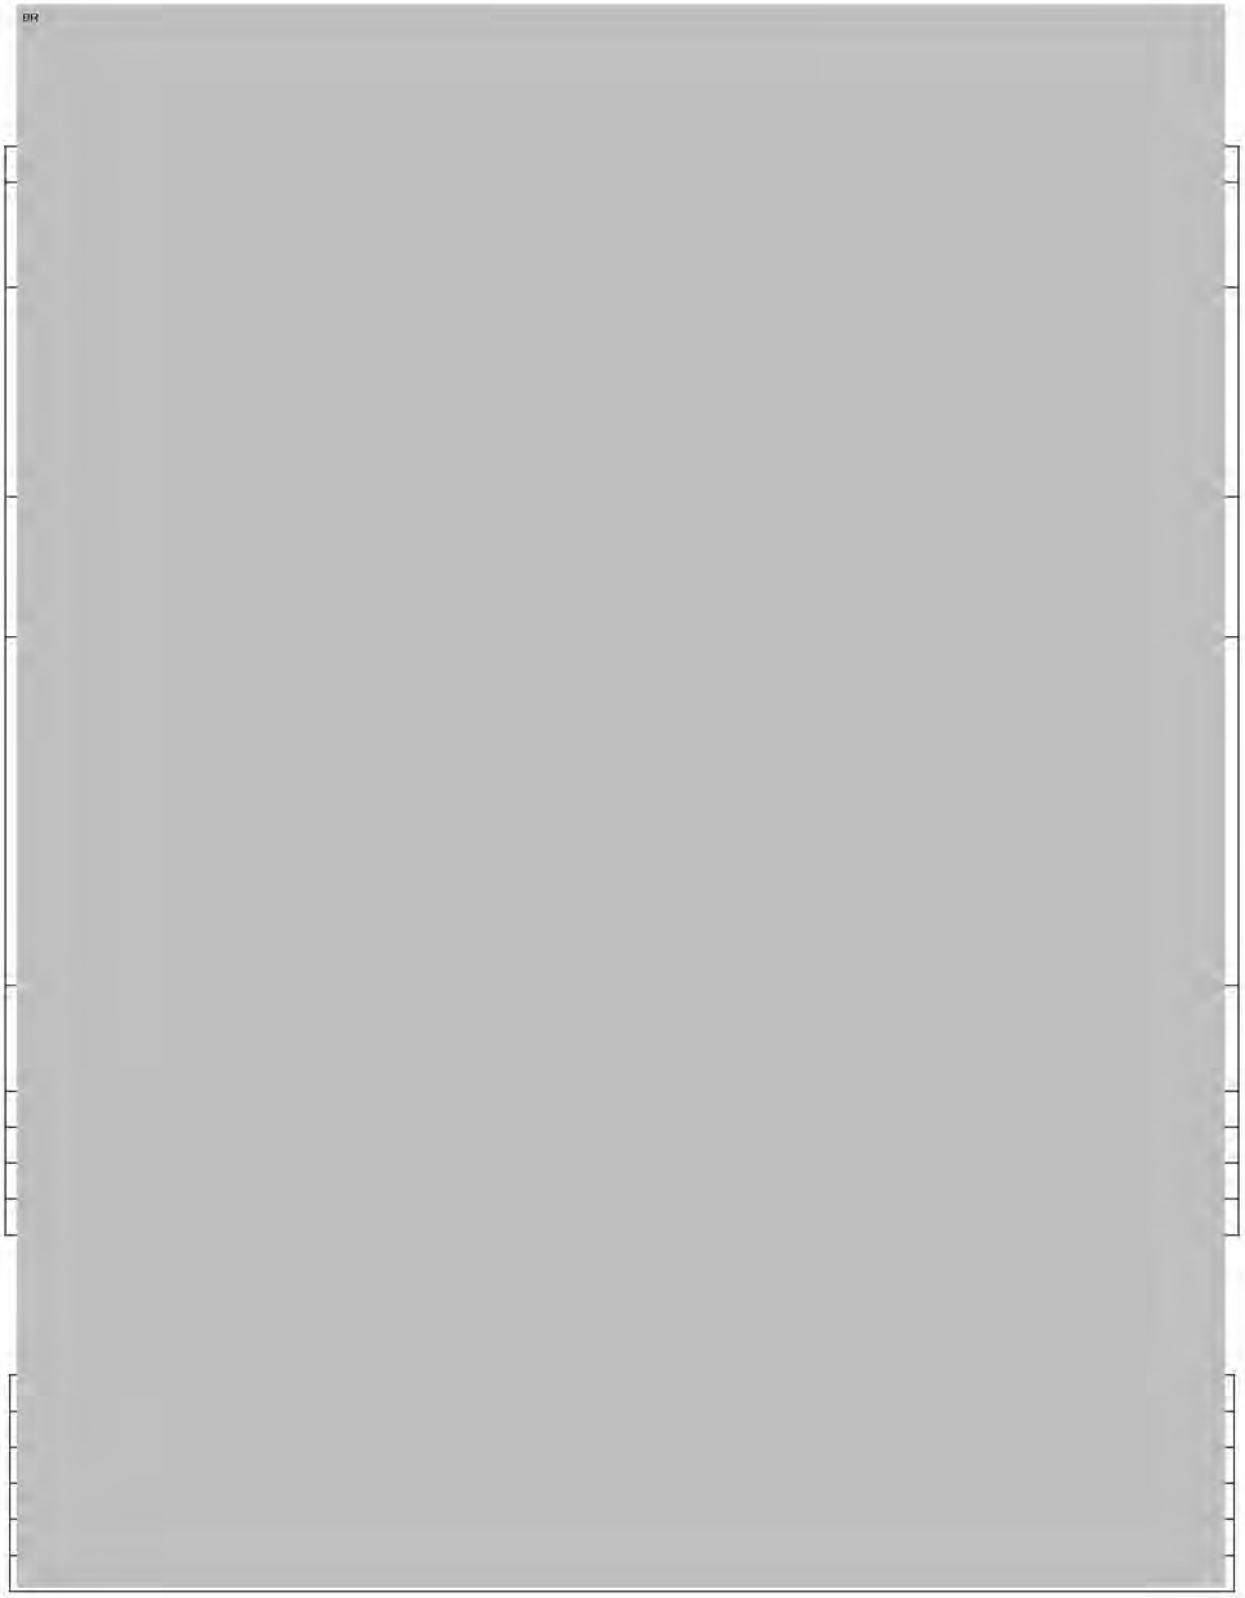
BR

BR

Docnr24



# 3 Projectvoortgang

## 3.1 Aanbesteden en contracteren

### 3.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Voorbereiding contractering en aanbesteding tweede watertoevoer. | Er zijn nog diverse issues uit te werken alvorens tot voorbereiding van de aanbesteding te komen startend met een aanbestedingsstrategie voor de Tenderboard. |
| [redacted] | |

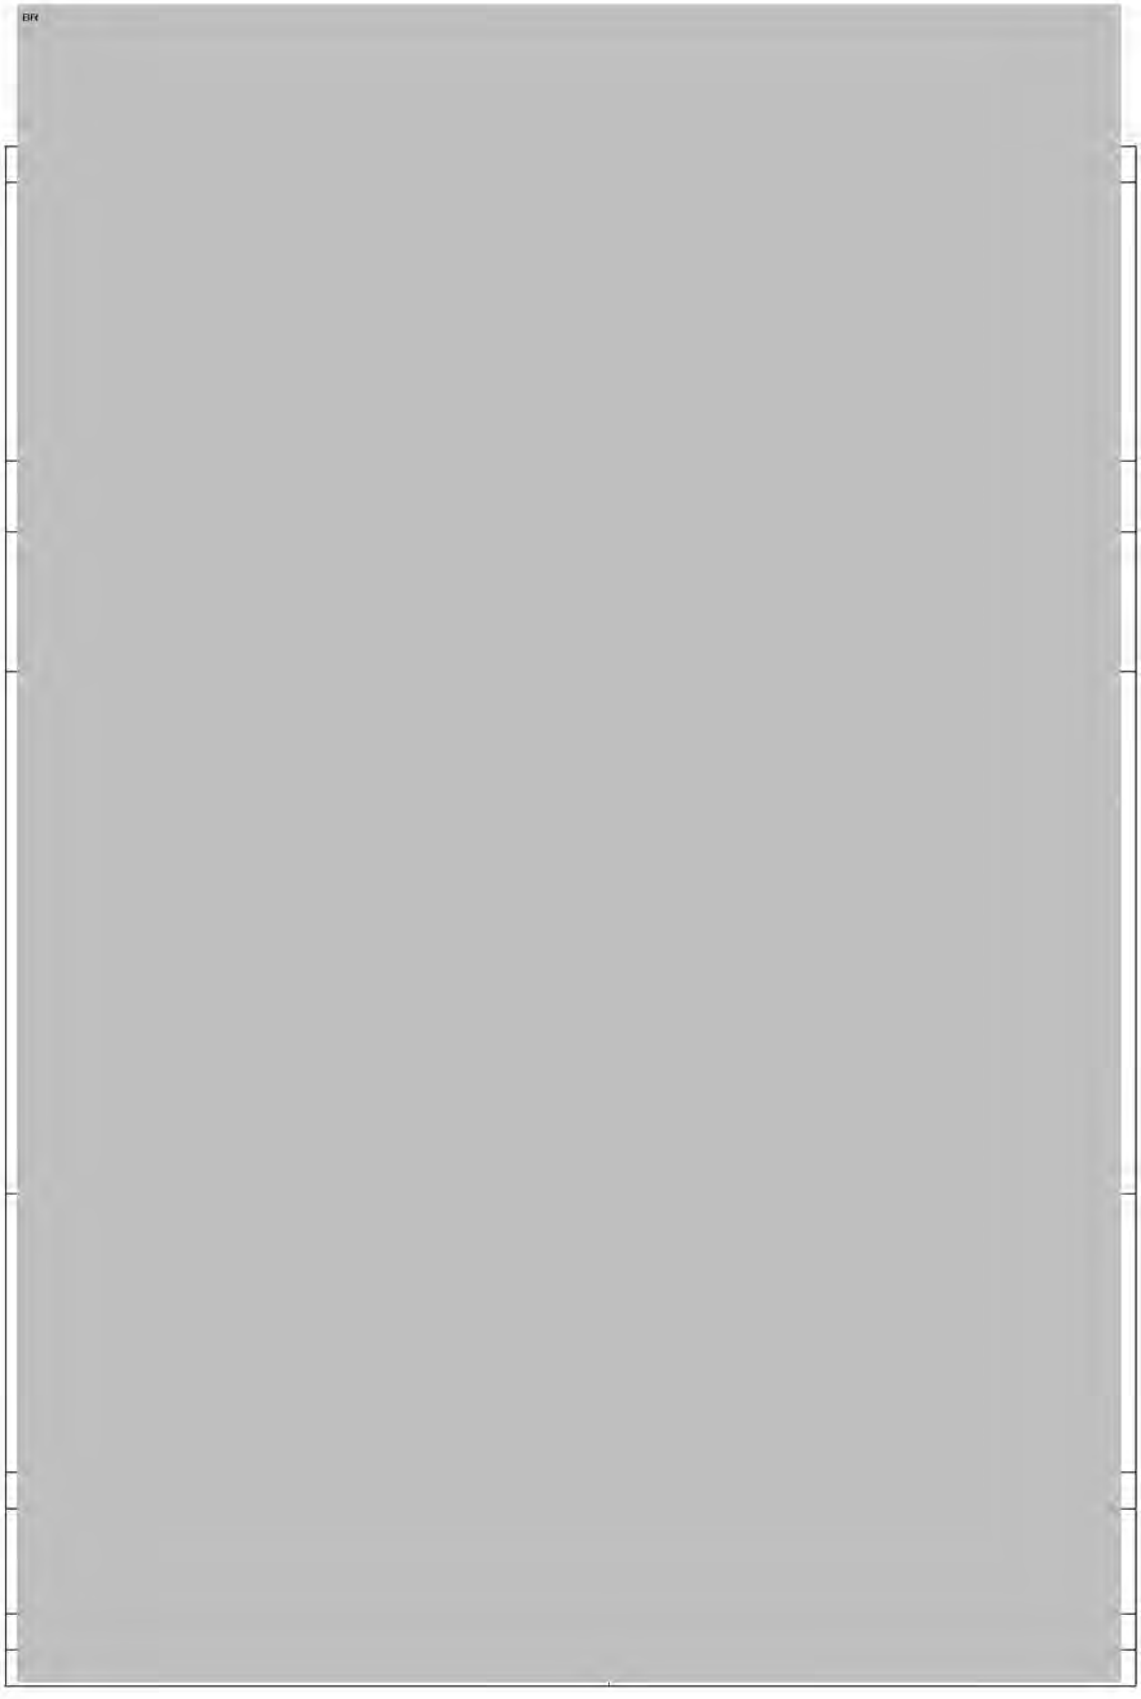
BR

BR

BR

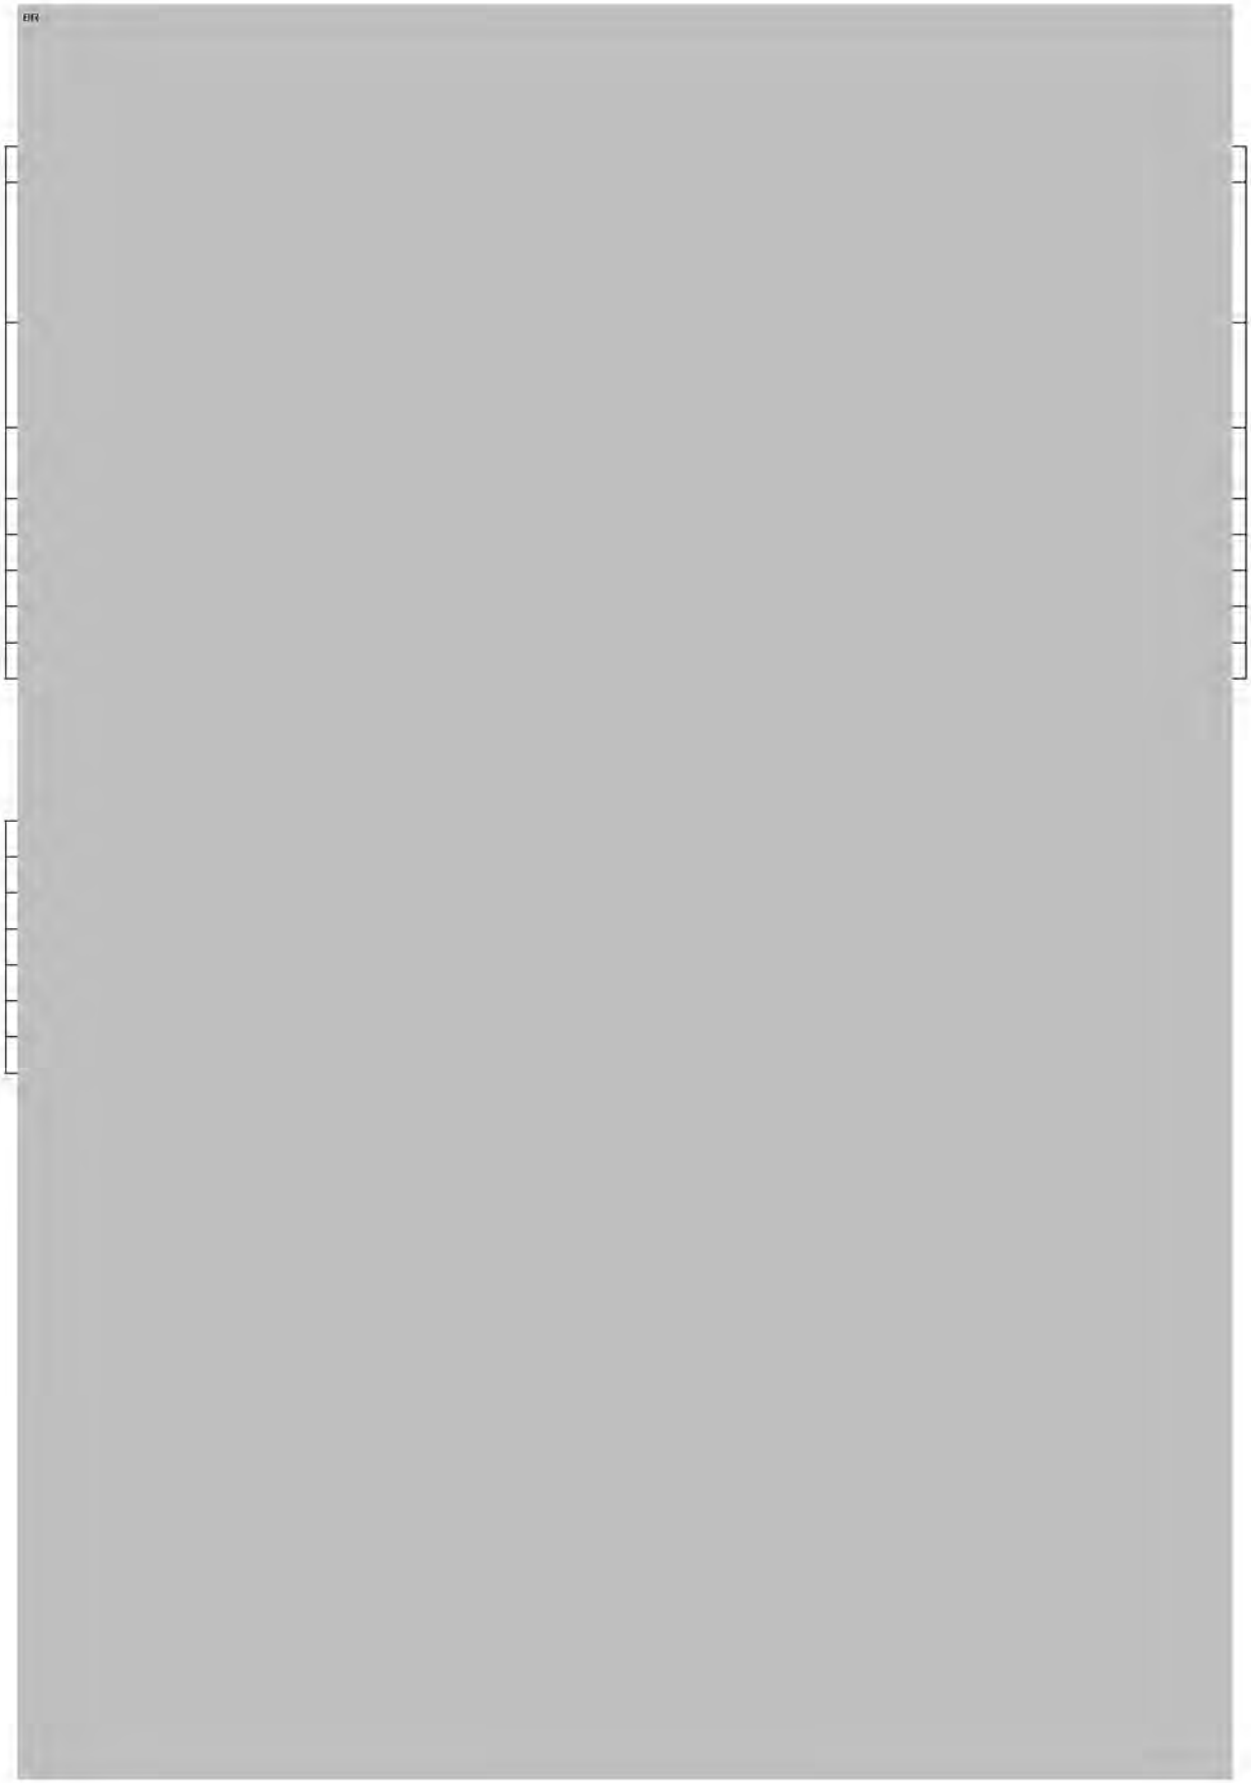
BR

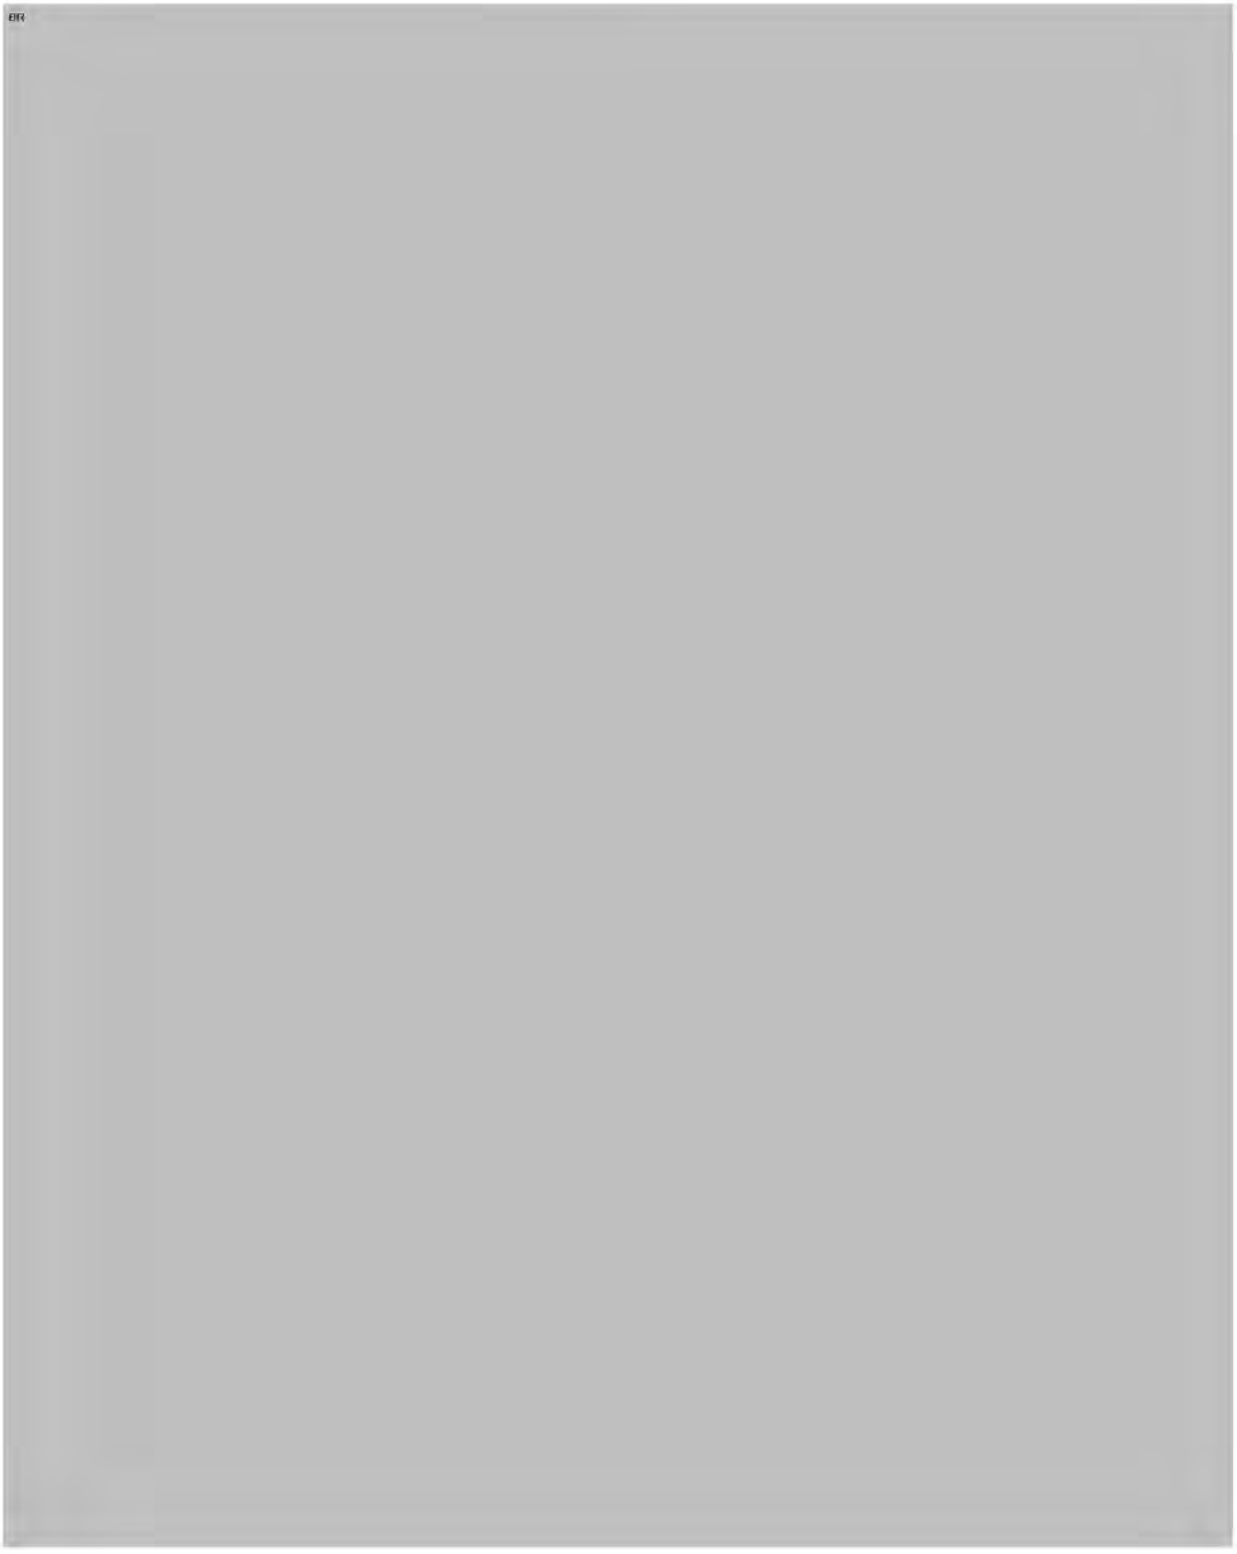

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Werkzaamheden inrichting Molenvlietpark voortzetten. | Rond de bouwvakperiode is de inrichting van het Molenvlietpark voortgezet. Het voormalige parkeerterrein van Drievliet is verwijderd t.h.v. de calamiteitenberging. De watergang langs Drievliet is gegraven. Op het moment van schrijven wordt de kade op het voormalige parkeerterrein aangelegd. |
| Realisatie recreatieve bruggen in Molenvlietpark. | De palen t.b.v. de fundaties van de bruggen zijn aangebracht in het afgelopen kwartaal. |
| Afbouwen aflaat constructie. | Na het uitvoeren van het betonwerk en plaatsen van de kantelstuwen in het vorige kwartaal, is in dit kwartaal duiker 8.2 geplaatst. Deze duiker maakt de toevoer van water vanuit de Molensloot richting het calamiteitengebied mogelijk. Verder is duiker 8.1 (een verbinding tussen de vispaaiplaats en de Molensloot) aangelegd. |
| [redacted] | |

### 3.5.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| Realiseren bruggen en kade in het Molenvlietpark. Vervolgens wordt rondom de kunstwerken het calamiteitengebied ingericht en afgewerkt. |
| BR |

Realisatie duiker 8.2 t.h.v. de aflaat in he Molenvlietpark

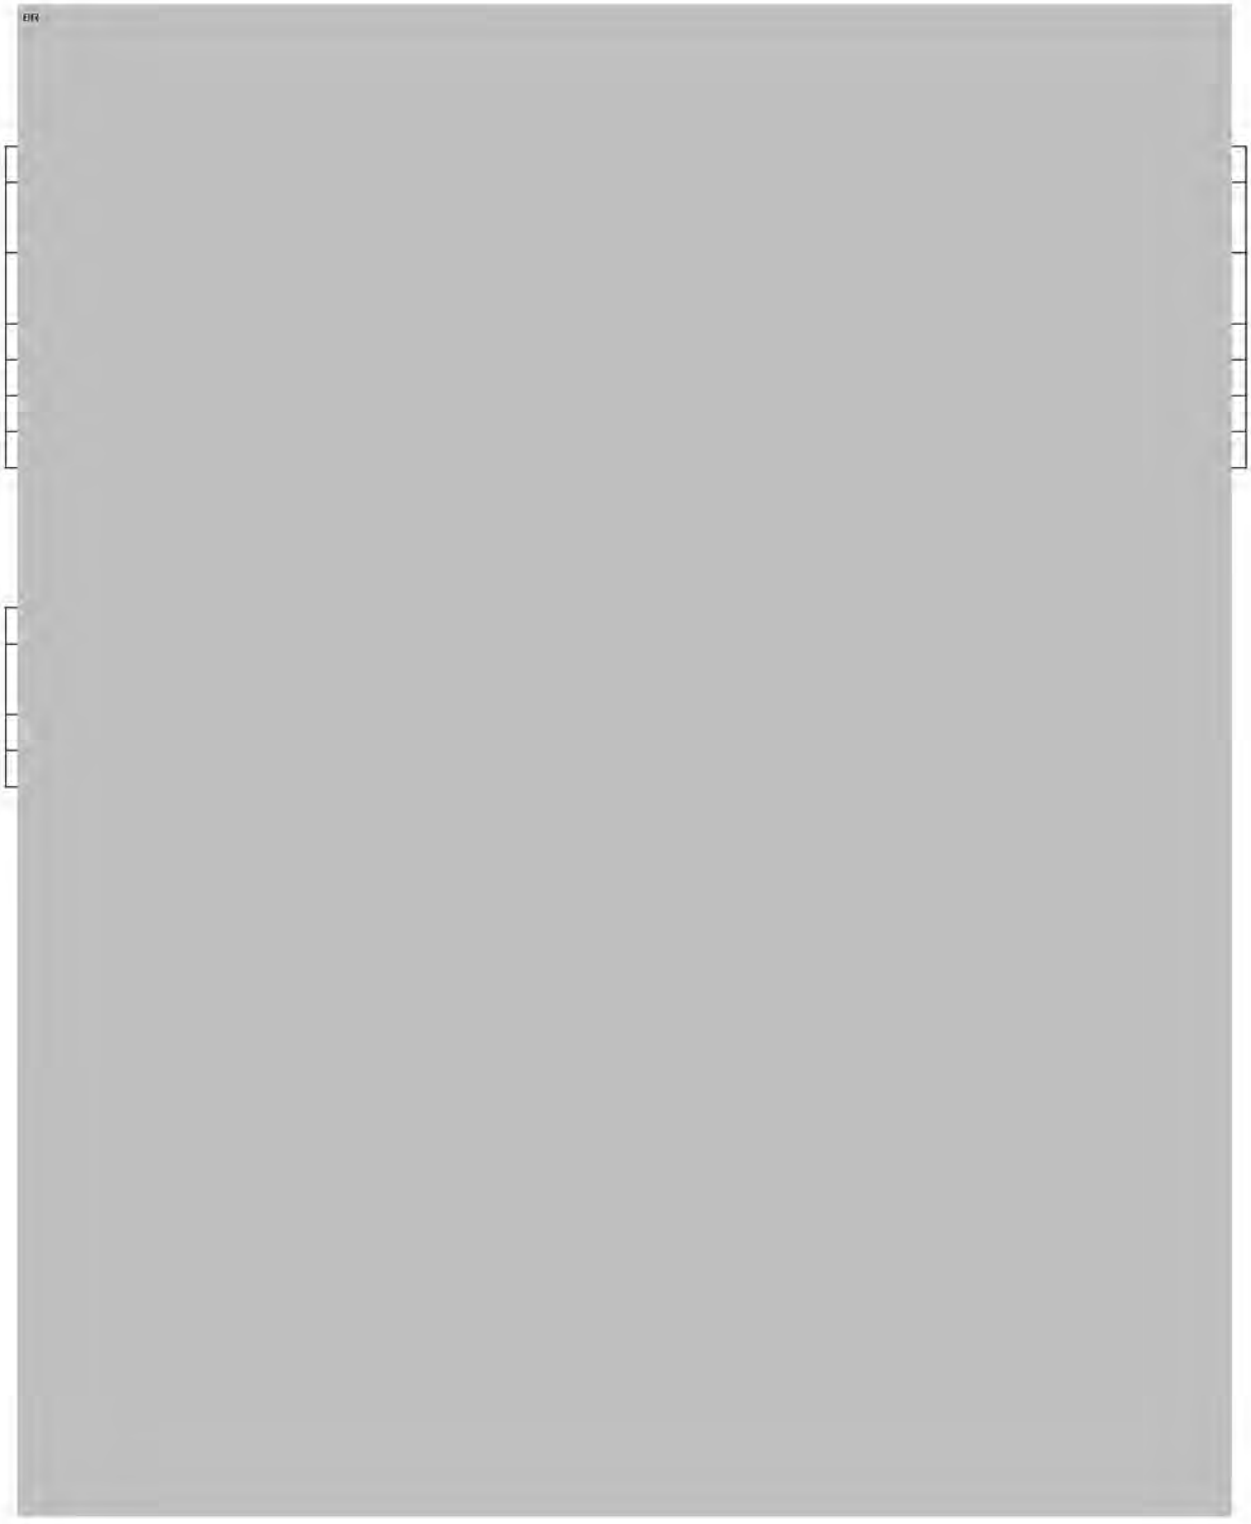

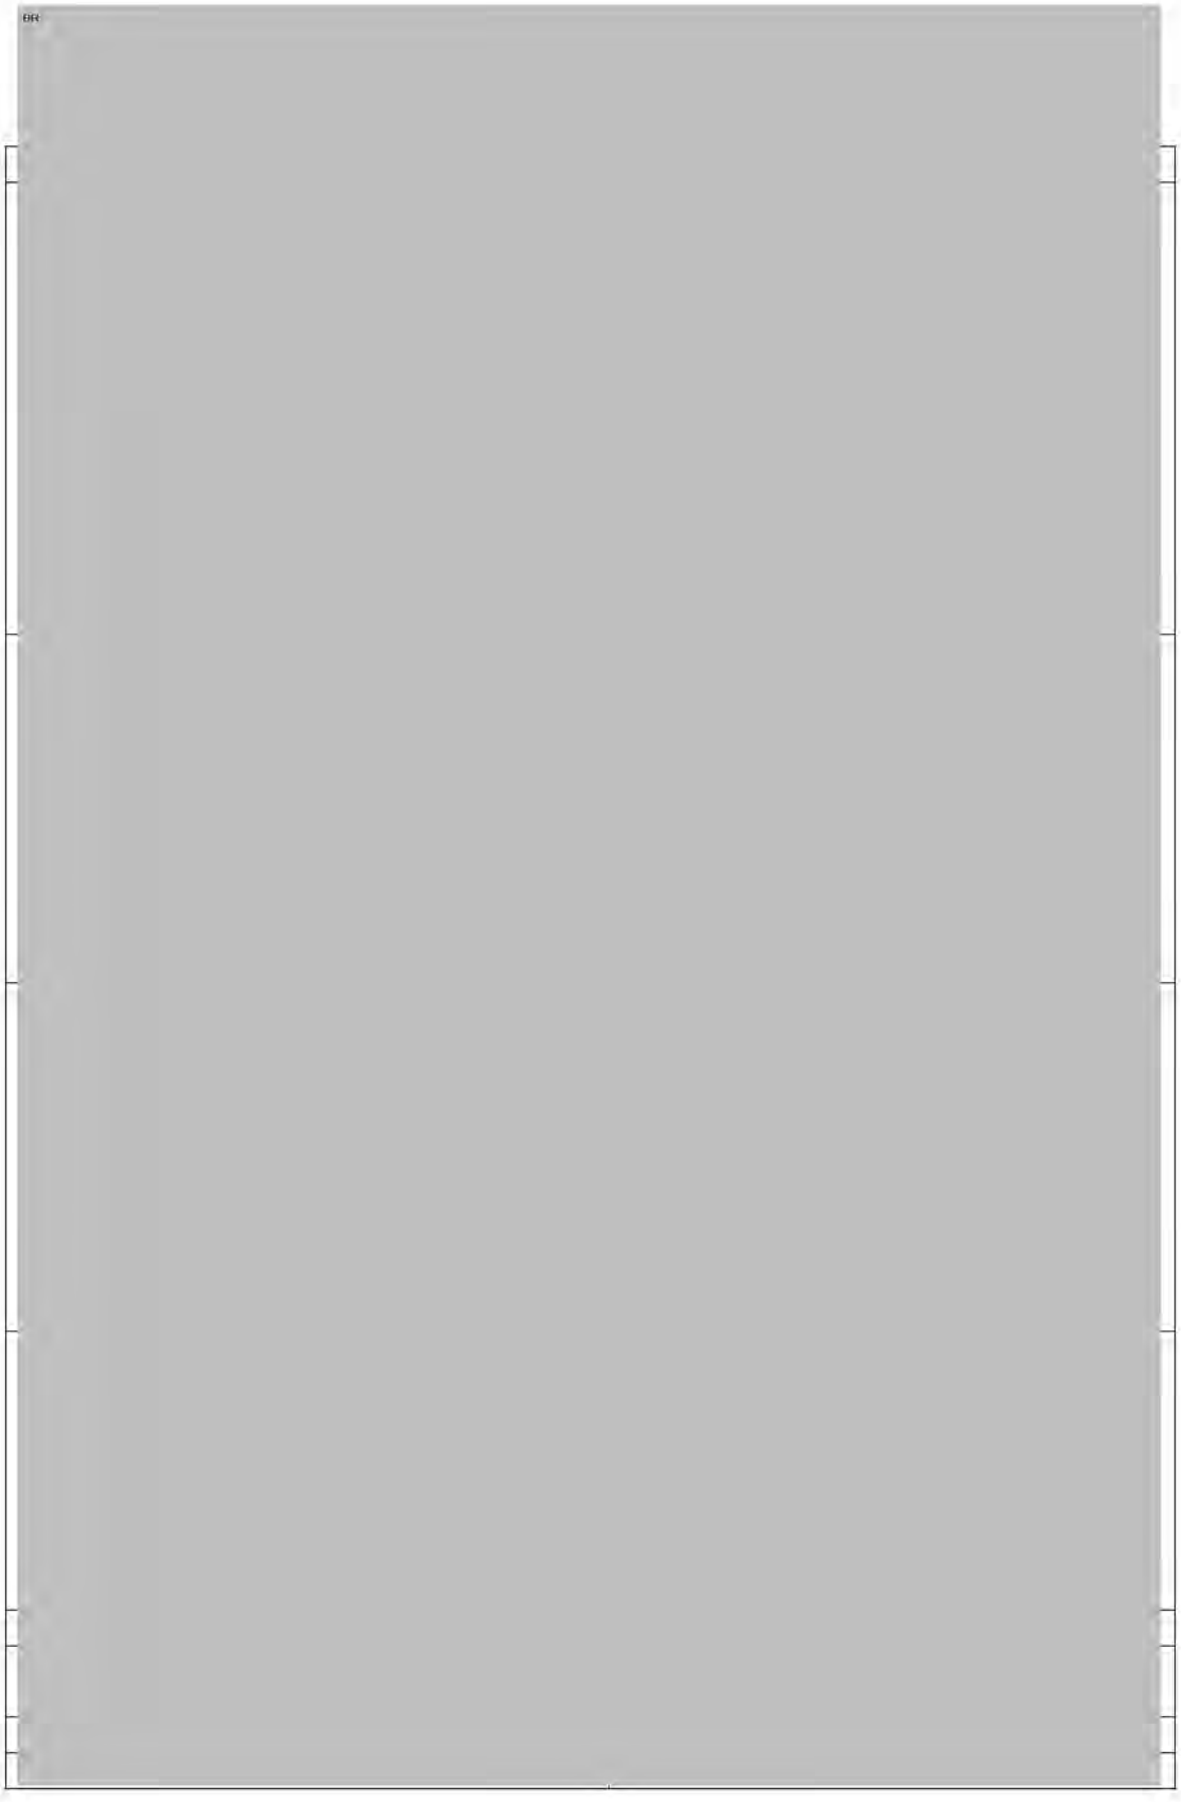

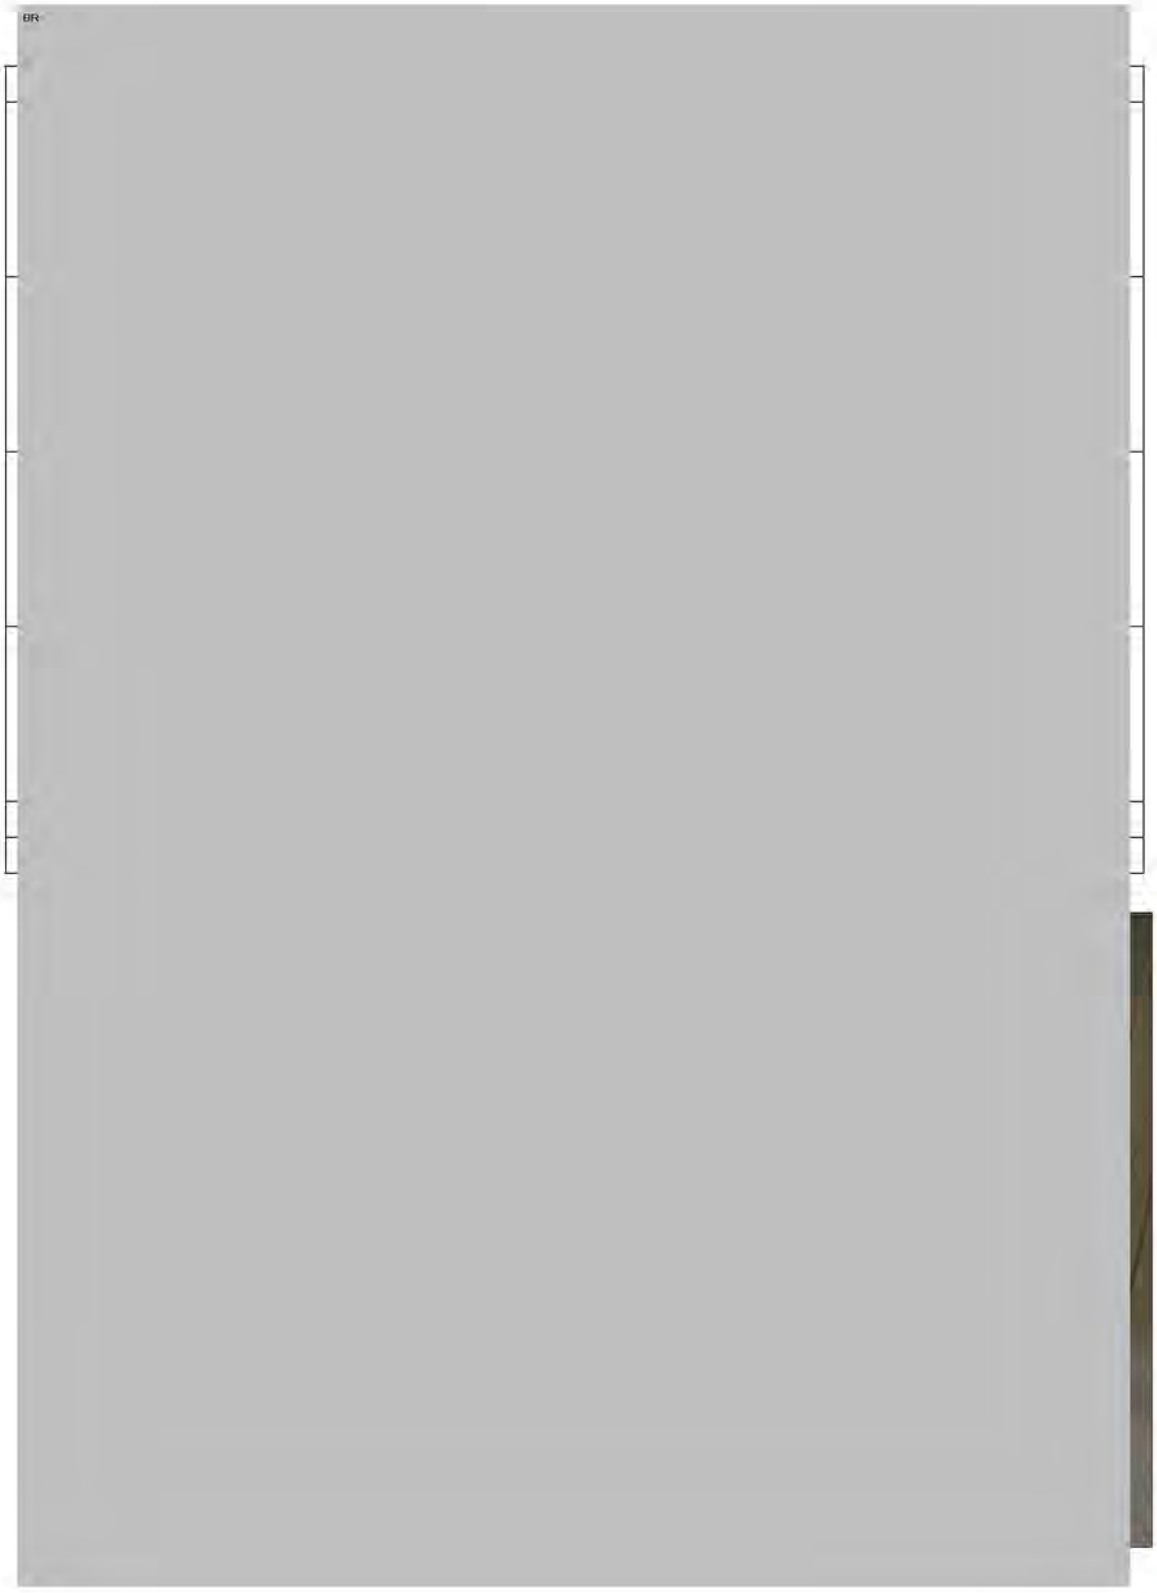

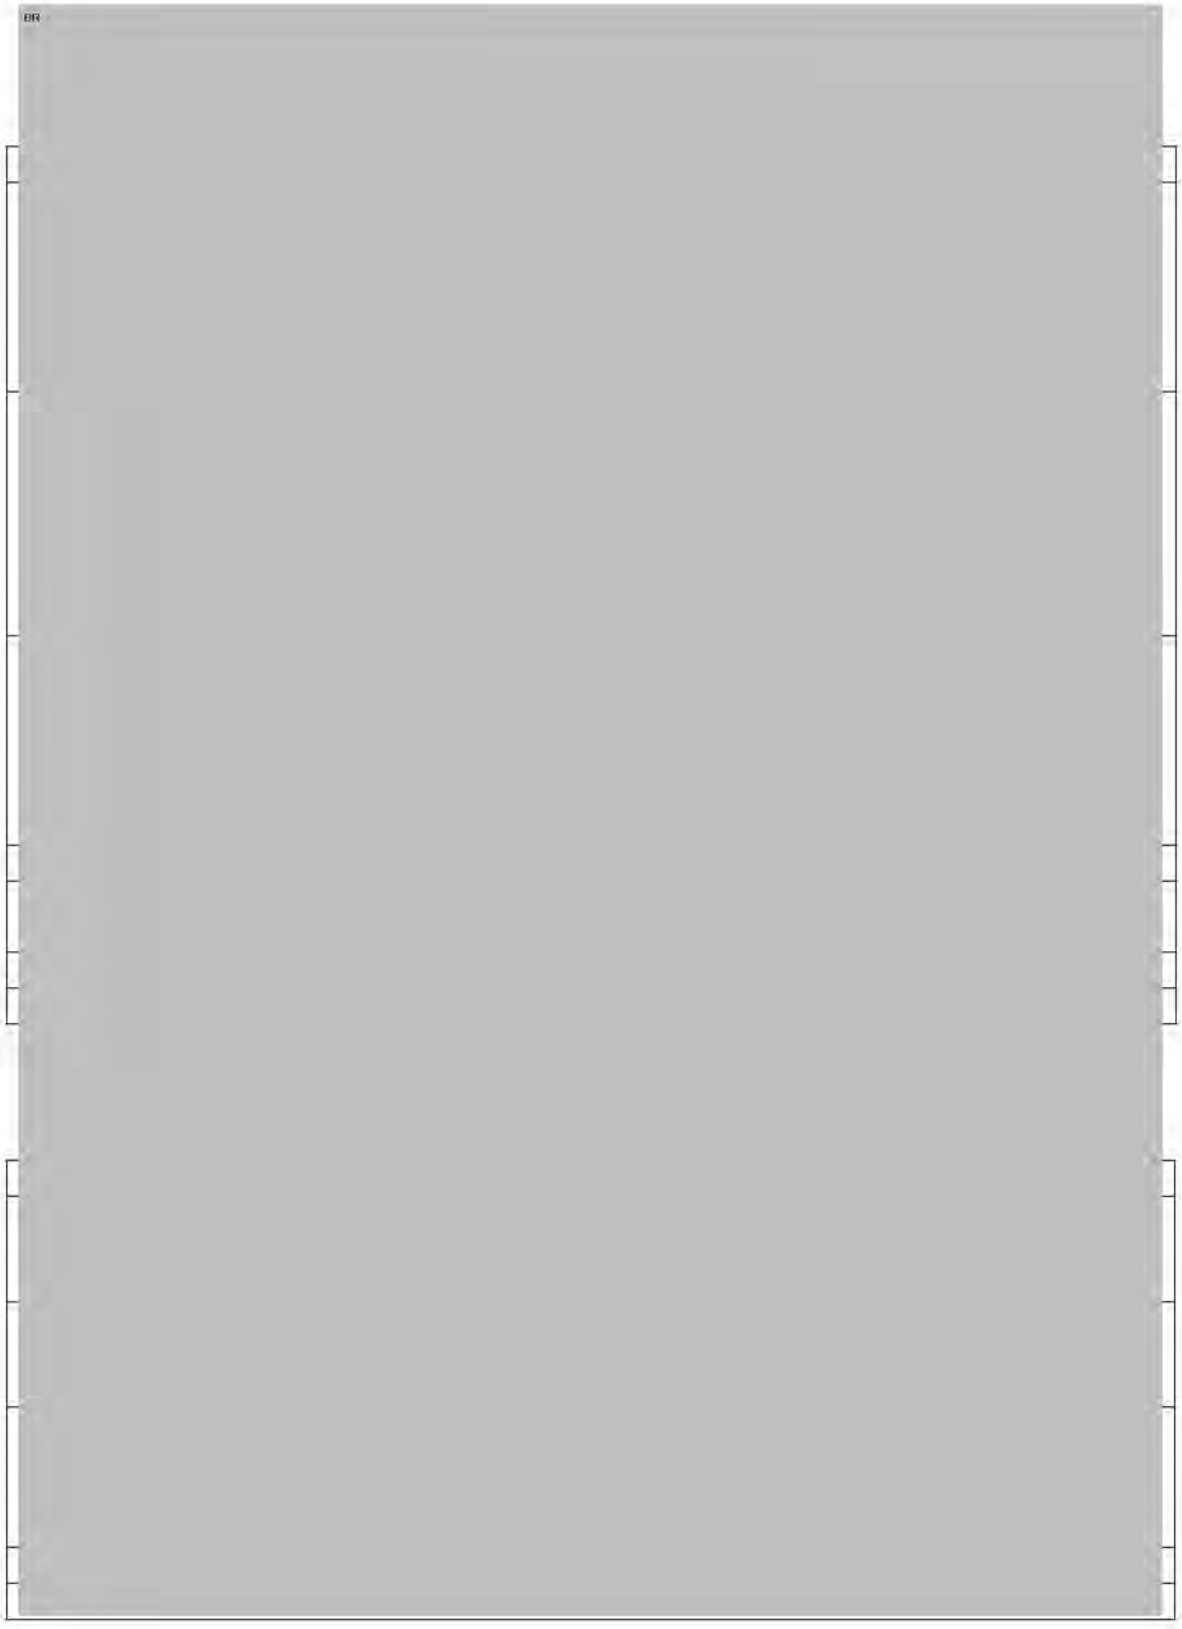

BR

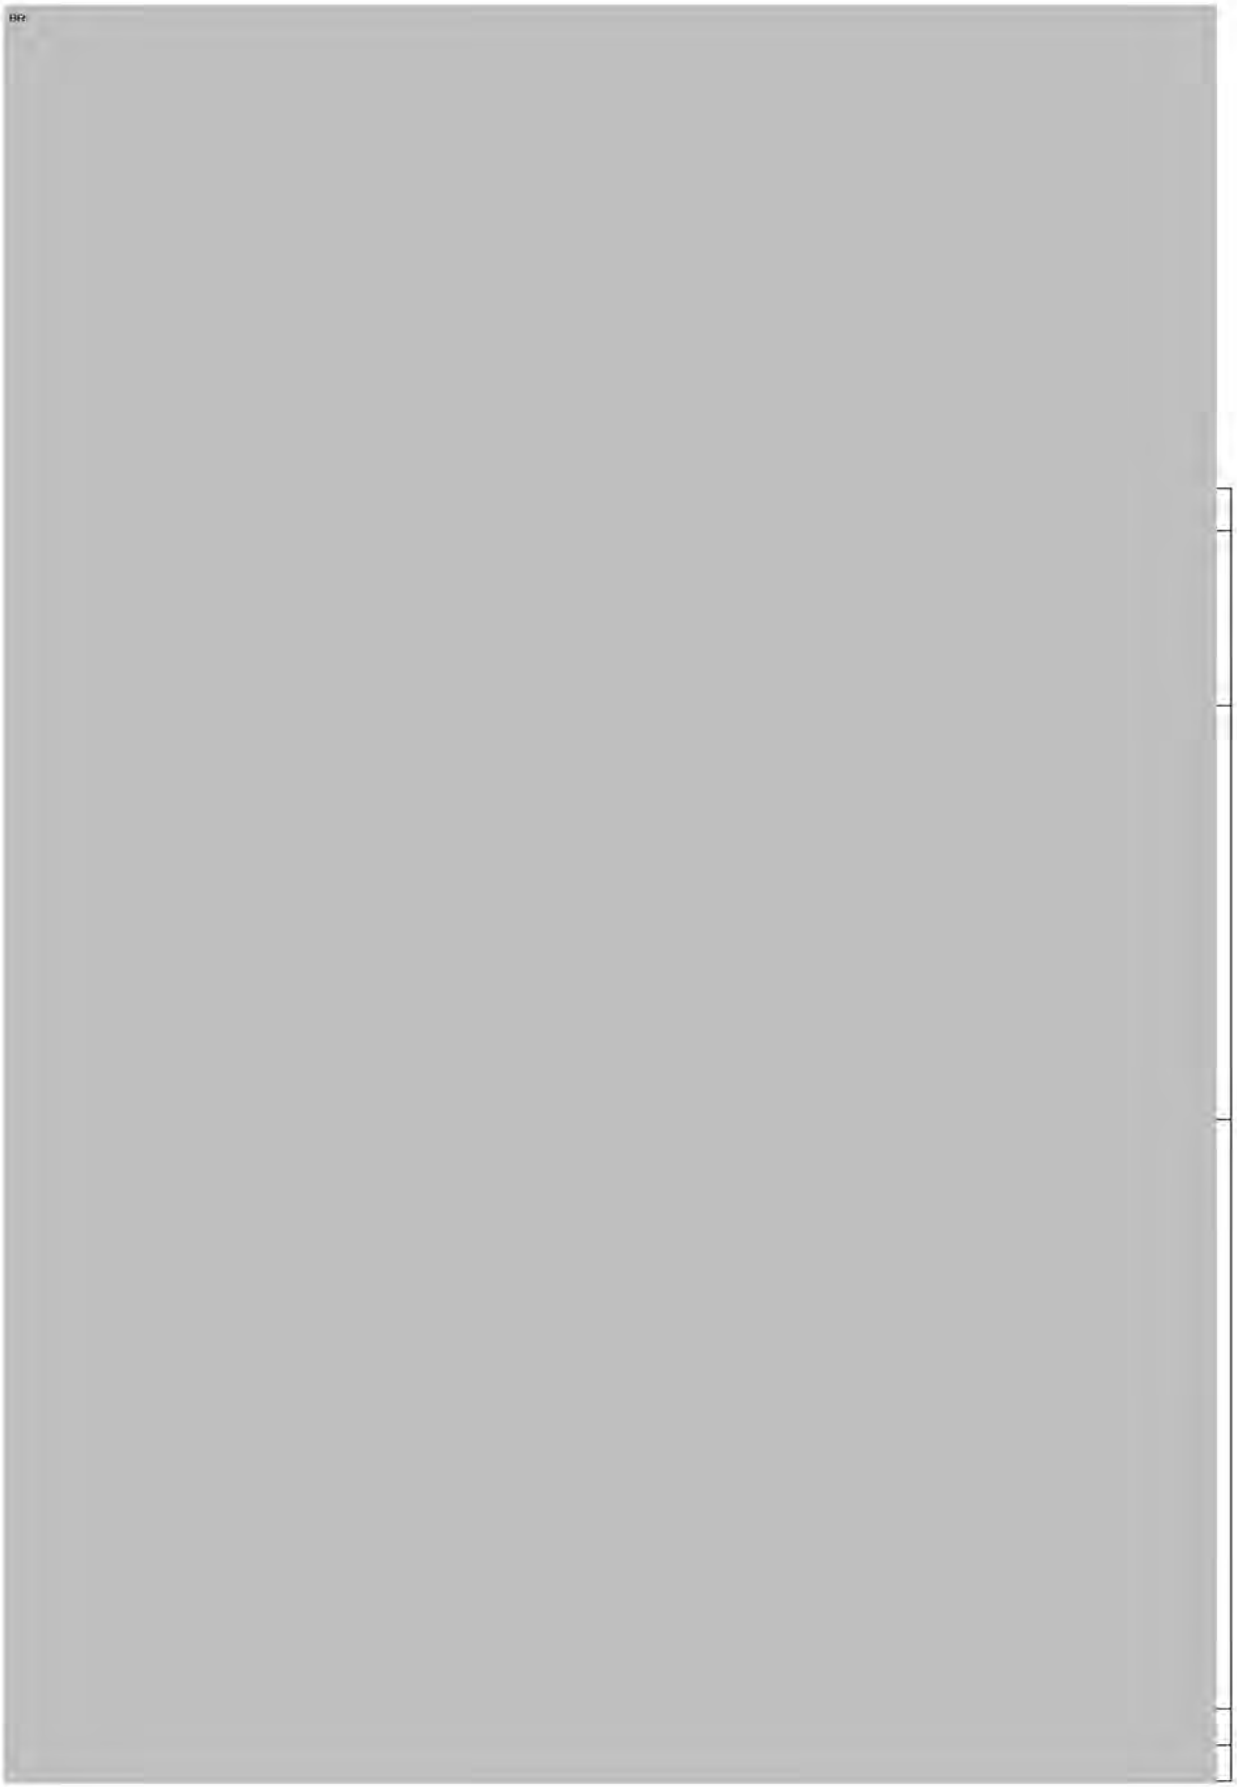

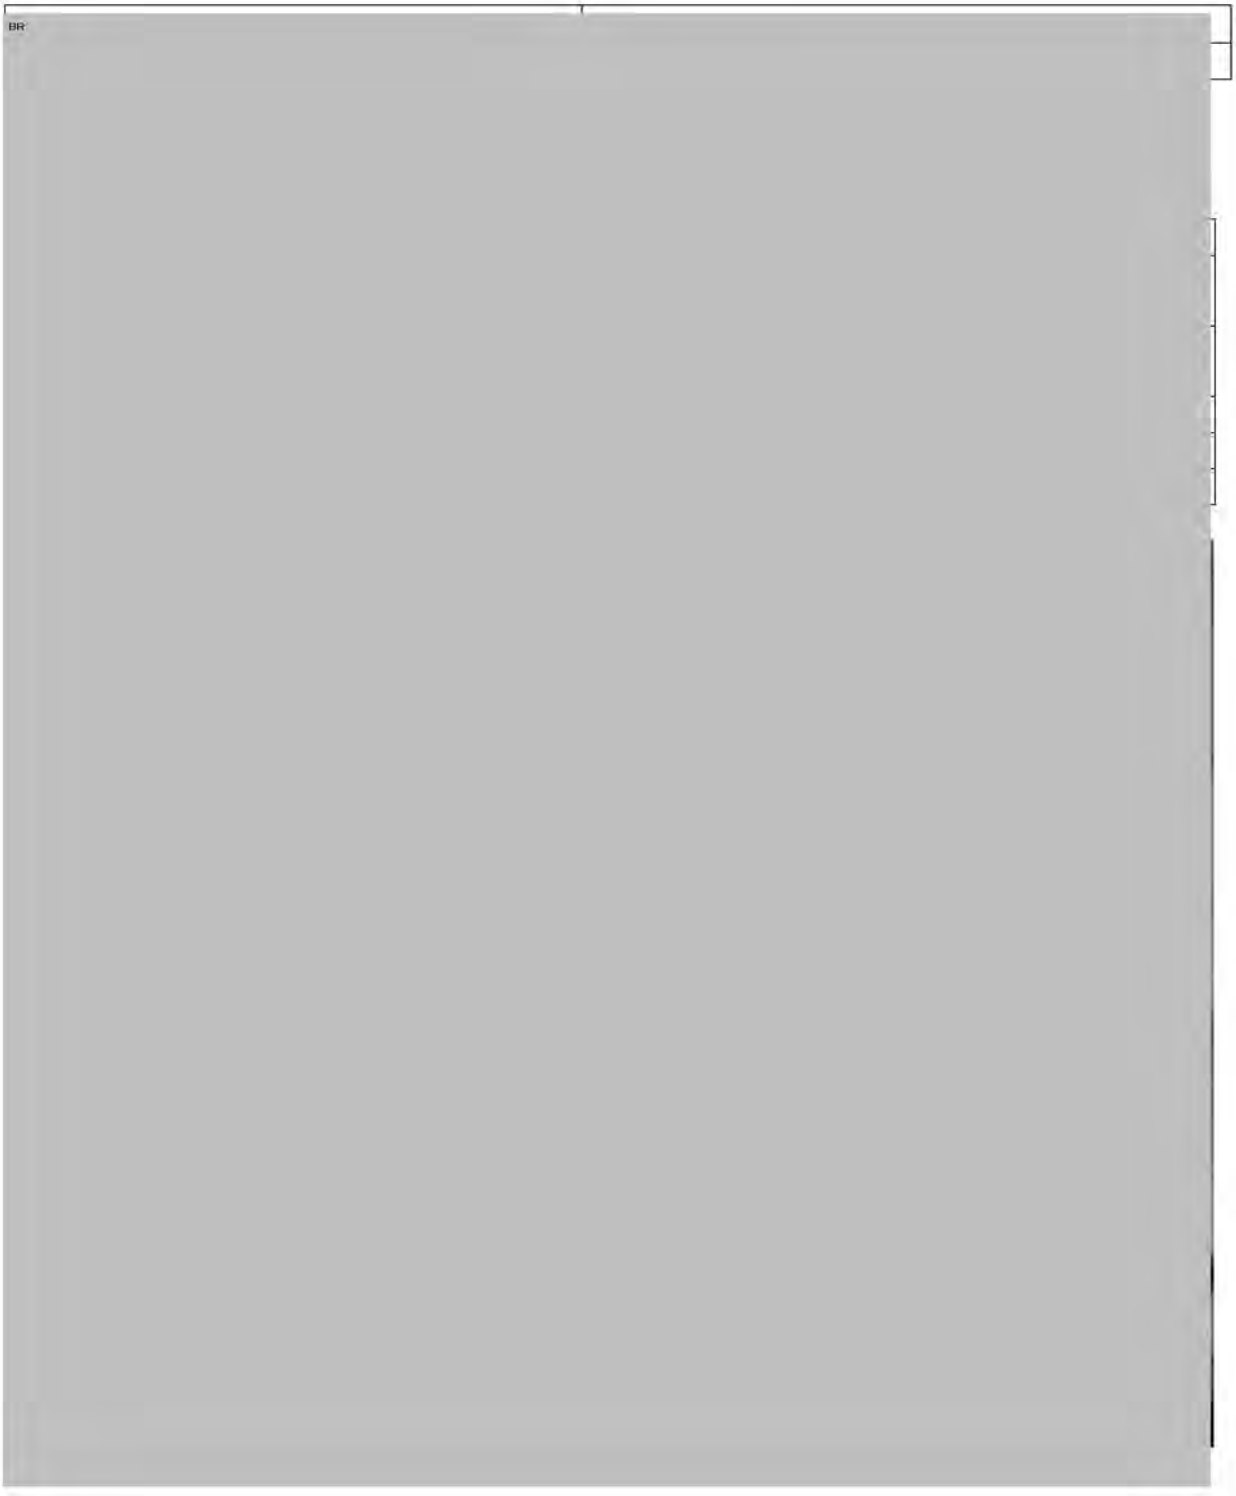
BR

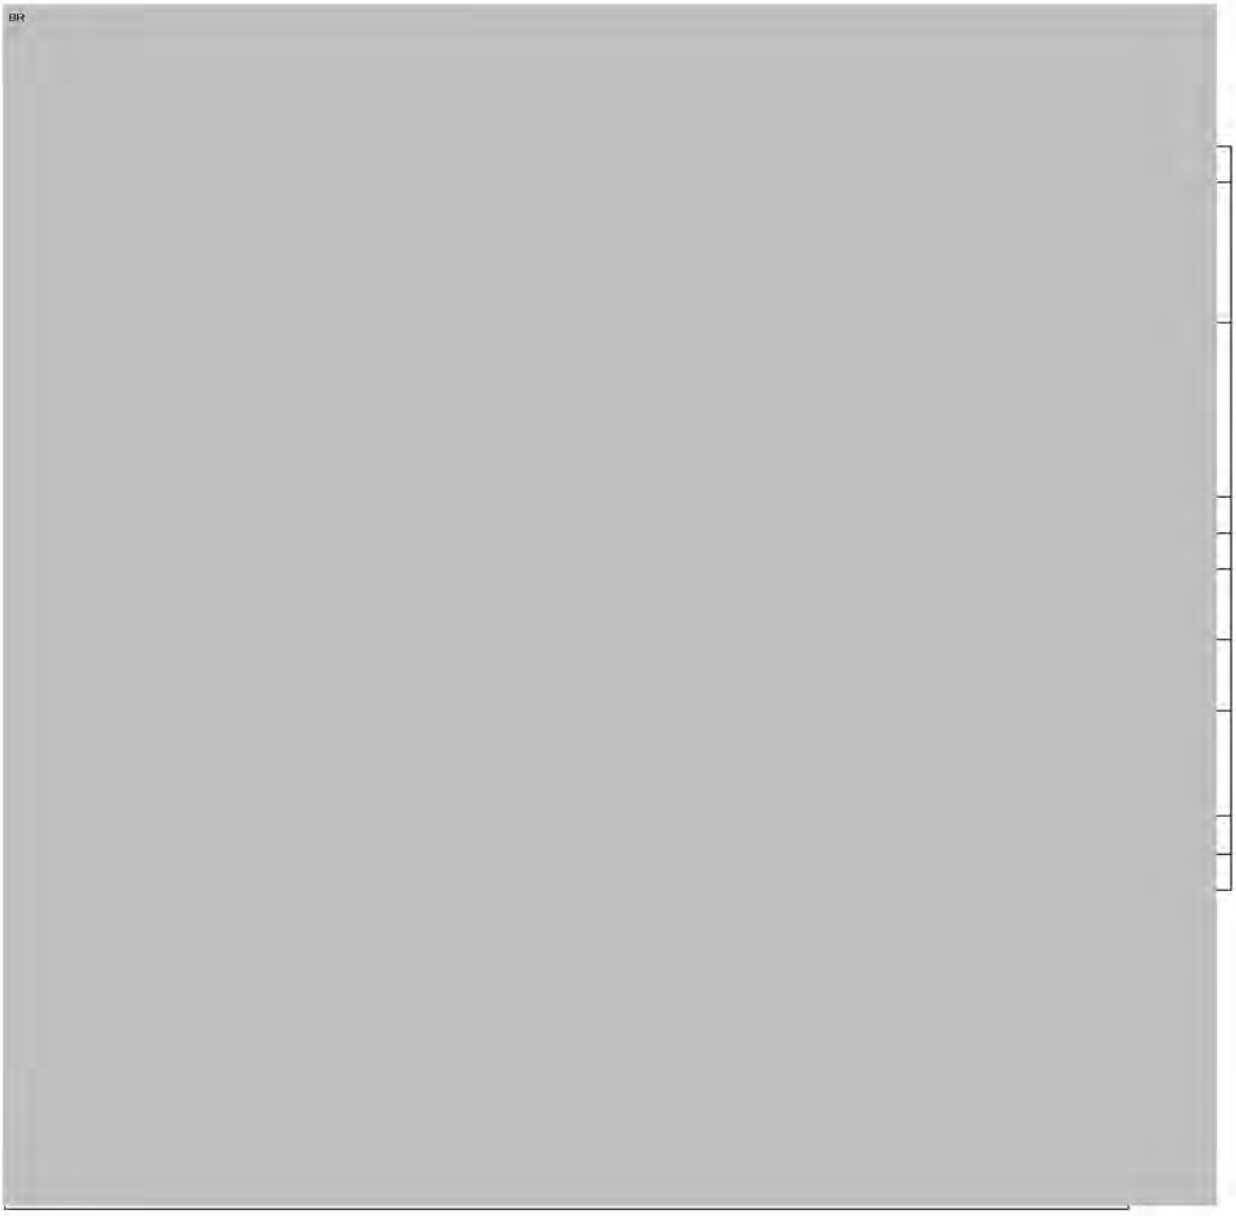
BR

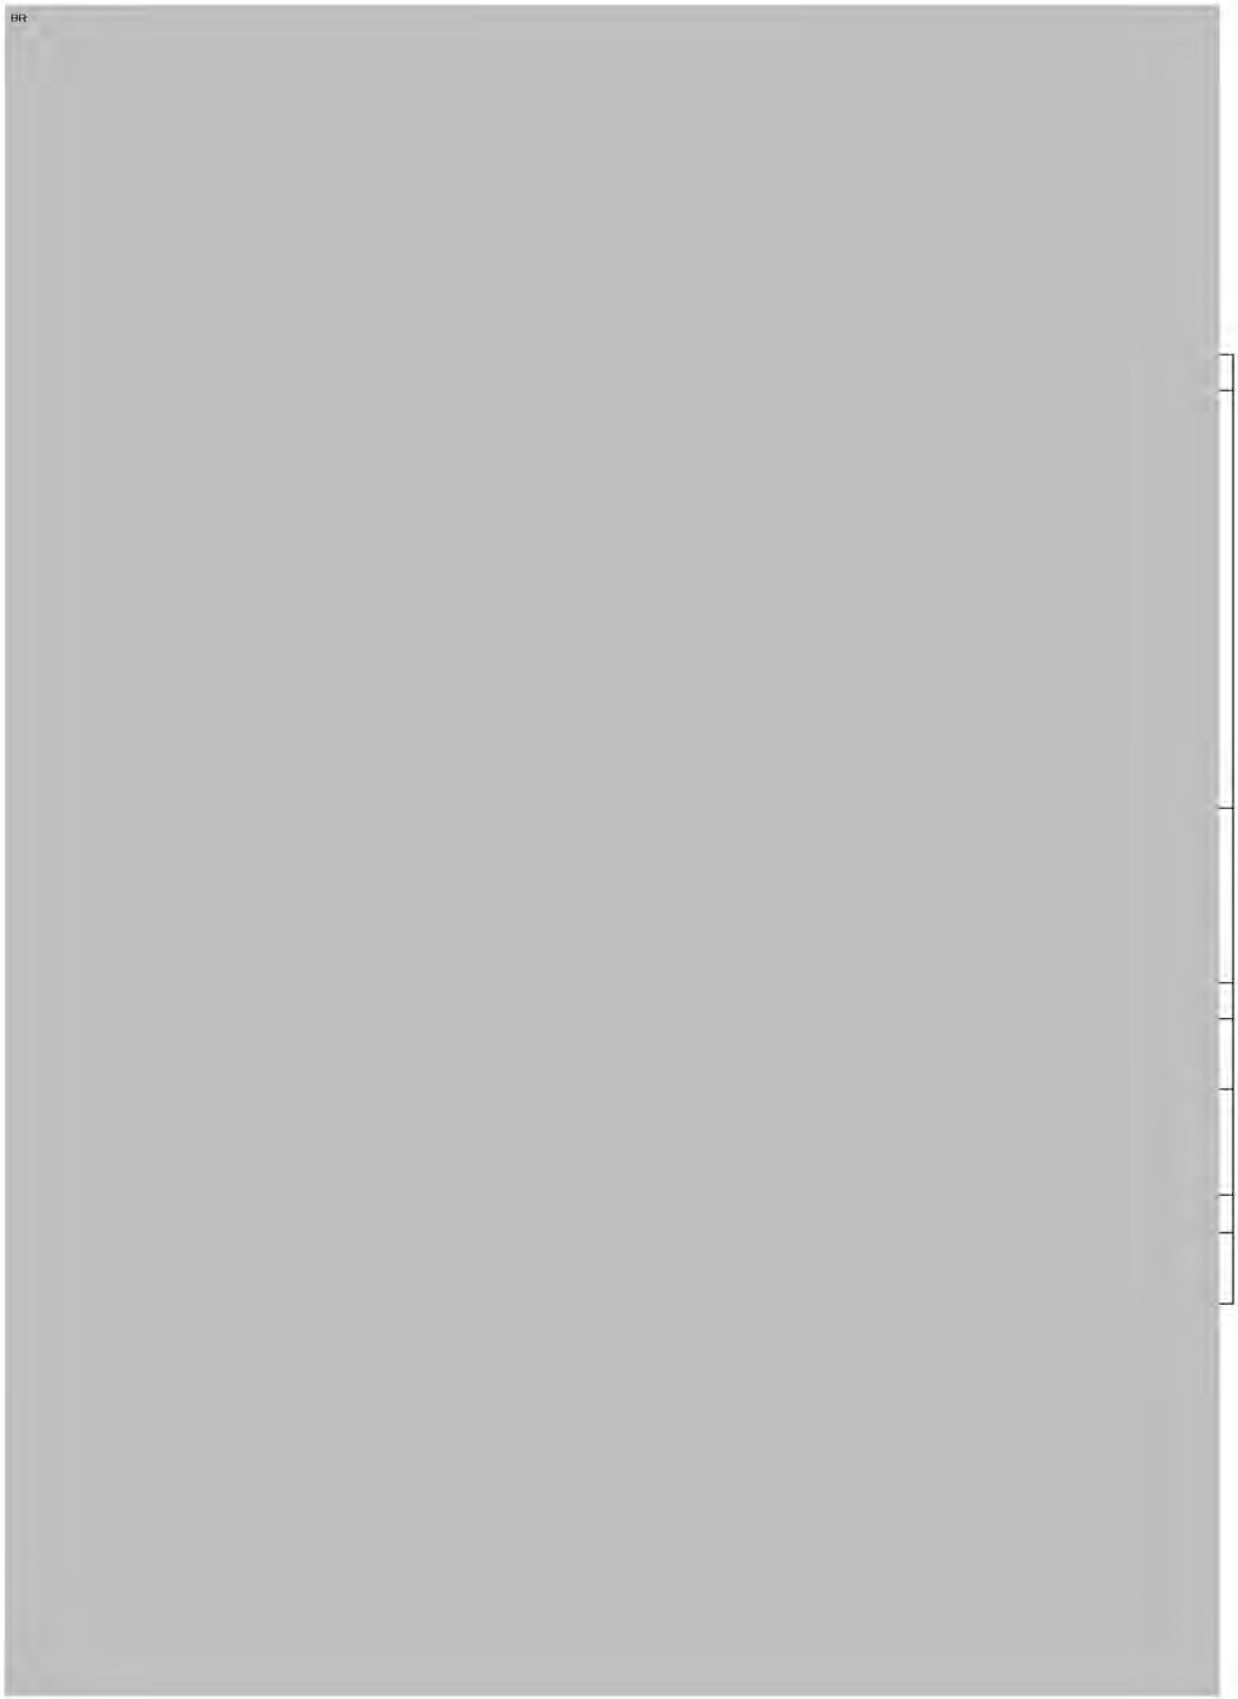
BR

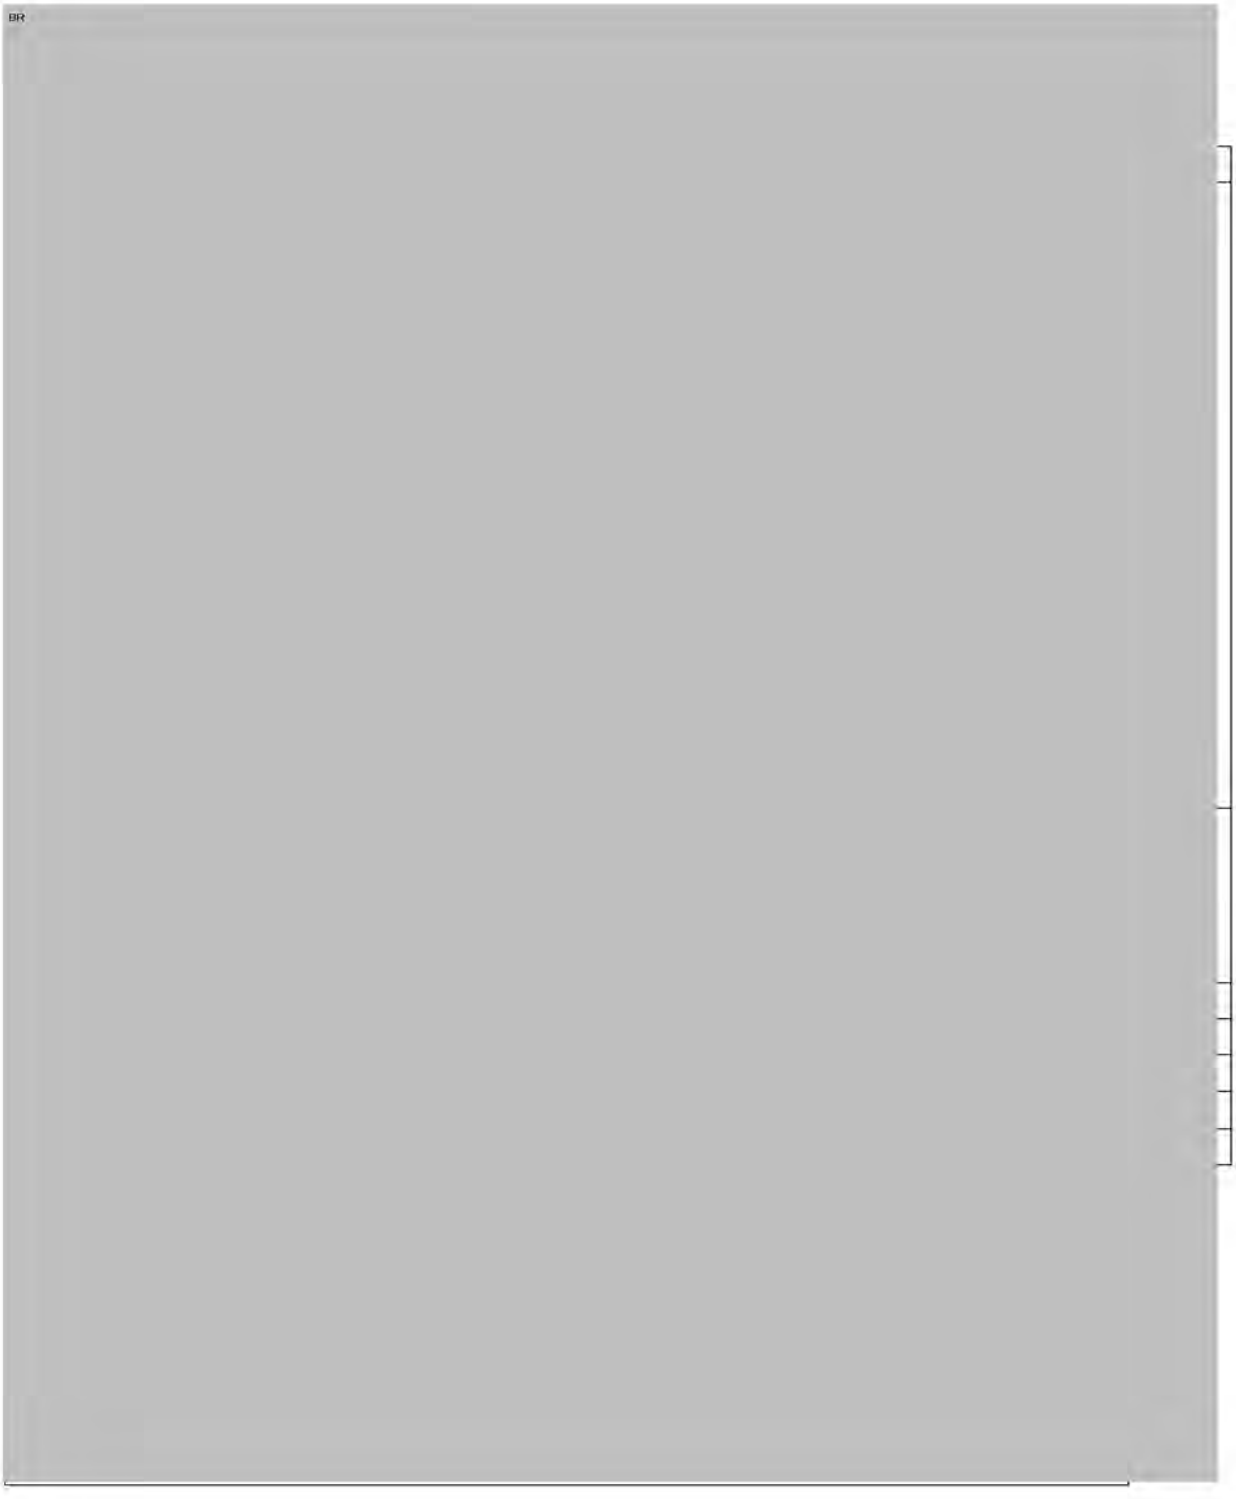
BR

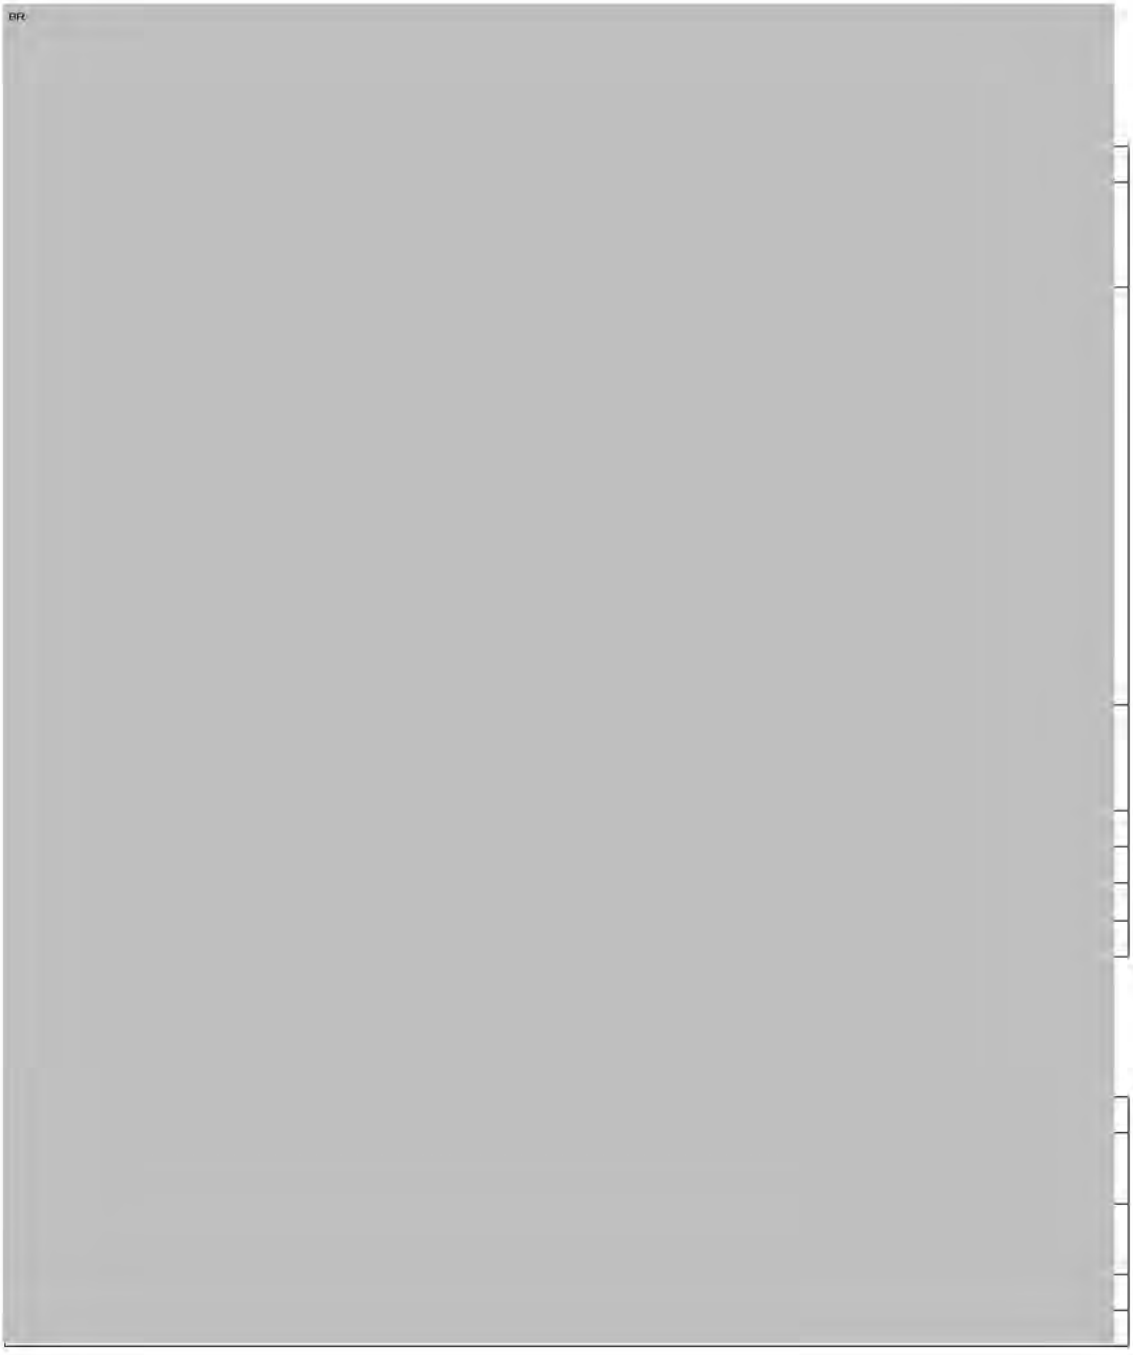

# 4 Overdracht en openstelling

Docnr24



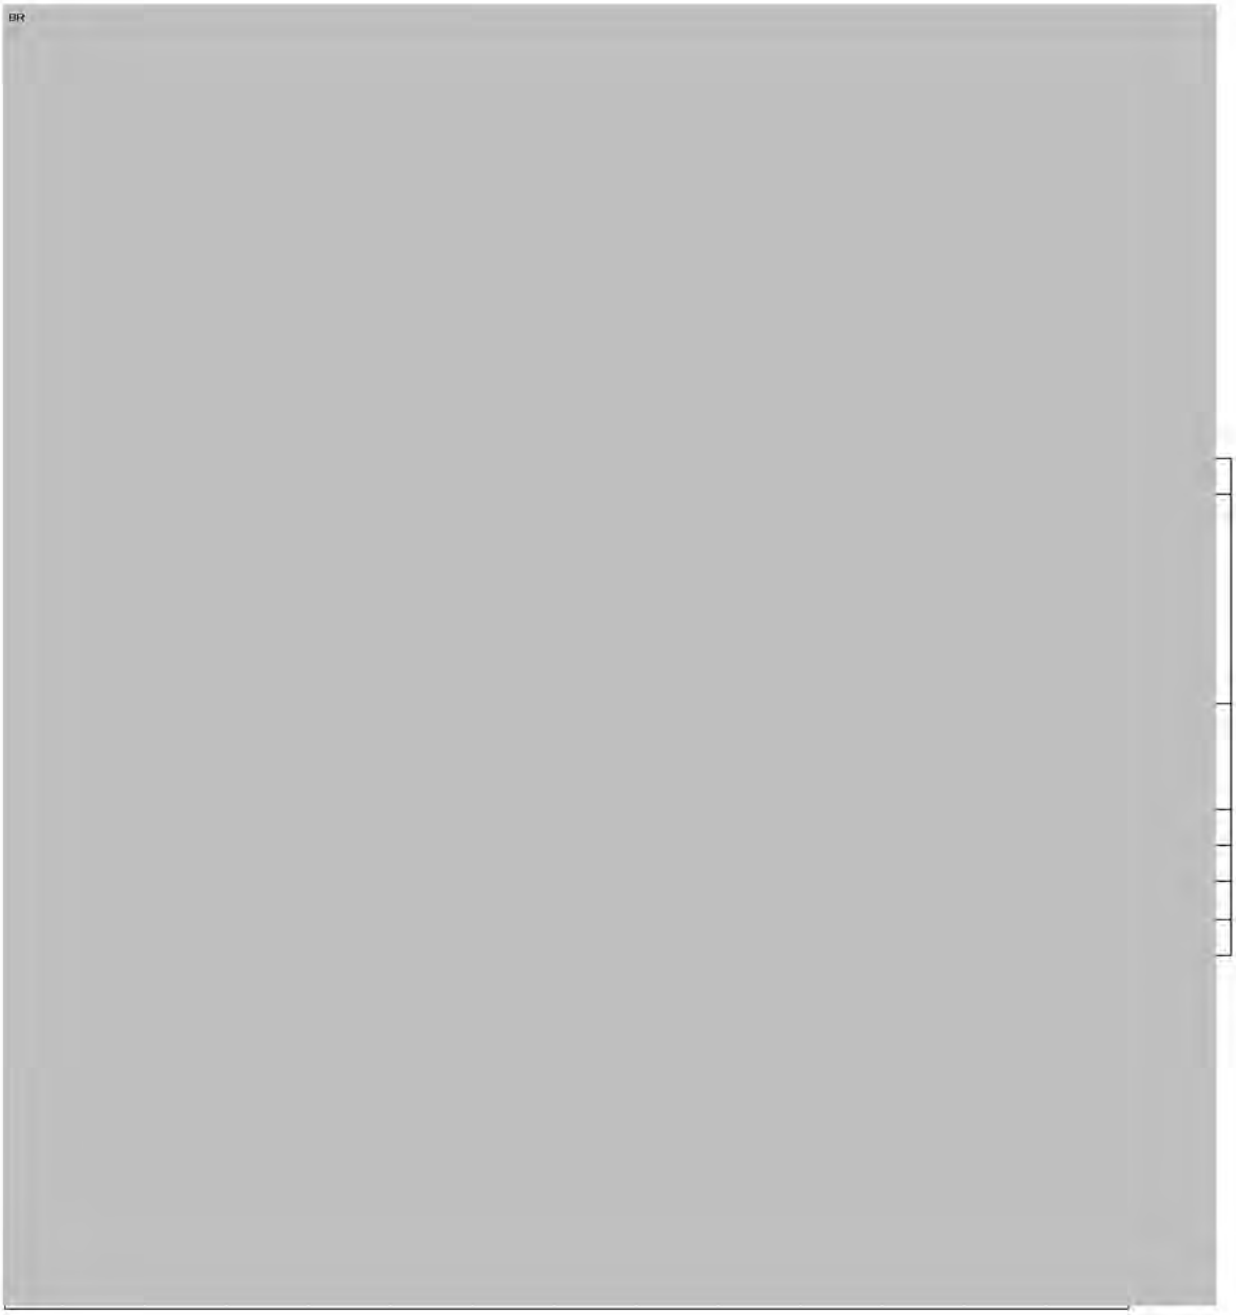

Docnr24



# 5 Projectbeheersing

Docnr24



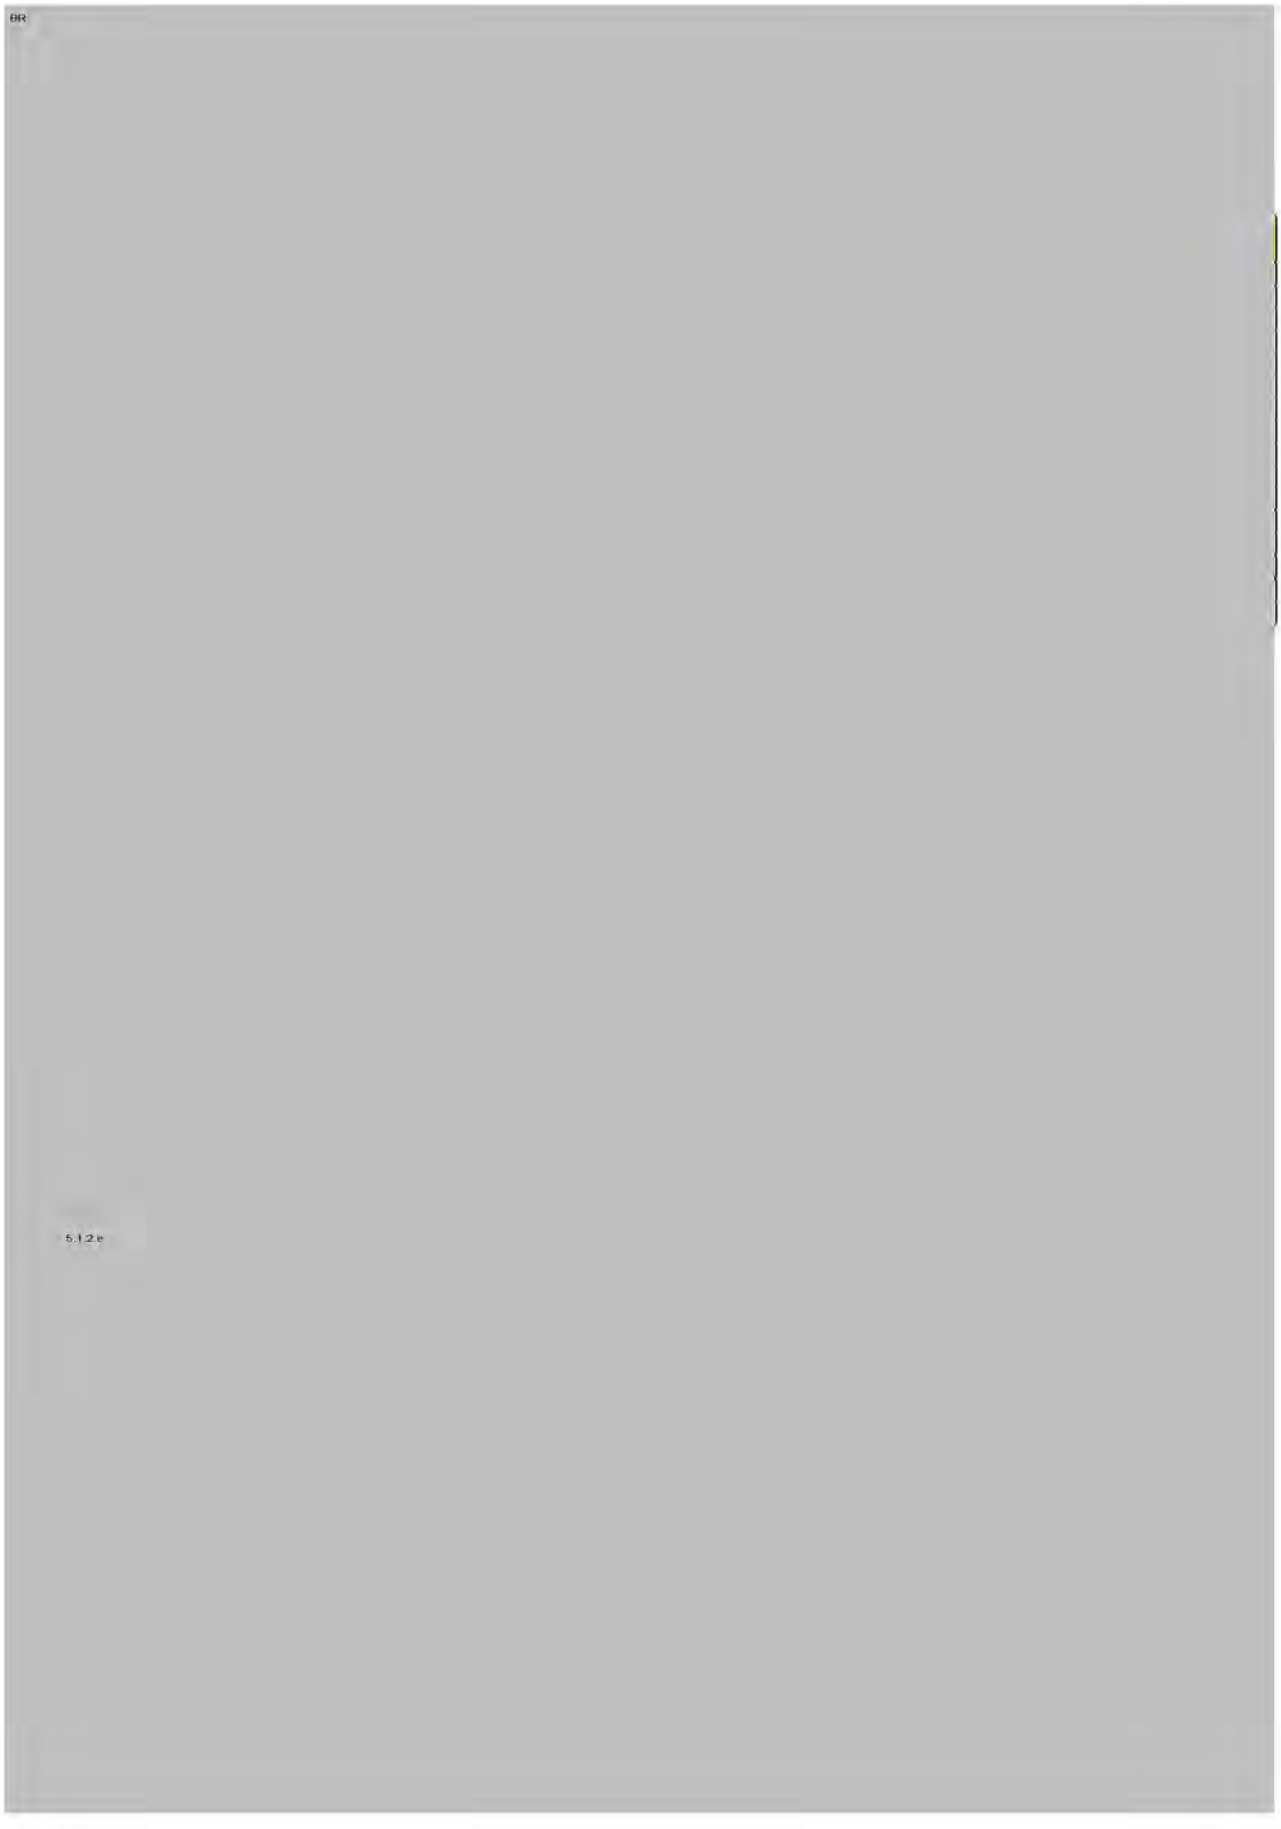

### 5.2.2 Dekkingen

Tabel : Overzicht toegezegde dekkingen Rotterdamsebaan, Euro's prijspeil 2019 (excl. BTW)

Overzicht toegezegde/verwachte dekkingen Rotterdamse Baan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delftland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland
Er zijn in het derde kwartaal 2019 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland

Er zijn in het derde kwartaal 2019 geen mutaties geweest.

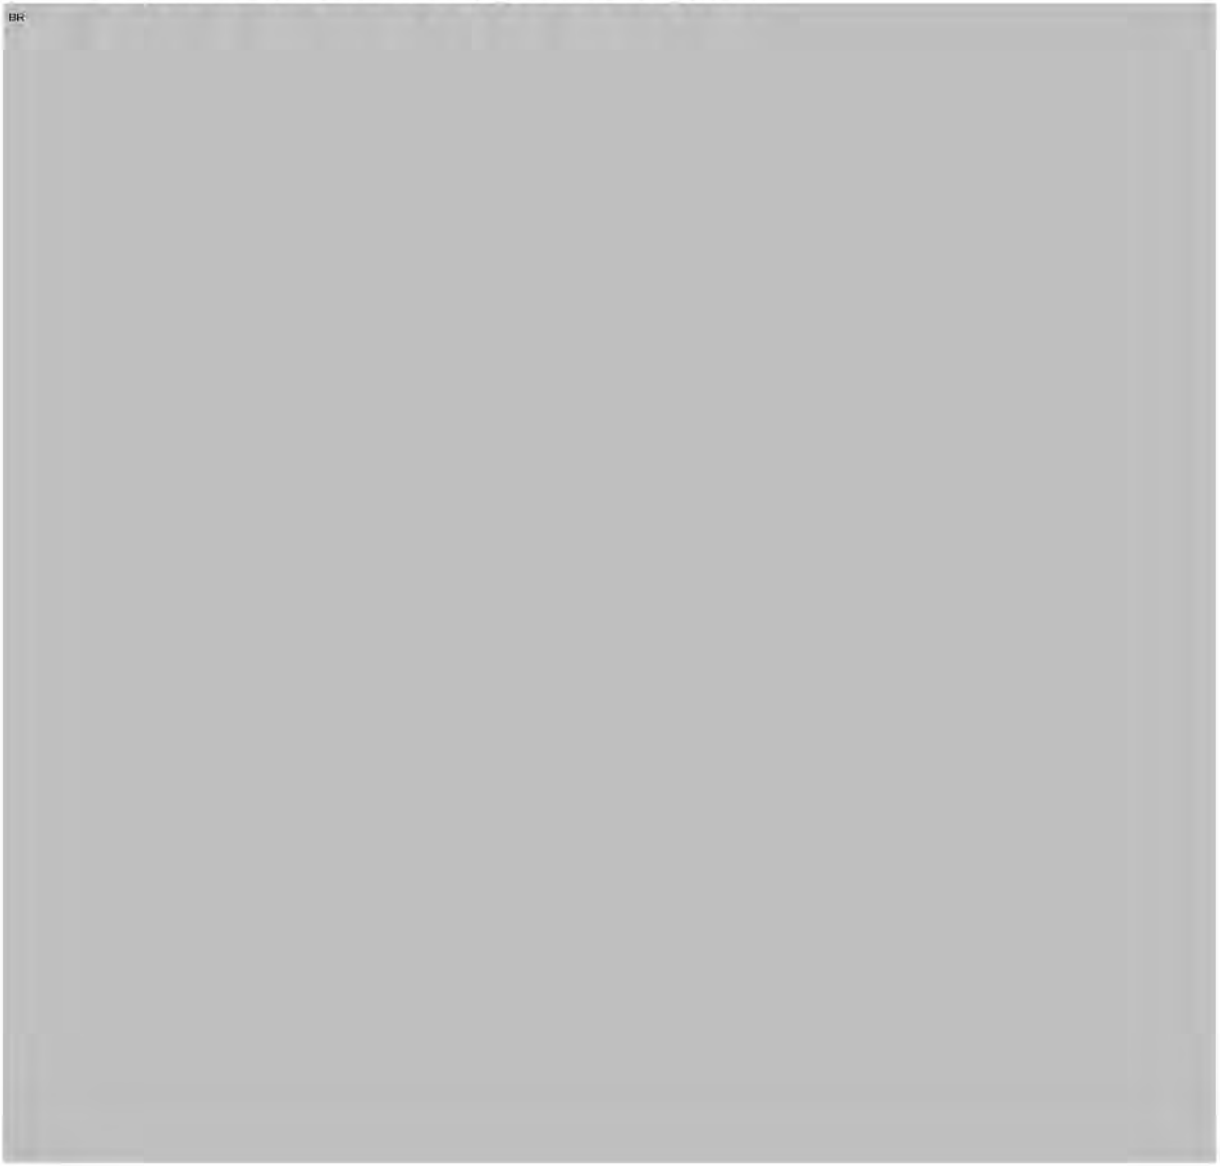

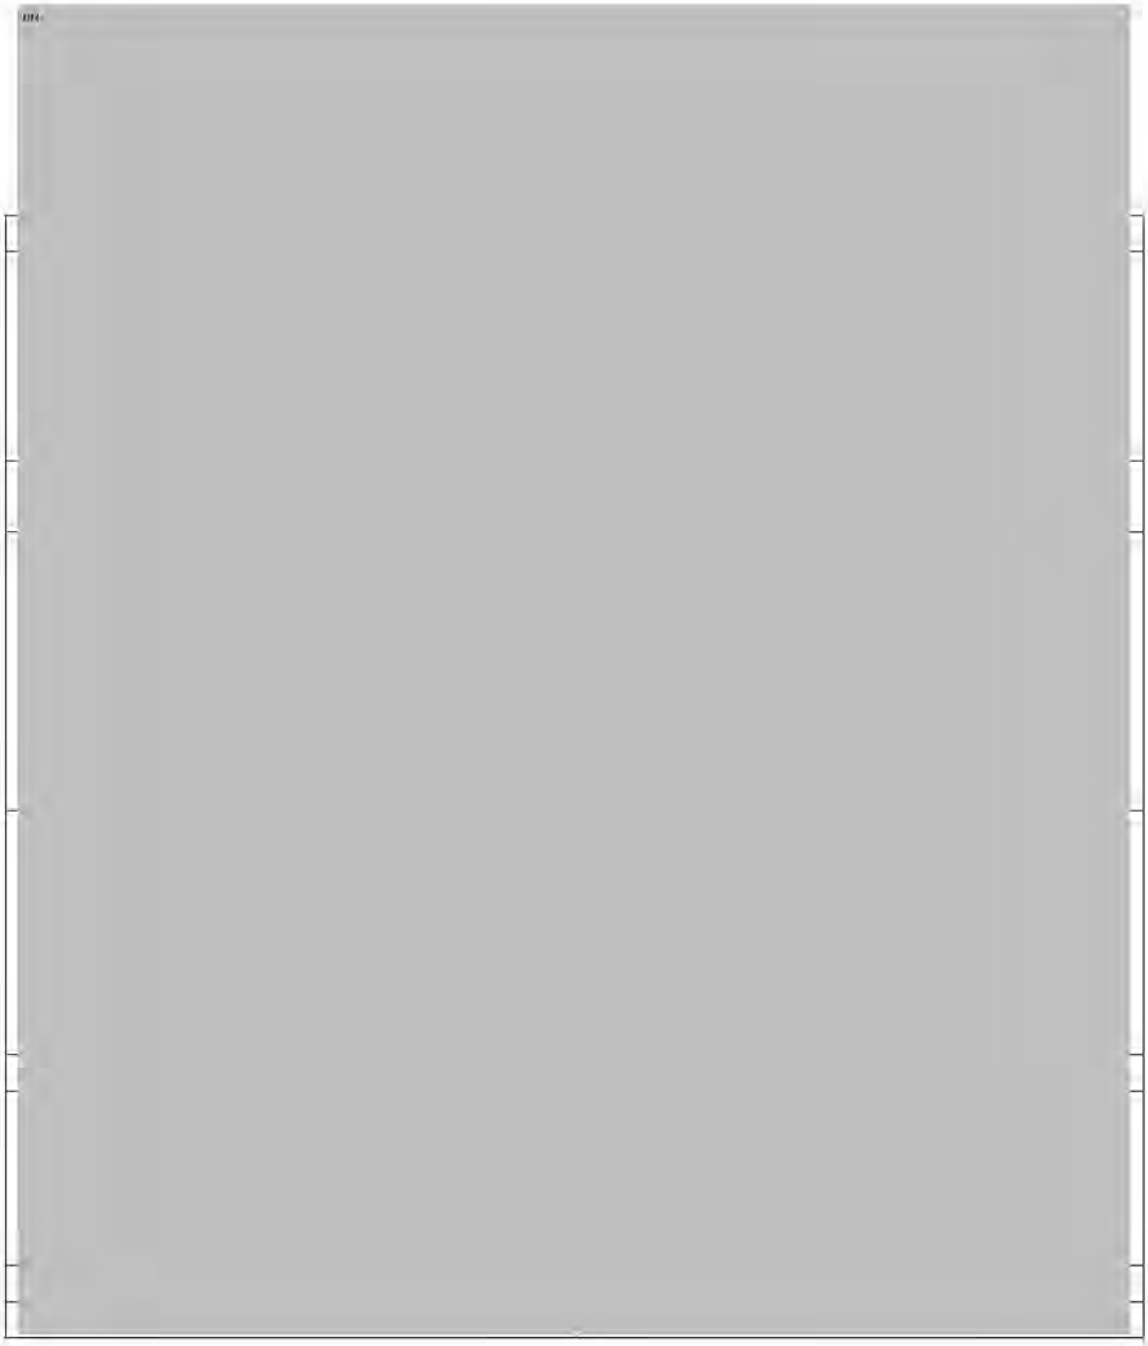

### 5.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| BR |
| Uitvoeren van een onzekerheidsanalyse op tijd en financiën voor de onderdelen Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e watertoevoer naar waterberging: |
| BR |

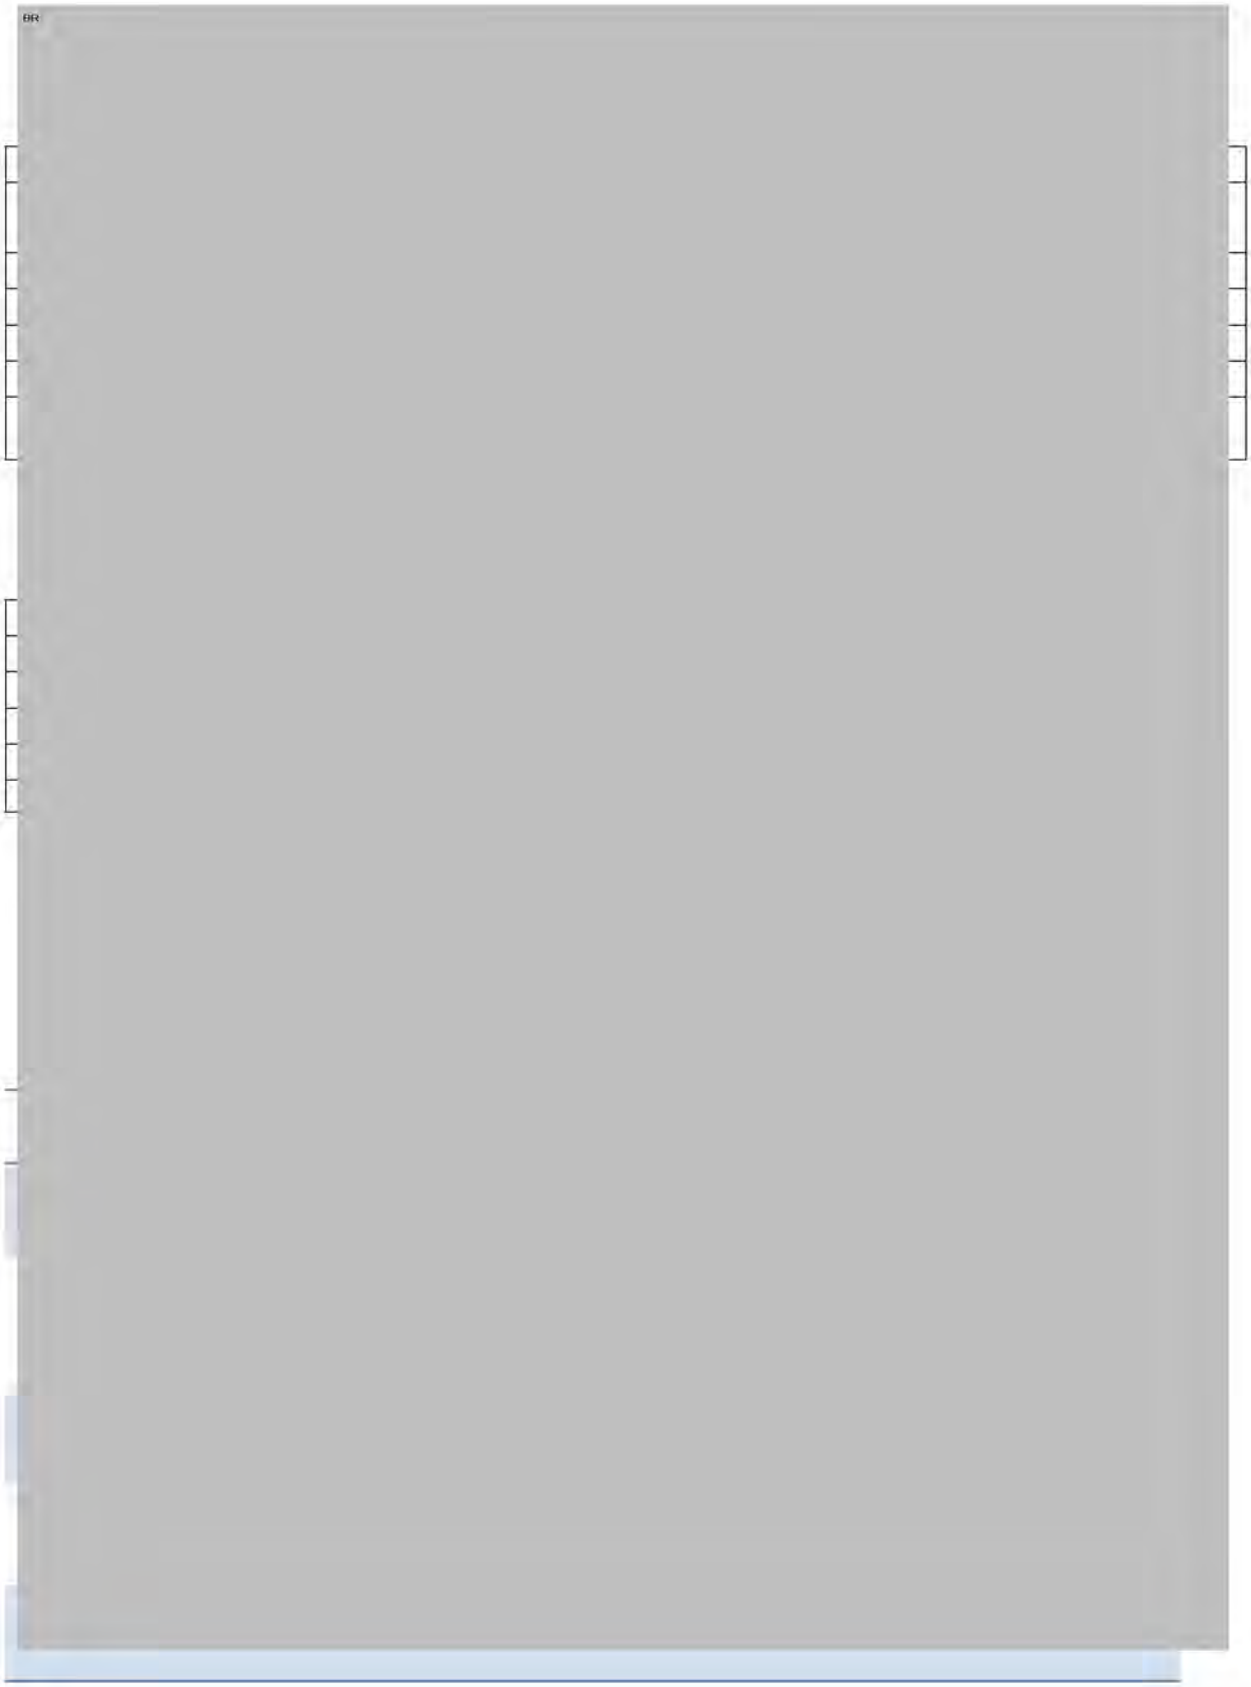

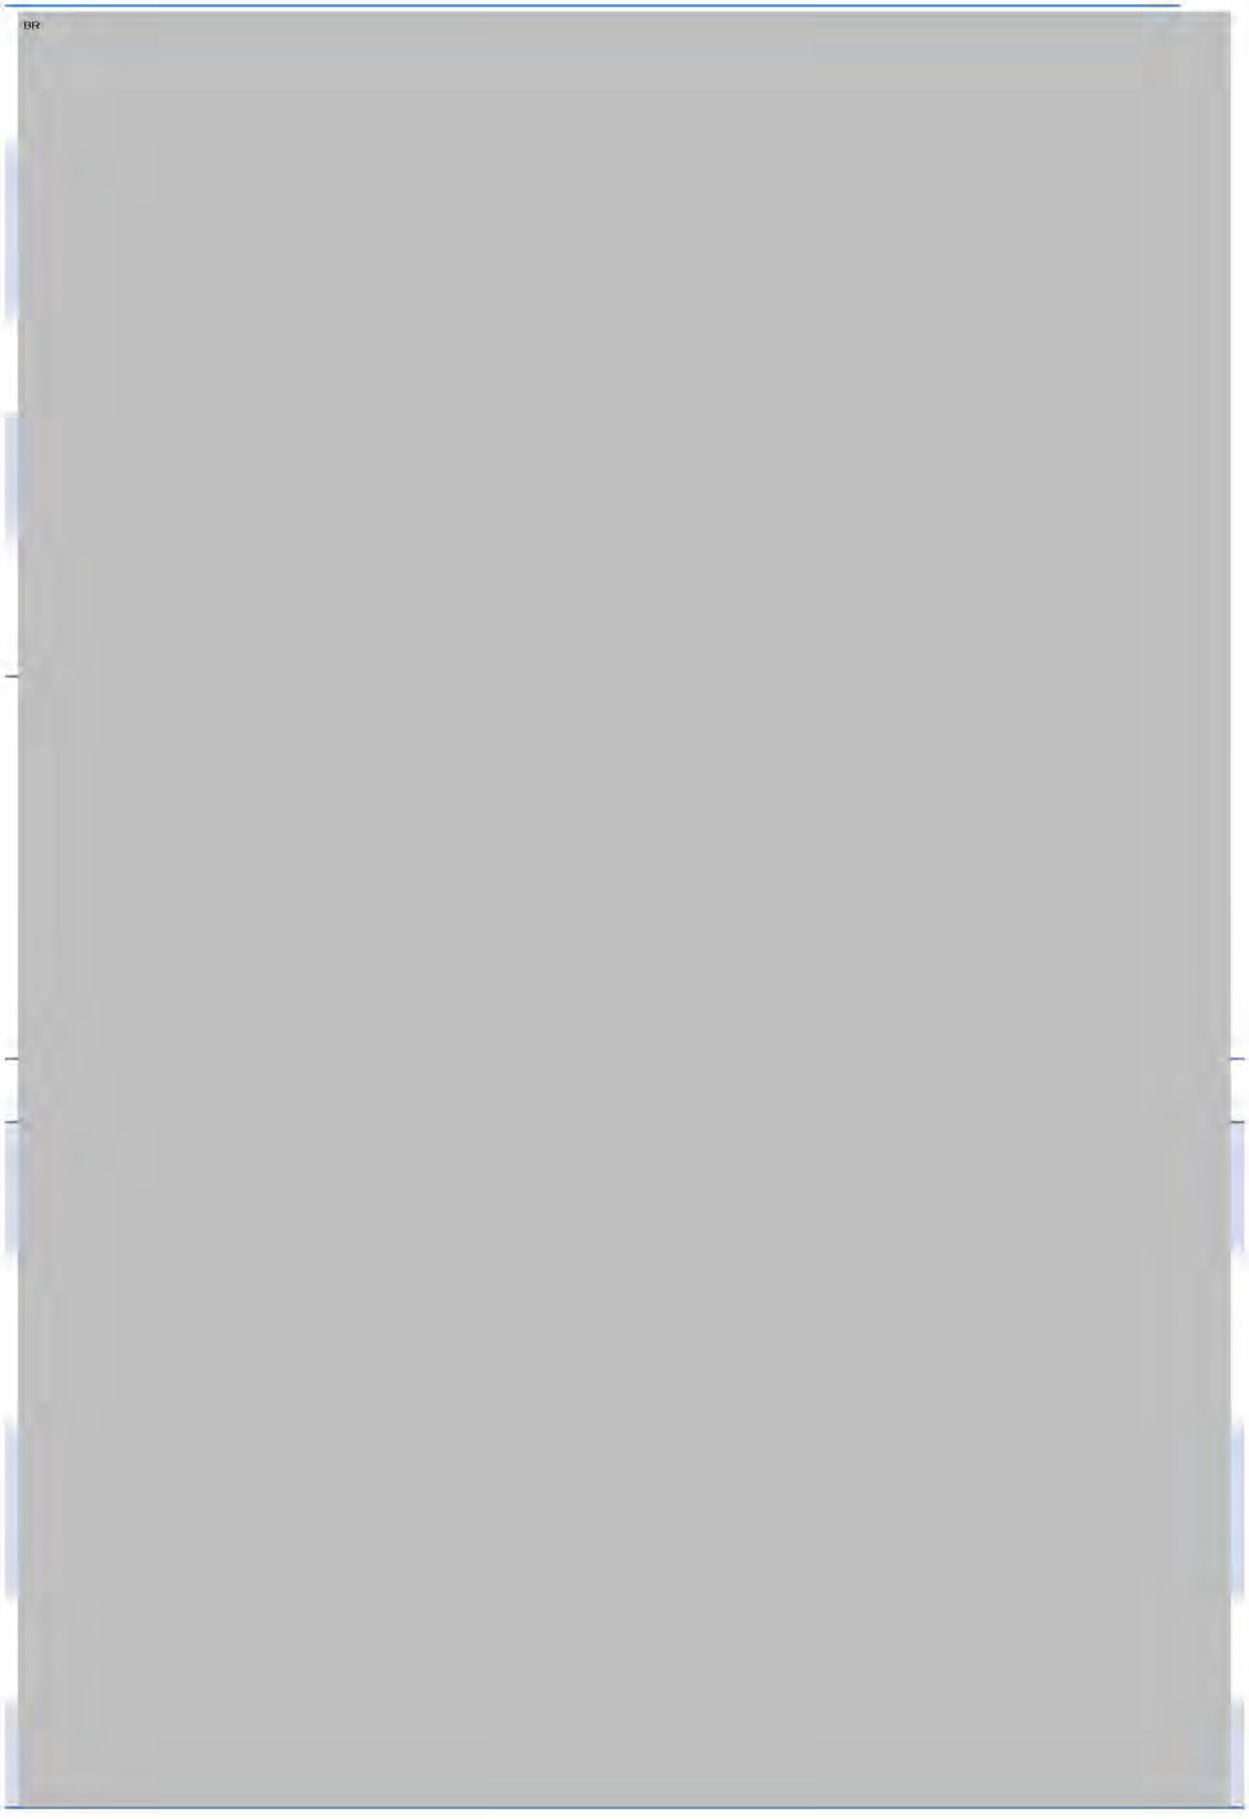
BR

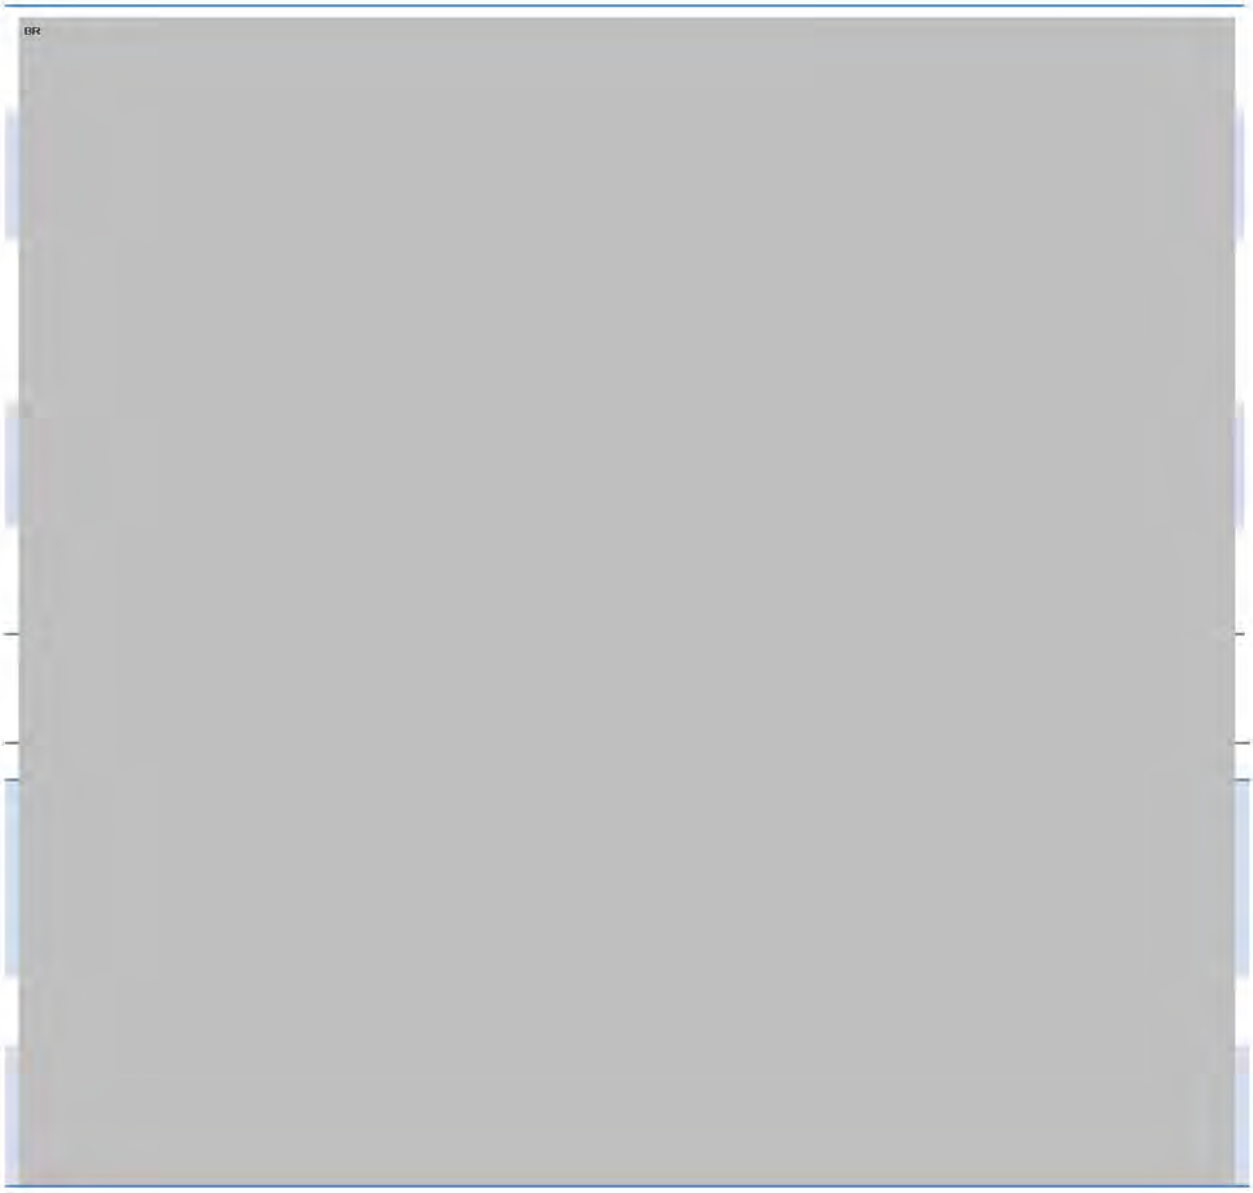
BR

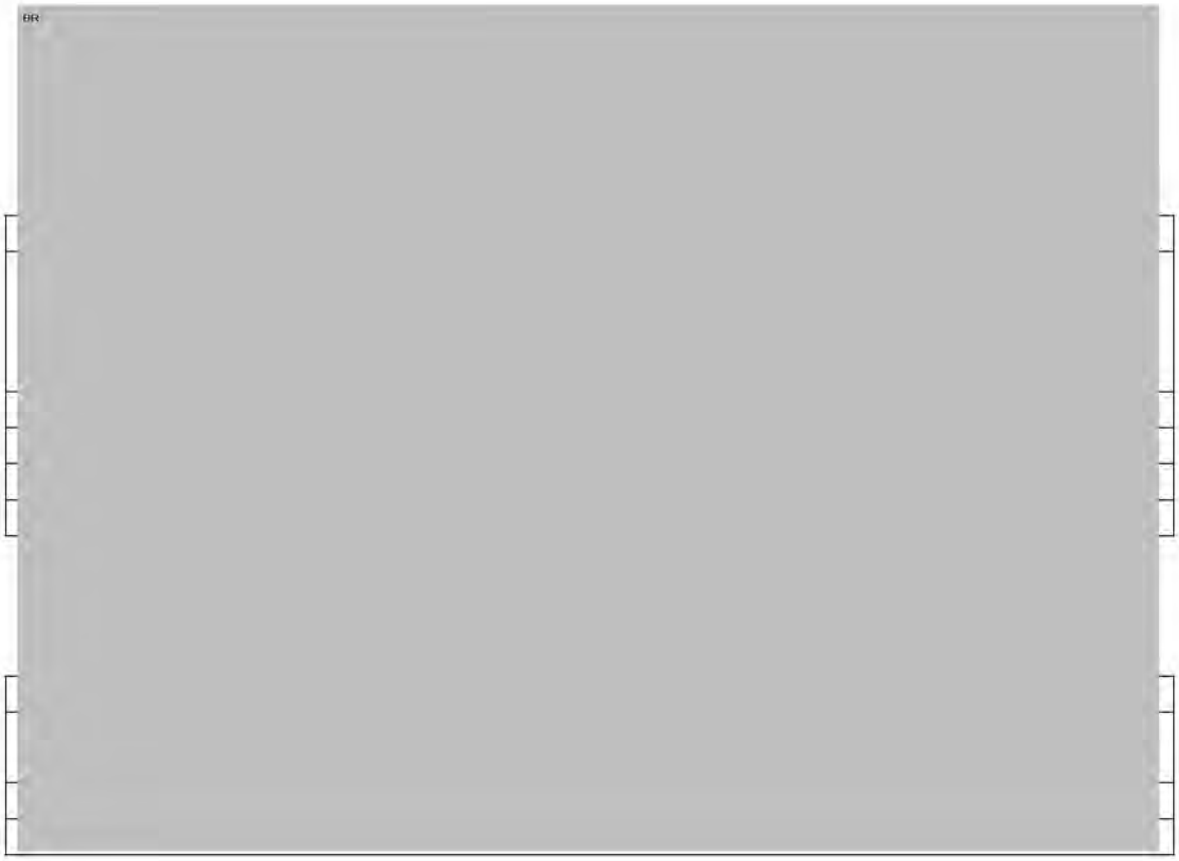

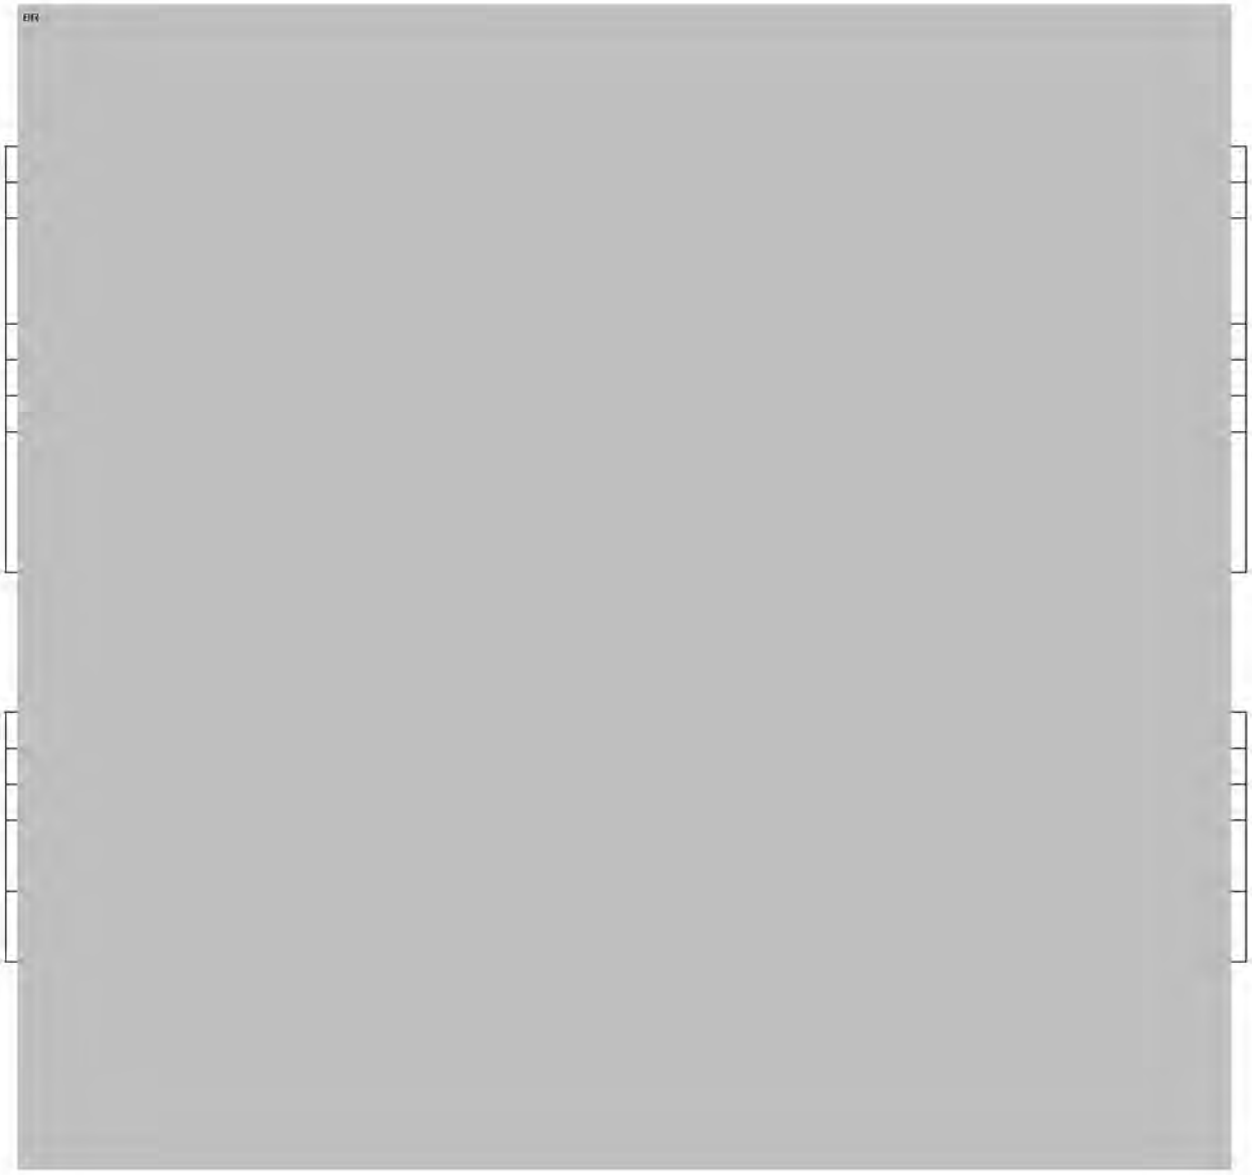

Docnr24



# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 30 sept 2019 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 17-apr-20 | 23 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie (incl. consolidatieperiode) vertraagd. |
| BR | | | | | |

*

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

5.1.2.e

Docnr24

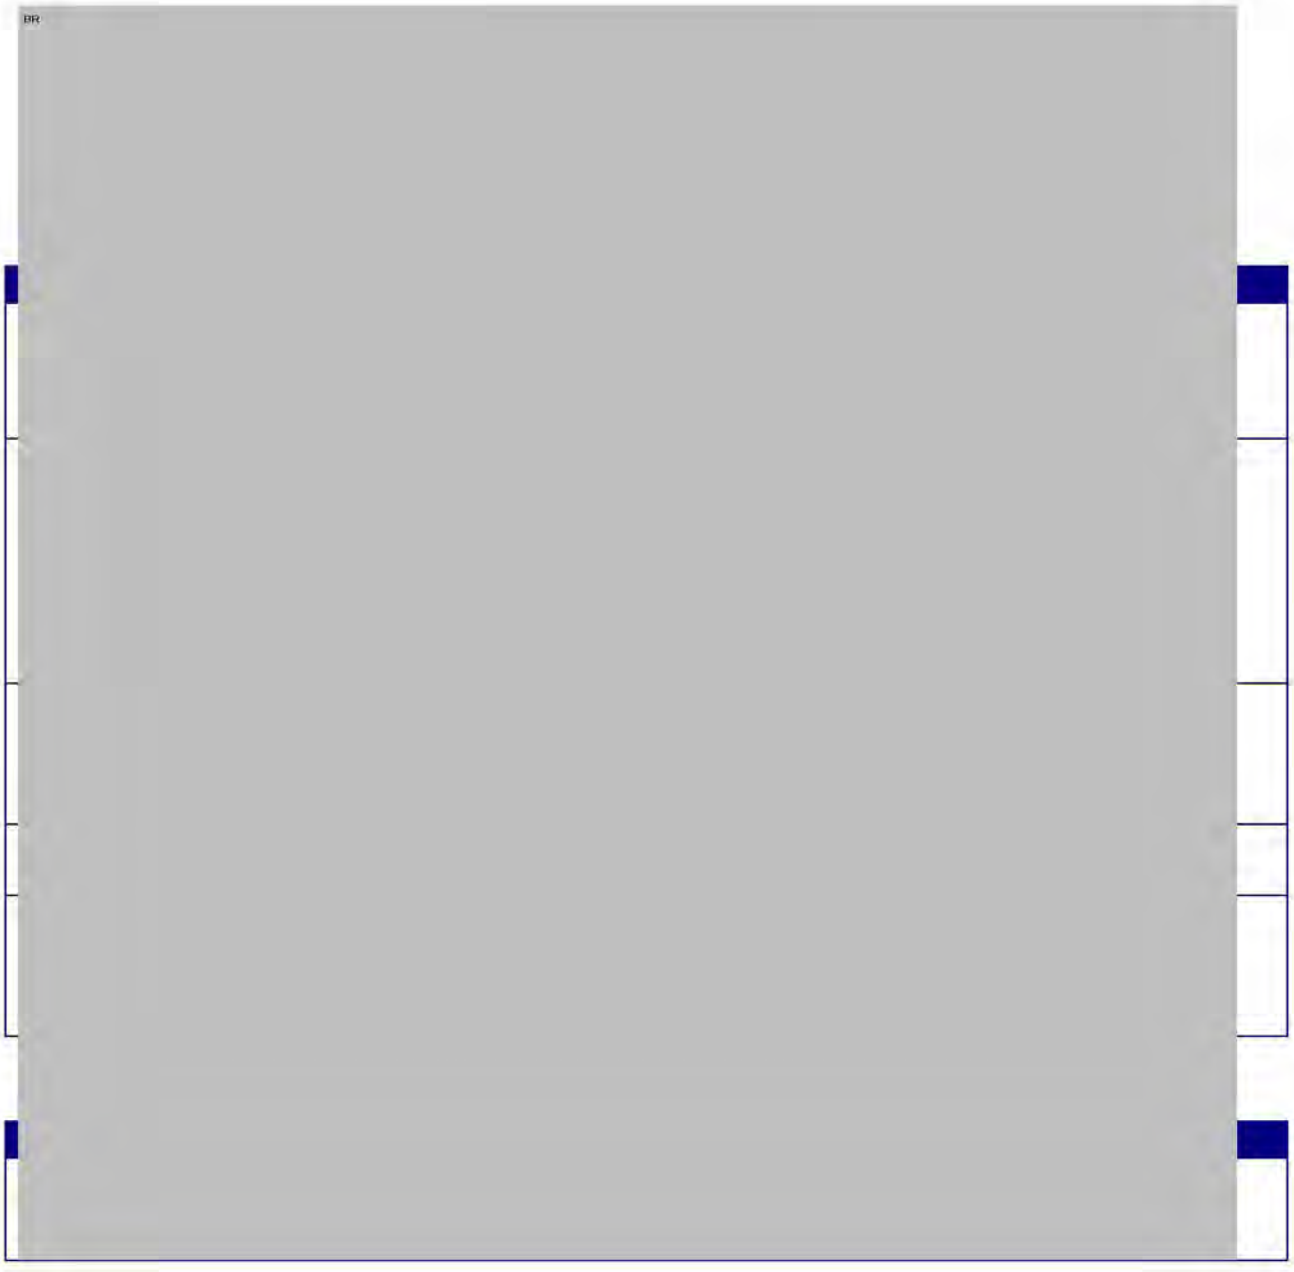
BR



Docnr25

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 4e kwartaal 2019

# Rotterdamsebaan

Dienst Stadsbeheer
Afdeling Opdrachtgeving
Datum: 17 februari 2020
Vertrouwelijk/Intern
Versie 1.0

Docnr25

Docnr25



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 4e kwartaal 2019
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004534

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>10 januari 2020 | Versie 0.1<br>13 januari 2020 | Versie 1.0<br>15 januari 2020 | Versie 1.0<br>23 januari 2020 | Versie 1.0<br>17 februari 2020 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr25



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 9

*2.1 Omgevingsmanagement* *9*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 9
2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie en Vergunningen* *10*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2.2 Komende kwartaal 10

*2.3 Verwervingen* *11*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 11
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Overeenkomsten* *12*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 12
2.4.2 Komende kwartaal 12

*2.5 Communicatie* *13*
2.5.1 Afgelopen kwartaal 13
2.5.2 Komende kwartaal 13
2.5.3 Diversen 13

3 Projectvoortgang 14

*3.1 Aanbesteden en contracteren* *14*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 14
3.1.2 Komende kwartaal 14

*3.2 Vormgeving* *15*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 15
3.2.2 Komende kwartaal 16

*3.3 Monitoring* *17*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 17
3.3.2 Komende kwartaal 17

*3.4 Inpassing Binckhorst* *18*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 18
3.4.2 Komende kwartaal 18

*3.5 Inpassing Vlietzone* *19*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 19
3.5.2 Komende kwartaal 19

*3.6 Inpassing Laan van Hoornwijck* *21*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 21
3.6.2 Komende kwartaal 21

*3.7 Boortunnel en toeritten* *22*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 22
3.7.2 Komende kwartaal 23

*3.8 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *24*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 24

Docnr25




3.8.2 Komende kwartaal 24

*3.9 Installaties* *26*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 26
3.9.2 Komende kwartaal 26

*3.10 Veiligheid en gezondheid* *28*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 28
3.10.2 Komende kwartaal 28

*3.11 Bediencentrale* *29*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 29
3.11.2 Komende kwartaal 29

*3.12 Uitvoeringskwaliteit* *30*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 30
3.12.2 Komende kwartaal 30

*3.13 Contractmanagement* *31*
3.13.1 Afgelopen kwartaal 31
3.13.2 Komende kwartaal 31

4 Overdracht en openstelling 32

*4.1 Tunnelveiligheid* *32*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 32
4.1.2 Komende kwartaal 32

*4.2 Overdracht aan beheerders* *33*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 33
4.2.2 Komende kwartaal 33

*4.3 Beheer en onderhoud* *34*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 34
4.3.2 Komende kwartaal 34

5 Projectbeheersing 35

*5.1 Scope* *35*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 35
5.1.2 Komende kwartaal 35

*5.2 Financien* *36*
5.2.1 Kostenstructuur 36
5.2.2 Dekkingen 37

*5.3 Planning* *39*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 39
5.3.2 Komende kwartaal 39

*5.4 Risico's* *40*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 40
5.4.2 Komende kwartaal 40
5.4.3 Financiële toprisico's 40
5.4.4 Toprisico's planning 41

*5.5 Interne kwaliteit* *43*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 43
5.5.2 Komende kwartaal 43

Docnr25



*5.6 Informatiebeheer* *44*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 44
5.6.2 Komende kwartaal 44
5.6.3 Kennisdeling 44
*5.7 Organisatie* *45*
5.7.1 Afgelopen kwartaal 45
5.7.2 Komende kwartaal 45

**6 Bijlage: Planningsmijlpalen 46**

**7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 47**

**8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 49**

# 1 Managementsamenvatting

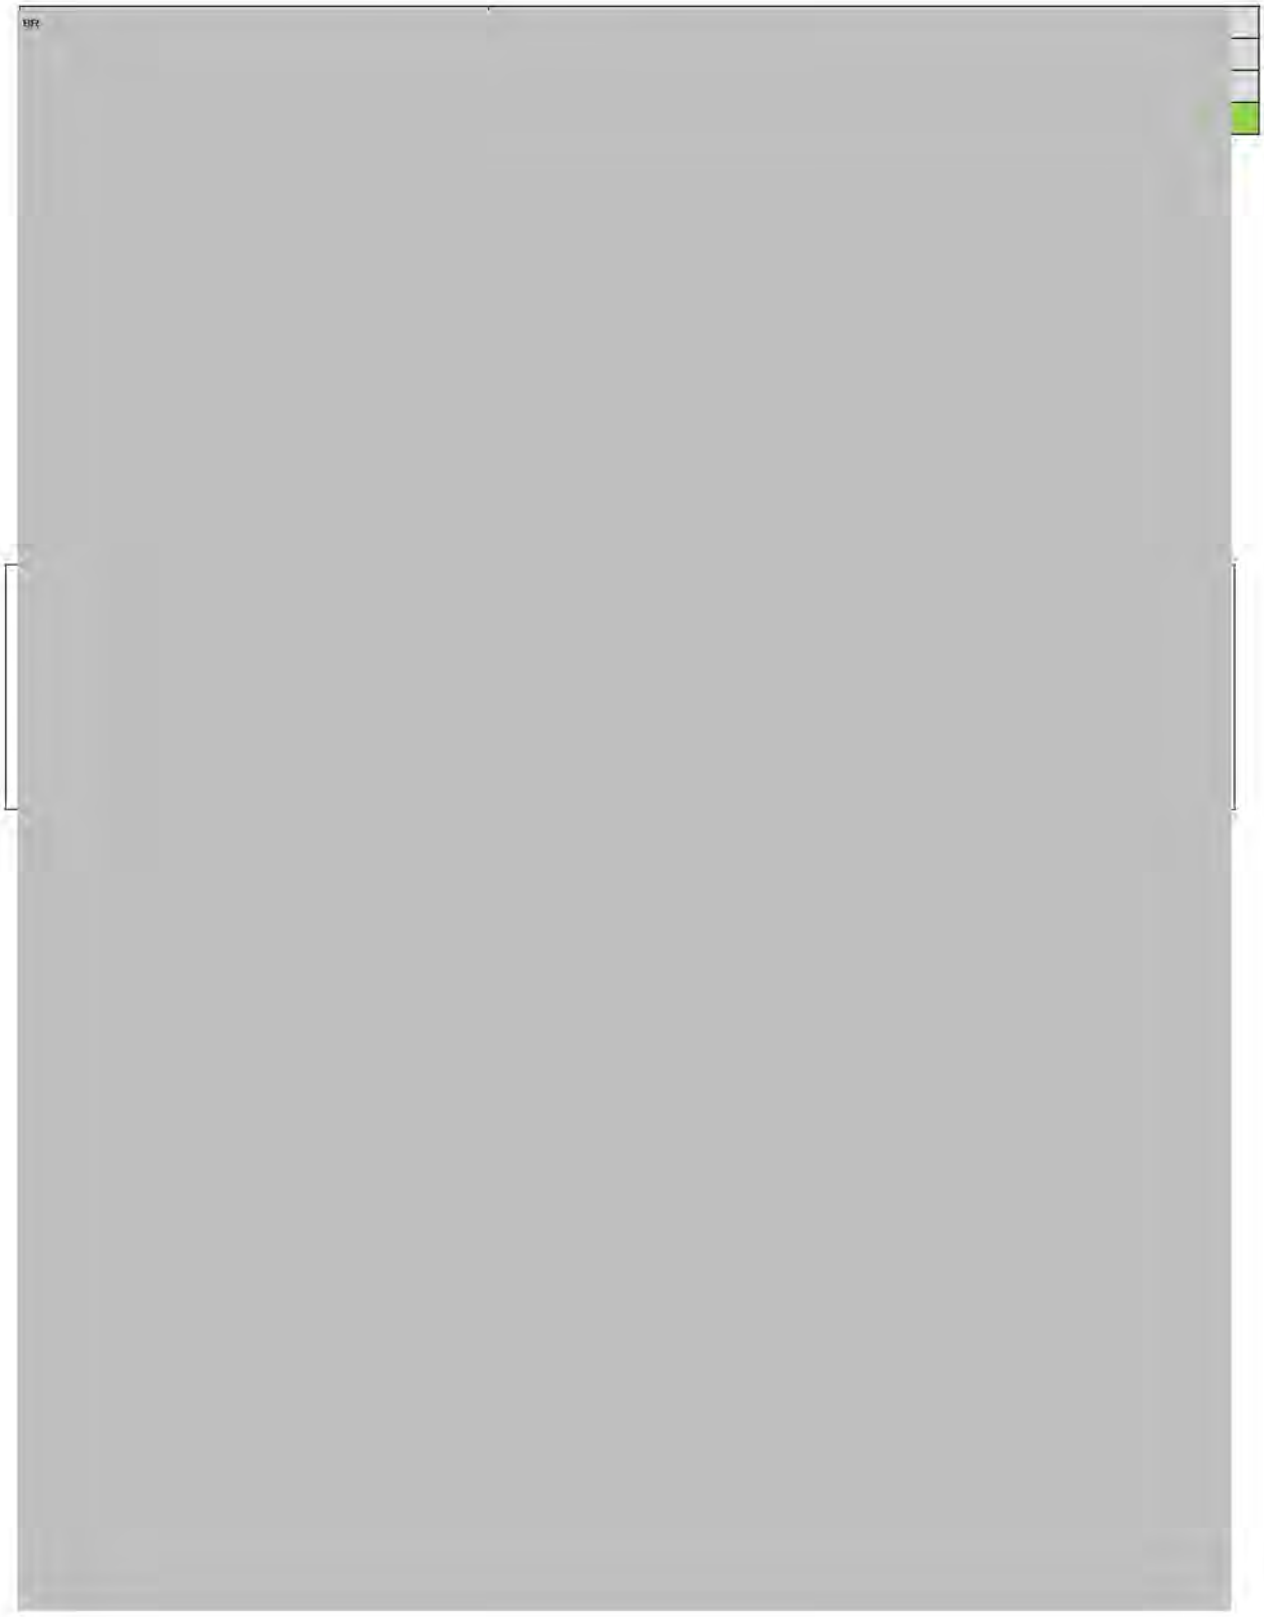

## 4. TERUGBLIK AFGELOPEN KWARTAAL

Afgelopen kwartaal is er onder andere gewerkt aan:

- De kade rondom de calamiteitenberging is gerealiseerd. De fundatielagen t.b.v. het voetpad zijn op de kade aangebracht. Nadien is de calamiteitenberging verder uitgegraven. Een groot deel van de eilanden is al zichtbaar. Ter plaatse van de aflaat is brug 6 geplaatst.

## 5. VERWACHTING KOMEND KWARTAAL

Komende kwartaal wordt er onder andere gewerkt aan:

- Besluit afwachten op kapaanvraag en ontheffing Wet natuurbescherming in verband met aanleg tweede watertoevoer.

- Voorbereiden aanbesteding en contractering van het onderdeel Tweede watertoevoer.

Na openstelling van de Rotterdamsebaan voor het verkeer is er nog een aantal activiteiten voorzien, zoals: de bouw van de bediencentrale, kunsttrajecten en de tweede watertoevoer. Ondertussen werkt CRB in alle deelgebieden verder aan de realisatie van het project waardoor de onderdelen die niet beïnvloed worden door de VTTI-problematiek wel per 1 juli 2020 opgeleverd worden. Dat betreffen onder andere de voorzieningen van familiepark Drievliet, het Molenvlietpark en de maaiveldinrichting.

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

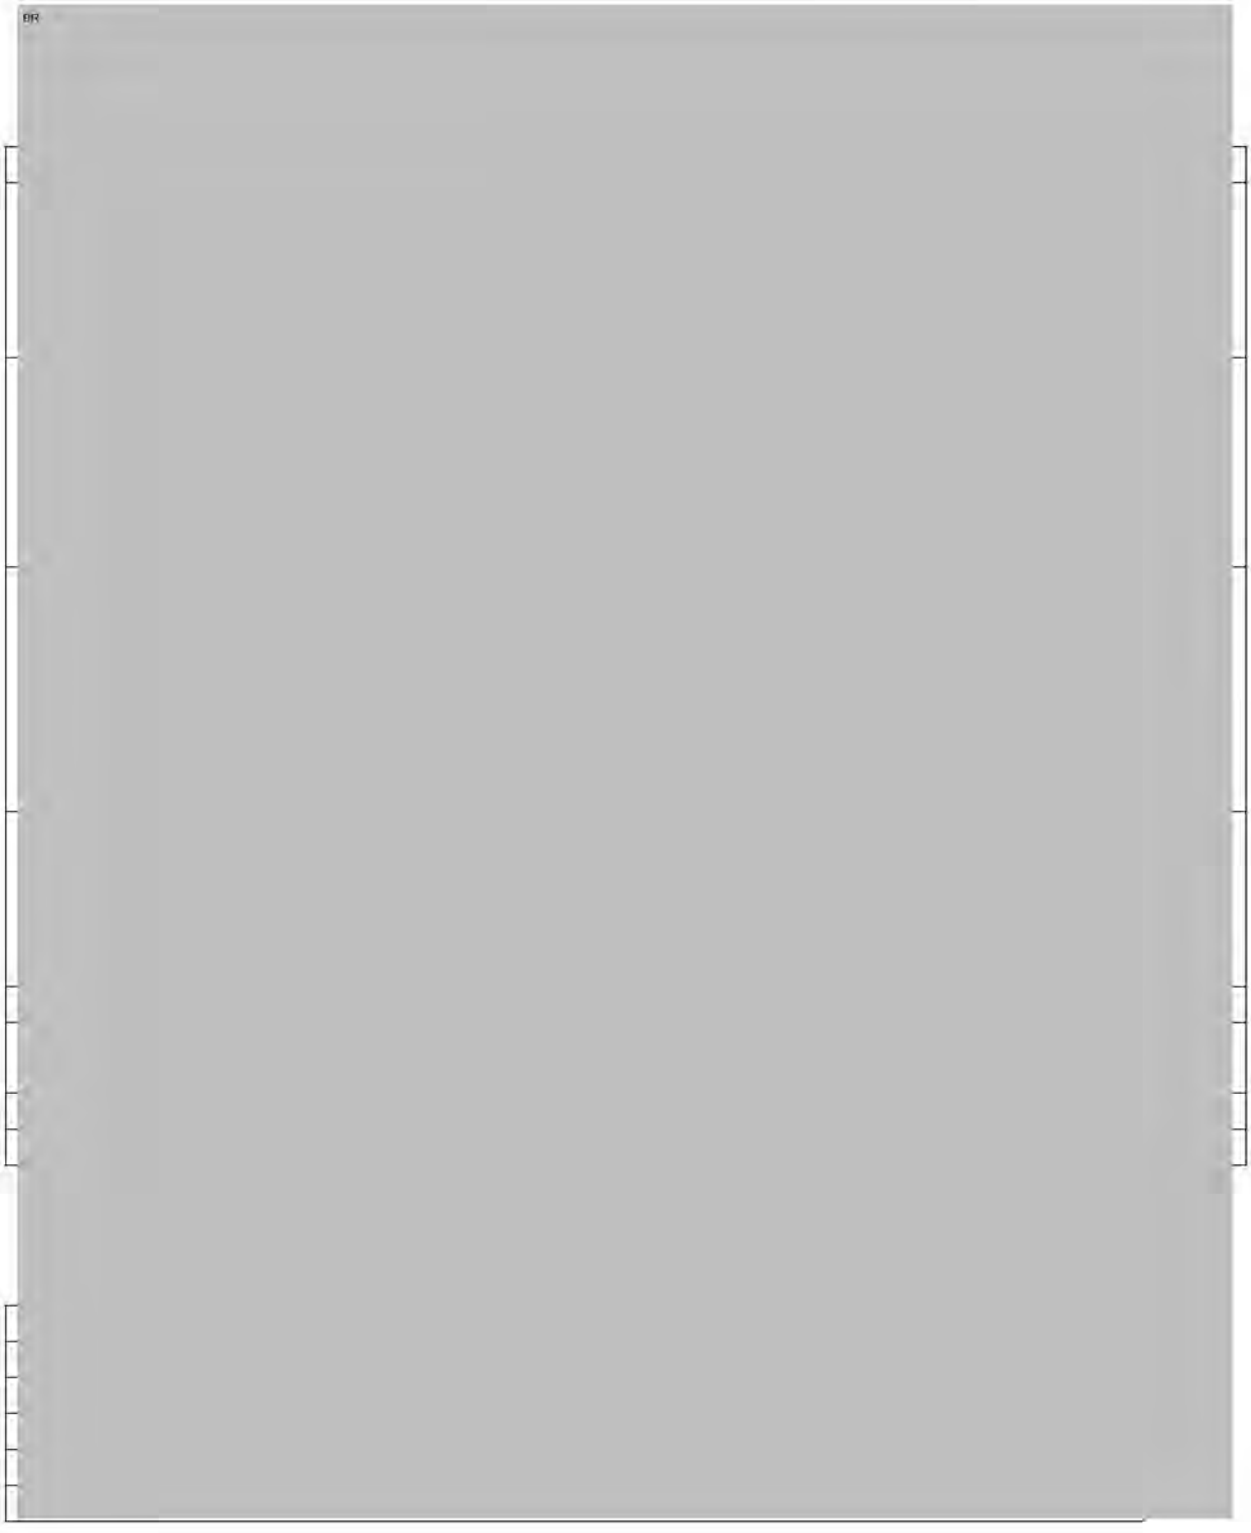

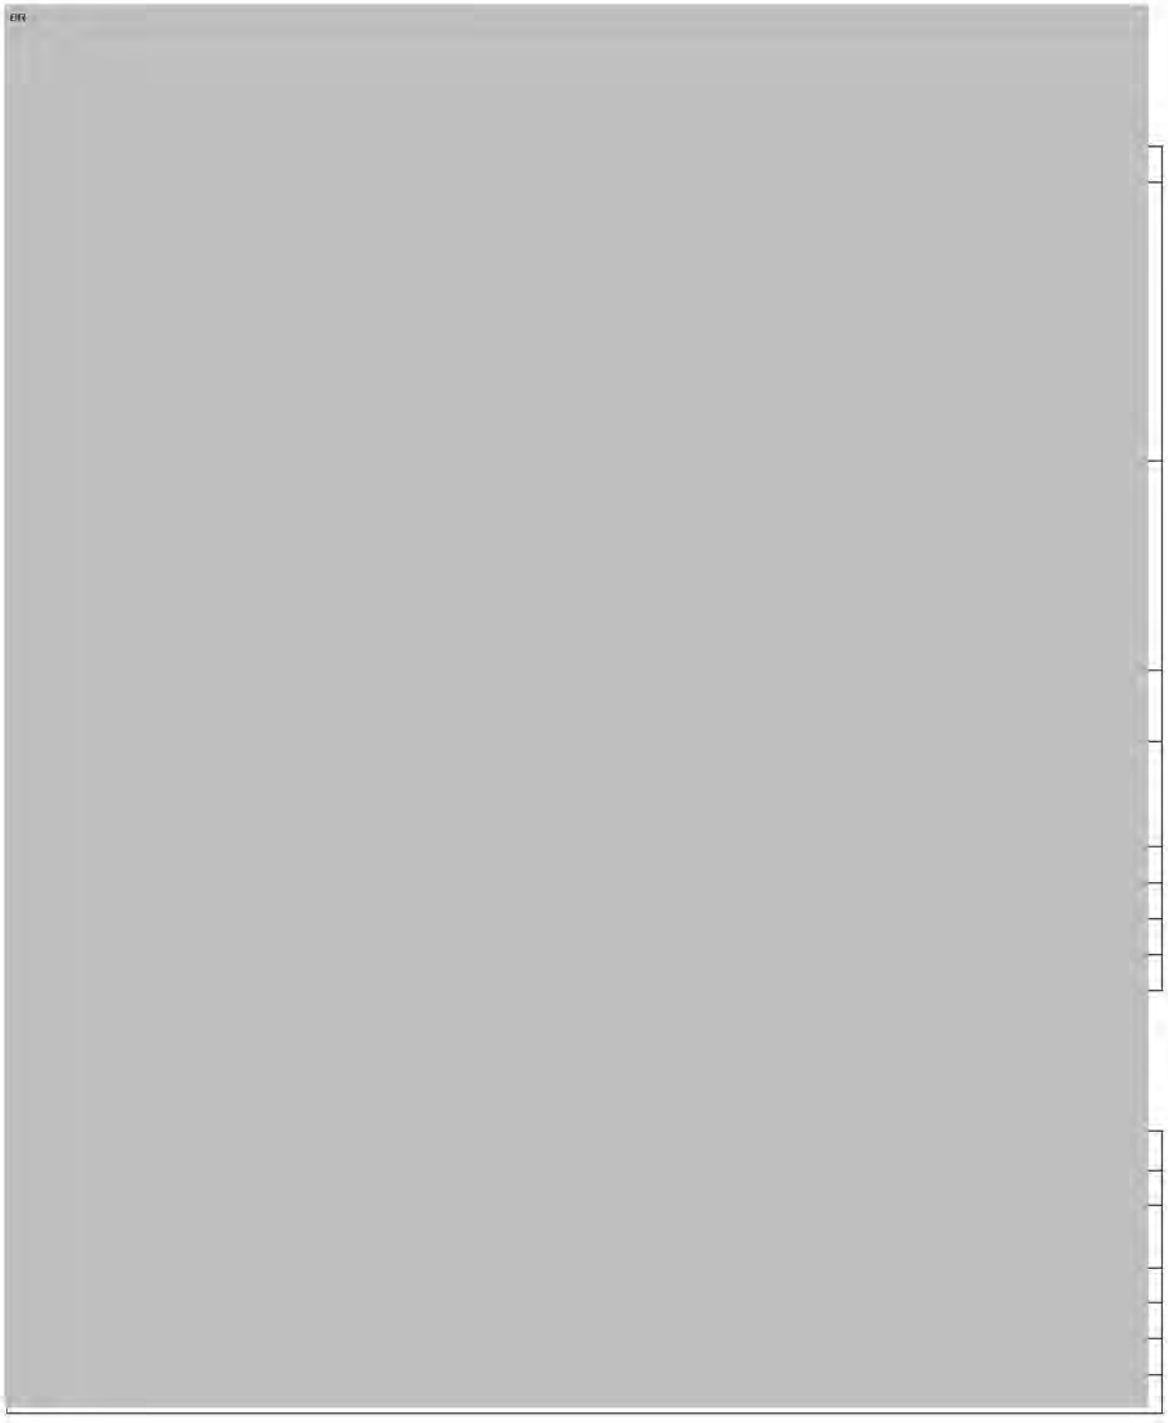
BR

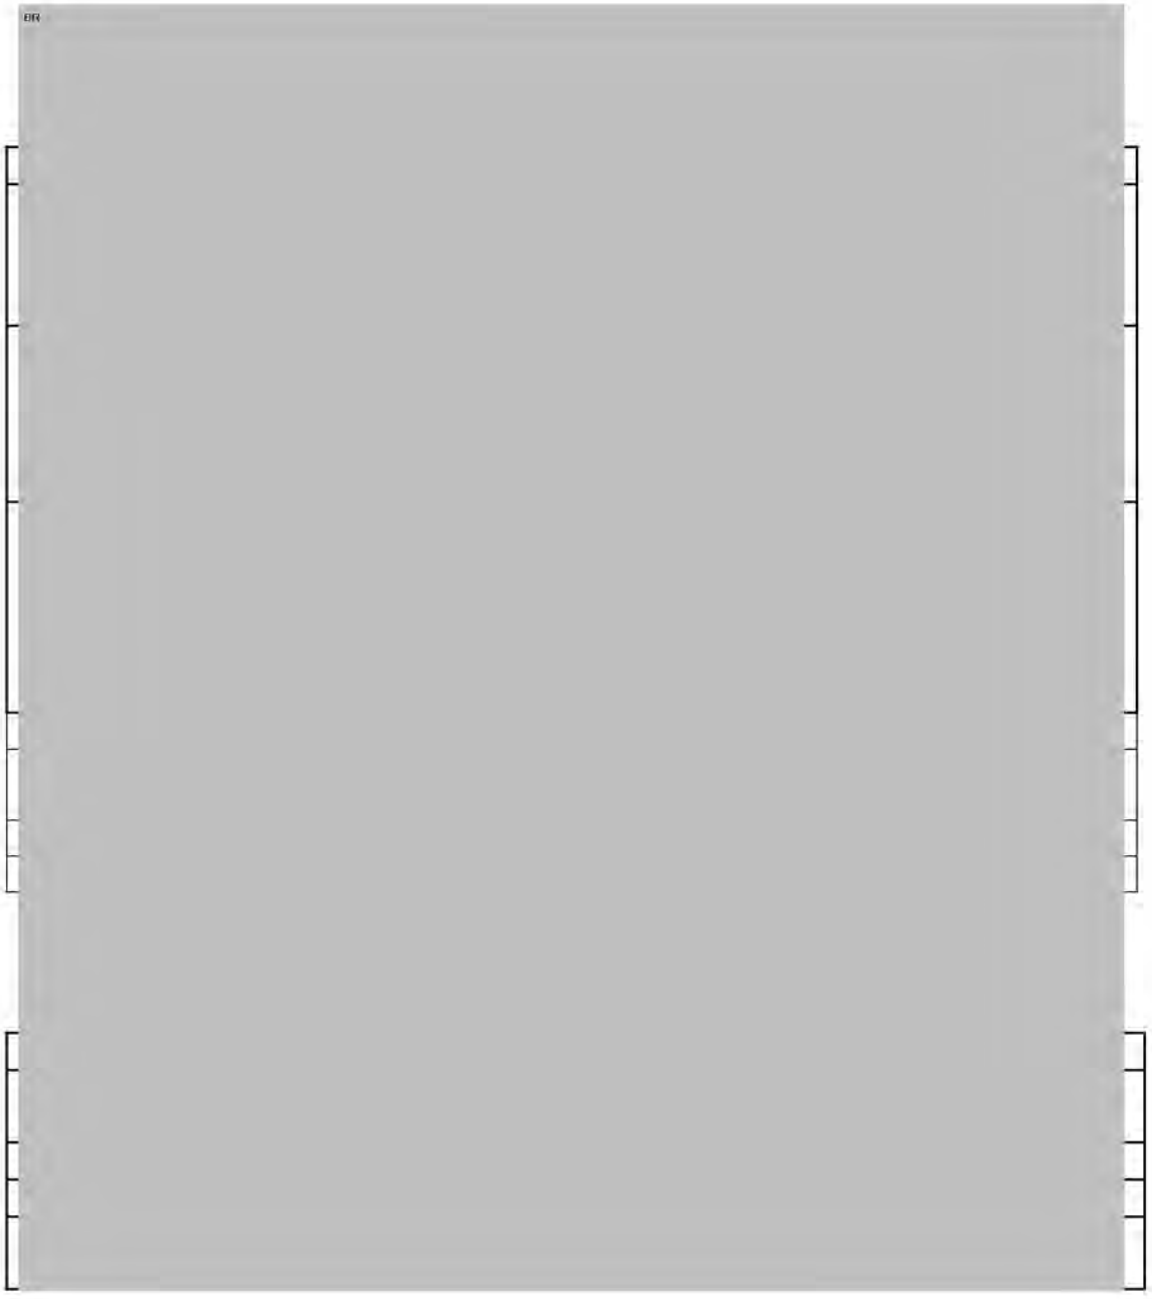

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Samenwerkingsovereenkomst met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. | De tekst van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de tweede toevoer is voor beide partijen akkoord. Helaas heeft de Provincie problemen met het plan voor realisatie van landgoed Nieuw Vredenoord. Verder is er nog geen overeenstemming over de anterieure overeenkomst t.b.v. deze ontwikkeling. Hoewel deze twee laatste zaken los van de SOK staan, verhinderen deze zaken momenteel ondertekening van de SOK. |
| Samenwerkingsovereenkomst met Provincie Zuid Holland t.a.v. gedeeltelijke vervanging oeverconstructie langs Vliet. | De Samenwerkingsovereenkomst is gereed en kan de parafenronde in voor ondertekening.<br>De datum waarop de oeverconstructie uiterlijk gereed moet zijn is verschoven naar een later tijdstip vanwege de afhankelijkheid met het kappen van de bomen en het afronden van het ontwerp. |
| [redacted] | |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Met de eigenaren van het pand en perceel aan de Jan Thijssenweg 8 zijn nadere gesprekken gevoerd over de herinrichting van het Molenslootpad, grondaankoop t.b.v. hun perceel en nadere afspraken. Dit wordt in een overeenkomst en akte vastgelegd. | |
| [redacted] | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Samenwerkingsovereenkomst afronden met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. |
| [redacted] |
| Afronden overeenkomst met eigenaren Jan Thijssenweg 8. |
| [redacted] |

## 2.5 Communicatie

BR

**Overige / extra verrichte werkzaamheden**

BR BR

Op 22 oktober werd een informatiebijeenkomst gehouden over de inrichting van de pluktuin, op het perceel achter stal Meyvliet (onderdeel Molenvlietpark). Hiervoor werd gesproken met de directe stakeholders/omwonenden, waaronder stichting Meyvliet en stal Meyvliet.

BR

# 3 Projectvoortgang

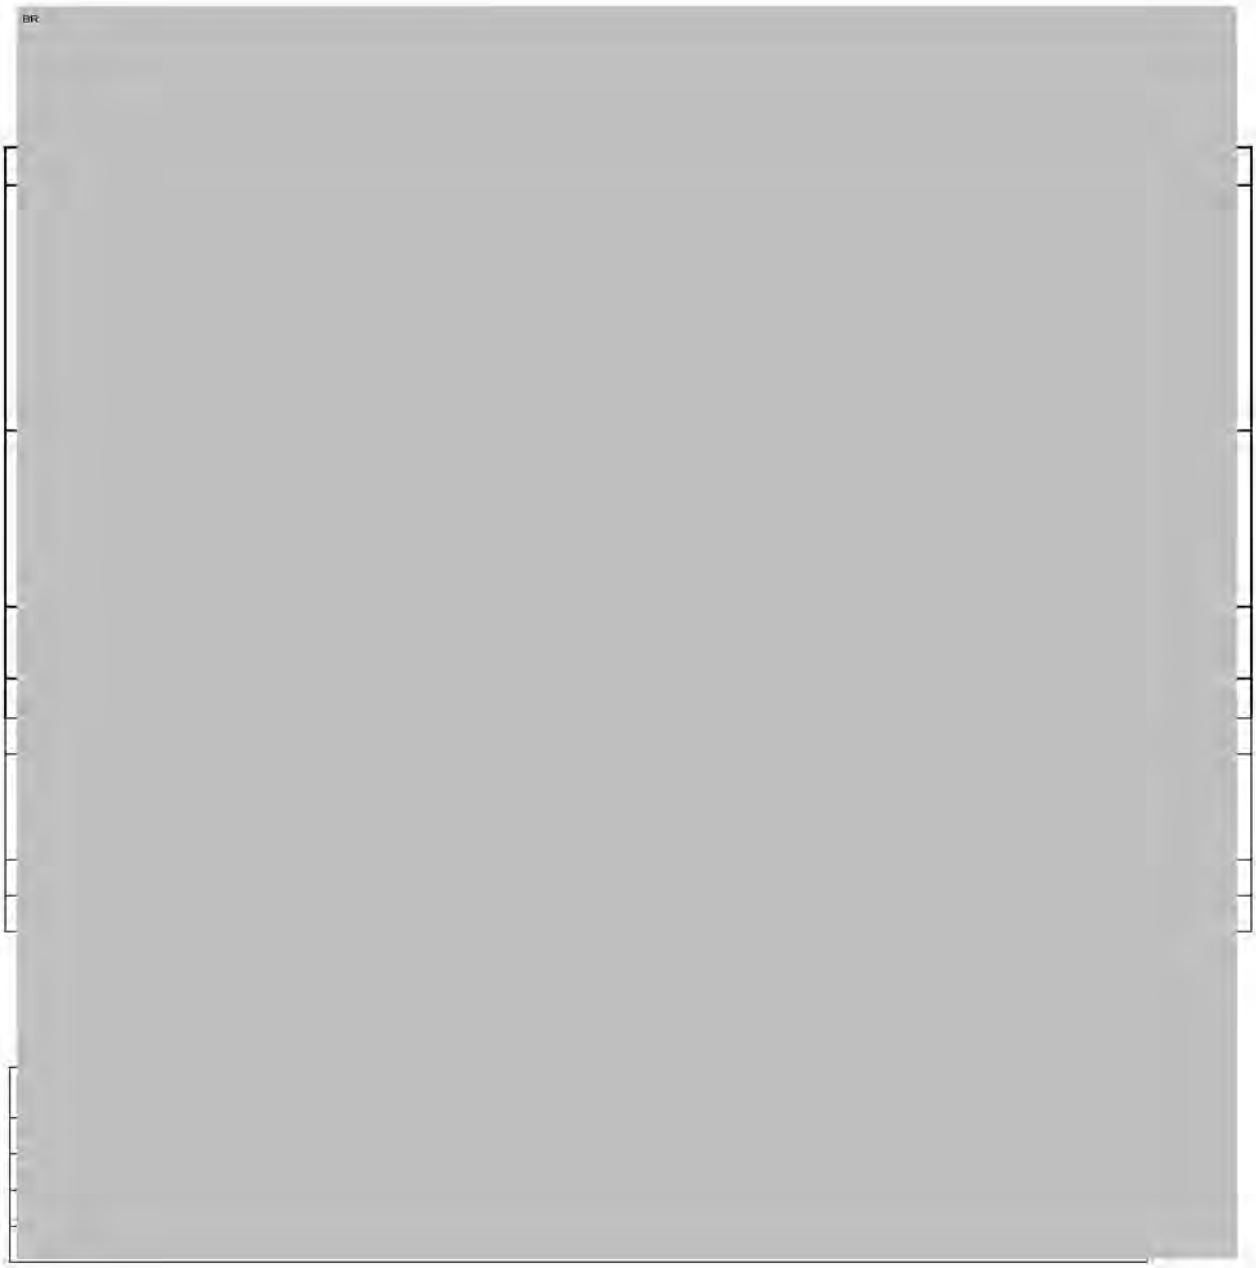

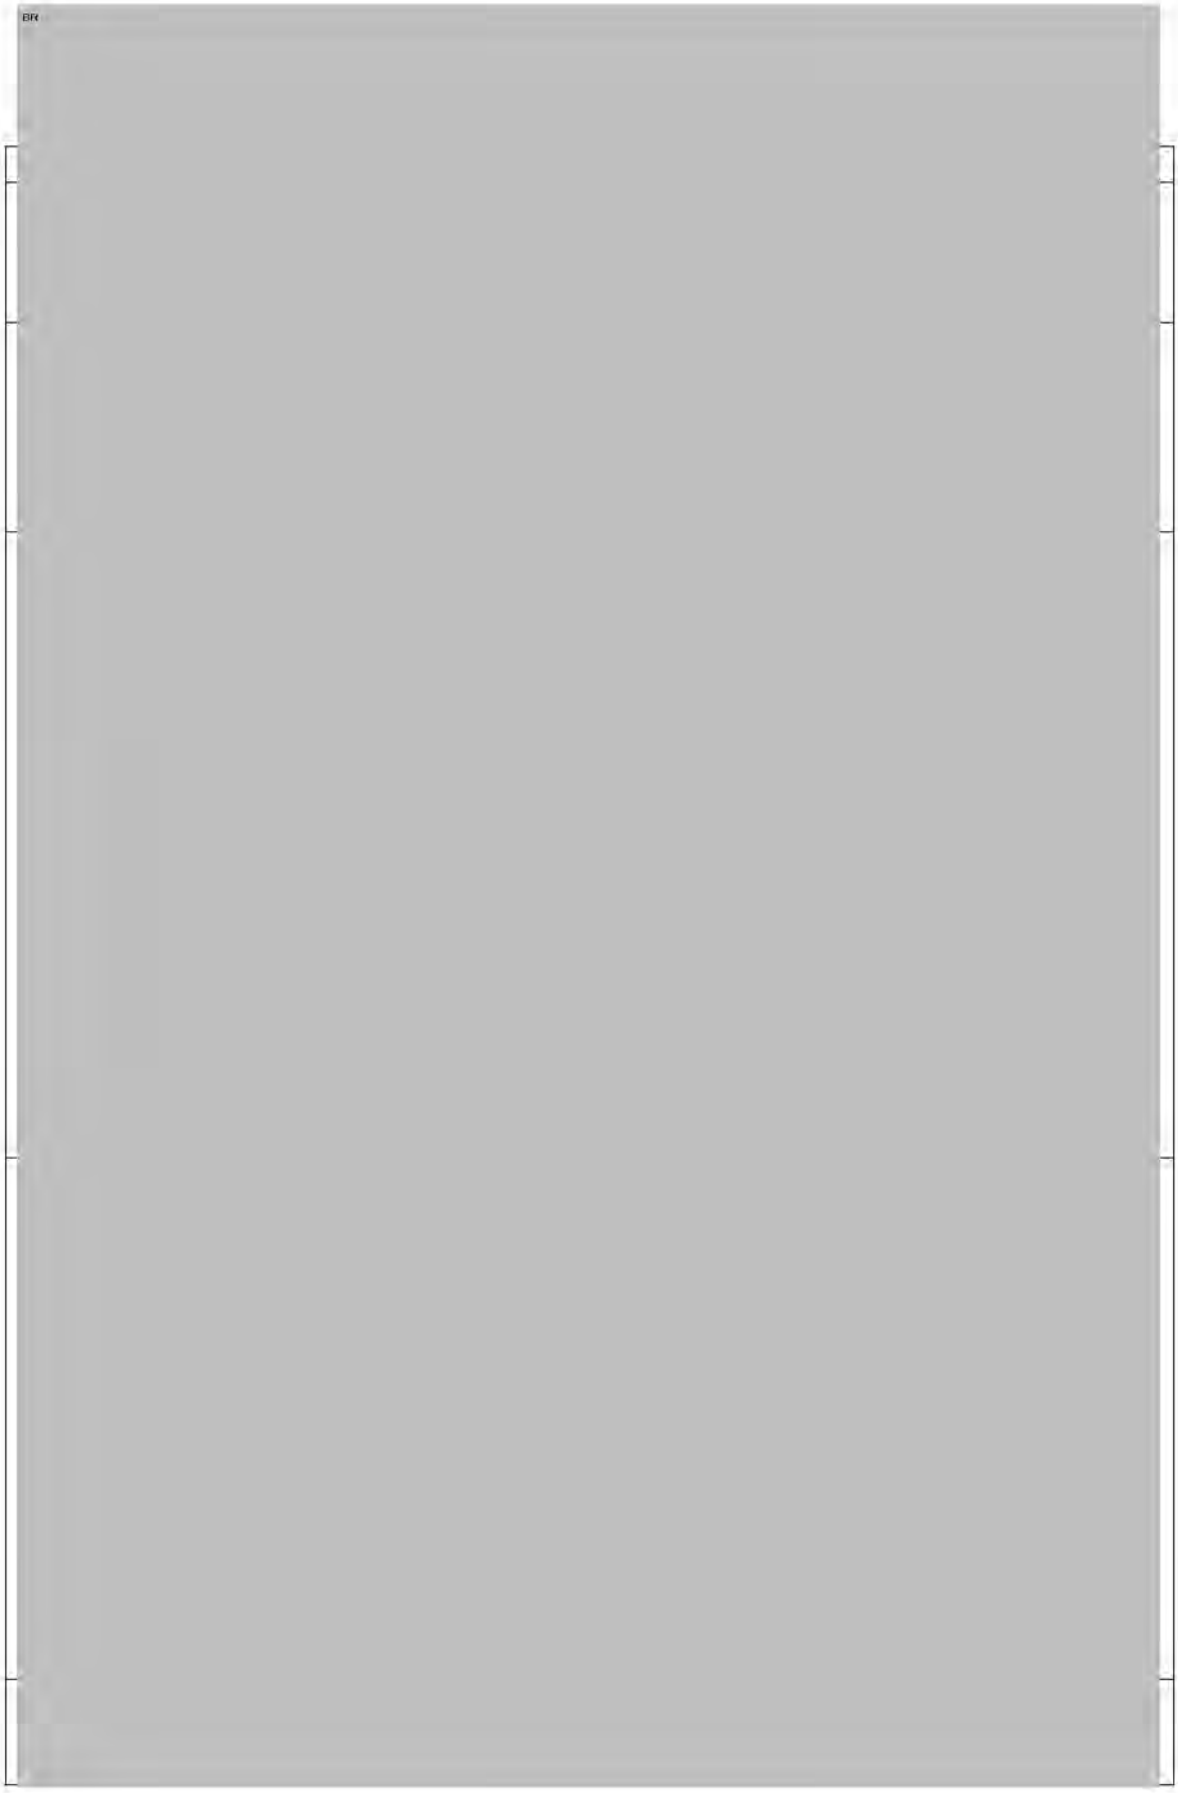

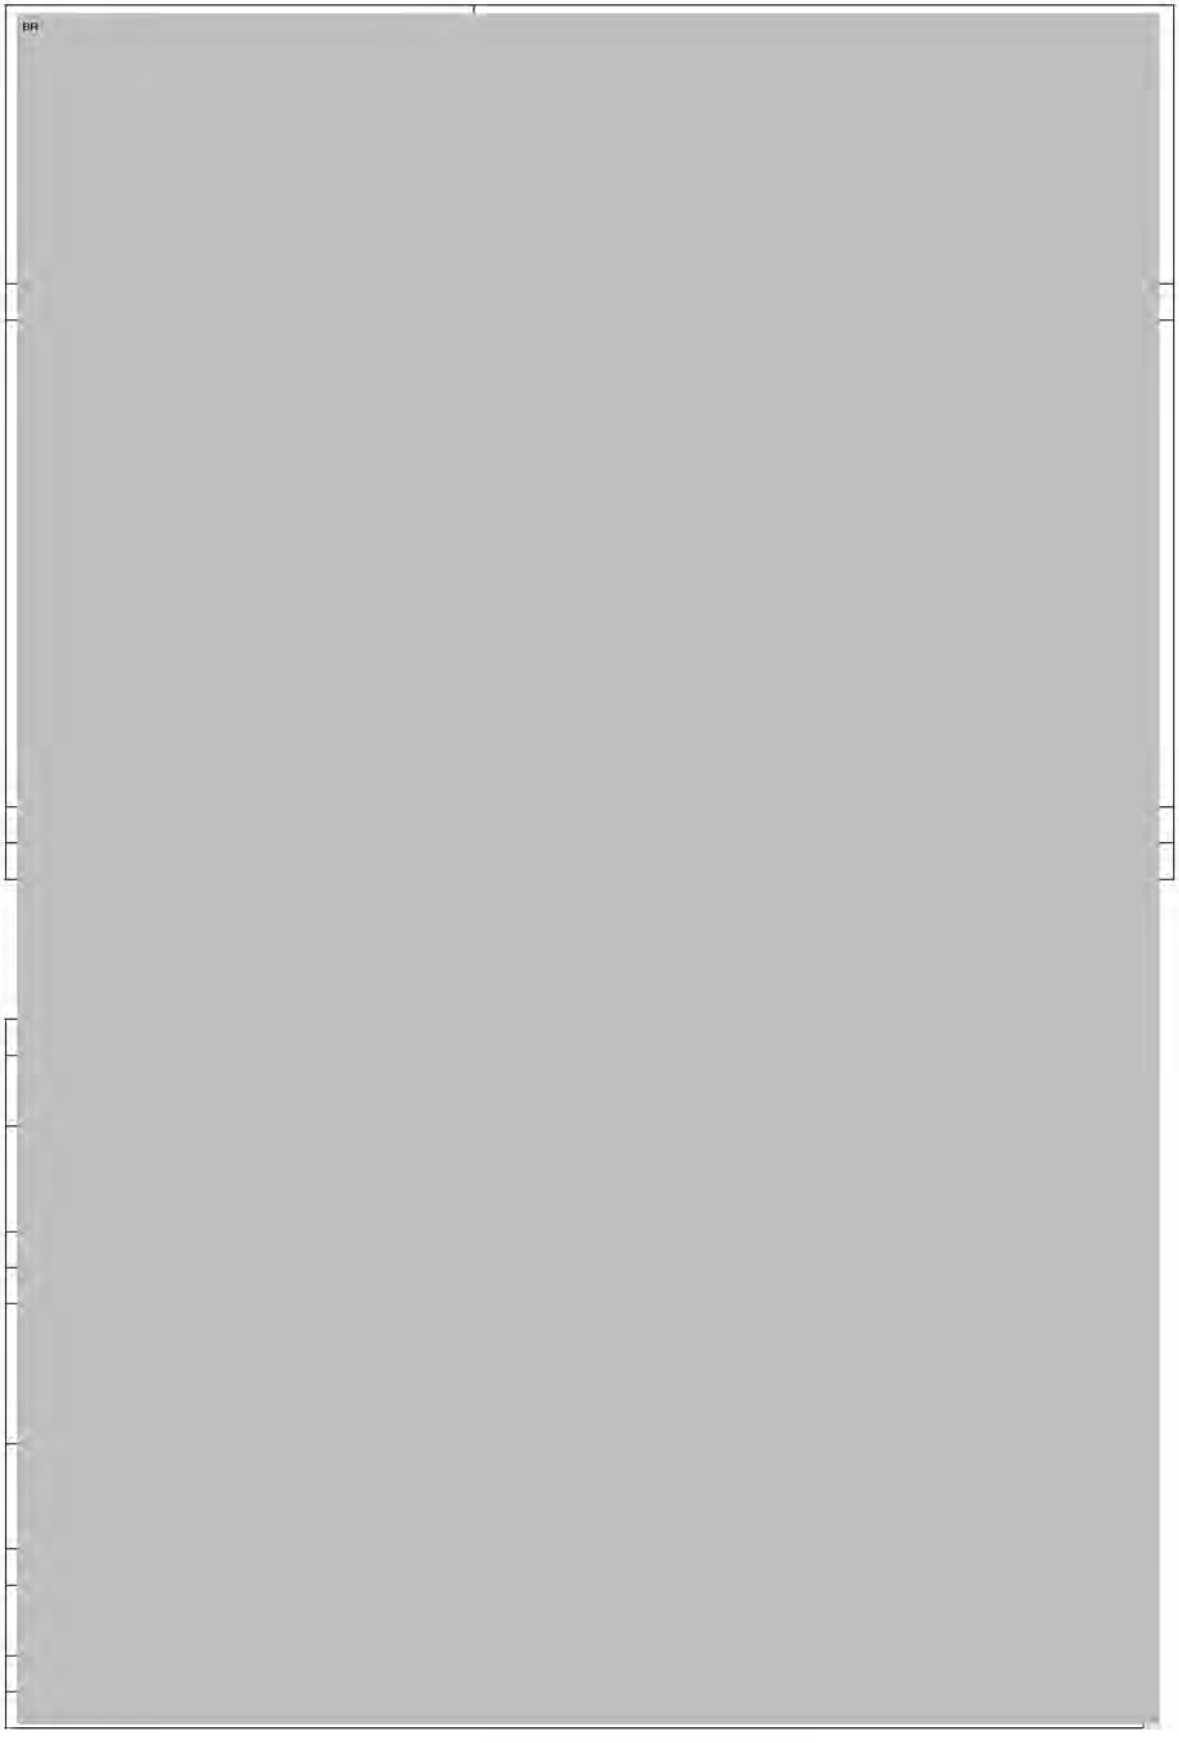
BR

BR

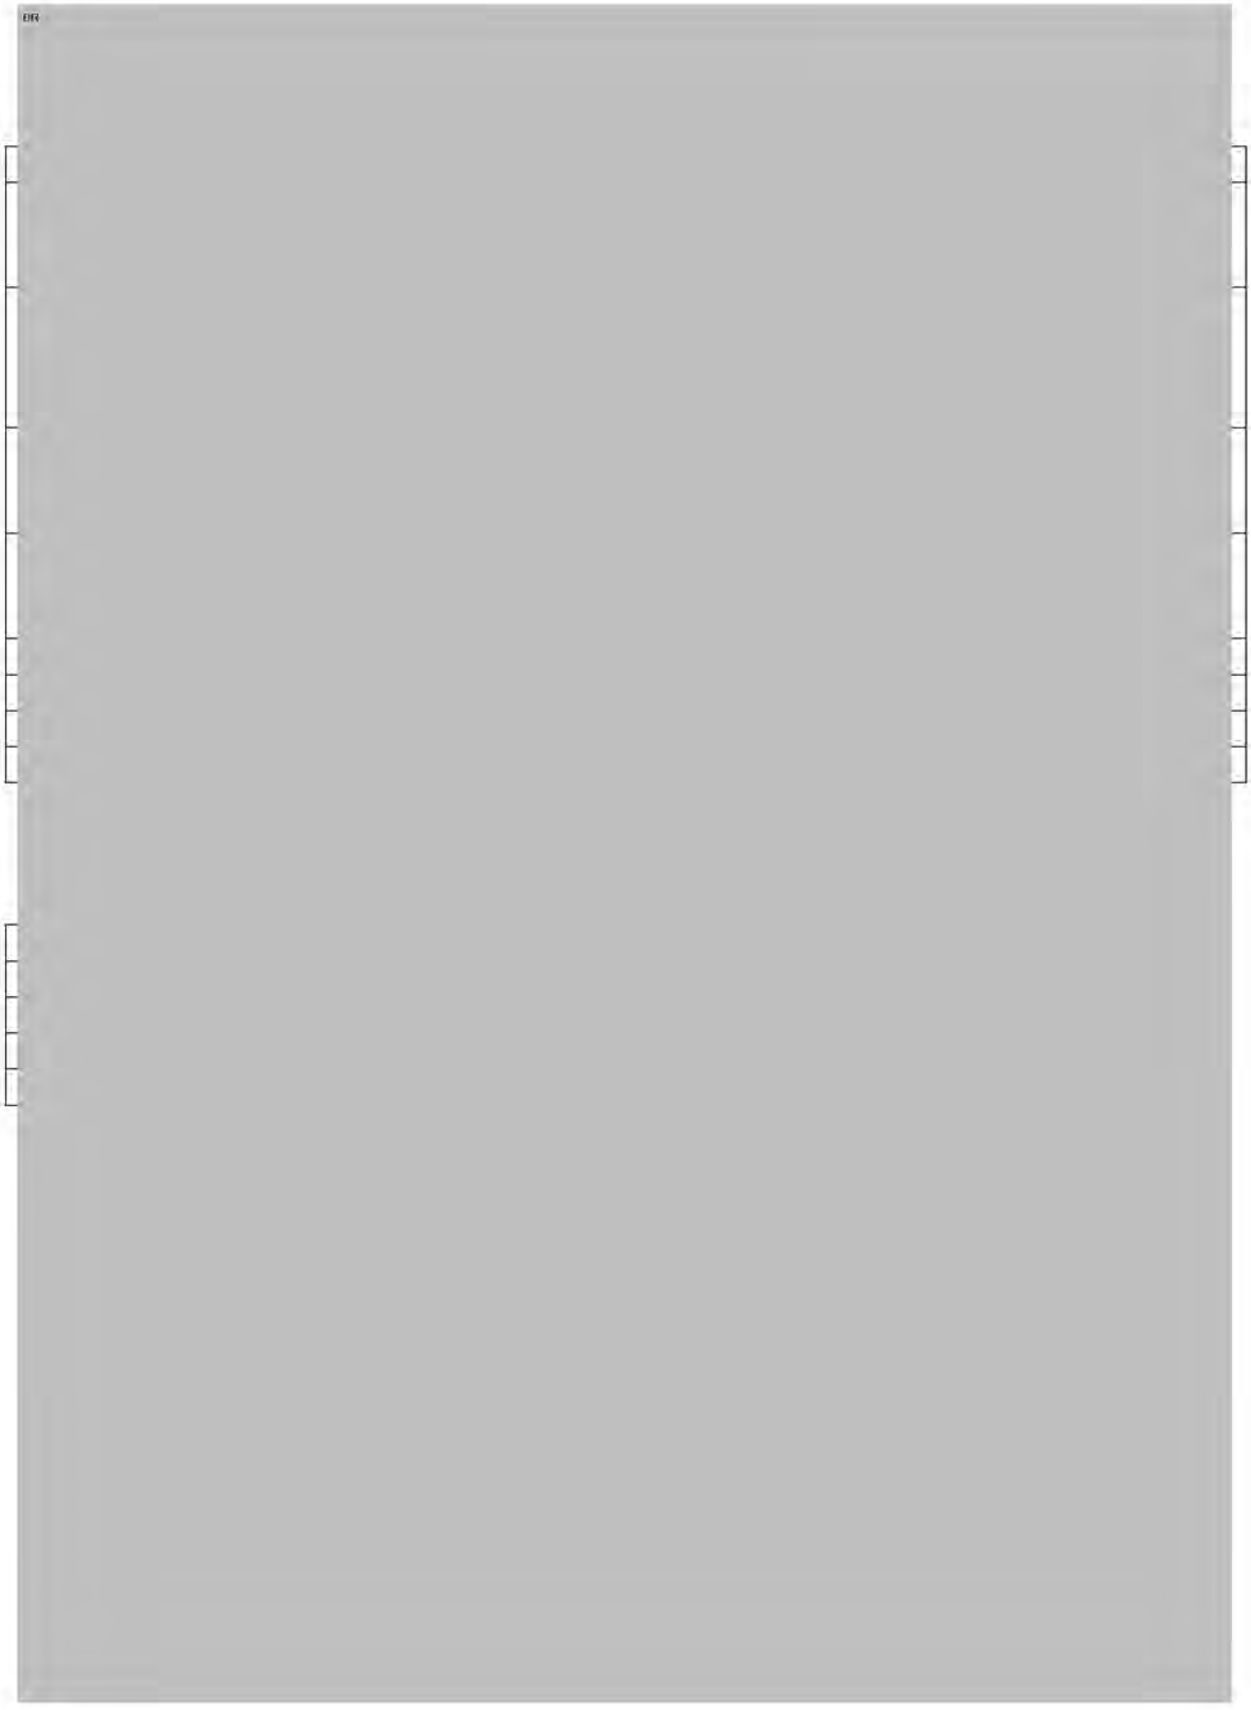

## 3.5 Inpassing Vlietzone

### 3.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Realiseren bruggen en kade in het Molenvlietpark. Vervolgens wordt rondom de kunstwerken het calamiteitengebied ingericht en afgewerkt. | De kade rondom de calamiteitenberging is gerealiseerd. De fundatielagen t.b.v. het voetpad zijn op de kade aangebracht. Nadien is de calamiteitenberging verder uitgegraven. Een groot deel van de eilanden is al zichtbaar. Ter plaatse van de aflaat is brug 6 geplaatst. Vervolgens is hier de steenbestorting aangebracht en de grond ontgraven. De bomen en een deel van het bosplantsoen zijn geplant. De fundering van het vlonderpad is aangebracht. |
| [redacted] | |

### 3.5.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Molenvlietpark: Ontgraven calamiteitenberging en afvoeren grond. Plaatsen brug I t/m III, kabelpont en eventueel afronden vlonderpad. Uitvoeren resterende plantwerkzaamheden. Plaatsen straatmeubilair, speelaanleidingen en hekwerken. Realiseren padenstructuur. |
| [redacted] |

| |
|---|
| BR |

Foto: Plaatsen brug 6 boven aflaatconstructie

Foto: Asfalt aangebracht t.b.v. uitrit Drievliet en dienstweg dienstgebouw

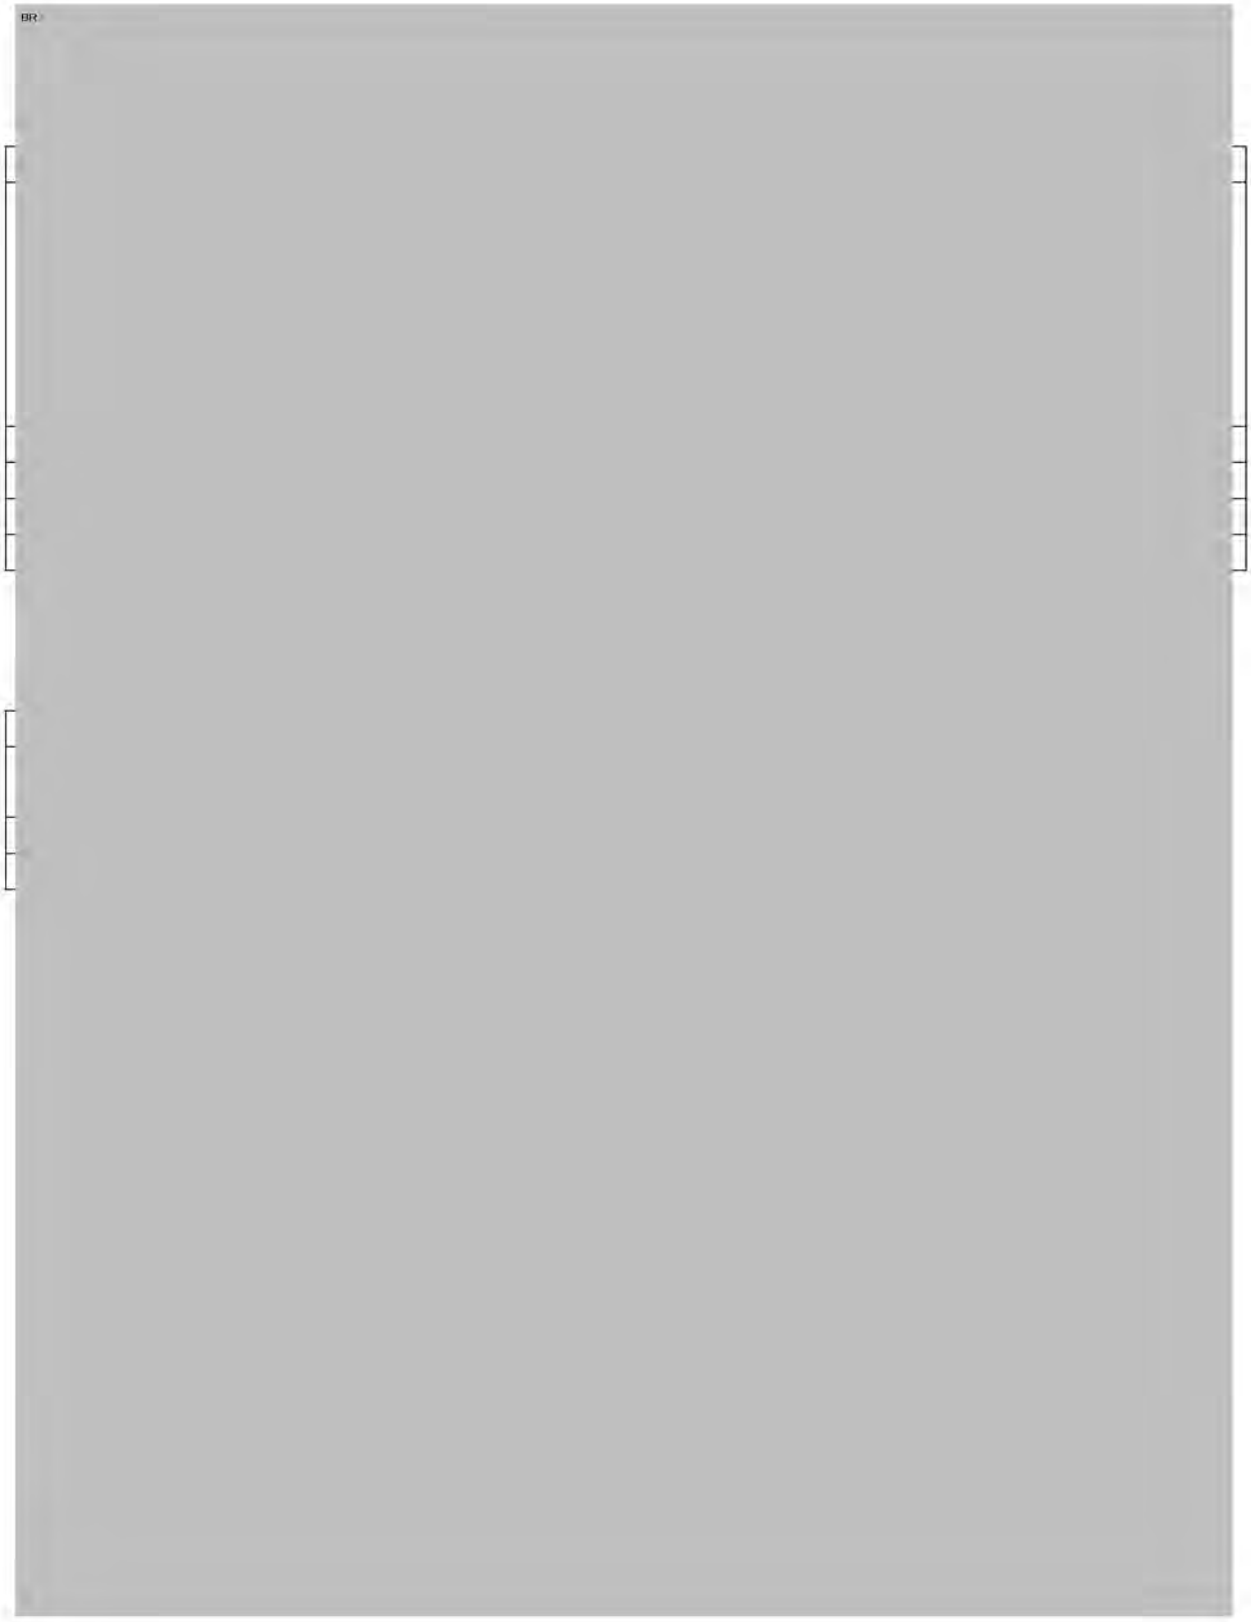

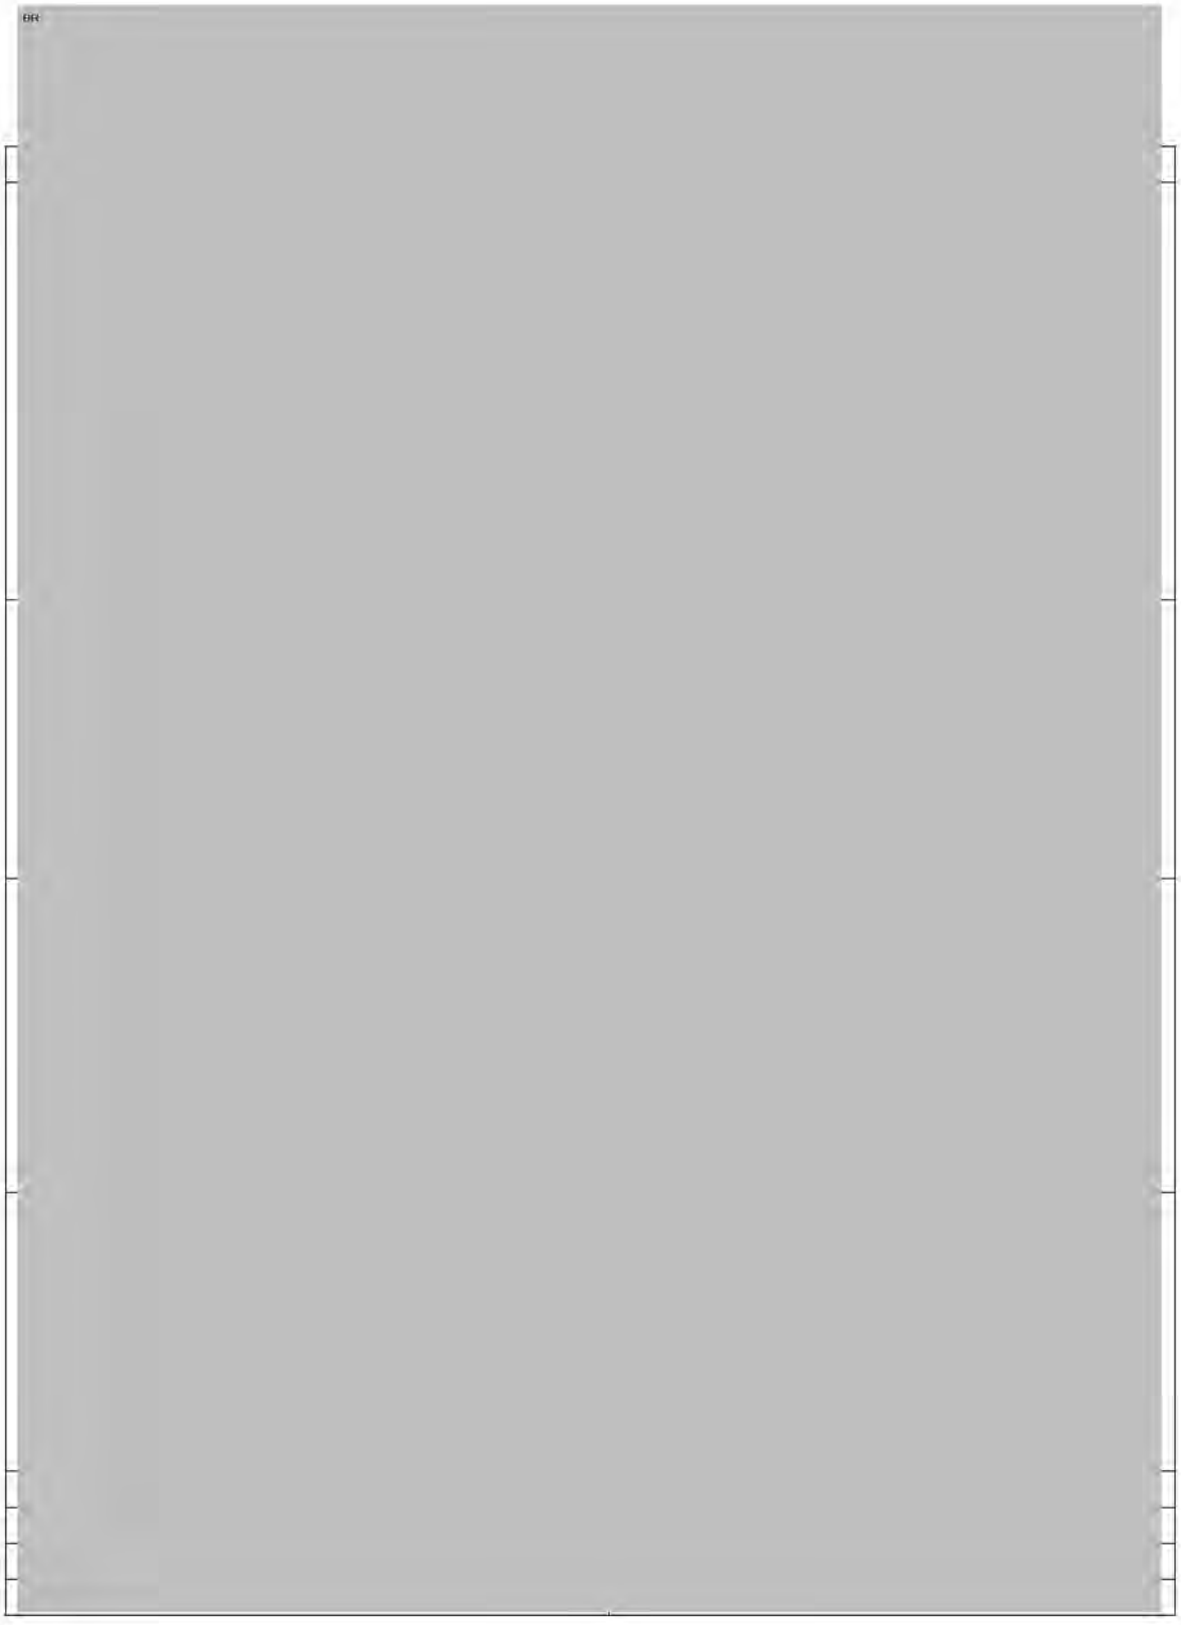

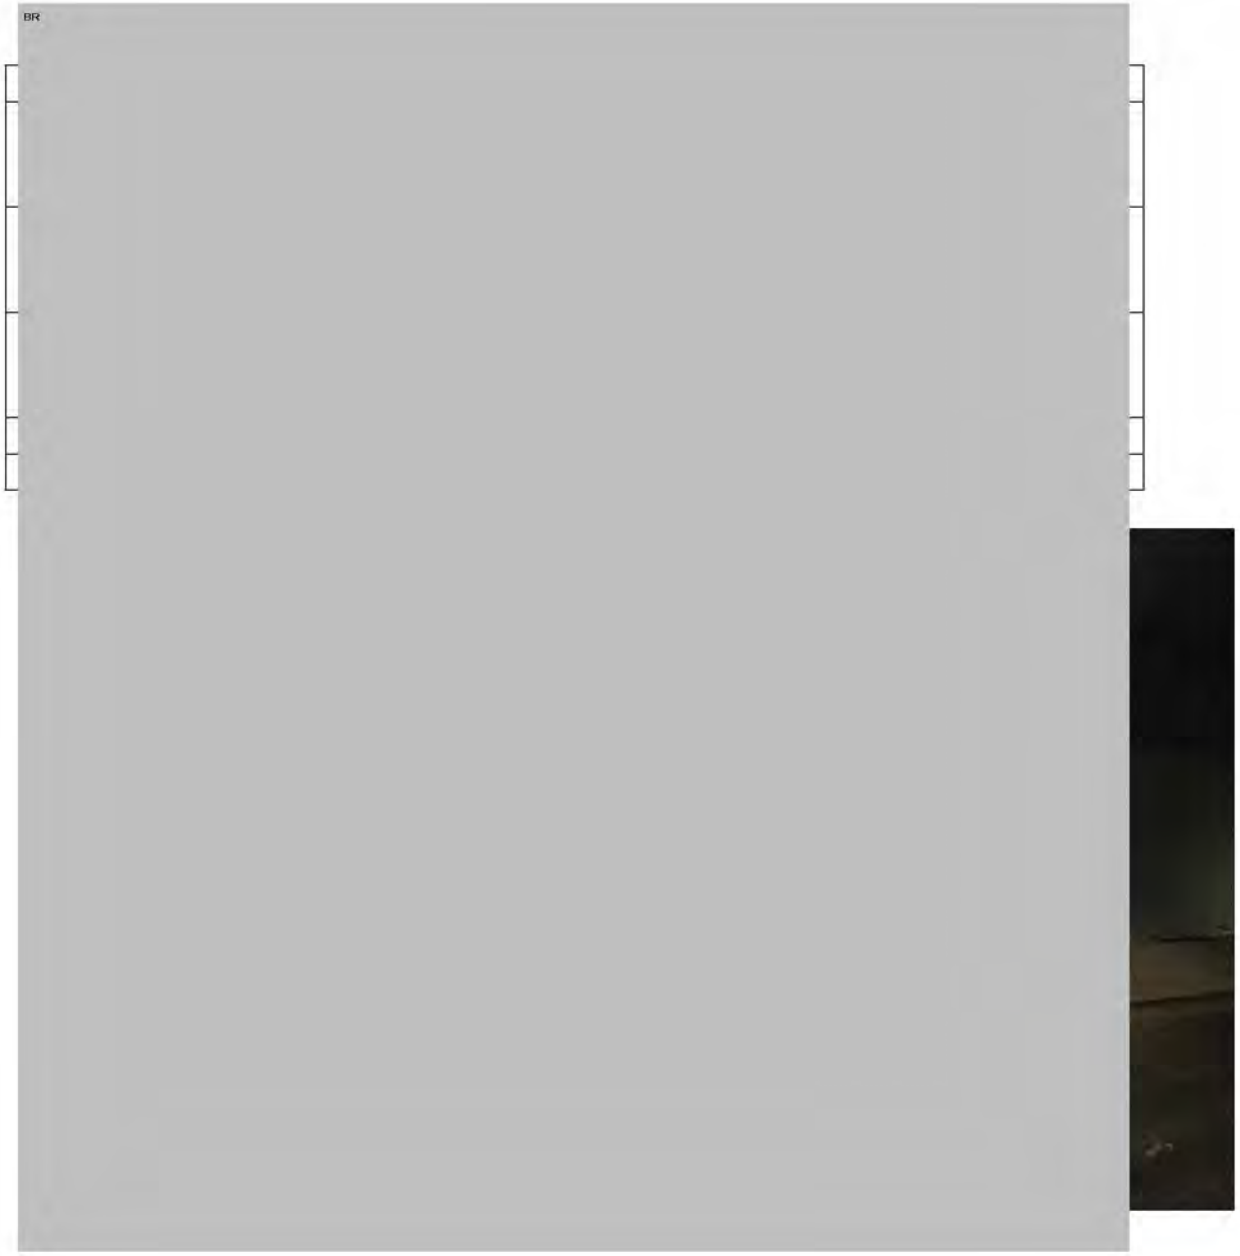
BR

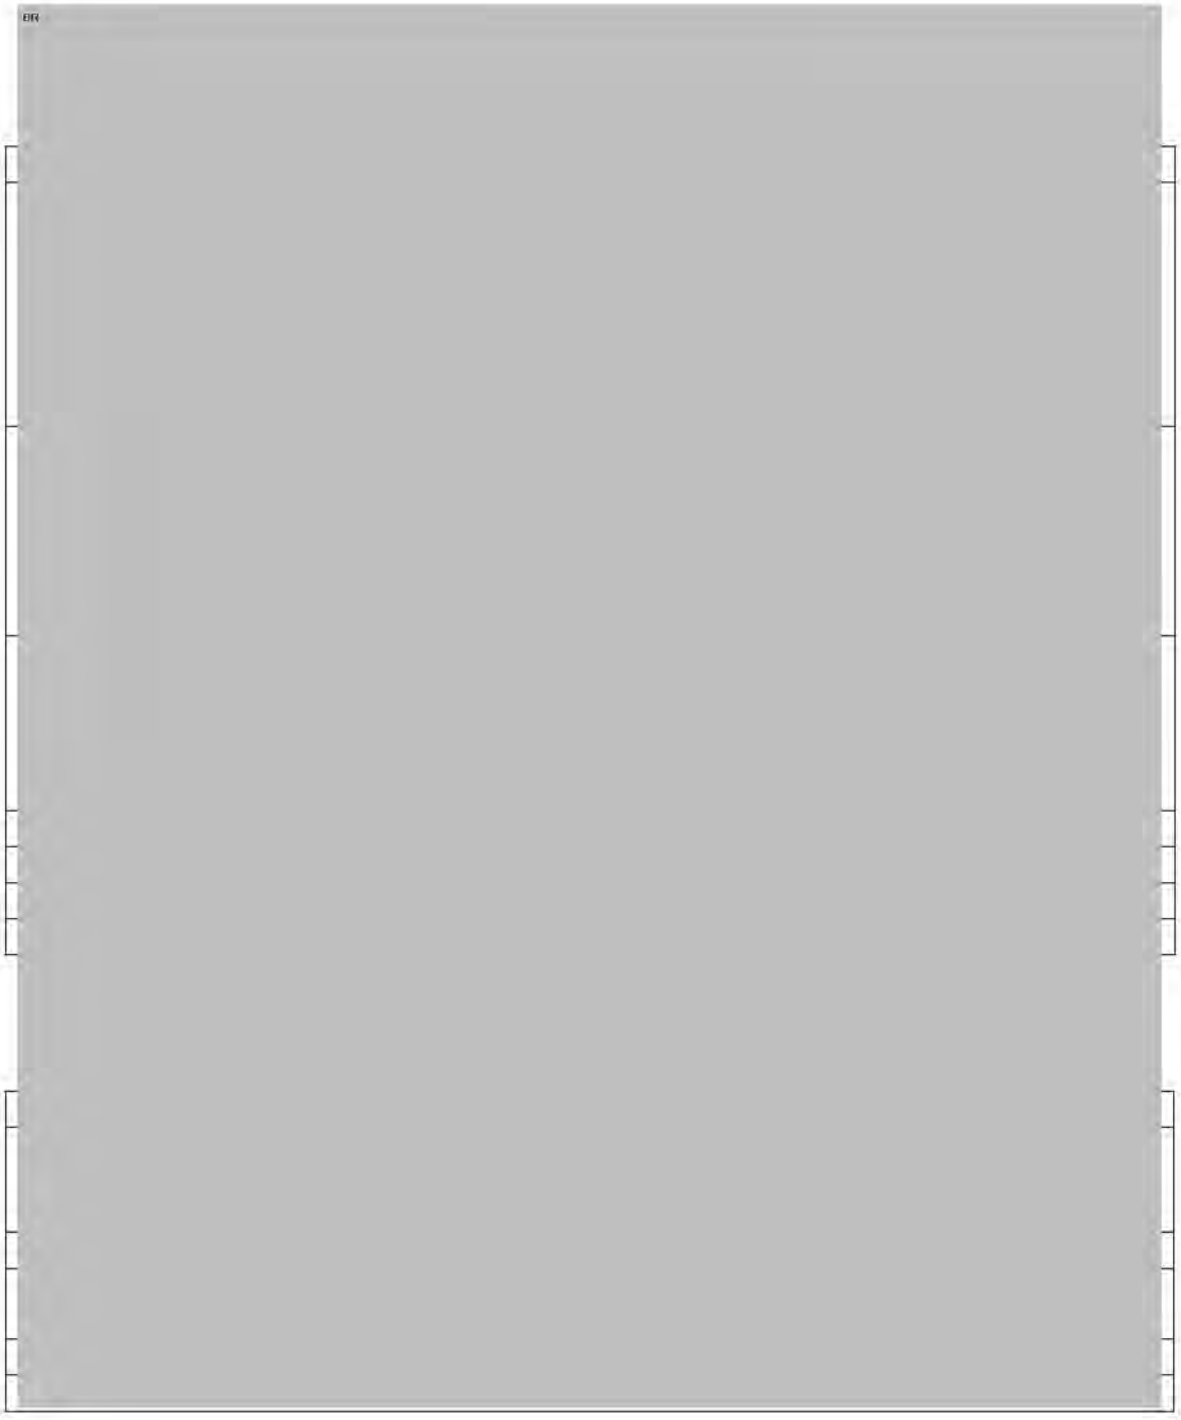

BR

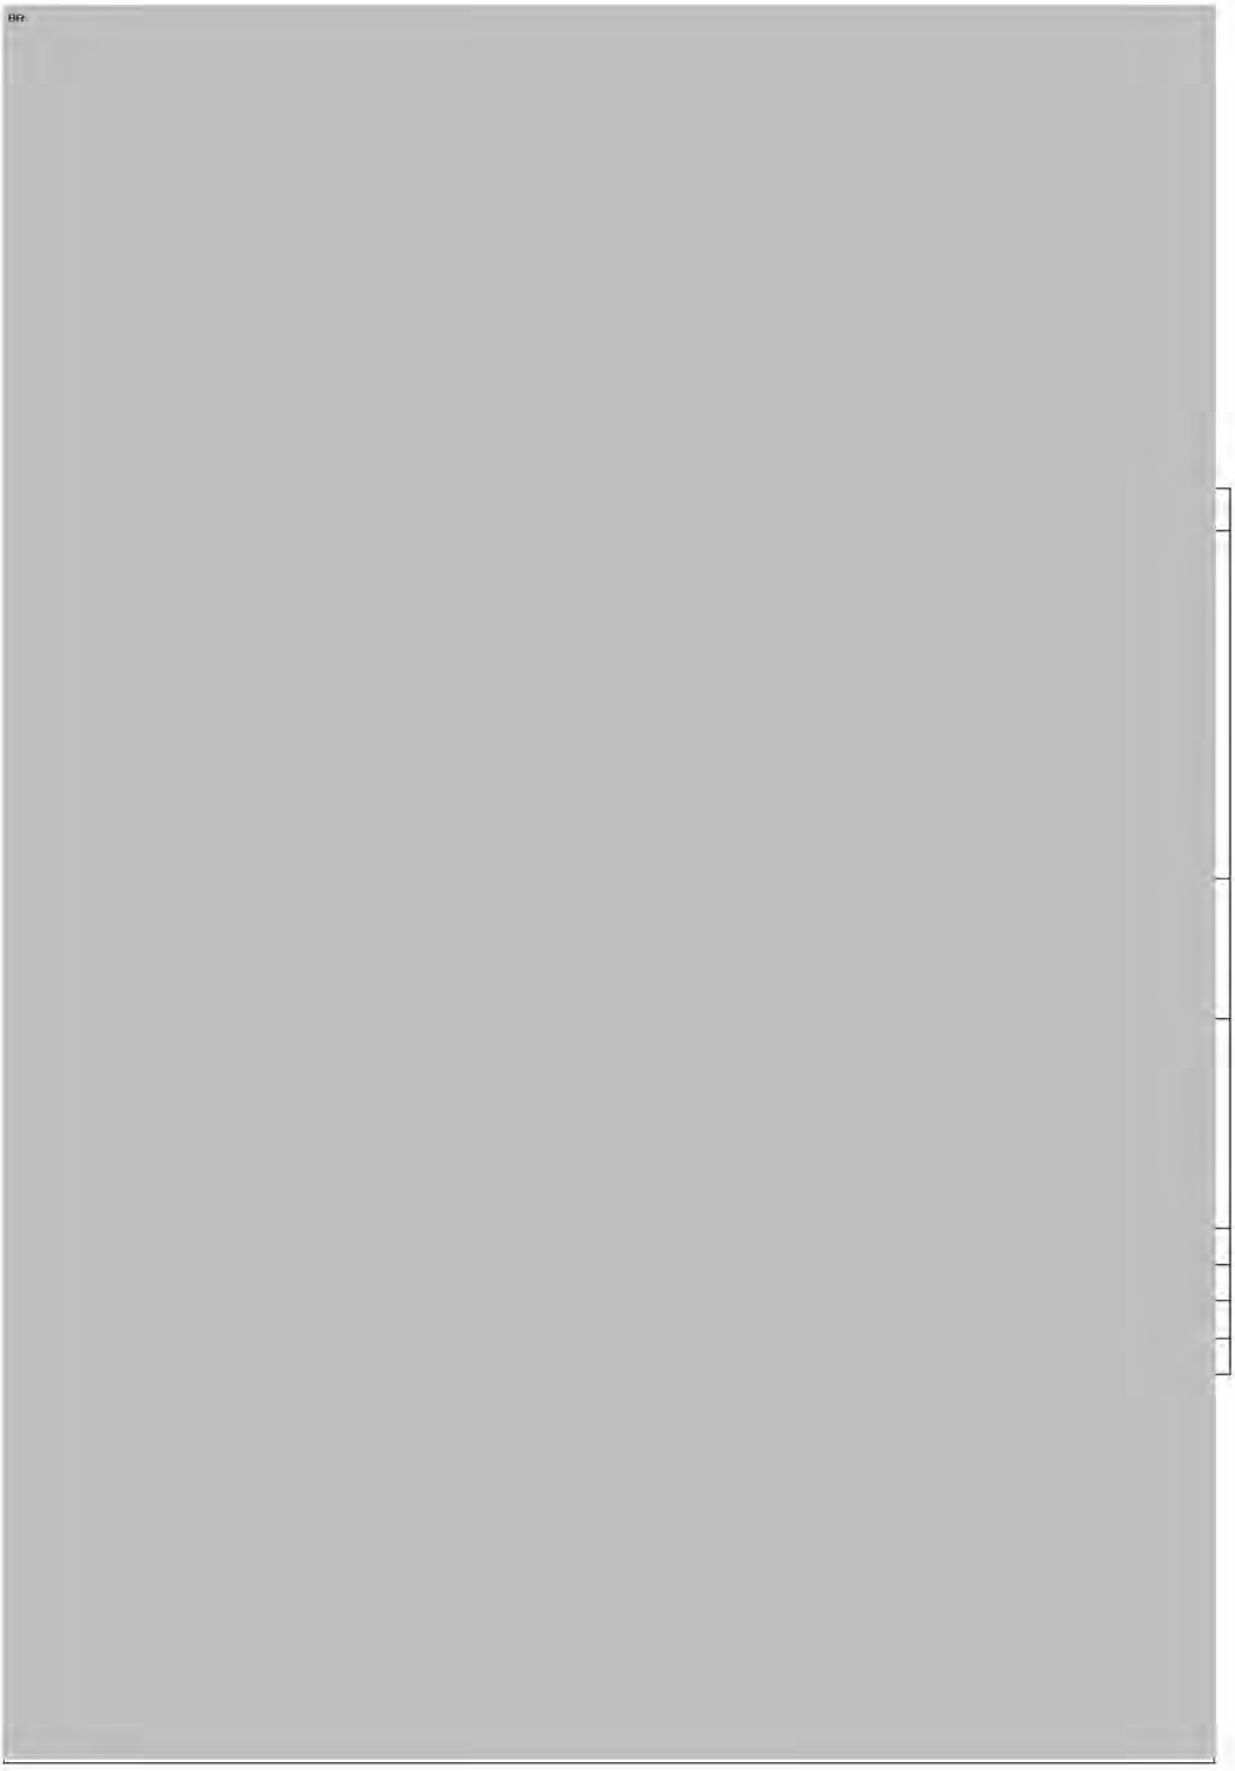
BR

BR

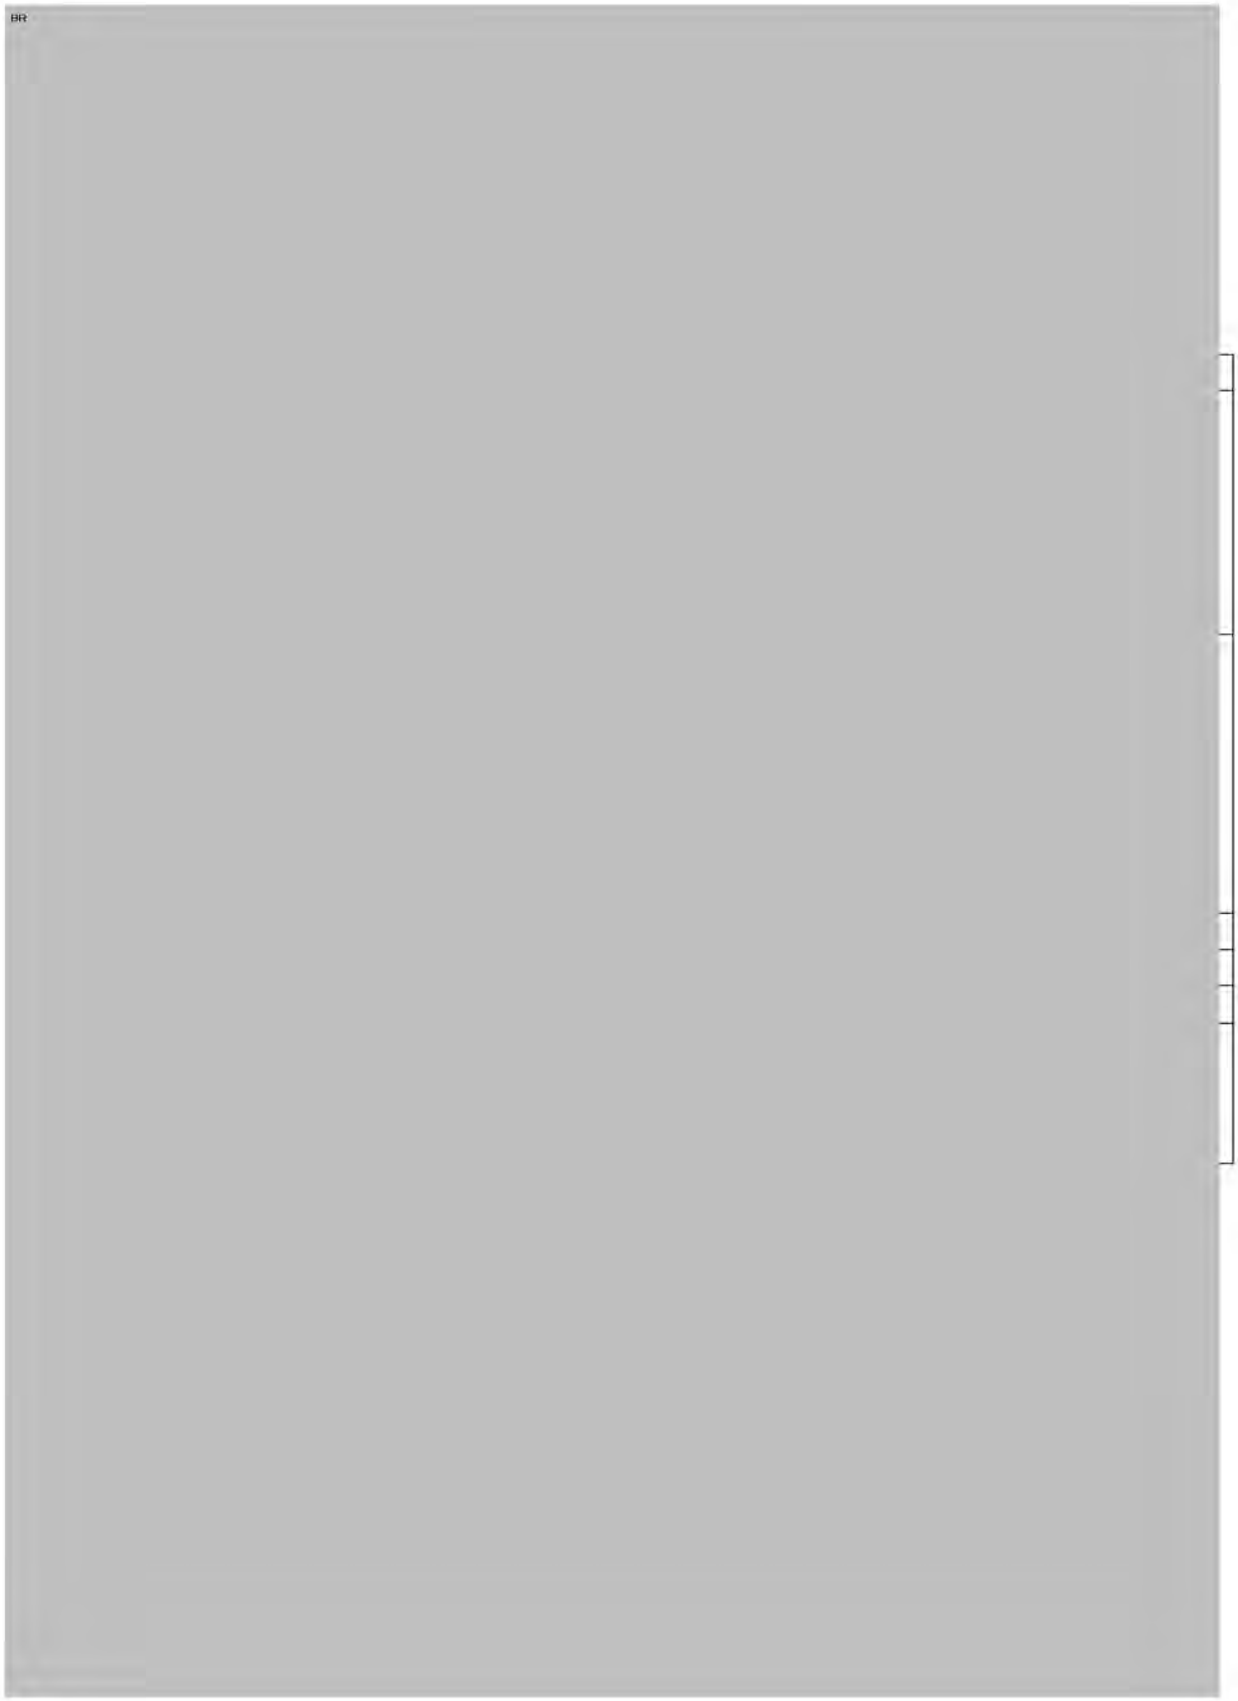

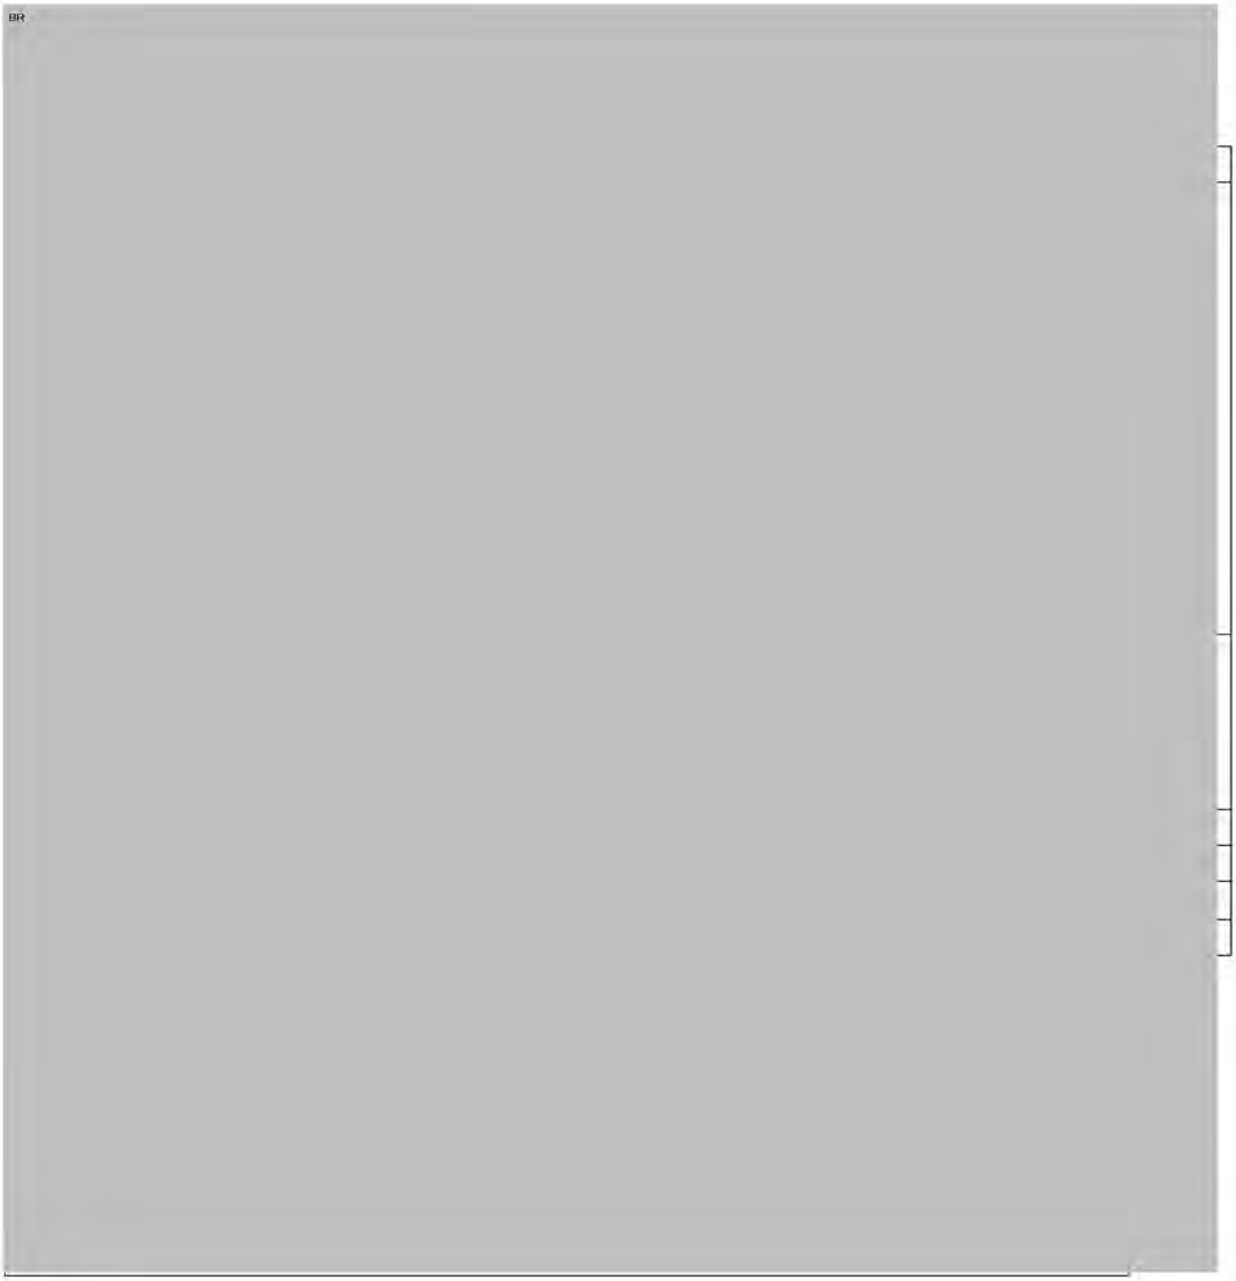
BR

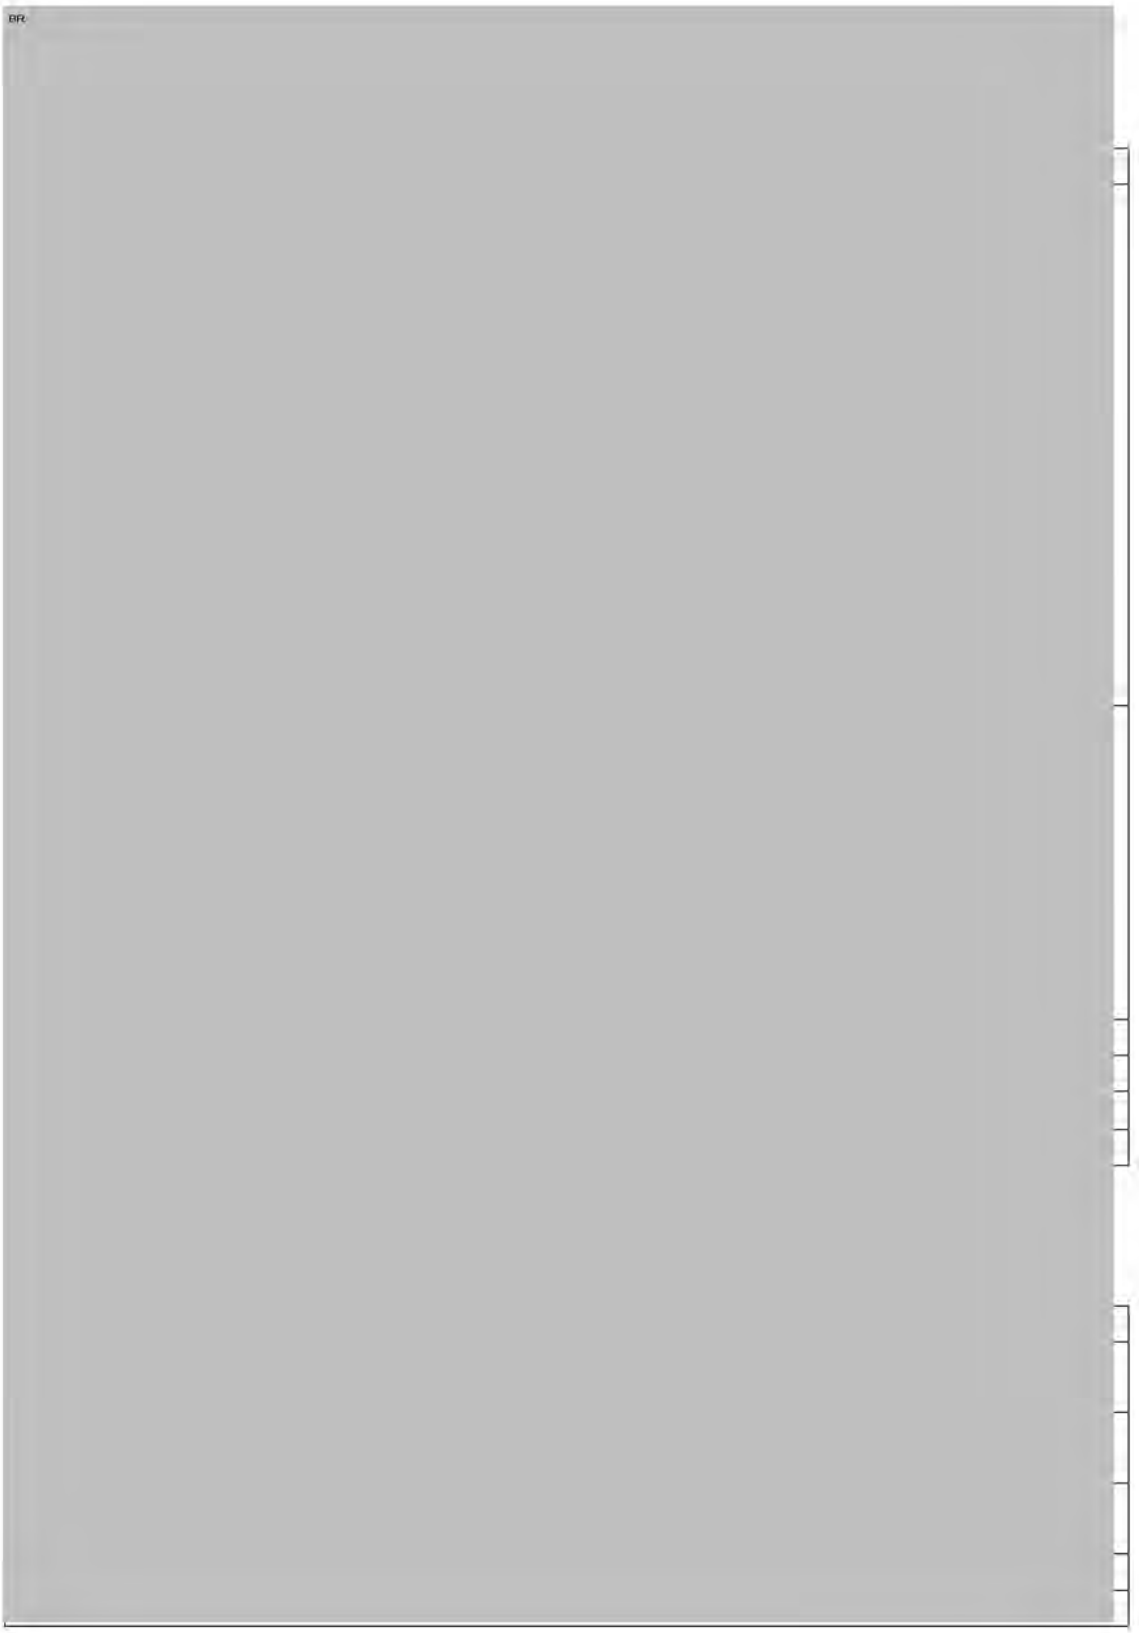

# 4 Overdracht en openstelling

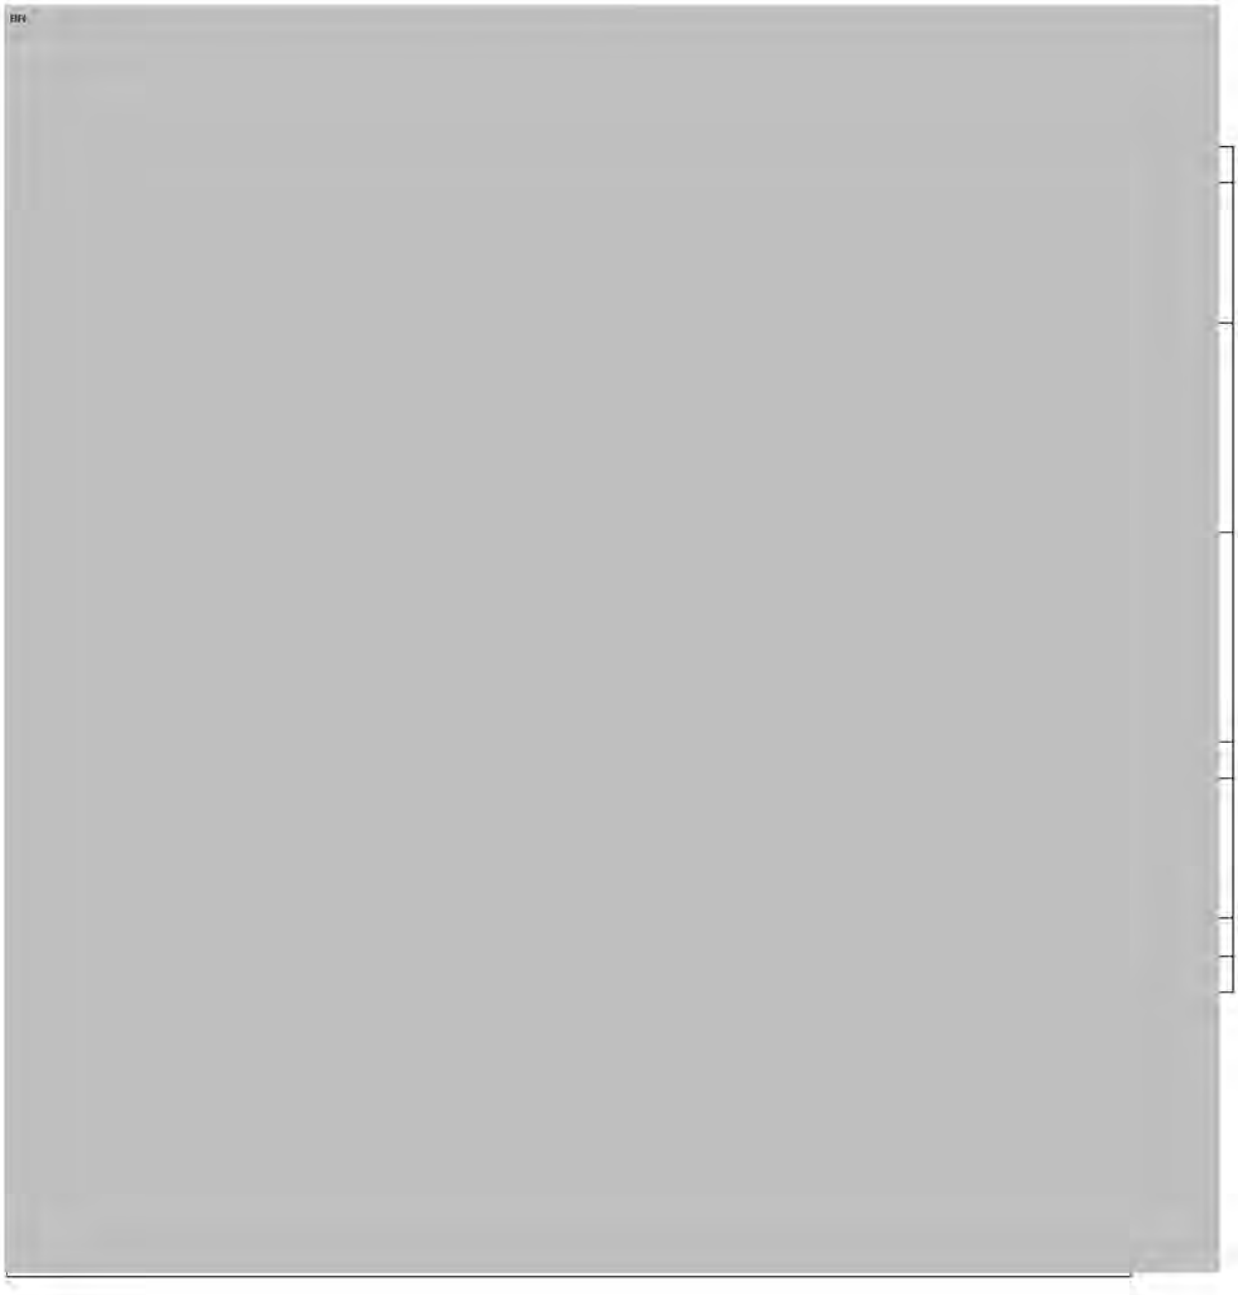

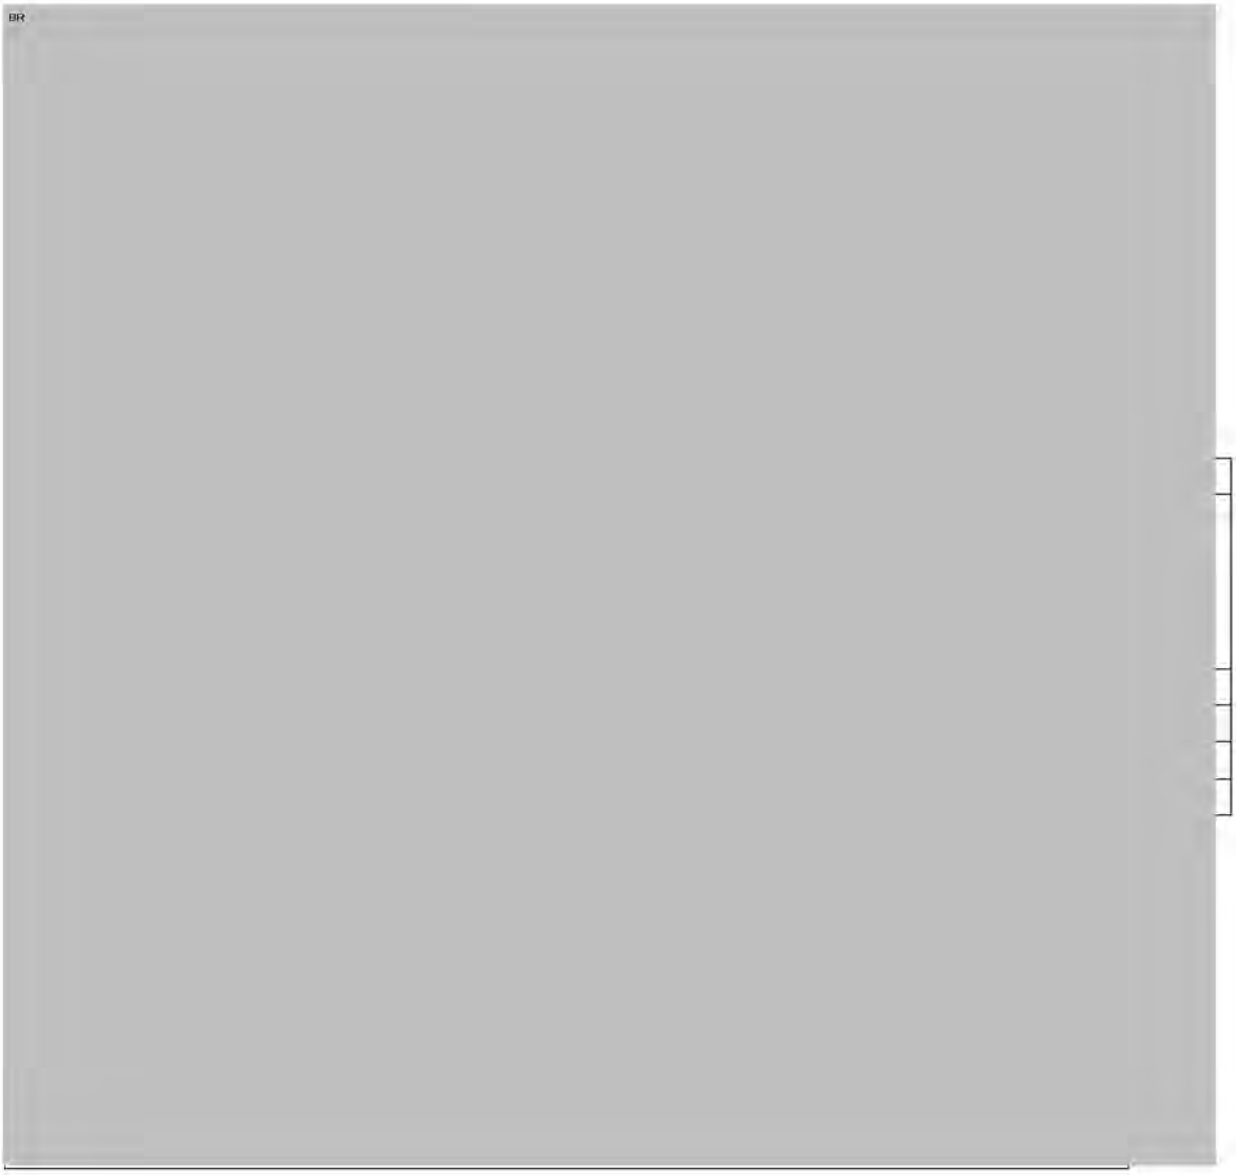

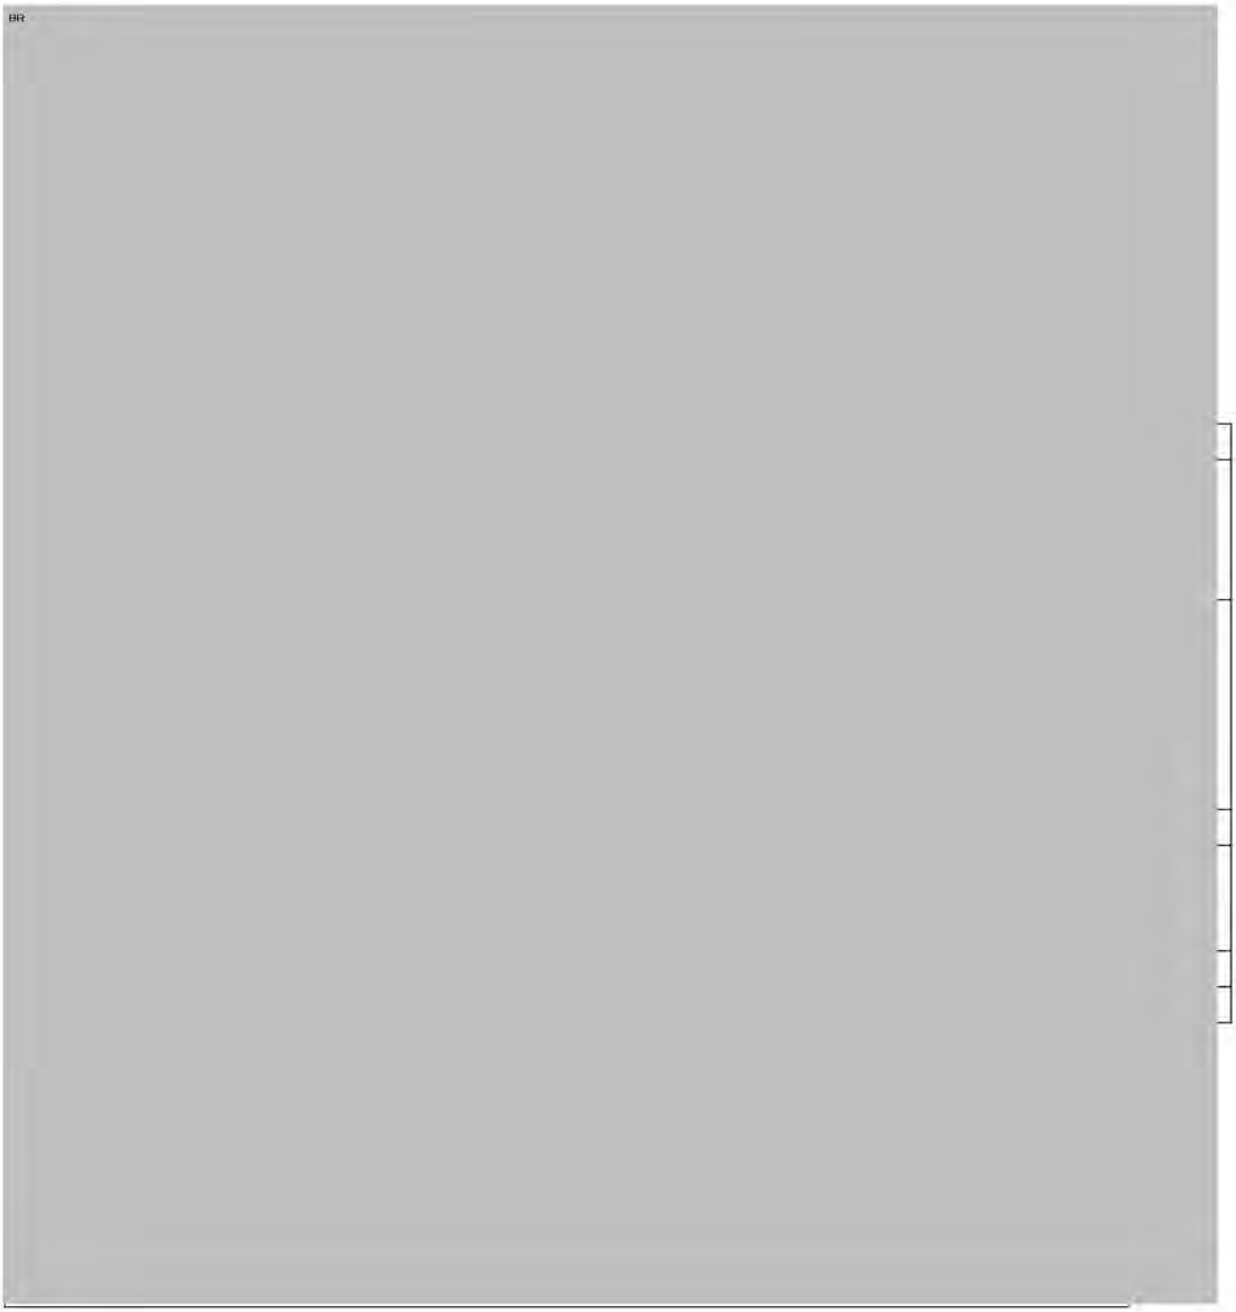

# 5 Projectbeheersing

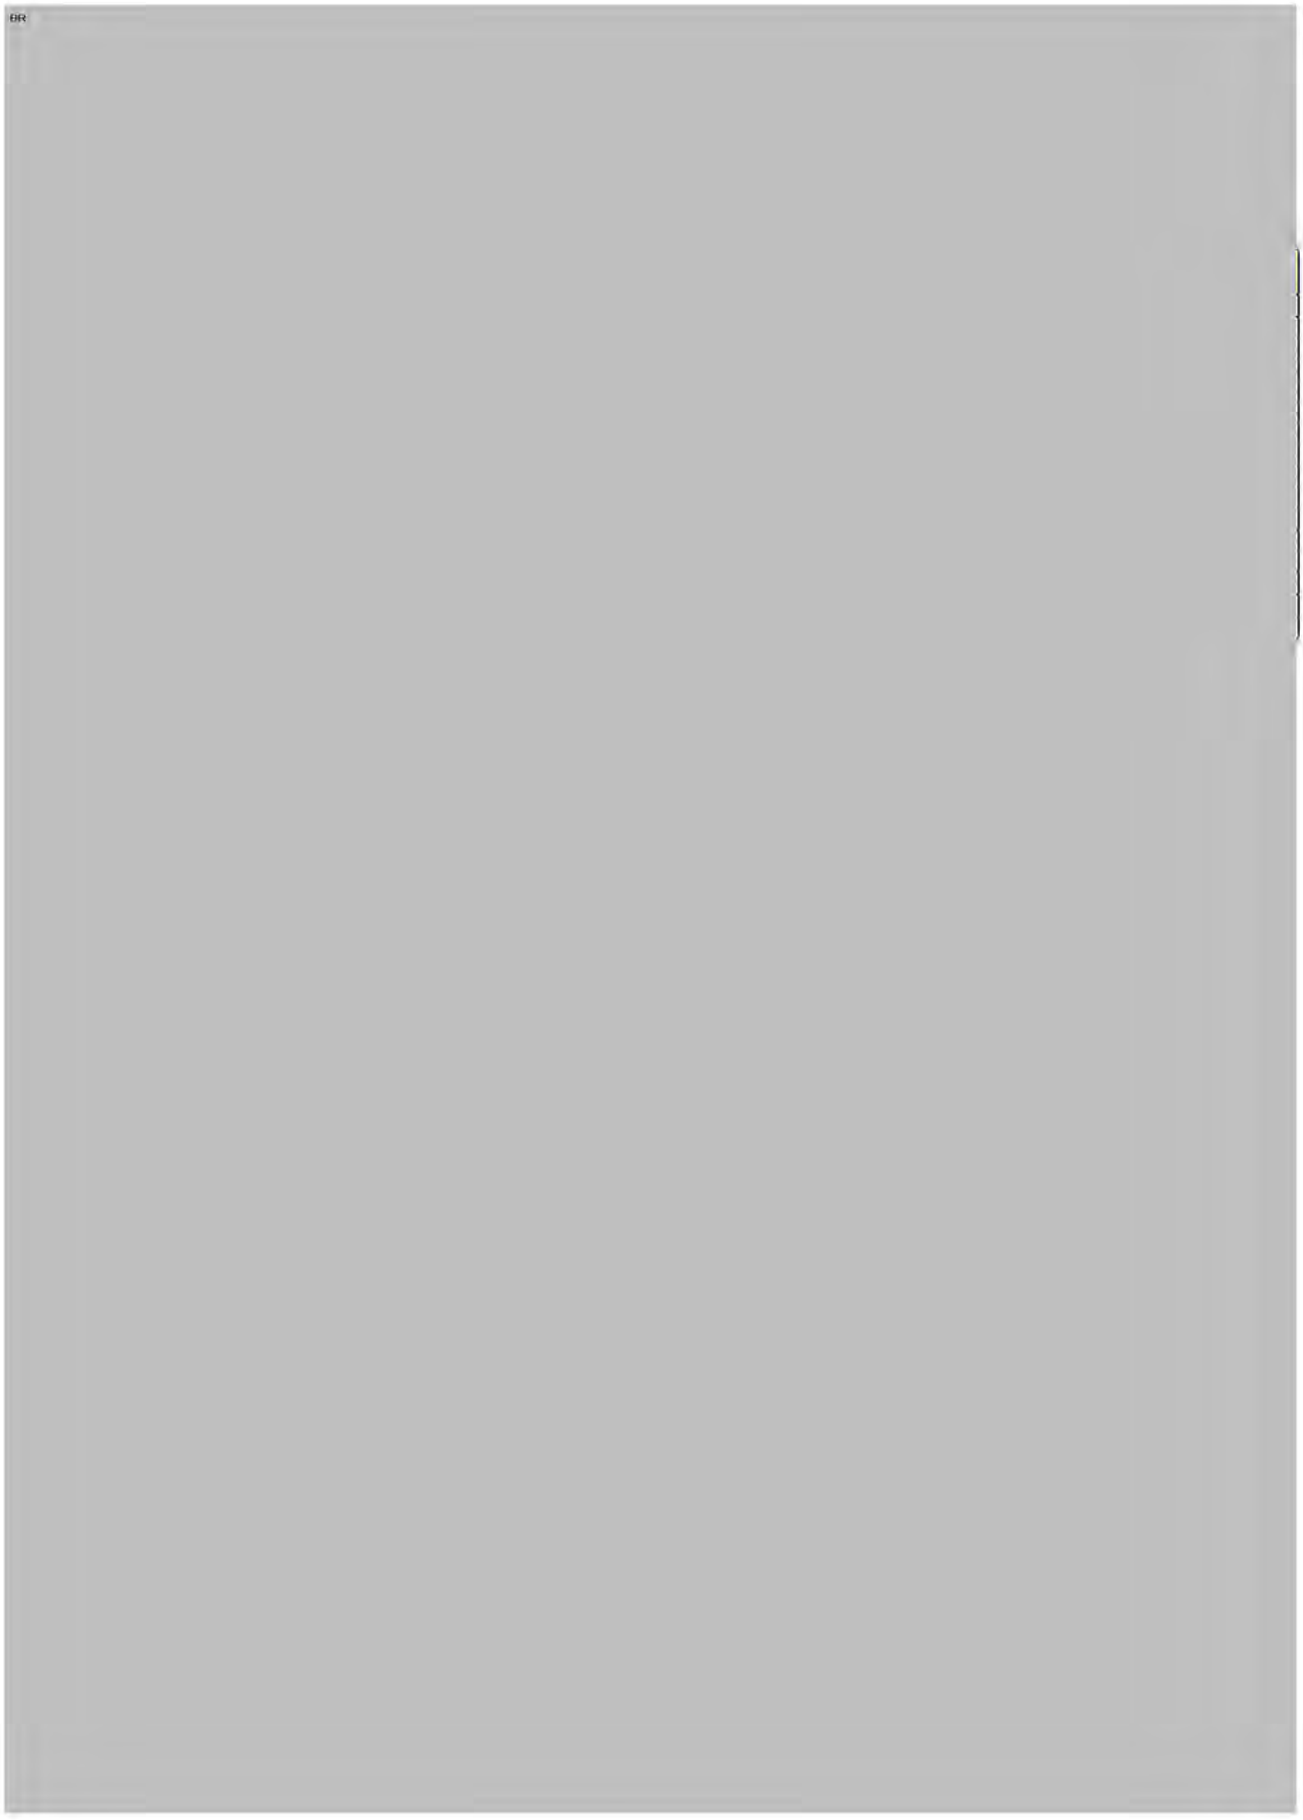

### 5.2.2 Dekkingen

Tabel : Overzicht toegezegde dekkingen Rotterdamsebaan, Euro's prijspeil 2019 (excl. BTW)

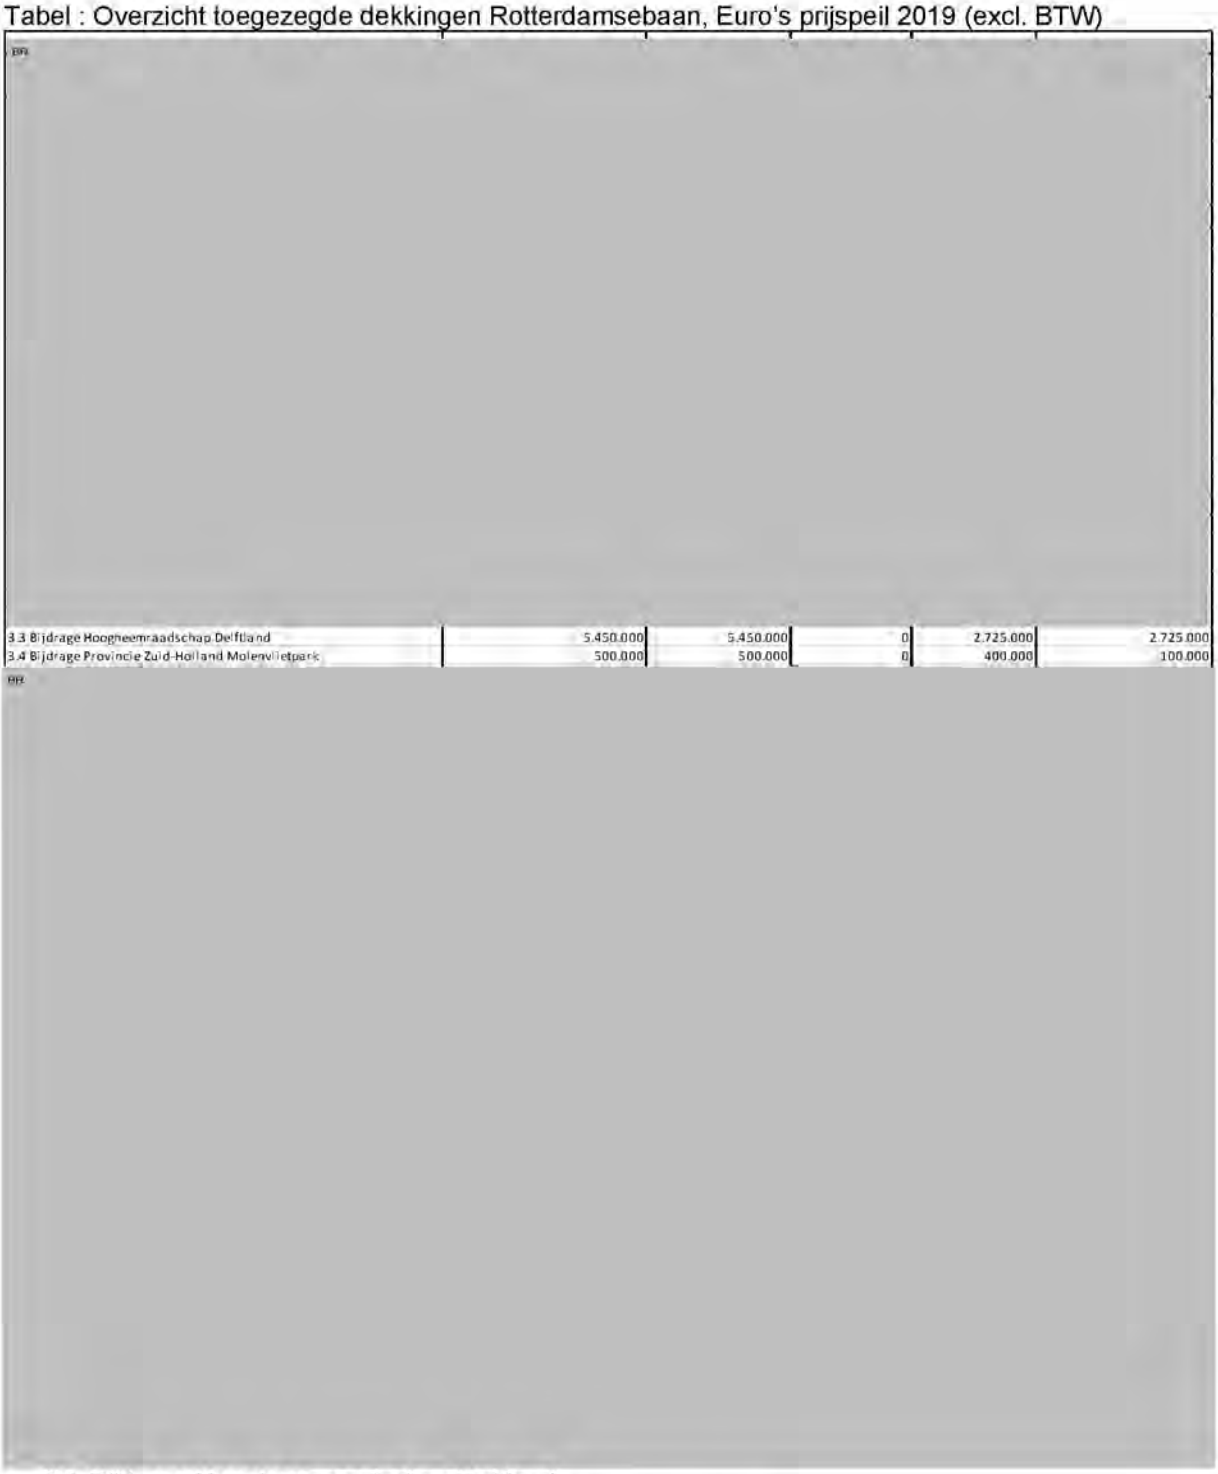

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland
Er zijn in het vierde kwartaal 2019 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland
Er zijn in het vierde kwartaal 2019 geen mutaties geweest.

BR

## 5.3 Planning

Zie tevens de bijlage 'Planningsmijlpalen'.

### 5.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Uitvoeren van een onzekerheidsanalyse op de planning en financiën voor de onderdelen Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e watertoevoer: | De onzekerheidsanalyses op de bedien-centrale en de 2e toevoer hebben plaatsgevonden. De onzekerheidsanalyse op de planning van de Rotterdamsebaan is uitgesteld tot 1e kwartaal 2020 (in afwachting van een geaccepteerde herziene Overallplanning van CRB). |
| BR | |

### 5.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Voortzetten regulier planningsproces Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e toevoer. |
| Uitvoeren van een onzekerheidsanalyse op tijd en financiën Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e toevoer. |
| BR |
| |

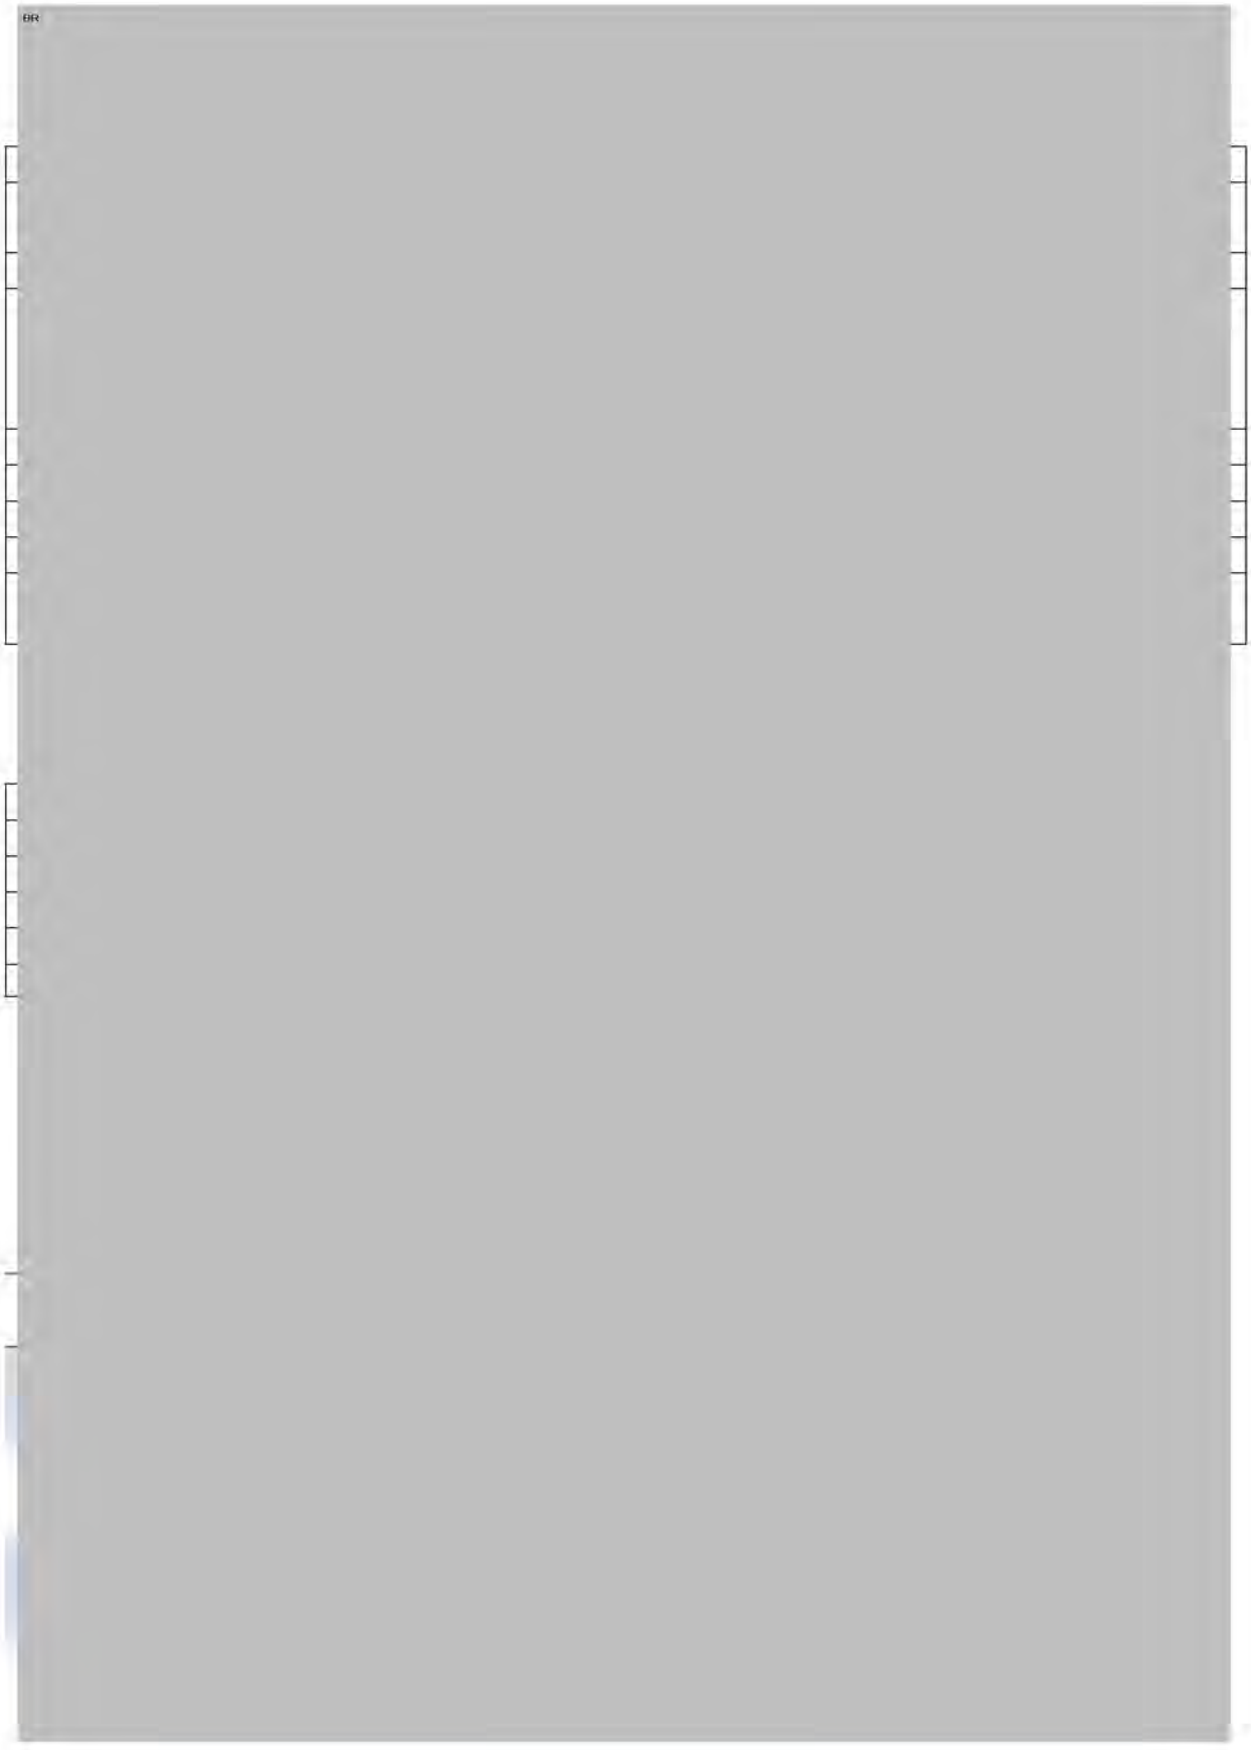

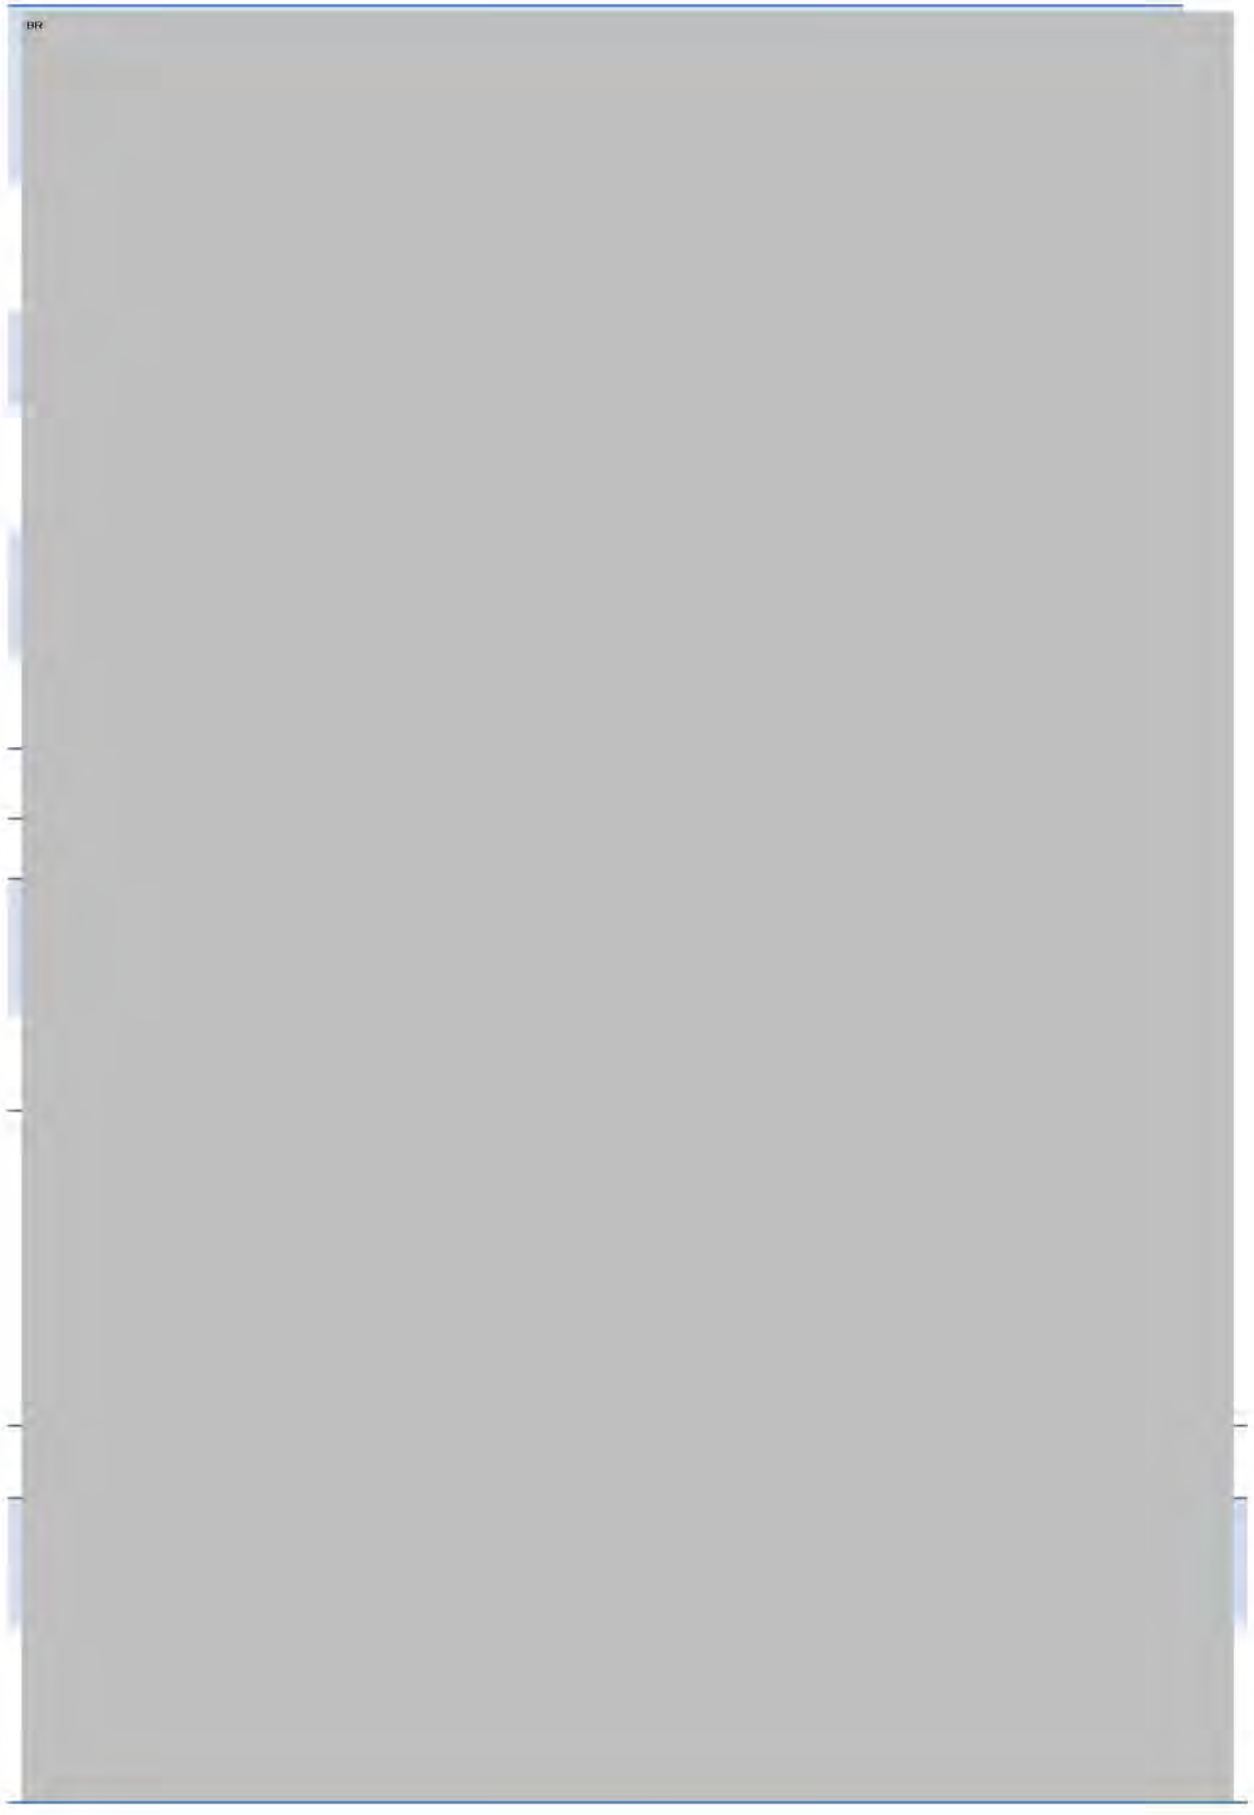
BR

BR

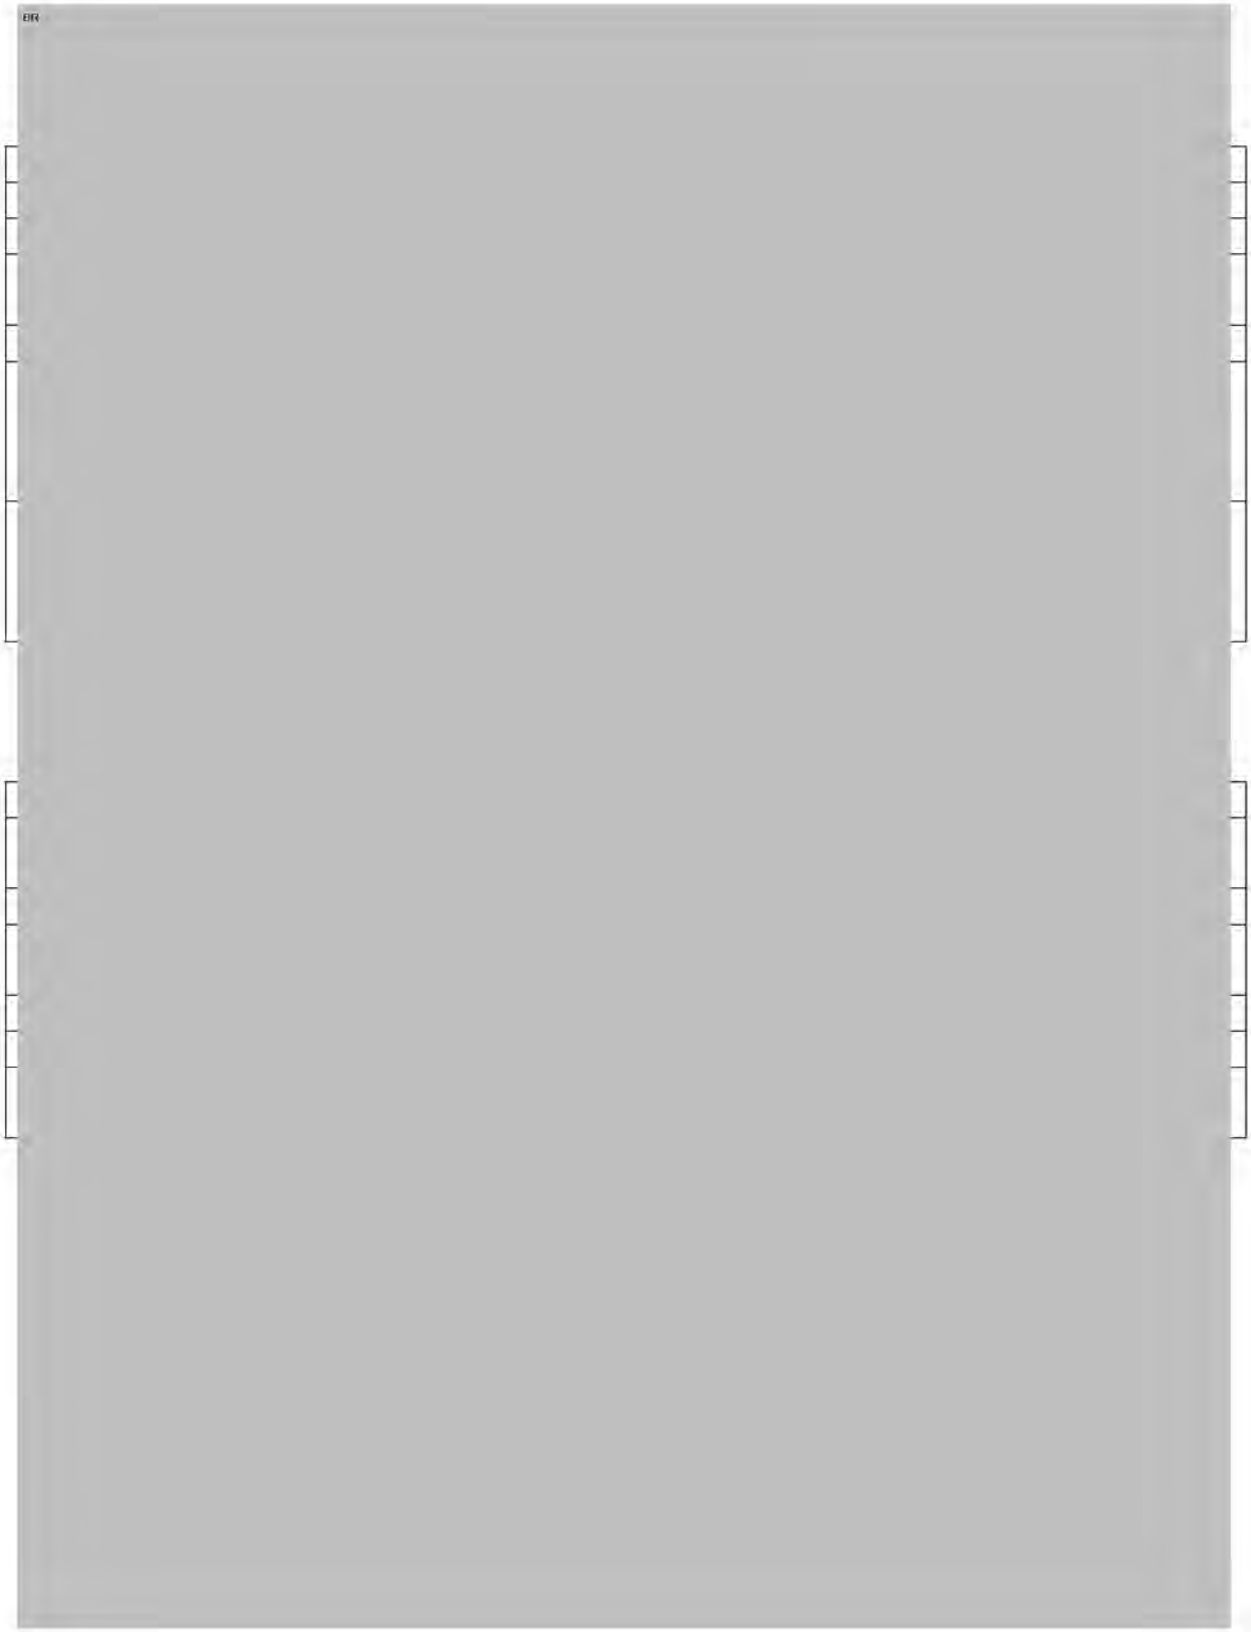

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 31 dec 2019 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 1-mei-20 | 25 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie (incl. consolidatieperiode) vertraagd. |
| BR | | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

5.1.2.e

5.1.2.e
BR

BR

Docnr25



Docnr26

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 1e kwartaal 2020

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 16 april 2020**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

Docnr26

Docnr26



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 1e kwartaal 2020
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004554

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>2 april 2020 | Versie 0.1<br>6 april 2020 | Versie 1.0<br>8 april 2020 | Versie 2.0<br>16 april 2020 | Versie 2.0<br>20 mei 2020 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr26



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 9

*2.1 Omgevingsmanagement* *9*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 9
2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie en Vergunningen* *10*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2.2 Komende kwartaal 10

*2.3 Verwervingen* *11*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 11
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Overeenkomsten* *12*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 12
2.4.2 Komende kwartaal 12

*2.5 Communicatie* *13*
2.5.1 Afgelopen kwartaal 13
2.5.2 Komende kwartaal 13
2.5.3 Diversen 14

3 Projectvoortgang 15

*3.1 Aanbesteden en contracteren* *15*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 15
3.1.2 Komende kwartaal 15

*3.2 Vormgeving* *16*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 16
3.2.2 Komende kwartaal 17

*3.3 Inpassing Binckhorst* *18*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 18
3.3.2 Komende kwartaal 18

*3.4 Inpassing Vlietzone* *20*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 20
3.4.2 Komende kwartaal 20

*3.5 Inpassing Laan van Hoornwijck* *22*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 22
3.5.2 Komende kwartaal 22

*3.6 Boortunnel en toeritten* *23*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 23
3.6.2 Komende kwartaal 23

*3.7 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *25*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 25
3.7.2 Komende kwartaal 25

*3.8 Installaties* *26*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 26

Docnr26



3.8.2 Komende kwartaal 27

*3.9 Veiligheid en gezondheid* *28*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 28
3.9.2 Komende kwartaal 28

*3.10 Bediencentrale* *29*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 29
3.10.2 Komende kwartaal 31

*3.11 Uitvoeringskwaliteit* *32*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 32
3.11.2 Komende kwartaal 32

*3.12 Contractmanagement* *33*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 33
3.12.2 Komende kwartaal 33

4 Overdracht en openstelling 34

*4.1 Tunnelveiligheid* *34*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 34
4.1.2 Komende kwartaal 34

*4.2 Overdracht aan beheerders* *35*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 35
4.2.2 Komende kwartaal 35

*4.3 Beheer en onderhoud* *36*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 36
4.3.2 Komende kwartaal 36

5 Projectbeheersing 37

*5.1 Scope* *37*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 37
5.1.2 Komende kwartaal 37

*5.2 Financiën* *38*
5.2.1 Kostenstructuur 38
5.2.2 Dekkingen 39

*5.3 Planning* *41*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 41
5.3.2 Komende kwartaal 41

*5.4 Risico's* *42*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 42
5.4.2 Komende kwartaal 42
5.4.3 Financiële toprisico's 42
5.4.4 Toprisico's planning 43

*5.5 Interne kwaliteit* *45*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 45
5.5.2 Komende kwartaal 45

*5.6 Informatiebeheer* *46*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 46
5.6.2 Komende kwartaal 46

Docnr26



5.6.3 Kennisdeling 47

*5.7 Organisatie* *48*

5.7.1 Afgelopen kwartaal 48

5.7.2 Komende kwartaal 48

6 Bijlage: Planningsmijlpalen 49

7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 50

8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 52

Docnr26



# 1 Managementsamenvatting

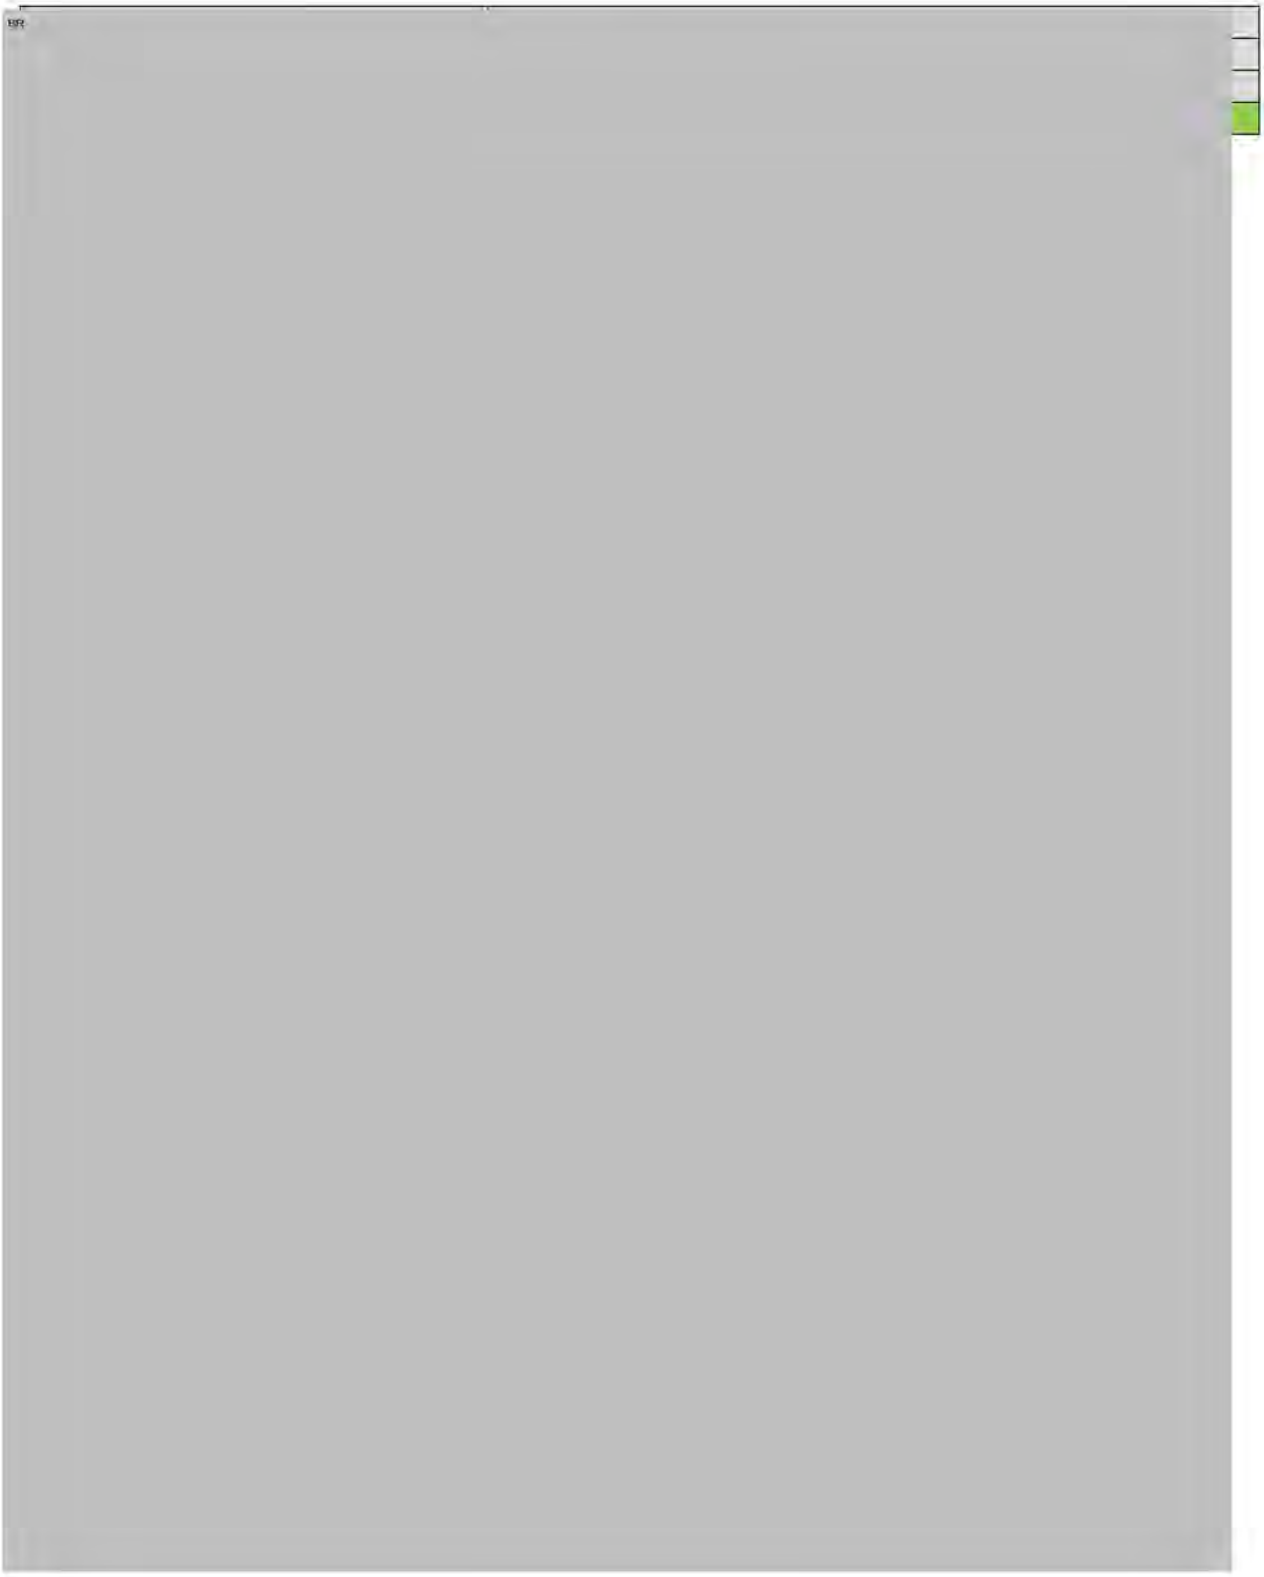

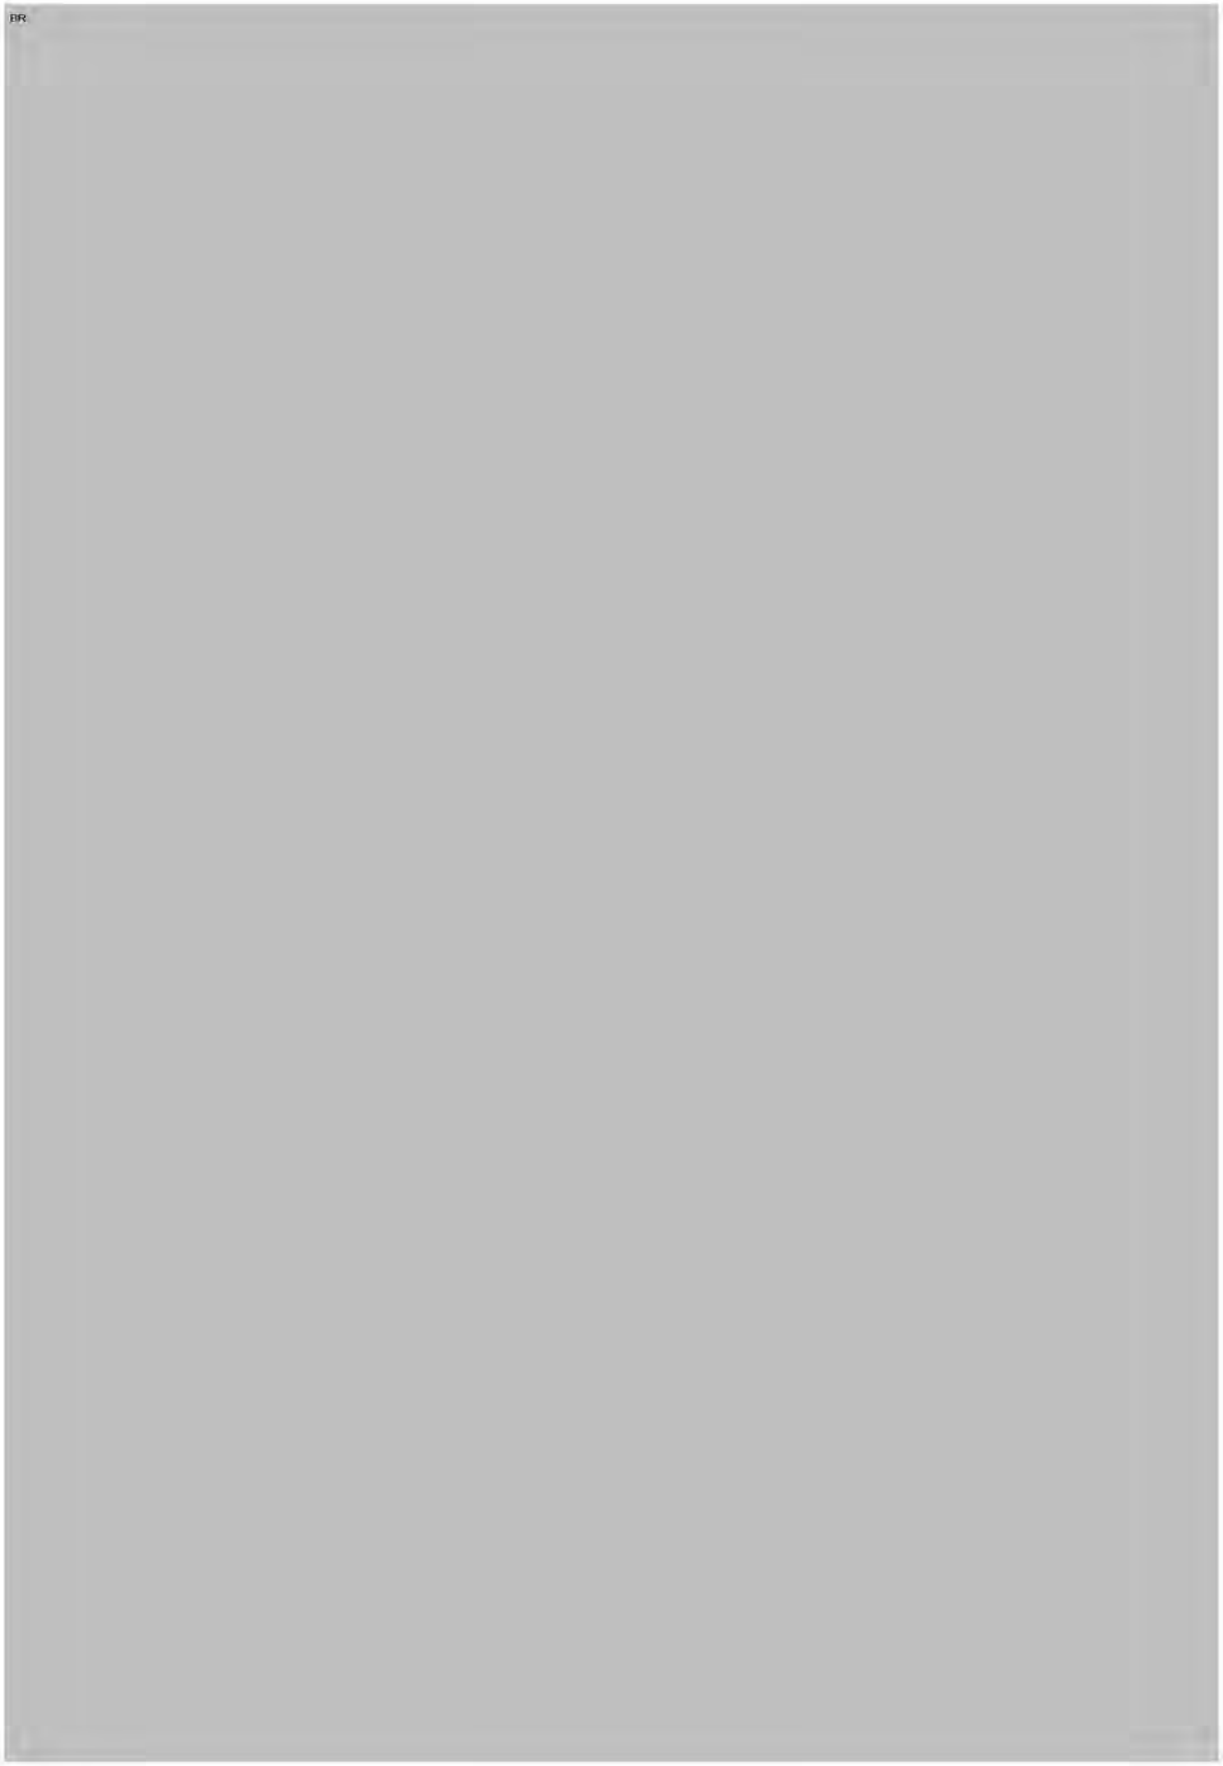

## 5. VERWACHTING KOMEND KWARTAAL

Komende kwartaal wordt er onder andere gewerkt aan:

- Voorbereiden en uitvoeren communicatie over de opening van een deel van het Molenvlietpark.

## 7. Planning

Na openstelling van de Rotterdamsebaan voor het verkeer eind 2020 is er nog een aantal activiteiten voorzien zoals: de bouw van de bediencentrale, kunsttrajecten en de tweede watertoevoer. Ondertussen werkt CRB in alle deelgebieden verder aan de realisatie van het project waardoor de onderdelen die niet beïnvloed worden door de VTTI-problematiek wel per 1 juli 2020 opgeleverd worden. Dat betreffen onder andere de voorzieningen van familiepark Drievliet, het Molenvlietpark en de maaiveldinrichting. Dat is na het 1e kwartaal onveranderd gebleven.

Docnr26



# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorig kwartaal | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Bezoek met landschapsarchitect en vertegenwoordiger namens Rijswijk aan een tweetal bewoners in Park Hoornwijck wegens klachten n.a.v. realisatie van aflaat-constructie in Molenvlietpark. | Er heeft afstemming met het Hoogheemraadschap van Delfland plaatsgevonden. Nader onderzoek wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing en aanpassing. Als de conclusies bekend zijn, zal een voorstel met de bewoners besproken worden. |
| [redacted] | |

## 2.2 Planologie en Vergunningen

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| In overleg met CRB en andere betrokkenen inzicht houden op het vergunningenproces. | Periodiek overleg gevoerd met zowel CRB, HHD als DSO Vergunningen & Toezicht. CRB heeft een aantal vergunningen aangevraagd en/of verkregen, zoals een aanlegvergunning voor het onderdeel van het Trekfietstracé dat door CRB wordt gerealiseerd ter plaatse van Stal Meyvliet en een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een Ooievaarsnest in het Molenvlietpark. |
| BR | |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Een AERIUS-stikstofdepositieberekening is uitgevoerd t.b.v. aanlegvergunning inrichting Molenvlietpark tussen landgoed Zeerust en de golfbaan (voormalige pluktuin); | |
| BR | |

### 2.2.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| In overleg met CRB en andere betrokkenen inzicht houden op het vergunningenproces. |
| Ontwerp-besluit afwachten op kapaanvraag en vvgb Wet natuurbescherming in verband met aanleg tweede watertoevoer. |
| BR |

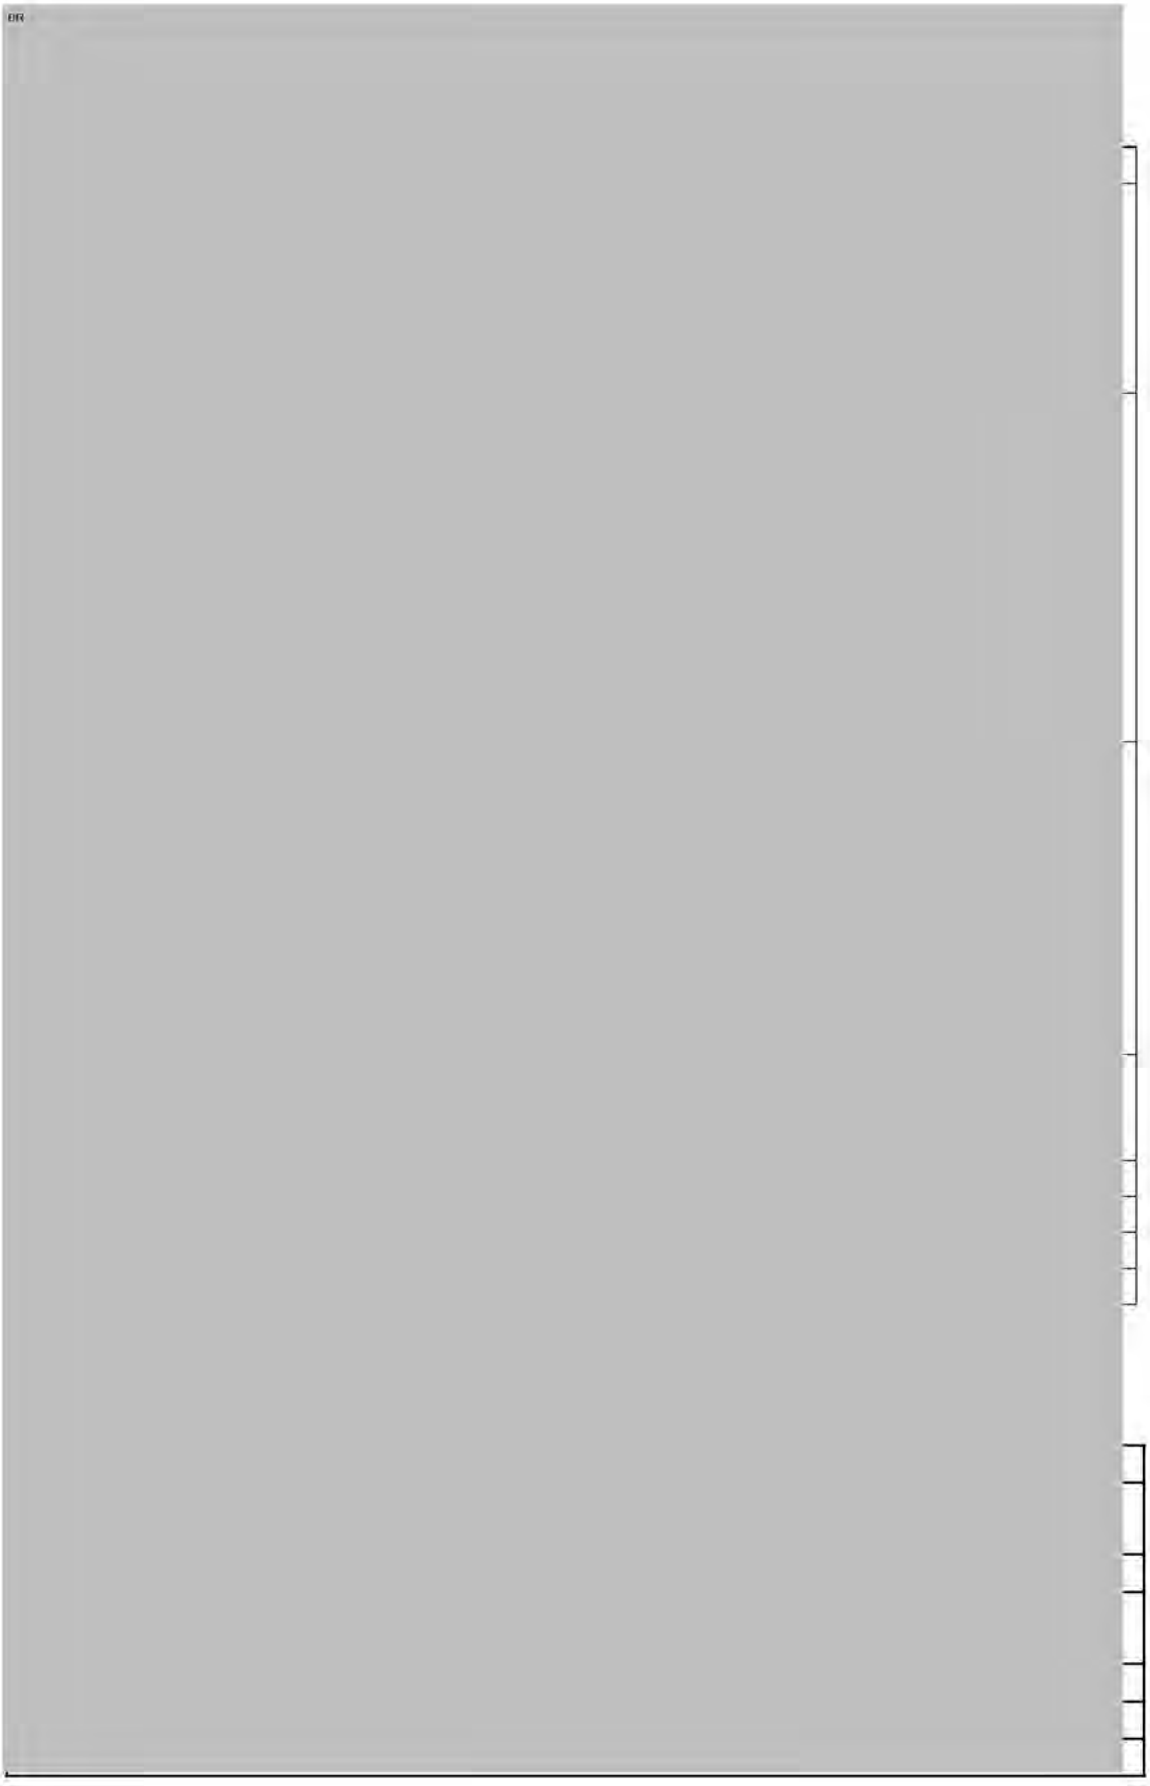

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Samenwerkingsovereenkomst met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. | De samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de tweede toevoer is voor Roba en eigenaar op hoofdlijnen akkoord. De Provincie is niet akkoord met het ontwerp van het landgoed van de grondeigenaar. DSO is in overleg getreden voor een oplossing. Dit proces heeft invloed op de SOK Roba. In afwachting van uitsluitsel over de anterieure overeenkomst t.b.v. het landgoed, tekent de grondeigenaar de SOK met Roba nog niet. |
| Samenwerkingsovereenkomst met Provincie Zuid-Holland t.a.v. gedeeltelijke vervanging oeverconstructie langs Vliet. | De Samenwerkingsovereenkomst is door beide partijen ondertekend. Vervanging van de oeverconstructie in opdracht van Den Haag zal gecombineerd plaatsvinden met de realisatie van de tweede watertoevoer. |
| Met de eigenaren van het pand en perceel aan de Jan Thijssenweg 8 worden afspraken vastgelegd in een overeenkomst en akte over o.a. de herinrichting van het Molenslootpad en grondaankoop t.b.v. hun perceel. | Nadere gesprekken hebben plaatsgevonden met de perceeleigenaar. Er wordt een ruilovereenkomst opgesteld. Alvorens tot afronding over te kunnen gaan, dient de SOK met de grondeigenaar landgoed afgerond te zijn. Als gevolg van die ontwikkeling zal het Molenslootpad namelijk worden verplaatst en kan de eigenaar van de Jan Thijssenweg een extra stuk grond van de gemeente krijgen en aan de gemeente afstaan i.v.m. o.a. de verlegging van kabels en leidingen. |
| [redacted] | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Samenwerkingsovereenkomst ondertekenen met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer op particulier terrein. |
| Opstellen ruilovereenkomst (en indien mogelijk) met eigenaren Jan Thijssenweg 8. |
| [redacted] |

## 2.5 Communicatie

### 2.5.1 Afgelopen kwartaal

| |
|---|
| |
| **Overige / extra verrichte werkzaamheden** |
| |
| Er is een video gemaakt over de aanleg van het Molenvlietpark. Deze video is gedeeld via YouTube, de social mediakanalen van de Rotterdamsebaan en de digitale nieuwsbrief. |
|  |

### 2.5.2 Komende kwartaal

| |
|---|
| **Werkzaamheden** |
| |
| Voorbereiden en uitvoeren communicatie over de opening van een deel van het Molenvlietpark. |
| |

Docnr26

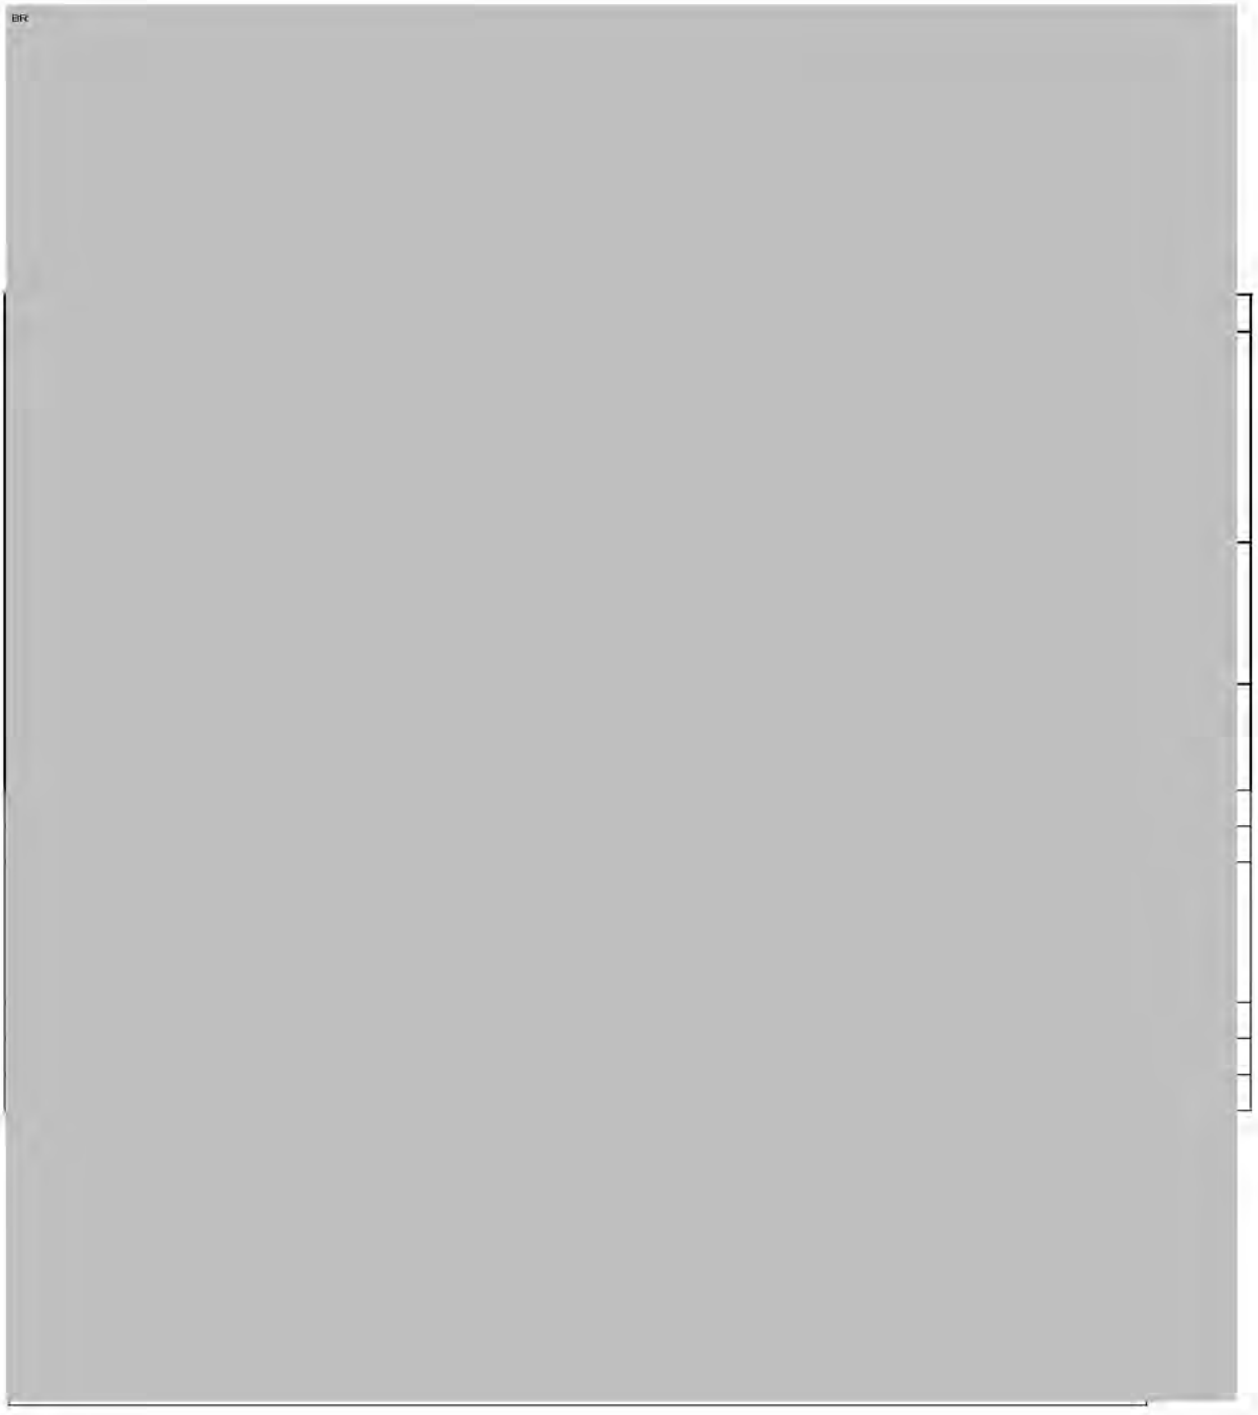
BR

## 3.2 Vormgeving

### 3.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| In het 1e kwartaal 2020 staan overleggen gepland over de kunsttrajecten met collega's van OCW en stadsdeel. | - Er is overleg gevoerd met o.a. de directeur OCW/Cultuur. Afgesproken is een regulier overleg in te stellen om Cultuur te betrekken en te informeren over de voortgang van beide kunstopdrachten.<br>- De directeur van het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg is geïnformeerd over de kunstopdracht m.b.t. Archeologie. Het te realiseren kunstwerk krijgt een plek in het Molenvlietpark, dat in het stadsdeel ligt. |
| [redacted] | |

BR

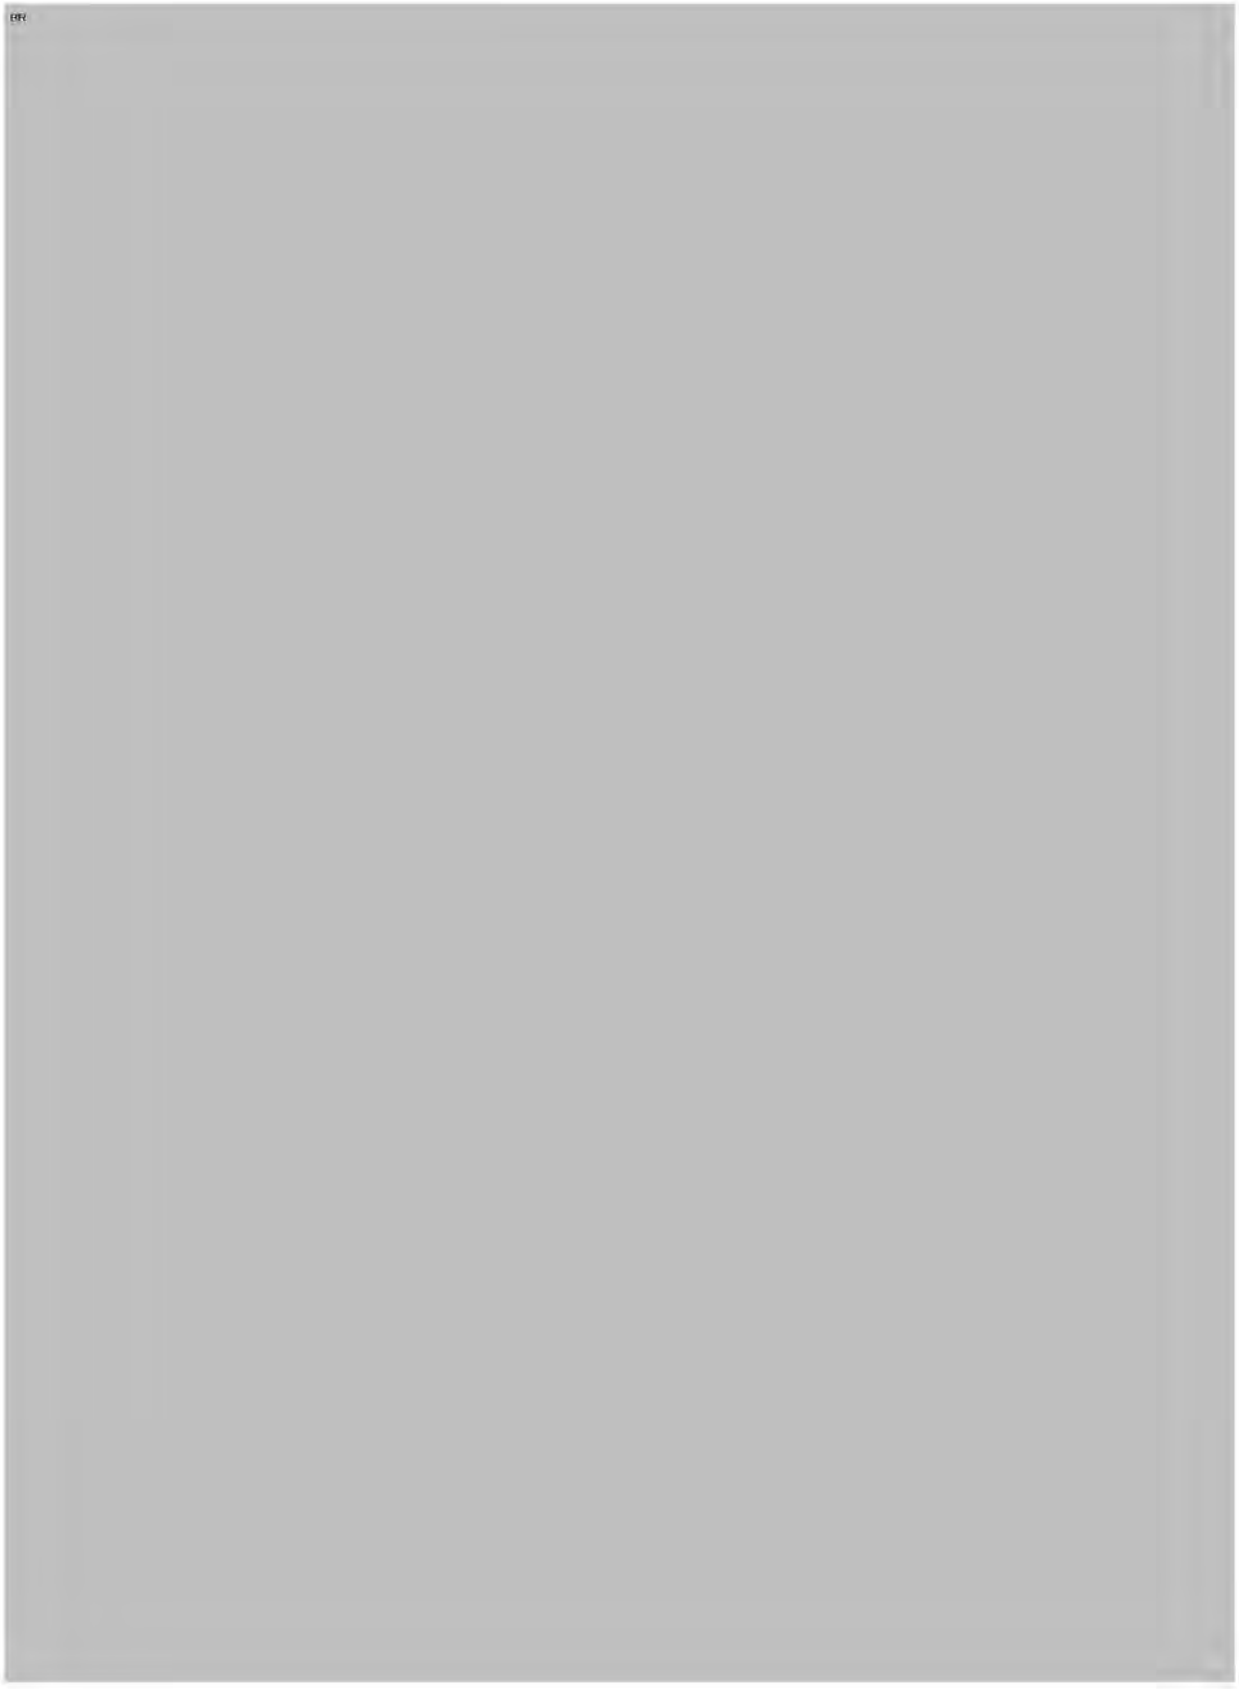

## 3.4 Inpassing Vlietzone

### 3.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Molenvlietpark: Plaatsen brug I t/m III, afronden vlonderpad. Uitvoeren resterende plantwerkzaamheden. | De bruggen I t/m III en het vlonderpad zijn geplaatst. Een groot deel van de plantwerkzaamheden is afgerond. Diverse wandelpaden in het Molenvlietpark zijn geasfalteerd. De herinrichting van het perceel naast landgoed Zeerust is gestart. |
| Parkeerterrein Drievliet: Aansluiten persleidingen riolering op riolering Laan van 's Gravenmade en inrichten inrit Drievliet,. | De werkzaamheden ter plaatse van het parkeerterrein Drievliet zijn grotendeels afgerond. CRB dient nog wel een groot deel van de hekwerken rondom het parkeerterrein te plaatsen. |
| Grondwal golfterrein: Uitvoeren resterende grond- en plantwerkzaamheden. | De grond- en plantwerkzaamheden op de grondwal langs het golfterrein zijn afgerond. Er dienen nog wel grond- en plantwerkzaamheden ter plaatse van de boorterp te worden uitgevoerd. |
| [redacted] | |

### 3.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Molenvlietpark West: de werkweg door het gebied zal worden weggegraven, de oeverbescherming en de beplanting van de eilanden worden aangebracht en het trekpontje en de natuurlijke speelaanleiding worden geplaatst. Tevens zal de deklaag van schelpenasfalt op de wandelpaden worden aangebracht. Naar verwachting wordt dit deel van het Molenvlietpark in mei opengesteld. |
| Molenvlietpark Noord: CRB gaat verder met het inrichten van het perceel naast landgoed Zeerust en de aanleg van het deel van het fietspad tussen het dienstgebouw en de Westvlietweg. Opgemerkt wordt dat voor het kunnen maken van de aansluiting van dit fietspad op de Westvlietweg de goedkeuring van het VOV op het ontwerp nog een vereiste is. CRB gaat verder met de inrichting van de boorterp en het terrein aan de voorzijde van het dienstgebouw. Tevens zullen de hekwerken langs de golfbaan worden geplaatst. |

Docnr26

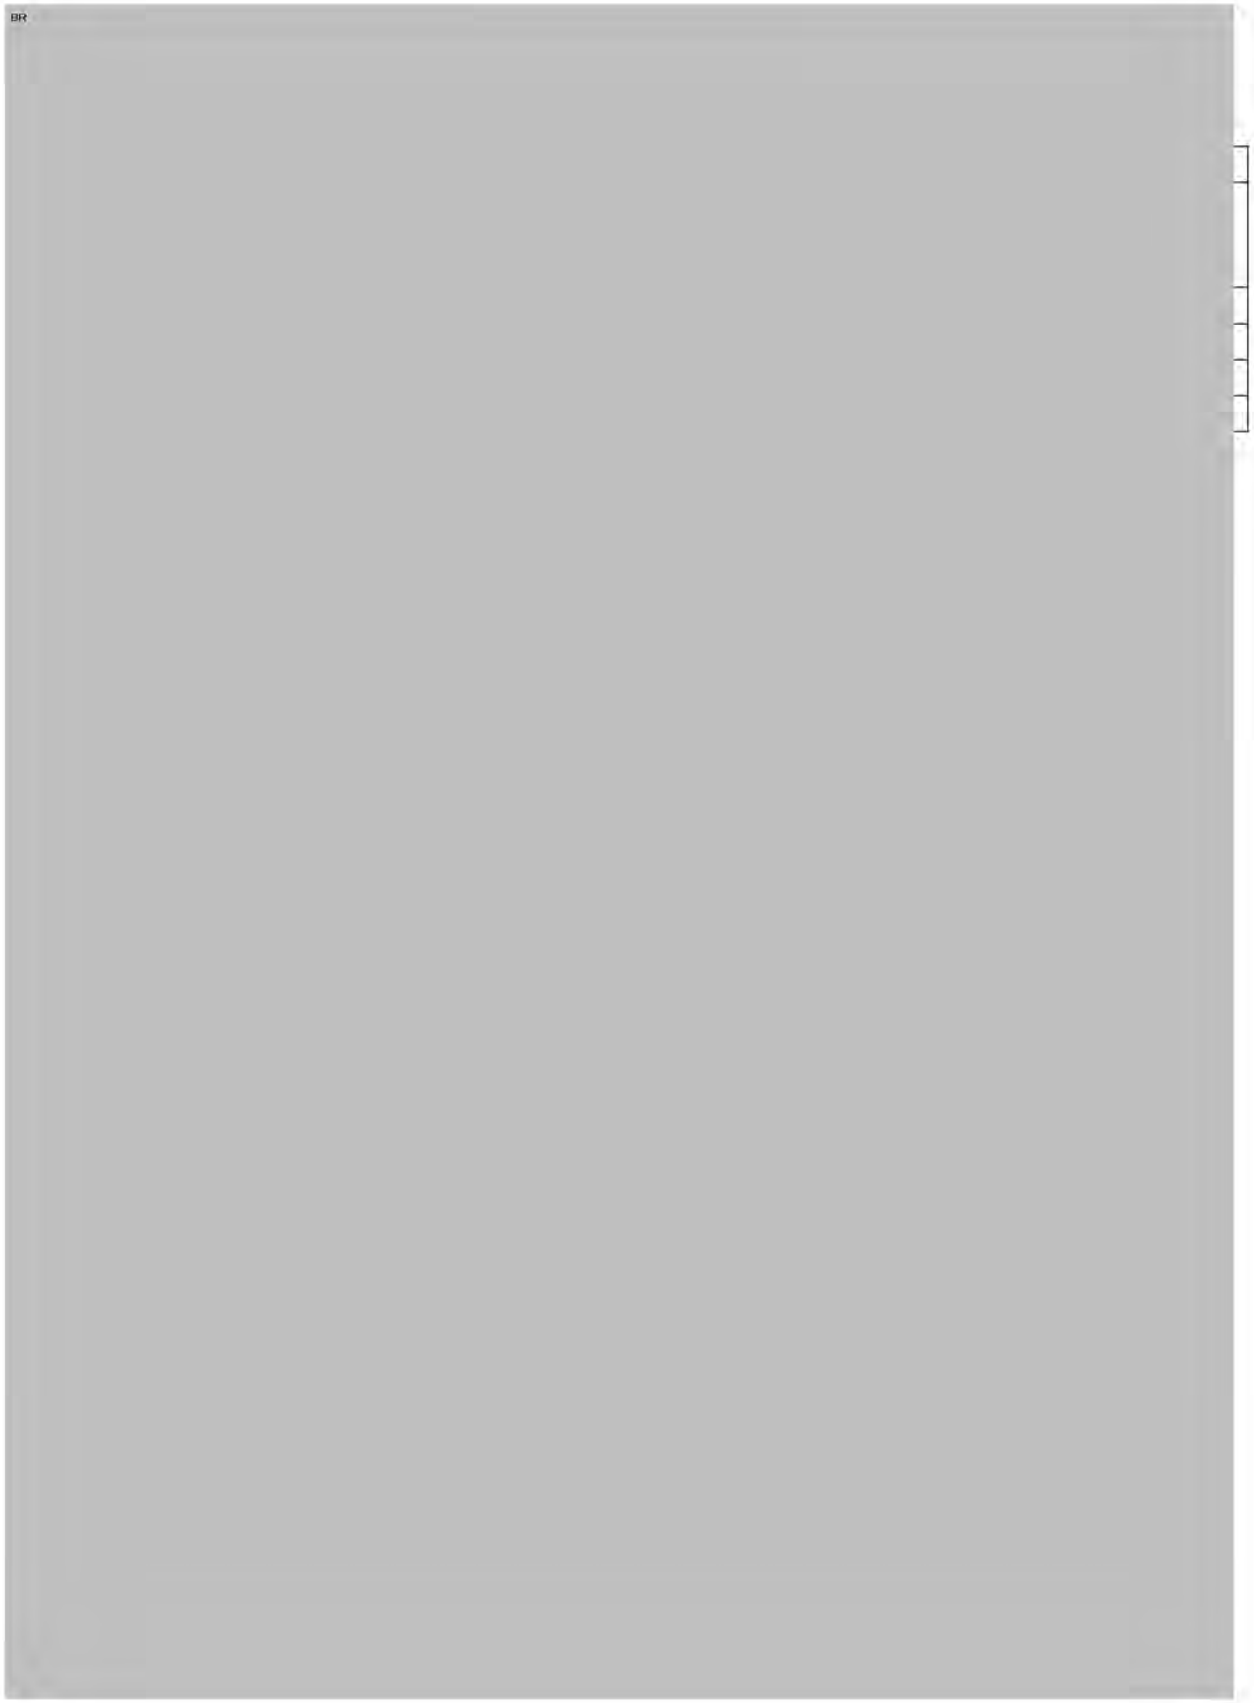

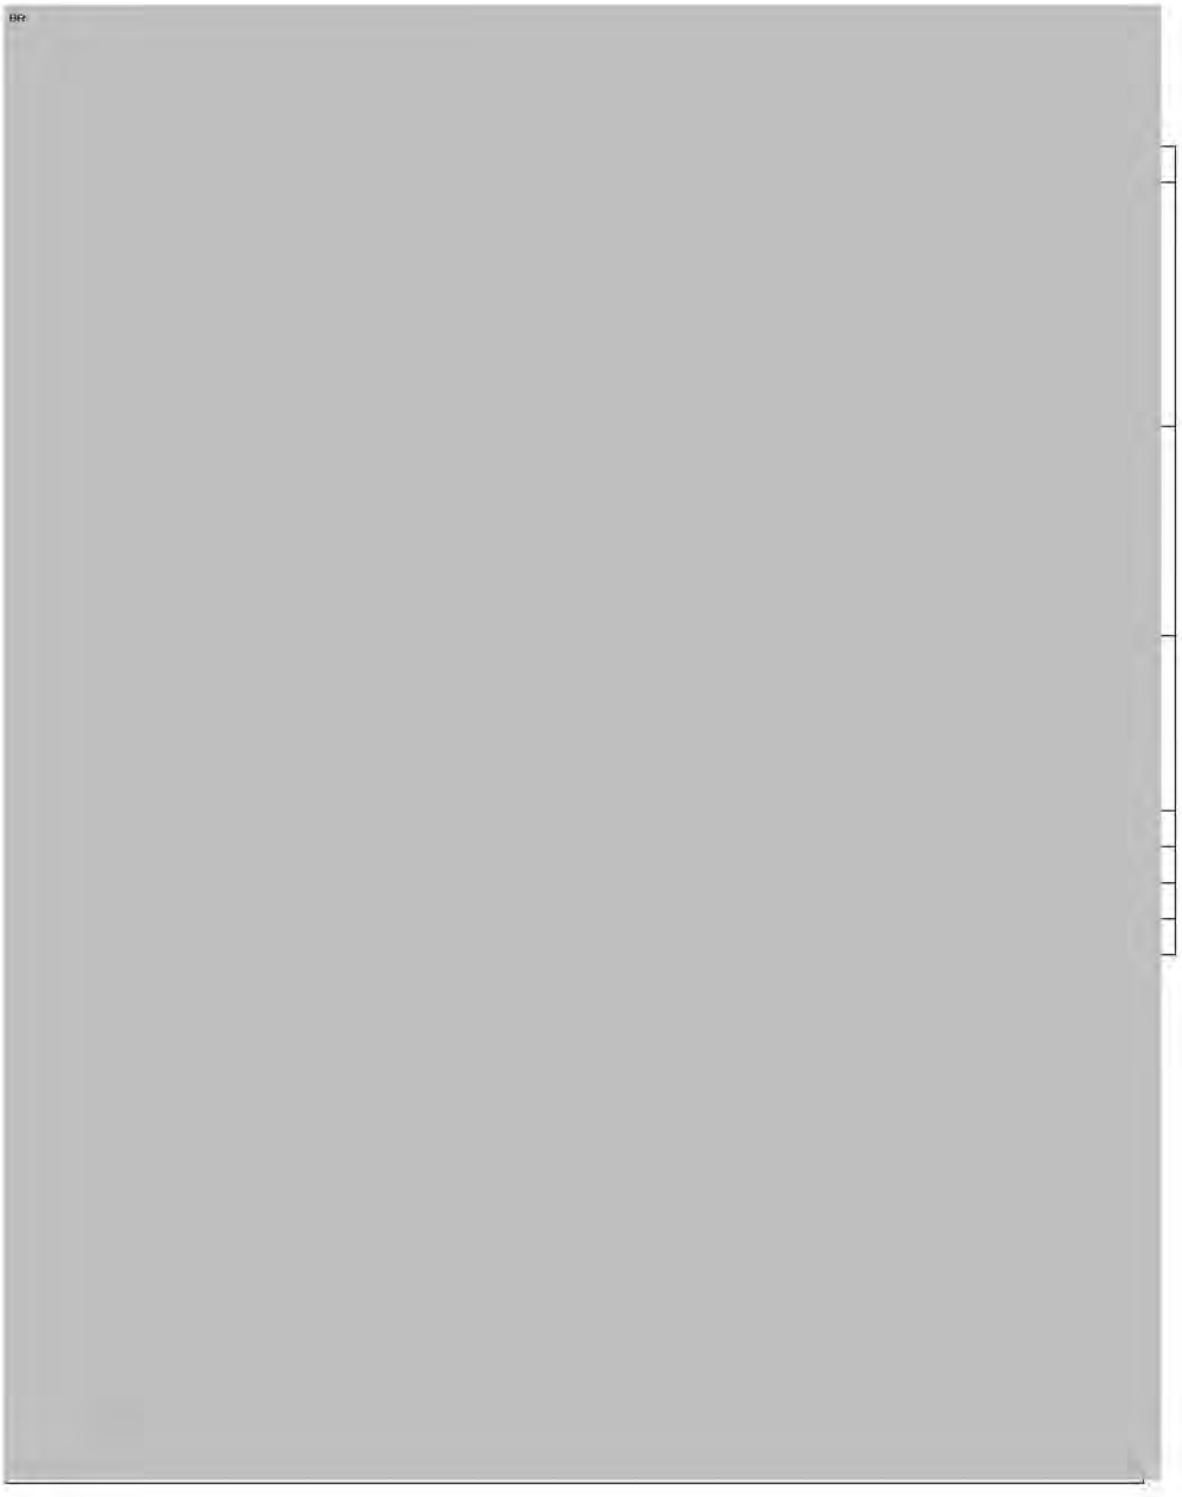
BR2

Docnr26

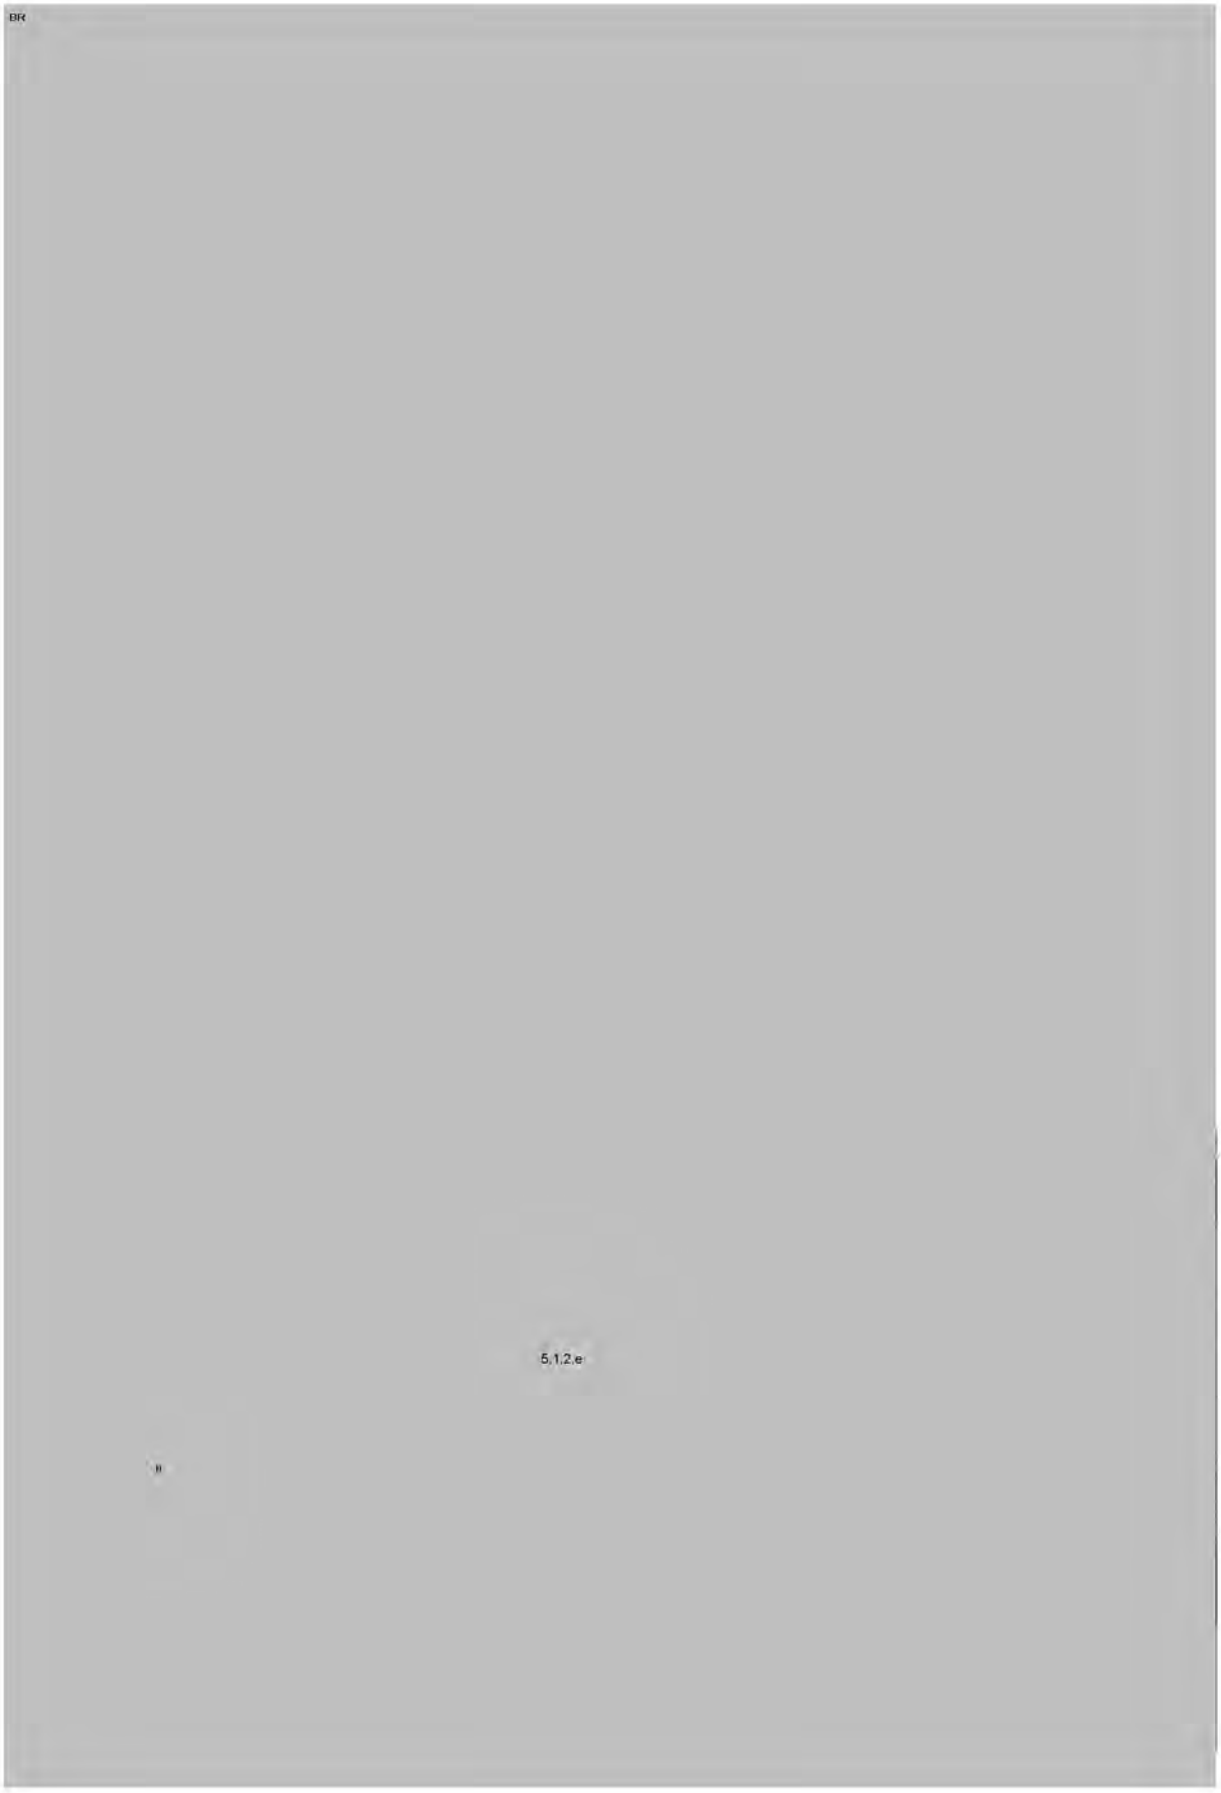
BR
5.1.2.e

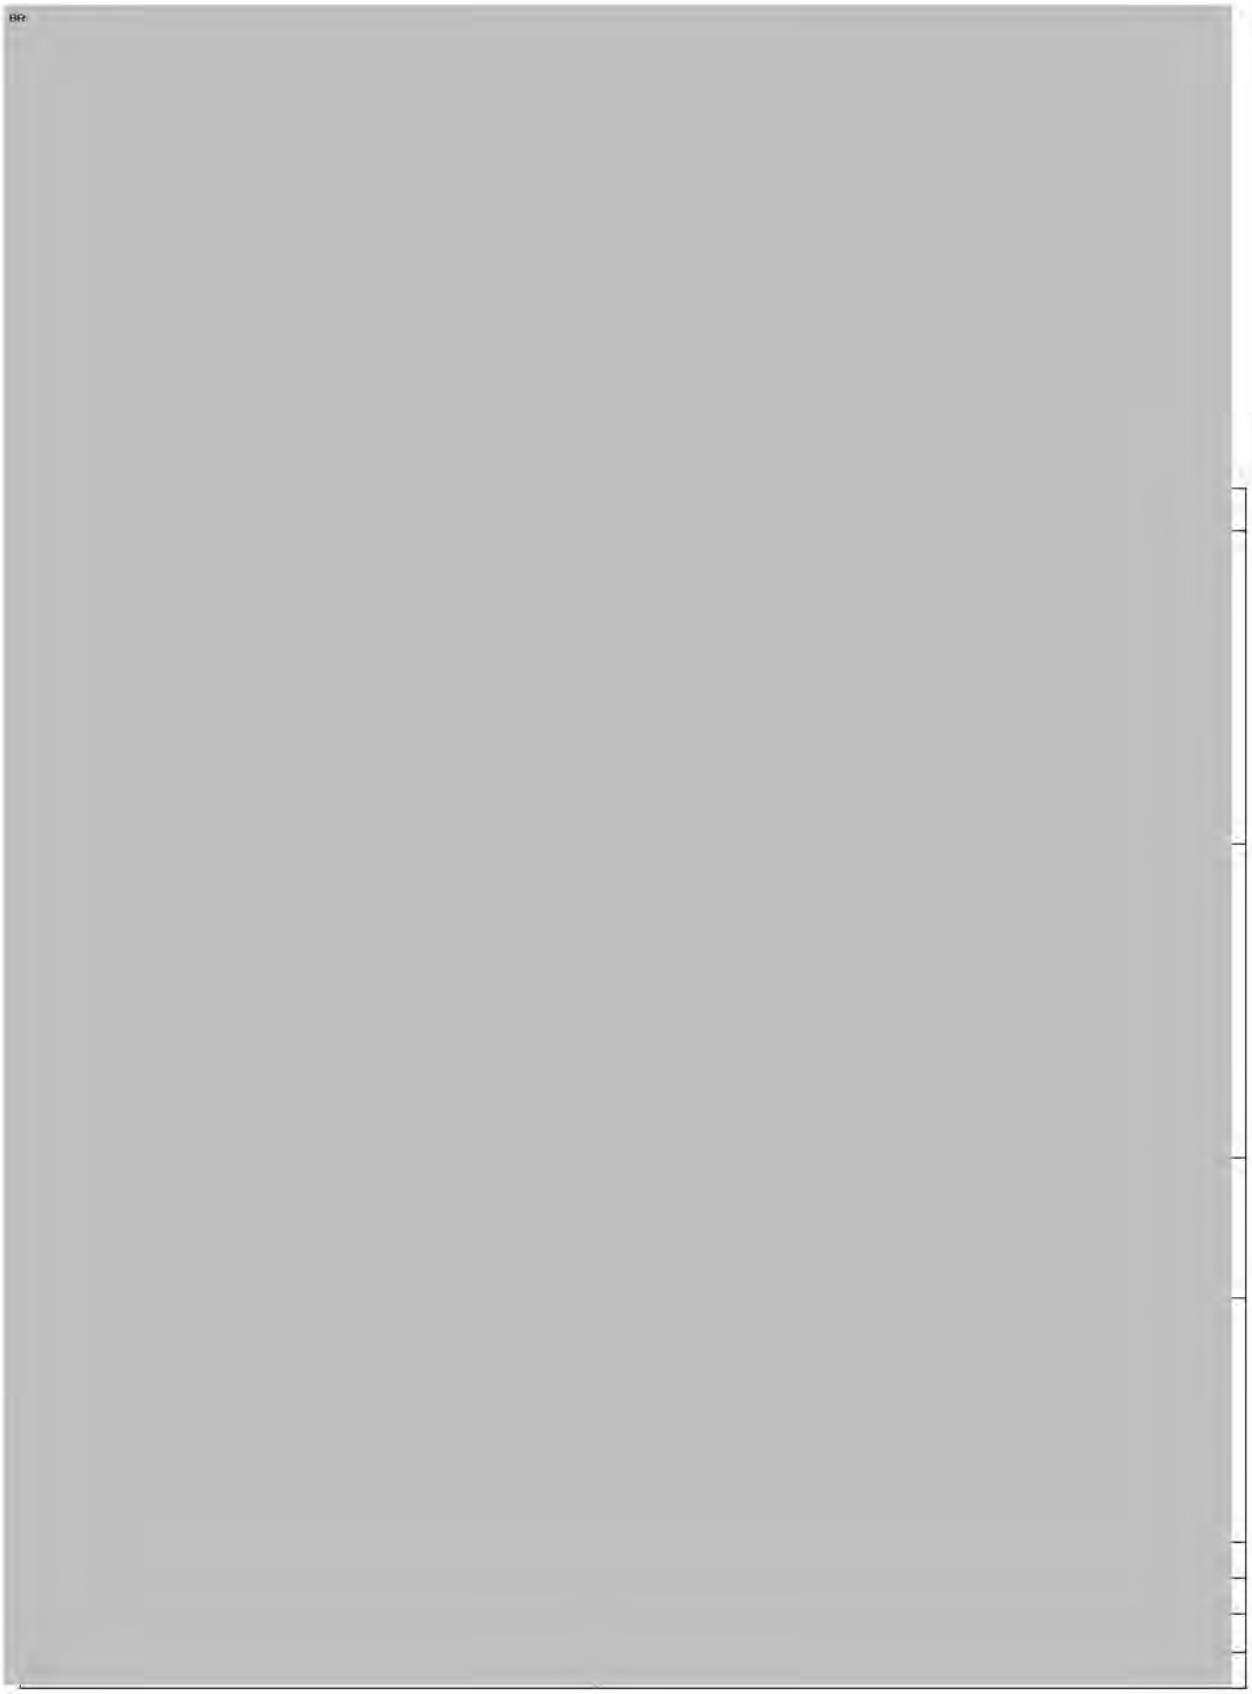

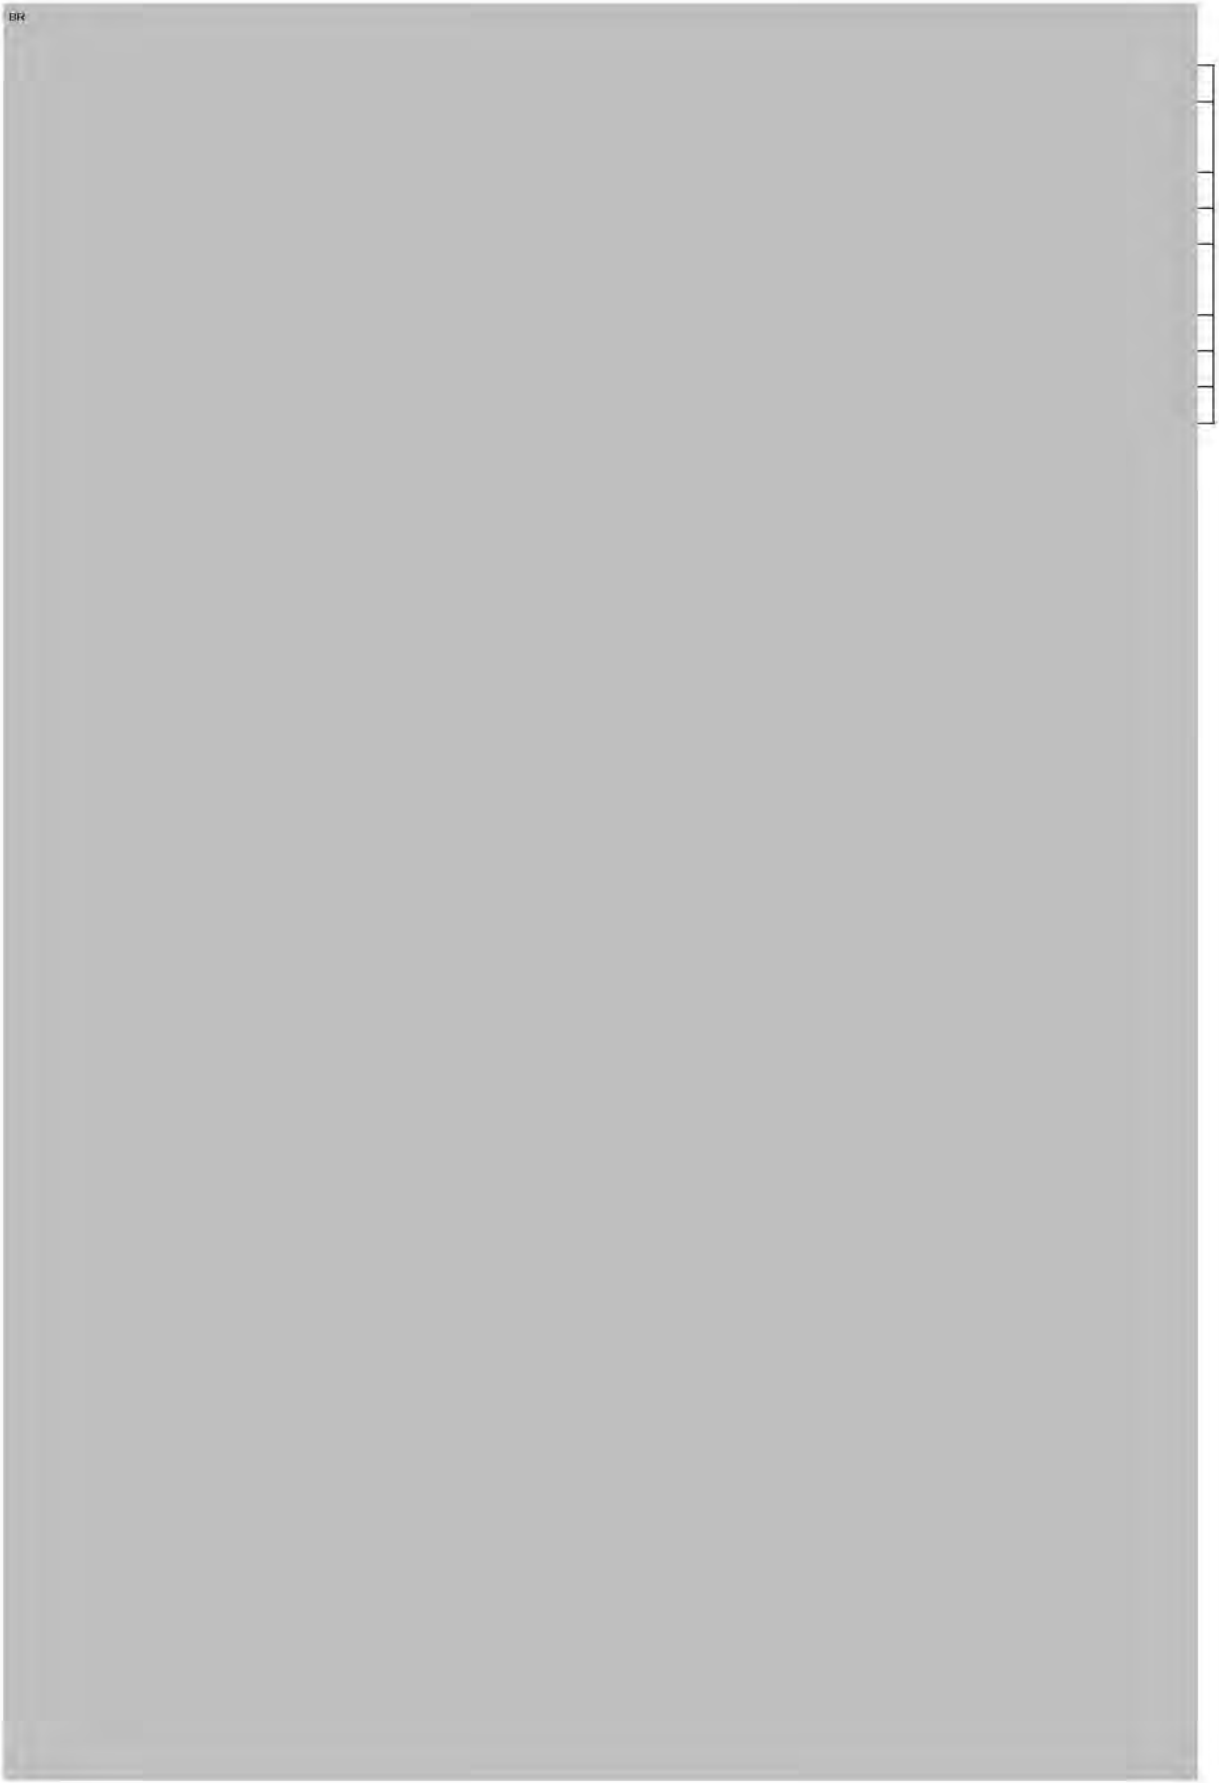

BR

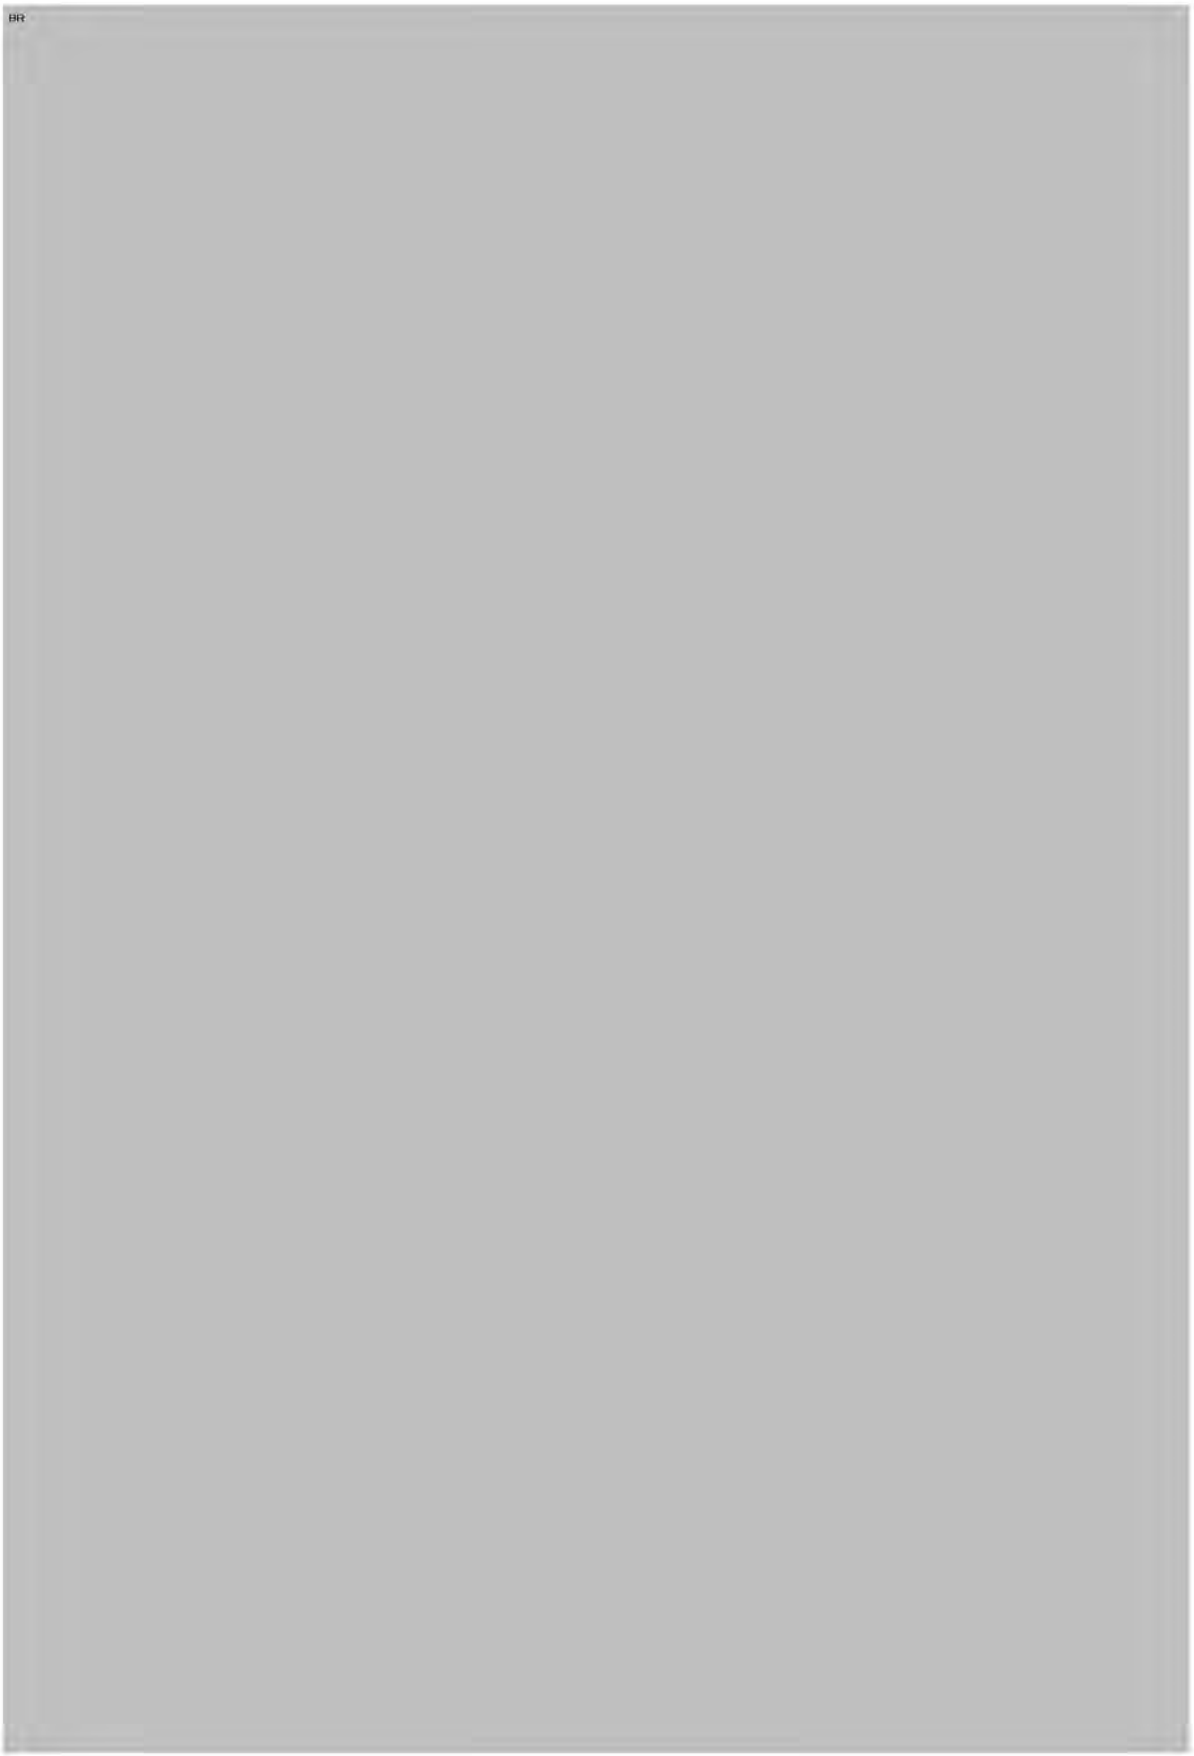
BR

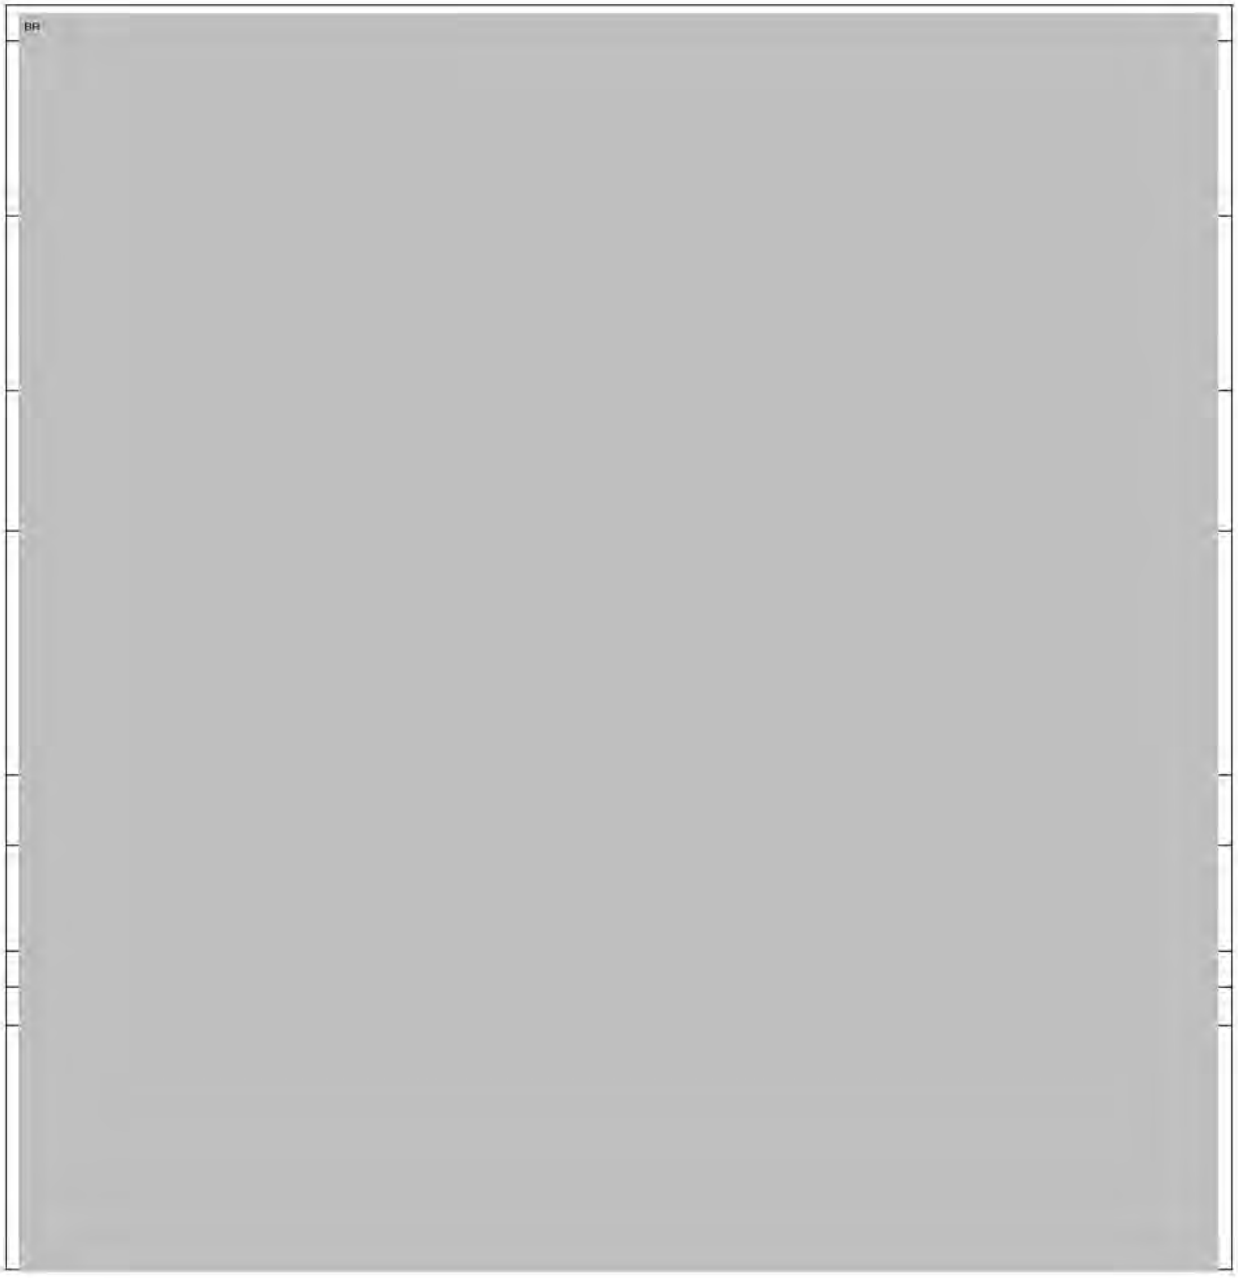
BR

BR

## 3.11 Uitvoeringskwaliteit

### 3.11.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Elke maand worden er tenminste 2 audits uitgevoerd bij CRB. | In het 1e kwartaal 2020 zijn er in totaal 2 audits uitgevoerd bij CRB of leveranciers / onderaannemers van CRB. De audits die uitgevoerd zijn:<br>1. Productaudit kunstwerken Molenvlietpark;<br>BR<br>In totaal zijn er tijdens deze audits 3 afwijkingen vastgesteld, is er 1 bevinding / verbeterpunt voorgesteld en zijn 3 aanbevelingen gedaan. |

BR

## 3.12 Contractmanagement

### 3.12.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| De contractwijziging met betrekking tot het realiseren van het Molenvlietpark tussen landgoed Zeerust en de golfbaan wordt overeengekomen. | De contractwijziging m.b.t. de landschappelijke inrichting van het Molenvlietpark tussen landgoed Zeerust en de golfbaan is overeengekomen. Deze zal echter nog aangepast worden vanwege de tegenvallende bodemkwaliteit, wat leidt tot een alternatief beplantingsplan (zonder eetbare gewassen) en aangepaste fasering. |
| BR | |

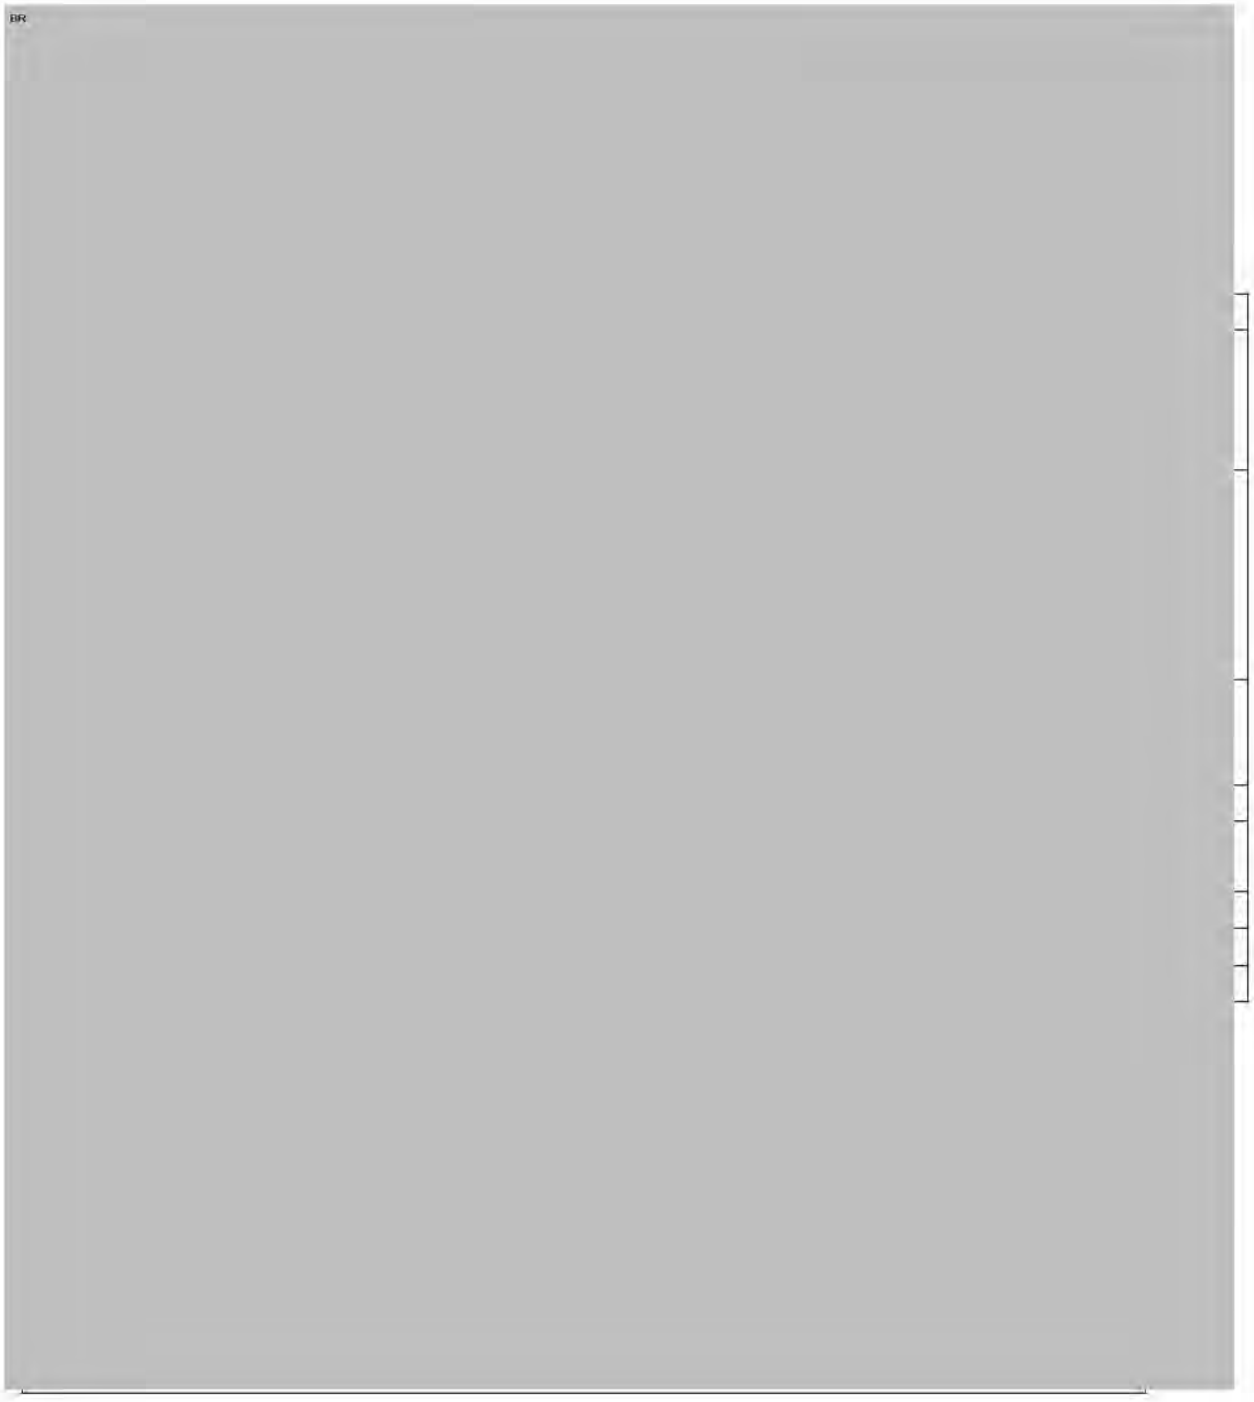

Docnr26



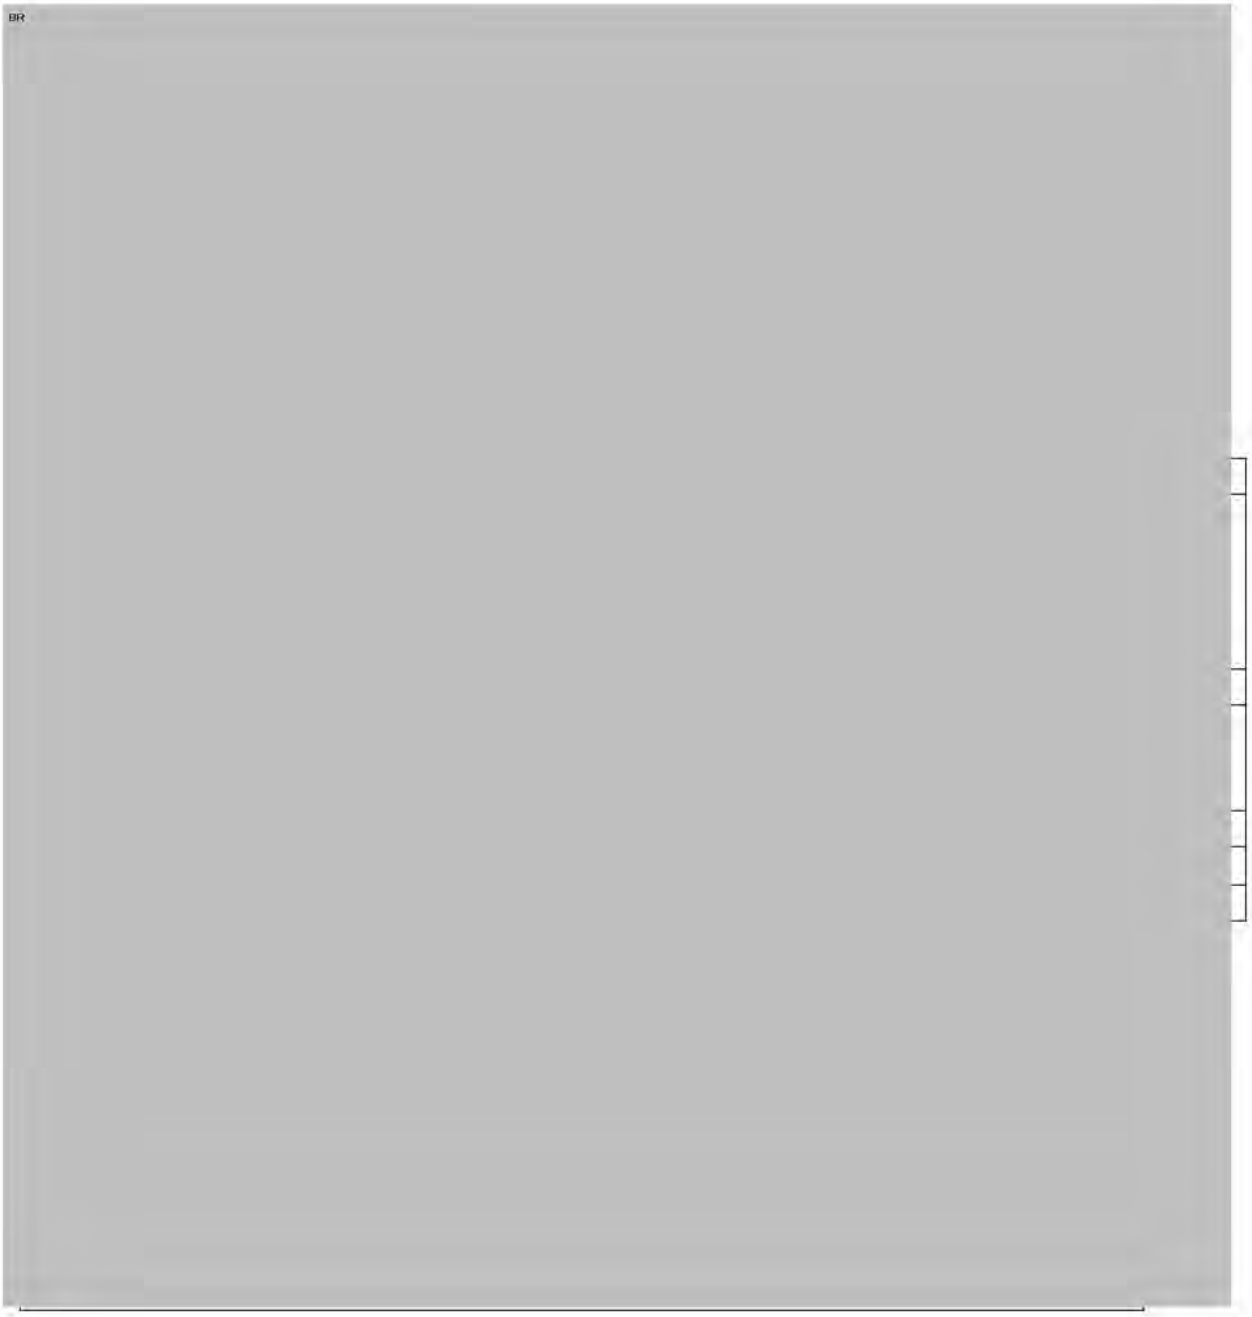

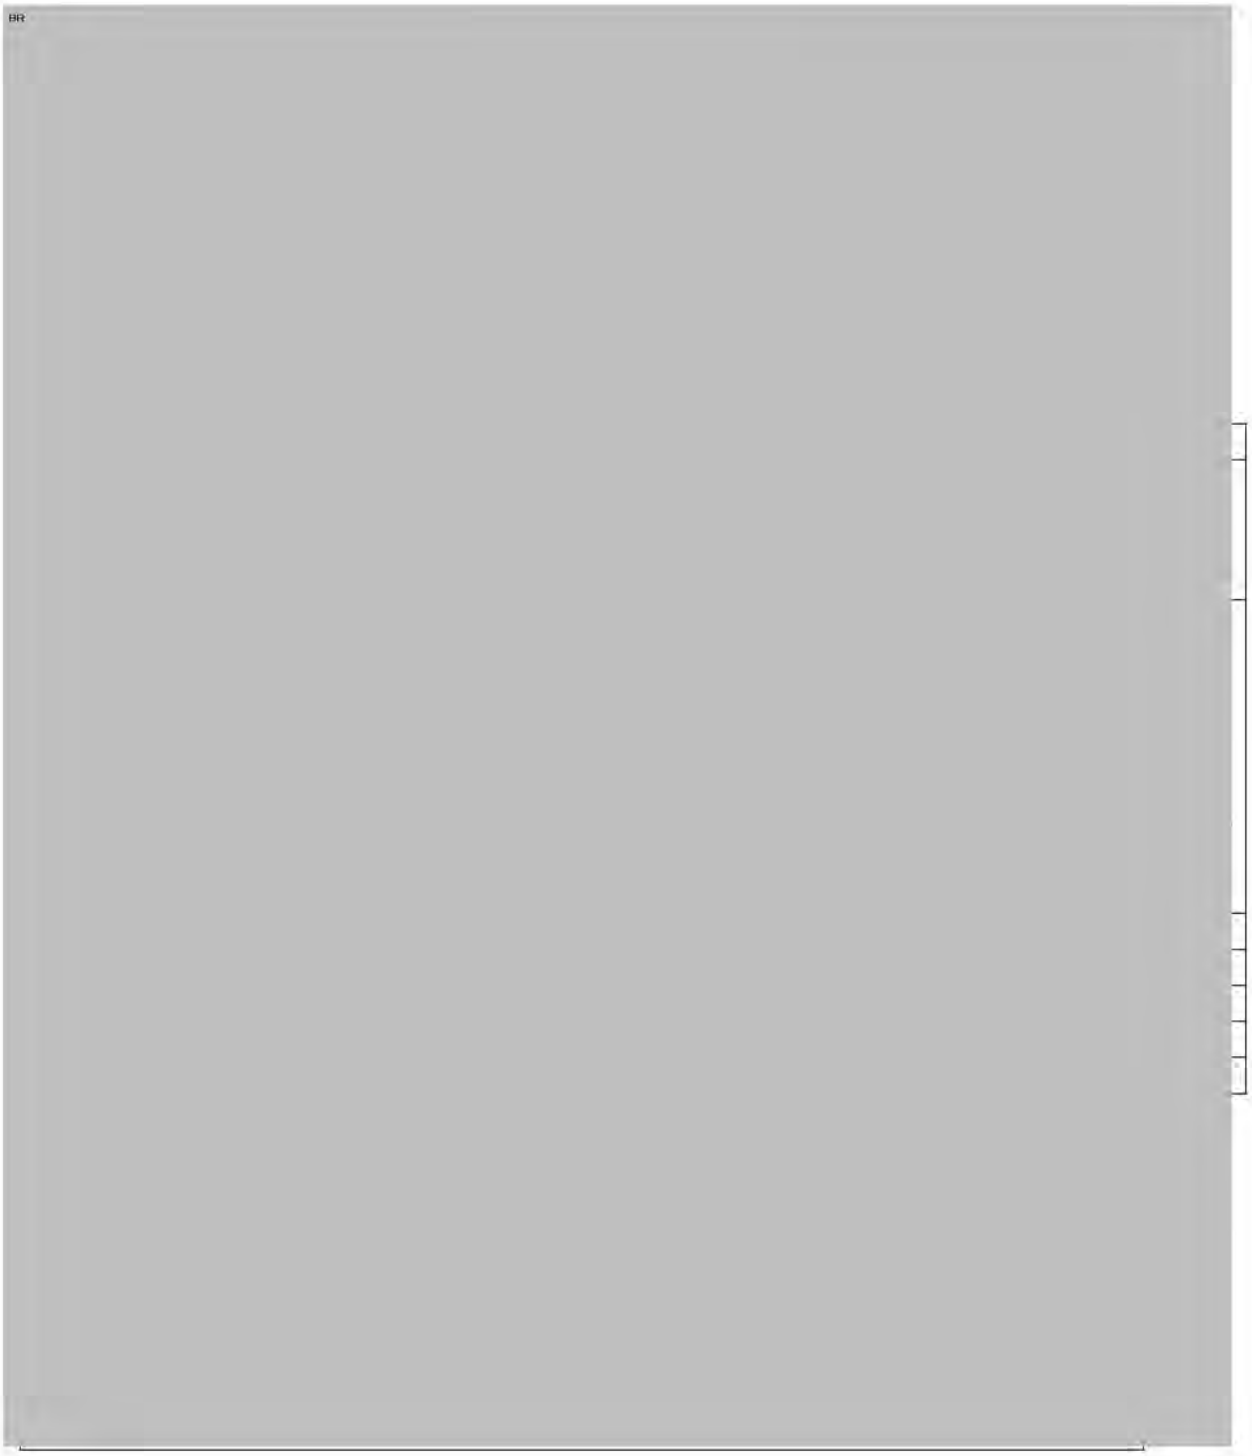

Docnr26

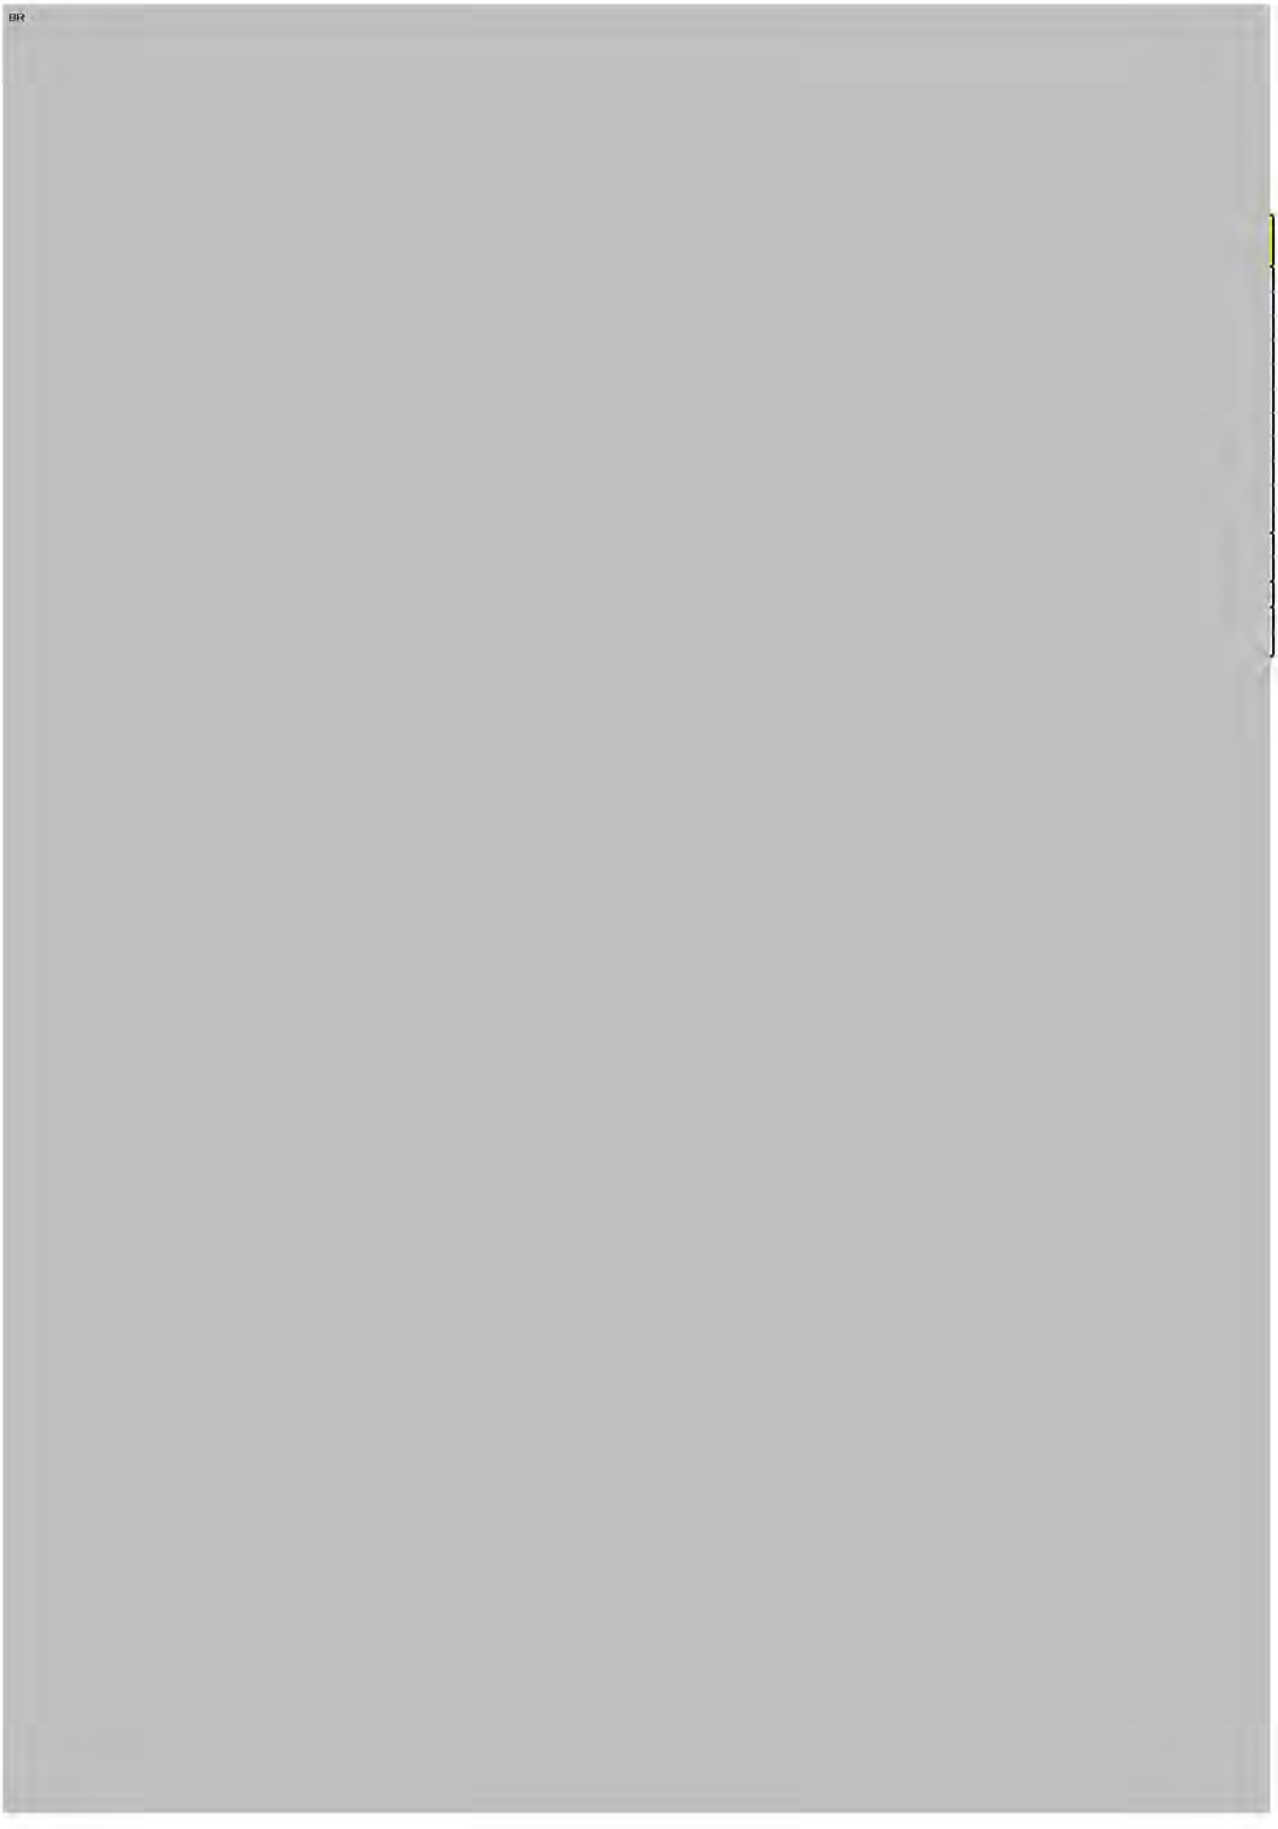

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland

Er zijn in het eerste kwartaal 2020 geen mutaties geweest.

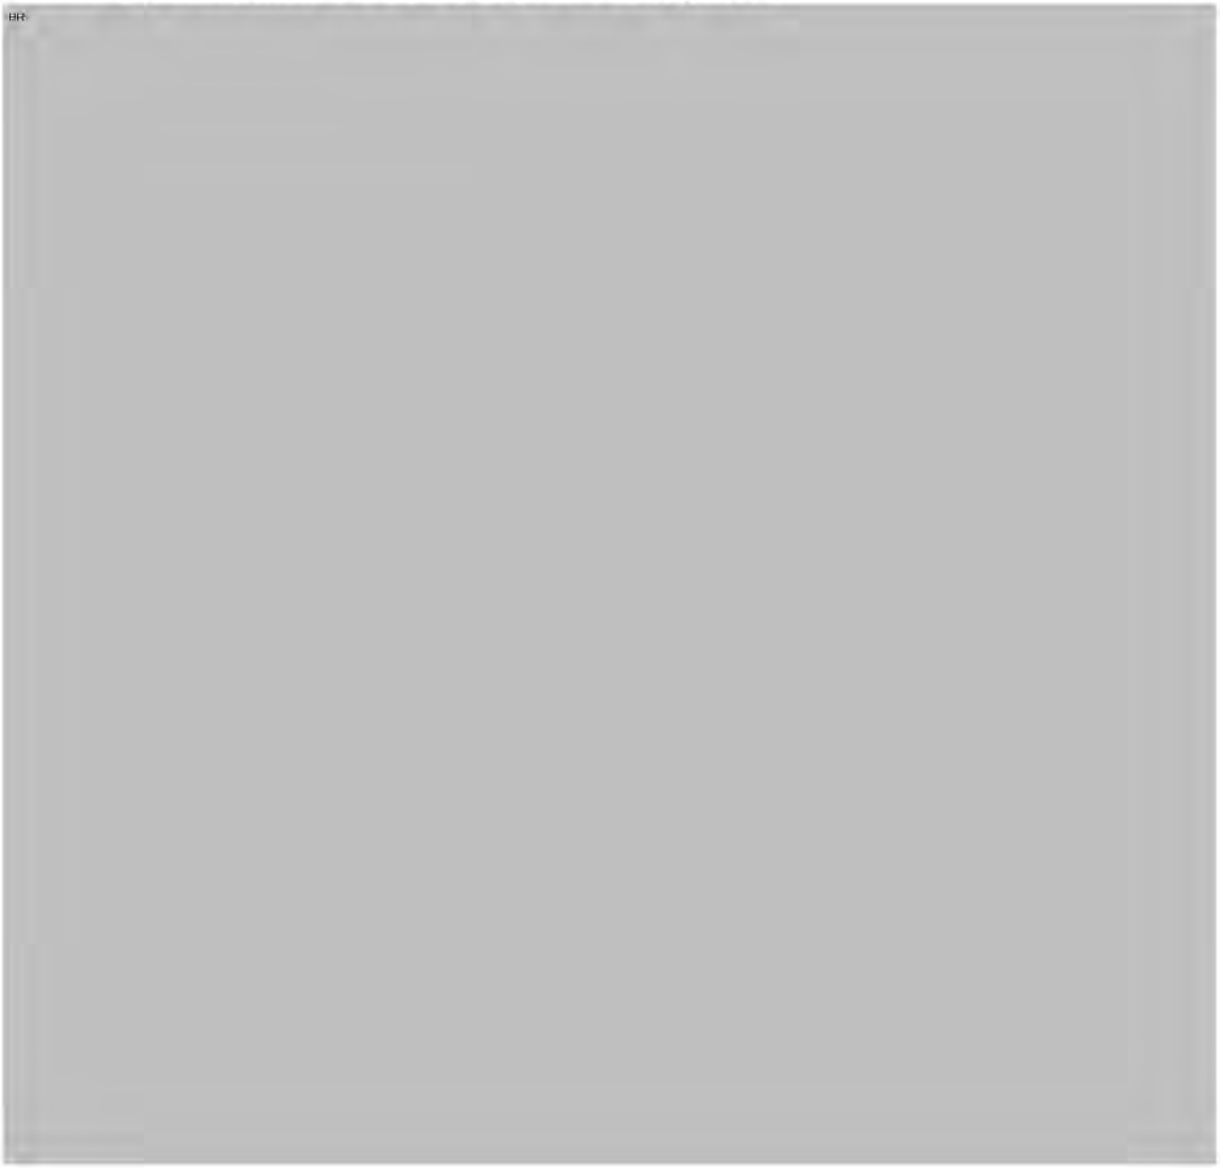

## 5.3 Planning

Zie tevens de bijlage 'Planningsmijlpalen'.

### 5.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Voortzetten regulier planningsproces Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e toevoer (o.a. mijlpalenmatrices, mijlpaal trendanalyses, voortgangsplanningen, 6-wekenplanningen, prestatieverklaring, voortgangsrapportages). | Het reguliere planningsproces is voortgezet. |
| Uitvoeren van een onzekerheidsanalyse op tijd en financiën Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e toevoer. | De onzekerheidsanalyses op de bedien-centrale en de 2e toevoer hebben plaatsgevonden. De onzekerheidsanalyse op de planning van de Rotterdamsebaan is tot nader order uitgesteld in verband met het niet kunnen accepteren van de overallplanning revisie K. |
| BR | |

### 5.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Voortzetten regulier planningsproces Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e toevoer. |
| Uitvoeren van onzekerheidsanalyses Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e toevoer. |
| |
| BR |
| |

## 5.4 Risico's

### 5.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Opstellen planningsrisicoprofiel. | Voor 2e toevoer en Bediencentrale zijn planningsprofielen opgesteld. Een analyse op de ingebruikname datum van de Rotterdamsebaan is niet uitgevoerd, vanwege het ontbreken van een geaccepteerde planning. |
| [redacted] | |

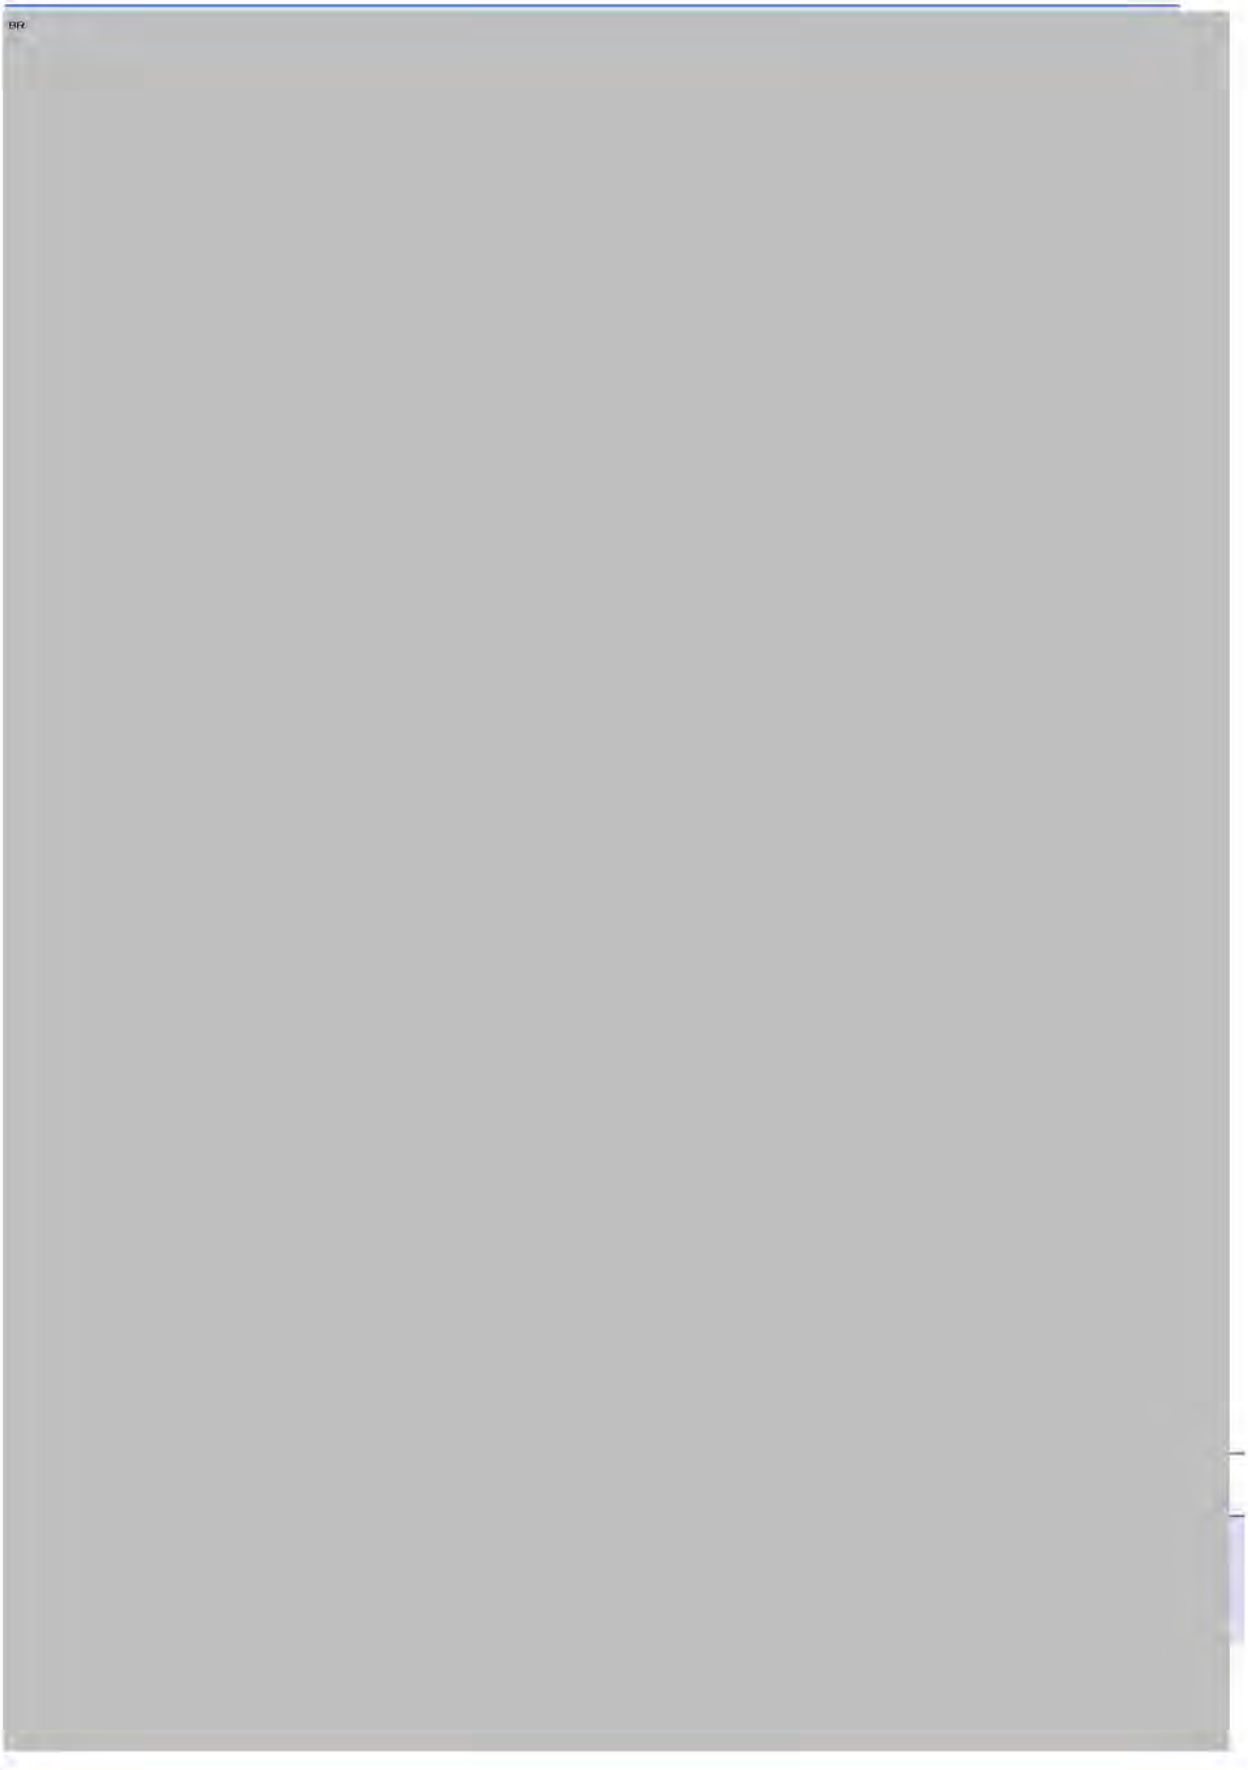
BR

Docnr26



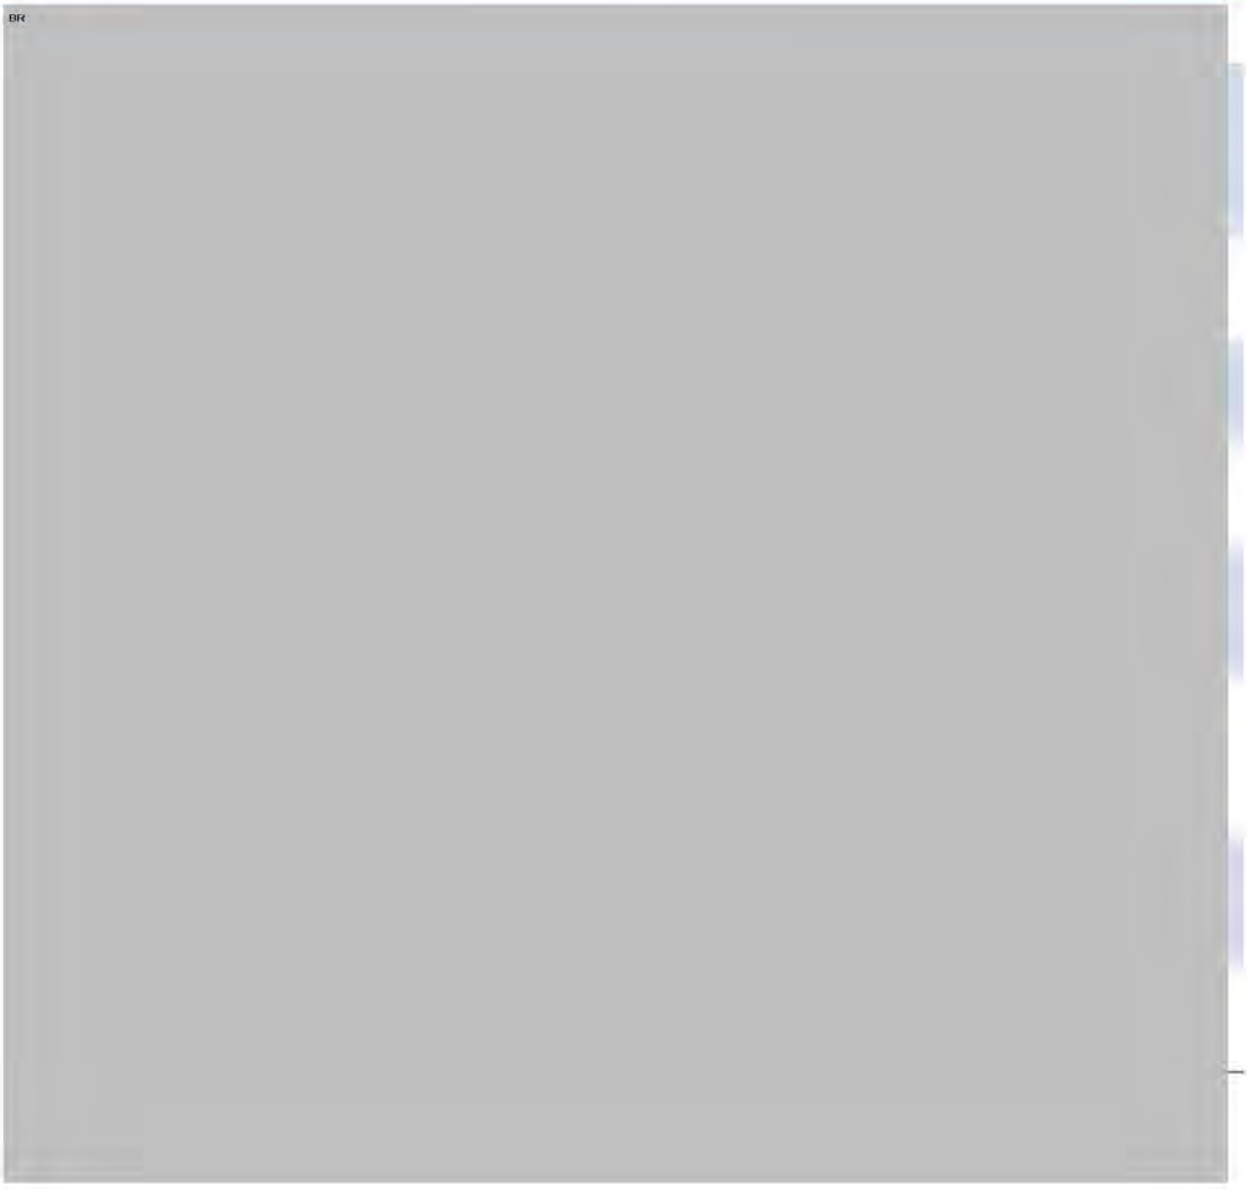

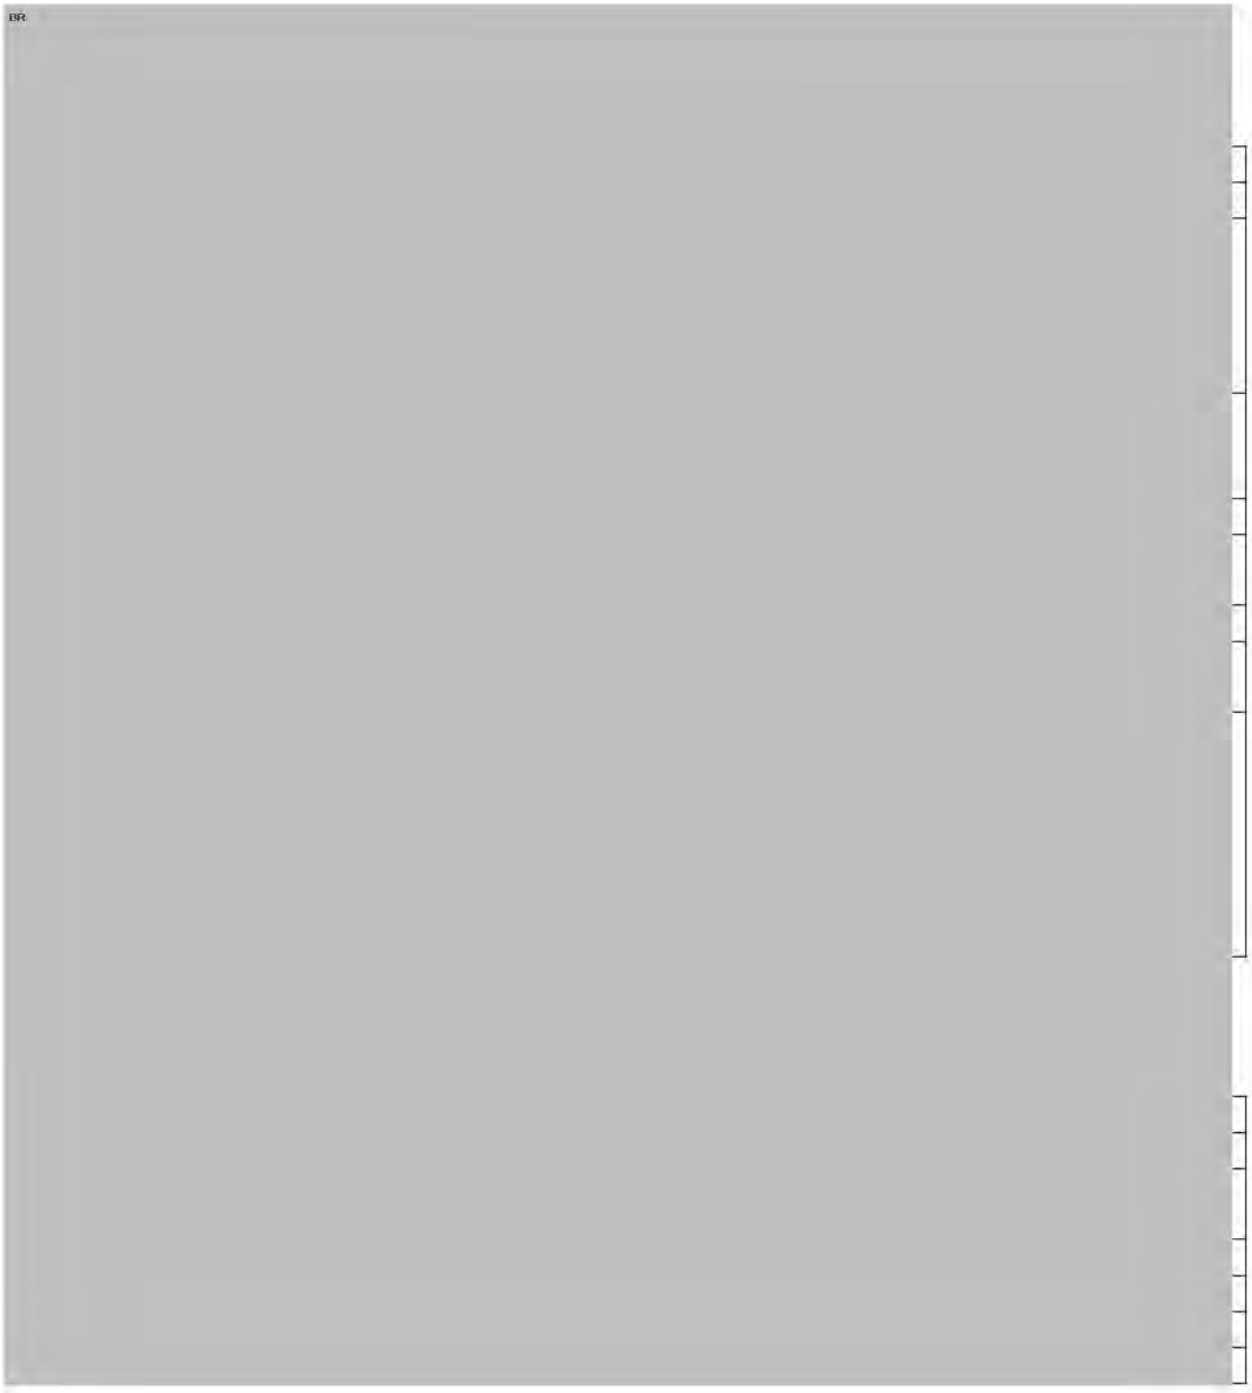
BR

Docnr26

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 31 mrt 2020 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 30-apr-20 | 24 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie (incl. consolidatieperiode) vertraagd. |
| BR | | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

Docnr26

Docnr26

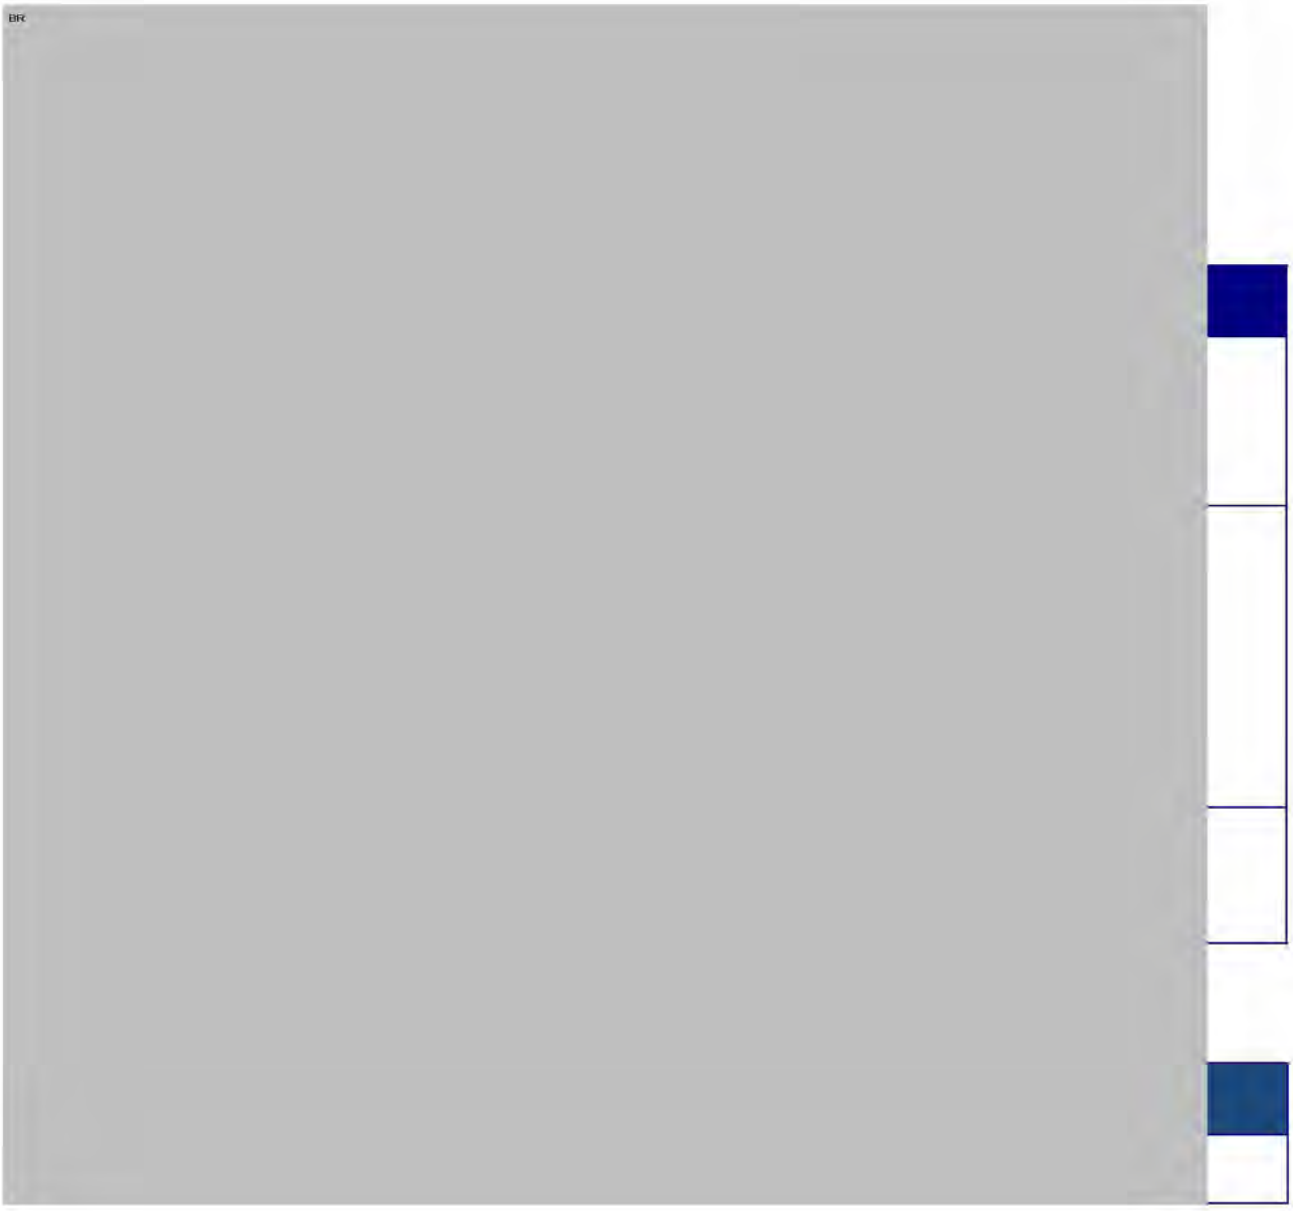
BR

Docnr26

Docnr26



Docnr27

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 2e kwartaal 2020

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 1 september 2020**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

Docnr27

Docnr27



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 2e kwartaal 2020
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-004569

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>23 juli 2020 | Versie 0.1<br>10 augustus 2020 | Versie 1.0<br>11 augustus 2020 | Versie 2.0<br>27 augustus 2020 | Versie 2.0<br>1 september 2020 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. B. Revis, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr27



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 9

*2.1 Omgevingsmanagement* *9*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 9
2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie en Vergunningen* *10*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2.2 Komende kwartaal 10

*2.3 Verwervingen* *11*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 11
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Overeenkomsten* *12*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 12
2.4.2 Komende kwartaal 12

*2.5 Communicatie* *13*
2.5.1 Afgelopen kwartaal 13
2.5.2 Komende kwartaal 14
2.5.3 Diversen 14

3 Projectvoortgang 15

*3.1 Aanbesteden en contracteren* *15*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 15
3.1.2 Komende kwartaal 15

*3.2 Vormgeving* *16*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 16
3.2.2 Komende kwartaal 17

*3.3 Inpassing Binckhorst* *18*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 18
3.3.2 Komende kwartaal 18

*3.4 Inpassing Vlietzone* *19*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 19
3.4.2 Komende kwartaal 19

*3.5 Inpassing Laan van Hoornwijck* *21*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 21
3.5.2 Komende kwartaal 21

*3.6 Boortunnel en toeritten* *22*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 22
3.6.2 Komende kwartaal 22

*3.7 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *24*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 24
3.7.2 Komende kwartaal 24

*3.8 Installaties* *25*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 25

Docnr27



3.8.2 Komende kwartaal 26
*3.9 Veiligheid en gezondheid* *27*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 27
3.9.2 Komende kwartaal 27
*3.10 Bediencentrale* *28*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 28
3.10.2 Komende kwartaal 29
*3.11 Uitvoeringskwaliteit* *30*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 30
3.11.2 Komende kwartaal 30
*3.12 Contractmanagement* *31*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 31
3.12.2 Komende kwartaal 31
4 Overdracht en openstelling 32
*4.1 Tunnelveiligheid* *32*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 32
4.1.2 Komende kwartaal 32
*4.2 Overdracht aan beheerders* *33*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 33
4.2.2 Komende kwartaal 33
*4.3 Beheer en onderhoud* *34*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 34
4.3.2 Komende kwartaal 34
5 Projectbeheersing 35
*5.1 Scope* *35*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 35
5.1.2 Komende kwartaal 35
*5.2 Financiën* *36*
5.2.1 Kostenstructuur 36
5.2.2 Budget 37
*5.3 Planning* *39*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 39
5.3.2 Komende kwartaal 39
*5.4 Risico's* *40*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 40
5.4.2 Komende kwartaal 40
5.4.3 Financiële toprisico's 40
5.4.4 Toprisico's planning 41
*5.5 Interne kwaliteit* *42*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 42
5.5.2 Komende kwartaal 42
*5.6 Informatiebeheer* *43*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 43
5.6.2 Komende kwartaal 43

Docnr27



5.6.3 Kennisdeling 43

*5.7 Organisatie* *44*

5.7.1 Afgelopen kwartaal 44

5.7.2 Komende kwartaal 44

6 Bijlage: Planningsmijlpalen 45

7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 46

8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 48

Docnr27



# 1 Managementsamenvatting

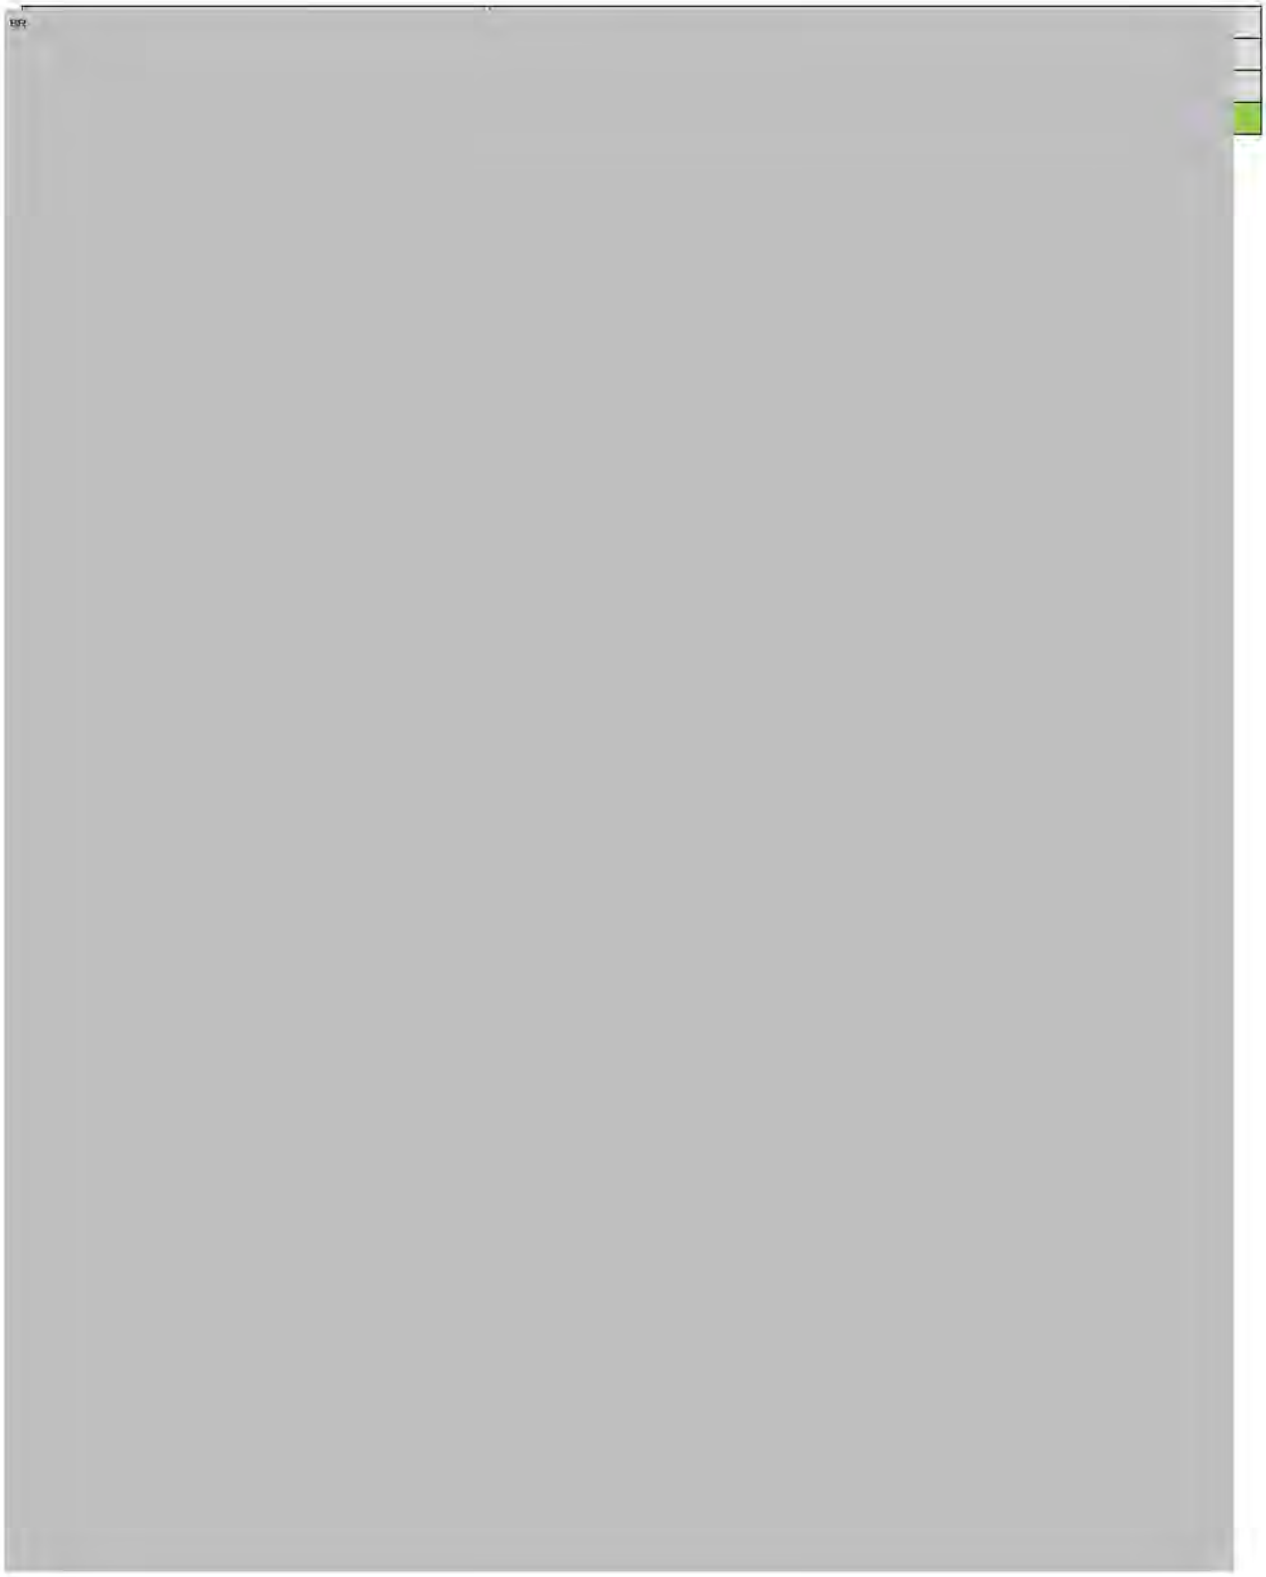

## 4. TERUGBLIK AFGELOPEN KWARTAAL

Afgelopen kwartaal is er onder andere gewerkt aan:

- 5 juni is het eerste deel van het Molenvlietpark, rondom de waterberging, opengesteld voor publiek. Nadien zijn diverse vragen van omwonenden beantwoord. De vragen hadden betrekking op onder andere loslopende honden, fietsers op voetpaden, verlichting en graffiti.

- Afgelopen kwartaal hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met particuliere grondeigenaar een adviseur over de gewenster realisatie van een 2e watertoevoer. Wederpartij heeft aanvullende / nieuwe eisen gesteld waardoor partijen nog niet tot overeenstemming zijn gekomen.

## 5. VERWACHTING KOMEND KWARTAAL

Komende kwartaal wordt er onder andere gewerkt aan:

- Per 1 juli zal CRB diverse projectonderdelen opleveren, waaronder de Laan van Delfvliet, Binckhorstlaan, Mercuriusweg, parkeerterrein Drievliet, loopburg Drievliet en het Molenvlietpark. Na oplevering zal CRB nog diverse restpunten oplossen.

- 9 juli wordt het tweede deel van het Molenvlietpark, fietspaden en Heemtuin, opengesteld voor publiek.

## 7. Planning

CRB heeft per 1 juli de werkzaamheden diverse deelgebieden afgerond en opgeleverd. Dat betreffen de maaiveldonderdelen rond de A4/A13, Molenvlietpark Noord en West, de voorzieningen van familiepark Drievliet en de maaiveldinrichting in de Binckhorst. Wel zijn er nog restpunten op te lossen door CRB.

BR

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorig kwartaal | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Beantwoorden diverse vragen van omwonenden. | Diverse vragen van omwonenden zijn beantwoord. De vragen kwamen voornamelijk binnen naar aanleiding van de openstelling van het Molenvlietpark en hadden betrekking op onder andere loslopende honden, fietsers op voetpaden, verlichting en graffiti. |
| In samenwerking met landschapsarchitect en Hoogheemraadschap en in afstemming met gemeente Rijswijk en een tweetal bewoners uit Park Hoornwijck onderzoeken naar mogelijkheden landschappelijke inpassing en aanpassing aflaat-constructie in Molenvlietpark. | De ideeën zijn besproken met de bewoners en het Hoogheemraadschap. Vervolgens is de landschapsarchitect verzocht een aangepast ontwerp te maken. Dat concept-ontwerp is ter toetsing aangeboden aan het Hoogheemraadschap (eigenaar aflaatconstructie) en de beheerder van Den Haag (eigenaar omliggend park). |
| BR | |

### 2.1.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| In samenwerking met landschapsarchitect en Hoogheemraadschap en in afstemming met gemeente Rijswijk en een tweetal bewoners uit Park Hoornwijck onderzoeken naar mogelijkheden landschappelijke inpassing en aanpassing aflaat-constructie in Molenvlietpark. |
| |
| **Besluiten** |
| Geen. |

Docnr27



## 2.2 Planologie en Vergunningen

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Ontwerp-besluit afwachten op kapaanvraag en aangevraagde ontheffing Wet natuurbescherming in verband met aanleg tweede watertoevoer. | ODH heeft vooruitlopend op haar besluit om wel / geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven een aantal vragen gesteld. De vragen zijn beantwoord. |
| [redacted] | |

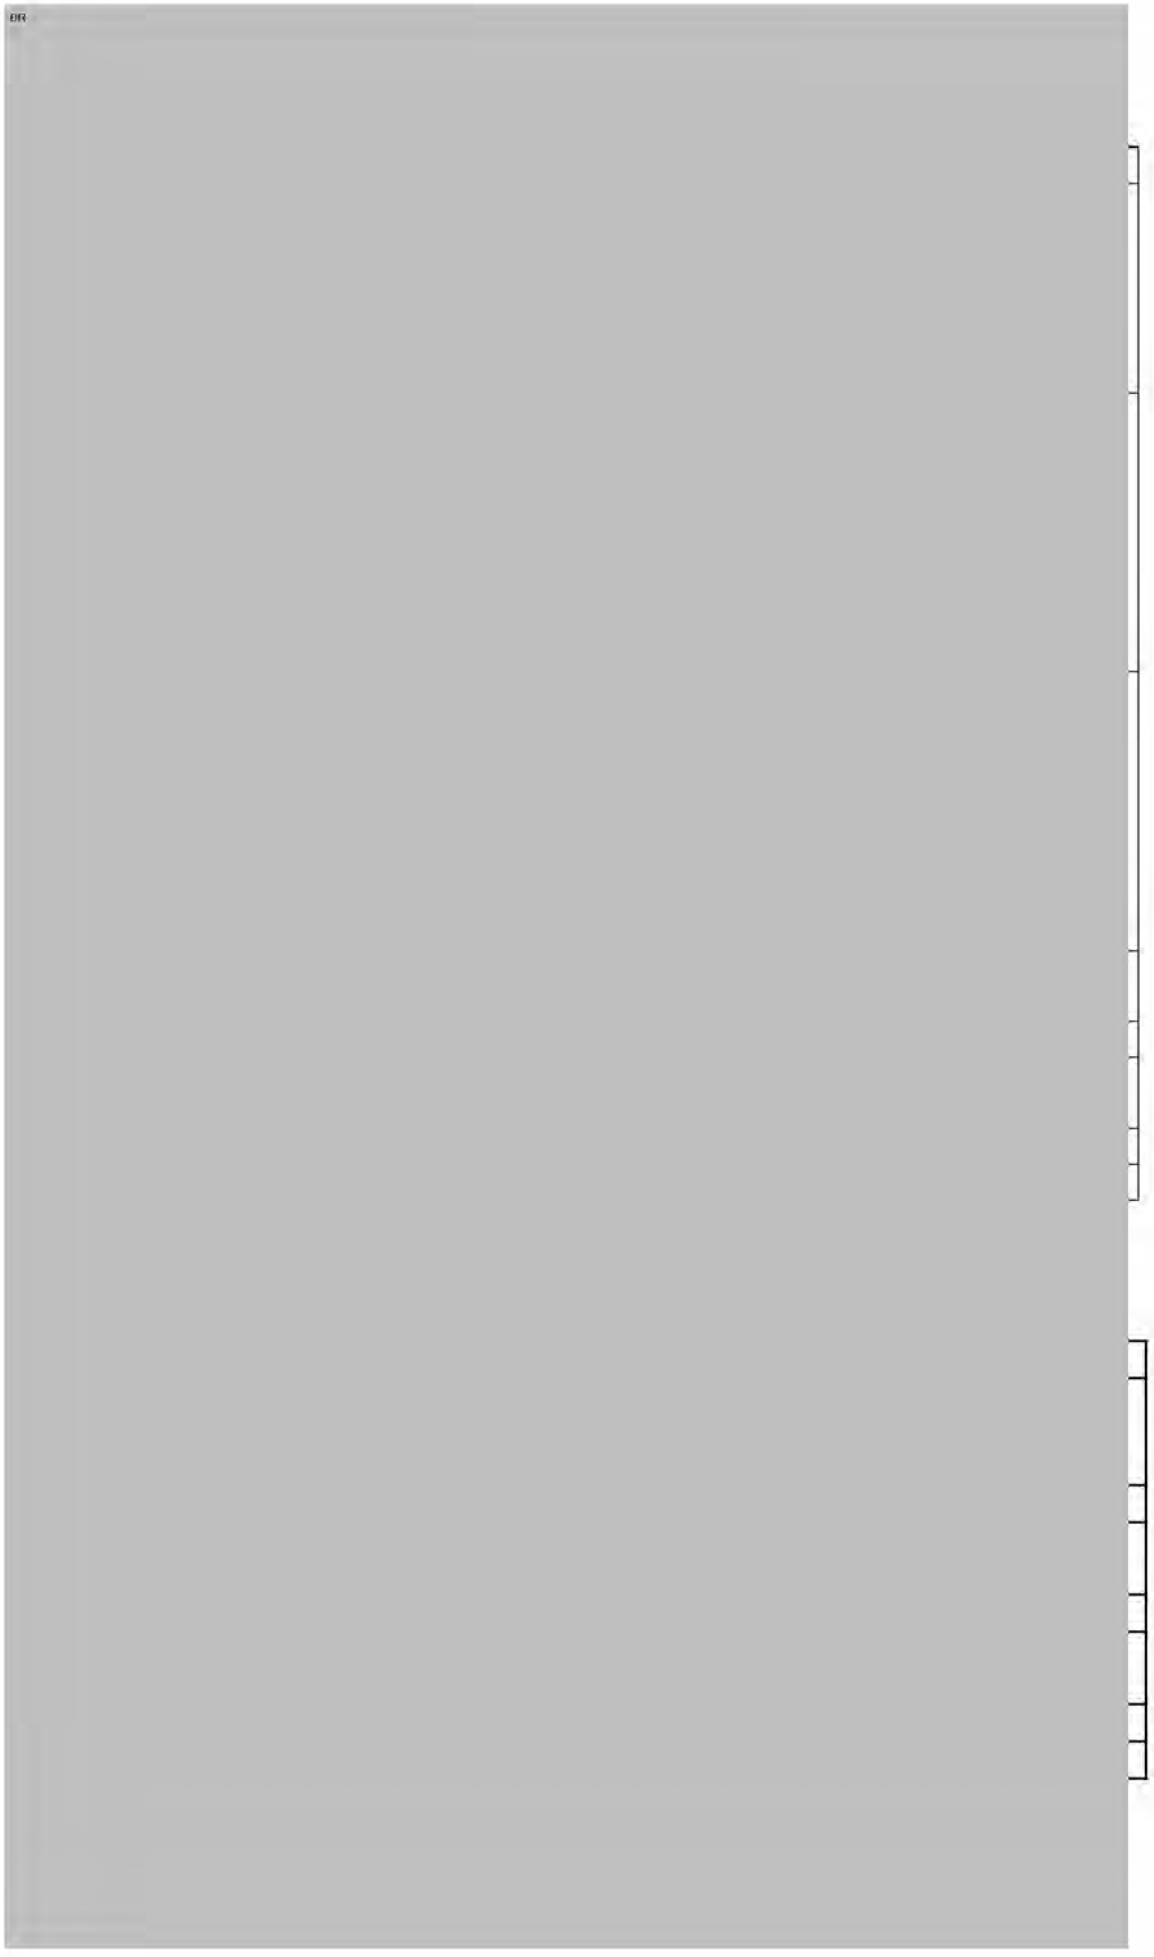

## 2.4 Overeenkomsten

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Samenwerkingsovereenkomst met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer. | De samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de tweede toevoer is voor Roba en eigenaar op hoofdlijnen akkoord. Afgelopen kwartaal hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met particuliere grondeigenaar een adviseur over de details voor in de biljagen. Wederpartij heeft aanvullende / nieuwe eisen gesteld waardoor partijen nog niet tot overeenstemming zijn gekomen. |
| [redacted] | |
| Met de eigenaren van het pand en perceel aan de Jan Thijssenweg 8 worden afspraken vastgelegd in een overeenkomst en akte over o.a. de herinrichting van het Molenslootpad en grondaankoop t.b.v. hun perceel. | Nadere gesprekken hebben plaatsgevonden met de perceeleigenaar. Er is een concept-grondruilovereenkomst opgesteld onder de voorwaarde dat gemeente overeenstemming bereikt met andere particuliere grondeigenaar voor realisatie tweede watertoevoer en herinrichten Molenslootpad. |
| [redacted] | |

### 2.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Samenwerkingsovereenkomst met bijlagen bespreken en afronden met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer op particulier terrein. Den Haag zal het perceel taxeren voor het geval de gesprekken niet tot overeenstemming leiden. Dan kan Den Haag een bieding doen om de grond te minnelijk aan te kopen. Tot slot behoort het starten van een onteigeningsprocedure tot de mogelijkheden. |
| [redacted] |

## 2.5 Communicatie

### 2.5.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Voorbereiden en uitvoeren communicatie over de opening van een deel van het Molenvlietpark. | Begin juni werd het deel van het Molenvlietpark rondom de waterberging opengesteld voor het publiek. Hiervoor was een publieksactiviteit gepland, maar deze is afgeblazen vanwege de geldende coronamaatregelen. In overleg met de Taskforce Corona van de gemeente Den Haag is de communicatie over het nieuwe park beperkt gehouden, om geen grote aantallen bezoekers te trekken en zo drukte te voorkomen.<br>Er werd via social media een 360 graden-video gepubliceerd, waarmee je met een smartphone of via je computer virtueel rond kan kijken in het park. Ook werd via social media een video gepubliceerd waarin o.a. een projectleider van het Hoogheemraadschap van Delfland verteld over de waterberging. |
| [redacted] | |

Mailbox Rotterdamsebaan

Vragen gingen o.a. over verlichting op het parkeerterrein van Drievliet, verzorging van nieuwe bomen langs de Binckhorstlaan en in het Molenvlietpark en het gebruik van het park (verzoeken tot handhaving op honden aan de lijn o.a.).

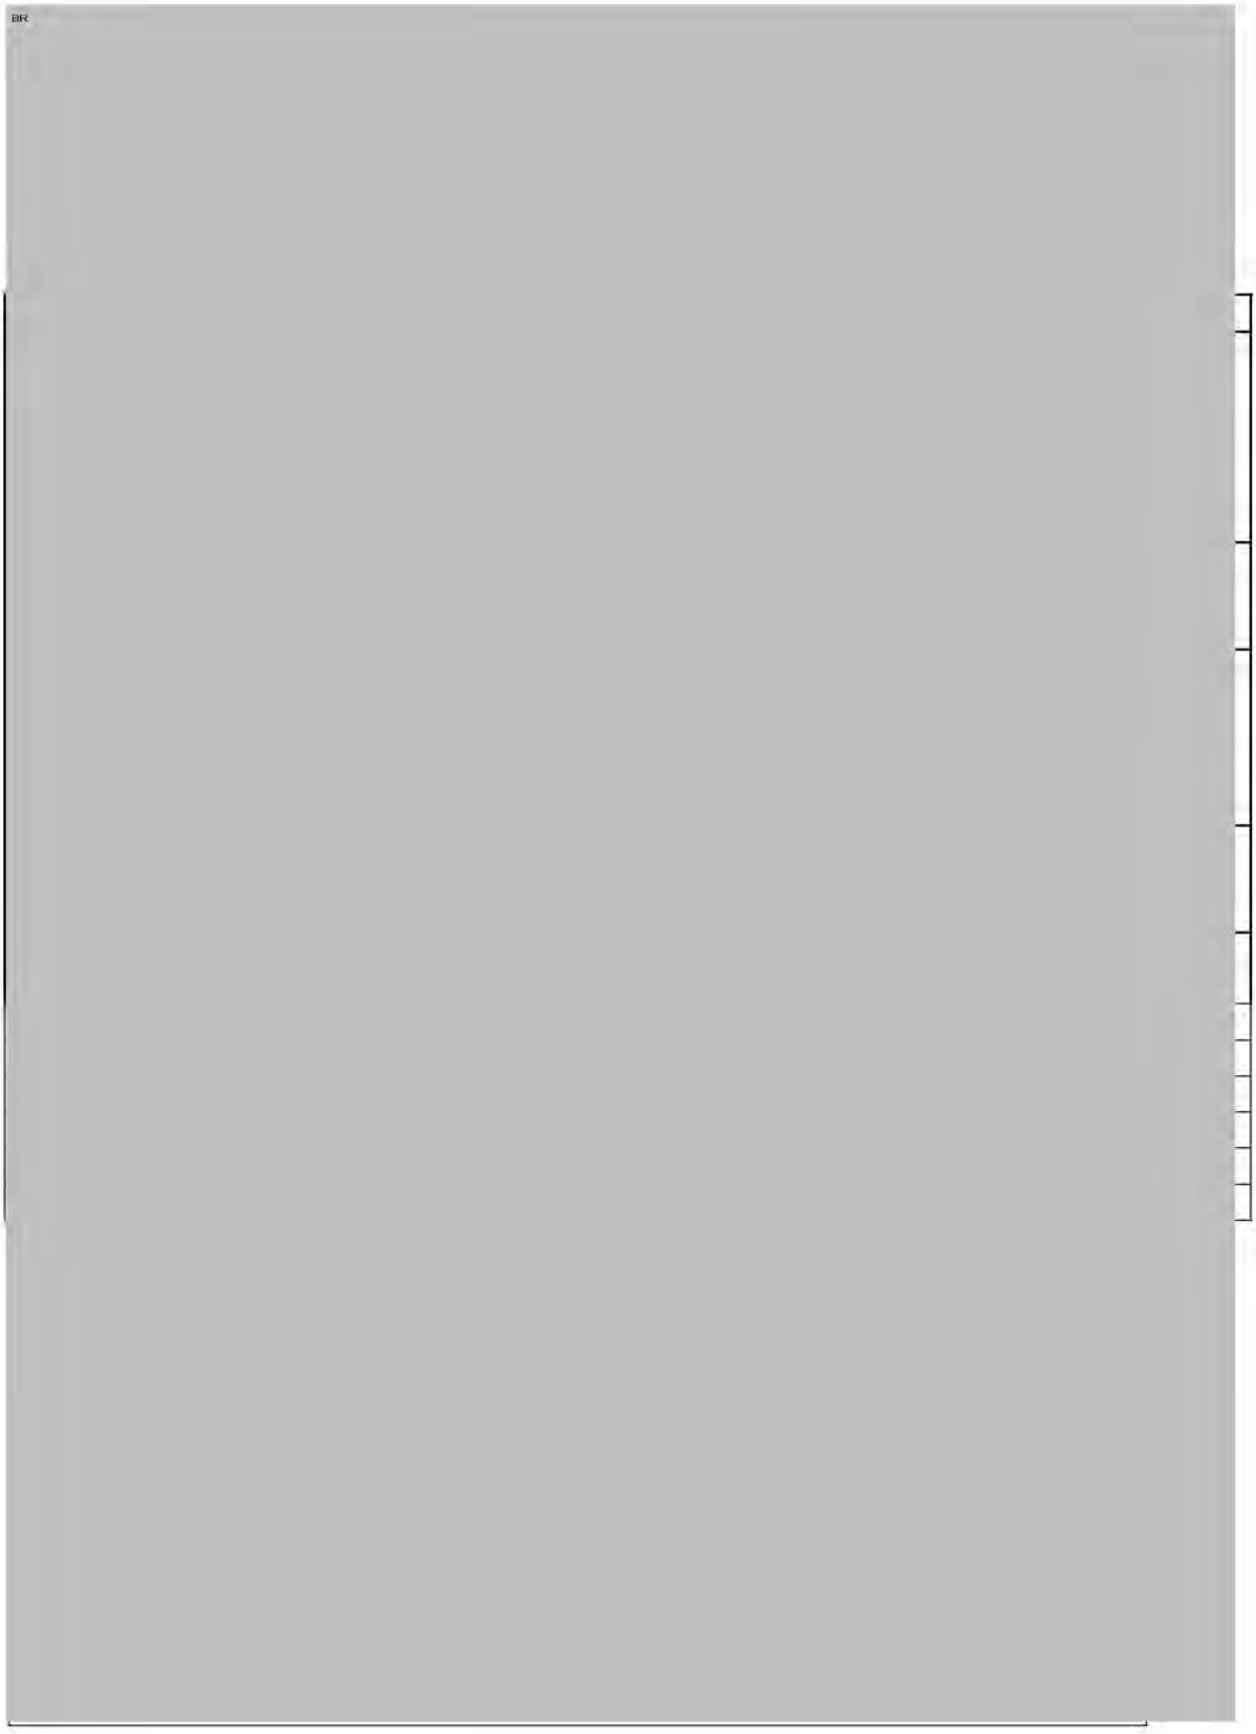
BR

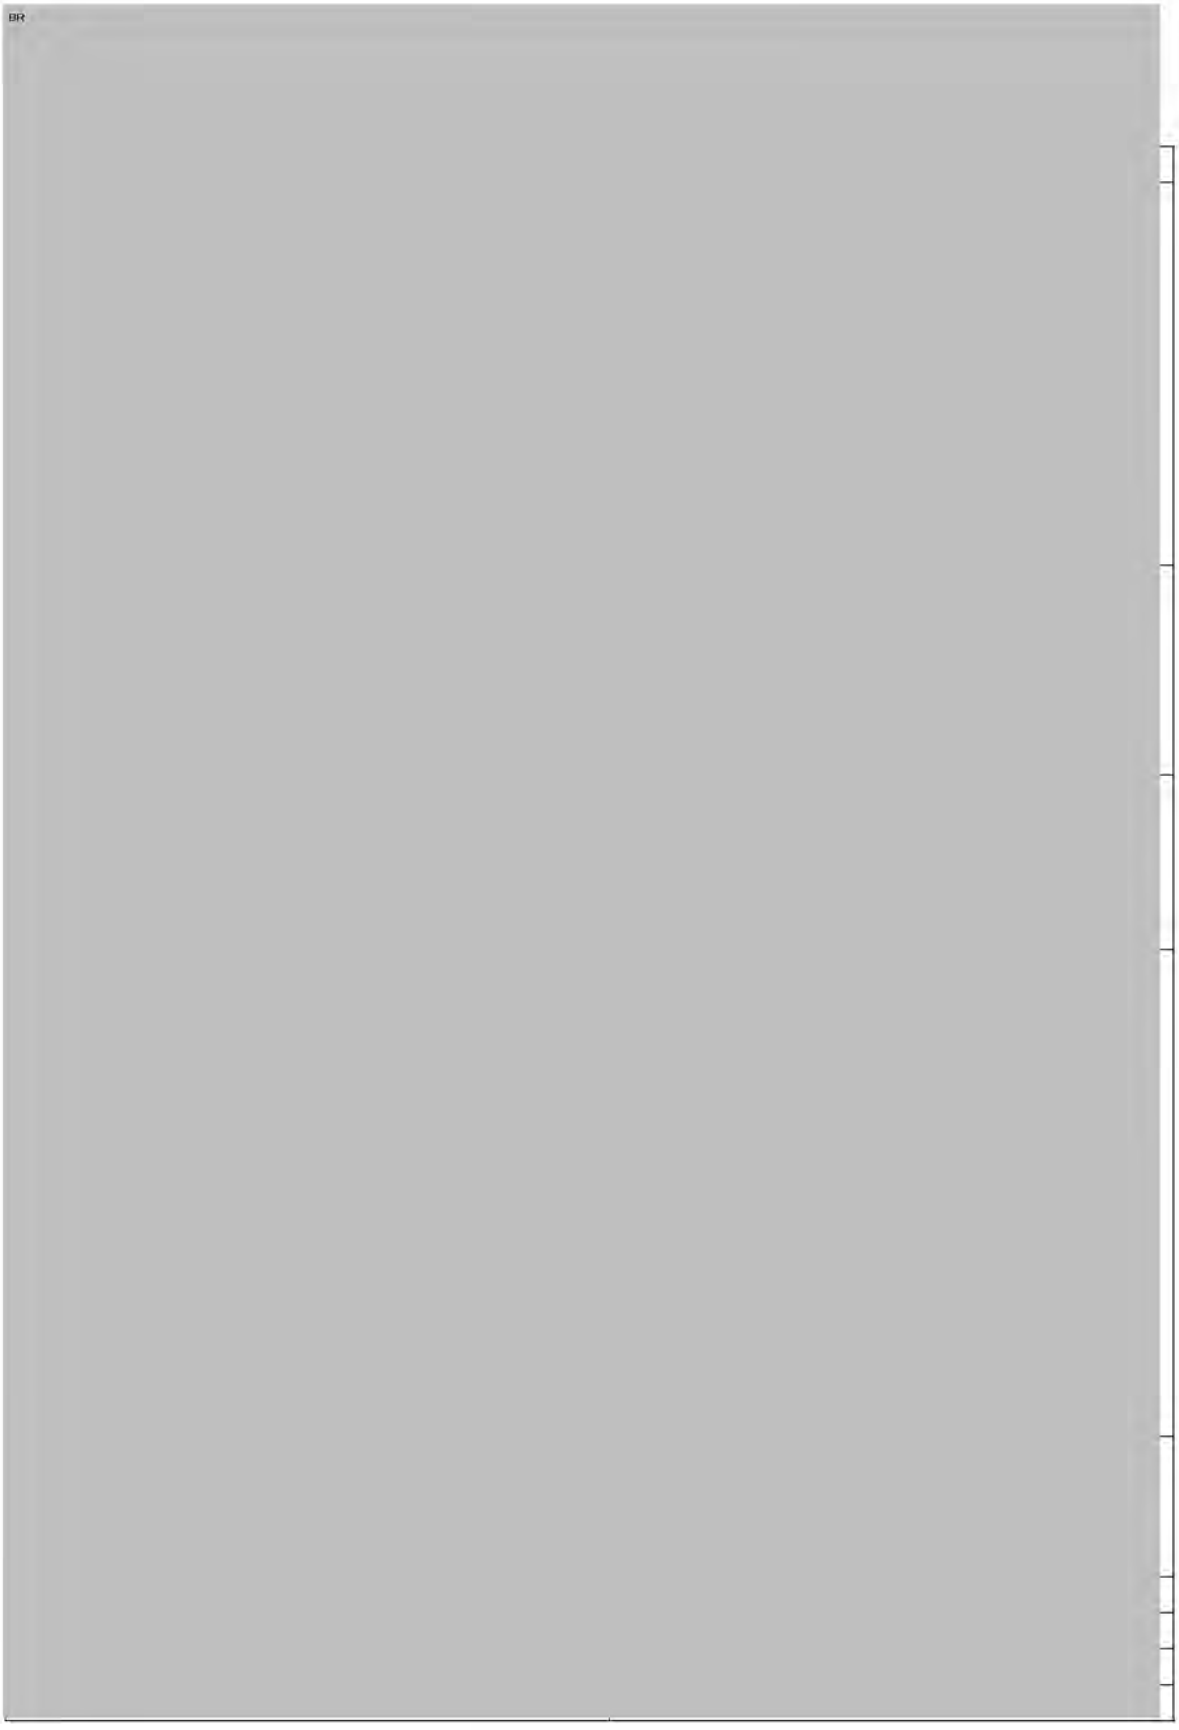
BR

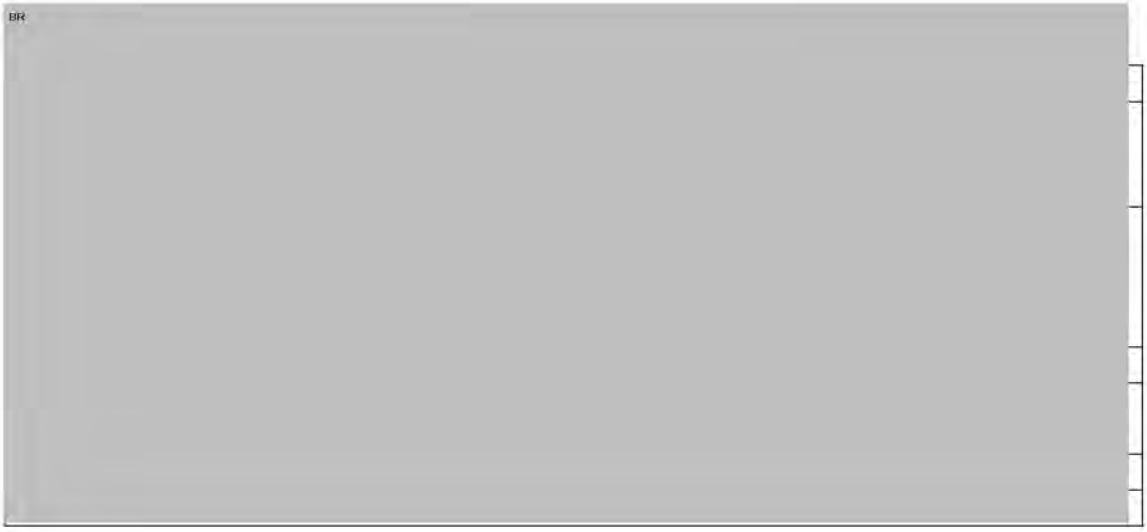
BR

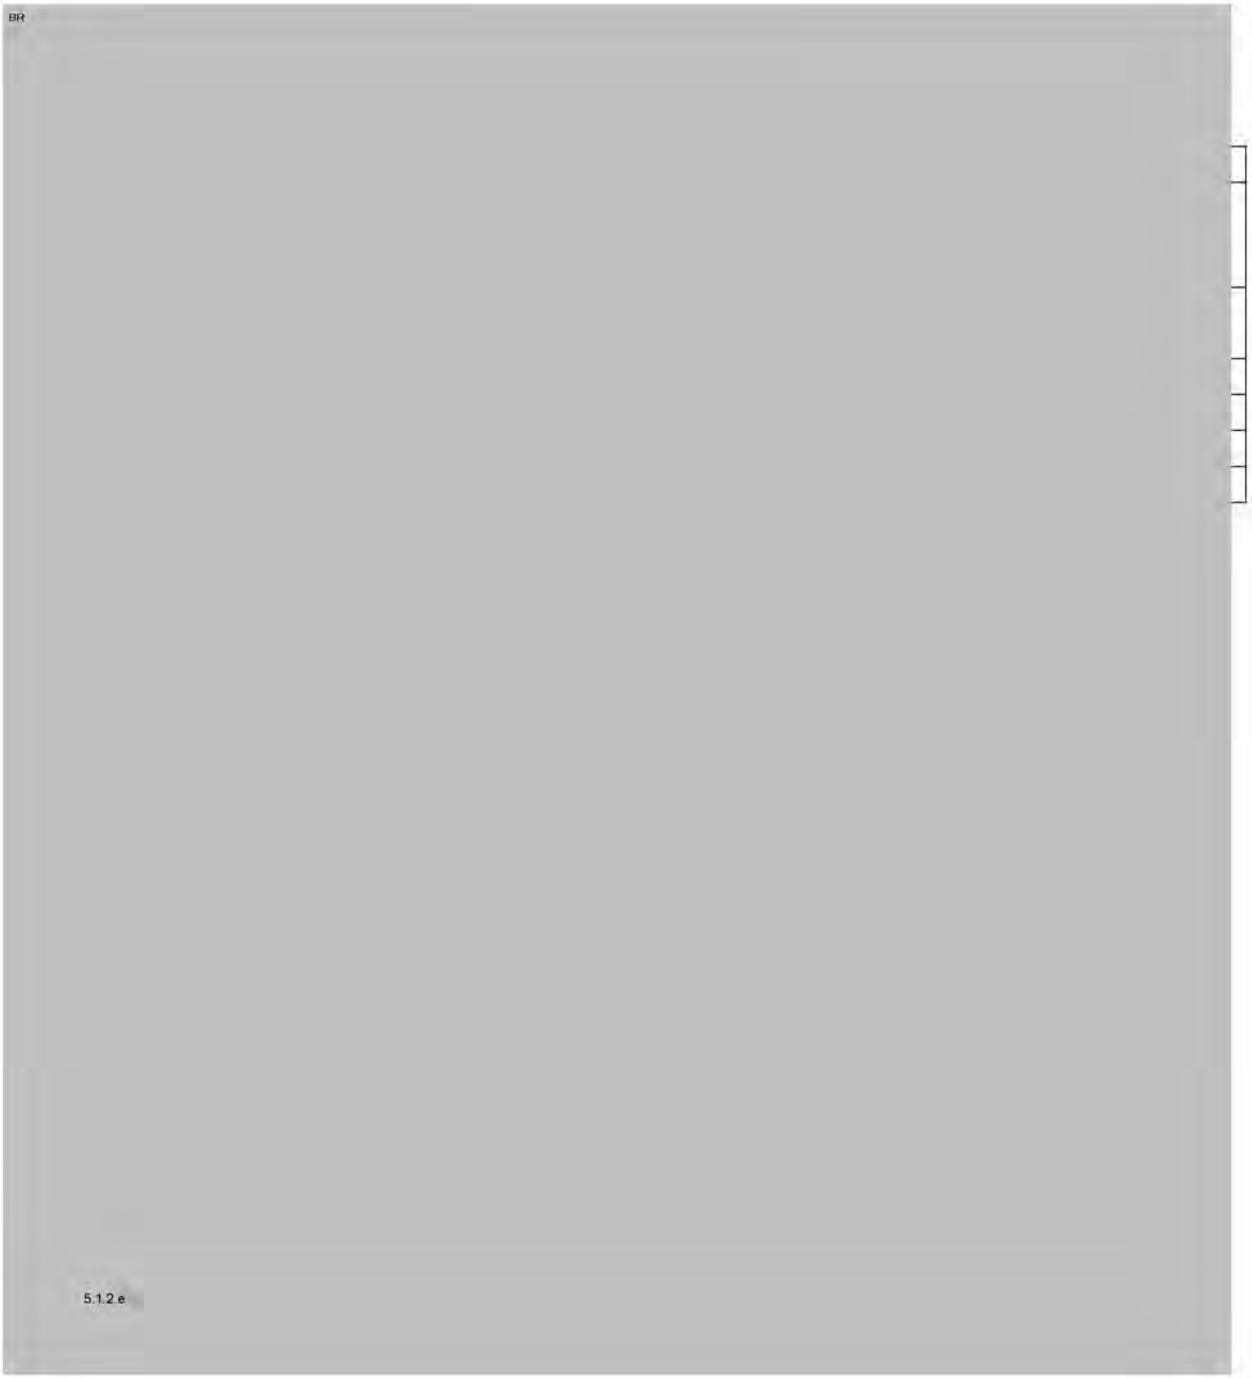
BR
5.1.2.e

Docnr27



## 3.4 Inpassing Vlietzone

### 3.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Molenvlietpark West: de werkweg door het gebied weggegraven, de oeverbescherming en de beplanting van de eilanden aanbrengen en het trekpontje en speelaanleiding plaatsen. | Molenvlietpark rondom waterberging: De werkweg is verwijderd, de oeverbescherming en de beplanting van de eilanden zijn aangebracht en de speelaanleidingen zijn geplaatst. Tevens is de deklaag van schelpenasfalt op de wandelpaden aangebracht. Het park is op 5 juni jl. opengesteld voor het publiek. |
| Molenvlietpark Noord: CRB gaat verder met het inrichten van de Heemtuin en het deel van het fietspad tussen het dienstgebouw en de Westvlietweg. | Molenvlietpark Noord: CRB heeft het perceel naast landgoed Zeerust (Heemtuin), m.u.v. een deel van de beplanting, ingericht. De resterende beplanting zal in het najaar worden aangebracht.<br>Het deel van het Trekfietspad tussen het dienstgebouw Vlietzone en de Westvlietweg is aangelegd. Vanwege het niet tijdig kunnen verplaatsen van een KPN-kast, is de fietsoversteek bij de Westvlietweg nog niet definitief gereed. De boorterp is, m.u.v. een deel van de beplanting, ingericht. De resterende beplanting zal in het najaar worden aangebracht.<br>De hekwerken langs de golfbaan zijn geplaatst. |
| [redacted] | |

### 3.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Molenvlietpark West (rond waterberging): Per 1 juli zal het Molenvlietpark West door CRB worden opgeleverd. Na oplevering zal CRB nog diverse restpunten oplossen, waaronder het plaatsen van het trekpontje. |
| Molenvlietpark Noord (Heemtuin): Per 1 juli zal het Molenvlietpark Noord door CRB worden opgeleverd. Na oplevering zal CRB nog diverse restpunten oplossen.<br>Het Trekfietspad en het Molenvlietpark Noord zullen op 9 juli voor publiek worden opengesteld.<br>Vanwege het nog niet definitief gereed zijn van de fietsoversteek bij de Westvlietweg, wordt de eerste weken een tijdelijke VRI ingezet. Naar verwachting wordt in september de fietsoversteek definitief ingericht. |
| [redacted] |

Foto: Uitzicht op het Molenvlietpark incl. waterberging vanaf de loopbrug Drievliet

Foto: Heemtuin in Molenvlietpark Noord

Docnr27

Docnr27



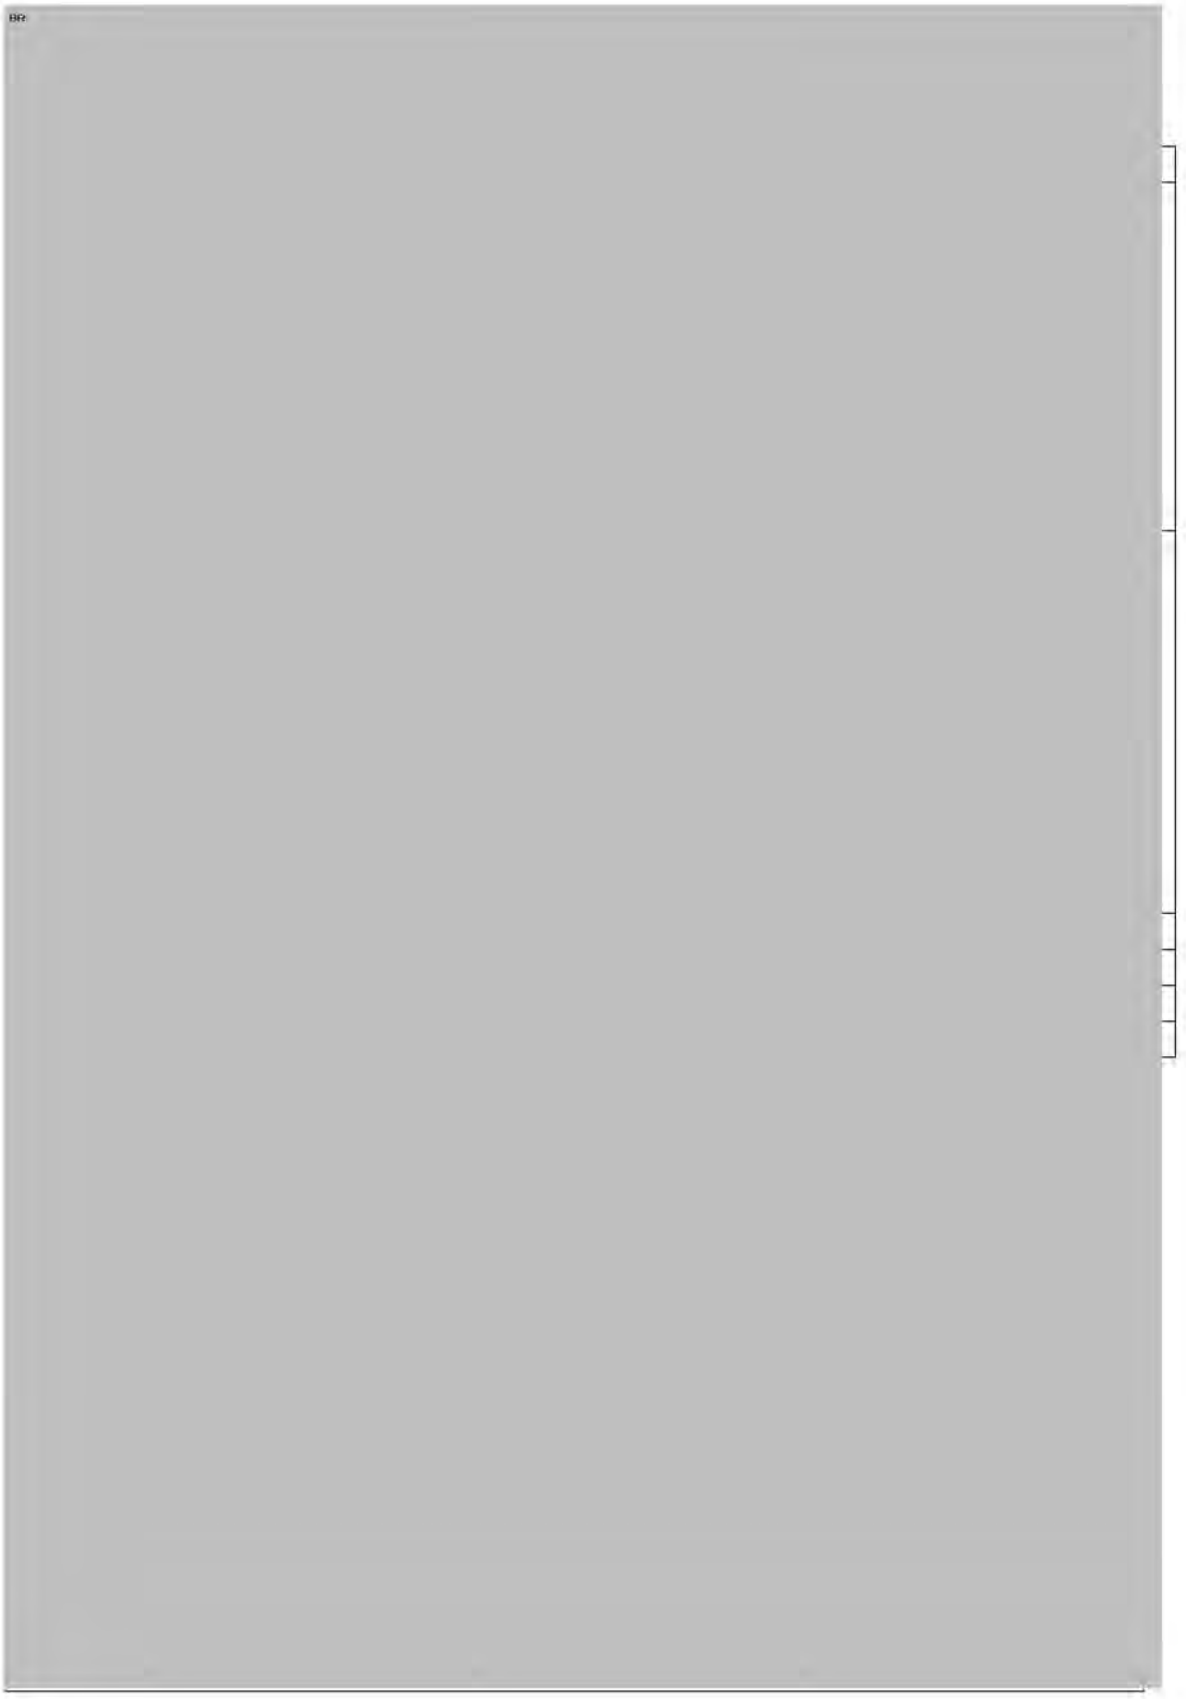

Docnr27

Docnr27



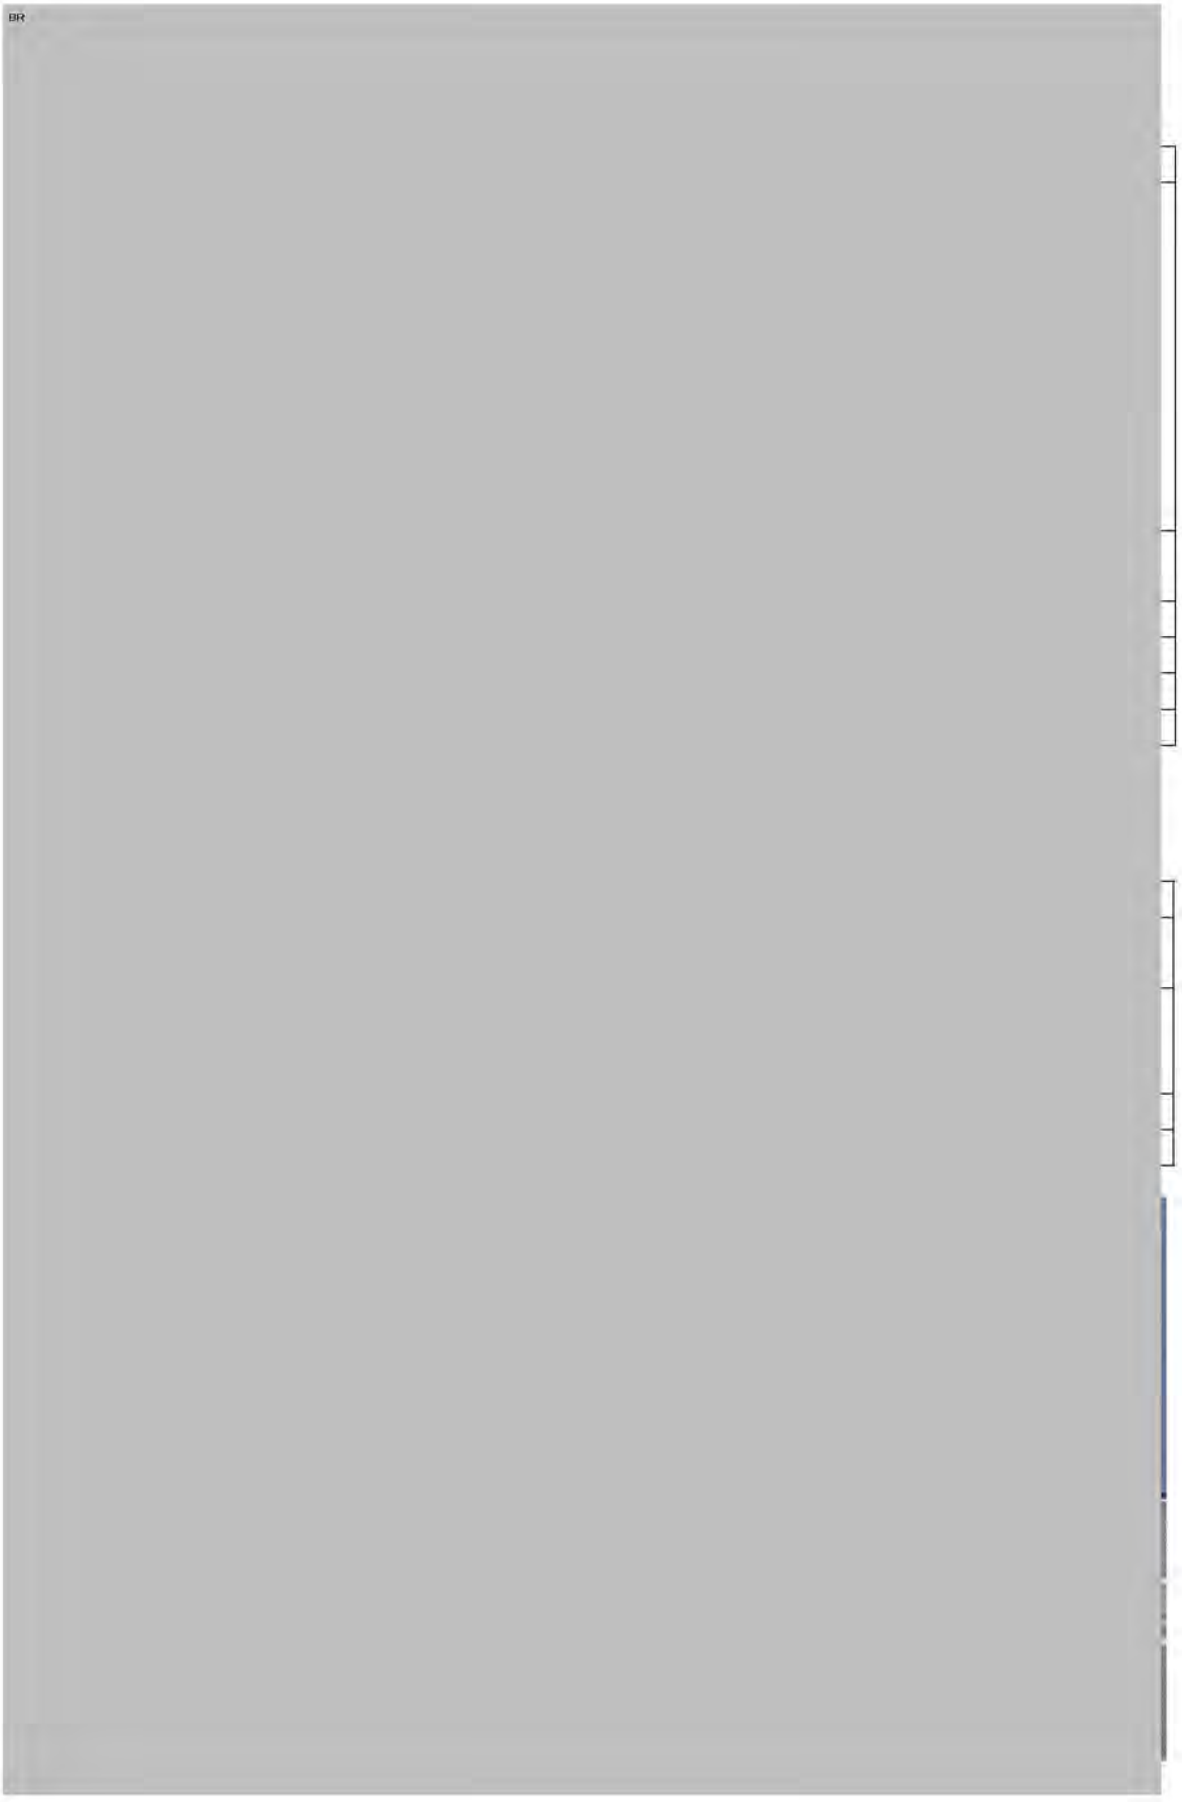

Docnr27



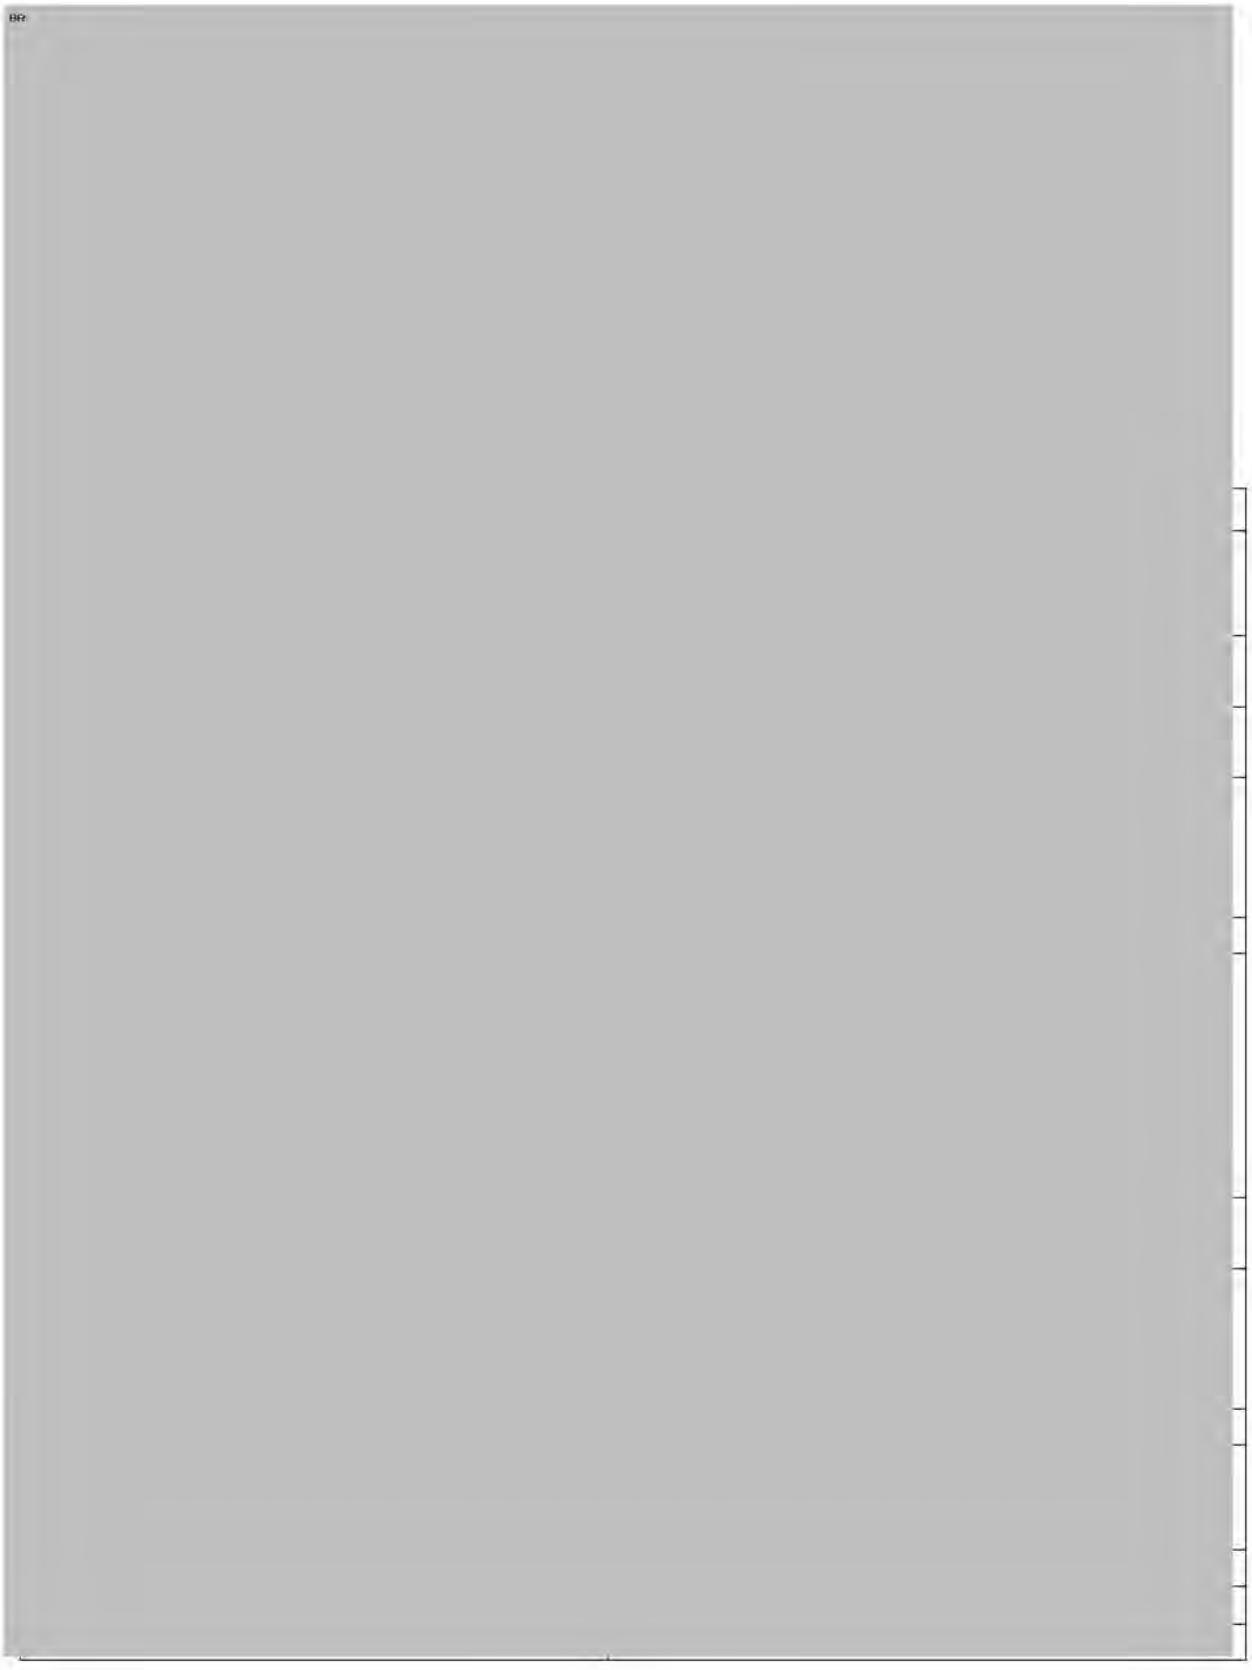

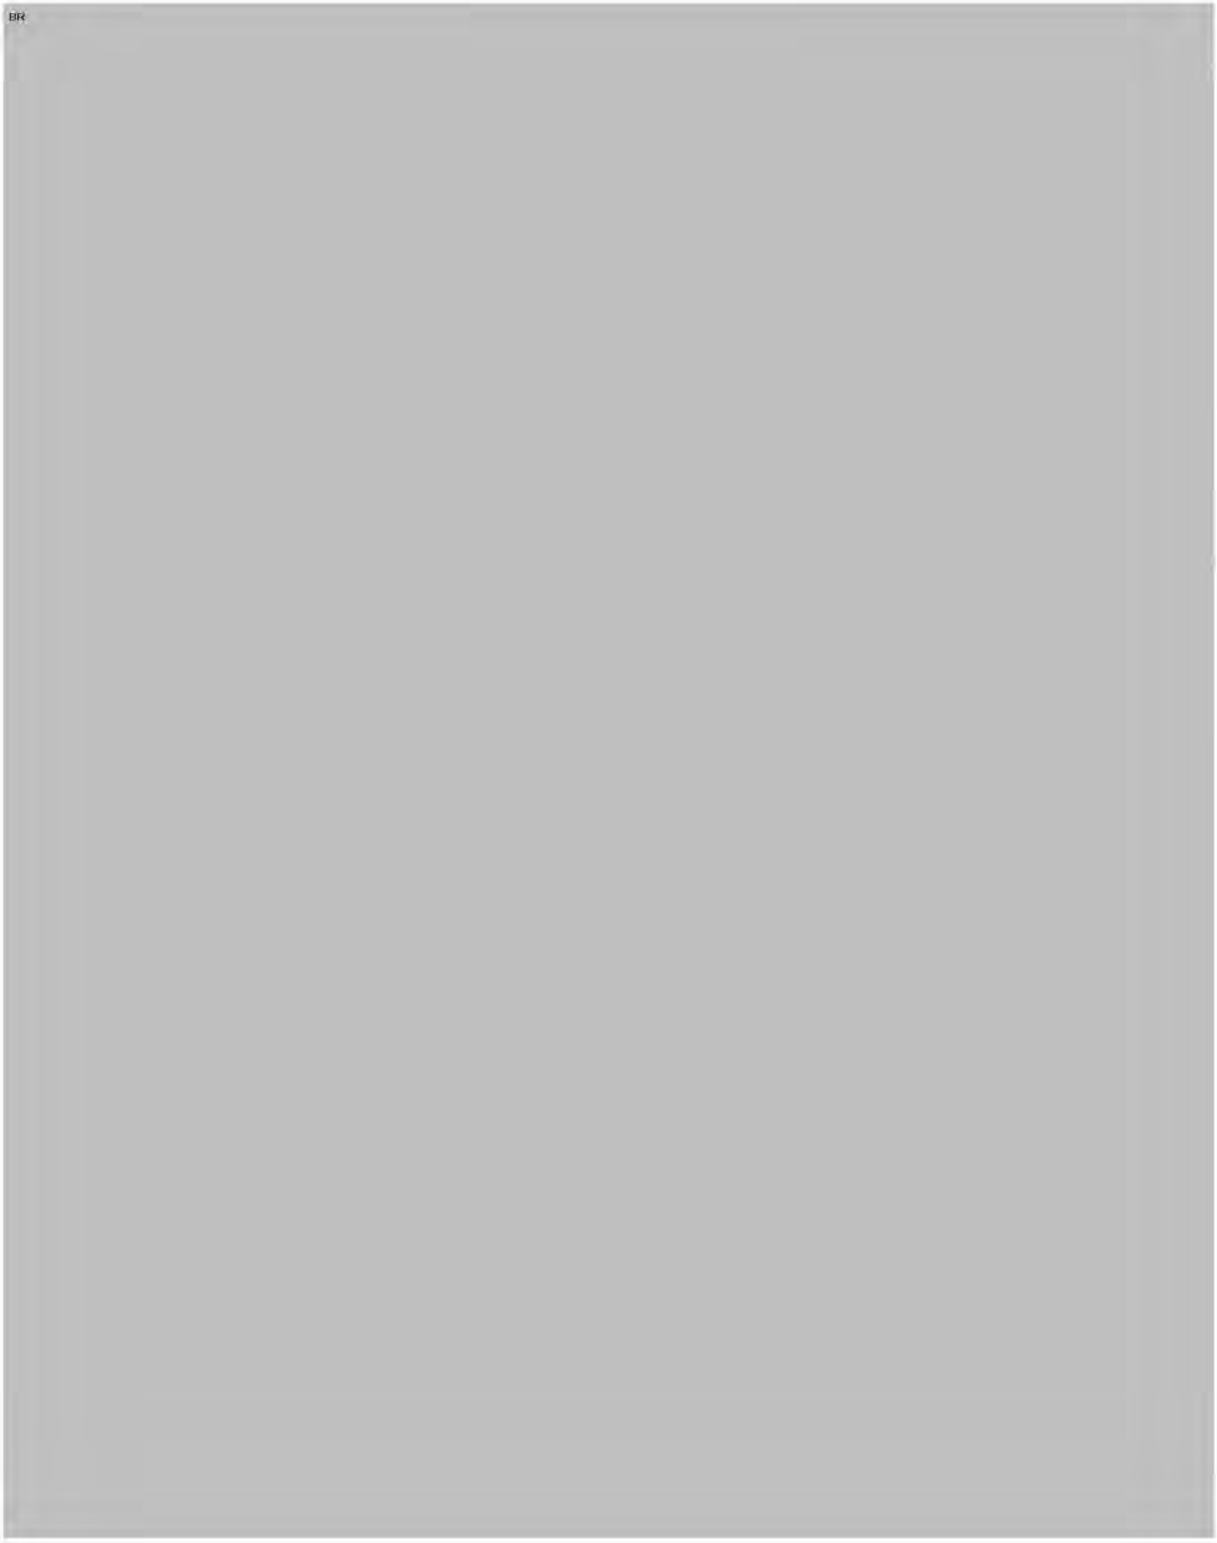
BR

Docnr27

Docnr27



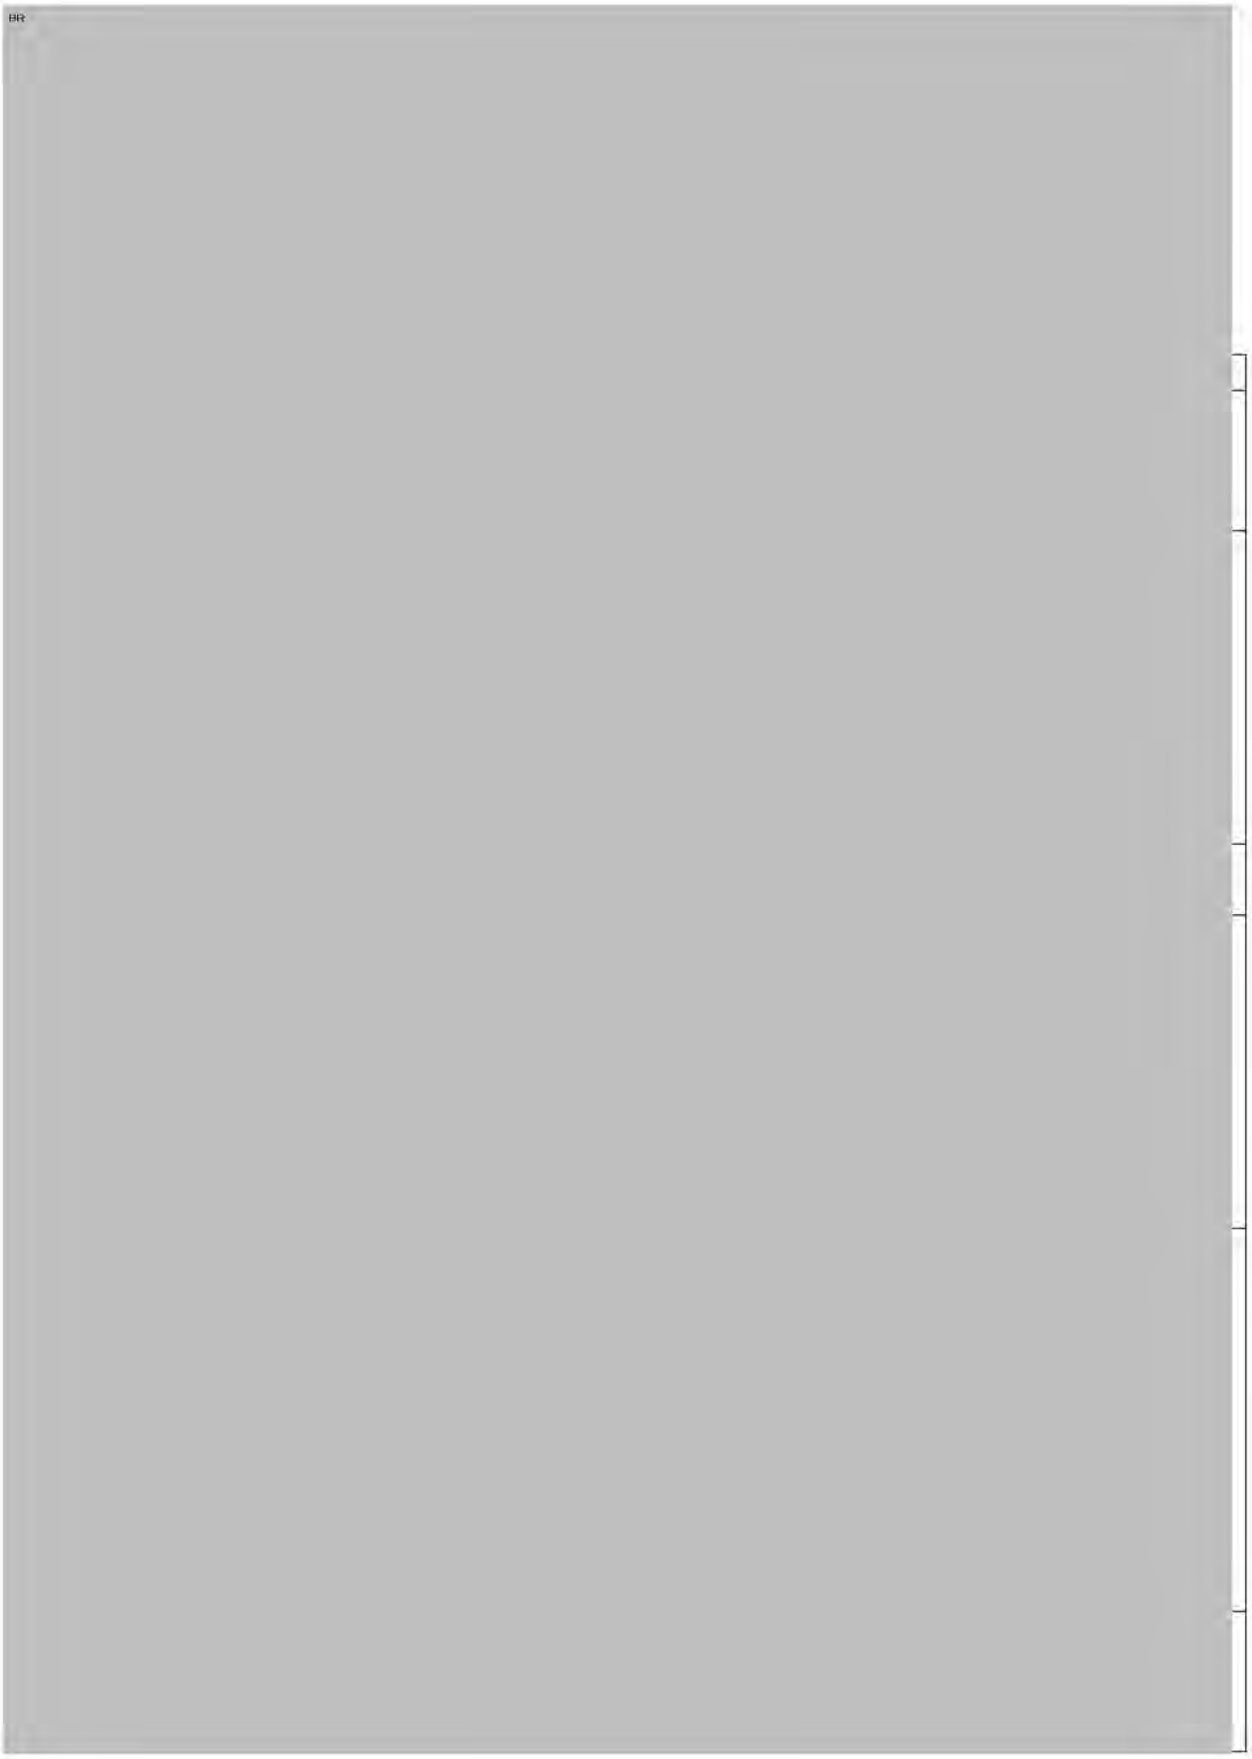

Docnr27

## 3.11 Uitvoeringskwaliteit

### 3.11.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Doel van Roba is om elke maand tenminste 2 audits uit te voeren bij CRB. Voor het 2e kwartaal 2020 is e.e.a. is afhankelijk van de dan geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. | Er zijn 2 audits uitgevoerd bij CRB of leveranciers/onderaannemers van CRB:<br>• Productaudit realisatie Molenvlietpark;<br>BR<br>N.B.: In verband met de geldende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn de audits pas in juni opgestart. |
| BR | |

Docnr27



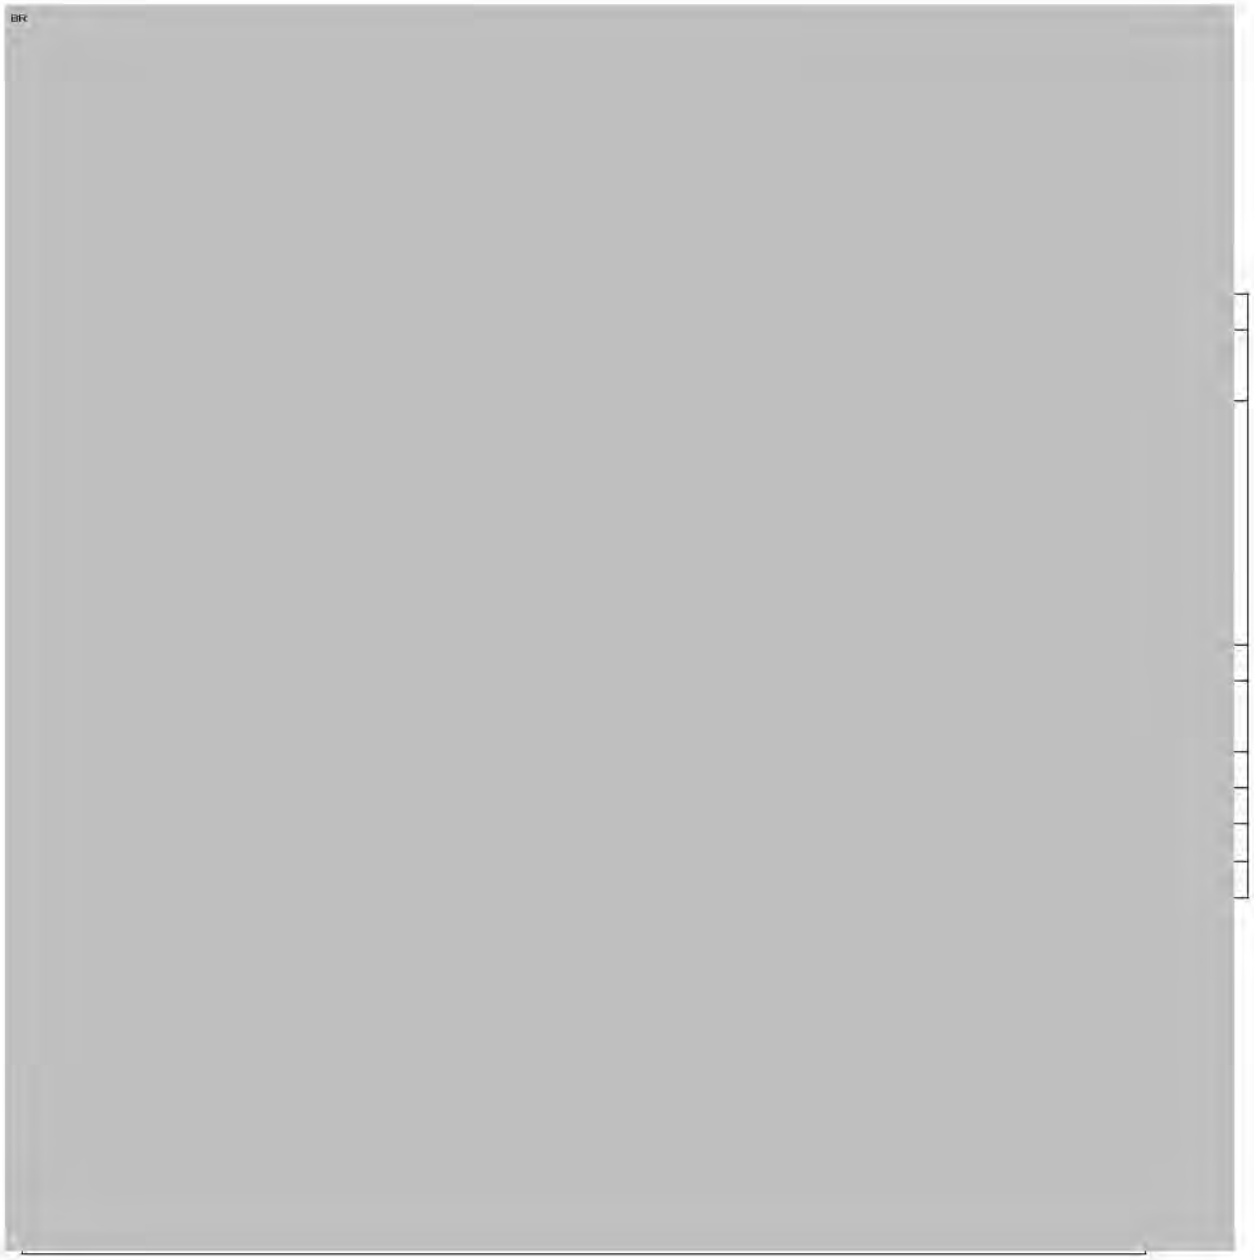

## 4.2 Overdracht aan beheerders

### 4.2.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
| --- |
| 1 Juli 2020 verwachten we van CRB de volgende verzoeken tot aanvaarding te ontvangen:<br> <br>• Molenvlietpark Noord<br> <br>• Molenvlietpark West<br> <br>We verwachten de onderdelen komend kwartaal over te dragen aan de beheerders. |
| **Besluiten** |
| Geen. |

Docnr27



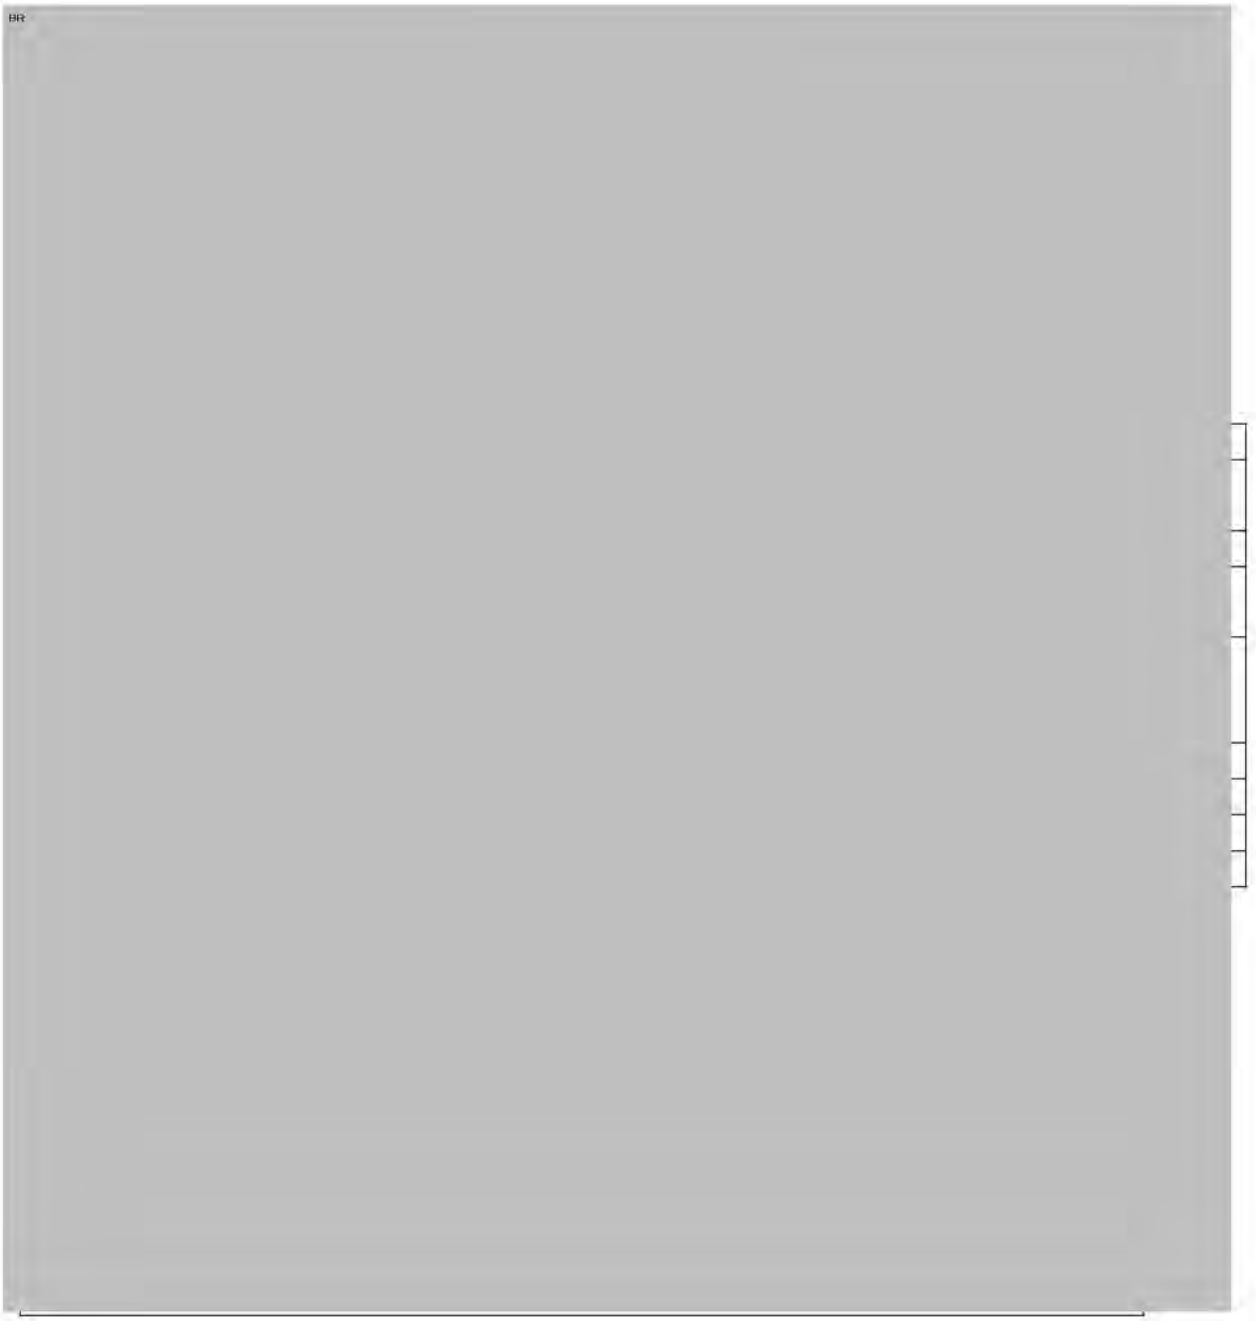

Docnr27



# 5 Projectbeheersing

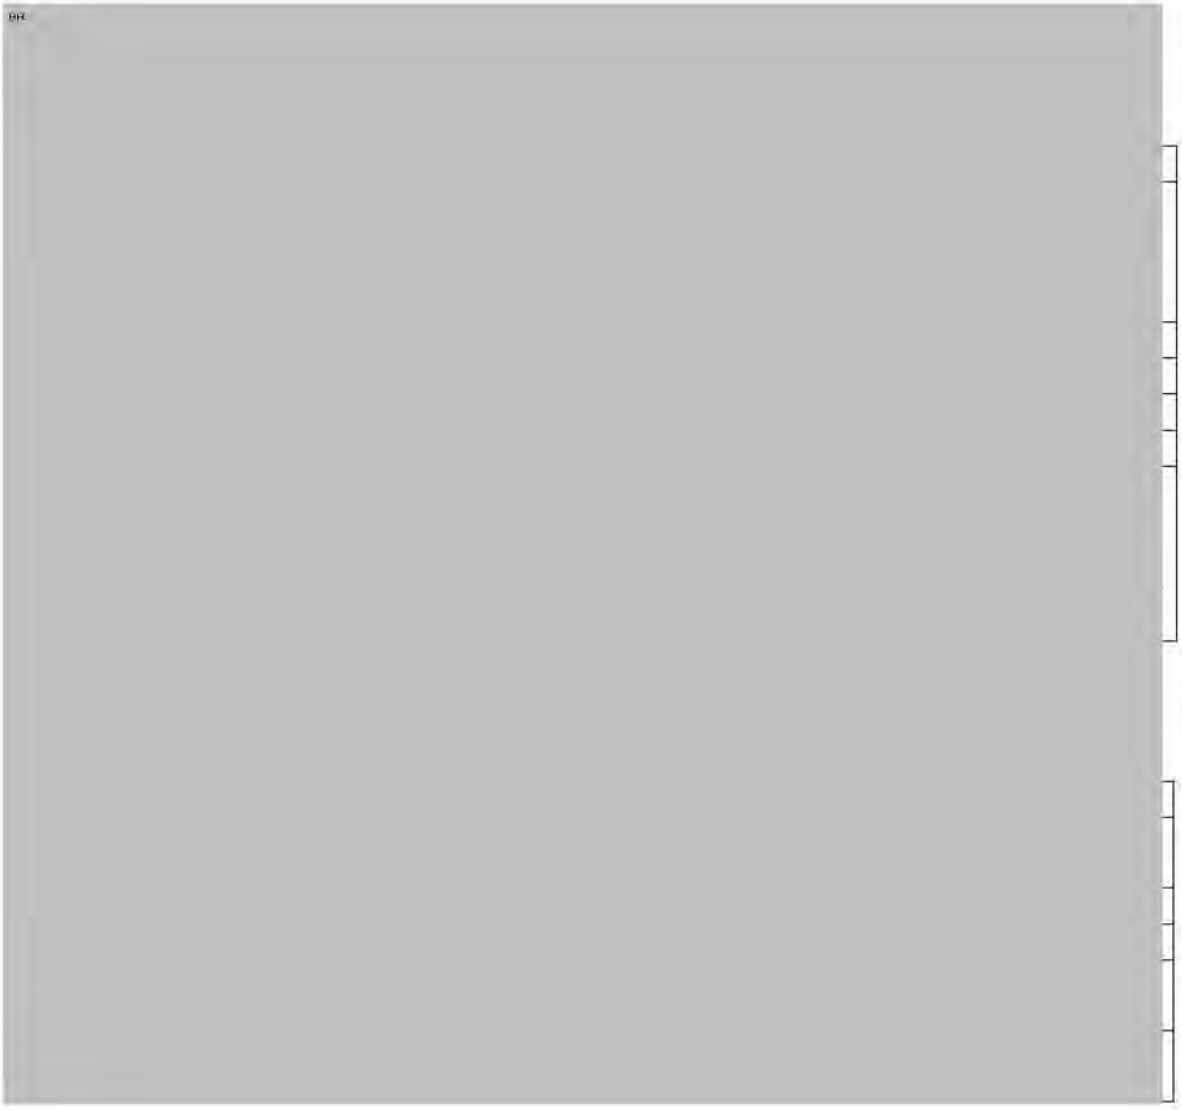

Docnr27



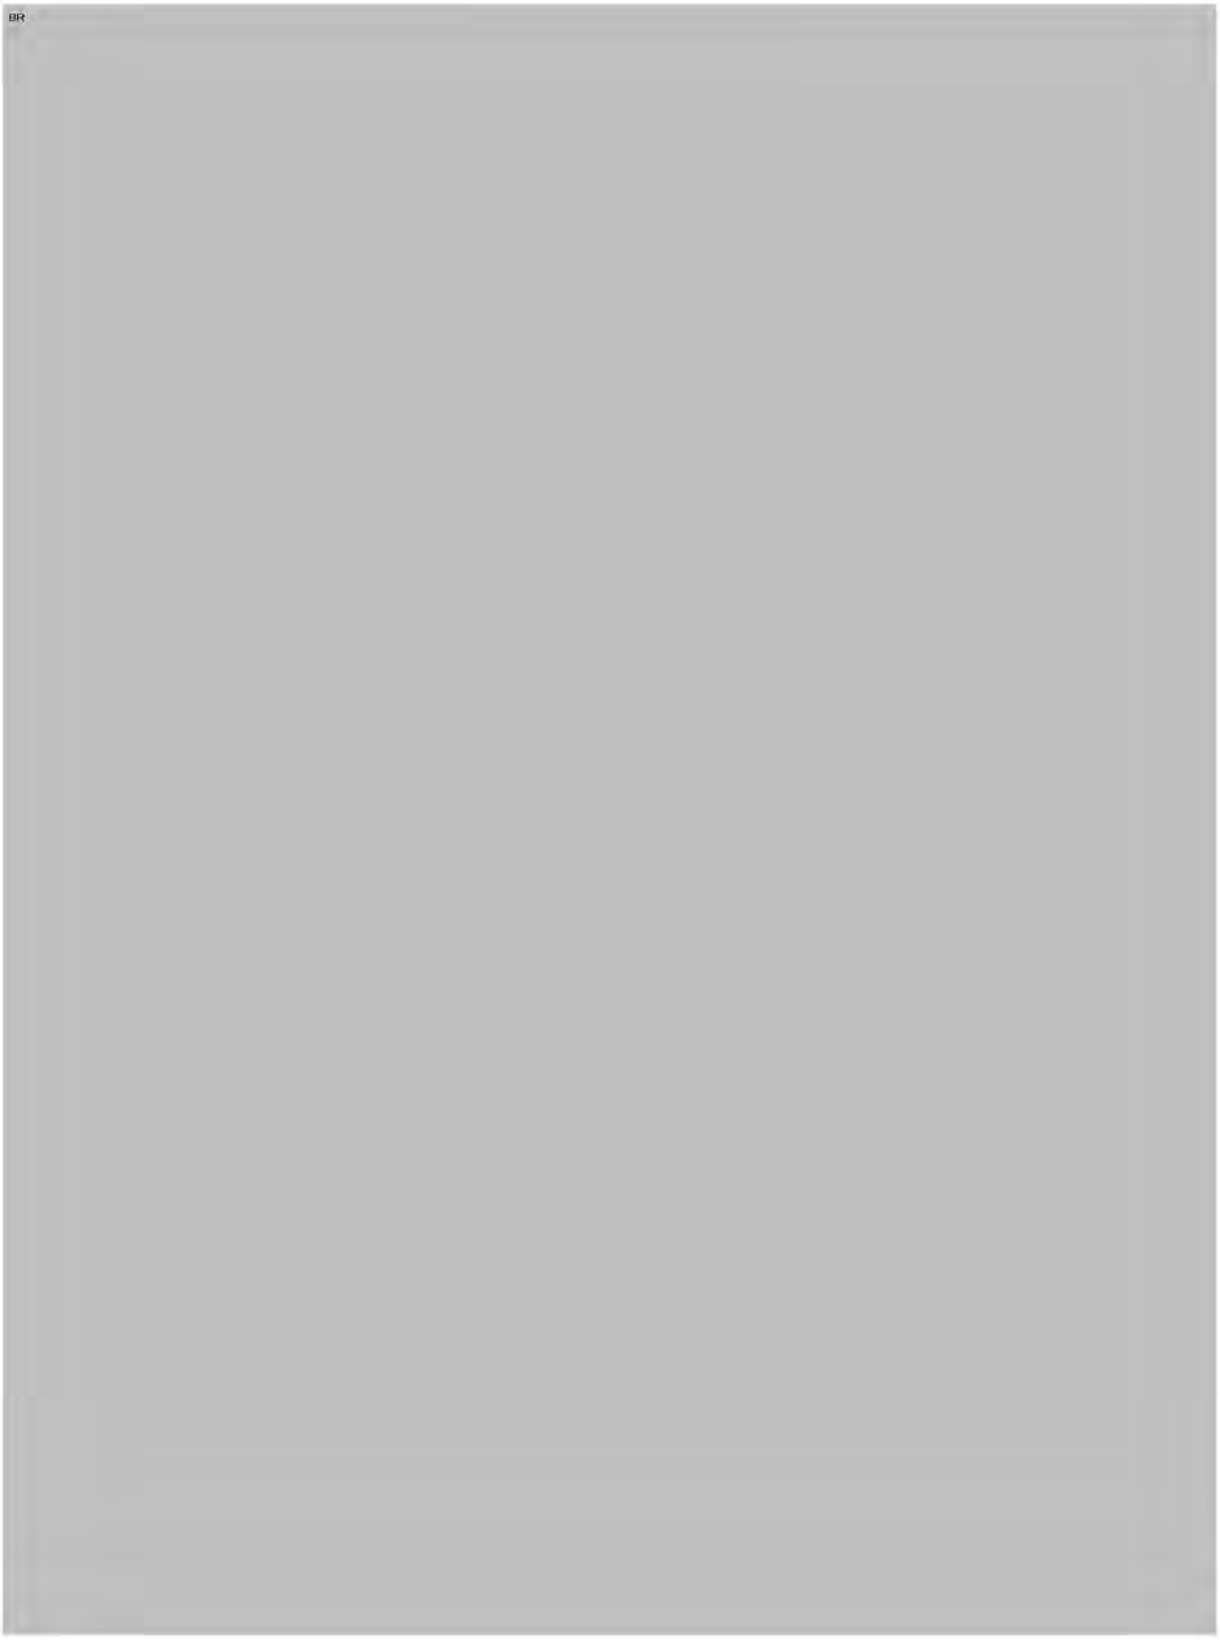

### 5.2.2 Budget

Tabel : Overzicht toegezegde budget Rotterdamsebaan, Euro's prijspeil 2019 (excl. BTW)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delftland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland
Er zijn in het tweede kwartaal 2020 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland
Er zijn in het tweede kwartaal 2020 geen mutaties geweest.

Docnr27

## 5.3 Planning

Zie tevens de bijlage 'Planningsmijlpalen'.

### 5.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Voortzetten regulier planningsproces Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e toevoer. | Het reguliere planningsproces is voortgezet. |
| Uitvoeren van onzekerheidsanalyses Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e toevoer. | De onzekerheidsanalyses op de bediencentrale en de 2e toevoer zijn uitgevoerd. Aangezien het Rotterdamsebaan qua planning binnen een half jaar van de ingebruiknamedatum is aangeland, wordt er geen onzekerheidsanalyse op de planning meer uitgevoerd. Het aantal risico's dat nog speelt is goed te overzien en het is duidelijk waar op gestuurd moet worden. |
| BR | |

Docnr27



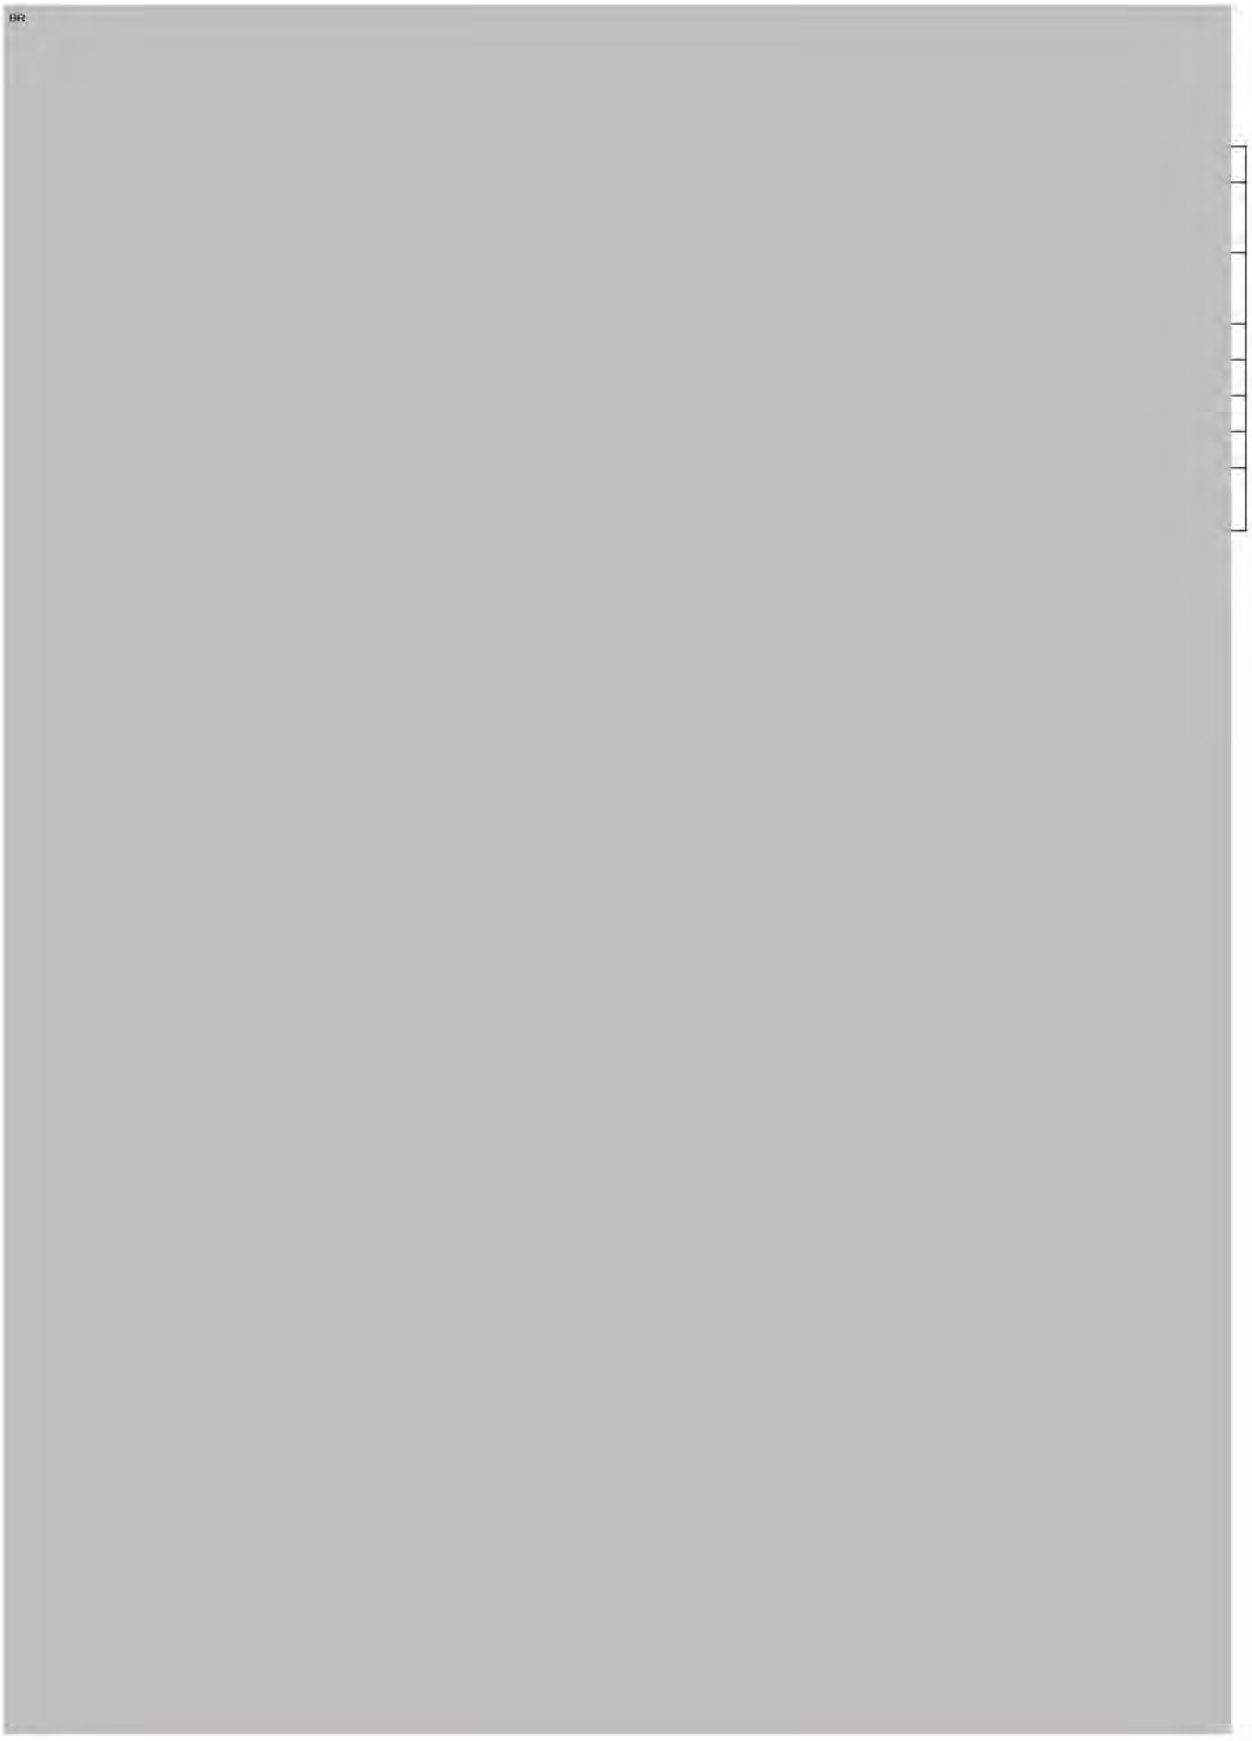

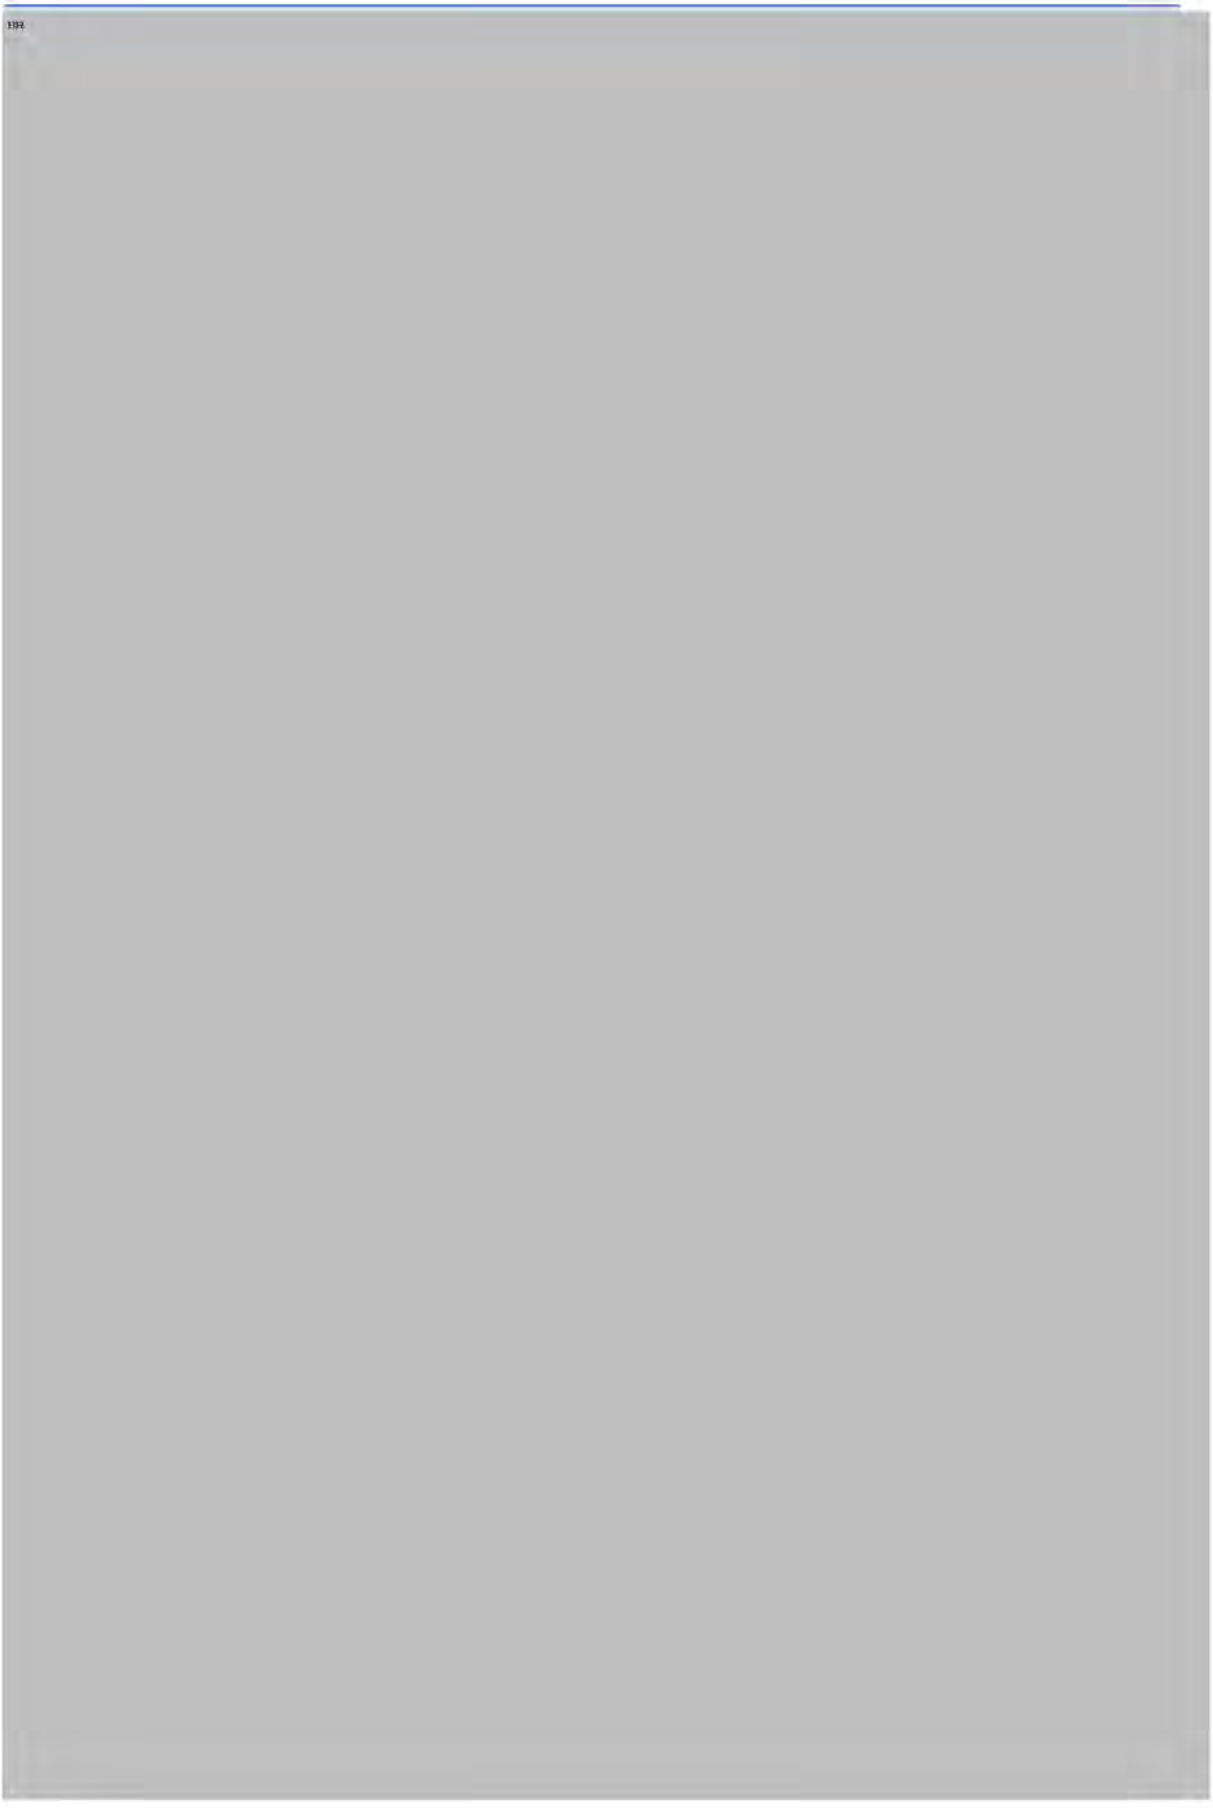

Docnr27



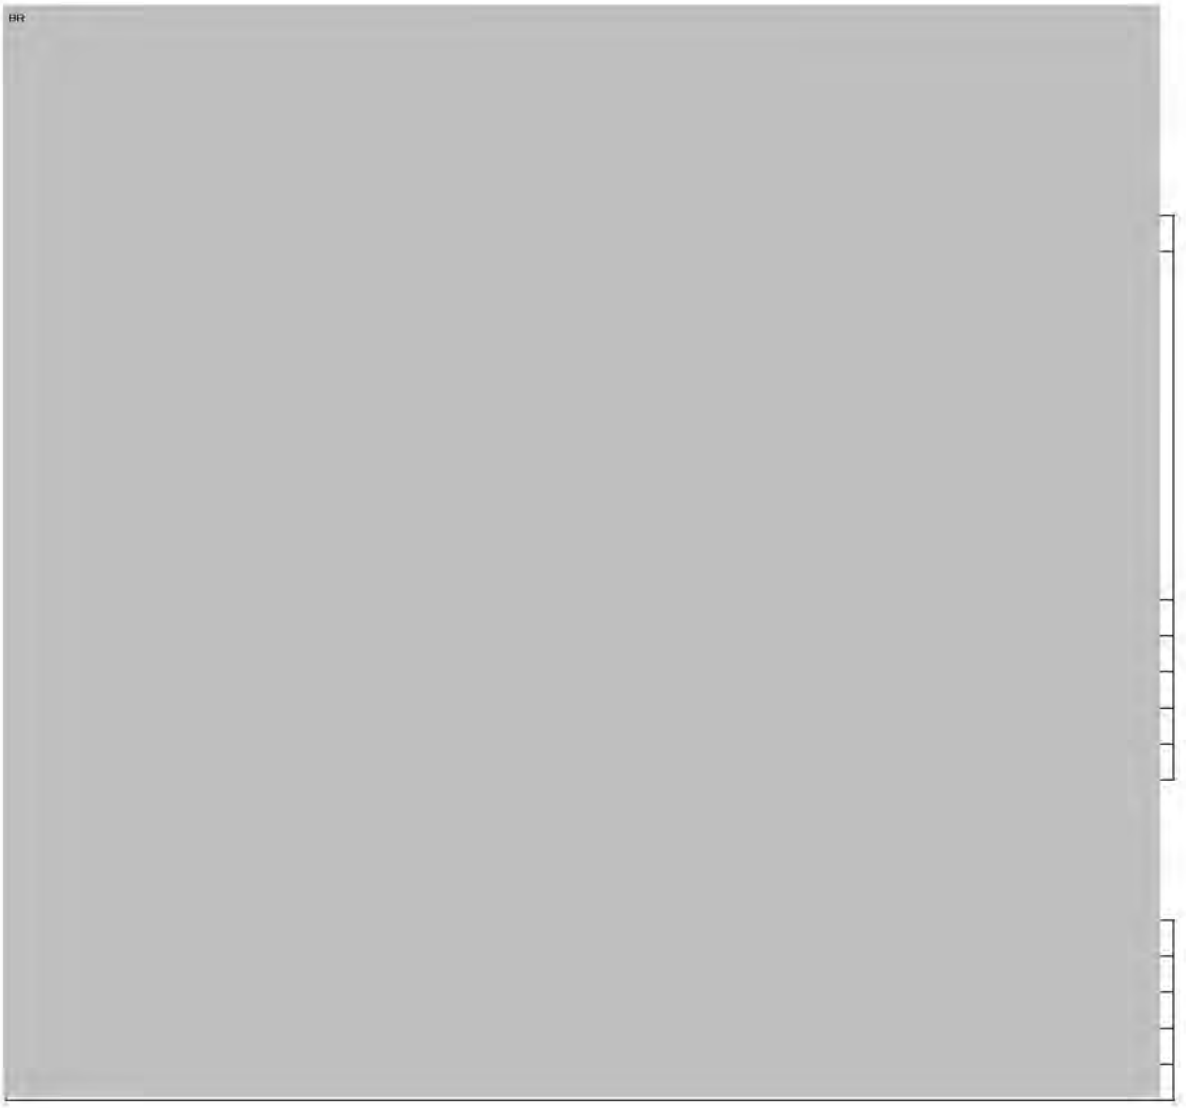

Docnr27



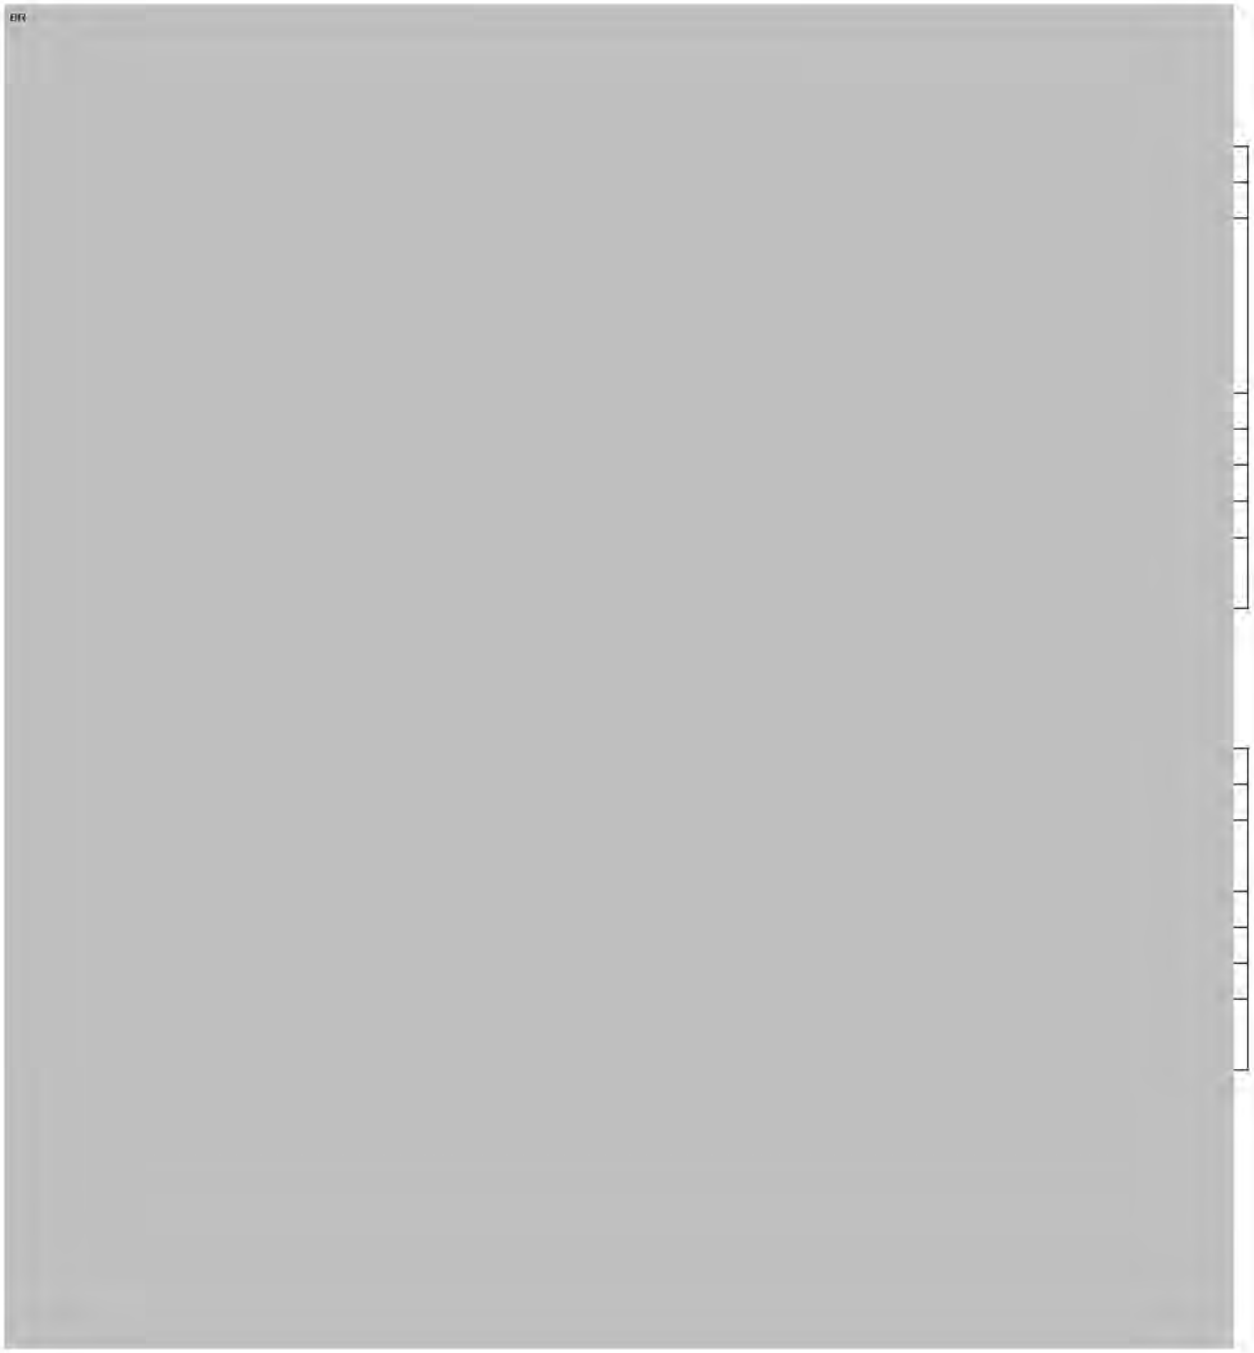

Docnr27

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 30 jun 2020 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 5-jun-20 | 30 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie (incl. consolidatieperiode) vertraagd. Planten laatste groenvoorzieningen in het najaar '20. |
| BR | | | | | |

*

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

Docnr27

Docnr27

BR

Docnr27

Docnr27



Docnr28

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 3e kwartaal 2020

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 20 oktober 2020**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 1.0**

Docnr28

Docnr28



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 2e kwartaal 2020
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-005013

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>15 oktober 2020 | Versie 0.1<br>16 oktober 2020 | Versie 1.0<br>20 oktober 2020 | Versie 1.0<br>27 oktober 2020 | Versie 1.0<br>13 november 2020 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. A. Mulder, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr28



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 9

*2.1 Omgevingsmanagement* *9*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 9
2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie en Vergunningen* *10*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2.2 Komende kwartaal 10

*2.3 Overeenkomsten en verwervingen* *11*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 11
2.3.2 Komende kwartaal 12

*2.4 Communicatie* *13*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 13
2.4.2 Komende kwartaal 13
2.4.3 Diversen 14

3 Projectvoortgang 15

*3.1 Aanbesteden en contracteren* *15*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 15
3.1.2 Komende kwartaal 15

*3.2 Vormgeving* *16*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 16
3.2.2 Komende kwartaal 17

*3.3 Inpassing Binckhorst* *18*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 18
3.3.2 Komende kwartaal 18

*3.4 Inpassing Vlietzoom* *19*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 19
3.4.2 Komende kwartaal 19

*3.5 Inpassing Laan van Hoornwijck* *20*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 20
3.5.2 Komende kwartaal 20

*3.6 Boortunnel en toeritten* *21*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 21
3.6.2 Komende kwartaal 21

*3.7 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *23*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 23
3.7.2 Komende kwartaal 23

*3.8 Installaties* *24*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 24
3.8.2 Komende kwartaal 24

*3.9 Veiligheid en gezondheid* *26*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 26

Docnr28



3.9.2 Komende kwartaal 26

*3.10 Bediencentrale* *27*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 27
3.10.2 Komende kwartaal 28

*3.11 Uitvoeringskwaliteit* *29*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 29
3.11.2 Komende kwartaal 29

*3.12 Contractmanagement* *30*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 30
3.12.2 Komende kwartaal 30

4 Overdracht en openstelling 31

*4.1 Tunnelveiligheid* *31*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 31
4.1.2 Komende kwartaal 31

*4.2 Overdracht aan beheerders* *32*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 32
4.2.2 Komende kwartaal 32

*4.3 Beheer en onderhoud* *33*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 33
4.3.2 Komende kwartaal 33

5 Projectbeheersing 34

*5.1 Scope* *34*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 34
5.1.2 Komende kwartaal 34

*5.2 Financiën* *35*
5.2.1 Kostenstructuur 35
5.2.2 Budget 36

*5.3 Planning* *38*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 38
5.3.2 Komende kwartaal 38

*5.4 Risico's* *39*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 39
5.4.2 Komende kwartaal 39
5.4.3 Financiële toprisico's 39
5.4.4 Toprisico's planning 40

*5.5 Interne kwaliteit* *41*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 41
5.5.2 Komende kwartaal 41

*5.6 Informatiebeheer* *42*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 42
5.6.2 Komende kwartaal 42
5.6.3 Kennisdeling 42

*5.7 Organisatie* *43*
5.7.1 Afgelopen kwartaal 43

Docnr28



5.7.2 Komende kwartaal 43

6 Bijlage: Planningsmijlpalen 44

7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 45

8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 47

# 1 Managementsamenvatting

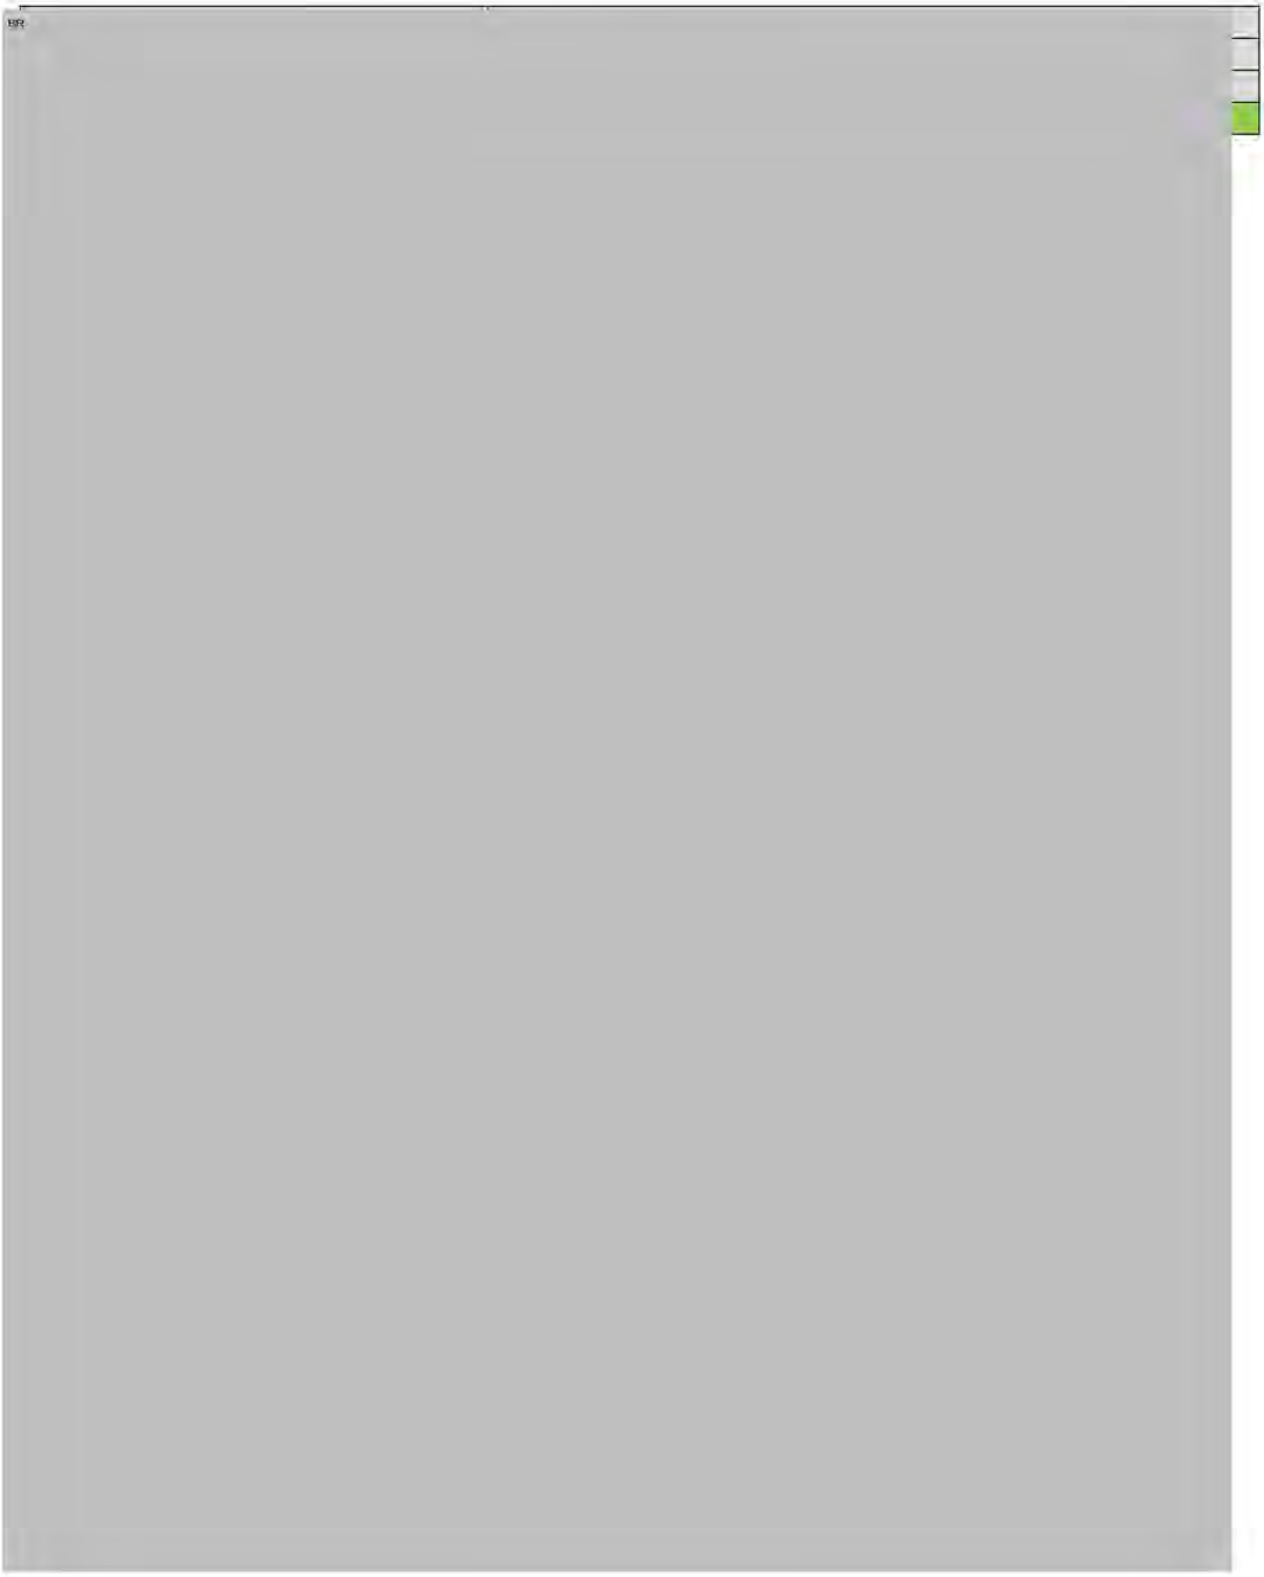

## 4. TERUGBLIK AFGELOPEN KWARTAAL

Afgelopen kwartaal is er onder andere gewerkt aan:

- 1 juli heeft CRB het gerealiseerde werk in diverse deelgebieden opgeleverd. Dat betreffen de maaiveldonderdelen rond de A4/A13, Molenvlietpark Noord en West, de voorzieningen van familiepark Drievliet en de maaiveldinrichting in de Binckhorst. Voor ieder deelgebied resteert nog een lijst met af te handelen restpunten;
- 9 juli is het tweede deel van het Molenvlietpark, fietspaden en Heemtuin, opengesteld voor publiek.
- De bouwkundige- en civiele werkzaamheden zijn afgerond en hiervan moeten nu alleen nog de restpunten uitgevoerd of hersteld worden;

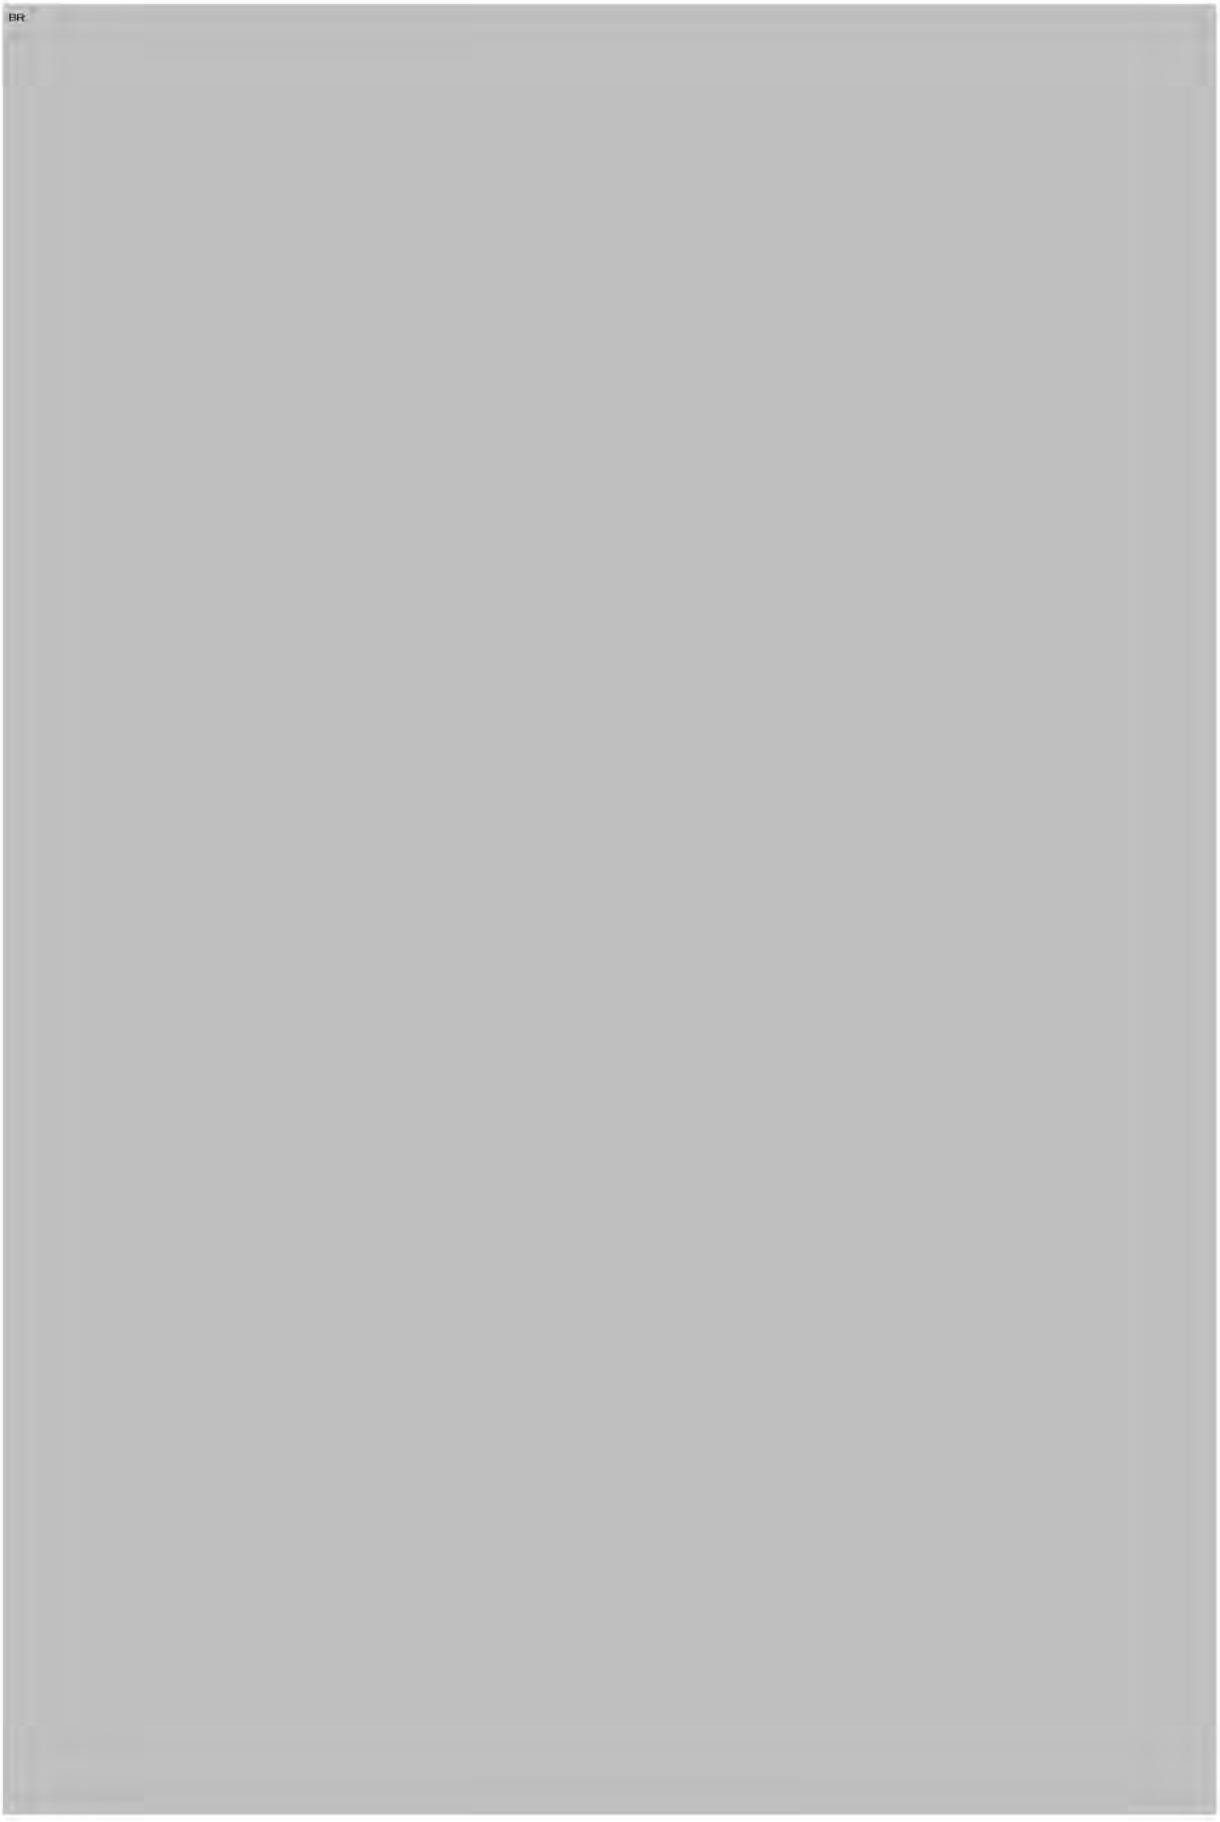
BR

BR Ook is na de openstelling van de Rotterdamsebaan voor het verkeer nog een aantal andere activiteiten voorzien zoals: de bouw van de bediencentrale, beide kunsttrajecten en het realiseren van de tweede watertoevoer tot de berging in het Molenvlietpark.

BR

Docnr28



# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorig kwartaal | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Beantwoorden diverse vragen van omwonenden. | Diverse vragen van omwonenden zijn beantwoord. De vragen hadden voornamelijk betrekking op de inrichting en het gebruik van het Molenvlietpark. |
| In samenwerking met landschapsarchitect en Hoogheemraadschap en in afstemming met gemeente Rijswijk en een tweetal bewoners uit Park Hoornwijck onderzoeken naar mogelijkheden landschappelijke inpassing en aanpassing aflaat-constructie in Molenvlietpark. | Het voorstel van de landschapsarchitect is besproken met de bewoners (in aanwezigheid van vertegenwoordiger gemeente Rijswijk). Bewoners zijn tevreden met het voorstel. Het ontwerp is aan CRB aangeboden met het verzoek de werkzaamheden in het 4e kwartaal 2020 uit te voeren. |
| **Overige / extra verrichte werkzaamheden** | |
| Geen. | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen. | Geen. |

[redacted]

## 2.2 Planologie en Vergunningen

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Ontwerp-besluit afwachten op kapaanvraag en aangevraagde ontheffing Wet natuurbescherming in verband met aanleg tweede watertoevoer. | ODH heeft aangegeven dat er voor de nog te kappen bomen geen ontheffing nodig is.<br>De dode boom waarin een vleermuisverblijfplaats aanwezig was is op natuurlijke wijze afgebroken. Hierdoor heeft de gevraagde kapvergunning geen effect meer op vleermuisverblijfplaatsen.<br>Wegens voortschrijdend inzicht in het ontwerpproces en het vervallen van de noodzaak voor een ontheffing Wet natuurbescherming zal Roba de oorspronkelijke kapaanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag kapvergunning bij Den Haag indienen. Naar verwachting kan die via een korte procedure beoordeeld worden en ter inzage worden gelegd. |
| [redacted] | |

### 2.2.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| [redacted] |
| Ontwerp-besluit afwachten op kapaanvraag in verband met aanleg tweede watertoevoer. |
| [redacted] |

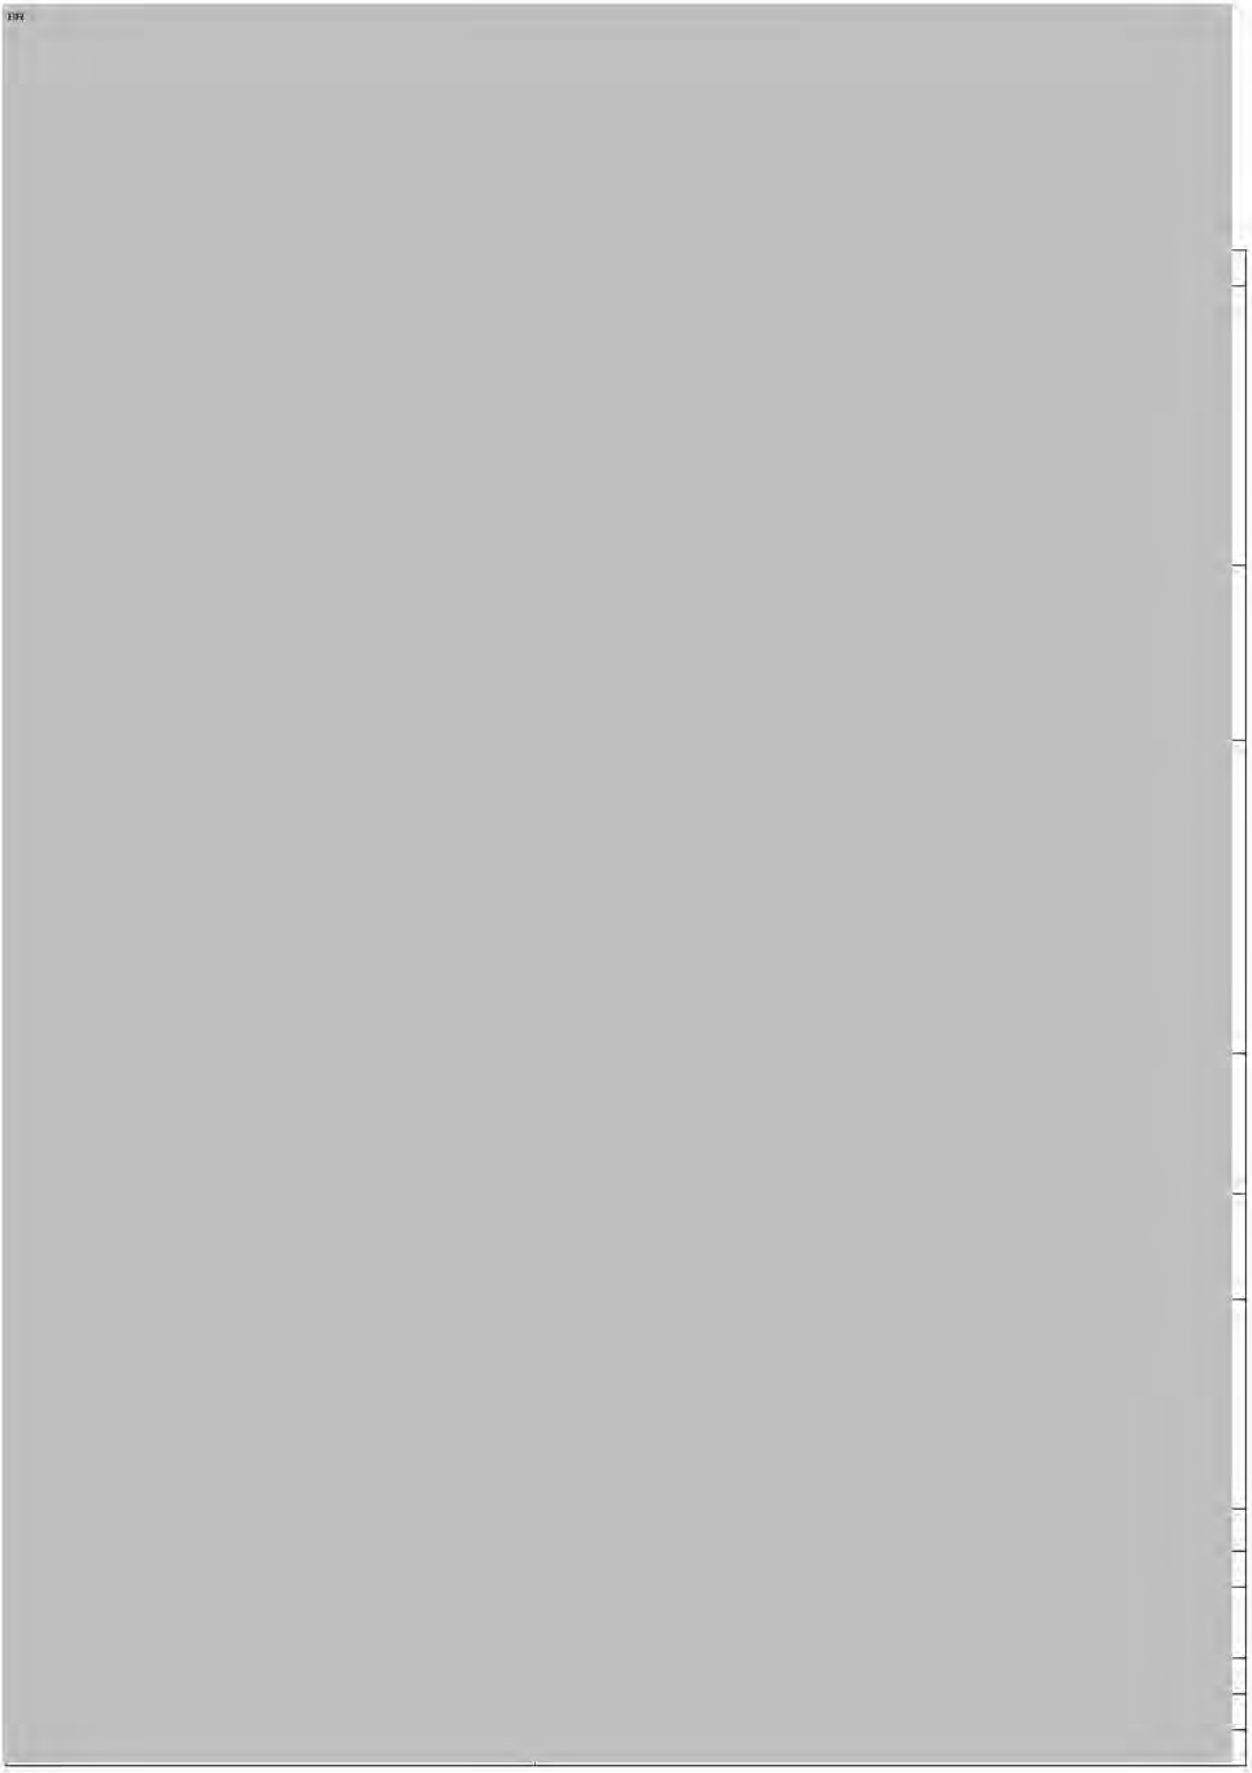

## 2.4 Communicatie

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

| |
|---|
| |
| **Overige / extra verrichte werkzaamheden** |
| |
| Begin juli ging het Molenvlietpark in zijn geheel open. Vanwege de geldende coronamaatregelen is hiervoor geen bijeenkomst met publiek georganiseerd. Er werden verschillende berichten over het park gedeeld via de social mediakanalen van de Rotterdamsebaan. In de lokale media verschenen verschillende positieve artikelen over het park.<br>In overleg met het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg en de landschapsarchitect worden informatieborden gemaakt over de heemtuin in het Molenvlietpark (te plaatsen bij de ingang van de heemtuin) en het park in het algemeen (te plaatsen bij de belangrijkste ingangen van het park). |

| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
|---|---|
| Geen. | Geen. |

### 2.4.3 Diversen

BR

Mailbox Rotterdamsebaan

BR

Vragen waren divers en gingen o.a. over regels die gelden in het Molenvlietpark (moeten honden aan de lijn, waar meld ik overlast) BR

BR

Docnr28



# 3 Projectvoortgang

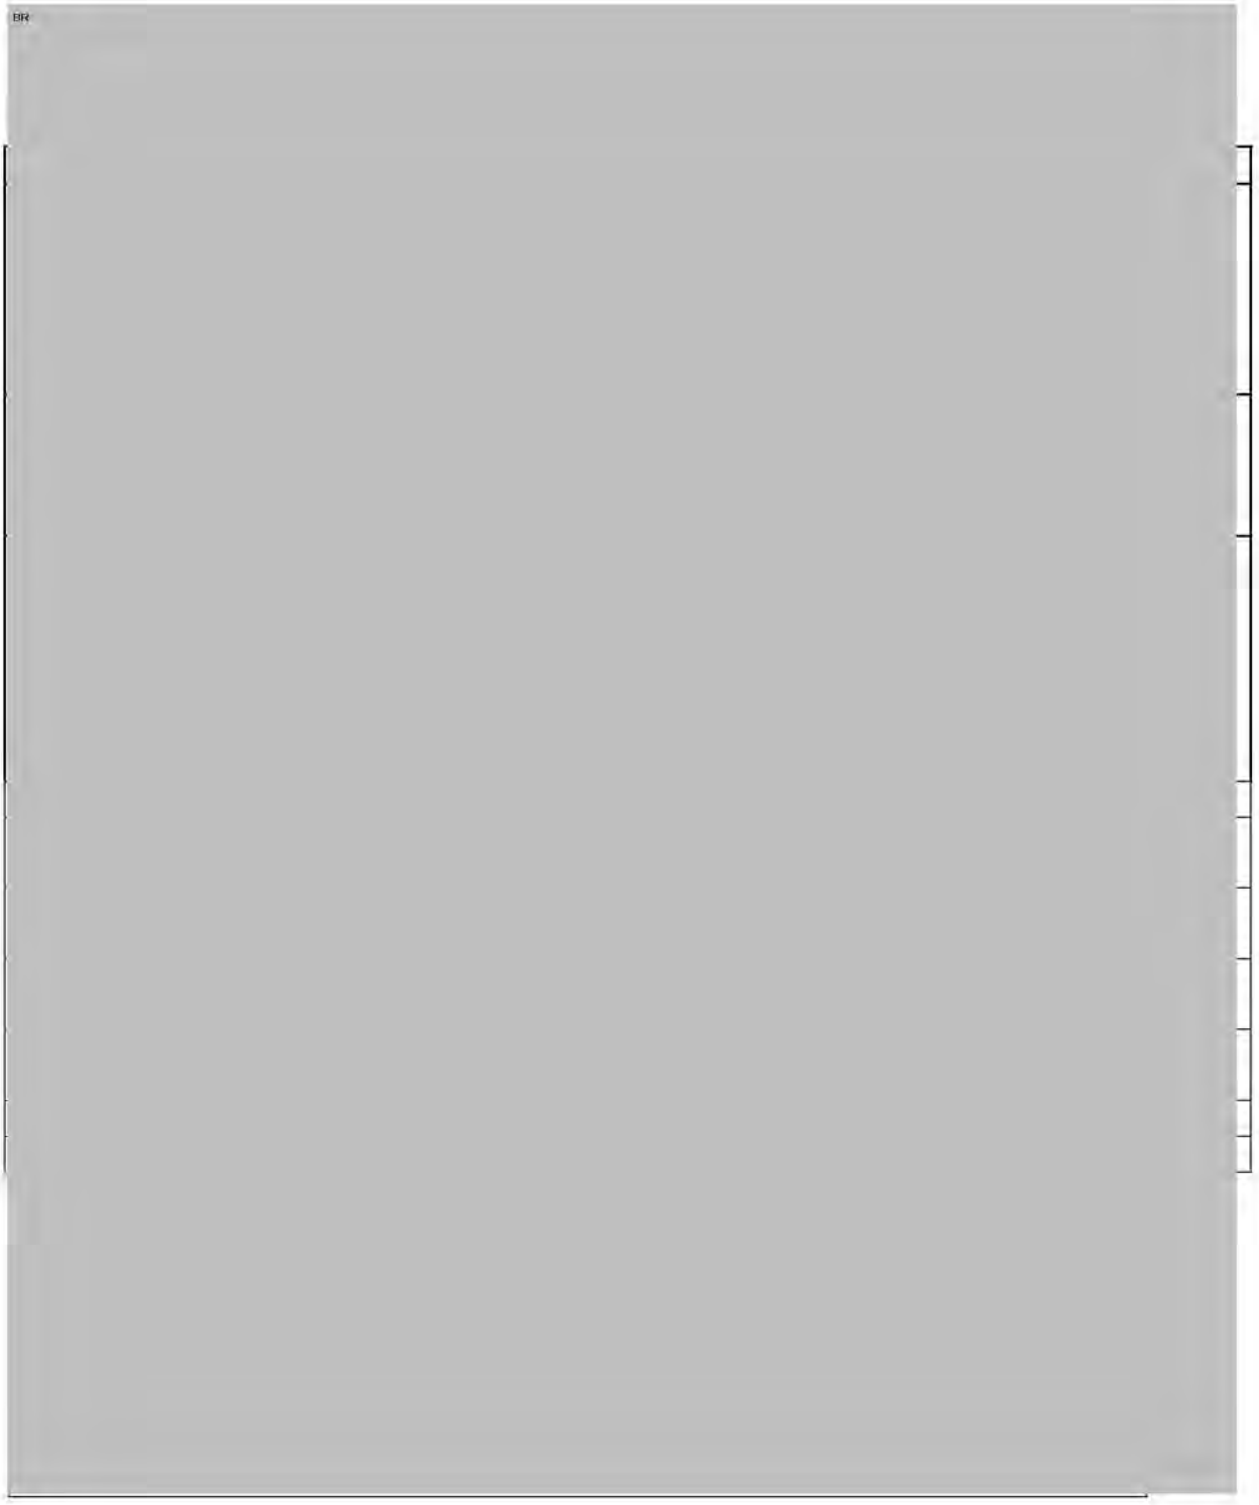

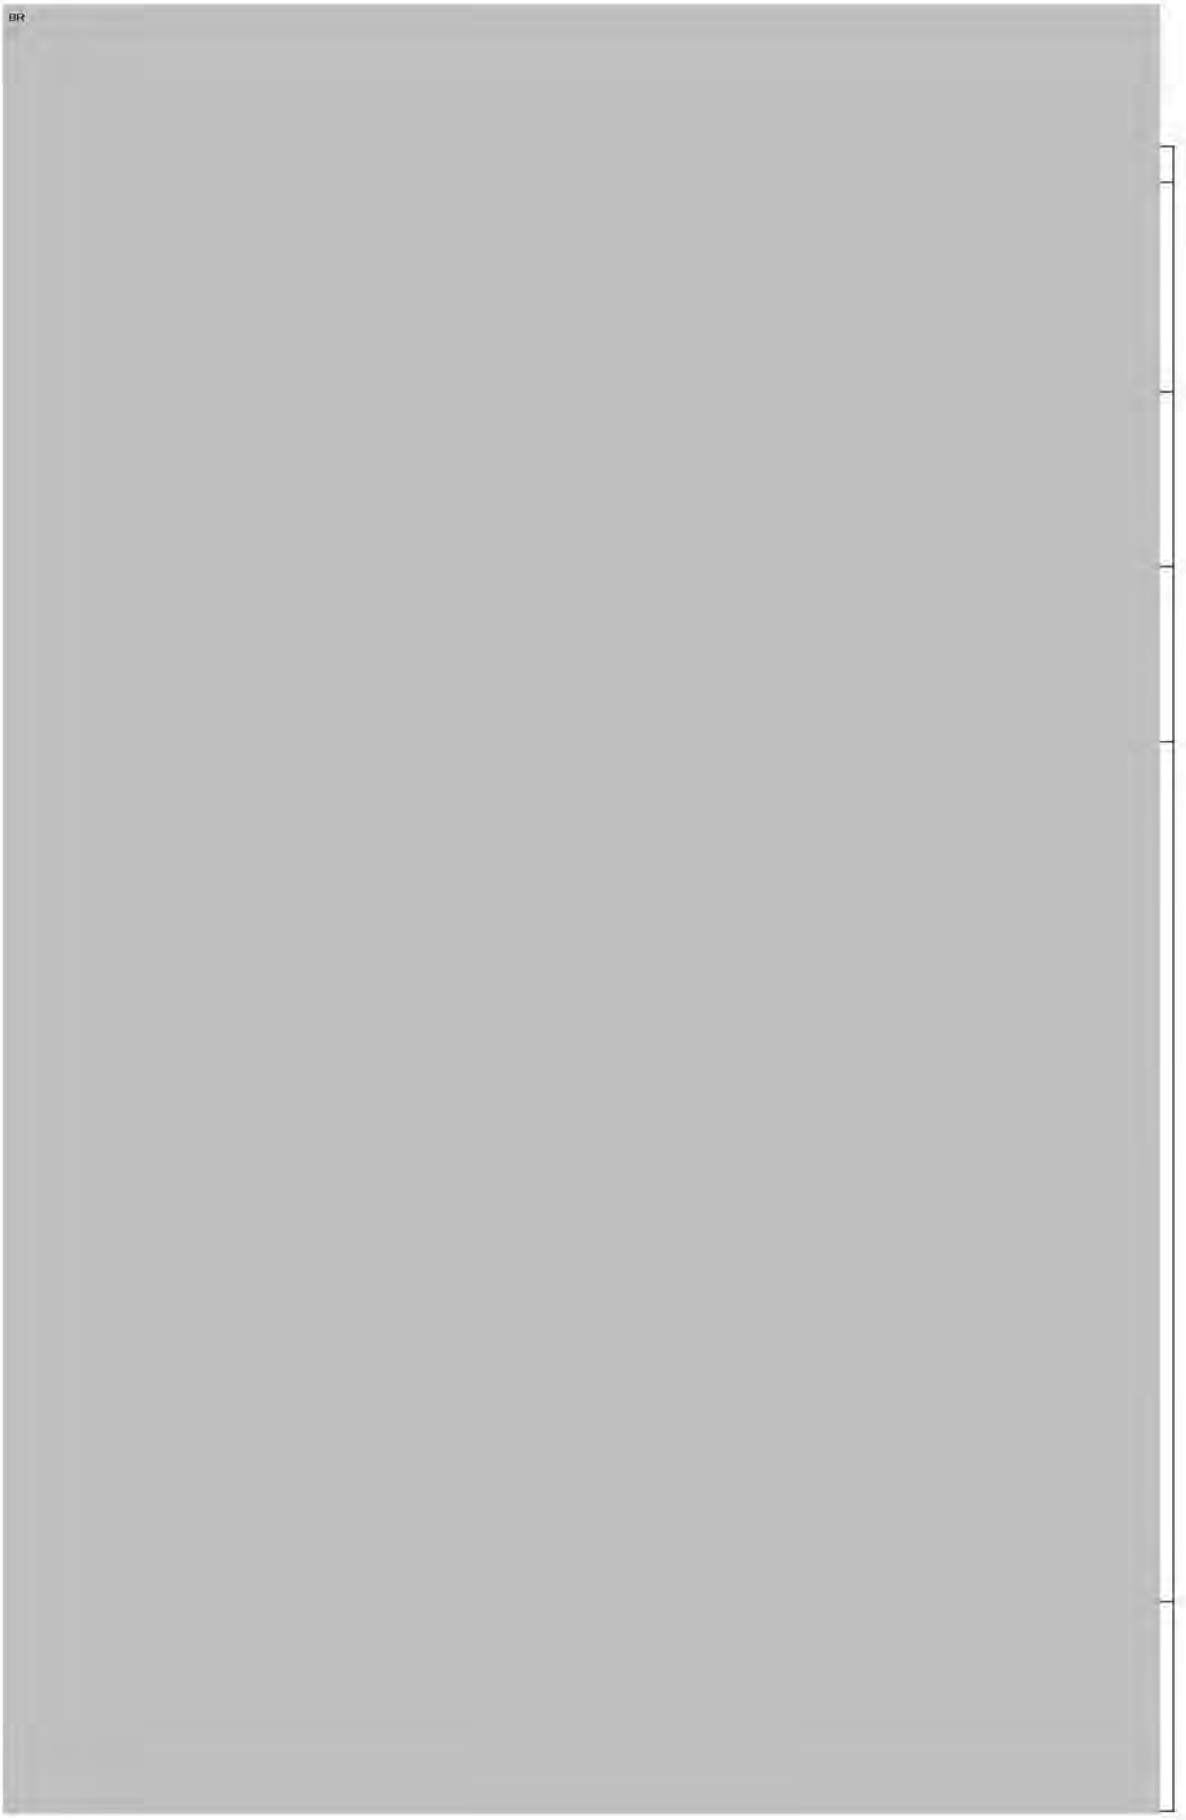
BR

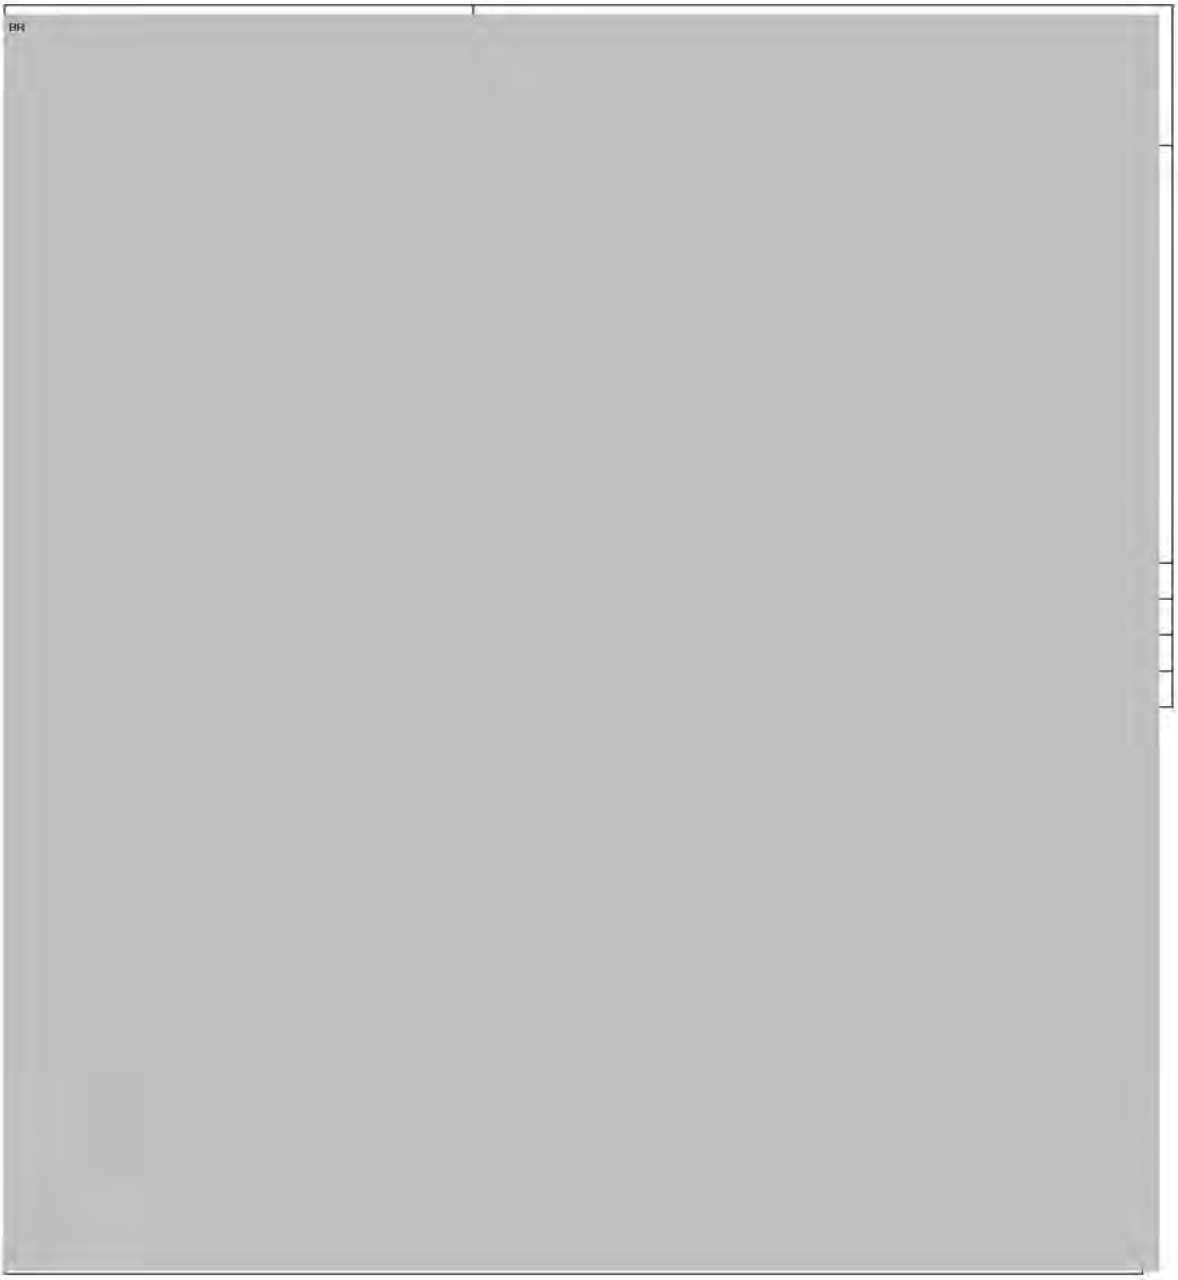
BR

BR

## 3.4 Inpassing Vlietzoom

### 3.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Molenvlietpark West (rond waterberging): Per 1 juli zal het Molenvlietpark West door CRB worden opgeleverd. Na oplevering zal CRB nog diverse restpunten oplossen, waaronder het plaatsen van het trekpontje. | CRB heeft op 1 juli jl. het Molenvlietpark West opgeleverd. Diverse restpunten zijn opgelost, maar de restpunten m.b.t. het trekpontje (afgekeurd door het Keurmerkinstituut), de beplanting (plantseizoen start medio november) en de waterhuishoudkundige kunstwerken (diverse bevindingen hoogheemraadschap) staan voor een deel nog open. |
| Molenvlietpark Noord (Heemtuin): Per 1 juli zal het Molenvlietpark Noord door CRB worden opgeleverd. Na oplevering zal CRB nog diverse restpunten oplossen. | CRB heeft op 1 juli jl. het Molenvlietpark Noord opgeleverd. Diverse restpunten zijn opgelost, maar de restpunten m.b.t. de beplanting (plantseizoen start medio november) en de fietspaden (afwatering en asfaltschade) staan voor een deel nog open. |
| [redacted] | |

### 3.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| CRB zal de nog resterende restpunten uit de diverse deelopleveringen oplossen. |
| De inpassing van de aflaatconstructie van de waterberging zal (n.a.v. klachten van omwonenden) worden verbeterd. Het betreft o.a. het dempen van een waterkom, het bekleden van de damwanden en het planten van diverse struiken. |
| |
| **Besluiten** |
| Geen. |

BR

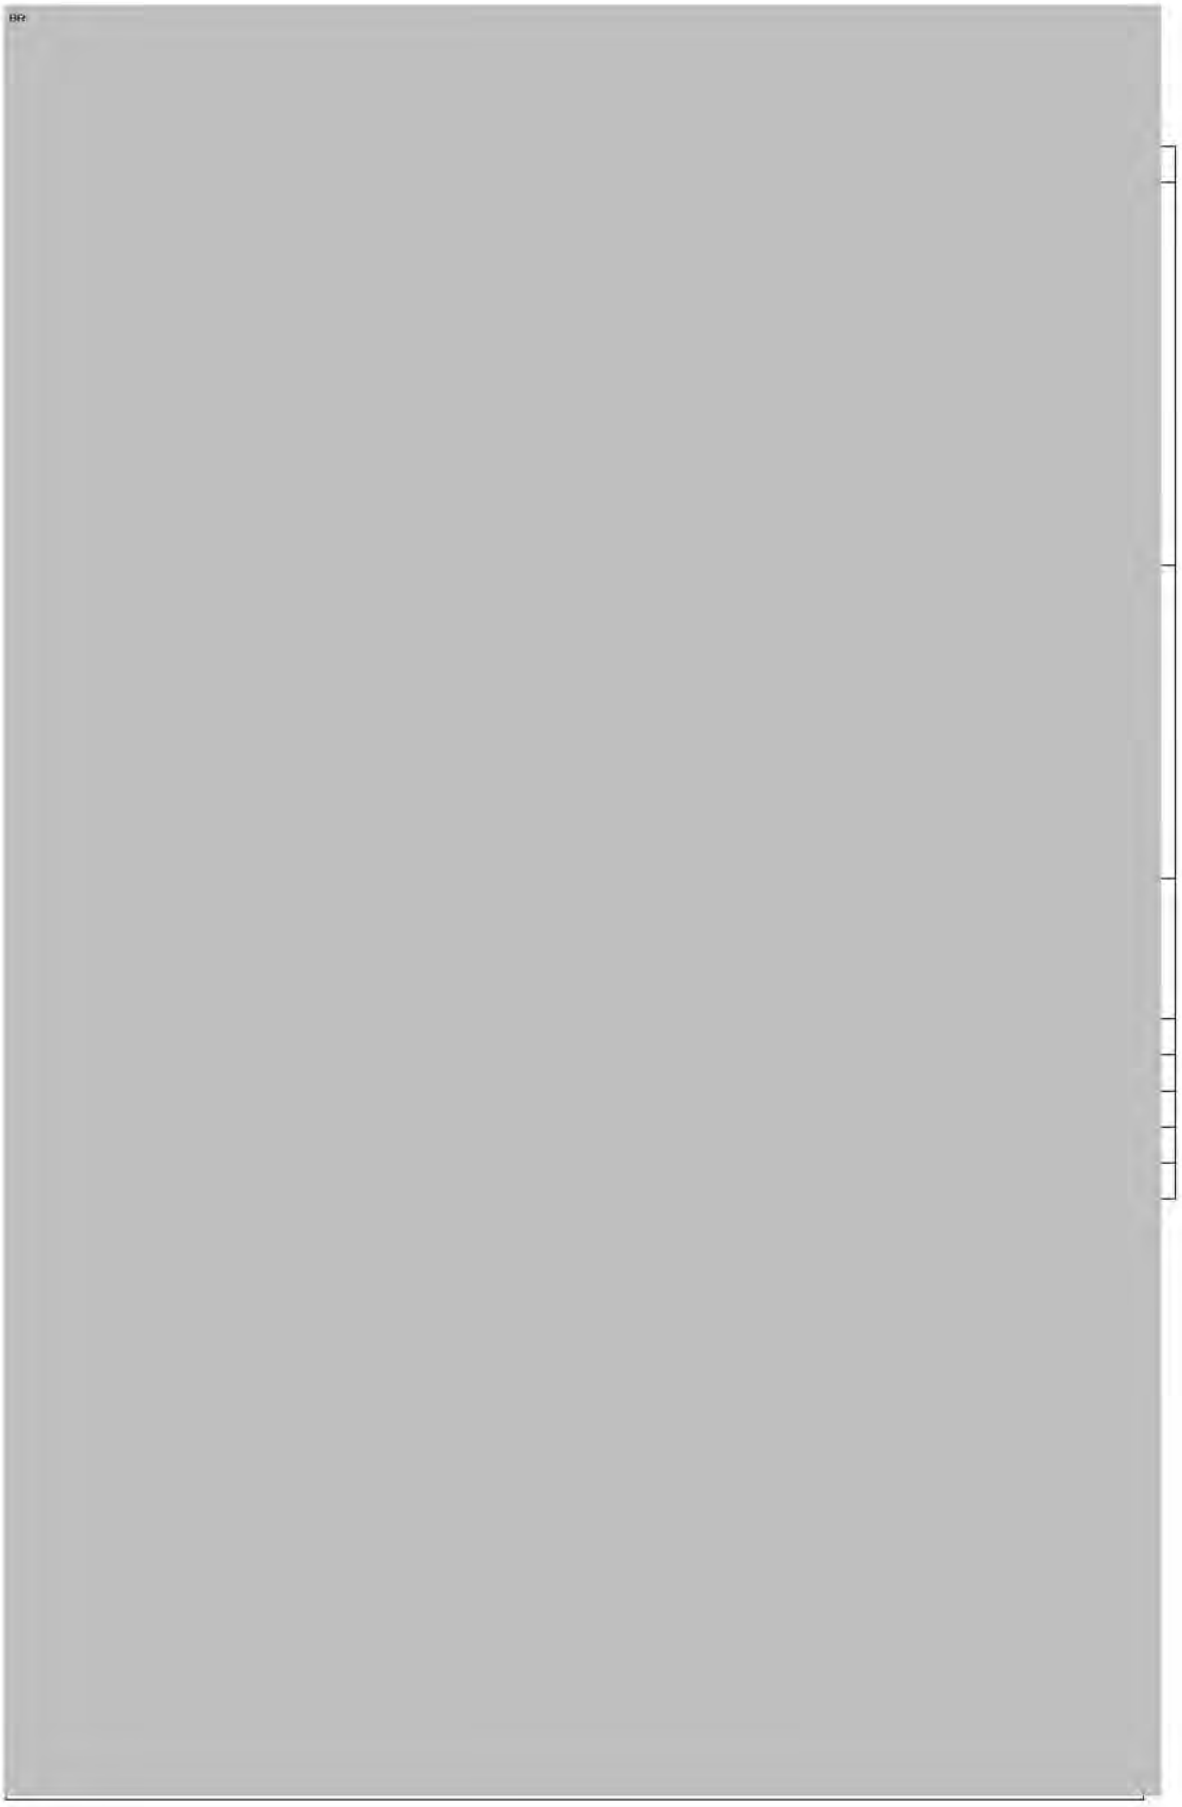

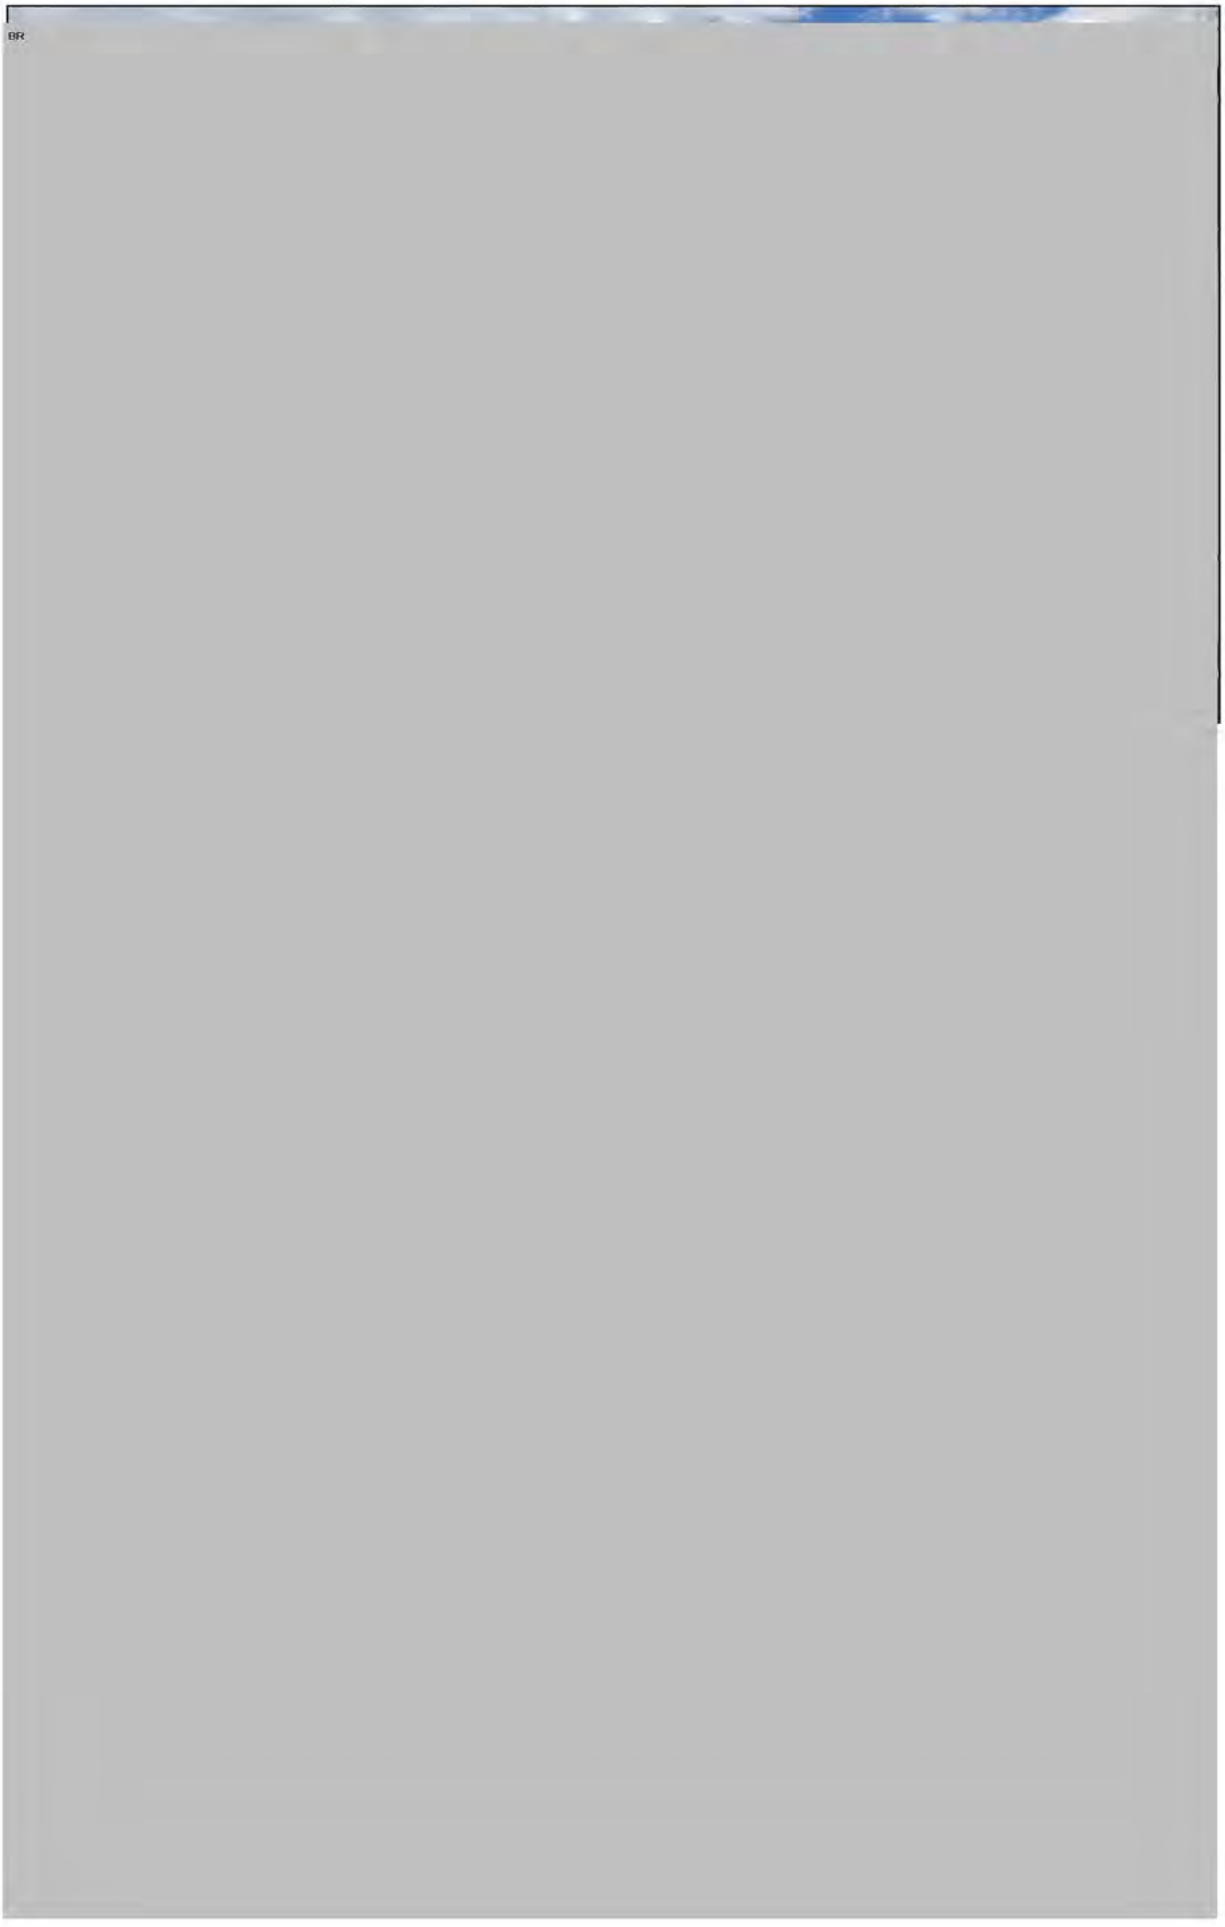
BR

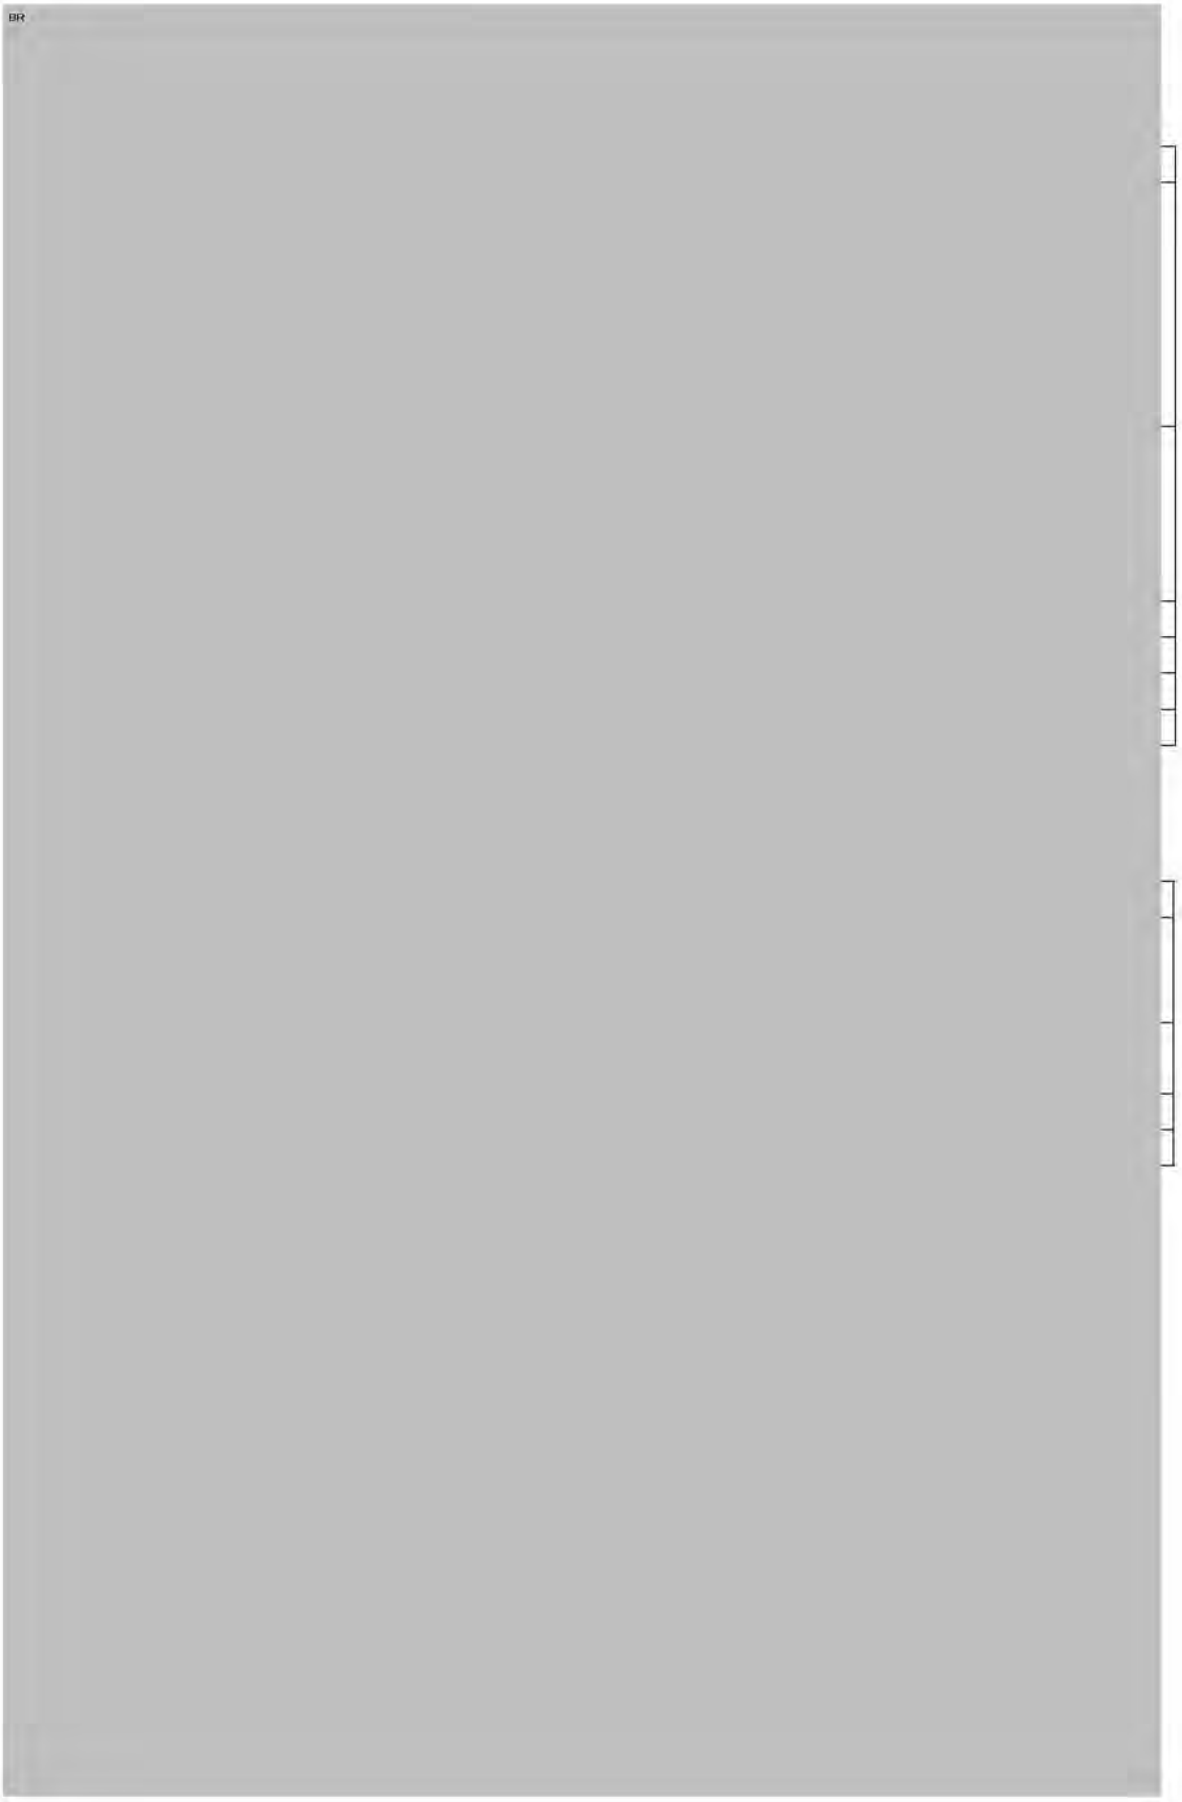

Docnr28



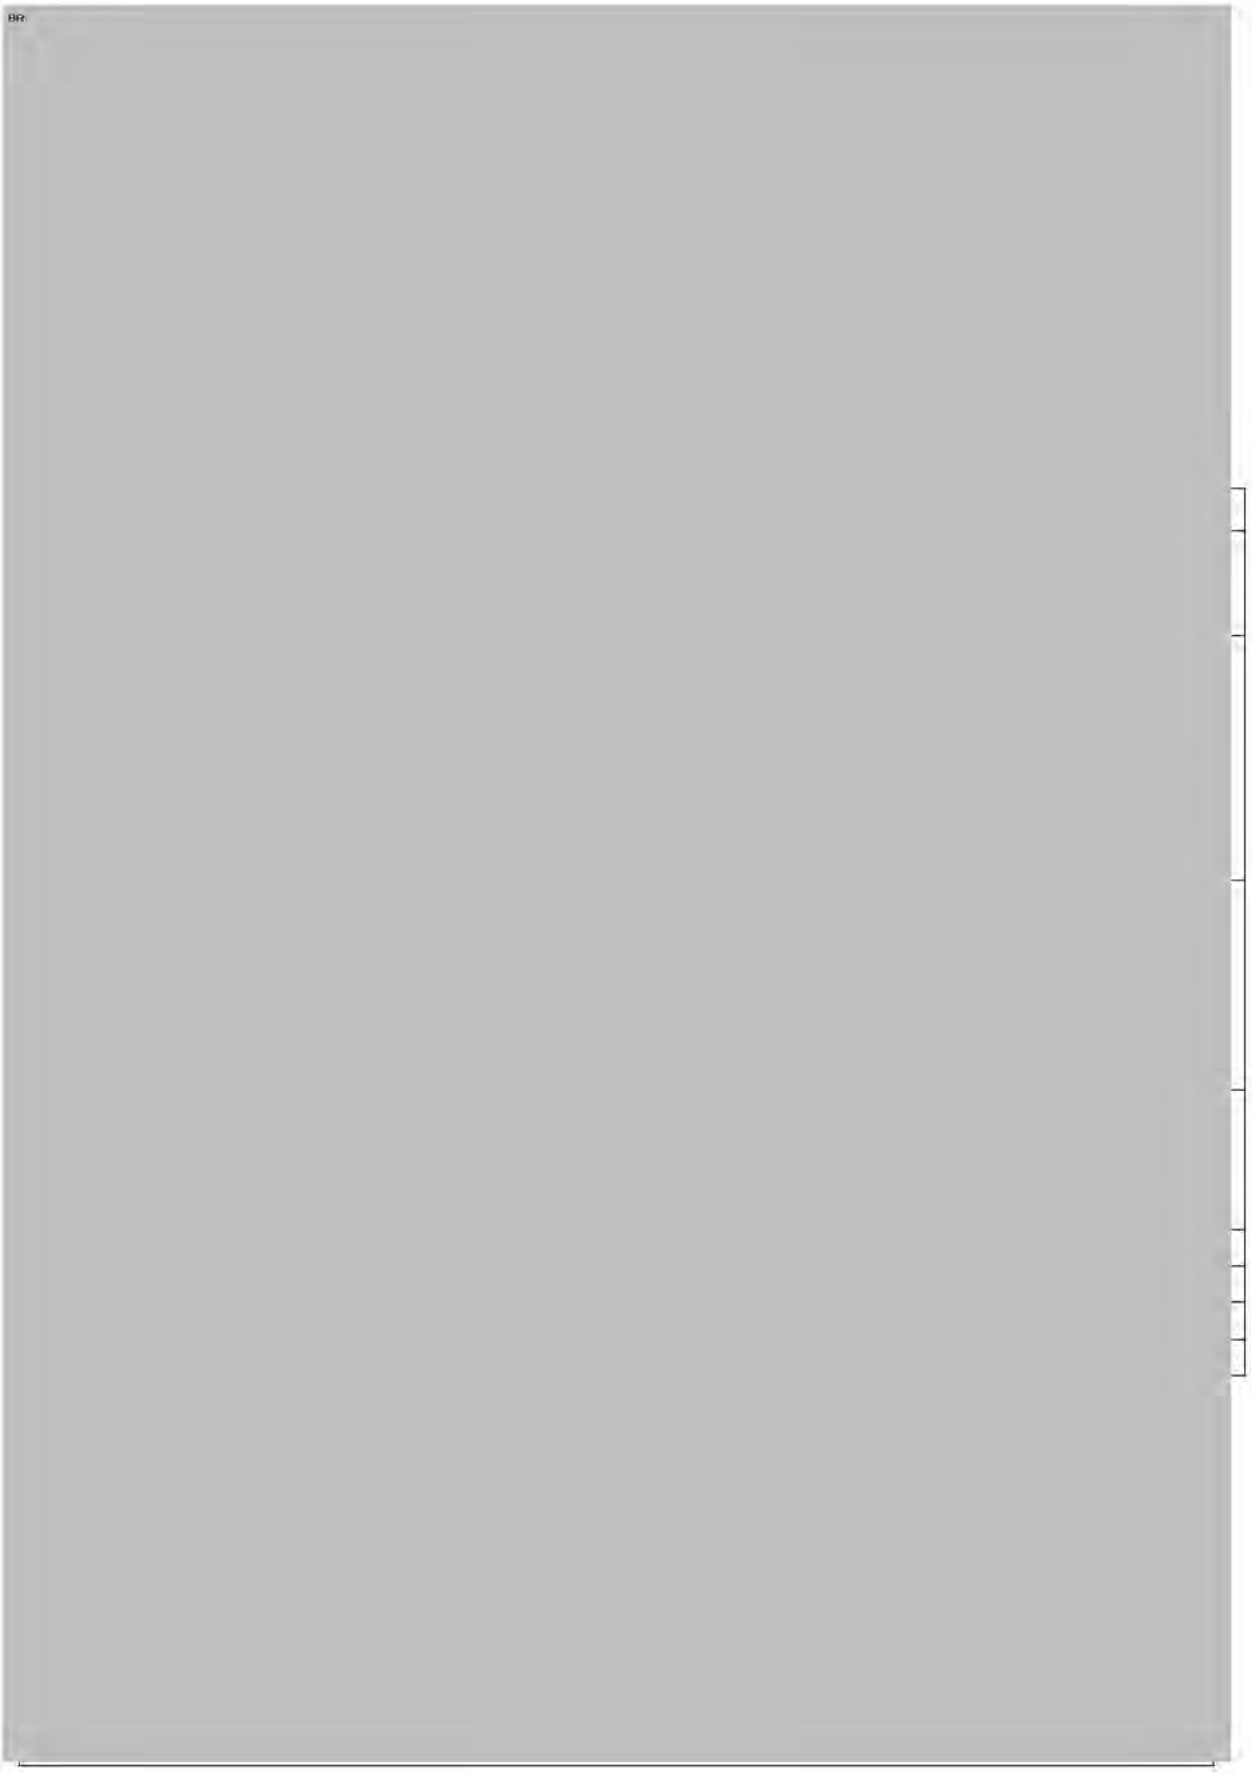

Docnr28



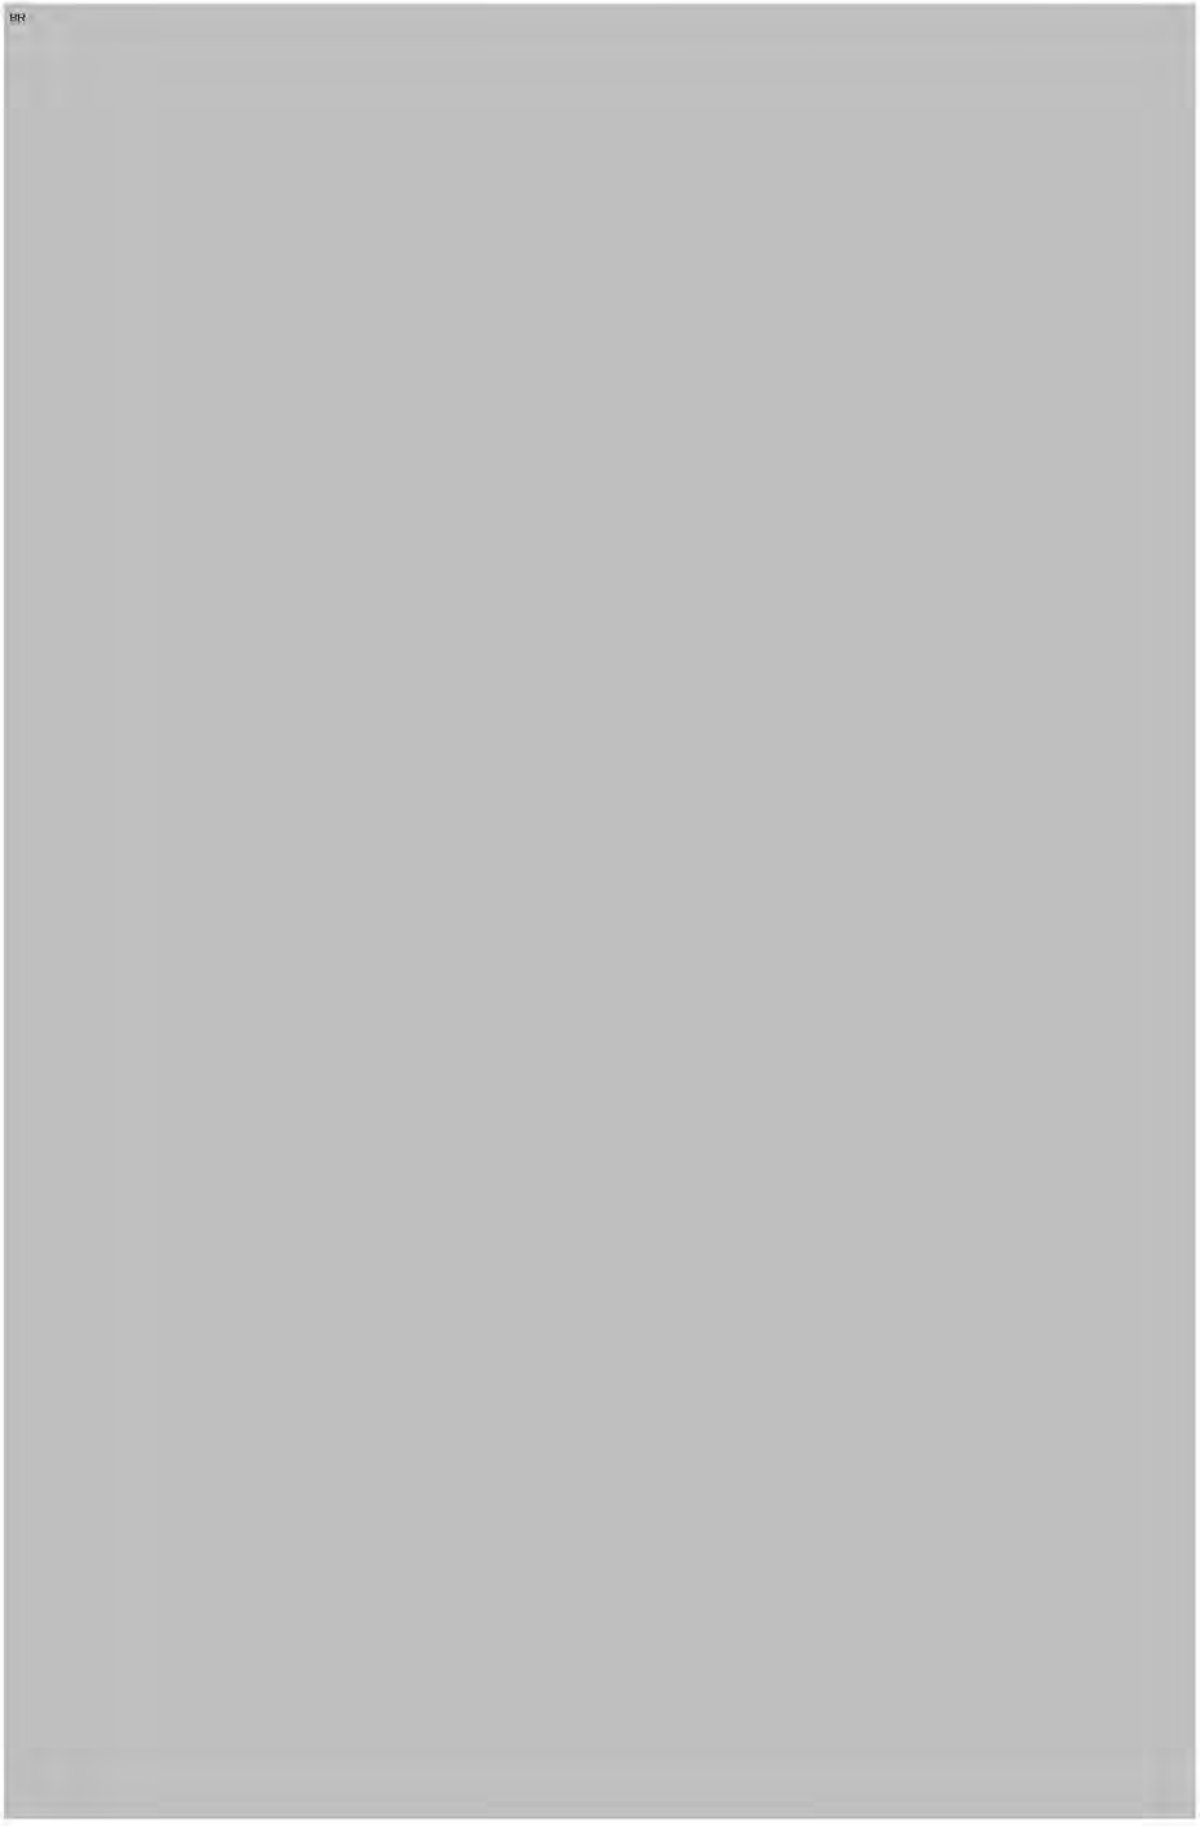

BR

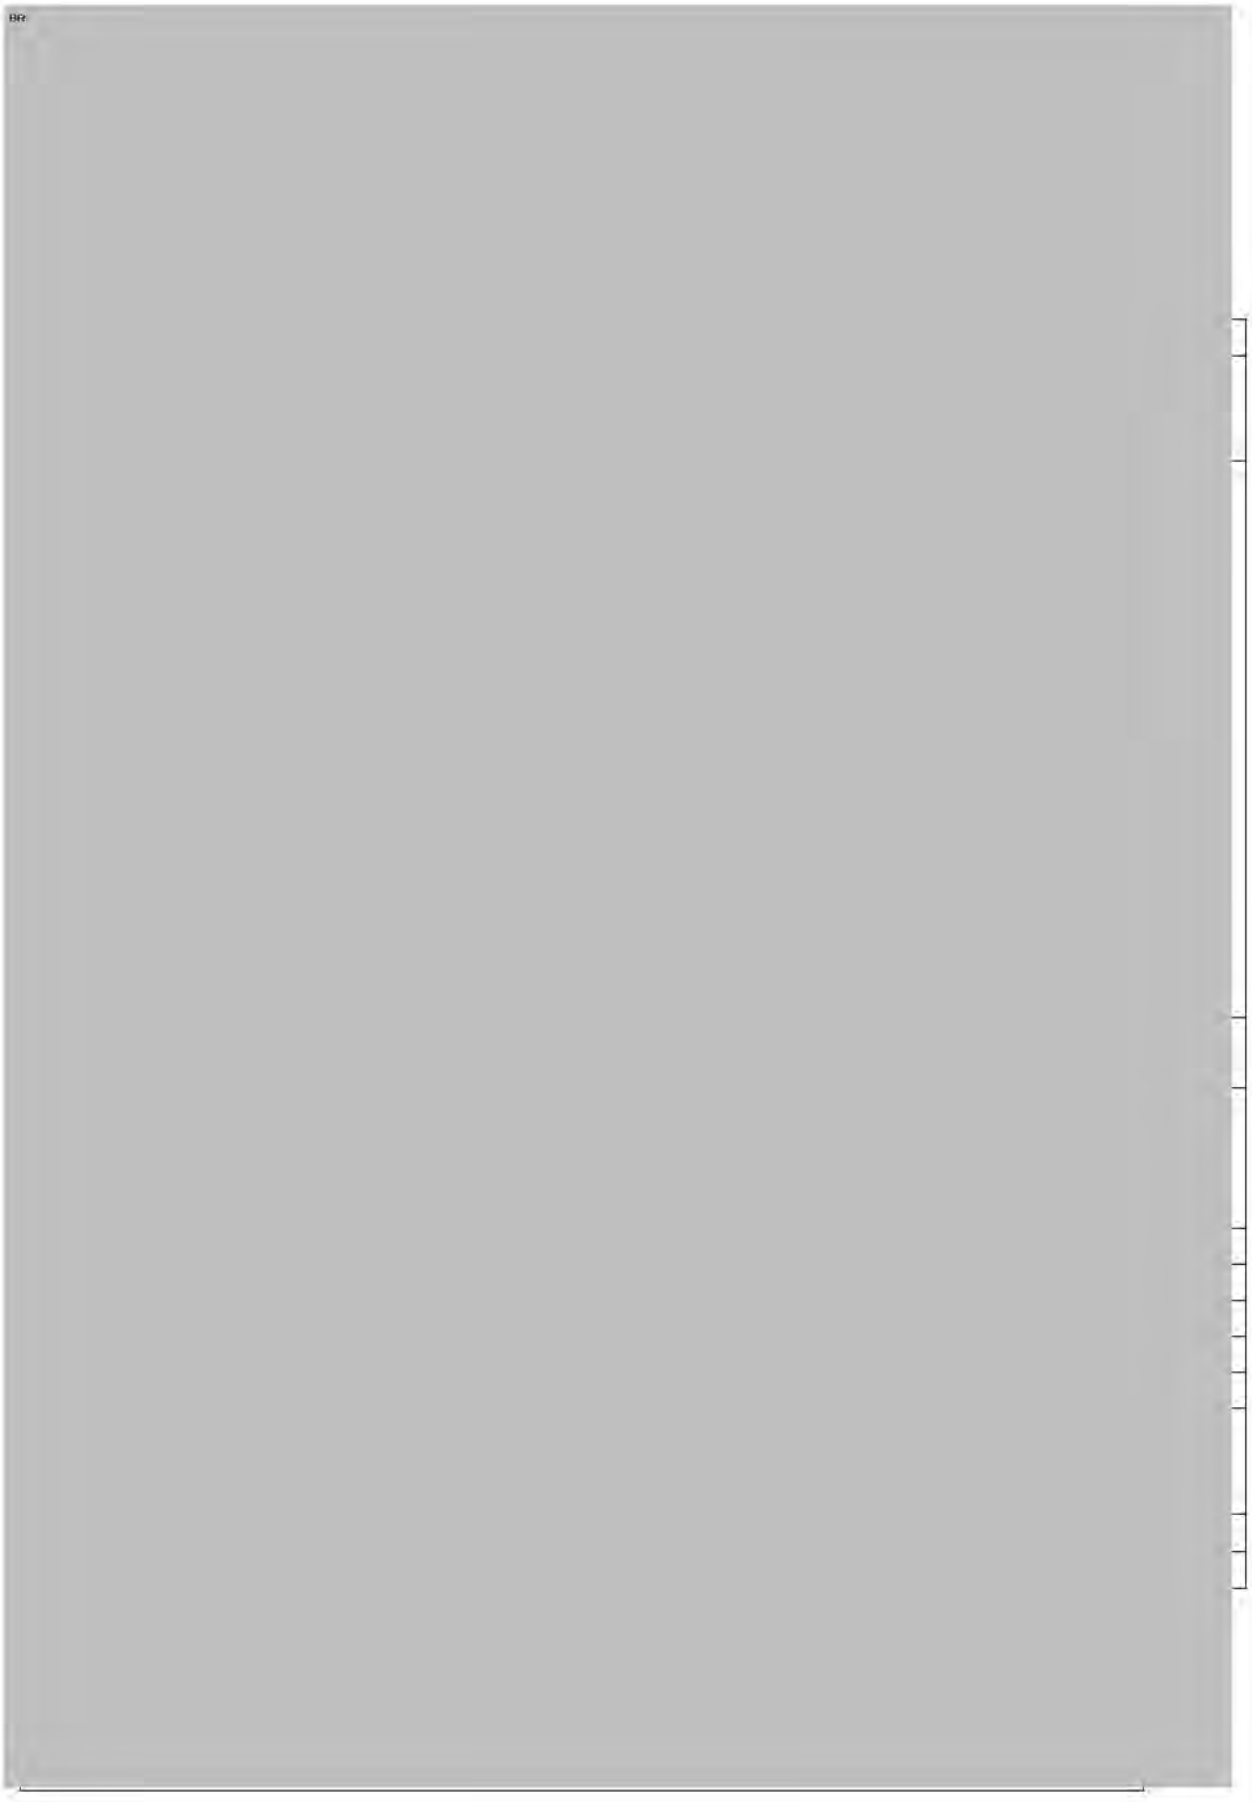

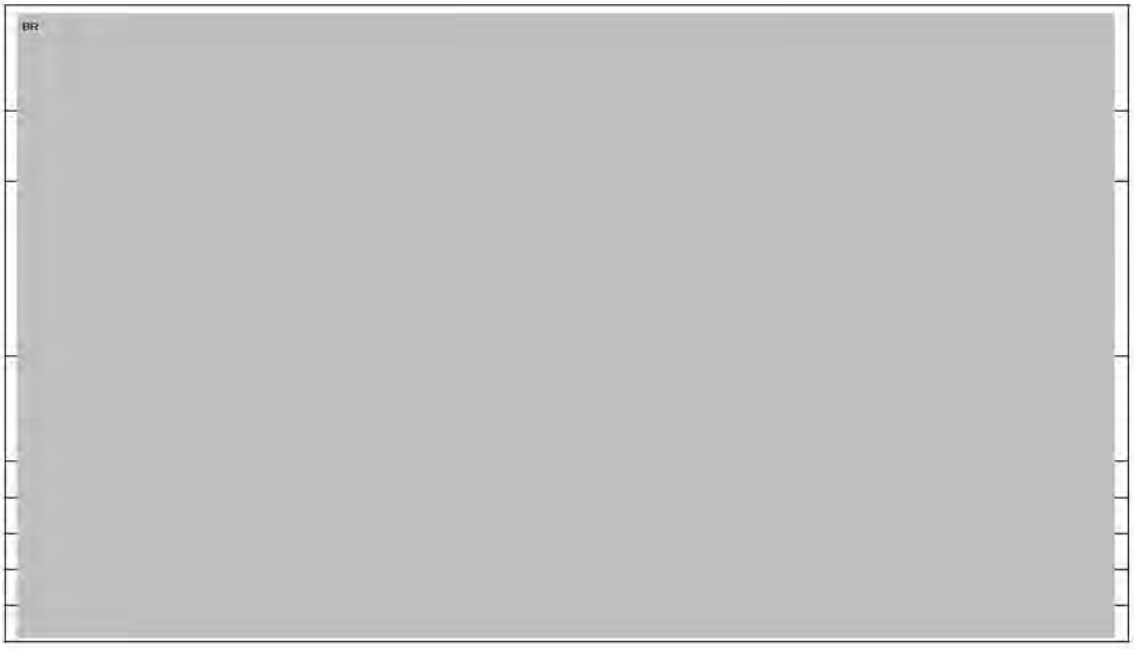
BR

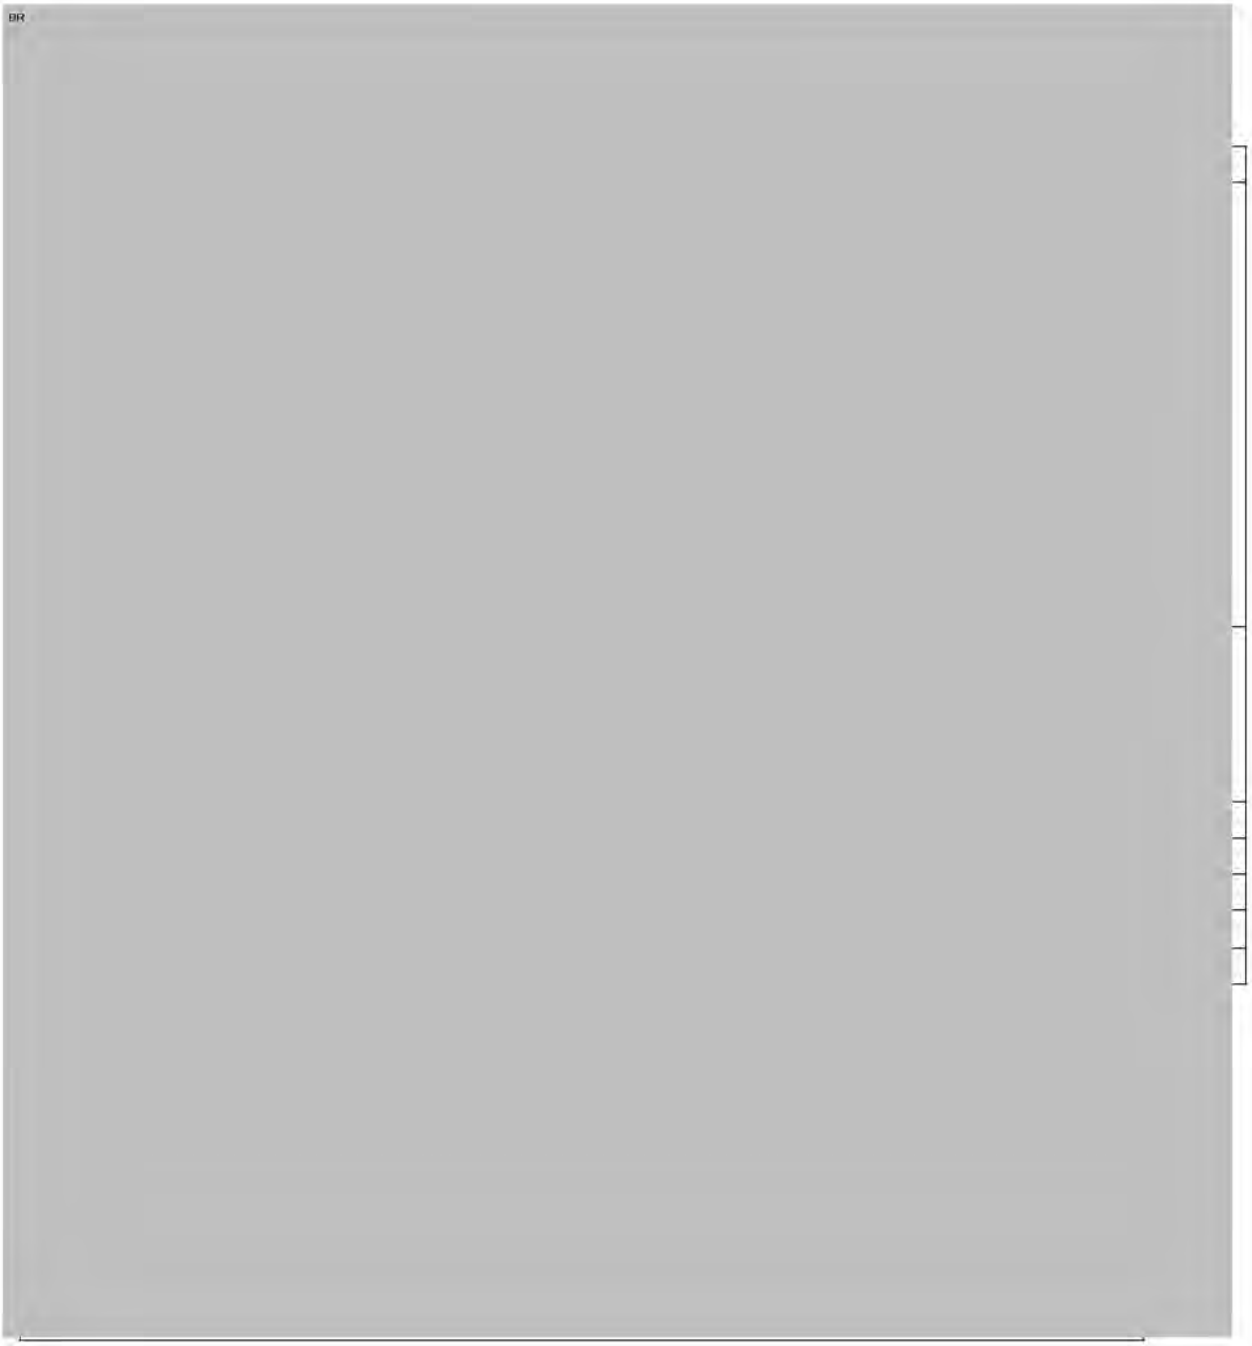

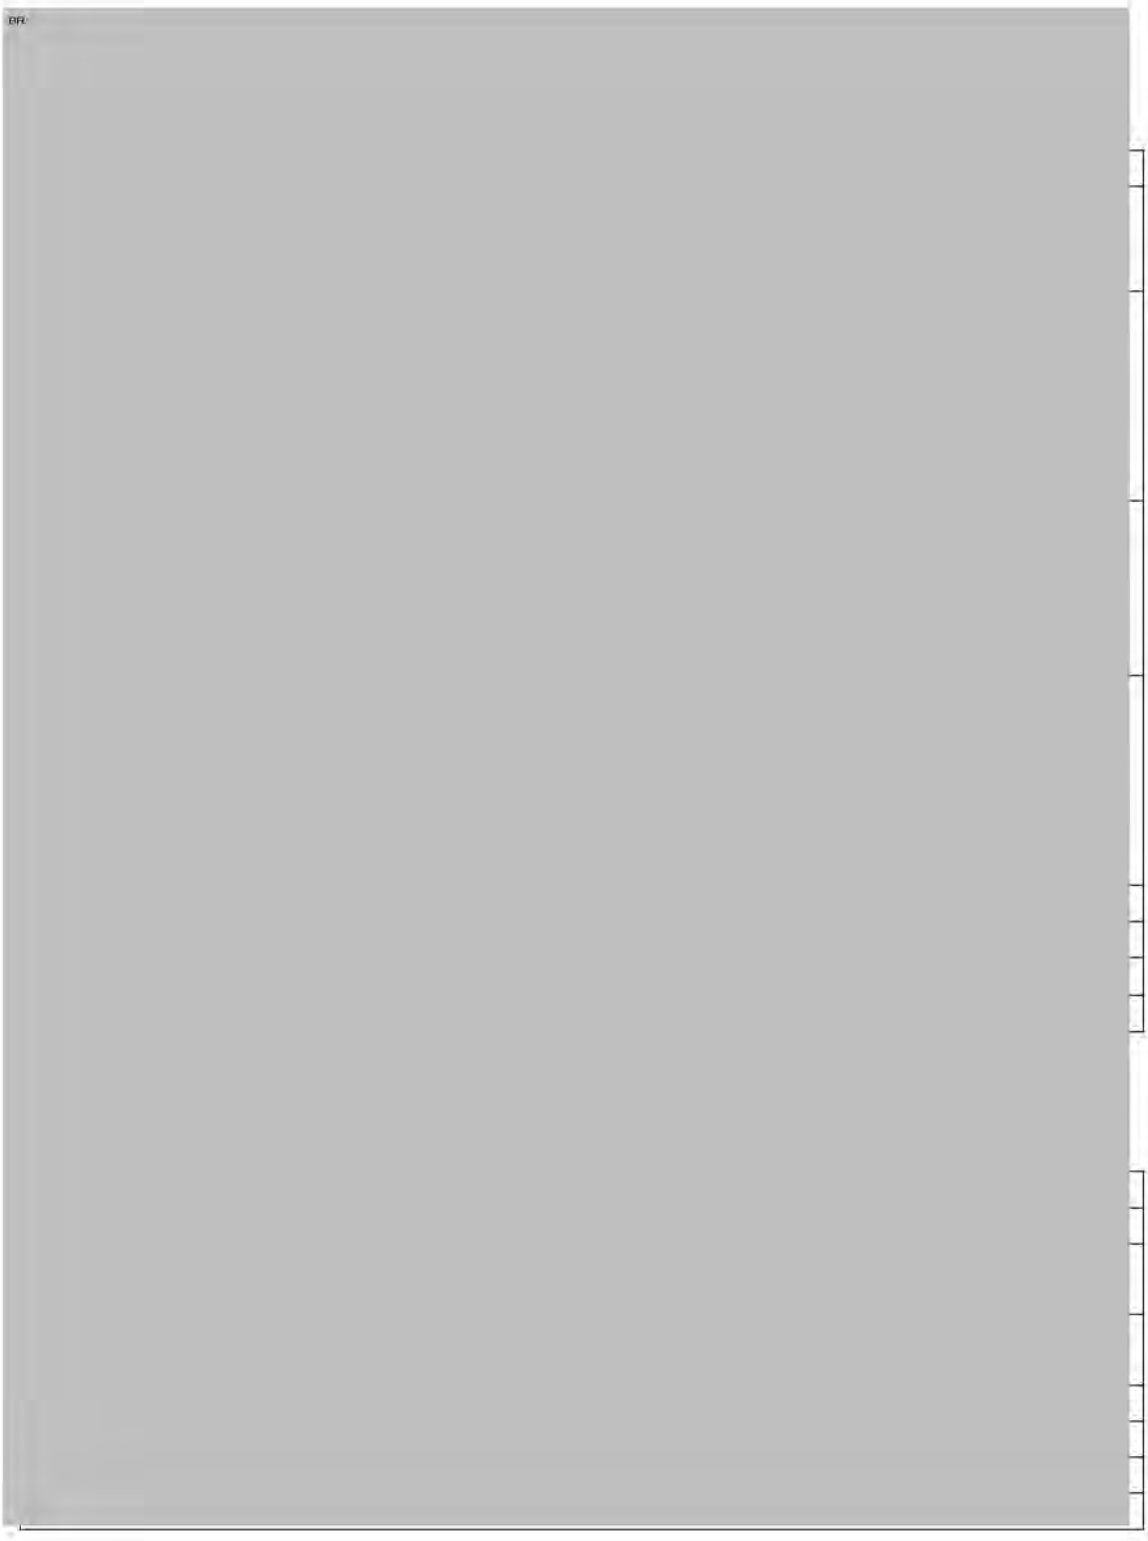

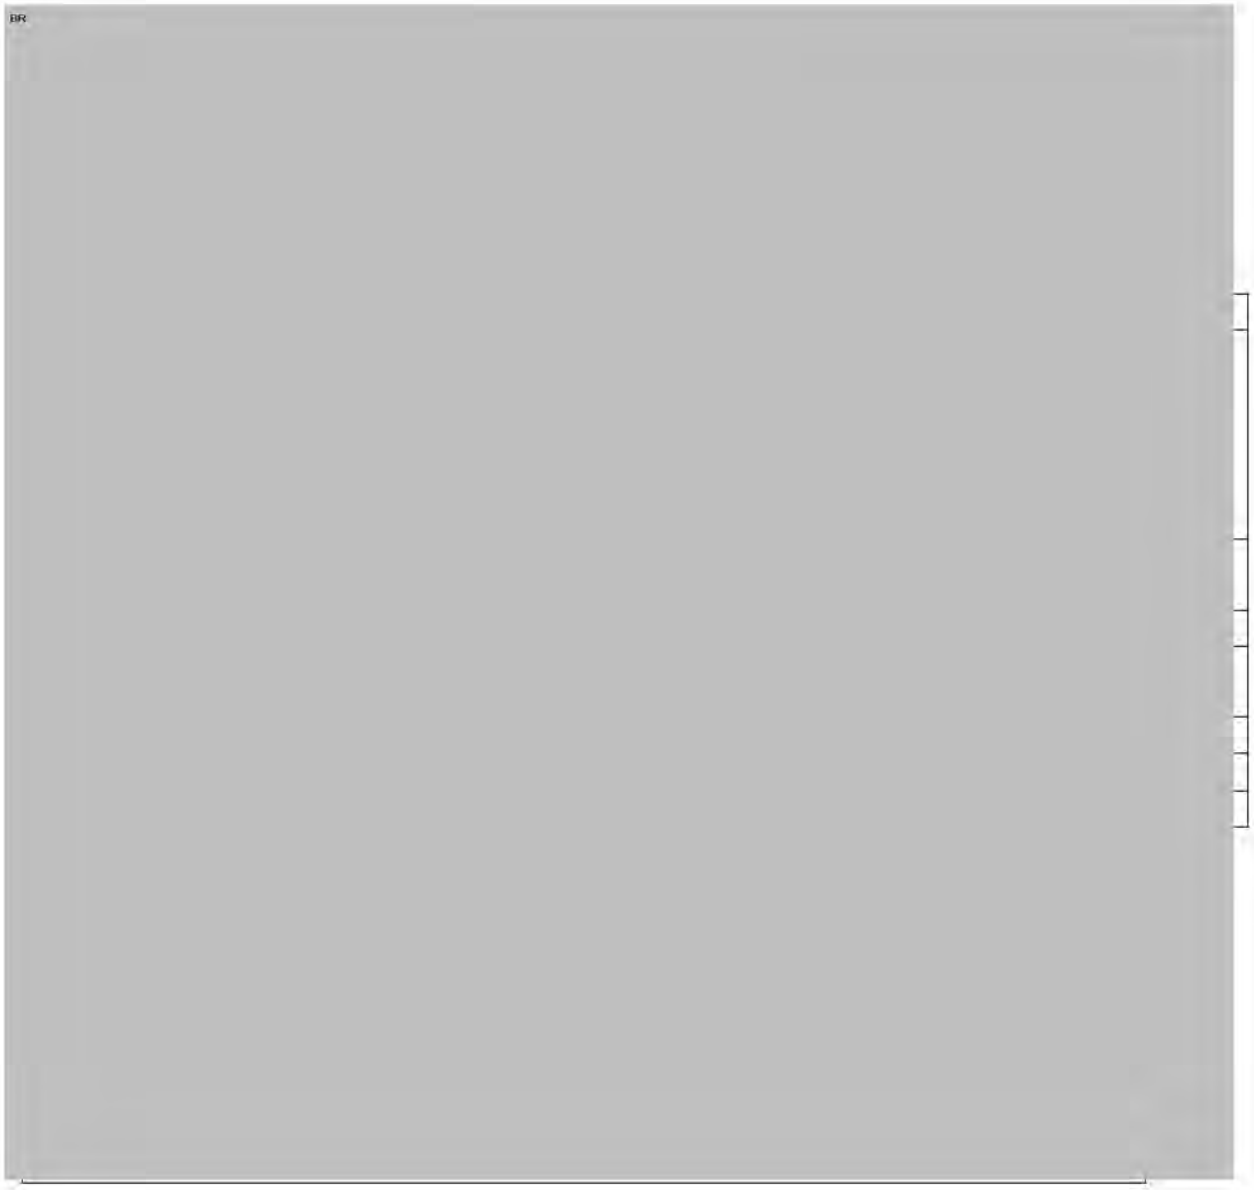
BR

## 4.2 Overdracht aan beheerders

### 4.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| 1 Juli 2020 verwachten we van CRB de volgende verzoeken tot aanvaarding te ontvangen en over te dragen aan de beheerders<br>• <br>• Molenvlietpark Noord<br>• <br>• Molenvlietpark West<br>• | |
| **Overige /extra verrichte werkzaamheden** | |
| Geen bijzonderheden. | |
| | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen. | Geen. |

### 4.2.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Komend kwartaal hopen we de onderdelen over te kunnen dragen die 1 juli jl. zijn opgeleverd, maar nog niet aan de beheerders zijn overgedragen. |
| |
| **Besluiten** |
| Geen. |

Docnr28



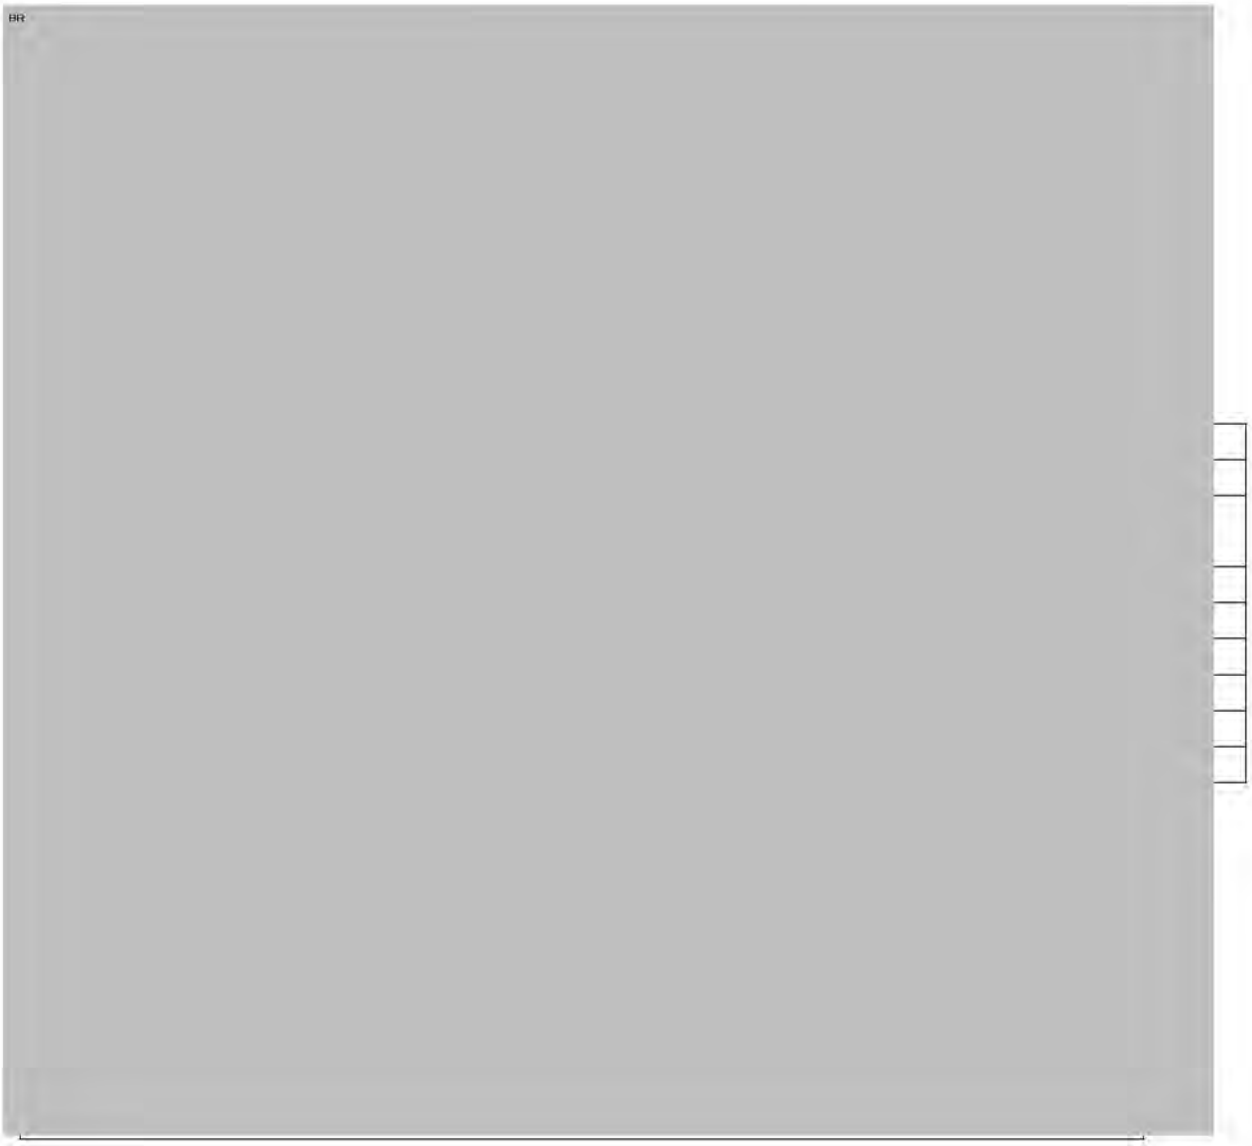

# 5 Projectbeheersing

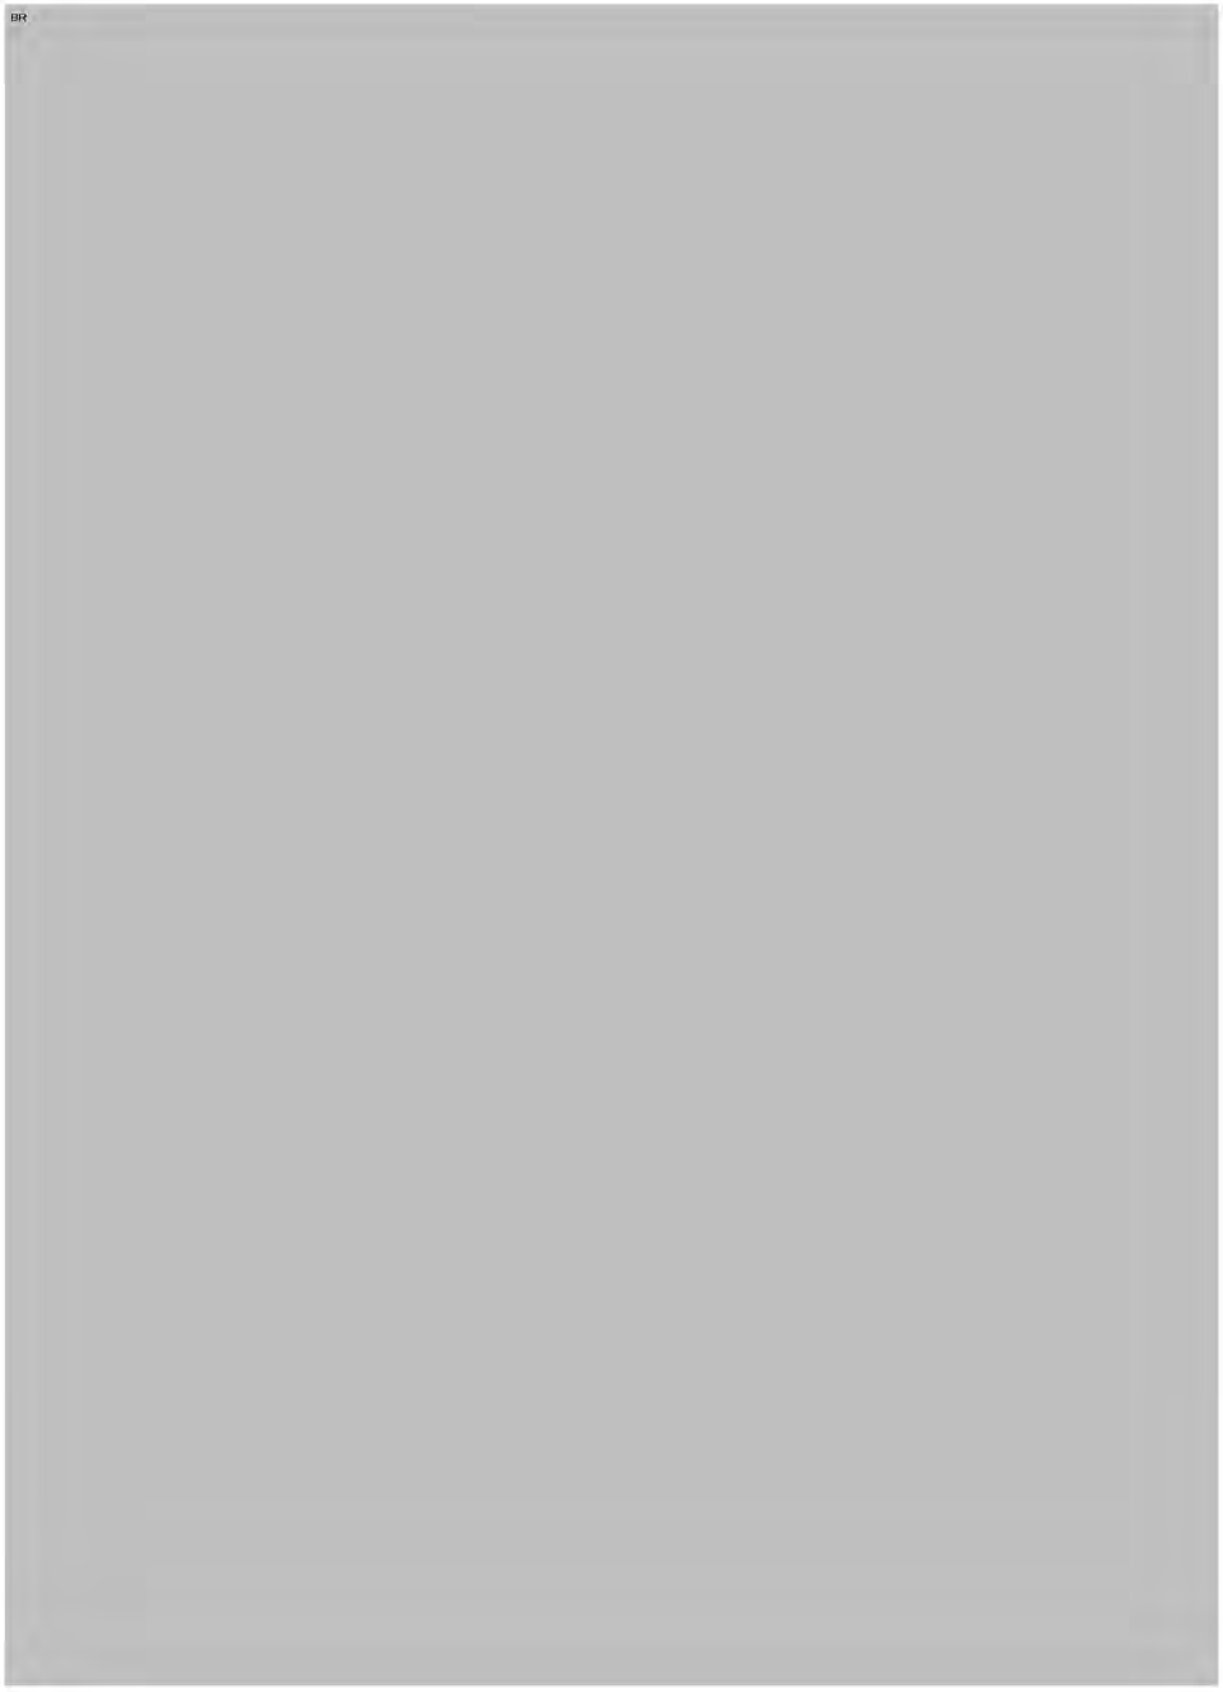
BR

### 5.2.2 Budget

Tabel : Overzicht toegezegde budget Rotterdamsebaan, Euro's prijspeil 2019 (excl. BTW)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delftland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland
Er zijn in het derde kwartaal 2020 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland
Er zijn in het derde kwartaal 2020 geen mutaties geweest.

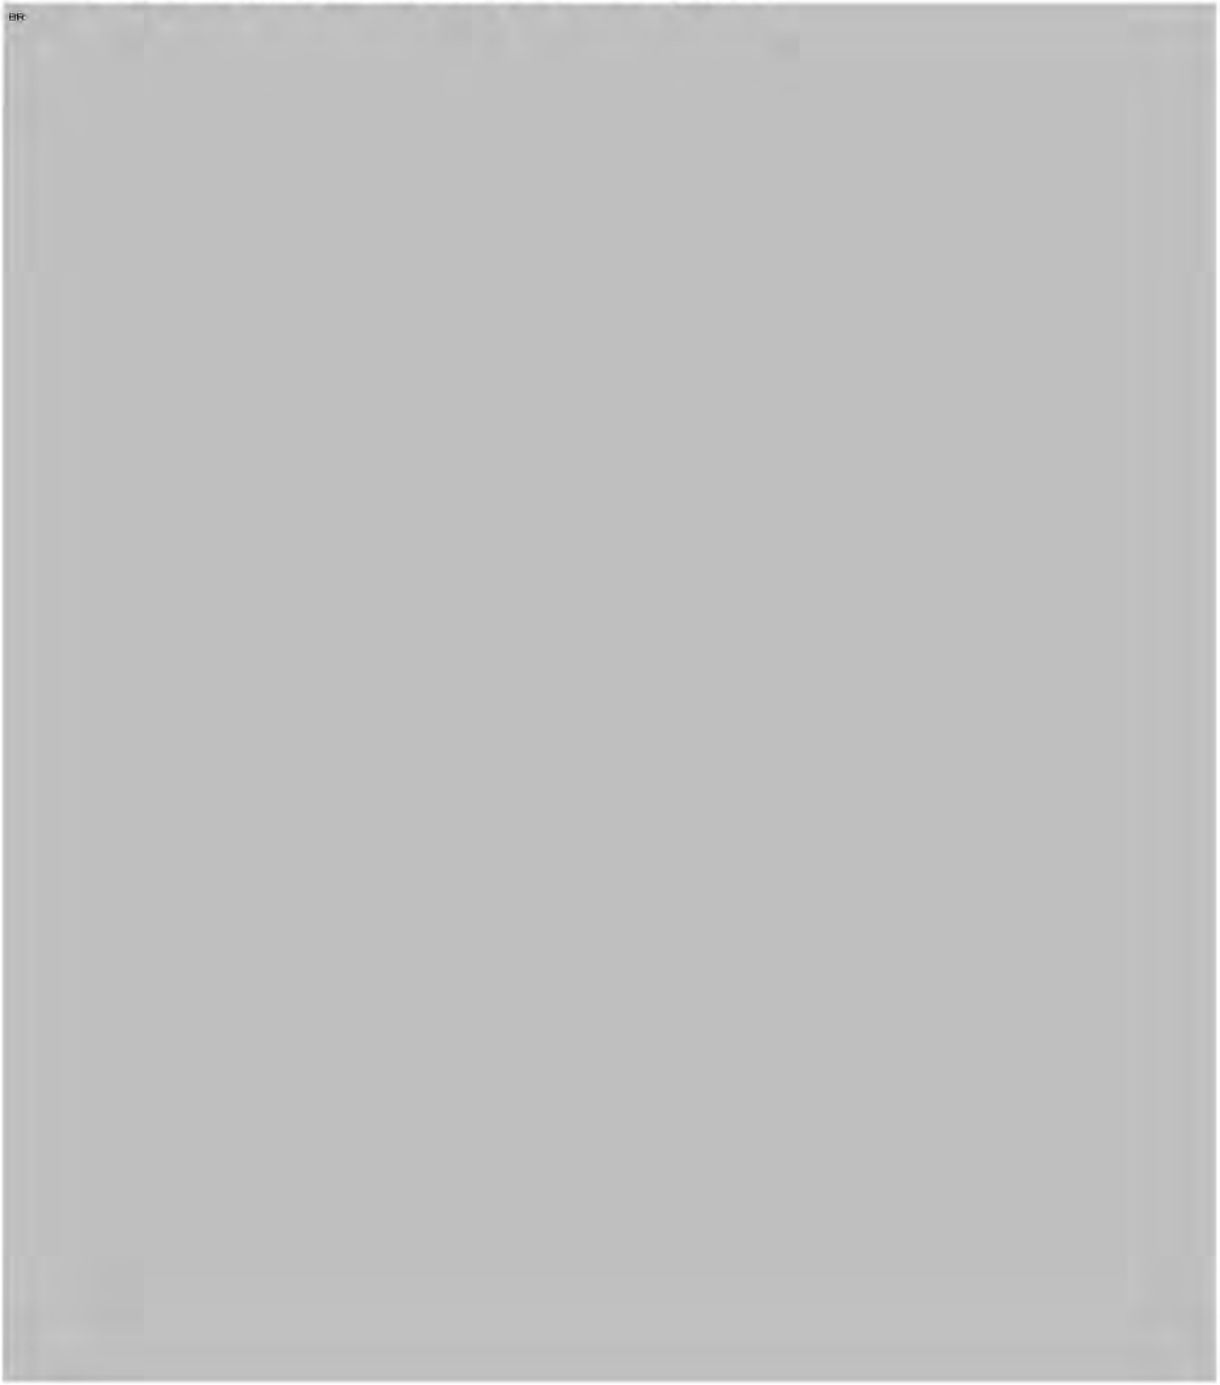

## 5.3 Planning

Zie tevens de bijlage 'Planningsmijlpalen'.

### 5.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Voortzetten regulier planningsproces Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e toevoer. | Het reguliere planningsproces is voortgezet. |
| Uitvoeren van onzekerheidsanalyses Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e toevoer. | De onzekerheidsanalyses op de bediencentrale en de 2e toevoer zijn uitgevoerd. |
| **Overige / extra verrichte werkzaamheden** | |
| Geen bijzonderheden. | |
| | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen | Geen |

### 5.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Voortzetten regulier planningsproces Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e toevoer. |
| Uitvoeren van onzekerheidsanalyses bediencentrale en 2e toevoer. |
| |
| **Besluiten** |
| Geen |

## 5.4 Risico's

### 5.4.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
|---|
| Actualiseren risicodossier t.b.v. 2e toevoer & |
| Opstellen risicoprofielen 2e toevoer & |
| **Besluiten** |
| Vaststellen van de risicoprofielen 2e Toevoer & |

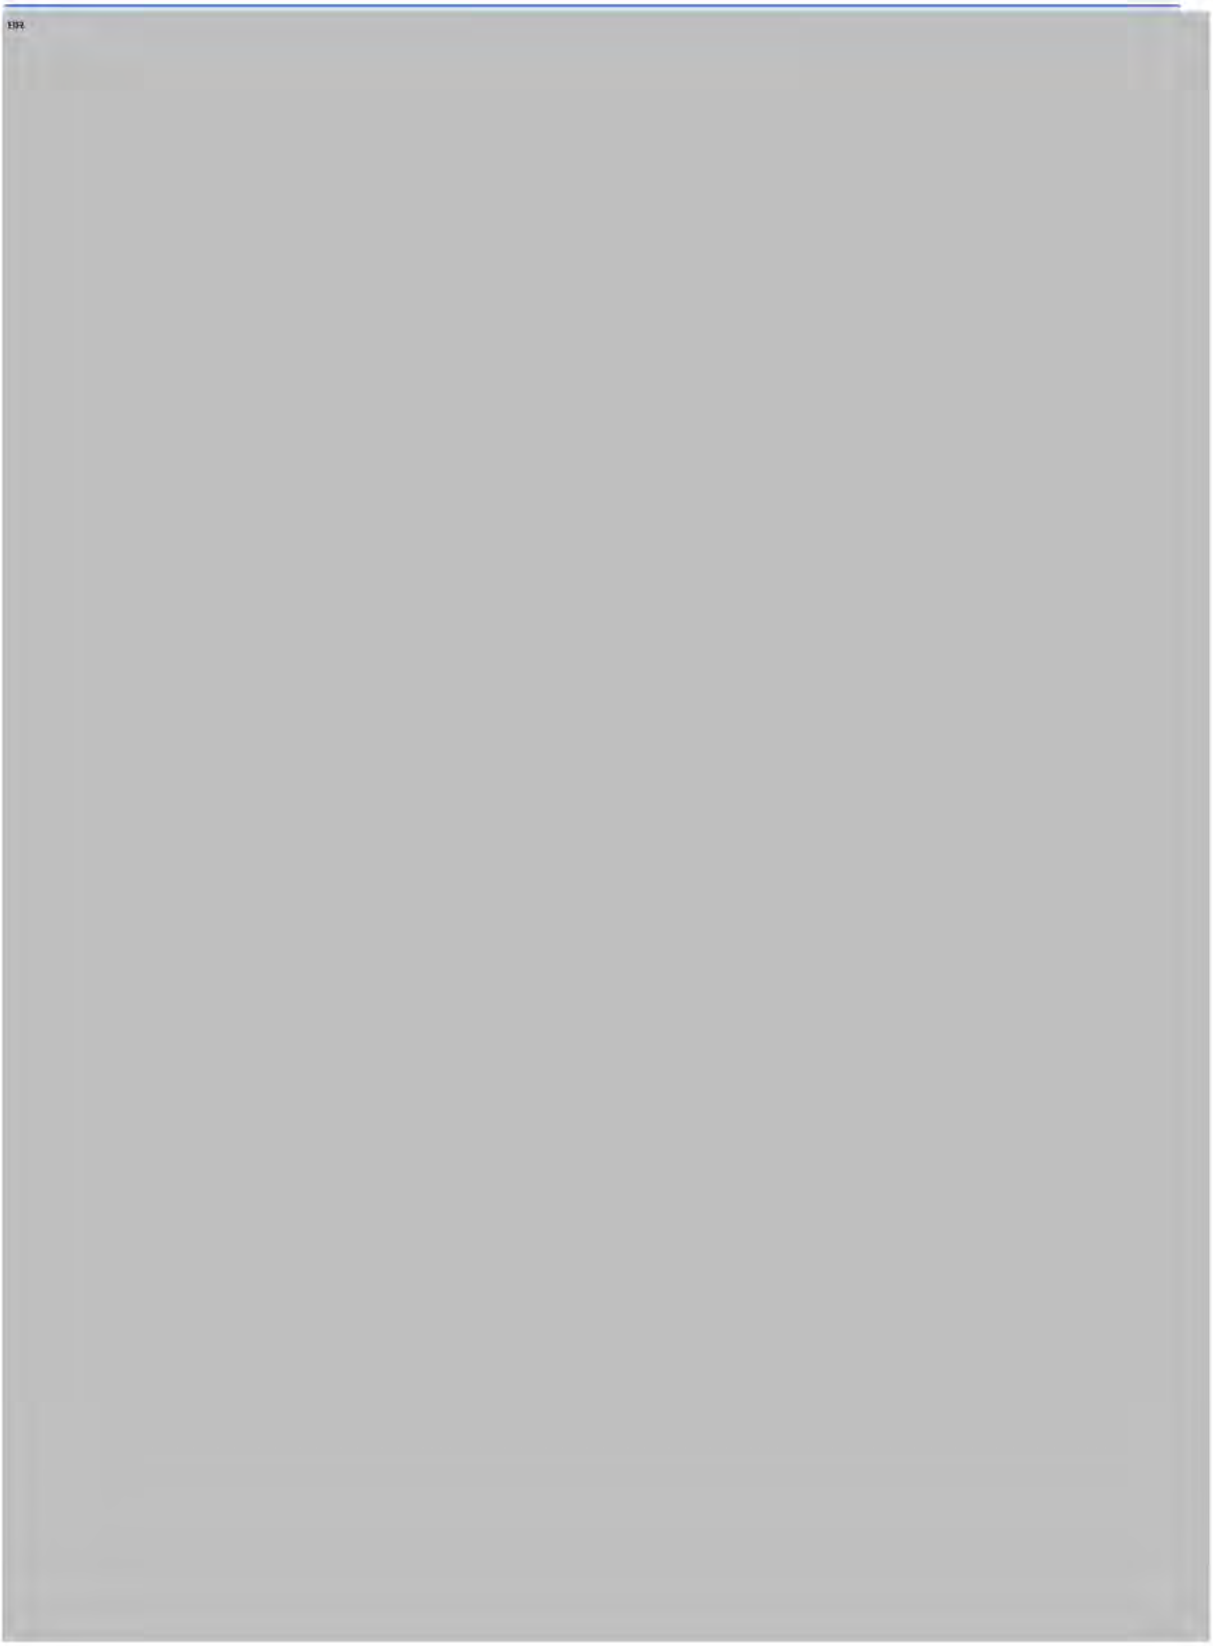

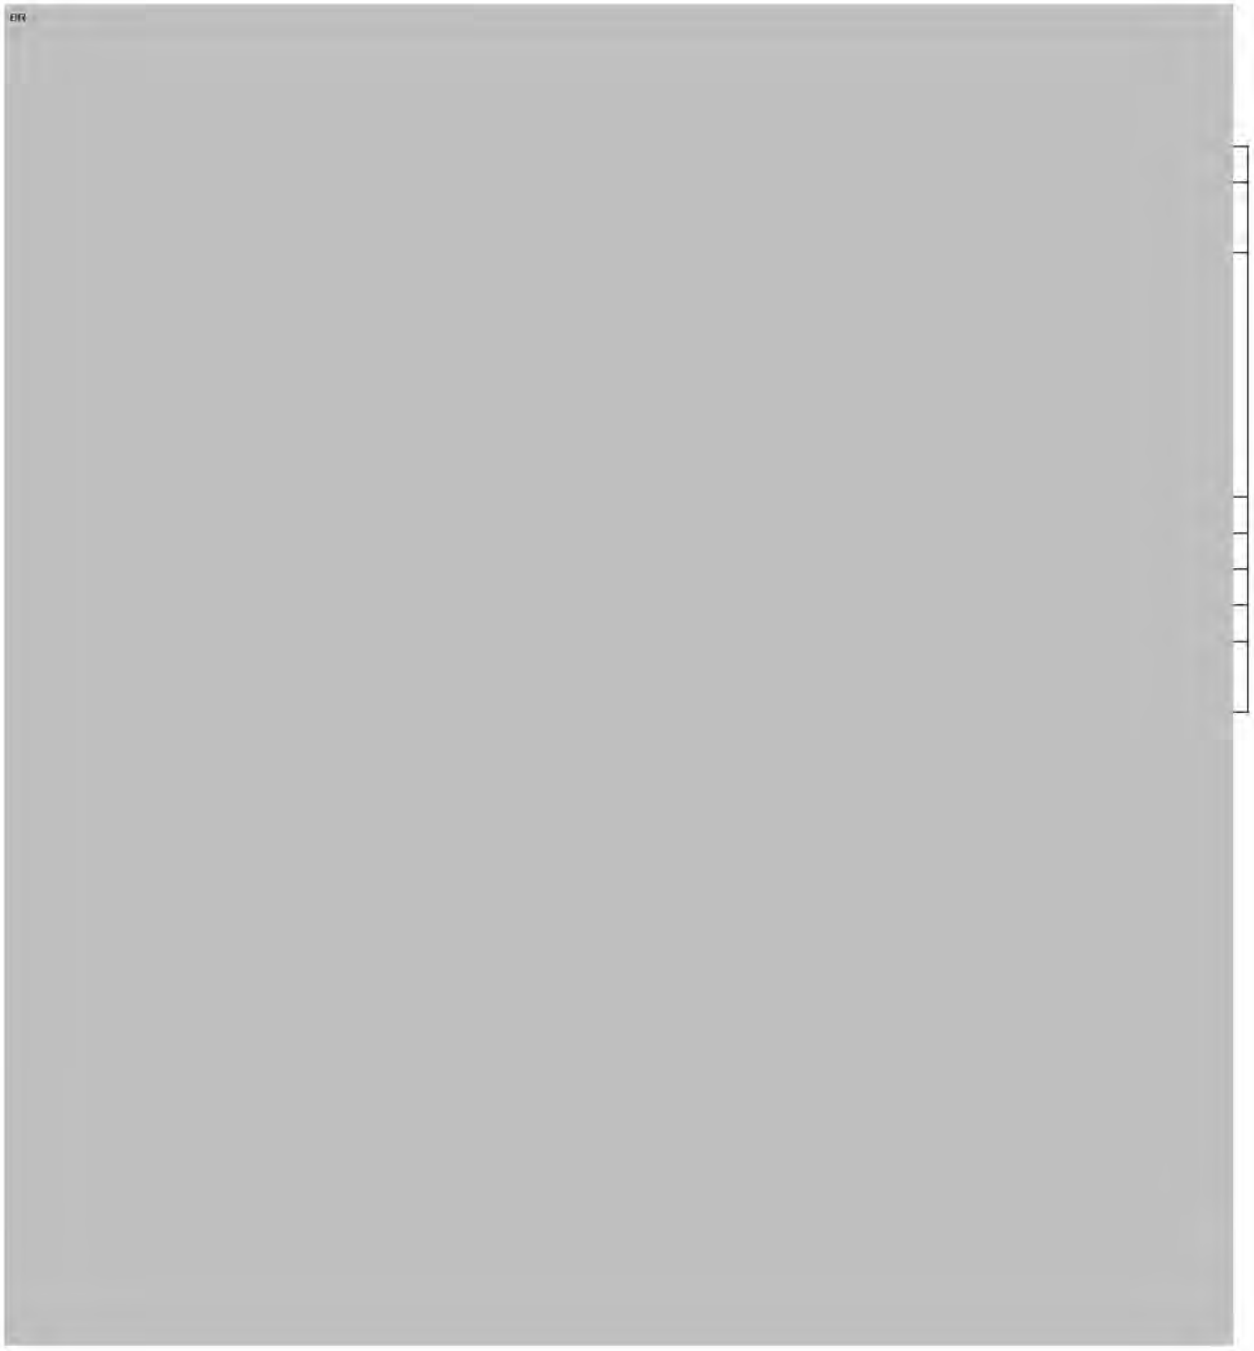

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 1 okt 2020 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 5-jun-20 | 30 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie (incl. consolidatieperiode) vertraagd. Het planten van de laatste groenvoorzieningen volgen in het |
| BR | | | | | h |

*

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

Docnr28

Docnr28

Docnr28

Docnr28



Docnr29

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 4e kwartaal 2020

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 12 januari 2021**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 1.0**

Docnr29

Docnr29



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 4e kwartaal 2020
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-005028

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>8 januari 2021 | Versie 0.1<br>11 januari 2021 | Versie 1.0<br>12 januari 2021 | Versie 1.0<br>22 januari 2021 | Versie 1.0<br>29 januari 2021 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. A. Mulder, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr29



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 9

*2.1 Omgevingsmanagement* *9*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 9
2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie en Vergunningen* *10*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2.2 Komende kwartaal 10

*2.3 Overeenkomsten en verwervingen* *11*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 11
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Communicatie* *12*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 12
2.4.2 Komende kwartaal 13
2.4.3 Diversen 13

3 Projectvoortgang 14

*3.1 Aanbesteden en contracteren* *14*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 14
3.1.2 Komende kwartaal 14

*3.2 Kunstprojecten* *15*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 15
3.2.2 Komende kwartaal 16

*3.3 Inpassing Binckhorst* *17*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 17
3.3.2 Komende kwartaal 17

*3.4 Inpassing Vlietzoom* *18*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 18
3.4.2 Komende kwartaal 18

*3.5 Inpassing Laan van Hoornwijck* *19*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 19
3.5.2 Komende kwartaal 19

*3.6 Boortunnel en toeritten* *20*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 20
3.6.2 Komende kwartaal 20

*3.7 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *22*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 22
3.7.2 Komende kwartaal 22

*3.8 Installaties* *23*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 23
3.8.2 Komende kwartaal 23

*3.9 Veiligheid en gezondheid* *25*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 25

Docnr29




3.9.2 Komende kwartaal 25

*3.10 Bediencentrale* *26*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 26
3.10.2 Komende kwartaal 27

*3.11 Uitvoeringskwaliteit* *28*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 28
3.11.2 Komende kwartaal 28

*3.12 Contractmanagement* *29*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 29
3.12.2 Komende kwartaal 29

4 Overdracht en openstelling 30

*4.1 Tunnelveiligheid* *30*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 30
4.1.2 Komende kwartaal 30

*4.2 Overdracht aan beheerders* *32*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 32
4.2.2 Komende kwartaal 32

*4.3 Beheer en onderhoud* *33*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 33
4.3.2 Komende kwartaal 33

5 Projectbeheersing 34

*5.1 Scope* *34*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 34
5.1.2 Komende kwartaal 34

*5.2 Financiën* *35*
5.2.1 Kostenstructuur 35
5.2.2 Budget 37

*5.3 Planning* *39*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 39
5.3.2 Komende kwartaal 39

*5.4 Risico's* *40*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 40
5.4.2 Komende kwartaal 40
5.4.3 Financiële toprisico's 40
5.4.4 Toprisico's planning 41

*5.5 Interne kwaliteit* *42*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 42
5.5.2 Komende kwartaal 42

*5.6 Informatiebeheer* *43*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 43
5.6.2 Komende kwartaal 43
5.6.3 Kennisdeling 43

*5.7 Organisatie* *44*
5.7.1 Afgelopen kwartaal 44

Docnr29



5.7.2 Komende kwartaal 44

6 Bijlage: Planningsmijlpalen 45

7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 46

8 Bijlage: Doorlopende actielijst kwaliteitsbeheer 47

# 1 Managementsamenvatting

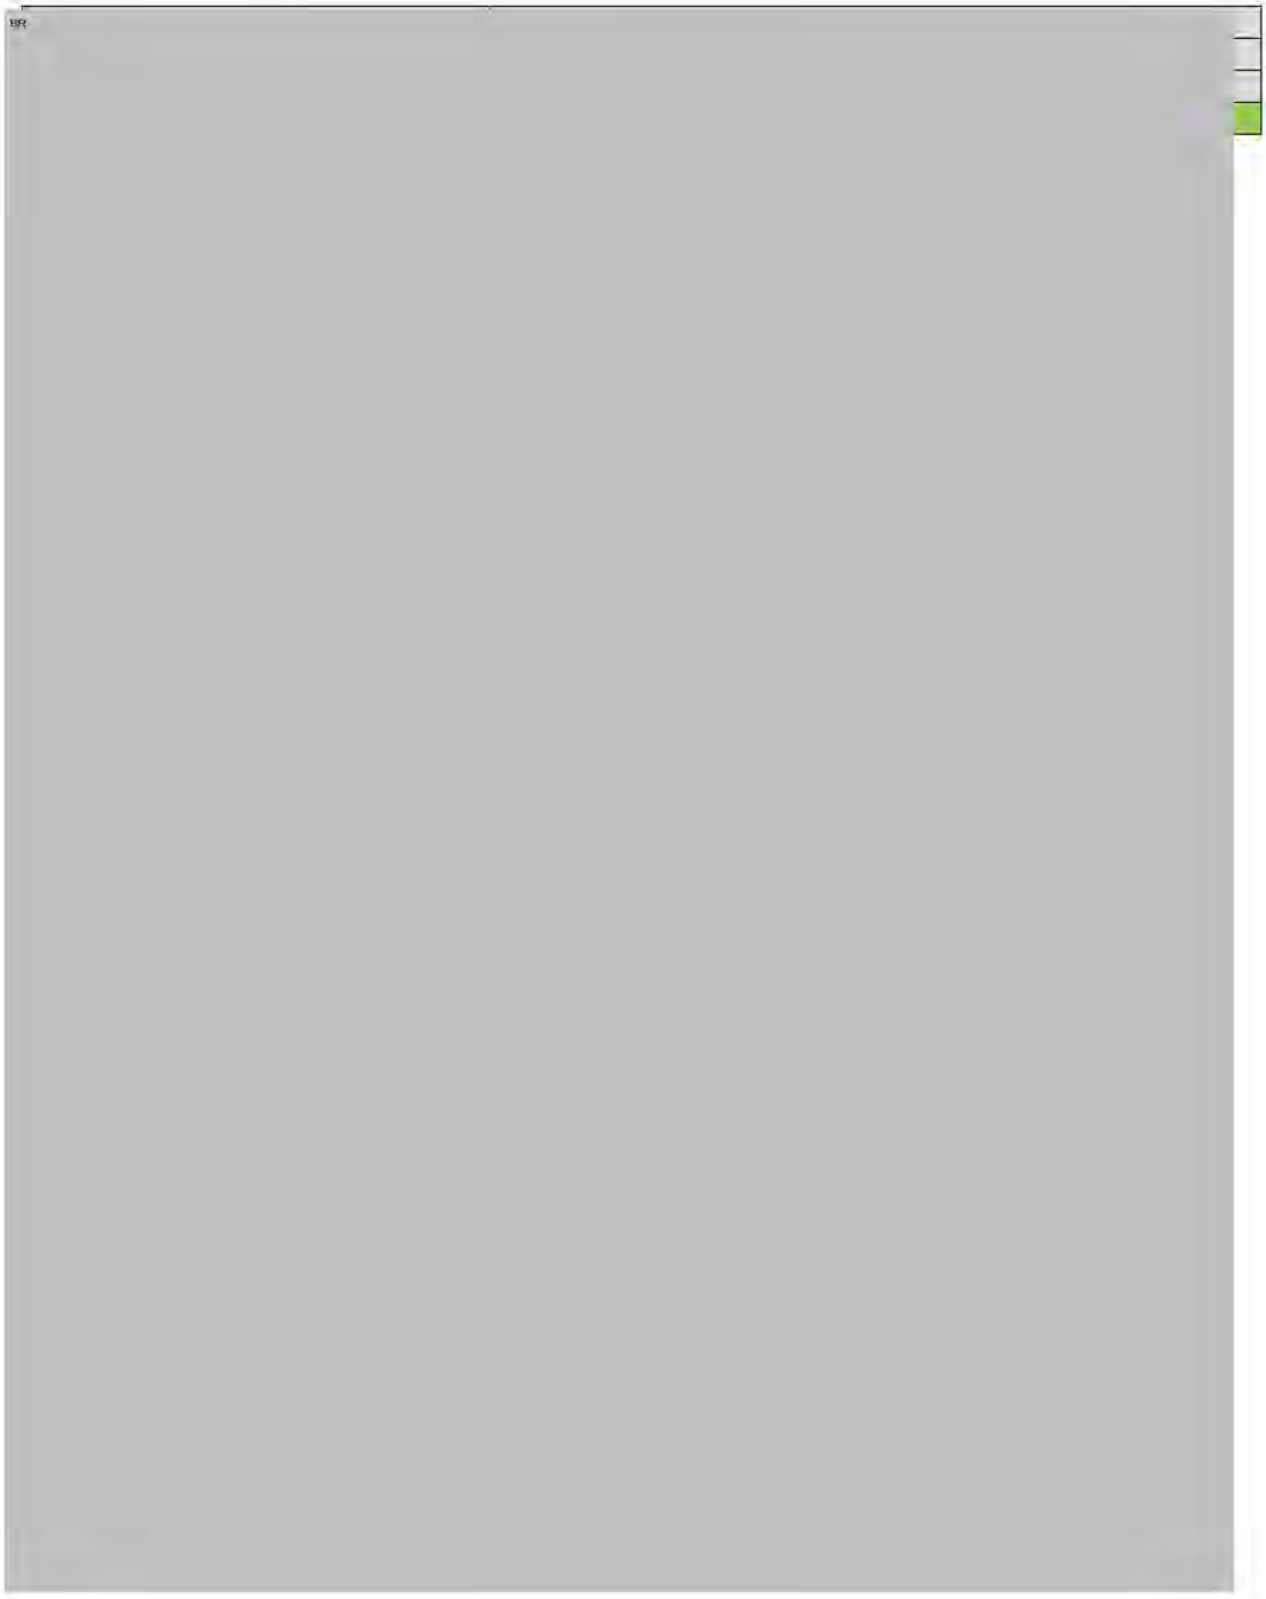

## 4. TERUGBLIK AFGELOPEN KWARTAAL

Afgelopen kwartaal is er onder andere gewerkt aan:

- De aflaatconstructie voor de waterberging in het Molenvlietpark en de picknicktafels zijn op verzoek van omwonenden beter landschappelijk ingepast, mede door aanplanten extra struiken.
- Wegens wijzingen in het ontwerp 2e watertoevoer (incl. herplantplan) en het wegvallen van de noodzaak voor een ontheffing Wnb i.v.m. vleermuisverblijfplaats, wordt de ingediende kapaanvraag naar verwachting in 1e kwartaal 2021 ingetrokken en vervangen door een nieuwe / geactualiseerde aanvraag kapvergunning.

- CRB heeft een groot deel van de restpunten uit de diverse deelopleveringen van 1 juli jl. opgelost. Het betreft onder andere realiseren van keerkom aan het einde van primaire watergang langs Rotterdamsebaan, inrichten Heemtuin en planten van ontbrekende bomen/struiken in Molenvlietpark.

- Risicodossiers zijn geactualiseerd. Voor de planningen 2e toevoer en bediencentrale zijn risicoprofielen opgesteld.

## 5. VERWACHTING KOMEND KWARTAAL

Komende kwartaal wordt er onder andere gewerkt aan:

- CRB zal in januari 2021 een eerste inboetronde uitvoeren, waarbij de niet aangeslagen (dode) bomen/struiken in het Molenvlietpark worden vervangen door nieuwe exemplaren.

- Voor de Rotterdamsebaan, 2e toevoer en bediencentrale worden financiële risicoanalyses gemaakt.
- Deelproject 2e toevoer wordt overgedragen aan de projectleider van DSB/OG.

## 7. Planning

Na de openstelling is er nog een aantal activiteiten voorzien zoals: de bouw van de bediencentrale, beide kunsttrajecten en het realiseren van de tweede toevoer tot de waterberging in het Molenvlietpark.

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorig kwartaal | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| | |

| Overige / extra verrichte werkzaamheden |
|---|
| De aflaatconstructie voor de waterberging in het Molenvlietpark is op verzoek van omwonenden beter landschappelijk ingepast. De betreffende omwonenden hebben aangegeven tevreden te zijn met het resultaat. |
| Op verzoek van een omwonende zijn extra struiken aangeplant naast de picknick banken in het Molenvlietpark zodat inkijk in de woning wordt beperkt. |
| Gesproken met gemeente Rijswijk en bewoner uit Park Hoornwijck (Rijswijk) n.a.v. de klacht van de bewoner over de beperkte hoogte van de heg bij het nieuwe voetpad langs de woning (entree naar het Molenvlietpark). Er is nog geen gedragen oplossing gevonden. |
| BR |
| |

| Geplande besluiten | Genomen besluiten |
|---|---|
| Geen. | Geen. |

### 2.1.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| |
| Samen met gemeente Rijswijk en bewoner Park Hoornwijck komen tot een gedragen oplossing t.a.v. de hoogte en het beheer van de heg bij het nieuwe voetpad naar het Molenvlietpark, langs de woning van de bewoner. |
| BR |
| |

| Besluiten |
|---|
| Geen. |

## 2.2 Planologie en Vergunningen

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Ontwerp-besluit afwachten op kapaanvraag in verband met aanleg tweede watertoevoer. | Wegens wijzingen in het ontwerp 2e watertoevoer (incl. herplantplan) en het wegvallen van de noodzaak voor een ontheffing Wnb i.v.m. vleermuisverblijfplaats, wordt de ingediende kapaanvraag naar verwachting in 1e kwartaal 2021 ingetrokken en vervangen door een nieuwe / geactualiseerde aanvraag kapvergunning. |
| BR | |

### 2.2.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Intrekken oorspronkelijke aanvraag kapvergunning t.b.v. tweede watertoevoer en nieuwe / geactualiseerde aanvraag kapvergunning indienen. |
| BR |

## 2.3 Overeenkomsten en verwervingen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Samenwerkingsovereenkomst (SOK) incl. bijlagen met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer op particulier terrein. | Adviseurs van beide partijen (gemeente en grondeigenaar hebben diverse gesprekken gevoerd om tot een gedragen programma van eisen (PvE) te komen. Enkele resterende onderwerpen zullen tijdens een gesprek in januari 2021 behandeld worden. Het PvE is een belangrijke bijlage bij de SOK. |
| DSO/Grondzaken laat taxatie uitvoeren van het eventueel aan te kopen particuliere perceel voor de realisatie van de tweede watertoevoer. | Taxatie heeft op verzoek van de projectorganisatie nog niet plaatsgevonden in afwachting van de uitkomsten van het gesprek met de betreffende grondeigenaar. |
| [redacted] | |

### 2.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Samenwerkingsovereenkomst incl. bijlagen met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer op particulier terrein. |
| [redacted] |

## 2.4 Communicatie

### 2.4.1 Afgelopen kwartaal

**Overige / extra verrichte werkzaamheden**

Samen met DSB/Archeologie wordt een plan uitgewerkt om een 'archeologische route' te maken, die loopt van het Molenvlietpark naar Forum Hadriani in Leidschendam-Voorburg. Er wordt bekeken hoe deze route kan lopen, en op welke manier informatie over archeologische vondsten en de geschiedenis van het gebied terug kan komen in de route. Ook wordt gedacht aan een educatief programma t.b.v. basisscholen in het gebied, in de vorm van een leskist. Het plan van aanpak wordt in het eerste kwartaal 2021 ook besproken met de gemeente Leidschendam-Voorburg en daarna afgerond. DSB/Archeologie zal vervolgens zorg dragen voor de uitvoering van het plan.

Docnr29



### 2.4.2 Komende kwartaal

# 3 Projectvoortgang

## 3.1 Aanbesteden en contracteren

### 3.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |

| Overige/extra verrichte werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Voor een stuk asfalteringswerkzaamheden van het fietspad Jan Thijssenweg (aanvullende scope) voor het project Tweede watertoevoer dienen de afspraken met Rijswijk te worden vastgelegd. |
| BR |

### 3.1.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Afspraken met Rijswijk maken inzake het asfalteren fietspad Jan Thijssenweg als aanvullende scope (werken derden) voor het project Tweede watertoevoer. |
| **Besluiten** |
| Geen. |

Docnr29



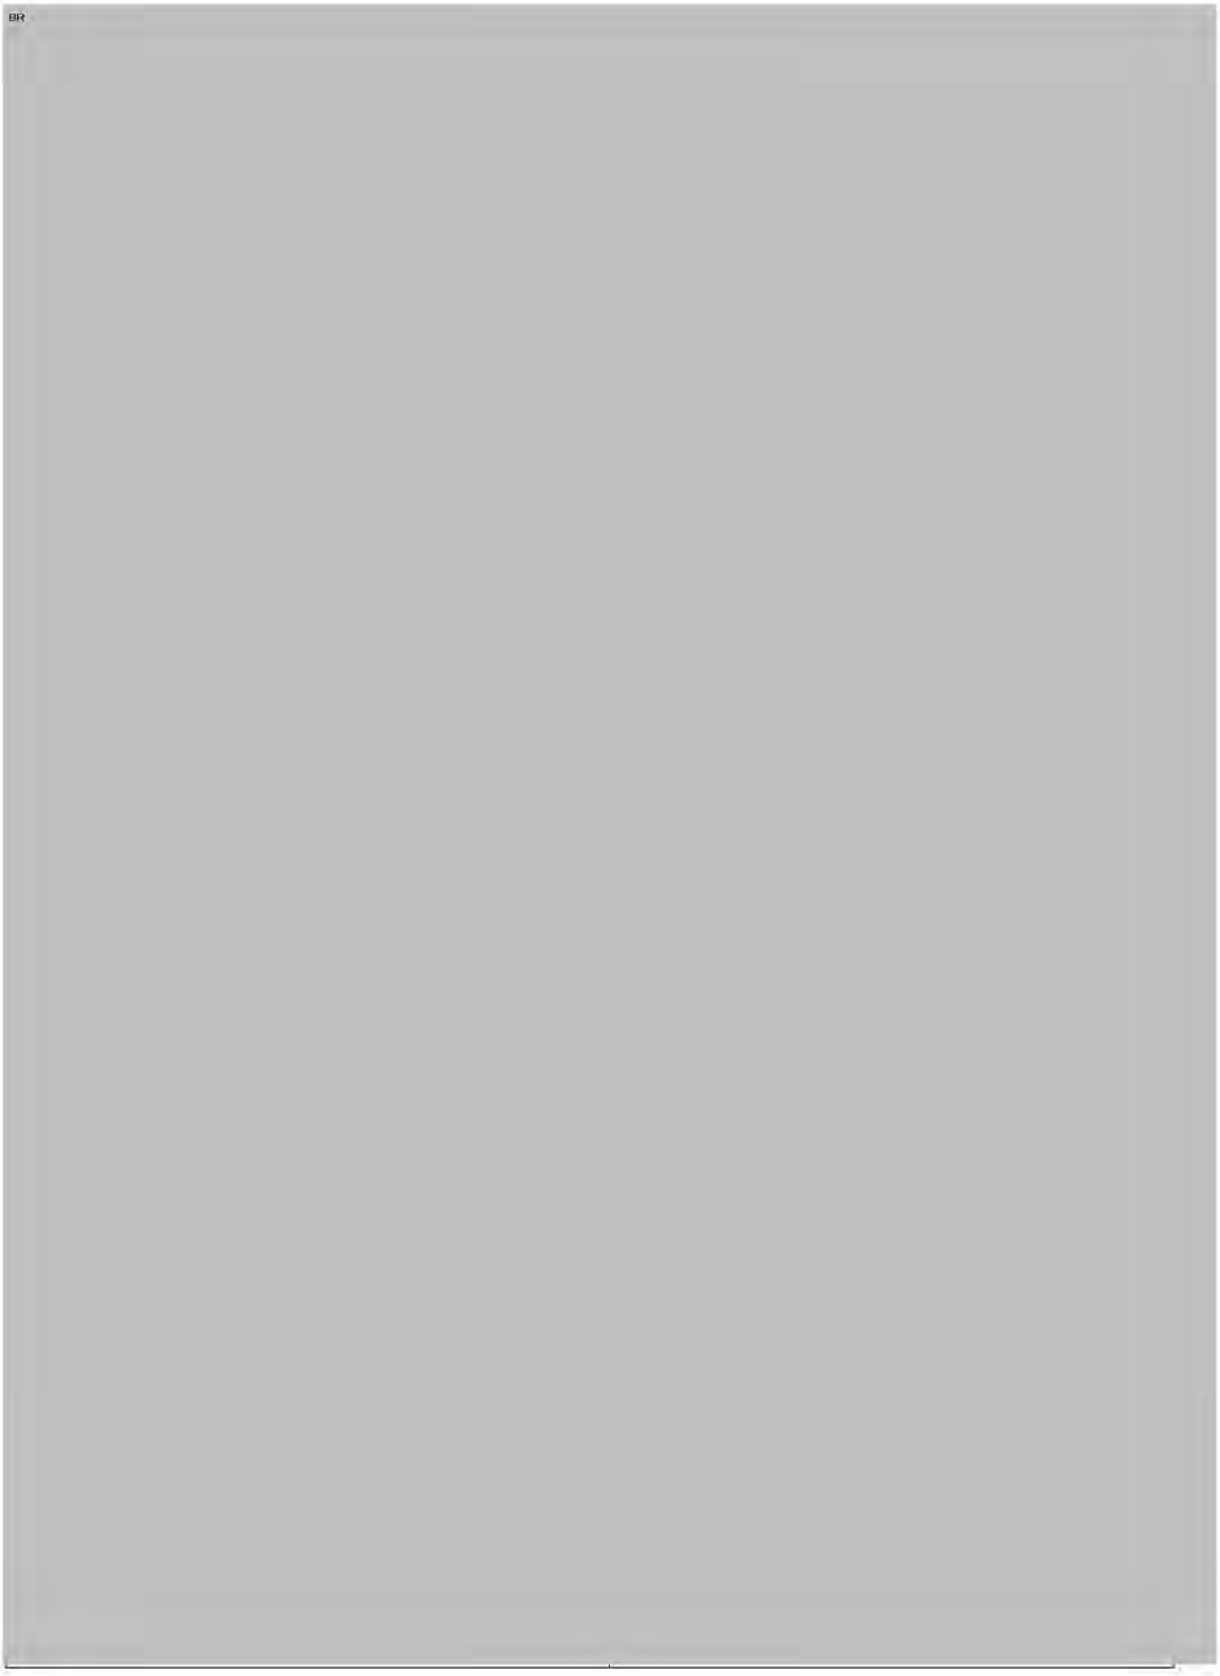

Docnr29

Docnr29



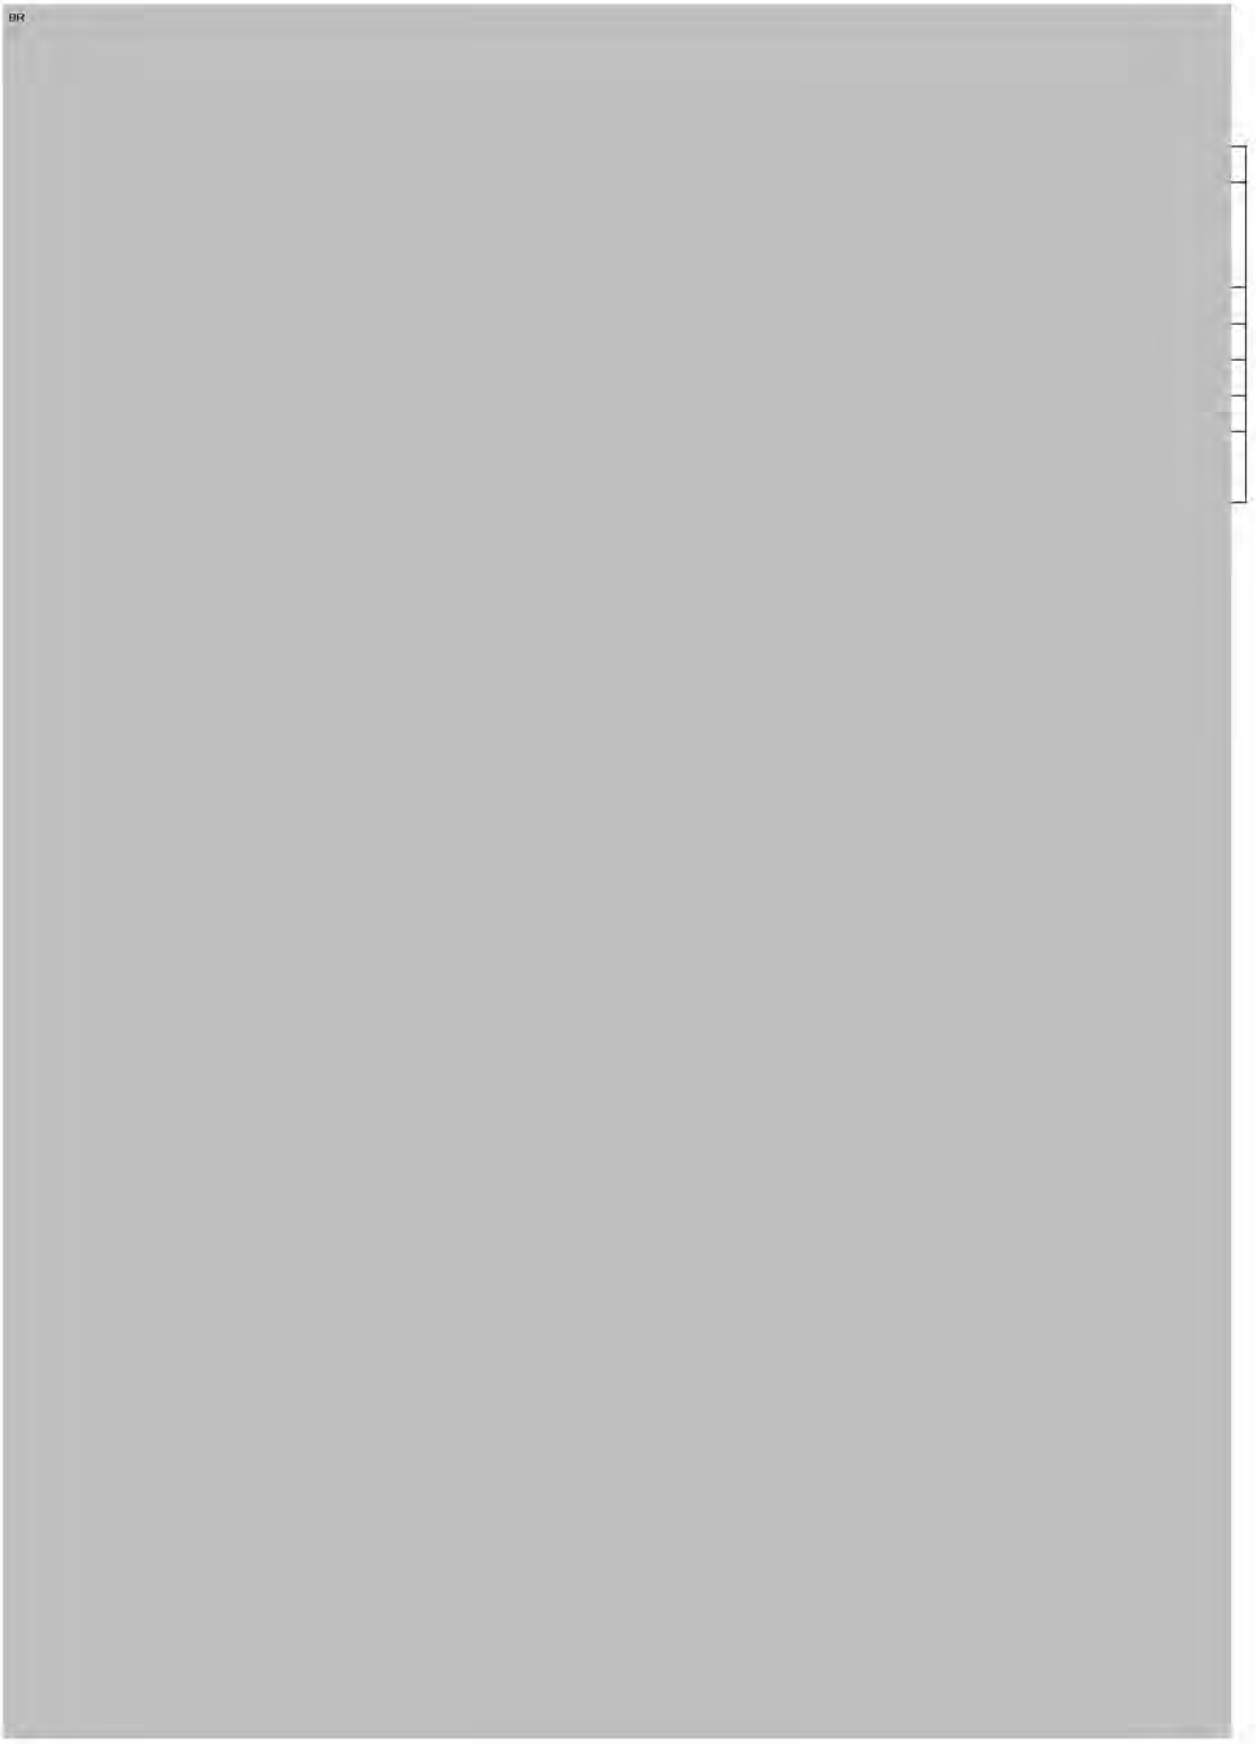

## 3.4 Inpassing Vlietzoom

### 3.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| CRB zal de nog resterende restpunten uit de diverse deelopleveringen oplossen. | CRB heeft een groot deel van de restpunten uit de diverse deelopleveringen van 1 juli jl. opgelost. Het betreft onder andere realiseren van keerkom aan het einde van primaire watergang langs Rotterdamsebaan, inrichten Heemtuin en planten van ontbrekende bomen/struiken in Molenvlietpark. |
| De aflaatconstructie van de waterberging beter landschappelijk inpassen n.a.v. klachten van omwonenden. Dit door o.a. het dempen van een waterkom, het bekleden van de damwanden en het aanplanten van struiken. | CRB heeft de werkzaamheden om de landschappelijke inpassing van de aflaatconstructie te verbeteren afgerond. |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Geen bijzonderheden. | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen. | Geen. |

### 3.4.2 Komende kwartaal

| **Werkzaamheden** |
|---|
| BR |
| CRB zal in januari 2021 een eerste inboetronde uitvoeren, waarbij de niet aangeslagen (dode) bomen/struiken in het Molenvlietpark worden vervangen door nieuwe exemplaren. |
| **Besluiten** |
| Geen. |

Foto: Verbeterde inpassing aflaatconstructie waterberging

BR

Docnr29



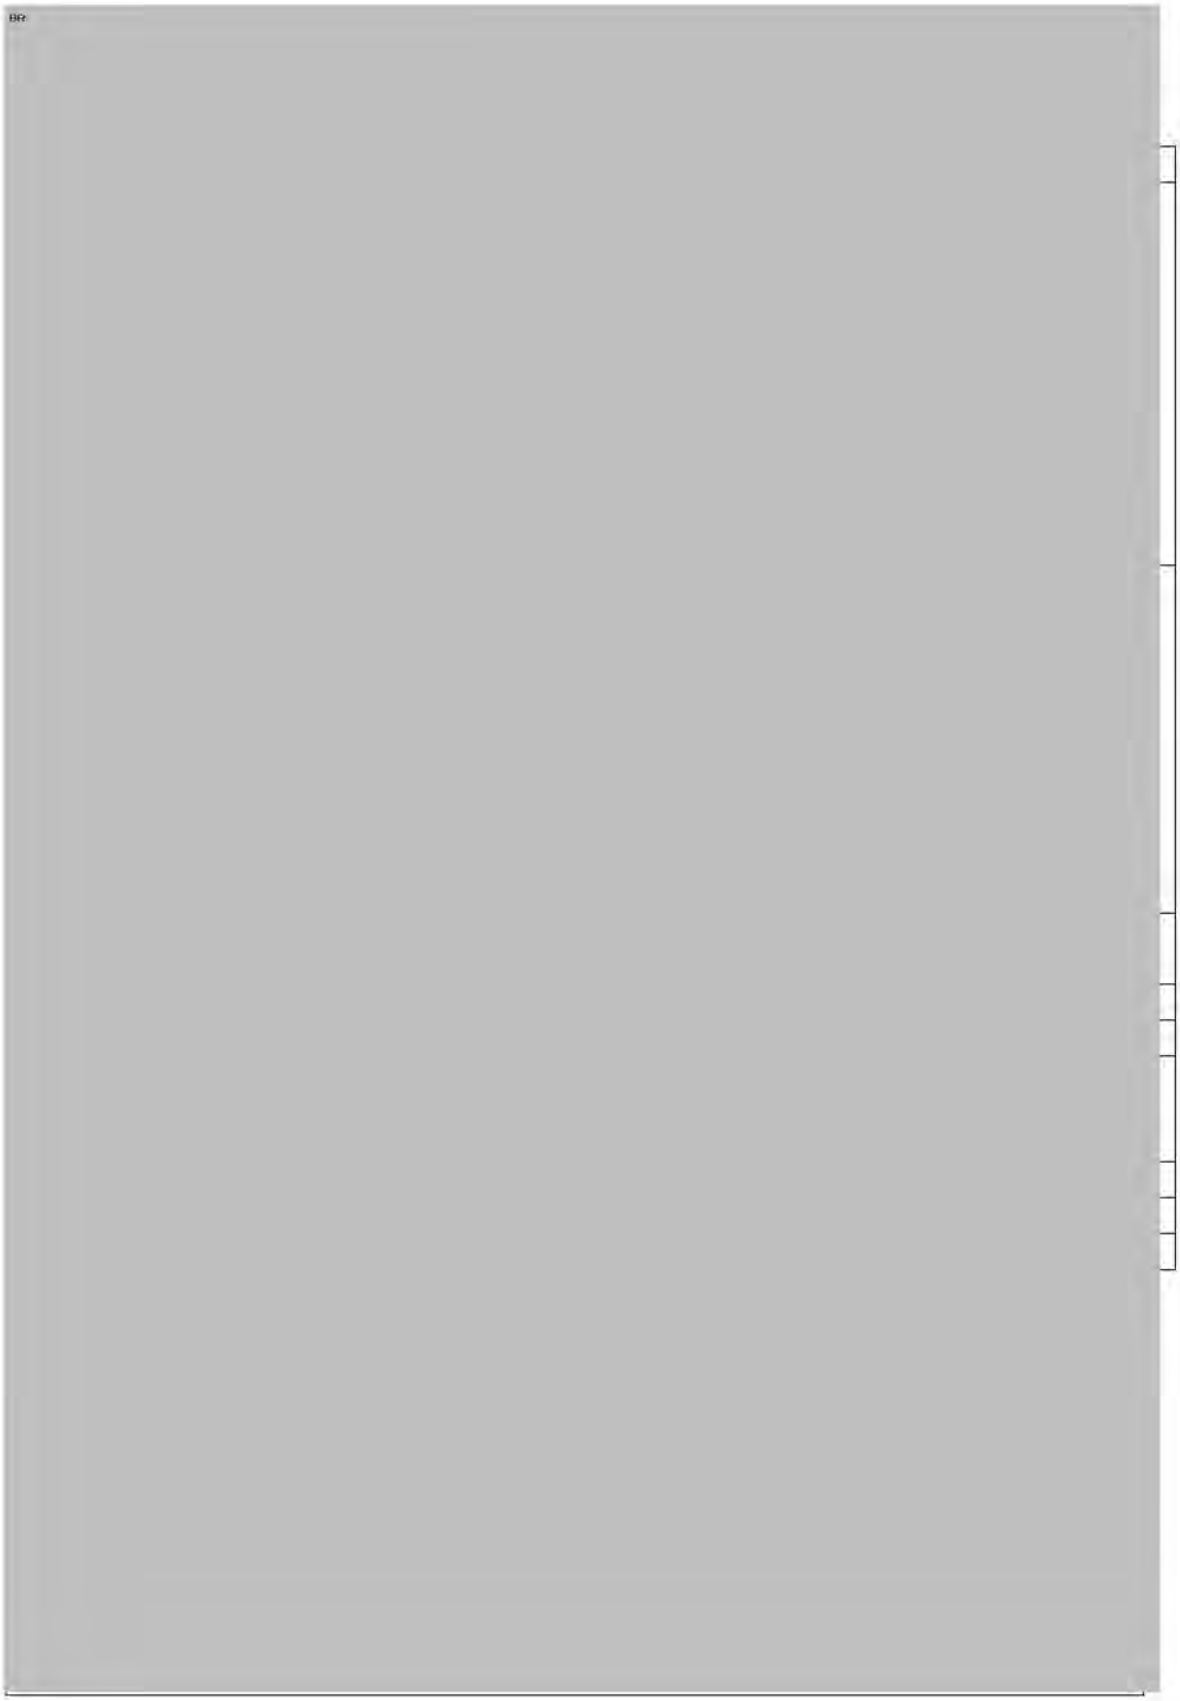

BR

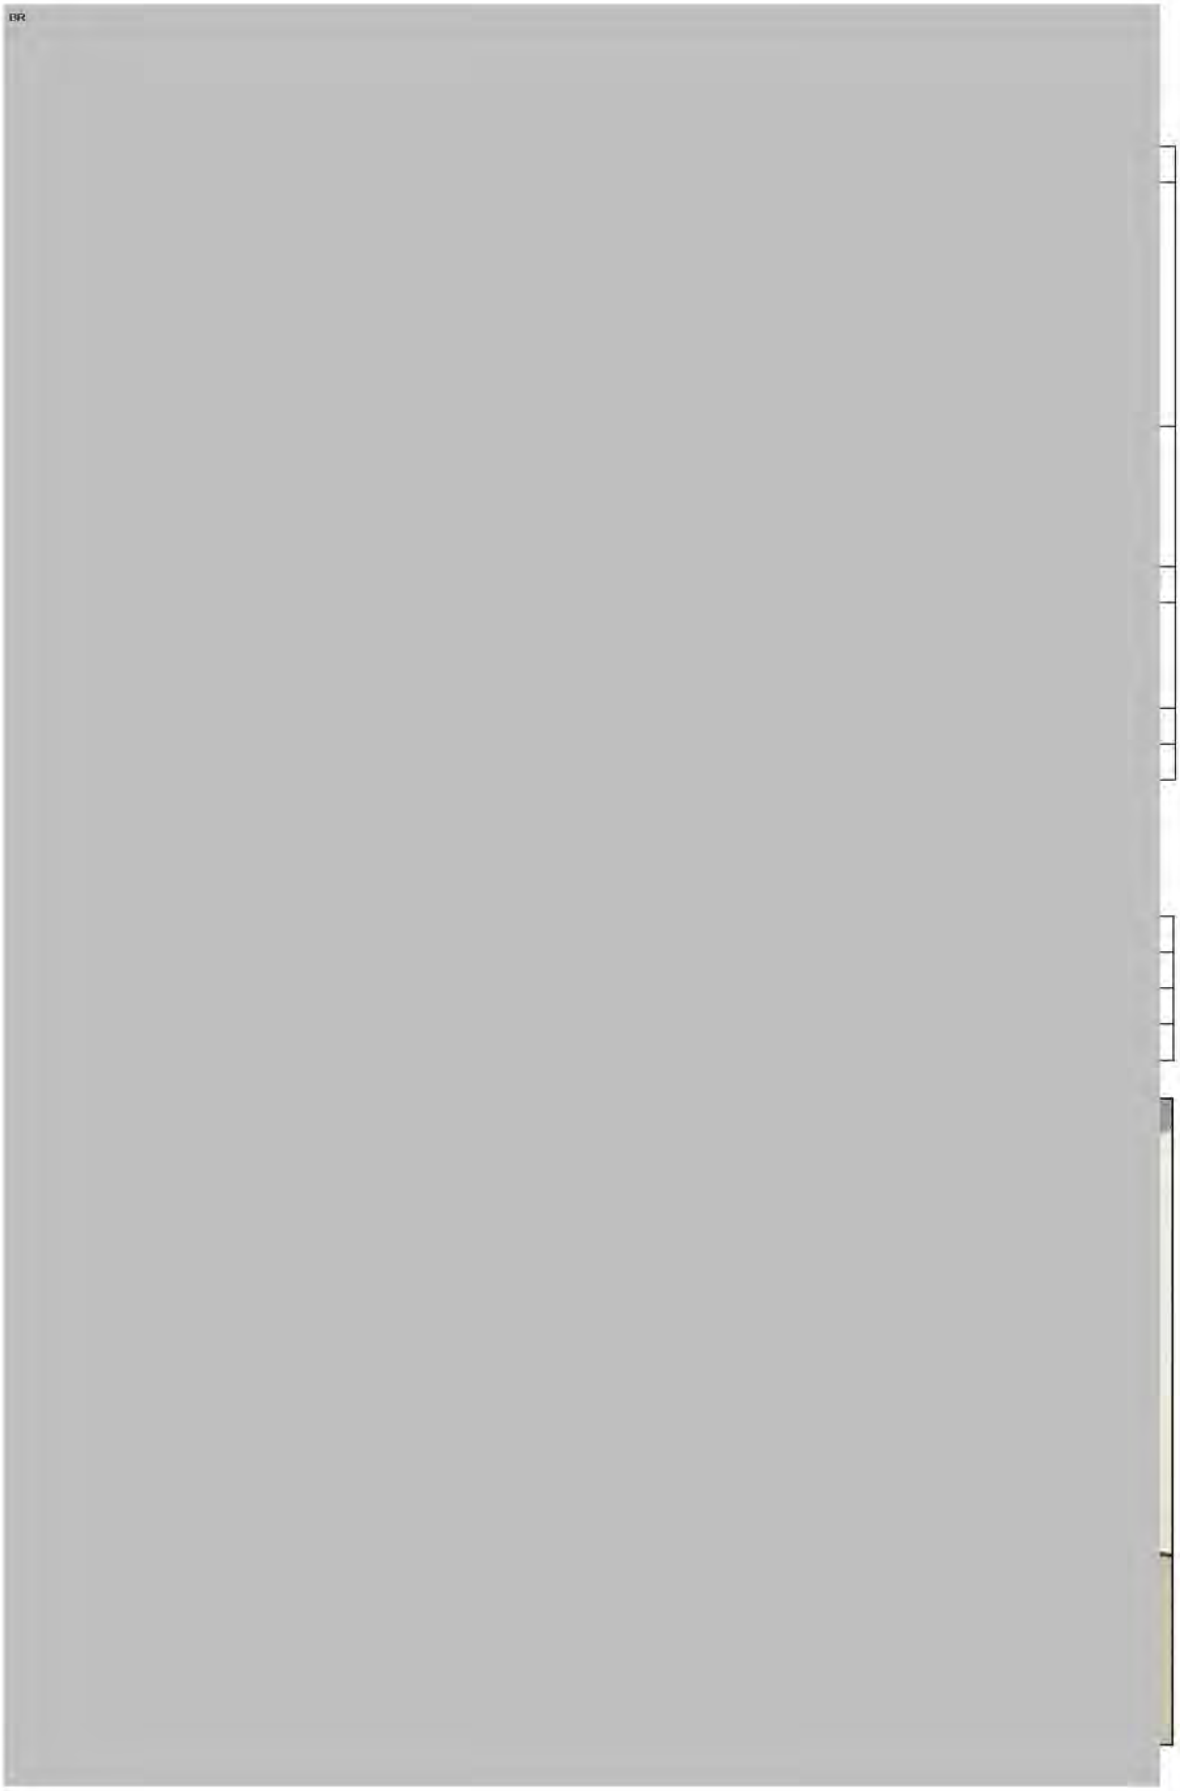
BR

Docnr29



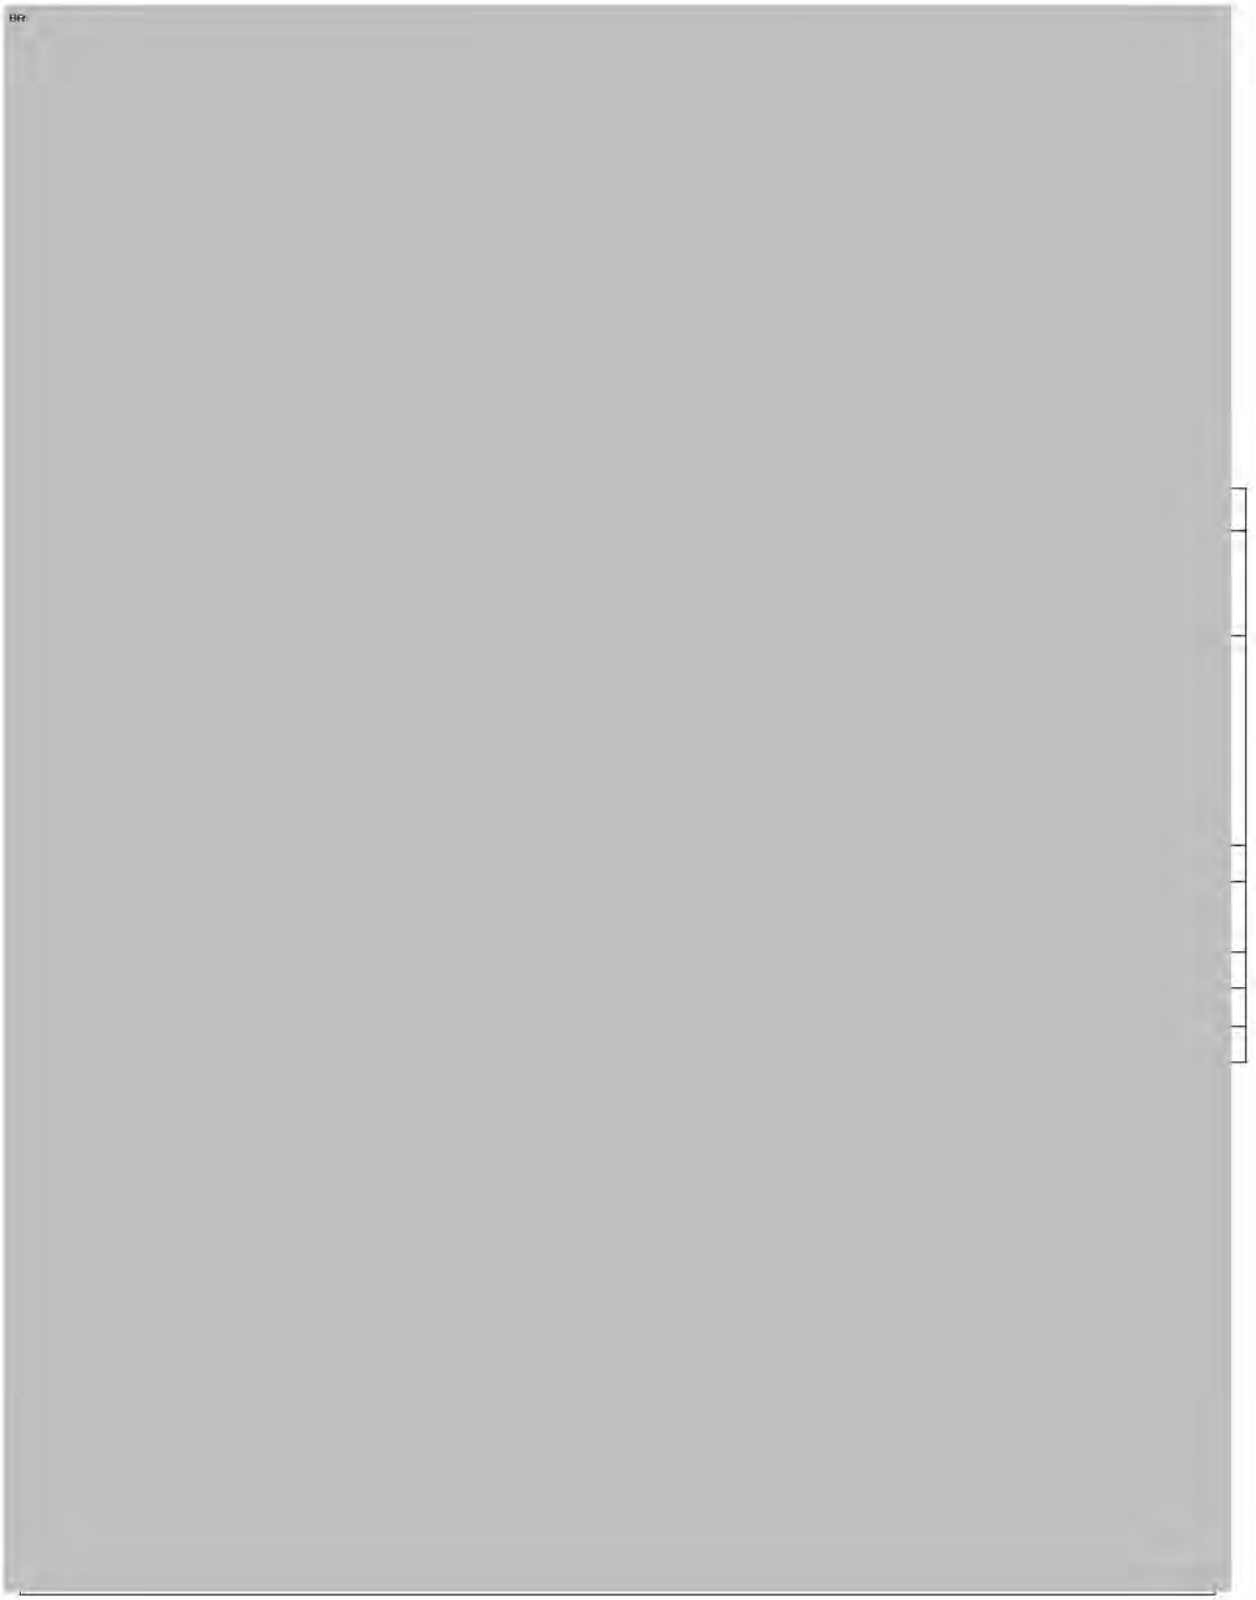

BR

BR

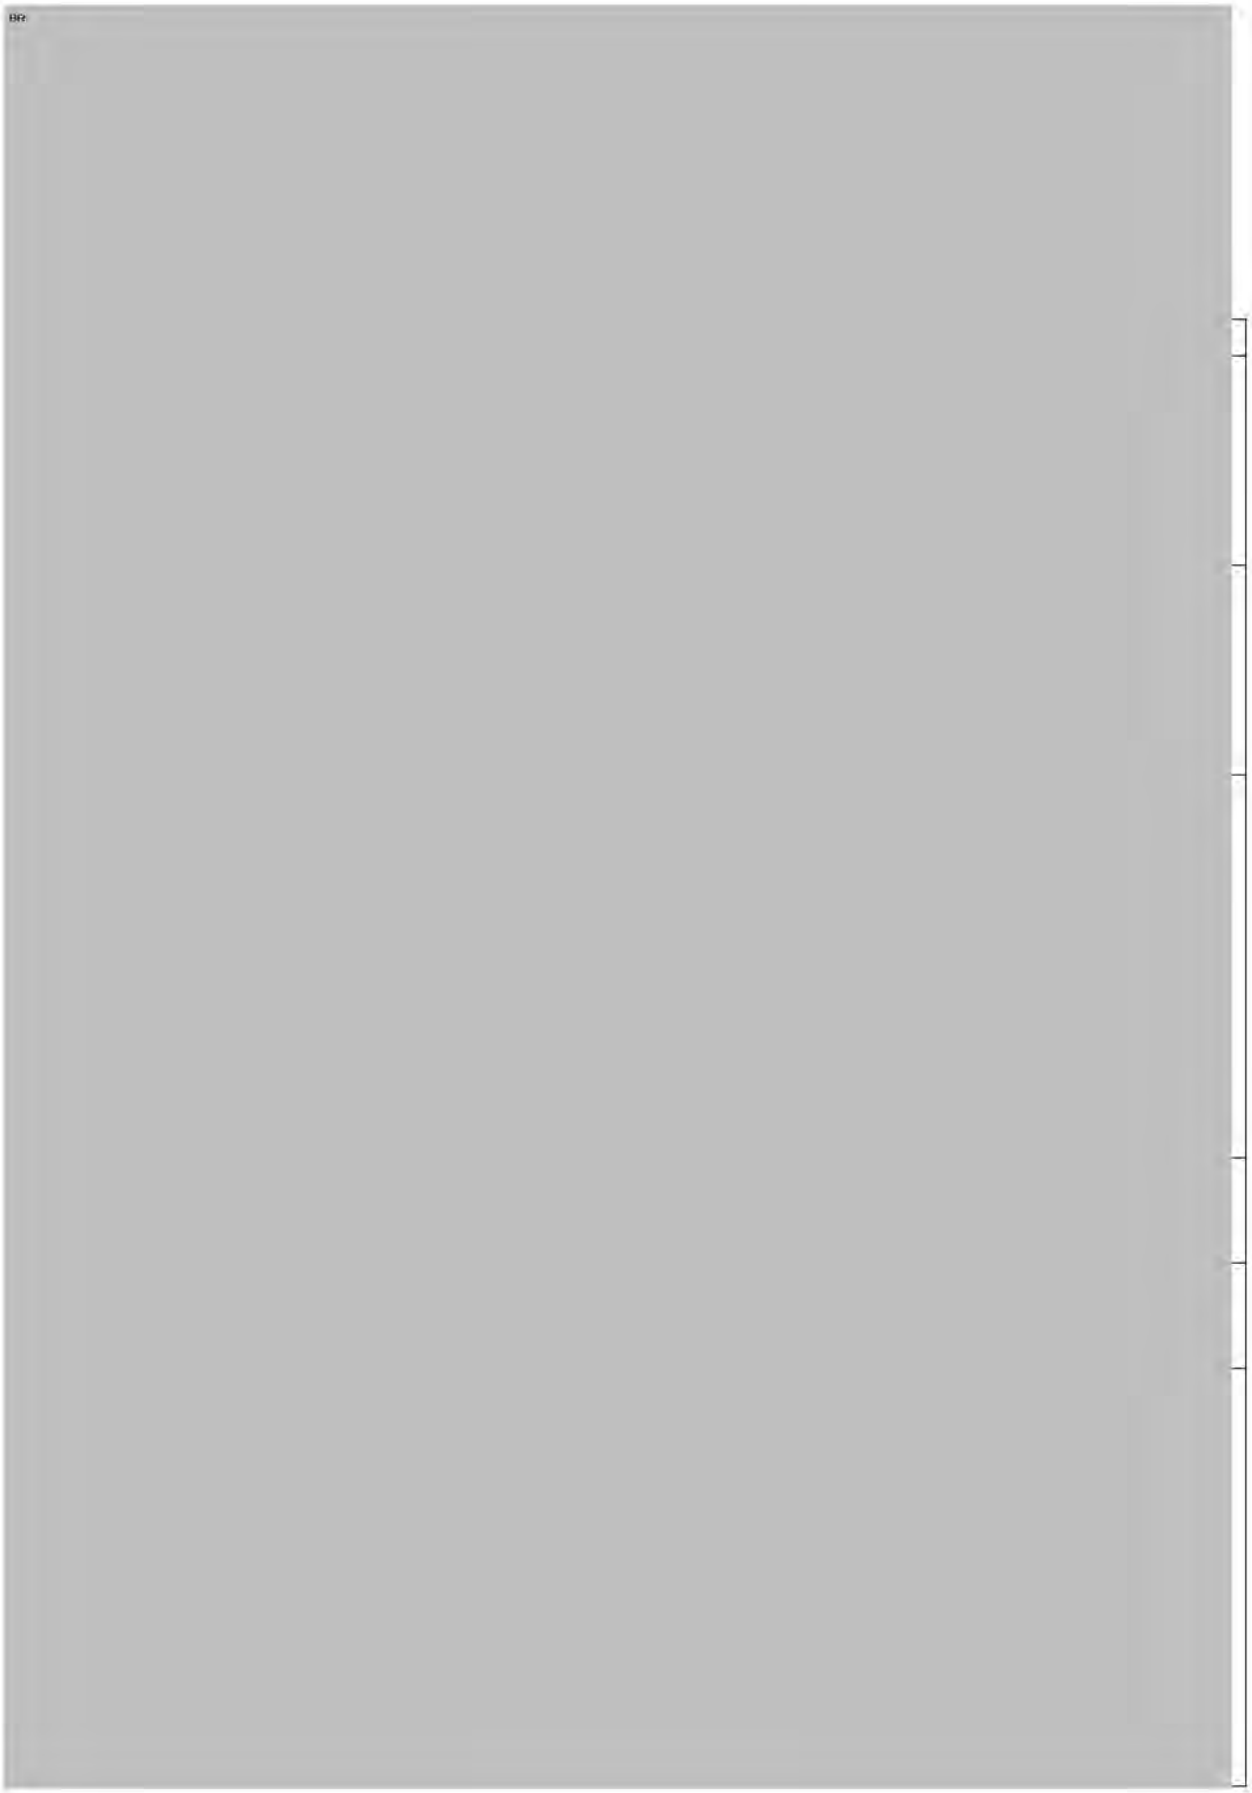

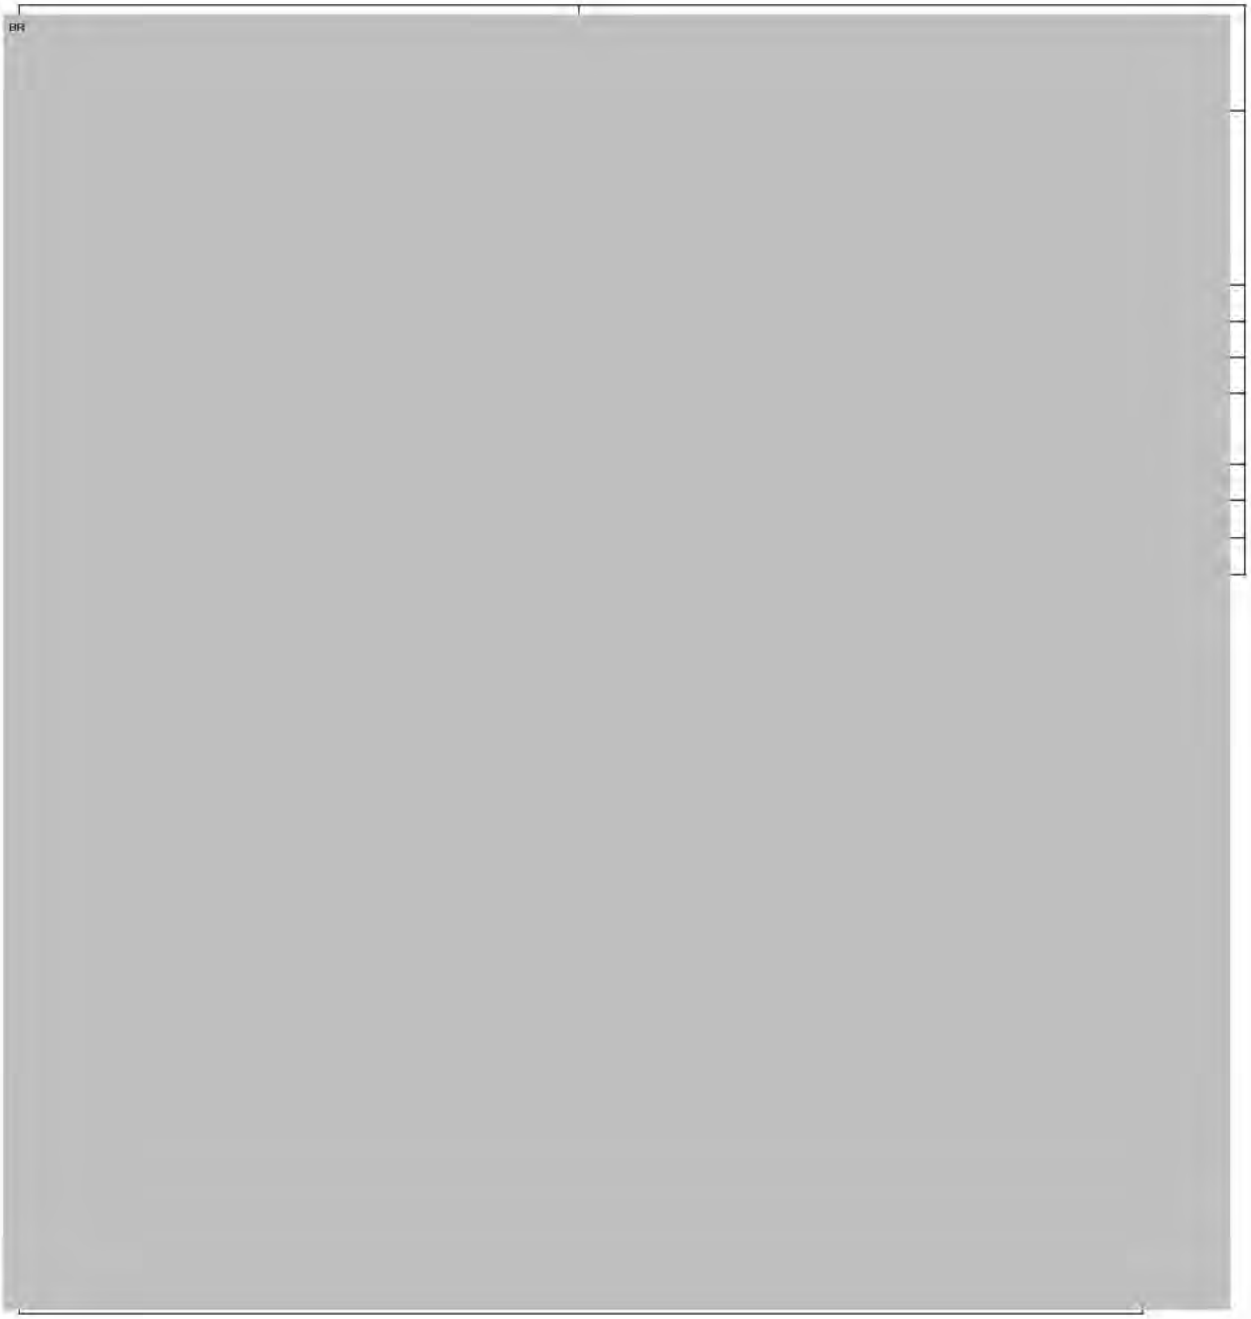
BR

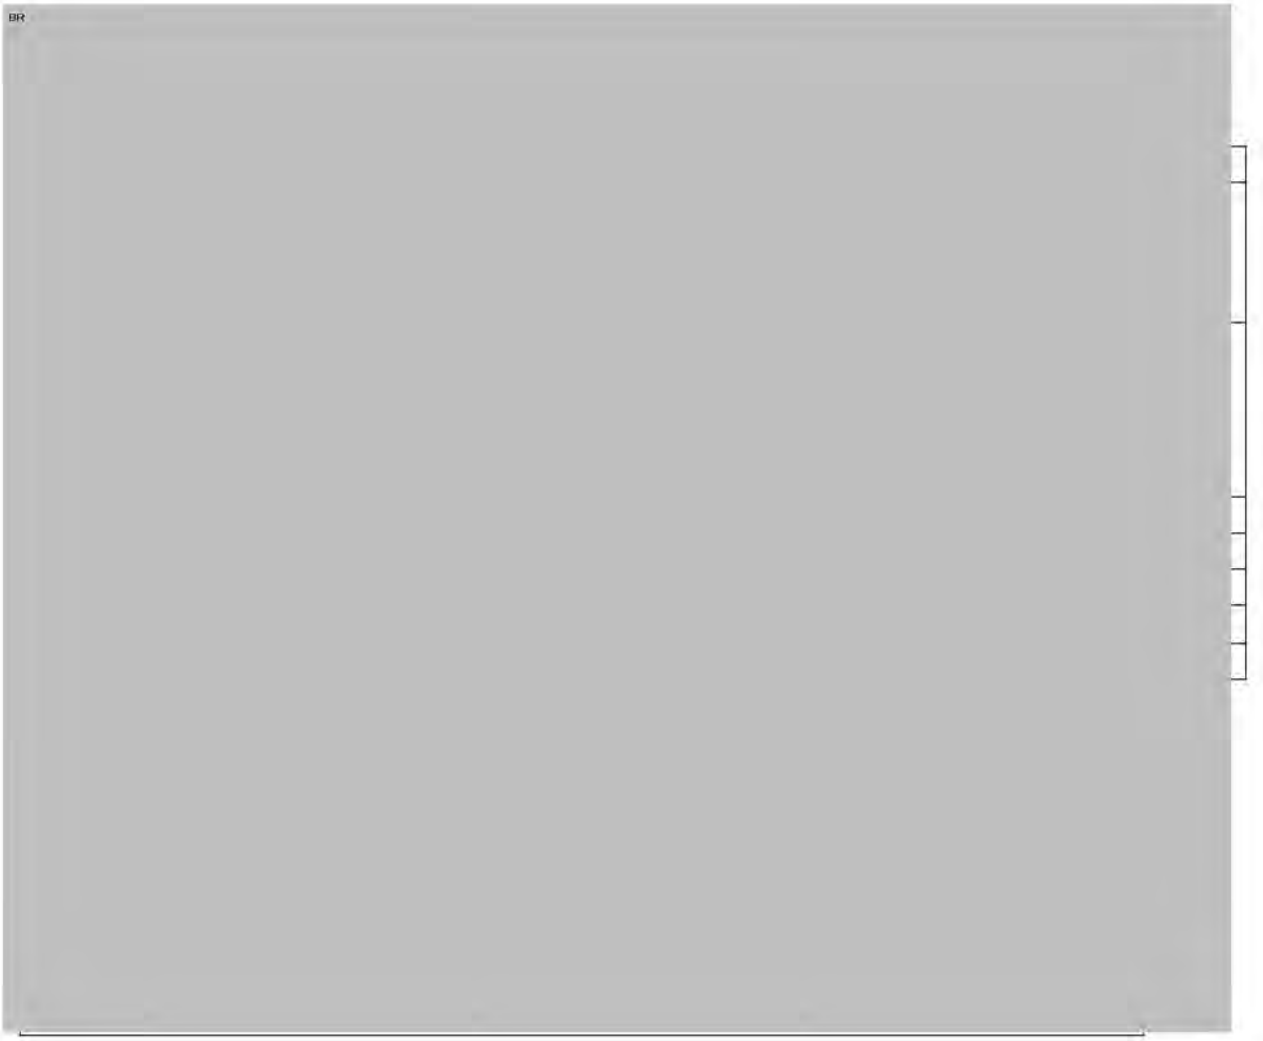
BR

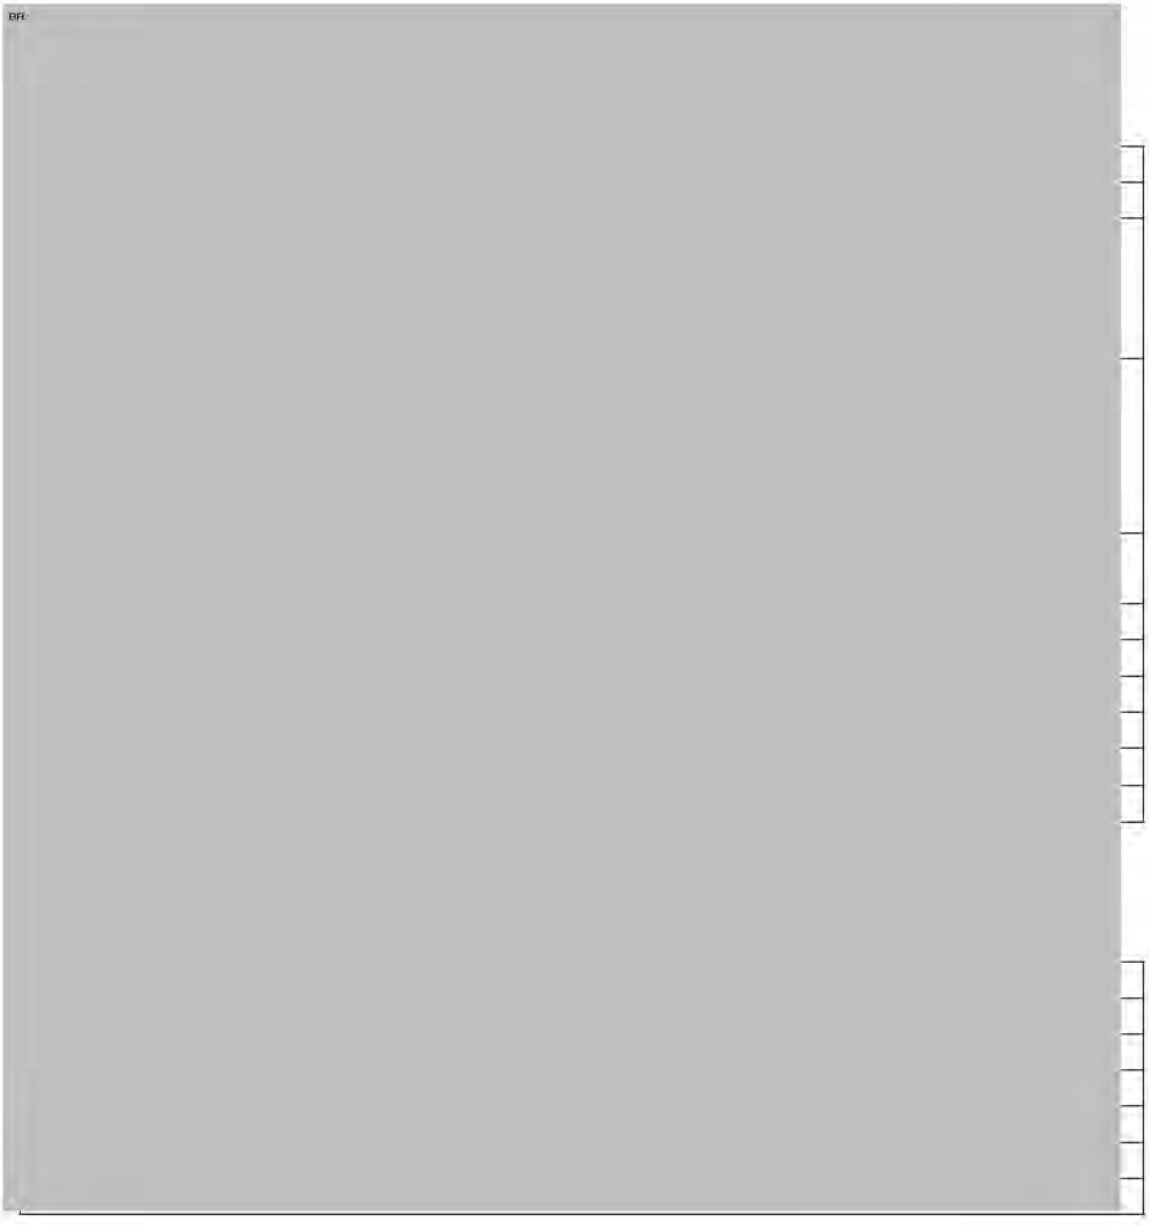

Docnr29



# 4 Overdracht en openstelling

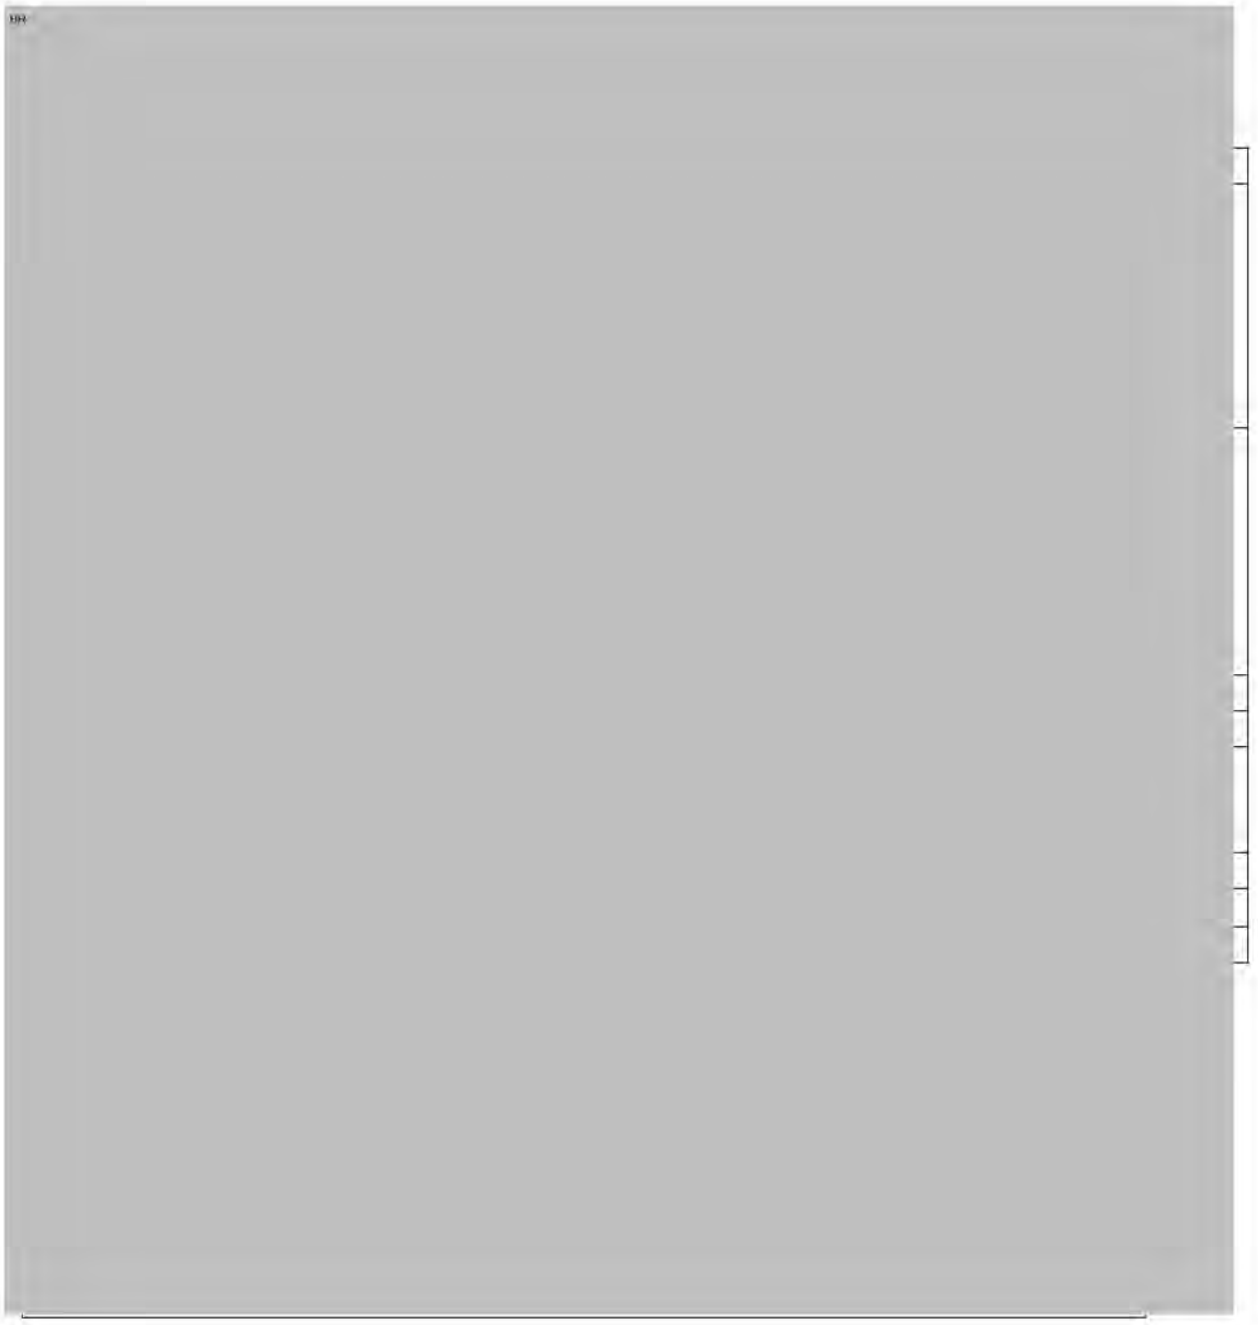

BR

Docnr29



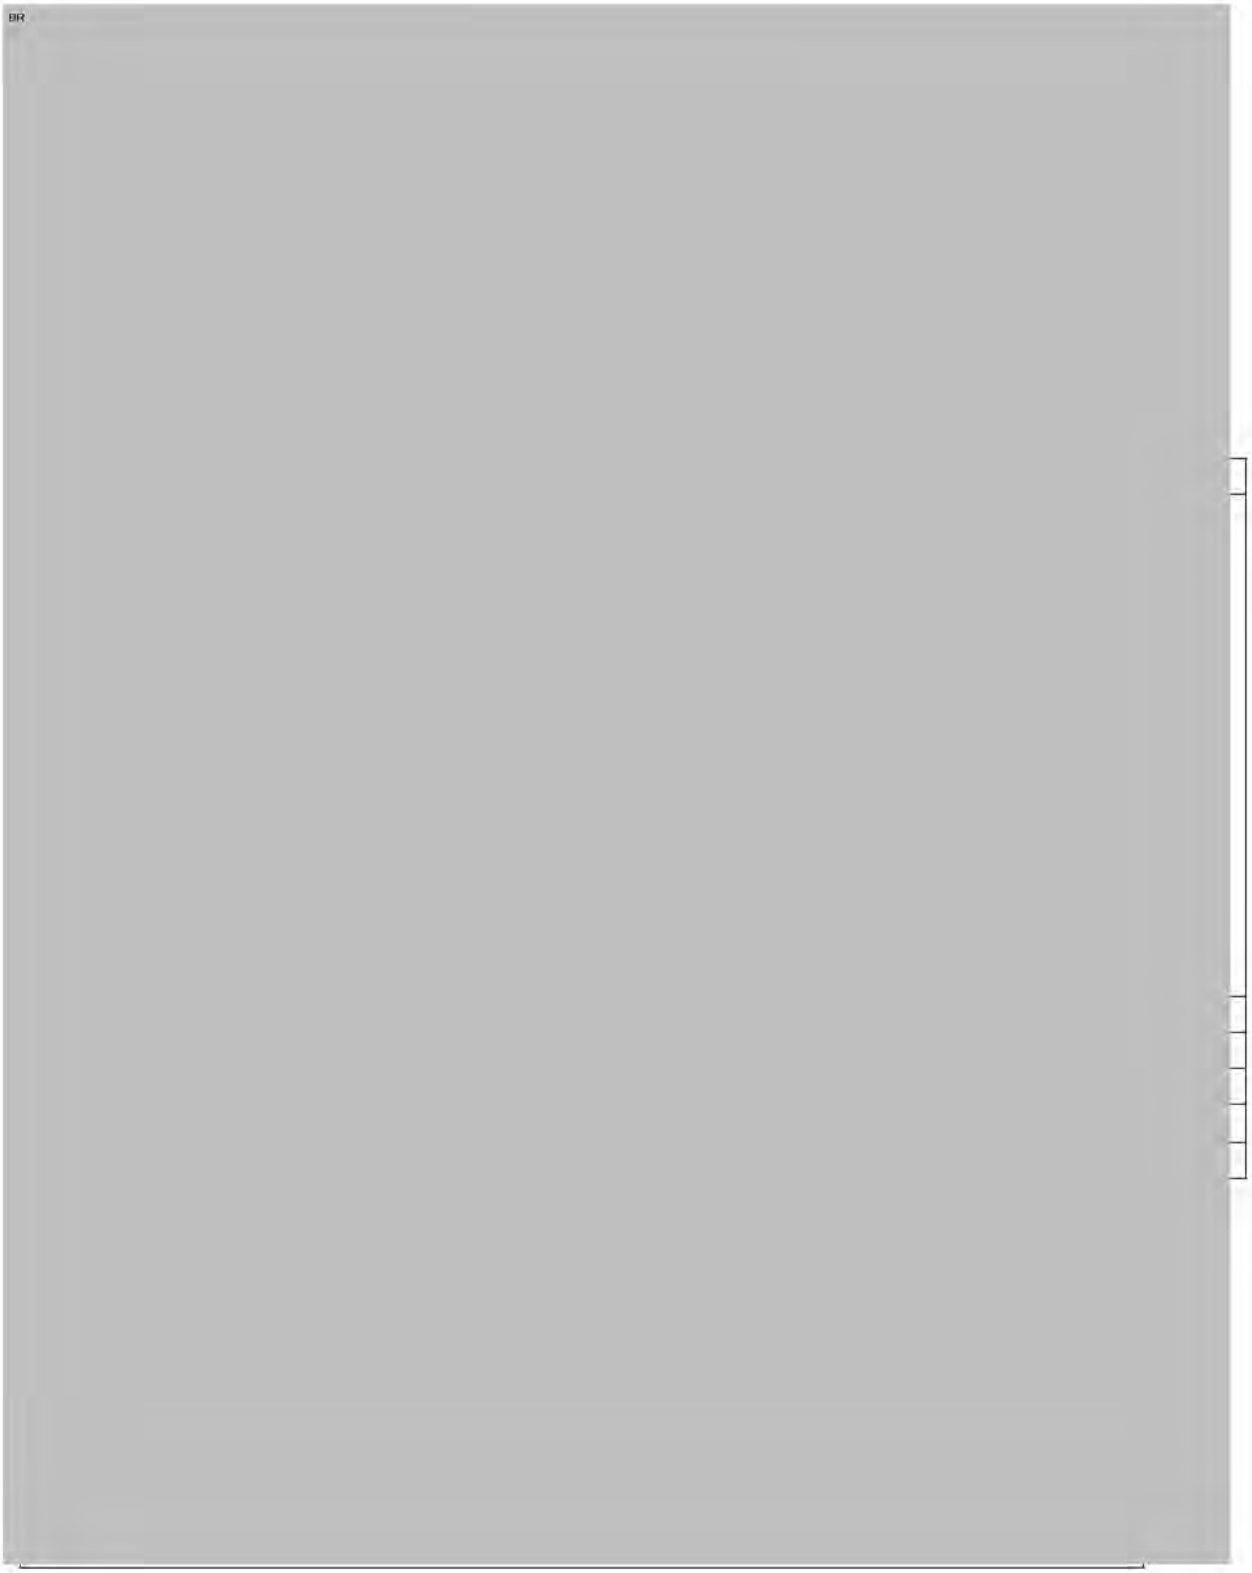

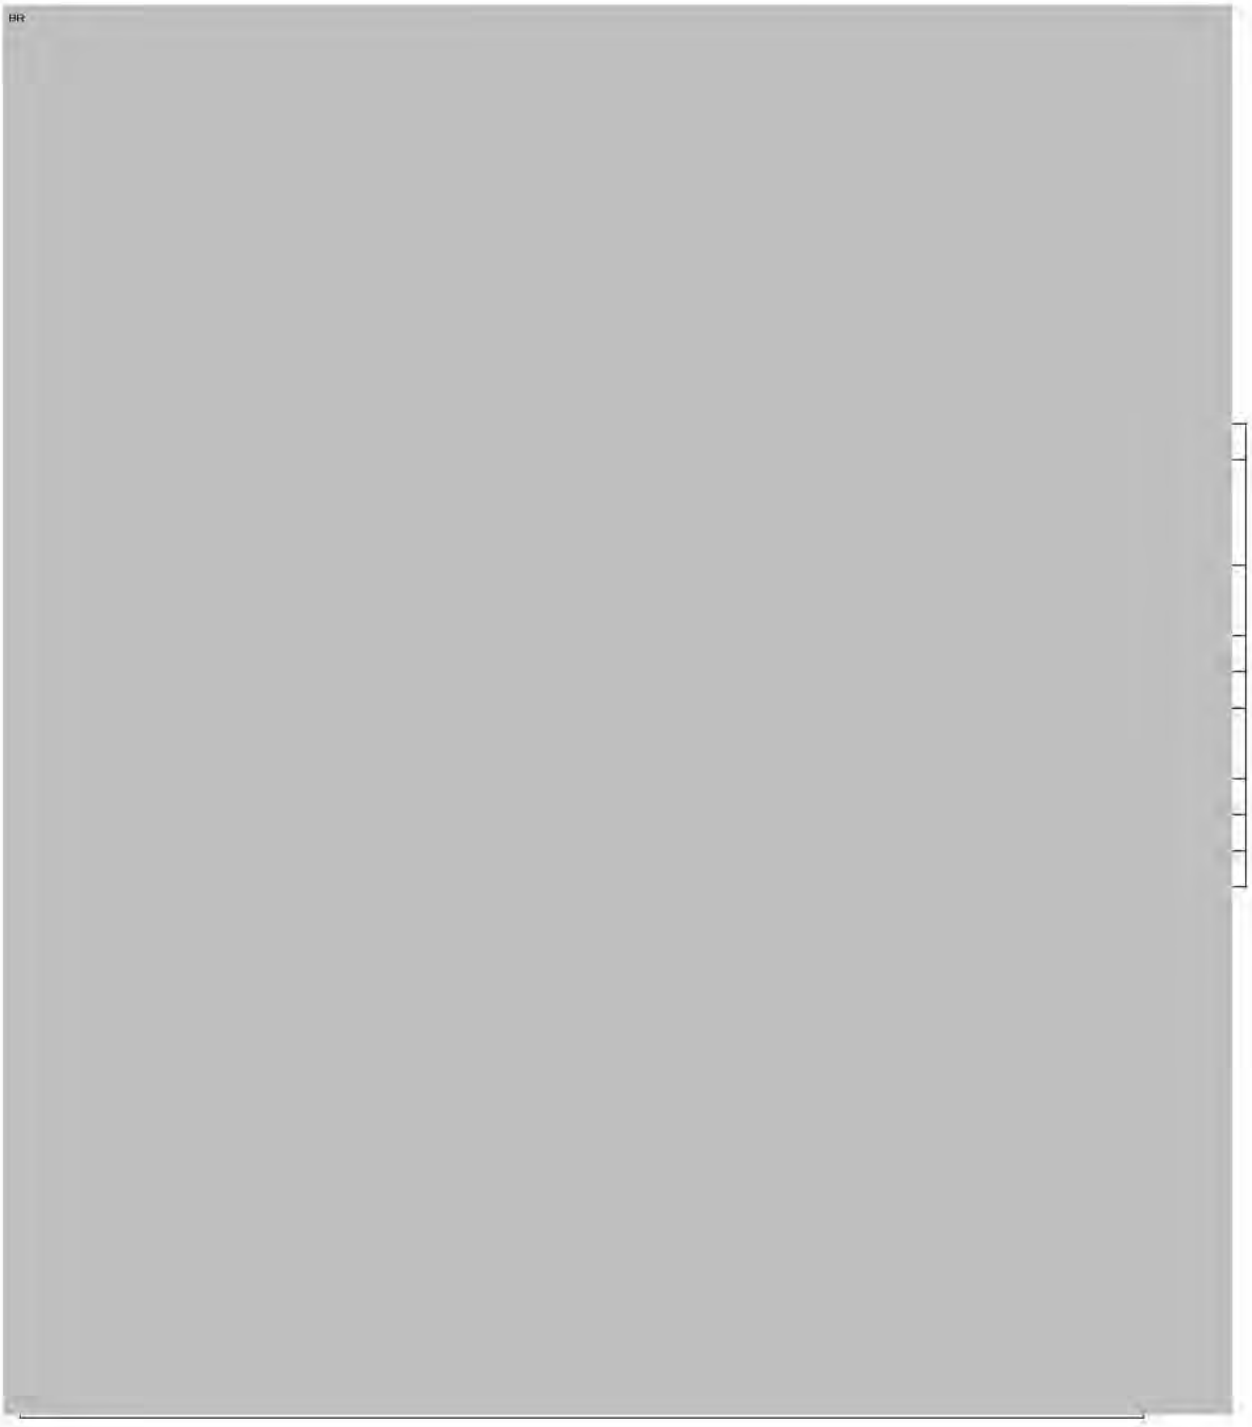
BR

Docnr29



# 5 Projectbeheersing

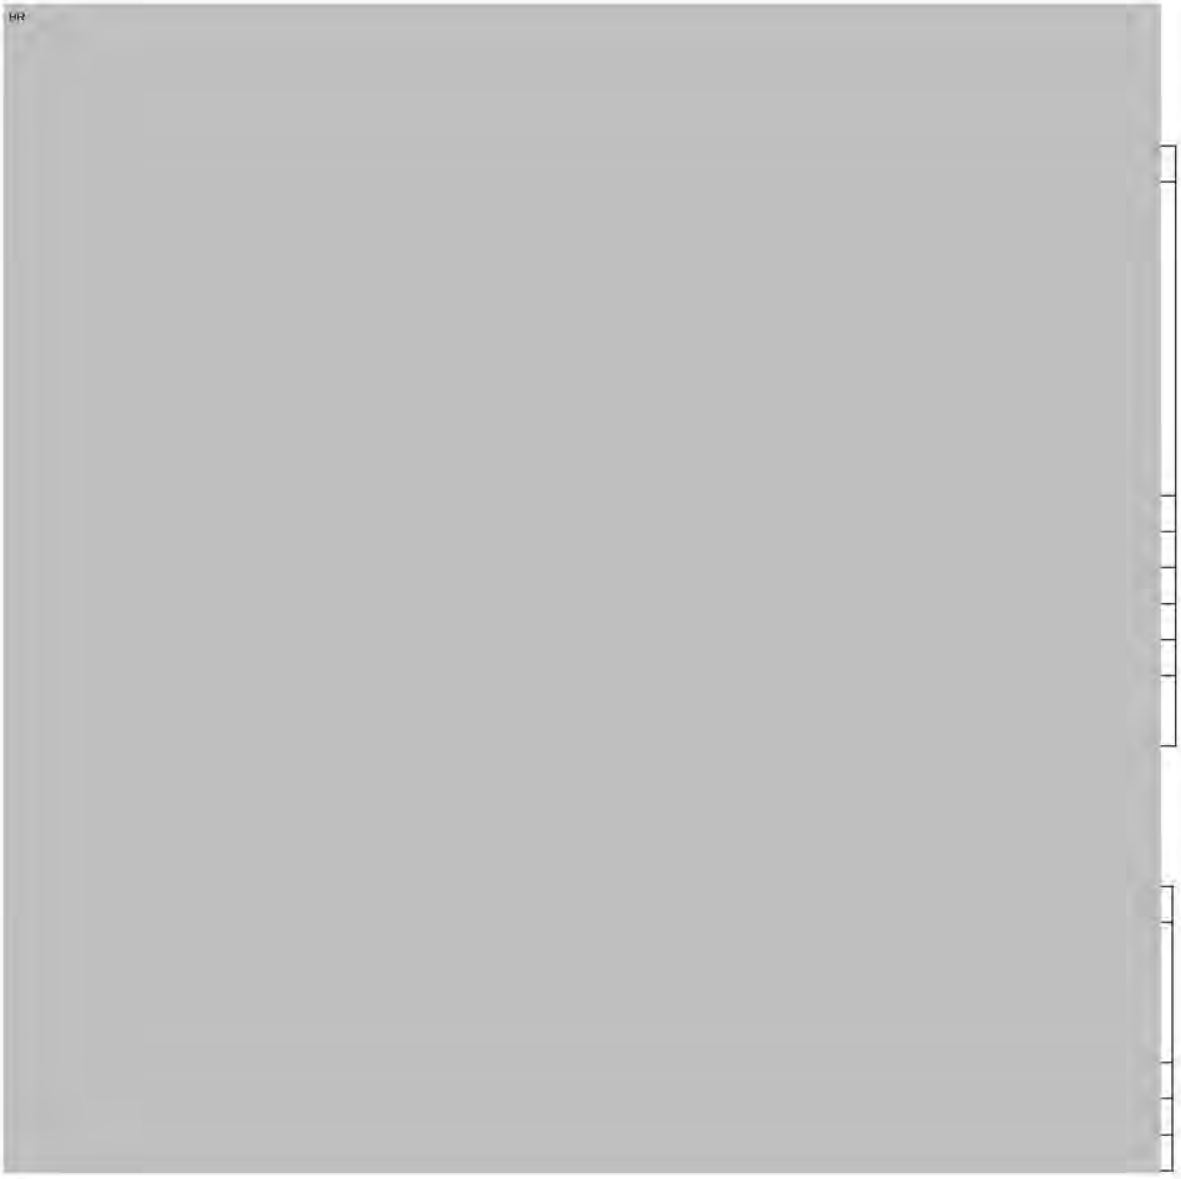

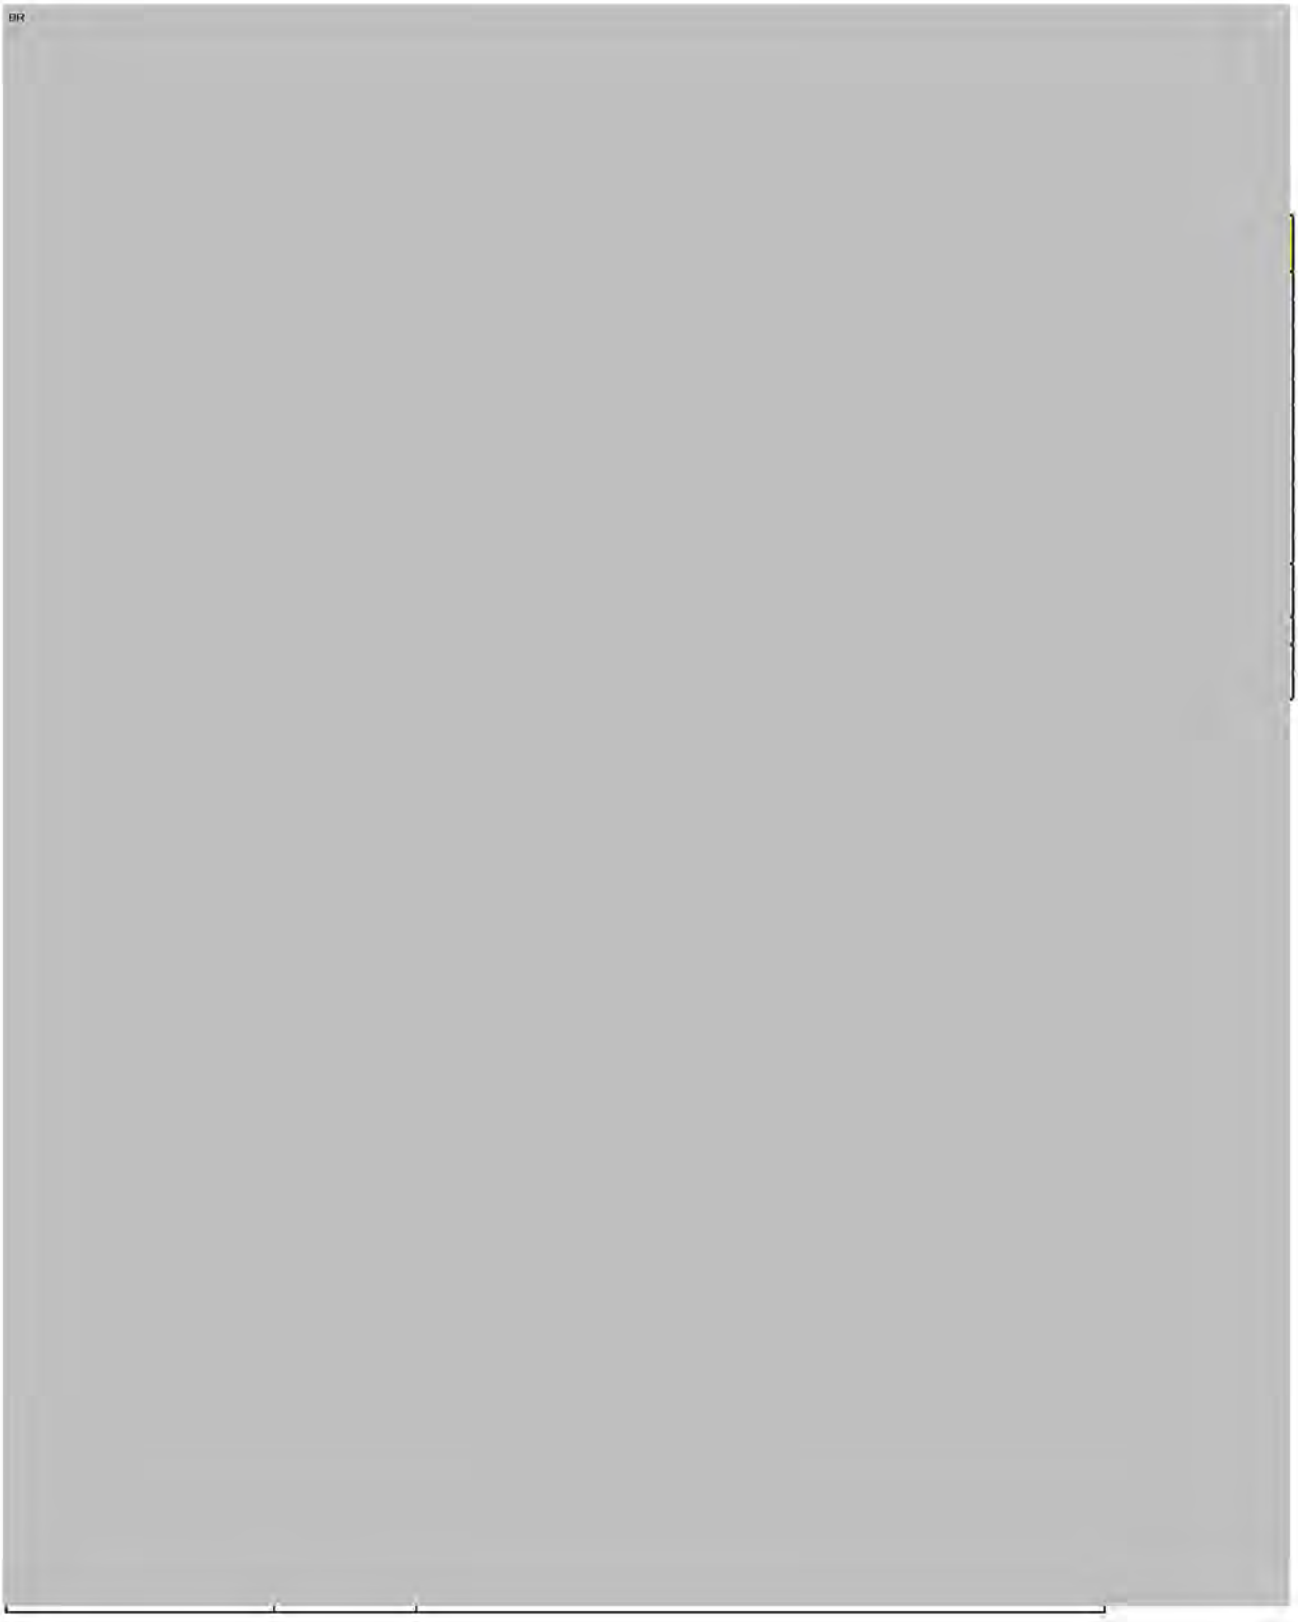

Docnr29

### 5.2.2 Budget

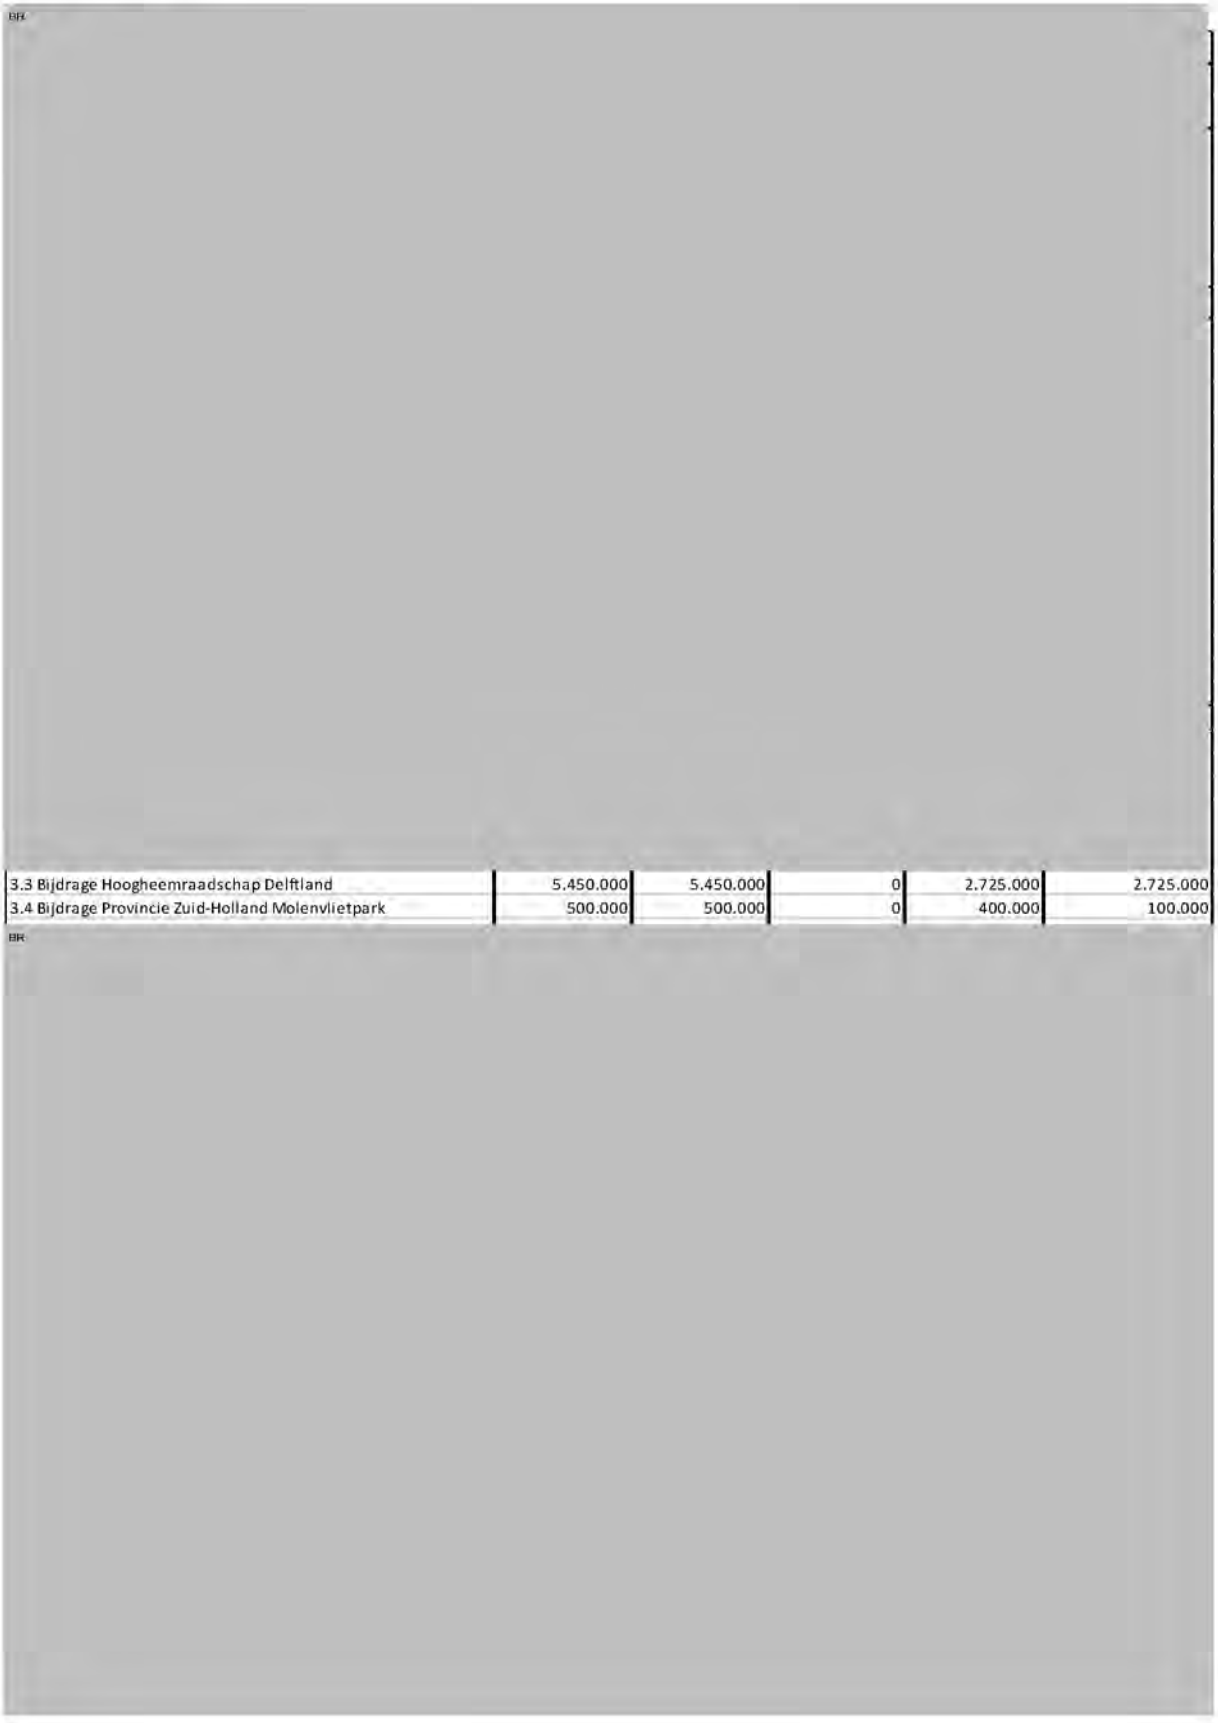

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delftland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland
Er zijn in het vierde kwartaal 2020 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland
Er zijn in het vierde kwartaal 2020 geen mutaties geweest.

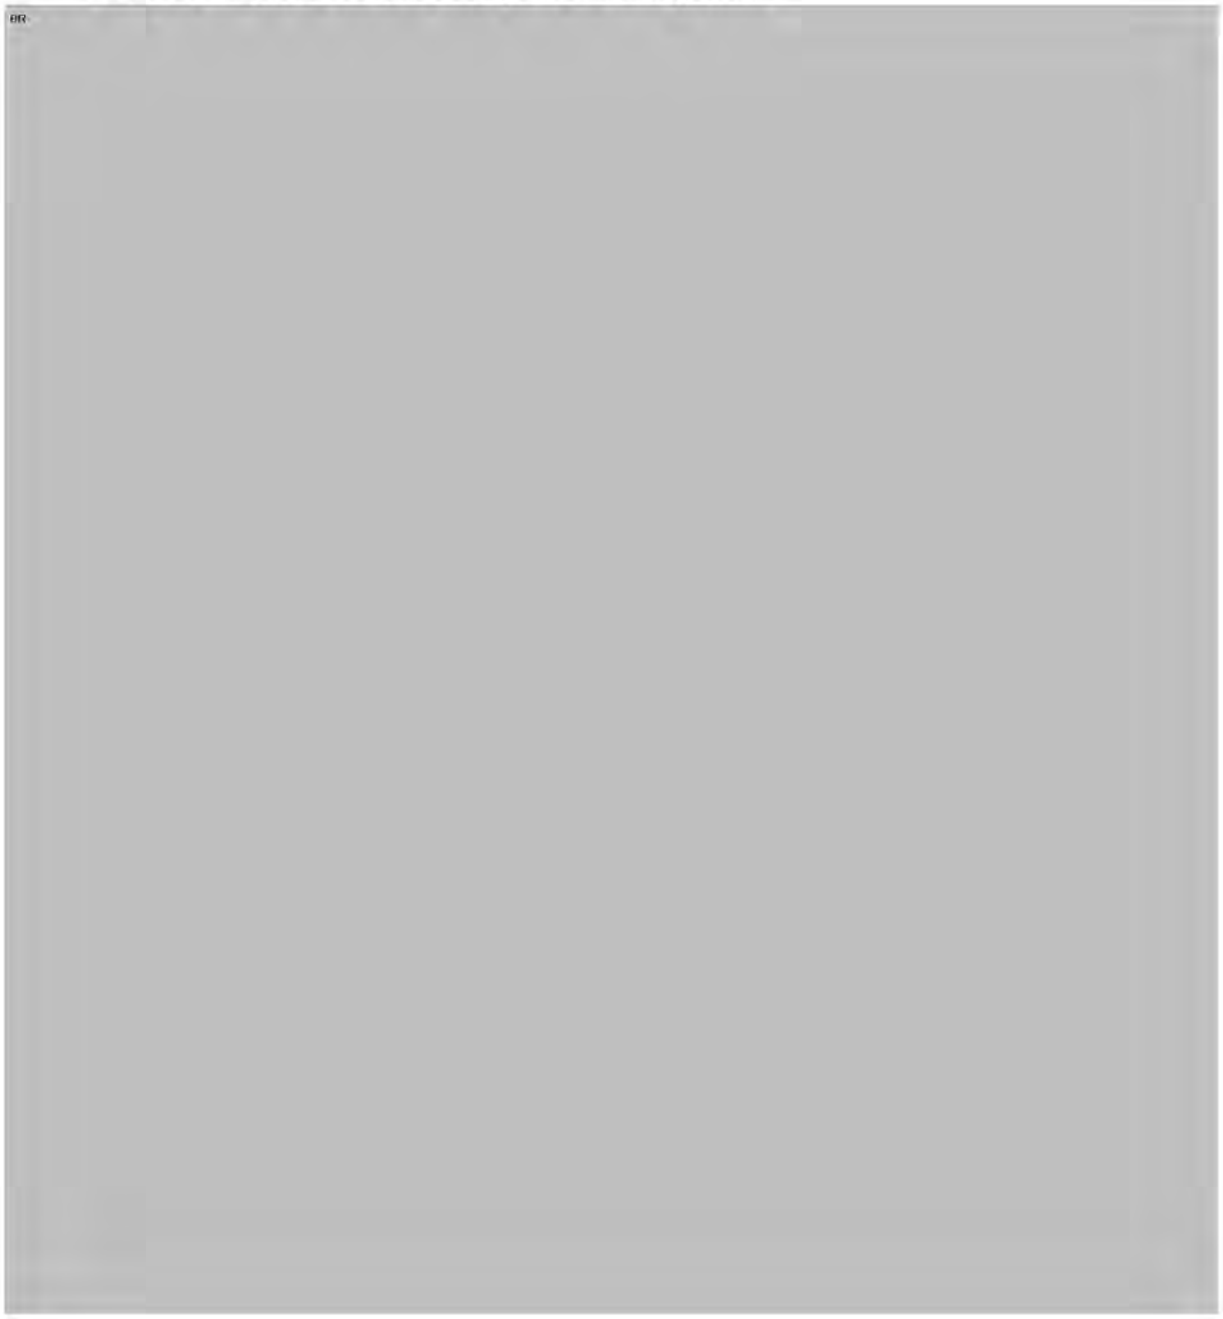

## 5.3 Planning

Zie tevens de bijlage 'Planningsmijlpalen'.

### 5.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Voortzetten regulier planningsproces Rotterdamsebaan, bediencentrale en 2e toevoer. | Her reguliere planningsproces is voortgezet. |
| Uitvoeren van onzekerheidsanalyses bediencentrale en 2e toevoer. | De onzekerheidsmodellen van de bedien-centrale en de 2e toevoer zijn geüpdatet en als basis gebruikt tijdens de risicosessies. Een doorrekening heeft niet plaats gevonden. |
| | |

[redacted]

## 5.4 Risico's

### 5.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Actualiseren risicodossier t.b.v. 2e toevoer & Bediencentrale. | Risicodossier is geactualiseerd. |
| Opstellen risicoprofielen 2e toevoer & Bediencentrale. | Risicodossier is geactualiseerd. |
| | |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Extra inzet gepleegd om overdracht 2e toevoer voor te bereiden. | |
| | |
| BR | |

### 5.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| BR |
| Uitvoeren financiële analyse van de Rotterdamsebaan, de Bediencentrale en de 2e Toevoer. |
| Uitvoeren van een planningsanalyse van de Bediencentrale en de 2e Toevoer (onder voorbehoud gemaakte afspraken/voortgang). |
| |
| BR |

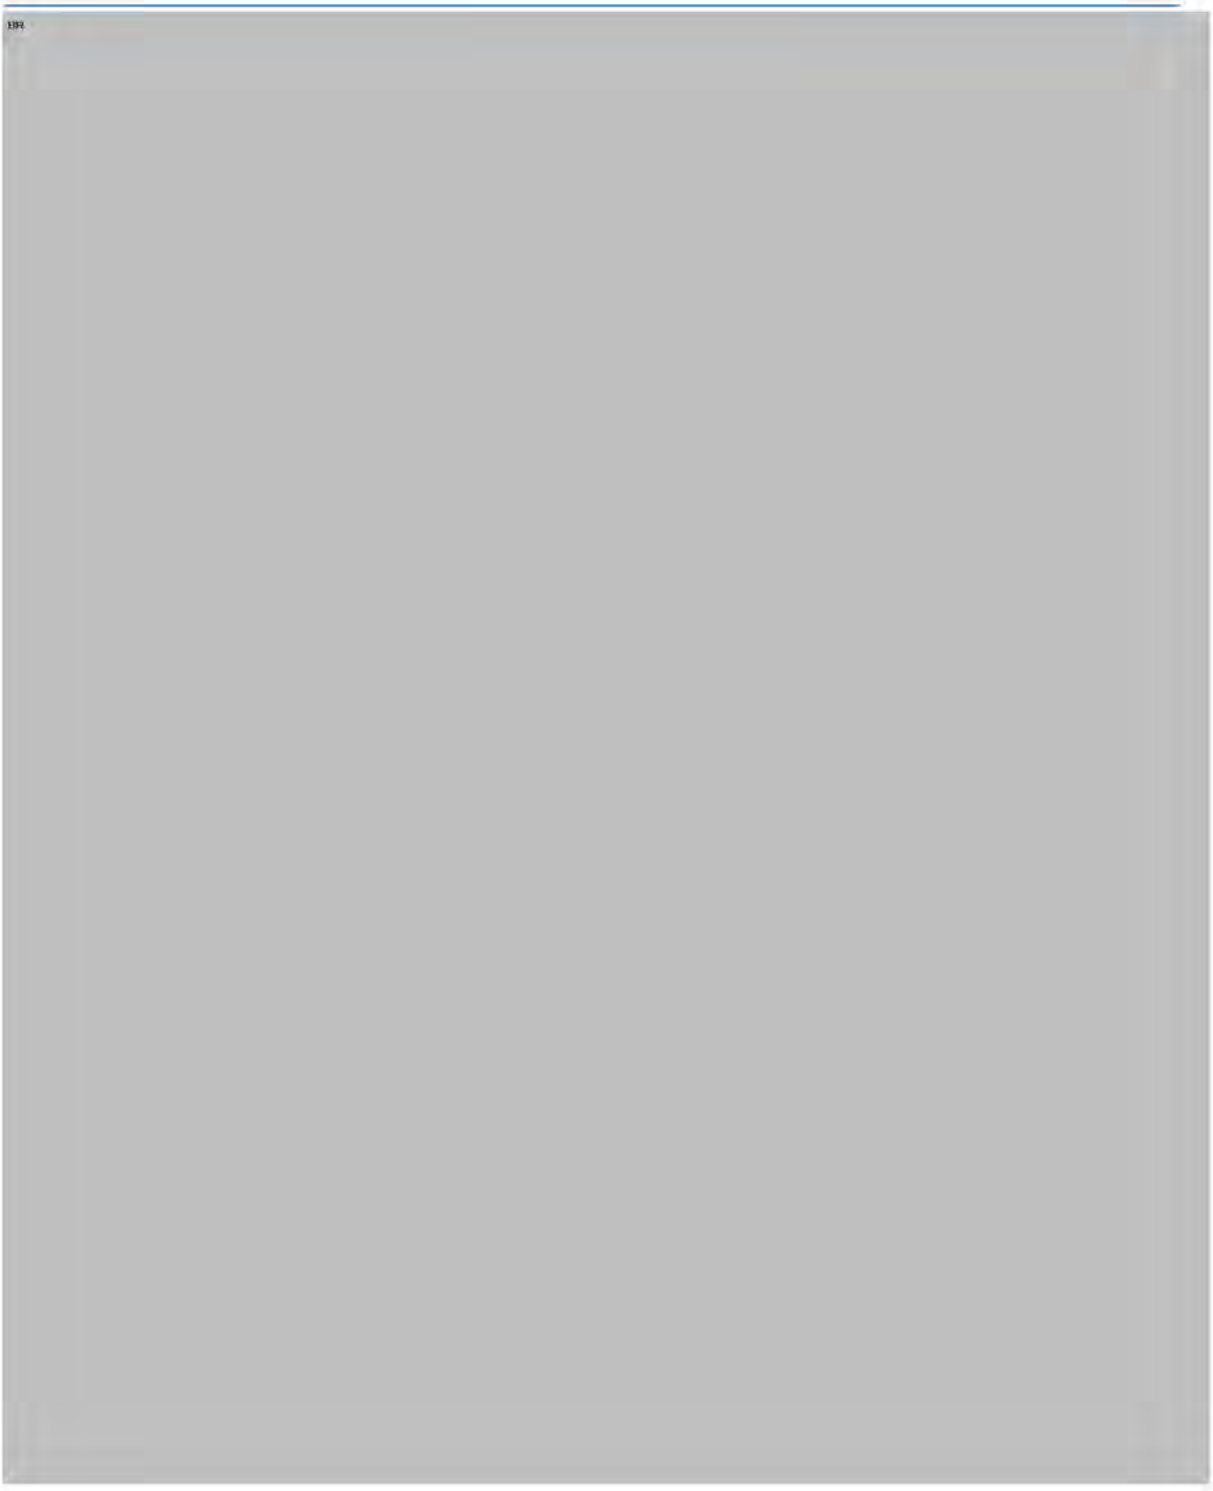

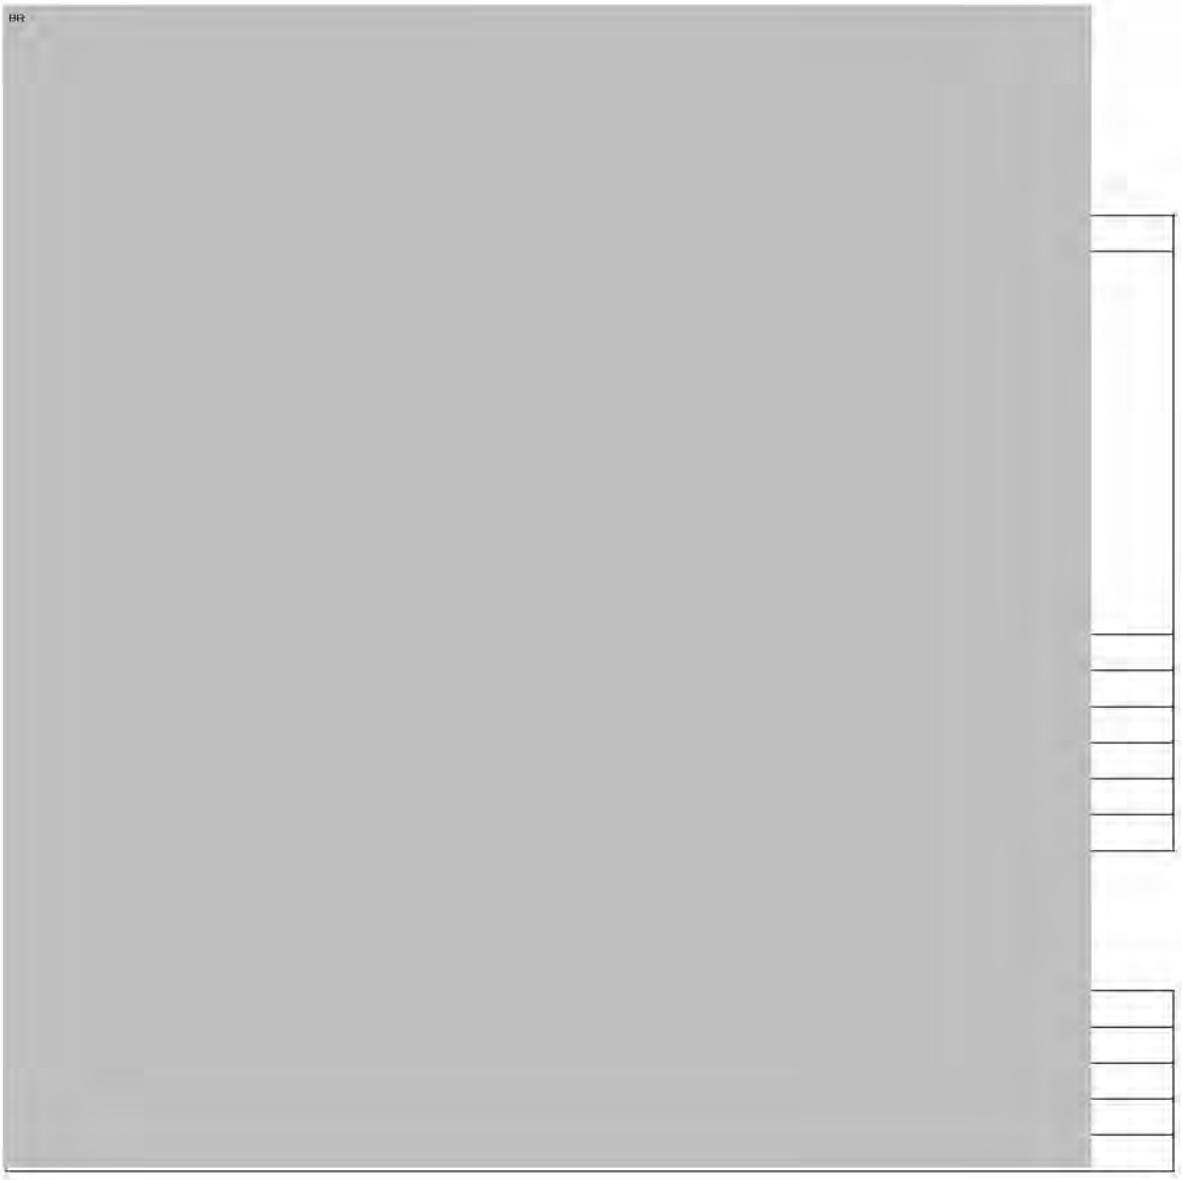
BR

Docnr29



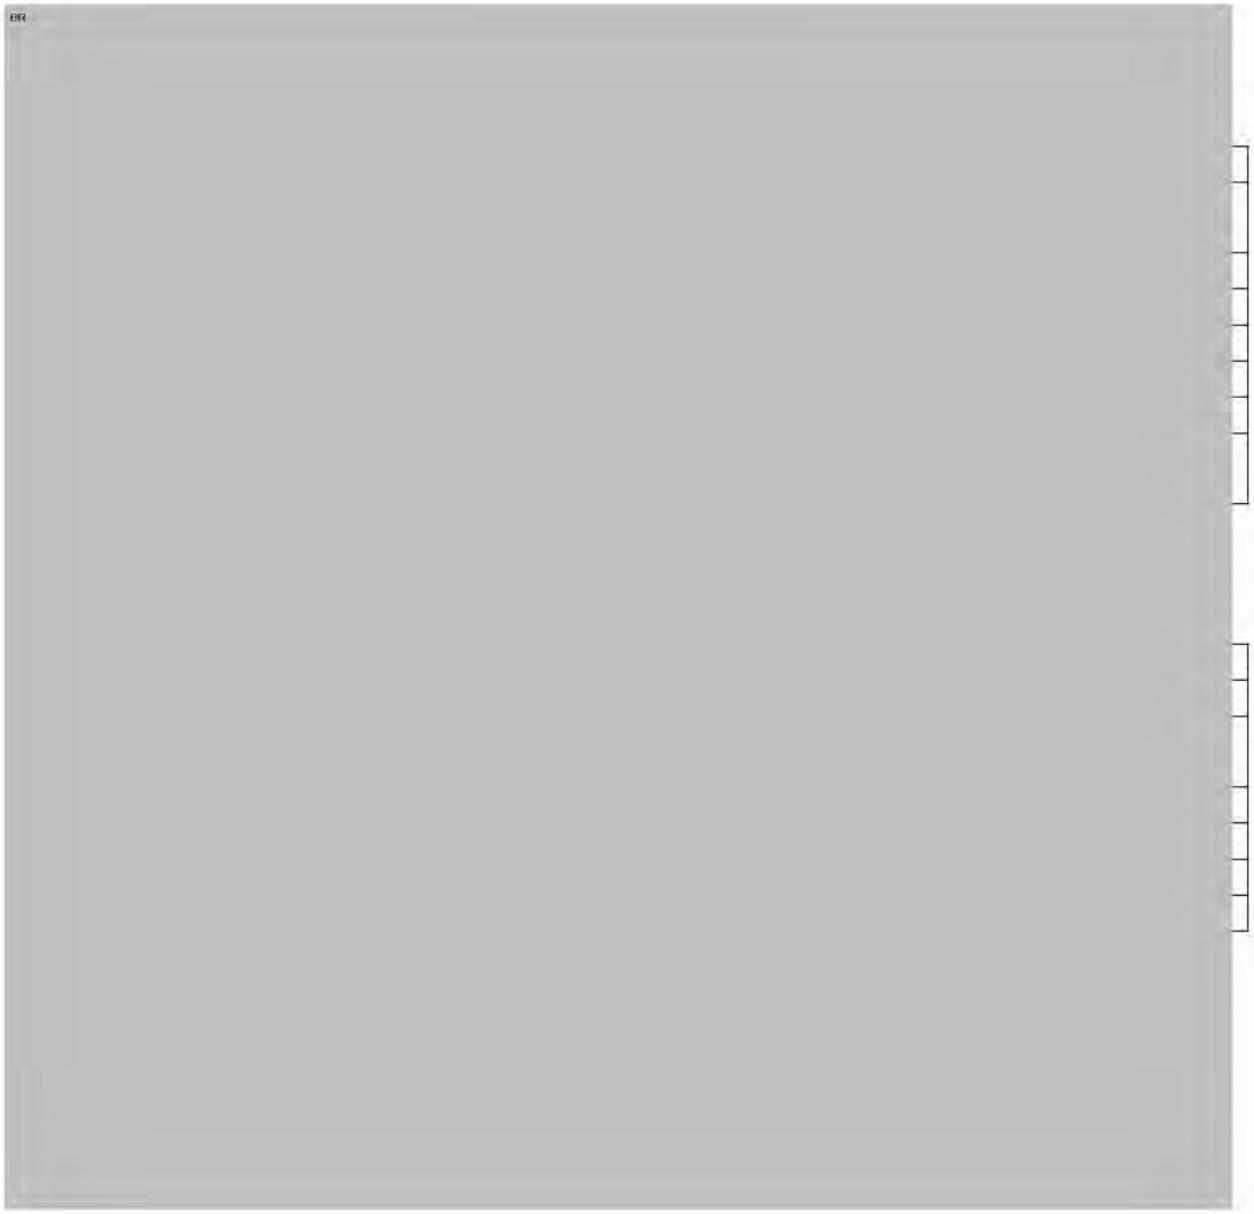

Docnr29

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 1 okt 2020 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 5-jun-20 | 30 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie (incl. consolidatieperiode) vertraagd. Het planten van de laatste groenvoorzieningen heeft in het najaar '20 plaats gevonden. |
| BR | | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

Docnr29

BR

Docnr29



Docnr30

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 1e kwartaal 2021

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 21 mei 2021**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 2.0**

Docnr30

Docnr30



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 1e kwartaal 2021
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-005036

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>15 april 2021 | Versie 0.1<br>16 april 2021 | Versie 1.0<br>20 april 2021 | Versie 1.0<br>11 mei 2021 | Versie 2.0<br>21 mei 2021 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. A. Mulder, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr30



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 9

*2.1 Omgevingsmanagement* *9*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 9
2.1.2 Komende kwartaal 9

*2.2 Planologie en Vergunningen* *10*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 10
2.2.2 Komende kwartaal 10

*2.3 Overeenkomsten en verwervingen* *11*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 11
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Communicatie* *13*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 13
2.4.2 Komende kwartaal 14
2.4.3 Diversen 14

3 Projectvoortgang 15

*3.1 Aanbesteden en contracteren* *15*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 15
3.1.2 Komende kwartaal 15

*3.2 Kunstprojecten* *16*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 16
3.2.2 Komende kwartaal 16

*3.3 Inpassing Binckhorst* *17*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 17
3.3.2 Komende kwartaal 17

*3.4 Inpassing Vlietzoom* *18*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 18
3.4.2 Komende kwartaal 18

*3.5 Inpassing Laan van Hoornwijck* *19*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 19
3.5.2 Komende kwartaal 19

*3.6 Boortunnel en toeritten* *20*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 20
3.6.2 Komende kwartaal 20

*3.7 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *21*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 21
3.7.2 Komende kwartaal 21

*3.8 Installaties* *22*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 22
3.8.2 Komende kwartaal 22

*3.9 Veiligheid en gezondheid* *23*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 23

Docnr30




3.9.2 Komende kwartaal 23

*3.10 Bediencentrale* *24*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 24
3.10.2 Komende kwartaal 25

*3.11 Uitvoeringskwaliteit* *26*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 26
3.11.2 Komende kwartaal 26

*3.12 Contractmanagement* *27*
3.12.1 Afgelopen kwartaal 27
3.12.2 Komende kwartaal 27

**4 Overdracht en openstelling** **28**

*4.1 Tunnelveiligheid* *28*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 28
4.1.2 Komende kwartaal 28

*4.2 Overdracht aan beheerders* *29*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 29
4.2.2 Komende kwartaal 29

*4.3 Beheer en onderhoud* *31*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 31
4.3.2 Komende kwartaal 31

**5 Projectbeheersing** **32**

*5.1 Scope* *32*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 32
5.1.2 Komende kwartaal 32

*5.2 Financiën* *33*
5.2.1 Kostenstructuur 33
5.2.2 Budget 34

*5.3 Planning* *37*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 37
5.3.2 Komende kwartaal 37

*5.4 Risico's* *38*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 38
5.4.2 Komende kwartaal 38
5.4.3 Financiële toprisico's 38
5.4.4 Toprisico's planning 39

*5.5 Informatiebeheer* *40*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 40
5.5.2 Komende kwartaal 40
5.5.3 Kennisdeling 40

*5.6 Organisatie* *41*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 41
5.6.2 Komende kwartaal 41

**6 Bijlage: Planningsmijlpalen** **42**

Docnr30



**7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 43**

# 1 Managementsamenvatting

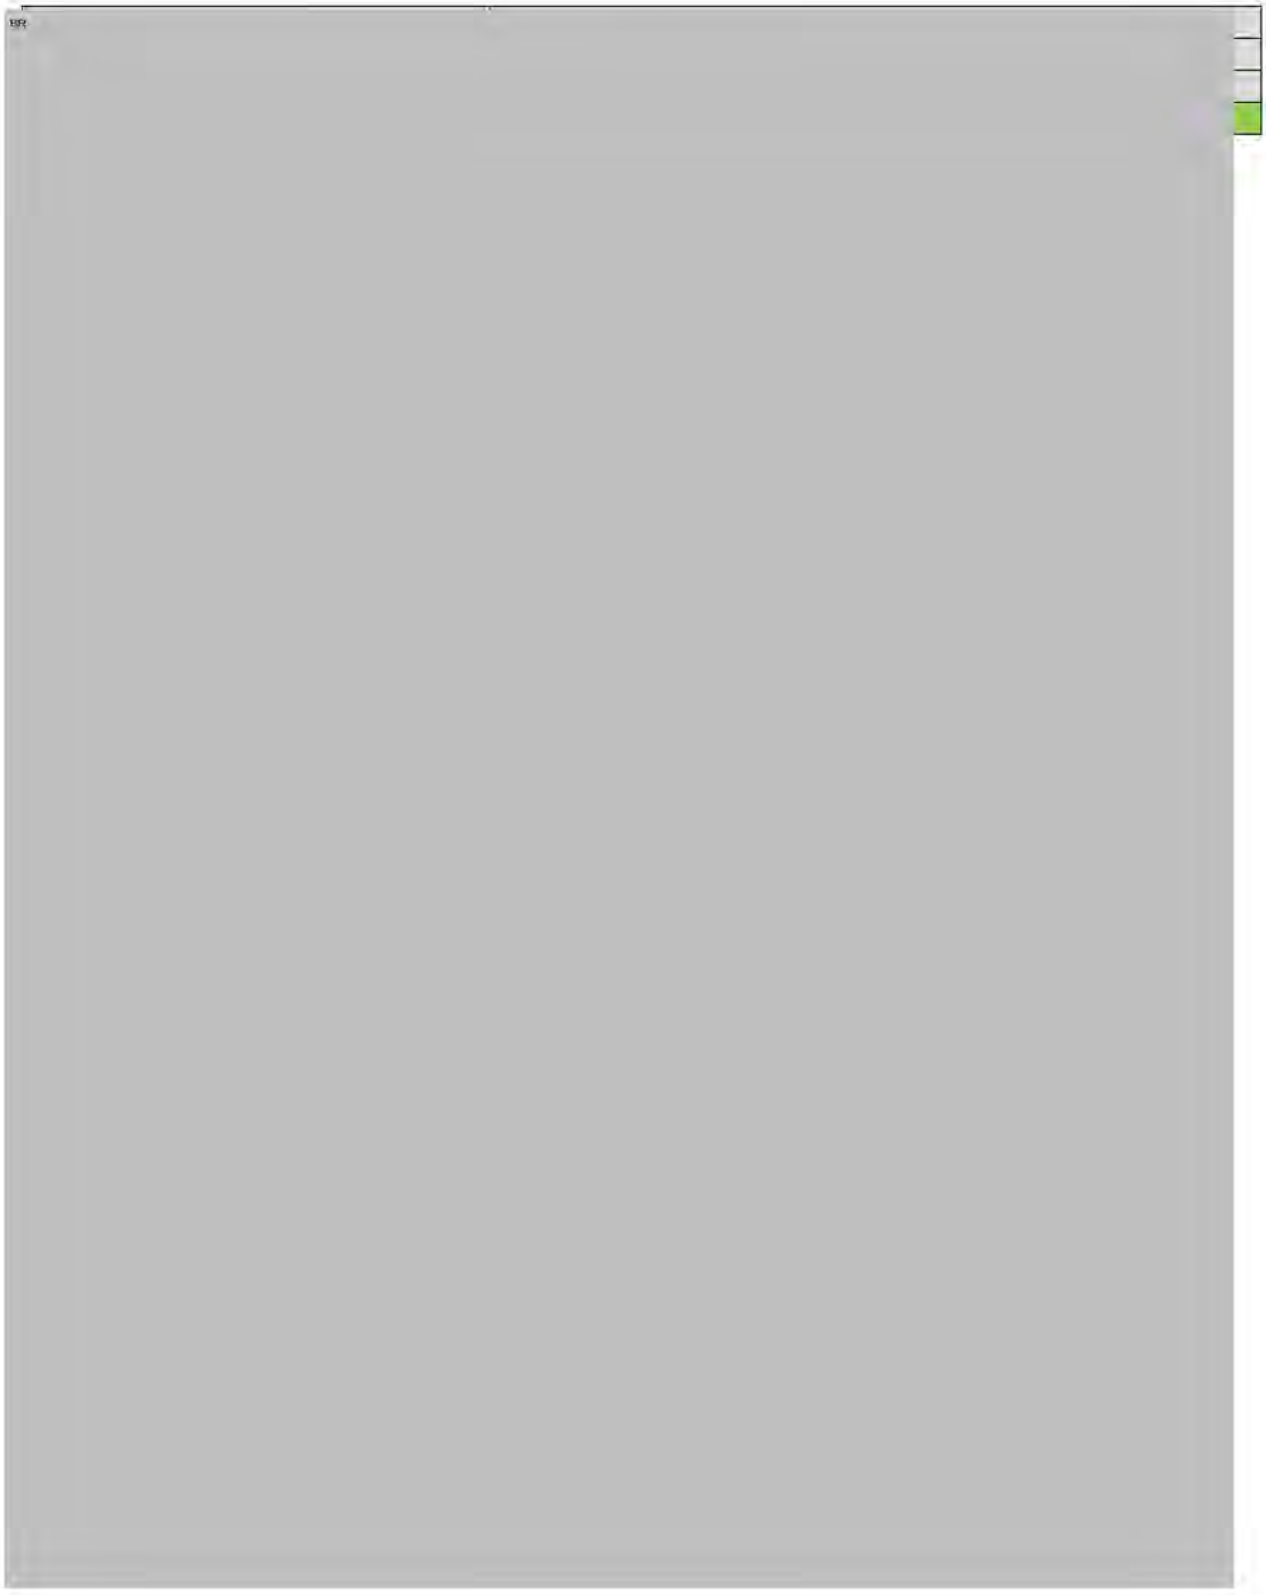

## 4. TERUGBLIK AFGELOPEN KWARTAAL

Afgelopen kwartaal is er onder andere gewerkt aan:

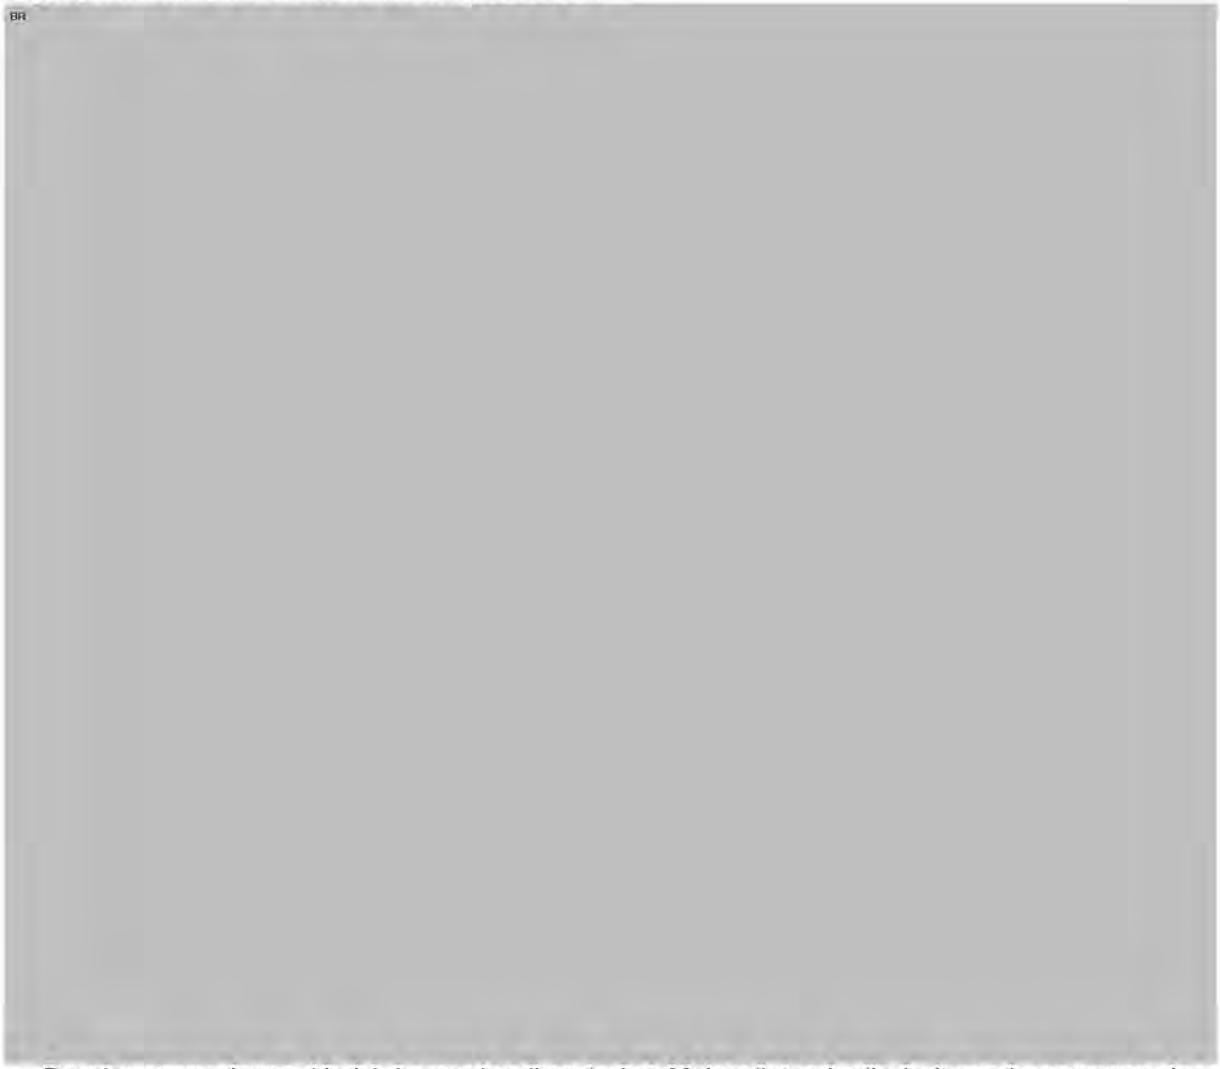

- De niet aangeslagen (dode) bomen/struiken in het Molenvlietpark zijn in januari vervangen door nieuwe exemplaren.
- Bij de test van de aflaatconstructie tussen de Molensloot en de waterberging op 25 februari jl. is gebleken dat de bodembescherming achter de aflaat niet conform ontwerp is uitgevoerd en er herstelmaatregelen moeten worden uitgevoerd.

- De volgende onderdelen zijn afgelopen kwartaal overgedragen aan diverse beheerders binnen de gemeente Den Haag:
  - [redacted]
  - Speelaanleidingen Molenvlietpark;
  - [redacted]
- Met de particuliere eigenaar van het perceel waarover de Tweede watertoevoer is gepland is gesproken over de concept-SOK. Hij heeft aangegeven bij nader inzien zijn eigendom waarop de Tweede watertoevoer gerealiseerd wordt toch aan de gemeente te willen verkopen. Hierop worden de SOK en bijlagen aangepast.
- Er is een begin gemaakt met twee projectmutaties om de projecten Bediencentrale en Tweede toevoer als opvolgende projecten van Rotterdamsebaan te verzelfstandigen. Het doel is om de scope en de bijbehorende middelen uit de projectopdracht en de -administratie van het project Rotterdamsebaan te halen en als eigenstandige projecten verder apart van elkaar uit te voeren, met eigen bemensing.
- Door middel van risicosessies is het risicodossier is geactualiseerd. Vervolgens zijn de financiële analyses uitgevoerd. Voor de Tweede toevoer is de onzekerheidsanalyse op de planning uitgevoerd en voor de Bediencentrale is de praatplaat geactualiseerd.

[redacted]

## 8. Risico's

In het 1e kwartaal is het risicodossier t.a.v. de onderdelen tweede watertoevoer, BR BR BR door middel van diverse risicosessies besproken en geactualiseerd. De financiële haalbaarheid is op grond van het risicoprofiel en beschikbare budget opnieuw berekend. Die heeft uitgewezen dat het project valt in de categorie >60% (dit is een 'Laag' risicoprofiel en is ongewijzigd gebleven sinds de vorige rapportage).

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.1 Omgevingsmanagement

### 2.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorig kwartaal | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Samen met gemeente Rijswijk en bewoner Park Hoornwijck komen tot een gedragen oplossing t.a.v. de hoogte en het beheer van de heg bij het nieuwe voetpad naar het Molenvlietpark, langs de woning van de bewoner. | Projectorganisatie en groenbeheerder van Rijswijk hebben een gezamenlijk voorstel aan de bewoner gedaan. Gemeente Rijswijk is bereid om de haag tot 2 meter hoogte te laten doorgroeien. Hierop is van de woningeigenaar of zijn advocaat nog geen reactie ontvangen. |
| | |
| BR | |

## 2.2 Planologie en Vergunningen

### 2.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| BR | |
| Intrekken oorspronkelijke aanvraag kapvergunning t.b.v. tweede watertoevoer en nieuwe / geactualiseerde aanvraag kapvergunning indienen. | Landschappelijk ontwerp tweede watertoevoer wordt geactualiseerd, mede n.a.v. het aangepaste landschapsontwerp voor het naastgelegen Nieuw Vredenoord. Tezamen met het landschappelijk ontwerp worden ook de lijst met te kappen bomen en het herplantingsplan geactualiseerd. |
| BR | |

### 2.2.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| Tezamen met het te actualiseren landschappelijk ontwerp tweede watertoevoer worden ook de lijst met te kappen bomen en het herplantingsplan geactualiseerd. Daarna wordt het geactualiseerde dossier bij Den Haag aangeleverd voor de aangevraagde kapvergunning. |
| BR |

## 2.3 Overeenkomsten en verwervingen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Samenwerkingsovereenkomst incl. bijlagen met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer op particulier terrein. | Met de particuliere eigenaar is gesproken over de concept-SOK. Hij heeft aangegeven bij nader inzien zijn eigendom waarop de Tweede watertoevoer gerealiseerd wordt toch aan de gemeente te willen verkopen. Hierop worden de SOK en bijlagen aangepast. |

Docnr30



| Vervolggesprek met particuliere woningeigenaar Jan Thijssenweg 8 over mogelijke grondruil ter optimalisatie van ontwerp Tweede Watertoevoer. |
| --- |
| |

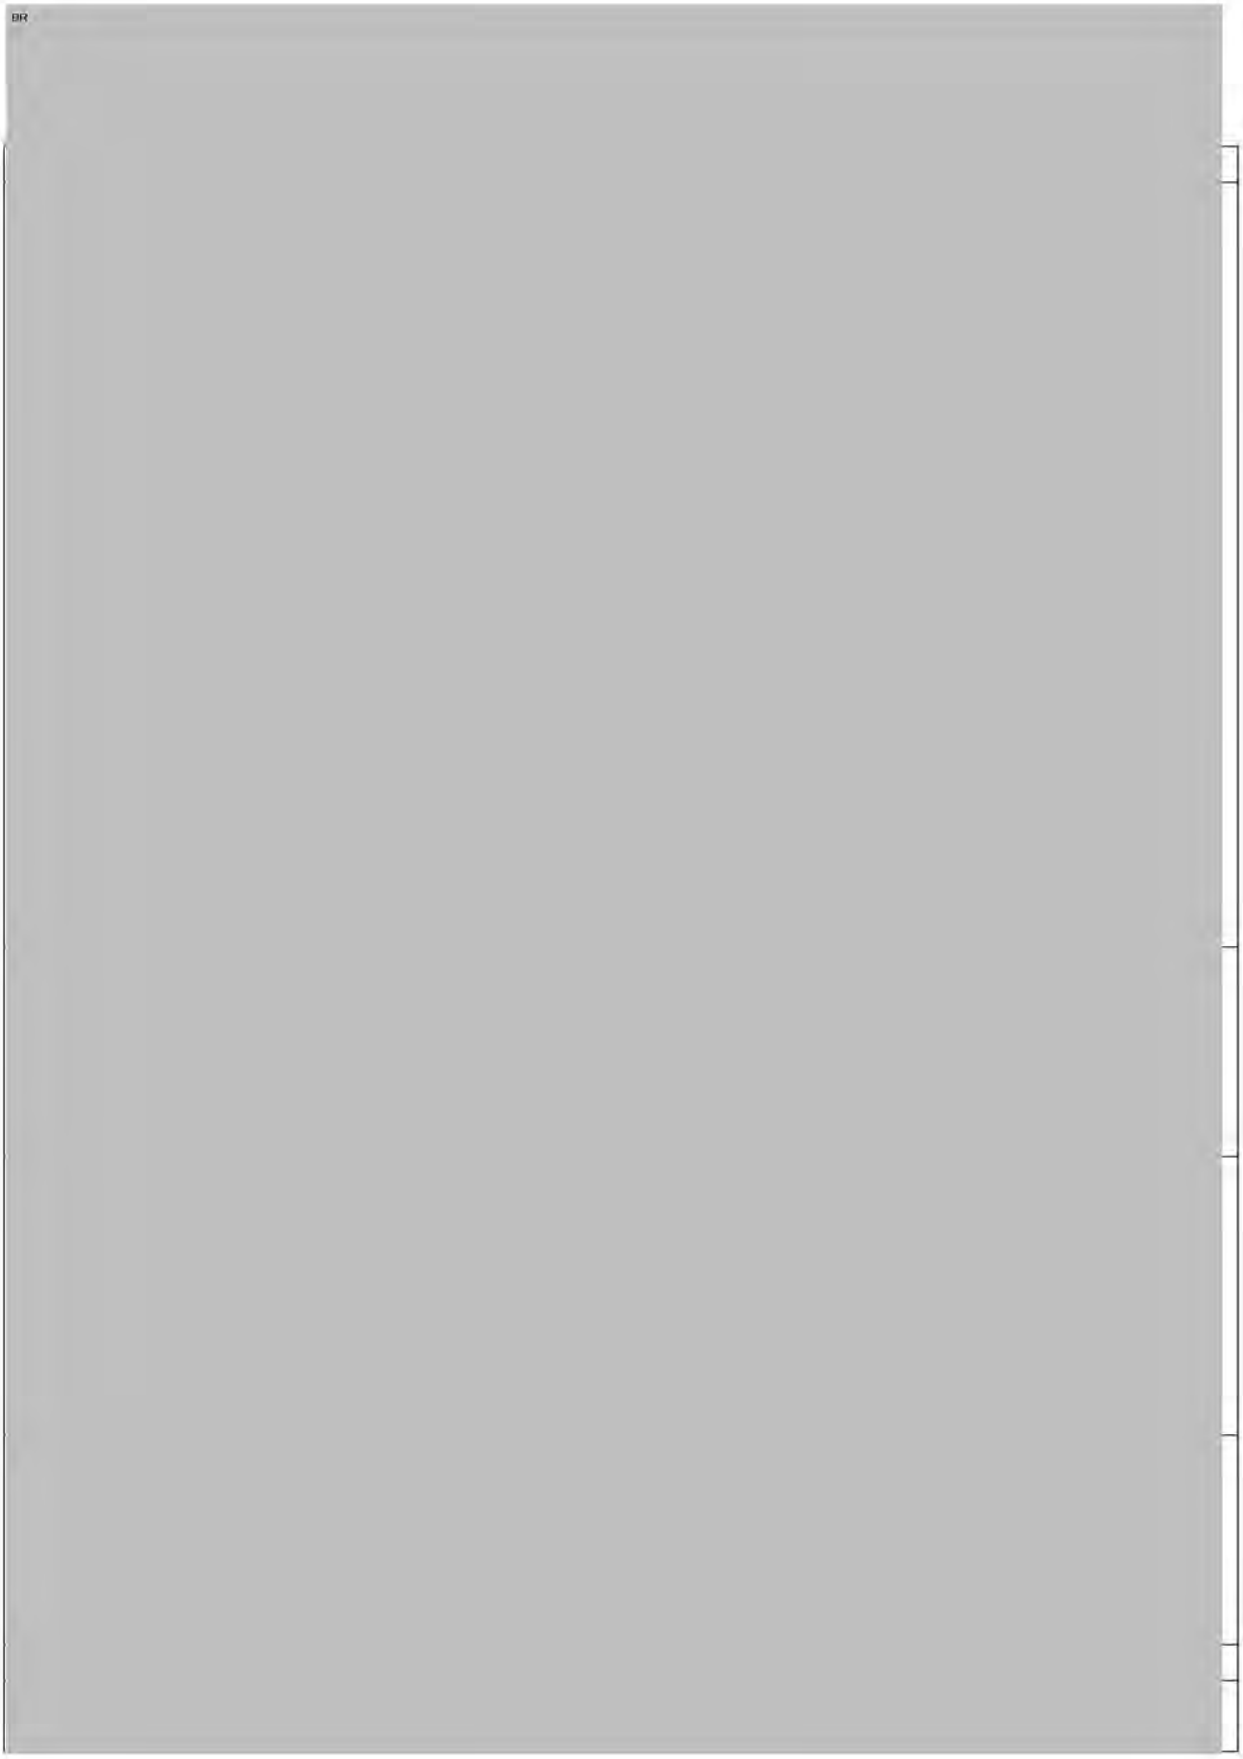

| |
|---|
| [redacted] |
| Voor het Molenvlietpark zijn verschillende informatieborden ontworpen: voor het park in het algemeen, voor de heemtuin en voor de waterberging. Doel van deze borden is de bezoeker van het park meer te vertellen over de flora en fauna. |
| |

| Geplande besluiten | Genomen besluiten |
|---|---|
| Geen. | Geen. |

| |
|---|
| [redacted] |

### 2.4.3 Diversen

Mailbox Rotterdamsebaan

[redacted]

De klachten gingen over [redacted] en paarden in het Molenvlietpark (overgedragen aan stadsdeel Leidchenveen-Ypenburg).

[redacted]

# 3 Projectvoortgang

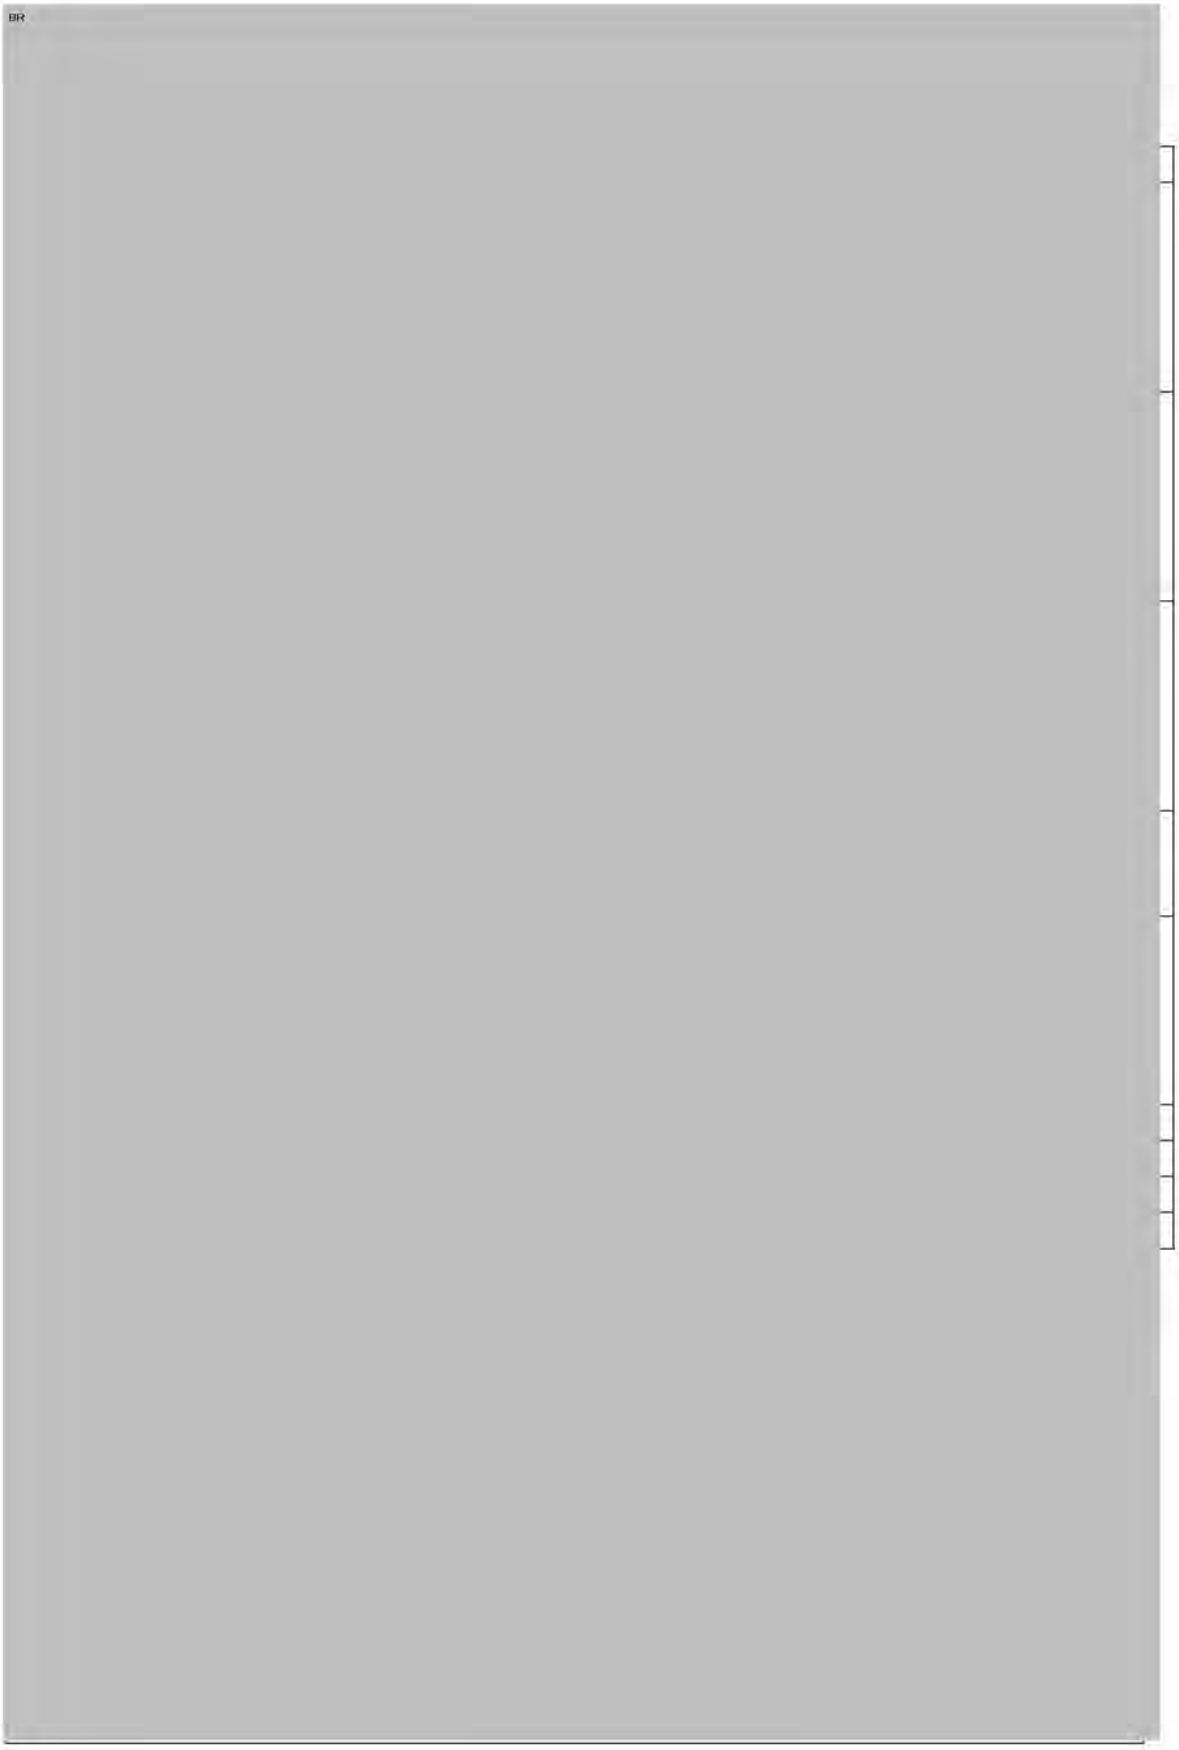
BR

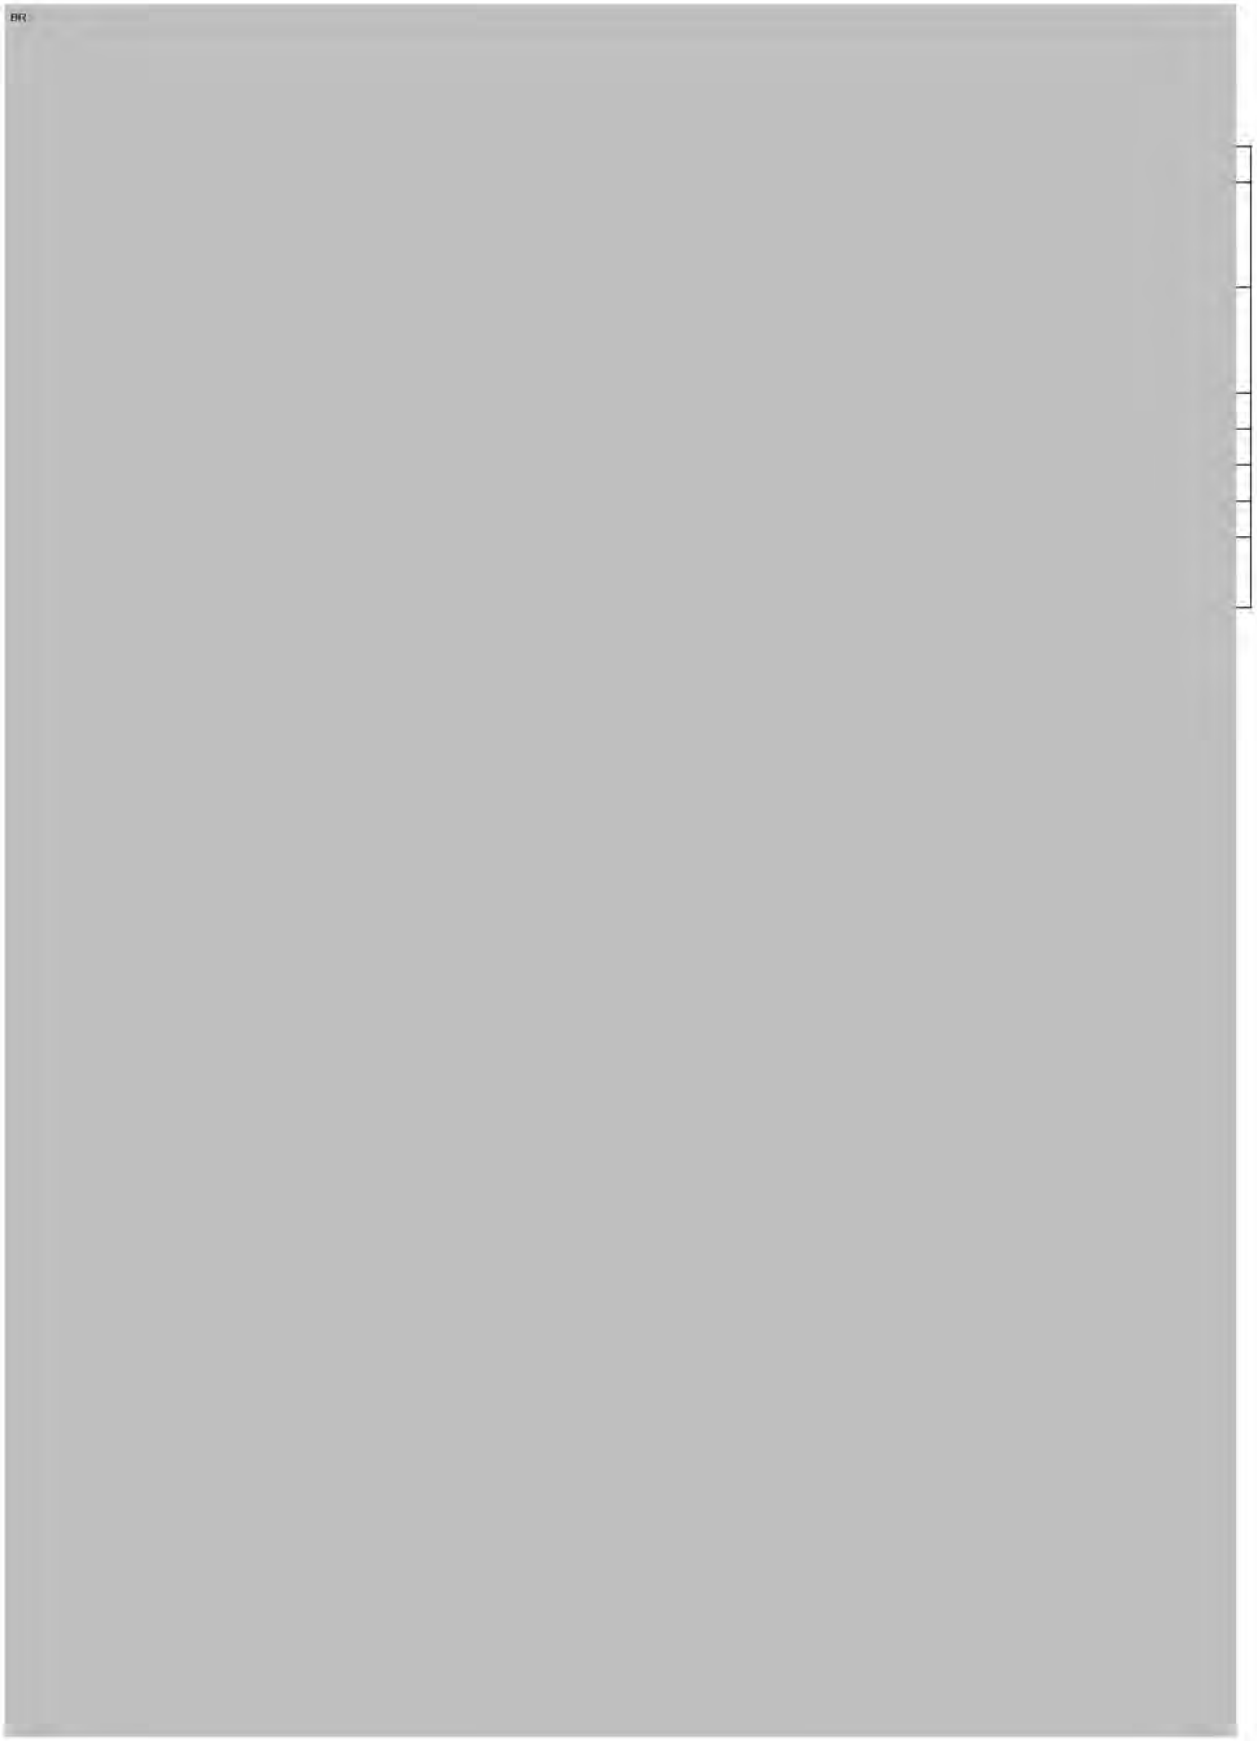
BR

## 3.4 Inpassing Vlietzoom

### 3.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| CRB zal de nog resterende restpunten uit de diverse deelopleveringen van 1 juli jl. oplossen. | Het grootste deel van de restpunten uit de diverse deelopleveringen van 1 juli 2020 is opgelost. Er resteren nog enkele restpunten, die alleen in het voorjaar kunnen worden afgerond (o.a. inzaaien bermen en waterplanten). |
| BR | |
| CRB zal in januari 2021 een eerste inboetronde uitvoeren, waarbij de niet aangeslagen (dode) bomen/struiken in het Molenvlietpark worden vervangen door nieuwe. | De niet aangeslagen (dode) bomen/struiken in het Molenvlietpark zijn in januari vervangen door nieuwe exemplaren. |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Bij de test van de aflaatconstructie tussen de Molensloot en de waterberging op 25 februari jl. is gebleken dat de bodembescherming achter de aflaat niet conform ontwerp is uitgevoerd en er herstelmaatregelen moeten worden uitgevoerd. | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen. | Geen. |

### 3.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| CRB zal de nog resterende restpunten uit de diverse deelopleveringen van 1 juli jl. oplossen. |
| CRB zal een oplossing uitwerken en uitvoeren voor de niet functionerende bodembescherming bij de aflaatconstructie tussen Molensloot en waterberging. |
| BR |

Informatiebord en entreepoort Heemtuin Molenvlietpark

BR

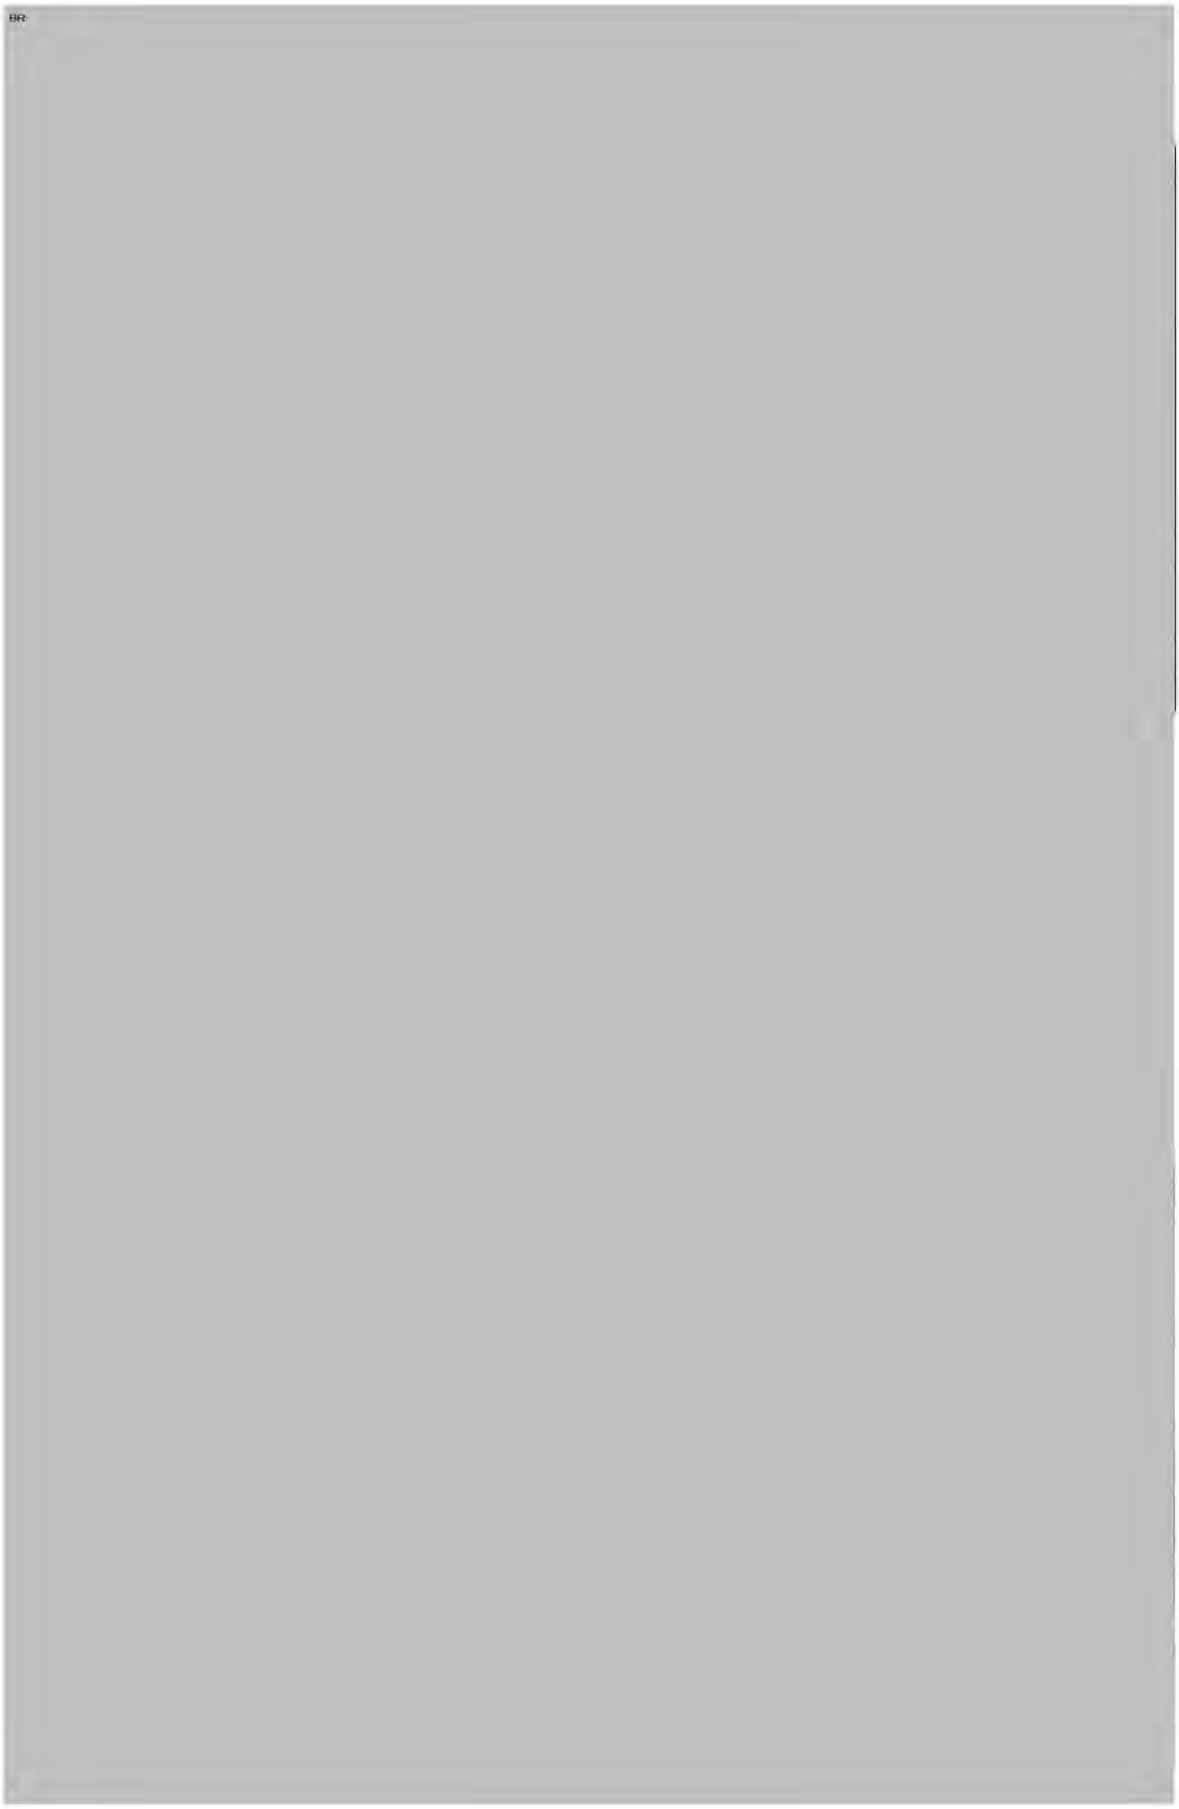
BR

BR

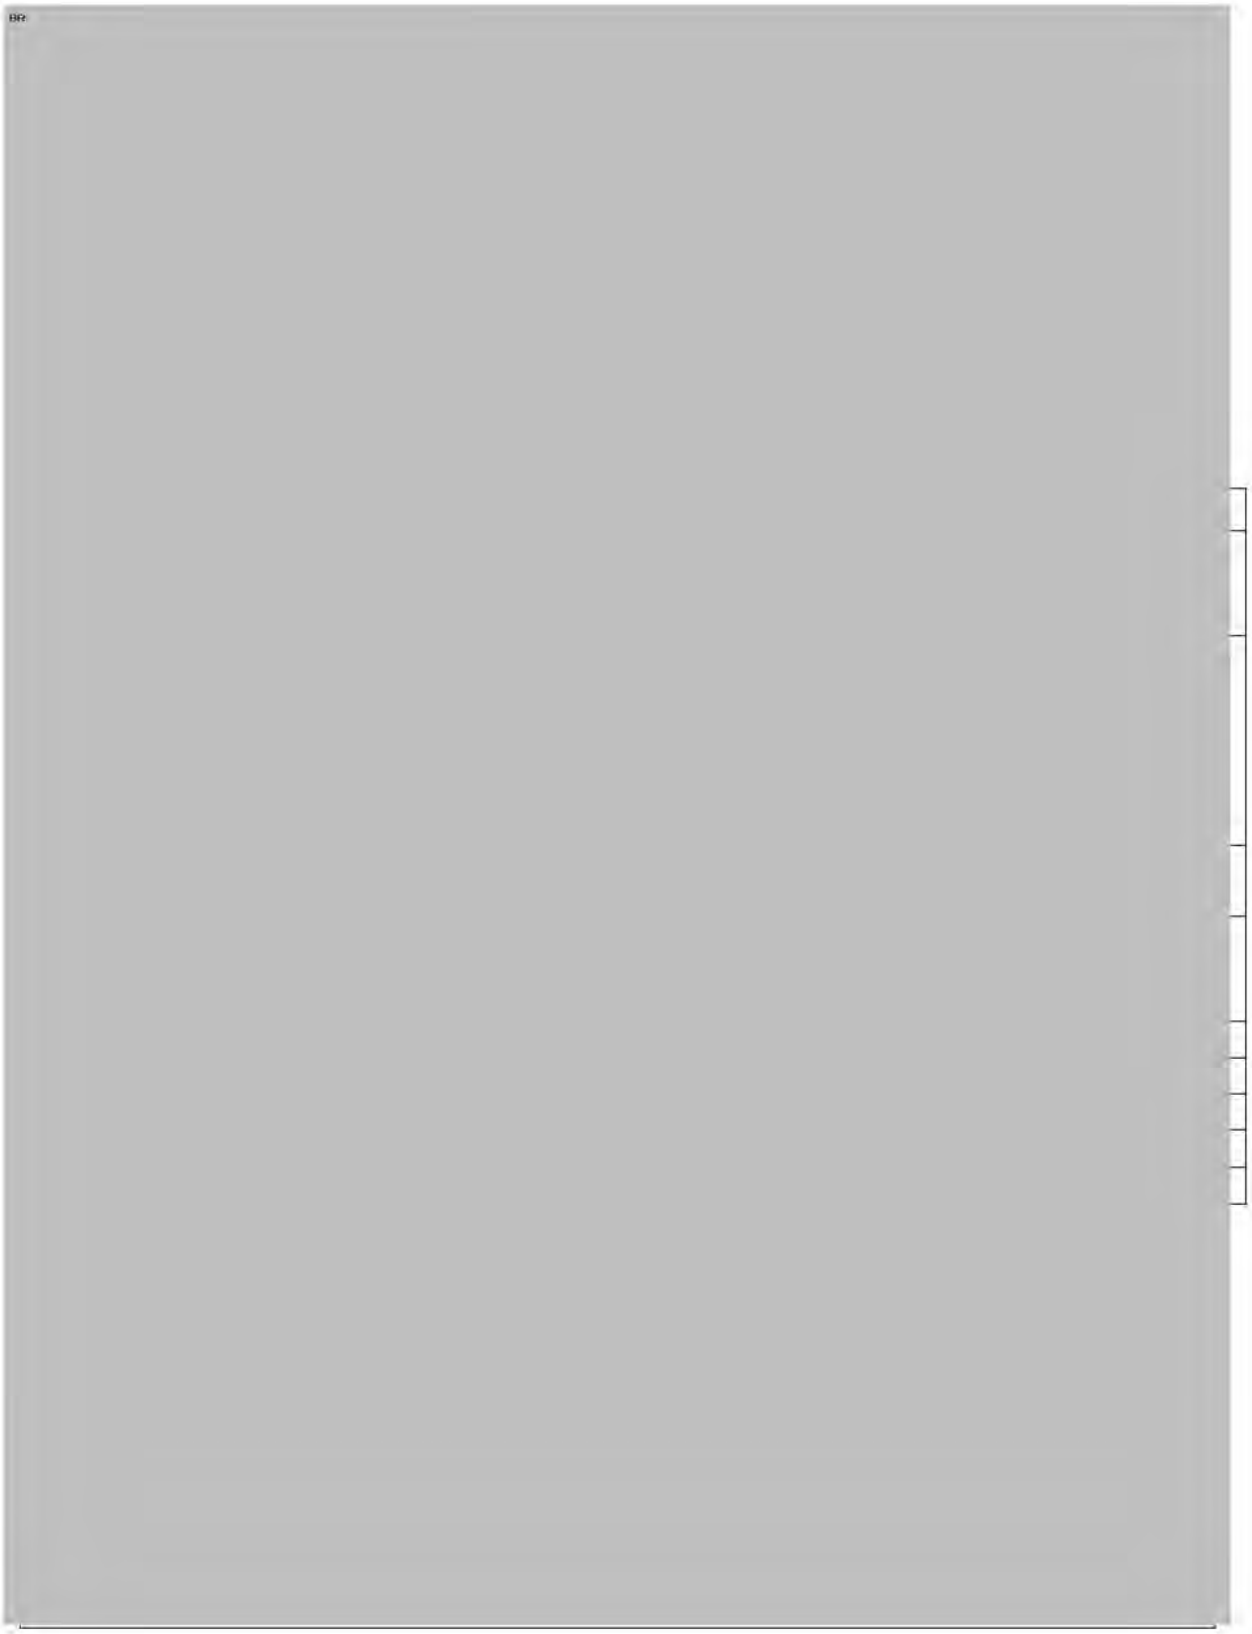

BR

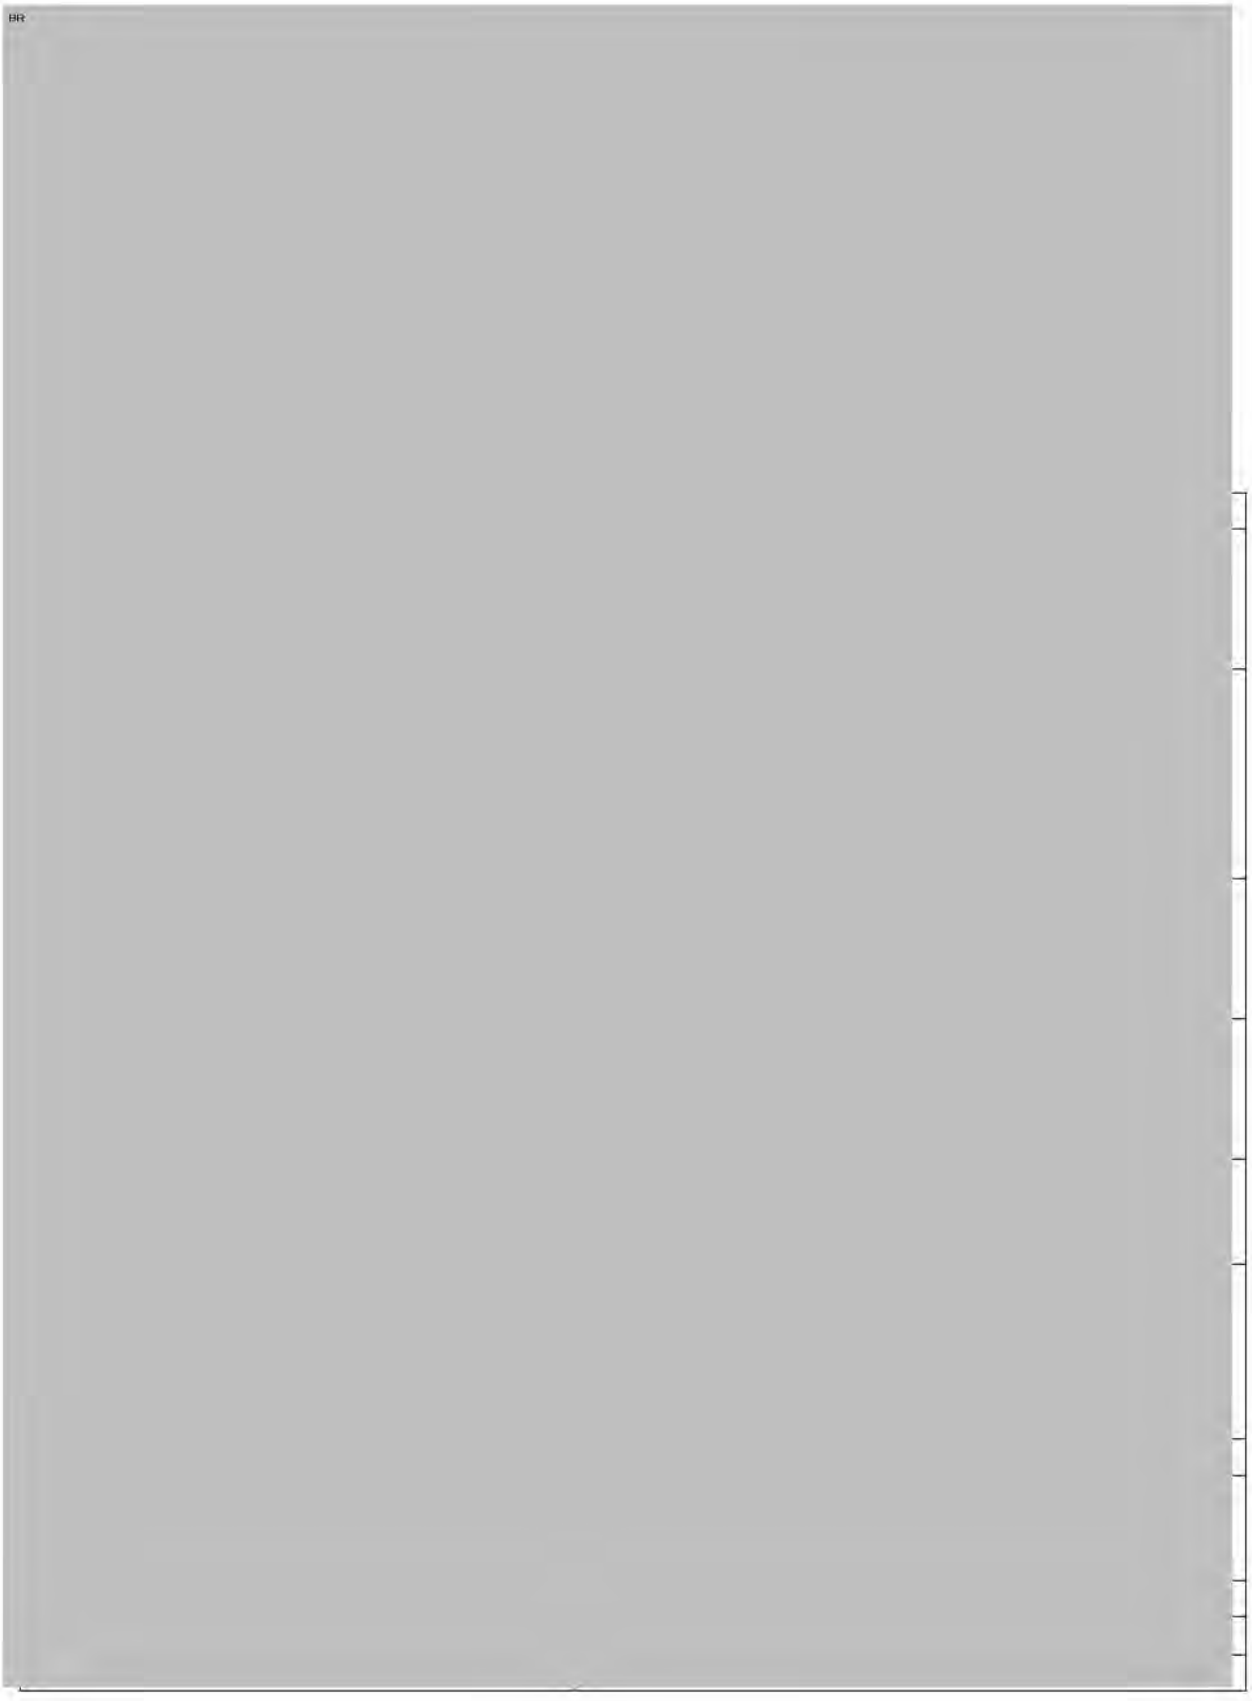
BR

BR

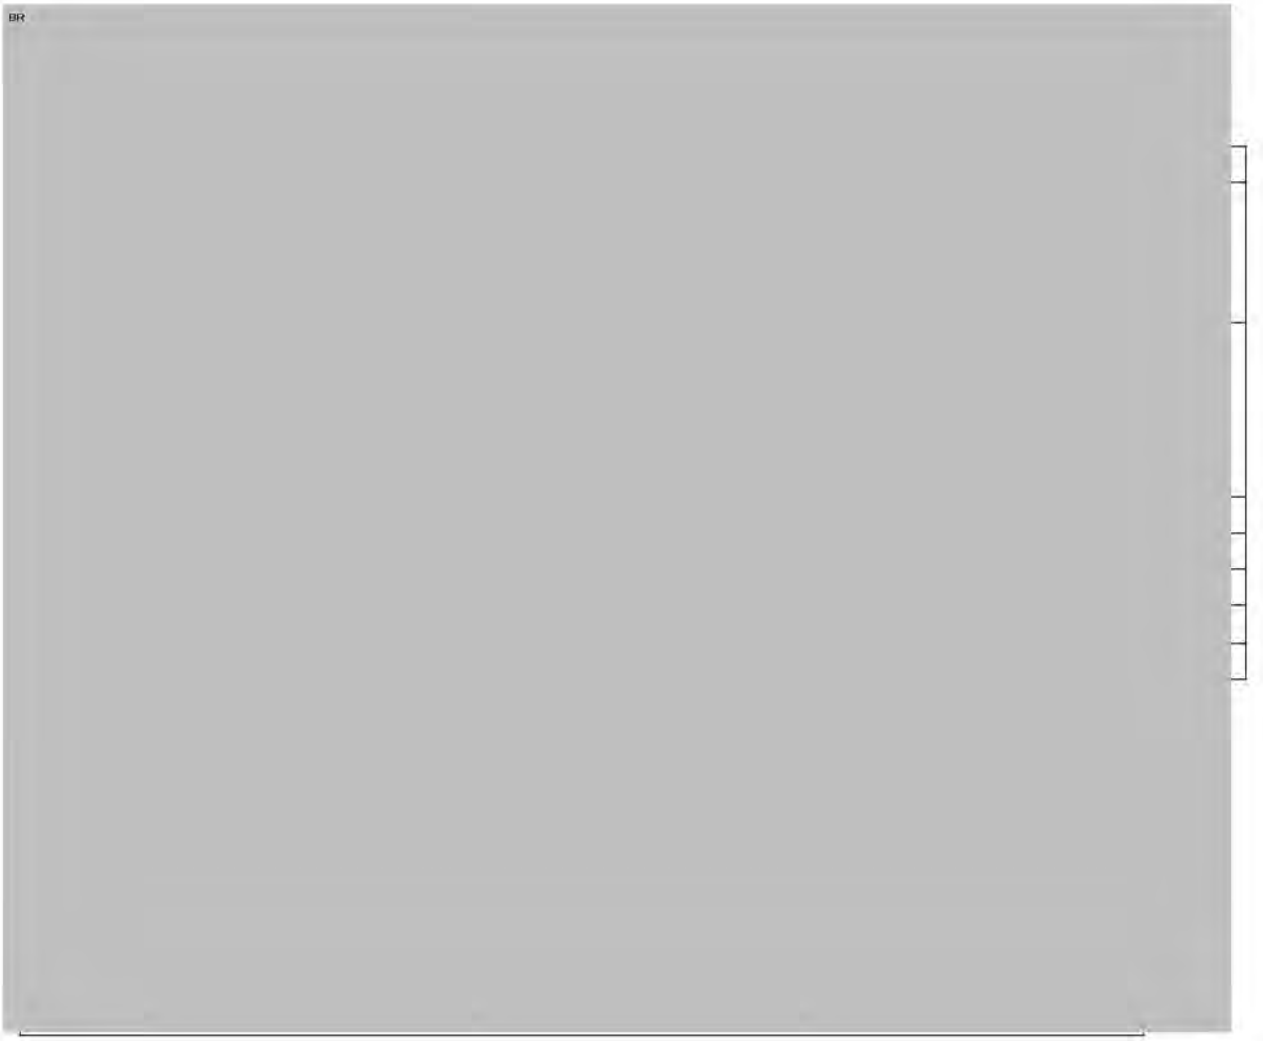
BR

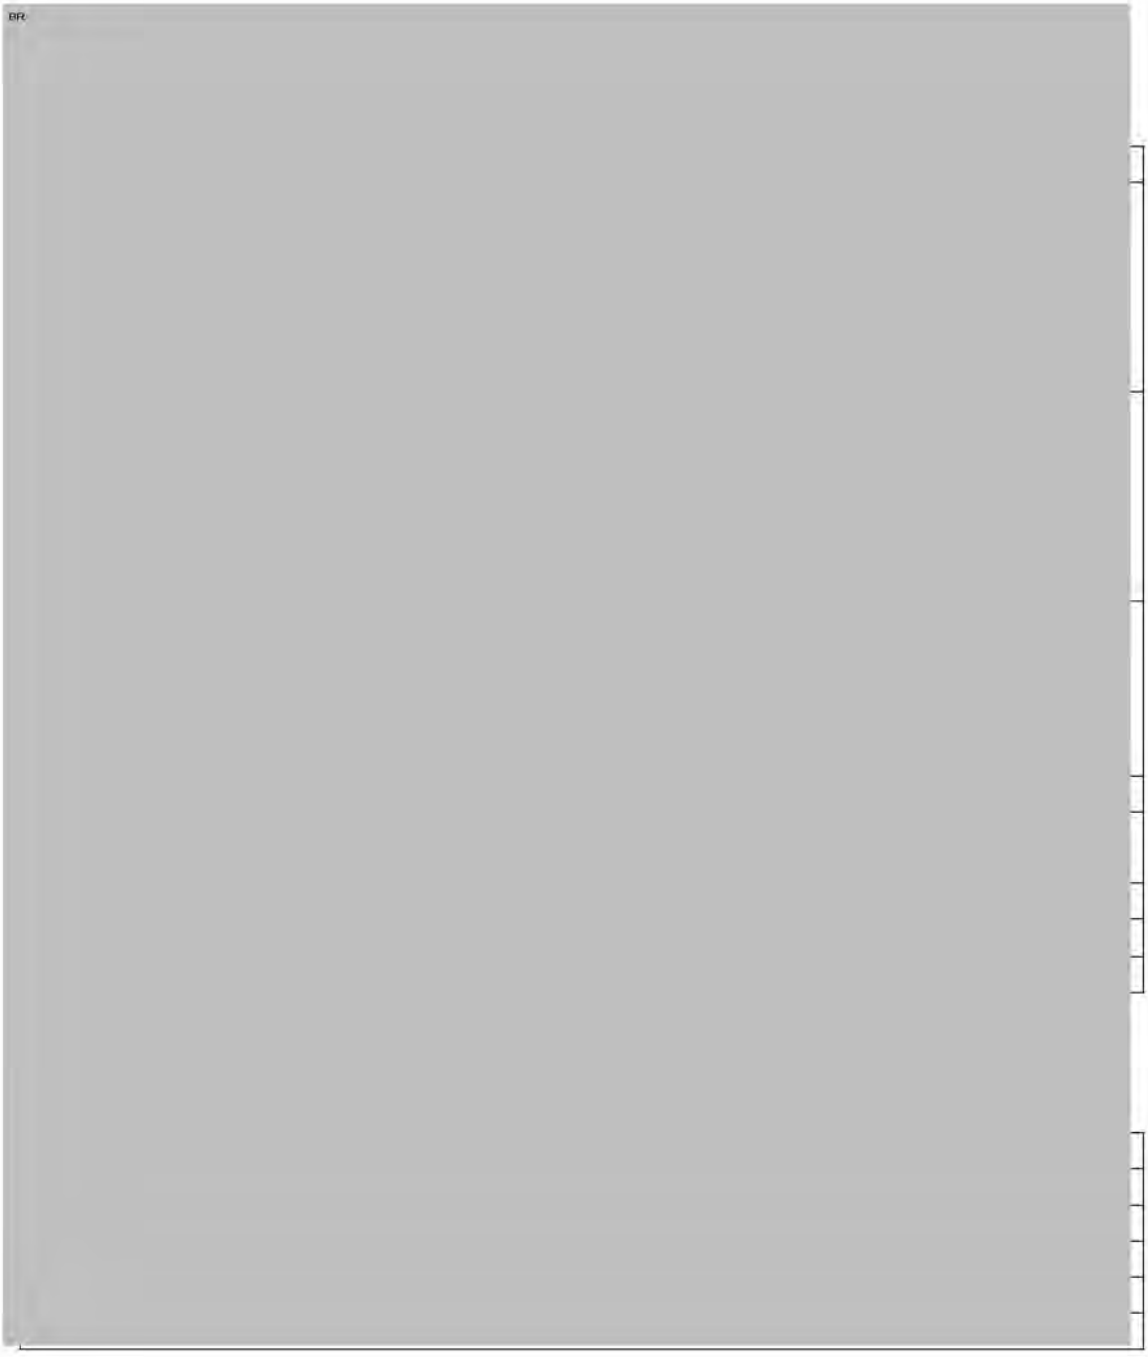

# 4 Overdracht en openstelling

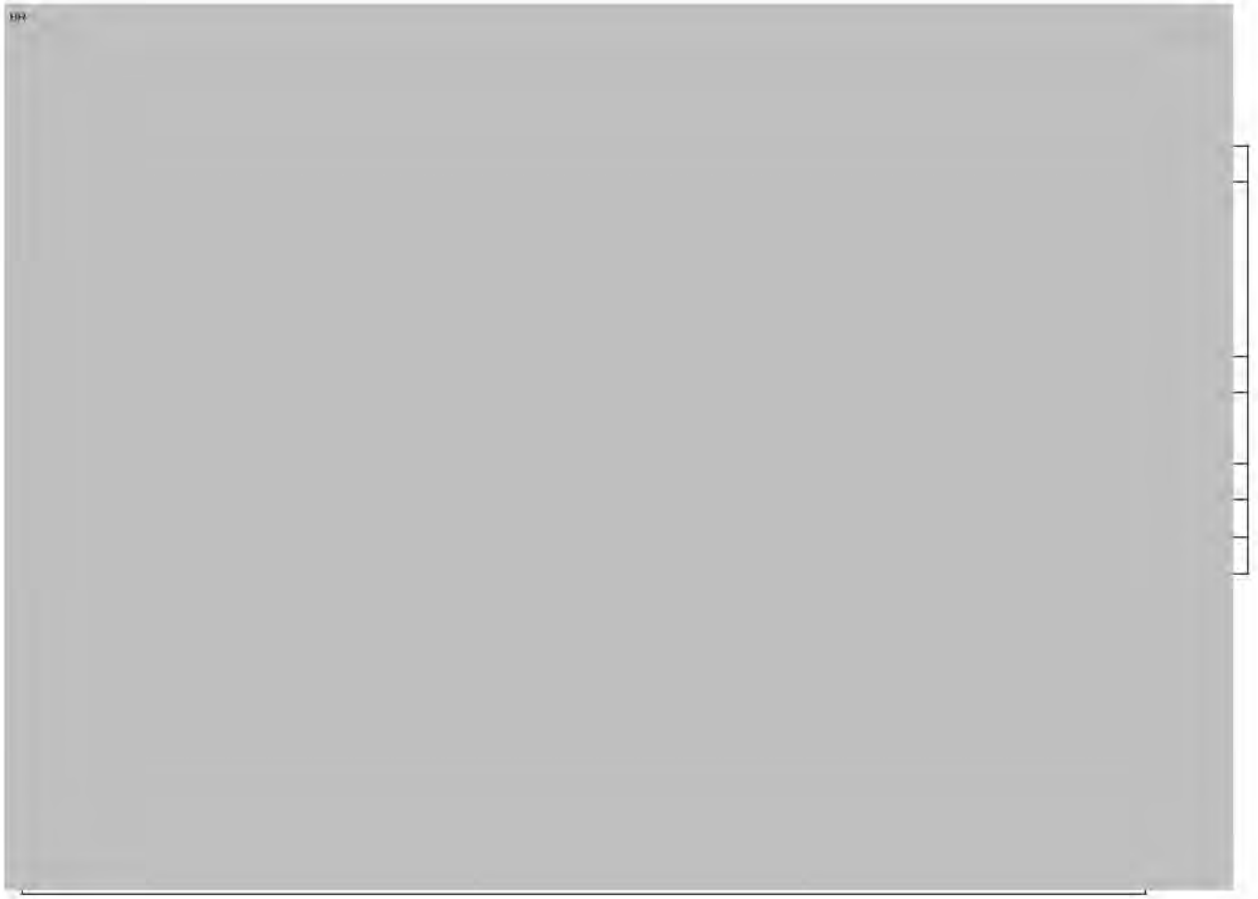

## 4.2 Overdracht aan beheerders

Het project Rotterdamsebaan bestaat uit het hoofdcontract met de CRB en diverse nevencontracten. Na de realisatie van de contracten wordt het gerealiseerde (deel van het) Werk overgedragen aan de betreffende beheerder(s).

### 4.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Komend kwartaal verwachten we alle onderdelen over te dragen die op dit moment zijn opgeleverd. Dit betreft met name onderdelen die worden overgedragen aan Rijkswaterstaat en de Gemeente Den Haag. | De volgende onderdelen zijn afgelopen kwartaal overgedragen aan de beheerders:<br>BR<br>Gemeente den Haag Stadsdeel Leidscheveen Ypenburg:<br>• BR ;<br>• Speelaanleidingen Molenvlietpark.<br>BR |

BR

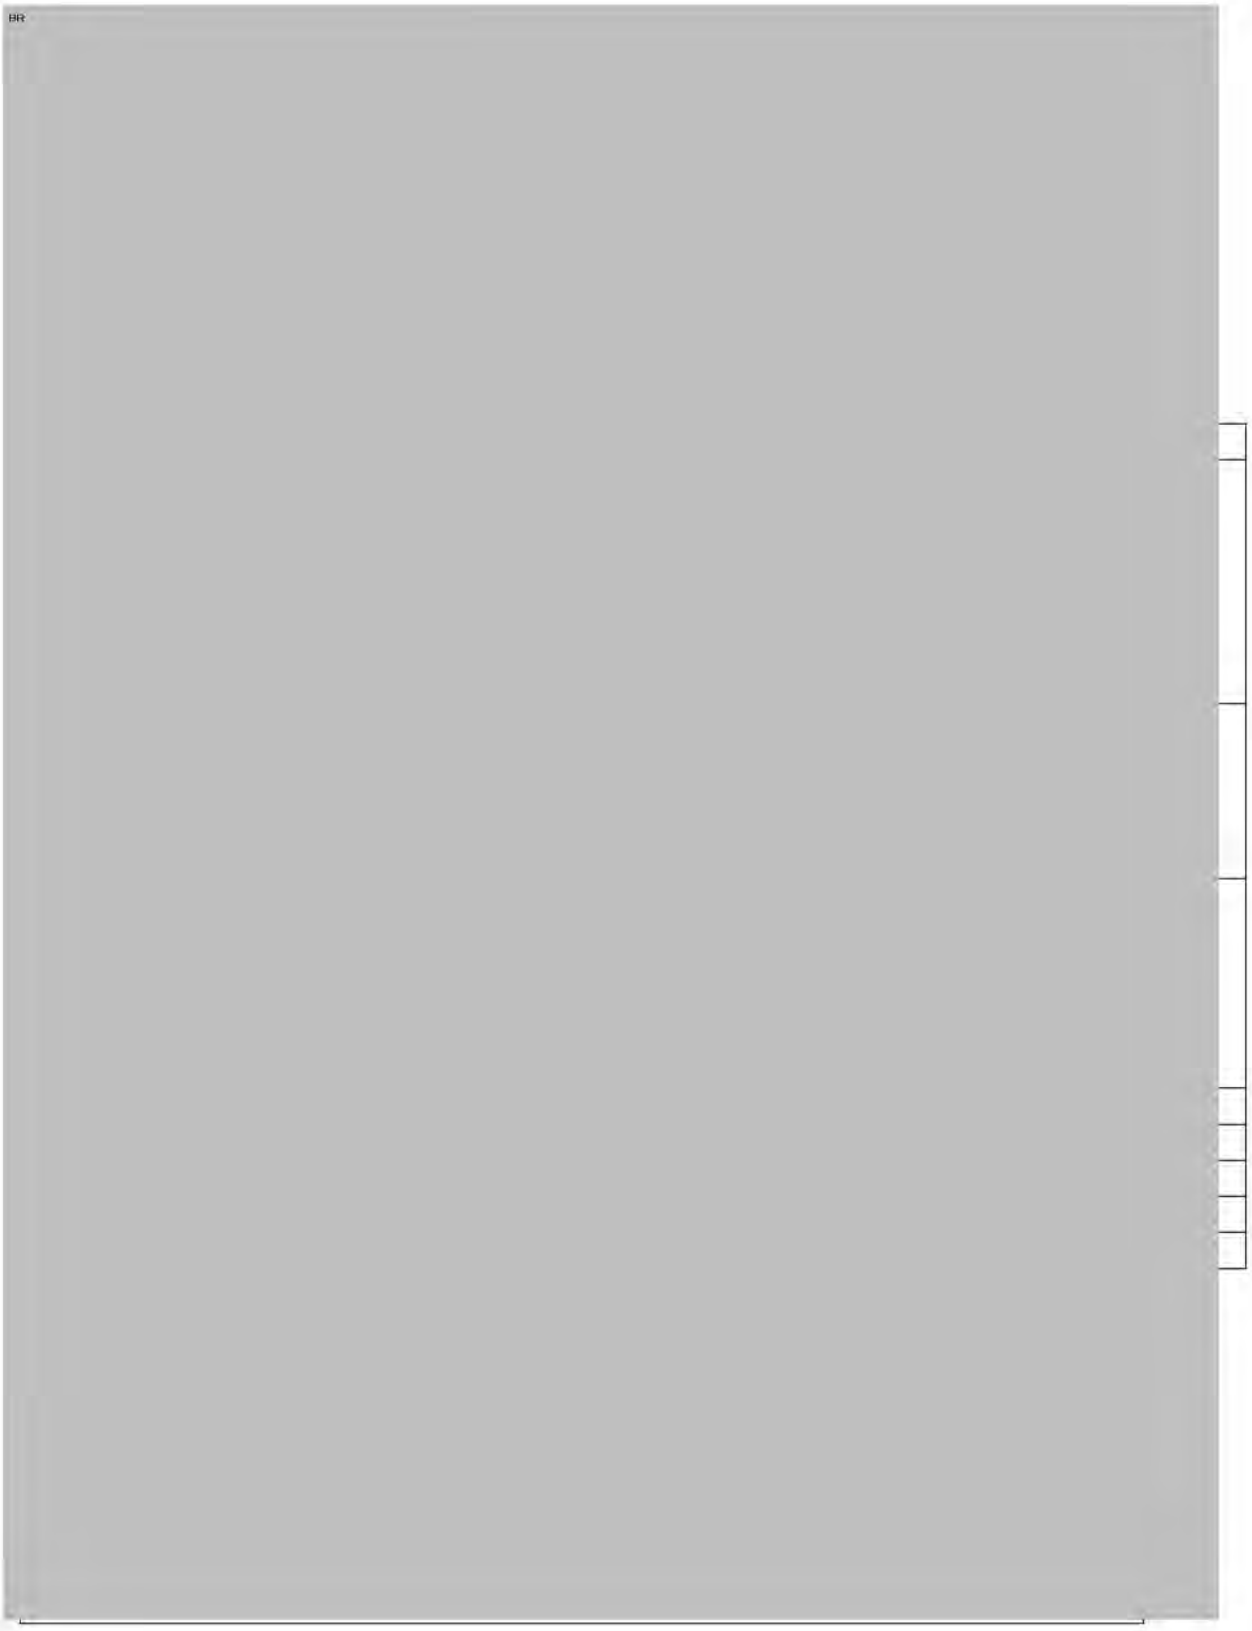
BR

# 5 Projectbeheersing

## 5.1 Scope

### 5.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Signaleren van wijzigingen in de projectscope en, naar aanleiding daarvan projectmutaties voorbereiden, beoordelen en ter besluitvorming agenderen. Op dit moment geen specifieke projectmutaties in behandeling (buiten de projectmutaties 32 en 33 ten behoeve van de 2e toevoer). | Van projectmutatie 32 fietsdek Molenslootbrug is de bevestiging van de beheerder binnen ten aanzien van het budget. Deze zal verder in procedure gebracht worden. Van projectmutatie 33 Asfalteren fietspad gemeente Den Haag wachten we nog op definitieve goedkeuring vanuit het programma Fiets om middelen ter beschikking te stellen aan het project Tweede toevoer. |
| | |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Dit kwartaal is een begin gemaakt met twee projectmutaties (34 en 35) om de projecten Bediencentrale en Tweede toevoer te verzelfstandigen. Het doel is om de scope en de bijbehorende middelen uit de projectopdracht en de -administratie van het project Rotterdamsebaan te halen en als eigenstandige projecten verder apart van elkaar uit te voeren, met eigen bemensing. | |
| | |

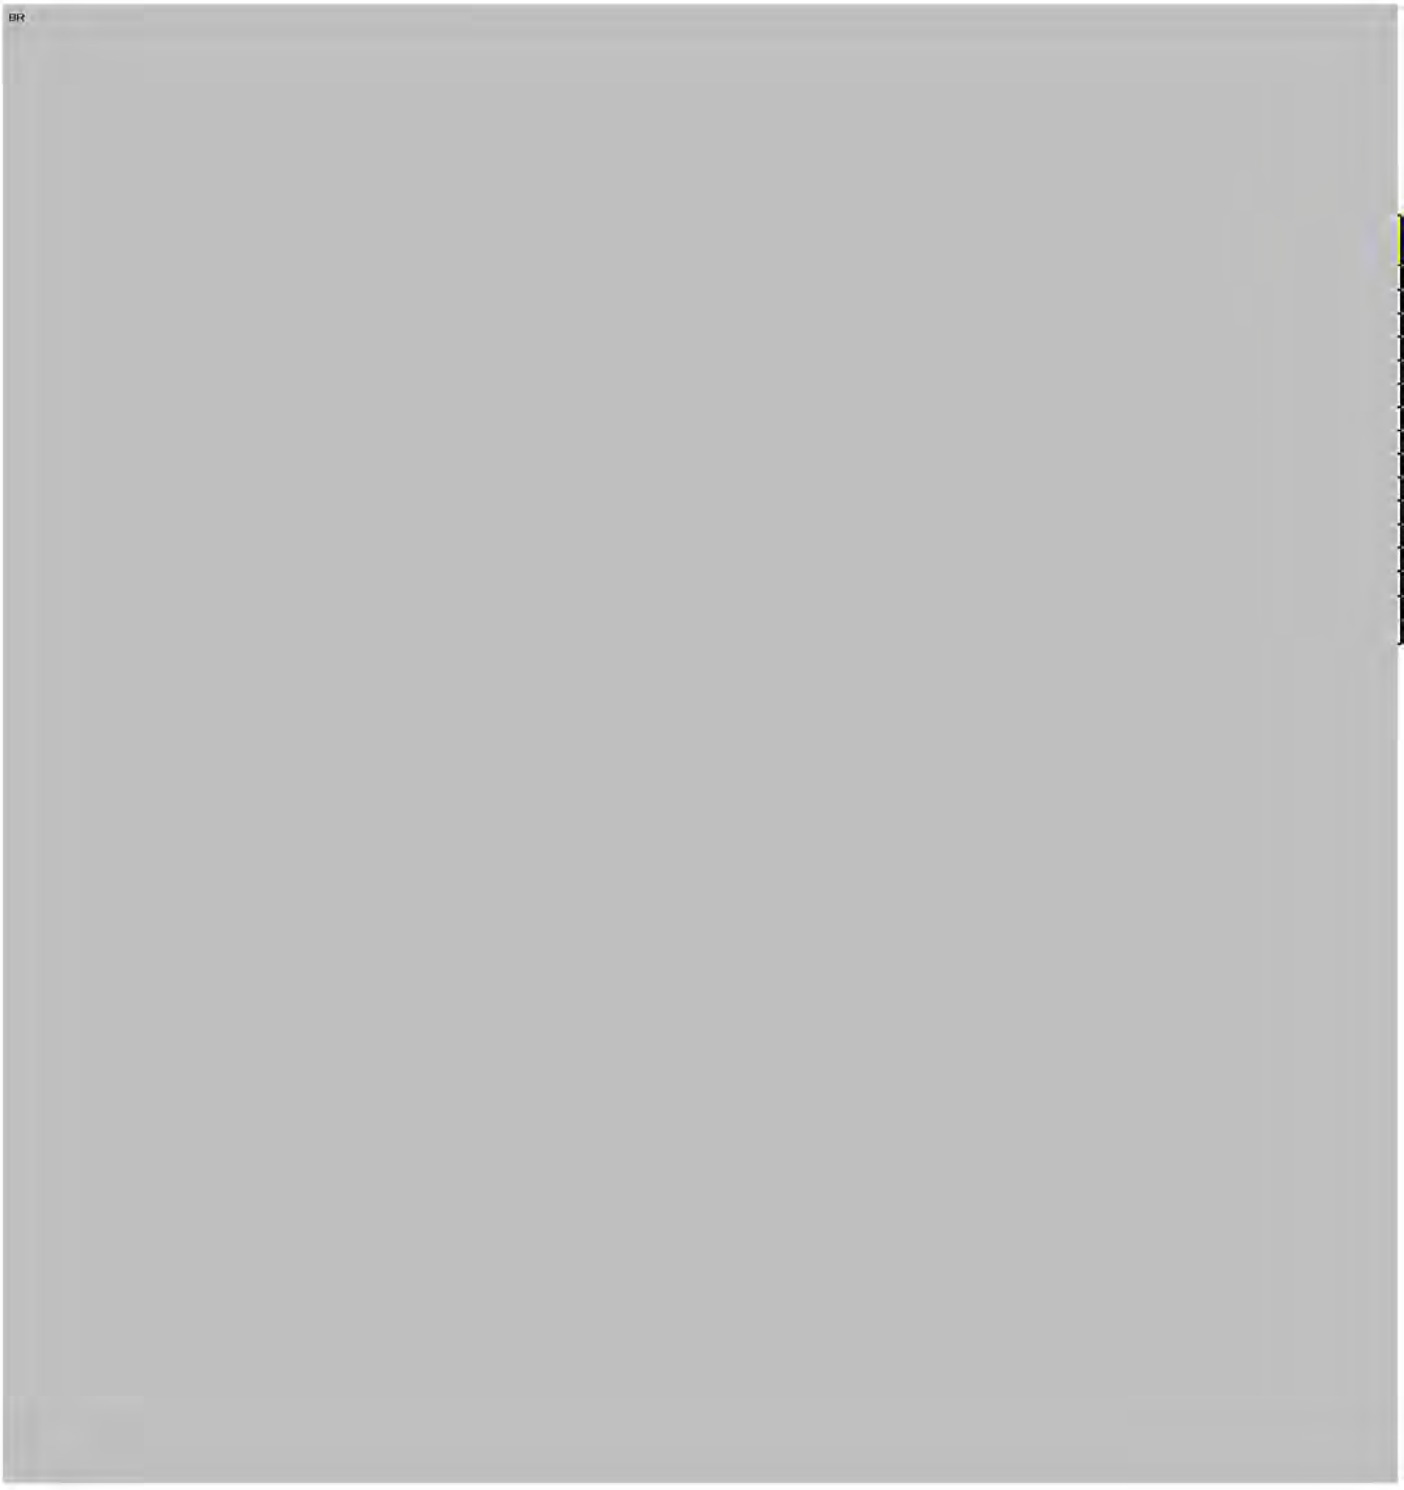

### 5.2.2 Budget

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delftland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland

Er zijn in het eerste kwartaal 2021 geen mutaties geweest.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland

Er zijn in het eerste kwartaal 2021 geen mutaties geweest.

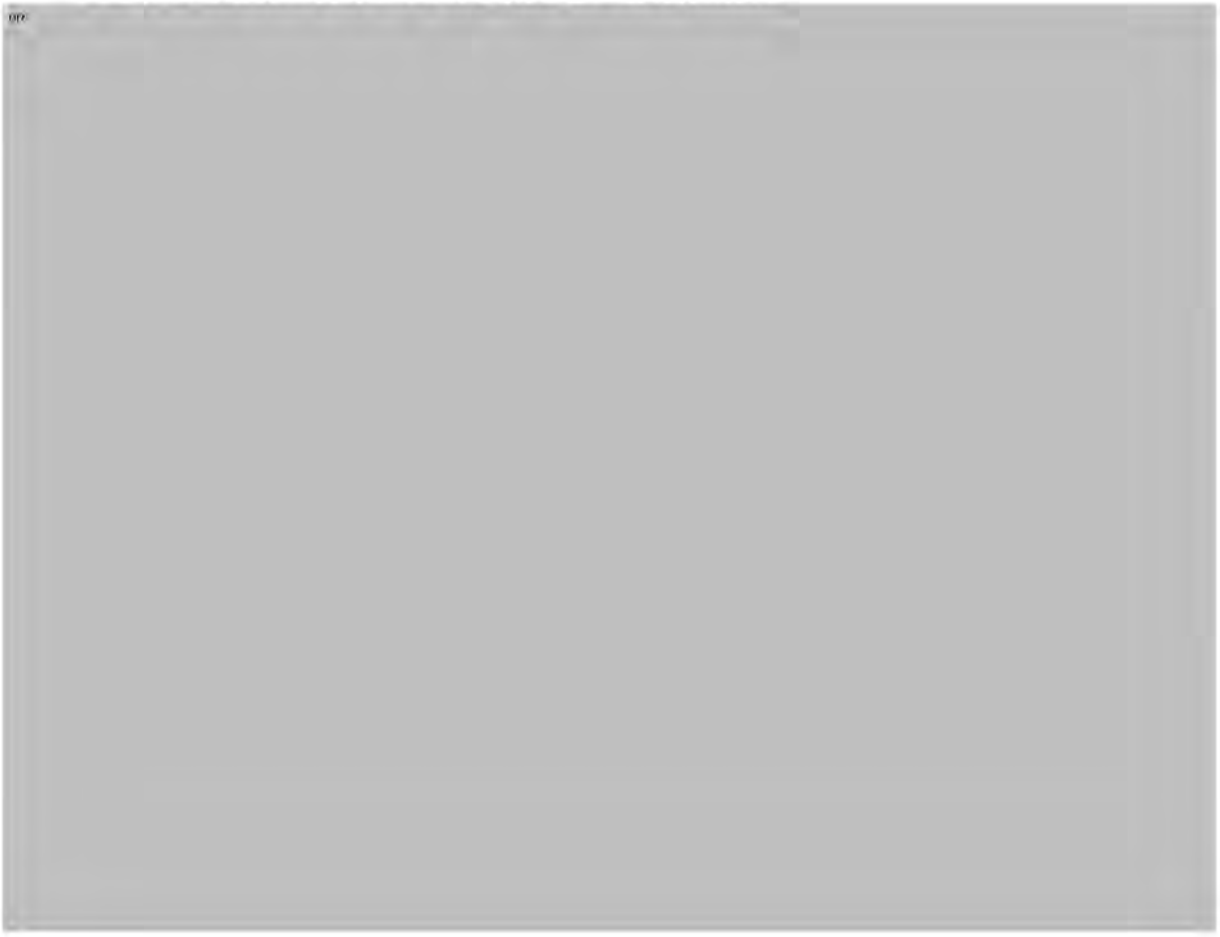

Update financieel risicoregister

In dit kwartaal is in verband met de fase-overgang na openstelling van de tunnel voor verkeer het financiële risicoregister geactualiseerd. De budgetpost van de voorziene kosten is beoordeeld en bijgesteld op de inzichten uit Q1 voor wat betreft de resterende werkzaamheden van het project en de opvolgende projecten Bediencentrale, Tweede Watertoevoer, het Kunstproject en het project restwerkzaamheden.

BR

BR

## 5.4 Risico's

### 5.4.1 Afgelopen kwartaal

| | |
|---|---|
| [redacted] | |
| Uitvoeren financiële analyse van de Rotterdamsebaan, de Bediencentrale en de 2e Toevoer. | De financiële analyses zijn uitgevoerd en geverifieerd in een MT-sessie. |
| Uitvoeren van een planningsanalyse van de Bediencentrale en de 2e Toevoer (onder voorbehoud gemaakte afspraken/voortgang). | Voor de Tweede toevoer is de onzekerheidsanalyse op de planning uitgevoerd en geverifieerd. Voor de Bediencentrale is de praatplaat wel geactualiseerd, maar deze is op aangeven van het MT niet doorgerekend. |
| [redacted] | |

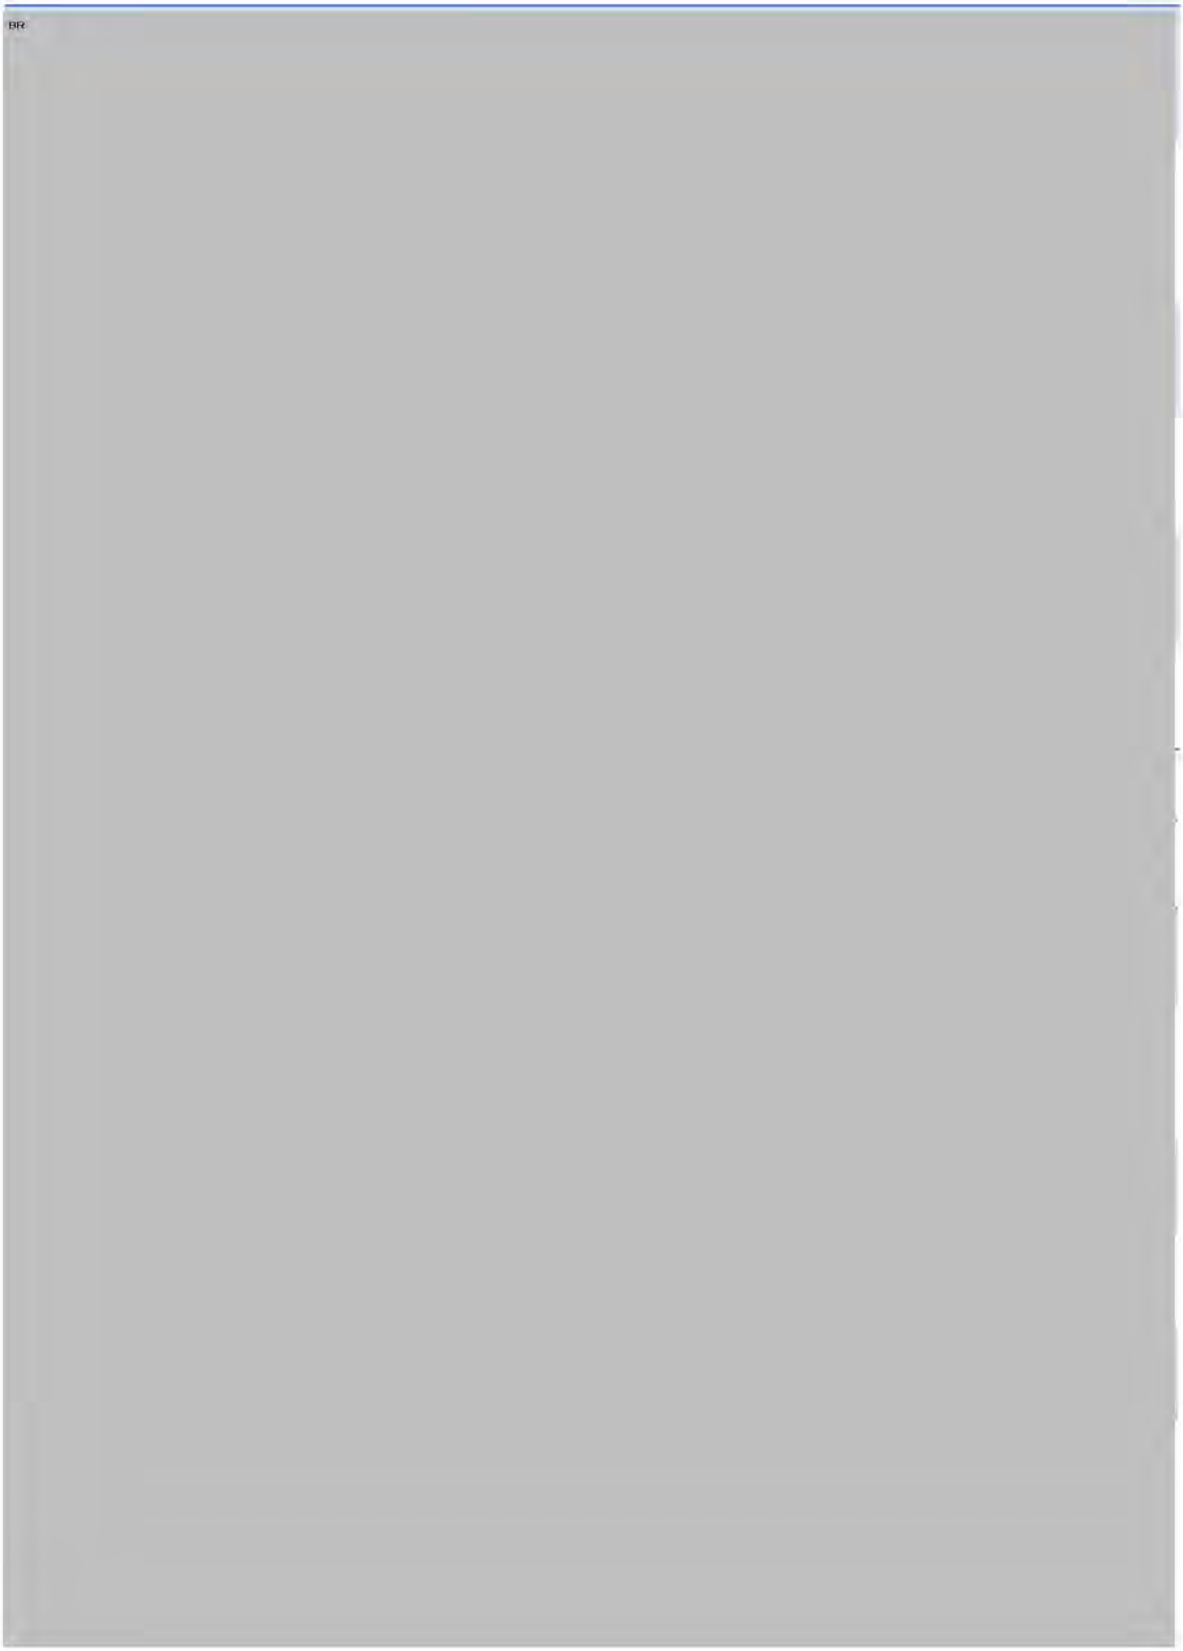

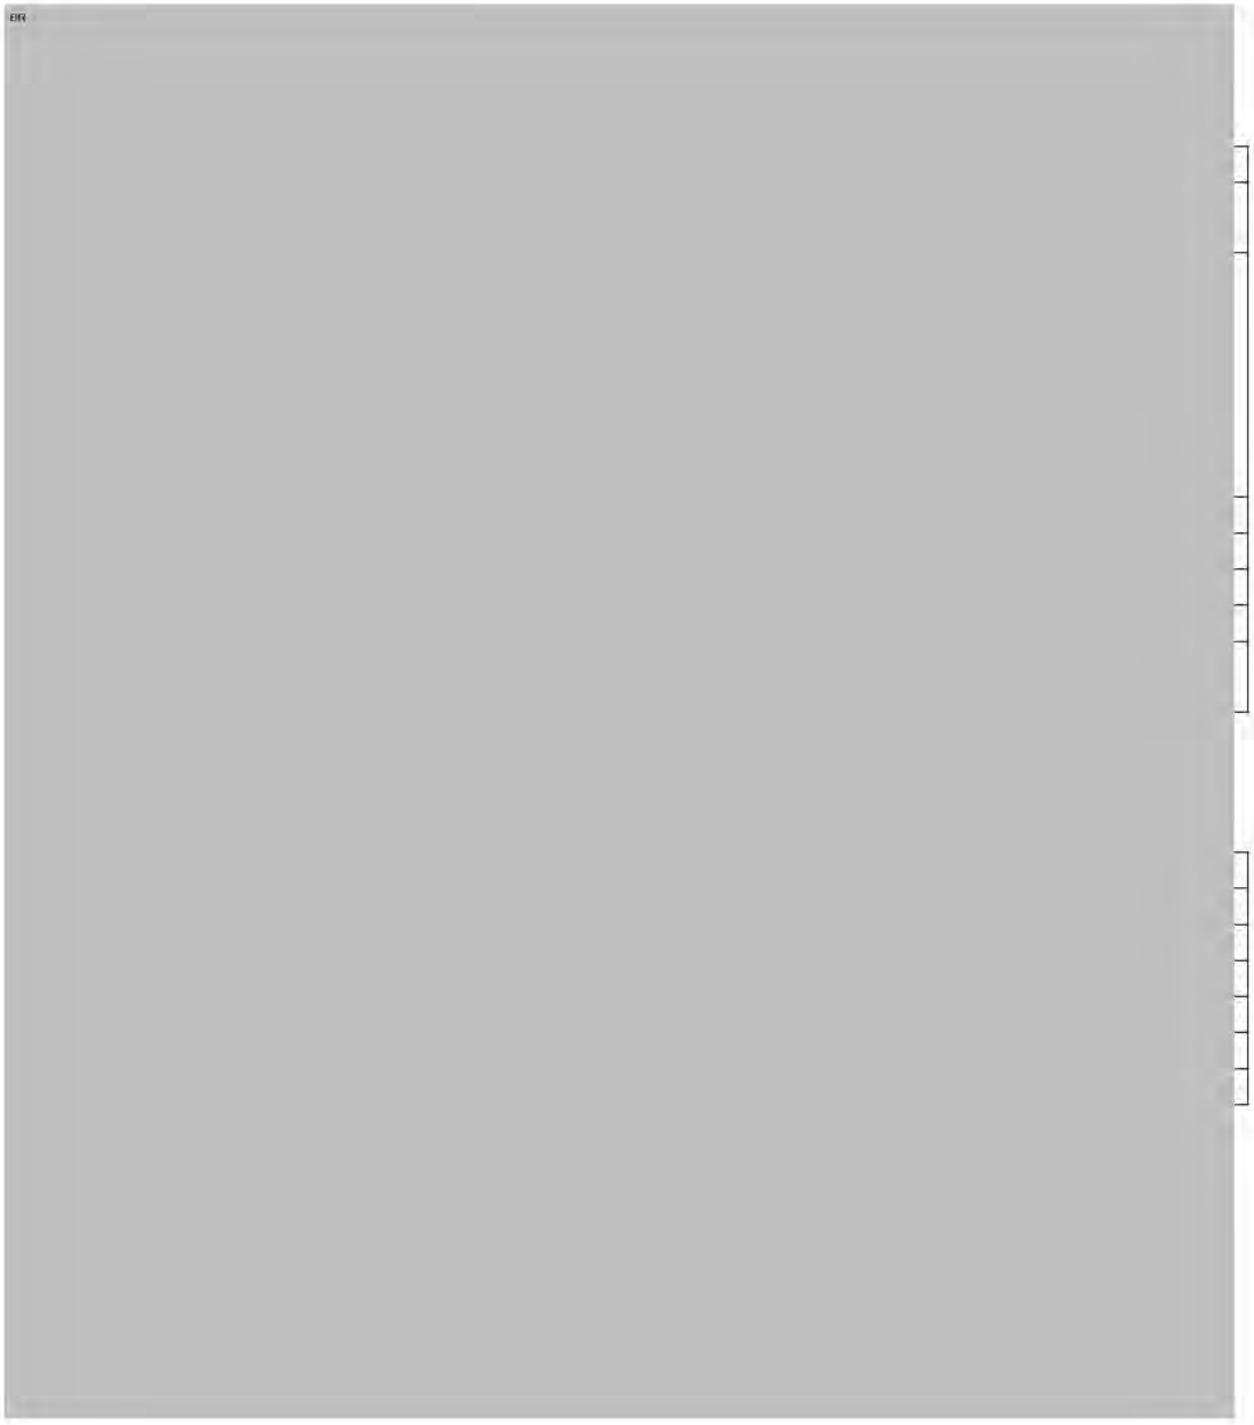

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 31 mrt 2021 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 5-jun-20 | 30 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie (incl. consolidatieperiode) vertraagd. Het planten van de laatste groenvoorzieningen heeft in het najaar '20 plaats gevonden. |
| BR | | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

Docnr30

Docnr30



Docnr31

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 2e kwartaal 2021

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 27 juli 2021**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 1.0**

Docnr31

Docnr31



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 2e kwartaal 2021
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-005048

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>21 juli 2021 | Versie 0.1<br>22 juli2021 | Versie 1.0<br>27 juli 2021 | Versie 1.0<br>31 augustus 2021 | Versie 2.0<br>10 september 2021 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. A. Mulder, wethouder SWS / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr31



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* *8*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 8
2.1.2 Komende kwartaal 8

*2.2 Planologie en Vergunningen* *9*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 9
2.2.2 Komende kwartaal 9

*2.3 Overeenkomsten en Verwervingen* *10*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 10
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Communicatie* *12*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 12
2.4.2 Komende kwartaal 12
2.4.3 Diversen 12

3 Projectvoortgang 13

*3.1 Aanbesteden en contracteren* *13*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 13
3.1.2 Komende kwartaal 13

*3.2 Kunstprojecten* *14*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 14
3.2.2 Komende kwartaal 15

*3.3 Inpassing Binckhorst* *16*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 16
3.3.2 Komende kwartaal 16

*3.4 Inpassing Vlietzoom* *17*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 17
3.4.2 Komende kwartaal 17

*3.5 Inpassing Laan van Hoornwijck* *18*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 18
3.5.2 Komende kwartaal 18

*3.6 Boortunnel en toeritten* *19*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 19
3.6.2 Komende kwartaal 19

*3.7 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *20*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 20
3.7.2 Komende kwartaal 20

*3.8 Installaties* *21*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 21
3.8.2 Komende kwartaal 21

*3.9 Veiligheid en gezondheid* *22*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 22

Docnr31




3.9.2 Komende kwartaal 22

*3.10 Uitvoeringskwaliteit* *23*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 23
3.10.2 Komende kwartaal 23

*3.11 Contractmanagement* *24*
3.11.1 Afgelopen kwartaal 24
3.11.2 Komende kwartaal 24

4 Overdracht en openstelling 25

*4.1 Tunnelveiligheid* *25*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 25
4.1.2 Komende kwartaal 25

*4.2 Overdracht aan beheerders* *26*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 26
4.2.2 Komende kwartaal 26

*4.3 Beheer en onderhoud* *27*
4.3.1 Afgelopen kwartaal 27
4.3.2 Komende kwartaal 27

5 Projectbeheersing 28

*5.1 Scope* *28*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 28
5.1.2 Komende kwartaal 28

*5.2 Financiën* *29*
5.2.1 Kostenstructuur 29
5.2.1 Budget 30

*5.3 Planning* *32*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 32
5.3.2 Komende kwartaal 32

*5.4 Risico's* *33*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 33
5.4.2 Komende kwartaal 33
5.4.3 Financiële toprisico's 33
5.4.4 Toprisico's planning 33

*5.5 Informatiebeheer* *34*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 34
5.5.2 Komende kwartaal 34
5.5.3 Kennisdeling 34

*5.6 Organisatie* *35*
5.6.1 Afgelopen kwartaal 35
5.6.2 Komende kwartaal 35

6 Bijlage: Planningsmijlpalen 36

7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan 37

# 1 Managementsamenvatting

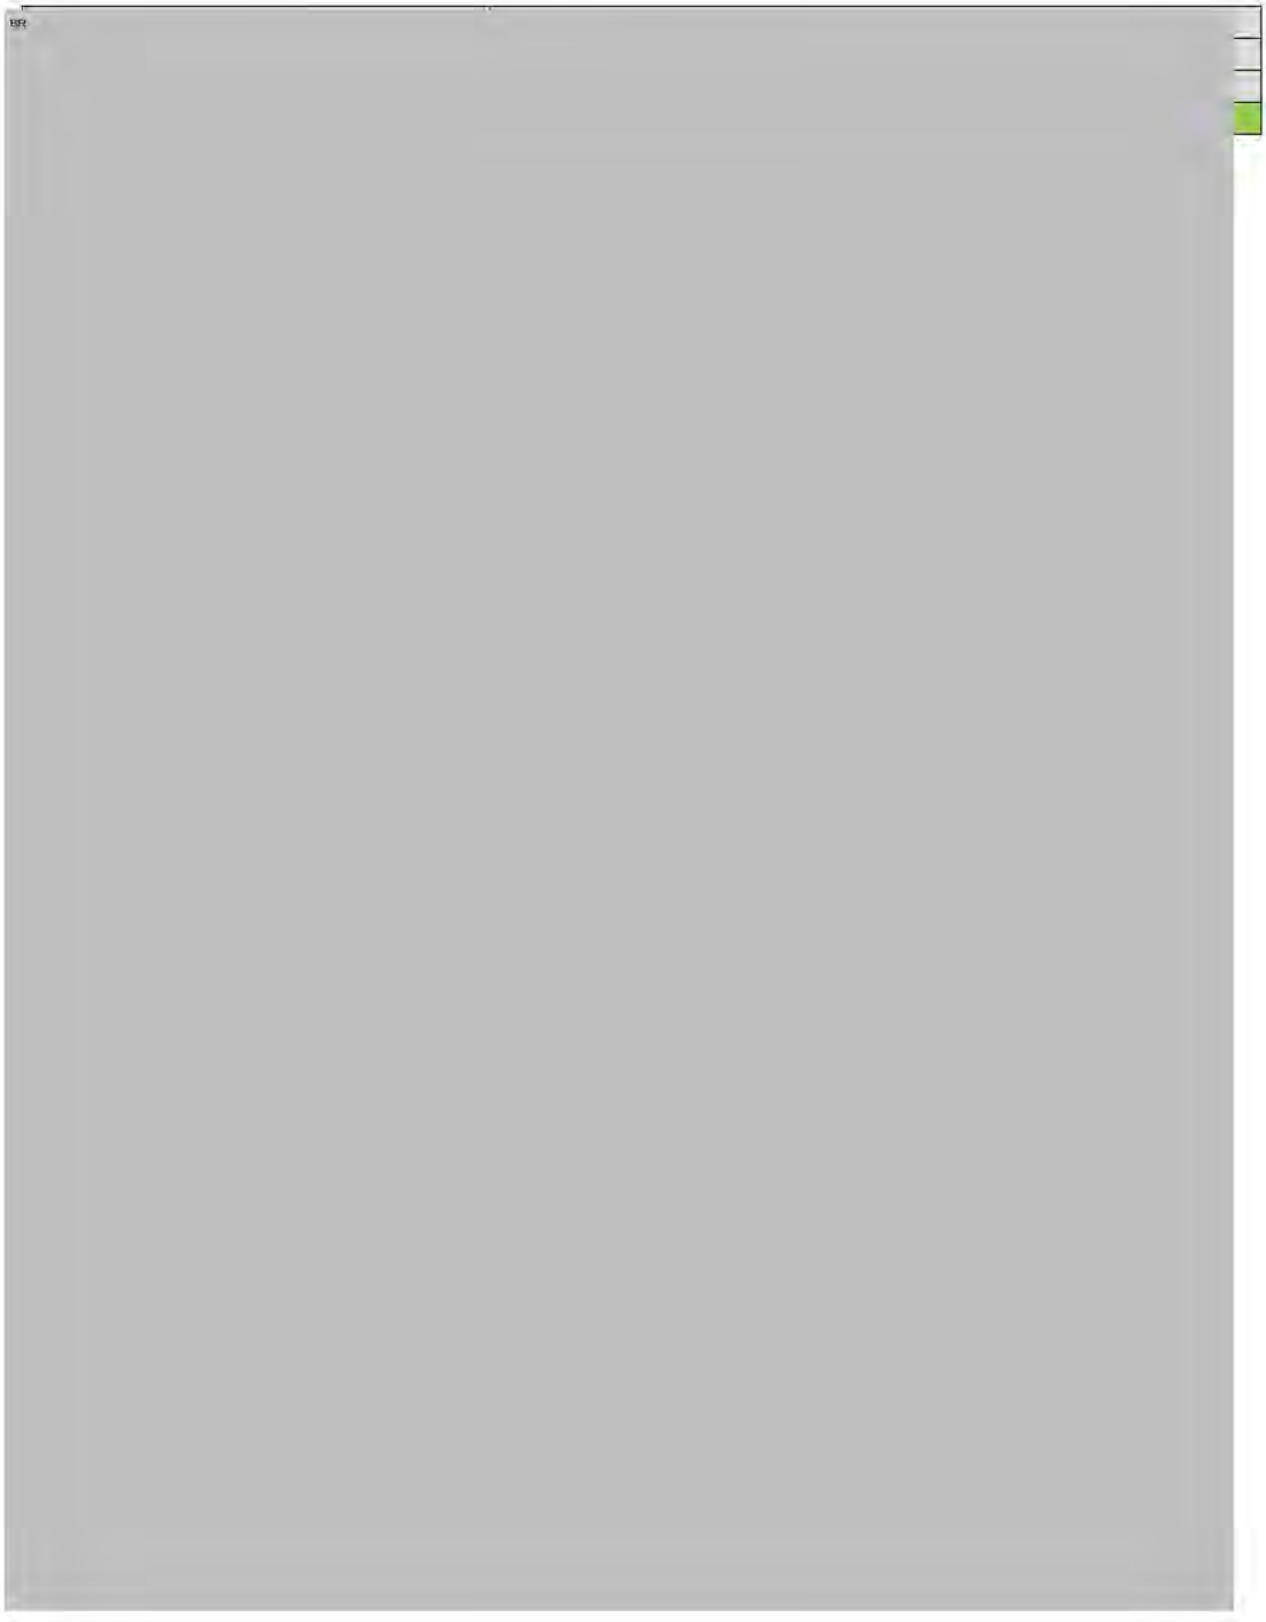

[redacted]

## 4. TERUGBLIK AFGELOPEN KWARTAAL

[redacted]

- De bodembescherming bij de aflaatconstructie in het Molenvlietpark is door CRB hersteld door het aanbrengen van een onderwaterbetonvloer. De aflaat is opnieuw getest door het Hoogheemraadschap van Delfland en akkoord bevonden. De waterberging is begin juni formeel overgedragen aan het Hoogheemraadschap.

[redacted]

- Voor elke kunstenaar die een schetsontwerp voor Archeologie / Vlietzoom maakt, wordt een locatiebezoek gehouden. Vanwege de coronamaatregelen en de reisbeperkingen verloopt de organisatie hiervan niet vlot. In het tweede kwartaal kon 1 locatiebezoek gehouden worden, met o.a. bezoek aan Molenvlietpark en toelichting op archeologische vondsten. Voor de andere deelnemers moet gewacht worden tot zij kunnen reizen.

[redacted]

- Scopemutaties vastgesteld t.a.v.:
    - Nr. 32: Vervangen fietsdek Molenslootbrug Jan Thijssenweg (scope project 2e watertoevoer);
    - Nr. 34: Afsplitsen realisatie tweede watertoevoer;

[redacted]

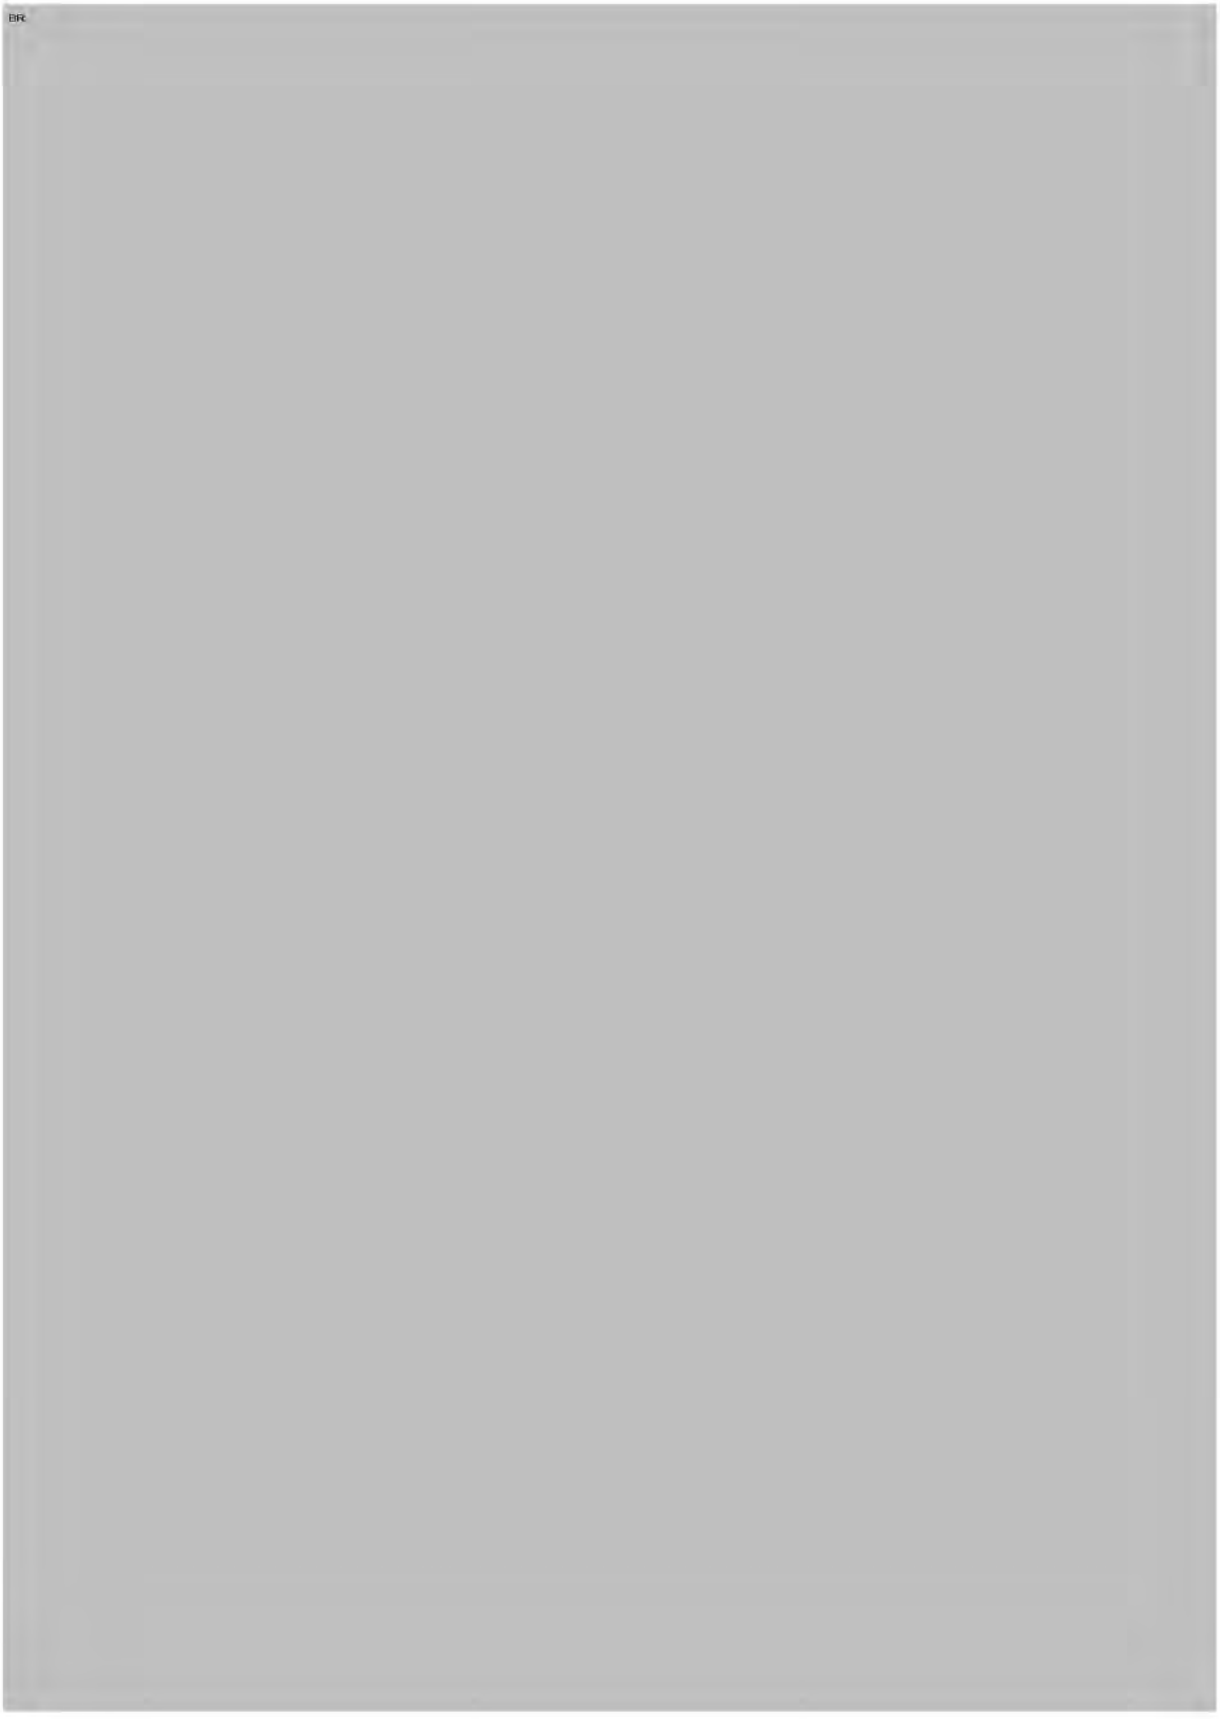
BR

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

BR

## 2.3 Overeenkomsten en Verwervingen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Samenwerkingsovereenkomst incl. bijlagen met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer op particulier terrein. | Met de particuliere eigenaar is de concept-SOK uitgewisseld en besproken. Hierop worden de SOK en bijlagen aangepast. |
| [redacted] | |
| Vervolggesprek met particuliere woningeigenaar Jan Thijssenweg 8 over mogelijke grondruil ter optimalisatie van ontwerp Tweede Watertoevoer. | Gesprek heeft 18 mei plaatsgevonden. Afspraken worden afgerond nadat ontwerp en samenwerkingsovereenkomst met grondeigenaar tweede watertoevoer gereed zijn. |
| [redacted] | |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Concept tekening opgesteld t.b.v. formaliseren van een recht van overpad van DH aan het Hoogheemraadschap voor de aanvoerroute naar opstelplaats mobiele pompen en voor de opstelplaats van de mobiele pompen bij de waterberging in het Molenvlietpark. | |
| Concept tekening opgesteld t.b.v. formaliseren opstalrecht van DH aan HHD voor aflaatconstructie en duikers bij de waterberging in het Molenvlietpark. | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen. | Geen. |

### 2.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| |
| Samenwerkingsovereenkomst incl. bijlagen met particuliere grondeigenaar t.b.v. de tweede watertoevoer op particulier terrein. |
| |
| Vestigen erfdienstbaarheden (opstalrecht en recht van overpad) voor de objecten van het Hoogheemraadschap van Delfland rondom de waterberging in het Molenvlietpark (bijv. aflaatconstructie en duikers, opstalplaats mobiele pompen). |
| |

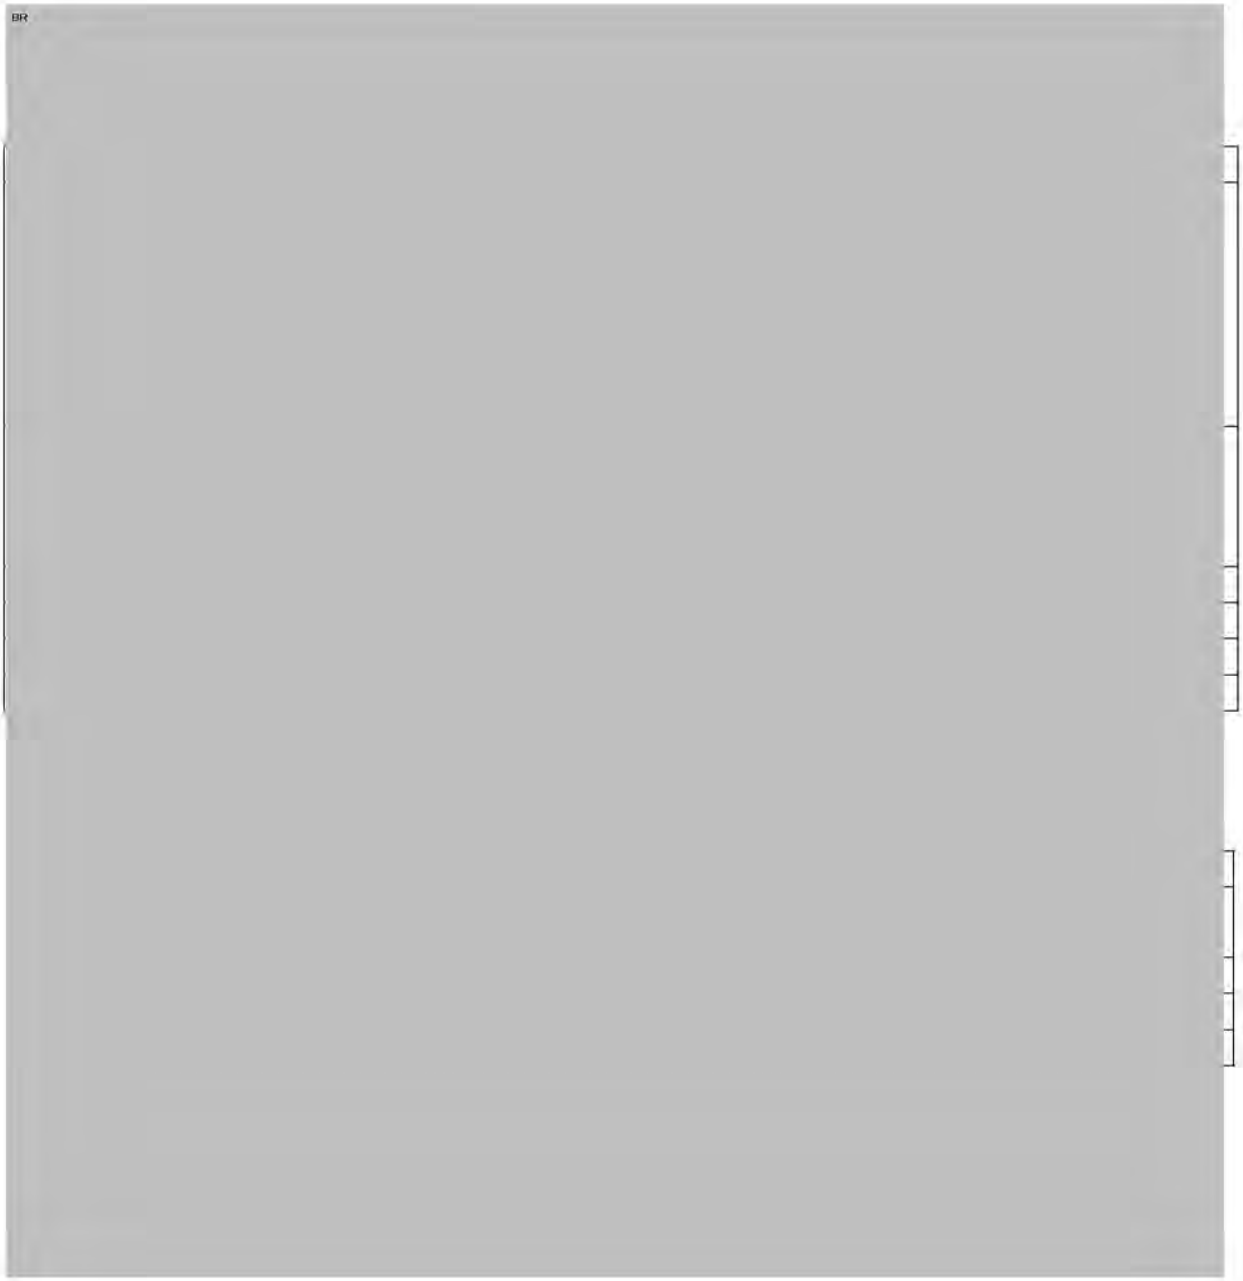
BR

Docnr31



# 3 Projectvoortgang

## 3.2 Kunstprojecten

### 3.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Kunstopdracht commissie Archeologie – fase schetsontwerp | BR<br><br>Voor elk van de kunstenaars die een schetsontwerp maken, wordt een locatiebezoek gehouden. Vanwege de coronamaatregelen en de reisbeperkingen verloopt de organisatie hiervan niet vlot. In het tweede kwartaal kon 1 locatiebezoek gehouden worden, met o.a. bezoek aan Molenvlietpark en toelichting op archeologische vondsten. Voor de andere deelnemers moet gewacht worden tot zij kunnen reizen (ofwel doordat zij gevaccineerd en/of door reis. |
| BR | |

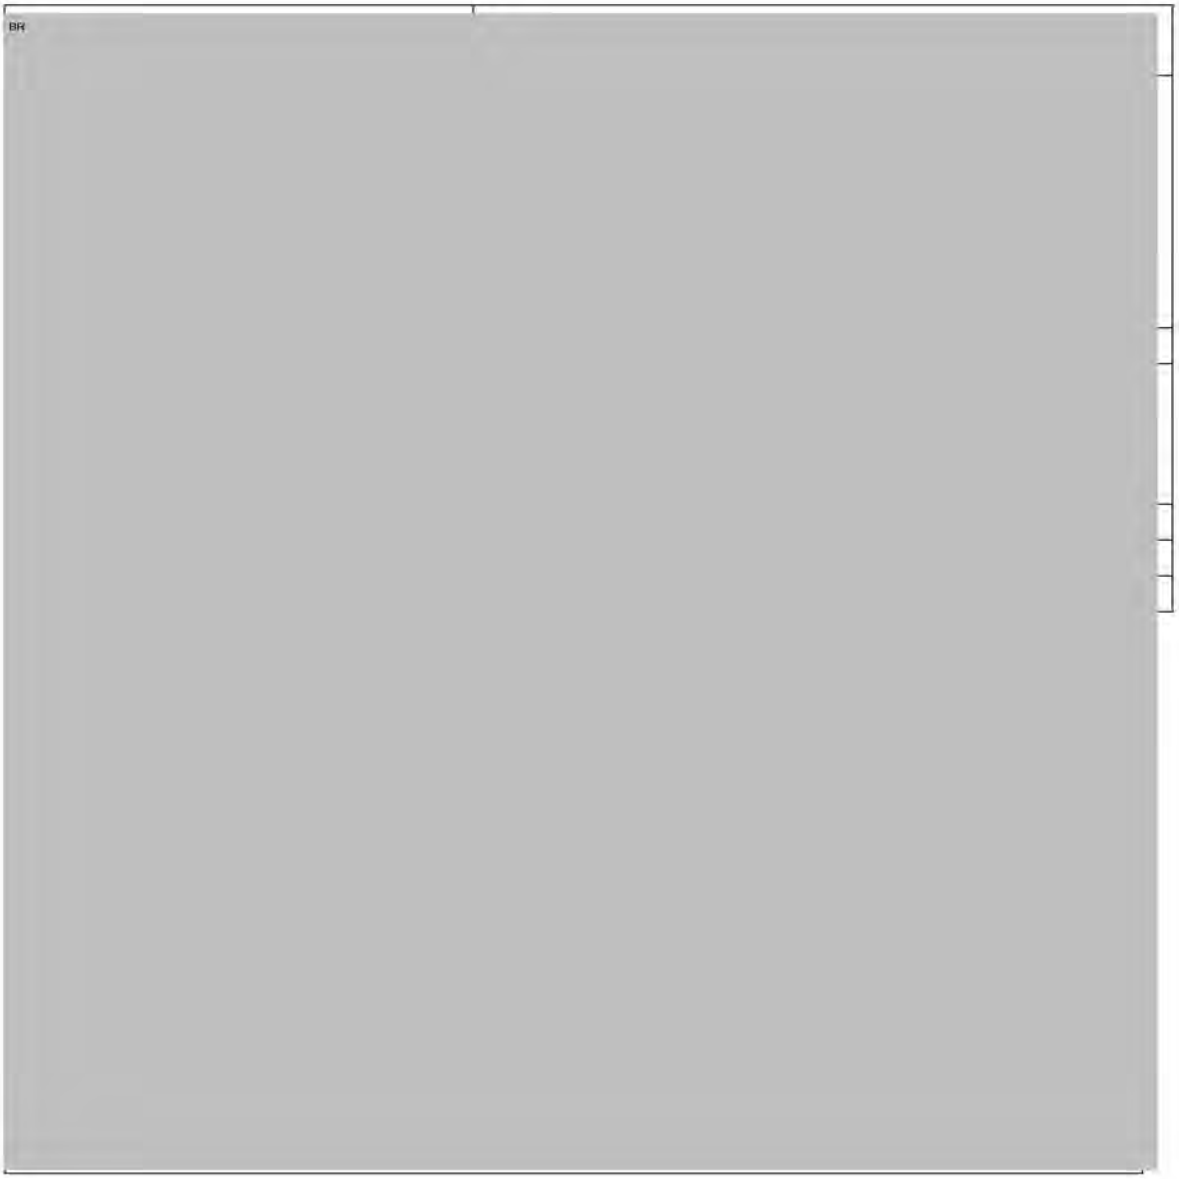
BR

BR

## 3.4 Inpassing Vlietzoom

### 3.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Oplossen resterende restpunten uit de deelopleveringen van 1 juli 2020. | De restpunten zijn grotendeels opgelost. Er resteren nog 2 restpunten en werkzaamheden uit contractwijzigingen. |
| CRB zal een oplossing uitwerken en uitvoeren voor de niet functionerende bodembescherming bij de aflaatconstructie tussen Molensloot en waterberging. | De bodembescherming is door CRB hersteld door het aanbrengen van een onderwaterbetonvloer. De aflaat is opnieuw getest door het Hoogheemraadschap van Delfland en akkoord bevonden. De waterberging is begin juni formeel overgedragen aan het hoogheemraadschap. |
| Eind juni 2021 zal opnameronde van de groenvoorzieningen met CRB en de groenbeheerder van stadsdeel plaatsvinden i.h.k.v. het einde van de onderhoudstermijn van CRB (1 juli 2021) en overdracht aan beheerder. | De opnameronde van de groenvoorzieningen heeft plaatsgevonden. In het najaar zal nog een aantal niet aangeslagen bomen en struiken worden vervangen. |
| BR | |

### 3.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| CRB zal de resterende werkzaamheden m.b.t. de deelopleveringen van 1 juli 2020 afronden. Dit betreft het oplossen van 2 restpunten, het herstellen van 3 gebreken uit de onderhoudstermijn en het afronden van werkzaamheden uit contractwijzigingen (o.a. verplaatsen peilbuis). |
| BR |

Foto: Storten onderwaterbetonvloer bij aflaatconstructie waterberging

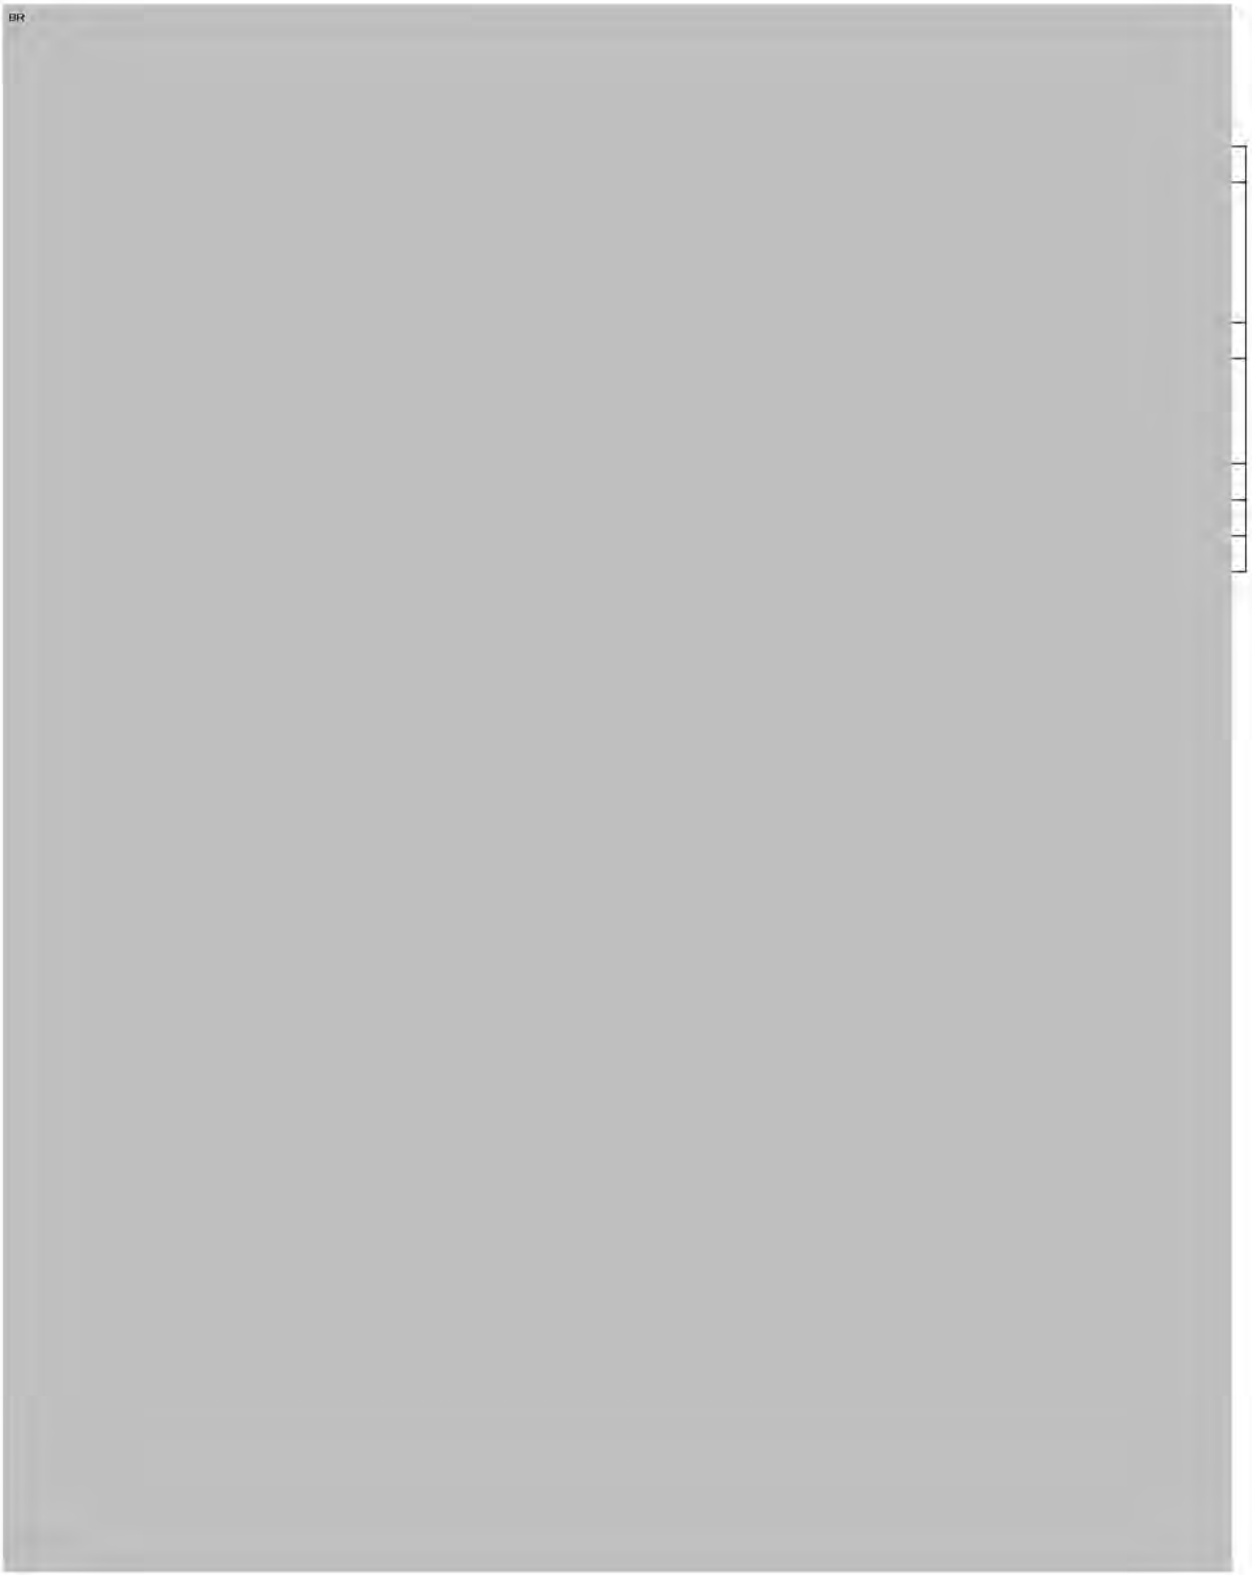

BR

BR

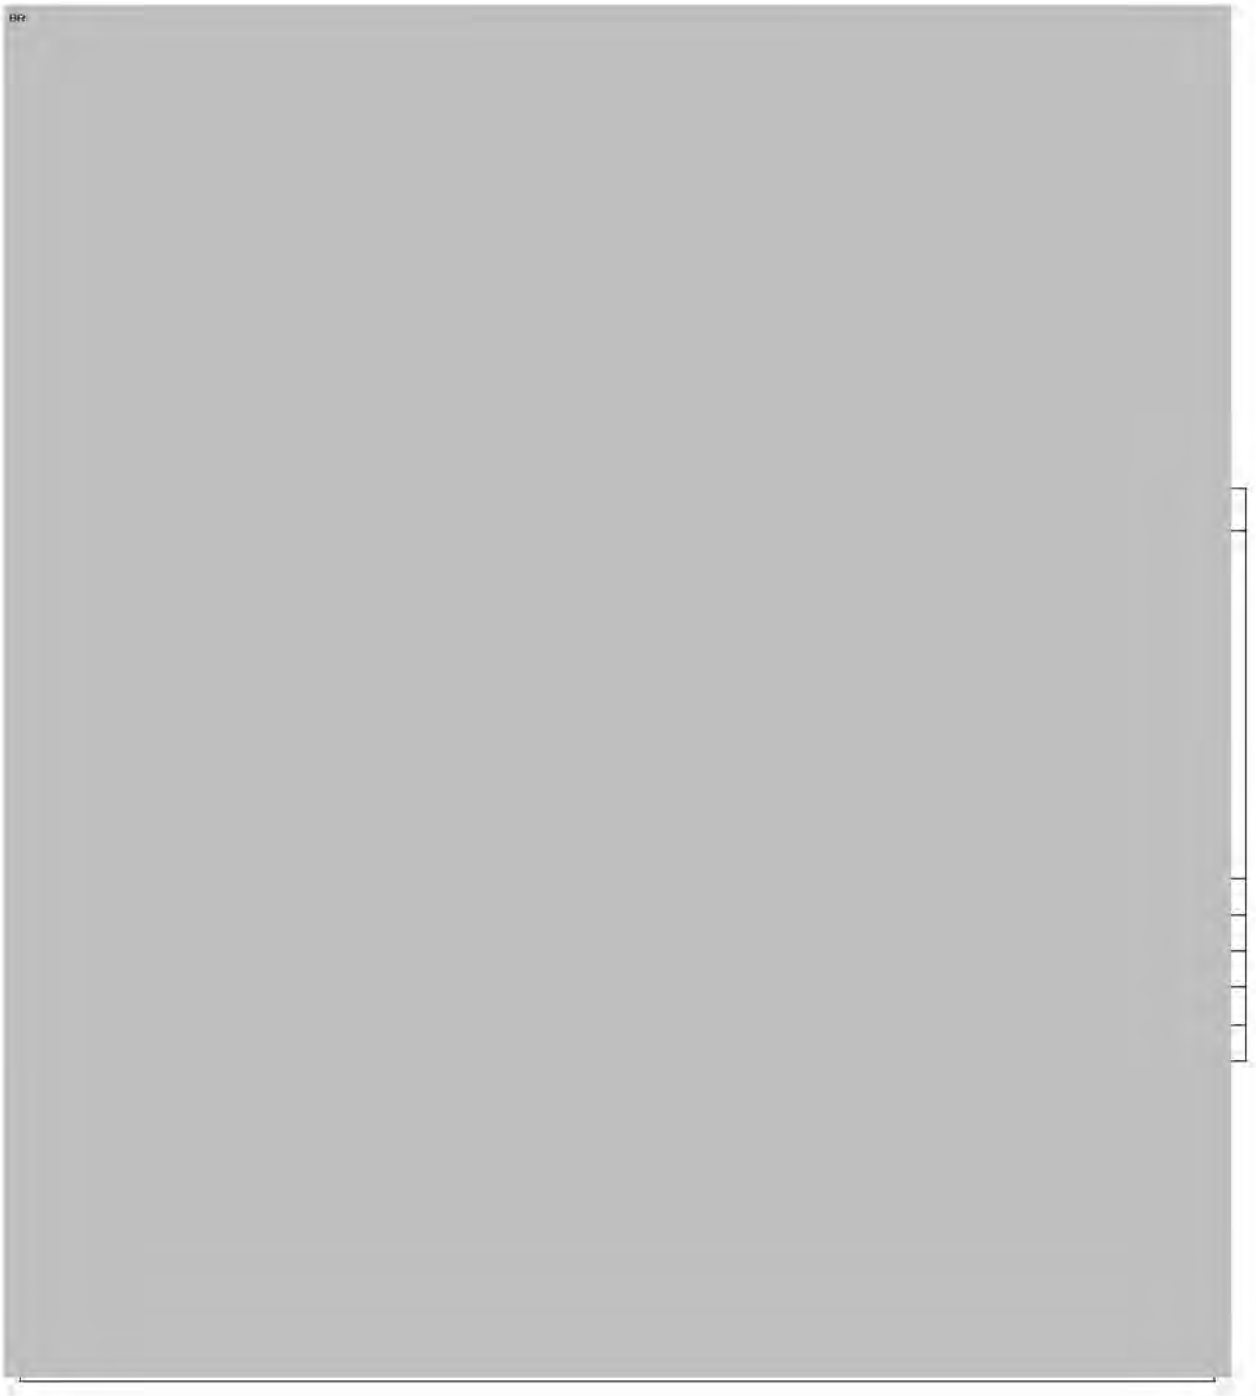

BR

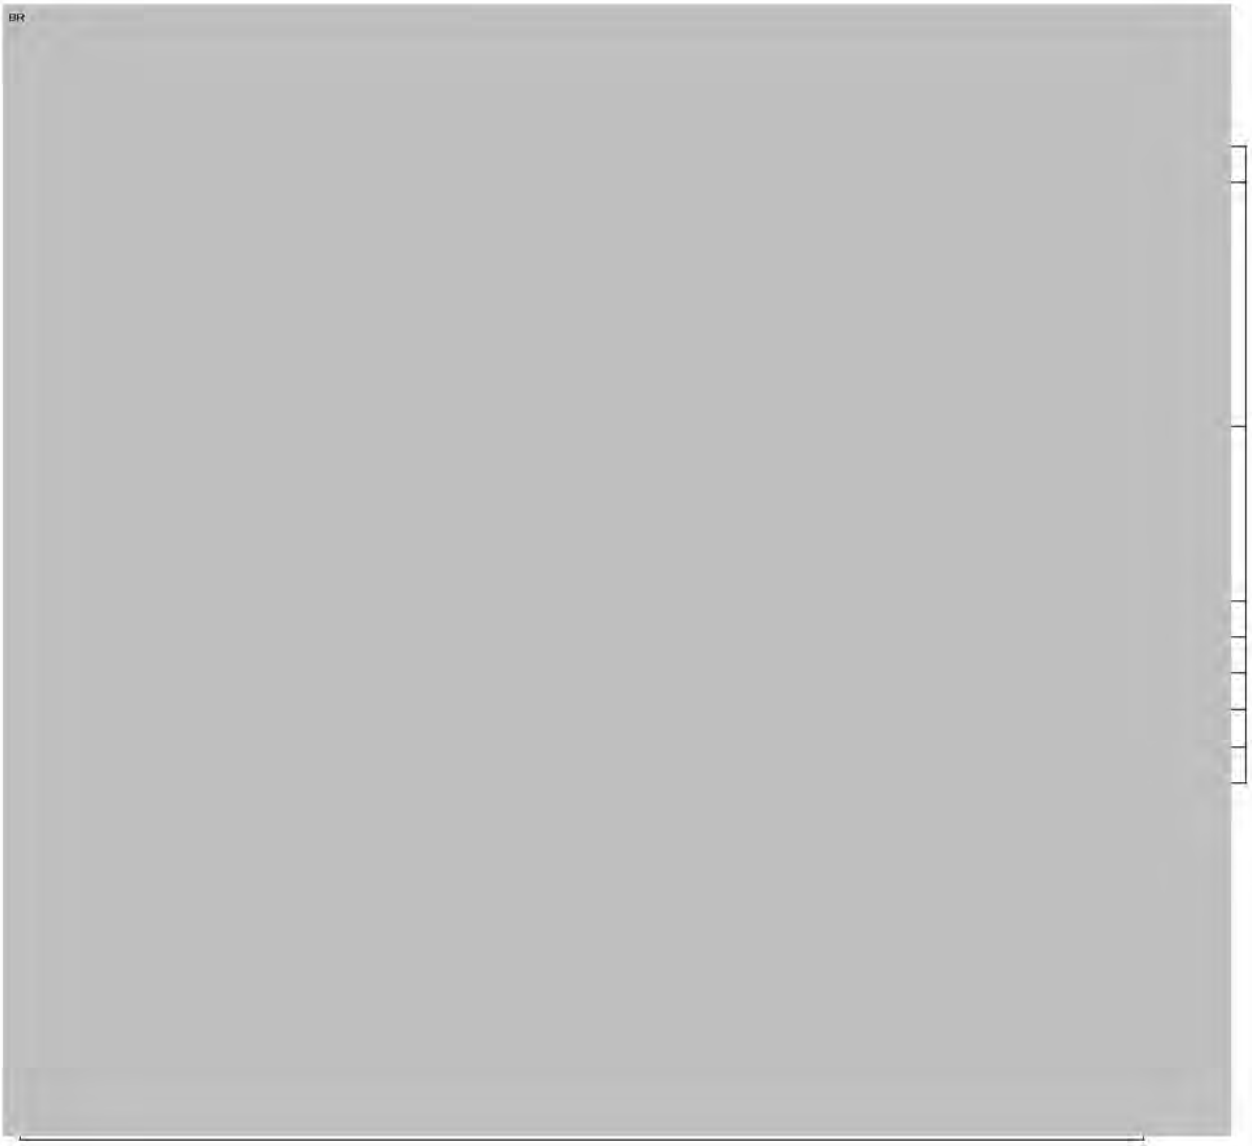
BR

Docnr31



# 4 Overdracht en openstelling

## 4.2 Overdracht aan beheerders

Het project Rotterdamsebaan bestaat uit het hoofdcontract met de CRB en diverse nevencontracten. Na de realisatie van de contracten wordt het gerealiseerde (deel van het) Werk overgedragen aan de betreffende beheerder(s).

### 4.2.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Komend kwartaal verwachten we alle onderdelen over te dragen die op dit moment zijn opgeleverd maar nog niet zijn overgedragen. Dit betreft met name onderdelen die worden overgedragen aan Rijkswaterstaat en de Gemeente Den Haag. | De volgende onderdelen zijn afgelopen kwartaal overgedragen aan de beheerders:<br>• Hoogheemraadschap van Delfland: Waterberging in Molenvlietpark. |

BR

# 5 Projectbeheersing

## 5.1 Scope

### 5.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Opstellen projectmutaties 29, 32, 33, 34 en 35. | Projectmutaties 32, 34 en 35, betrekking hebbend op respectievelijk het fietsdek van de Molenslootbrug (Jan Thijssenweg), het afsplitsen van de 2e Toevoer en Bediencentrale als aparte projecten, zijn opgesteld. |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Geen bijzonderheden. | |
| | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Vaststellen projectmutaties 29, 32, 33, 34 en 35. | Besluiten zijn genomen voor de mutaties:<br>- 32: Vervangen fietsdek Molenslootbrug Jan Thijssenweg (scope project 2e watertoevoer);<br>- 34: Afsplitsen realisatie tweede watertoevoer;<br>- 35: Afsplitsen realisatie nieuwe bediencentrale. |

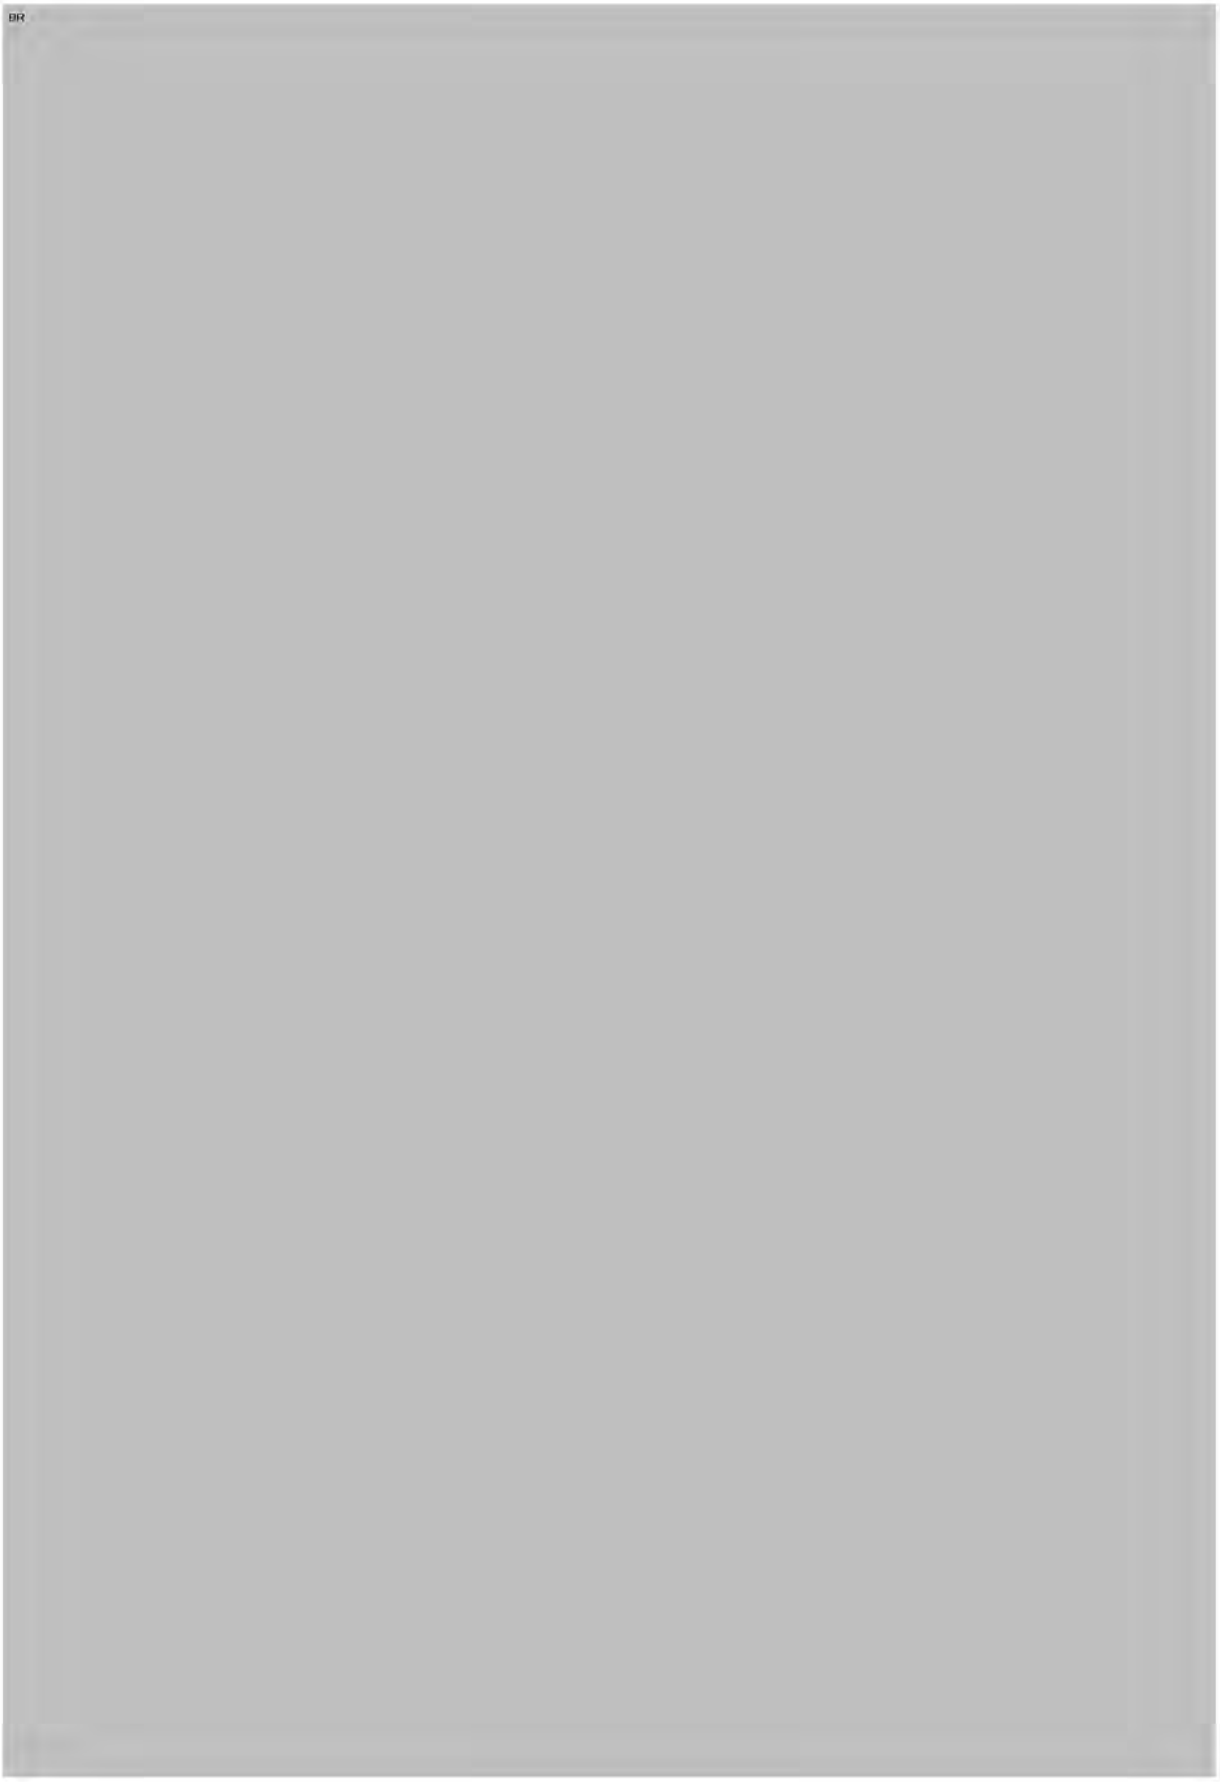

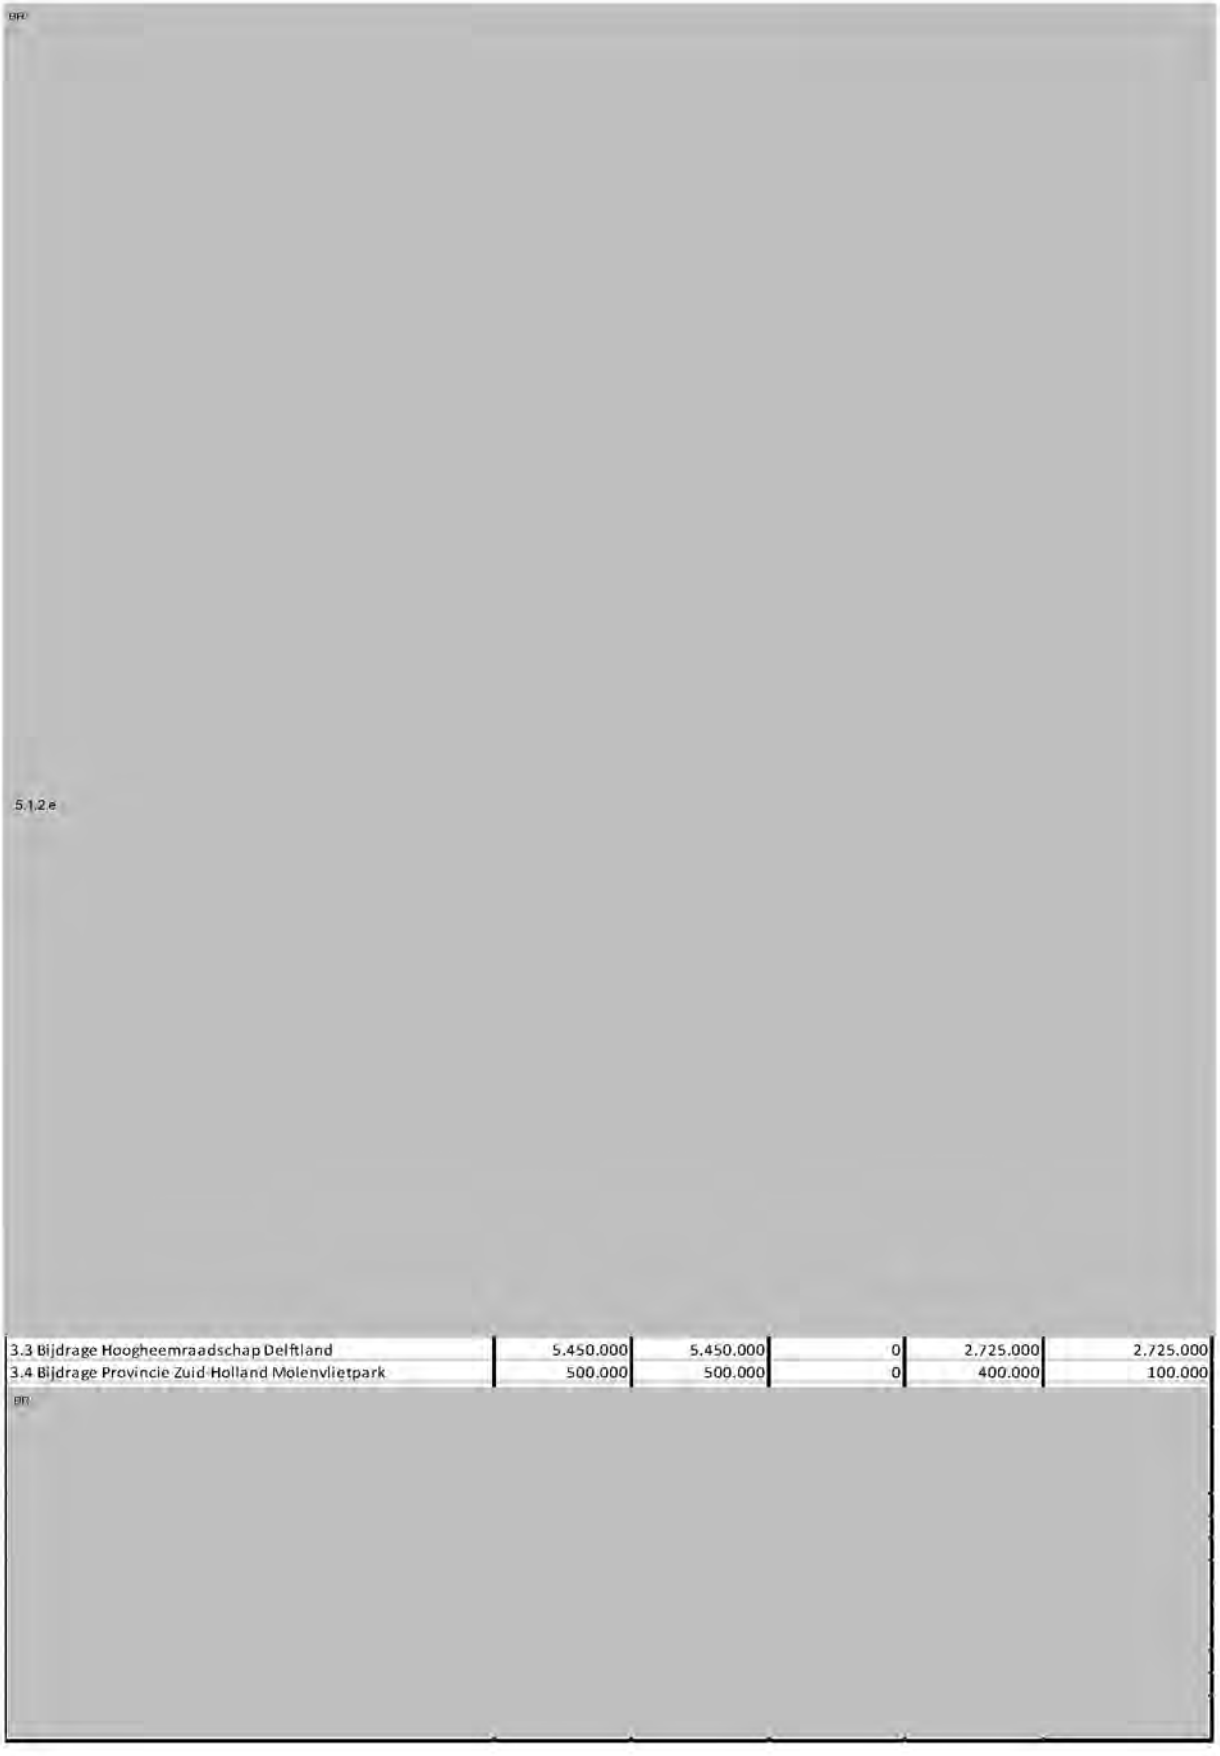

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delftland | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 2.725.000 | 2.725.000 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |

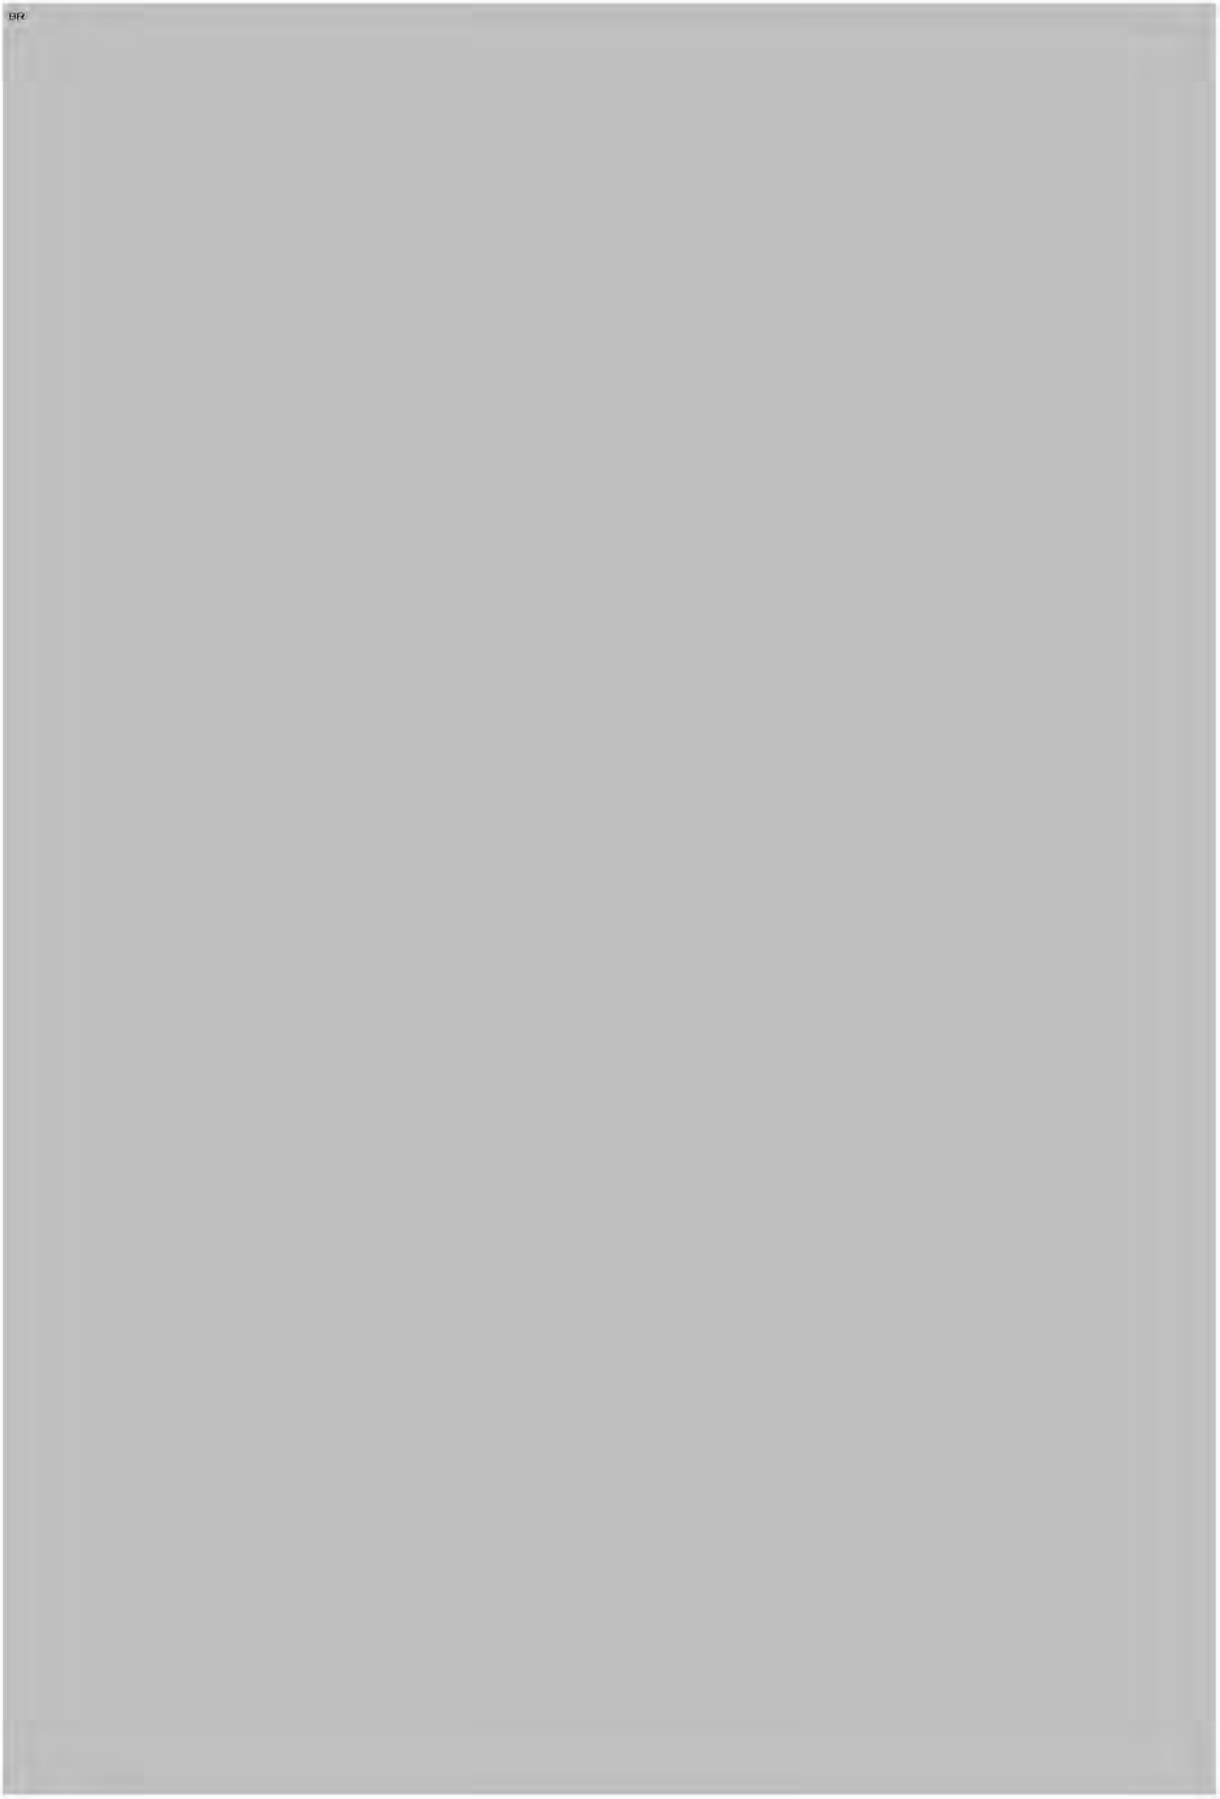
BR

## 5.3 Planning

Zie tevens de bijlage 'Planningsmijlpalen'.

### 5.3.1 Afgelopen kwartaal

| |
|---|
| BR |
| **Overige / extra verrichte werkzaamheden** |
| Planning 2e toevoer is geactualiseerd. |
| BR |

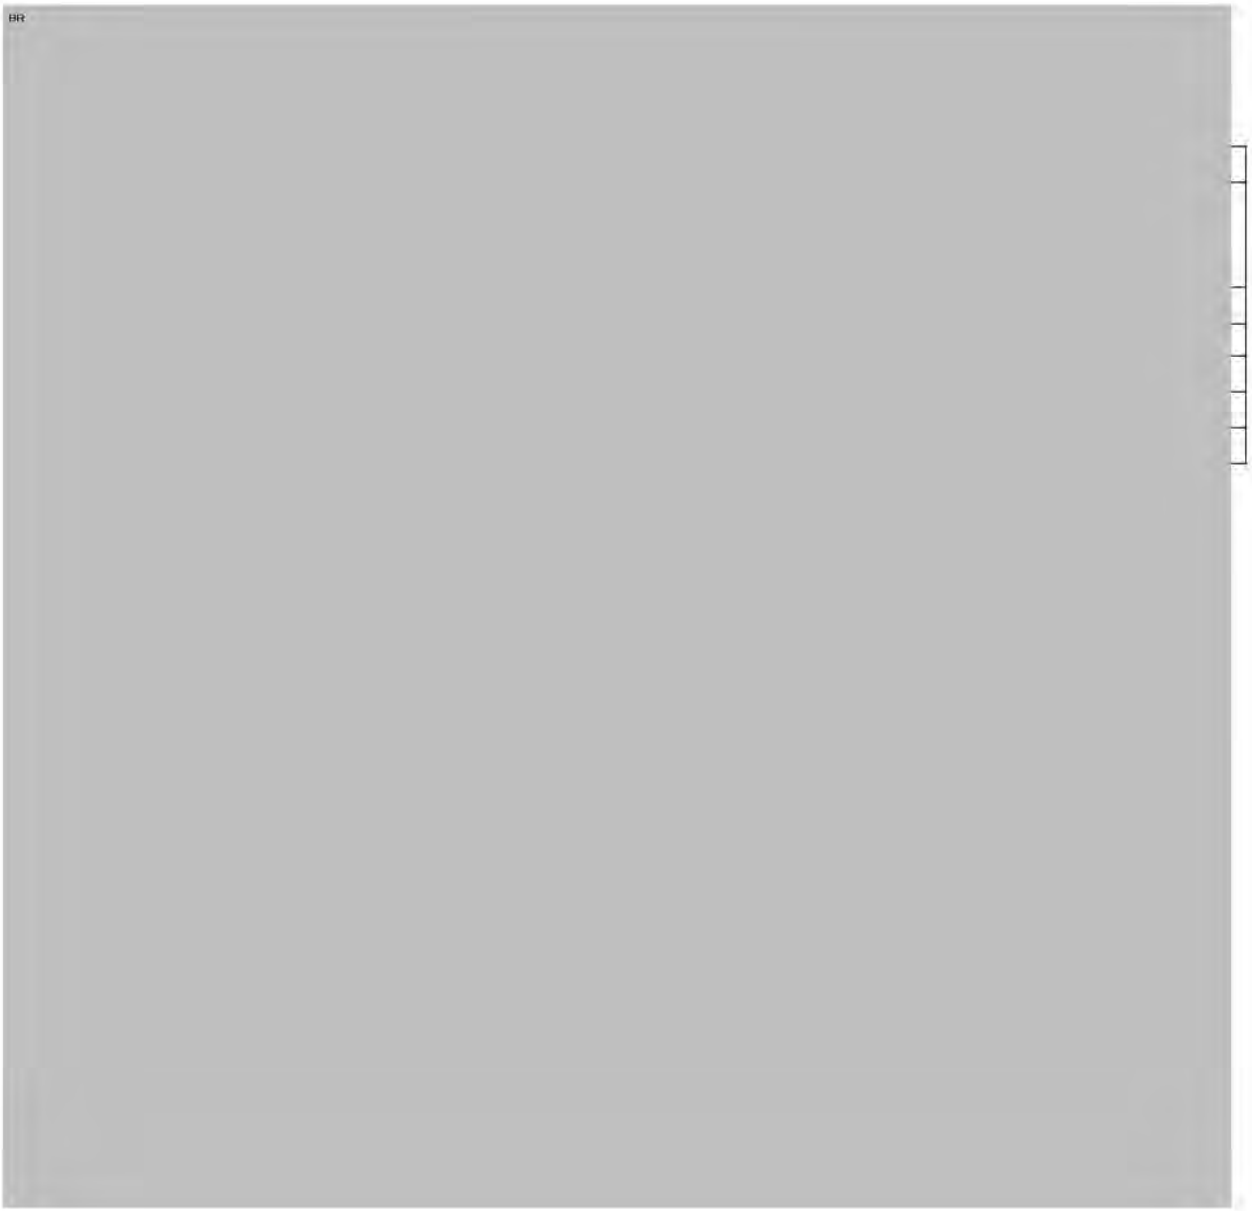
BR

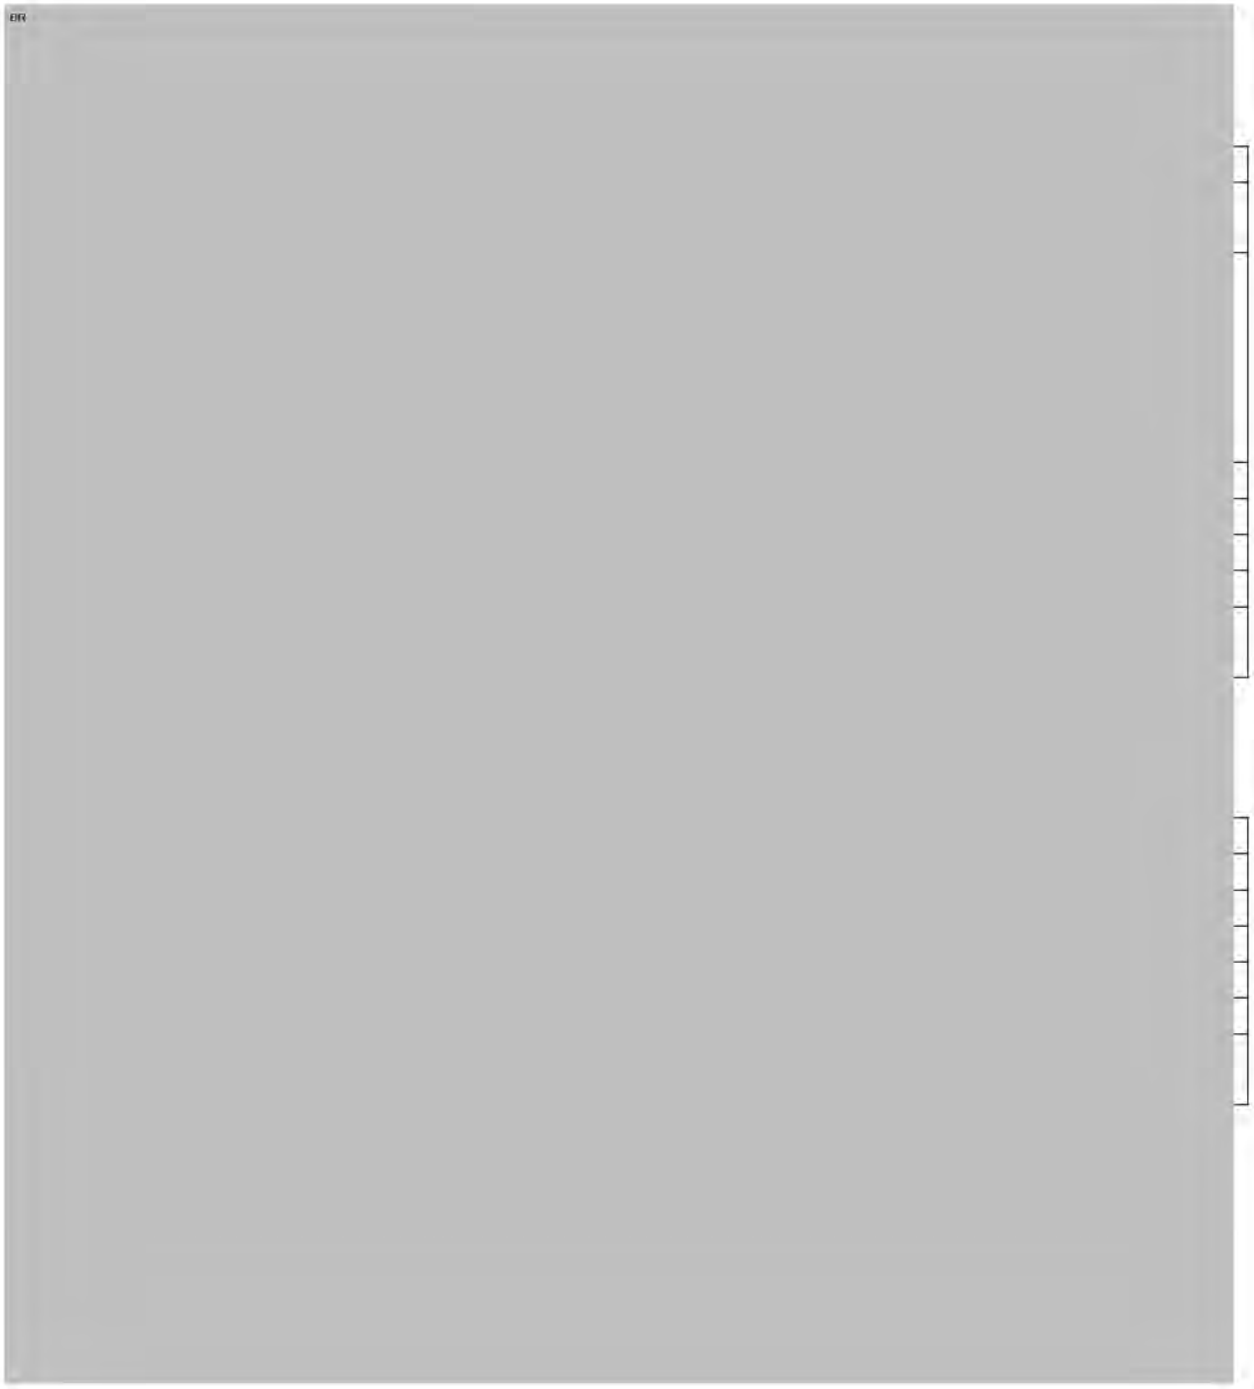

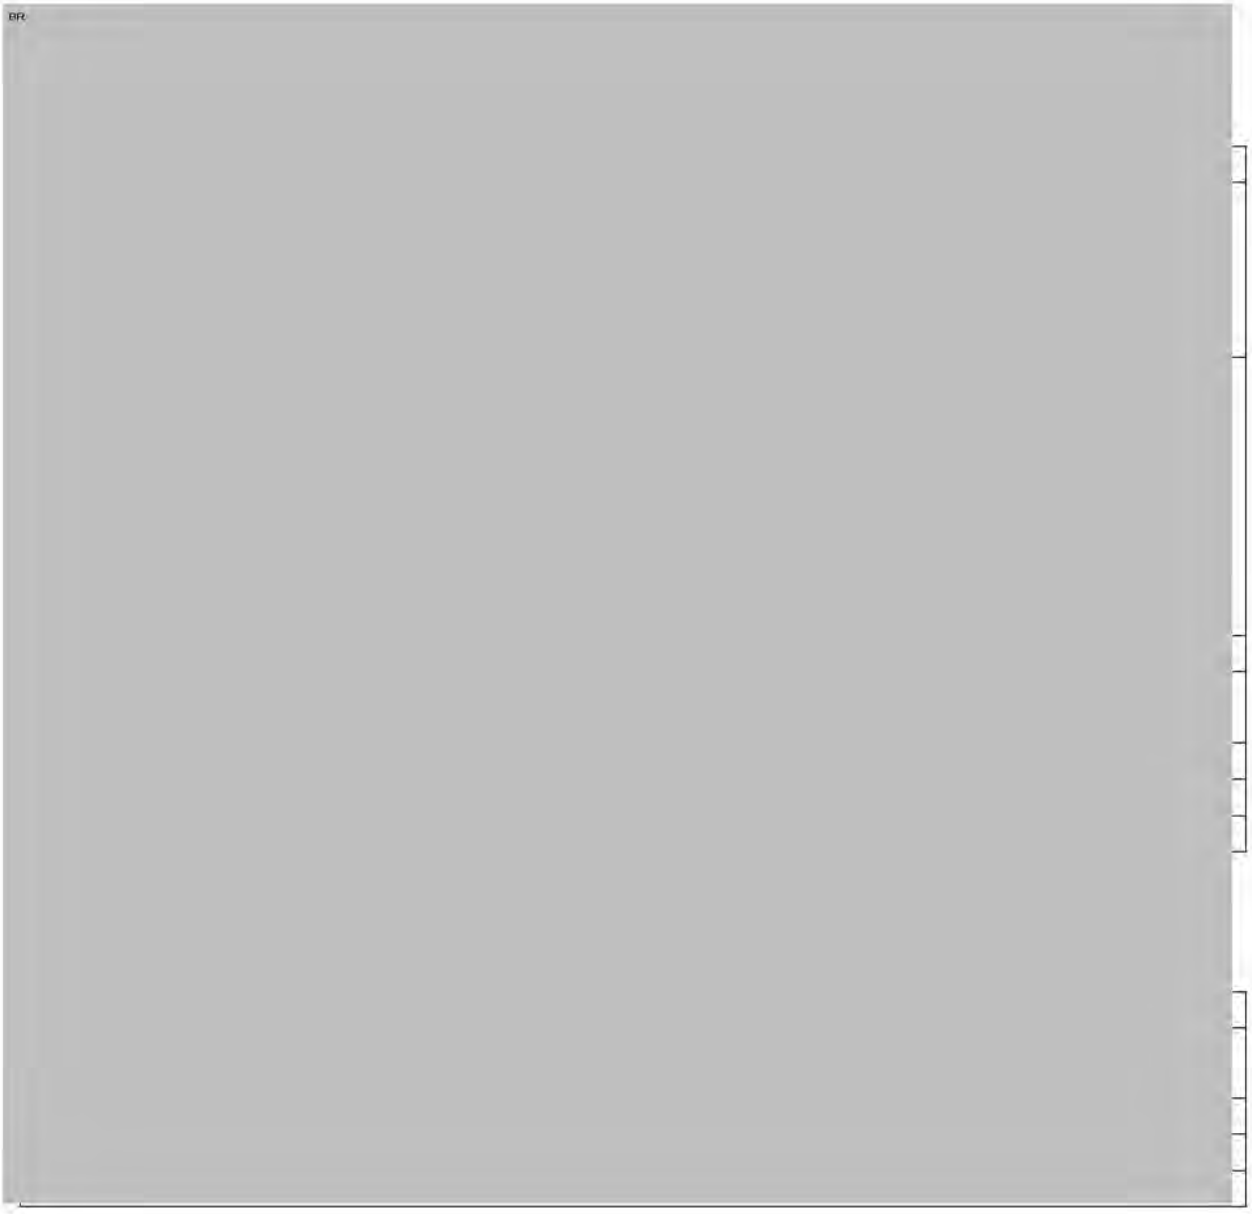

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

**Overzicht planningsmijlpalen**

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM PER 30 jun 2021 | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 5-jun-20 | 30 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie (incl. consolidatieperiode) vertraagd. Het planten van de laatste groenvoorzieningen heeft in het najaar '20 plaats gevonden. |
| BR | | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

Docnr31

Docnr31



Docnr32

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 3e kwartaal 2021

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 27 oktober 2021**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 1.0**

Docnr32

Docnr32



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 3e kwartaal 2021
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-005055

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>13 oktober 2021 | Versie 0.1<br>12 oktober 2021 | Versie 1.0<br>19 oktober 2021 | Versie 1.0<br>27 oktober 2021 | Versie 1.0<br>11 november 2021 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. A. Mulder, wethouder / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr32



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* *8*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 8
2.1.2 Komende kwartaal 8

*2.2 Planologie en Vergunningen* *9*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 9
2.2.2 Komende kwartaal 9

*2.3 Overeenkomsten en Verwervingen* *10*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 10
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Communicatie* *12*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 12
2.4.2 Komende kwartaal 12
2.4.3 Diversen 12

3 Projectvoortgang 13

*3.1 Aanbesteden en contracteren* *13*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 13
3.1.2 Komende kwartaal 13

*3.2 Kunstprojecten* *14*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 14
3.2.2 Komende kwartaal 14

*3.3 Inpassing Binckhorst* *15*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 15
3.3.2 Komende kwartaal 15

*3.4 Inpassing Vlietzoom* *16*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 16
3.4.2 Komende kwartaal 16

*3.5 Inpassing Laan van Hoornwijck* *17*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 17
3.5.2 Komende kwartaal 17

*3.6 Boortunnel en toeritten* *18*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 18
3.6.2 Komende kwartaal 18

*3.7 Verdiepte ligging knooppunt Ypenburg* *19*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 19
3.7.2 Komende kwartaal 19

*3.8 Installaties* *20*
3.8.1 Afgelopen kwartaal 20
3.8.2 Komende kwartaal 20

*3.9 Uitvoeringskwaliteit* *22*
3.9.1 Afgelopen kwartaal 22

Docnr32



3.9.2 Komende kwartaal 22

*3.10 Contractmanagement* *23*
3.10.1 Afgelopen kwartaal 23
3.10.2 Komende kwartaal 23

**4 Overdracht en openstelling** **24**

*4.1 Overdracht aan beheerders* *24*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 24
4.1.2 Komende kwartaal 24

*4.2 Beheer en onderhoud* *25*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 25
4.2.2 Komende kwartaal 25

**5 Projectbeheersing** **26**

*5.1 Scope* *26*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 26
5.1.2 Komende kwartaal 26

*5.2 Financiën* *27*
5.2.1 Kostenstructuur 27
5.2.1 Budget 28

*5.3 Planning* *30*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 30
5.3.2 Komende kwartaal 30

*5.4 Informatiebeheer* *31*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 31
5.4.2 Komende kwartaal 31
5.4.3 Kennisdeling 31

*5.5 Organisatie* *32*
5.5.1 Afgelopen kwartaal 32
5.5.2 Komende kwartaal 32

**6 Bijlage: Planningsmijlpalen** **33**

**7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan** **34**

Docnr32

# 1 Managementsamenvatting

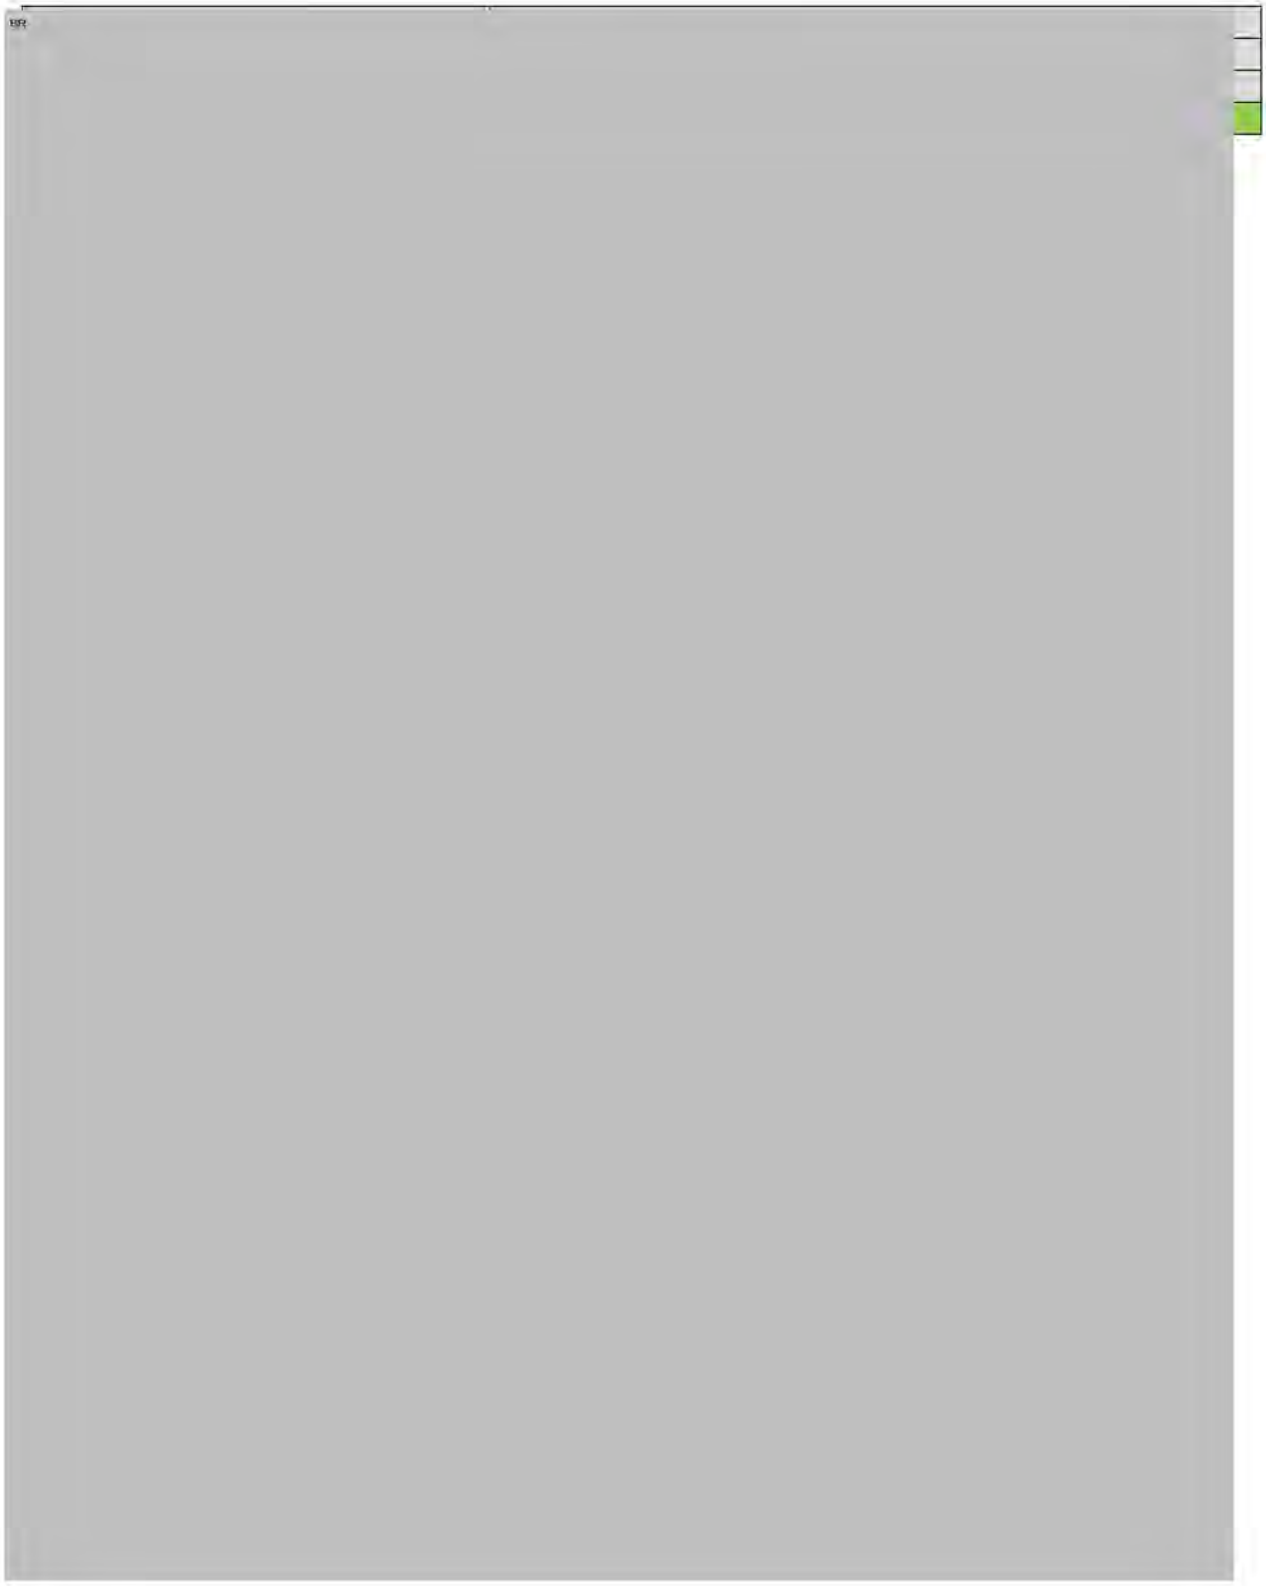

## 4. TERUGBLIK AFGELOPEN KWARTAAL

Afgelopen kwartaal is er onder andere gewerkt aan:

- Via scopemutaties is besloten de projecten Nieuwe Bediencentrale en Tweede Watertoevoer per 1 juli 2021 uit de scope van het project Rotterdamsebaan te halen. Derhalve wordt er in deze voortgangsrapportage niet meer over deze projecten gerapporteerd.

## 6. Financiën

Het project bevindt zich binnen het gestelde budget.

- Het uitvoeringsbudget is per 30 september op € 585,7 mln. te stellen (was 30 juni € 594,6 mln.). Het uitvoeringsbudget is met € 8,9 mln. verlaagd als gevolg van het loskoppelen van de werkzaamheden Tweede watertoevoer. Hiervoor is een apart project ingericht.

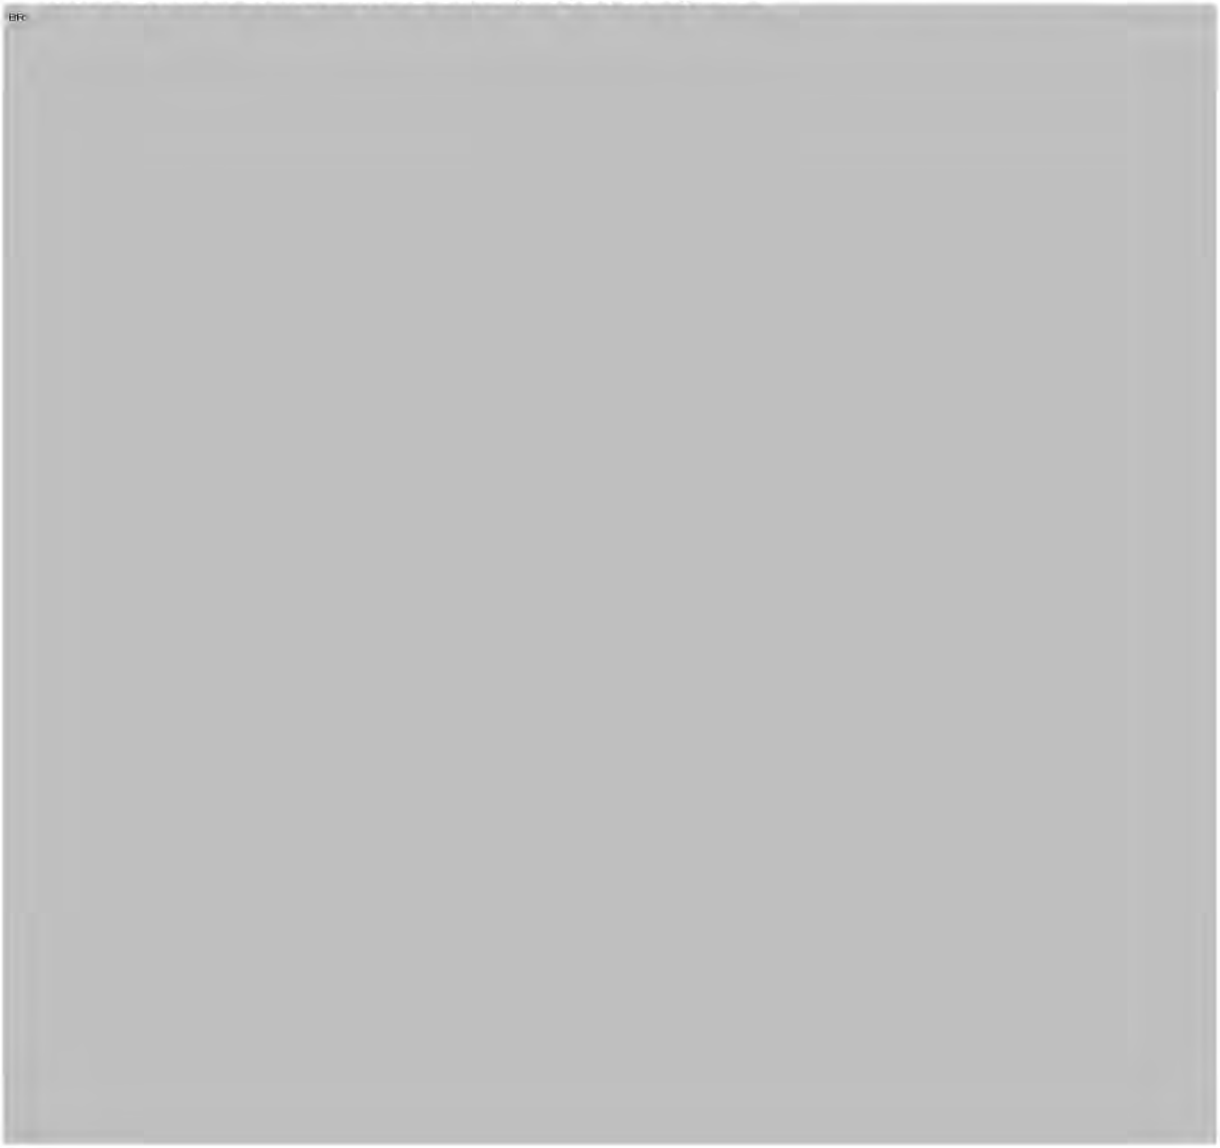

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

## 2.3 Overeenkomsten en Verwervingen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Vestigen erfdienstbaarheden (opstalrecht en recht van overpad) voor de objecten van het Hoogheemraadschap van Delfland rondom de waterberging in het Molenvlietpark (bijv. aflaatconstructie en duikers, opstalplaats mobiele pompen). | De tekeningen met de exacte locatie/grenzen zijn opgesteld. De tekeningen worden eerst aan HHD voorgelegd ter accordering. Vervolgens zal de notaris gevraagd worden om de concept akte op te stellen. Indien de gemeente de concept akte goed bevonden heeft zal deze aan HHD worden aangeboden voor goedkeuring. Uiteindelijk zal de akte incl. bijlagen bij de notaris passeren. |
| [redacted] | |

### 2.3.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
| --- |
| [redacted] |
| Vestigen van een zakelijk recht en erfdienstbaarheden voor de objecten van het Hoogheemraadschap van Delfland rondom de waterberging in het Molenvlietpark (bijv. aflaatconstructie en duikers, opstalplaats mobiele pompen). |
| [redacted] |

BR

# 3 Projectvoortgang

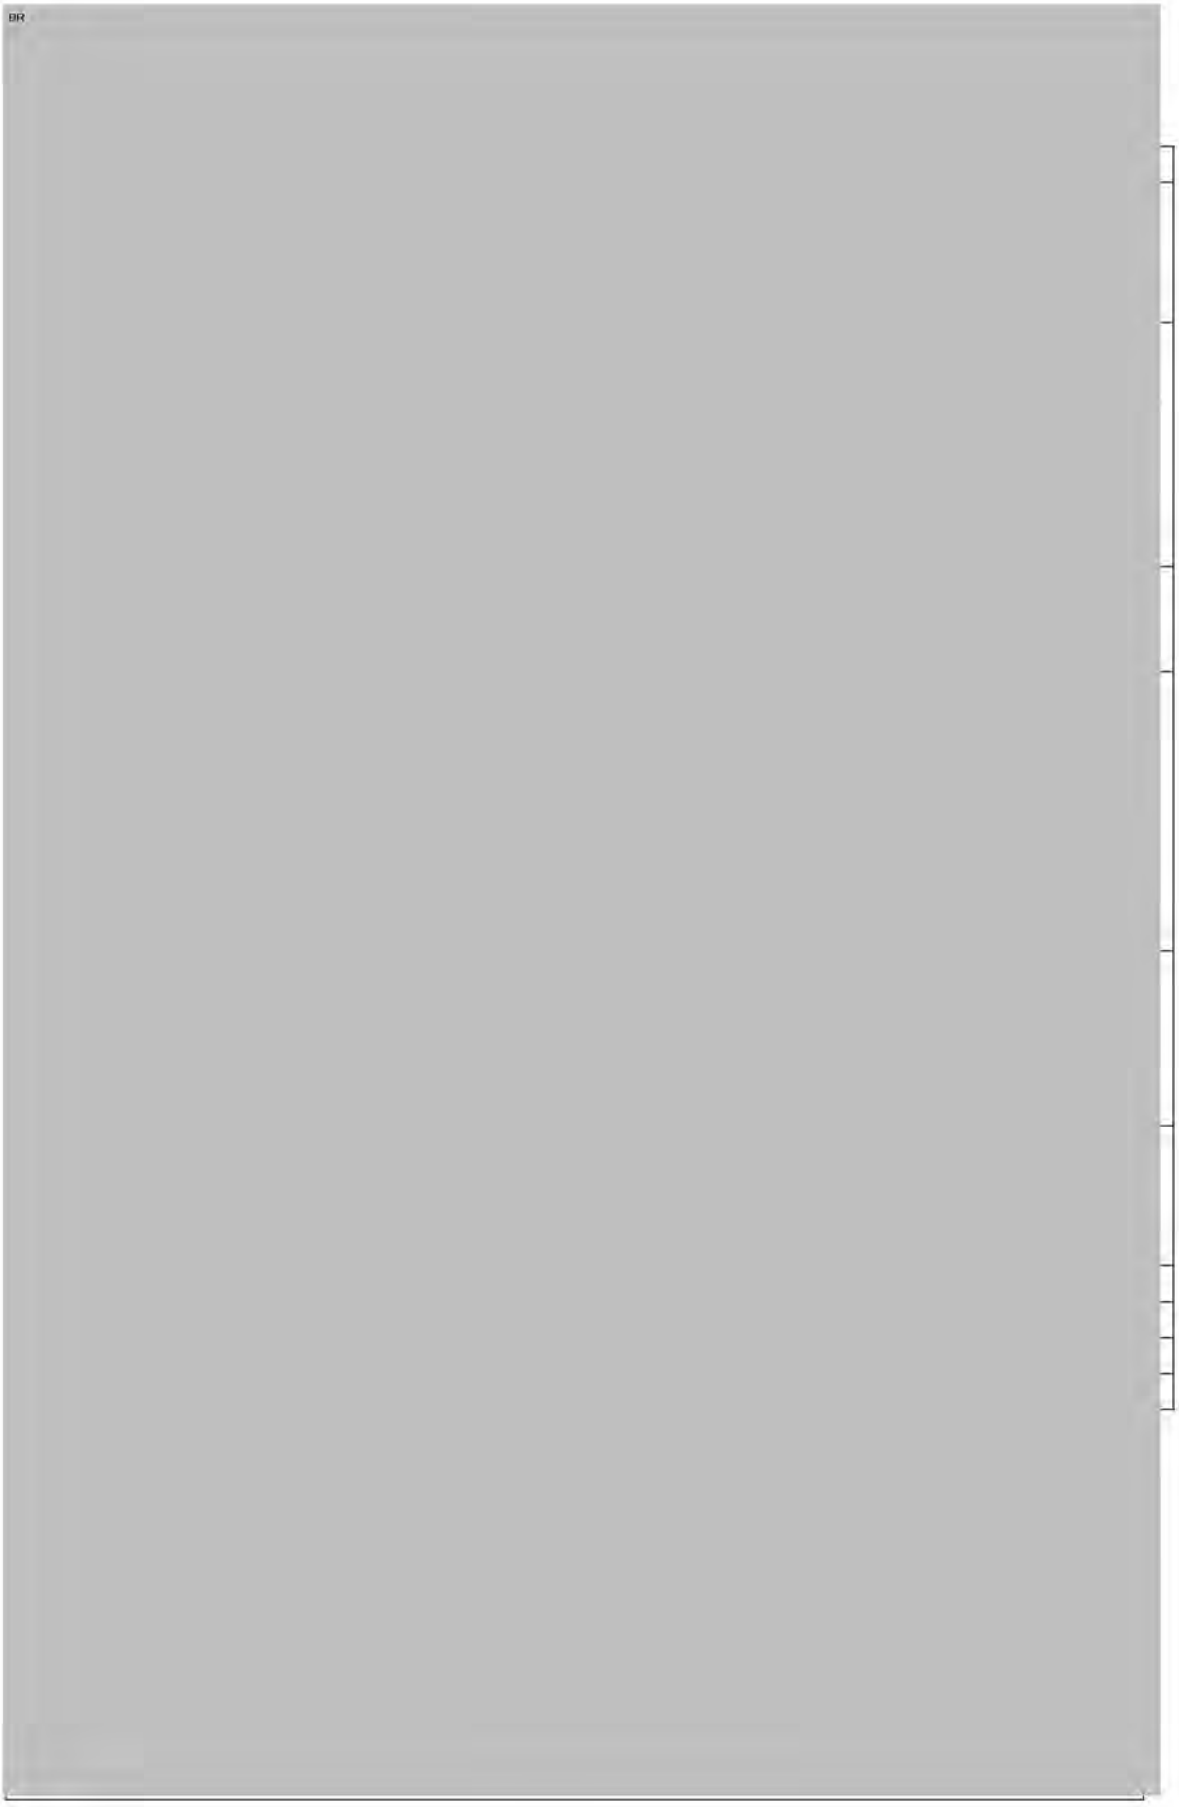

BR

## 3.4 Inpassing Vlietzoom

### 3.4.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| CRB zal de resterende werkzaamheden m.b.t. de deel-opleveringen van 1 juli 2020 afronden. Dit betreft het oplossen van 2 restpunten, het herstellen van 3 gebreken uit de onderhoudstermijn en het afronden van werkzaamheden uit contractwijzigingen. | De resterende werkzaamheden van CRB m.b.t. de deelopleveringen van 1 juli 2020 zijn afgerond. Wel zal de groenaannemer van CRB in het najaar van 2021 nog één keer een inboetronde in de Vlietzoom uitvoeren. |
| [redacted] | |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Roba is in overleg met de speelbeheerder van het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg over de stabiliteit van het trekpontje in het Molenvlietpark. Hoewel het trekpontje is goedgekeurd door het Keurmerkinstituut, is de leverancier van het trekpontje (onderaannemer CRB) op verzoek van de speelbeheerder gevraagd om met een voorstel te komen om de stabiliteit te verbeteren. | |
| | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen. | Geen. |

### 3.4.2 Komende kwartaal

| Werkzaamheden |
|---|
| In overleg met de speelbeheerder van het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg en de leverancier kijken naar de mogelijkheden om de stabiliteit van het trekpontje in het Molenvlietpark te verbeteren. |
| |
| **Besluiten** |
| Geen. |

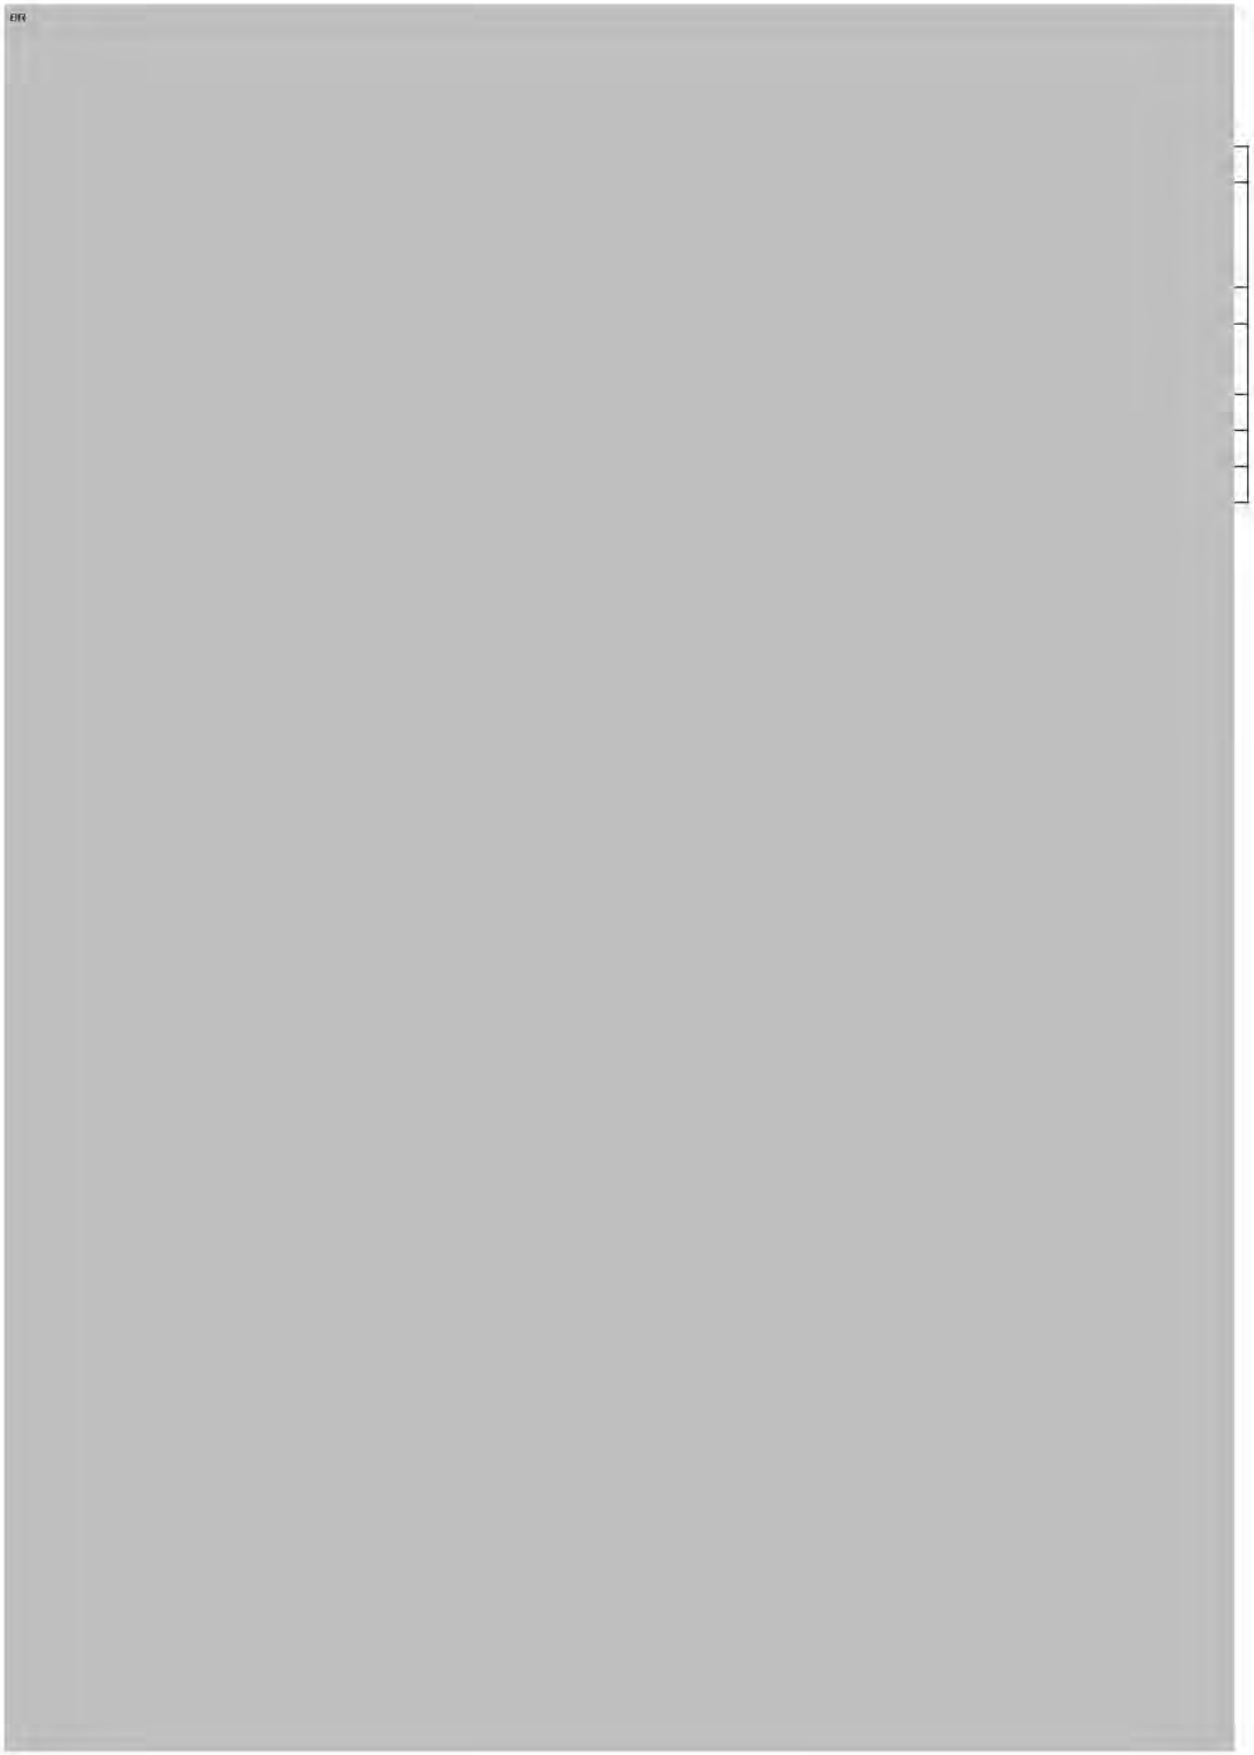

BR

BR

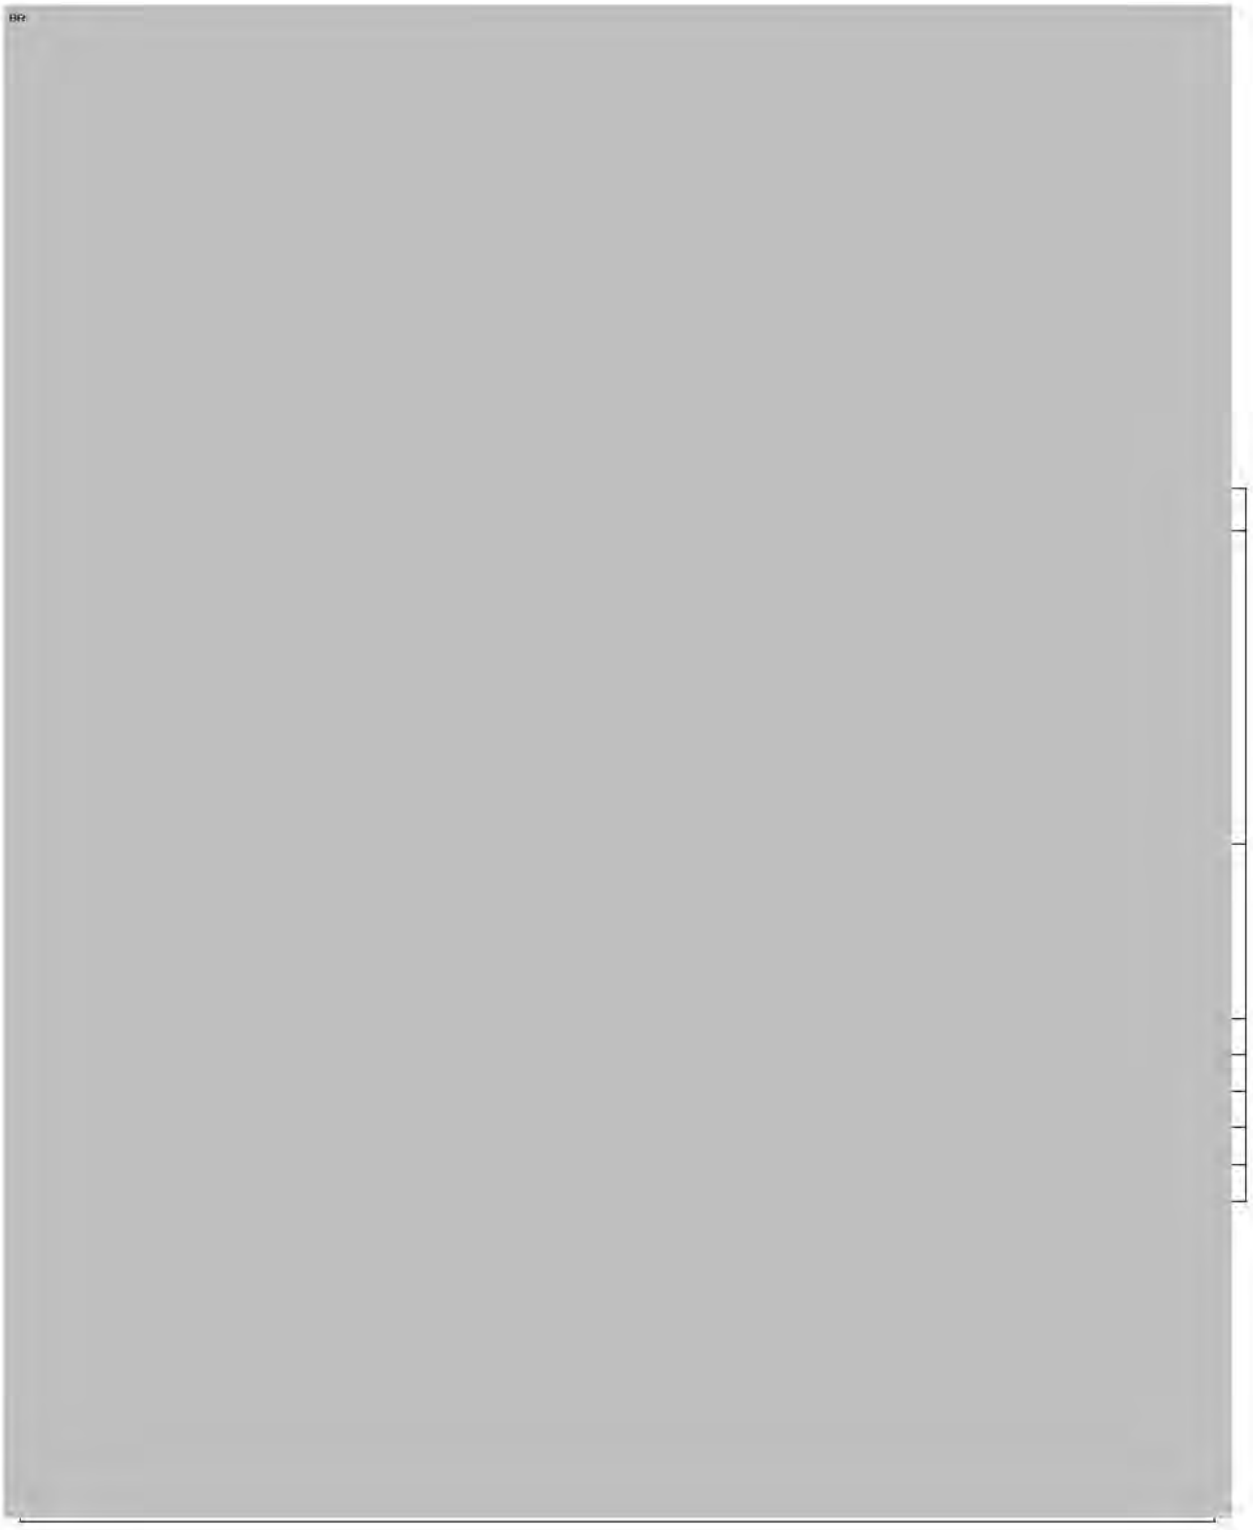

Docnr32

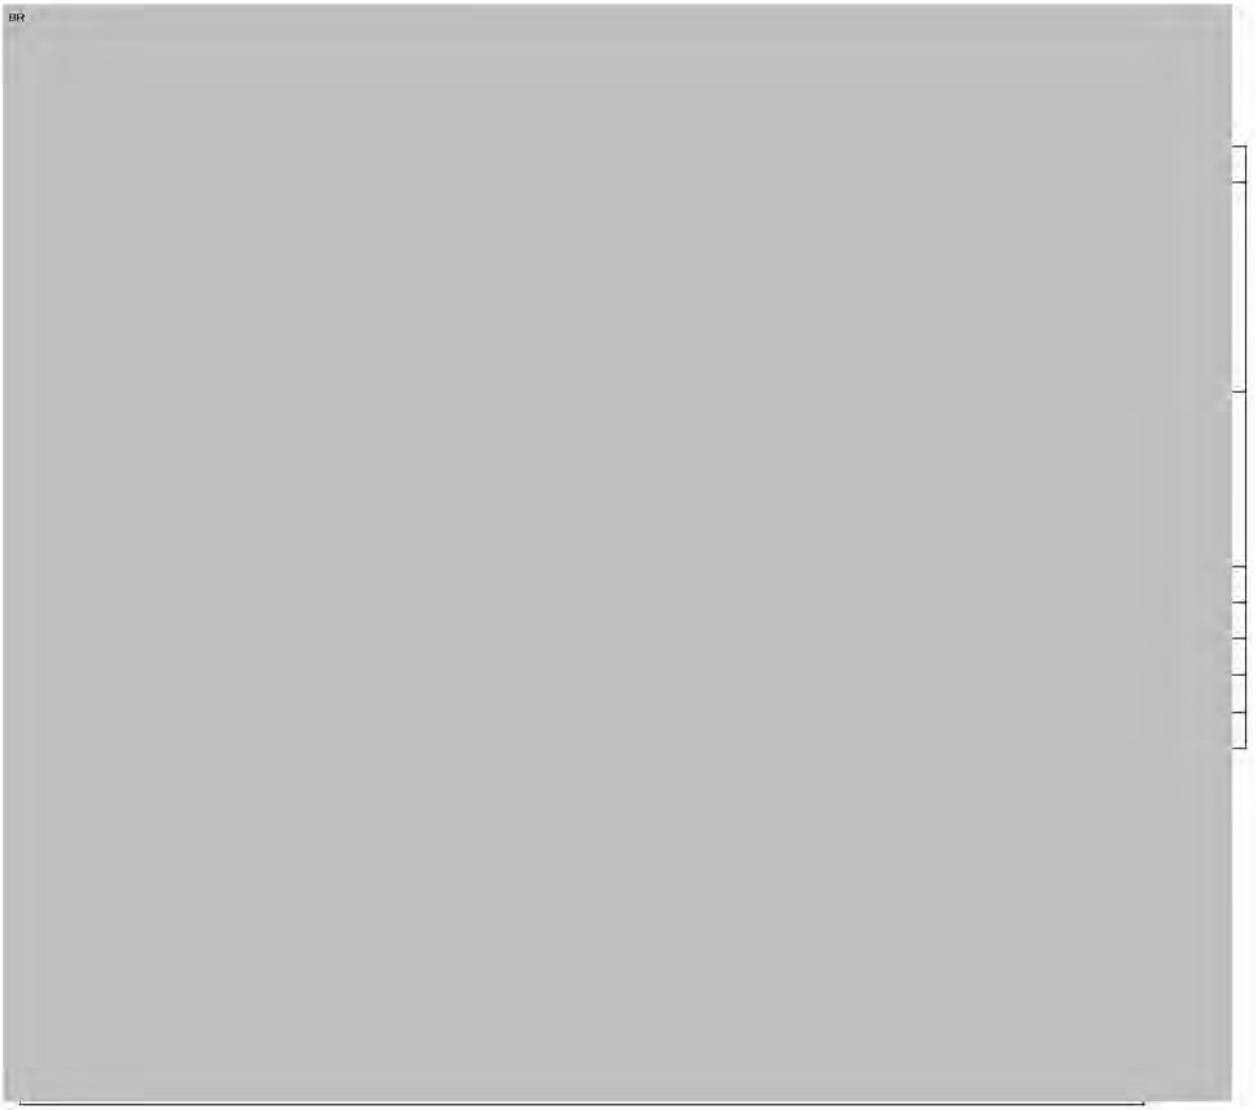
BR

# 4 Overdracht en openstelling

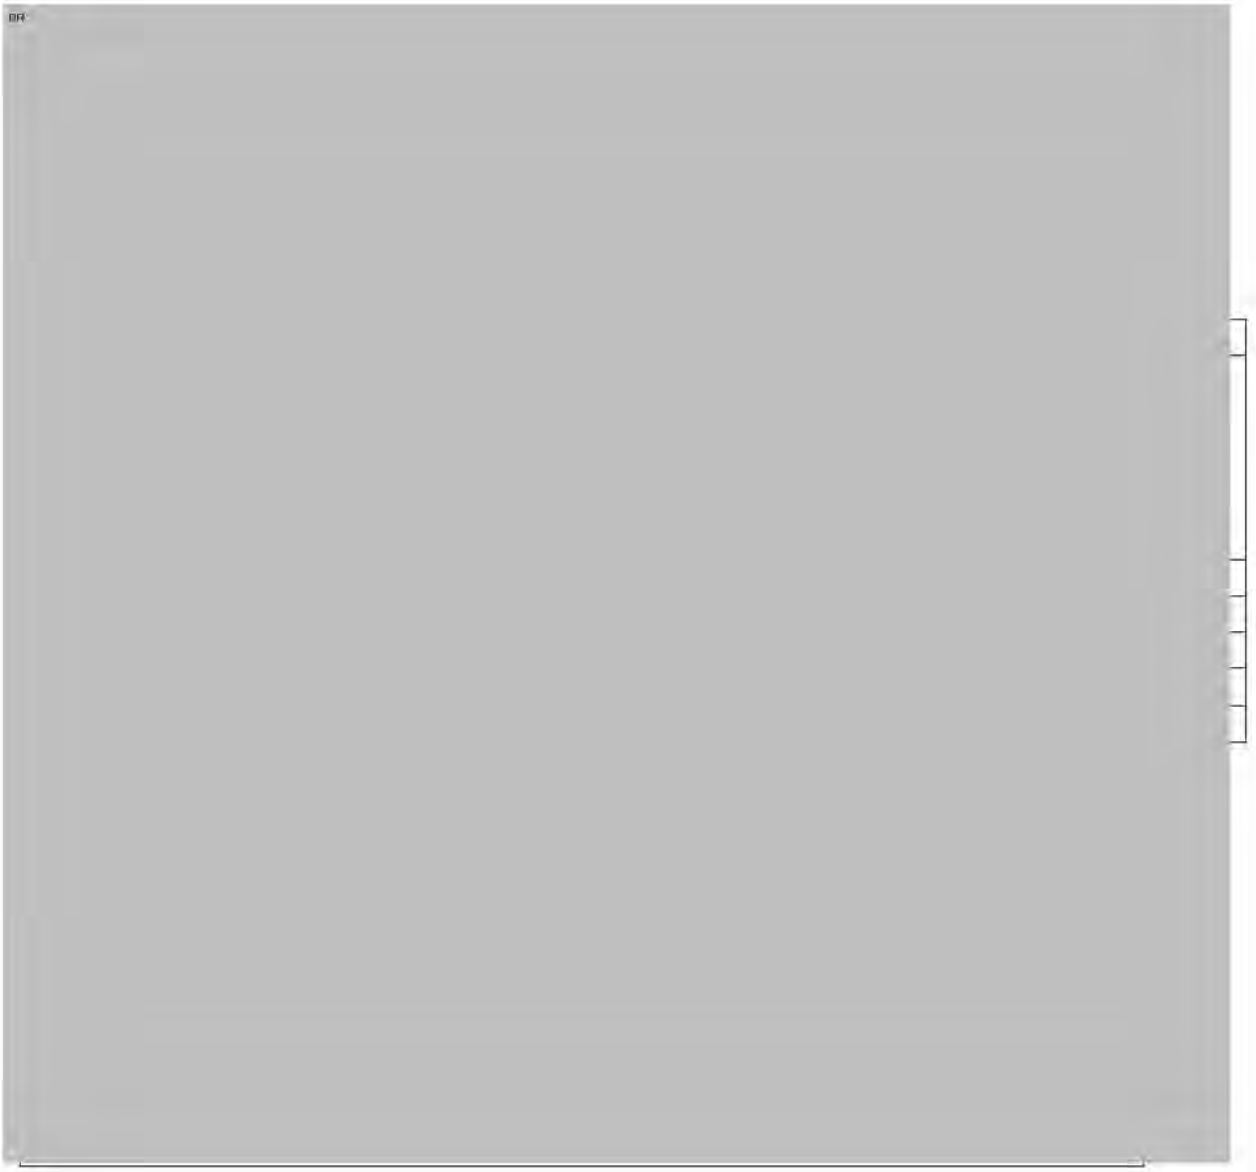

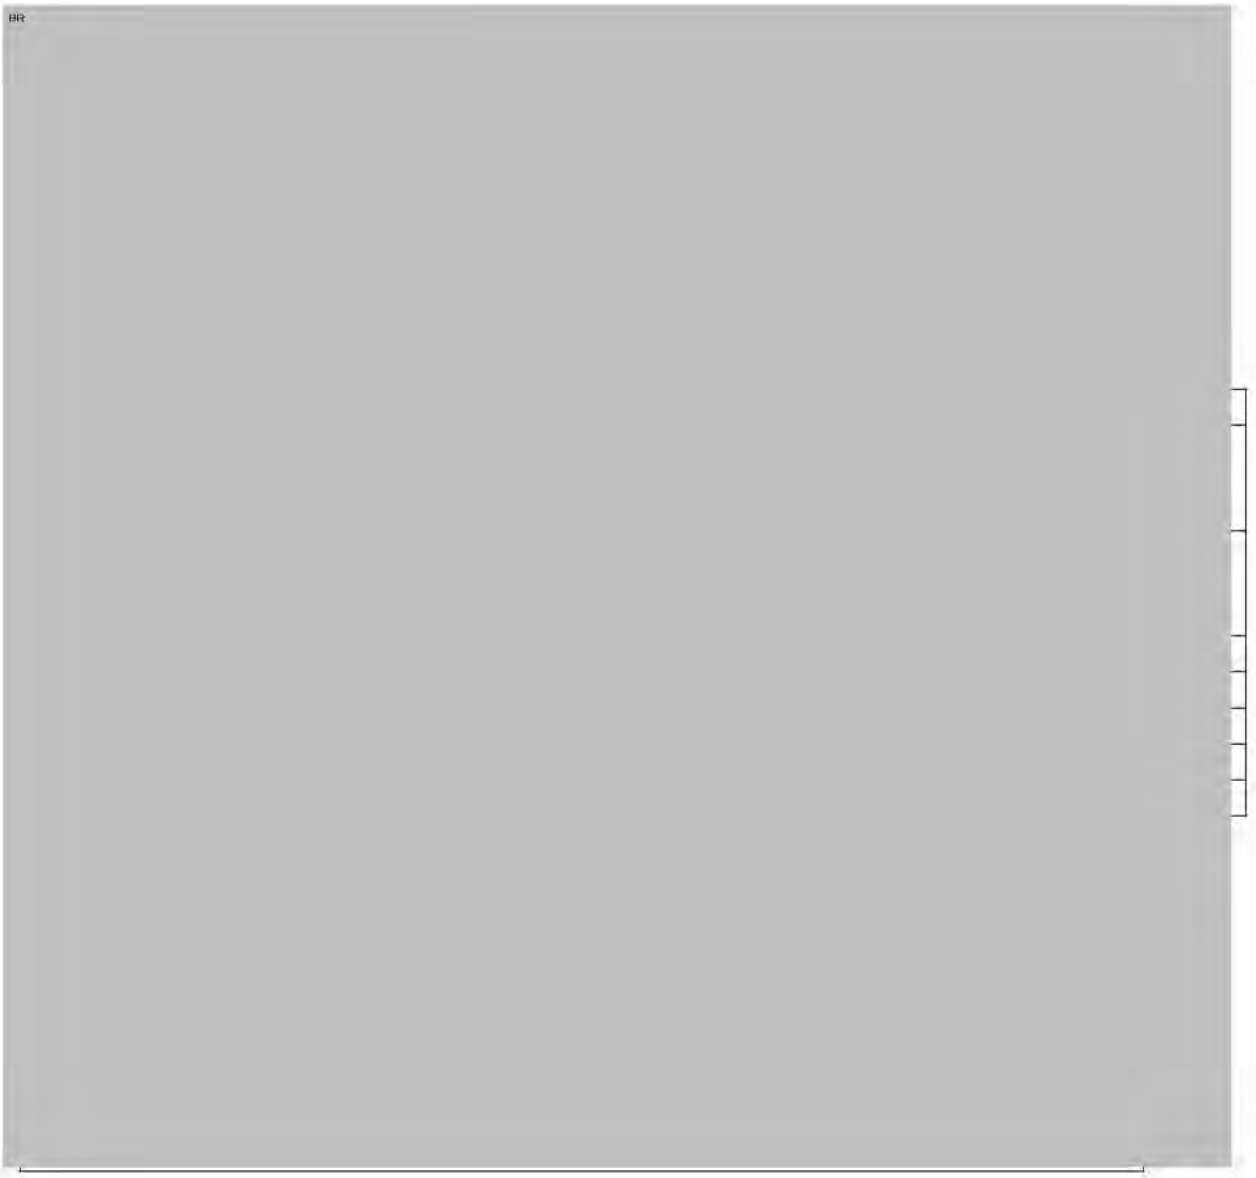

# 5 Projectbeheersing

## 5.1 Scope

### 5.1.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| Afronden projectmutaties 29 en 33 inzake het asfalteren van het fietspad langs de Jan Thijssenweg voor respectievelijk de gemeente Rijswijk en gemeente Den Haag. | Nog geen definitieve akkoorden voor de projectmutaties 29 en 33. Na de afsplitsing van het project Tweede Watertoevoer per 1 juli 2021, worden deze verder afgehandeld door het nieuwe projectteam. |

Via een scopemutatie procedure is besloten dat het project Tweede watertoevoer per 1 juli 2021 wordt 'losgeknipt' van het project Rotterdamsebaan en als een zelfstandig project verder gaat.

Tabel: Afname budget Rotterdamsebaan

| | | € | € | € |
|---|---|---|---|---|
| **Beschikbaar budget RoBa 30-06-2021** | | | | **594.597.191** |
| | | | | |
| **Afsplitsen scope:** | | | | |
| Tweede toevoer Molenvlietpark onderdeel Hoogheemraadschap Delfland | | 5.450.000 | | |
| Tweede toevoer Molenvlietpark onderdeel oeverbescherming Prov. Zuid-Holland | | 529.302 | | |
| Tweede toevoer Molenvlietpark onderdeel gemeente Den Haag | | 2.920.698 | | |
| **Totaal afname budget Rotterdamsebaan** | | | | **8.900.000** |
| **Resteert beschikbaar budget RoBa 30-09-2021** | | | | **585.697.191** |

### 5.2.1 Budget

Tabel : Overzicht toegezegde budget Rotterdamsebaan, Euro's prijspeil 2020 (excl. BTW)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 0 | 5.450.000 | -5.450.000 | 0 | 0 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |

3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland
De bijdrage van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn bestemd voor de werkzaamheden voor het project Tweede watertoevoer. Het budget is overgeheveld naar het genoemde project.

3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland
De bijdrage van de Provincie Zuid-Holland zijn bestemd voor het project Tweede watertoevoer. Het budget is overgeheveld naar het genoemde project.

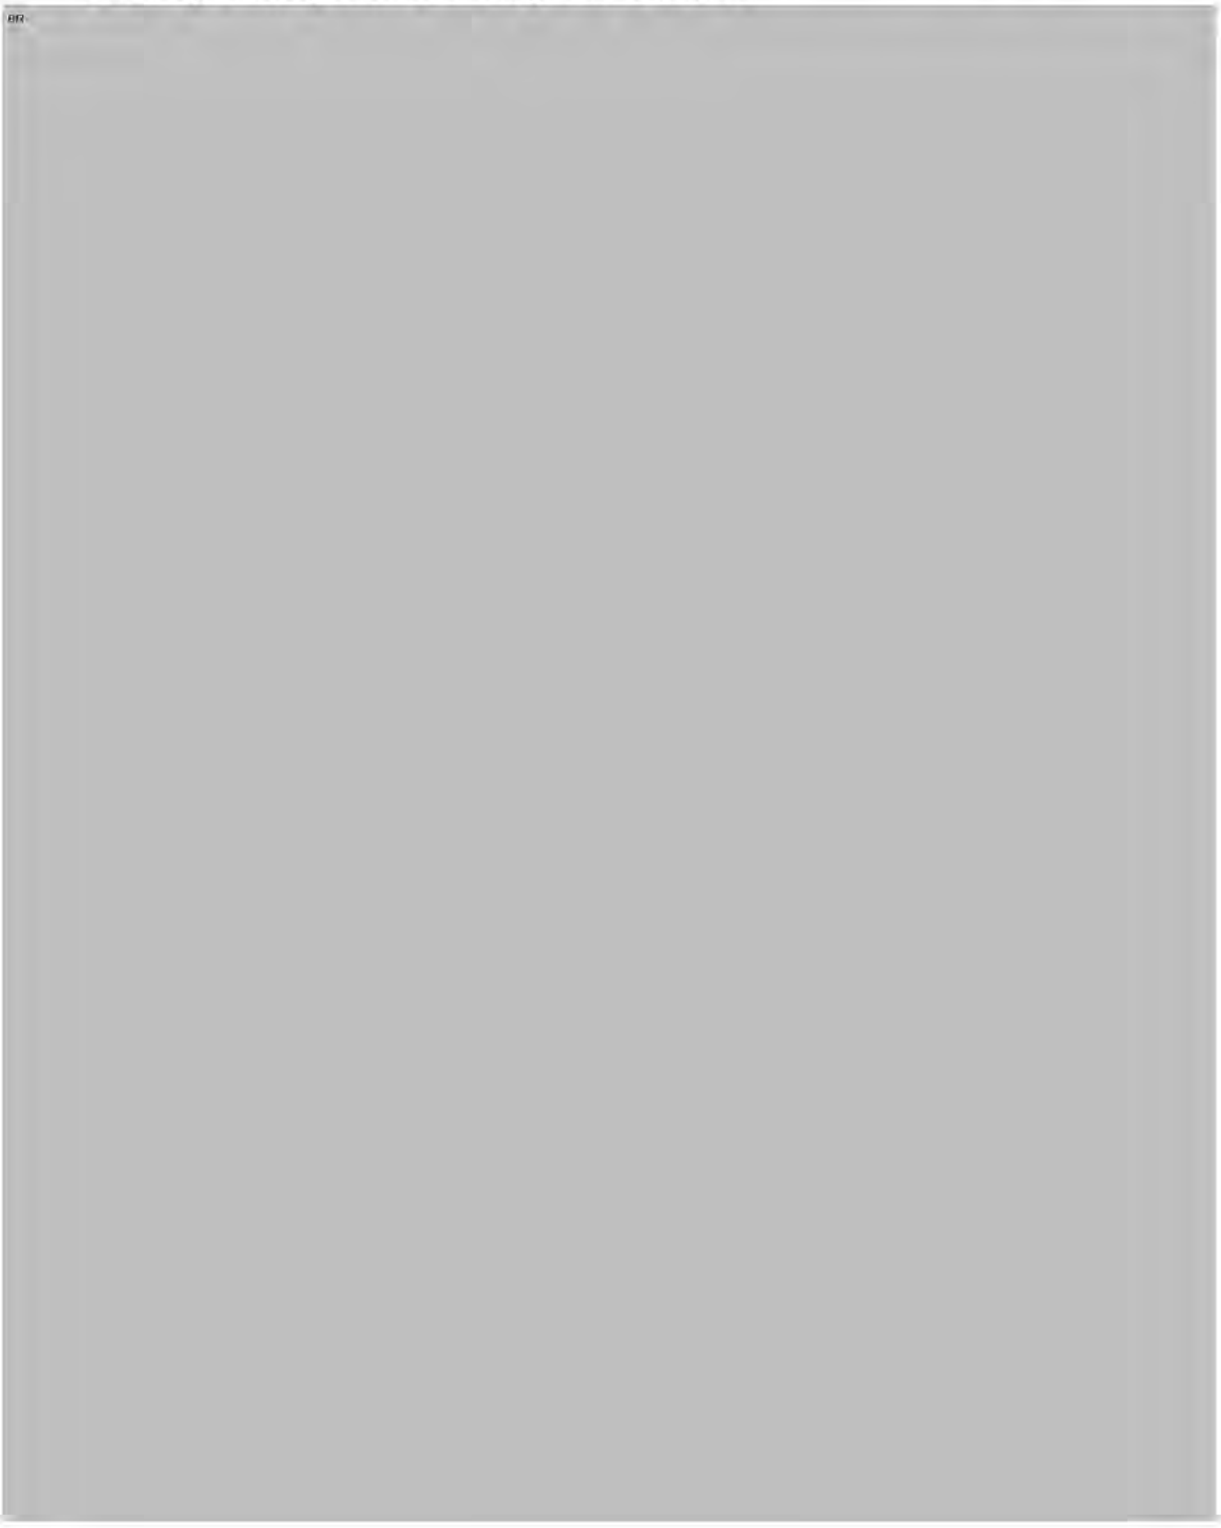

BR

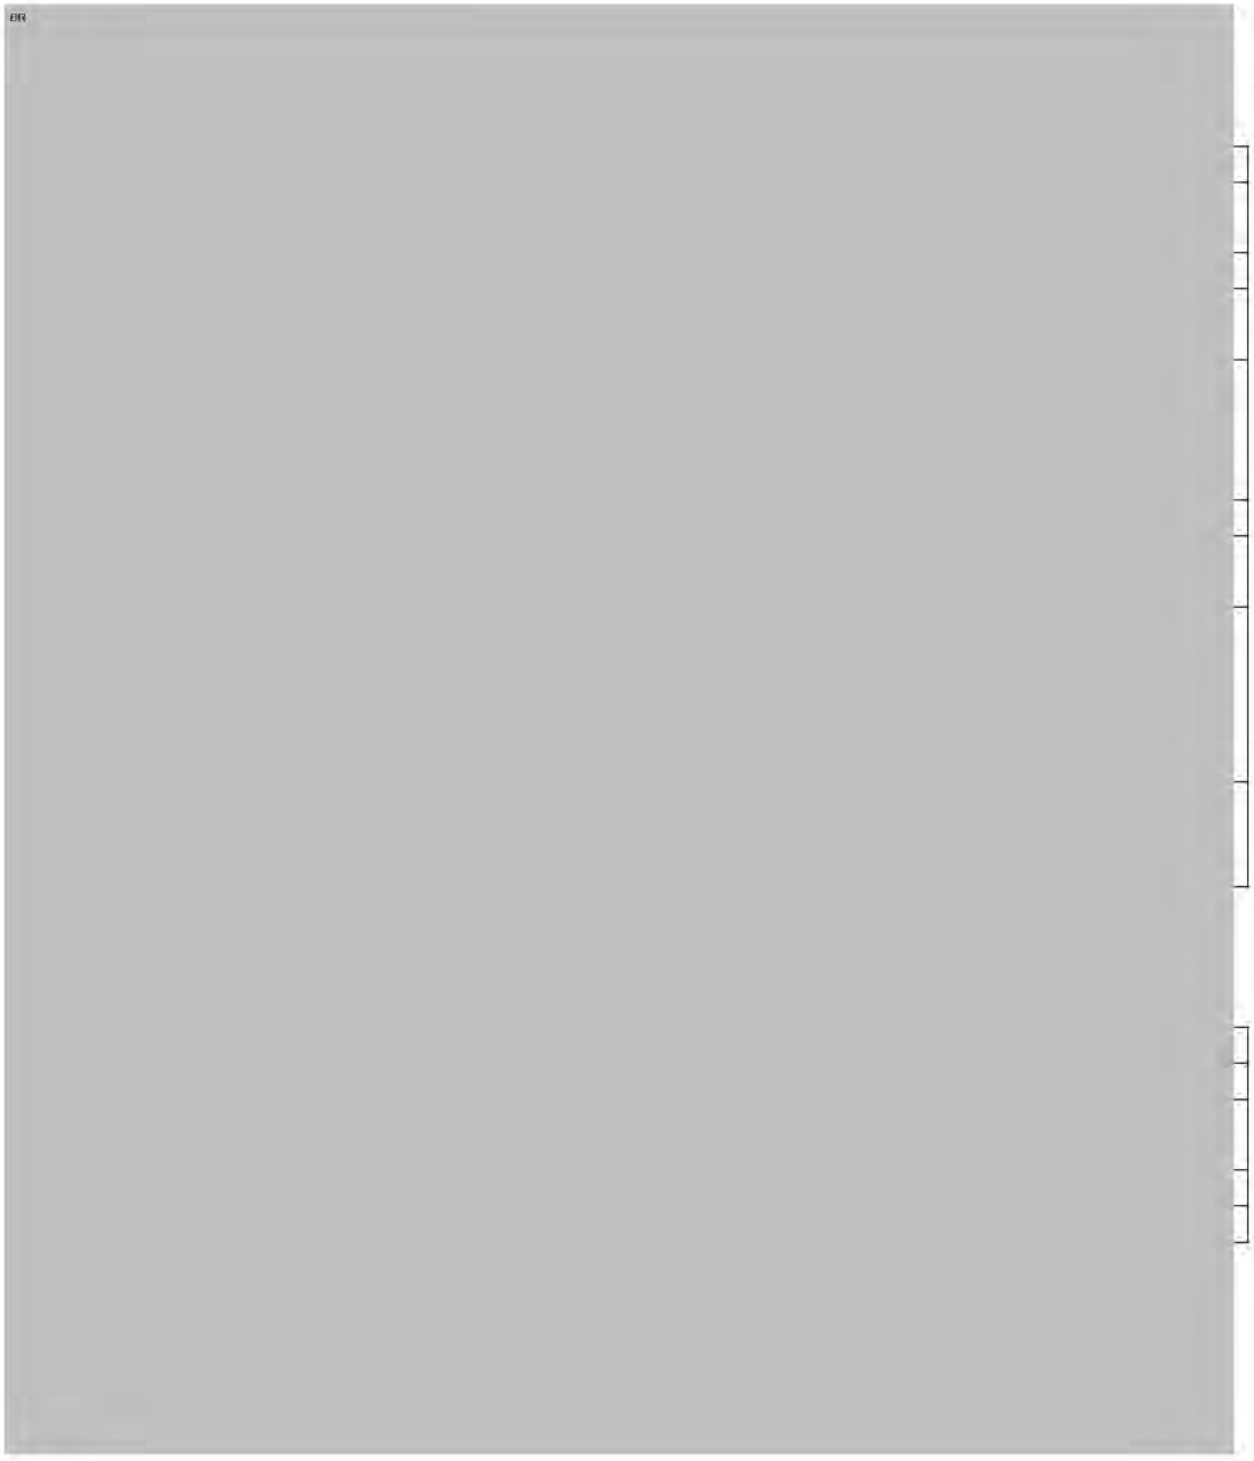

# 6 Bijlage: Planningsmijlpalen

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM WERKELIJK BEHAALD | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 5-jun-20 | 30 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie (incl. consolidatieperiode) vertraagd. Het planten van de laatste groenvoorzieningen heeft in het najaar '20 plaats gevonden. |
| BR | | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

Docnr32

Docnr32

Docnr32



Docnr33

Den Haag

# Voortgangsrapportage

## 4e kwartaal 2021

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 14 januari 2022**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 1.0**

Docnr33

Docnr33



Titel document: Voortgangsrapportage Rotterdamsebaan
Ondertitel doc: 4e kwartaal 2021
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-005064

| **Opgesteld:** | **Gecontroleerd** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>10 januari 2022 | Versie 0.1<br>13 januari 2022 | Versie 1.0<br>14 januari 2022 | Versie 1.0<br>18 februari 2022 | Versie 1.0<br>24 februari 2022 |
| 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Rotterdamsebaan | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. A. Mulder, wethouder / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr33



# Inhoudsopgave


1 Managementsamenvatting 5

2 Omgevingsmanagement & Communicatie 8

*2.1 Omgevingsmanagement* *8*
2.1.1 Afgelopen kwartaal 8
2.1.2 Komende kwartaal 8

*2.2 Planologie en Vergunningen* *9*
2.2.1 Afgelopen kwartaal 9
2.2.2 Komende kwartaal 9

*2.3 Overeenkomsten en Verwervingen* *10*
2.3.1 Afgelopen kwartaal 10
2.3.2 Komende kwartaal 11

*2.4 Communicatie* *12*
2.4.1 Afgelopen kwartaal 12
2.4.2 Diversen 12
2.4.3 Komende kwartaal 12

3 Projectvoortgang 13

*3.1 Kunstprojecten* *13*
3.1.1 Afgelopen kwartaal 13
3.1.2 Komende kwartaal 13

*3.2 Inpassing Binckhorst* *14*
3.2.1 Afgelopen kwartaal 14
3.2.2 Komende kwartaal 14

*3.3 Inpassing Vlietzoom* *15*
3.3.1 Afgelopen kwartaal 15
3.3.2 Komende kwartaal 15

*3.4 Inpassing Laan van Hoornwijck* *16*
3.4.1 Afgelopen kwartaal 16
3.4.2 Komende kwartaal 16

*3.5 Installaties* *17*
3.5.1 Afgelopen kwartaal 17
3.5.2 Komende kwartaal 17

*3.6 Uitvoeringskwaliteit* *18*
3.6.1 Afgelopen kwartaal 18
3.6.2 Komende kwartaal 18

*3.7 Contractmanagement* *19*
3.7.1 Afgelopen kwartaal 19
3.7.2 Komende kwartaal 19

4 Overdracht en openstelling 20

*4.1 Overdracht aan beheerders* *20*
4.1.1 Afgelopen kwartaal 20
4.1.2 Komende kwartaal 20

Docnr33



*4.2 Beheer en onderhoud* *21*
4.2.1 Afgelopen kwartaal 21
4.2.2 Komende kwartaal 21

**5 Projectbeheersing** **22**

*5.1 Scope* *22*
5.1.1 Afgelopen kwartaal 22
5.1.2 Komende kwartaal 22

*5.2 Financiën* *23*
5.2.1 Kostenstructuur 23
5.2.1 Budget 24

*5.3 Informatiebeheer* *27*
5.3.1 Afgelopen kwartaal 27
5.3.2 Komende kwartaal 27
5.3.3 Kennisdeling 27

*5.4 Organisatie* *28*
5.4.1 Afgelopen kwartaal 28
5.4.2 Komende kwartaal 28

**6 Bijlage: Gerealiseerde planningsmijlpalen** **29**

**7 Bijlage: Grip op grote projecten Rotterdamsebaan** **30**

Docnr33

# 1 Managementsamenvatting

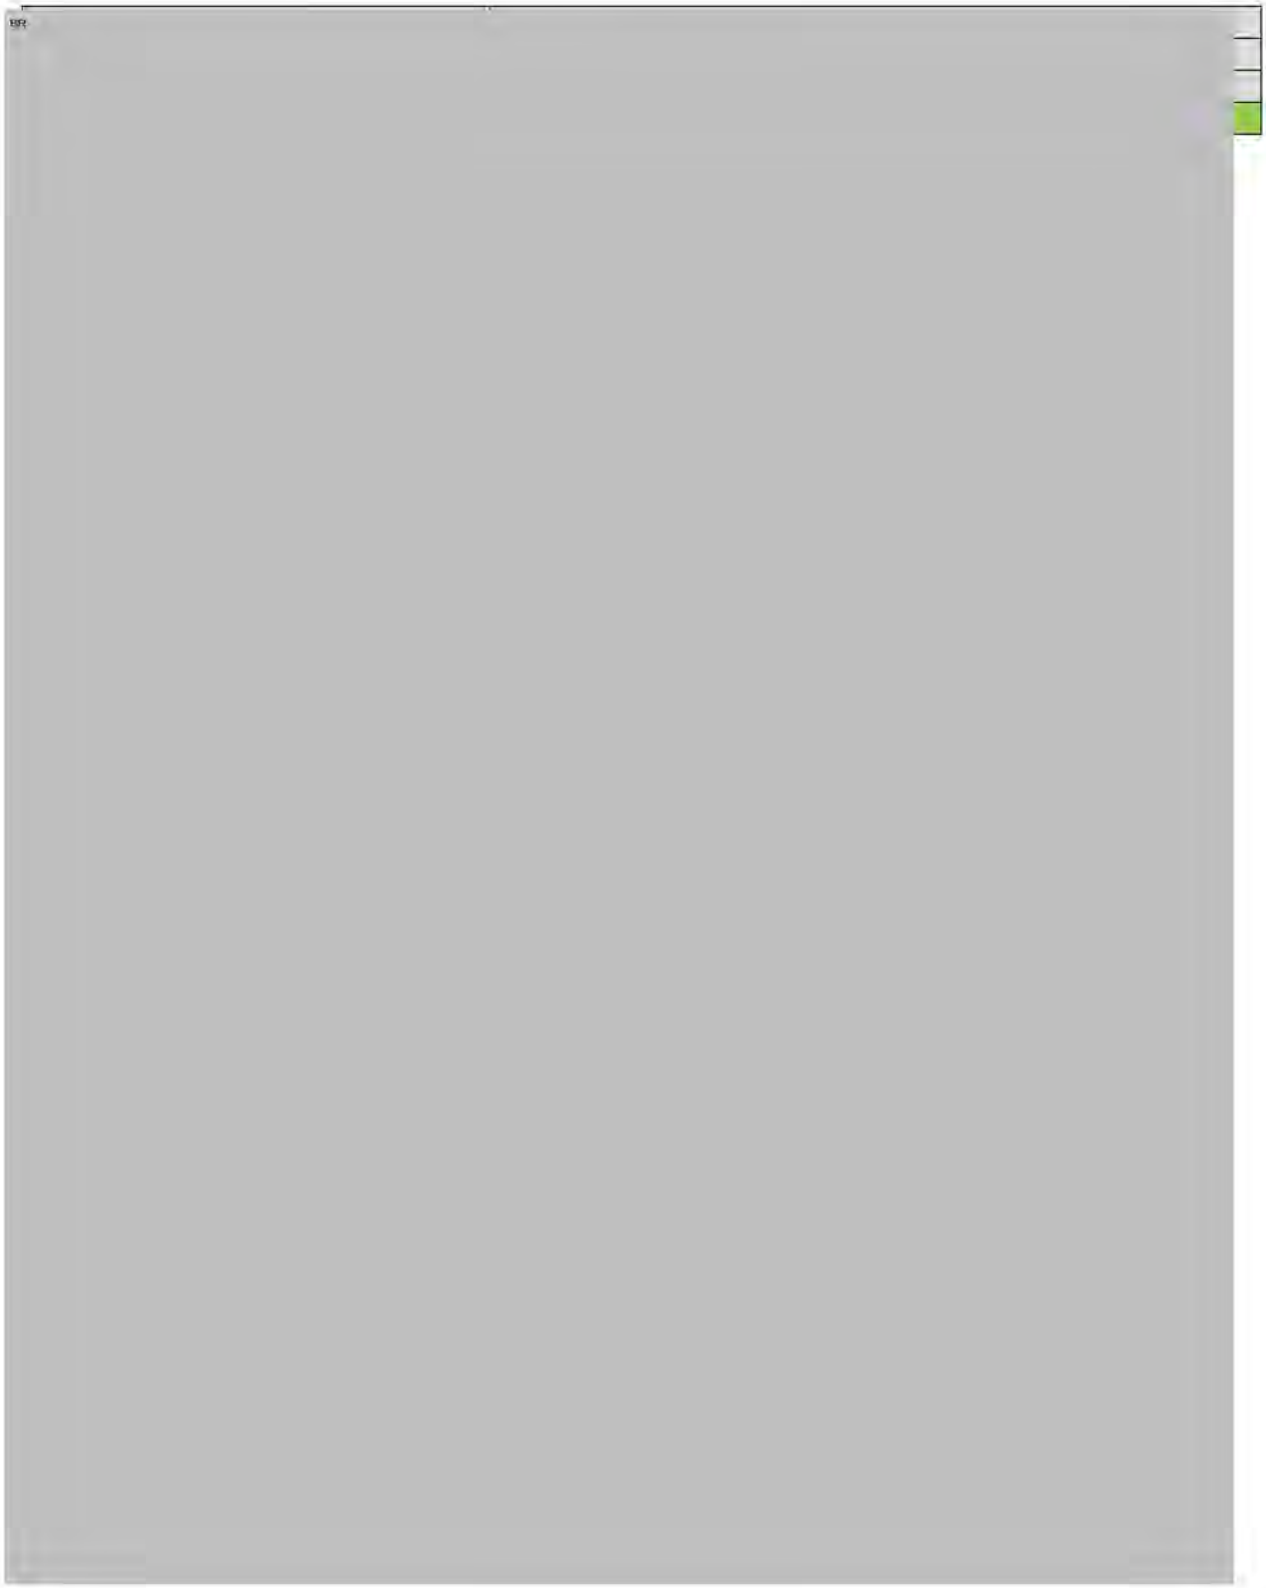

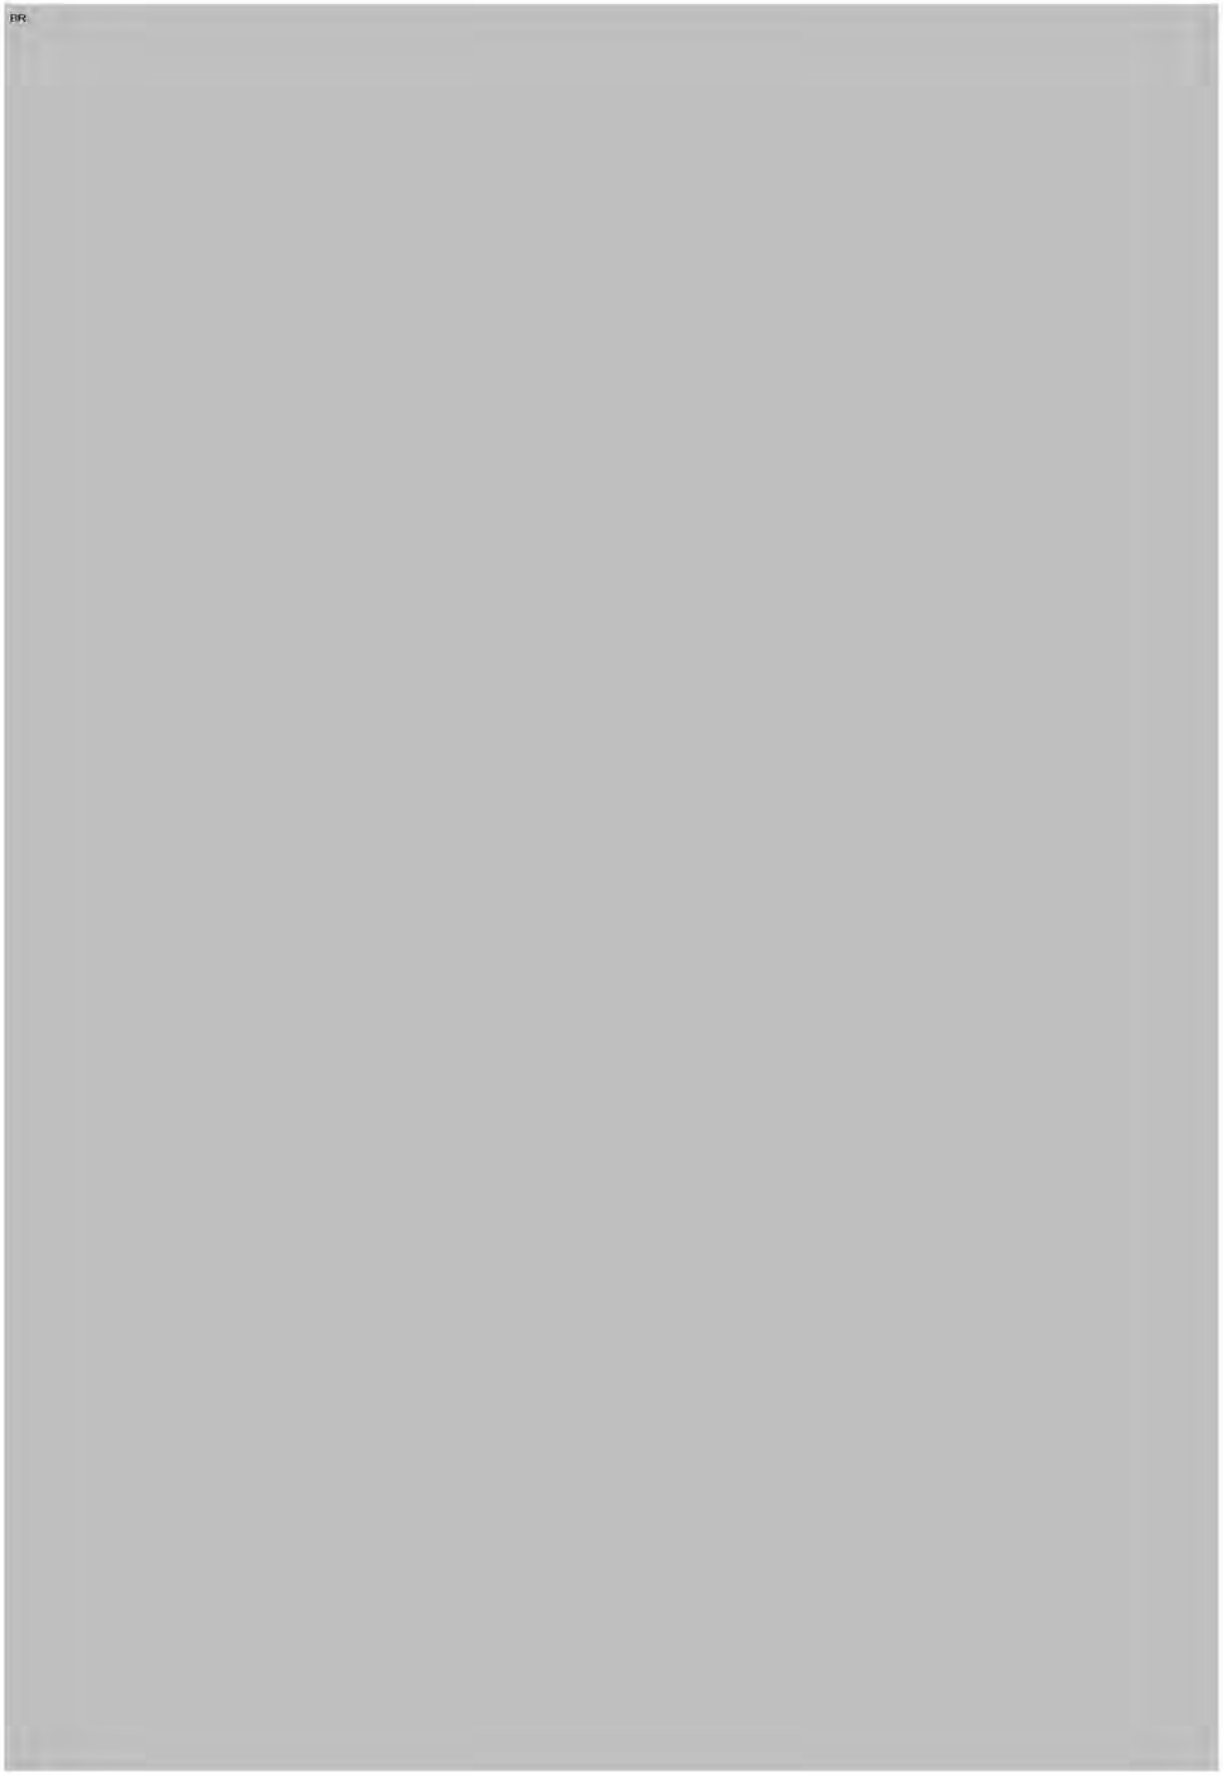

BR

# 2 Omgevingsmanagement & Communicatie

BR

## 2.3 Overeenkomsten en Verwervingen

### 2.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| [redacted] | |
| Vestigen van een zakelijk recht en erfdienstbaarheden voor de objecten van het Hoogheemraadschap van Delfland rondom de waterberging in het Molenvlietpark (bijv. aflaatconstructie en duikers, opstalplaats mobiele pompen). | De tekeningen met de exacte locatie/grenzen zijn door Den Haag opgesteld waarna het Hoogheemraadschap deze heeft beoordeeld en geaccordeerd.<br>Momenteel is de notaris de concept akte aan het opstellen. Nadat gemeente en Hoogheemraadschap de concept akte goed bevonden hebben, zal deze bij de notaris passeren. |

| | |
|---|---|
| | Deze in het jaar 2022 doorlopende werkzaamheden zijn via scopemutatie 39 voor de verdere afwikkeling overgedragen aan DSO/Grondzaken (zie ook het hoofdstuk Scope verderop in deze rapportage). |

BR

# 3 Projectvoortgang

BR

## 3.3 Inpassing Vlietzoom

### 3.3.1 Afgelopen kwartaal

| Verwachting uit vorige rapportage | Situatie aan het eind van het kwartaal |
|---|---|
| In overleg met de speelbeheerder van het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg en de leverancier kijken naar de mogelijkheden om de stabiliteit van het trekpontje in het Molenvlietpark te verbeteren. | In overleg met de speelbeheerder en de leverancier van het trekpontje is besloten om een nieuw stabieler pontje te bestellen. De speelbeheerder zal dit in 2022 oppakken, de kosten worden door het project Rotterdamsebaan gedragen. |
| **Overige/extra verrichte werkzaamheden** | |
| Geen. | |
| | |
| **Geplande besluiten** | **Genomen besluiten** |
| Geen. | Geen. |

### 3.3.2 Komende kwartaal

Niet van toepassing. Dit is de laatste zelfstandige voortgangsrapportage over het project.

BR

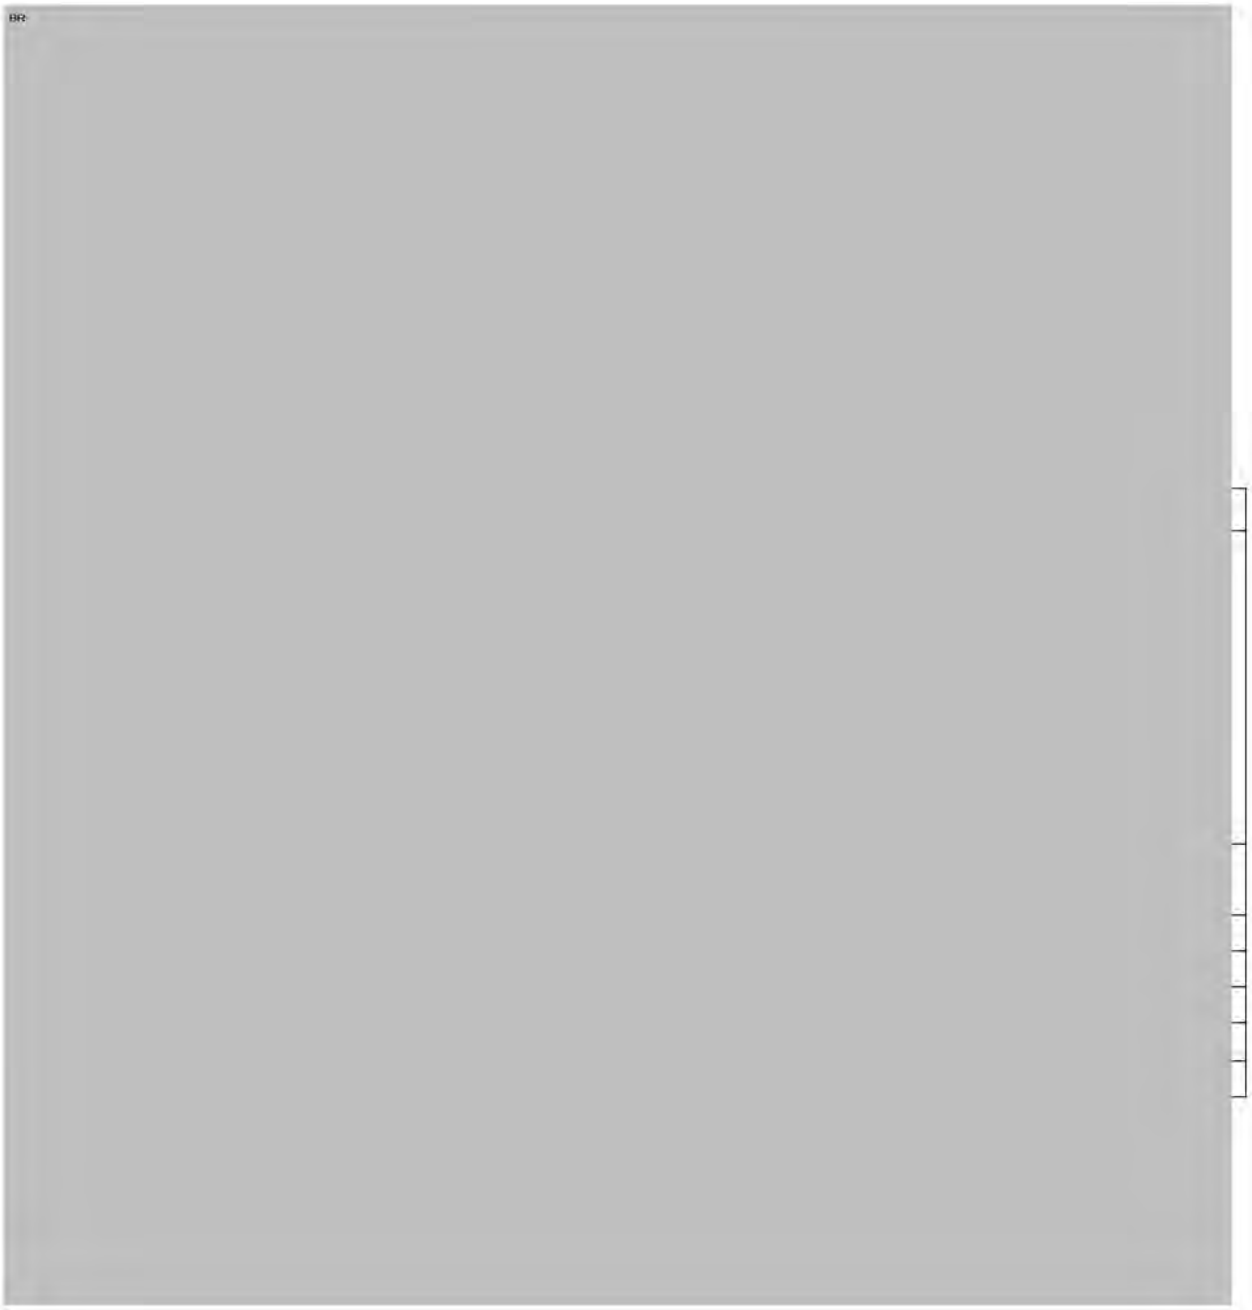
BR

BR

# 4 Overdracht en openstelling

BR

Docnr33



# 5 Projectbeheersing

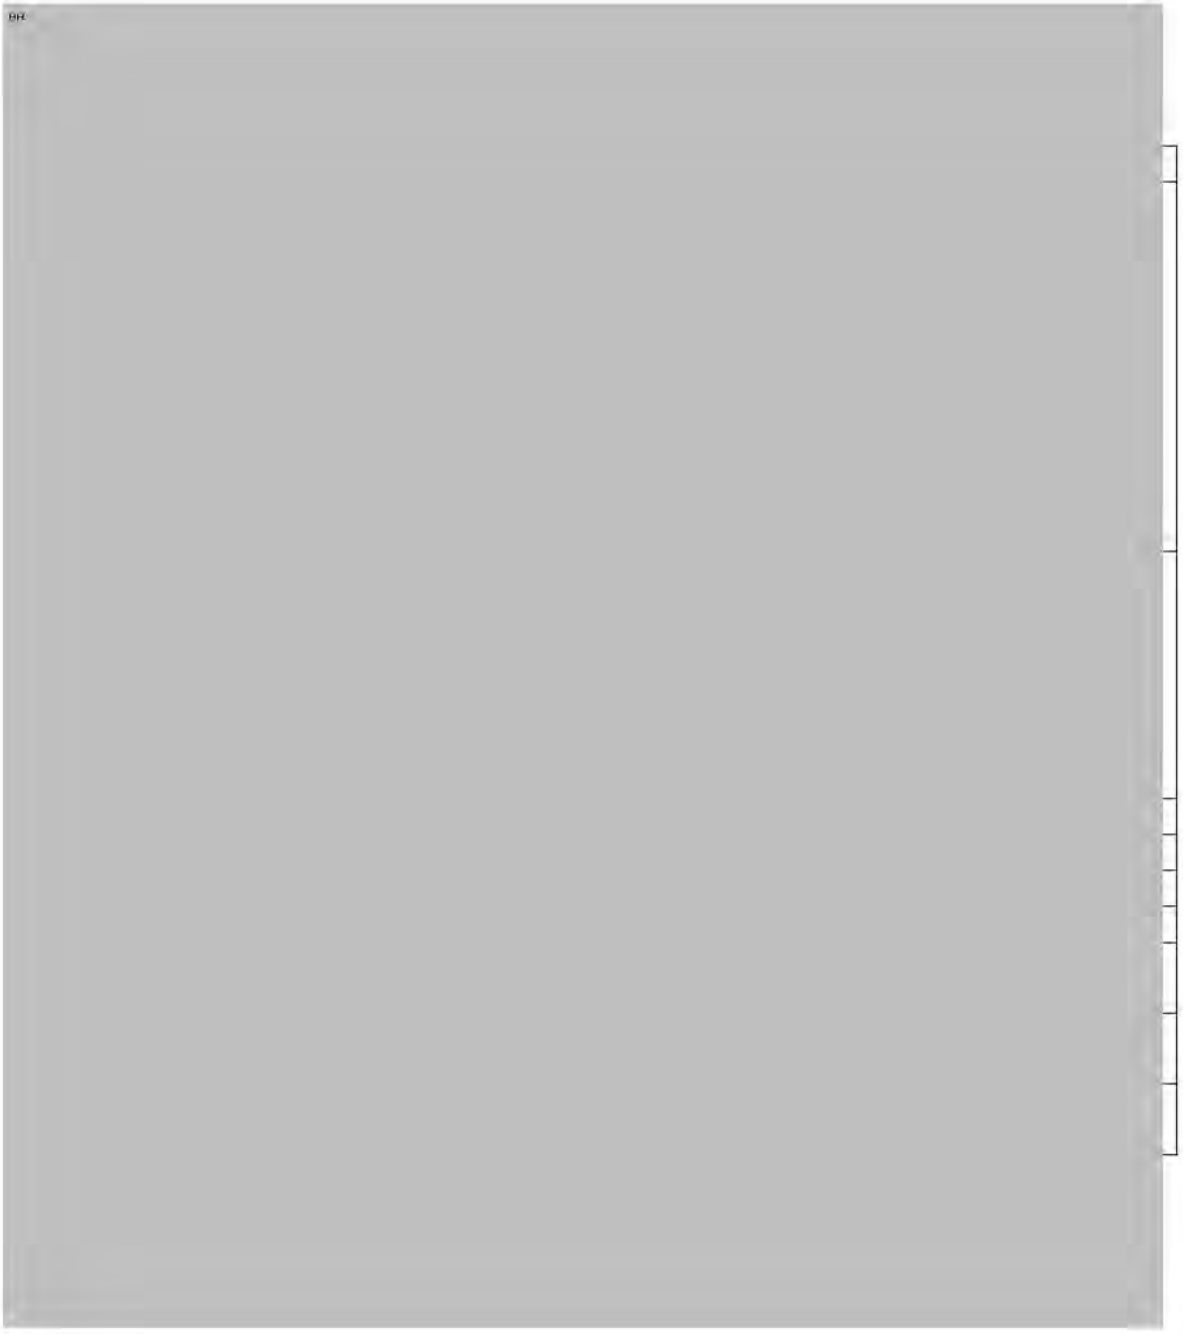

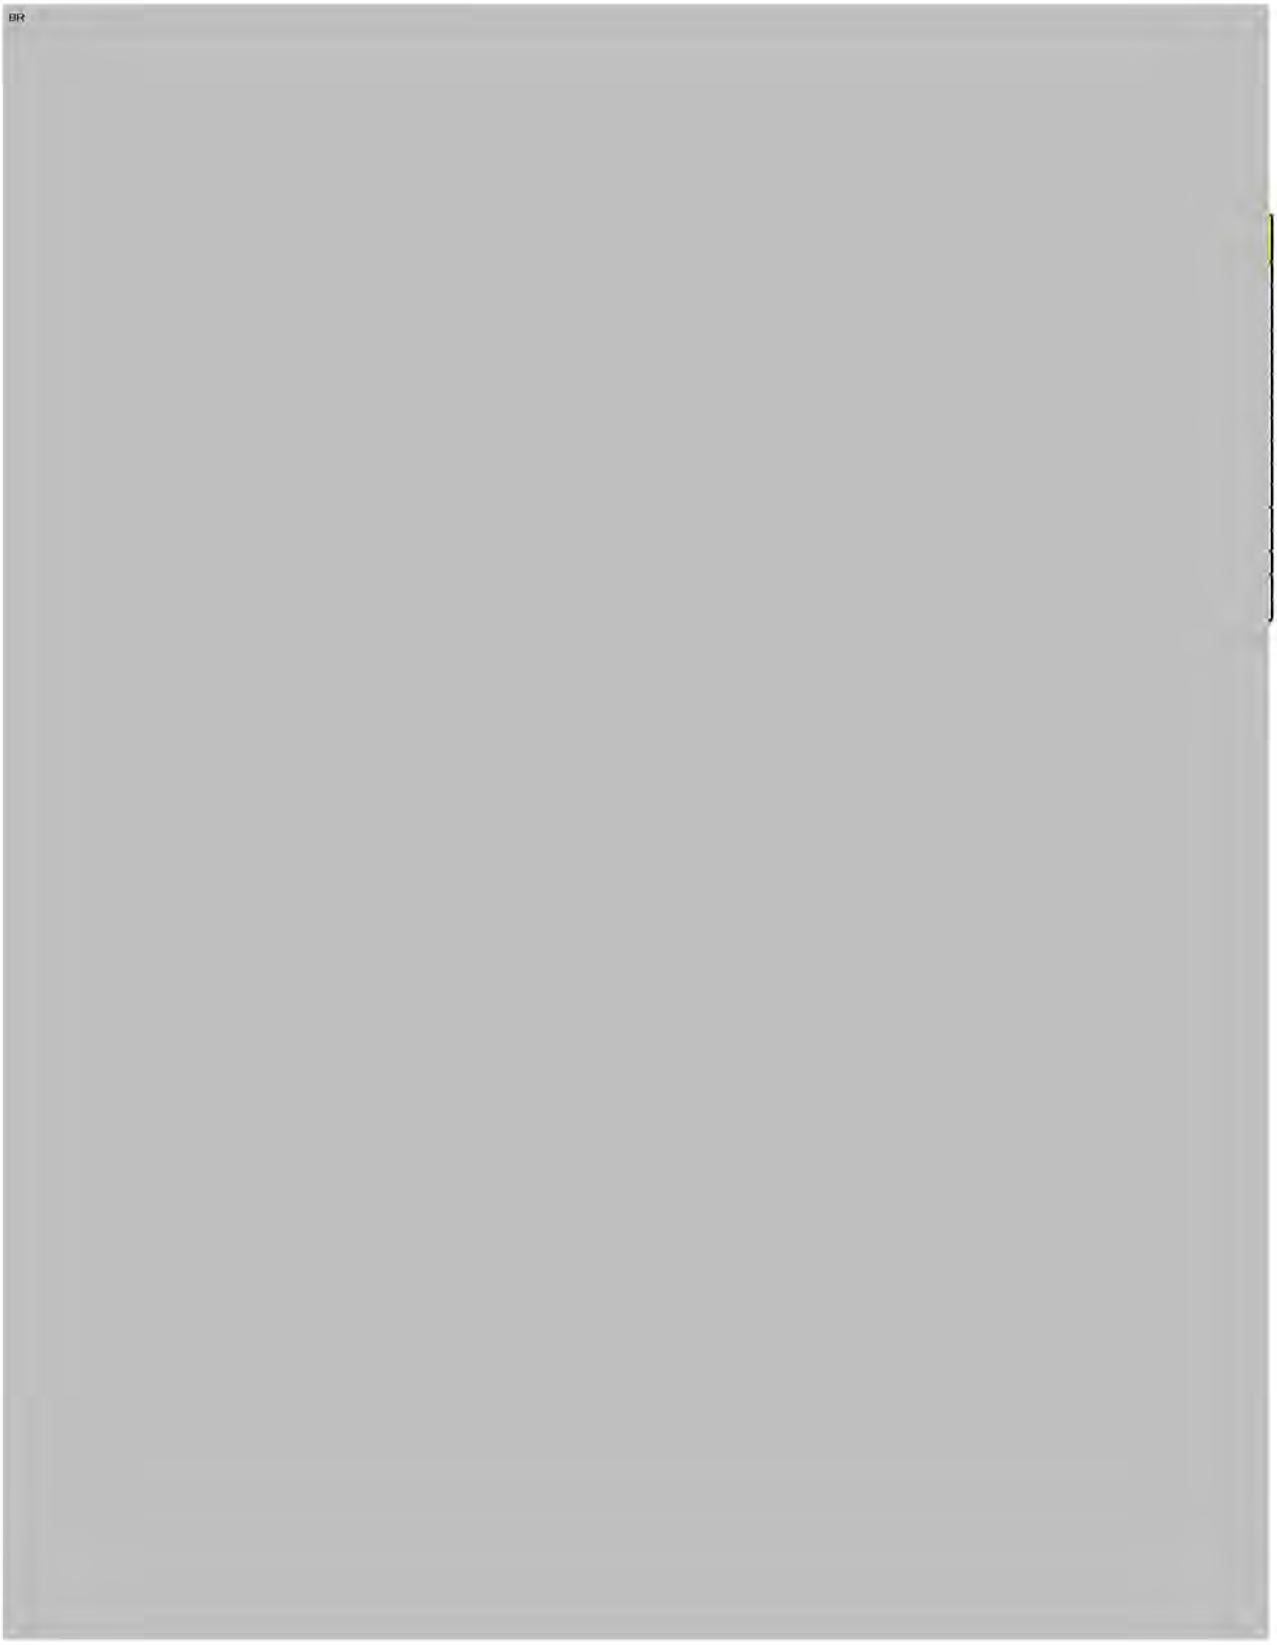

### 5.2.1 Budget

Tabel : Overzicht toegezegde budget Rotterdamsebaan, Euro's prijspeil 2021 (excl. BTW)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 500.000 | 500.000 | 0 | 400.000 | 100.000 |

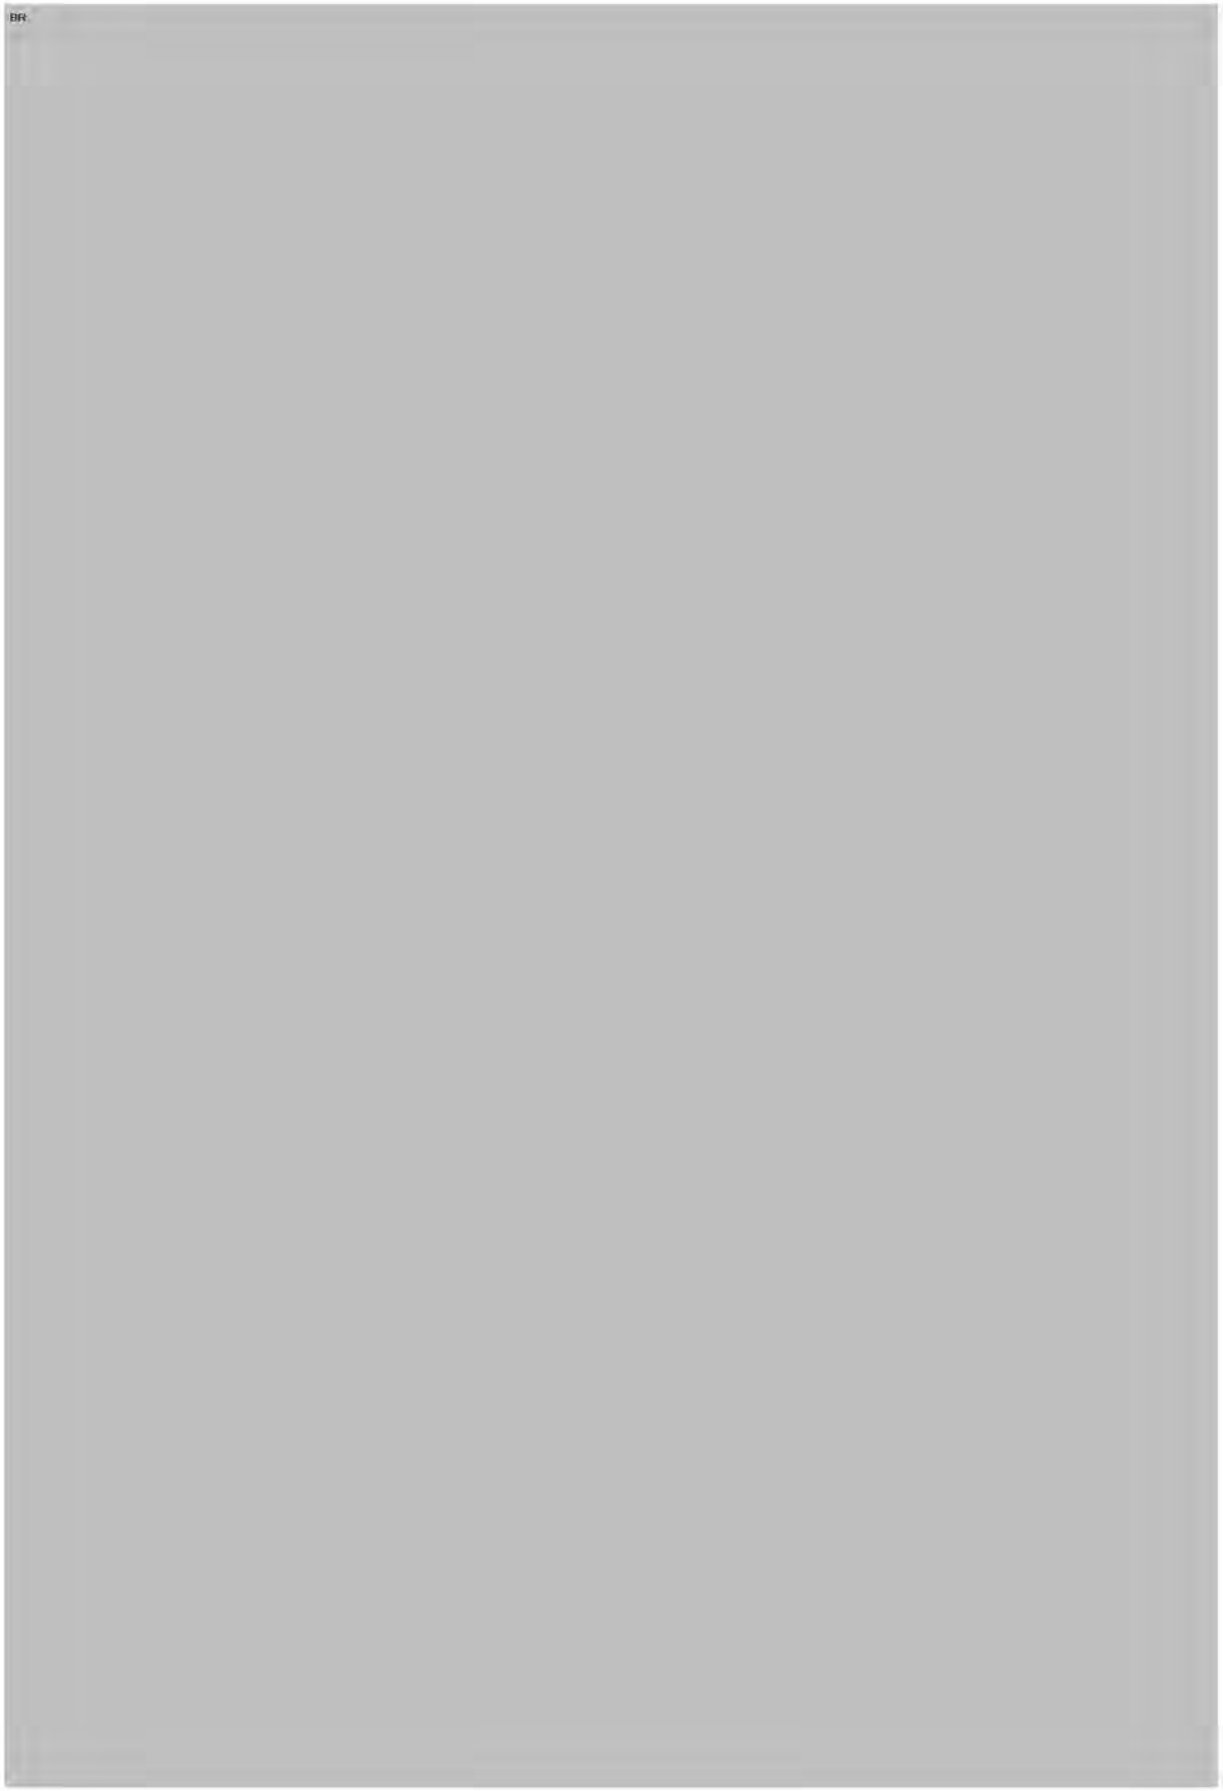
BR

Projectmutaties:

In het eerste kwartaal 2022 worden er een aantal resterende werkzaamheden/risico's met bijbehorend budget overgedragen aan de gemeentelijke lijn organisatie ter voorbereiding van het finaal afsluiten van het project. Per 31 maart 2022 worden deze mutaties in de administratie verwerkt.

Tabel: Overzicht nog af te handelen projectmutaties (bedragen kunnen nog worden aangepast):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BR | | | | |
| Archeologie (waar is deze) wandelroute Molenvlietpark | 200.000 | | | |
| BR | | | | |

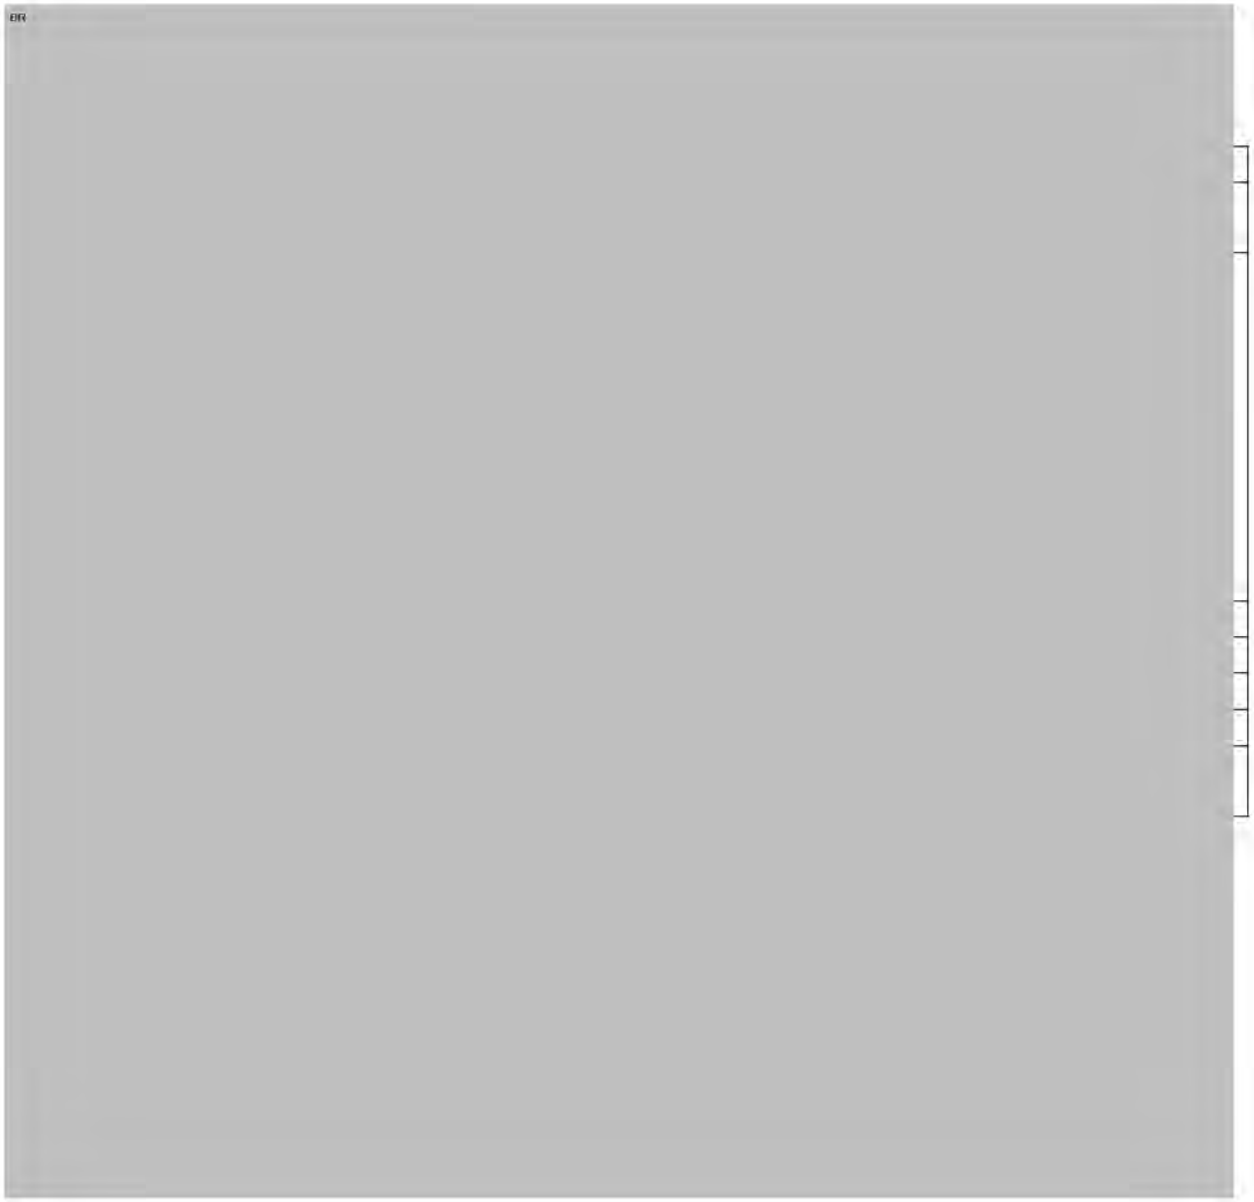

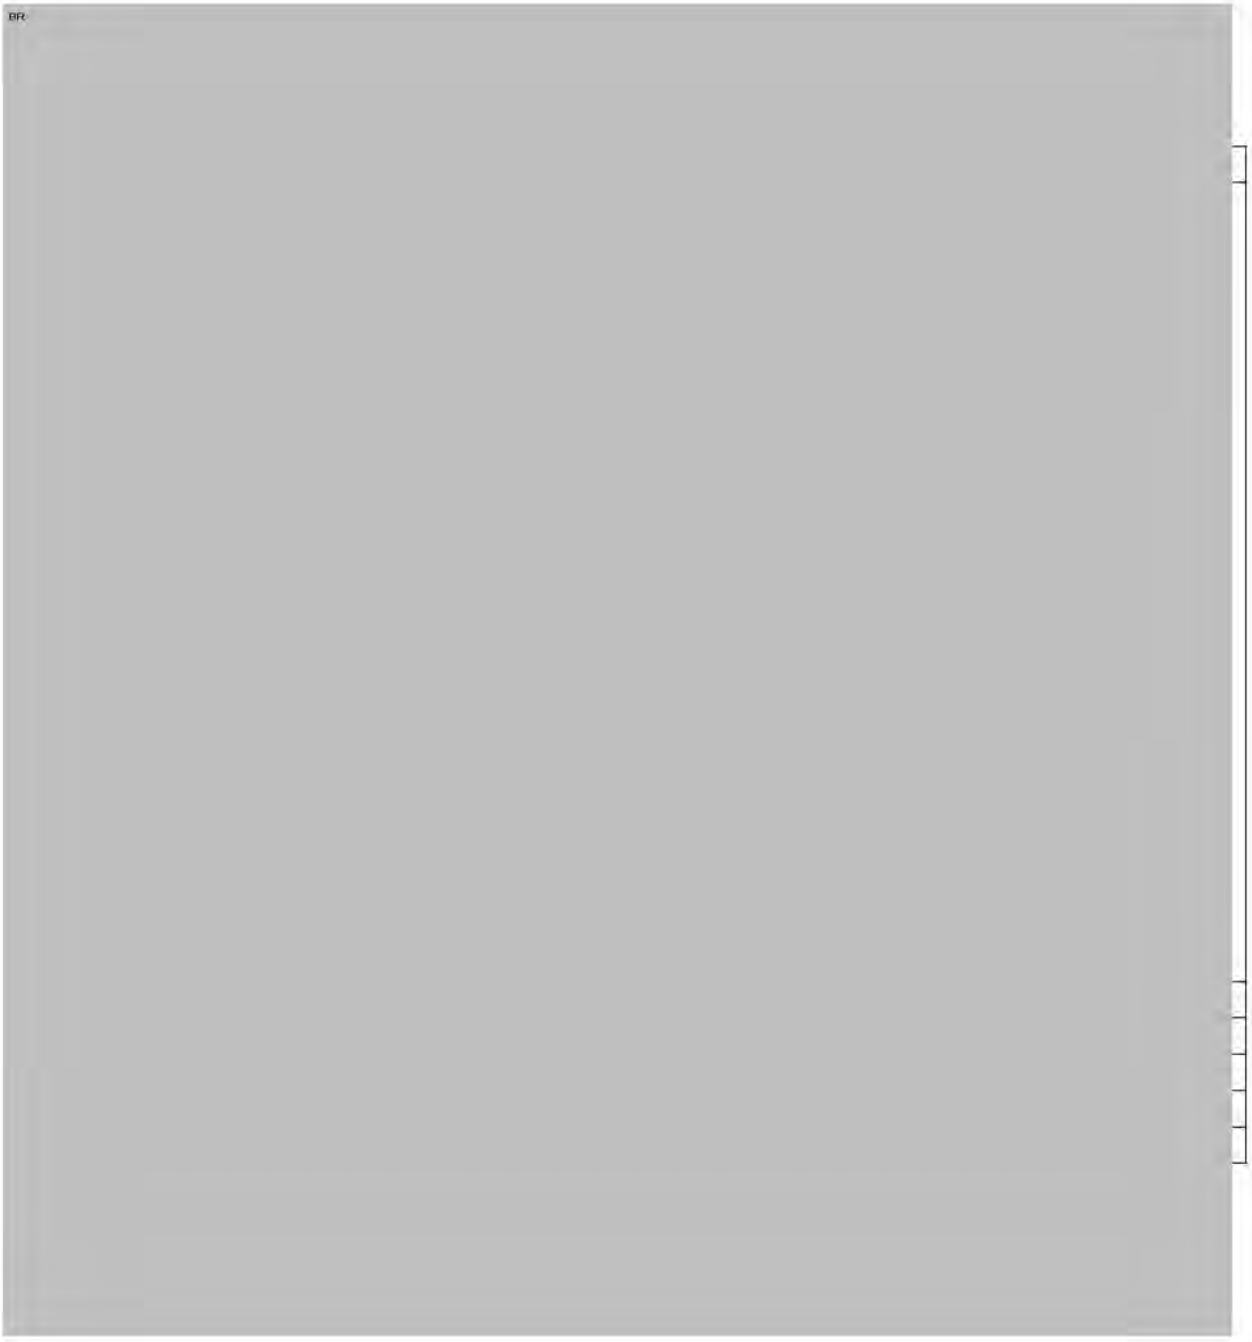

# 6 Bijlage: Gerealiseerde planningsmijlpalen

Tabel: Terugblik behaalde mijlpalen

| NR | OMSCHRIJVING MIJLPAAL | REFERENTIE-DATUM MIJLPAAL | MIJLPAAL-DATUM WERKELIJK BEHAALD | VERSCHIL T.O.V. REFERENTIE-DATUM (weken*) | TOELICHTING |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | | | | | |
| 11 | Molenvlietpark gereed | 11-nov-19 | 5-jun-20 | 30 | Door ontwerpafstemmingen met stakeholders is de realisatie (incl. consolidatieperiode) vertraagd. Het planten van de laatste groenvoorzieningen heeft in het najaar '20 plaats gevonden. |
| BR | | | | | |

**Locatieaanduiding van de planningsmijlpalen uitvoering binnen het projectgebied**

Docnr33

Docnr33



Docnr34

Den Haag

# Eindrapportage

# (laatste voortgangsrapportage)

## 1e kwartaal 2022

# Rotterdamsebaan

**Dienst Stadsbeheer**
**Afdeling Opdrachtgeving**
**Datum: 2 mei 2022**
**Vertrouwelijk/Intern**
**Versie 1.0**

Docnr34

Docnr34



Titel document: Laatste voortgangsrapportage Rotterdamsebaan (financieel)
Ondertitel doc: 1e kwartaal 2022
Kenmerk/docnr.: ROBA-RAP-005069

| **Opgesteld:** | **Geautoriseerd:** | **Vastgesteld:** | **Besproken:** |
|---|---|---|---|
| Versie 0.0<br>20 april 2022 | Versie 0.1<br>1 mei 2022 | Versie 1.0<br>2 mei 2022 | Versie 1.0<br>?? juni 2022 |
| 5.1.2.e +<br>5.1.2.e +<br>5.1.2.e | 5.1.2.e<br>Projectdirecteur Rotterdamsebaan / Ambtelijk opdrachtnemer | 5.1.2.e<br>Directeur Stadsbeheer / Ambtelijk opdrachtgever | Dhr. A. Mulder, wethouder / Bestuurlijk opdrachtgever Rotterdamsebaan |

Docnr34



# Inhoudsopgave

**1 Managementsamenvatting** **3**

**2 Financiën** **5**

***2.1 Kostenstructuur*** *5*

***2.2 Budget*** *7*

# 1 Managementsamenvatting

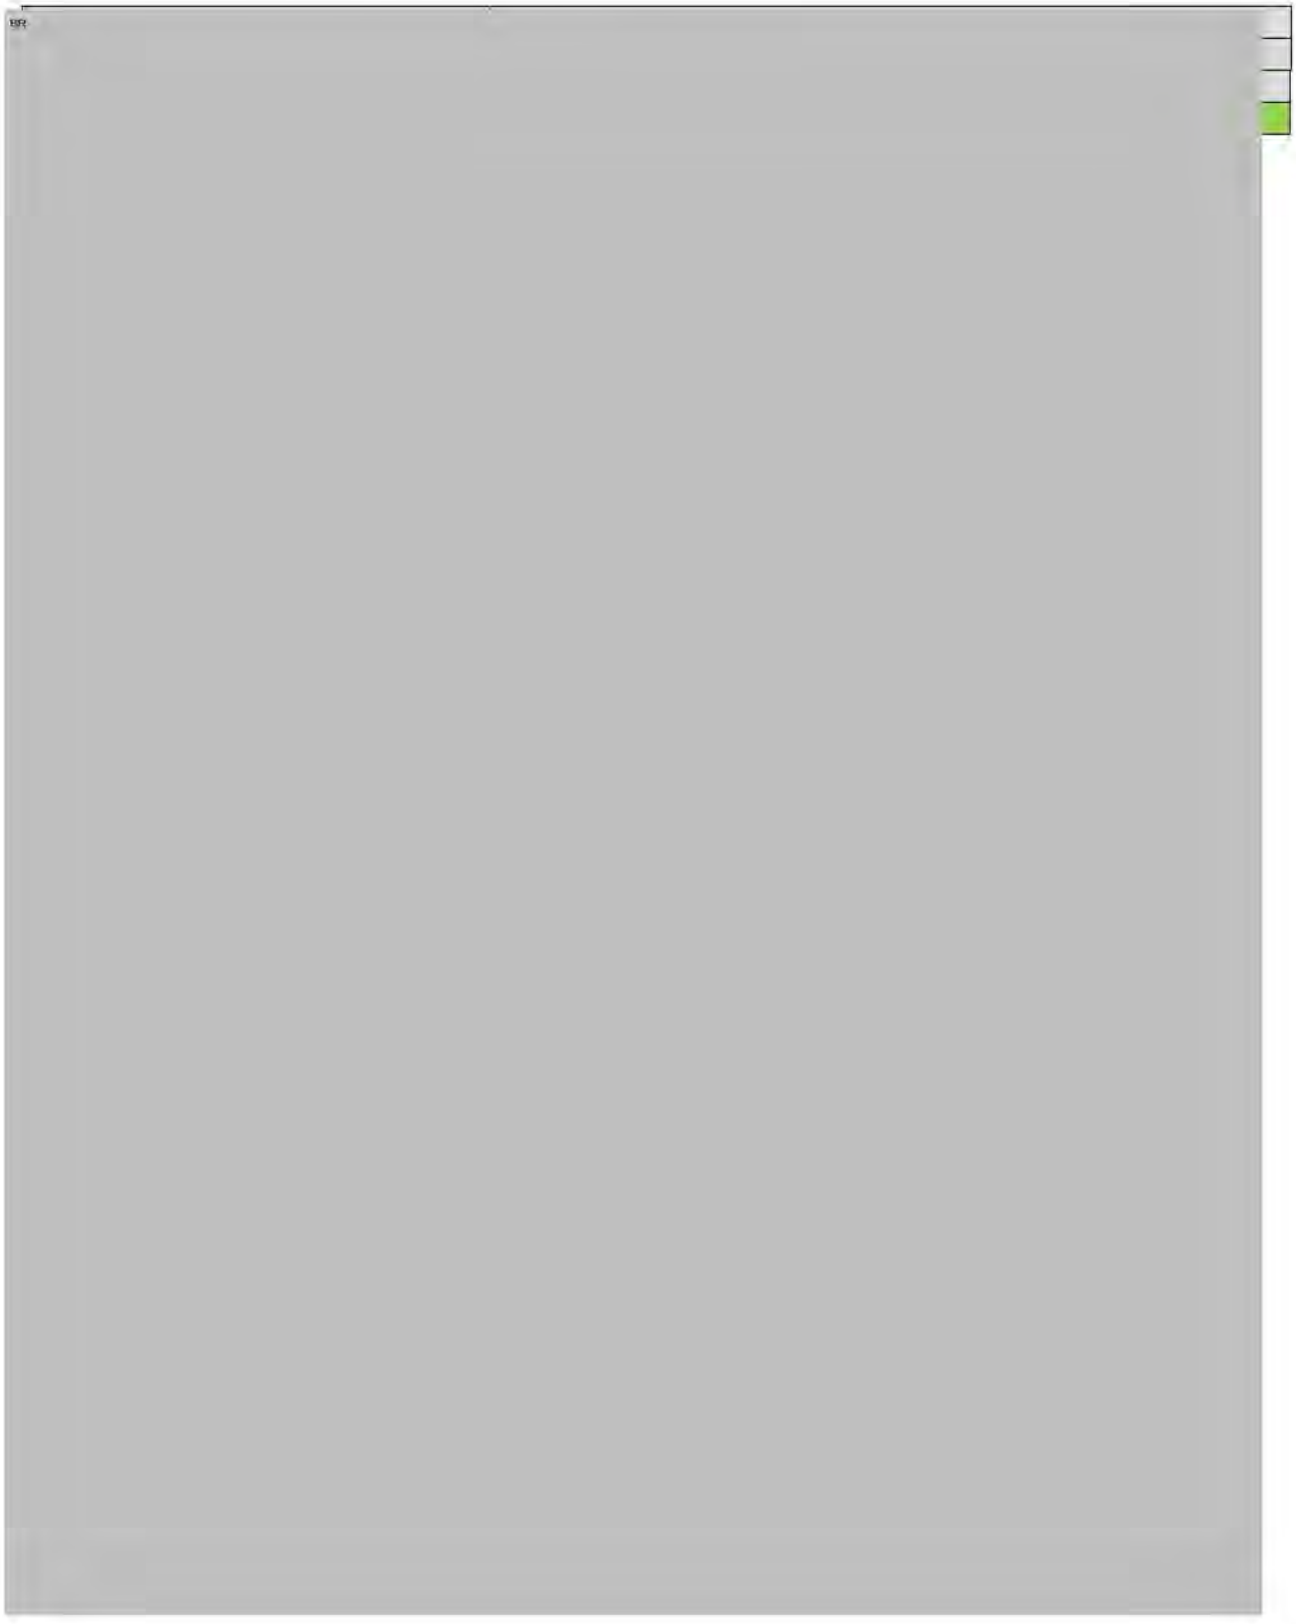

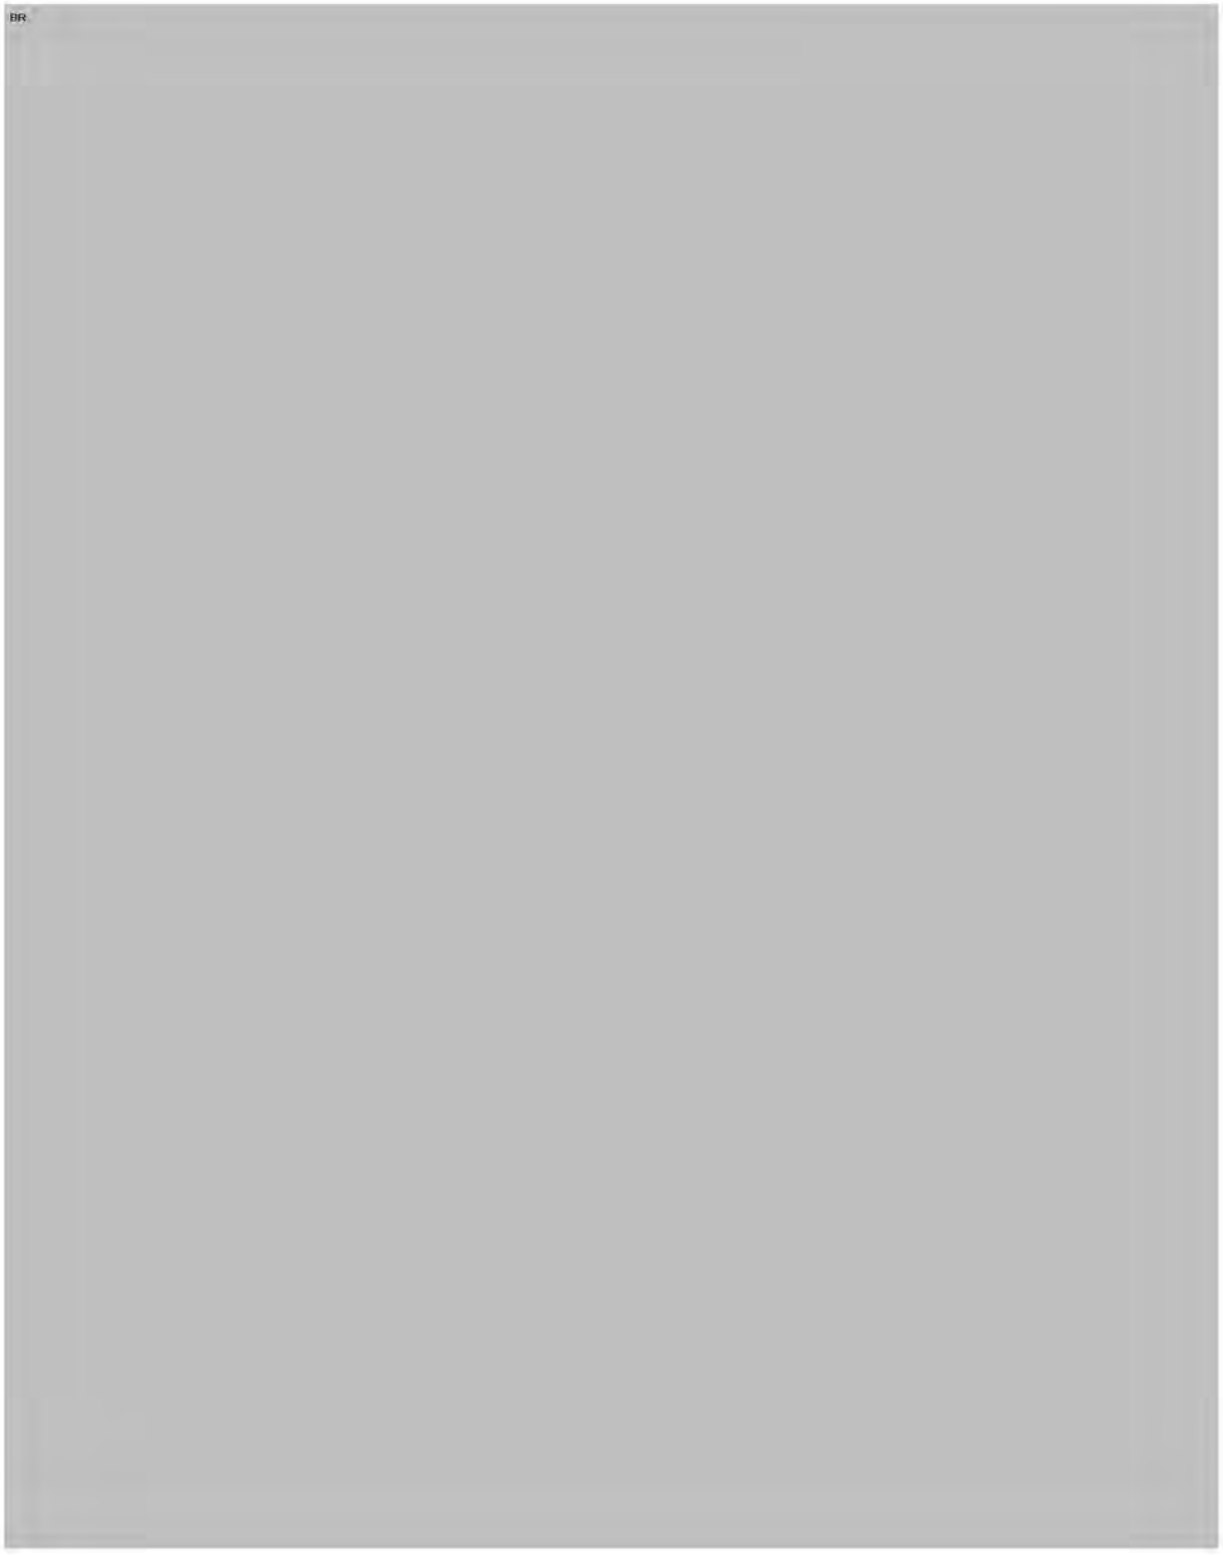
BR

# 2 Financiën

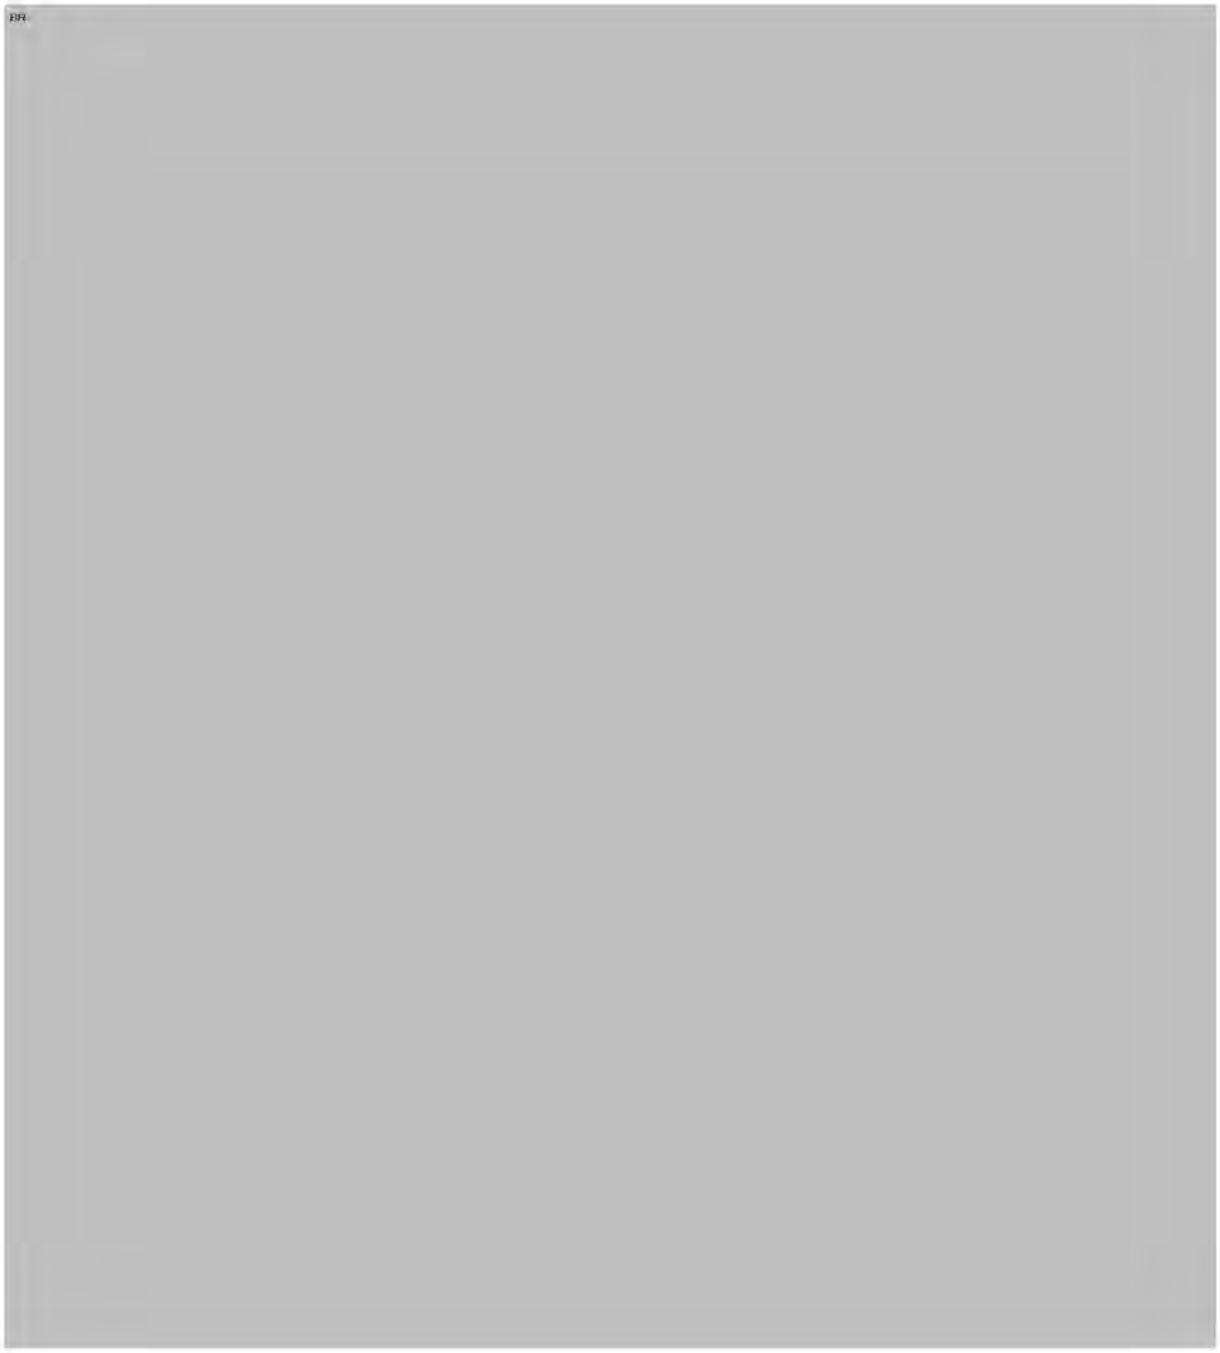

BR

Tabel: Afname budget Rotterdamsebaan

| | | |
|---|---|---|
| **Beschikbaar budget 31-12-2021** | | **543.347.620** |
| BR | | |
| Mutatie 38: Archeologie wandelroute Molenvlietpark | -200.000 | |

BR

## 2.2 Budget

Tabel : Overzicht toegezegde budget Rotterdamsebaan, Euro's prijspeil 2021 (excl. BTW)

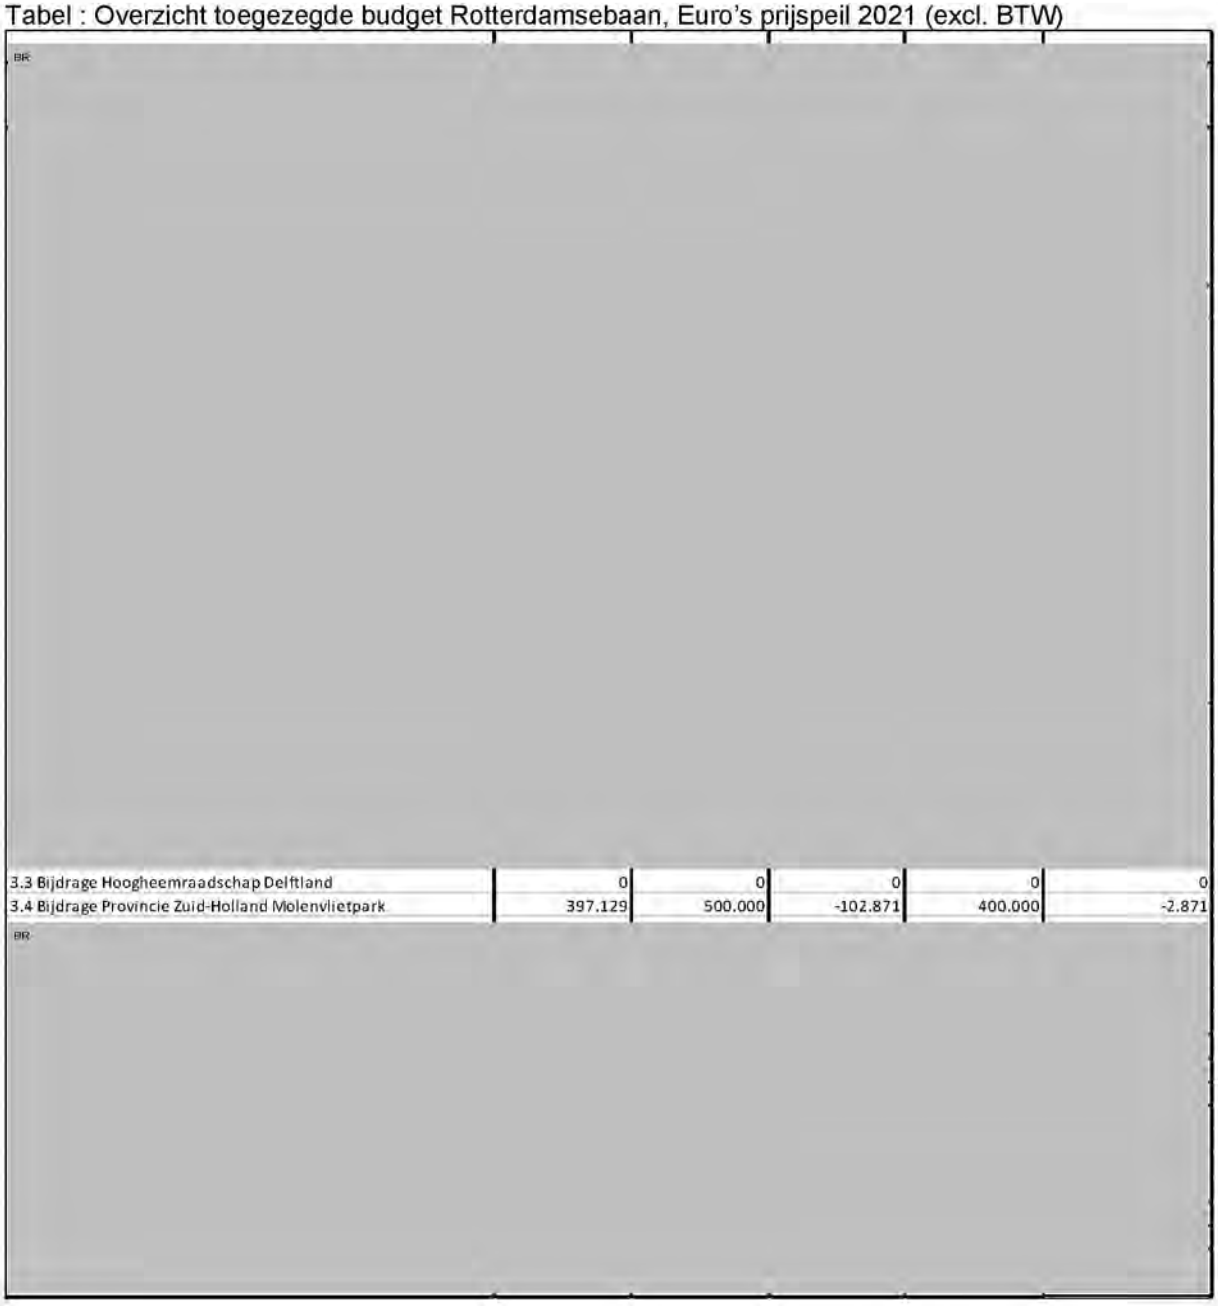

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 Bijdrage Hoogheemraadschap Delfland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Bijdrage Provincie Zuid-Holland Molenvlietpark | 397.129 | 500.000 | -102.871 | 400.000 | -2.871 |

Toelichting op de dekkingsmiddelen:

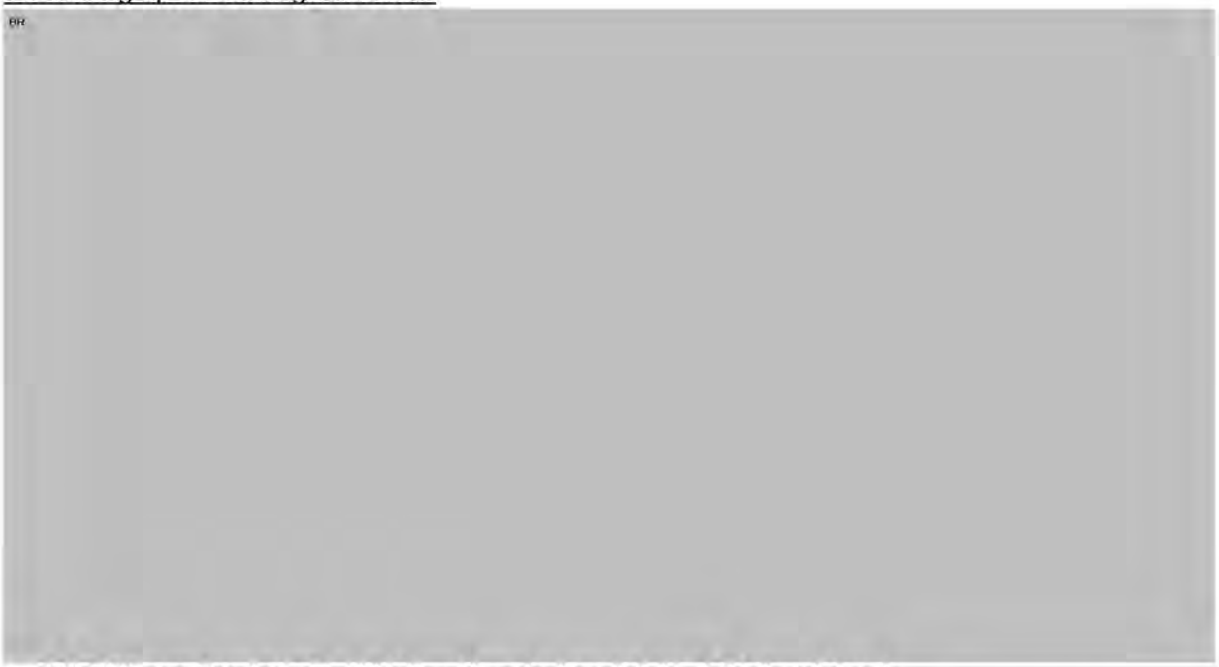

3.3 Bijdrage Provincie Zuid-Holland/Landschapstafel i.r.t. Molenvlietpark

In het eerste kwartaal 2022 is het verzoek tot vaststelling van de subsidie ingediend. Aangezien de werkzaamheden voor een lager bedrag zijn uitgevoerd wordt het plafond van deze subsidie niet gehaald (was € 500.000,--). Het verzoek tot vaststelling is gedaan op een bedrag van € 397.129,--. De lagere bijdrage is in het budget verwerkt. De definitieve vaststelling wordt verwacht in het tweede kwartaal 2022.

Indexatie:
Het overzicht inzake de reeds ontvangen indexatiebedragen van de diverse financiers na het uitvoeringsbesluit is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel: Rotterdamsebaan ontvangen indexatie bijdrage

| Financieerder | 2013 (€) | 2014 (€) | 2015 (€) | 2016 (€) | 2017(€) | 2018(€) | 2019(€) | 2020(€) | 2021(€) | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente Den Haag* | 1.600.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | **7.600.000** |
| MrdH BOR-fonds | 1.993.734 | 383.636 | 285.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.663.334** |
| MrdH Mobiliteitsfonds | 0 | 427.991 | 429.703 | 0 | 0 | 3.153.088 | 2.220.172 | 1.172.042 | 129.833 | **7.532.829** |
| Ministerie van Infra en Milieu | 4.185.593 | 3.103.282 | 996.760 | 497.688 | 3.002.274 | 3.058.311 | 3.137.433 | 1.382.008 | 920.596 | **20.283.945** |
| **Totaal (€)** | **7.779.327** | **5.114.909** | **1.712.427** | **497.688** | **4.202.274** | **7.411.399** | **6.557.605** | **3.754.050** | **1.050.429** | **38.080.108** |

* De gemeente Den Haag heeft de indexatie voor 2018-2020 in 1 x vrijgemaakt.

Alle verkregen indexaties zijn verwerkt in het reguliere budget.

Beheer en Onderhoud: Het beheer en onderhoud van de Rotterdamsebaan (incl. bediencentrale) komt niet ten laste van het projectbudget Rotterdamsebaan. De dekking voor de structurele jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn separaat door Den Haag in de begroting gedekt.

Accountantscontrole: In het tweede kwartaal 2022 begint de accountant met de slot controle van het project Rotterdamsebaan.

Projectmutaties:
In het eerste kwartaal 2022 heeft de stuurgroep (d.d. 24-02-2022) ingestemd met de laatste projectmutaties. Deze zijn verwerkt in de cijfers. Zie hiervoor ook de toelichting op het uitvoeringsbudget waarin de projectmutaties 36 t/m 40 zijn verwerkt.

Conclusie: De beschikbaar gestelde dekkingsmiddelen zijn, conform de huidige inzichten, toereikend voor de afronding van het project.

Decharge:
Nadat van MRDH de vaststellingsbrief ter afdoening van de subsidie is ontvangen, wordt het college van B&W verzocht het aan de projectdirecteur verleende mandaat in te trekken en decharge te verlenen aan de projectorganisatie Rotterdamsebaan. De vaststellingsbrief wacht op het resultaat van de finale accountantscontrole van het project en wordt in september 2022 verwacht.

Docnr34



| Document nummer | Bestandsnaam export | Weigeringsgrond | Tags |
|---|---|---|---|
| 00001 | ROBA-VER-004339.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00002 | ROBA-VER-004378.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00003 | ROBA-VER-004401.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00004 | ROBA-VER-004442.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00005 | ROBA-VER-004454.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00006 | ROBA-VER-004465.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00007 | ROBA-VER-004478.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00008 | ROBA-VER-004572.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00009 | ROBA-VER-004582.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00010 | ROBA-VER-004587.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00011 | ROBA-VER-004601.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00012 | ROBA-VER-004650.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00013 | ROBA-VER-004699.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00014 | ROBA-VER-004712.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00015 | ROBA-VER-004718.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00016 | ROBA-VER-004747.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00017 | ROBA-VER-004749.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00018 | ROBA-VER-004781.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00019 | ROBA-VER-004792.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00020 | ROBA-VER-004816.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00021 | ROBA-VER-004828.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00022 | ROBA-VER-004839.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00023 | ROBA-VER-004847.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00024 | ROBA-VER-005422.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00025 | ROBA-VER-005471.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00026 | ROBA-VER-005548.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00027 | ROBA-VER-005561.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00028 | ROBA-VER-005599.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00029 | ROBA-VER-005606.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00030 | ROBA-VER-005641.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00031 | ROBA-VER-005681.PDF | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00032 | ROBA-VER-005689.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |

Docnr1

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Status: | Concept |
| Kenmerk: | ROBA-VER-04339 |
| Afdeling: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Verslag datum: | 1 maart 2016 |

Naam overleg **Projectoverleg Rotterdamsebaan 002**

| | |
|---|---|
| Overlegdatum: | 1 maart 2016 |
| Locatie: | Binckhorstlaan 119, zaal links |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (ROBA):<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Combinatie Rotterdamsebaan (CRB):<br>5.1.2.e 5.1.2.e )<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Afwezig met bericht: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (ROBA):<br>5.1.2.e 5.1.2.e |
| Kopieën aan: | - |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | Dinsdag 22 maart 2016, 10.00 uur, Binckhorstlaan 174, zaal 2 |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | 5.1.2.e |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

BR

5.4 CRB heeft aangegeven een versnellingsmaatregel toe te willen passen zodat het boorproces beter in de planning past. Over ca. 4 weken wordt duidelijk of een versnelling haalbaar is. E.e.a. is afhankelijk van de fasering van de waterhuishouding in de Vlietzone. Een mogelijke versnelling heeft relatie met het nevencontract monitoring van ROBA. Voor dit nevencontract zal ROBA t.a.v. planning zelf een inschatting maken.

BR

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

[redacted]

6.5 CRB geeft aan dat de kapvergunning voor de bomen in de Vlietzone is verleend en de beroepstermijn loopt tot 9 maart a.s.. Verder is CRB druk bezig met de diverse watervergunningen voor de Vlietzone.

[redacted]

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| [redacted] | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR1 | [redacted] | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| | | 5.1.2.e |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| [redacted] | | |

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens ROBA,

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 22-03-16

Namens CRB.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 22-01-16

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Status: | Concept |
| Kenmerk: | ROBA-VER-004378 |
| Afdeling: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Verslag datum: | 9 juni 2016 |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 005** |

| | |
|---|---|
| Overlegdatum: | 17 mei 2016 |
| Locatie: | Binckhorstlaan 172, Kamer 2 |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (ROBA):<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Combinatie Rotterdamsebaan (CRB):<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Afwezig: | - |
| Kopieën aan: | - |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | Dinsdag 14 juni 2016, 10.00 uur, Binckhorstlaan 172, zaal 2 |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 5.1.2.e | | |

5.1.2.e



5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| [redacted] | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 1111 | [redacted] | |

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

[redacted]

8.6 CRB heeft voor het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) de eindsituatie in beeld gebracht van het watersysteem. Dit heeft vertrouwen gewekt bij HHD. Zij is voornemens om deelvergunningen voor de tussenliggende werkzaamheden te gaan verlenen. De vergunningsaanvragen voor de bemalingen van de bouwkuipen wordt begin juni ingediend.

[redacted]

9.5 CRB meldt dat het werkterrein in de Vlietzone ingericht wordt en het watersysteem wordt aangepast. Vanaf 15 juli mag men delen van het bestaande watersysteem gaan dempen.

5.1.2.e

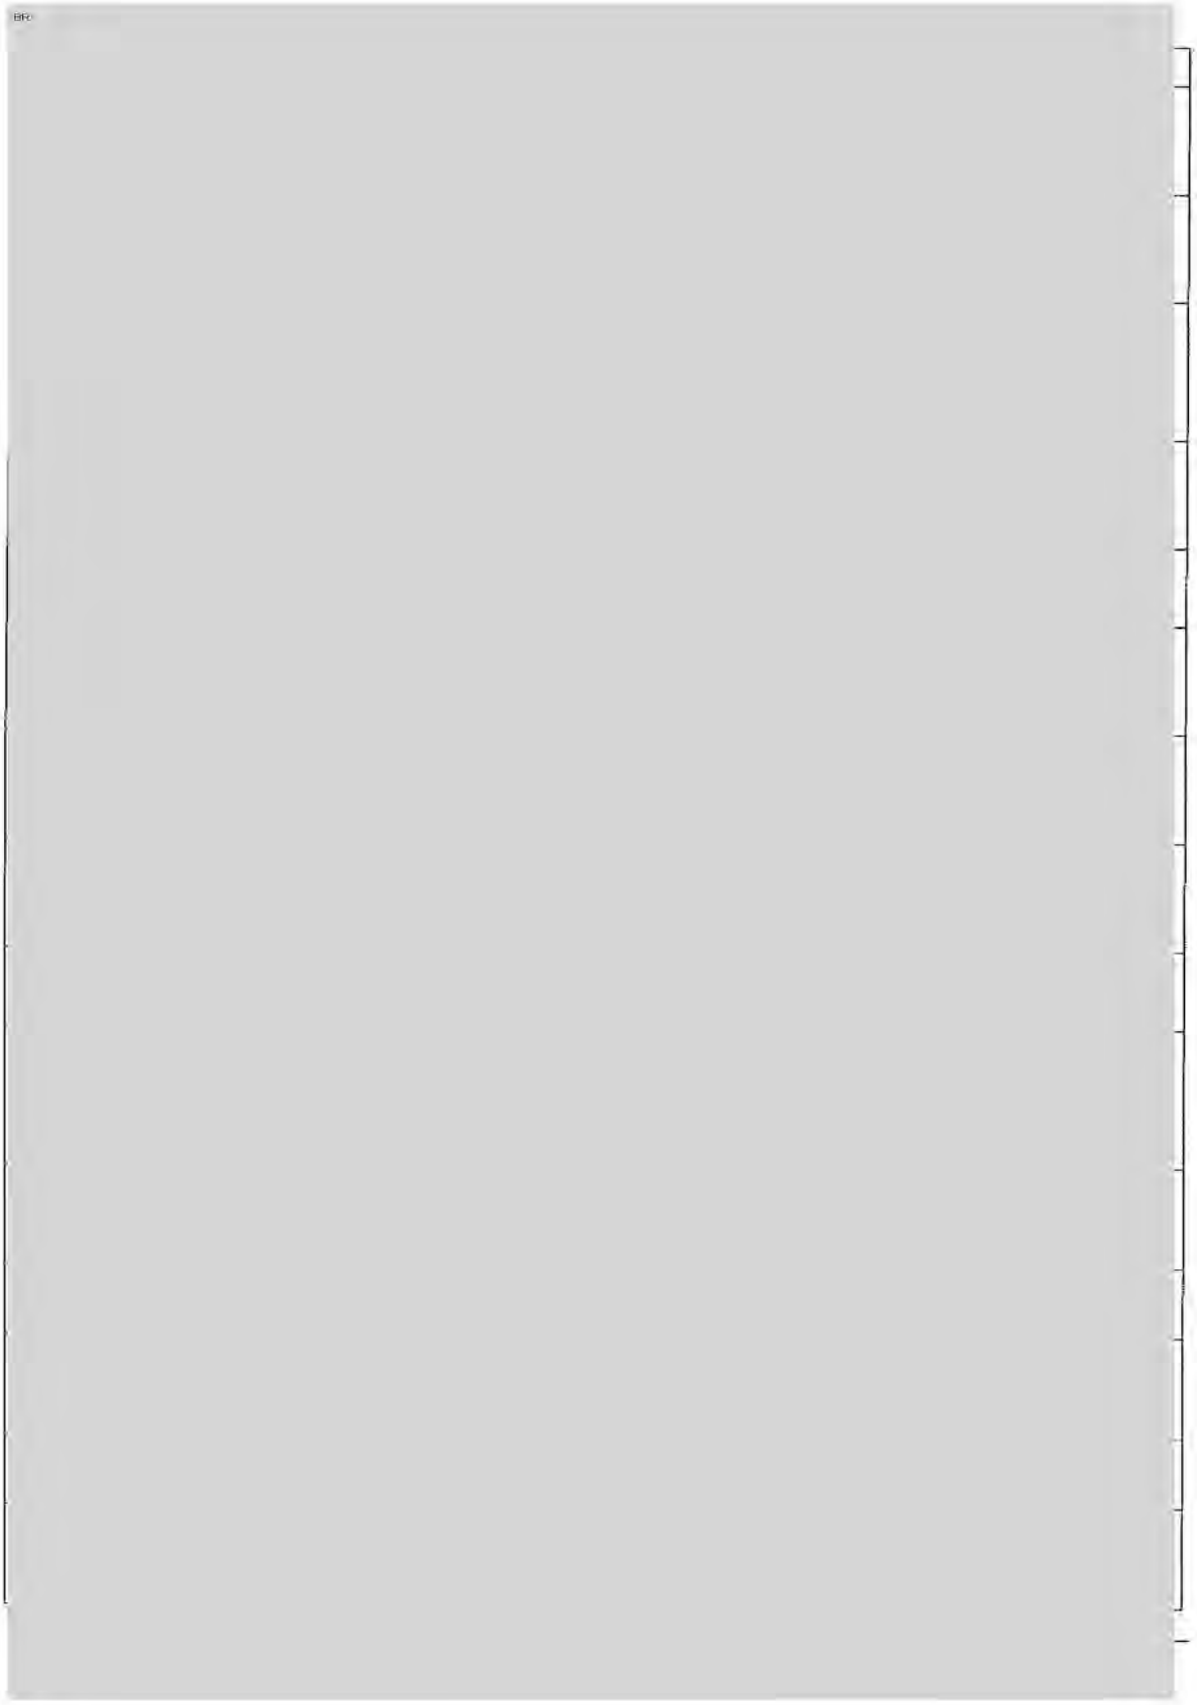

5.1.2.e



5.1.2.e

Docnr2

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 8R | | |

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens ROBA,

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 4-06-16

Namens CRB

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 14-06-2016

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004401 |
| Auteur: | 5.1.2.e projectsecretaris Rotterdamsebaan |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 006** |

| | |
|---|---|
| Overlegdatum: | 14 juni 2016 |
| Locatie: | Binckhorstlaan 172, kamer 2 |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba):<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Combinatie Rotterdamsebaan (CRB):<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Afwezig: | - |
| Kopieën aan: | - |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | Dinsdag 12 juli 2016, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

Docnr3

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| 6N | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BR | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

BR

8.5 Het ontwerp en de vergunningsverlening van de waterberging in de Vlietzone wordt door partijen wekelijks besproken met het Hoogheemraadschap van Delfland. CRB geeft aan dat de vergunningsverlening conform planning loopt, maar de berekeningswijze voor het bepalen van de bergingscapaciteit van de waterberging een discussiepunt is.

BR

5.1.2.e



5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| 8R | [redacted] | |

5.1.2.e



5.1.2.e

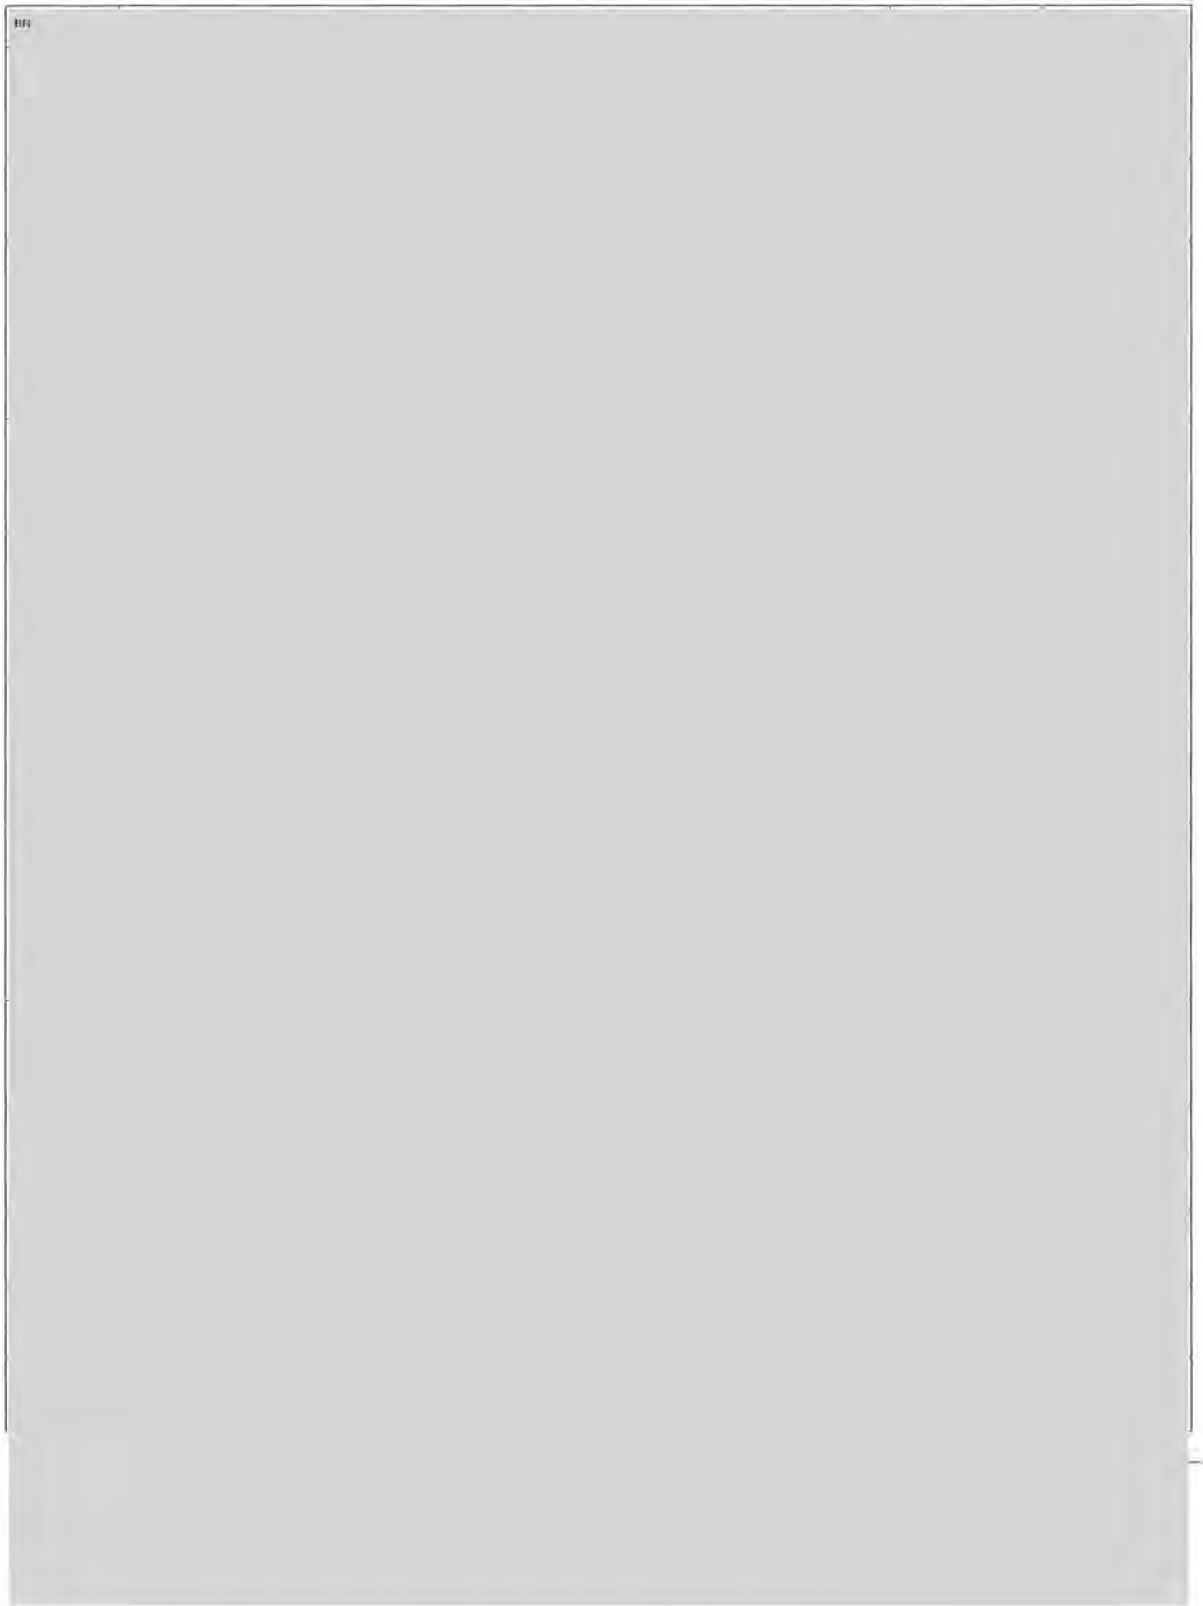

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba, Namens CRB.

Docnr3

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 06-05-2016

datum: 06-05-2016

Docnr4

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004442 |
| Auteur: | 5.1.2.e projectsecretaris Rotterdamsebaan |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 008** |

| | |
|---|---|
| Overlegdatum: | 6 september 2016 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba):<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Combinatie Rotterdamsebaan (CRB):<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |
| Kopieën aan: | - |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | Dinsdag 4 oktober 2016, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

Docnr4

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

Docnr4

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| [redacted] | | CRB |



5.1.2.e

5.1.2.e

Actiehouder

Actiehouder

[redacted]

9.11 CRB heeft afgelopen periode in de Vlietzone gewerkt aan het aanpassen van de waterhuishouding en het verbeteren van de stabiliteit van de grond. Komende week wordt gestart met het aanbrengen van de combiwanden van de bouwkuip.

[redacted]

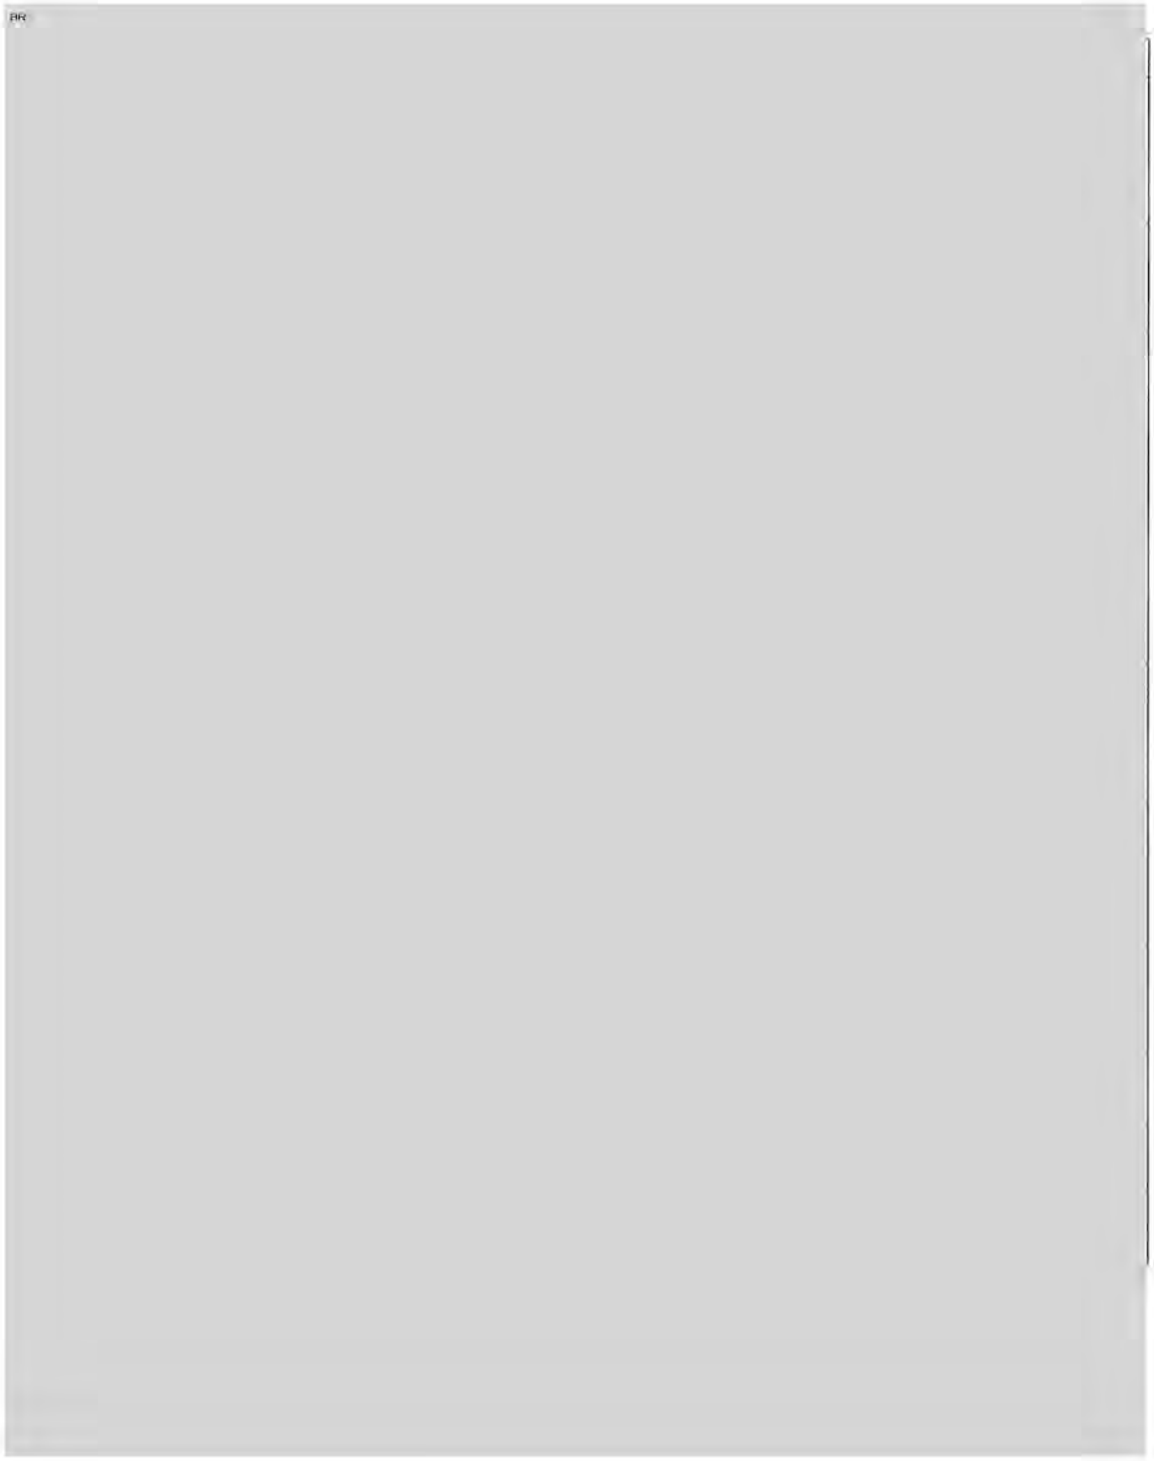

Docnr4

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba

5.1.2.e

5.1.2.e

05-10-16

Namens CRB

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum:

05-10-2016

Docnr5

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004454 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 009** |
| Overlegdatum: | 4 oktober 2016 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba):<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Combinatie Rotterdamsebaan (CRB):<br>5.1.2.e 5.1.2.e )<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( ), 5.1.2.e ( ) |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 1 november 2016, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

5.1.2.e



5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| RR | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

## 7 Projectbeheersing

| | | |
|---|---|---|
| BR | | |
| 7.3 | Roba constateert dat de planning van de openstelling van het noordelijke deel van het Molenvlietpark per 1 april 2017 niet gehaald word (EMVI-belofte). CRB bevestigt dat en geeft aan dat hier al over gesproken is tussen Roba en CRB. CRB zal een wijzigingsvoorstel indienen. | CRB |
| BR | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr5

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 8R | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr5

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 6 | [redacted] | |

5.1.2.e



5.1.2.e

| | | | |
|---|---|---|---|
| BR | | | |
| 009-01 | Wijzigingsvoorstel indienen voor (vertraagde) voltooiing van Molenvlietpark West. | 7.3 | CRB |
| BR | | | |

5.1.2.e

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba.

5.1.2.e

5.1.2.e

Namens CRB.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum:

Docnr6

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004465 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 010** |
| Overlegdatum: | 1 november 2016 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e<br>Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e |
| Afwezig: | |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 29 november 2016, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| [redacted] | | CRB |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | [redacted] | |

5.1.2 e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

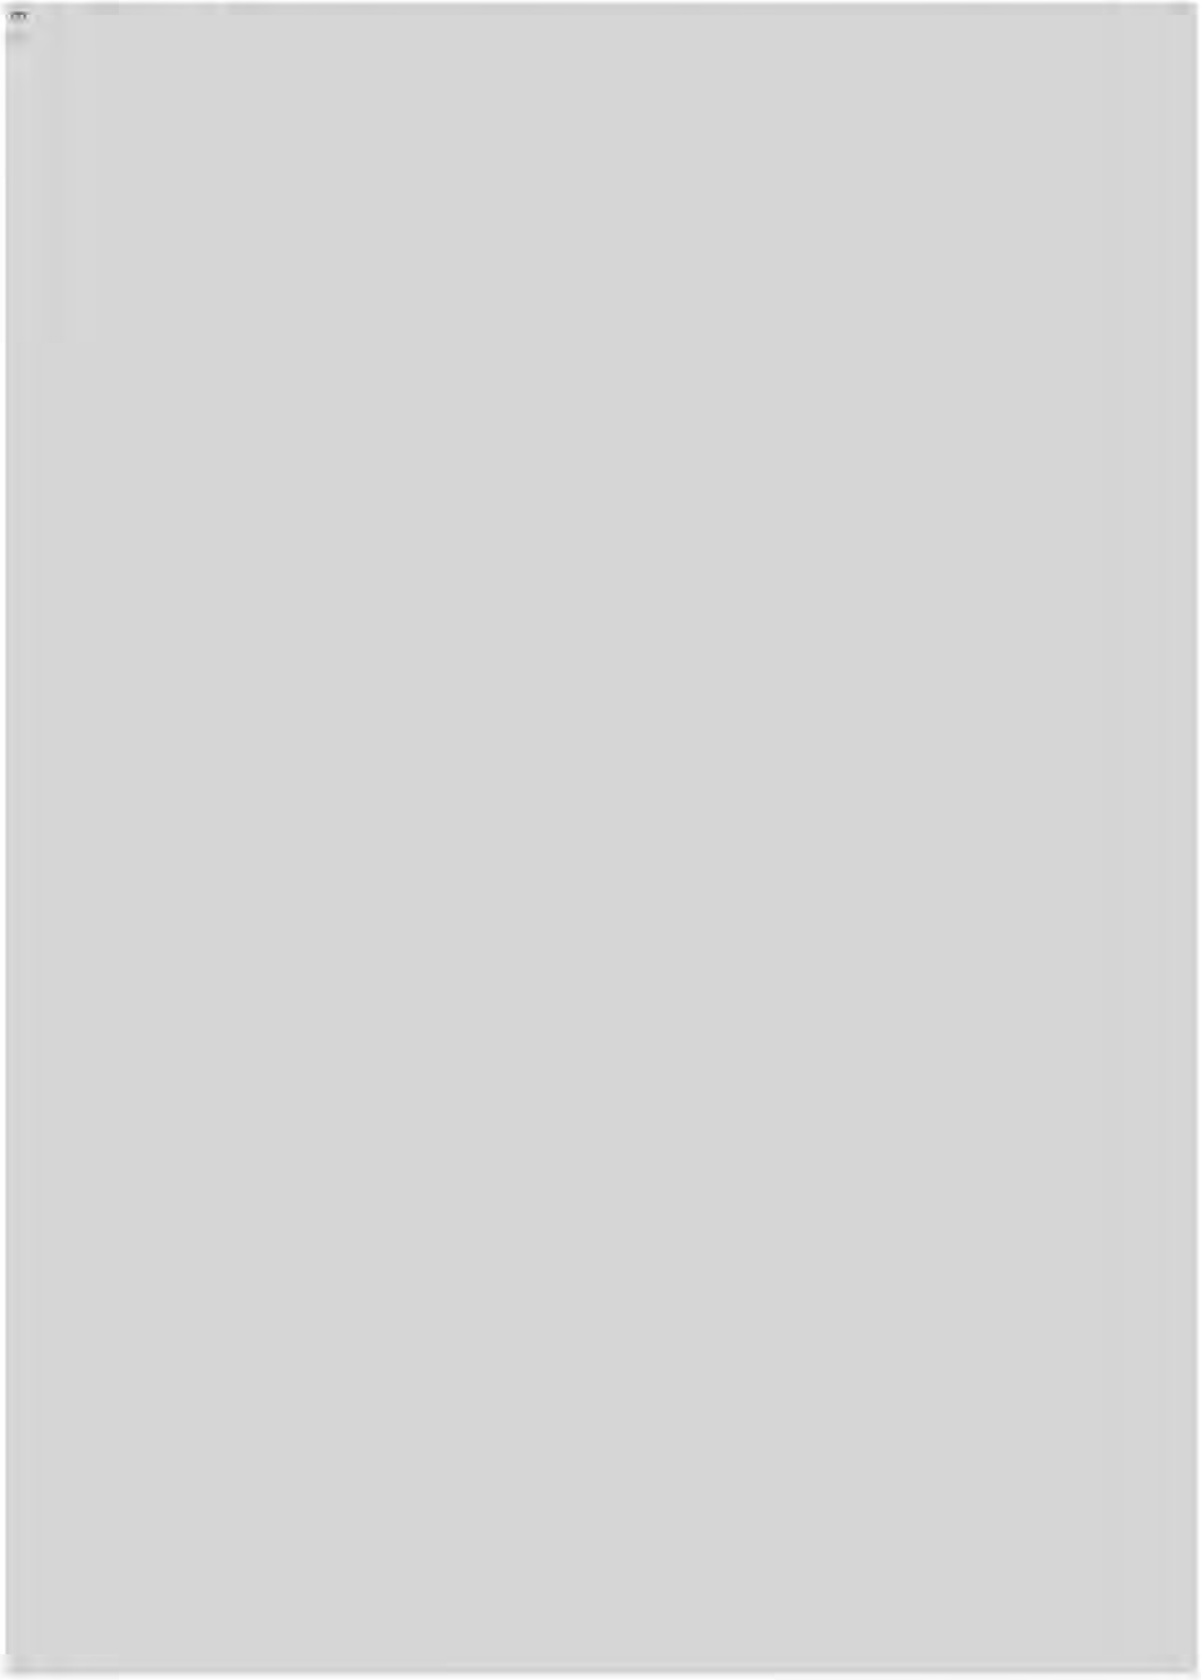

Docnr6

| Item nr. | Beschrijving | | Actiehouder |
|---|---|---|---|
| BR | | | |
| 009-01 | Wijzigingsvoorstel indienen voor (vertraagde) voltooiing van Molenvlietpark West.<br>*Actie aanhouden. CRB geeft aan dat dit WV-0068 zal zijn.* | 7.3 | CRB |
| BR | | | |

5.1.2.e

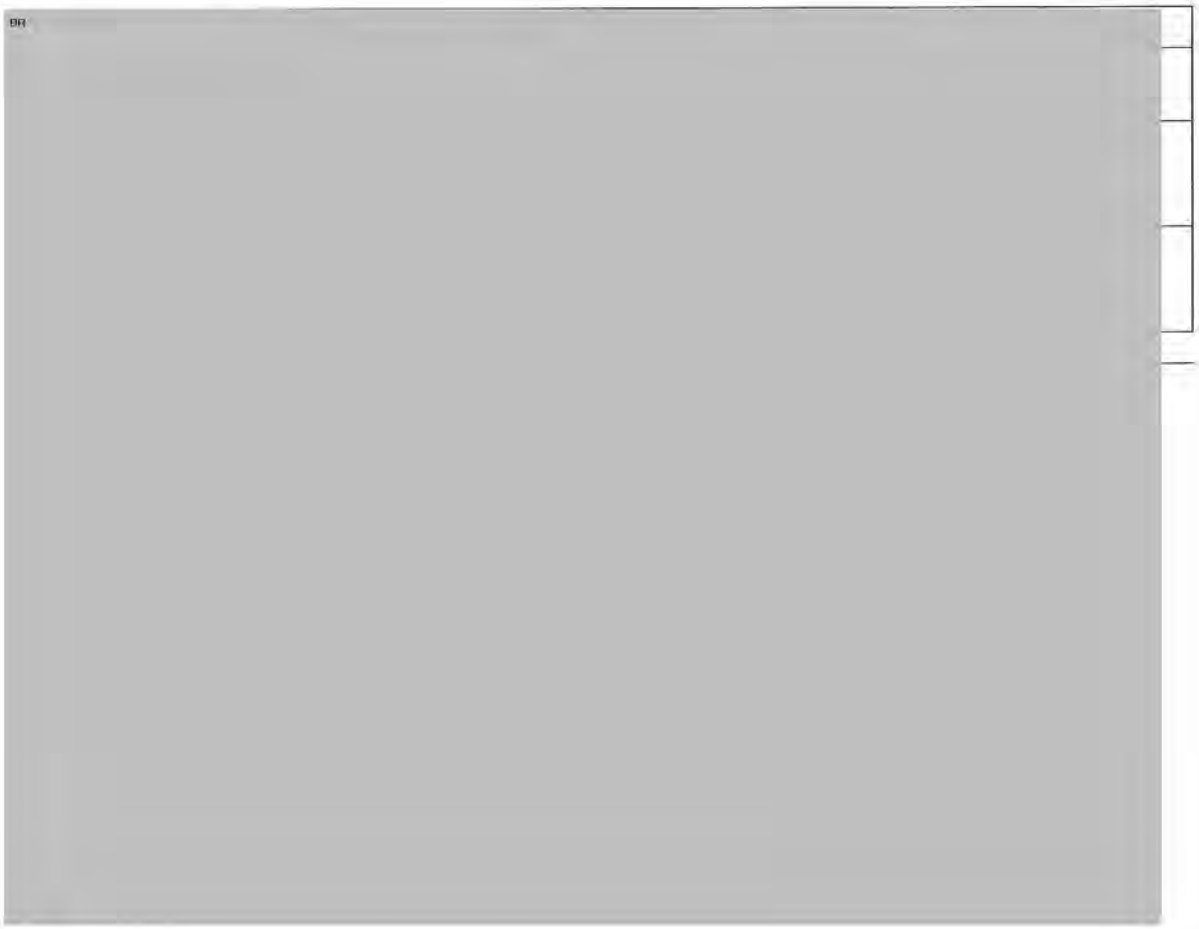

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 29-11-16

Namens CRB.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 29.11-2016

Docnr7

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004478 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 011** |
| Overlegdatum: | 29 november 2016 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba):<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Combinatie Rotterdamsebaan (CRB):<br>5.1.2.e 5.1.2.e )<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 24 januari 2017, 10.00-11:30 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 1 | [redacted] | |

Docnr7

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | [redacted] | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| [redacted] | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr7

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BR | [redacted] | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | | Actiehouder |
|---|---|---|---|
| BR | | | |
| ~~009-01~~ | ~~Wijzigingsvoorstel indienen voor (vertraagde) voltooiing van Molenvlietpark West.~~<br>*Afgerond: Wijzigingsvoorstel nog niet ontvangen (WV-0068), maar actie wordt bewaakt in het reguliere contractoverleg.* | ~~7.3~~ | ~~CRB~~ |
| BR | | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba,

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 21/02/17

Namens CRB.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 21-02-17

Docnr8

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004572 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 017** |
| Overlegdatum: | 13 juni 2017 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Bovenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( ) |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 11 juli 2017, 10.00-11:30 uur |

BR

Actiehouder

| | Actiehouder |
|---|---|
| RR | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|



7.10 Roba geeft aan dat de werkzaamheden aan de boezemkade in het Molenvliet-park niet conform het monitoringsplan zijn opgestart. CRB heeft adequaat gereageerd, o.a. door het terugdraaien van een aantal werkzaamheden en het aanpassen van de monitoring. Roba spreekt echter haar zorgen uit, mede omdat

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

een dergelijke afwijking het vertrouwen van het Hoogheemraadschap van Delfland op de proef stelt.

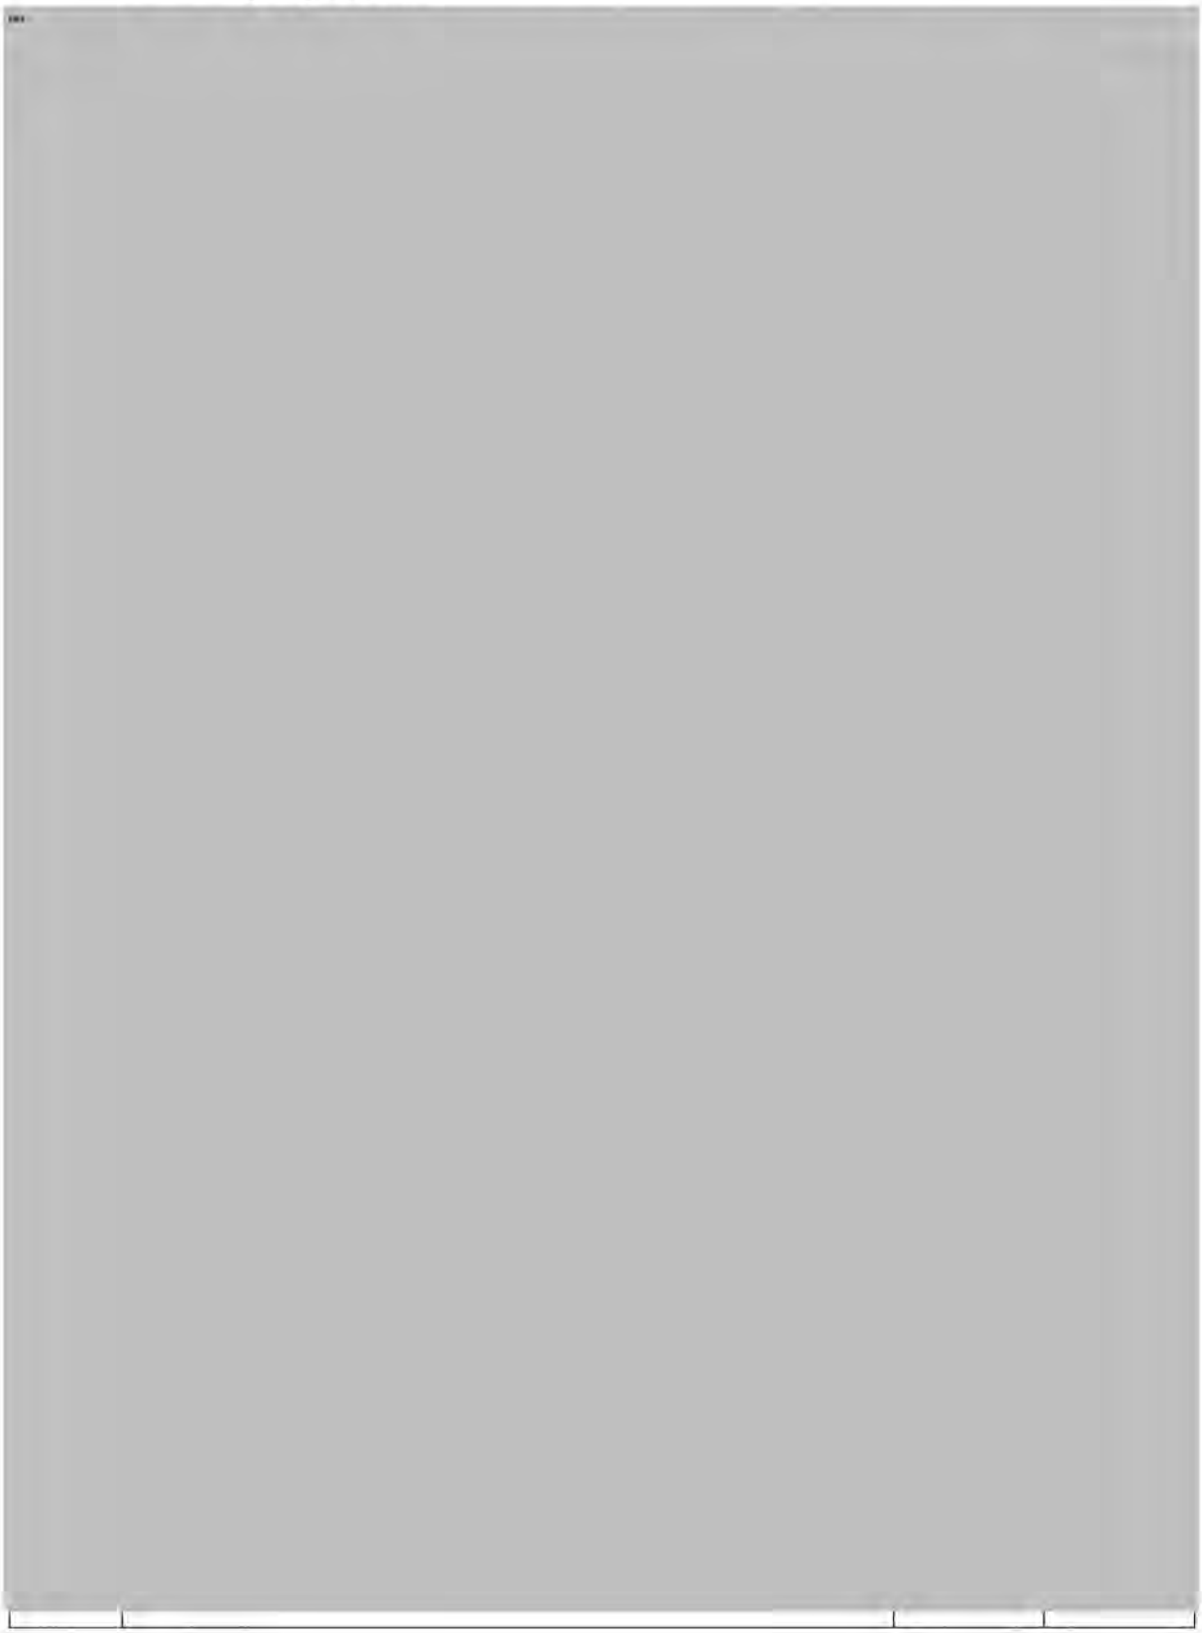

Docnr8

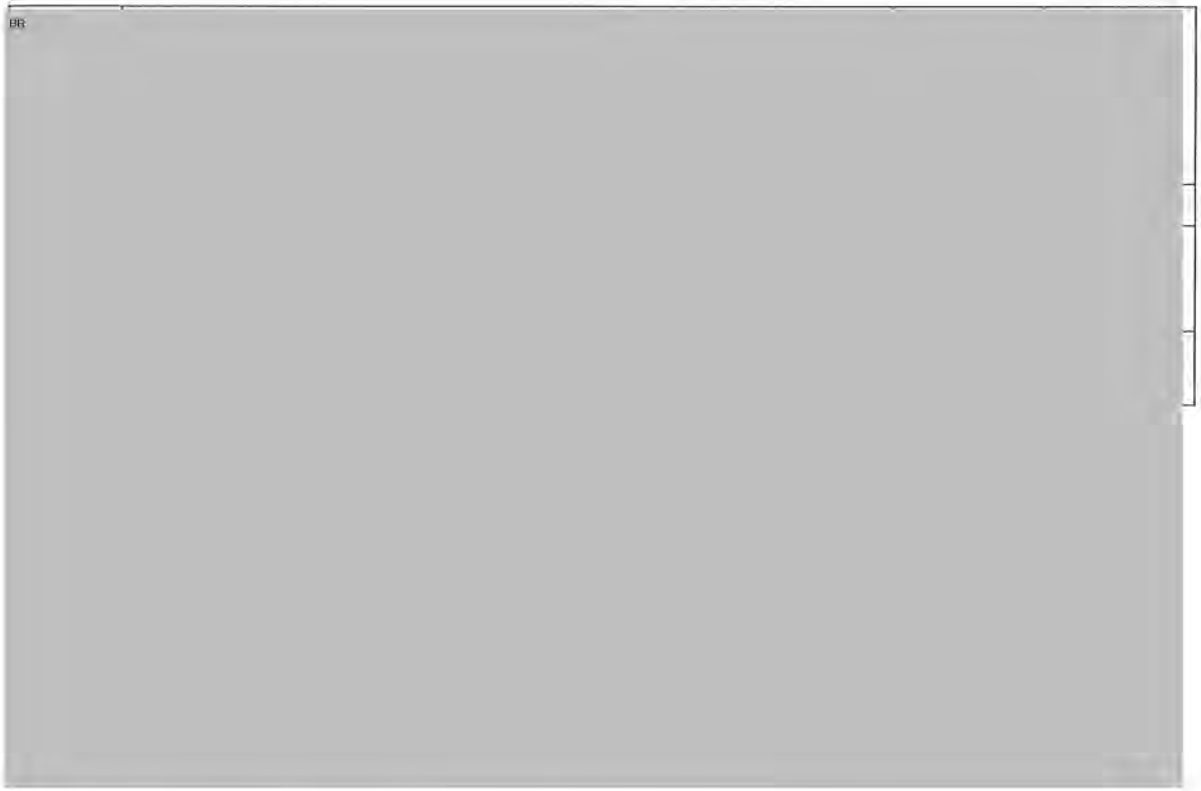

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba,

Namens

datum: 11-7-17

Docnr9

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004582 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 018** |
| Overlegdatum: | 11 juli 2017 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 8 augustus 2017, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

## 5 Voortgangsrapportage

BR

5.3 Blz. 21 derde bullet onder Aandachtspunten: het fundamentele verschil van inzicht tussen CRB en Roba over de consequenties van door stakeholders gestelde eisen aan bijv. de aflaatconstructie en voltooiing Molenvlietpark 'belemmert' het voltooien van het ontwerp. Roba herkent betreffende zaken als discussiepunt, maar niet als belemmering in het ontwerpproces voor CRB. Mocht dat wel zo zijn dan moet CRB snel het initiatief nemen voor een bespreking. Bovendien heeft Roba voor de aflaatconstructie tot op heden nog geen DO ontvangen.

BR

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

Docnr9

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| 5.1.2.e | [redacted] | |

Docnr9

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| nr. | | |

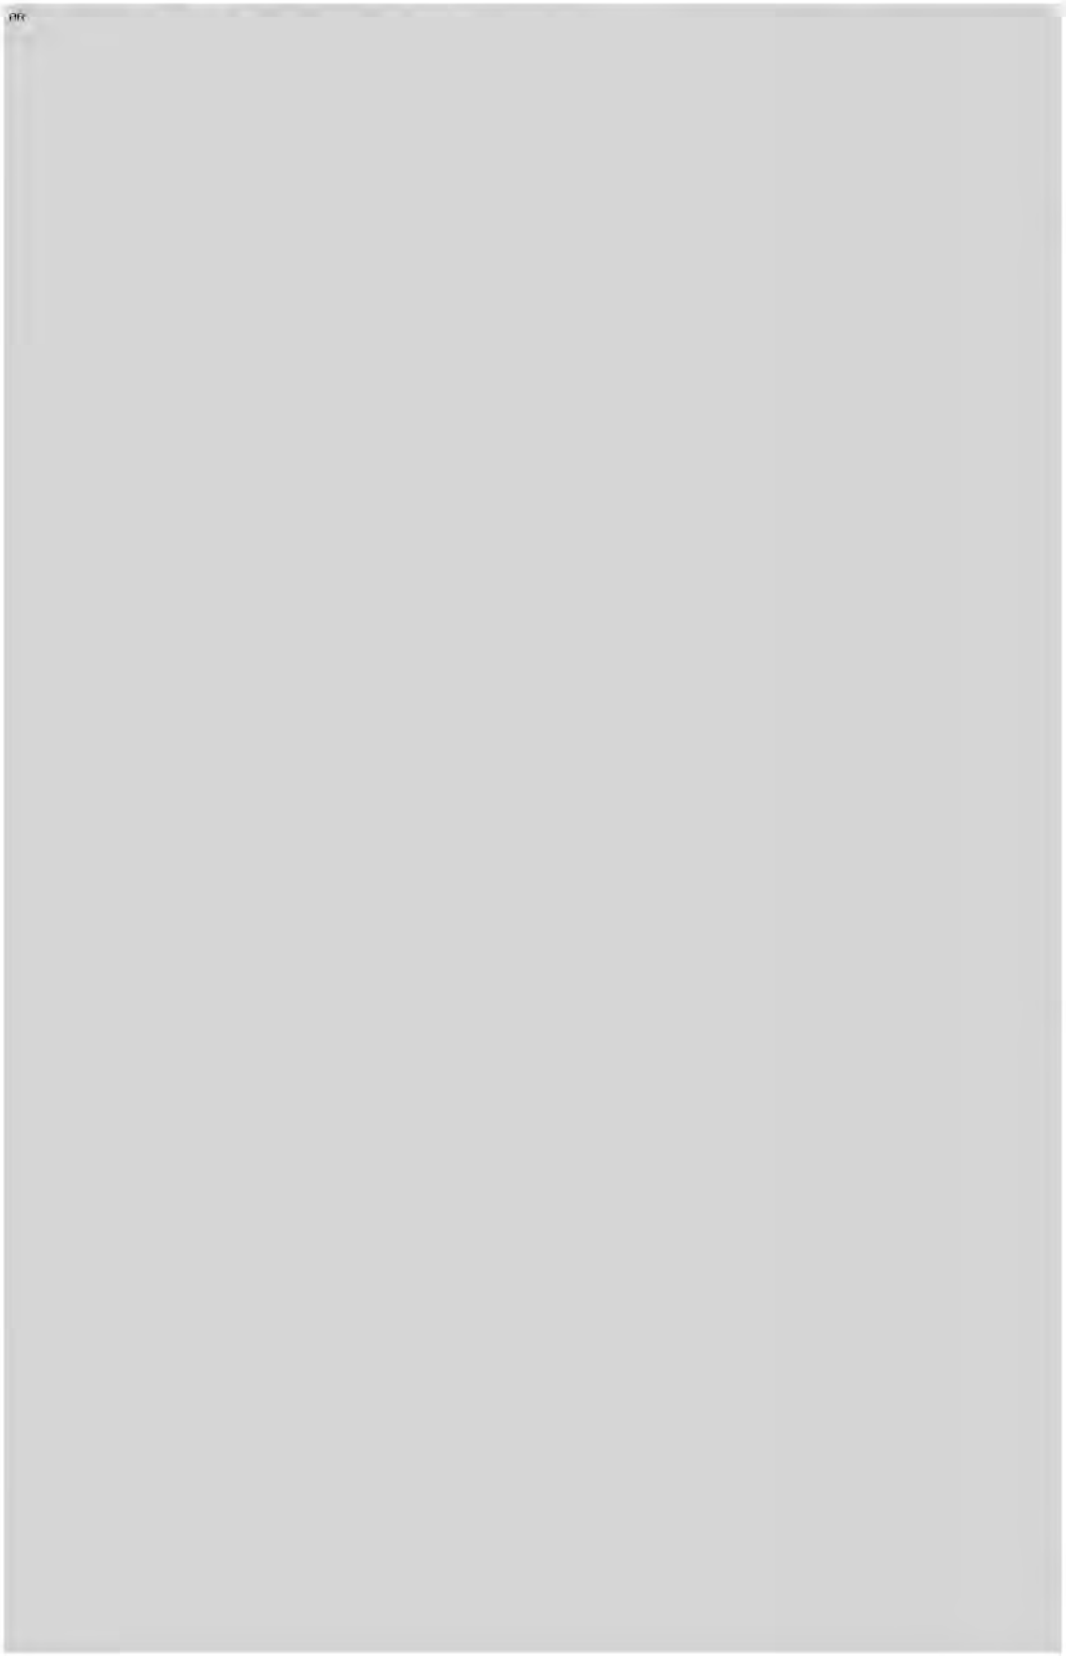

5.1.2.e

Docnr9

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba,

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 08/08/17

Namens CRB.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 08 08 17

Docnr10

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004587 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 019** |
| Overlegdatum: | 8 augustus 2017 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( |
| Bijlage(n) verslag: | |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 5 september 2017, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 8R | | |

5.1.2.e

Docnr10

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BR | [redacted] | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

[redacted]

## 9 Techniek

9.1 Roba en CRB hebben vastgesteld dat het Hoogheemraadschap t.a.v. het ontwerp van de aflaatconstructie aanvullende eisen stelt t.a.v. de onderhoudbaarheid. Dit wordt verder onderzocht en uitgewerkt. De onderhoudbaarheid van de aflaatconstructie wordt samen met de vormgeving ervan afgehandeld in het kader van het DO landschappelijke inpassing Vlietzone en de daarmee samenhangende Wijziging.

[redacted]

Docnr10

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag
Namens Roba,

datum: 050917

datum: 05-09-2017

Docnr11

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004601 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 020** |
| Overlegdatum: | 5 september 2017 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( |
| Bijlage(n) verslag: | |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 3 oktober 2017, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 6R | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

BR

5.6 Pag. 22, paragraaf 5.1, Voortgang, 1e bullet: Bij het DO van de discipline Wegen & waterhuishouding staat ook de aflaatconstructie nog open.

BR

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

BR

## 9 Techniek

9.1 CRB geeft aan nog te wachten op de eisen van HHD t.a.v. de aflaatconstructie.
→ FHA geeft aan dat HHD niet gewend is om vooraf een volledige eisenset af te geven. HHD komt binnenkort met een eerste set eisen. Vervolgens dient in onderlinge afstemming het ontwerp door CRB te worden uitgewerkt. Mogelijk leidt deze werkwijze tot meerdere iteratie-stappen, wat CRB zal meenemen in de bijbehorende Wijziging 0132.

BR

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BR | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr11

| | |
|---|---|
| RK | |

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba,

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 06-10-17

Namens CRB.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 6-10-17

Docnr12

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004650 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 025** |
| Overlegdatum: | 30 januari 2018 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( ) |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 20 februari 2018, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| | BR | |
| 5.5 | Pag. 15, paragraaf 4.3 Ontwikkelingen / aandachtspunten vergunningen: de boortunnel gaat onder (boezem)water en (boezem)waterkeringen door i.p.v. onder 'waterstaatswerken'. | |

BR

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

5.1.2.e



5.1.2.e

Docnr12

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| RR | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr12

[redacted]

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

5.1.2.e

5.1.2.e

Na [redacted]

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 3-4-18

Docnr13

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004699 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 027** |
| Overlegdatum: | 20 maart 2018 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Afwezig: | - |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 17 april 2018, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 5.1.2.e | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr13

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BIN | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BR | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 6.13 | Roba meldt dat zij een wijzigingsvoorstel zal opstellen voor de 2e toevoer van de calamiteitenberging. Het betreft een extra verbinding tussen de Vliet en de waterberging o.a. over het perceel van 5.1.2.e | |

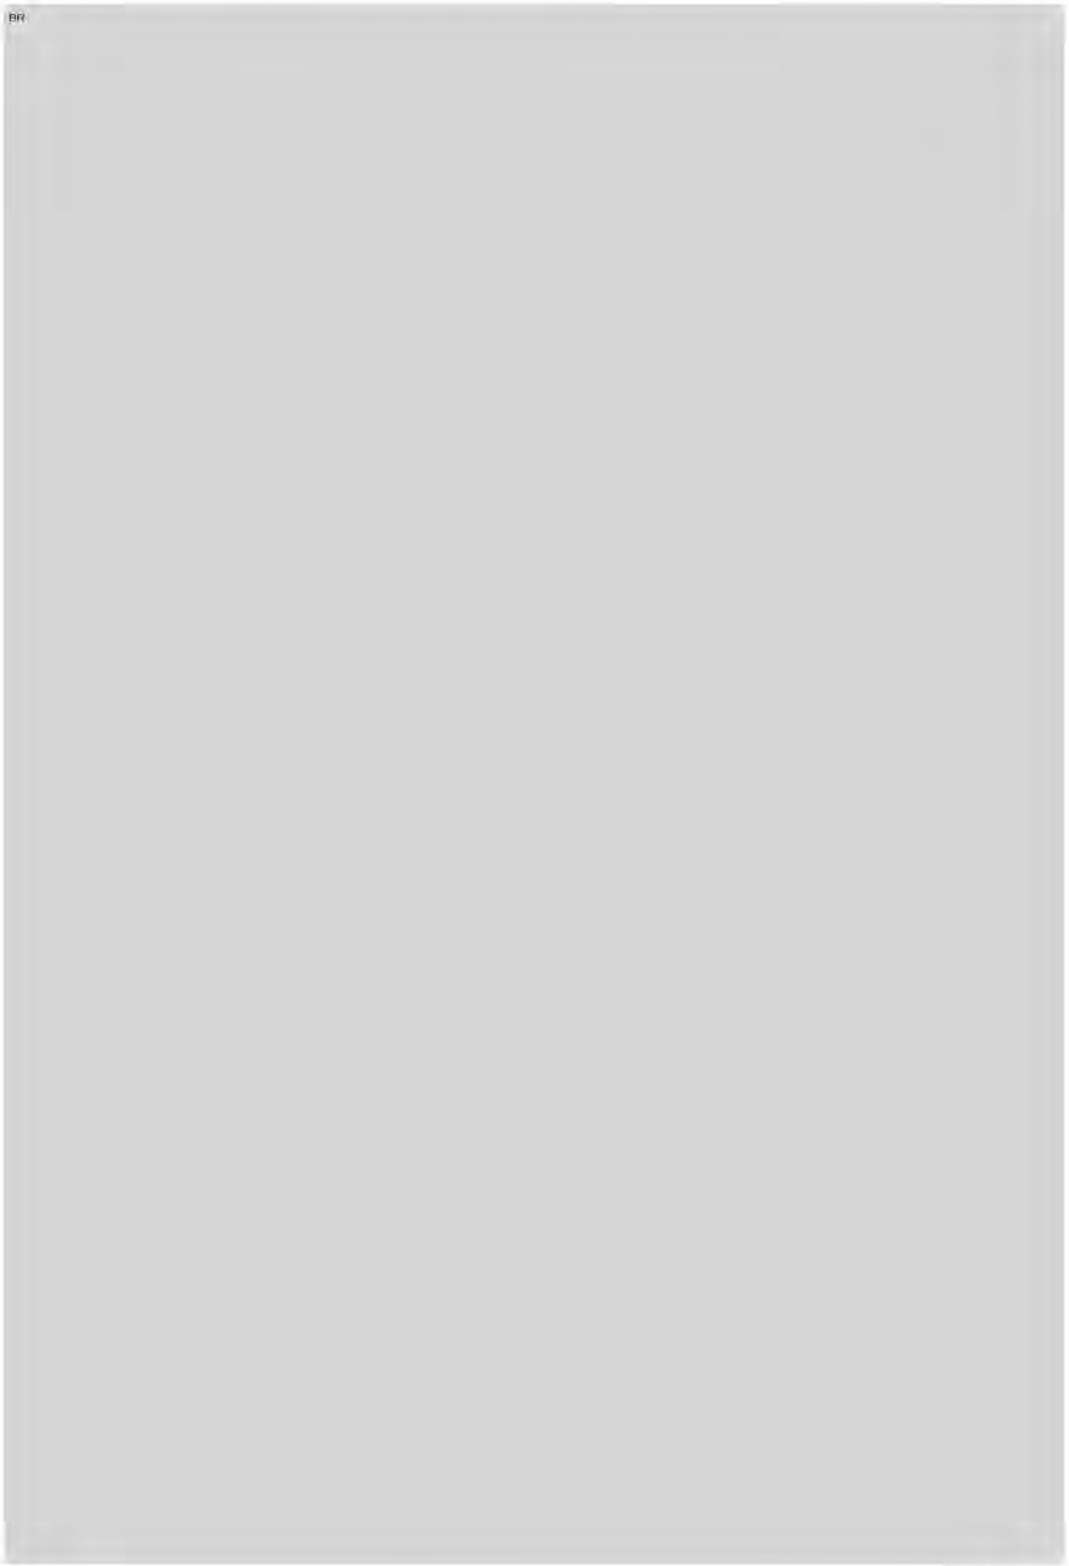

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

5.1.2.e

5.1.2.e

17-05-18

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 17-5-18

Docnr14

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004712 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 028** |
| Overlegdatum: | 17 april 2018 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Afwezig: | - |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 15 mei 2018, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 8R | [redacted] | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| [redacted] | | |

7.3 CRB meldt dat de planning m.b.t. het eind 2018 openstellen van de 1e fase Molenvlietpark niet haalbaar is. Dit is met name een gevolg van de aflaat en de kleinere kunstwerken die nog gebouwd moeten worden. CRB geeft aan o.a. nog geen duidelijke ontwerpeisen van HHvD voor de aflaat ontvangen te hebben. Roba stelt dat die duidelijkheid er inmiddels wel is. Roba is teleurgesteld over een nieuw uitstel, met name omdat daardoor opnieuw moet worden teruggekomen op de aan de omgeving gecommuniceerde verwachtingen. Opnieuw uitstellen van de openstelling moet daarom zoveel als mogelijk voorkomen worden.

[redacted]

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BIN | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BR: | | |

Docnr14

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 15-5-15

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 15-5-15

Docnr15

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004718 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 029** |
| Overlegdatum: | 15 mei 2018 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( ) |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 12 juni 2018, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

Docnr15



5.7 Pagina 21, par. 5.2 Voorbereiding, aandachtspunten: Roba had hier informatie over de faseringen in de Vlietzone verwacht (o.a. Molenvlietpark, waterberging en parkeerterrein Drievliet). → CRB erkent dit.



6.6 Op dit moment vindt de laatste afstemming plaats met het Hoogheemraadschap van Delfland over aflaat in de boezemwaterberging. Het ontwerp is ondertussen geaccepteerd door Roba.

5.1.2.e



5.1.2.e

Docnr15

RR

[redacted]

5.1.2.e

5.1.2.e

[redacted]

9.7 CRB is de planning van het Molenvlietpark aan het herzien. Belangrijke invloedsfactoren zijn de aflaat en de recreatieve bruggen.

[redacted]

Docnr15

BR

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba,

5.1.2.e

5.1.2.e

Namens CRB

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 12-6-18

Docnr16

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-00~~XXXX~~ 4747 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 030** |
| Overlegdatum: | 12 juni 2018 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 10 juli 2018, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

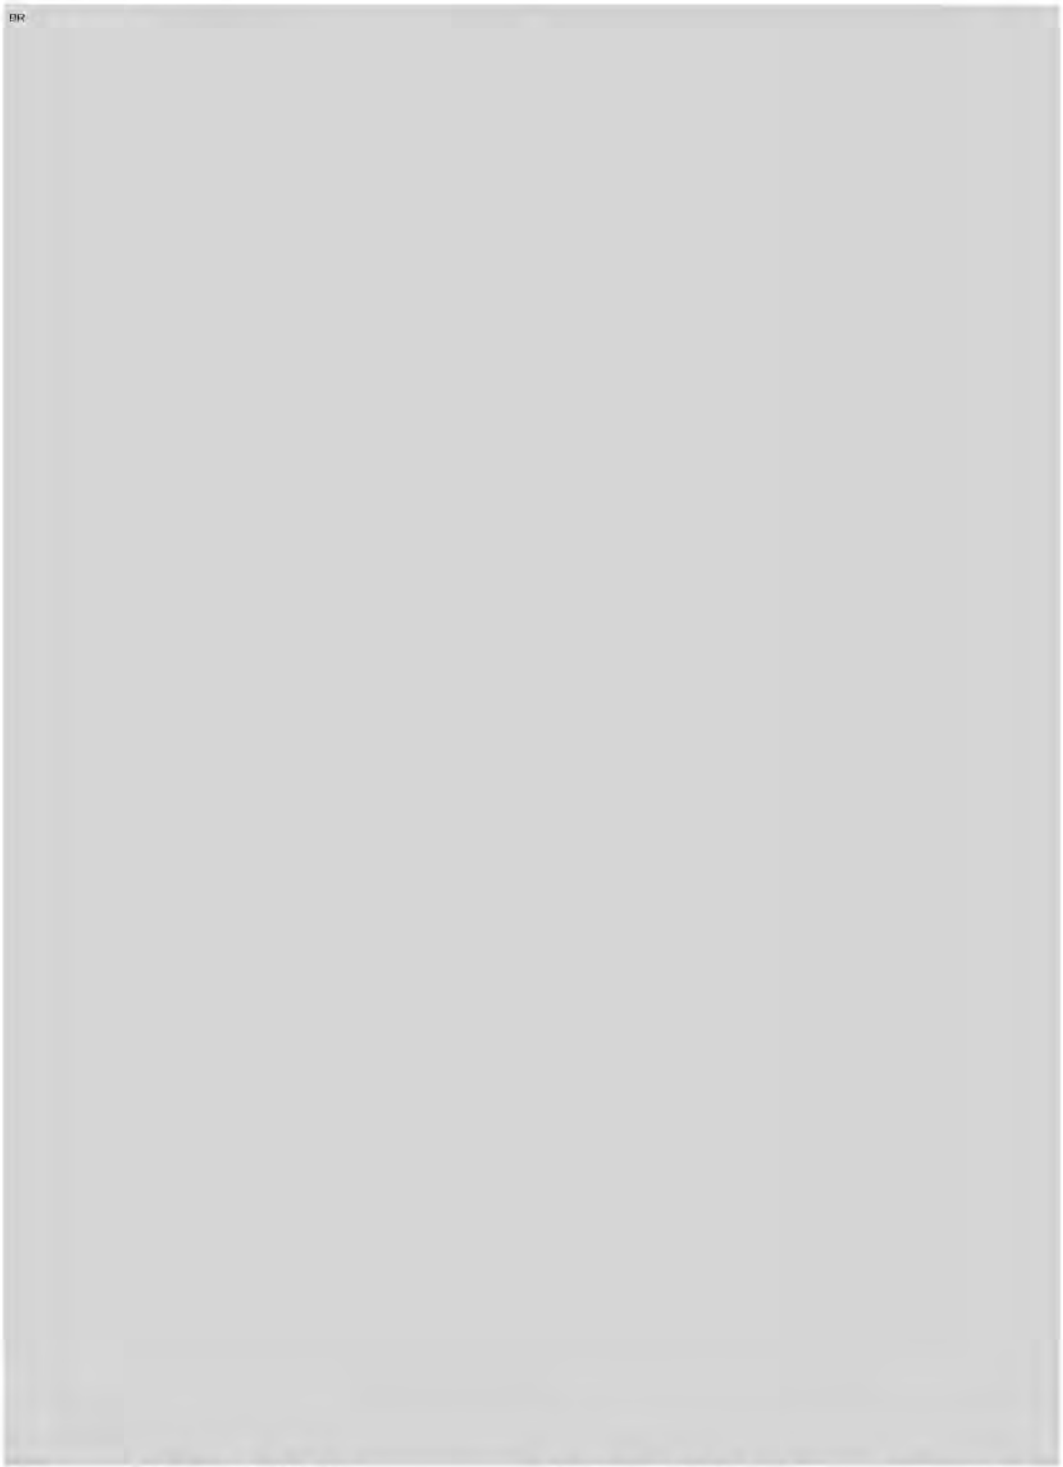


6.7 Roba meldt dat 5.1.2.e is aangesteld als 5.1.2.e ontwerp en voorbereiding tweede toevoer Molenvlietpark.

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 7 | **Projectbeheersing** | |
| 7.1 | CRB meldt dat zij voornemens is om een nieuwe revisie (H) van de overall planning op te stellen en deze medio augustus in te dienen. Dit zou een complete versie moeten zijn, o.a. incl. BR en fasering Molenvlietpark/Drievliet. Roba merkt op dat het inderdaad wenselijk is een complete integrale planning te hebben. Indien niet alles bekend is dan zal CRB, eventueel in overleg met Roba, daar aannames over doen. | |

BR

Docnr16

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BR | | |

Docnr16

[redacted]

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

datum: 10-7-18

Docnr17

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004749 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 031** |
| Overlegdatum: | 10 juli 2018 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e 5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 7 augustus 2018, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 8R | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| | [redacted] | |

5.5 Pagina 23, par. 5.2, Aandachtspunten: CRB schrijft dat duidelijkheid op korte termijn dringend gewenst is t.a.v. herziene planning Molenvlietpark. Wat verwacht CRB van Roba? → CRB is hierover reeds in overleg met Roba.

[redacted]

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| | 6R | |
| 6.4 | CRB informeert naar de status van de 2e toevoer naar het bergingsgebied. Roba meldt dat zij bezig is met het opstellen van het bestek. | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |
| 8.7 | CRB zal binnenkort de vergunningsaanvraag doen voor 'brug I' in het Molenvlietpark nabij de Molensloot. CRB zal voorafgaand aan de aanvraag in gesprek gaan met de omwonenden. | |
| BR | | |

Docnr17

BR

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

5.1.2e

5.1.2e

datum: 04-09-18

Namens CRB

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

datum: 4-9-18

Docnr18

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004781 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 033** |
| Overlegdatum: | 2 oktober 2018 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( ) |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 30 oktober 2018, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| RR | | |

Docnr18

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BR | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

BR

8.6 Volgende week worden door CRB de vergunningen voor de bruggen I t/m III in het Molenvlietpark aangevraagd. De vergunningaanvragen voor bruggen IV en V volgen later.

BR

Docnr18

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BR | | |

Docnr18

BR

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba.

5.1.2.e

5.1.2.e

30.10.08

Namens CRB.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 30-10-08

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004792 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 034** |
| Overlegdatum: | 30 oktober 2018 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| Afwezig: | - |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 27 november 2018, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BR | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| [redacted] | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| 8B | [redacted] | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 8.6 | CRB meldt dat de vergunning voor de aflaatconstructie is verleend en nu in de bezwaartermijn zit. | |
| | [redacted] | |
| 8.9 | CRB meldt dat de vergunning voor voetgangersbruggen I, II en III in het Molenvlietpark binnenkort wordt aangevraagd. | |
| | [redacted] | |

BR

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba,

5.1.2.e

5.1.2.e

Namens CRB.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 27-11-18

Docnr20

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

**Verslag**

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004816 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 035** |
| Overlegdatum: | 27 november 2018 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 22 januari 2019, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| | 6R | |
| 5.7 | Pagina 21, par. 5.3 Ontwikkelingen / aandachtspunten uitvoering: Roba constateert dat vrijwel uitsluitend civiele werkzaamheden worden genoemd; overige werkzaamheden lijken te ontbreken. Roba verwacht informatie over bijvoorbeeld de uitvoering van diverse objecten in het Molenvlietpark en de loopbrug Drievliet. | |
| | 6R | |
| 6.2 | Roba spreekt haar zorg uit t.a.v. de voortgang van de realisatie van het Molenvlietpark. Er lijkt binnen CRB geen integraal verantwoordelijke te zijn waardoor steeds meer vertraging optreedt. CRB geeft aan dat projectorganisator 5.1.2.e zich hier aan het inwerken is. | |
| | 6R | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| [redacted] | | |
| 6.7 | CRB informeert naar de planning van de eventuele wijziging m.b.t. de tweede watertoevoer voor de calamiteitenberging. → Roba meldt dat de voorbereiding van deze werkzaamheden een stroef proces blijkt, met diverse kritische stakeholders en complexe vergunningsvoorwaarden. Roba verwacht op korte termijn nog geen ontwikkelingen i.r.t. CRB. | |
| [redacted] | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

Docnr20

[redacted]

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

datum: 22-1-19

Docnr21

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004828 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 036** |
| Overlegdatum: | 22 januari 2019 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( 5.1.2.e |
| Afwezig: | - |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 19 februari 2019, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 8R | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| 5.1.2.e | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |
| 6.9 | Bij de watervergunning Molenvlietpark ontstaat volgens CRB mogelijk een knelpunt doordat de voorbereidingen van Roba voor de 2e toevoer vertragen. Hierdoor kan niet voldaan worden aan de vergunningsvoorwaarden. Roba zal dit afstemmen met CRB en het Hoogheemraadschap van Delfland. | Roba |
| BR | | |

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

8.2 CRB geeft aan dat de afstemming over de aanvraag van de watervergunningen benodigd voor de diverse bruggen in het Molenvlietpark met het Hoogheemraadschap van Delfland nagenoeg is afgerond. Verder meldt CRB dat de omgevingsvergunningen voor deze bruggen reeds zijn aangevraagd.

BR

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr21

| Item nr. | Beschrijving | | Actiehouder |
|---|---|---|---|
| BR | | | |
| 036-05 | Afstemming met Hoogheemraadschap van Delfland en CRB m.b.t. knelpunt i.r.t. vergunningsvoorwaarden watervergunning Molenvlietpark door vertraging 2e toevoer. | 6.8 | Roba |
| | | | |

Docnr21

BR

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 19-2-19

Docnr22

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004839 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 037** |
| Overlegdatum: | 19 februari 2019 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba):<br>5.1.2.e (5.1.2.e<br>5.1.2.e (<br>5.1.2.e (<br>5.1.2.e (<br>Combinatie Rotterdamsebaan (CRB):<br>5.1.2.e 5.1.2.e )<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e ) |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | woensdag 20 maart 2019, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| 5.1.2.e | | |

5.1.2.e



5.1.2.e

Docnr22

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |

Docnr22

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| nnn | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | | Actiehouder |
|---|---|---|---|
| 6R | [redacted] | | |
| 036-05 | Afstemming met Hoogheemraadschap van Delfland en CRB m.b.t. knelpunt i.r.t. vergunningsvoorwaarden watervergunning Molenvlietpark door vertraging 2e toevoer.<br>*Actie aanhouden: Roba onderhoudt in eerste instantie het contact hierover met HHvD en informeert CRB.* | 6.8 | Roba |
| 1R | [redacted] | | |

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

N 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 20-03-17

Docnr23

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-004847 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 038** |
| Overlegdatum: | 20 maart 2019 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 16 april 2019, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr23

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| | BR | |
| 5.6 | Pagina 24-25, par 5.3, Ontwikkelingen /aandachtspunten uitvoering: de uitvoering van het Molenvlietpark en bijbehorende waterberging ontbreekt. | |
| | BR | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|




5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

8.2 Roba onderhoudt het contact met het Hoogheemraadschap van Delfland i.r.t. de vergunningsvoorwaarden m.b.t. watercompensatie en de vertraging van de 2e toevoer. Roba geeft aan dat CRB haar werkzaamheden kan uitvoeren en zich

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

geen zorgen hoeft te maken over de betreffende vergunningsvoorwaarden in haar watervergunningen. De afstemming met HHvD over de invulling van de betreffende vergunningsvoorwaarden is de verantwoordelijkheid van Roba.

BR

## 10 Actielijst

| nr. | Actie | nr. in verslag | Actiehouder |
|---|---|---|---|
| 036-05 | ~~Afstemming met Hoogheemraadschap van Delfland en CRB m.b.t. knelpunt i.r.t. vergunningsvoorwaarden watervergunning Molenvlietpark door vertraging 2e toevoer.~~<br>~~Roba onderhoudt in eerste instantie het contact hierover met HHvD en informeert CRB.~~<br>*Actie afgerond: Roba blijft contact onderhouden met HHvD. Eventuele knelpunten vallen onder de verantwoordelijkheid van Roba, maar worden niet als risico gezien.* | 6.8 | Roba |

BR

5.1.2 e

5.1.2 e

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

Namens CBR

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 16-06-19

Docnr24

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-005422 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 039** |
| Overlegdatum: | 16 april 2019 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| Afwezig: | - |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 14 mei 2019, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| [redacted] | | |

Docnr24

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

BR

## 6 Projectmanagement

6.1 BR

BR Naast deze Wijzigingen is afgesproken dat CRB de openstelling van 1 juli 2020 gestand doet en dat CRB "right of first refusal" krijgt voor de realisatie van de tweede watertoevoer. BR

BR

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr24

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| 8a | [redacted] | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

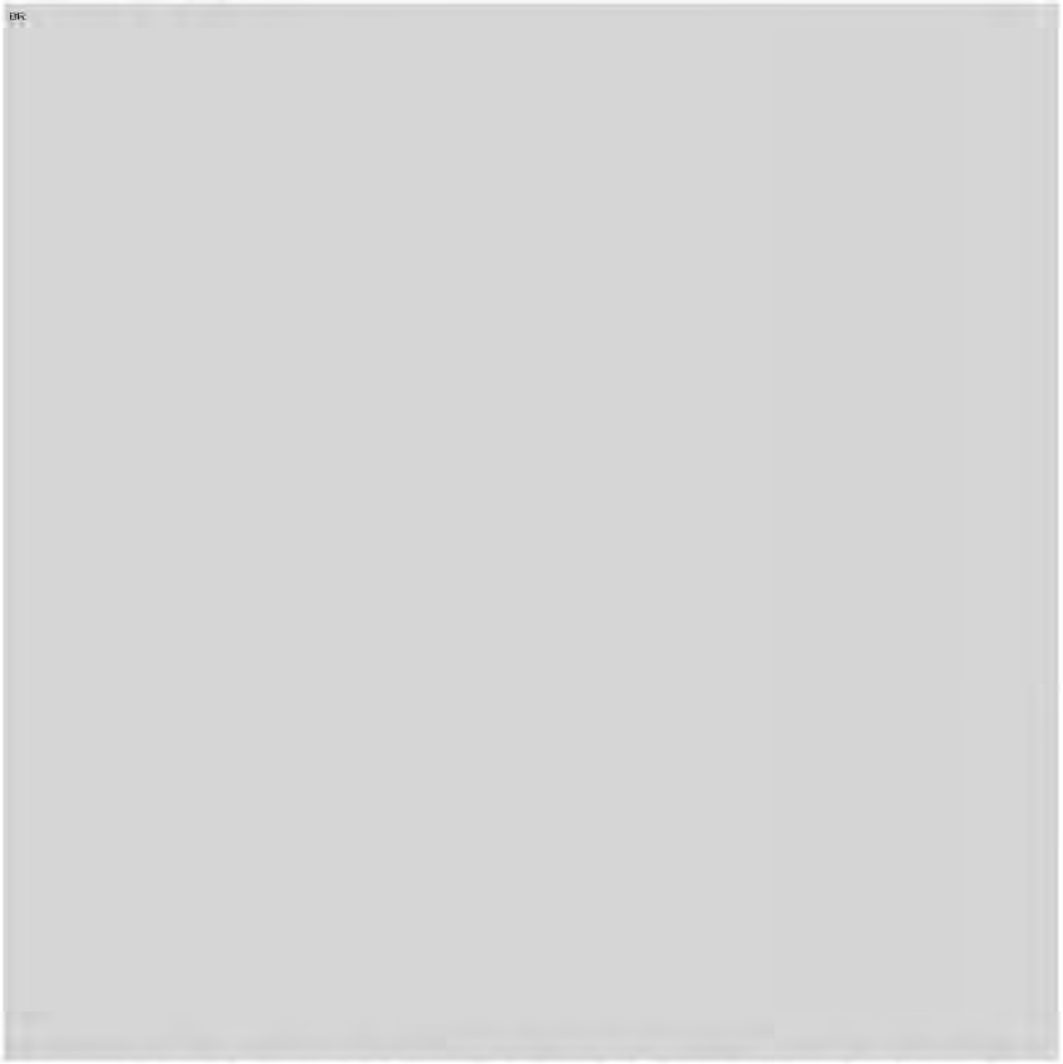

8.4 CRB heeft vernomen dat er in ieder geval één bezwaar is ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning bouwen voor de toegangsbrug naar het Molenvlietpark (brug I).

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

datum: 14-5-19

Docnr25

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

**Verslag**

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-005471 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 045** |
| Overlegdatum: | 17 september 2019 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e 5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 15 oktober 2019, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| RR | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| 60 | [redacted] | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

[redacted]

## 8 Omgeving

8.1 CRB meldt dat de laatste 3 omgevingsvergunningen voor het Molenvlietpark zijn verleend.

[redacted]

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| 88 | | |

Docnr25

RR

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 15-10-19

Docnr26

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-005548 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 053** |
| Overlegdatum: | 28 april 2020 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 26 mei 2020, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 8R | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr26

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| | BR | |

## 5 Voortgangsrapportage

5.1 Pag. 6, par. 3.1.3 Toelichting overall planning, Mijlpalen: Roba merkt op dat CRB voor het eerst de term "beschikbaar stellen" gebruikt m.b.t. de mijlpalen openstelling parkeerterrein Drievliet (CON002) en openstelling Molenvlietpark (CON003). Het is Roba niet duidelijk waarom dit begrip nu geïntroduceerd wordt, temeer het ook geen formele betekenis heeft. → CRB geeft aan niets anders dan voorheen te beogen en nog steeds te streven naar het openstellen op de genoemde mijlpalen en het afleveren en deelopleveren van deze onderdelen.

BR

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr26

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| 8R | [redacted] | |

Docnr26

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| [redacted] | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 7.5 | De openstelling van het Molenvlietpark zou medio mei 2020 plaatsvinden. Momenteel verwacht CRB dat dit pas op begin juni 2020 mogelijk is. 5.1.2.e is vanaf het heden ook het aanspreekpunt voor de GWW werkzaamheden. | |

RR

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr26

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | [redacted] | |

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 26-05-20

Namens CRB.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 26.05.2020

Docnr27

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-005561 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 055** |
| Overlegdatum: | 23 juni 2020 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba):<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Combinatie Rotterdamsebaan (CRB):<br>5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Afwezig: | - |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 21 juli 2020, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

5.1.2.e
5.1.2.e

Docnr27

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BR | [redacted] | |

5.1.2.e

Docnr27

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| 6R | [redacted] | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| | [redacted] | |

8.2 N.a.v. de openstelling van het eerste deel van het Molenvlietpark zijn diverse vragen ontvangen over het gebruik en de inrichting van het park. Roba en CRB proberen deze berichten gezamenlijk te beantwoorden.

[redacted]

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr27

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | [redacted] | |
| | 5.1.2.e | |
| | 5.1.2.e | |
| | 5.1.2.e | |

Docnr27

akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

5.1.2.e

Namens CRB,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 21-07-2020

Docnr28

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-005599 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 056** |
| Overlegdatum: | 21 juli 2020 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( ) |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 18 augustus 2020, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |



5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

[redacted]

5.3 Pag. 7, par. 3.1.2, Mijlpalen toegevoegde Overallplanning rev L, CON111(c): In de rapportage staat dat het Molenvlietpark Noord is opgeleverd. Roba merkt op dat het onderdeel van het Werk 'Molenvlietpark Noord' met uitzondering van het subonderdeel 'Westvlietweg' is opgeleverd.

[redacted]

5.1.2 e

5.1.2 e

Docnr28

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| nr. | | |

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 6R | [redacted] | |

5.1.2.e

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag

Namens Roba

datum:

Docnr29

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-005606 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 057** |
| Overlegdatum: | 18 augustus 2020 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | Combinatie Rotterdamsebaan (CRB): |
| | 5.1.2.e (5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e ( |
| | 5.1.2.e ( |
| Afwezig: | 5.1.2.e ( ) |
| | 5.1.2.e ( |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | dinsdag 15 september 2020, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr29

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| BR | [redacted] | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |
| 8.5 | Roba heeft op 19 augustus a.s. een gesprek met de twee bewoners in Park Hoornwijck n.a.v. hun reactie op de gerealiseerde aflaatconstructie in het Molenvlietpark. Roba zal daarbij de maatregelen voor de verbeterde inpassing van de aflaatconstructie presenteren. Na vaststelling van de definitieve aanpak zal Roba met CRB nagaan of de betreffende werkzaamheden dit najaar uitgevoerd kunnen worden. | |
| BR | | |
| 5\|2= | | |

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 15-09-2020

Docnr30

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-005641 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 002 t.a.v. beheer en exploitatiefase** |
| Overlegdatum: | 18 januari 2021 |
| Locatie: | Laan van Hoornwijck 80 Den Haag, Benedenkamer |
| Aanwezig: | Tunnelbeheerorganisatie gemeente Den Haag<br>5.1.2.e (5.1.2.e)<br>5.1.2.e ( )<br>Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba):<br>5.1.2.e (5.1.2.e)<br>5.1.2.e ( )<br>Combinatie Rotterdamsebaan (CRB):<br>5.1.2.e (5.1.2.e)<br>5.1.2.e ( ) |
| Afwezig: | - |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | Maandag 15 februari 2021, 9.30-11:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| 5.1.2.e | | |

5.1.2.e

5.1.2.e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| [redacted] | | |

5.1.2 e

5.1.2 e

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

BR

## 7 Omgeving

7.1 BR

BR Roba heeft ook nog contact met het Hoogheemraadschap van Delfland in verband met de waterberging en realisatie van een extra watertoevoer. CRB kan contact hebben met Delfland als reguliere waterbeheerder. Roba ziet Rijkswaterstaat als wegbeheerder ook als belangrijke stakeholders voor CRB. Voor de realisatie zijn Roba en Rijkswaterstaat zo goed als gereed. → PKE zal binnenkort bij Drievliet een kennismakingsgesprek aanvragen, mede wegens de gezamenlijke beheerverantwoordelijkheid van een watergang.

BR

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Docnr30



Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.

Namens Roba

5.1.2.e

5.1.2.e

Nam 5.1.2.e

5.1.2.e

Projectmanager

datum: ex 03 2021

Docnr31

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

| | |
|---|---|
| Kenmerk: | ROBA-VER-005681 |
| Auteur: | 5.1.2.e |
| Naam overleg | **Projectoverleg Rotterdamsebaan 069** |
| Overlegdatum: | 24 augustus 2021 |
| Locatie: | Binckhorstlaan 340 (Trefpunt) Den Haag |
| Aanwezig: | Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba):<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>Combinatie Rotterdamsebaan (CRB):<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>) |
| Afwezig: | 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Bijlage(n) verslag: | - |
| Datum volgend overleg: | Dinsdag 21 september 2021, 10.00-12:00 uur |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

5.1.2.e

Docnr31

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| 98. | | |

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|

## 7 Projectbeheersing

7.1 CRB vraagt hoe Roba denkt om te gaan met het openstaande punt bij het trekpontje in het Molenvlietpark in het kader van het einde van de onderhoudstermijn van CRB. → Roba heeft recent geconstateerd dat het pontje wederom is omgeduwd, waarna het pontje door de beheerder aan de ketting is gelegd. De beheerder gaat eerst in gesprek met de leverancier en het keurmerkinstituut. Roba zal CRB over de uitkomsten van dit gesprek en eventuele vervolgacties op de hoogte houden.

Docnr31

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | [redacted] | |

Getekend voor akkoord, behoudens opmerkingen volgend verslag.
Namens Roba,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

datum: 21-

5.1.2.e

Den Haag

Gemeente Den Haag
Projectorganisatie Rotterdamsebaan

# Verslag

Kenmerk: ROBA-VER-005689

Auteur:

Naam overleg **Projectoverleg Rotterdamsebaan 071**

Overlegdatum: 26 oktober 2021
Locatie: Binckhorstlaan 340 (Trefpunt) Den Haag
Aanwezig: Projectorganisatie Rotterdamsebaan (Roba):
5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
Combinatie Rotterdamsebaan (CRB):
5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
Afwezig:
Bijlage(n) verslag: -
Datum volgend overleg: -

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
|---|---|---|
| BR | | |

Docnr32

| Item nr. | Beschrijving | Actiehouder |
| --- | --- | --- |
| [redacted] | | |

[redacted]

9.6 Roba geeft aan dat de deelopleverdossiers m.b.t. de calamiteitenberging en de Laan van Delfvliet vandaag geaccepteerd zullen worden. De deelopleverdossiers m.b.t. ontsluiting Drievliet en de Binckhorst zijn informeel afgestemd. De informele toets van het deelopleverdossier Molenvlietpark West & Noord staat nog open.

[redacted]

Getekend voor akkoord,
Namens Roba,

5 1 2e

5 1 2e

datum:

Namens CRB,

5 1 2e

5 1 2e

datum:

| Document nummer | Bestandsnaam export | Weigeringsgrond | Tags |
|---|---|---|---|
| 00001 | ROBA-VER-005424.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00002 | ROBA-VER-005435.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00003 | ROBA-VER-005468.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00004 | ROBA-VER-005479.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00005 | ROBA-VER-005491.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00006 | ROBA-VER-005517.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00007 | ROBA-VER-005546.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00008 | ROBA-VER-005553.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00009 | ROBA-VER-005564.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00010 | ROBA-VER-005615.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00011 | ROBA-VER-005623.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00012 | ROBA-VER-005632.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00013 | ROBA-VER-005668.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00014 | ROBA-VER-005676.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00015 | ROBA-VER-004501.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00016 | ROBA-VER-004525.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00017 | ROBA-VER-004547.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00018 | ROBA-VER-004638.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00019 | ROBA-VER-004646.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00020 | ROBA-VER-004707.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00021 | ROBA-VER-004748.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00022 | ROBA-VER-004765.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00023 | ROBA-VER-004788.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00024 | ROBA-VER-004819.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00025 | ROBA-VER-004830.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00026 | ROBA-OG-BSO-VER-0004.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00027 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0096.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00028 | ROBA-VER-004430.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00029 | ROBA-VER-004458.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 5 | ROBA-OG-BSO-00-VER-0003.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 3 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0075.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 2 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0081.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 1 | ROBA-VER-004329.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 6 augustus 2019 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

BR

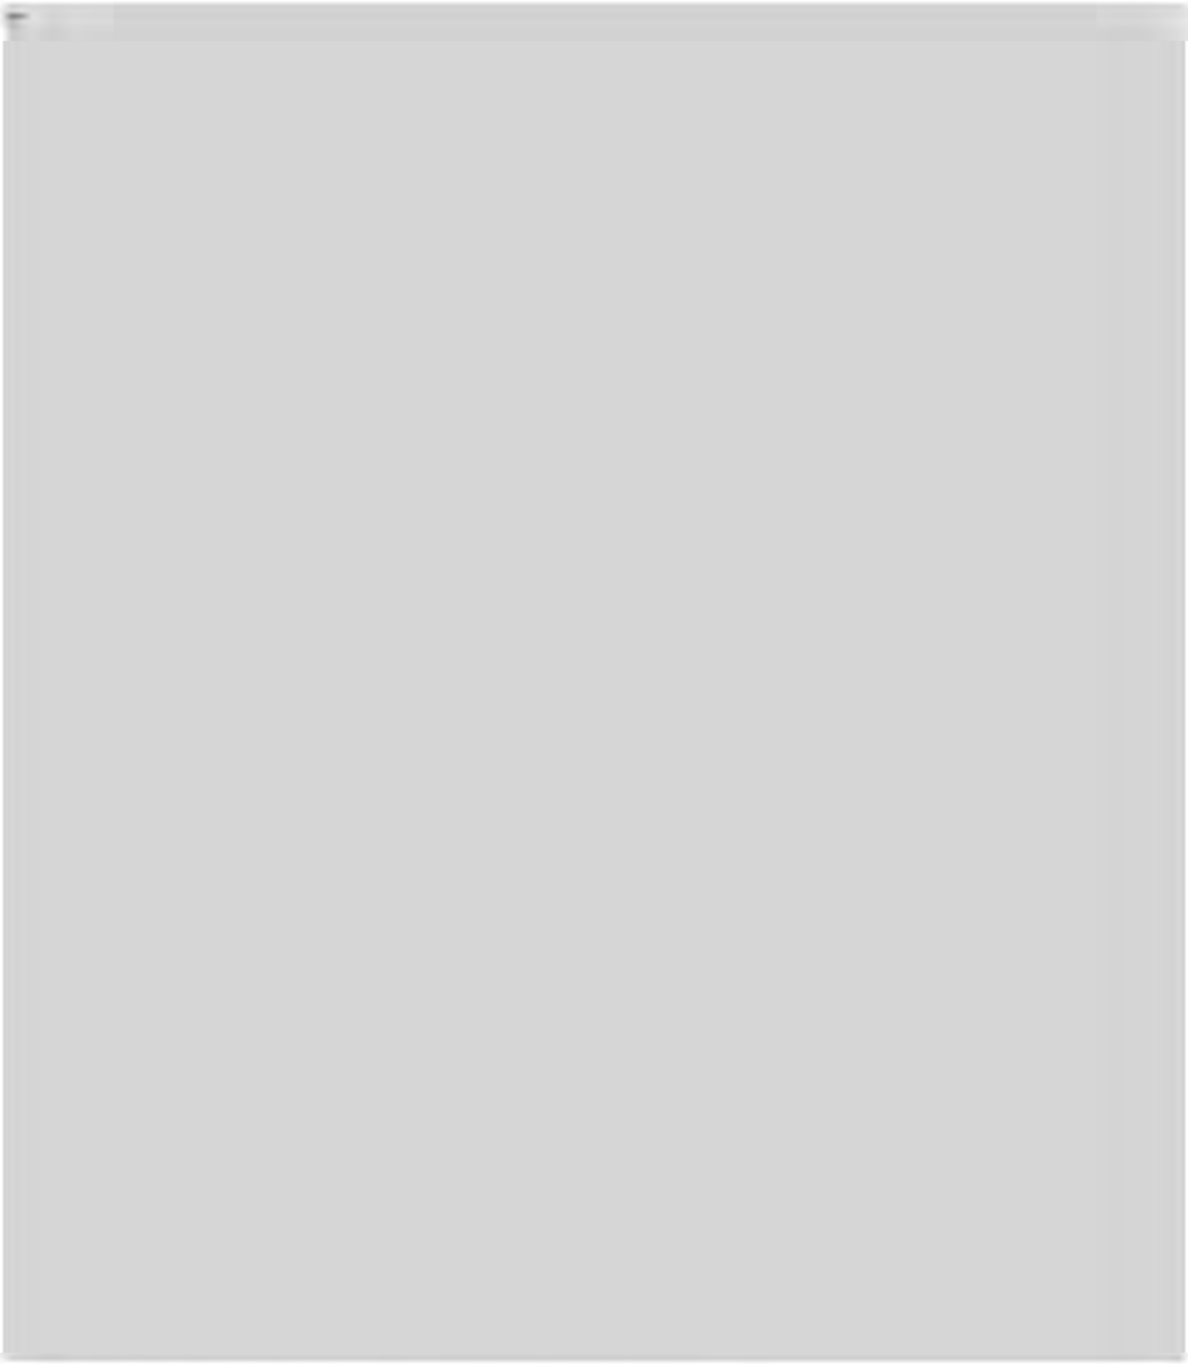

**7. Stand van zaken project (standaard agendapunt)**

Gevraagd: Toelichting door 5.1.2e

Besproken:

- 5.1.2e heeft de belangrijkste actuele werkzaamheden toegelicht, waaronder SOK met provincie, tweede watertoevoer, herinrichting kruising Binckhorstlaan, CRB heeft 100% social return opgave behaald, project Trekfietstracé kan zonneboom alleen realiseren als er een beheerder is, fietsviaduct wordt 8-10 augustus boven Rijkswegen gemonteerd.

Besloten: Besproken.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr2

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 12 juni 2019 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

BR

- Na 1 juli 2020 zullen nog diverse werkzaamheden in de omgeving afgerond moeten worden, zoals het Molenvlietpark en de tweede watertoevoer. Particuliere grondeigenaar heeft wederom bevestigd mee te zullen werken aan de realisatie van de tweede watertoevoer.

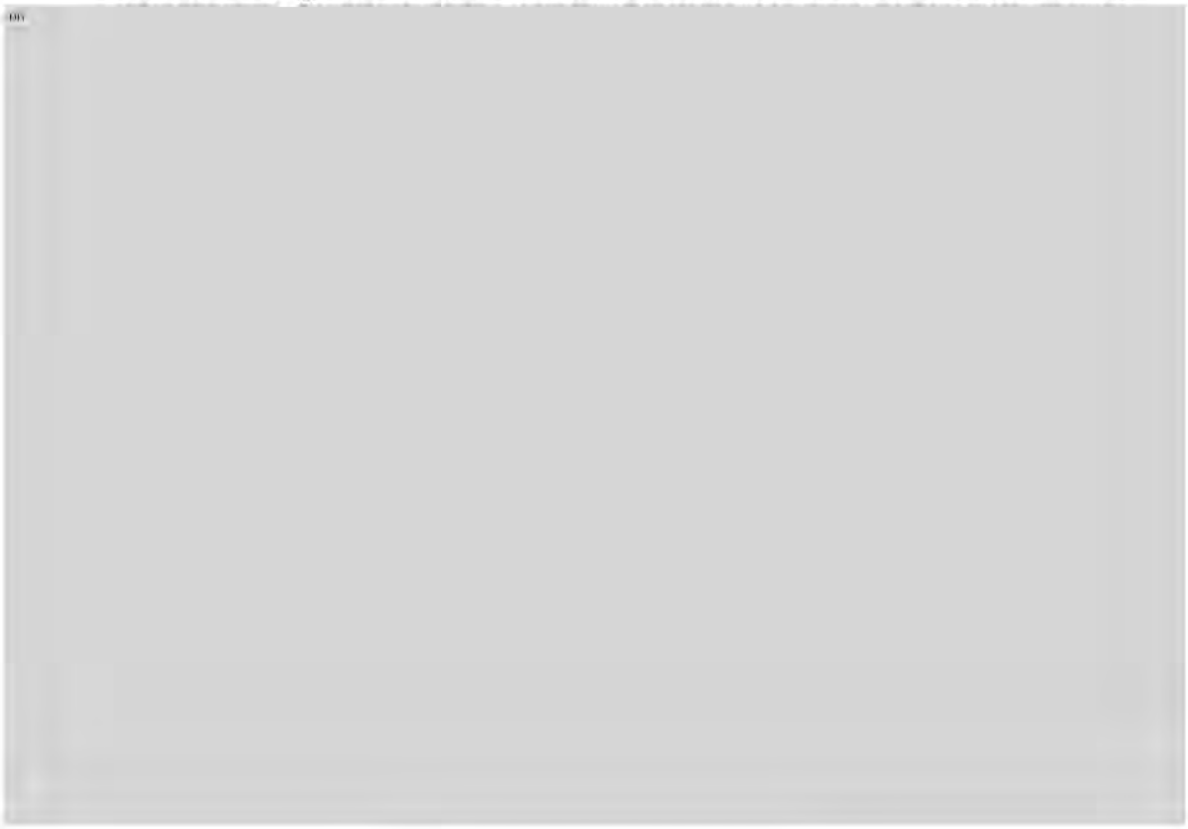

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 3 september 2019 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

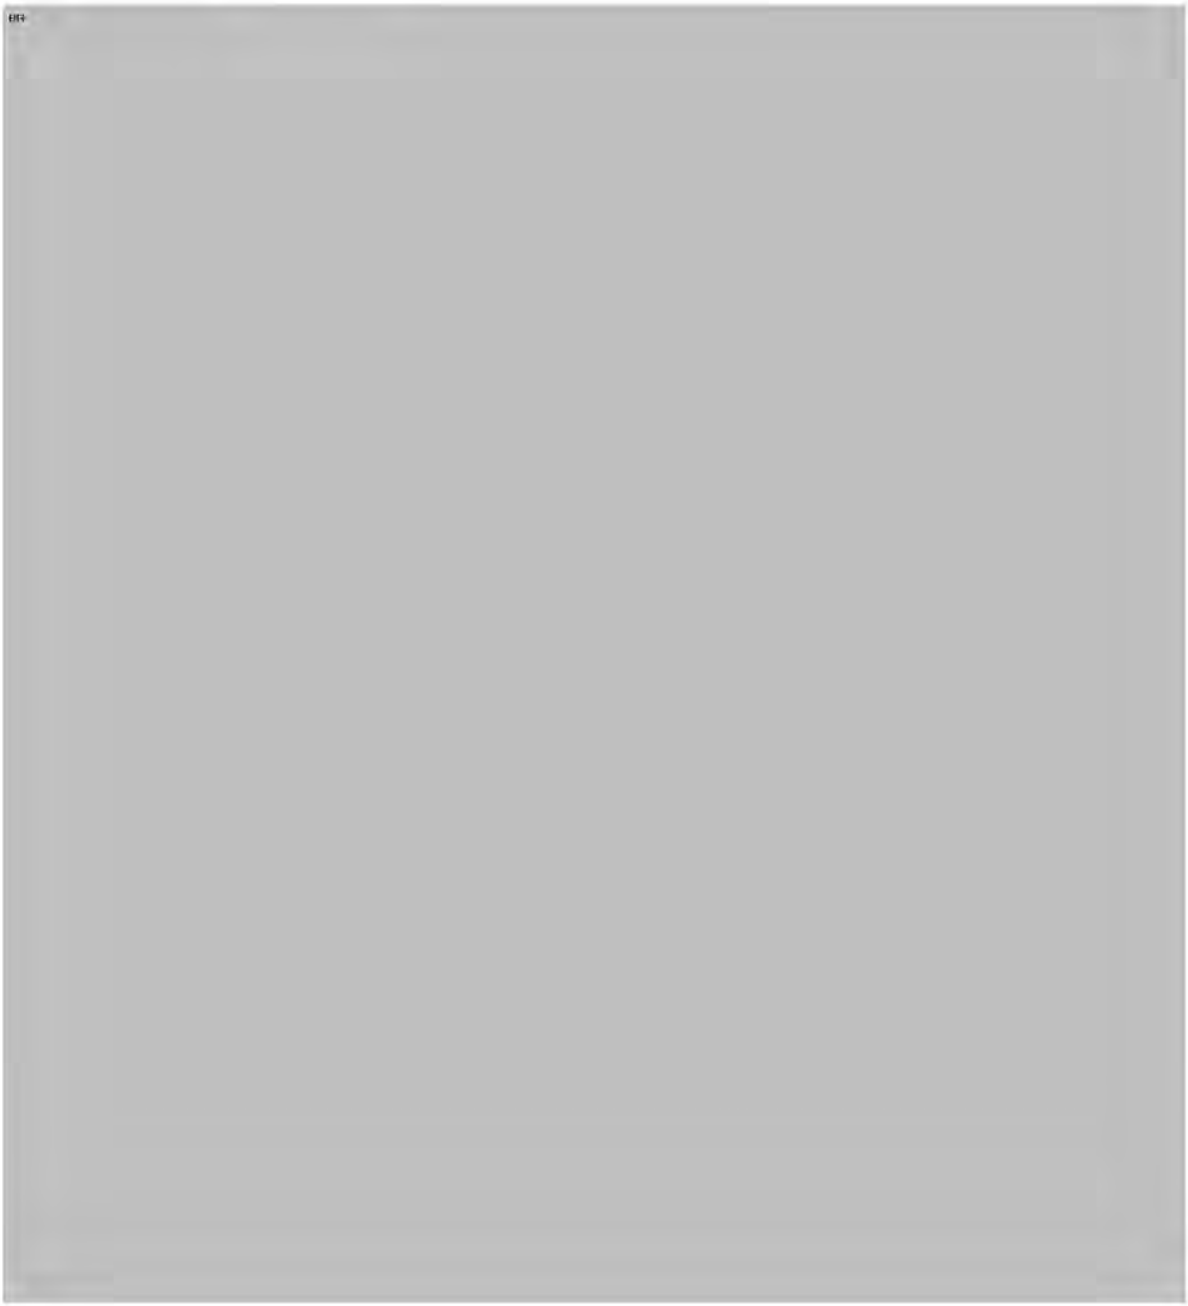

- Sok 2e watertoevoer kan bijna ondertekend worden.



o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr4

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 1 oktober 2019 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

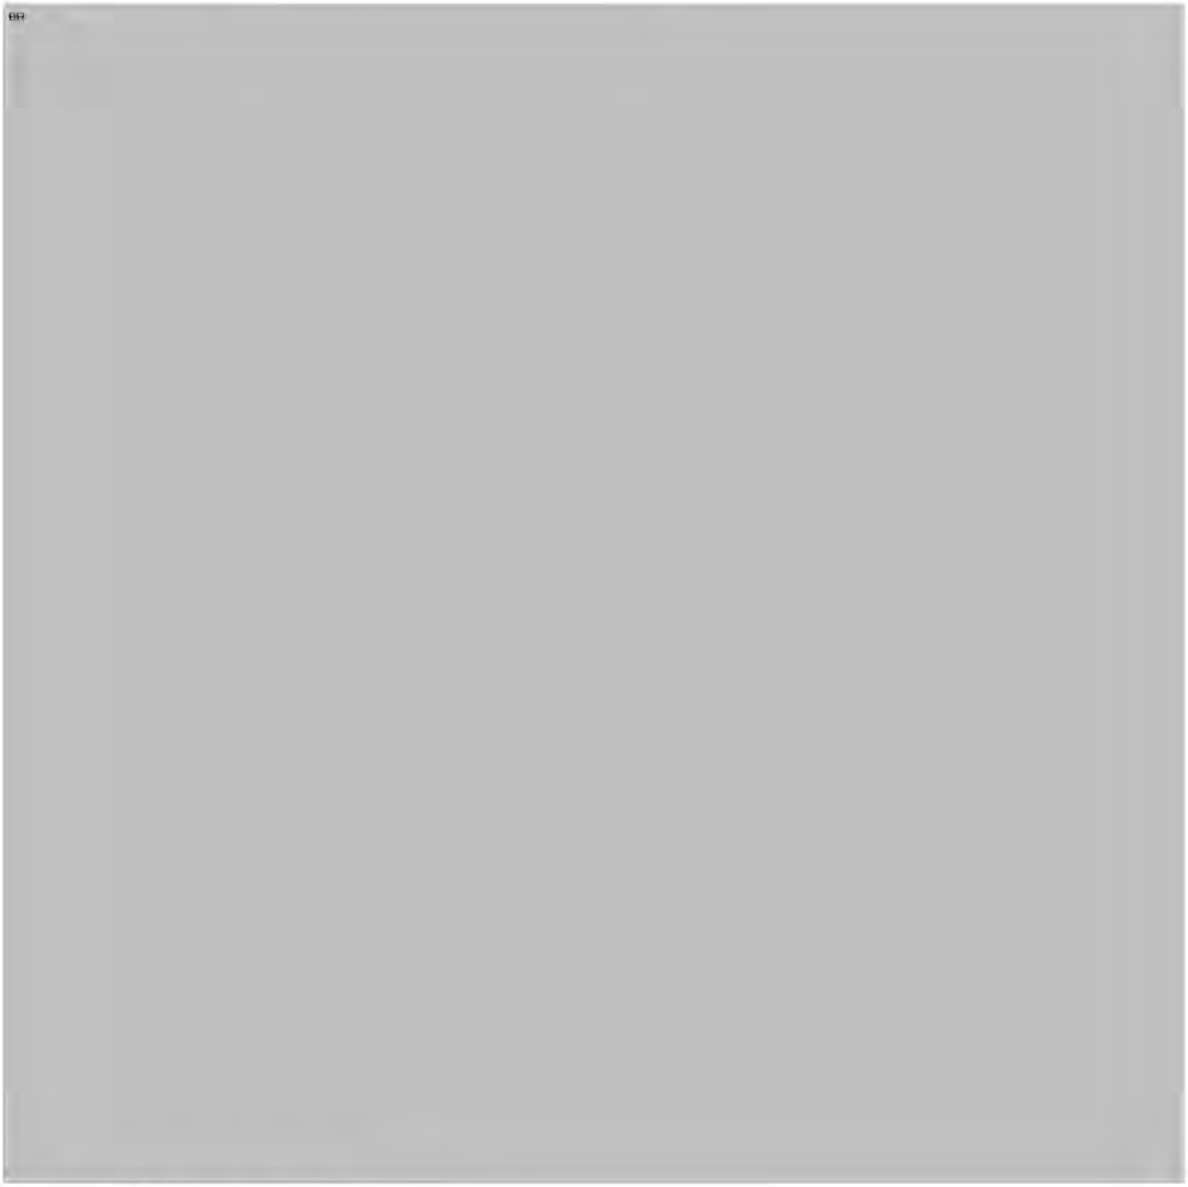

## 5. Tweede watertoevoer

Gevraagd: Toelichting door 5.1.2.e

Besproken:

- De laatste punten van de samenwerkingsovereenkomst met 5.1.2.e dienen beslecht te worden. De concept-akte is ook aan hem aangeboden. Het moment van onherroepelijke afgifte van de kapvergunning voor de tweede toevoer is een planningsrisico.

Besloten: Besproken.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 3 december 2019 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

- Molenvlietpark:
  - inrichting gaat gestaag door. Omwonenden stellen nog diverse vragen over het beplantingsplan en de aflaatconstructie.
  - Daarnaast beoordeeld SAOZ een tweetal planschadeverzoeken welke eerder door adviescommissie bezwaarschriften van Den Haag zijn toegewezen en door adviescommissie van het Schadebureau Rotterdamsebaan waren afgewezen. Na de eventuele toekenning van de planschade dient de hoogte van een vergoeding nog te worden bepaald.
  - De kapvergunning voor de 2e watertoevoer verwachten wij pas in 1e kwartaal 2020. Daarna kunnen zienswijzen worden ingediend en dus zullen de bomen waarschijnlijk niet voor het broedseizoen (15 maart) gekapt worden.

- Voor de realisatie van de 2e watertoevoer wordt een bestek opgesteld waarop CRB the right of first refusal heeft. Indien CRB geen aanbieding maakt zal het werk worden aanbesteed.
- Onderhoud van tijdelijke hellingbaan Drievliet is kostbaar en dus zal de projectorganisatie aan Drievliet voorstellen deze te vervangen door een grondmassief. Beheer ligt vooralsnog bij Den Haag. Een definitieve hellingbaan wacht op de planvorming van Drievliet. Drievliet dient daarvoor contractueel binnen een paar jaar een vergunning aan te vragen.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 13 februari 2020 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

BR

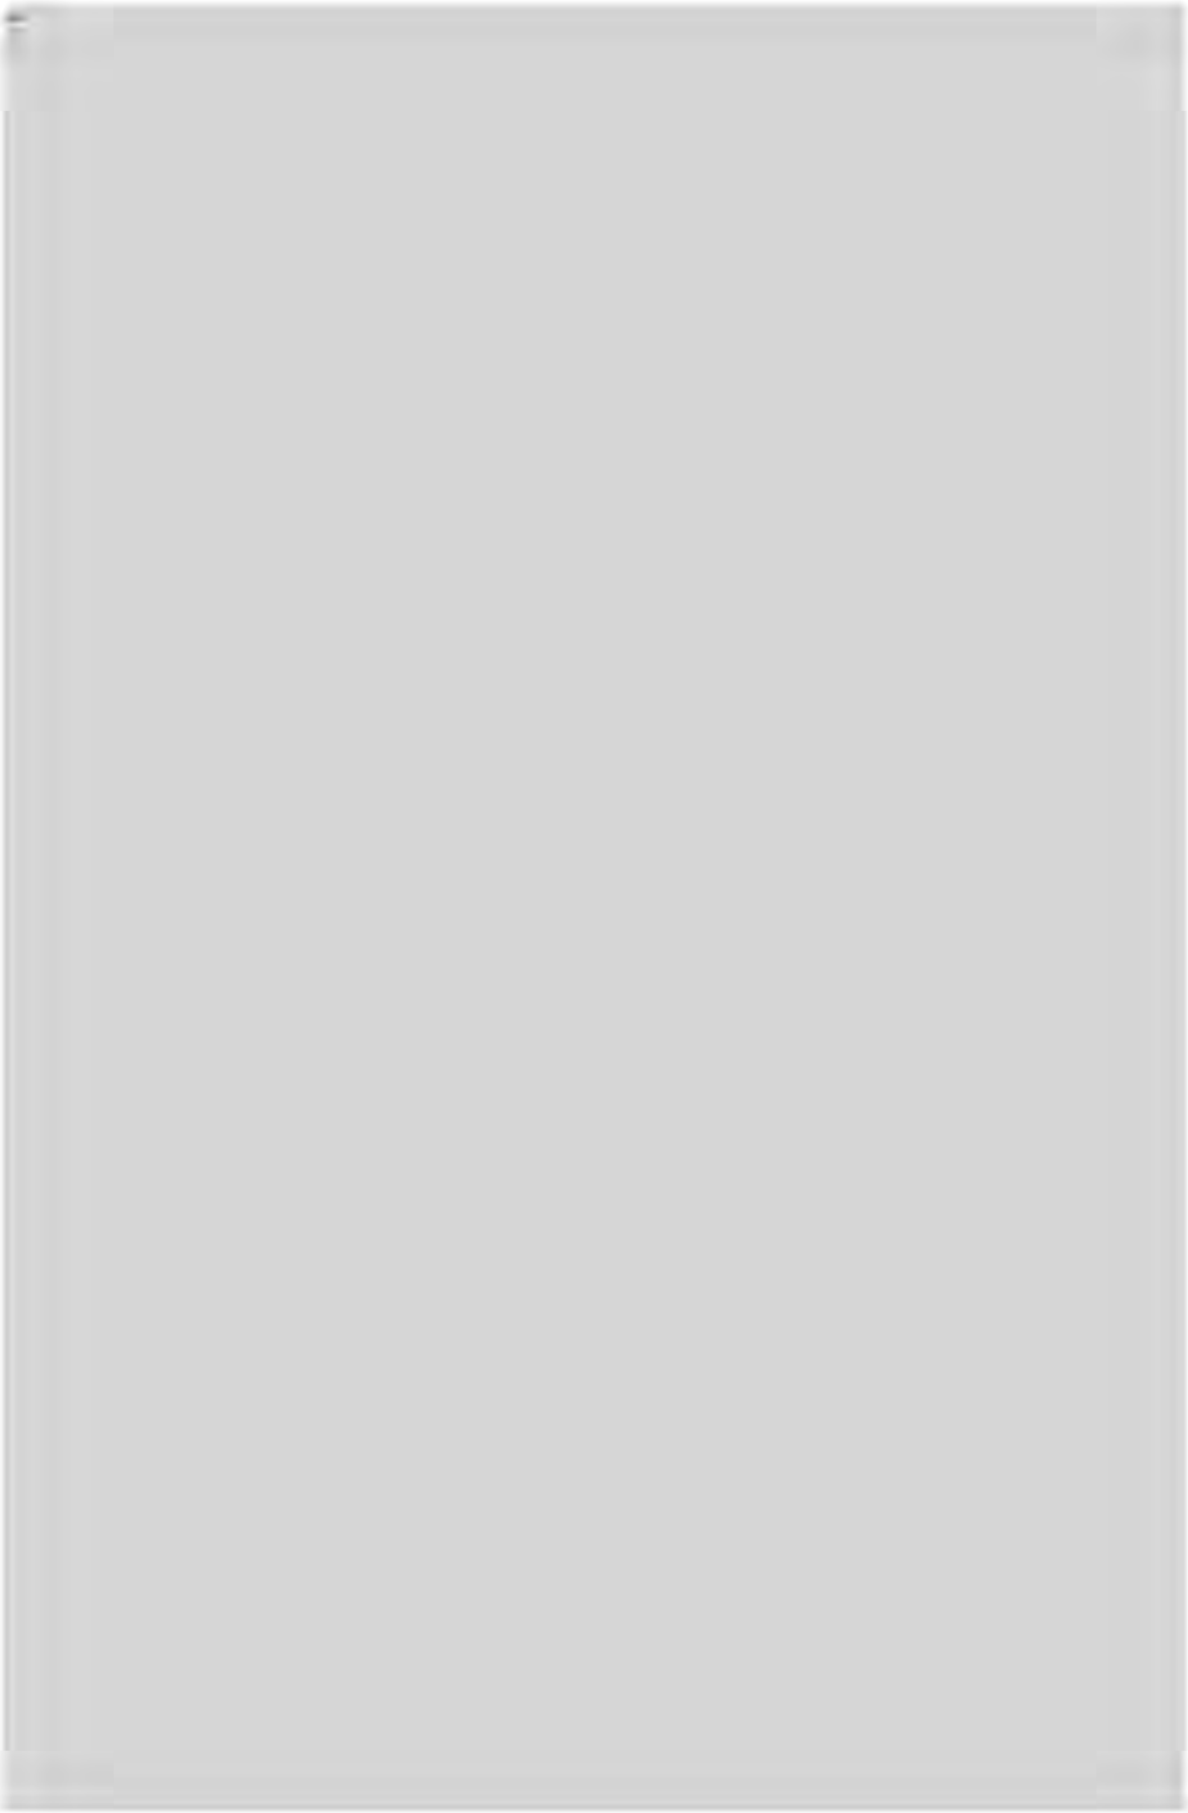

## 9. Rondvraag en sluiting

- 5.1.2.e meld dat hij graag in aanwezigheid van 5.1.2.e in dit OGON gemeld had dat:
  - De particuliere grondeigenaar de samenwerkingsovereenkomst voor de tweede watertoevoer vooralsnog niet wil ondertekenen omdat hij een conflict heeft met gemeente en provincie over de voorgenomen woningbouw. Ondanks de afspraken zoals vastgelegd in het PUK Nieuw Vredenoord wil DSO geen bestemmingsplan opstellen.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 16 april 2020 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

[redacted]

## 4. Tweede watertoevoer

Gevraagd: Bespreken.

Besproken:

- Het verkrijgen van een onherroepelijke kapvergunning en overeenstemming met de grondeigenaar zijn vertraagd en momenteel is onbekend wanneer deze twee traject worden afgerond. De realisatie van de tweede watertoevoer zal hierdoor ook later plaatsvinden en daarom niet door CRB worden uitgevoerd, maar door een via een aanbesteding nog te selecteren aannemer. Ten tijde van de realisatie is ook de projectorganisatie Rotterdamsebaan grotendeels afgebouwd zodat met IbDH besproken wordt of zij het technisch management kunnen verzorgen in aanvulling op 5.1.2.e (PM), 5.1.2.e 5.1.2.e (OM) en 5.1.2.e (waterbouwkundig deskudige).

- 5.1.2e gaat vooruitlopend op de realisatie van de tweede watertoevoer binnenkort met Hoogheemraadschap in gesprek over oplevering en overdracht van de waterberging in het Molenvlietpark.
- 5.1.2e vindt het jammer dat de grondeigenaar een relatie blijft leggen tussen het uitvoeren van zijn particuliere ontwikkeling en de door de gemeente gewenste realisatie van de tweede watertoevoer. → 5.1.2e geeft aan dat met de eigenaar was afgesproken dat hij medewerking verleend aan de tweede watertoevoer op het moment de gemeente het concept-bestemmingsplan voor zijn ontwikkeling in procedure brengt. De gemeente heeft daarmee gewacht in verband met de gesprekken met de provincie.
- 5.1.2e vraagt om een toelichting aangaande de voorziene overeenkomst met de naastgelegen woningeigenaar. → 5.1.2e geeft aan dat er concept-afspraken gemaakt zijn over wederzijdse grondruil t.b.v. het beter kunnen uitvoeren van de aansluiting Molenslootpad. Deze overeenkomst ligt klaar, maar wordt pas ondertekend als gemeente overeenstemming heeft met de particuliere ontwikkelaar. Er zijn hier dus geen onderhandelingen meer met een potentieel effect op de planning.
- 5.1.2e vraagt of de afgifte van de kapvergunning ingepland kan worden? → 5.1.2e geeft aan dat het projectteam de kapvergunning in oktober 2018 heeft aangevraagd. Later is de wet natuurbeheer aangehaakt i.v.m. mogelijke verblijfplaats vleermuizen. Dit heeft effect gehad op de doorlooptijd, maar momenteel wordt er lang gewacht op een verklaring van geen bedenkingen vanuit de ODH. → 5.1.2e wil binnenkort geïnformeerd worden of de ODH inmiddels heeft gereageerd.

Besloten: Besproken.

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 12 mei 2020 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

5.1.2.e

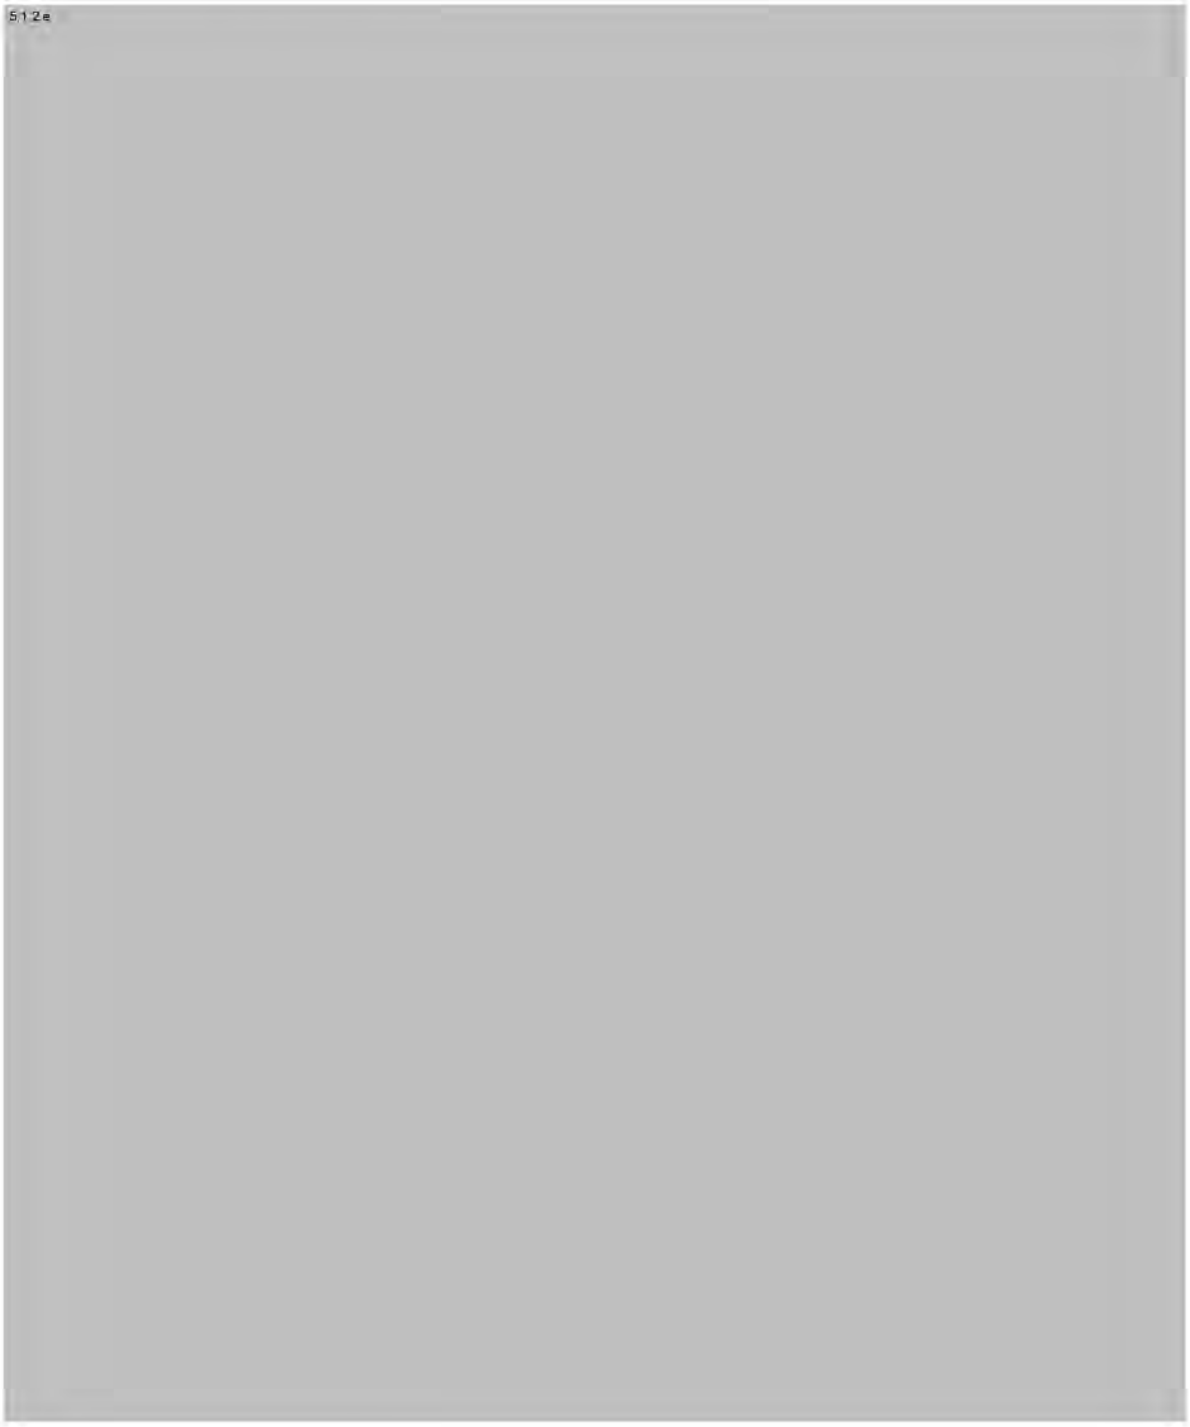

- In de Vlietzoom wordt het Molenvlietpark afgerond zodat het volgende maand op een alternatieve /creatieve wijze kan worden opengesteld voor bezoekers.

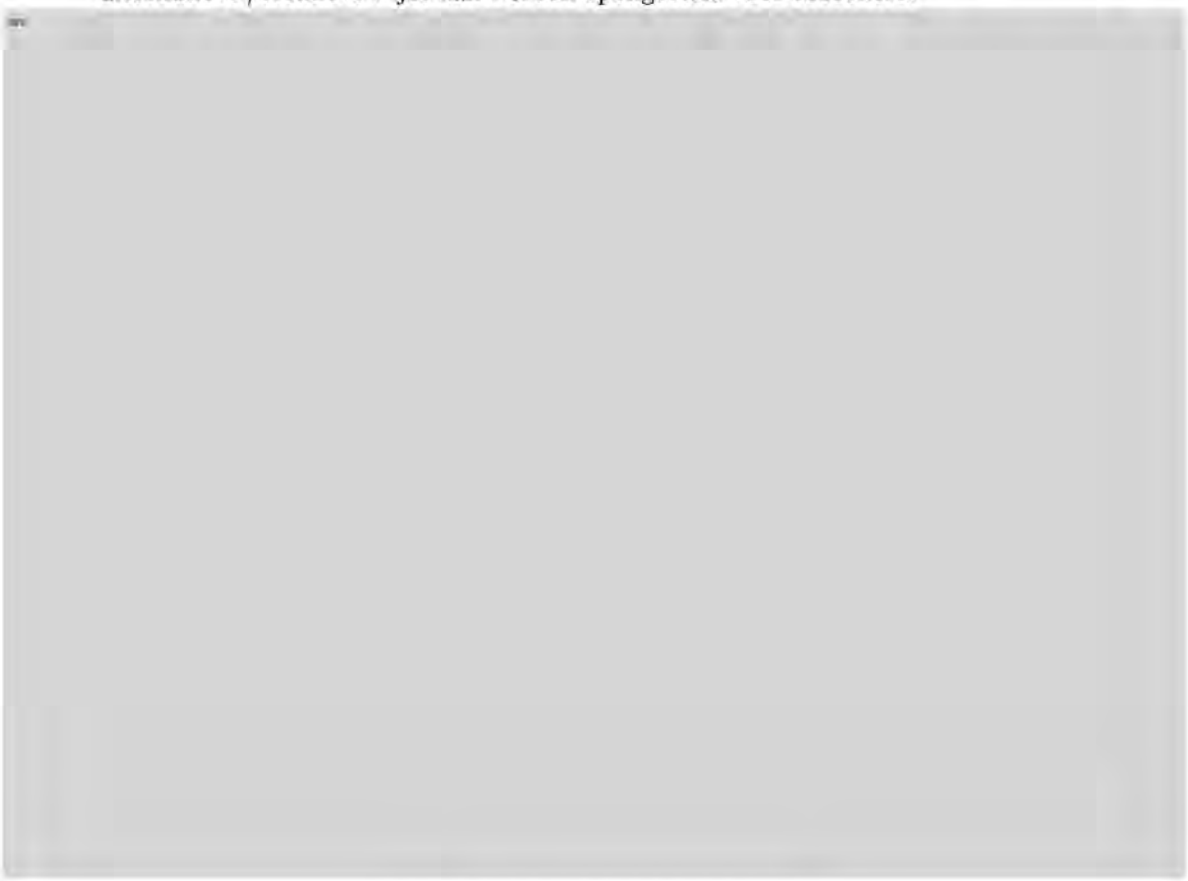

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 7 juli 2020 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | |

[redacted]

## 3. Ontruimen Molenvlietpark in geval van waterberging (bijlage)

Gevraagd: Bespreken welke beheerder namens Den Haag verantwoordelijk wordt voor het afsluiten van het Molenvlietpark voorafgaand aan een inundatie van de waterberging.

Besproken:

- 5.1.2.e Den Haag een Hoogheemraadschap hebben samenwerkingsovereenkomst voor waterberging in Molenvlietpark. Voorafgaand aan inundatie moet het park ontruimd en afgesloten worden. Geen van de beheerders willen deze taak op zich nemen. → 5.1.2.e is voornemens om in gesprek te treden met Stedelijk Beheer en het Hoogheemraadschap. 5.1.2.e zal dit gesprek initiëren.

[redacted]

## 6. Stand van zaken project (standaard agendapunt)

Gevraagd: Toelichting door 5.1.2e

Besproken:

- 5.1.2e op termijn zal er een 2e watertoevoer gerealiseerd moeten worden om de waterberging sneller met water te vullen. Recent heet gesprek plaatsgevonden met de particuliere grondeigenaar. Als er geen minnelijke overeenstemming mogelijk blijkt, zal Den Haag een bieding moeten doen voor aankoop van de betreffende grond en in het uiterste geval een onteigeningstraject starten. In verband met de totale planning zal Den Haag het Hoogheemraadschap moeten informeren over het potentiele risico t.a.v. tijd en geld. → 5.1.2e dit onderwerp mogelijk betrekken in hetzelfde gesprek met Hoogheemraadschap. → 5.1.2e spreekt 13 juli met 5.1.2e van DSO/Grondzaken over de diverse scenario's.
- 5 juni is eerste deel van het Molenvlietpark opengesteld voor het publiek.

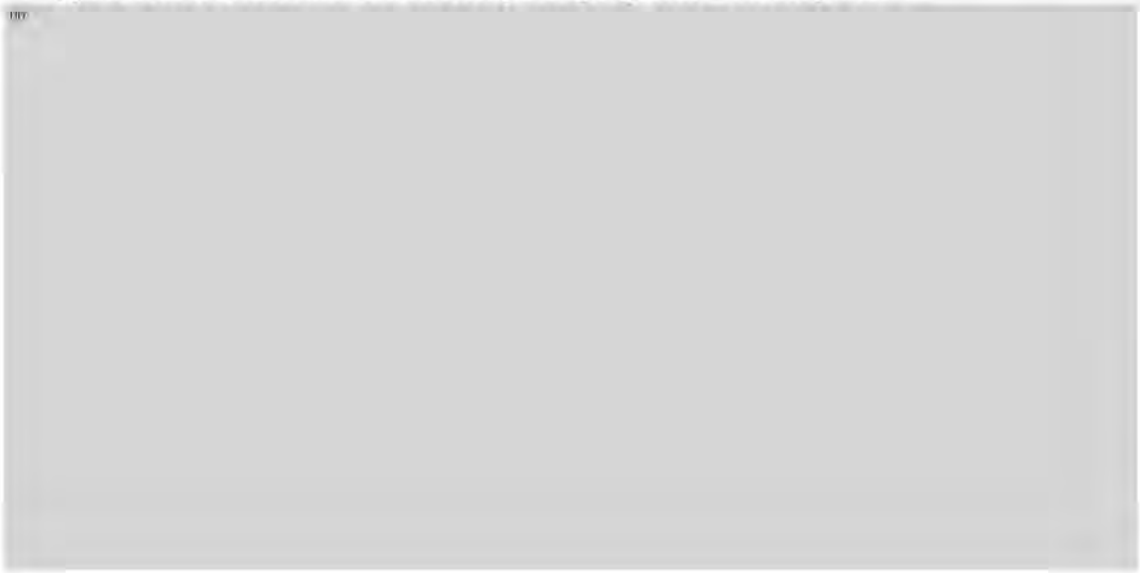

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 29 september 2020 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | |

BR

## 4. Afsluiten waterberging voorafgaand aan inundatie waterberging

Gevraagd: De projectorganisatie verzoekt het OGON om binnen Den haag te bepalen welke afdeling gebeld wordt zodra het Hoogheemraadschap de waterberging wil inunderen en daarop het Molenvlietpark (laat) ontruimen en afsluiten.

Besproken:

- 5.1.2.e erkent de rol voor de gemeente Den Haag en verwacht dat Stedelijk Beheer hier voor Delfland het aanspreekpunt kan zijn i.v.m. de overige taken van deze afdeling aangaande wateroverlast / waterbeheer. Zij werken hierbij al geregeld samen met Delfland.

Besloten:

- 5.1.2.e gaat in gesprek met Stedelijk Beheer om hen te verzoeken invulling te geven aan deze taak van Den Haag.

BR

- De tweede watertoevoer is door de projectorganisatie nog in voorbereiding, waardoor het niet logisch lijkt dat de projectorganisatie dit de aankomende jaren verder uitwerkt, aanbesteed en realiseert. 5.1.2e heeft de lijnorganisatie gevraagd een team te formeren. 5.1.2e heeft daarop het IbDH gevraagd of zij dit team kunnen formeren. 5.1.2e heeft een suggestie voor een 5.1.2e aan 5.1.2e gedaan, als IbDH deze zelf niet heeft.

Besloten: Besproken.

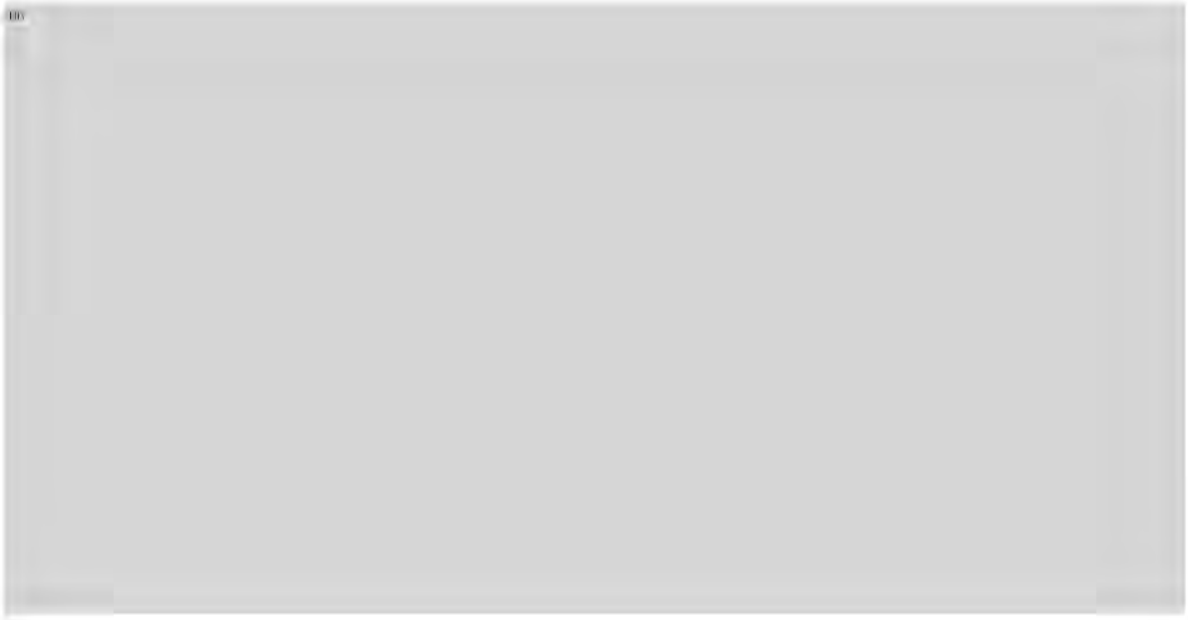

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr11

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 27 oktober 2020 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

BR

## 2. Verslag vorig overleg

Gevraagd: Vaststellen verslag 29 september.

Besproken:

- 5.1.2.e heeft n.a.v. de afspraak over het ontruimen van het Molenvlietpark gesproken met Stedelijk Beheer en afzonderlijk het stadsdeel. Binnenkort gesprek met Stedelijk Beheer en het betreffende stadsdeel. Actie blijft actueel.

Besloten: Vastgesteld.

BR

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 10 december 2020 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

[redacted]

- 5.1.2.e meldt dat hij een contactpersoon voor HHD gevonden heeft in geval van inundatie waterberging Molenvlietpark. De officier van dienst (bestuursdienst) kan gebeld worden en die zet de actie vervolgens uit bij de piketdienst van DPZ/stadsdeel. Stadsdeel maakt momenteel een intern werkprotocol zodat het Molenvlietpark tijdig wordt ontruimd en afgezet.

Besloten: Vastgesteld.

## 3. Verzelfstandigen project Tweede watertoevoer

Gevraagd 1: Toelichting door 5.1.2.e

Besproken 1:

- Particuliere grondeigenaar heeft nog geen inrichtingsplan voor zijn beoogde ontwikkeling aan Roba verstrekt. Zodra die er is kan Roba haar inrichtingsplan afronden, definitieve financiële afspraken met Hoogheemraadschap maken en de SOK met de grondeigenaar.
- 5.1.2.e meldt dat gemeente een beoogd 5.1.2.e voor het te verzelfstandigen project heeft. 5.1.2.e biedt aan hem gedurende het 1e kwartaal 2021 een overdrachtsperiode te laten hebben bij de projectorganisatie Roba. → 5.1.2.e meldt dat gemeente de beoogde 5.1.2.e zal contracteren en hij na de verzelfstandiging gaat rapporteren aan een nieuwe ambtelijk opdrachtgever.

Besloten 1: Besproken.

Gevraagd 2: Agenderen in stuurgroep.

Besloten 2: Niet agenderen in stuurgroep.

[redacted]

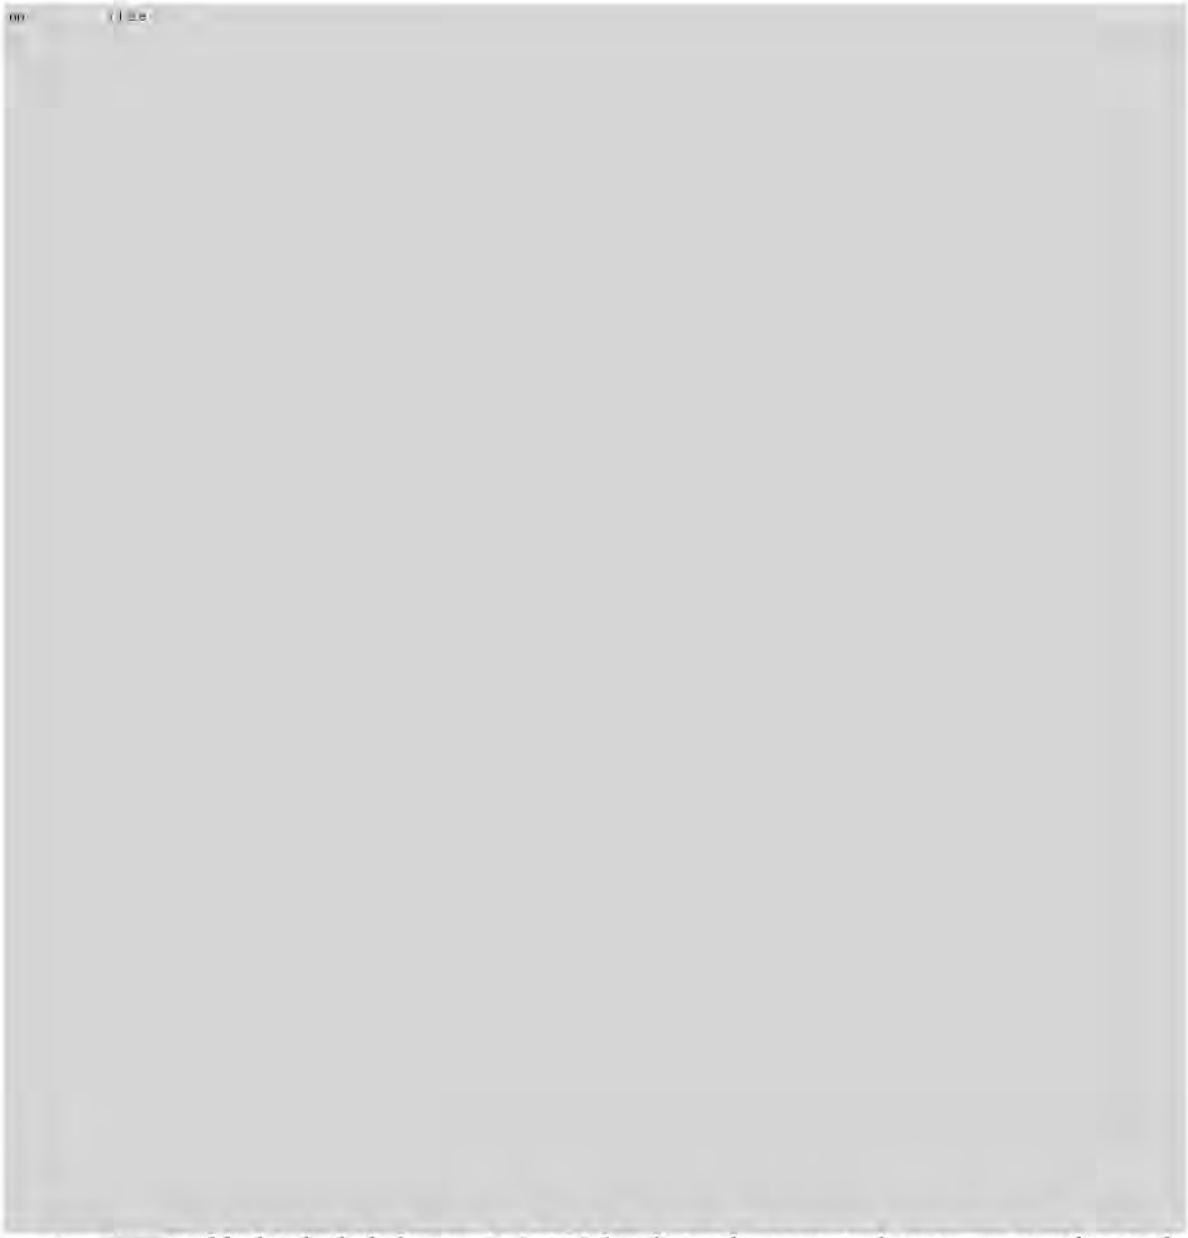

- [redacted] meldt dat de dode bomen in het Molenvlietpark momenteel vervangen worden en de Heemtuin wordt aangeplant. Op de ooievaarspaal in het Molenvlietpark zijn de eerste ooievaars gesignaleerd.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 11 mei 2021 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

BR

## 4. Scopemutatie 34: Verbijzonderen project Tweede Watertoevoer

Gevraagd: Vaststellen en agenderen in stuurgroep.

Besproken:

- 5.1.2.e Aangezien de contouren voor het project Tweede Watertoevoer bijna zijn geformaliseerd, wordt voorgesteld om er een apart project van te maken Dit via de reguliere Rotterdamsebaan-procedure voor scopemutaties. Tot op heden hebben we scope aan het project toegevoegd. Nu vragen we de stuurgroep om een onderdeel uit de scope het project Rotterdamsebaan te halen → 5.1.2.e geeft aan dat zowel de nieuwe projectleider 5.1.2.e 5.1.2.e als de nieuwe opdrachtgever 5.1.2.e met de nu voorliggende documenten hebben ingestemd.
- 5.1.2.e meldt dat de financiële inrichting van separate projecten onder het budget Rotterdamsebaan in het MIP komende periode nader ingeregeld wordt.
- 5.1.2.e kondigt aan dat voor de nieuwe bediencentrale komende periode een vergelijkbare scopemutatie wordt opgesteld.

Besloten: Vastgesteld en agenderen in stuurgroep.

BR

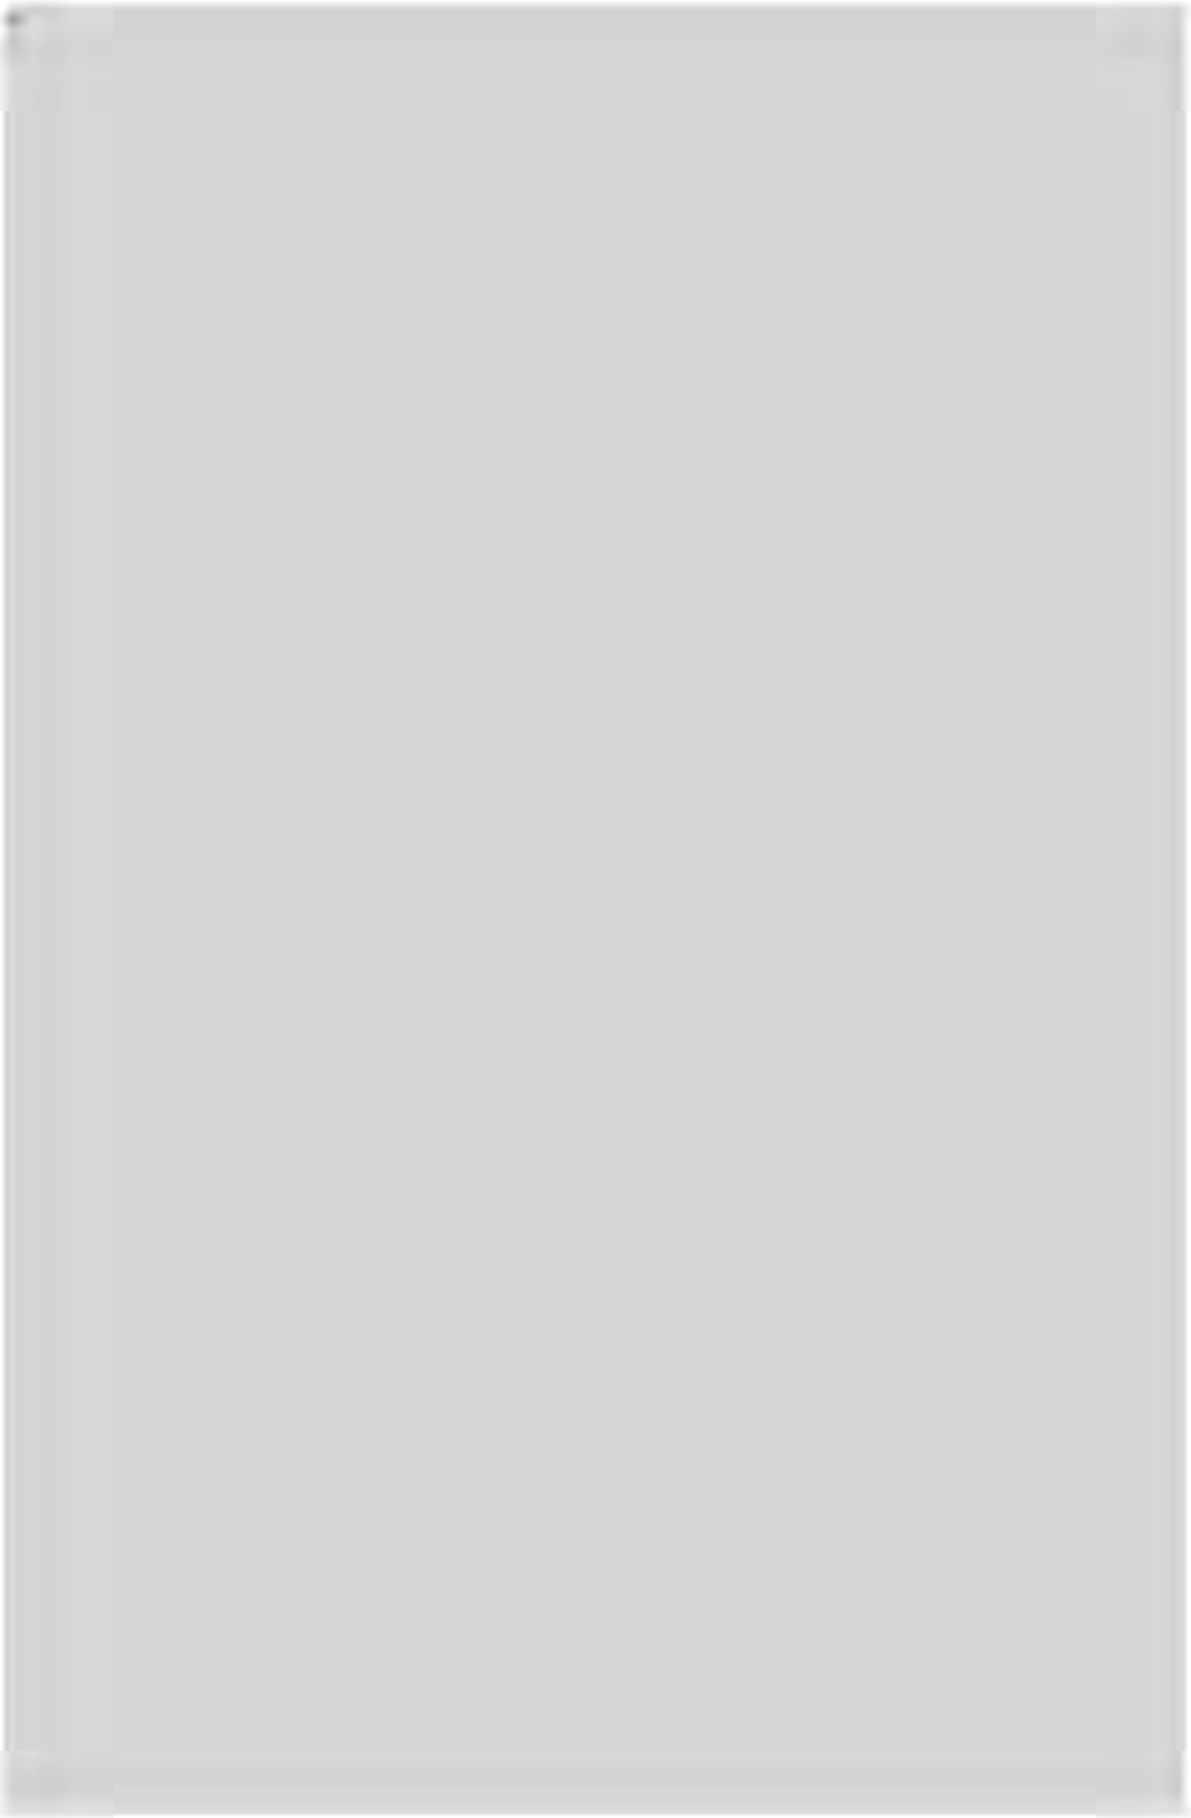

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag | 8 juli 2021 |
| Naam overleg | **OGON Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

- Met de eigenaar van de grond benodigd voor de realisatie van de 2e Watertoevoer is overeenstemming bereikt.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr15

# Verslag OGON Rotterdamsebaan

Datum: 2 februari 2017
Aanwezig: 5.1.2.e vd 5.1.2.e
5.1.2.e , 5.1.2.e
Afwezig: 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besluit |
|---|---|---|
| **Opening en mededelingen** | Zijn er mededelingen? | BR<br>- 5.1.2.e dinsdag hebben de projectorganisatie en 5.1.2.e een bezoek gebracht aan 5.1.2.e en het terrein waarop hij Nieuw Vredenoord wil ontwikkelen en de Rotterdamsebaan de 2e watertoevoer. Medegedeeld is dat de gemeente een PUK zal opstellen (incl. o.a. max. bouwoppervlak) en laten vaststellen waarna zijn plan daaraan wordt getoetst. Mogelijk moet hij daarna zijn plan aanpassen om binnen de gemeentelijke kaders van het PUK te blijven. → 5.1.2.e vraagt aandacht voor de ecologische belangen op dit terrein. Voor het kappen van ieder type houtopstand is in Den Haag een kapvergunning nodig. Daarnaast vraagt 5.1.2.e aan 5.1.2.e een second opinion uit te voeren op de ontwerpoplossing voor de 2e watertoevoer. → 5.1.2.e verwacht dat 5.1.2.e akkoord gaat met de realisatie van de 2e watertoevoer op het moment dat het PUK is vastgesteld. |
| 5.1.2.e | | |

Docnr15

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1.2e | | | |
| | | - | 5.1.2e in paragraaf 1.7 staat dat de 1e fase Molenvlietpark later opgeleverd wordt, maar waarom? → 5.1.2e Er bleek intensieve samenwerking nodig tussen CRB en het |

Docnr15

| | | |
|---|---|---|
| | | Hoogheemraadschap op de gecompliceerde waterhuishouding in de Vlietzone (o.a. oorspronkelijk diverse peilhoogten) en over de toekomstige waterberging incl. de waterveiligheidseisen aan de te realiseren omliggende kades. Gesprekken zijn inmiddels dusdanig ver gevorderd dat de vergunning aangevraagd worden. |
| 5.12.6 | | |

Docnr16

# Verslag OGON Rotterdamsebaan

Datum: 22 maart 2017
Aanwezig: 5.1.2.e , 5.1.2.e
Afwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besproken + besluit |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | [redacted]<br>- Samen met DSO is de projectorganisatie bezig met de PUK voor Nieuw Vredenoord van 5.1.2.e en de SOK voor de 2e watertoevoer over zijn perceel. Het PUK bevat o.a. een logische hoeveelheid te verharden oppervlakte t.o.v. het areaal groen. Het plan van 5.1.2.e kan daarop getoetst worden. Nadat het college akkoord is met de PUK is 5.1.2.e bereidt de SOK te ondertekenen.<br>[redacted] |

Docnr17

# Verslag OGON Rotterdamsebaan

Datum: 8 mei 2017

Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besproken + besluit |
|---|---|---|
| 6N | | |

Docnr17

| | | |
|---|---|---|
| | | [redacted] 5.1.2e<br>5.1.2e uitkomsten ontvangen n.a.v. zijn alternatievenonderzoek naar de watertoevoer. Deze informatie zal 5.1.2e aan 5.1.2e verzenden.<br>- De samenwerkingsovereenkomst met zowel Rijkswaterstaat als het Hoogheemraadschap gaat goed. Er is veel tijd in geïnvesteerd, maar met het beoogde resultaat.<br>[redacted] |

Docnr18

# Verslag OGON Rotterdamsebaan

Datum: 14 december 2017
Aanwezig: 5.1.2.e
5.1.2.e
Afwezig: 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besproken + besluit |
|---|---|---|
| 5.1 | | |
| | | ○ Er lijkt akkoord met 5.1.2.e te komen over de PUK Nieuw Vredenoord waarna er ook mogelijkheden zijn om de waterinlaat over zijn perceel te realiseren. De terugvaloptie via het perceel van 5.1.2.e stuit op bezwaren bij het Hoogheemraadschap, maar er wordt toch geprobeerd de woning aan te kopen gezien de noodzakelijke medewerking, |

Docnr18

| | | |
|---|---|---|
| | | overlast en ingrepen op dit perceel. |
| | | |

Docnr19

# Verslag OGON Rotterdamsebaan

Datum: 18 januari 2017
Aanwezig: 5.1.2.e
Afwezig: 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besproken + besluit |
|---|---|---|
| [redacted] | | |
| | | ○ 5.1.2.e de gemeente had in december een eindbod uitgebracht op de woning van 5.1.2.e Men heeft besloten de woning aan een particulier te verkopen welke het gaat verbouwen en er zelf gaat wonen. Er heeft reeds een kennismakingsgesprek met de nieuwe eigenaar plaatsgevonden waarin ook is verteld wat de plannen zijn t.a.v. het Molenvlietpark, de Rotterdamsebaan en de waterinlaat vanuit de Vliet<br>○ 5.1.2.e nu de gemeente de woning van 5.1.2.e niet heeft kunnen kopen wordt in februari (na zijn vakantie) verder gesproken met 5.1.2.e t.a.v. die variant voor de waterinlaat vanuit de Vliet. |
| [redacted] | | |

Docnr19

Docnr20

# Verslag OGON Rotterdamsebaan

Datum: 29 maart 2018
Aanwezig: 5.1.2.e
Afwezig: 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besproken + besluit |
| --- | --- | --- |
| [redacted] | | |

Docnr20

| | | |
|---|---|---|
| [redacted] | | |
| **Aanlanding voetgangersbrug Drievliet** | Toelichting 5.1.2.e<br>5.1.2.e | ○ Roba realiseert voetgangersbrug tussen Drievliet en haar nieuwe parkeerterrein. Eerste plan was om de voetgangersbrug tijdens realisatiefase Roba via het Molenvlietpark tijdelijk aan te sluiten op het bestaande entreegebouw bij Drievliet. Drievliet heeft echter aangegeven concrete plannen te hebben voor de realisatie van haar indoorhal. Conform samenwerkingsovereenkomst met Drievliet moet Roba de voetgangersbrug dan aansluiten op de indoorhal, kassa bevindt zich in het nieuwe entreegebouw op maaiveld zodat er een zaagtand hellingbaan nodig is. Voordeel voor gemeente is dat Roba direct de definitieve aansluiting op indoordal en daarmee ook de definitieve inrichting Molenvlietpark/waterhuishouding kan realiseren. Drievliet moet spoedig een definitieve keuze maken. Beide opties kan Roba realiseren voordat de indoorhal er staat. De zaagtand kost Roba nu iets meer geld, maar daarna heeft de gemeente t.z.t. geen verplichtingen meer jegens Drievliet.<br>Besloten: Besproken. |
| [redacted] | | ○ 20 maart heeft college PUK Nieuwe Vredenoord vastgesteld. De twee gescheiden trajecten (Nieuwe Vredenoord door DSO en watertoevoer door DSB) worden voortgezet. Voor de watertoevoer hebben we contact met HHD en Borgdorff.<br>[redacted] |

Docnr20

Docnr21

# Verslag OGON Rotterdamsebaan

Datum: 5 juli 2018
Aanwezig: 5.1.2.e
Afwezig: 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besproken + besluit |
|---|---|---|
| **Opening** | Mededeling | ○ Geen. |
| **Verslag** | Vaststellen | ○ N.a.v. informeert 5.1.2.e of er inmiddels een parkeeroplossing is voor bij de bediencentrale. → 5.1.2.e zal dat betrekken bij agendapunt 's.v.z. project'.<br>Besloten: Verslag 7 juni 2018 is vastgesteld. |
| **Implementatie conclusies evaluatie aanbesteding hoofdcontract** | Vaststellen | ○ 5.1.2.e Voorstel is om de lessons learned uit het evaluatierapport aan te vullen met de leerervaring van team-Roba nu de realisatiefase a.d.h.v. het gesloten contract een tijdje op weg is.<br>Besloten: Vastgesteld. De conclusies worden eind augustus in OGON besproken en gaan in september ter kennisgeving ook naar de Stuurgroep alvorens het d.m.v. sessie breder binnen de gemeentelijke organisaties te presenteren. |
| **Presentatie GAD aan rekeningcie** | T.k.n. en t.k.n. naar Stuurgroep | ○ GAD heeft in haar presentatie aan rekeningencommissie t.a.v. project Rotterdamsebaan dat de financiële administratie 'op orde' is. → 5.1.2.e GAD toets op rechtmatigheid van de bestedingen. GAD heeft hierop wederom een accountantsverklaring afgegeven. Ilma Merx heeft deze ondertekend en overhandigd het document aan de projectorganisatie. De projectorganisatie zal deze conform subsidievoorwaarde verstrekken aan de subsidiegevers MRDH en 5.1.2.e<br>Besloten: Ter kennisgeving aangenomen en ter kennisgeving naar Stuurgroep. |
| **Budgetverlaging n.a.v. coalitieakkoord** | Bespreken en agenderen in Stuurgroep. | ○ 5.1.2.e In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat er tot € 25 mln. van het projectbudget Rotterdamsebaan wordt ingezet voor de gebiedsontwikkelingen Binckhorst & CID (en een overig deel voor REIS). Vervolgens is er vorige week door DSO en DSB met weth. Revis gesproken over een uitname van €5,- voor een project met een dekkingstekort in het stadcentrum. Afgesproken is dat dit in 2019 geeffectueerd kan worden indien het boorproces in de 2e helft van 2018 succesvol verloopt en de daarbij betrokken risico's zijn gesloten. Directie financiën is daarmee akkoord gegaan met het raadsvoorstel ten aanzien van de additionele dekking van het andere project aangezien er in redelijkheid dekking gevonden lijkt te zijn. → 5.1.2.e geeft aan niet betrokken te zijn bij deze afspraken en verrast te zijn door de tekst in het openbare raadsvoorstel van het andere project waarin gemeld staat dat de Rotterdamsebaan een financiële haalbaarheid kent van 99%.<br>Besloten: Besproken en aangezien het (pas) in 2019 eventueel geeffectueerd wordt is er komende Stuurgroep geen besluit noodzakelijk. |
| **Projectmutatie 21. Lichtmasten Binckhorstlaan 145** | Vaststellen en ter vaststelling naar Stuurgroep | ○ 5.1.2.e werkzaamheden op verzoek DSO en op kosten DSO.<br>Besloten: Vastgesteld en ter vaststelling agenderen in Stuurgroep. |
| **Projectmutatie 22"Lichtmasten** | Vaststellen en ter vaststelling naar | ○ 5.1.2.e werkzaamheden op verzoek DSO en op kosten DSO.<br>Besloten: Vastgesteld en ter vaststelling agenderen in Stuurgroep. |

Docnr21

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | ○ 5.1.2.e de informatiebijeenkomst over realisatie 2e watertoevoer op 3 juli is goed verlopen. Er waren diverse vragen over naastgelegen bouwontwikkeling, maar dat is een particulier initiatief waarvoor hijzelf omgevingscommunicatie doet. Er is o.a. verteld dat voor de realisatie van de watertoevoer en het vervangen van de kademuur op verzoek provincie de Jan Thijssenweg in worst-case scenario voor 6 maanden afgelopen is voor verkeer. Optimalisatie wordt nog bezien. O.a. de houder van het tankstation maakt zich hierover zorgen. |
| | | |

Docnr22

# Verslag OGON Rotterdamsebaan

Datum: 29 augustus 2018
Aanwezig: 5.1.2.e
Afwezig: 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besproken + besluit |
|---|---|---|
| [redacted] | | |

Docnr22

| | | |
|---|---|---|
| | | ○ Door middel van overleggen met ontwikkelaar Nieuw Vredenoord, omwonenden, het Hoogheemraadschap en de provincie Zuid Holland wordt de tweede watertoevoer voorbereid. |

Docnr23

# Verslag OGON Rotterdamsebaan

Datum: 18 oktober 2018
Aanwezig: 5.1.2.e
Afwezig: 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besproken + besluit |
|---|---|---|
| 5.1.2.e | | |
| | | ○ 5.1.2.e wat wordt bedoeld met de grondverkoop aan Jan Thijssenweg op pagina 8? → 5.1.2.e er worden gronden uitgeruild en deels verkocht tussen deze particulier en Den Haag t.b.v. een goede landschappelijke en verkeerveilige inpassing van de tweede watertoevoer en de ontsluiting van deze woning. |
| | | 5.1.2.e |

Docnr23

Docnr24

# Verslag OGON Rotterdamsebaan

Datum: 13 december 2018
Aanwezig: 5.1.2.e
5.1.2.e
Afwezig: 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besproken + besluit |
|---|---|---|
| [redacted] | | |

Docnr24

Docnr25

# Verslag OGON Rotterdamsebaan

Datum: 23 januari 2019
Aanwezig: 5.1.2.e
5.1.2.e
Afwezig: 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besproken + besluit |
|---|---|---|
| [redacted] | | |

Docnr25

| | | |
|---|---|---|
| | | ○ T.b.v. tweede watertoevoer wordt gewacht op de info van [redacted] over de grondbalans, worden diverse vragen uit de omgeving beantwoord aangaande de aangevraagde kapvergunning en zijn hierover raadsvragen gesteld. Vnauit Gouda is er een petitie gestart. |

**Actie- en Besluitenlijst OGON Rotterdamsebaan**
31 juli 2014
Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e
Afwezig: 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besluit |
|---|---|---|
| [redacted] | | |
| **Molenvlietpark** | Stand van zaken bespreken | 1) Behandeling in de raadscommissie: besluitvorming over indoorhal Drievliet en Molenvlietpark wil men waarschijnlijk, volgens toezegging Smit, tegelijk behandelen. Indoorhal Drievliet ligt klaar voor besluitvorming, Molenvlietpark niet aangezien dekking van de laatste 3mln nog gevonden moet worden. Revis heeft 5.1.2.e gevraagd hiervoor contact op te nemen met de provincie en haaglanden. Begin september moet hierover een verhaal naar Revis. --> 5.1.2.e Let wel: omdat Drievliet voor €0,- in de boeken stond gaat er met deze oplosing al €8,2mln. vanuit risicopot vewwerving (Roba). Revis wil niet meer geld van Roba aan deze oplossing uitgeven.<br><br>2) gemeente en hoogheemraadschap hebben een werkgroep t.a.v. de mogelijke calamiteitenberging in het Molenvlietpark. Dit is een wens van HHD die Den Haag kan meenemen, mits zij extra kosten betaald. Wegens vakanties is er geen stuurgroep tussen wethouder en dijkgraaf mogelijk. Dijkgraaf gaat wethouder waarschijnlijk deze week bellen om situatie te bespreken. 5.1.2.e heeft wethouder hierover per mail geinformeerd. -> 5.1.2.e in eerstvolgende stuugroep-Roba moet er een memo liggen met de laatste s.v.z. incl. relatie met 'hogere' discussie over de doorstroming in de Vliet. |
| [redacted] | | |

Docnr26

| | | |
|---|---|---|
| | | |

Docnr27

**Actie- en Besluitenlijst OGON Rotterdamsebaan**
**22 april 2015**
**Aanwezig:** 5.1.2.e
5.1.2.e
**Afwezig:** -

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besluit |
|---|---|---|
| [redacted] | | |
| **Projectmutatie Molenvlietpark** | Vaststellen en naar Stuurgroep | 5.1.2.e Formulieren heten vanaf heden Projectmutatie i.p.v. Verzoek tot Wijziging aangezien een VtW t.z.t. dient om meer- en minderwerk t.o.v. het contract vast te leggen tussen gemeente en aannemer.<br>5.1.2.e kent wethouder Revis de overheveling van €9mln vanuit het verwervingsbudget? -> 5.1.2.e ja, dat verhaal is onderdeel geweest bij de besluitvorming in de gemeenteraad.<br>Besluit: vastgesteld en ter vaststelling naar Stuurgroep |
| **Projectmutatie Waterberging** | Vaststellen en naar Stuurgroep | 5.1.2.e voorafgaande aan behandeling in de Stuurgroep zal de figuur 'nadere uitwerking waterinlaat' vervangen worden door een figuur waarop de door 5.1.2.e beoogde ontwikkeling op landgoed Vredenoord, niet zichtbaar is.<br>Besluit: vastgesteld en ter vaststelling naar Stuurgroep |
| [redacted] | | |
| | | |
| | | |

Docnr28

# Actie- en Besluitenlijst OGON Rotterdamsebaan

Datum: 11 augustus 2016

Aanwezig: 5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig: 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besluit |
|---|---|---|
| BR | | |

Docnr28

| | | |
|---|---|---|
| | | [redacted]<br>- 5.1.2.e ambtelijk is er overeenstemming met het Hoogheemraadschap over de capaciteit van de waterberging in het Molenvlietpark. De nieuwe ontwerpoplossing rondom de waterinlaat uit de Vliet vraagt om de aankoop van meer particuliere grond waardoor de deal met 5.1.2.e aangepast moet worden. Zijn reactie wordt nog afgewacht. |
| [redacted] | | |
| **Rondvraag** | Vragen/opmerkingen? | 5.1.2.e levert het kappen van bomen recentelijk nog vragen uit de omgeving op? → 5.1.2.e niet van de politiek. Bewonersvereniging Park Hoornwijck heeft wel 2 brieven aan de raad gestuurd over de waterinlaat en over het kappen van bomen. Brieven worden beantwoord en de vertegenwoordigers worden uitgenodigd voor een gesprek. |

Docnr29

# Actie- en Besluitenlijst OGON Rotterdamsebaan

Datum: 6 oktober 2016

Aanwezig: 5 1 2 e

5 1 2 e , 5 1 2 e

Afwezig: 5 1 2 e 5 1 2 e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besluit |
|---|---|---|
| BR | | |
| **Bijdrage Hoogheemraadschap t.b.v. calamiteitenberging** | Mondelinge toelichting 5 1 2 e | - Ambtelijk is er overeenstemming met het Hoogheemraadschap over de capaciteit van de waterberging in het Molenvlietpark. De nieuwe ontwerpoplossing rondom de waterinlaat uit de Vliet vraagt om de aankoop van meer particuliere grond waardoor de deal met 5 1 2 e aangepast moet worden. Getracht wordt dit uit de risicopot van het Hoogheemraadschap te laten financieren. |
| BR | | |

Docnr29

Docnr5

## Actie- en Besluitenlijst OGON Rotterdamsebaan

**2 juli 2014**

**Aanwezig:** 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

**Afwezig:** 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besluit |
|---|---|---|
| **Opening en mededelingen** | Zijn er mededelingen? | Het onderwerp 'Raadsvoorstel Molenvlietpark+Indoorhal Drievliet' wordt aan de agenda toegevoegd |
| BR: | | |
| | | - 5.1.2.e het Molenvlietpark krijgt t.z.t. een eigen communicatietraject(plan), evenals nu het geval is bij het verleggen van de kabels&leidingen aan de onevenzijde van de Binckhorstlaan en t.z.t. het slopen van de opstallen aan de evenzijde van de Binckhorstlaan |
| BR: | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## Actie- en Besluitenlijst OGON Rotterdamsebaan

**16 februari 2015**
**Aanwezig:** 5.1.2.e
**Afwezig:** 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besluit |
|---|---|---|
| BR | | |
| | | 5.1.2.e T.a.v. de financien is er een toename aan de kostenkant opgetreden wegens het toevoegen van het Molenvlietpark aan de scope van het project (reeds opgenomen kosten voor de inpassing zijn overgegaan van bouwkosten naar verwervingskosten). Financiel risico is o.a. het mogelijke verschil tussen de GWW-kostenindexatie en de IBOI-budgetindexatie. Op dit moment is er 54% zekerheid dat het project binnen budget gerealiseerd wordt.<br>Besloten: wederom agenderen in volgend OGON en de presentatie dan als vergaderstuk vooraf toesturen. |
| **2e Voortgangsbericht 2014 aan de raad, incl. Grip** | Bespreken en bij wethouder aanbieden | BR<br>5.1.2.e meer vermelden over het Molenvlietpark, met name de tekst vanuit het raadsvoorstel Molenvlietpark overnemen waarmee duidelijk wordt dat er nog een subsidieaanvraag bij provincie ingediend is om het financiele tekort op het plan te dekken.<br>Besloten: agenderen in RBVS (19feb) |
| BR | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## Actie- en Besluitenlijst OGON Rotterdamsebaan

**12 maart 2015**
**Aanwezig:** 5.1.2.e
**Afwezig:** 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besluit |
|---|---|---|
| 5.1.2.e | | |
| Risicoanalyse planning en financien | Bespreken van de presentatie | 5.1.2.e Data in deze presentatie zijn het resultaat van rekenmodellen voor het inschatten van toekomstige eindwaarden. Belangrijker dan de data is het bekijken van de trends. Worden curves smaller of breder? Verschuiven de curves naar voren of naar achteren? De criticallity laat zien waar het nuttig is om beheersmaatregelen in te zetten om de kans op het te bereiken eindresultaat te behalen. Nieuwe info t.o.v. deze presentatie is het raadsbesluit van afgelopen 5 maart over de komst van het Molenvlietpark incl. waterberging op verzoek van het hoogheemraadschap van Delfland (SOK op 11 maart ondertekend).<br>5.1.2.e<br>5.1.2.e Door besluit tot realisatie Molenvlietpark vindt er een verschijving plaats tussen de vastgoed- en bouwkosten. --> 5.1.2.e tekort Molenvlietpark wordt niet uit pot onvoorzien gedekt (tenzij politieke wil verandert), maar uit de mogelijk subsidie, of bezuiniging in het plan of aanvullende dekking van elders. --> 5.1.2.e grootste financiele risico betreft een hoge marktindexatie. |
| 5.1.2.e | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Actie- en Besluitenlijst OGON Rotterdamsebaan**

22 januari 2016

Aanwezig: 5.1.2.e
5.1.2.e (i.v. 5.1.2.e)

Afwezig: 5.1.2.e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besluit |
|---|---|---|
| [redacted] | | |
| | | |
| Rapportage Grip op grote projecten d.d. 31dec2015 | 1) Bespreken opleverdatum i.r.t. kleurcode van de planning | 1) 5.1.2.e openstellingsdatum inmiddels 1 juli 2020? --> 5.1.2.e wens was 2019, vervolgens is vorig jaar i.h.k.v. de aanbesteding 31 maart 2020 voorgeschreven, maar die is gezien de vertraging door het kort geding verschoven naar 1 juli 2020. Ondanks de extra werkzaamheden voor het Molenvlietpark is de haalbaarheid hiervan ca. 85%. --> Besluit: kleurcode van oranje naar groen. |
| [redacted] | | |

| ProcessId | Document nummer | Bestandsnaam export | Weigeringsgrond | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 8683 | 00001 | Actielijst+Termijnagenda RBVS.pdf | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8683 | 00002 | ROBA-OG-BSS-VER-0001.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8683 | 00003 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0014.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8683 | 00004 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0031.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8683 | 00005 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0034.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8683 | 00006 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0038.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8683 | 00007 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0043.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8683 | 00008 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0065.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8683 | 00009 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0087.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8683 | 00010 | ROBA-VER-004270.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8683 | 00011 | ROBA-VER-004470.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |

| ProcessId | Document nummer | Bestandsnaam export | Weigeringsgrond | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 8682 | 00001 | ROBA-OG-BSG-00-VER-0003.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00002 | ROBA-OG-BSG-VER-0002.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00003 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0066.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00004 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0115.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00005 | ROBA-VER-004309.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00006 | ROBA-VER-004321.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00007 | ROBA-VER-004374.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00008 | ROBA-VER-004435.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00009 | ROBA-VER-004468.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00010 | ROBA-VER-004517.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00011 | ROBA-VER-004551.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00012 | ROBA-VER-004596.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00013 | ROBA-VER-004628.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00014 | ROBA-VER-004651.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00015 | ROBA-VER-004721.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00016 | ROBA-VER-004771.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00017 | ROBA-VER-004794.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00018 | ROBA-VER-004833.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00019 | ROBA-VER-005416.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00020 | ROBA-VER-005438.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00021 | ROBA-VER-005472.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00022 | ROBA-VER-005534.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00023 | ROBA-VER-005556.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00024 | ROBA-VER-005588.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00025 | ROBA-VER-005627.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00026 | ROBA-VER-005643.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00027 | ROBA-VER-005659.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 8682 | 00028 | ROBA-VER-005671.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |

Docnr1

**From:** "5.1.2.e "

**Sent:** Fri, 18 Sep 2015 15:38:06 +0200

**To:** "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>

**Cc:** "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @denhaag.nl>

**Subject:** Actielijst+Termijnagenda RBVS

BR

Hallo allen,

BR

**Rotterdamsebaan:**

BR

5. Donderdagavond 24 september bespreekt commissie Leefomgeving het bestemmingsplan Molenvlietpark. 5.1.2.e heeft 5.1.2.e ter voorbereiding aantal vragen gemaild. Deze zal de projectorganisatie beantwoorden.

BR

Docnr1

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @denhaag.nl

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
www.denhaag.nl

5.1.2.e

Docnr2

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Naam overleg | **Rotterdamsebaan-Binckhorst-Vlietzone-Schenkviaduct-overleg (RBVS-overleg)** |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 9 juli 2014 |

Aanwezig:

Wethouder Revis, 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

Afwezig:

x

Kopieën aan:

5.1.2.e

Data volgende vergaderingen:

Maandag 8 september

5.1.2.e

## 7 Dekking Molenvlietpark (2 bijlagen)

- 5.1.2.e er is nog geen dekking gevonden, maar in de memo wordt een aantal mogelijkheden genoemd. Deze vragen echter bestuurlijke keuzes, ook tussen de portefeuillehouders.
- Wethouder: college is gisteren akkoord gegaan met de bestuurlijke documenten. Komende weken zal de dekking gevonden moeten worden. Wethouder gaat in gesprek met weth. De Bruijn t.a.v. de Meerjarenbegroting Fiets en het NSL. T.a.v. de financiële mogelijkheden zoals benoemd in de mem moet er prioritair gezocht worden naar de mogelijkheden in het Groenfonds/ProgrammaNSL/Geluid/Groen en provinciale subsidie.

## 8 Rondvraag

- Wethouder heeft 5.1.2.e (persvoorlichter) gesproken over het Molenvlietpark → 5.1.2.e hierover is goed contact tussen 5.1.2.e en 5.1.2.e → 5.1.2.e in september wordt waarschijnlijk het communicatiecentrum aan de Binckhorstlaan geopend. Hierin is ruimte voor zowel de realisatie van de Rotterdamsebaan als de ontwikkeling van de Binckhorst.

| | |
|---|---|
| Naam overleg | **Rotterdamsebaan-Binckhorst-Vlietzone-Schenkviaduct-overleg (RBVS-overleg)** |
| Auteur | 5.1.2.e |
| **Verslag** d.d. | 3 november 2014 |

Aanwezig:

Weth. Revis, 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

5.1.2.e

Data volgende vergaderingen:

Maandag 10 november

[redacted]

- Wethouder: n.a.v. hetgeen besproken over het Molenvlietpark heeft er vrijdag 31 oktober een separaat overleg plaatsgevonden. Afgesproken is dat er subsidieaanvraag bij provincie ingediend wordt. → 5.1.2.e in onderling overleg graag die contactmomenten vanuit de gemeente (DSO, Wethouder, team-Roba) met de provincie inventariseren zodat die contactmomenten i.h.k.v. het lobbytraject benut kunnen worden. (**Actie:** 5.1.2.e ). → 5.1.2.e wie kunnen er een negatieve lobby richting de provincie ondernemen? → 5.1.2.e o.a. vereniging Houdt Vlietrand Groen en Bewonersvereniging Park Hoornwijck.

- Besloten: vastgesteld

[redacted]

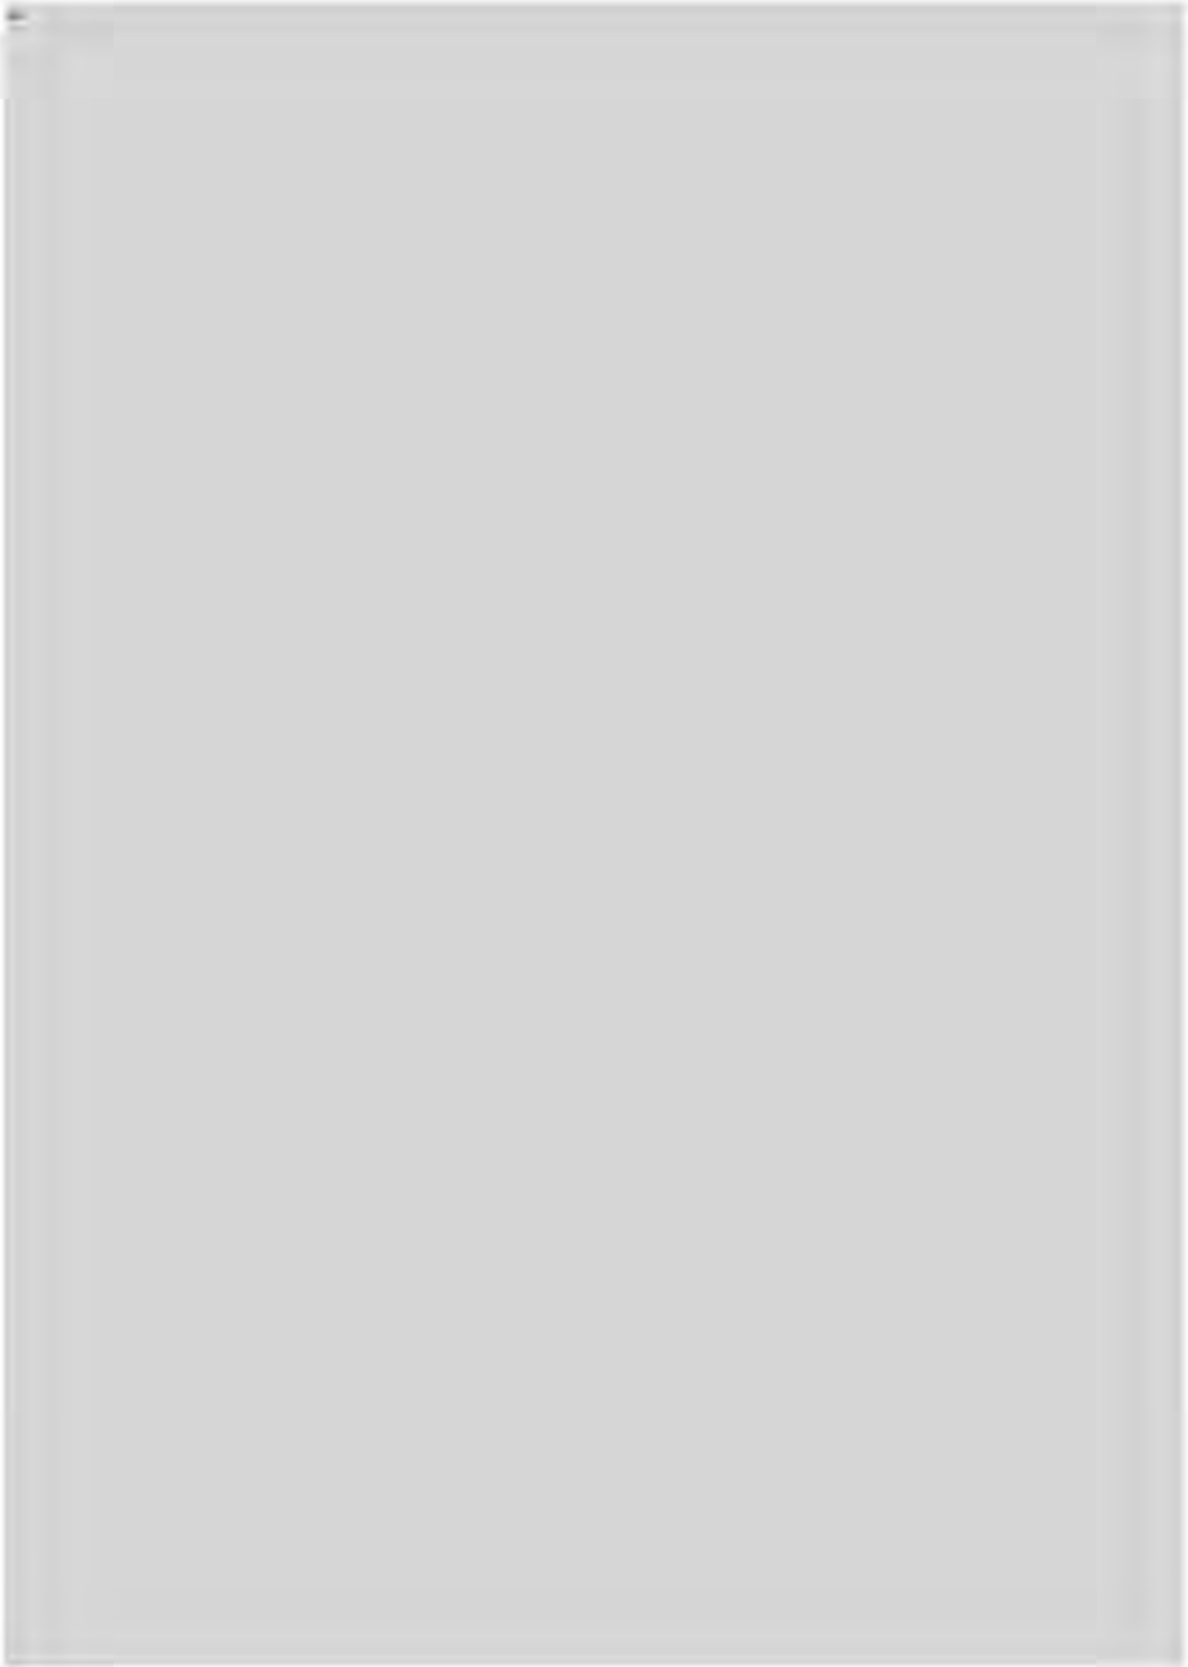

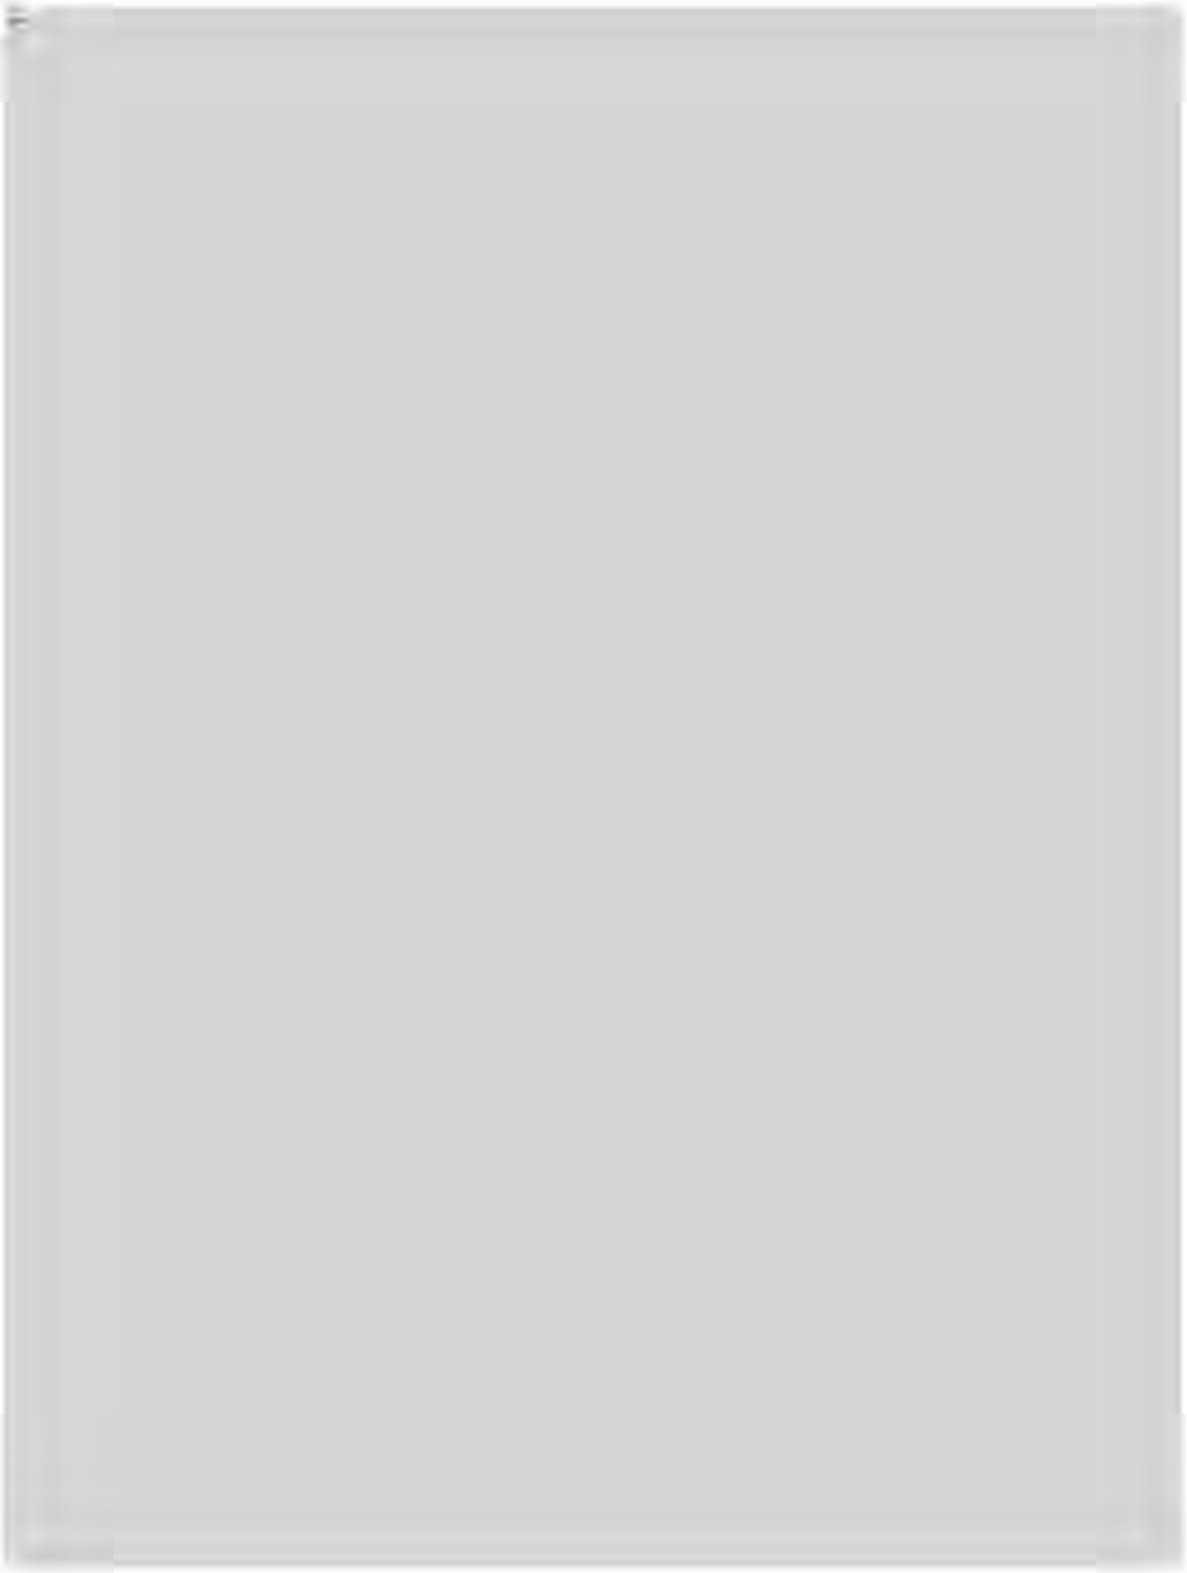

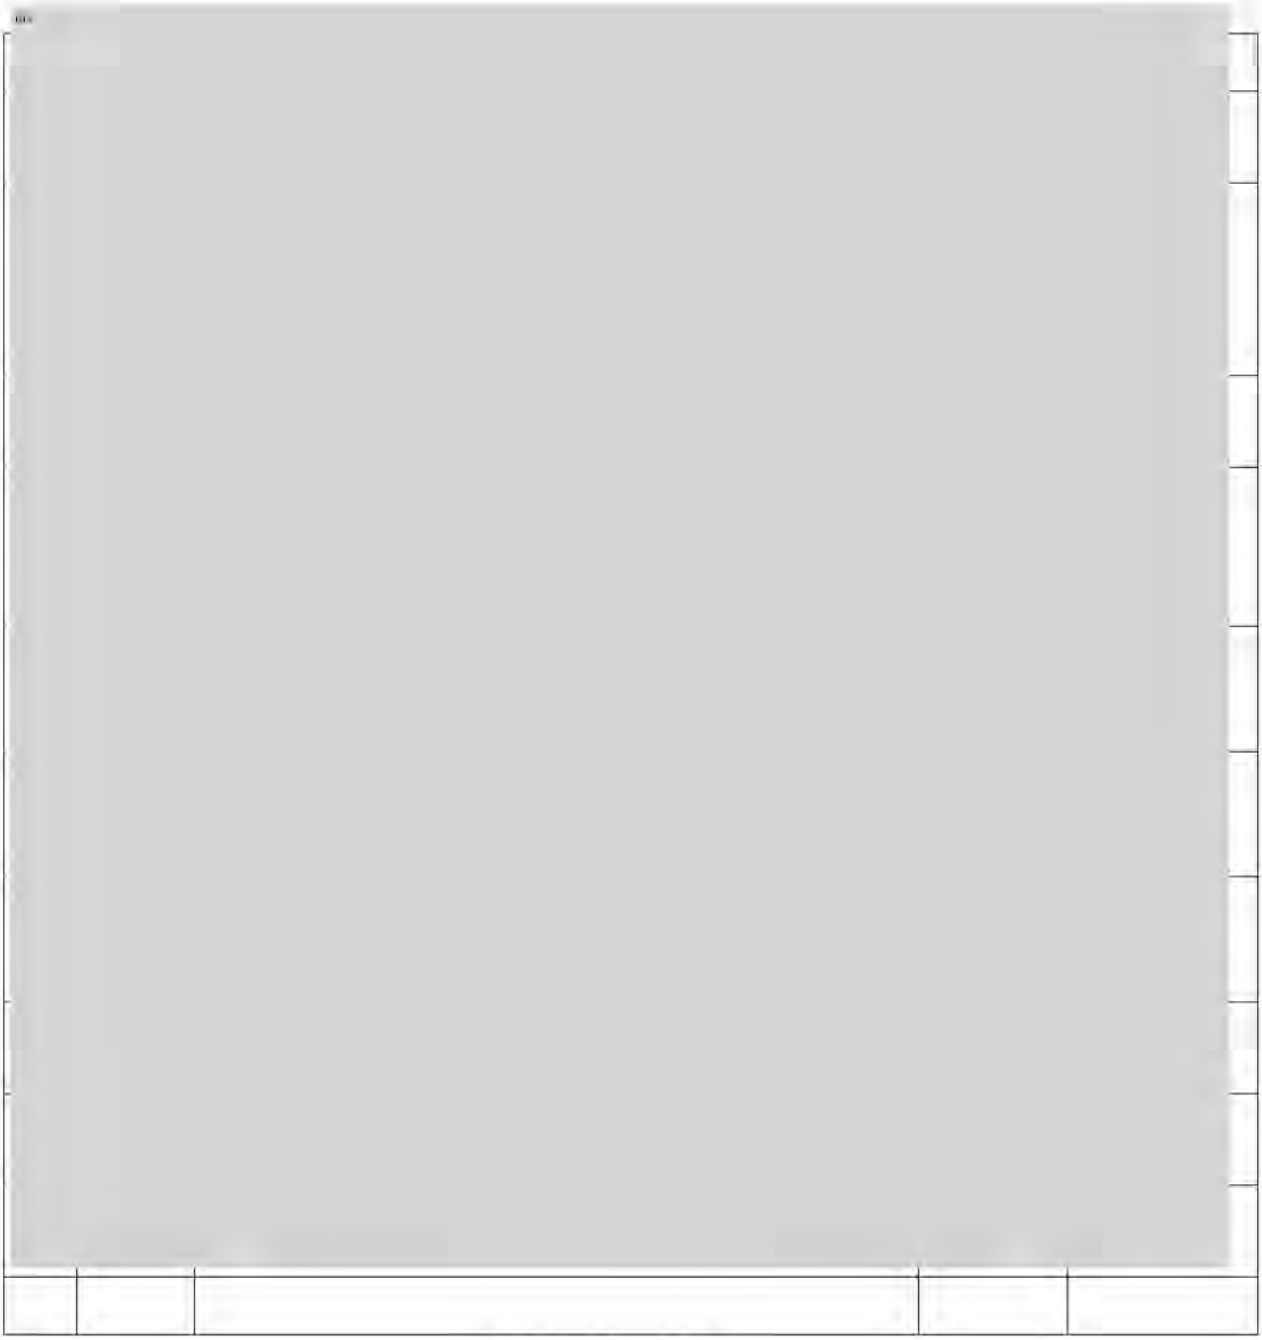

o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr4

| | |
|---|---|
| Naam overleg | **Rotterdamsebaan-Binckhorst-Vlietzone-Schenkviaduct-overleg (RBVS-overleg)** |
| Auteur | 5.1.2.e |
| **Verslag** d.d. | 17 november 2014 |

Aanwezig:

Weth. Revis, 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

5.1.2.e 5.1.2.e

Data volgende vergaderingen:

Maandag 24 november

6. **Molenvlietpark**

- Gevraagd: in te stemmen met bijgevoegde financiële paragraaf, zodat deze in het inmiddels gereed liggende Raadsvoorstel gevoegd kan worden.
- Besproken:
  - Wethouder: het raadsvoorstel nog niet gezien, maar tekst voor in de financiële paragraaf moet korter. Goed uitleggen waaruit de kostenraming is opgebouwd en welke dekking we al hebben.
  - Wethouder: tekst 'daarvoor lijken kansen aanwezig' vervangen door 'daarvoor zijn kansen aanwezig'.
  - Wethouder: Subsidieaanvraag bij de provincie gaan we doen voor €3,5mln. t.b.v. het oorspronkelijke ontwerp. Wetende dat een versobert ontwerp zelfs nog een tekort kent van €1,9mln.
  - 5.1.2.e het bezoek van de Statencommissie aan het gebied op woensdag 26 november moet benut worden t.b.v. het lobbyen voor deze subsidiebijdrage.
  - 5.1.2.e wethouder krijgt separaat nog een aanvullende memo t.a.v. het Haagse standpunt over de langjarige ambitie voor de Vlietzone. Officieel ziet Den Haag de gehele Vlietzone als een mogelijkheid voor toekomstige uitbreiding. De provincie is er voorstander van om dit gebied te vergroenen. → Wethouder: de komst van de Rotterdamsebaan geeft voor dit specifieke deelgebied een mogelijkheid om te vergroenen en de toegankelijkheid te vergroten voor recreanten. Dat is geen vrijbrief voor het vergroenen van de gehele Vlietzone.
- Besloten: Subsidieaanvraag en strategie t.b.v. de lobby over 3 weken in het RBVS bespreken. (**Actie:** 5.1.2.e). Wethouder wil voorafgaande aan de voorvisieronde het gehele raadsvoorstel zelf gelezen hebben. (**Actie:** 5.1.2.e)

Docnr4

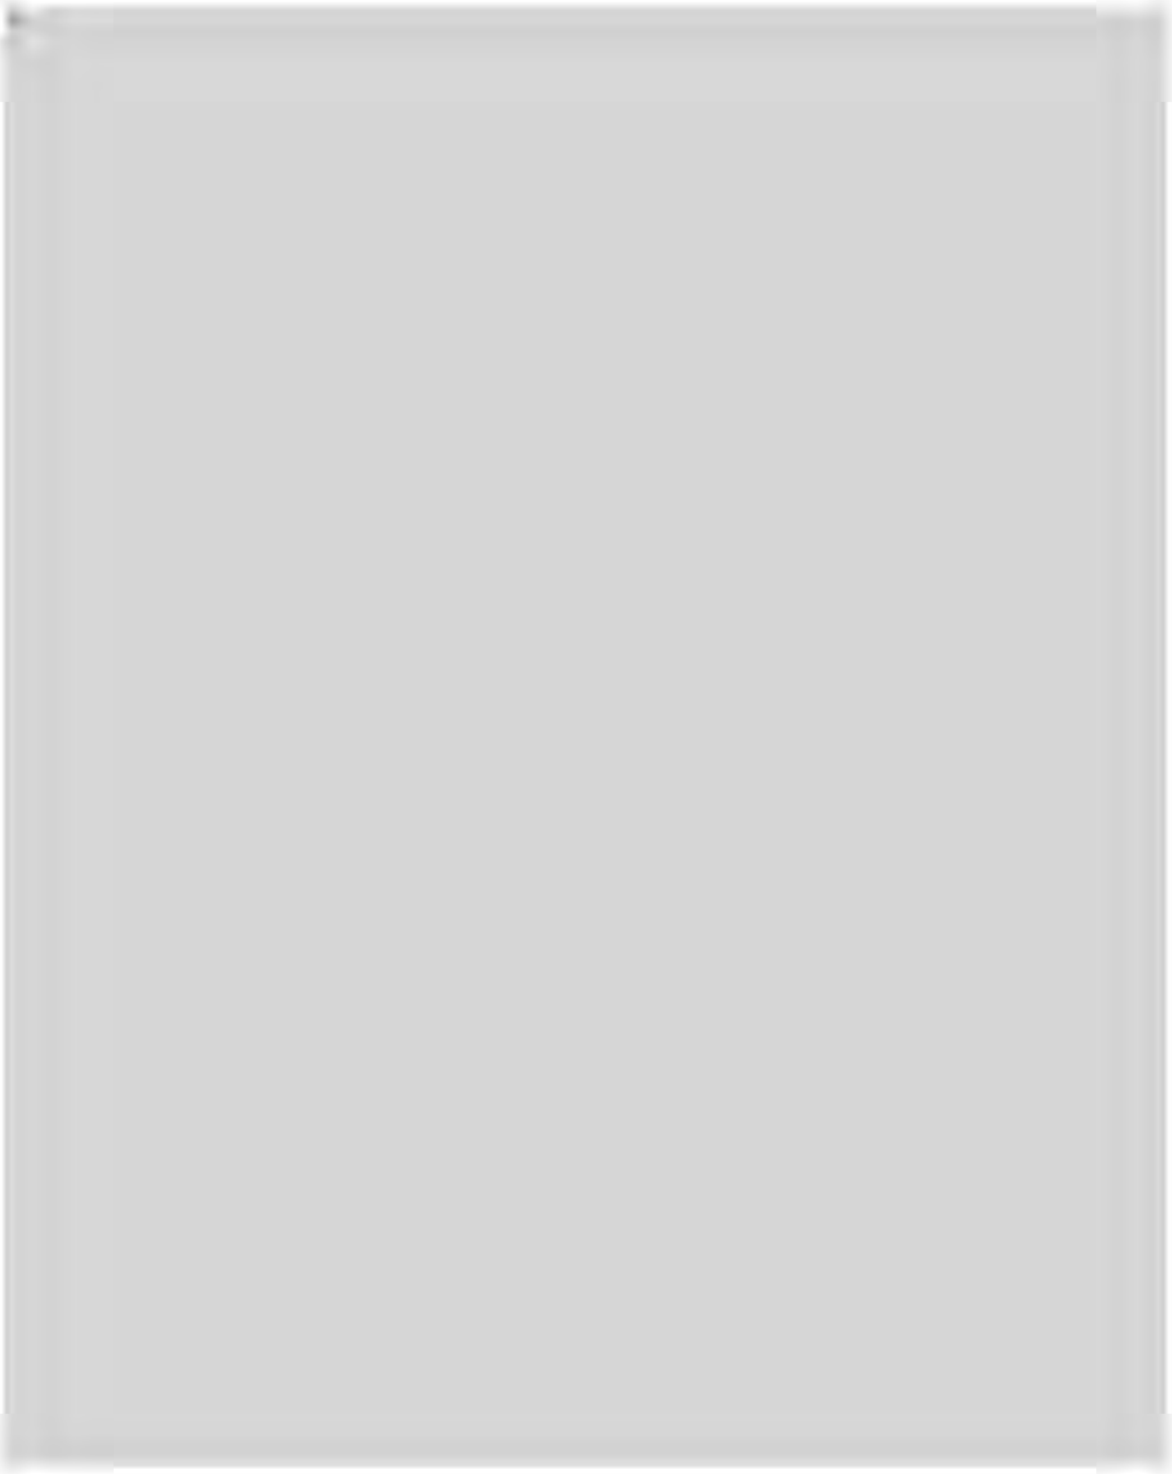

**ACTIELIJST:**

| Nr. | datum | Actie punt | Wie | Planning |
|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | |
| 5 | 17 nov 2014 | Raadsvoorstel Molenvlietpark voorafgaande aan voorvisieronde door wethouder laten lezen | [redacted] | 24 nov 2014 |
| [redacted] | | | | |

o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr5

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Naam overleg | **Rotterdamsebaan-Binckhorst-Vlietzone-Schenkviaduct-overleg (RBVS-overleg)** |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 24 november 2014 |

Aanwezig:

Weth. Revis, 5.1.2.e
5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

5.1.2.e 5.1.2.e

Data volgende vergaderingen:

Maandag 1 december

---

5.1.2.e

**ROTTERDAMSEBAAN**

**3. RV vaststelling Voorlopig Ontwerp Molenvlietpark (bijlage)**

5.1.2.e geeft een korte toelichting op het RV. M.b.t. de SOK meldt hij dat er al ambtelijk akkoord is. De wethouder heeft een paar opmerkingen:

- in de inleidende alinea er ook een leuk verhaal van maken, nu vooral technisch (groene poort naar DH naar boven en aanvullen).
- trekfietstrace, de wethouder vraagt of hier nu staat dat het er echt gaat komen? 5.1.2.e geeft aan dat de subsidie voor het fietspad nog niet rond is. 5.1.2.e vraagt naar de precieze locatie, hij is als ruimtereservering opgenomen. De Bruijn heeft aan de raad gemeld dat hij pas volgend jaar aangeeft waar het gaat omen. 5.1.2.e licht toe dat het hier gaat om "deels", over dat gedeelte van het trace dat ligt op het Molenvlietpark en wat ligt op de Golfbaan. Als het gaat over Meyvliet, dat niet. Afgesproken wordt een stuk tekst te schrappen.

- Bij financiën wordt gesproken over 4 lagen. Zin over lagenbenadering aanvullen met wat deze benadering inhoudt.
- Besluiten: wat betekend nadere uitwerking bij besluit I? 5.1.2.e geeft aan dat dit inhoudt van VO naar DO. Nadere uitwerking kan geschrapt worden, na VO volgt een DO dat is altijd een nadere uitwerking van het VO.
- De wethouder vraagt of de raad vorige keer ook bijlagen met plaatjes heeft ontvangen. 5.1.2.e geeft aan dat het toen het SO was, nu VO dus meer detaillering e.d. toegevoegd. De wethouder vraagt om in de tekst van het RV een foto en een overzichtskaartje te plakken, meer een geïllustreerd verhaal.
- De wethouder vraagt of de bijlage Movares niet te veel informatie is om naar de Raad te sturen? 5.1.2.e oppert om deze ter inzage te leggen. De wethouder vraagt of er iets op tegen is om het weg te laten, dit is niet het geval. Afgesproken wordt dat het rapport niet meegestuurd wordt.
- [redacted] zal e.e.a. aanpassen (5.1.2.e **en** [redacted])

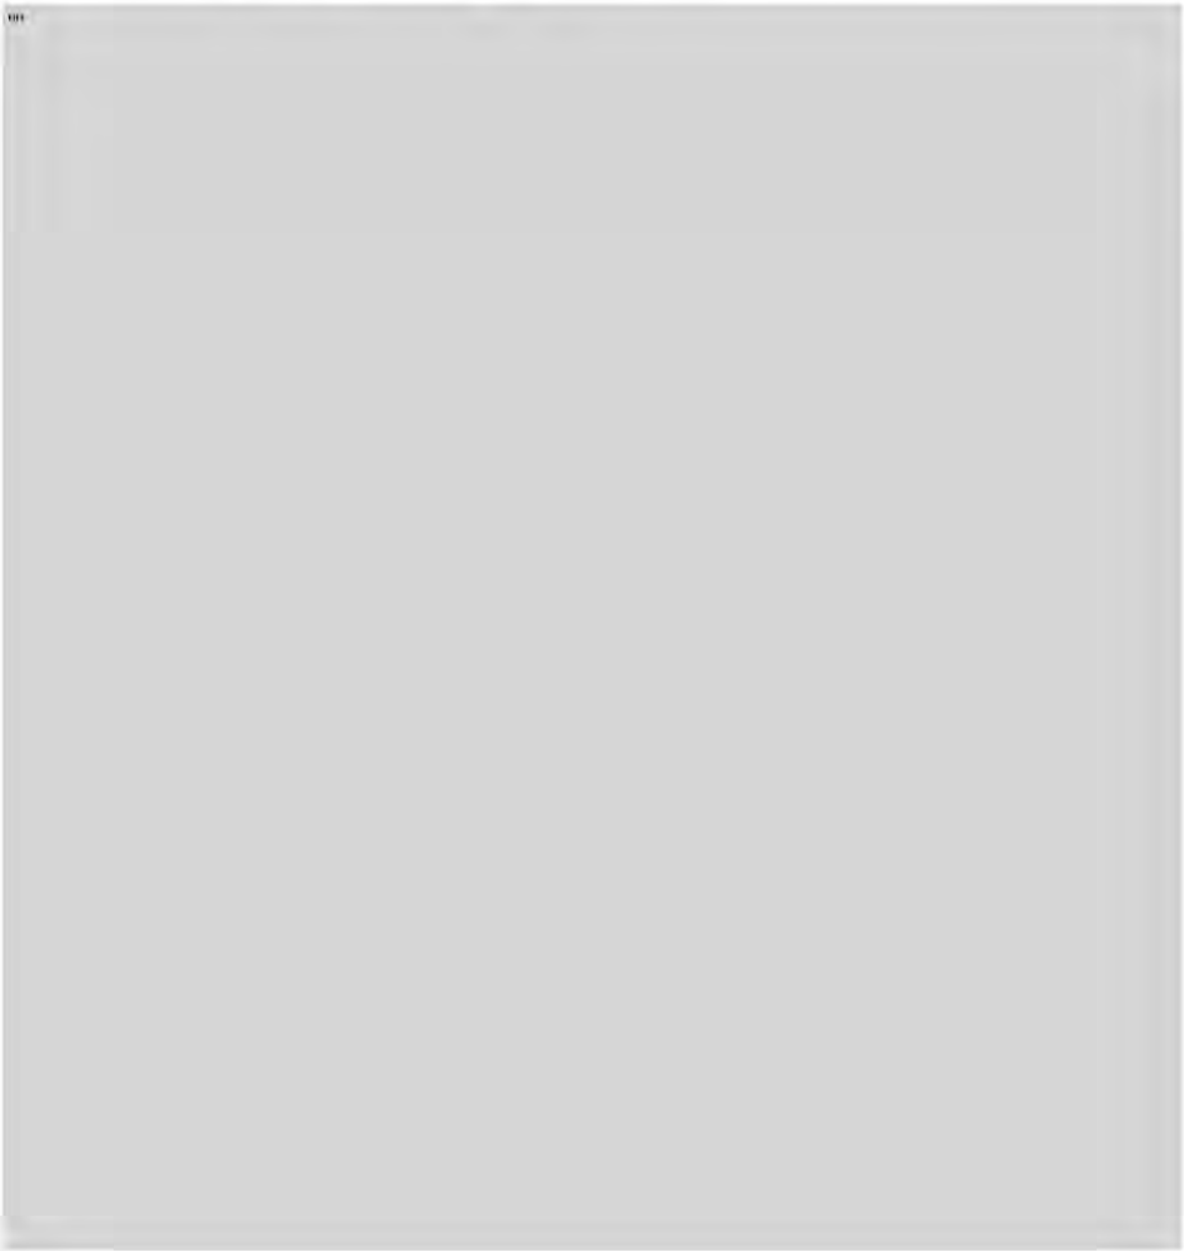

o-o-o-o-o-o-o-o-o

**Actielijst**

| Nr. | datum | Actie punt | Wie | Planning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 4 | 24 nov 2014 | Tekstueel aanpassen Raadsvoorstel Molenvlietpark t.b.v. college 2 december | 5.1.2.e + | 26 nov 2014 |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| Naam overleg | **Rotterdamsebaan-Binckhorst-Vlietzone-Schenkviaduct-overleg (RBVS-overleg)** |
| Auteur | 5.1.2.e |
| **Verslag** d.d. | 1 december 2014 |

Aanwezig:

Weth. Revis, 5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

5.1.2.e 5.1.2.e

Data volgende vergaderingen:

Maandag 8 december

[redacted]

**ROTTERDAMSEBAAN:**

**3. Geen agendapunten**

- Besproken:
  - 5.1.2.e Begrepen dat Molenvlietpark morgen niet in college geagendeerd is. → 5.1.2.e parafen Bestuursdienst ontbraken, dient nog nader afgestemd te worden t.a.v. het Trekfietstracé en documenten werden pas in de loop van woensdag aangeleverd waardoor wethouder bijna geen tijd had om te lezen. → Wethouder: is geen termijngebonden besluit dus week later kan ook.

[redacted]

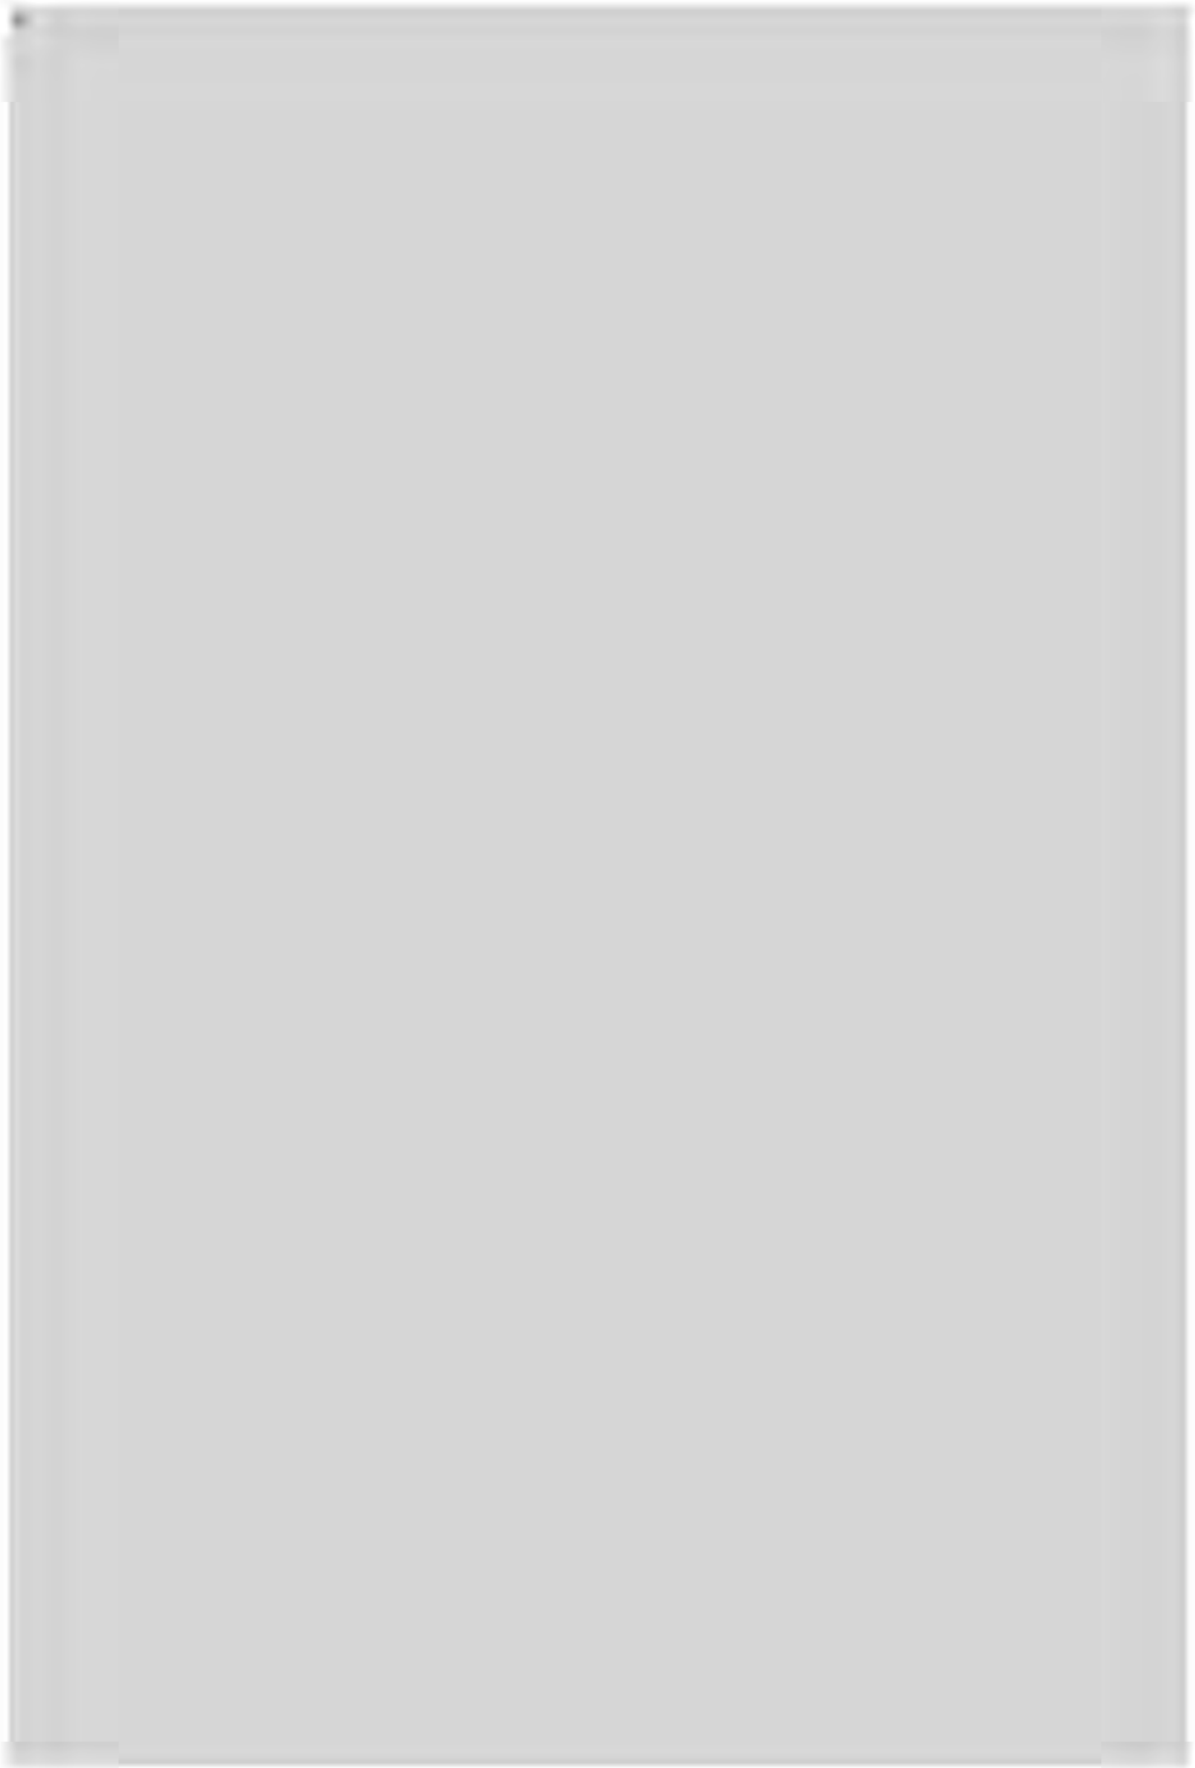

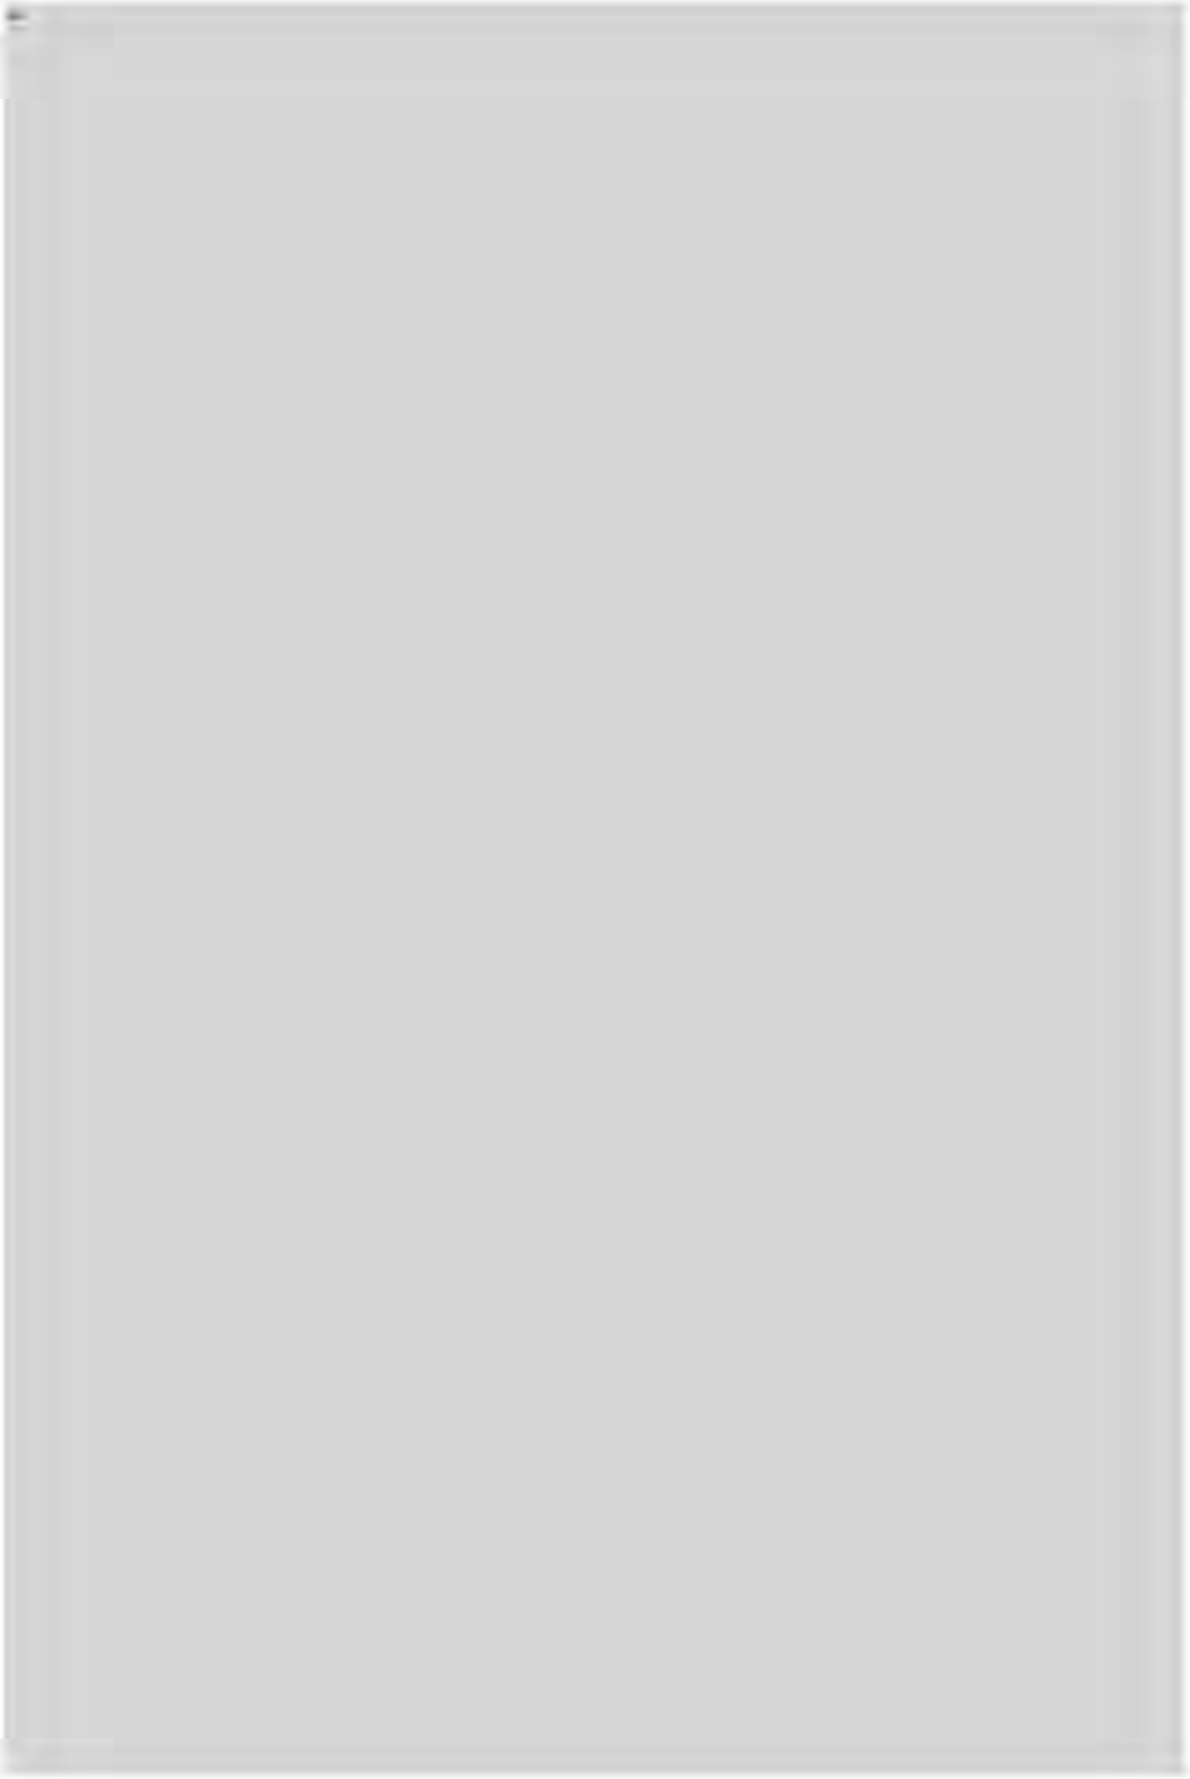

512e
0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr7

| | |
|---|---|
| Naam overleg | **Rotterdamsebaan-Binckhorst-Vlietzone-Schenkviaduct-overleg (RBVS-overleg)** |
| Auteur | 5.1.2.e |
| **Verslag** d.d. | 8 december 2014 |

Aanwezig:

Weth. Revis, 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Data volgende vergaderingen:

Maandag 15 december

BR

**ROTTERDAMSEBAAN:**

**3. Subsidieaanvraag bij provincie voor Molenvlietpark**

- Gevraagd: Bespreken van de voorgestelde aanpak in aanwezigheid van 5.1.2.e
- Besloten:
  - Lobby wordt ingezet op drie niveaus: wethouder met de gedeputeerde, 5.1.2.e met collega-directeur en ambtelijk vanuit onze medewerker van DSO, DSB en projectorganisatie-Rotterdamsebaan.
  - In de communicatie moet er nadrukkelijk de aandacht op gevestigd worden dat ook Hoogheemraadschap van Delfland €6,25mln. (+risicoreservering van €0,7mln.) steekt in het project; terwijl provincie om 'slechts' €3,5mln. gevraagd wordt.
  - Aan de partners die om ondersteuning van de subsidieaanvraag richting provincie worden verzocht ook gemeente Rijswijk toevoegen vanwege belang wijk Hoornwijk.
  - De subsidieaanvraag moet nu geconcretiseerd gaan worden door de elementen uit het raming die betrekking hebben op het park toe te voegen. 5.1.2.e kan daarvoor contact opnemen met 5.1.2.e en 5.1.2.e van de projectorganisatie.
  - Wethouder wil 29 januari de concept-subsidieaanvraag in het RBVS-overleg bespreken en de vooraankondiging.
  - In de loop van februari spreekt de wethouder de gedeputeerde en geeft hem de vooraankondiging. Ook kan bespreken worden de definitief aanvraag vóór of na de statenverkiezingen in te dienen.

Docnr7

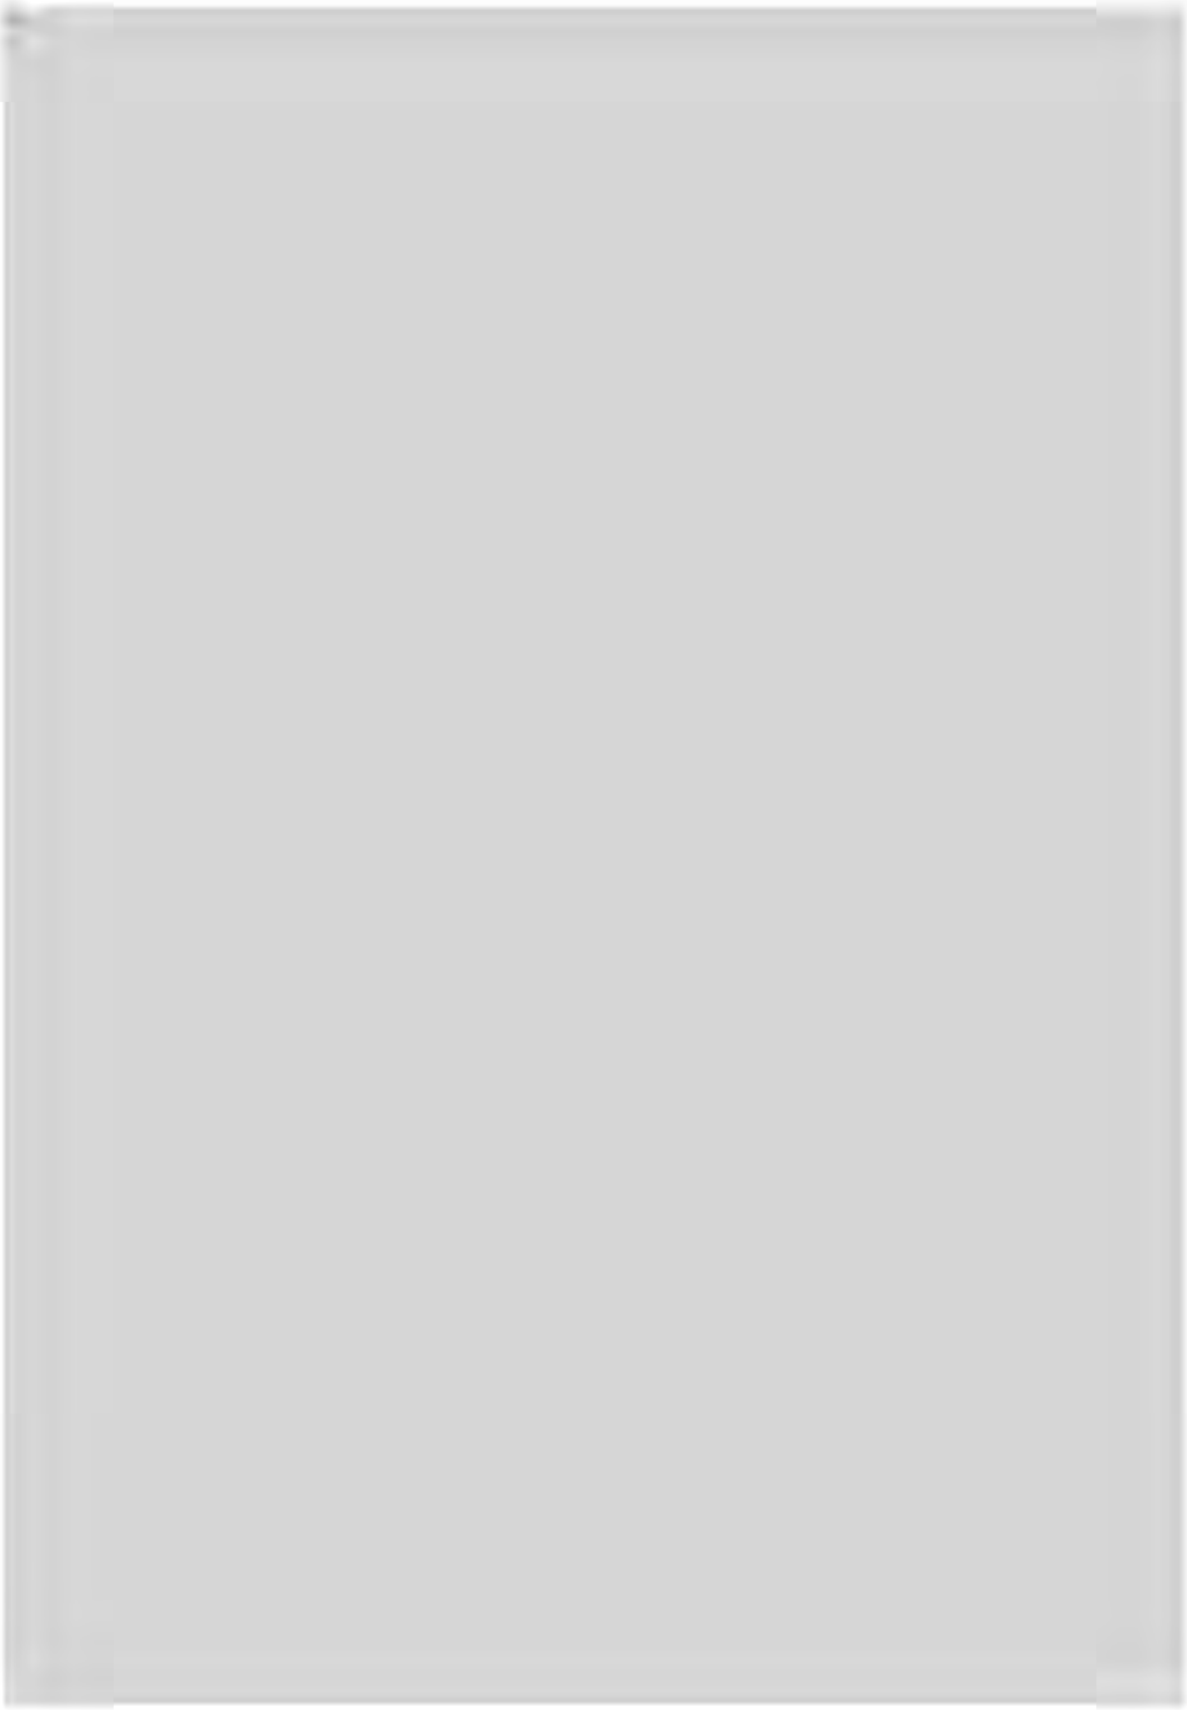

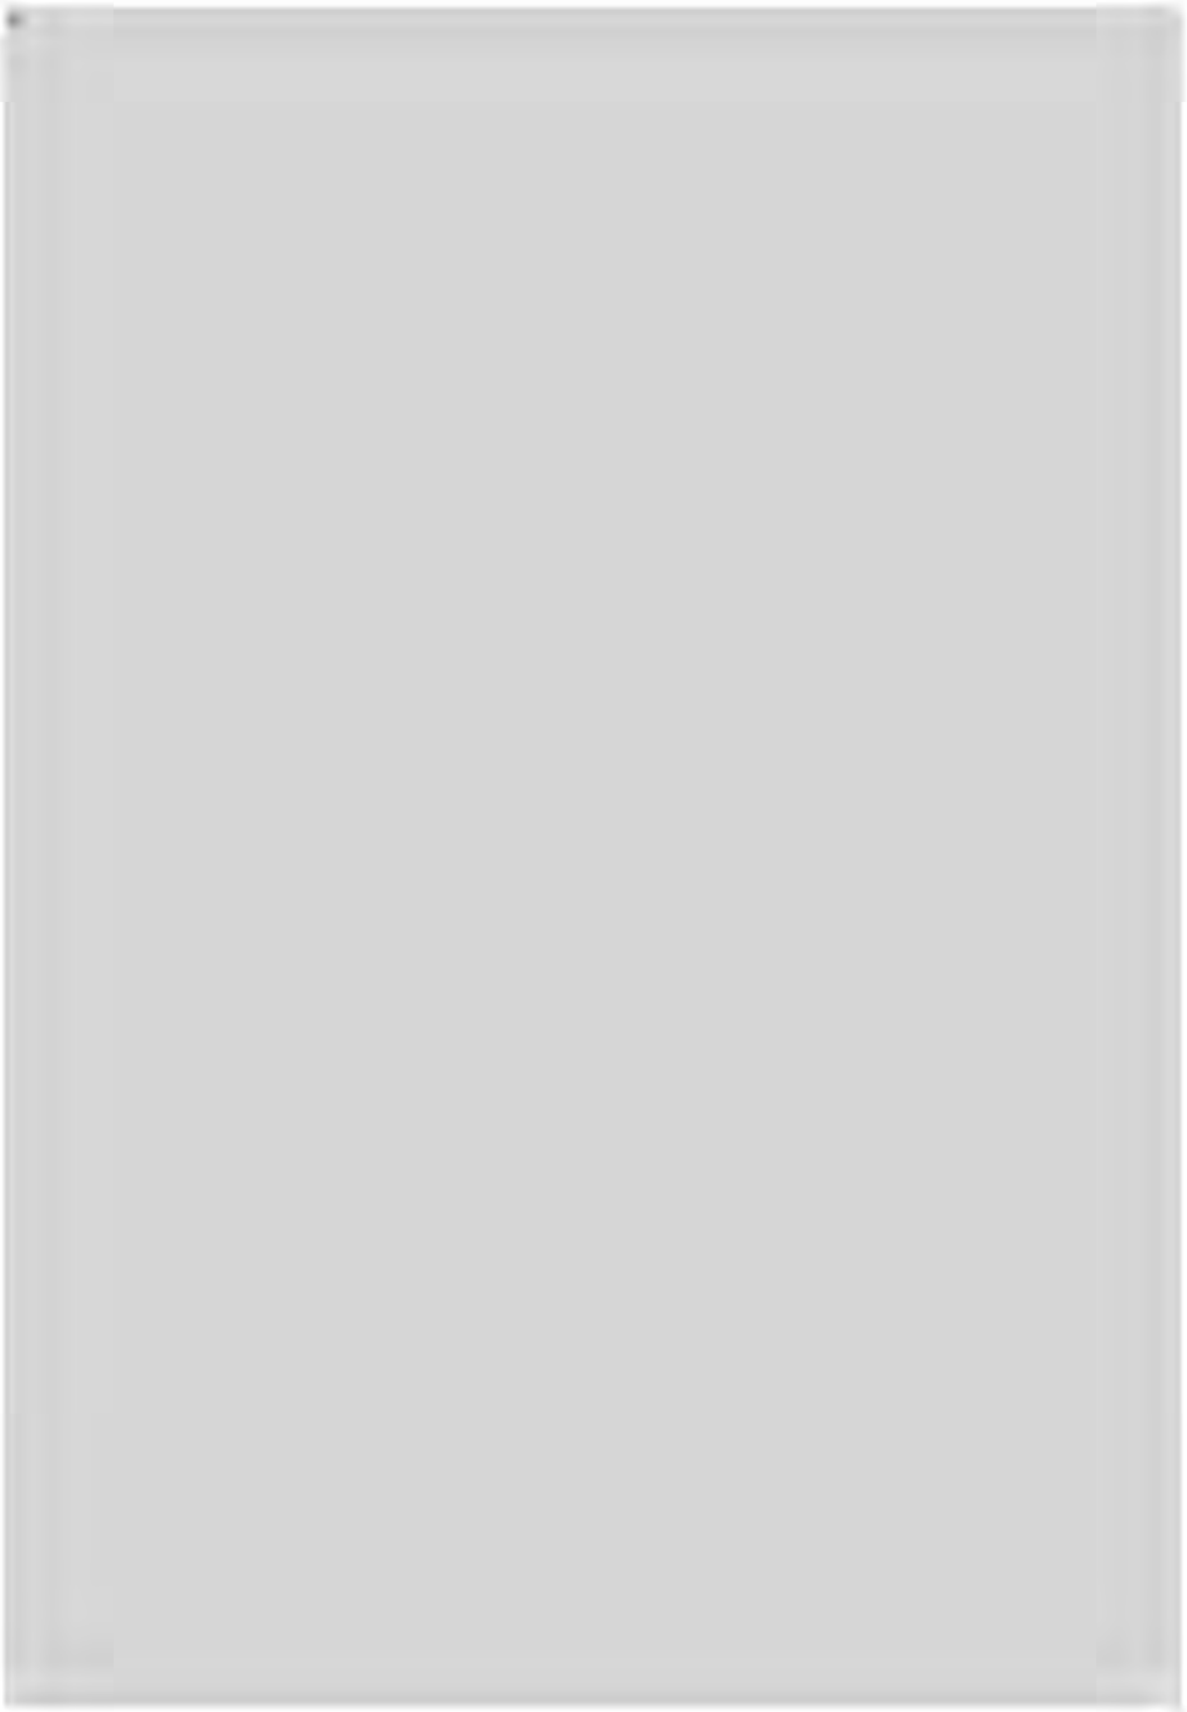

**ACTIELIJST:**

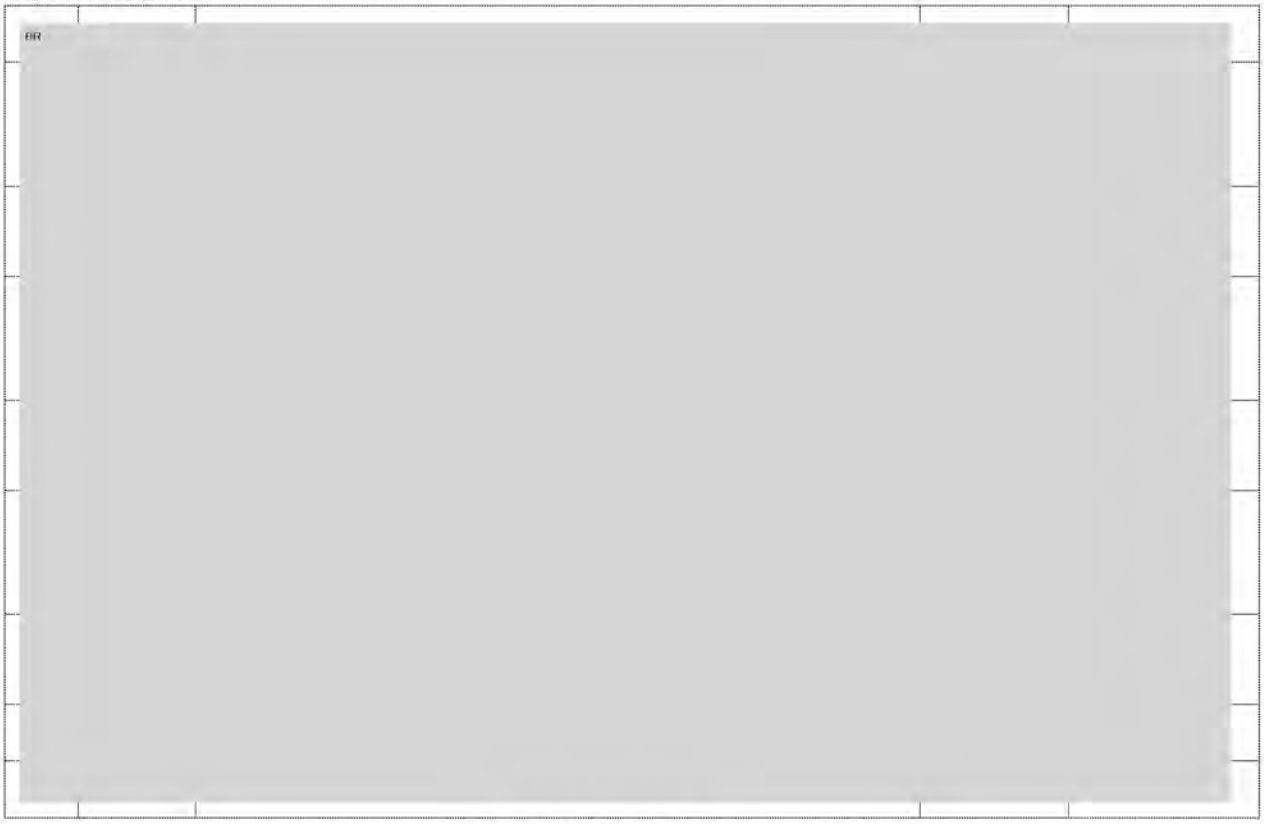


o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr8

| | |
|---|---|
| Naam overleg | **Rotterdamsebaan-Binckhorst-Vlietzone-Schenkviaduct-overleg (RBVS-overleg)** |
| Auteur | 5.1.2.e |
| **Verslag** d.d. | 29 januari 2015 |

Aanwezig:

Weth. Revis, 5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Data volgende vergaderingen:

Donderdag 19 februari 2015

BR:

**ROTTERDAMSEBAAN:**

**3. Brief wethouder aan gedeputeerde omtrent financiële bijdrage Molenvlietpark**

- Gevraagd: Bespreken in aanwezigheid van 5.1.2.e
- Besproken:
  - Wethouder: behandeling VO Molenvlietpark in de raadscommissie op woensdag 28 januari is goed gegaan. Meeste fracties wilde het op de besluitenlijst voor de raadsvergadering zetten, maar D66 wil het bespreken omdat realisatie Trekfietstracé (ook in een tijdelijk situatie vanaf 2017) in het plan ontbreekt. Het beoogde tracé voor het trekfietstracé valt echter buiten de scope van het project Rotterdamsebaan. Het is een project van wethouder De Bruijn met DSO/Verkeer. → 5.1.2.e naast de gronden waarop de Rotterdamsebaan aan het werk gaat moeten er aan weerszijde ook nog gronden verworven worden richting de brug over de A4 (van golfbaan) en naar de Westvlietweg (waarschijnlijk van stal Meyvliet). Daar heeft project Roba geen invloed op. Aanbesteding hoofdcontract is al in gang gezet waardoor t.z.t. opdrachtnemer verzocht kan worden (op kosten van project Trekfietstracé) om tijdelijke route over of langs het werkterrein te mogen aanleggen. Daarnaast zal hoogheemraadschap watercompensatie eisen wegens toevoegen van verhard oppervlak en moet er een oplossing komen t.a.v. de bestaande brug over de Vliet.
  - Wethouder: tijdens Interbestuurlijk-Overleg-Rotterdamsebaan ook de wethouders van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk opgeroepen om positief advies aan provincie uit te spreken t.a.v. de beoogde subsidieaanvraag door Den Haag voor kwaliteitsimpuls Molenvlietpark. Zijn zij daartoe bereid. Raadscommissie wil het dictum t.a.v. de subsidie aangepast hebben. → 5.1.2.e maakt een tekstvoorstel. → 5.1.2.e directeur Groen&Economie van de provincie staat positief tegenover de subsidieaanvraag, is geen garantie.
- Besloten:
  - Brief van 5.1.2.e (namens wethouder) aan gedeputeerde 5.1.2.e is akkoord. VO boekje Molenvlietpark toevoegen als bijlage. Brief in CC tevens versturen naar

betrokken directeuren binnen de provincie en andere 'groene' stakeholders in de regio zoals Landschapstafel, Hof van Delfland en de opvolger van het BO-groen-Haaglanden. **(Actie** 5.1.2e **)**

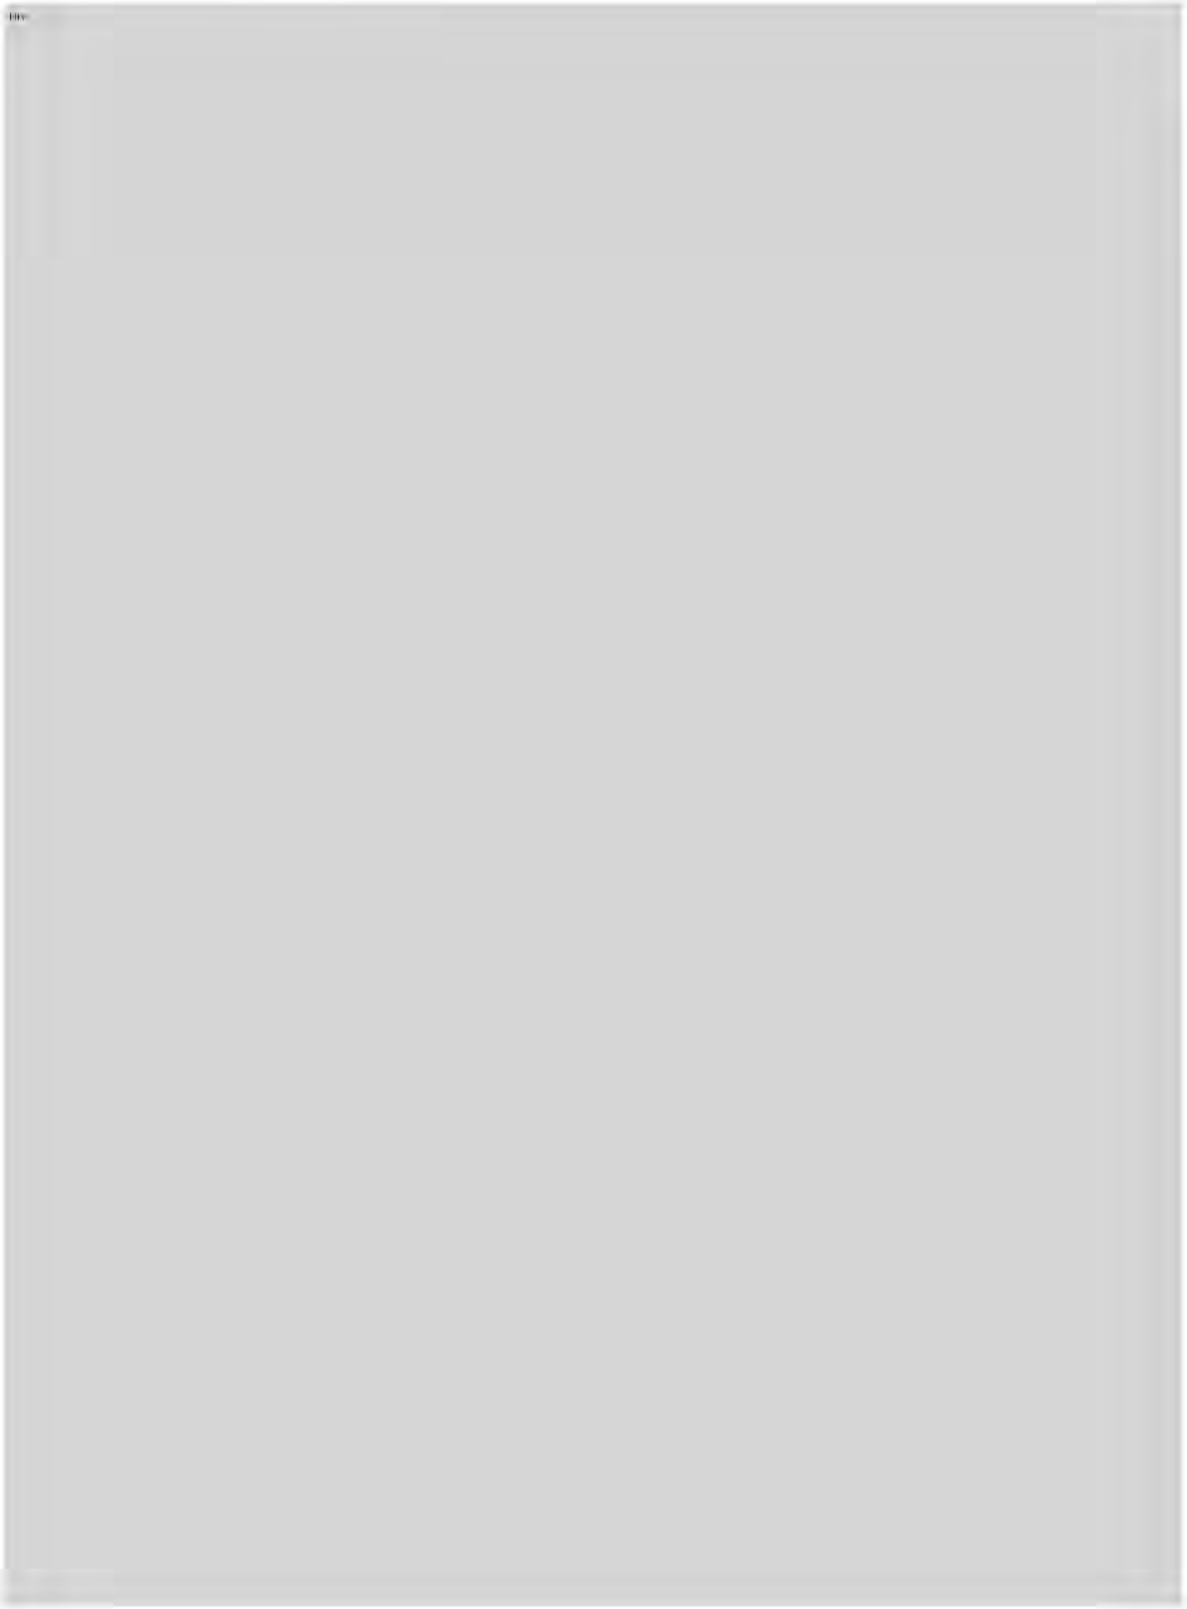

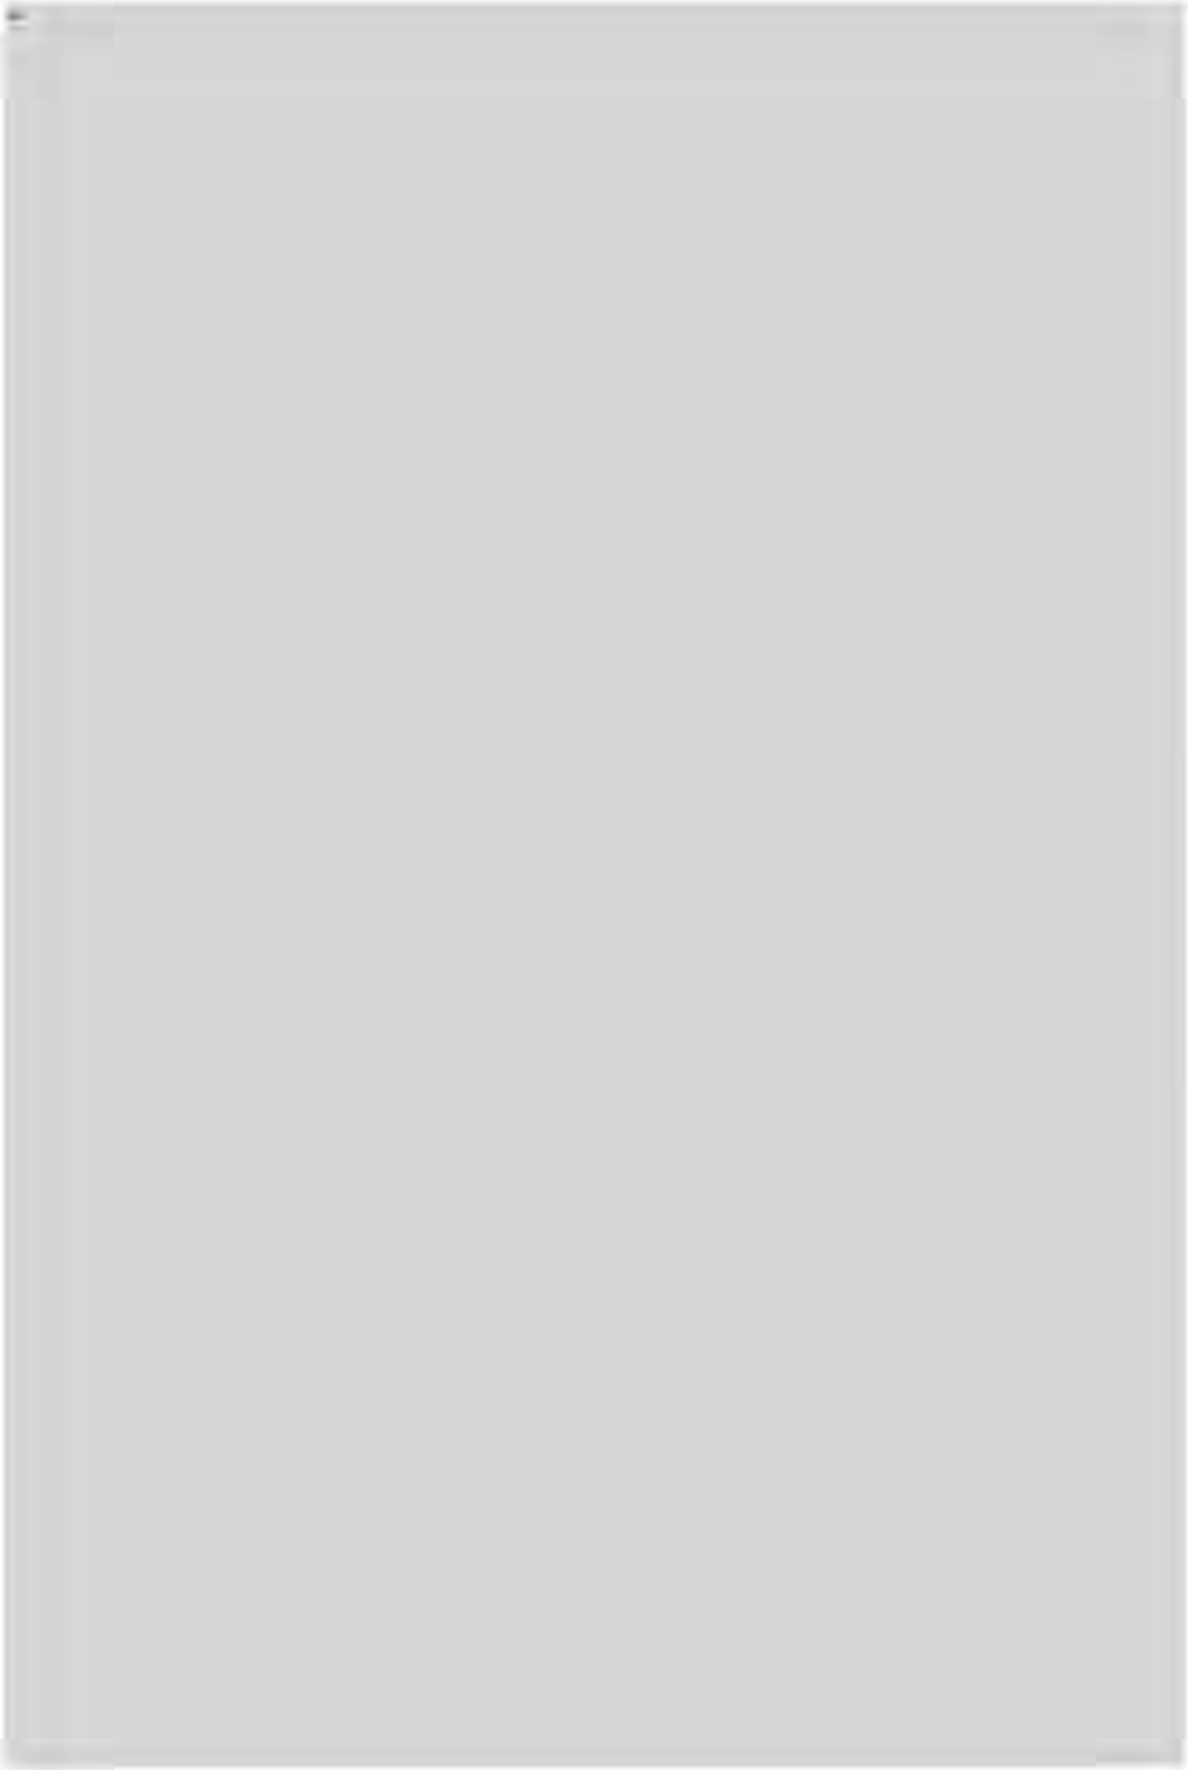

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BR | | | | |
| 4 | 29 jan 2015 | Brief t.a.v. subsidieaanvraag Molenvlietpark aan provincie verzenden (incl. VO boekje). In CC aan overige stakeholders | 5.1.2.e | 19 feb 2015 |
| BR | | | | |

o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr9

| | |
|---|---|
| Naam overleg | **Rotterdamsebaan-Binckhorst-Vlietzone-Schenkviaduct-overleg (RBVS-overleg)** |
| Auteur | 5.1.2.e |
| **Verslag** d.d. | 2 april 2015 |

Aanwezig:

Weth. Revis, 5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Data volgende vergaderingen:

Donderdag 23 april 2015

## 1. Opening en mededelingen

- Wethouder: sinds afgelopen RBVS-overleg is er veel gebeurt, waaronder:
  - VO Molenvlietpark is op 5 maart door de gemeenteraad vastgesteld;
  - Samenwerkingsovereenkomst met Hoogheemraadschap van Delfland t.b.v. waterberging in het Molenvlietpark is op 11 april ondertekend;

**4. Brief provincie t.a.v. Molenvlietpark**

- Gevraagd: Bespreken
- Besproken:
  - Wethouder: jammer dat provincie naar de Landschapstafel Hof van Delfland doorverwijst, maar dat betekend dat gemeente daar hard op moet inzetten. Er moet een duidelijk pitch komen vanuit de gemeente aan deze Landschapstafel. Wellicht kunnen de stakeholders, zoals stichting Meyvliet, daar een bijdrage aan leveren. Vanuit de gemeente zijn o.a. betrokken 5.1.2.e en 5.1.2.e

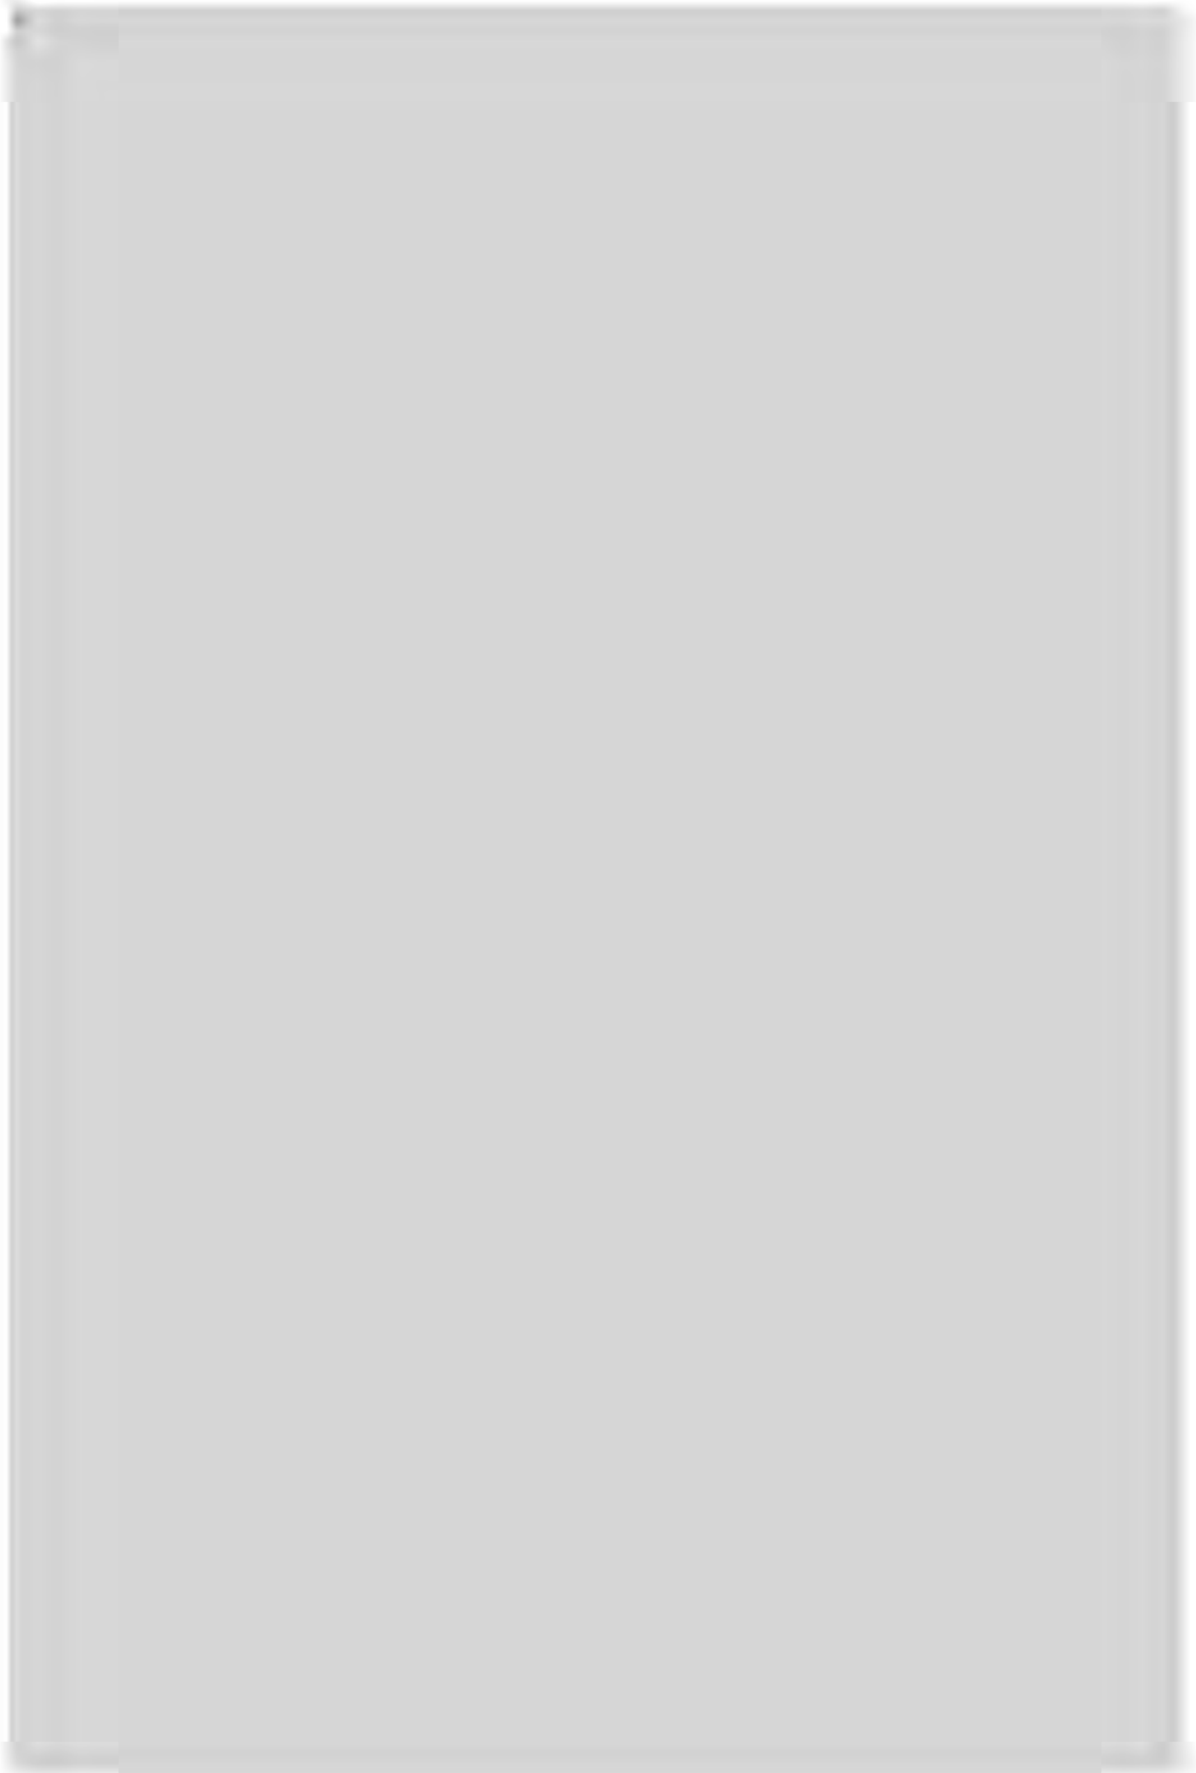

o-o-o-o-o-o-o-o-o

| | |
|---|---|
| Naam overleg | **Rotterdamsebaan-Binckhorst-Vlietzone-Schenkviaduct-overleg (RBVS-overleg)** |
| Auteur | 5.1.2.e |
| **Verslag** d.d. | 25 juni 2015 |
| Aanwezig: | Weth. Revis, 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |
| Kopieën aan: | 5.1.2.e 5.1.2.e |
| Volgende vergadering: | Donderdag 27 augustus 2015 |

**4. Bestemmingsplan Molenvlietpark e.o.**

- Gevraagd: Terugkoppeling n.a.v. inloopavond maandag 22 juni
- Besproken:
  - 5.1.2.e avond is beperkt bezocht. O.a. de bekende tegenstanders gesproken. Een zienswijze is daarom te verwachten.
- Besloten: Ter kennisgeving aangenomen

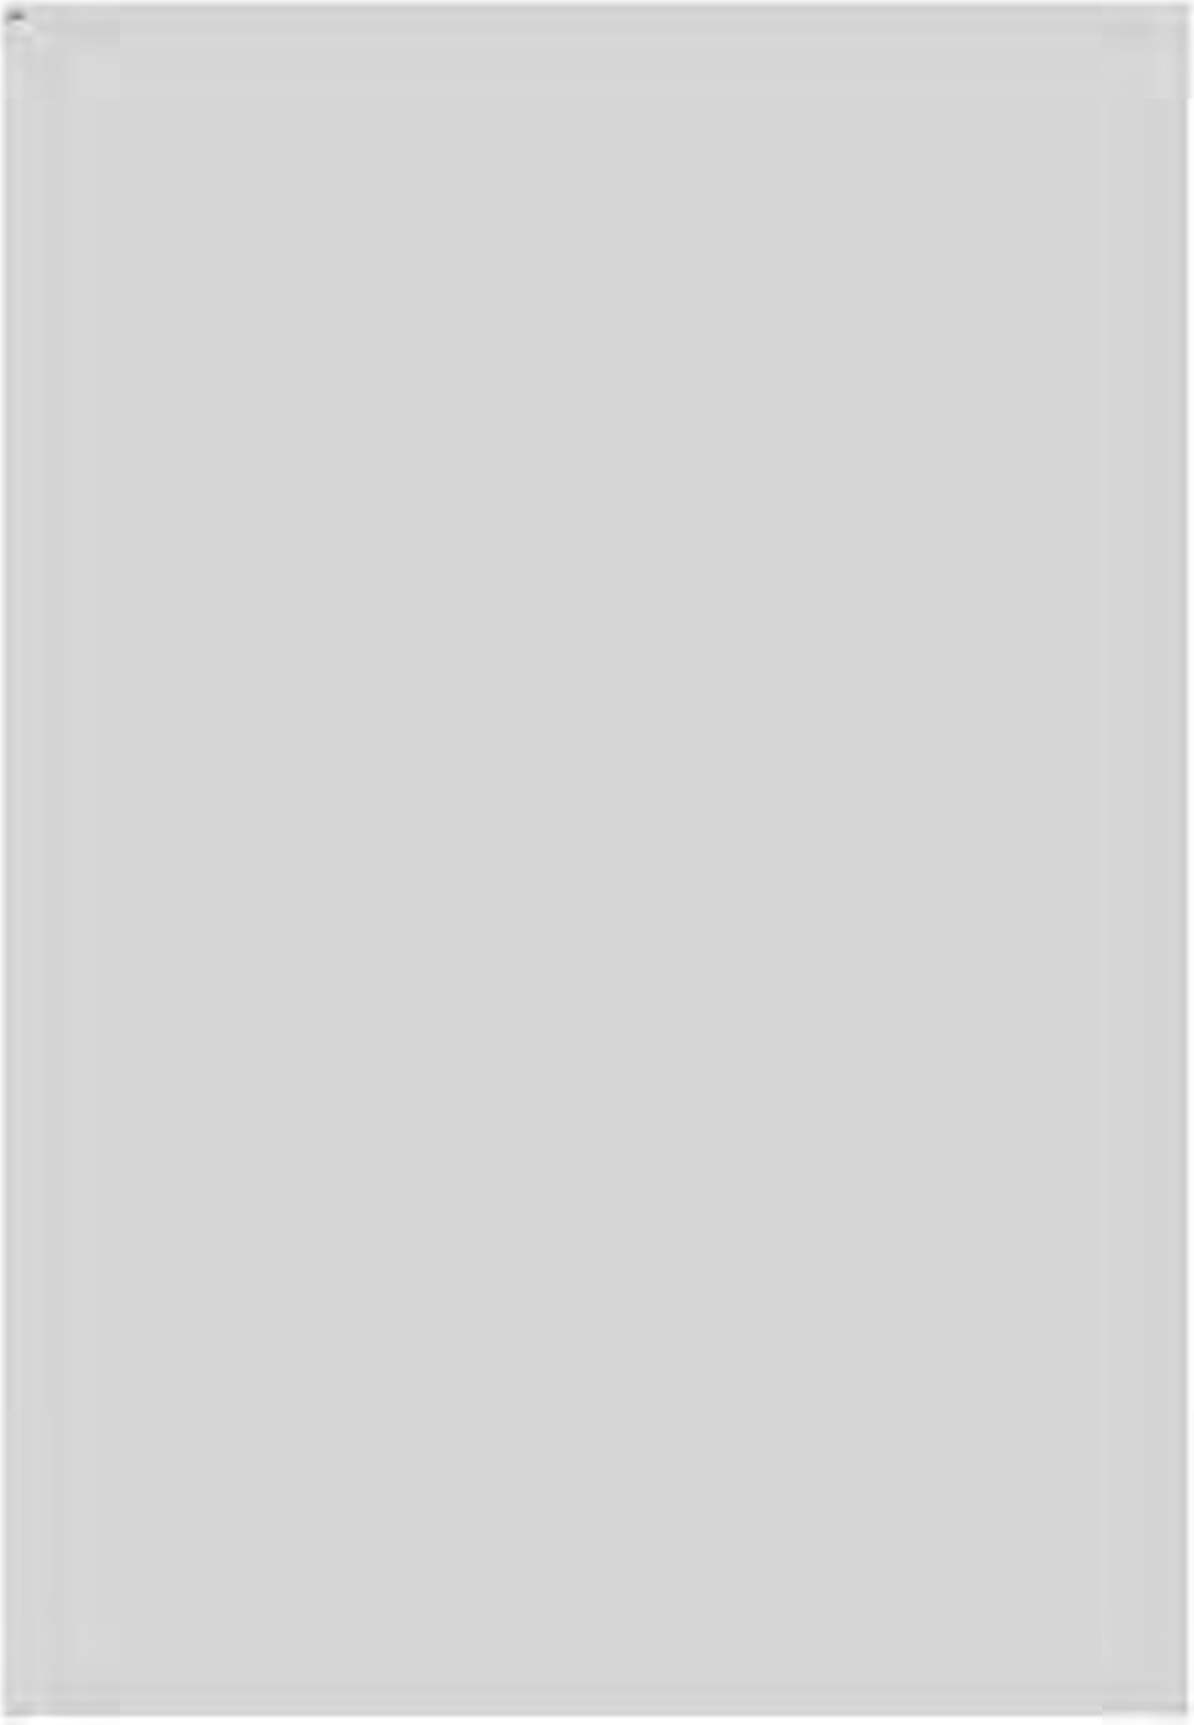

Docnr10

**ACTIELIJST:**

| Nr. | datum | Actie punt | Wie | Planning |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr11

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 10 november 2016 |
| Naam overleg | **Rotterdamsebaan-Binckhorst-Vlietzone-Schenkviaduct (RBVS-overleg)** |

Aanwezig:

Boudewijn Revis (weth. BSKB), 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

Afwezig:

x

Kopieën aan:

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

BR

## ROTTERDAMSEBAAN:

## 3. Geen agendapunten

- Besproken:
  - 5.1.2.e Gisterenmiddag is er (opnieuw) mondelinge overeenstemming bereikt met 5.1.2.e over de realisatie van de 2e watertoevoer over zijn perceel (n.a.v. de door HHD gewenste aanpassingen). Roba betaalt een vergoeding voor de extra beperkingen op zijn terrein. 5.1.2.e wenst opschortende voorwaarde in de overeenkomst in geval bestuurlijke goedkeuring uitblijft. Dit is ongewenst. → Wethouder verzoekt om een separaat overleg omtrent dit onderwerp.

BR

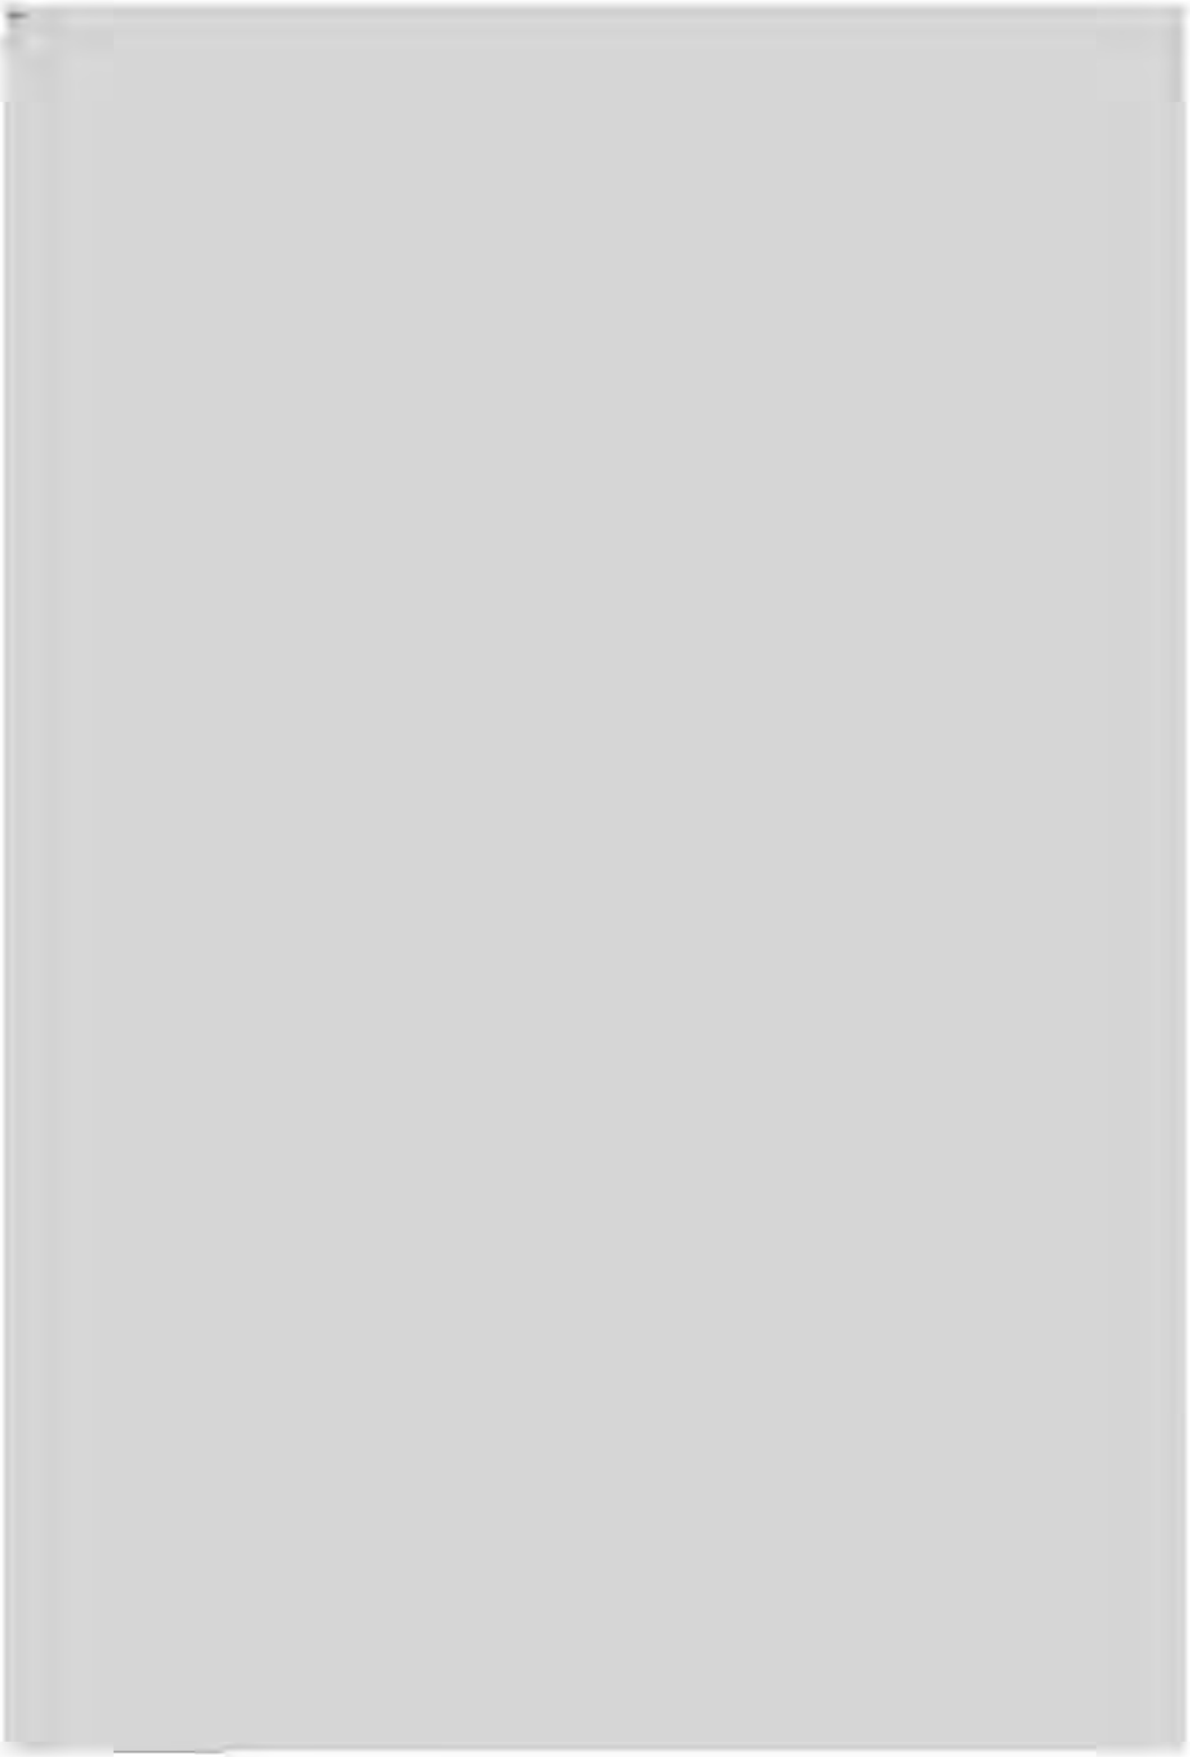

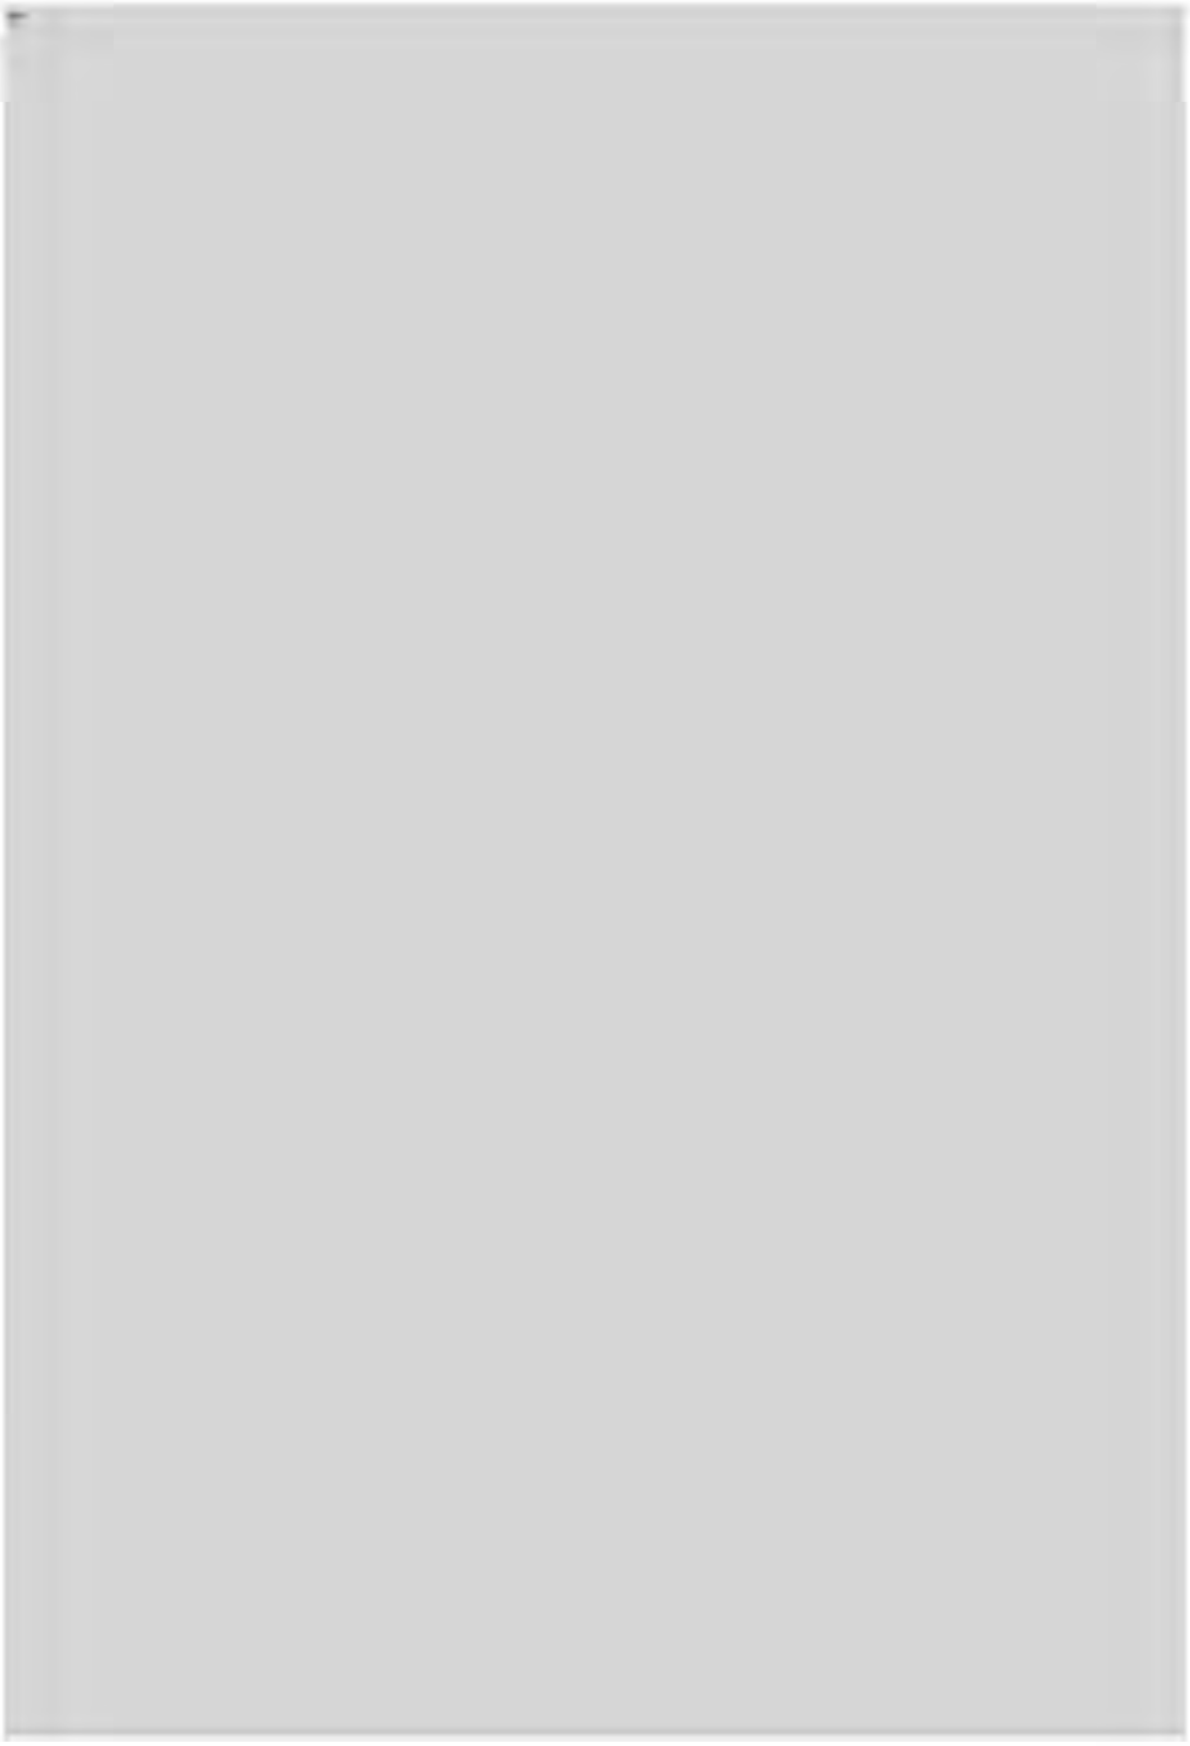

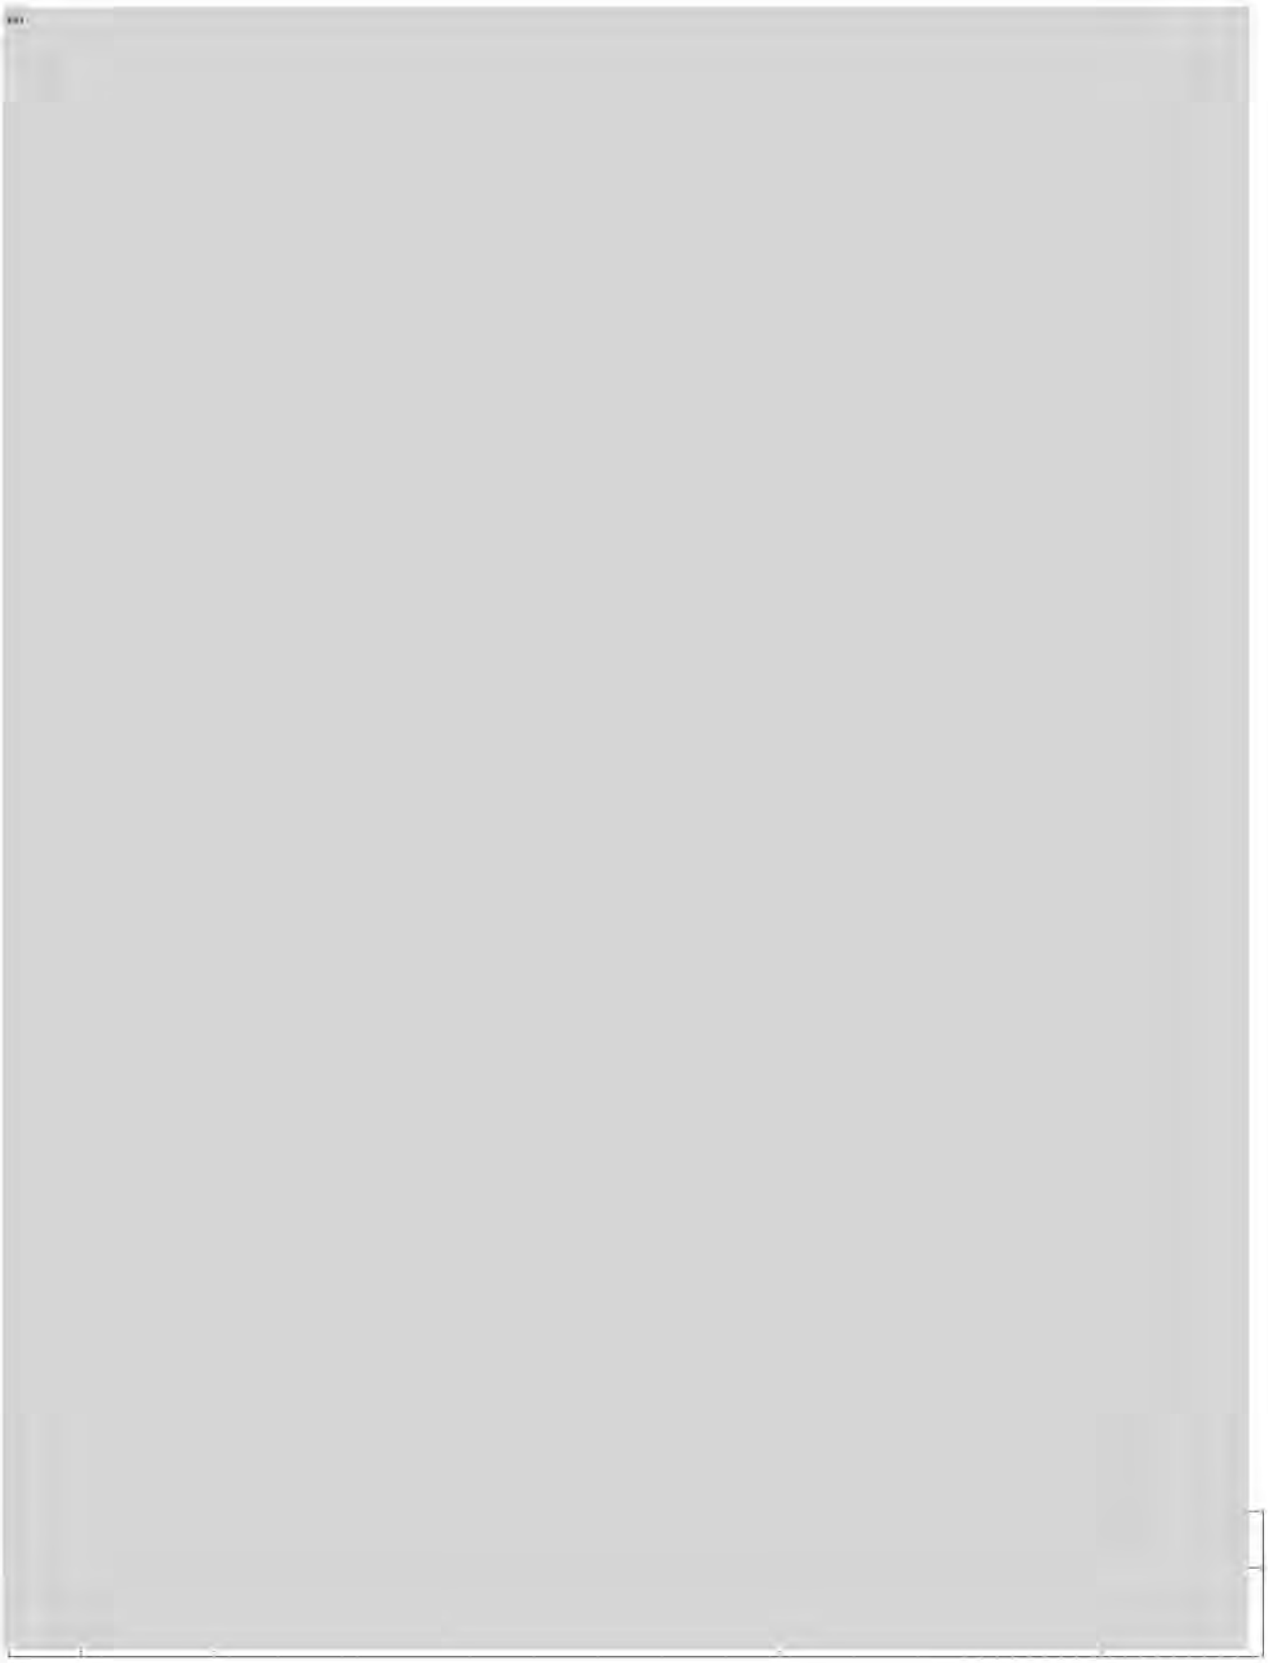

o-o-o-o-o-o-o-o-o

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Overleg: | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Datum + Tijd:: | **15 mei 2014, 13:30–14:30 uur** |
| Aanwezig: | Peter Smit - Wethouder VBV<br>5.1.2.e – DSO, directeur<br>5.1.2.e – BSD, directeur Concern bedrijfsvoering<br>5.1.2.e – DSB, afd. Opdrachtgeving<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e - 5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e – DSB, Ambtelijk opdrachtgever Roba<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e – plv 5.1.2.e tijdens vakantie |
| Afwezig: | 5.1.2.e – Rotterdamsebaan, 5.1.2.e |

---

BR

- Aanleg Molenvlietpark en waterberging, dit ontwerp bestrijkt een groter terrein dan plangebied Roba en heeft een additioneel kostenplaatje van ca. 4 mlj waarvoor geen dekking is binnen de Roba. Hiervoor dient een extra dekking te worden gevonden, dit zal aan de raad worden voorgelegd.
- HHD wil de aanleg van een calamiteitenberging bij de inpassing Vlietzone betrekken. Kostenraming ca. 5 milj. Voorstel is om dit door de projectorganisatie Roba te laten uitvoeren met een lumpsum financiering. Dit wordt alleen uitgevoerd indien er voldoende ruimte is om een risico af te dekken.
- De voor deze calamiteitenberging benodigde grond- en verwervingskosten (Borgdoff) komen eveneens ten laste van HHD
- In het raadsvoorstel is deze calamiteiten waterberging opgenomen. Mocht de Verenigde Vergadering van HHD het voorstel niet aannemen, dan wordt het Molenvlietpad zonder deze voorziening worden uitgevoerd en zal de raad door het college hiervan op de hoogte worden gesteld..

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr2

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Overleg: | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Datum + Tijd:: | **29 september 2014, 10:00–11:00 uur** |
| Aanwezig: | B. Revis - Wethouder BSKB<br>5.1.2.e – DSO, directeur<br>5.1.2.e – DSB, Ambtelijk opdrachtgever Roba<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e (namens 5.1.2.e<br>5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – BSD, directeur Concern bedrijfsvoering |

---

[redacted]

- 5.1.2.e DSO is nog bezig met het maken van een dekkingsvoorstel voor de aanvullende €2,5mln voor het Molenvlietpark. → 5.1.2.e het VO ligt tot 3 november ter inzage. Daarna start het bestuurlijk traject. → Wethouder: dekkingsvoorstel graag in het RBVS-overleg van 13 oktober agenderen.

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr3

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Overleg: | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Datum + Tijd:: | **2 februari 2015, 13:30–14:00 uur** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder BSKB |
| | 5.1.2.e – DSO, directeur |
| | 5.1.2.e – DSB, Ambtelijk opdrachtgever Roba |
| | 5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur |
| | 5.1.2.e (BSD/fin, vervangt 5.1.2.e ) |
| | 5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e (BSD/financiën) |

5.1.2.e

Besproken t.a.v. Molenvlietpark en Trekfietstracé:

- Wethouder: n.a.v. de Voortgangsrapportage is het goed om de raadscommissievergadering van woensdag 28 januari over het Molenvlietpark nu te bespreken. Deze is goed verlopen t.a.v. de gevraagde raadsbesluiten. D66 heeft echter vragen gesteld over het Trekfietstracé (TFT). Deze valt buiten de scope van het Molenvlietpark, maar D66 wil de garantie dat er na de realisatie van de fietsbrug over de A4 (voorzien in 2017) direct een (tijdelijk)fietspad mogelijk is door de Vlietzone zodat het TFT functioneel in gebruik genomen kan worden.

[redacted]

Besloten t.a.v. Molenvlietpark en Trekfietstracé:

[redacted]

- DSB en DSO bespreken hoeveel budget er nu in de boeken staat voor de realisatie van o.a. de brug over de A4, de grondverwerving, de watercompensatie het tijdelijke fietspad op verzoek van D66, de definitieve route door de Vlietzone en de oversteek van de Westvlietweg en de Vliet.

[redacted]

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr4

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Overleg: | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Datum + Tijd:: | **3 juni 2015, 17:00–17:30 uur** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder BSKB |
| | 5.1.2.e – DSB, Ambtelijk opdrachtgever Roba |
| | 5.1.2.e (BSD/financiën) |
| | 5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur |
| | 5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – DSO, directeur |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |

---

BR

- Wethouder: op basis waarvan is de plafondprijs in de dialoogfase van de aanbesteding verhoogd? → 5.1.2.e door de scope-uitbreidingen (Molenvlietpark) en de analyse dat het project maakbaar is voor het oorspronkelijke bedrag, maar er door deze verhoging meer ruimte is voor gewenste maatregelen i.h.k.v. de EMVI-criteria. De nu gehanteerde plafondprijs is wethouder al eens gepresenteerd en heeft dus geen effect op het risicobudget. → Wethouder: in hoofdstuk 11 dus toevoegen 'binnen budget'.

BR

**4. Projectmutaties**

Gevraagd 1: Vaststellen projectmutatie Molenvlietpark

Besproken 1: Wethouder: indien we geen subsidie van €1,9 mln. ontvangen is er geen dekking voor de plusvariant. Aangegeven is dat deze variant vooralsnog niet uit het budget Rotterdamsebaan betaald zal worden. → 5 1 2 e in dat geval dient er dus elders dekking vandaan te komen.

Besloten 1: Vastgesteld

Gevraagd 2: Vaststellen projectmutatie Waterberging

Besloten 2: Vastgesteld

Docnr5

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Overleg: | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Datum + Tijd:: | **4 november 2015, 16:00–16:30 uur** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder BSKB |
| | 5.1.2.e - DSB, Ambtelijk opdrachtgever Roba |
| | 5.1.2.e - BSD/financiën |
| | 5.1.2.e – DSB/Opdrachtgeving |
| | 5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing |
| | 5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – DSO, directeur |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |

---

5.1.2.e

- 5.1.2.e Voor bestemmingsplan Molenvlietpark is nu beroep bij Raad van State mogelijk. Voor bestemmingsplan Binckhorst kunnen zienswijzen ingediend worden. Naar verwachting gaan beide trajecten soepel richting vaststellen/onherroepelijk.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | **17 december 2015, 9:00–9:30 uur, stadhuis D04.10** |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

Boudewijn Revis - Wethouder BSKB
5.1.2.e – DSO, directeur
5.1.2.e – DSB, Opdrachtgeving
5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e
5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e
5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e - DSB, Ambtelijk opdrachtgever Roba
5.1.2.e - BSD/financiën

5.1.2.e

- Wethouder: n.a.v. het verslag: 5.1.2.e is inmiddels verhuist en er is één bezwaar binnengekomen van de 5.1.2.e tegen het bestemmingsplan Molenvlietpark.

5.1.2.e

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr7

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 25 april 2016, 13:30–14:00 uur, stadhuis A04.08 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

Boudewijn Revis - Wethouder BSKB
5.1.2.e - DSB, algemeen directeur
5.1.2.e – DSB, directeur
5.1.2.e - BSD/financiën
5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur
5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e
5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e – DSO, directeur
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e

BR

- 5.1.2.e op dit moment wordt er intensief gewerkt aan de ontwerpopgave rondom het perceel van 5.1.2.e Daar moet de waterinlaat naar de waterberging in het Molenvlietpark gerealiseerd worden in combinatie met zijn ontwikkelambities. → Wethouder: na het voorjaarsreces graag een separate afspraak inplannen over deze opgave. **Actie: Roba**

5.1.2.e

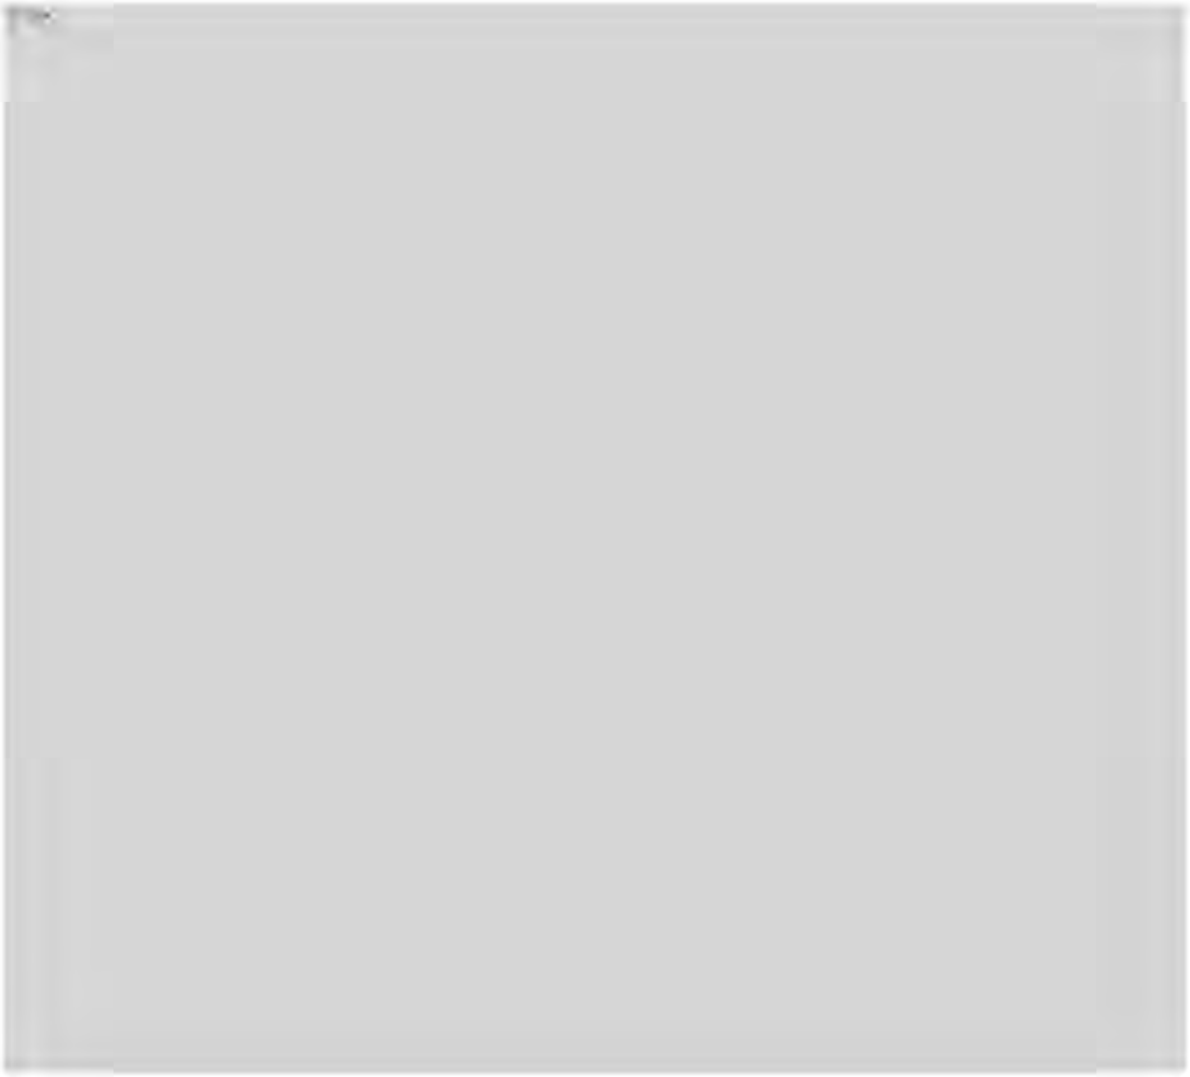

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 1 september 2016, 9:00–9:30 uur, stadhuis D04.10 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

Boudewijn Revis - Wethouder BSKB
5.1.2.e – DSB, directeur
5.1.2.e – i.p.v. 5.1.2.e BSD/Financien
5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e
5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e – DSO, directeur
5.1.2.e - BSD/financiën
5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e

BR

## 4. Voortgangsrapportage 2e kwartaal 2016 incl. GRIP

Gevraagd: Bespreken
Besproken:

- Wethouder wil graag het stappenplan weten t.a.v. de gesprekken met 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e over de 2e watertoevoer naar het Molenvlietpark en de woningbouwplannen van 5.1.2.e 5.1.2.e → 5.1.2.e 5.1.2.e is akkoord met het ontwerp van de 2e toevoer, maar er moet nog een deal gesloten worden. Met het Hoogheemraadschap moet nog gesproken worden over het aanwenden van haar risicopot door deze kosten.

5.1.2.e

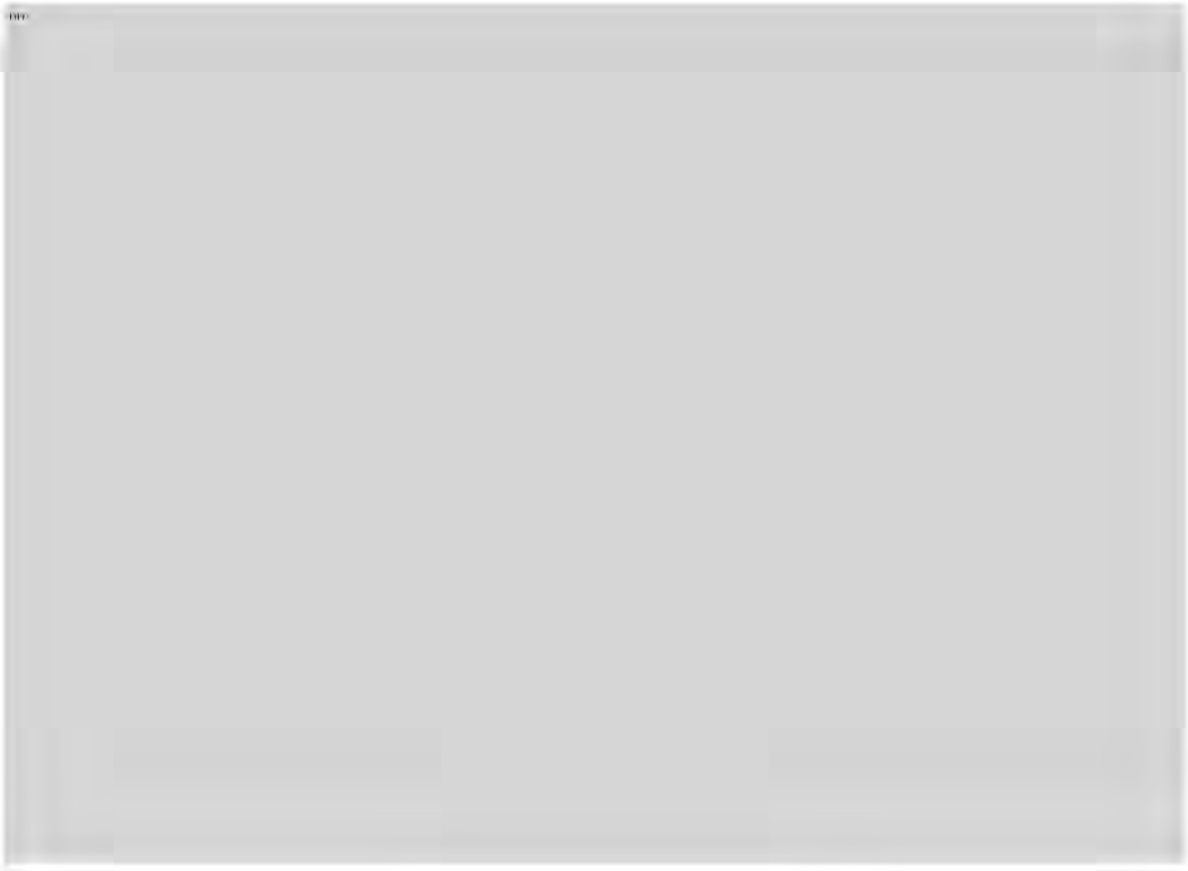

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Docnr9

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 3 november 2016, 16:30–17:00 uur, stadhuis D04.10 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

Boudewijn Revis - Wethouder BSKB
5.1.2.e – DSB, algemeen directeur
5.1.2.e – DSB, directeur
5.1.2.e – i.p.v. 5.1.2.e BSD/Financien
5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e
5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e – DSO, directeur
5.1.2.e - BSD/financiën
5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e

BR

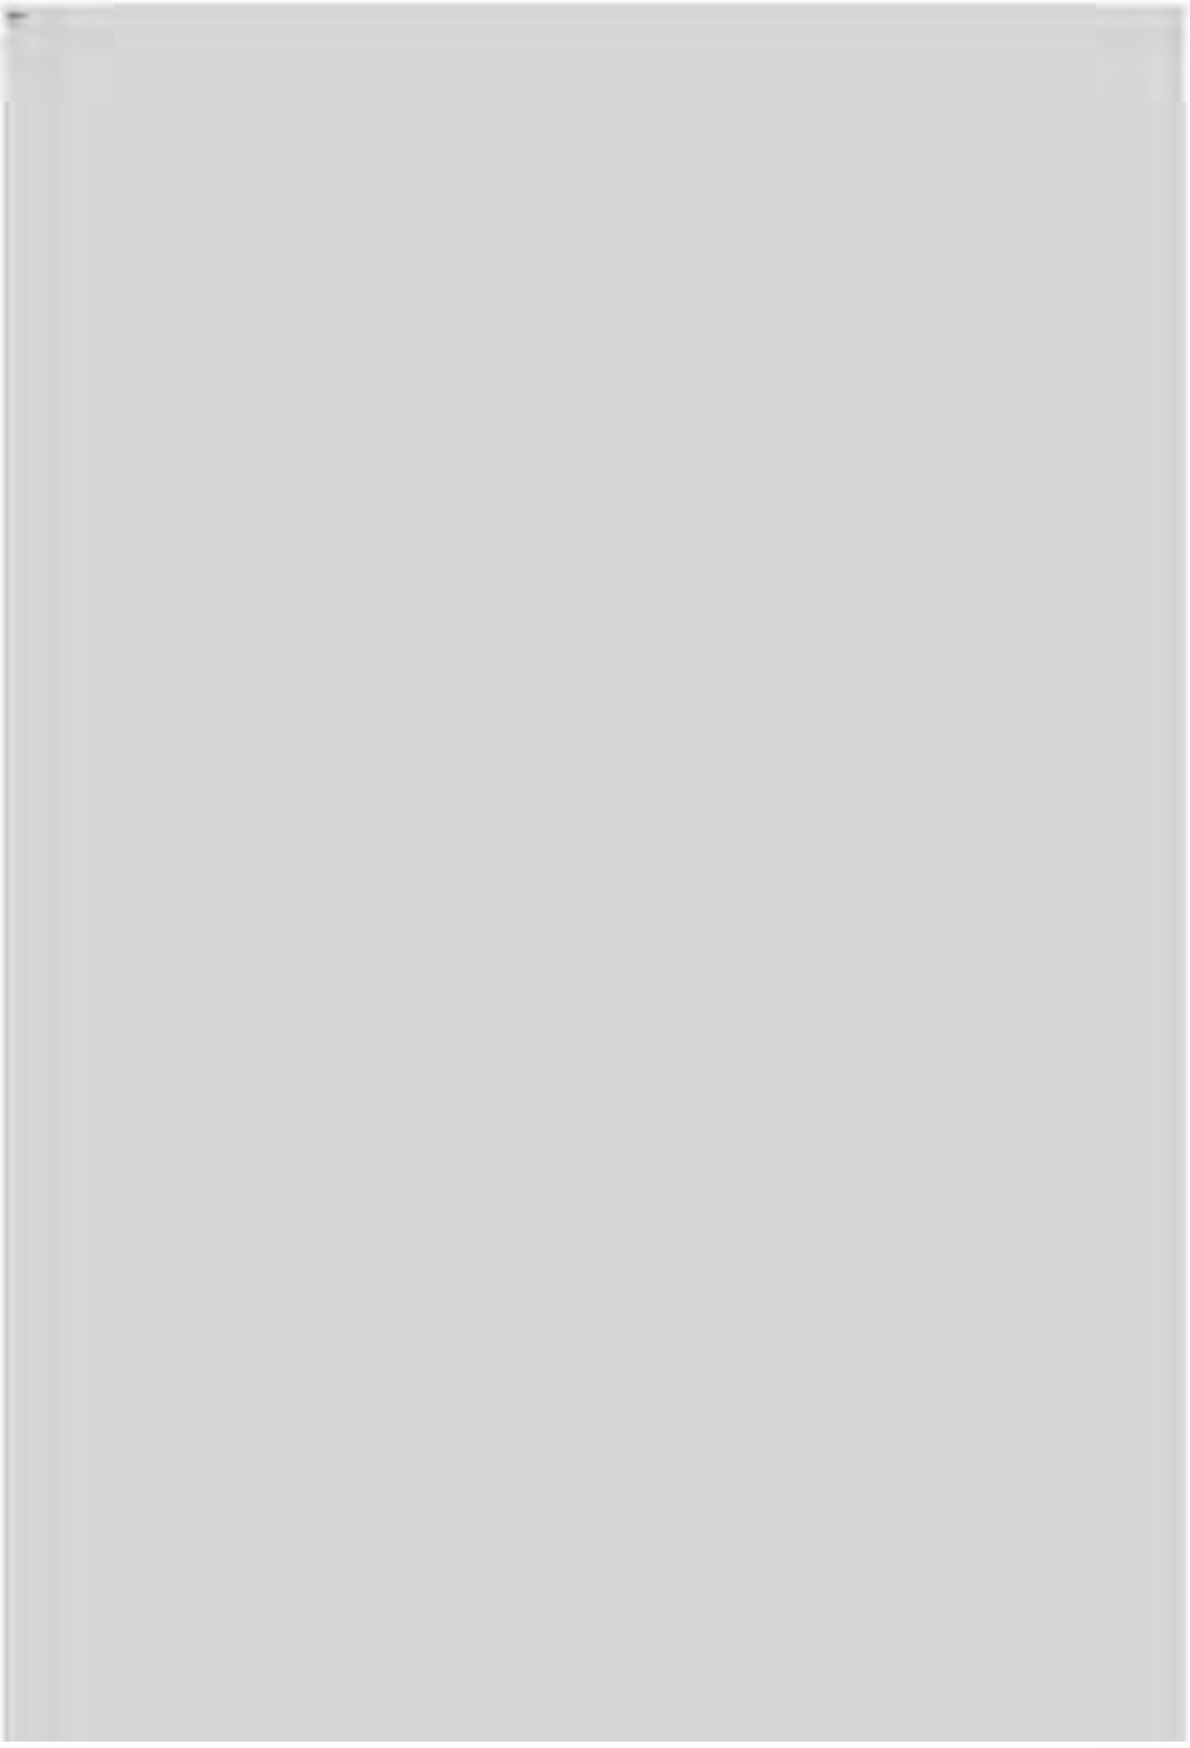

## 8. Rondvraag en sluiting

- Wethouder vraagt naar de stand van zaken van de onderhandelingen met 5.1.2e over zowel de 2e watertoevoer als Nieuw Vredenoord. → 5.1.2e over het ontwerp van de 2e toevoer is mondelinge overeenstemming. Beide partijen maken een kostenraming voor de te verrichten werkzaamheden (o.a. op zijn terrein) waarna de kostenverdeling moet plaatsvinden. In het kader van de waterveiligheid kan het Hoogheemraadschap als uiterste middel, indien 5.1.2e uiteindelijk geen medewerking verleent vanwege uitblijven bestuurlijke vaststelling van zijn voorgestane ontwikkeling Nieuw Vredenoord, een aanwijzing van de grond ter onteigening doen. T.a.v. van de ontwikkeling Nieuw Vredenoord (waarvoor er reeds een intentieovereenkomst gesloten is) is de stedenbouwkundige van DSO tevreden. DSO is aan zet om hiervoor een Project Uitvoeringskader (PUK) op te stellen. Daarin zal ook de toets door de provincie i.h.k.v. de landgoederenzone en het Nationaal Natuurwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) een plek krijgen. Vervolgens moeten zowel de provincie als de gemeenteraad met deze ontwikkeling instemmen. Er zal o.a. een groencompensatieplan bij moeten zitten. → Wethouder verzoekt 5.1.2e om binnen 2 weken hierover met hem een intern overleg te organiseren.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 8 maart 2017, 20:00–12:30 uur, stadhuis D04.10 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder BSKB<br>5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e – DSO, directeur<br>5.1.2.e – i.p.v. 5.1.2.e BSD/Financien<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing<br>5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – DSB, algemeen directeur<br>5.1.2.e - BSD/financiën |

BR

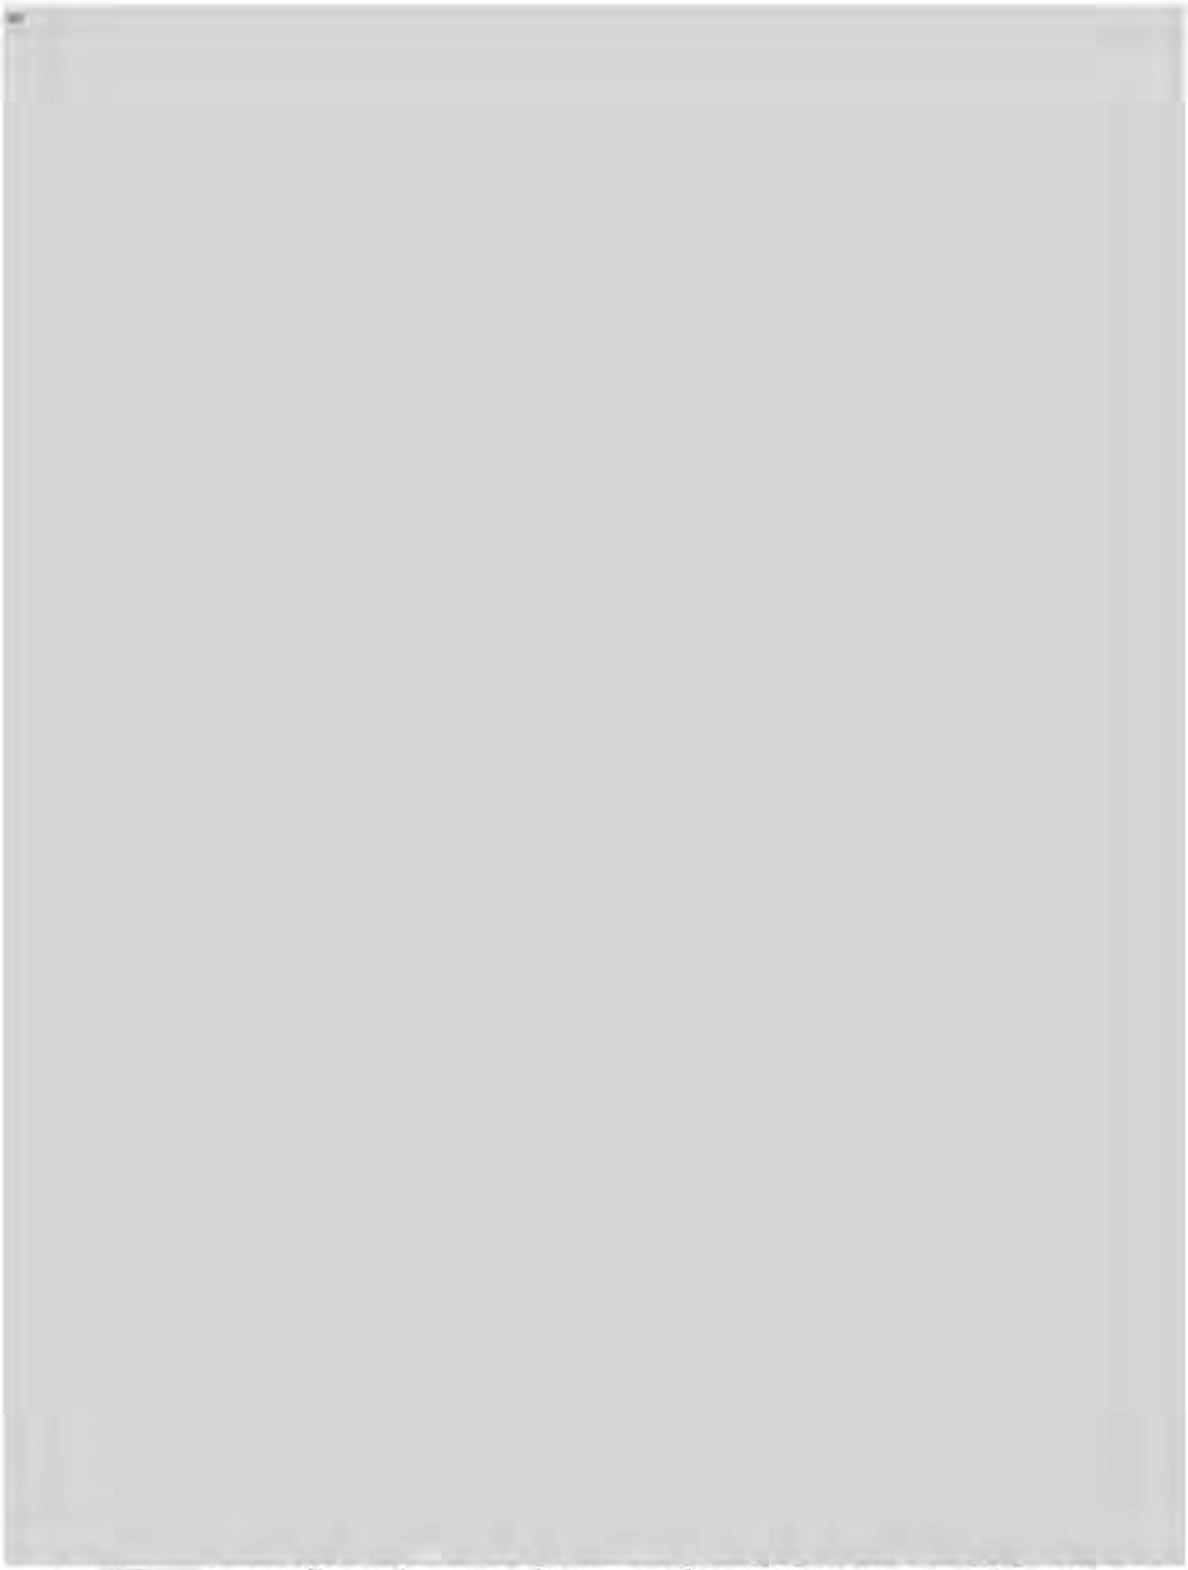

- 5.1.2.e vraagt of het verhogen van de waterstand van NAP +0,10m naar NAP +0,25m geen negatieve gevolgen heeft voor de bomen in de Vlietzone. → 5.1.2.e niet het water, maar de waterkering wordt verhoogd.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2e |
| Verslag d.d. | 11 mei 2017, 16:00–16:30 uur, stadhuis D04.10 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder BSKB<br>5.1.2e – DSB, Algemeen directeur<br>5.1.2e – DSB, directeur<br>5.1.2e – DSO, directeur<br>5.1.2e –BSD/Financiën<br>5.1.2e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2e – Roba, 5.1.2e<br>5.1.2e – Roba, 5.1.2e<br>5.1.2e - Roba, Projectbeheersing<br>5.1.2e – 5.1.2e 5.1.2e<br>5.1.2e – Roba, 5.1.2e |
| Afwezig: | - |

BR

Besproken:

- BR Wethouder vraagt naar de actuele stand van zaken van de ontwikkeling Nieuw Vredenoord. → 5.1.2e laat onder leiding van 5.1.2e door DSO het PUK opstellen. 5.1.2e zal deze kosten vergoeden. 5.1.2e en 5.1.2e (5.1.2e Roba) hebben deze week een goed gesprek gehad met 5.1.2e over de stand van zaken. 5.1.2e heeft met betrokken collega's van DSO en DSB diverse workshops ingepland om de onderwerpen voor in het PUK te bespreken/uitwerken. → 5.1.2e concept PUK zal met wethouder besproken worden waarna het voor de zomer in het college kan worden vastgesteld en de raad kan worden geïnformeerd. → Wethouder vraagt speciale aandacht voor de betrokkenheid van DSB/Groen. → 5.1.2e heeft persoonlijk nog geen concept-PUK gezien, maar heeft begrepen dat DSB goed in het proces is aangehaakt. Daarnaast heeft DSB een opdracht uitgezet m.b.t. een berekening van de capaciteit van de waterinlaat met als doel deze wellicht op een andere locatie te kunnen realiseren. Het alternatief zou met het Hoogheemraadschap besproken kunnen worden. → Wethouder vindt collegebehandeling na het zomer onwenselijk. → 5.1.2e o.b.v. de technische en inhoudelijke kaders uit het PUK wordt voor gemeente en 5.1.2e inzichtelijk of zijn plan past binnen die kaders of dat hij het moet aanpassen. → Wethouder: kan besluitvorming naar zomer 2018? → 5.1.2e er zal dan en vertraging in de uitvoering plaatsvinden waardoor de calamiteitenberging pas in 2021 in gebruik kan worden genomen t.o.v. 2020.. Het financiële voordeel van werk met werk uitvoeren komt dan te vervallen en het zal met het Hoogheemraadschap als opdrachtgevende partij besproken moeten worden. Uitstel van dit besluit heeft geen gevolgen voor de realisatie of openstelling van het wegtracé van de Rotterdamsebaan.

BR

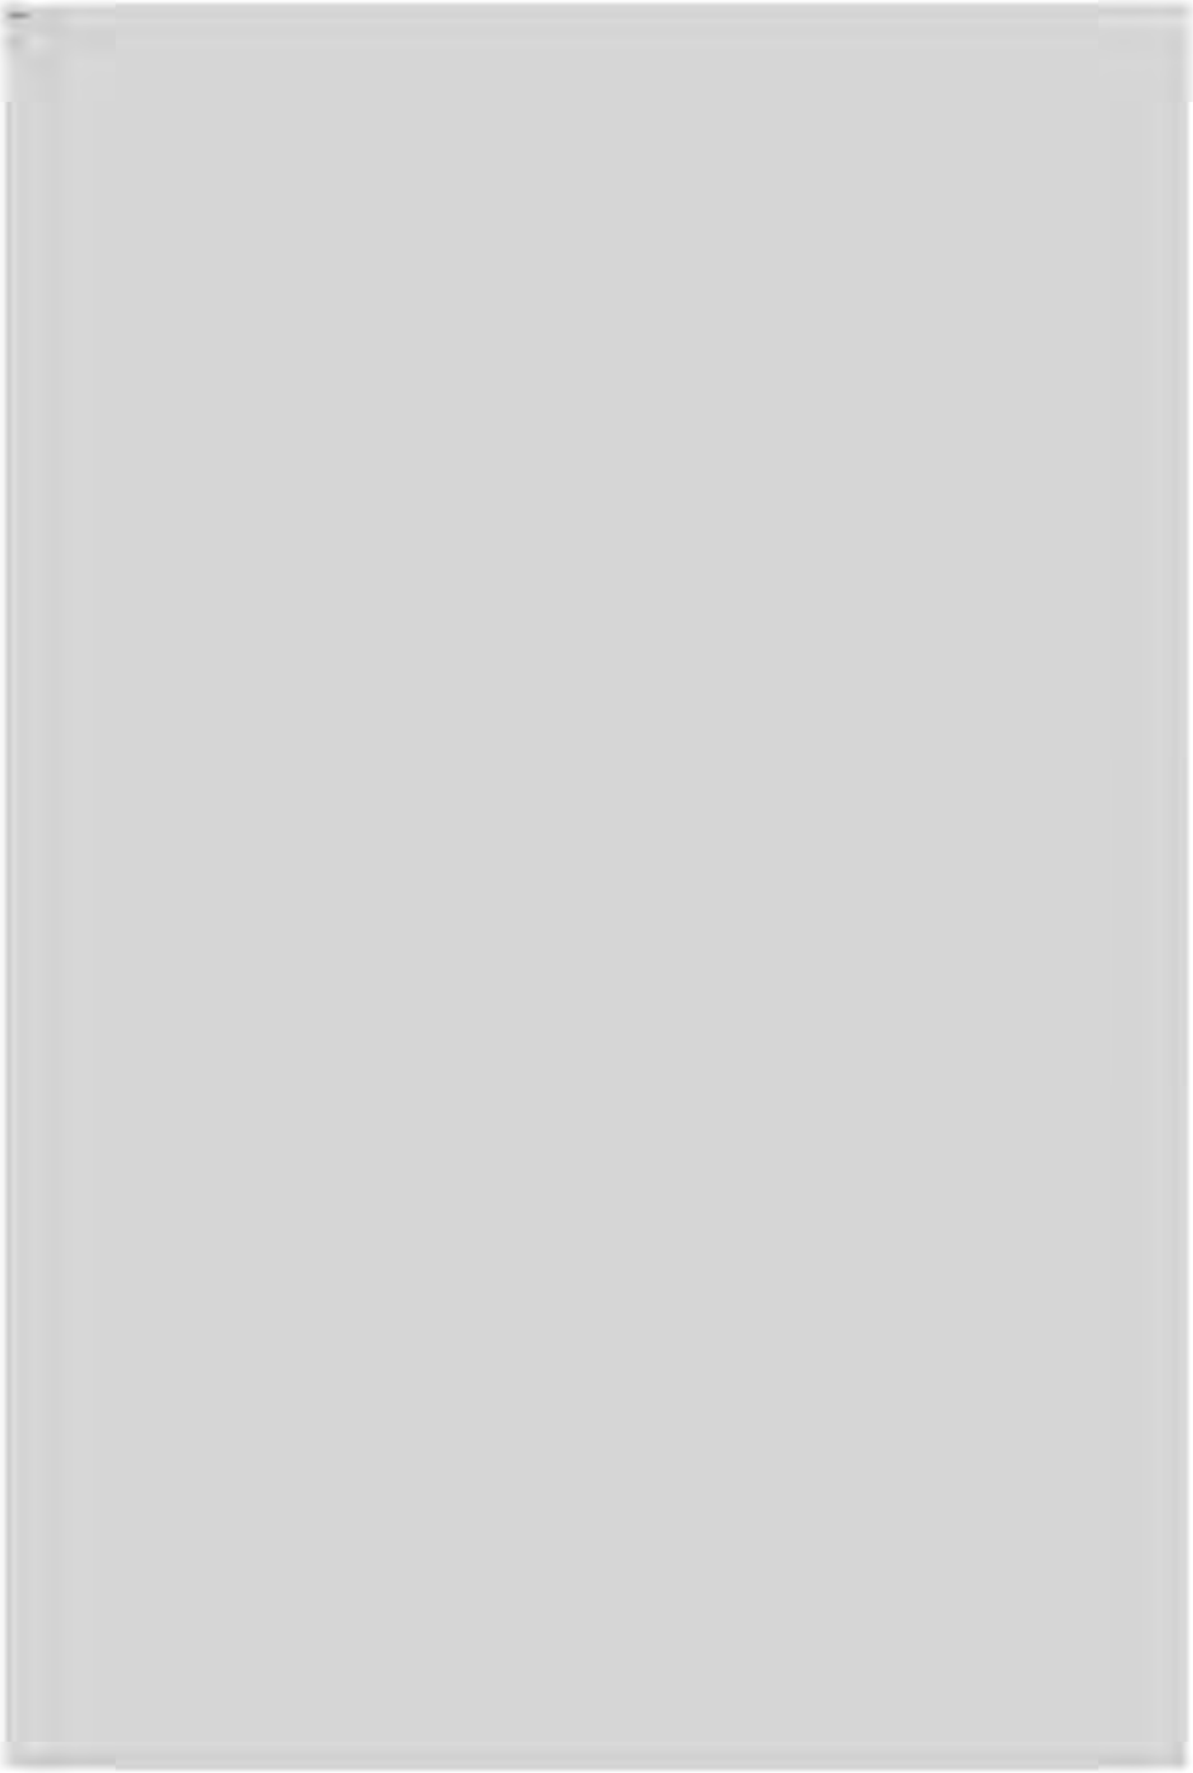

- Vlietzone: vergunning van Hoogheemraadschap verkregen voor dempen van een deel van de Molensloot nadat de aangebrachte persleiding in werking is gesteld. Het dempen van de Molensloot is direct aangevangen waarna ook bunker uit WOII (later onderdeel van de waterkering) verwijderd kan worden. De startschacht is na het uitharden van het onderwaterbeton leeg gepompt. Het is nu een bouwkuip van ca. 16m diep. Volgende week wordt er in 40uur een hoeveelheid van 2600m3 onderwaterbeton voor de toerit aangebracht.

- 5.1.2.6 provincie Zuid Holland heeft projectorganisatie gevraagd om tezamen met de realisatie van de waterinlaat van Vliet naar Molenvlietpark een 125m kade langs de Vliet te vervangen (op haar kosten). Deze werken derden opdracht zal via de gebruikelijke projectmutatieprocedure ter besluitvorming worden voorgelegd.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 24 augustus 2017, 16:00–16:30 uur, stadhuis D04.10 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder BSKB<br>5.1.2.e – DSB, Algemeen directeur<br>5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e –BSD/Financiën<br>5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing<br>5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – DSO, directeur<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |

## 3. Voortgangsrapportage n.a.v. 2e kwartaal 2017

Gevraagd: Bespreken

Besproken:

- Wethouder: t.a.v. de waterinlaat staat er voor maandag 4 september een afspraak ingepland met 5.1.2.e en 5.1.2.e

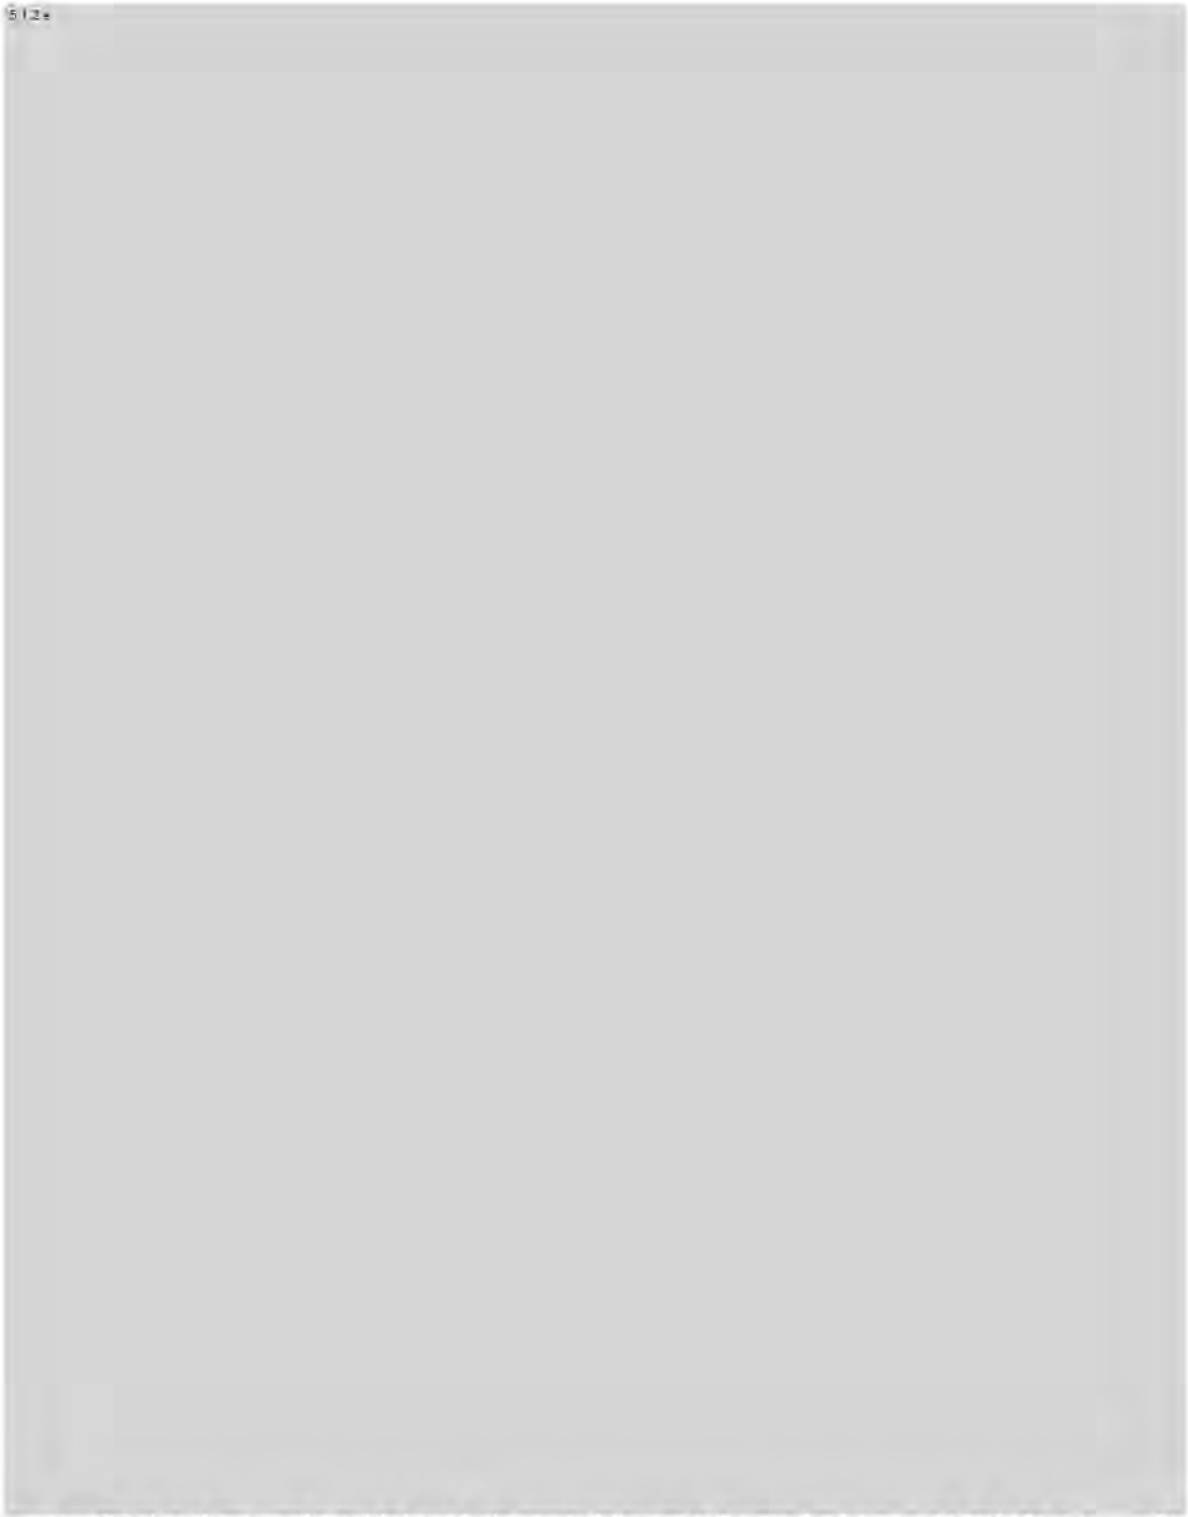

- Wethouder: wordt er i.h.k.v. de boormachine met de provincie gesproken? → 5.1.2.e Op initiatief van de provincie praat de projectorganisatie met de provincie over het mogelijk in opdracht van de provincie uitvoeren van extra lengte waarover de kademuur van de Vliet vervangen wordt. Dat kan de projectorganisatie eventueel meenemen samen met haar werkzaamheden aan de kademuur t.b.v. de waterinlaat.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 23 november 2017, 9:30–10:00 uur, stadhuis D04.10 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder BSKB<br>5.1.2.e – DSB, Algemeen directeur<br>5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e –BSD/Financiën<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – DSO, directeur |

BR

- Wethouder: s.v.z. watertoevoer? → 5.1.2.e vandaag is het opstellen van het PUK weer voortgezet. 5.1.2.e zal volgende week 5.1.2.e bezoeken, de concept PUK bespreken en aangeven dat een watertoevoer over terrein 5.1.2.e de gemeentelijke voorkeur geniet.

BR

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 1 februari 2018, 12:30–13:00 uur, stadhuis D04.10 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder BSKB<br>5.1.2.e – DSB, Algemeen directeur<br>5.1.2.e – DSO, directeur<br>5.1.2.e –BSD/Financiën<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e |

- Wethouder informeert of de nieuwe eigenaar van de woning van 5.1.2.e op de hoogte is gesteld van de aankomende werkzaamheden aan de waterinlaat → 5.1.2.e er heeft kort na de verkoop al een kennismakingsgesprek plaatsgevonden waarin is uitgelegd wat de waterinlaat behelst en welke impact dat tijdens de realisatie heeft. DSO rond in februari de PUK met 5.1.2.e af. Daarna verwacht Roba de SOK te kunnen afronden.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

Auteur 5.1.2.e

Verslag d.d. 17 mei 2018, 14:00–14:30 uur, stadhuis D04.10

Naam overleg **Stuurgroep Rotterdamsebaan**

Aanwezig:
5.1.2.e – DSB, Algemeen directeur
5.1.2.e – DSB, directeur
5.1.2.e –BSD/Financiën
5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur
5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing
5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e
5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e

Afwezig:
Boudewijn Revis - Wethouder BSKB
5.1.2.e – DSO, directeur

---

BR

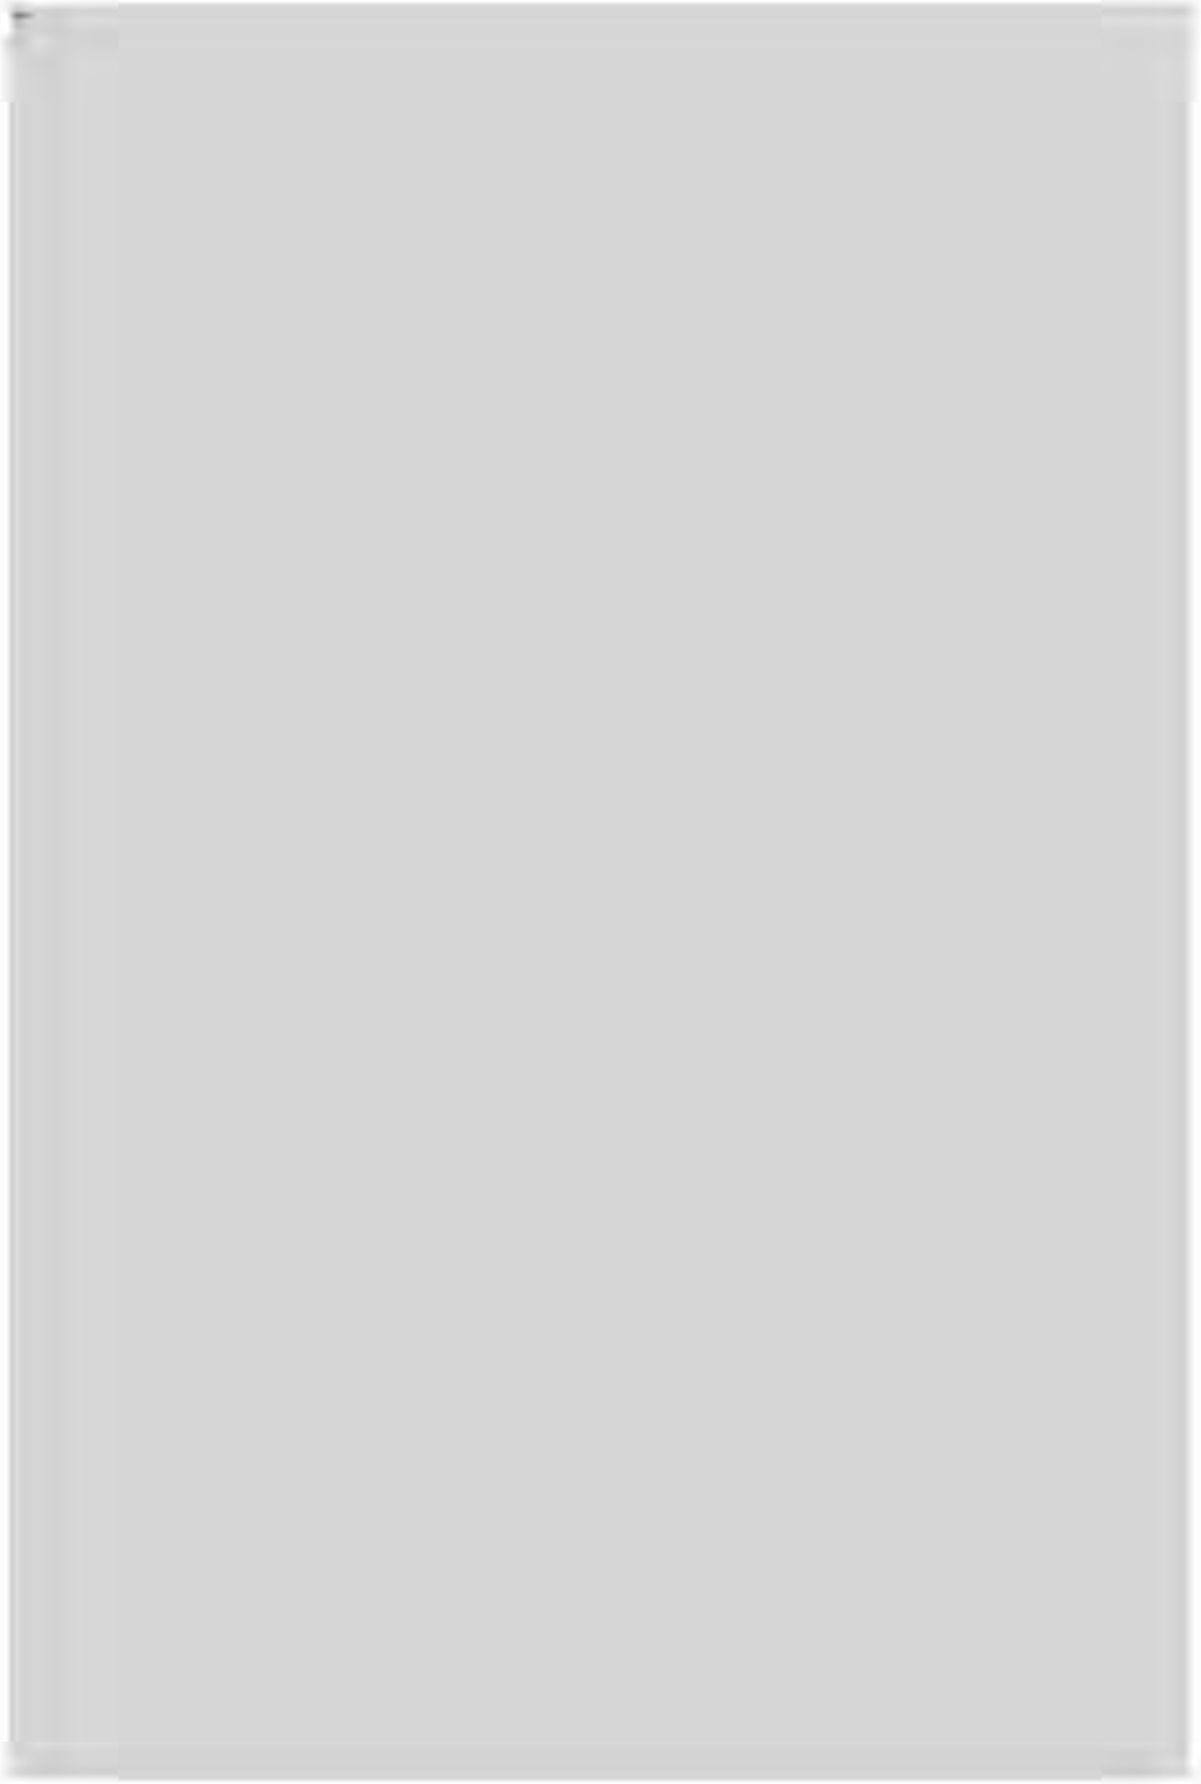

- Roba heeft overeenstemming bereikt met de familie van het perceel langs de Westvlietweg over de realisatie van de tweede watertoevoer over het perceel. Dit staat los van de PUK welke overeen is gekomen tussen de familie en DSO.



o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 7 september 2018, 13:00–13:30 uur, stadhuis D08.10 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder BSKB |
| | 5.1.2.e – DSB, Algemeen directeur |
| | 5.1.2.e – DSB, directeur |
| | 5.1.2.e –BSD/Financiën |
| | 5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur |
| | 5.1.2.e – 5.1.2.e BSKB |
| | 5.1.2.e – Roba, Omgevingsmanagement |
| | 5.1.2.e – Roba, Communicatie |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – DSO, directeur |
| | 5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing |

BR

## 5. Voortgangsrapportage n.a.v. 2e kwartaal 2018

Gevraagd: Bespreken

Besproken:

- Wethouder informeert naar stand van zaken samenwerkingsovereenkomsten tweede watertoevoer. → 5.1.2.e streven is om in oktober overeenstemming te bereiken over de samenwerkingsovereenkomst voor het hebben en realiseren van de watertoevoer over het perceel van de particuliere grondeigenaar. Daarnaast is de projectorganisatie in gesprek met de provincie Zuid Holland voor een samenwerkingsovereenkomst over onder andere het realisatie van de inlaat van de tweede watertoevoer en het op verzoek van de provincie vervangen van een deel van de bestaande oeverkade (werk-met-werk).

- Wethouder meldt dat de Partij voor de Dieren vragen gesteld heeft over het effect op de bestaande bomen n.a.v. het PUK Nieuw Vredenoord → 5.1.2e particuliere initiatiefnemer van Nieuw Vredenoord werkt het plan nader uit in samenwerking met DSO. Project Rotterdamsebaan stemt (enkel) met deze particulier af i.h.k.v. ontwerp tweede watertoevoer. → 5.1.2e voor de realisatie van de tweede watertoevoer dienen er ook bomen gekapt te worden. Dit is o.a. besproken tijdens de informatiebijeenkomst welke team-Roba georganiseerd heeft voor de omwonenden van de tweede watertoevoer. De particuliere initiatiefnemer van Nieuwe Vredenoord zal later zelf een informatiebijeenkomst voor de omwonenden organiseren.
- 5.1.2e meldt dat de verlaging van de prognose en het projectbudget correct is doorgevoerd en verwoord. Het besluit van de gemeente Den Haag over de structureel jaarlijkse beheerlasten van € 5 mln. mist echter in de voortgangsrapportage.

Besloten: Besproken.

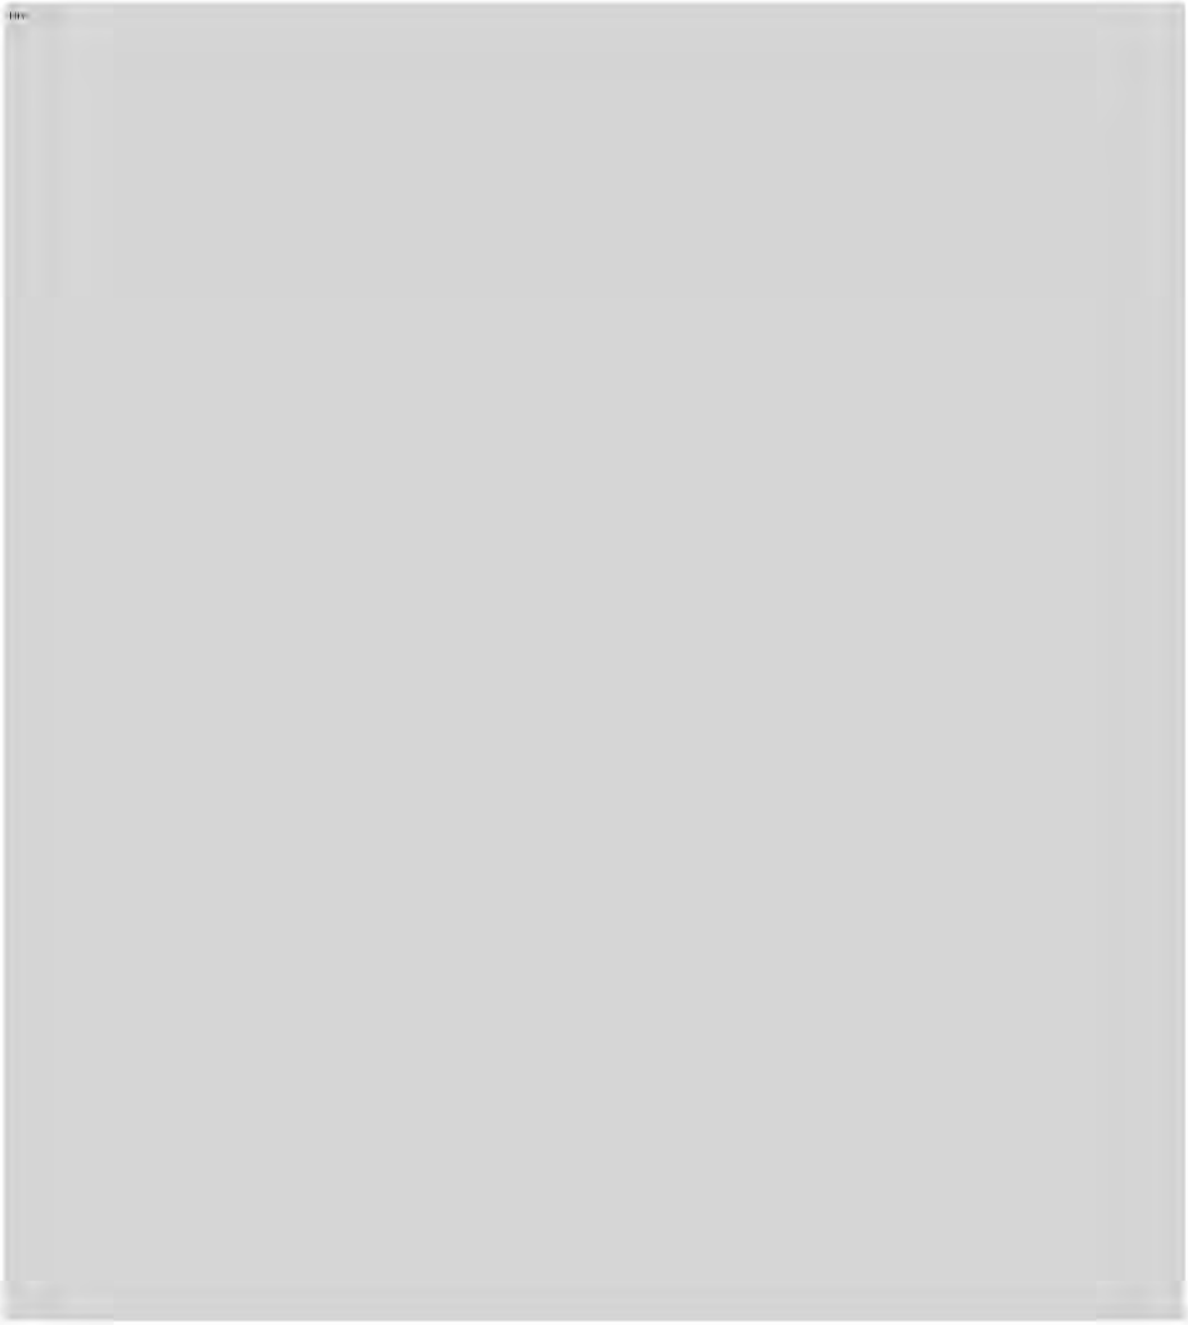

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 2 november 2018, 13:00–13:30 uur, stadhuis D08.10 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder BSKB<br>5.1.2.e – DSB, Algemeen directeur<br>5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e – DSO, directeur<br>5.1.2.e –BSD/Financiën<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing<br>5.1.2.e – Roba, Communicatie<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – Roba, Omgevingsmanagement |

BR

- Wethouder vraagt naar de stand van zaken kapvergunning voor tweede watertoevoer. → 5.1.2.e kapvergunning is aangevraagd voor 463 bomen conform gemeentelijke definitie. Nader gespecificeerd gaat het om een 18-tal aangeplante bomen . De overige 445 bomen staan in groepsverband (zaailingen). De zaailingen hebben een kleinere stamomtrek en vormen een samenhangende houtopstand in groepsverband. Dit groen is spontaan opgekomen en niet beheerd of onderhouden. Omwonenden zijn vooraf geïnformeerd tijdens de informatieavond over de realisatie van de tweede watertoevoer. Hierop heeft de projectorganisatie contact met diverse omwonenden over het waar mogelijk optimaliseren van het ontwerp, o.a. de locatie van een brug. Zelf is de projectorganisatie nog aan het uitzoeken of een ontheffing voor vleermuizen nodig is. Deze zijn bij ecologisch onderzoek niet waargenomen, maar 'zouden' er volgens het eindrapport kunnen zitten.

BR

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum | 7 februari 2019 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder SWS<br>5.1.2.e – DSB, Algemeen directeur<br>5.1.2.e – DSO, directeur<br>5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e –BSD/Financiën<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e – Roba, Omgevingsmanagement<br>5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing<br>5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – Roba, Communicatie |

[redacted]

- Pagina 11: Wethouder leest over aanhaken procedure natuurbescherming voor vergunningaanvraag kappen bomen bij tweede watertoevoer door niet uit kunnen sluiten van aanwezigheid vleermuizen. → 5.1.2.e vergunningverlening schuift op naar in ieder geval augustus 2019. Om mogelijk aanwezige vleermuizen een alternatieve verblijfplaats te bieden worden er deze maand rondom het plangebied vleermuiskasten opgehangen.

[redacted]

- Pagina 23: Wethouder informeert naar s.v.z. gesprekken t.b.v. tweede watertoevoer met particuliere grondeigenaar. → 5.1.2.e dinsdag aanstaande vervolgoverleg met deze eigenaar. Afgelopen periode heeft hij benut om onderzoeken uit te laten voeren door zijn adviseurs.

o.a. hydroloog en grondgronddeskundige om meer informatie te verkrijgen over de grondsituatie na aanleg van de tweede toevoer.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Docnr19

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum | 18 april 2019 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder SWS<br>5.1.2.e –BSD/Financiën<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing<br>5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – DSB, Algemeen directeur<br>5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e – DSO, directeur<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |

BP

- Tweede toevoer: De Provincie heeft richting particuliere initiatienemer negatief gereageerd op het nieuwbouwplan voor het landgoed Nieuw Vredenoord. De grondeigenaar wil een gesprek met DSO in het kader van door hem gewenste steun van op zijn plan n.a.v. het commentaar van de Provincie. Dit wordt besproken met 5.1.2e De reactie van provincie heeft mogelijk ook weerslag op de houding van de grondeigenaar t.a.v. de voortgang voor de door DSB te realiseren tweede toevoer. De openstaande punten voor de samenwerkingsovereenkomst tussen DSB en de particuliere grondeigenaar (waarover de tweede toevoer loopt) zijn inmiddels afgehandeld in een e-mailbericht. Dit moet nog vastgelegd en geformaliseerd worden in de samenwerkingsovereenkomst t.b.v. de tweede watertoevoer.

- Er is enige weerstand tegen de aanvraag voor de kapvergunning voor de tweede toevoer. Op 9 mei vindt er een 2-minutendebat plaats.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr20

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum | 20 juni 2019 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder SWS<br>5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e –BSD/Financiën<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e – Roba, Omgevingsmanagement<br>5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing<br>5.1.2.e – Roba, Communicatie<br>5.1.2.e – 5.1.2.e SWS |
| Afwezig: | 5.1.2.e – DSB, Algemeen directeur<br>5.1.2.e – DSO, directeur<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |

BR

- Na 1 juli 2020 zullen nog diverse werkzaamheden in de omgeving afgerond moeten worden, zoals het Molenvlietpark en de tweede watertoevoer.

BR

[redacted]

- 24 juni is er een gesprek met 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e over de verschillende geluiden die 5.1.2e van de afdeling Landgoed en natuur/groen van de Provincie ontvangt aangaande zijn ontwikkeling. 5.1.2e heeft aan de projectorganisatie wederom bevestigd mee te zullen werken aan de realisatie van de tweede watertoevoer over zijn perceel.

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr21

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum | 16 september 2019 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder SWS<br>5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e –BSD/Financiën<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing<br>5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – DSB, Algemeen directeur<br>5.1.2.e – DSO, directeur<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |

[redacted]

[redacted]

- Wethouder vraagt naar de stand van zaken tweede watertoevoer → [redacted] samenwerkingsovereenkomst met particuliere grondeigenaar kan bijna worden ondertekend.

Besloten: Verslag vastgesteld.

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr22

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum | 17 februari 2020 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder Stadsontwikkeling & Financiën |
| | 5.1.2.e – DSB, directeur |
| | 5.1.2.e –BSD/Financiën |
| | 5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur - Later aangeschoven |
| | 5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing |
| | 5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – DSO, directeur |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |

[redacted]

## 5. Voortgangsrapportage 4e kwartaal 2019

Gevraagd 1: Bespreken.

Besproken:

- Wethouder constateert n.a.v. de voortgangsrapportage dat er weinig voortgang is op het dossier realisatie tweede watertoevoer op particulier grondgebied. De particulier is met Den Haag en provincie in gesprek over zijn voorgenomen woningbouw. De provincie geeft aan dat het bouwplan strijdig is met de NNN status van de landgoederenzone. → 5.1.2.e DSO van Den Haag geeft aan mogelijk geen bestemmingsplan op te stellen omdat de provincie

afwijzend op het plan gereageerd heeft, maar in de PUK tussen Den Haag een de particuliere ontwikkelaar is afgesproken dat Den Haag een bestemmingsplan in procedure brengt. → Wethouder geeft aan dat in de Staf van 27 januari met DSO is afgesproken dat er ambtelijk directeurenoverleg komt met de provincie. Voor de stuurgroep Rotterdamsebaan is het momenteel niet duidelijk of die afstemming al heeft plaatsgevonden.

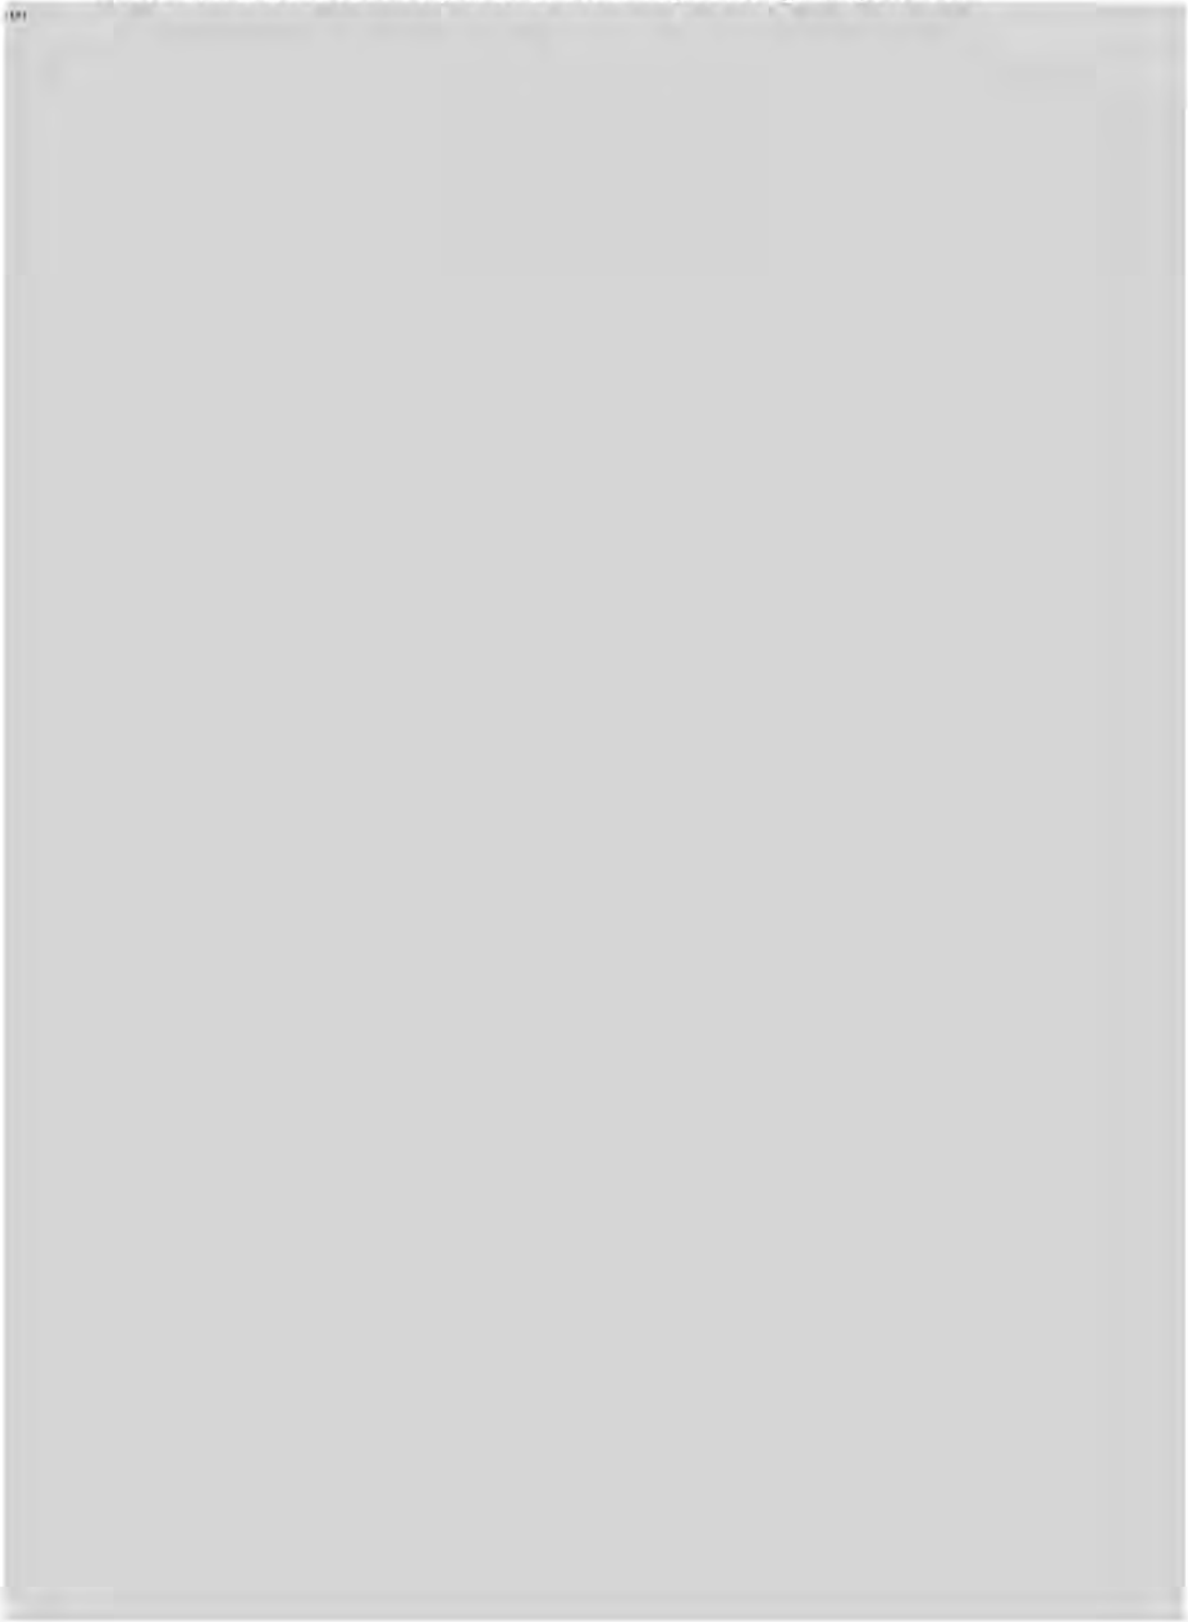

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Docnr23

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum | 20 mei 2020 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder Stadsontwikkeling & Financiën<br>5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e –BSD/Financiën<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur - Later aangeschoven<br>5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |

BR

## 4. Voortgangsrapportage 1e kwartaal 2020

Gevraagd 1: Bespreken.

Besproken:

BR

5.1.2.e

BR Het Molenvlietpark gaat begin juni open, BR

- Wethouder informeert naar de stand van zaken van de aangevraagde kapvergunning voor de tweede watertoevoer. → 5.1 2e meldt dat we lang gewacht hebben op een reactie van ODH. ODH heeft recent een brief gestuurd met daarin een aantal vragen. Project Roba is deze vragen momenteel aan het beantwoorden. Mochten die antwoorden wederom tot vragen vanuit ODH of anderszins leiden, dan heeft 5.1 2e reeds aangeboden om richting ODH te escaleren. 5.1 2e heeft zijn eigen kapvergunning ingetrokken wegens ontwerpwijzigingen in zijn particuliere ontwikkeling n.a.v. de eerdere reactie vanuit de provincie.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum | 16 juli 2020 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Boudewijn Revis - Wethouder Stadsontwikkeling & Financiën<br>5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e – DSO, directeur<br>5.1.2.e –BSD/Financiën<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur - Later aangeschoven<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing |

BR

- Binnenkort weer gesprek met adviseur van particuliere grondeigenaar over de tweede watertoevoer. Als er geen overeenkomst mogelijk is, zal gemeente minnelijke overeenstemming voor aankoop proberen te bereiken of onteigeningstraject starten.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr25

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum | 13 november 2020 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Anne Mulder - Wethouder Stadsontwikkeling & Financiën |
| | 5.1.2.e – DSB, directeur |
| | 5.1.2.e – DSO, directeur |
| | 5.1.2.e –BSD, financiën |
| | 5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur |
| | 5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e – 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e – DSB, opdrachtgeving |

BR

**5. Waterberging en 2e watertoevoer (bijlage)**

Gevraagd: Bespreken stand van zaken.

Besproken:

- [redacted] meldt dat de waterberging in het Molenvlietpark (verzoek van Hoogheemraadschap) de afgelopen jaren gerealiseerd is. Momenteel worden de praktische zaken geregeld voor de overdracht van o.a. de diverse civiele werken aan het Hoogheemraadschap.
- [redacted] meldt dat de extra (tweede) watertoevoer tussen de Vliet en de waterberging nog in de planvoorbereidingsfase zit. Met name door de voortgaande gesprekken met de particuliere grondeigenaar en het moeten aanpassen van de toekomstige maaiveldinrichting rondom de watertoevoer wegens zijn gewijzigde bouwplannen.

Besloten: Besproken.

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum | 28 januari 2021 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Anne Mulder - Wethouder Stadsontwikkeling & Financiën<br>5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e – DSO, PmDH<br>5.1.2.e –BSD, financiën<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e - Roba, Projectbeheersing<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e<br>5.1.2.e – 5.1.2.e Stadsontwikkeling & Financiën<br>5.1.2.e – Roba, 5.1.2.e |
| Afwezig: | - |

BR

## 4. Voortgangsrapportage 4e kwartaal

Gevraagd: Bespreken.

Besproken:

- 5.1.2.e heeft een korte toelichting gegeven. BR

  BR

  5.1.2.e vult aan da bij de analyse in februari / maart ook gekeken wordt naar het benodigd budget voor doorlopende activiteiten zoals 2e watertoevoer, bediencentrale en afwikkeling Drievliet.

BR

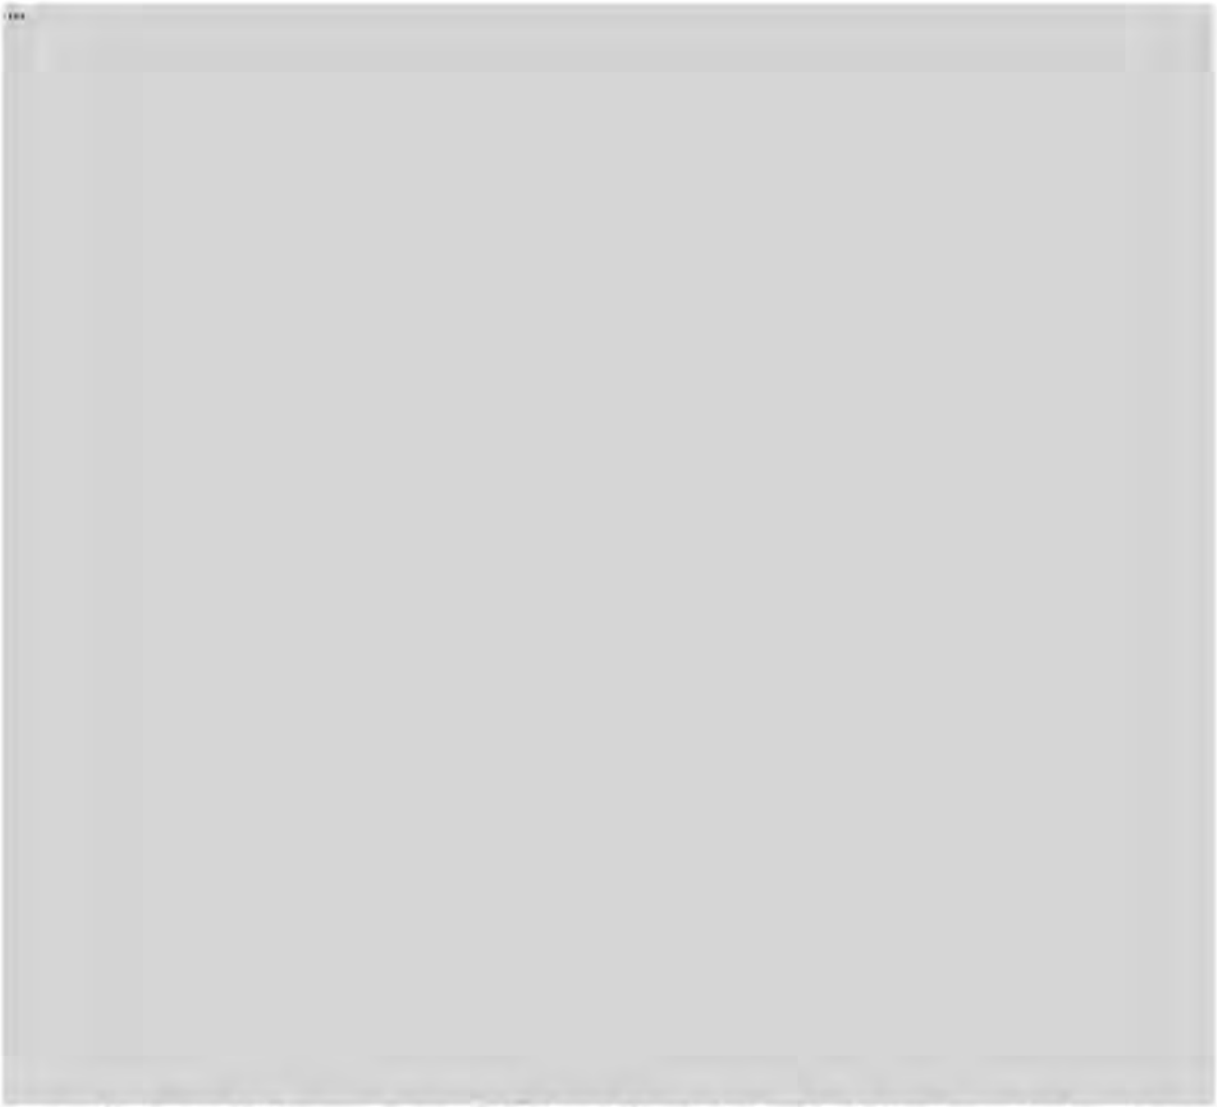

- Na de openstelling gaan een aantal deelprojecten eind 1e kwartaal 2021 afgezonderd worden van het project Rotterdamsebaan, zoals finale afrekening met Drievliet, 2e watertoevoer, bediencentrale en kunstprojecten.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum | 26 maart 2021 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Anne Mulder - Wethouder stadsontwikkeling & financiën |
| | 5.1.2.e – DSB, directeur |
| | 5.1.2.e – DSO, directeur |
| | 5.1.2.e –BSD, financiën |
| | 5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur |
| | 5.1.2.e - Roba, projectbeheersing |
| | 5.1.2.e – Roba, BR |
| Afwezig: | 5.1.2.e – Roba, BR |
| | 5.1.2.e – 5.1.2.e BR |

BR

- Diverse projectonderdelen van de Rotterdamsebaan worden komende periode afgescheiden in zelfstandige projecten, zoals nieuwe bediencentrale, tweede watertoevoer, kunstobjecten.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr28

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum | 21 mei 2021 |
| Naam overleg | **Stuurgroep Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | Anne Mulder - Wethouder stadsontwikkeling & financiën<br>5.1.2.e – DSB, directeur<br>5.1.2.e – DSO, directeur<br>5.1.2.e –BSD, financiën<br>5.1.2.e – Rotterdamsebaan, projectdirecteur<br>5.1.2.e - Roba, projectbeheersing<br>5.1.2.e – 5.1.2.e BR<br>5.1.2.e – Roba, BR |
| Afwezig: | 5.1.2.e – Roba, BR |

BR

## 5. Scopemutatie 34: Verzelfstandigen project Tweede Watertoevoer

Gevraagd: Vaststellen.

Besproken:

- 5.1.2.e geeft aan dat het projectonderdeel Tweede Watertoevoer een langere doorlooptijd kent dan het hoofdproject Rotterdamsebaan. Om het project Rotterdamsebaan te kunnen afsluiten, wordt voorgesteld de scope Tweede Watertoevoer met budget los te koppelen. 5.1.2.e wordt 5.1.2.e en DSB/Opdrachtgever 5.1.2.e
- 5.1.2.e overweegt om met wethouder Bredemeijer in gesprek te treden over de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het project Tweede Watertoevoer. Vooralsnog blijft het in zijn portefeuille ondergebracht.

Besloten: Vastgesteld.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

| Document nummer | Bestandsnaam export | Weigeringsgrond | Tags |
|---|---|---|---|
| 00001 | ROBA-OM-IBO-00-VER-0006.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00002 | ROBA-OM-IBO-VER-0004.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00003 | ROBA-OM-IBO-VER-0005.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00004 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0061.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00005 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0063.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00006 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0103.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00007 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0105.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00008 | ROBA-VER-004311.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00009 | ROBA-VER-004335.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00010 | ROBA-VER-004337.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00011 | ROBA-VER-004394.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00012 | ROBA-VER-004444.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00013 | ROBA-VER-004446.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00014 | ROBA-VER-004481.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00015 | ROBA-VER-004518.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00016 | ROBA-VER-004520.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00017 | ROBA-VER-004577.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00018 | ROBA-VER-004613.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00019 | ROBA-VER-004631.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00020 | ROBA-VER-004696.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00021 | ROBA-VER-004752.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00022 | ROBA-VER-004782.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00023 | ROBA-VER-004818.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00024 | ROBA-VER-004842.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00025 | ROBA-VER-004849.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00026 | ROBA-VER-005449.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00027 | ROBA-VER-005469.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00028 | ROBA-VER-005537.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00029 | ROBA-VER-005645.doc | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| | |
|---|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2.e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Peter van Ostaijen (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>Dick Jense (Rijswijk, wethouder)<br>Peter Smit (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2.e (Rijkswaterstaat ZH, dirc. Netwerkmanagement)<br>5.1.2.e (Stadsgewest Haaglanden, Hoofd Verkeer)<br>5.1.2.e (Rotterdamsebaan, Projectdirecteur)<br>5.1.2.e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2.e )<br>5.1.2.e (Rijswijk, verkeerskundige)<br>5.1.2.e (Den Haag, 5.1.2.e )<br>5.1.2.e (Rotterdamsebaan, 5.1.2.e ) | |
| Afwezig:<br>5.1.2.e (Den Haag, Ambtelijk opdrachtgever)<br>5.1.2.e (Rijswijk, 5.1.2.e )<br>5.1.2.e (Rijkswaterstaat ZH, wegbeheerder)<br>5.1.2.e (Den Haag, 5.1.2.e ) | |
| Locatie:<br>Stadhuis Den Haag, A04.15 | Datum:<br>28 augustus 2013, 14:00–15.30uur |

## 1. Opening en mededelingen

BR

[redacted]

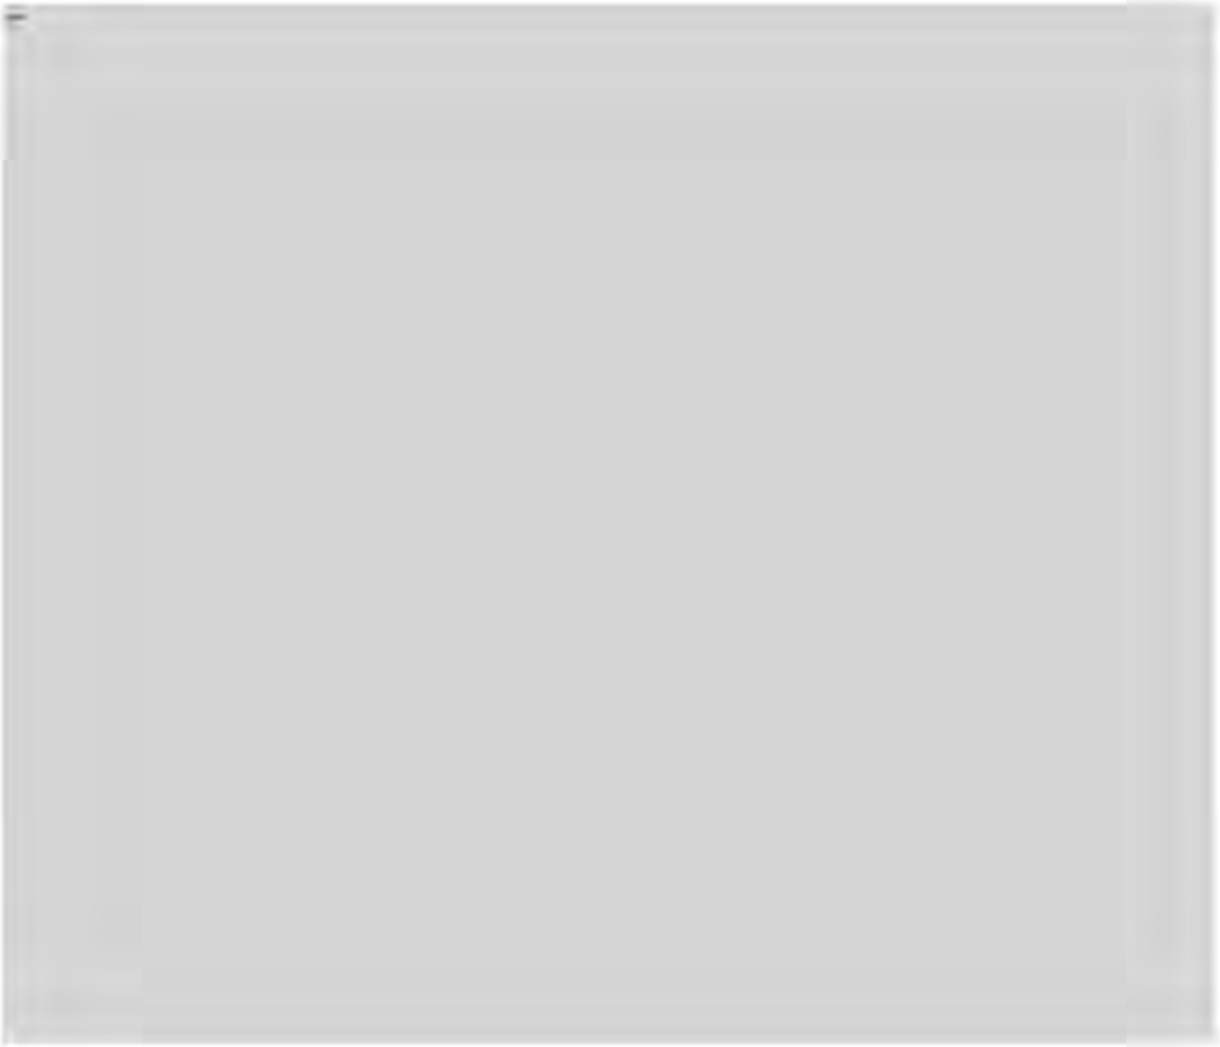

- 5.1.2e de commissie is uitgelegd dat er voor de Rotterdamsebaan 2 bestemmingsplannen zijn, 1x t.a.v. Haags grondgebied en 1x t.a.v. Leidschendam-Voorburgs grondgebied. Het bestemmingsplan Leidschendam-Voorburg is, afgezien van de Rotterdamsebaantunnel, conserverend. Is het mogelijk dat in het Haagse bestemmingsplan geen ontwikkelingen in de Vlietzone beschreven worden? → Dhr. Smit: het bestemmingsplan Rotterdamsebaan in Vlietzone betreft enkel de strook gronden benodigd voor de Rotterdamsebaan en niet de gehele Vlietzone. Huidige vigerende kader voor de Vlietzone is de Beheersverordening en die is conserverend voor de huidige situatie, dus zonder grote gebiedsaanpak. Uiteraard zullen er aanknopingspunten in het bestemmingsplan Rotterdamsebaan aanwezig zijn omdat het ontwerp toekomst vast moet zijn, maar het regelt het niet.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr2

**Actie- en Besluitenlijst Ambtelijk-IBO**

**23 juni 2014**

**Aanwezig:** 5 1 2 e

5 1 2 e

**Afwezig:** 5 1 2 e

| Onderwerp | Besluit: | Actie: |
| --- | --- | --- |
| BR | | |

Docnr2

| | | |
|---|---|---|
| **Inpassing in Vlietzone (Drievliet en Molenvlietpark)** | In de samenwerkingsovereenkomst tussen Drievliet en Den Haag is afgesproken dat Den Haag de benodige gronden in eigendom krijgt. Den Haag zal parkeerplaatsen compenseren en meewerken aan bouw van indoorhal (mits goed ingepast in het landschap). Voor dit inpassing en de watercompensatie wordt getekend aan het 'Molenvlietpark'. Hoogheemraadschap Delfland maakt mogelijk van de kans gebruik voor extra waterretentie bij hoog water in de Vliet.<br><br>Na Haags collegebesluit zullen 5 1 2 e en 5 1 2 e gevraagd worden om een informerend overleg te hebben met 5 1 2 e + 5 1 2 e van Leidschendam-Voorburg en 5 1 2 e 5 1 2 e van Rijswijk. | 5 1 2 e en 5 1 2 e hebben na collegebesluit Den Haag informatief overleg met betrokkenen van gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg |
| [redacted] | | |
| | | |
| | | |

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| |
|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Saskia Bruines (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>René van Hemert (Rijswijk, wethouder)<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat ZH, dirc. Netwerkmanagement)<br>5.1.2e (Den Haag, DSB Ambtelijk opdrachtgever-Roba)<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, Projectdirecteur)<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, hoofd RO)<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Den Haag, 5.1.2e<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) |
| Afwezig:<br>5.1.2e (Stadsgewest Haaglanden, Hoofd Verkeer)<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Den Haag, 5.1.2e ) |

| Locatie: | Datum: |
|---|---|
| Binckhorstlaan 172 Den Haag, 1e etage | 18 september 2014, 16:00–17.00 uur |

## 1. Opening en mededelingen

5.1.2e

## 2. Doel en rol Interbestuurlijk overleg Rotterdamsebaan

Gevraagd: Toelichting door 5.1.2.e

Besproken:

- 5.1.2.e geeft aan dat het IBO al vele jaren bestaat als overleg tussen de wethouders van de drie gemeenten en in latere instantie ook met stadsgewest Haaglanden en Rijkswaterstaat. Is rond 2010/2011 een tijdje niet bijeen gekomen wegens onenigheid rondom de inpassing van de Rotterdamsebaan in de Vlietzone, maar is vanaf de zomer van 2011 weer gecontinueerd onder onafhankelijk voorzitterschap van allereerst 5.1.2.e 5.1.2.e en later 5.1.2.e
- BR
- 
- 
- 

## 3. Stand van zaken bestemmingsplannen, aanbesteding en conditionering

Gevraagd: Toelichting door 5.1.2.e

Besproken:

- 5.1.2.e BR
BR
Leidschendam-Voorburg wil een goed inpassing in de Vlietzone omdat haar inwoners daarop uitkijken BR
BR
- BR
- 
- 

[redacted]

[redacted]

## 5. Rondvraag en sluiting

- [redacted]
-

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr4

## Actie- en Besluitenlijst Ambtelijk-IBO

**20 januari 2015**

**Aanwezig:** 5.1.2.e
5.1.2.e

**Afwezig:** 5.1.2.e

| Onderwerp | Besluit: | Actie: |
|---|---|---|
| | | |
| S.v.z. Rotterdamsebaan | - VO Molenvlietpark (incl. financiele dekking en calamiteitenberging op verzoek van Hoogheemraadschap) wordt op 28 januari in de raadscommissie behandeld. | |
| | | |

Docnr4

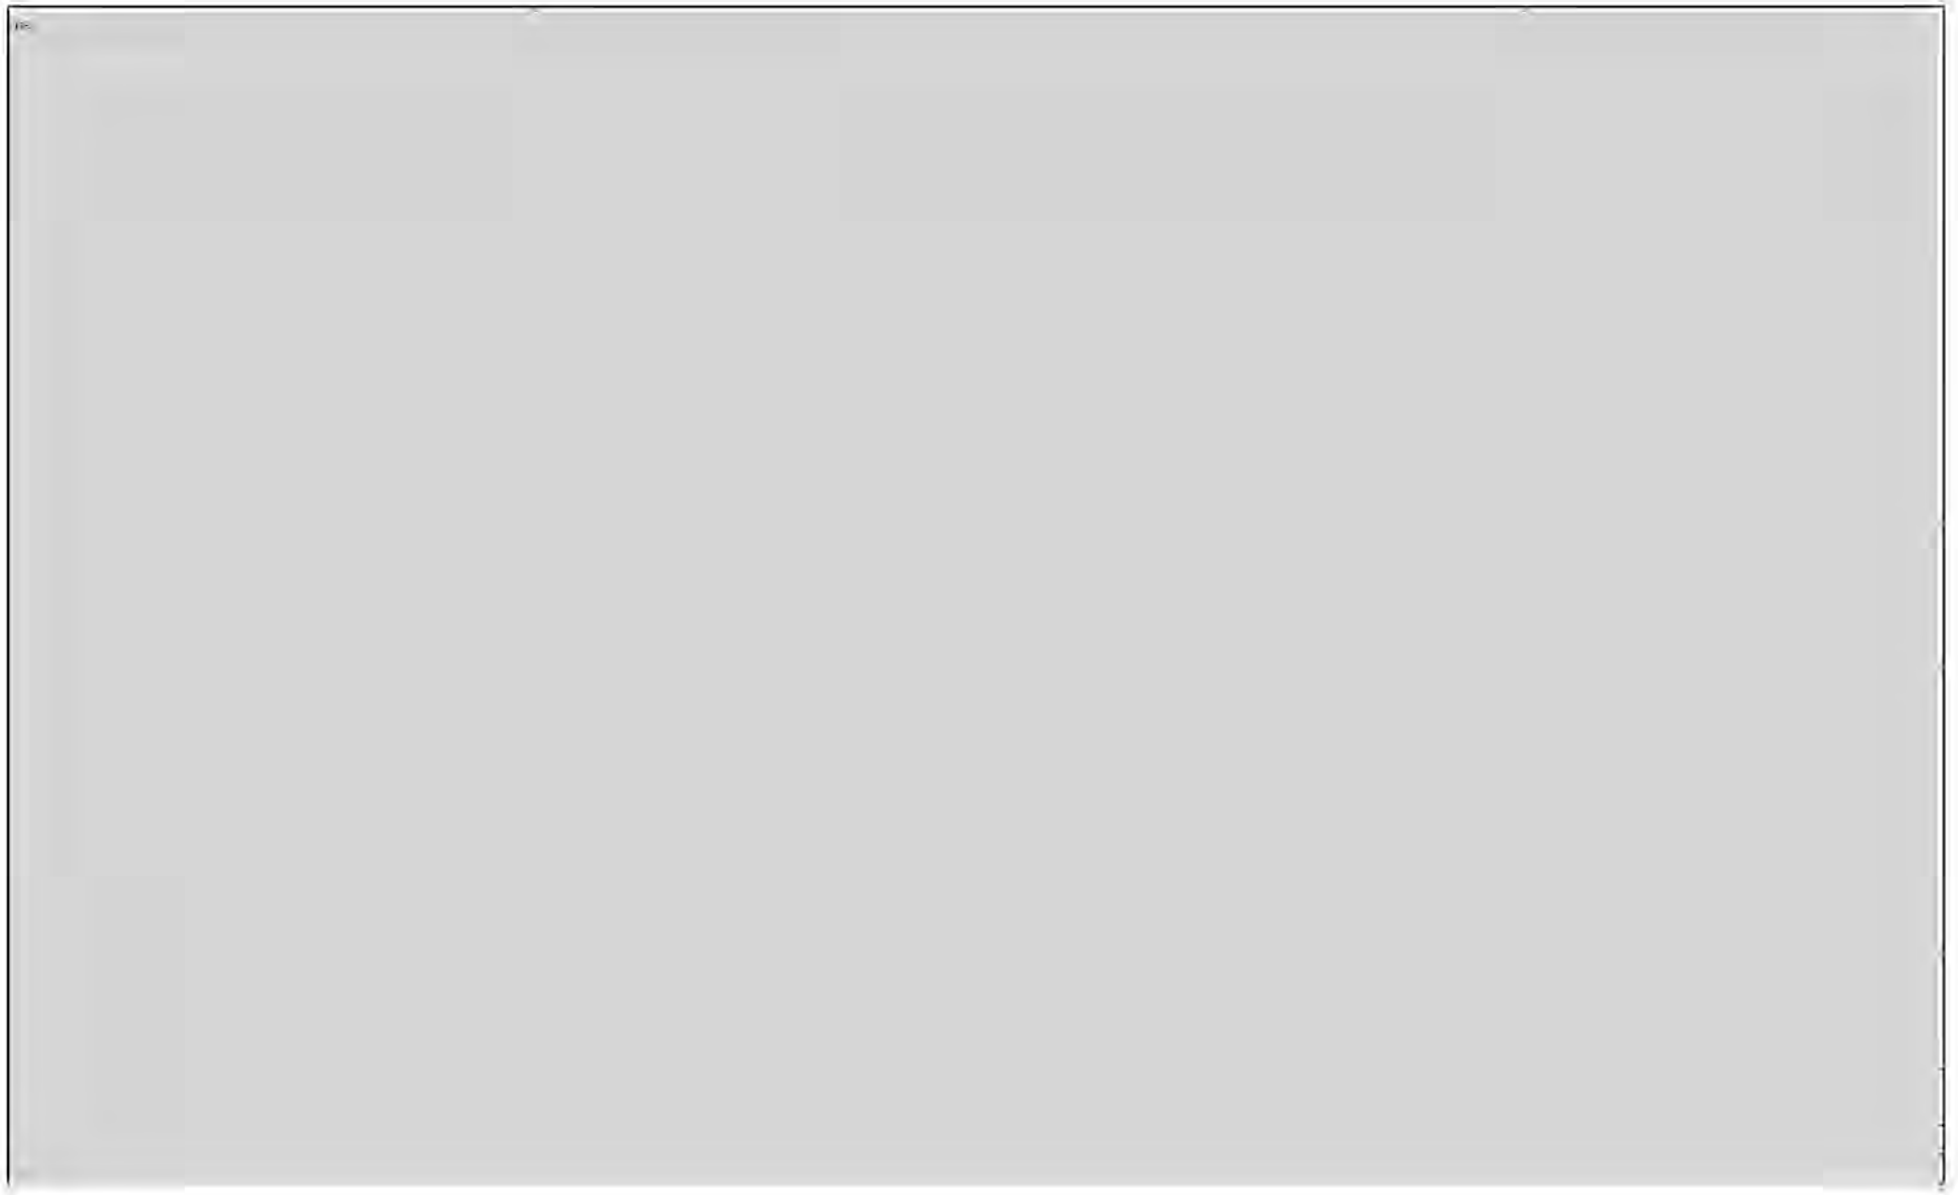

Docnr5

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| | |
|---|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Saskia Bruines (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>René van Hemert (Rijswijk, wethouder)<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat ZH, dirc. Netwerkmanagement)<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Den Haag, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Den Haag, 5.1.2e<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) | |
| Afwezig:<br>5.1.2e (Den Haag, DSB Ambtelijk opdrachtgever-Roba)<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, Projectdirecteur) | |
| Locatie:<br>Spui 70 Den Haag, A04.16 | Datum:<br>29 januari 2015, 09:00 – 10:30 uur |

- VO Molenvlietpark door participatietraject tot stand gekomen en geeft antwoord op diverse opgaven (indoorhal+parkeerterrein Drievliet, calamiteitenberging HHD, inpassen Rotterdamsebaan). Provinciale Statencommissie heeft gebied bezocht en dat is als positief ervaren. Den Haag zal provincie binnenkort om subsidiebijdrage vragen om extra kwaliteitsniveau te kunnen realiseren. Alle drie de gemeenten moedigen dit aan en Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zullen Den Haag hierbij ondersteunen. Gisteren in Haagse commissie besproken en 5 februari in de raad. D66 wil Trekfietstracé aan dit VO toevoegen en ook vóór 2019 al kunnen gebruiken. Dat is separaat project van weth. De Bruijn.

[redacted]

- In de Vlietzone worden de werkzaamheden aan de golfbaan in april afgerond, is er een romeinse schat gevonden door archeologen en zijn er vergunningstrajecten voor het tijdelijk parkeerterrein Drievliet, de indoorhal Drievliet en binnenkort het Molenvlietpark.

[redacted]

[redacted]

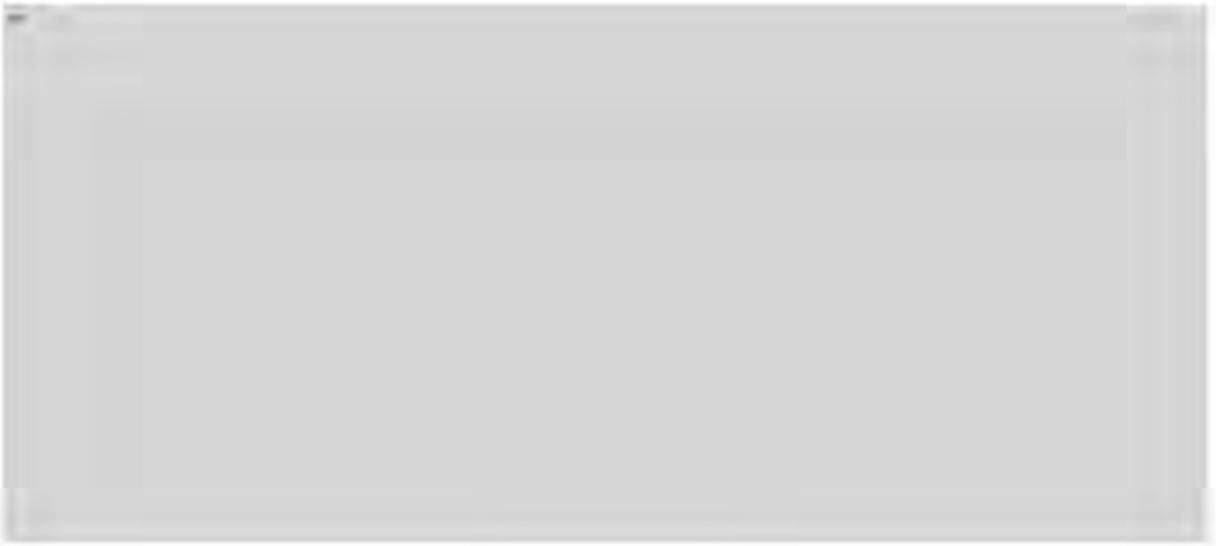

o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr6

## Actie- en Besluitenlijst Ambtelijk-IBO

**6 mei 2015**

**Aanwezig:** 5.1.2.e (DH) , 5.1.2.e (RW), 5.1.2.e (LV), 5.1.2.e (RWS), 5.1.2.e (DH), 5.1.2.e (DH),

**Afwezig:** 5.1.2.e (RW), 5.1.2.e (MRDH),

| Onderwerp | Besluit: | Actie: |
|---|---|---|
| IBR | | |
| **S.v.z. Rotterdamsebaan** | 5.1.2.e<br>1) Bestemmingsplan, Molenvlietpark en Trekfietstracé : Roba is onherroepelijk. N.a.v. komst Molenvlietpark, Trekfietstracé, waterberging en extra ruimte/flexibiliteit voor opdrachtnemers (bijv. functieaanduiding voor locatie boorschacht) en het verschuiven van de dekken in knooppunt Ypenburg (zodat ontwerp weer in bestemmingsplan past). Lukt dit bestemmingsplan procedureel niet door bezwaren dan de benodigde stukken losknippen van de onmogelijke stukken of volledig terugvallen op het nu vigerende bestemmingsplan Rotterdamsebaan. Hierdoor kan Rotterdamsebaan volgens planning gerealiseerd worden en zit er een planningsrisico op de realisatie van Molenvlietpark, Trekfietstracé etc. Belanghebbenden rondom de Vlietzone en knooppunt Ypenburg zijn vorige week al tijdens een bijeenkomst over deze plannen en planning geinformeerd. Is goed ontvangen.<br><br>IBR | |

Docnr6

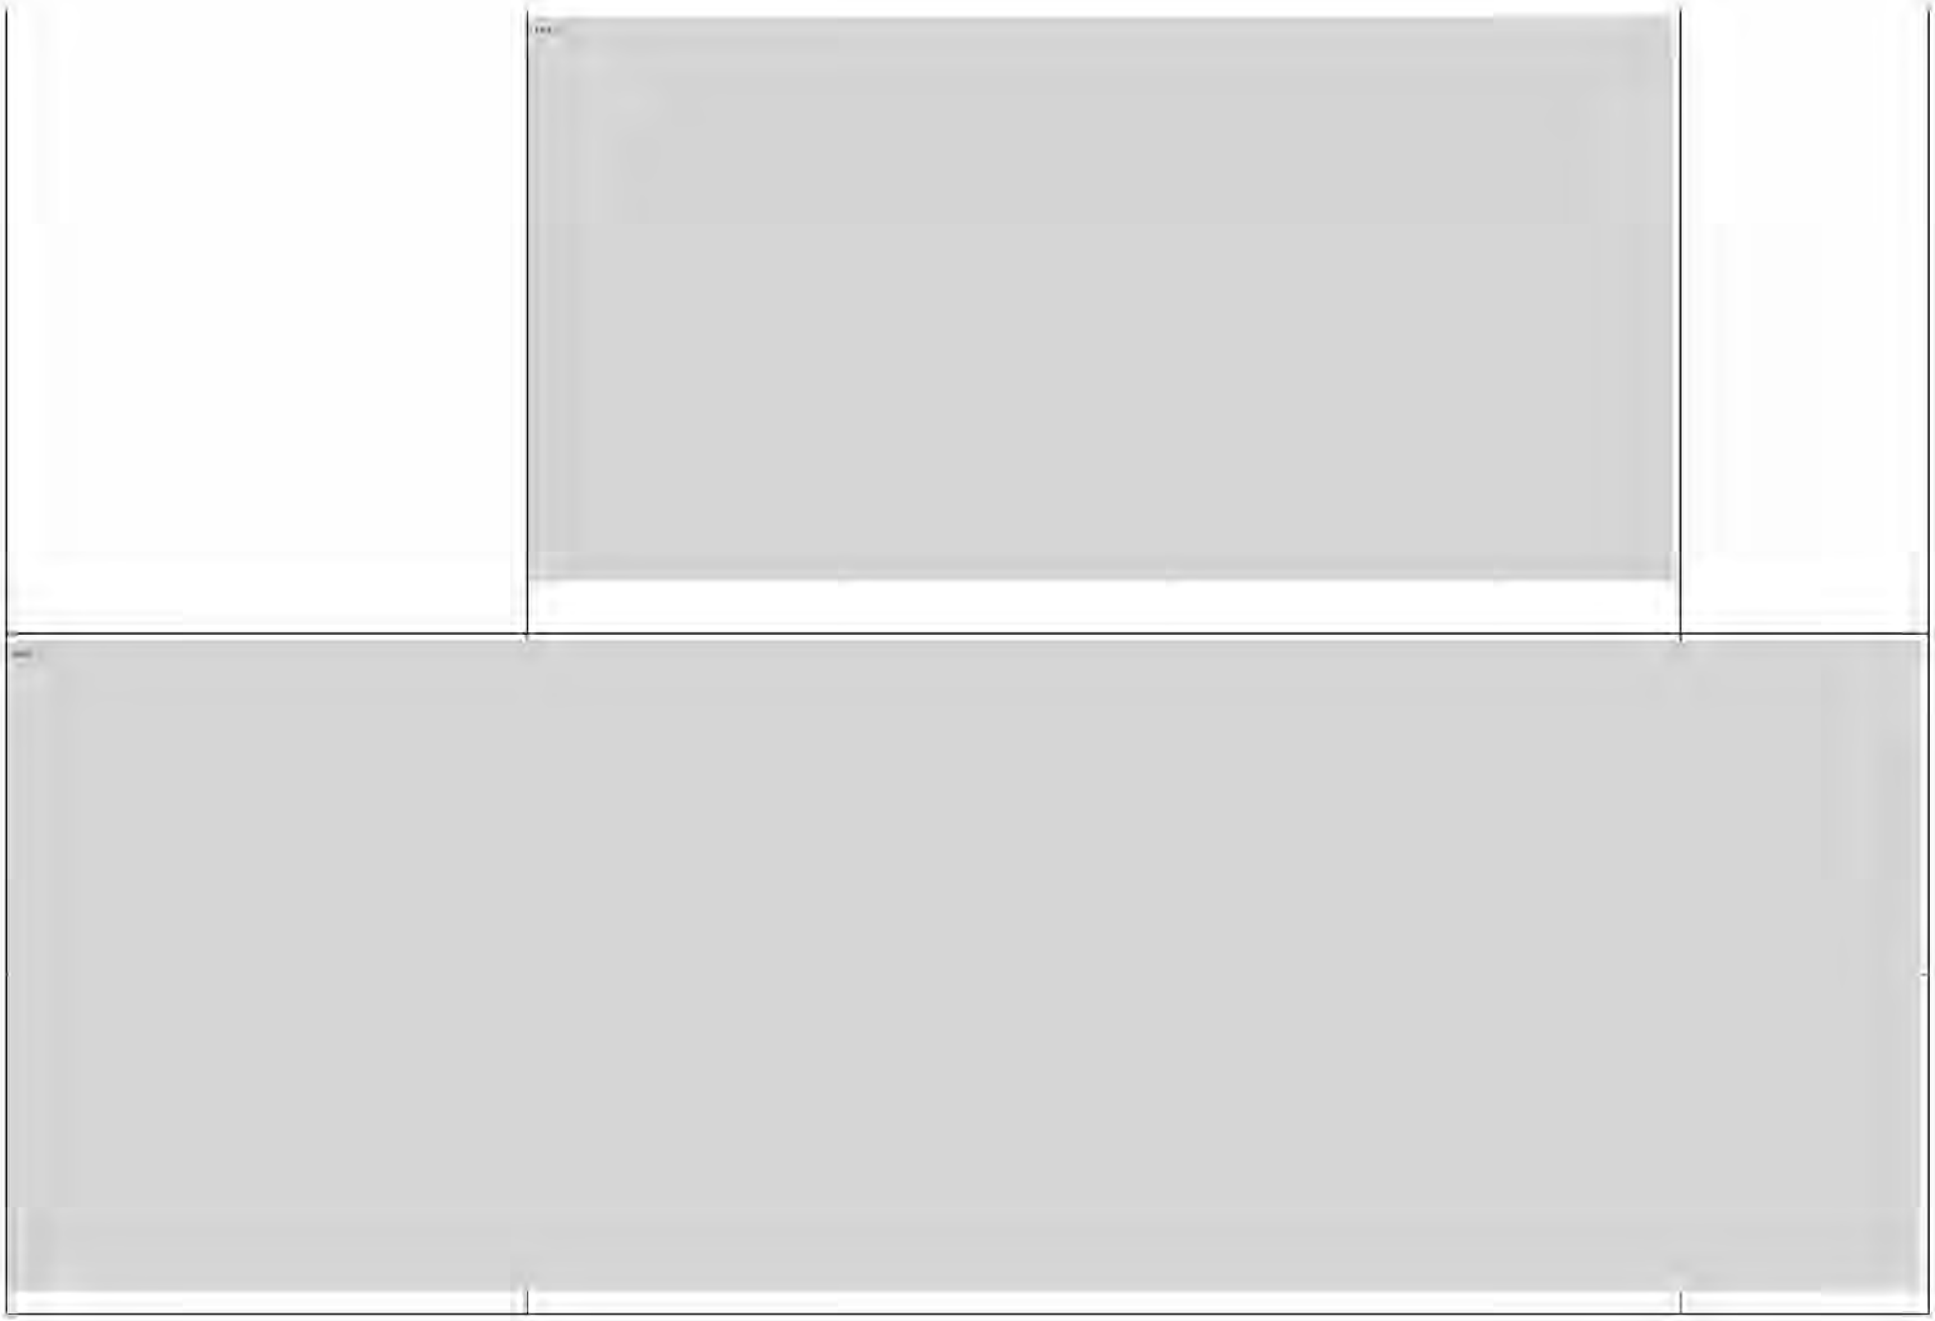

Docm6

Docnr7

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| |
|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Floor Kist (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>René van Hemert (Rijswijk, wethouder)<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, i.p.v. mevr. Dekker)<br>5.1.2e (Den Haag, DSB Ambtelijk opdrachtgever-Roba)<br>5.1.2e (projectdirecteur Rotterdamsebaan)<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Den Haag, 5.1.2e<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) |
| Afwezig:<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat ZH, dirc. Netwerkmanagement)<br>5.1.2e (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, projectleider) |

| Locatie: | Datum: |
|---|---|
| Spui 70 Den Haag, A04.08 | 7 september 2015, 9:00 – 10:00 uur |

## 1. Opening en mededelingen

[redacted]

## 3. Stand van zaken van het project

Gevraagd 1: Toelichting door 5.1.2e

Besproken:

- [redacted]

  Tegen het ontwerp-bestemmingsplan Molenvlietpark zijn acht zienswijzen ingediend van bekende personen en organisaties. Het college van Den Haag heeft het plan vorige week ter vaststelling aan de raad aangeboden. [redacted]

- [redacted]

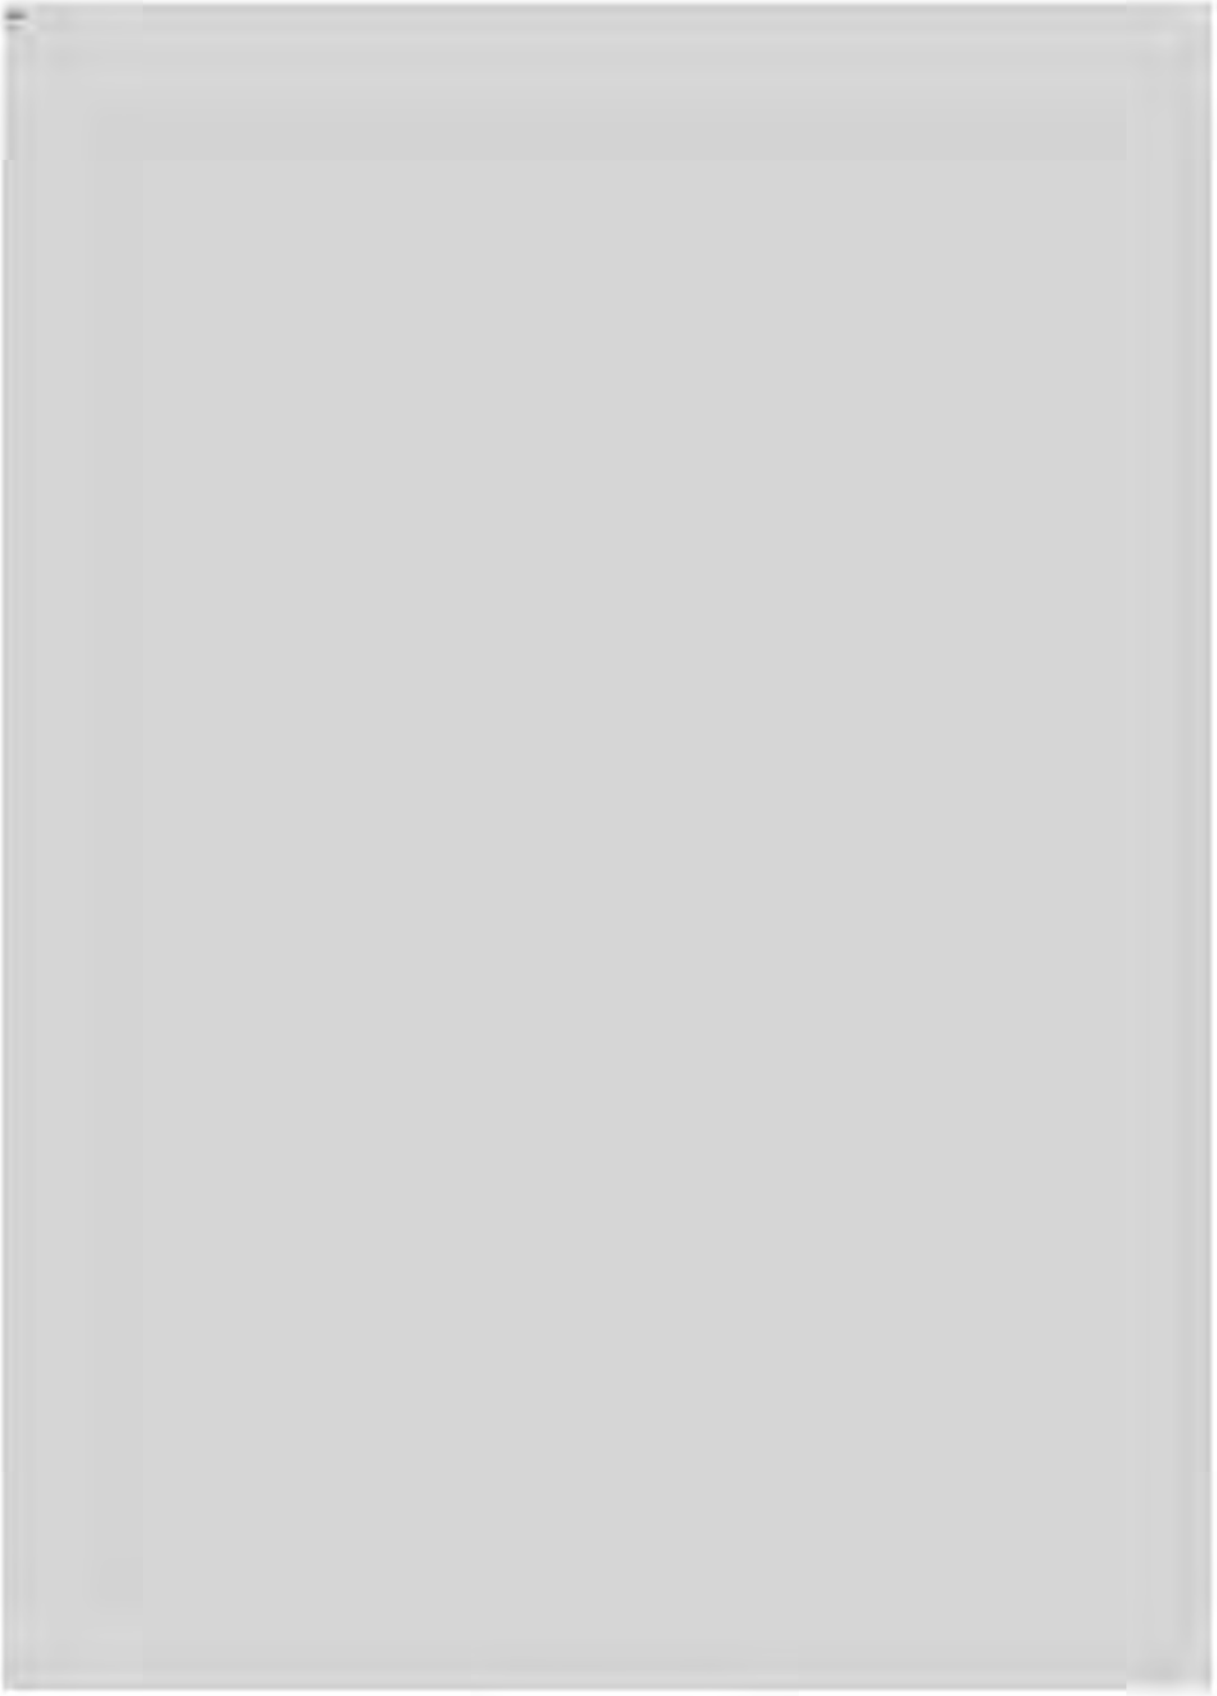

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr8

## Actie- en Besluitenlijst Ambtelijk-IBO

19 november 2015

**Aanwezig:** 5.1.2.e (DH) , 5.1.2.e (RW), 5.1.2.e (LV), 5.1.2.e (RWS), 5.1.2.e (DH), 5.1.2.e (DH), 5.1.2.e (RW), 5.1.2.e (MRDH),

**Afwezig:**

| Onderwerp | Besluit: | Actie: |
|---|---|---|
| [redacted] | | |
| **S.v.z. Rotterdamsebaan** | 5.1.2.e heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken van o.a. de aanbesteding van het hoofdcontract (incl. kort geding), de bestemmingsplannen Molenvlietpark en BinckhorstlaanZuid, de laatste onteigeningsdossiers en de conditionerende werkzaamheden in de Binckhorst en de Vlietzone. | |
| [redacted] | | |

Docnr9

## Actie- en Besluitenlijst Ambtelijk-IBO

**4 februari 2016**

**Aanwezig:** 5.1.2.e (DH) , **Tekin Ates(RWS),** 5.1.2.e **(DH),** 5.1.2.e **(DH),** 5.1.2.e **de Jong(RW),** 5.1.2.e **(MRDH),**
**Afwezig:** 5.1.2.e **(LV),**

| Onderwerp | Besluit: | Actie: |
|---|---|---|
| [redacted] | [redacted] | de<br>ij |
| **S.v.z. Rotterdamsebaan** | [redacted]<br>[redacted] Bestemmingsplanherziening Binckhorst en bestemmingsplan Molenvlietpark zijn bijna onherroepelijk. [redacted]<br>[redacted] | |

Docnr9

Docnr10

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| |
|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Floor Kist (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>René van Hemert (Rijswijk, wethouder)<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (projectdirecteur Rotterdamsebaan)<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Den Haag, 5.1.2e<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) |
| Afwezig: |

| Locatie: | Datum: |
|---|---|
| Stadhuis Den Haag, zaal B01.08 | 11 februari 2016, 9:00–10:30 uur |

[redacted]

5. **Stand van zaken project Rotterdamsebaan**
   Gevraagd: Toelichting door [redacted]
   Besproken:
   - [redacted] Tegen het bestemmingsplan Molenvlietpark is één zienswijze ingediend in het kader van het bestemmen van een woning langs de Westvlietweg. De werkzaamheden Rotterdamsebaan en Molenvlietpark kunnen gewoon in uitvoering gaan.

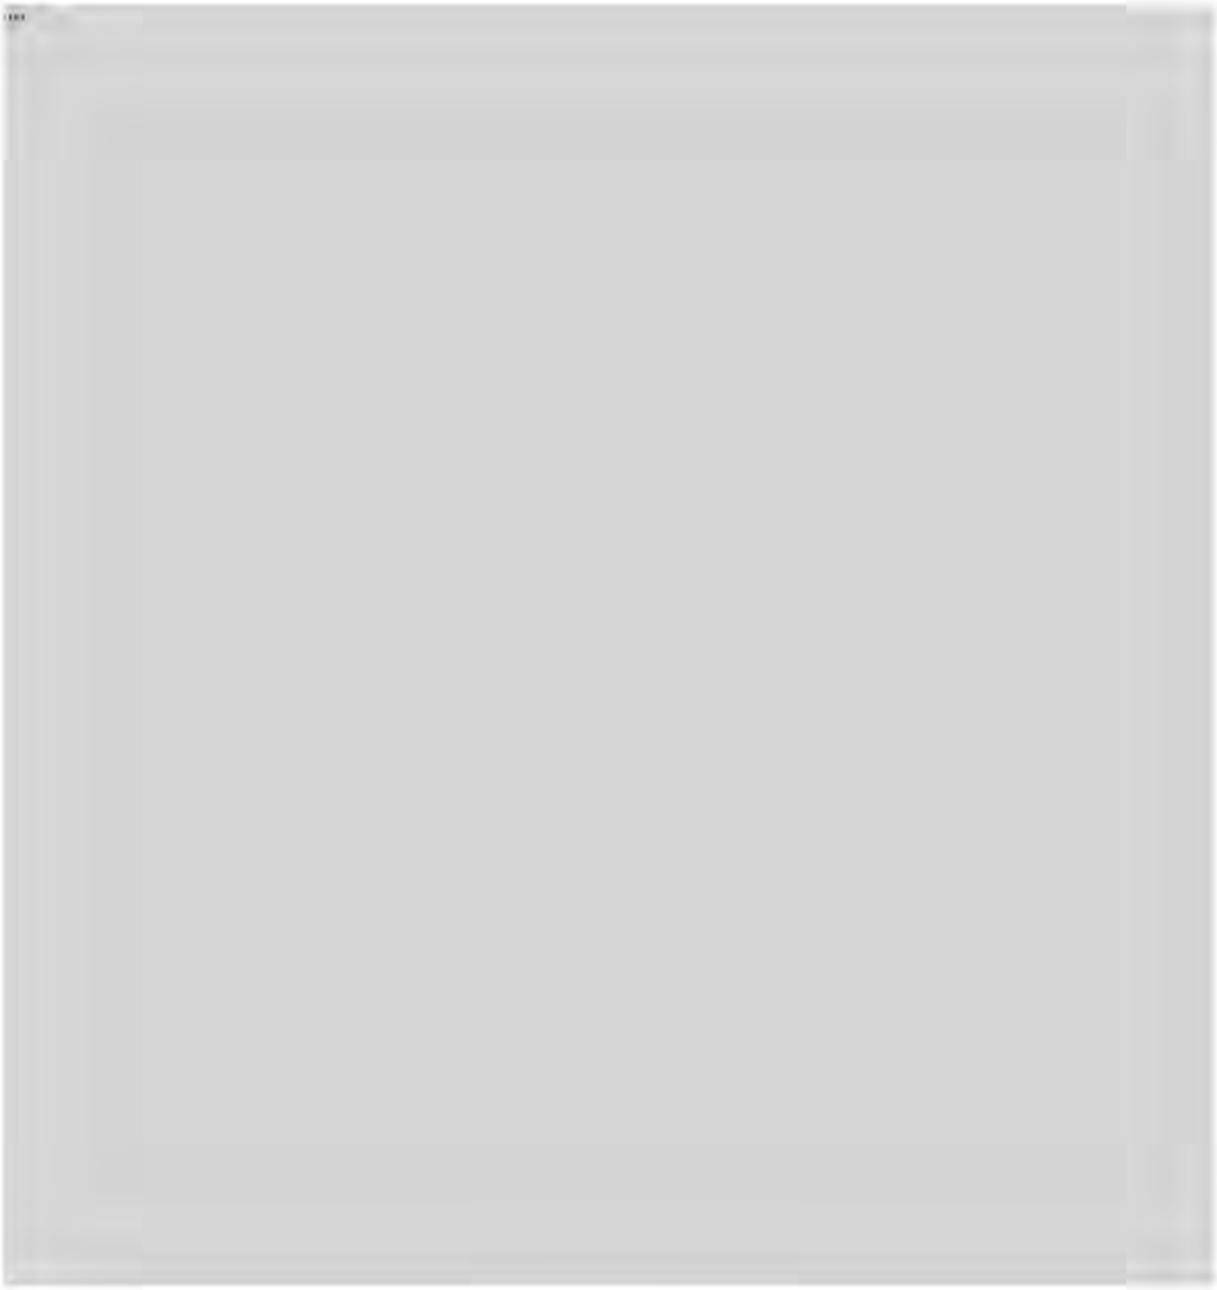

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| | |
|---|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2.e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Floor Kist (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2.e (Rijkswaterstaat, 5.1.2.e )<br>5.1.2.e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2.e )<br>5.1.2.e (Rijkswaterstaat, 5.1.2.e )<br>5.1.2.e (Rotterdamsebaan, 5.1.2.e )<br>5.1.2.e (Den Haag, 5.1.2.e<br>5.1.2.e (Rotterdamsebaan, 5.1.2.e ) | |
| Afwezig:<br>René van Hemert (Rijswijk, wethouder)<br>5.1.2.e (projectdirecteur Rotterdamsebaan)<br>5.1.2.e (Rijswijk, 5.1.2.e ) | |
| Locatie:<br>Stadhuis Den Haag, zaal A04.15 | Datum:<br>2 juni 2016, 9:00–10:30 uur |

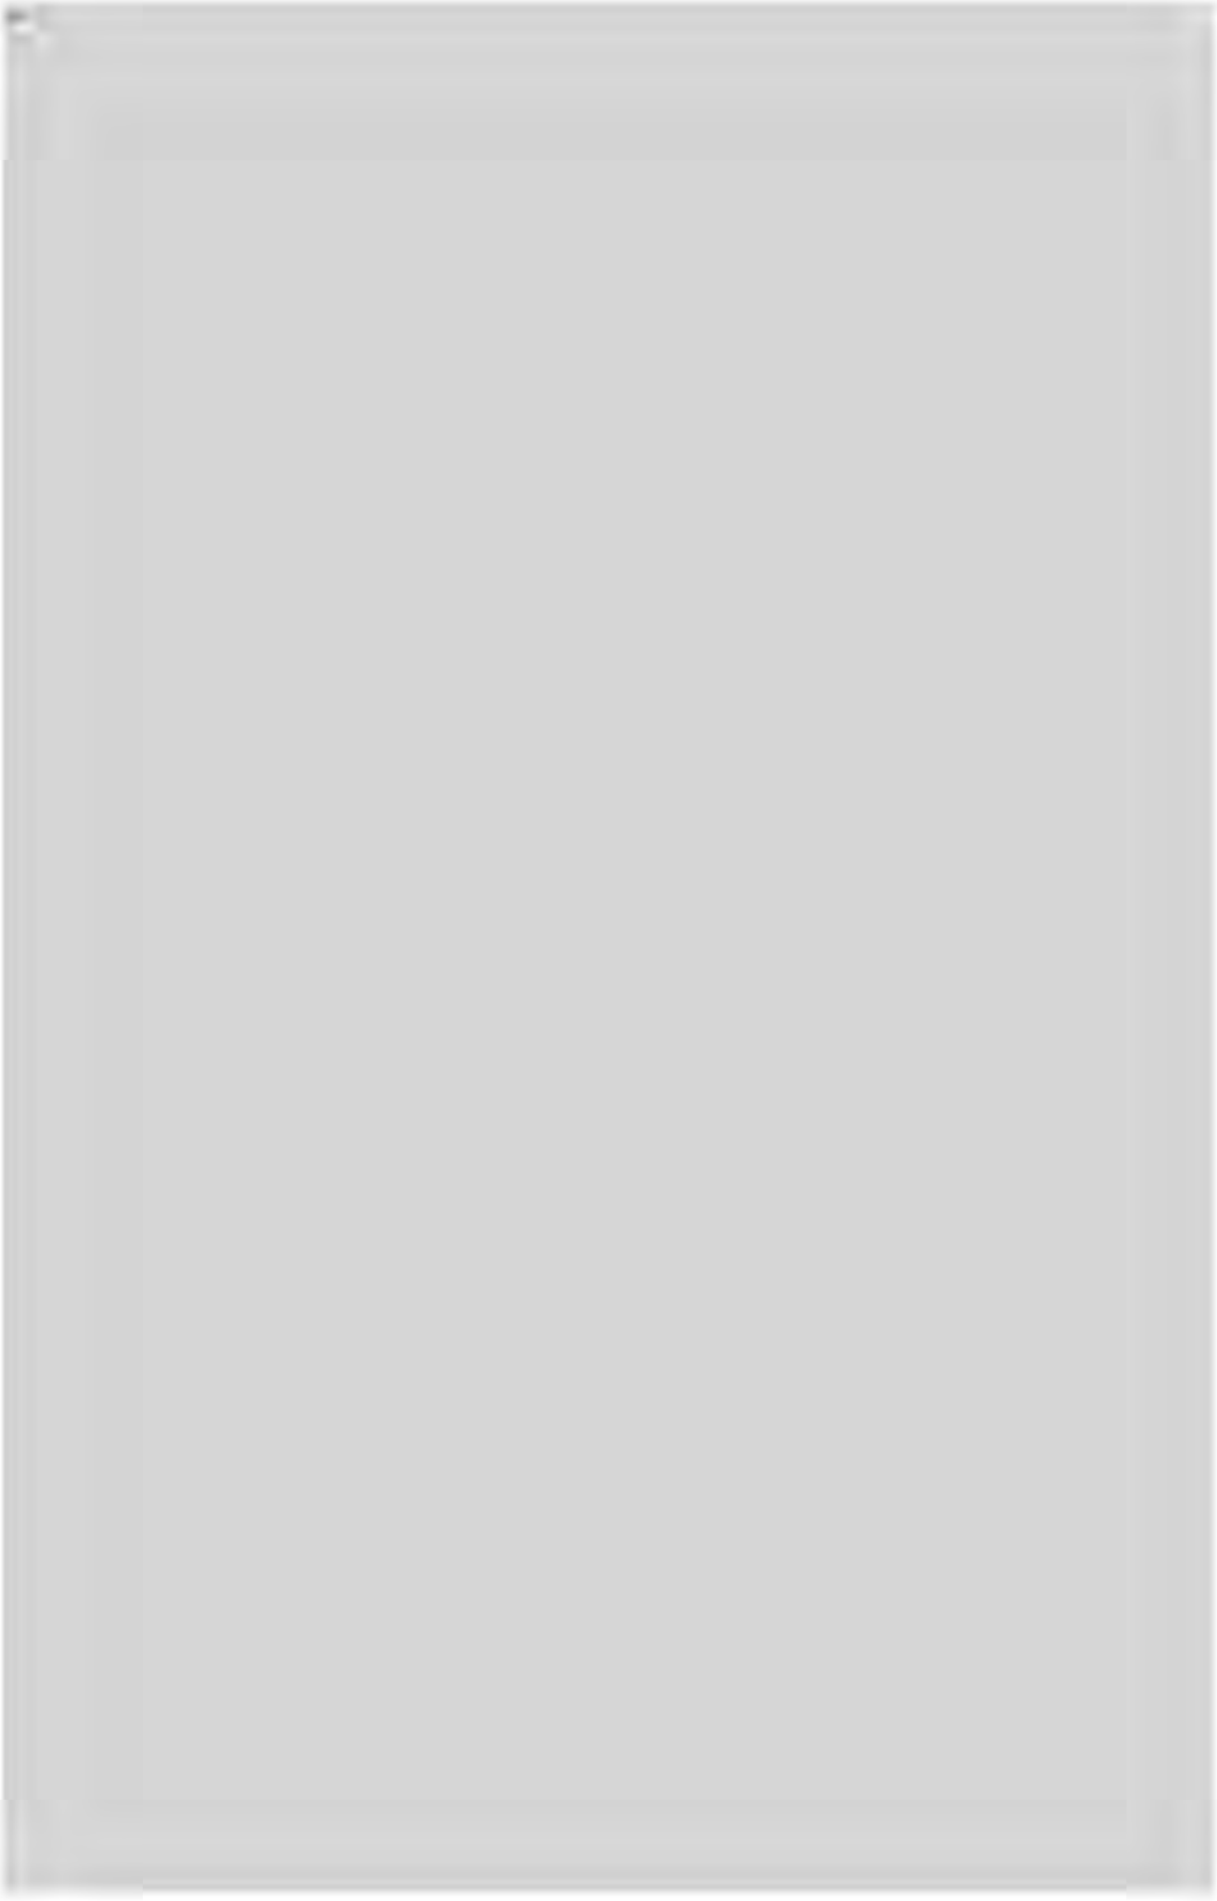

[redacted]

7. **Rondvraag en sluiting**
   - Weth. Revis: De landschapstafel Hof van Delfland is voornemens een subsidiebijdrage te leveren aan de totstandkoming van het Molenvlietpark vanuit het programma Groen van de provincie Zuid Holland. Het bedrag is nog niet voldoende, maar het is mooi dat, naast de gemeenten en het Hoogheemraadschap, ook de provincie de waarde van dit plan erkend.

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr12

## Actie- en Besluitenlijst Ambtelijk-IBO

**12 september 2016**

**Aanwezig:** 5.1.2.e (DH), 5.1.2.e (LV), 5.1.2.e (RWS), 5.1.2.e (DH), 5.1.2.e 5.1.2.e (RW), 5.1.2.e (MRDH),

**Afwezig:** 5.1.2.e (DH),

| Onderwerp | Besluit: | Actie: |
|---|---|---|
| BR | | |
| **S.v.z. Rotterdamsebaan** | BR<br>- In de Vlietzone is de waterhuishouding aangepast, heeft grondverbetering plaatsgevonden en is het bouwterrein gemaakt voor de bouw van de startschacht van de boormachine. Op 13 september vieren we het intrillen van de 1e paal (= 2 maanden eerder dan oorspronkelijke planning). Roba en CRB hebben intensief contact met enkele omwonenden (van zowel Rijswijk en Leidschendam-Voorburg) over de uitwerking van het ontwerp Molenvlietpark (Park Hoornwijck t.a.v. Molensloot en afschermng Drievliet) en de start van de werkzaamheden aan de boorschacht (Park Leeuwenbergh vreest schade door trillingen). De archeologen hebben de Vlietzone vrijgegeven nadat er nog een paardenskelet uit de 14e eeuw gevonden was. Op 15+16 oktober wordt er tijdens de Nationale archeologiedagen van alles in het Trefpunt georganiseerd.<br>BR | |

Docm12

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| | |
|---|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Floor Kist (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>René van Hemert (Rijswijk, wethouder)<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Den Haag, directeur stadsbeheer)<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, projectleider)<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) | |
| Afwezig:<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (projectdirecteur Rotterdamsebaan) | |
| Locatie:<br>Stadhuis Den Haag, zaal B01.08 | Datum:<br>15 september 2016, 9:00–10:30 uur |

[redacted]

## 3. Stand van zaken Rotterdamsebaan

Gevraagd: Toelichting door 5.1.2e en 5.1.2e

[redacted]

- 5.1.2e In de Vlietzone is de waterhuishouding aangepast, heeft grondverbetering plaatsgevonden en is het bouwterrein gereed gemaakt voor de bouw van de startschacht (250x18meter). In december zullen de betonpalen geheid worden en in 2018 start het boren. In goede samenwerking met Drievliet en door het inzetten van verkeersregelaars konden het bouwverkeer en de bezoekers van Drievliet veilig af- en aanrijden. De archeologen hebben de percelen vrijgegeven nadat zij nog een skelet van een paard uit de 14e eeuw (incl. hoefijzers) hadden gevonden. Op 15 +16 oktober worden vondsten in het Trefpunt getoond tijdens de Nationale Archeologiedagen

[redacted]

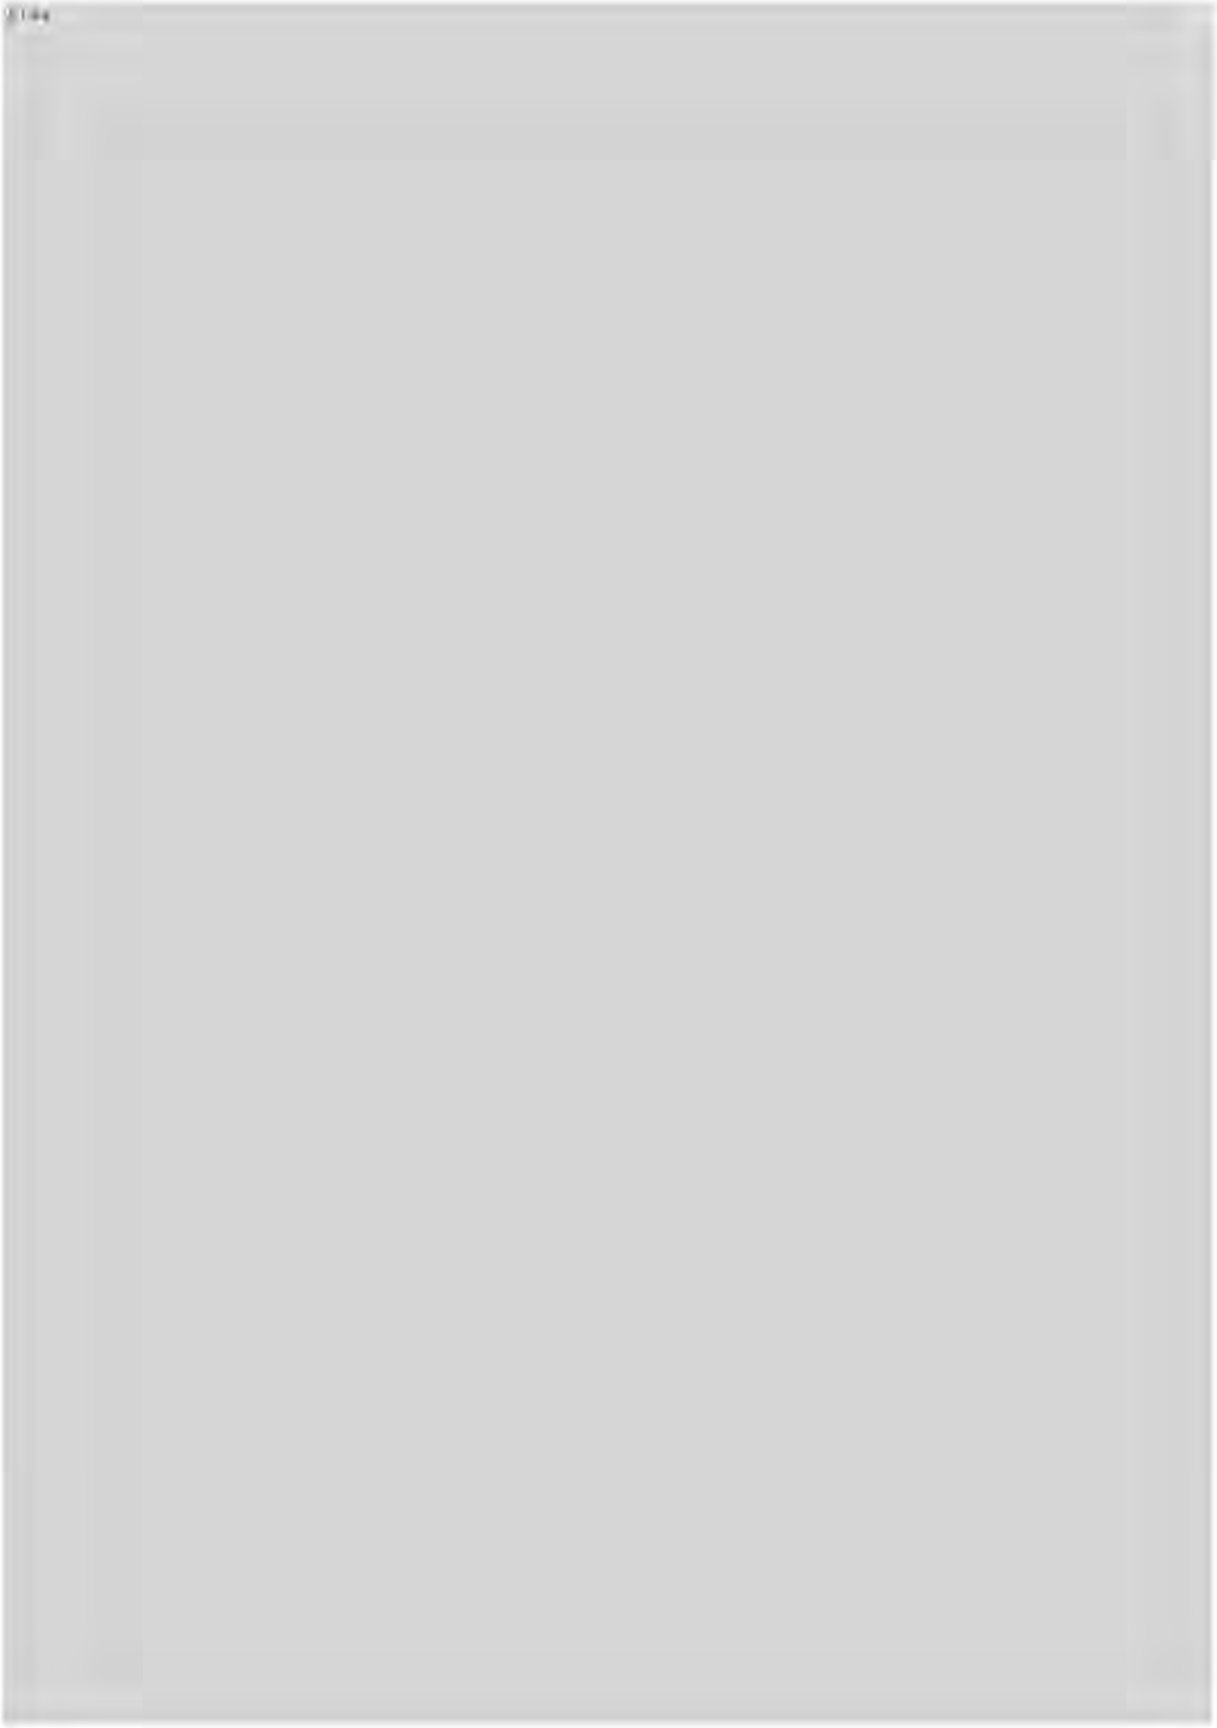

0-0-0-0-0-0-0-0-0

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| |
|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Floor Kist (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>René van Hemert (Rijswijk, wethouder)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Den Haag, directeur stadsbeheer)<br>5.1.2e (projectdirecteur Rotterdamsebaan)<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, projectleider)<br>5.1.2e (Den Haag, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) |
| Afwezig:<br>- |

| Locatie: | Datum: |
|---|---|
| Infocentrum Plaspoelpolder,<br>Handelskade 49, Rijswijk | 8 december 2016, 9:00–10:30 uur |

5.1.2e

- Bestuurlijke aandacht gaat komende periode nog uit naar het sluiten van overeenkomsten om de 2e watertoevoer naar het Molenvlietpark te kunnen realiseren.

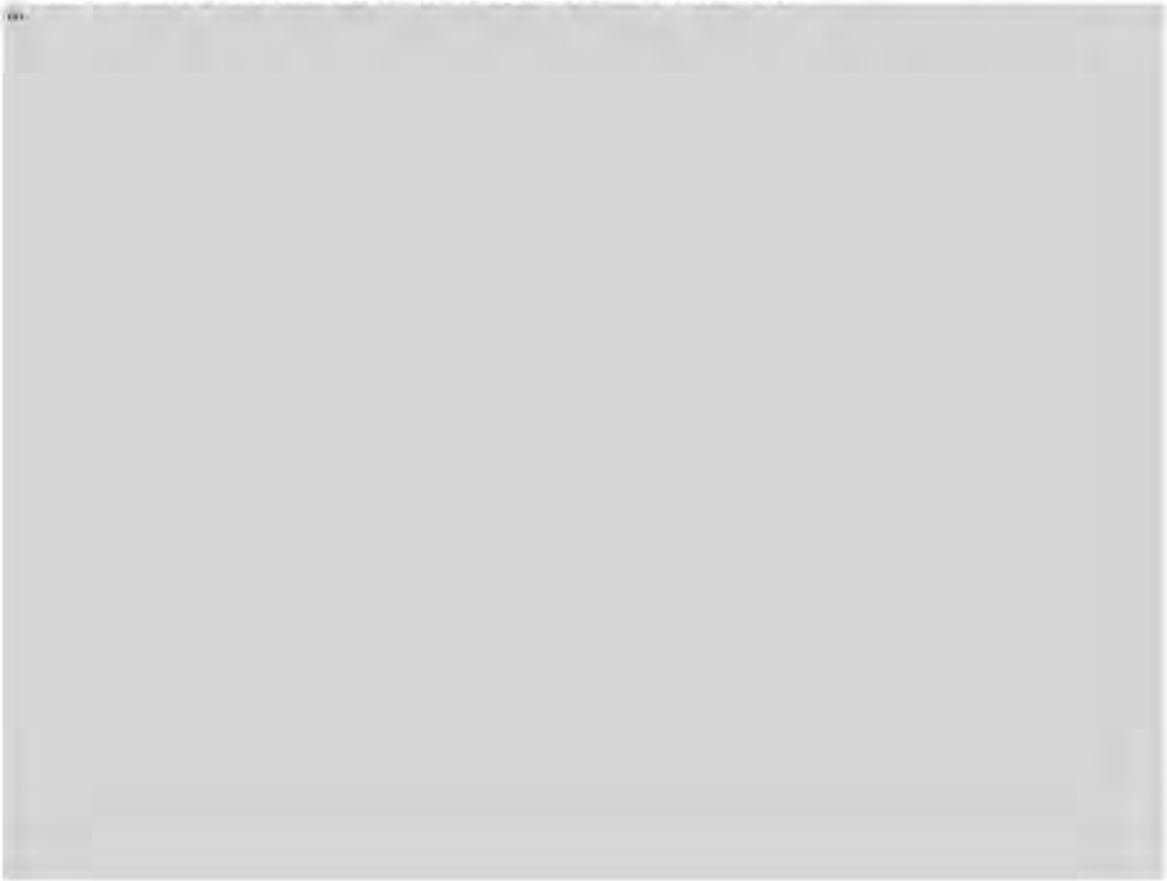

o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr15

## Verslag Ambtelijk-IBO

**9 maart 2017**

**Aanwezig:** 5.1.2e (DH) , 5.1.2e (RW), 5.1.2e (LV), 5.1.2e (RWS), 5.1.2e 5.1.2e (DH),

**Afwezig:** 5.1.2e (MRDH)

| Onderwerp | Besluit: |
| --- | --- |
| BR | |

| | |
|---|---|
| | |
| **S.v.z. Rotterdamsebaan** | In de Vlietzone is de startschacht ontgraven en is het onderwaterbeton aan het uitharden. De fundering van de toerit is aangebracht. Het DO-vormgeving wordt nog afgerond, o.a. de loopbrug van Drievliet en de dienstgebouwen op de tunnelmonden in de Vlietzone en de Binckhorst. Hierdoor kan het ontwerp niet in het komende IBO maar in die van juli toegelicht worden. Met Vredenoord in overleg over de waterinlaat vanuit de Vliet naar het Molenvlietpark. Ook hierover in overleg met het Hoogheemraadschap. |
| | |

Docnr16

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| |
|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2.e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Floor Kist (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>5.1.2.e (Rijkswaterstaat, 5.1.2.e )<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2.e (Den Haag, directeur stadsbeheer)<br>5.1.2.e (projectdirecteur Rotterdamsebaan)<br>5.1.2.e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2.e )<br>5.1.2.e (Rijkswaterstaat, 5.1.2.e )<br>5.1.2.e (Rotterdamsebaan, 5.1.2.e )<br>5.1.2.e (Rotterdamsebaan, communicatie)<br>5.1.2.e (Rotterdamsebaan, 5.1.2.e ) |
| Afwezig:<br>René van Hemert (Rijswijk, wethouder)<br>5.1.2.e (Rijswijk, 5.1.2.e )<br>5.1.2.e (Den Haag, 5.1.2.e ) |

| Locatie: | Datum: |
|---|---|
| Neherpark 5, Leidschendam | 17 maart 2017, 13:00–14:30 uur |

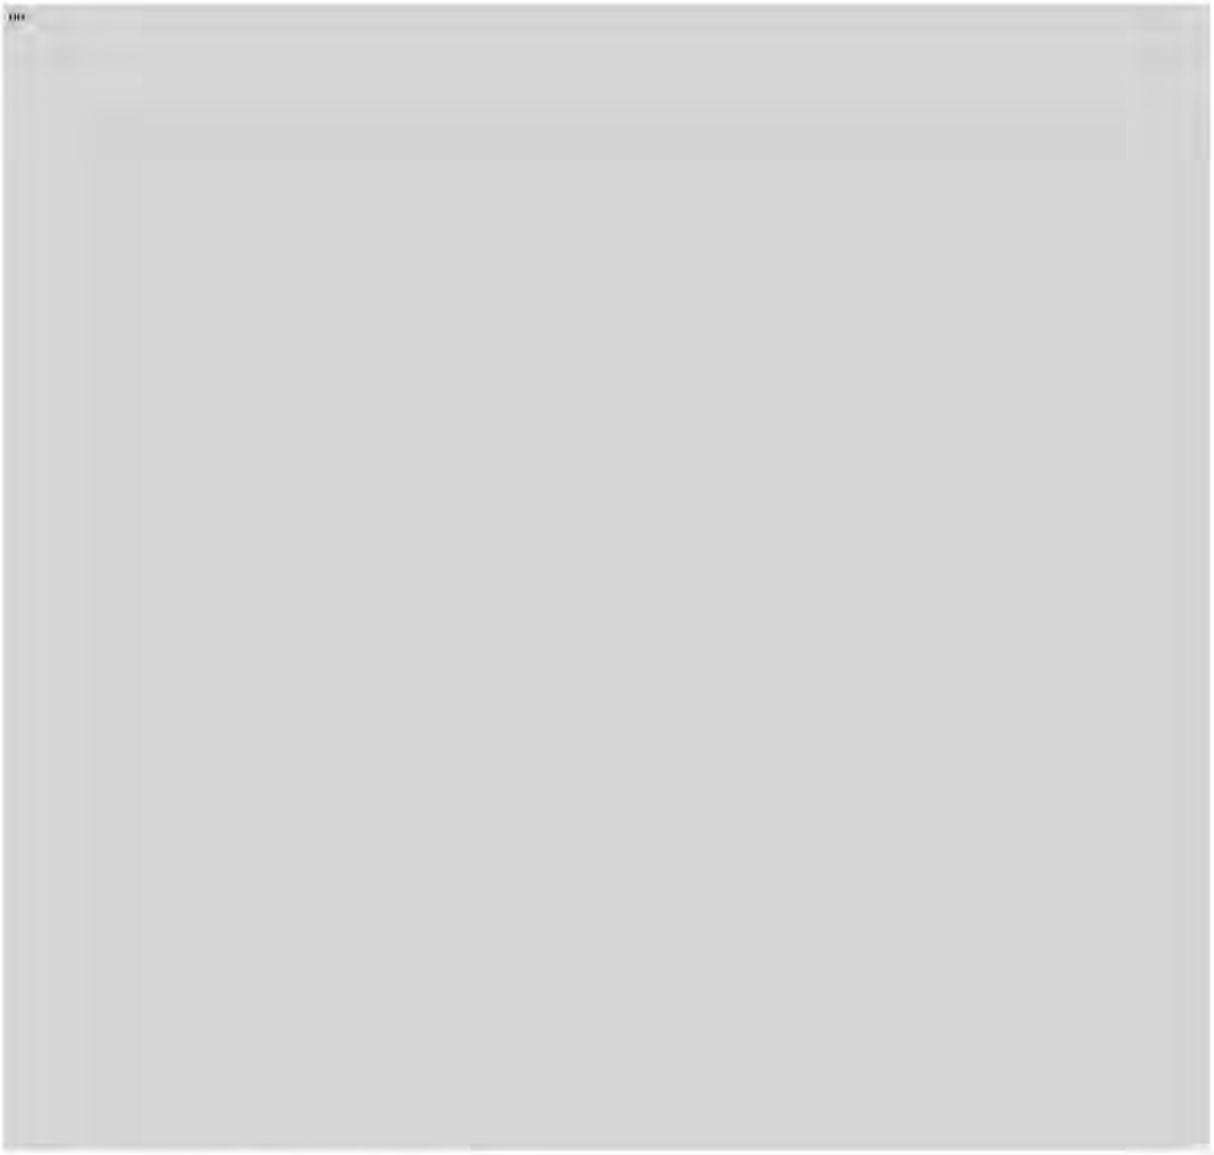

## 6. Stand van zaken Rotterdamsebaan

Gevraagd: Toelichting door 5.1.2e

Besproken:

- Recent zijn er onder de A4 een tweetal persleidingen aangebracht met een gestuurde boring. Deze leidingen gaan het te dempen deel van de Molensloot vervangen tussen woonwijk Ypenburg en de Vliet. Na het dempen van de Molensloot kunne vanaf de Laan van Hoornwijck de op- en afrit naar de Vlietzone aangelegd worden.



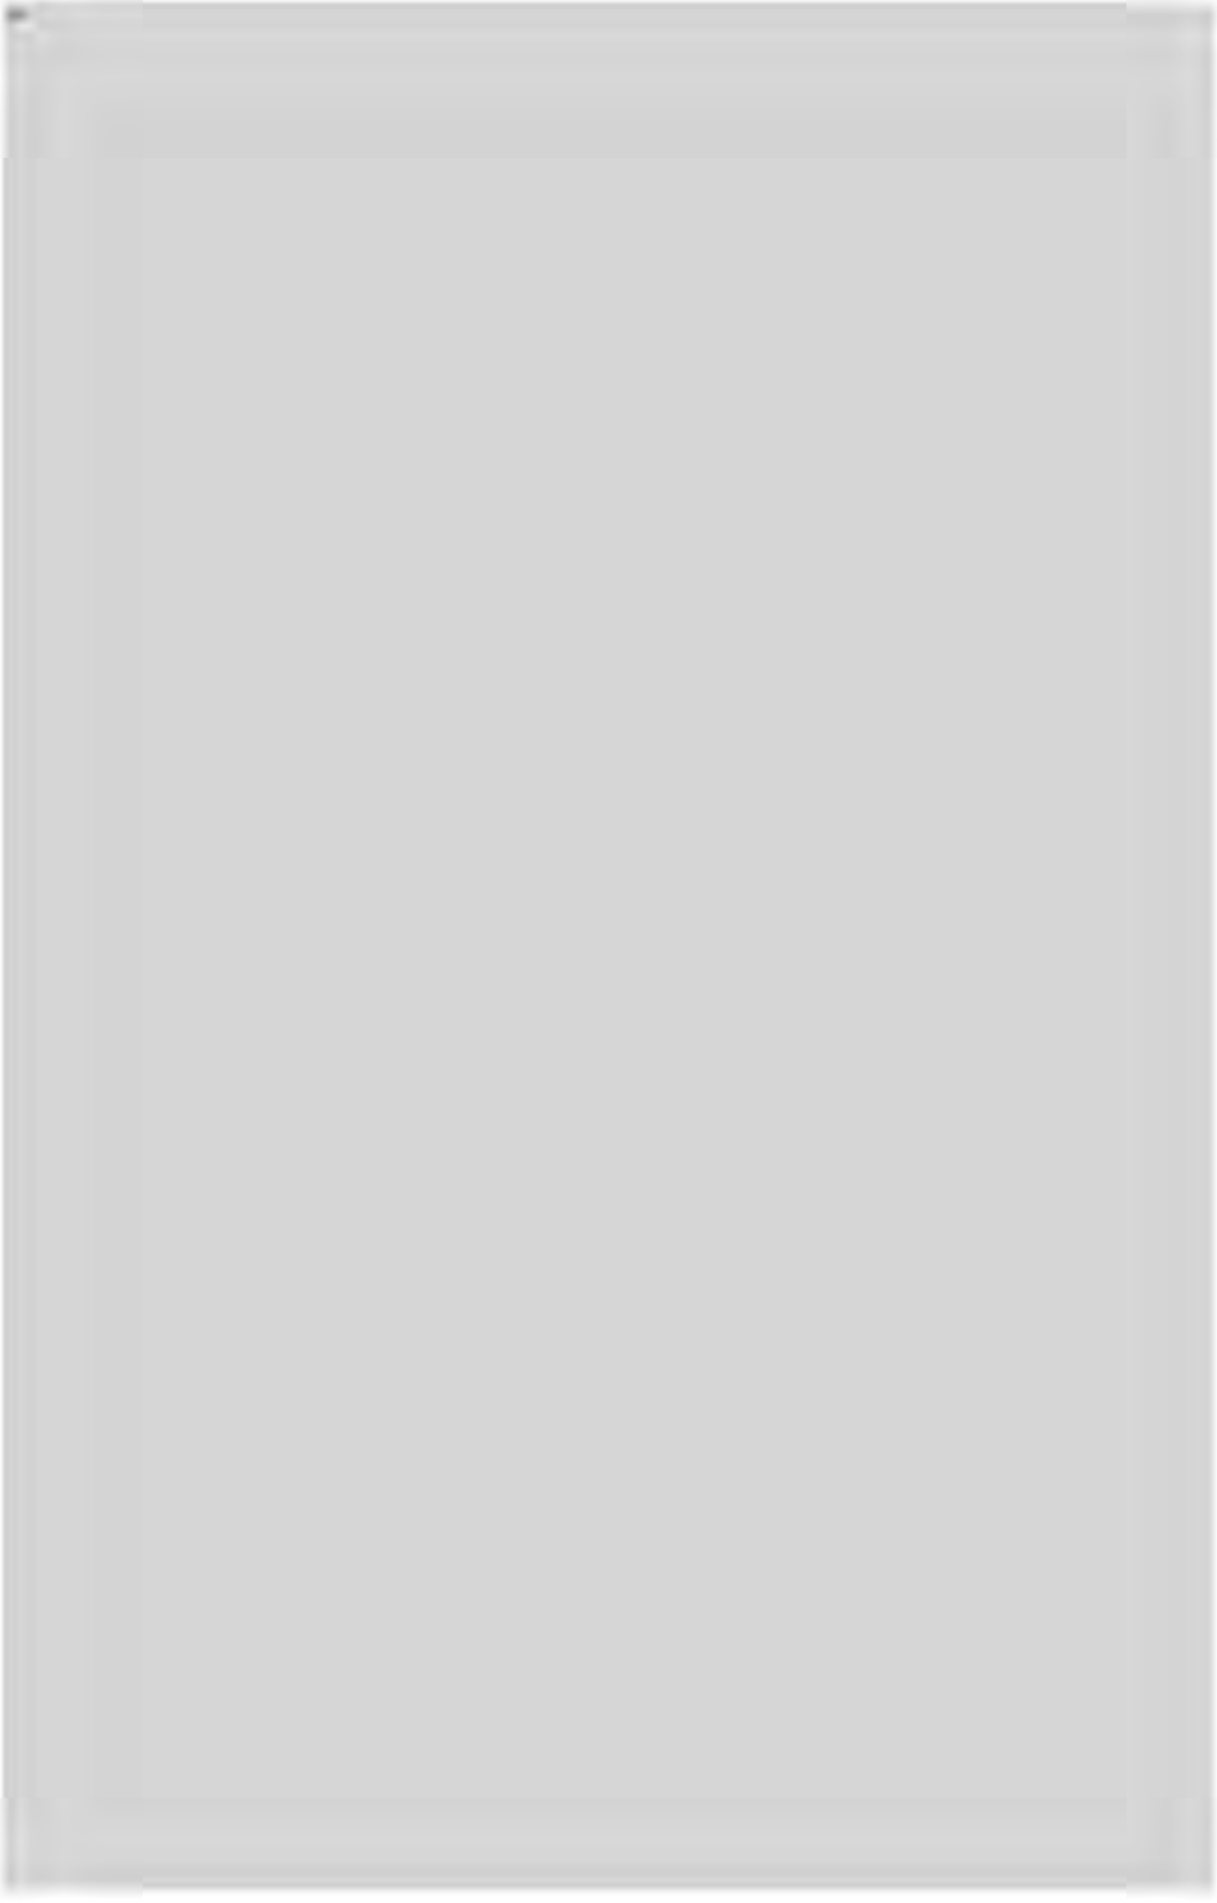

O-O-O-O-O-O-O-O-O

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| |
|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>René van Hemert (Rijswijk, wethouder)<br>5.1.2e (projectdirecteur Rotterdamsebaan)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Den Haag, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) |
| Afwezig:<br>Floor Kist (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Den Haag, directeur stadsbeheer)<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e ) |

| Locatie: | Datum: |
|---|---|
| Binckhorstlaan 172, Den Haag | 5 juli 2017, 13:00–14:30 uur |

Docnr17

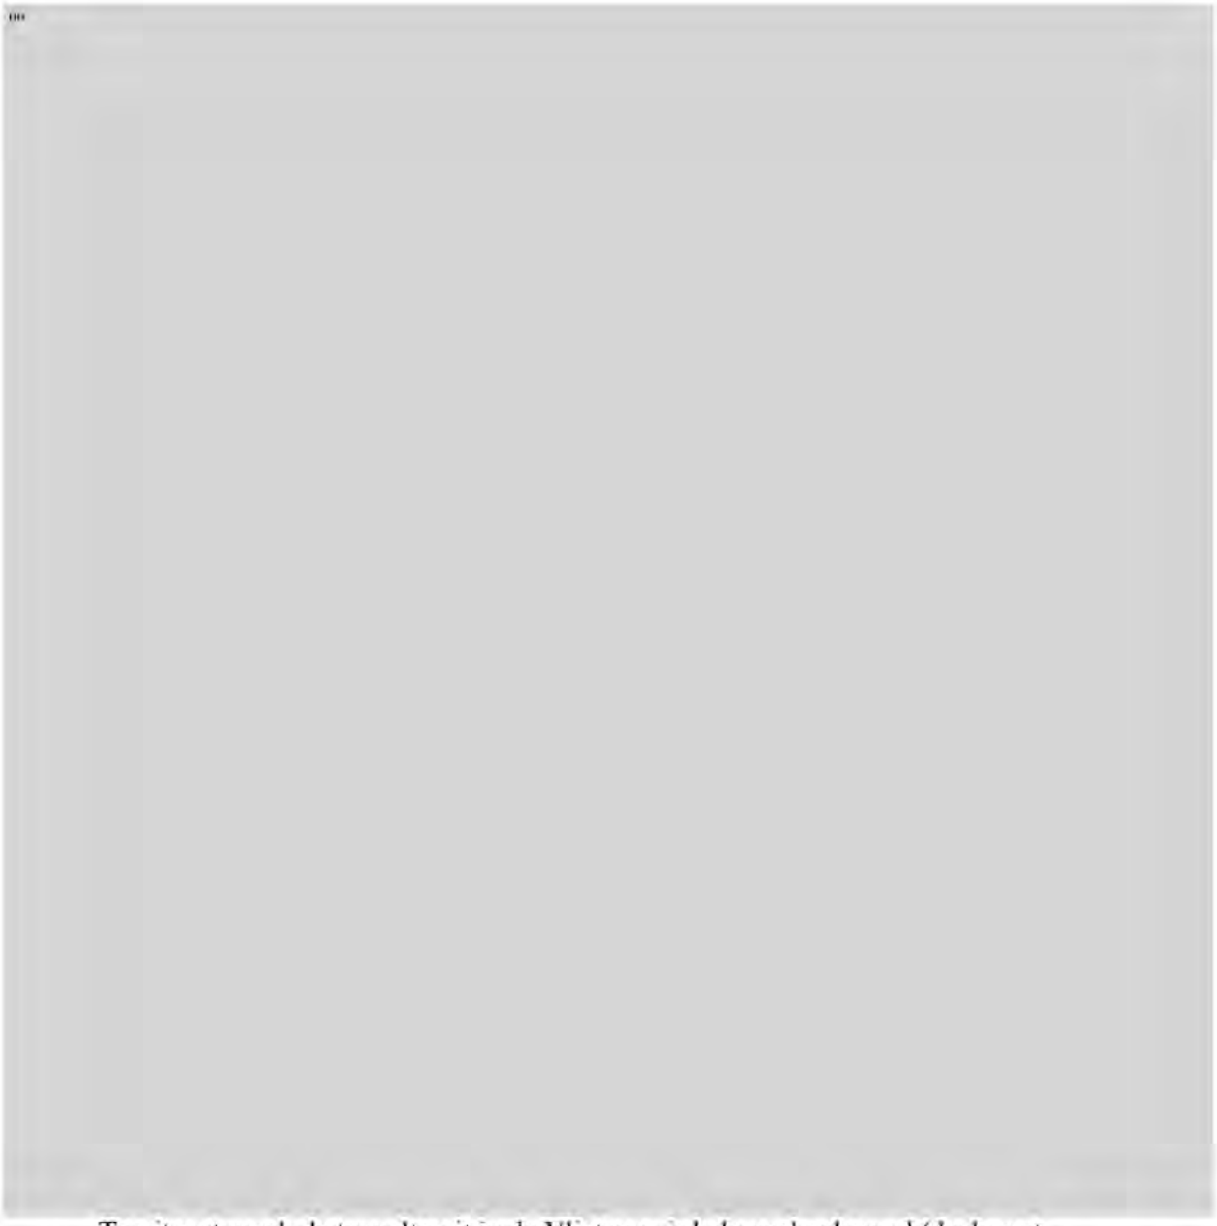

- Toerit en tunnel: de tunneltoerit in de Vlietzone is helemaal gebouwd (deels met onderwaterbeton) en leeggepompt, waardoor je nu vanaf het maaiveld door kan lopen naar de startschacht. Bij de startschacht wordt de brilwand geplaatst. De tunnelboor zal vanaf september vanuit Duitsland worden aangevoerd en worden opgebouwd in de startschacht. Op 12 januari zal de start van het boren feestelijk worden gevierd (i.p.v. 4 december). Op 13 januari is er een open dag voor publiek. Eind 2018 zal er ook een feestelijk iets georganiseerd worden op het moment de boormachine de 2e tunnelbuis afrond in de Binckhorst.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| |
|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>René van Hemert (Rijswijk, wethouder)<br>Floor Kist (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Den Haag, directeur stadsbeheer)<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (projectdirecteur Rotterdamsebaan)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Den Haag, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) |
| Afwezig:<br>5.1.2e (Den Haag, 5.1.2e ) |

| Locatie: | Datum: |
|---|---|
| Spui 70, Den Haag | 5 oktober 2017, 16:00–17:30 uur |

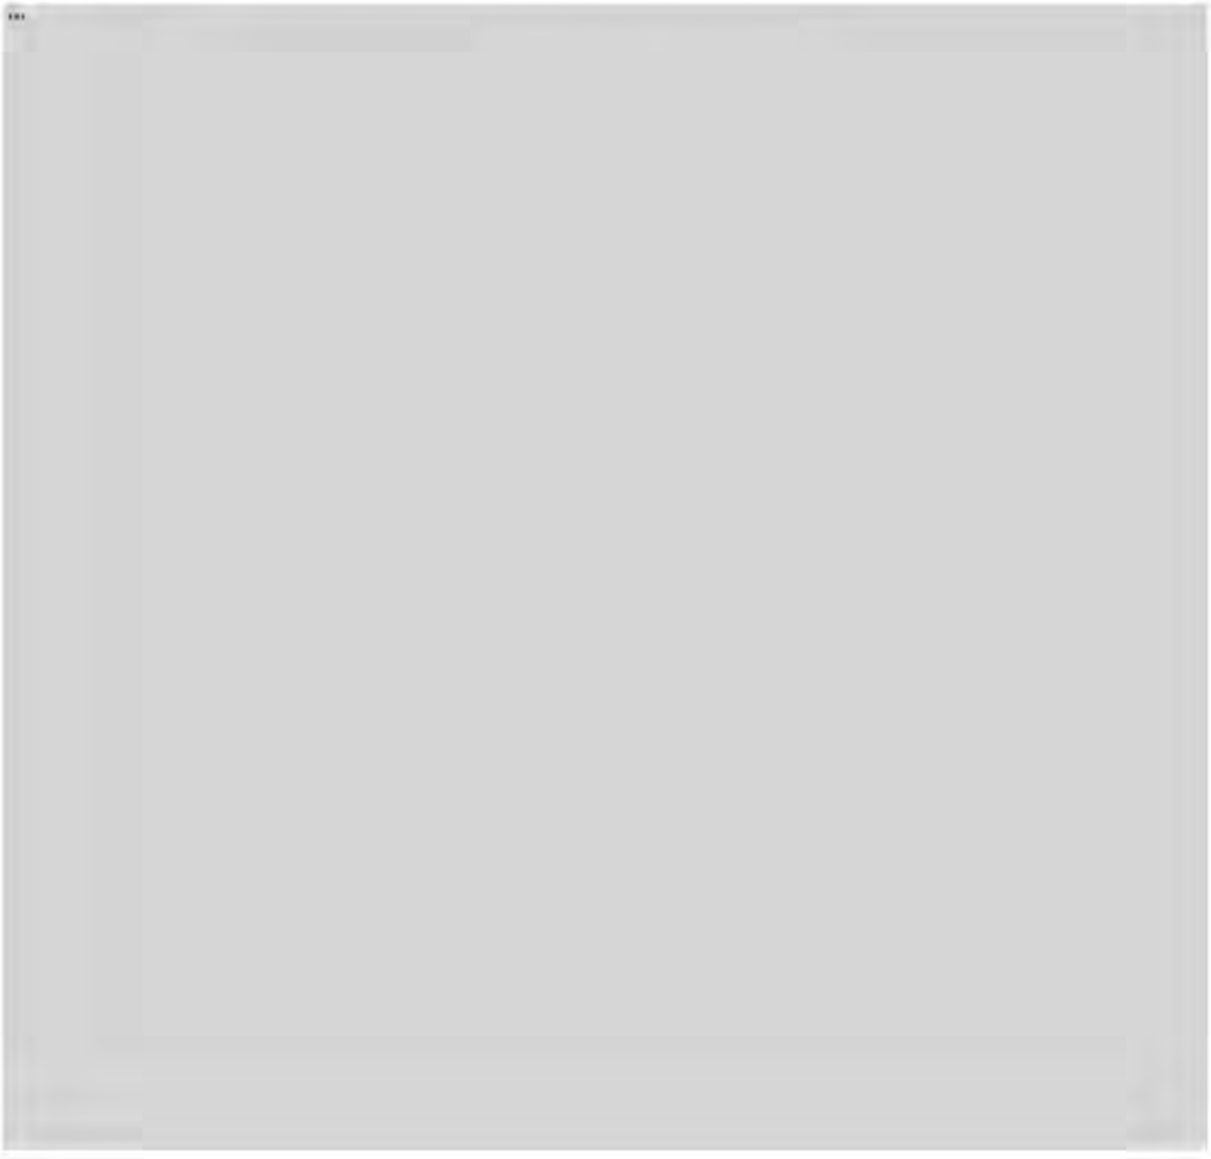

Docnr18

- In de Vlietzone wordt de tunnelboormachine aangevoerd en opgebouwd. Daarnaast wordt de voor het tunnelboorproces benodigde fabrieksterrein en opslagruimte voor de tunnelsegmenten ingericht. De tunnelsegmenten worden per vrachtwagen vanuit Duitsland aangevoerd en opgeslagen. In de aanbieding van CRB stond ALS emvi-maatregel dat de segmenten per trein van Duitsland naar de Rotterdamse haven vervoerd zouden worden. Omdat men daar inmiddels vanaf heeft gezien, zal CRB de extra CO2 uitstoot anderszins moten compenseren.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr19

## Verslag Ambtelijk-IBO

**30 november 2017**

**Aanwezig:** 5 12e **(DH),** 5 12e **(RW),** 5 12e **(RWS),** 5 12e **(DH),** 5 12e **(DH),**

**Afwezig:** 5 12e **(LV),** 5 12e **(MRDH),**

BR

| | |
|---|---|
| **S.v.z. Rotterdamsebaan** | BR<br>- Vlietzone: bentonietsilo's en portaalkraan geinstalleerd. Vanaf gisteren aanvoeren tunnelsegmenten uit Duitsland. Tunnelboormachine aangevoerd en installeren zodat start boren in januari kan plaatsvinden. Ook de contouren van het Molenvlietpark worden door grondverzet al zichtbaar.<br>BR |

BR

Docnr20

## Verslag Ambtelijk-IBO

13 maart 2018

Aanwezig: 5.1.2e (DH), 5.1.2e (LV), 5.1.2e (RWS), 5.1.2e (DH), 5.1.2e (DH),

Afwezig: 5.1.2e (MRDH), 5.1.2e (RW),

| Onderwerp | Besluit: |
|---|---|
| 5.1.2e | |
| S.v.z. Rotterdamsebaan | 5.1.2e<br>- Vlietzone: het dijklichaam voor de waterberging is aangebracht en aan het consolideren. Drievliet gaat op 30 maart weer open. |
| 5.1.2e | |

Docnr21

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| |
|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Bjorn Lugthart (Rijswijk, wethouder)<br>Astrid van Eekelen (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (projectdirecteur Rotterdamsebaan)<br>5.1.2e (Den Haag, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) |
| Afwezig:<br>5.1.2e (Den Haag, directeur stadsbeheer) |

| Locatie: | Datum: |
|---|---|
| Laan van Hoornwijck 80, Den Haag | 13 juli 2018, 13:00–14:00 uur |

[redacted]

3. **Introductie project Rotterdamsebaan en stand van zaken realisatie**
   Gevraagd: Presentatie door 5.1.2e (projectdirecteur Rotterdamsebaan).
   Besproken:
   - 5.1.2e heeft in zijn presentatie onder andere aandacht besteed aan:
     - [redacted]
     - Afgelopen juni is een kunsttraject gestart met als doel het realiseren van 2 kunstwerken in de openbare ruimte, 1 in relatie tot de Victory Boogiewoogie nabij de tunnelmond Binckhorst en 1 in relatie tot de archeologische vondsten in het Molenvlietpark. De ideeën worden komende jaren geschetst, uitgewerkt en gerealiseerd.

[redacted]

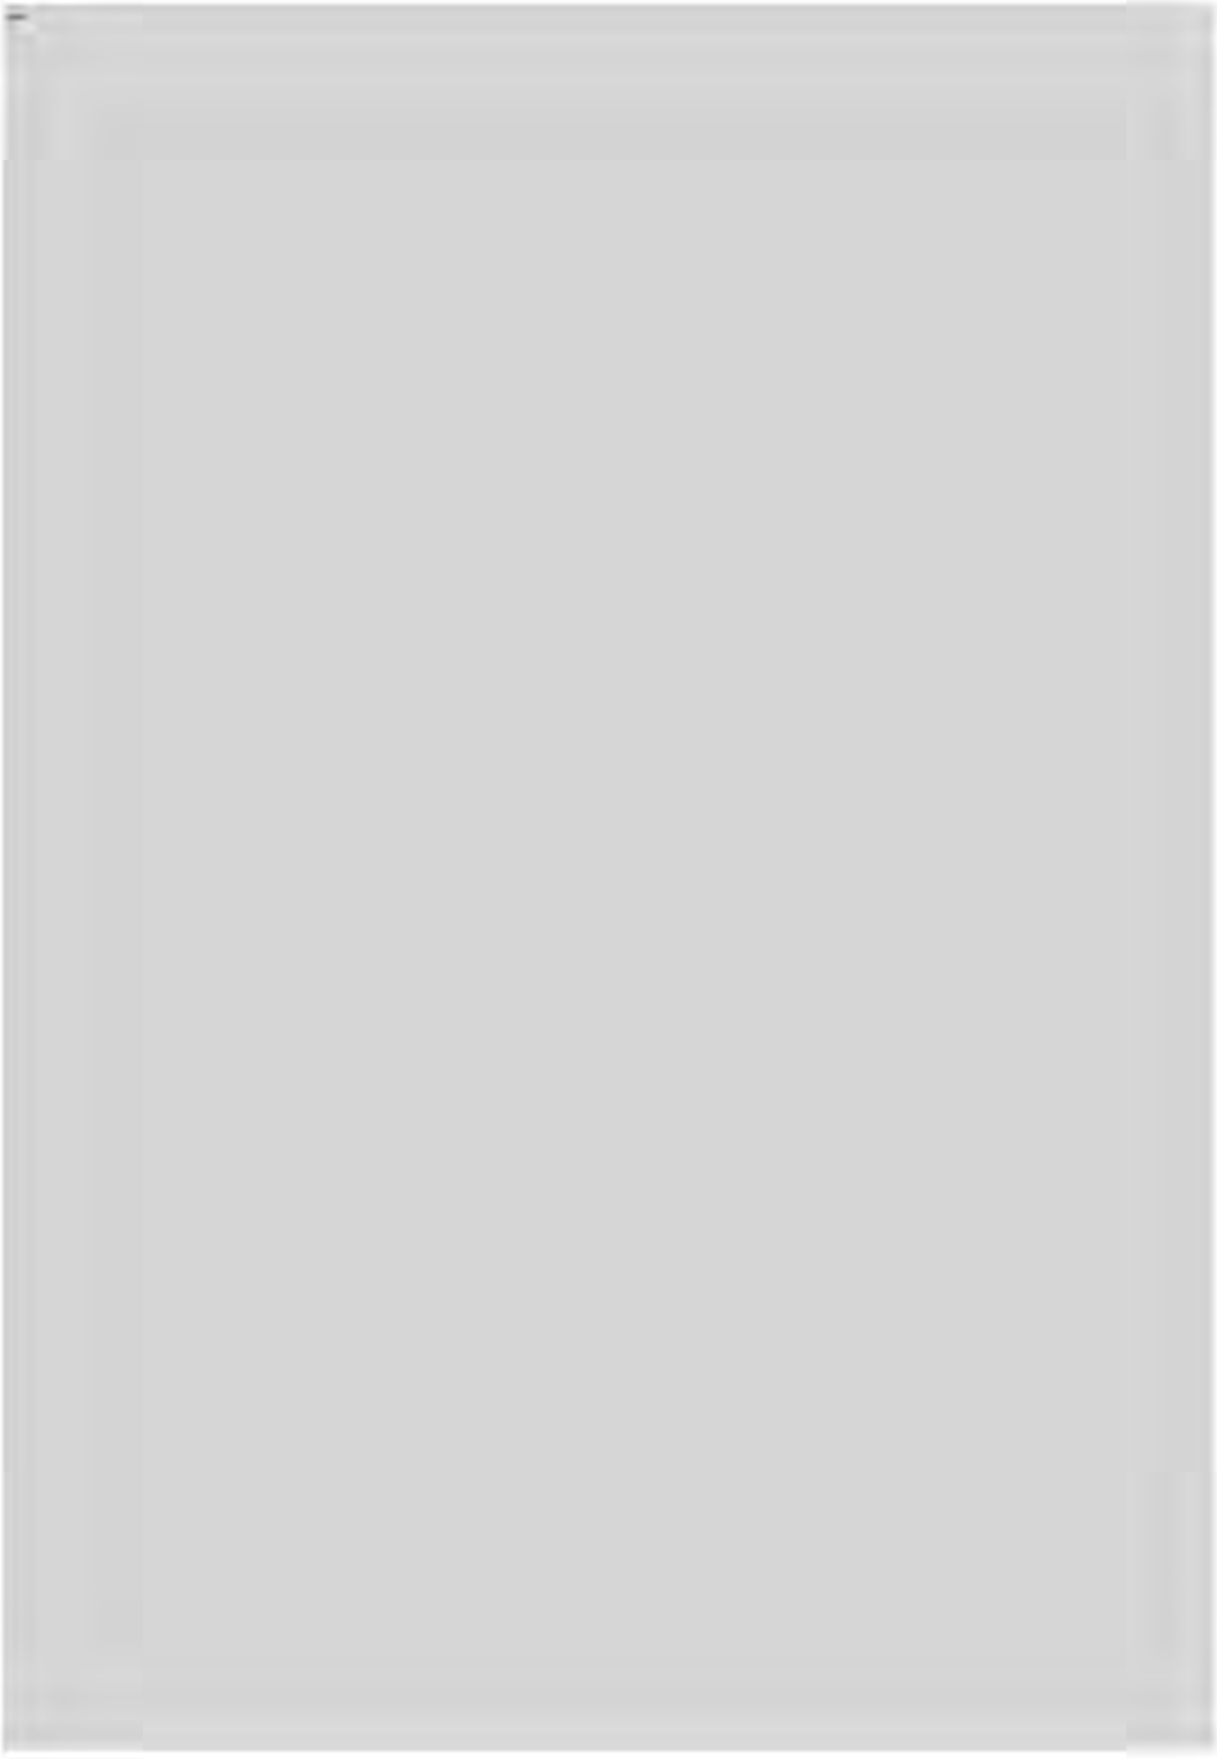

0-0-0-0-0-0-0-0-0

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| |
|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Astrid van Eekelen (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>Bjorn Lugthart (Rijswijk, wethouder)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, Directeur netwerkmanagement Zuid Holland)<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Den Haag, directeur stadsbeheer)<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) |
| Afwezig:<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, Projectdirecteur) |

| | |
|---|---|
| Locatie:<br>Laan van Hoornwijck 80, Den Haag | Datum:<br>5 oktober 2018, 13:00–15:00 uur |

[redacted]

**6. Stand van zaken project**

Gevraagd: Toelichting door 5.1.2.e en 5.1.2.e

Besproken:

- 5.1.2.e en 5.1.2.e hebben onder andere uiteengezet:

[redacted]

  - In de Vlietzone zijn de contouren van het dienstgebouw zichtbaar welke de toekomstige entree van de tunnel zal markeren. Er wordt gewerkt aan de realisatie van het Molenvlietpark, onder andere de kades rondom toekomstige waterbergingsgebied.

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr23

## Verslag Ambtelijk-IBO

**6 december 2018**

**Aanwezig:** 5 1 2 e (DH), 5 1 2 e (LV), 5 1 2 e (RWS), 5 1 2 e (MRDH), 5 1 2 e (DH), 5 1 2 e (DH),

**Afwezig:** 5 1 2 e (RW),

| Onderwerp | Besluit: |
|---|---|
| RR | |
| **S.v.z. Rotterdamsebaan** | RR<br>Vanuit het boorproces komt veel zand vrij. Zoveel als mogelijk wordt hergebruikt in het Molenvlietpark en het parkeerterrein Drievliet.<br>RR<br>RR |
| RR | |

Docnr24

## Verslag Ambtelijk-IBO

**21 februari 2019**

**Aanwezig:** 5 1/2e (DH), 5 1/2e (LV), 5 1/2e (RWS), 5 1/2e (DH), 5 1/2e (DH),
**Afwezig:** 5 1/2e (RW),
**Agendalid:** 5 1/2e 5 1/2e (MRDH),

| Onderwerp | Besluit: |
|---|---|
| [redacted] | |
| S.v.z. Rotterdamsebaan | 5 1/2e heeft s.v.z. project besproken. Deze onderwerpen kom ook aan bod tijdens het bestuurlijk overleg 15 maart: boren tunnelbuizen afgerond, betonwerk nagenoeg gereed, hittewerende bekleding gesloten toeritten, aanvraag kapvergunning tweede watertoevoer, 3 april werkbezoek 3 gemeenteraden. |
| Rondvraag | Geen |

Docnr25

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| | |
|---|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Astrid van Eekelen (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>Bjorn Lugthart (Rijswijk, wethouder)<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Den Haag, directeur stadsbeheer)<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, Projectdirecteur)<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, Omgevingsmanagement)<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) | |
| Afwezig:<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e ) | |
| Locatie:<br>Spui 70, stadhuis Den Haag | Datum:<br>15 maart 2019, 11:00–12:30 uur |

Docnr25

**6. Stand van zaken project**

Gevraagd: Toelichting door 5.1.2e

Besproken:

- 5.1.2e heeft onder andere uiteengezet:

  - Nevenprojecten van het hoofdcontract Rotterdamsebaan welke in voorbereiding of uitvoering zijn: calamiteitenberging in Molenvlietpark op verzoek Hoogheemraadschap (o.a. aanvraag kappen bomen ingediend), voetgangersbrug voor Drievliet door middel van een hellingbaan aansluiten op het bestaande park (tijdelijke oplossing omdat Drievliet ambitie t.a.v. indoorhal nog niet uitgewerkt heeft),



o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr26

## Verslag Ambtelijk-IBO

16 juli 2019

Aanwezig: 5.1.2e (RW), 5.1.2e (LV), 5.1.2e (RWS), 5.1.2e (DH), 5.1.2e (DH), 5.1.2e (DH),
Afwezig: 5.1.2e (DH),
Agendalid: 5.1.2e (MRDH),

| Onderwerp | Besluit: |
|---|---|
| BR | |
| Bestuurlijk documenten en vragen | team-Roba heeft diverse vragen uit Park Hoornwijck ontvangen t.a.v. Molenvlietpark, MER en 2e watertoevoer. College en Raad van Den Haag hebben brieven van Park Hoornwijck ontvangen over MER Rotterdamsebaan. Deze brieven kunnen goed beantwoord worden.<br>BR |
| S.v.z. Rotterdamsebaan | 5.1.2e en 5.1.2e hebben s.v.z. project besproken, waaronder:<br>BR<br>Vanavond (16 juli) plenaire informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden over 2e watertoevoer. Presentaties geven over fasering (incl. 1 rijstrook afsluiten van Jan Tijssenweg), waterberging en landschapsontwerp. N.a.v. de aanvraag kapvergunning uit oktober (ca. 460 bomen) zijn diverse bezwaren binnengekomen. Verdere behandeling van de vergunning wacht op ontheffing t.a.v. mogelijk aanwezig vleermuizen.<br>Voor een voetgangersbrug vanuit Park Hoornwijck (Rijswijk) naar Molenvlietpark (Den Haag) volgt een beslissing op bezwaar tegen de vergunning. |
| BR | |

Docnr27

## Verslag Ambtelijk-IBO

**10 september 2019**

**Aanwezig:** 5 1 2 e **(LV),** 5 1 2 e **(RWS),** 5 1 2 e **(DH),** 5 1 2 e **(DH),**
**Afwezig:** 5 1 2 e **(DH),** 5 1 2 e **(RW),**
**Agendalid:** 5 1 2 e **(MRDH),**

| Onderwerp | Besluit: |
|---|---|
| BR | |
| **Verslag 16 juli** | Vastgesteld<br>N.a.v. het verslag meldt 5 1 2 e dat het bezwaar tegen de voetbrug vanuit Park Hoornwijk naar het Molenvlietpark is ingetrokken. |
| BR | |
| **S.v.z. Rotterdamsebaan** | 5 1 2 e heeft s.v.z. project besproken, waaronder:<br>BR<br>- Voor 2e watertoevoer is gebleken dat er ca. 45 bomen behuden kunnen blijven waarvoor eerder een kapverunning is aangevraagd.<br>BR |
| BR | |

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| |
|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Astrid van Eekelen (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>Boudewijn Revis (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, Projectdirecteur)<br>5.1.2e (Den Haag, directeur stadsbeheer)<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) |
| Afwezig:<br>- |
| Agendalid:<br>Bjorn Lugthart (Rijswijk, wethouder)<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e 5.1.2e (MRDH, subsidieverlener) |

| Locatie: | Datum: |
|---|---|
| Laan van Hoornwijck 80 Den Haag | 5 maart 2020 |

Docnr28

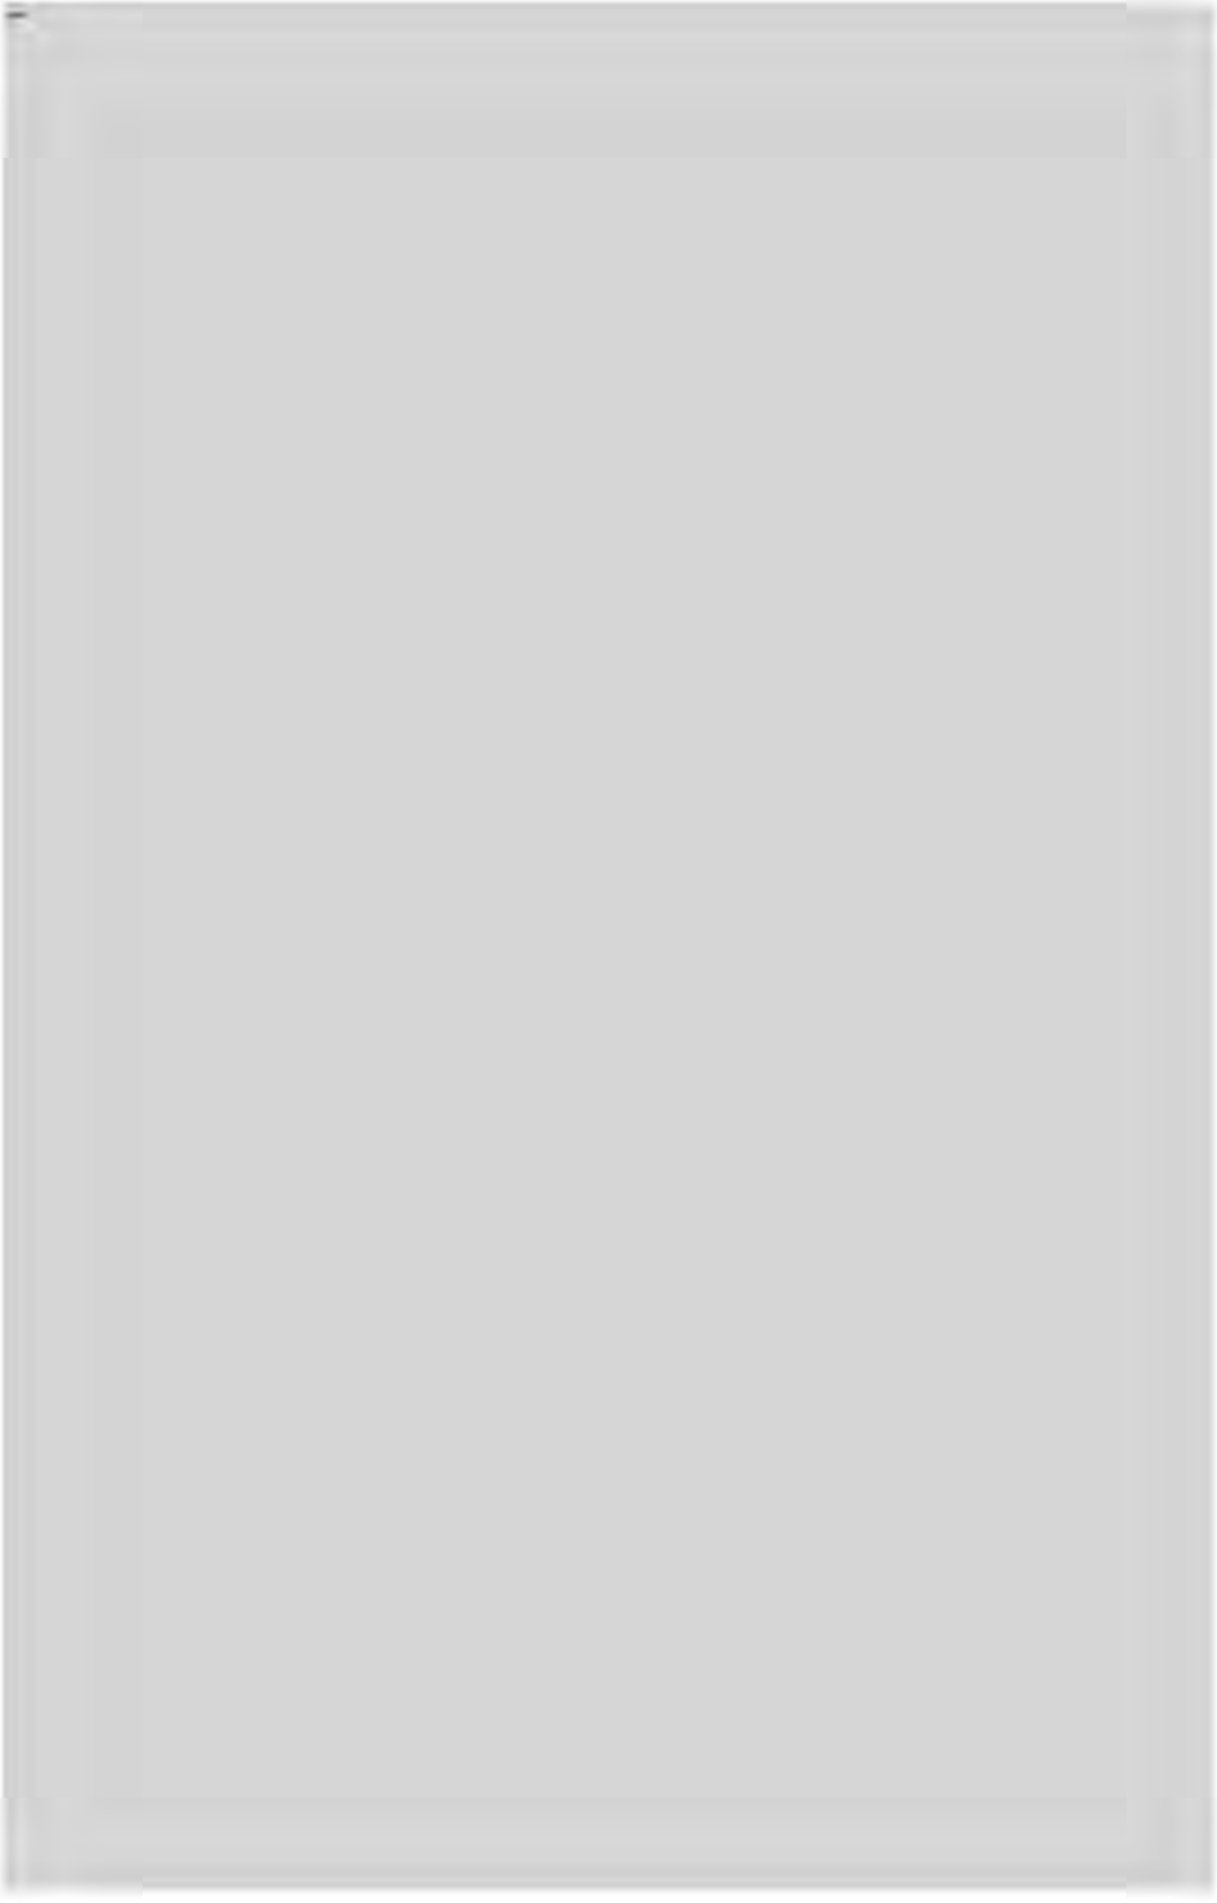

- De realisatie van de tweede watertoevoer vanaf de Vliet start eind 2020 indien kapvergunning en grondovereenkomst er zijn.

o-o-o-o-o-o-o-o-o

# Verslag Interbestuurlijk Overleg (IBO) Rotterdamsebaan

| |
|---|
| Aanwezig:<br>5.1.2e (onafhankelijk voorzitter IBO-Rotterdamsebaan)<br>Astrid van Eekelen (Leidschendam-Voorburg, wethouder)<br>Bjorn Lugthart (Rijswijk, wethouder)<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>Anne Mulder (Den Haag, wethouder)<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, Projectdirecteur)<br>5.1.2e (Den Haag, directeur stadsbeheer)<br>5.1.2e (Rijswijk, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Leidschendam-Voorburg, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rijkswaterstaat, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e )<br>5.1.2e (Rotterdamsebaan, 5.1.2e ) |
| Afwezig:<br>- |

| Locatie: | Datum: |
|---|---|
| Digitaal via MS Teams | 29 januari 2021 |

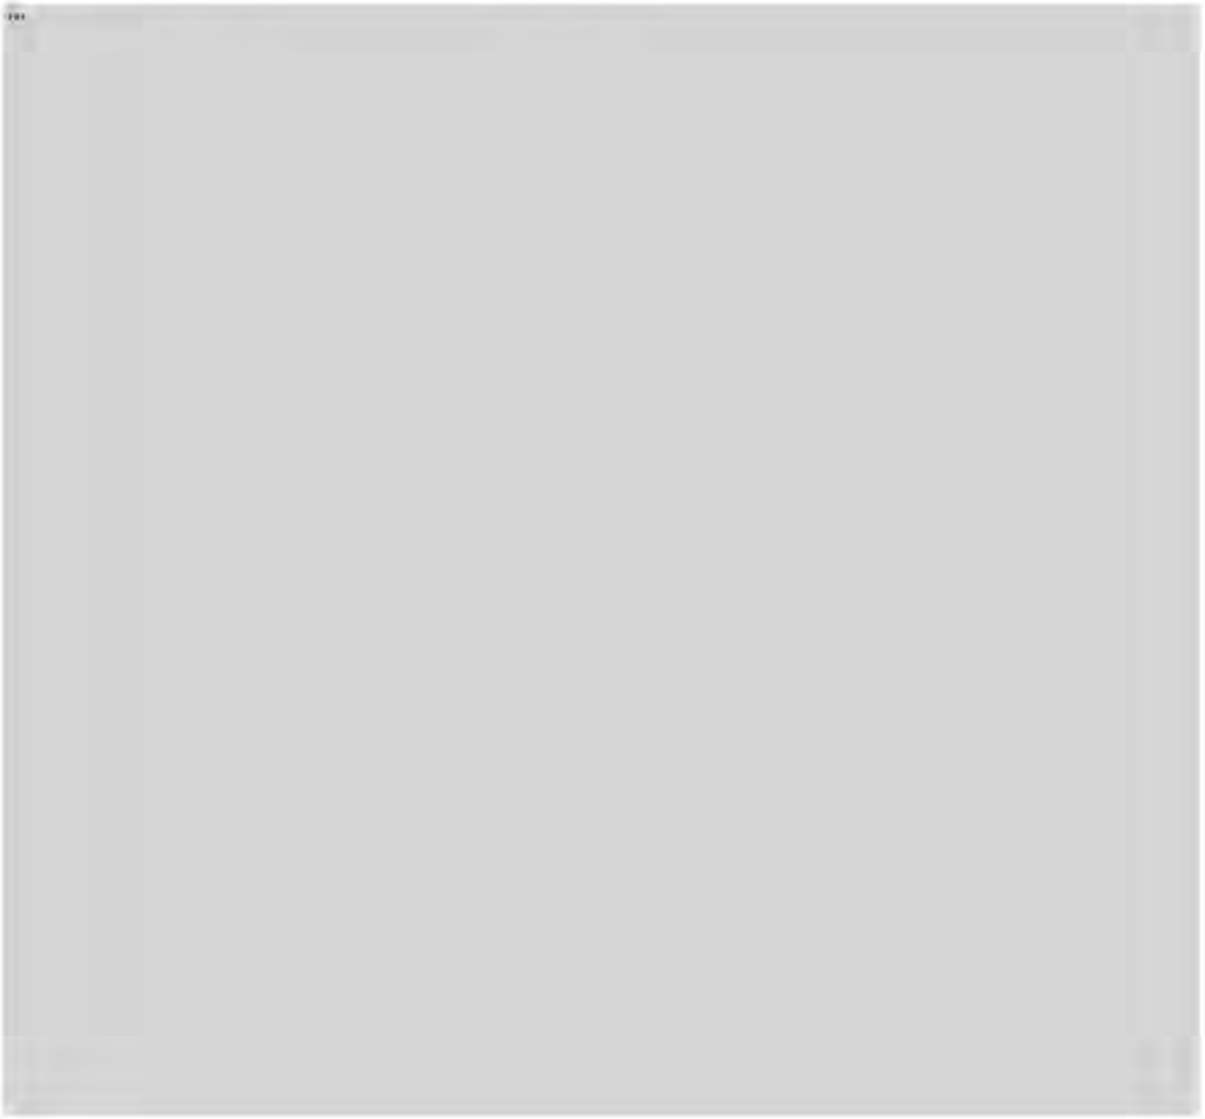

[redacted]

- Enkele restwerkzaamheden zullen voor verdere realisatie verzelfstandigd worden van het project Rotterdamsebaan om komende jaren alsnog te realiseren zoals een definitieve hellingbaan vanaf de voetgangersbrug naar Drievliet, een onteigening in de Binckhorst, de tweede watertoevoer naar het Molenvlietpark en de nieuwe primaire bediencentrale op Scheveningen (daarna is bediencentrale Vlietzoom de secundaire bediencentrale van Den Haag).

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

| Document nummer | Bestandsnaam export | Weigeringsgrond | Tags |
|---|---|---|---|
| 00001 | ROBA-OG-BSM-00-VER-0017.xls | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00002 | ROBA-OG-BSM-00-VER-0023.docx | 5.1.2.e | Document deels openbaar |
| 00003 | ROBA-OG-BSM-VER-0013.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00004 | ROBA-OG-BSM-VER-0020.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00005 | ROBA-OG-BSM-VER-0021.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00006 | ROBA-OG-BSM-VER-0022.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00007 | ROBA-OG-BSM-VER-0023.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00008 | ROBA-OG-BSM-VER-0024.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00009 | ROBA-OG-BSM-VER-0025.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00010 | ROBA-OG-BSM-VER-0026.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00011 | ROBA-OG-BSM-VER-0027.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00012 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0021.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00013 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0040.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00014 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0051.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00015 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0062.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00016 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0070.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00017 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0079.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00018 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0083.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00019 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0089.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00020 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0101.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00021 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0109.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00022 | ROBA-PRJBEH-PRJBEH-INFBH-VER-0114.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00023 | ROBA-VER-004271.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00024 | ROBA-VER-004277.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00025 | ROBA-VER-004281.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00026 | ROBA-VER-004286.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00027 | ROBA-VER-004290.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00028 | ROBA-VER-004295.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00029 | ROBA-VER-004299.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00030 | ROBA-VER-004315.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00031 | ROBA-VER-004319.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00032 | ROBA-VER-004323.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00033 | ROBA-VER-004326.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00034 | ROBA-VER-004333.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00035 | ROBA-VER-004354.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00036 | ROBA-VER-004359.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00037 | ROBA-VER-004363.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00038 | ROBA-VER-004375.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00039 | ROBA-VER-004377.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00040 | ROBA-VER-004388.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00041 | ROBA-VER-004422.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00042 | ROBA-VER-004427.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00043 | ROBA-VER-004431.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00044 | ROBA-VER-004433.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00045 | ROBA-VER-004451.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00046 | ROBA-VER-004464.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00047 | ROBA-VER-004469.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00048 | ROBA-VER-004472.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00049 | ROBA-VER-004480.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00050 | ROBA-VER-004489.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00051 | ROBA-VER-004494.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00052 | ROBA-VER-004506.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00053 | ROBA-VER-004512.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00054 | ROBA-VER-004532.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00055 | ROBA-VER-004538.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00056 | ROBA-VER-004550.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00057 | ROBA-VER-004554.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00058 | ROBA-VER-004556.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00059 | ROBA-VER-004593.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00060 | ROBA-VER-004598.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00061 | ROBA-VER-004604.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00062 | ROBA-VER-004615.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00063 | ROBA-VER-004616.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00064 | ROBA-VER-004627.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00065 | ROBA-VER-004637.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00066 | ROBA-VER-004652.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00067 | ROBA-VER-004692.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00068 | ROBA-VER-004698.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00069 | ROBA-VER-004705.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00070 | ROBA-VER-004708.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00071 | ROBA-VER-004717.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00072 | ROBA-VER-004723.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00073 | ROBA-VER-004738.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00074 | ROBA-VER-004753.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00075 | ROBA-VER-004755.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00076 | ROBA-VER-004764.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00077 | ROBA-VER-004773.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00078 | ROBA-VER-004785.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00079 | ROBA-VER-004790.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00080 | ROBA-VER-004808.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00081 | ROBA-VER-004811.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00082 | ROBA-VER-004817.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00083 | ROBA-VER-004827.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00084 | ROBA-VER-004832.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00085 | ROBA-VER-004836.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00086 | ROBA-VER-004843.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00087 | ROBA-VER-004845.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00088 | ROBA-VER-005406.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00089 | ROBA-VER-005415.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00090 | ROBA-VER-005429.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00091 | ROBA-VER-005431.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00092 | ROBA-VER-005437.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00093 | ROBA-VER-005448.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00094 | ROBA-VER-005461.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00095 | ROBA-VER-005465.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00096 | ROBA-VER-005470.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00097 | ROBA-VER-005475.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00098 | ROBA-VER-005478.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00099 | ROBA-VER-005484.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00100 | ROBA-VER-005488.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00101 | ROBA-VER-005493.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00102 | ROBA-VER-005494.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00103 | ROBA-VER-005504.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00104 | ROBA-VER-005515.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00105 | ROBA-VER-005538.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00106 | ROBA-VER-005541.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00107 | ROBA-VER-005544.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00108 | ROBA-VER-005547.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00109 | ROBA-VER-005549.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00110 | ROBA-VER-005554.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00111 | ROBA-VER-005558.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00112 | ROBA-VER-005559.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00113 | ROBA-VER-005587.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00114 | ROBA-VER-005600.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00115 | ROBA-VER-005609.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00116 | ROBA-VER-005614.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00117 | ROBA-VER-005616.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00118 | ROBA-VER-005624.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00119 | ROBA-VER-005628.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00120 | ROBA-VER-005629.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00121 | ROBA-VER-005634.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00122 | ROBA-VER-005644.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00123 | ROBA-VER-005647.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00124 | ROBA-VER-005651.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00125 | ROBA-VER-005653.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00126 | ROBA-VER-005658.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00127 | ROBA-VER-005664.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00128 | ROBA-VER-005670.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00129 | ROBA-VER-005673.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00130 | ROBA-VER-005675.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00131 | ROBA-VER-005679.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00001 | ROBA-OG-BSM-VER-0019.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |
| 00002 | ROBA-OG-BSM-00-VER-0023.docx | 5.1.2.e, BR | Document deels openbaar |

Docnr1

## Besluitenlijst Managementteam Rotterdamsebaan

**27 januari 2014**

**Aanwezig:** 5:12e

**Afwezig:** 5:12e

| Onderwerp | Gevraagd besluit | Besluit |
|---|---|---|
| *** | | |
| **Rondvraag en sluiting** | Zijn er nog vragen/mededelingen? | 5:12e Hoogheemraadschap en Provincie zijn positief aangehaakt bij opstellen landschapsvisie voor Vlietzone (los van project Roba)<br>*** |
| | | |
| | | |

# Verslag

## Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 12 mei 2014 |

**Naam overleg** **Managementteam Rotterdamsebaan**

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

MT- leden en Team Roba

Data volgende vergaderingen:

19 mei 2014

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|
| | | **1 Opening en mededelingen** |
| | | - 5.1.2.e Vanmiddag is DSB Hoofden korte presentatie. 5.1.2.e MT-leden z |
| | | **2 Besluitenlijst vorige vergadering** |
| | | Gevraagd: vaststellen |
| | | Besproken: enkele aanpassingen worden n |
| | | - 5.1.2.e en 5.1.2.e hebbe diensten kan aanbesteden. |
| | | Besloten: vastgesteld. |
| | | **3 Work Breakdown Structure Rott** |
| | | Gevraagd: vaststellen |
| | | Besloten: Vastgesteld |
| | | - De WBS is een gestructureerd ove het project Rotterdamsebaan. De a weergegeven in de overall- en de |
| | | - Behalve als basis voor de planning structureren van het informatiema risicomanagement en de scopebev |
| 5.1.2.e | | - Dit systeem kan ook worden toege (waterbeheer) . 5.1.2.e pakt dit op |
| | | - WBS agenderen voor Teamoverle |
| | | - Afgesproken wordt dat alle WBS- worden getoetst. 5.1.2.e bespreek |
| | | **4 Rondje langs de velden** |
| | | Gevraagd: actuele ontwikkelingen bespre |
| | | 5.1.2.e |
| | | - Bijeenkomst 5.1.2.e is goed |
| | | - HHD, calamiteit waterberging wo 24 september in de verenigde verg |

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|
| | | - Indoorhal en aanleg Molenvlietpa<br>met betrokkenen. Vorige week pr<br>de wethouder en akkoord gekrege<br>raming.<br>- Informaticavond Vlietzone vindt p<br>ontwerp Molenvlietpark gepresen<br>- Op 26 en 27 juni is de Raad van S<br>- Verwerving: Er is besloten om Va<br>verwerven.<br>- 5.1.2.e maakt de consequenties s<br>bespreking in het MT.<br>5.1.2.e<br>- Uitleg Dashboard Binckhorst t.b.v<br>andere keer in het MT gepresentee<br>- Offerte Archeologie 1e fase is inge<br>5.1.2.e en 5.1.2.e bespreken de offerte<br>5.1.2.e<br>- Brieven aan gegadigden zijn vorig<br>de stukken gestuurd ter inventaris<br>- Themasessies worden ingepland.<br>5.1.2.e<br>- Rapportage is vastgesteld in OGO<br>- Overdrachtsdocument nog in voor<br>stakeholder.<br>5.1.2.e<br>- Uitvraag gedaan voor inrichting in<br>met 5.1.2.e gehad over de offerte en<br>werkzaamheden gereed zijn, kan<br>- Begeie Vlietzone vindt plaats op 2<br>- Begeleidingscommissie Binckhor<br>- Conditionering Binckhorst: bewo<br>(5.1.2.e is hiermee bezig)<br>- Om de twee weken communicatie<br>- Aandachtspunt: 5.1.2.e is aanspree<br>- Afstudeerpresentatie Darinde is op<br>- Afscheid 5.1.2.e ergens in juli<br><br>5.1.2.e meld dat de klimaatbeheersing op de<br>maakt melding hiervan bij de beheerder va<br><br>**5 Afspraken komende periode**<br>Gevraagd: ter kennisgeving.<br>- Ter kennisgeving aangenomen.<br><br>**6 Rondvraag en sluiting**<br>- Geen |

## Actie - besluitenlijst Managementteam Rotterdamsebaan

| Nr. | MT-datum | Actie - Besluit | Wie | Planning ge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-03-14 | Bijeenkomst Adviesraad Rotterdamsebaan | 5.1.2.e / 5.1.2.e | 26 maart 201 |
| 2 | 17-03-14 | Startbijeenkomst Dialoog Rotterdamsebaan | 5.1.2.e | 17 april 2014 |
| 3 | 17-03-14 | 5.1.2.e informeert naar de mogelijkheden voor integratie met gemeentelijke netwerk voor tablets van MT-Roba | 5.1.2.e | medio april |
| 4 | | Cursus UAV-GC 2005, gegeven door Croon Advocaten | 5.1.2.e | 9 en 23 april |
| 5 | 12-05-14 | 5.1.2.e levert input stakeholder tbv Overdrachtsdocument | 5.1.2.e | ?? |
| 6 | 12-05-14 | Offerte Archeologie 1e fase bespreken met 5.1.2.e | 5.1.2.e / 5.1.2.e | ?? |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Verslag

## Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 31 maart 2014 |

Naam overleg: Managementteam Rotterdamsebaan

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e en 5.1.2.e

Afwezig met bericht:

Kopieën aan:

MT- leden en Team Roba

Data volgende vergaderingen:

7 april 2014

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

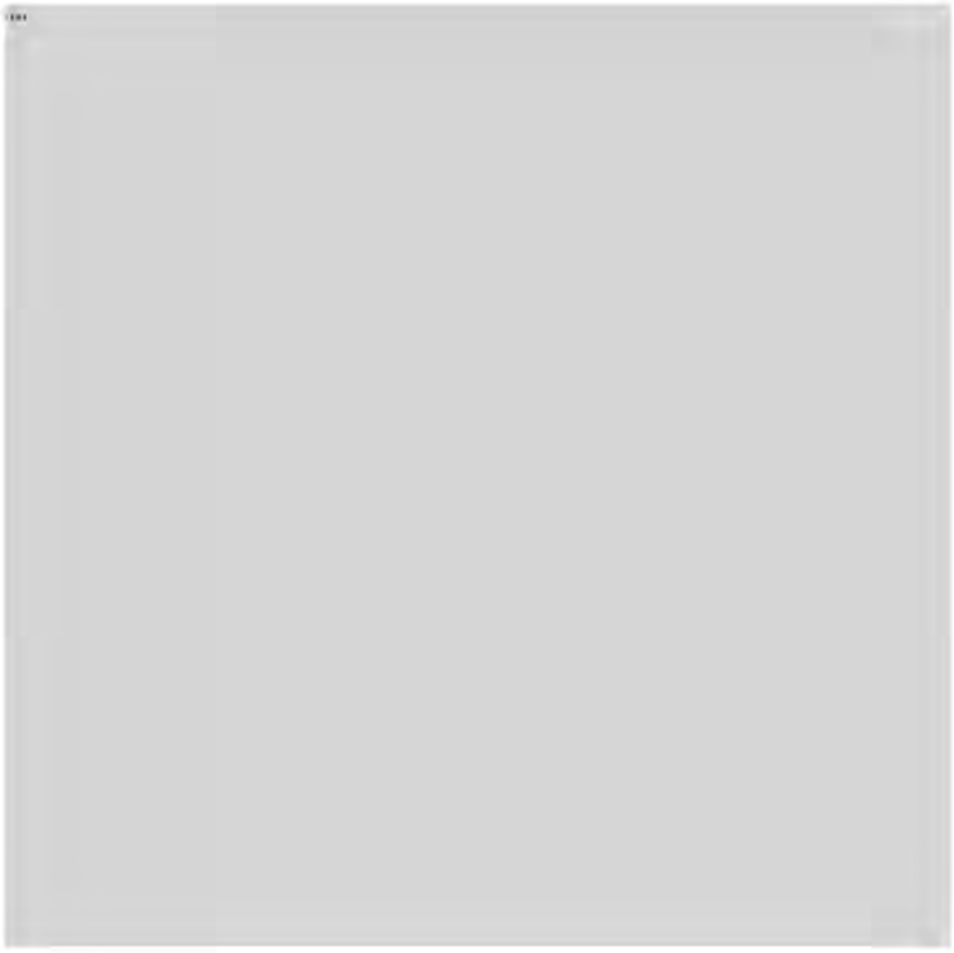

Actie Datum Verslag

## 6 Rondje langs de velden

Gevraagd: actuele ontwikkelingen bespreken/melden

- HHD doet onderzoek voor de waterhuishouding in de Vlietzone incl. PvE calamiteitenberging.

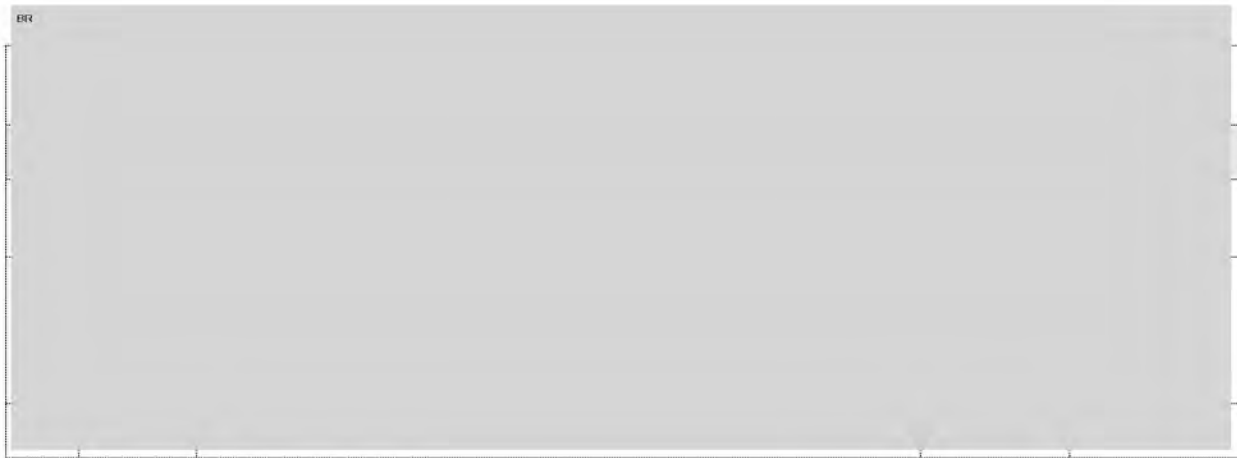
BR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 22 juli 2014 |
| **Naam overleg** | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e , 5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

4 augustus 2014

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

BR

## 2 Besluitenlijst vorige vergadering (bijlage)

Gevraagd: vaststellen

Besloten: na kleine aanpassingen akkoord en vastgesteld.

N.a.v.:

BR

- 5.1.2.e gesprek arrangeren tussen dijkgraaf en wethouder t.a.v. de mogelijk calamiteitenberging in de Vlietzone blijkt wegens vakanties de komende twee maanden niet mogelijk. 5.1.2.e zoekt i.s.m. hoogheemraadschap naar alternatief voor 18 augustus;

BR

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

[redacted]

## 6 Rondje langs de velde

Gevraagd: actuele ontwikkelingen bespreken/melden

Besproken:

[redacted]

- Communicatie rondom de komst van het Molenvlietpark wordt voorbereid;

[redacted]

Actie Datum Verslag

BR

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

**Actielijst Managementteam Rotterdamsebaan**

| Nr. | MT-datum | Actie | Wie | Gereed |
|---|---|---|---|---|
| BR | | | | |
| 2 | 21 juli 2014 | Vooroverleg dijkgraaf en wethouder t.a.v. calamiteitenberging | 5.1.2 e | 18 augustus |
| BR | | | | |

Docnr5

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 5 augustus 2014 |
| **Naam overleg** | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e , 5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

18 augustus 2014

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

[redacted]

## 8 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

5.1.2.e

[redacted]

- I.s.m. wethouder en dijkgraaf bepalen of er in het Molenvlietpark wel/geen waterberging mogelijk wordt. Men vindt het een goed idee, maar hoe financieren? Op 27 aug hebben de heren Revis en 5.1.2.e hierover weer contact. Keuze moet eigenlijk gemaakt zijn voorafgaande aan behandeling van Molenvlietpark en indoorhaal Drievliet in de raadscommissie;

[redacted]

Actie Datum

BR

5.1.2.e

- Groot deel van team is hard bezig met schrijven van de vraagspecificaties. O.a. het alignement blijkt te moeten worden bijgesteld. Eind augustus is er duidelijkheid nodig over of de kans het grootste is dat er wel of geen waterberging in Molenvlietpark komt. Dit heeft relatie met het treffen van voorzieningen in de rest van het watersysteem

BR

**0-0-0-0-0-0-0-0-0-0**

BR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 18 augustus 2014 |
| **Naam overleg** | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e , 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e .

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

1 september 2014

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

- Discussie HHD - Drievliet over watercompensatie. We moeten heel scherp zijn.

**0-0-0-0-0-0-0-0-0-0**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Docnr7

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 1 september 2014 |
| **Naam overleg** | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

10 september 2014

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

5.1.2.e

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

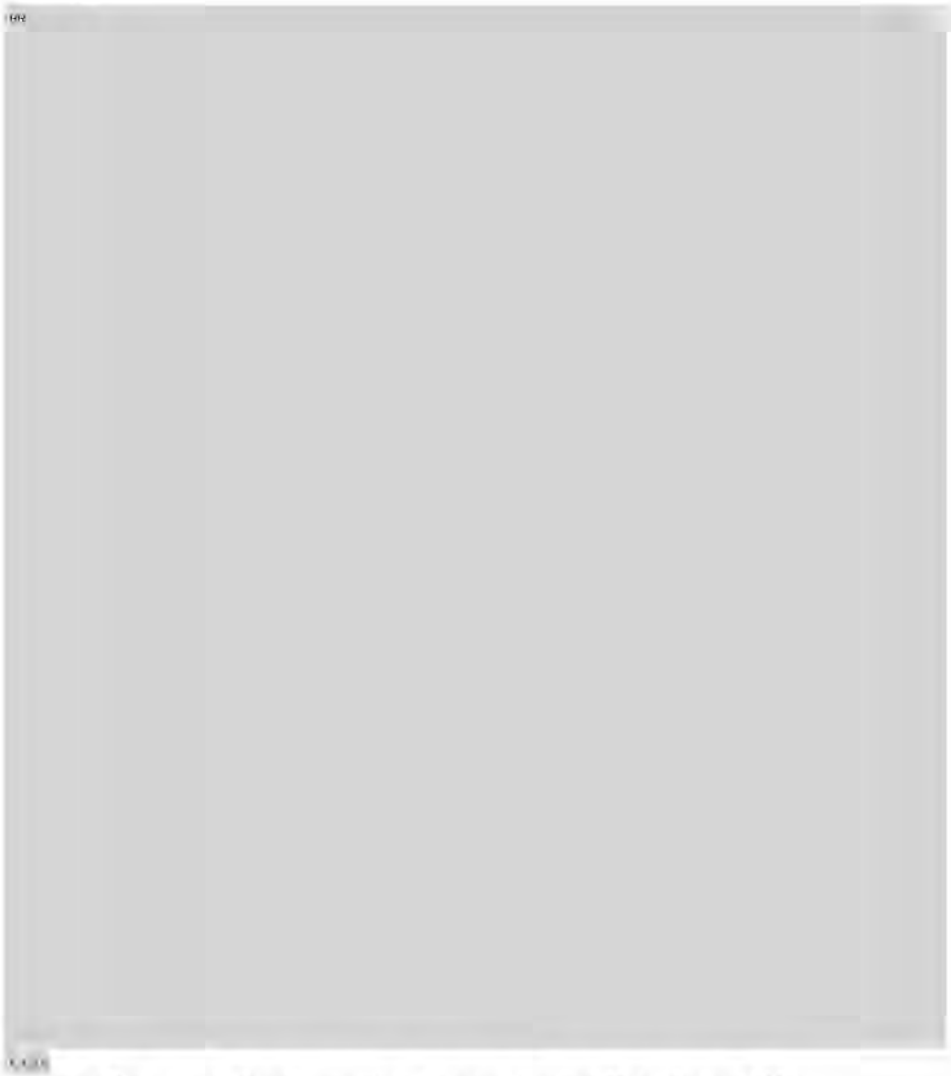

- Commissie Leefomgeving, bespreking hal Drievliet en VO Molenvlietpark.

Actie Datum Verslag

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 10 september 2014 |
| **Naam overleg** | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e , 5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

15 september 2014

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

Actie Datum Verslag

[redacted]

## 7 Rondje langs de velden

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken/melden

[redacted]

- Helpen bij het ter inzage leggen van het VO Molenvlietpark
- 1 oktober zal de Statencommissie van de provincie per bus een bezoek brengen aan de Vlietzone.

[redacted]

| Actie | Datum | Verslag | | |
|---|---|---|---|---|
| BR | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | | | | |

Docnr9

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 15 september 2014 |
| **Naam overleg** | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

15 september 2014

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

Molenvlietpark is uitgegaan en ligt vanaf maandag 22 september 6 weken ter inzage.

- Budget Molenvlietpark vraagt om aandacht. 5.1.2.e is bezig met concept scopewijzigingsdocument.

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

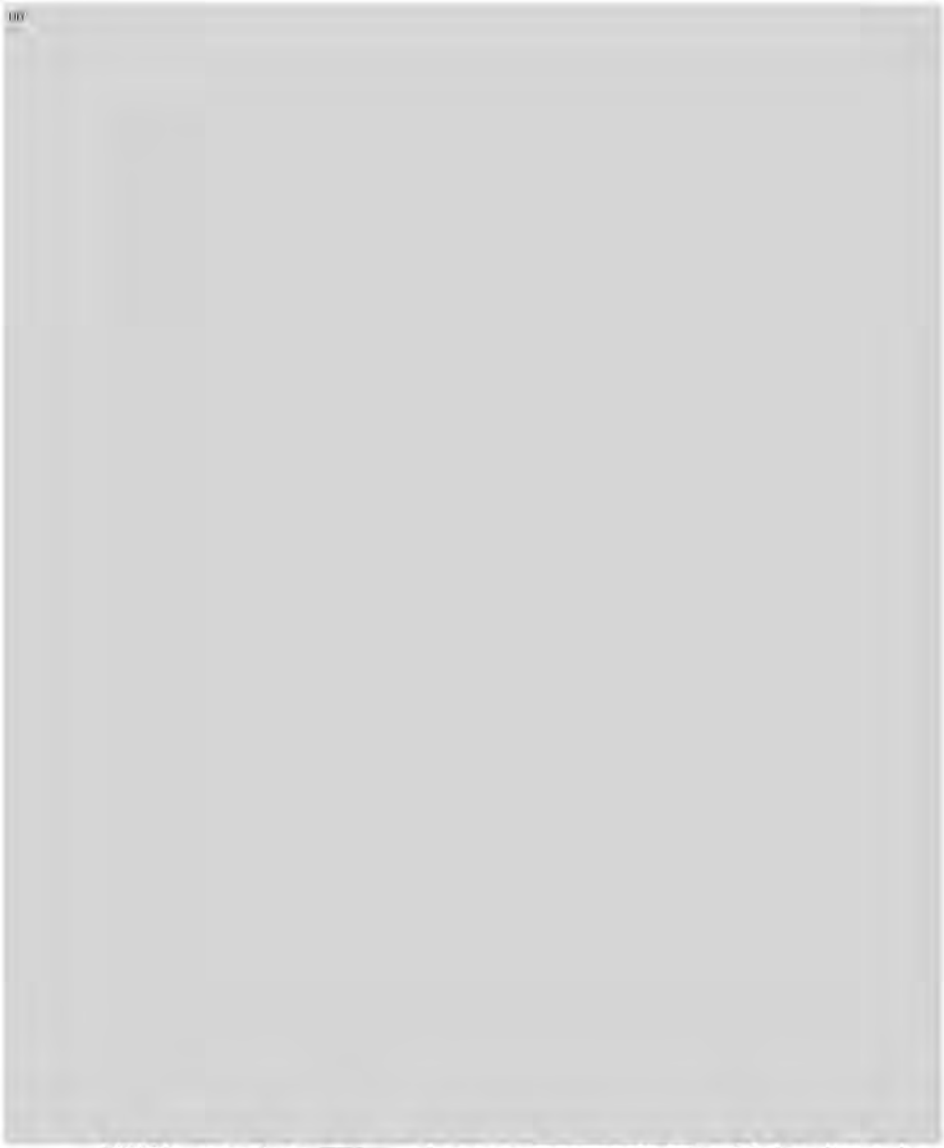

- VTW- procedure: 5.1.2.e stelt concept scopewijziging Molenvlietpark op en verzoekt 5.1.2.e om nadere input..
- De benaming VTW moet aangepast worden, het is een project scope - wijziging afwijking.
- Waterberging is een apart scope wijziging. Conceptovereenkomst staat al tussen Dijkgraaf en onze wethouder. Concept is bijna klaar. 5.1.2.e checkt met 5.1.2.e

| Actie | Datum | Verslag | | |
|---|---|---|---|---|
| BR | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 29 september 2014 |
| **Naam overleg** | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e
5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

13 oktober 2014

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

[redacted]

- Afgesproken dat 5.1.2.e (DSO) in het RBVS van 13 oktober rapporteert hoe zij de €2,5mln bijdrage aan het Molenvlietpark wel/niet kan dekken.

[redacted]

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

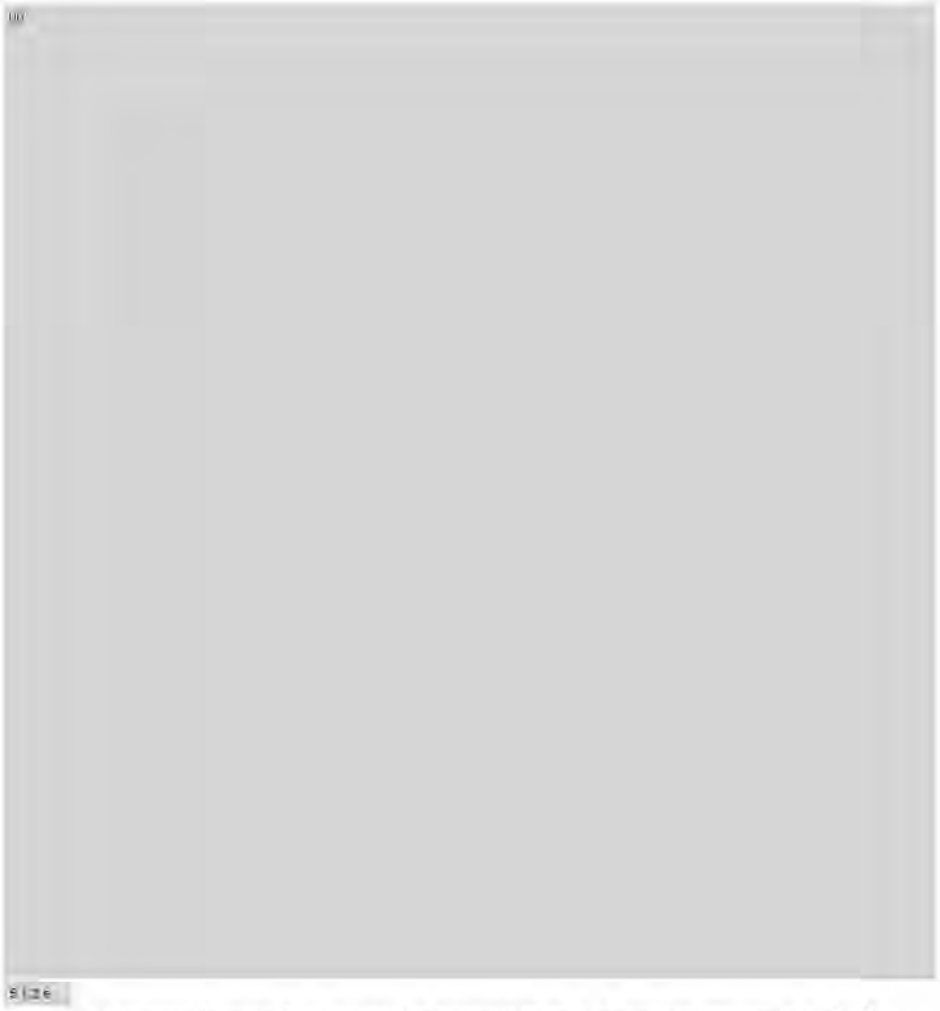

- Dataroom wordt nog verder gevuld met o.a. architectuurvisie, VO Molenvlietpark en DO inpassing.

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |

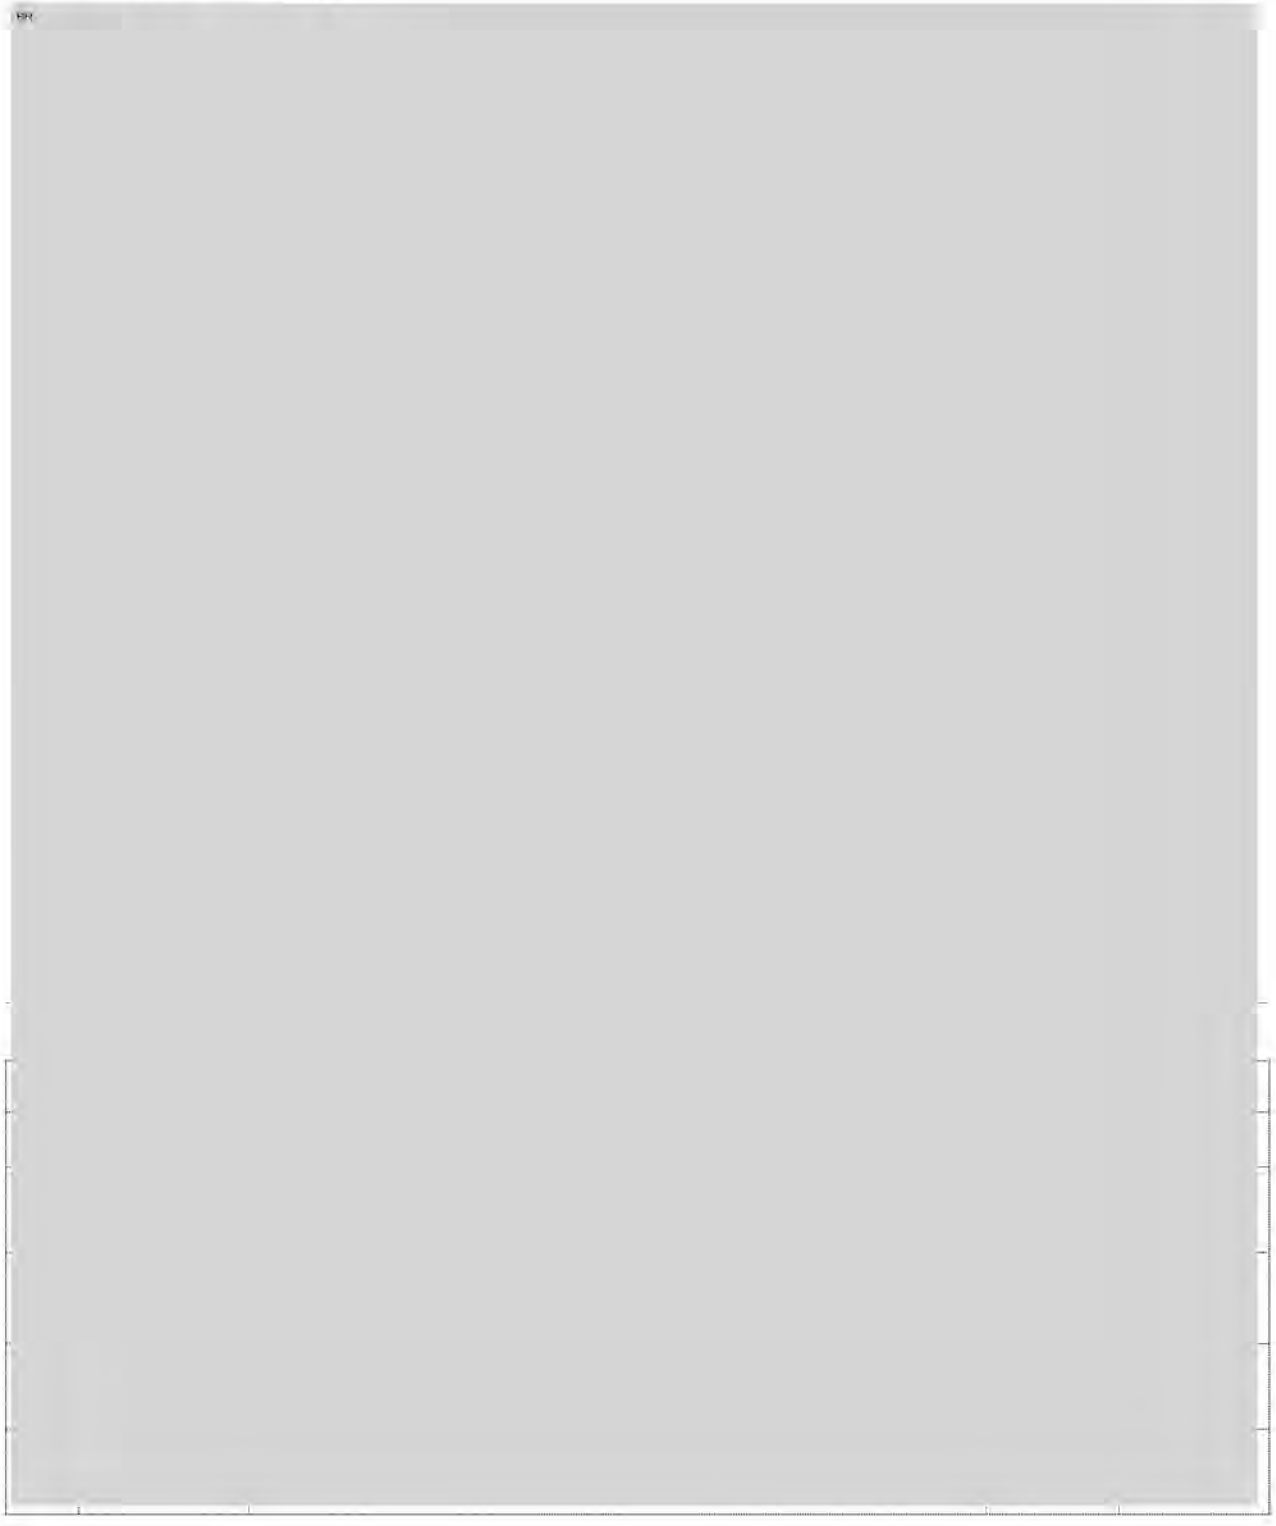

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 13 oktober 2014 |
| **Naam overleg** | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

27 oktober 2014

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

[redacted]

## 3 Terugkoppeling vanuit RBVS-overleg (standaard agendapunt)

Gevraagd: Bespreken

Besproken:

- 5.1.2.e 5.1.2.e heeft nog geen dekkingsvoorstel voor de €2,5mln t.b.v. het Molenvlietpark. Memo volgt in het RBVS van 27okt.

[redacted]

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |

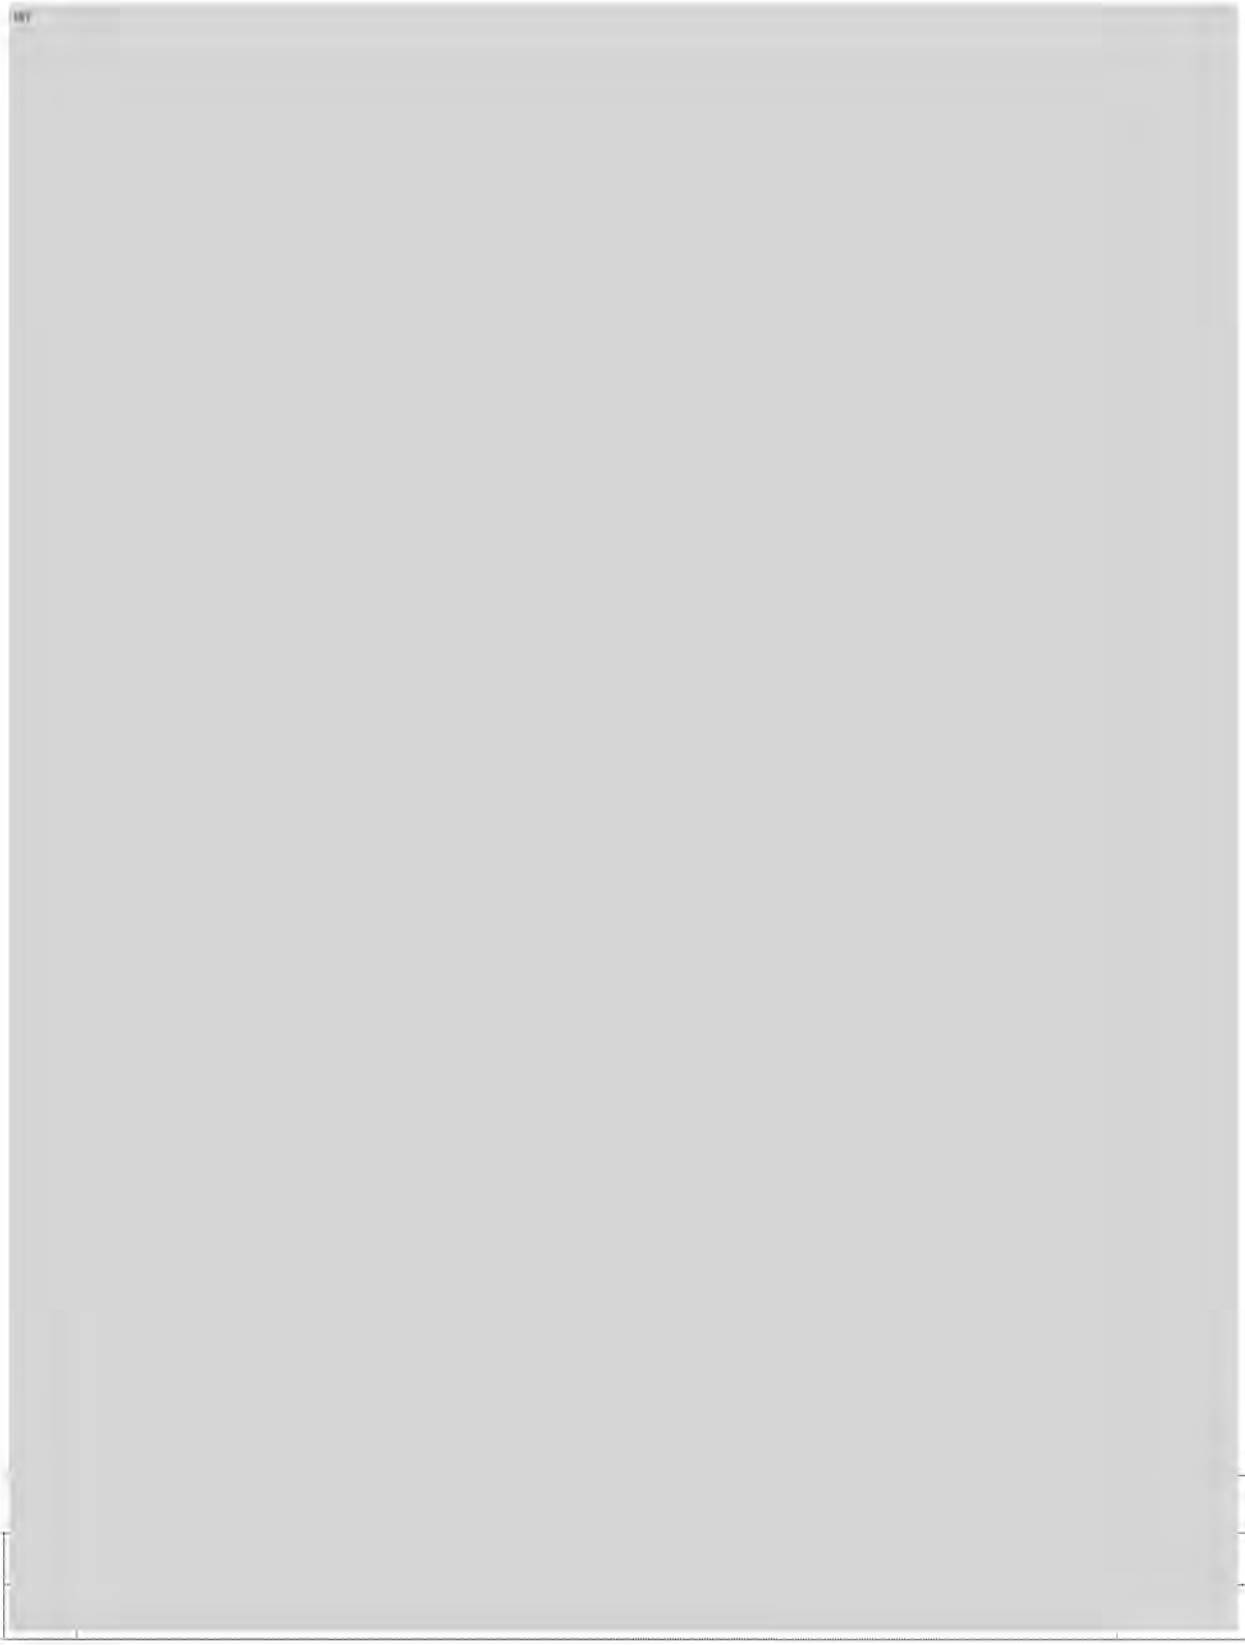

BR

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 27 oktober 2014 |
| **Naam overleg** | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

10 november 2014

Actie Datum Verslag

[redacted]

## 3 Terugkoppeling vanuit RBVS- en Stuurgroep overleg (standaard agendapunt)

Gevraagd: Bespreken

Besproken: o.a. aan bod is gekomen:

- Er is nog geen dekking voor het Molenvlietpark. Voortgangsrapportage n.a.v. het 3e kwartaal is besproken. Afdeling BSD/Financiën heeft gevraagd hoe de dekking van de gemeentelijke indexering is geregeld.

[redacted]

## 5 Teamoverleg 3 november

- Molenvlietpark: toelichting door 5.1.2.e

Actie Datum Verslag

## 6 Rondje langs de velden

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken/melden

512a

- Veel overleg met HHD over het opstellen van de SOK.
- HHD moet nog stuk leveren over waterberging

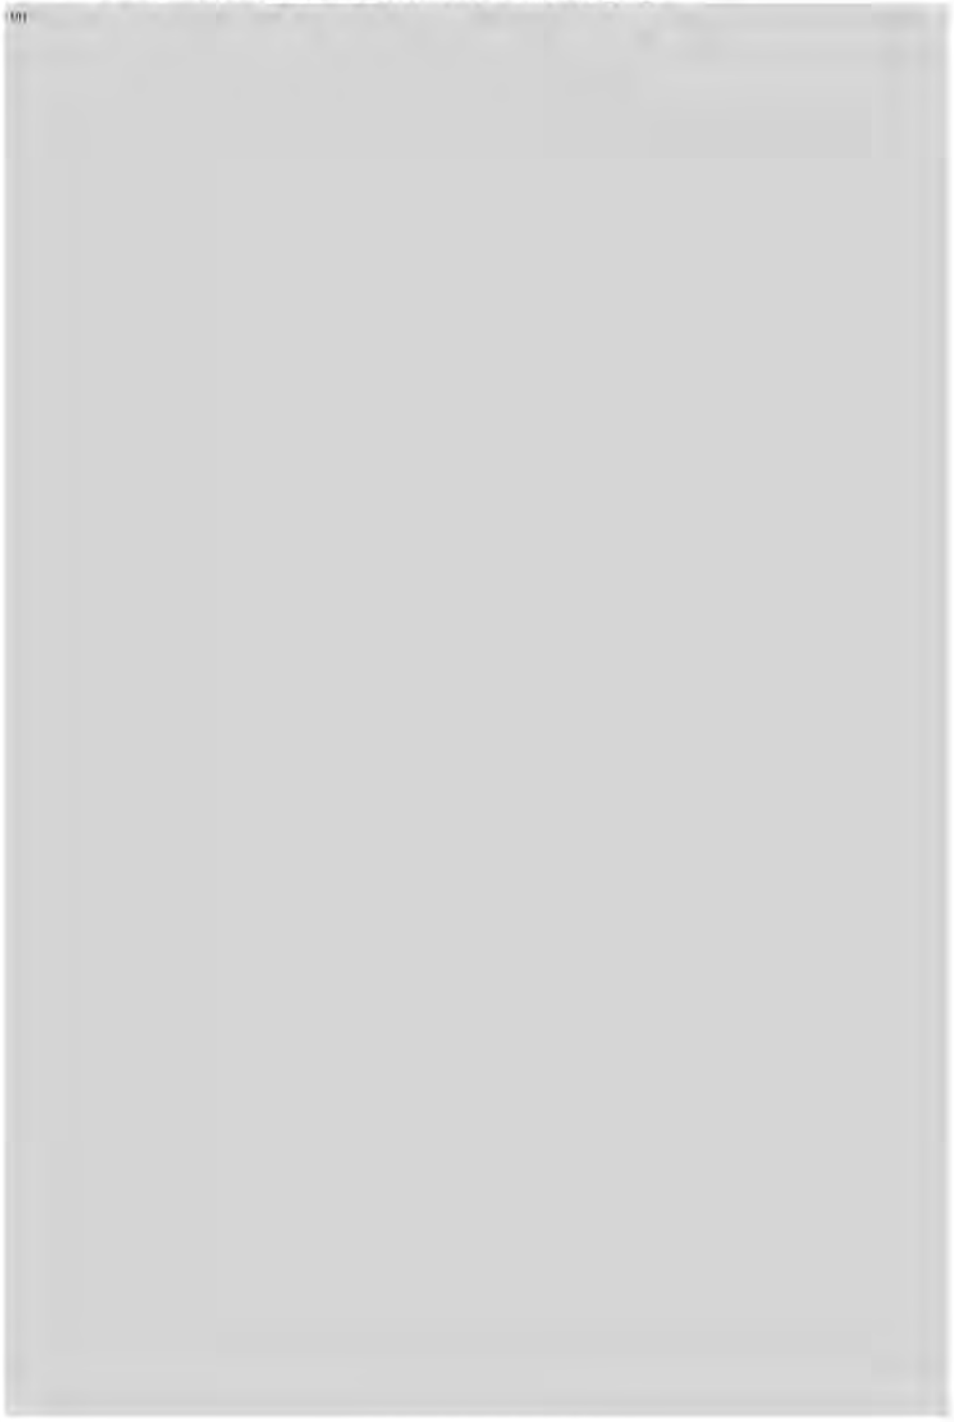

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Actie Datum Verslag

**Actielijst Managementteam Rotterdamsebaan**

| Nr. | MT-datum | Actie | Wie | Gereed |
|---|---|---|---|---|
| | | BR | | |
| 5 | 27 okt 2014 | 5.1.2.e stelt memo op met antwoord naar 5.1.2.e en 5.1.2.e (BSD/Financiën) t.a.v. hoe de dekking van de gemeentelijke indexering is geregeld. Het memo wordt aan hen gemaild en behandeld in het Stuurgroep van 8 december | 5.1.2.e | 20 nov |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 24 november 2014 |
| **Naam overleg** | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

8 december 2014

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

[redacted]

## 3 Terugkoppeling vanuit RBVS- en Stuurgroep overleg (standaard agendapunt)

Gevraagd: Bespreken

Besloten:: VO Molenvlietpark vastgesteld.

[redacted]

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

[redacted]

in

## 8 Rondje langs de velden

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken/melden

[redacted]

- Overeenstemming met Dijkgraaf bereikt, samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) akkoord. Gaat mee ter bespreking in college van 2 december

[redacted]

Actie Datum Verslag



## Actielijst Managementteam Rotterdamsebaan

| Nr. | MT-datum | Actie | Wie | Gereed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 8 december 2014 |
| Naam overleg | Managementteam Rotterdamsebaan |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e en 5.1.2.e

Afwezig met bericht:

Kopieën aan:

Team Roba

Ontvangen stukken:

Data volgende vergaderingen:

22 december 2014

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

BR

## 3 Terugkoppeling vanuit RBVS-overleg

Gevraagd: bespreken

BR

- Aan de orde is geweest: Molenvlietpark, subsidieaanvraag.

BR

## 4 Procedure college- en raadsstukken

- Dit agendapunt is opgevoerd om kennis te geven over de te ondernemen stappen bij collegebesluiten. Sinds de vorming van het nieuwe college, moet bestuursdienst ook standaard paraferen voordat iets naar de wethouder gaat. Dit hebben we weer ervaren met de stukken voor het Molenvlietpark.

BR

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |
| | | [redacted] |

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |
| | | [redacted] |

()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 12 januari 2015>> |

Naam overleg: Managementteam Rotterdamsebaan

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e en 5.1.2.e

Afwezig met bericht:

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

2 februari 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

BR

Actie Datum Verslag

[redacted]

## 6 Ambtelijk IBO

Gevraagd: Agendapunten inventariseren.
Besloten: Agenderen:

- Stand van zaken Rotterdamsebaan (o.a. Molenvlietpark en conditionering, schadebureau, hoofdlijnenplanning);

[redacted]

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |
| | | [redacted] |
| | | - College heeft op 16 dec ingestemd met de VO Molenvlietpark en SOK met Hoogheemraadschap. 28 januari volgt de behandeling in de raadscommissie en naar verwachting 5 februari in de gemeenteraad. |
| | | [redacted] |

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |
| | | [redacted] |

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr16

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 9 februari 2015 |
| Naam overleg | Managementteam Rotterdamsebaan |

Aanwezig:

5.1.2.e en

5.1.2.e en 5.1.2.e (presentatie financiële risicoanalyse)

Afwezig met bericht:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

24 februari 2015

**Actie Datum Verslag**

BR

- 5.1.2.e n.a.v. het verslag: raadsvergadering over Molenvlietpark is verschoven naar 5 maart. Ondertekenen SOK met Delfland is derhalve verschoven naar 11 maart.

Besloten: Vastgesteld

BR

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |

Actie Datum Verslag

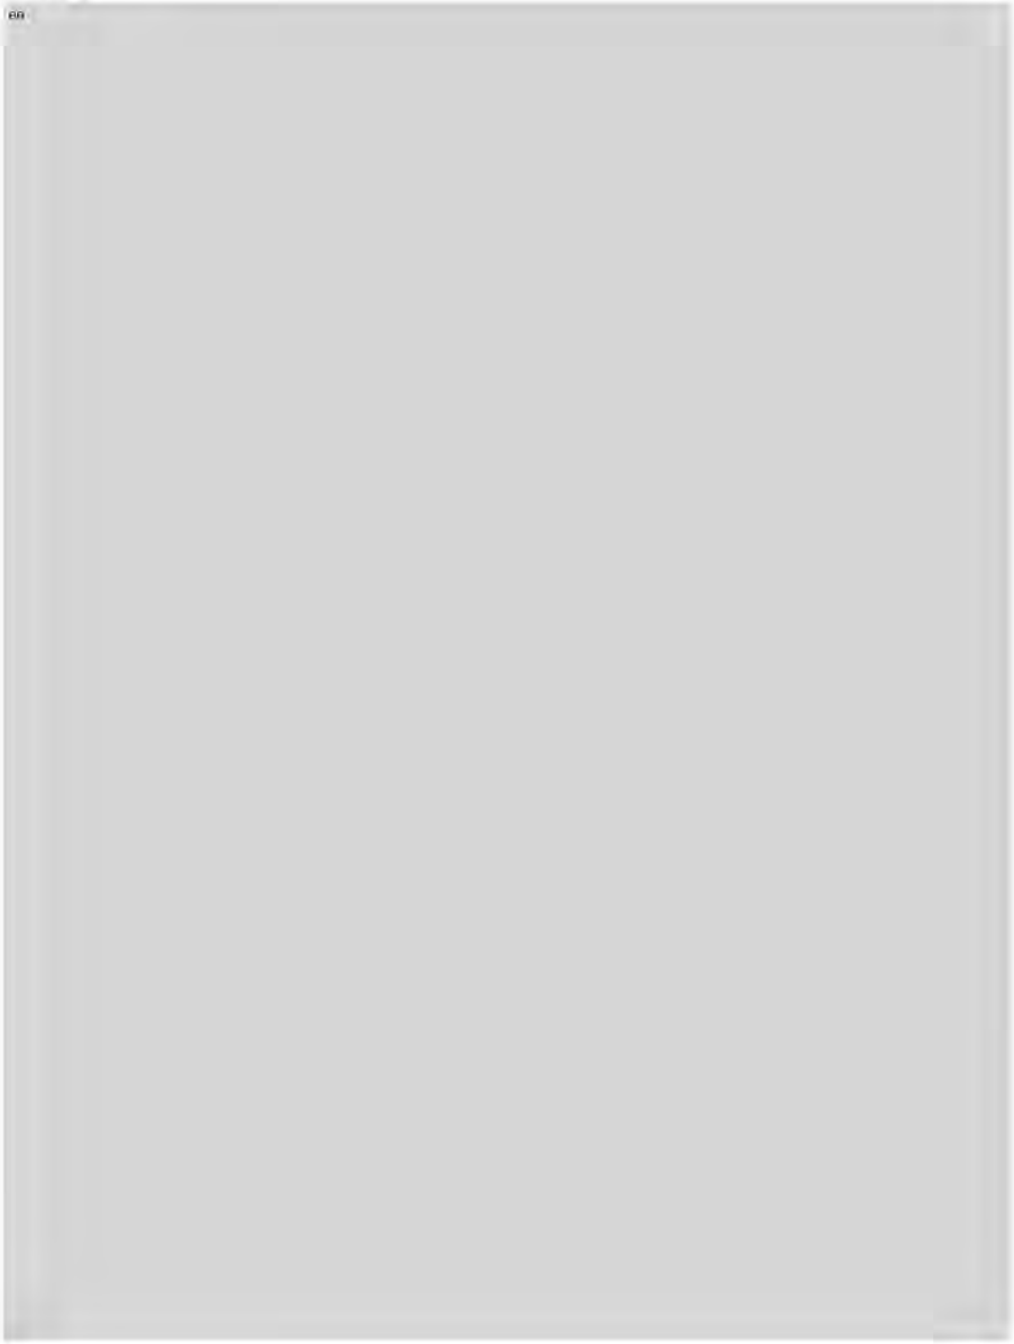

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr17

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 9 maart 2015 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

en 5.1.2.e

Afwezig met bericht:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

23 maart 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|
| | | [redacted] |

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

[redacted]

## 6 Rondje langs de velden

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken/melden

[redacted]

- 5 maart is raad akkoord gegaan met komst Molenvlietpark incl. waterberging. Nu kunnen onderhandelingen met [redacted] echt starten t.a.v. de grondverwerving en inpassing. De SOK met Delfland wordt woensdagmiddag ondertekend.

[redacted]

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |
| | | [redacted] |

Docnr18

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 23 maart 2015 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:
5.1.2.e

Afwezig met bericht:
5.1.2.e

Kopieën aan:
Team Roba

Data volgende vergaderingen:
7 april 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

BR

### 3 Verzoek tot wijziging Molenvlietpark en Waterberging

Gevraagd: Bespreken

Besproken:

- Algemeen: naam van het format en deze procedure wijzigen van 'Verzoek tot Wijziging' in 'Verzoek tot Projectmutatie'. Een VtW krijgen we t.z.t. als er tussen OG en ON contractwijzigingen plaatsvinden.
- Voor beide verzoeken tot Projectmutatie worden diverse tekstuele optimalisaties afgesproken.

Besloten:

- Formulieren aanpassen n.a.v. hetgeen besproken. Laten accorderen door de projectleider (5.1.2.e) en laten paraferen door het cluster projectbeheersing (5.1.2.e en 5.1.2.e). Vervolgens ter vaststelling agenderen in eerstvolgende MT, OGON en Stuurgroep.

BR

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |
| | | [redacted] |

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |
| | | [redacted] |

Docnr19

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 7 april 2015 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:
5.1.2.e
5.1.2.e

Afwezig met bericht:
5.1.2.e

Kopieën aan:
Team Roba

Data volgende vergaderingen:
20 april 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

BR

## 2 Verslag vorige keer

Gevraagd: Vaststellen

Besproken:

- 5.1.2.e N.a.v. het verslag: Projectmutaties Molenvlietpark en Calamiteitenberging worden nog intern besproken en aangepast en in MT 20 april geagendeerd t.b.v. vaststelling in OGON 22 april

BR

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

## 4 Rondje langs de velden

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken/melden

5.1.2.e

- Deal met 5.1.2.e bestuurlijk akkoord met HHD. Ambtelijk nog uitwerken waarbij het BTW-aspect nog uitgezocht moet worden aangezien de grond wordt afgewaardeerd i.p.v. aangekocht en wij dus werk (boezemwater en dijk) op grond van derden gaan uitvoeren. Bestuur van HHD zal naar verwachting voor de zomer een definitief besluit nemen omtrent de financiering o.b.v. het uitgewerkte plan.

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|
| | | [redacted] |
| | | - Trekfietstracé wordt omwille van de provinciale subsidie die in 2015 verplicht moet zijn, deels in de Vraagspecificatie meegenomen (maaiveldligging rondom tunnelmond). De brug over de A4, de route langs Stal Meyvliet en ook de waterinlaat naar de calamiteitenberging kunnen t.z.t. o.b.v. bestekken op de markt gezet worden (of meerwerk hoofdaannemer). |
| | | [redacted] |

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |
| | | [redacted] |

Docnr20

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 20 april 2015 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Presentatie: 5.1.2.e en 5.1.2.e

Afwezig met bericht:

Kopieën aan:

Team Roba

Data volgende vergaderingen:

7 mei 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|
| | | DR |

Actie Datum Verslag

**6 Verzoek tot projectmutaties Molenvlietpark**

- Gevraagd: Vaststellen er ter vaststelling naar OGON en Stuurgroep
- Bij het vaststellen van het voorlopig ontwerp Rotterdamsebaan op 17 oktober 2013 heeft de gemeenteraad gevraagd om tegemoet te komen aan een aantal wensen die de omgeving leven en hiertoe een alternatief plan voor de inpassing in de Vlietzone te maken. Dit is uitgewerkt in het voorontwerp Molenvlietpark. Het plan Molenvlietpark wordt toegevoegd aan de scope.
- Besloten: Vastgesteld

**7 Verzoek tot projectmutatie Waterberging**

- Gevraagd: vaststellen en ter vaststelling naar OGON en Stuurgroep
- Het Hoogheemraadschap van Delfland ziet een kans om het gebied rond de Rotterdamsebaan in de Vlietzone als zoekgebied voor een calamiteitenberging voor water vanuit de boezem (de Vliet) te benoemen.
- Besloten: vastgesteld



o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr21

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 11 mei 2015 |

Naam overleg 5.1.2.e

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e en 5.1.2.e

Afwezig met bericht:

Kopieën aan:

Team Rotterdamsebaan

Ontvangen stukken:

Data volgende vergaderingen:

1 juni 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|
| | | BR |

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

HH

5.1.2.e

5.1.2.e

- Overeenkomst bereikt met 5.1.2.e t.b.v. waterinlaat.
- 5.1.2.e heeft gesprek met HHD gehad en eind mei met wethouder Revis en 5.1.2.e over Landgoed Nieuw Vredenoord.
- Bezig met bestemmingsplan Molenvlietpark e.o.. 5.1.2.e en 5.1.2.e zullen vóór 15 juli het ontwerp-bestemmingsplan presenteren aan de omgeving. 24 aug naar college, sept ter inzage legging en okt het besluit.

5.1.2.e

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |

[redacted]

- Organiseren inloopbijeenkomst Molenvlietpark en omgeving.
- Tijdens de burenoverleg is bezwaar aangekondigd tegen de kapvergunning.

[redacted]

Docnr22

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | **3 juni 2015** |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

Afwezig met bericht:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Rotterdamsebaan

Ontvangen stukken:

Data volgende vergaderingen:

15 juni 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

[redacted]

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

- Het college heeft gisteren het bestemmingsplan Molenvlietpark vrijgegeven voor inspraak (12 juni t/m 23 juli). Infoavond op 22 juni.

---

Actie Datum Verslag

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr23

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | **29 juni 2015** |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

Afwezig met bericht:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Rotterdamsebaan

Ontvangen stukken:

Data volgende vergaderingen:

13 juli 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

RR

- Met 5.1.2.e overeenstemming bereikt om een overeenkomst zonder opschortende voorwaarden op te stellen. Deze wordt echter pas ondertekend nadat college akkoord is en de raad is geïnformeerd.
- Met 5.1.2.e is overeenstemming over het geld, maar er moeten

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |

t.a.v. het ontwerp nog vele vragen beantwoord worden.

[redacted]

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |
| | | |

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr24

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | **10 augustus 2015** |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

Afwezig met bericht:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Rotterdamsebaan

Data volgende vergaderingen:

24 augustus 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

5.1.2.e

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

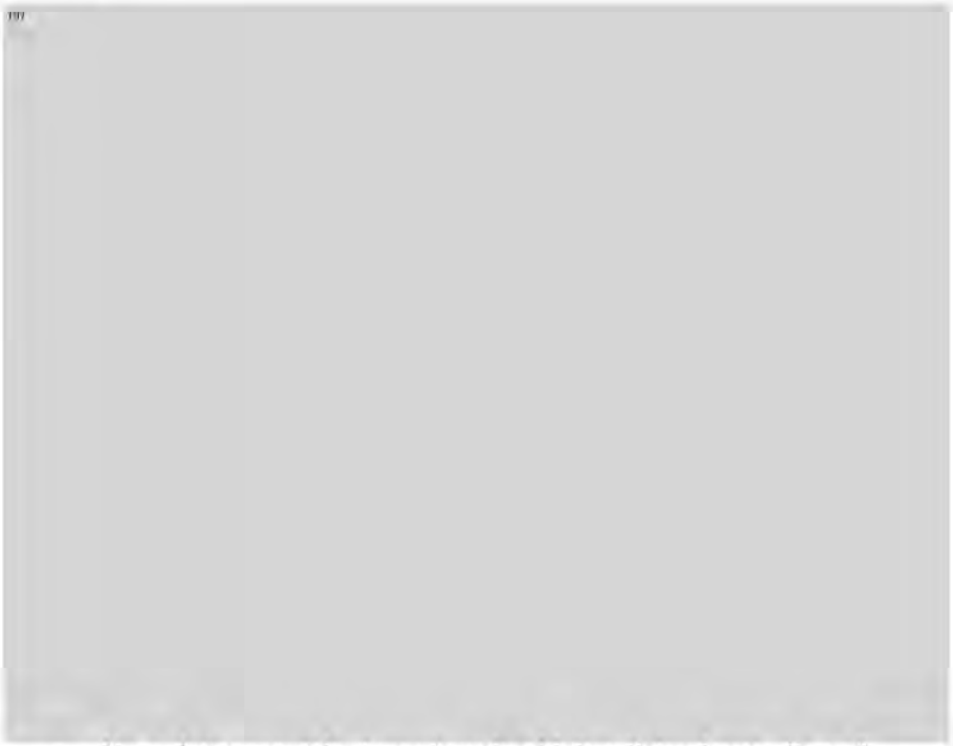

- N.a.v. het concept-bestemmingsplan Molenvlietpark e.o. zijn er 8 zienswijzen ontvangen. Naar verwachting wordt het college op 1 september gevraagd dit plan vast te stellen;

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |



o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr25

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | **24 augustus 2015** |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig met bericht:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Rotterdamsebaan

Data volgende vergaderingen:

7 september 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

BR

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

- 1 of 8 september komt bestemmingsplan Molenvlietpark ter vaststelling in college. Bestemmen van woning stal Meyvliet moet nog opgelost worden.

Actie Datum Verslag



o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

# Agenda Managementteam Rotterdamsebaan

Gemeente Den Haag

Datum + Tijd + Locatie: 7 september 2015, 15:00-16:30 uur, Binckhorstlaan 119, kamer Links
Deelnemers: 5.1.2.e
5.1.2.e
Afwezig: 5.1.2.e

---

[redacted]

## 4 Afspraken komende periode

| Dag | Datum | Vergadering | Aanwezig namens Roba |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |
| Donderdag | 24 sept | Raadscie over Voortgangsbericht + MKBA + bestemmingsplan Molenvlietpark | 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| [redacted] | | | |

## 5 Rondvraag & Sluiting

o-o-o-o-o-o-o

Docnr27

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | **7 september 2015** |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

Afwezig met bericht:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Rotterdamsebaan

Data volgende vergaderingen:

21 september 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

RM

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

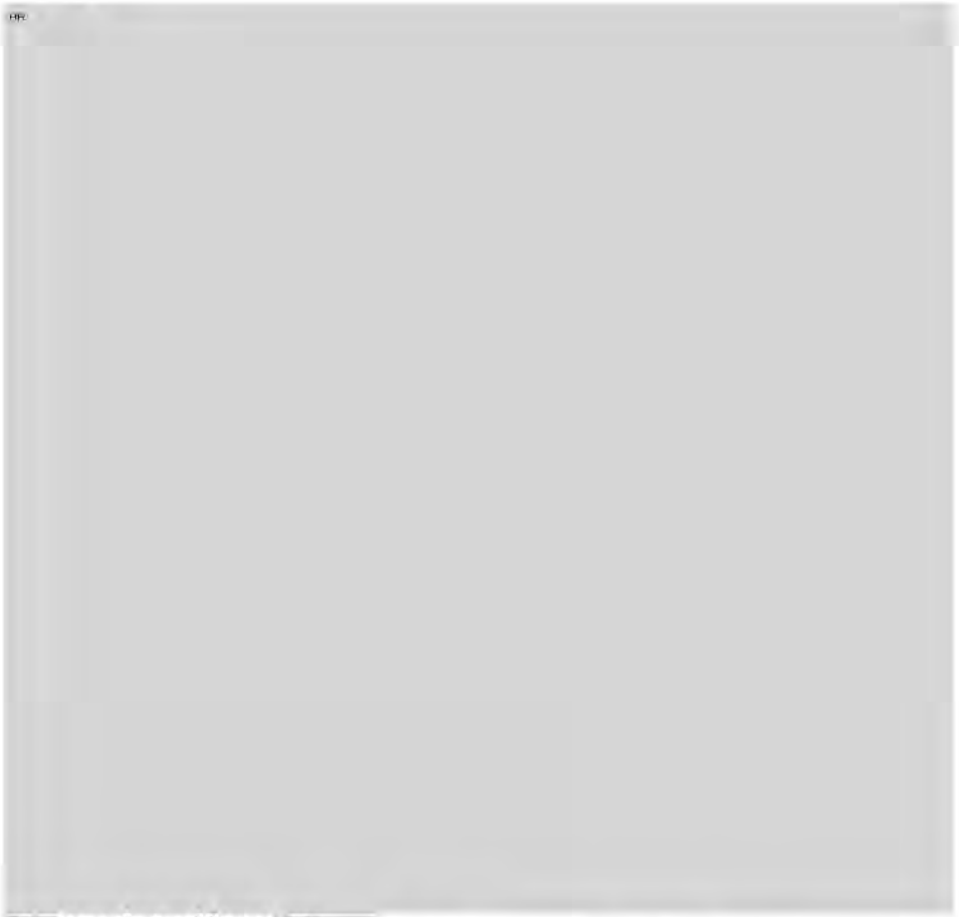

512e over het veld van 512e

- Overeenstemming met stal Meyvliet waarbij ook de woning correct in het bestemmingsplan Molenvlietpark is meegenomen.

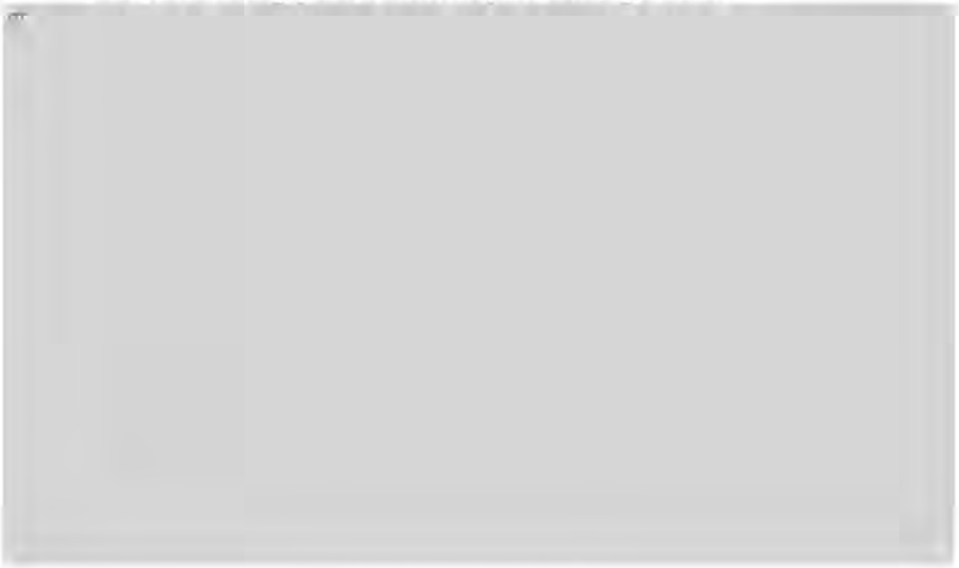

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr28

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | **21 september 2015** |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

Afwezig met bericht:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Rotterdamsebaan

Data volgende vergaderingen:

5 oktober 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|
| | | 5.1.2.e |

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

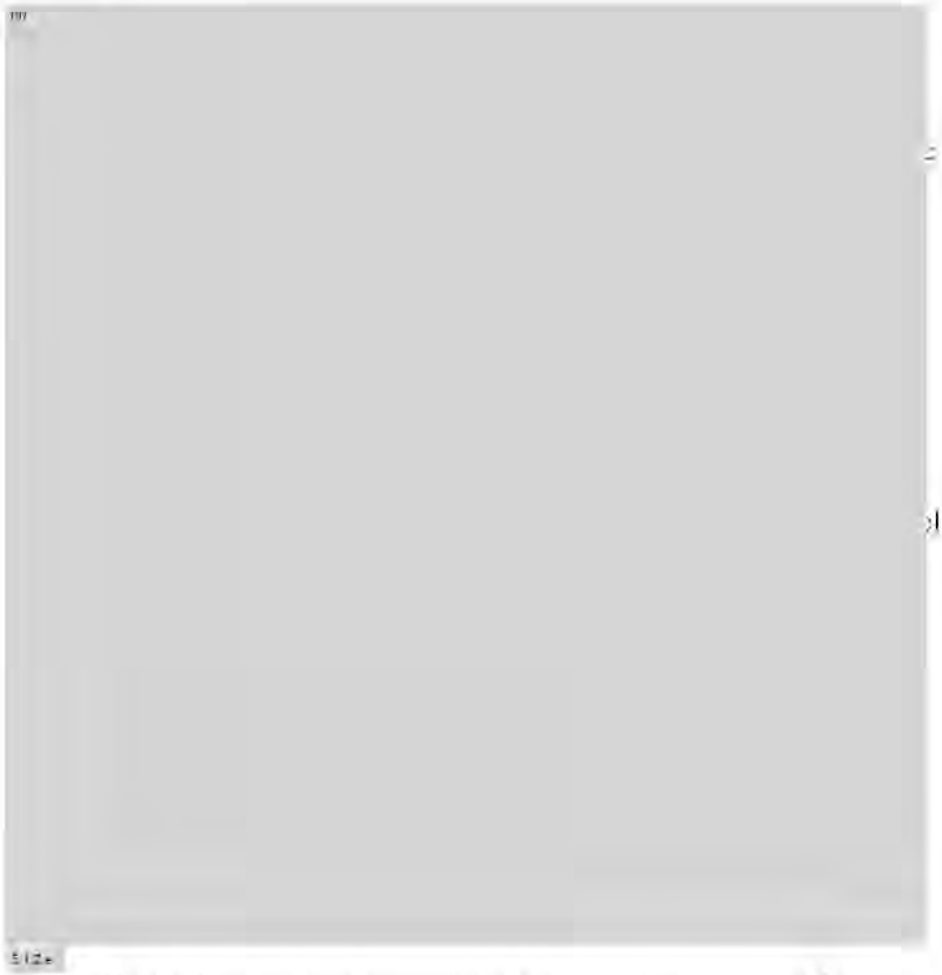

- Donderdagavond raadscommissie Leefomgeving over zowel het bestemmingsplan Molenvlietpark als het 2e + 3e Voortgangsbericht Rotterdamsebaan (incl. Grip op grote projecten).

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr29

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Afdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | **5 oktober 2015** |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig met bericht:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Rotterdamsebaan

Data volgende vergaderingen:

19 oktober 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

## 1 Opening en mededeling

BR

- Bestemmingsplan Molenvlietpark is op 1 oktober door de gemeenteraad vastgesteld.

BR

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

- 5.1.2.e heeft ingesproken bij de raadscommissie a.g.v. het bestemmingsplan Molenvlietpark. Er zal met hen een gesprek aangevraagd worden bij de provincie aangaande hun twee woonhuizen.

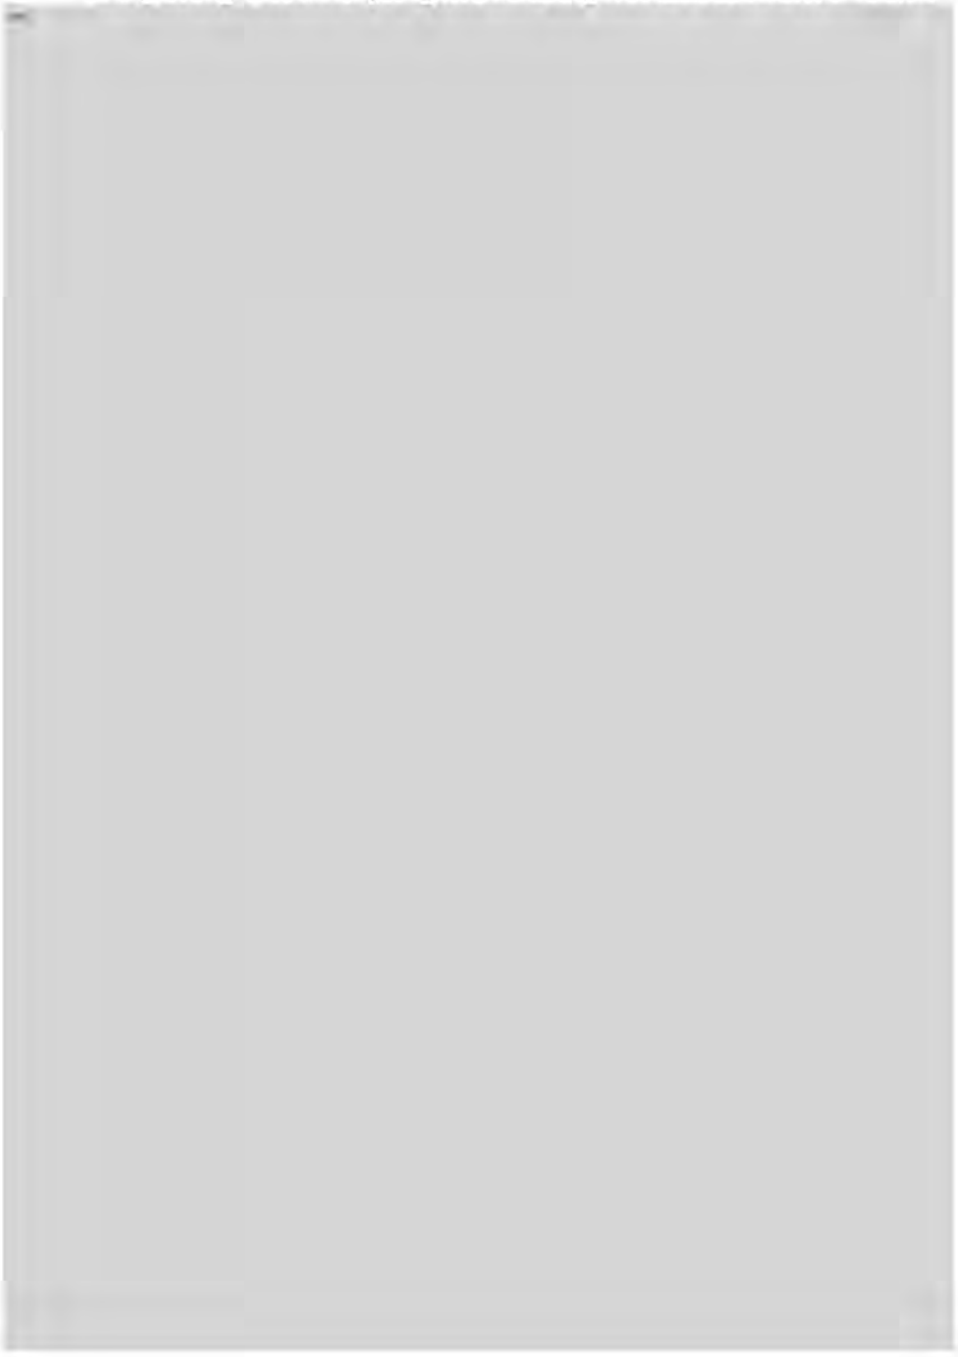

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |
| | | [redacted] |

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr30

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| aAfdeling | Projectorganisatie Rotterdamsebaan |
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | **30 november 2015** |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

Afwezig met bericht:

5.1.2.e

Kopieën aan:

Team Rotterdamsebaan

Data volgende vergaderingen:

14 december 2015

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|
| | | 5.1.2.e |

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|



- De toevoer naar de calamiteitenberging bij 5.1.2.e is niet goed van het Programma van Eisen in het Ontwerp vertaald. Hierdoor is meer grond van 5.1.2.e nodig om aan de benodigde capaciteit van de toevoer te kunnen voldoen. → 5.1.2.e uitgaande tekeningen moeten we in het vervolg beter controleren.

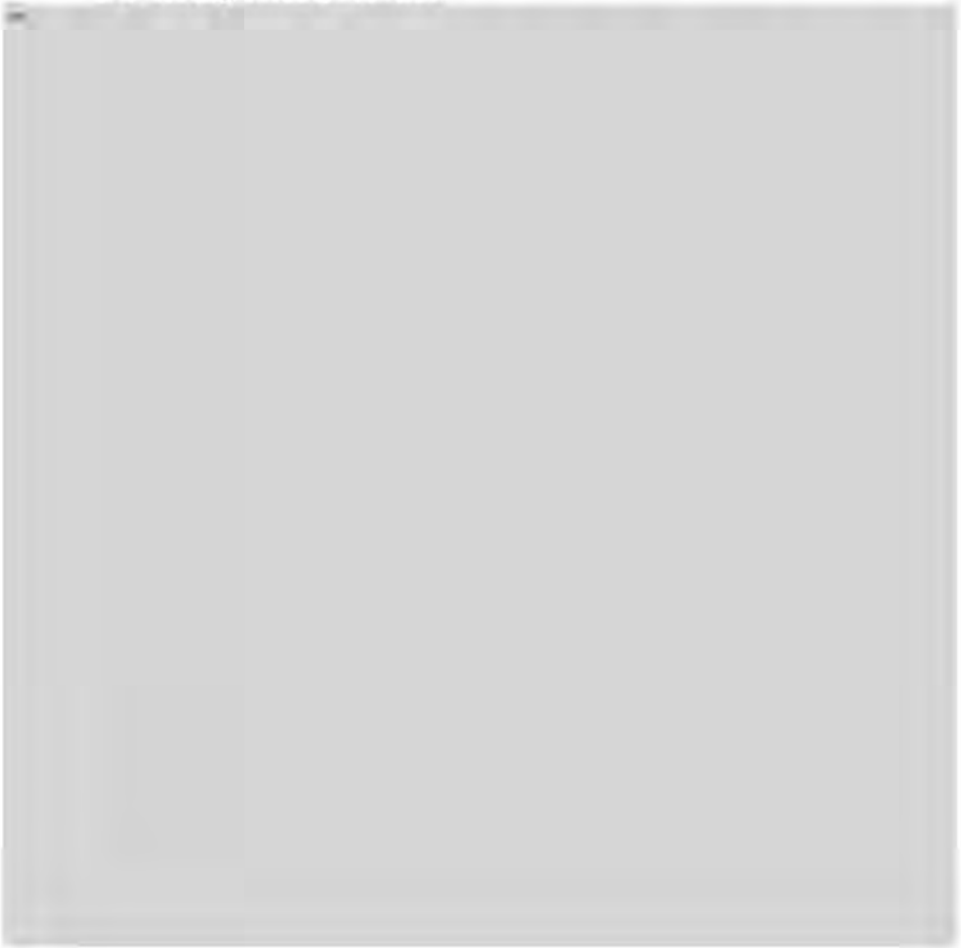

Actie Datum Verslag



o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr31

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | **14 december 2015** |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig met bericht:

5.1.2.e

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

BR

- 5.1.2.e 5.1.2.e heeft bezwaar aangetekend bij Raad van State tegen het bestemmingsplan Molenvlietpark. Zij willen 2 burgerwoningen i.p.v. 2 dienstwoningen. Tegelijkertijd hebben zij aangegeven geen voorlopige voorziening aan te vragen.

BR

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |
| | | [redacted] |

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr32

# Verslag

Gemeente Den Haag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | **6 januari 2016** |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig met bericht:

5.1.2.e

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

BR

| Actie | Datum | Verslag |
|---|---|---|

- Het bestemmingsplan Molenvlietpark is op 4 december in werking getreden. De Raad van State behandeld nog het bezwaar van de familie 5.1.2.e omtrent hun twee (burger? OF bedrijf?) woningen (geen voorlopige voorziening).

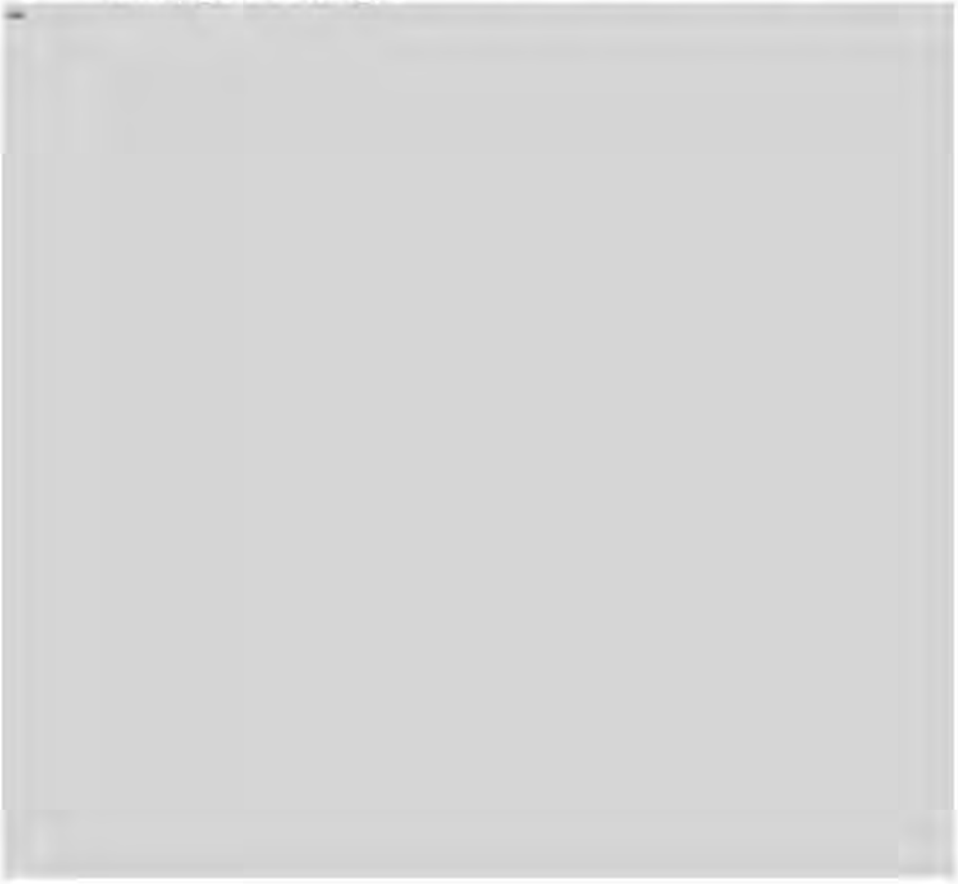

| Actie | Datum | Verslag |
| --- | --- | --- |
| | | [redacted] |

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr33

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 20 januari 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

BR

- Input geleverd aan DSO t.a.v. planning en kostenraming t.b.v. subsidieaanvraag Molenvlietpark bij de Landschapstafel Hof van Delfland van de provincie Zuid Holland. Wij hebben in 2016 duidelijkheid nodig over wel/geen subsidie gezien de noodzakelijke aanbesteding en spoedige uitvoering.

- Gesprekken gevoerd met 5.1.2.e De wateropgave i.r.t. HHD is een hoofdpijndossier. Hierover komt uiteindelijk geen brief van de dijkgraaf aan ons college, maar een addendum op de SOK.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 4 februari 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

---

[redacted]

- De besprekingen met HHD over de waterinlaat vinden inmiddels plaats 'in de geest van de gestelde eisen'. Wel begint duidelijk te worden dat er ca.57.000m3 van de afgesproken 60.000m3 watercapaciteit haalbaar is. Officieel moet CRB de haalbaarheid aantonen, maar dit lijkt een gedeelde verantwoordelijkheid met de projectorganisatie.

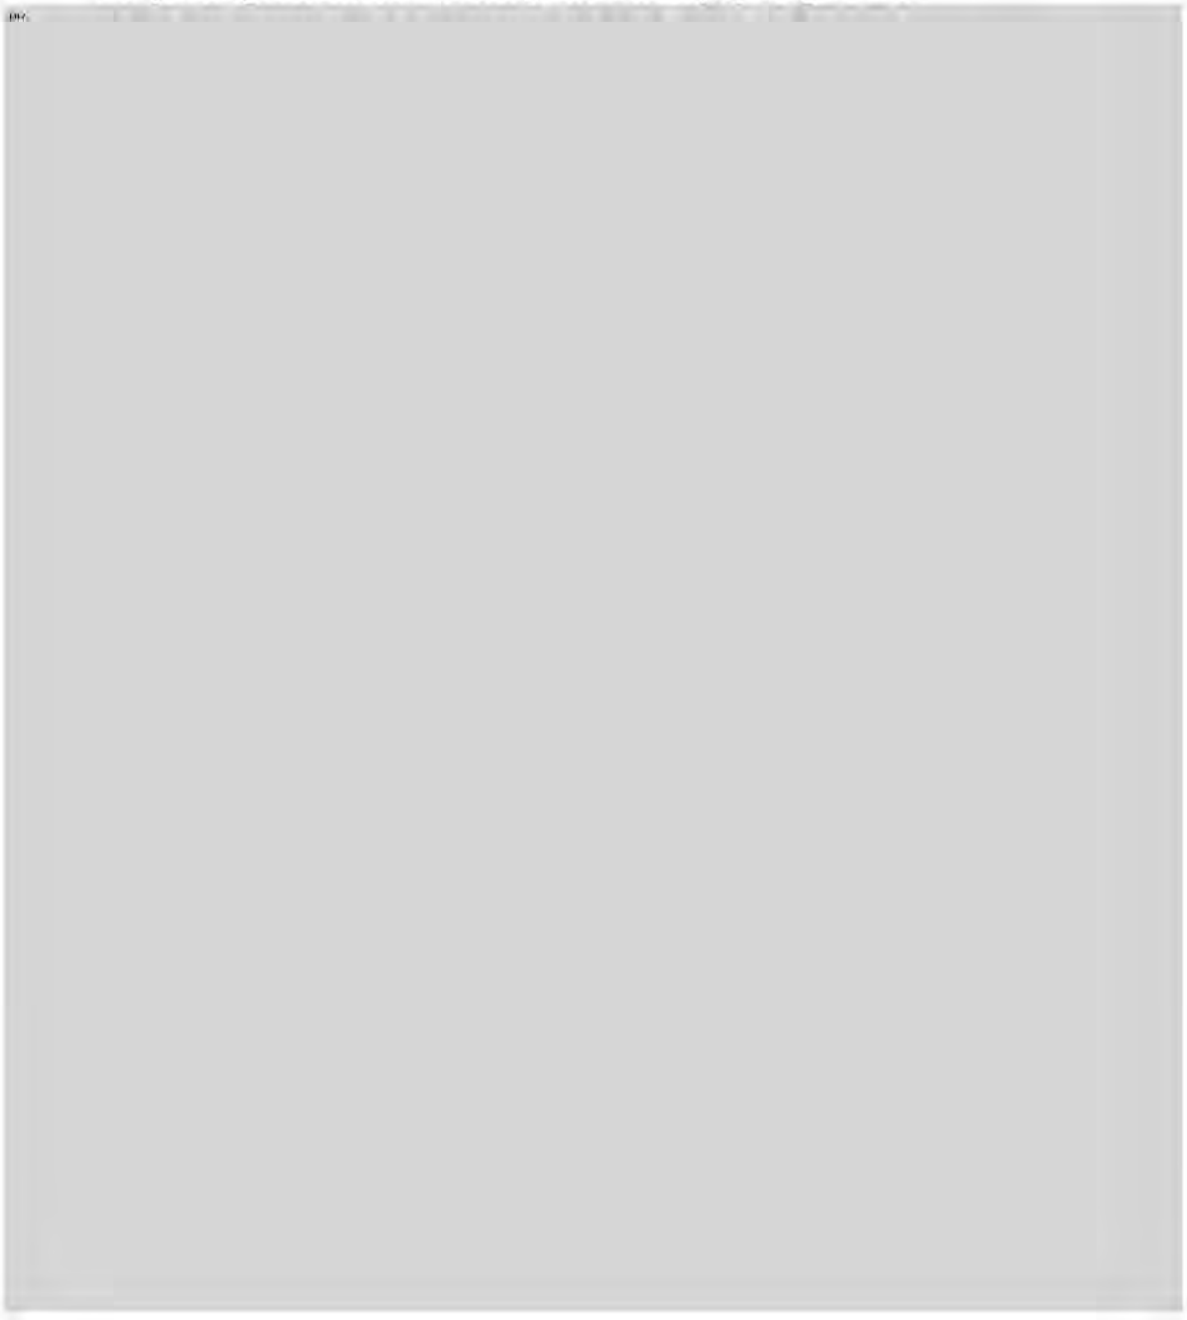

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr35

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 16 maart 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

BR

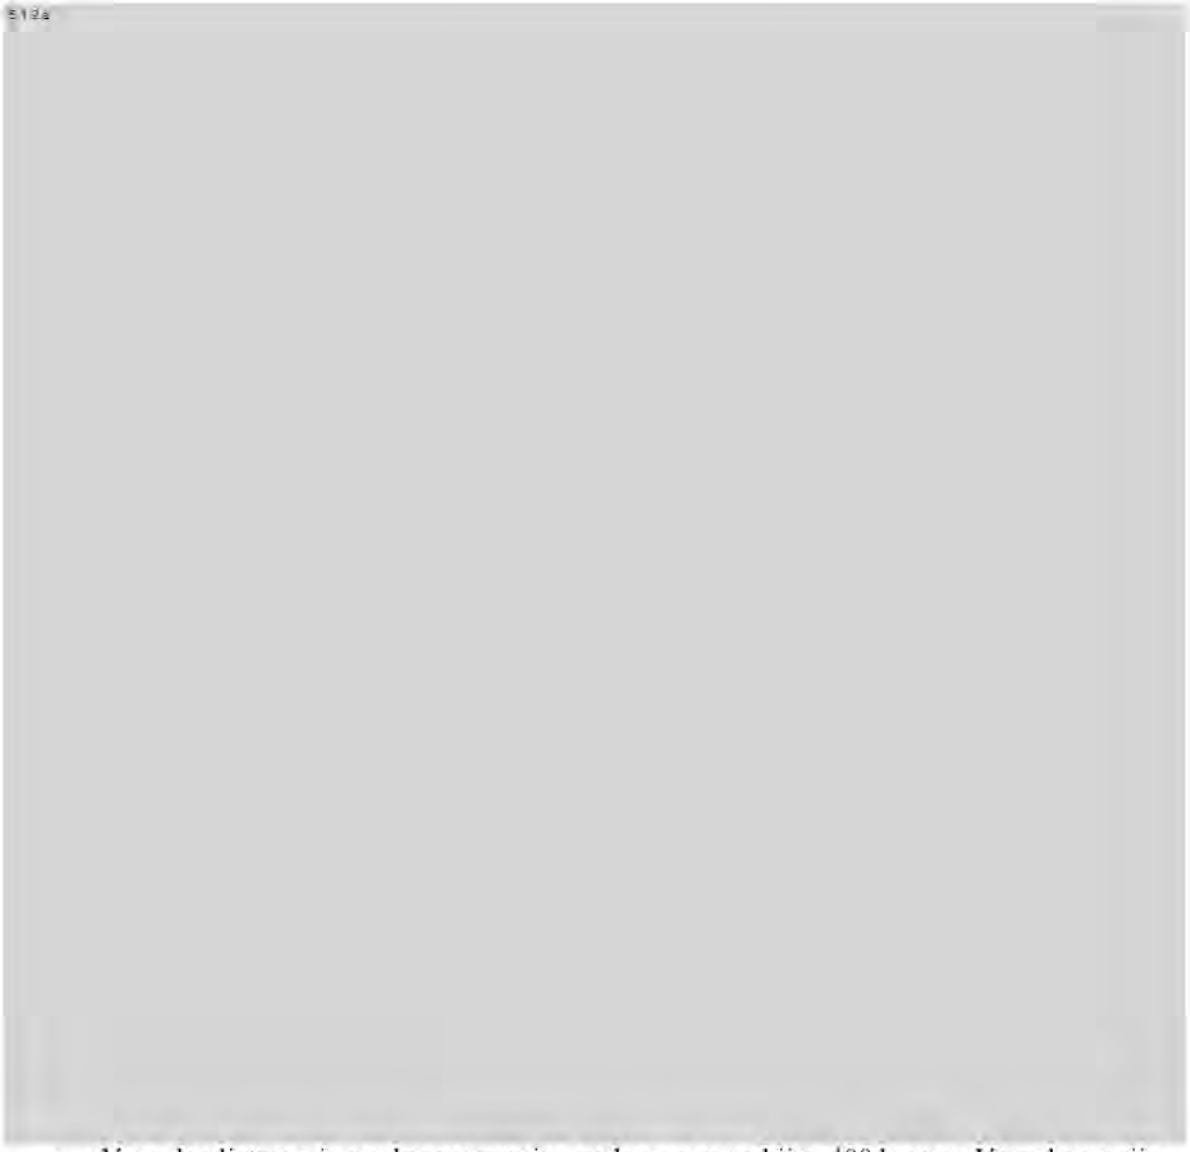

- Voor de vlietzone is een kapvergunning verkregen voor bijna 400 bomen. Vervolgens zijn er daarvan voor het broedseizoen nog bijna 200 gekapt.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 30 maart 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

-

BR

- Discussie met Hoogheemraadschap over 60.000m³ waterberging uit SOK t.o.v. de realiseerbare hoeveelheid.
- Intern verder uitzoeken van de cases watertoevoer Molenvlietpark i.r.t. de planontwikkeling van 5.1.2.e

BR

- [redacted] zal komende periode de mogelijke subsidies voor het Molenvlietpark in de gaten houden bij DSO.

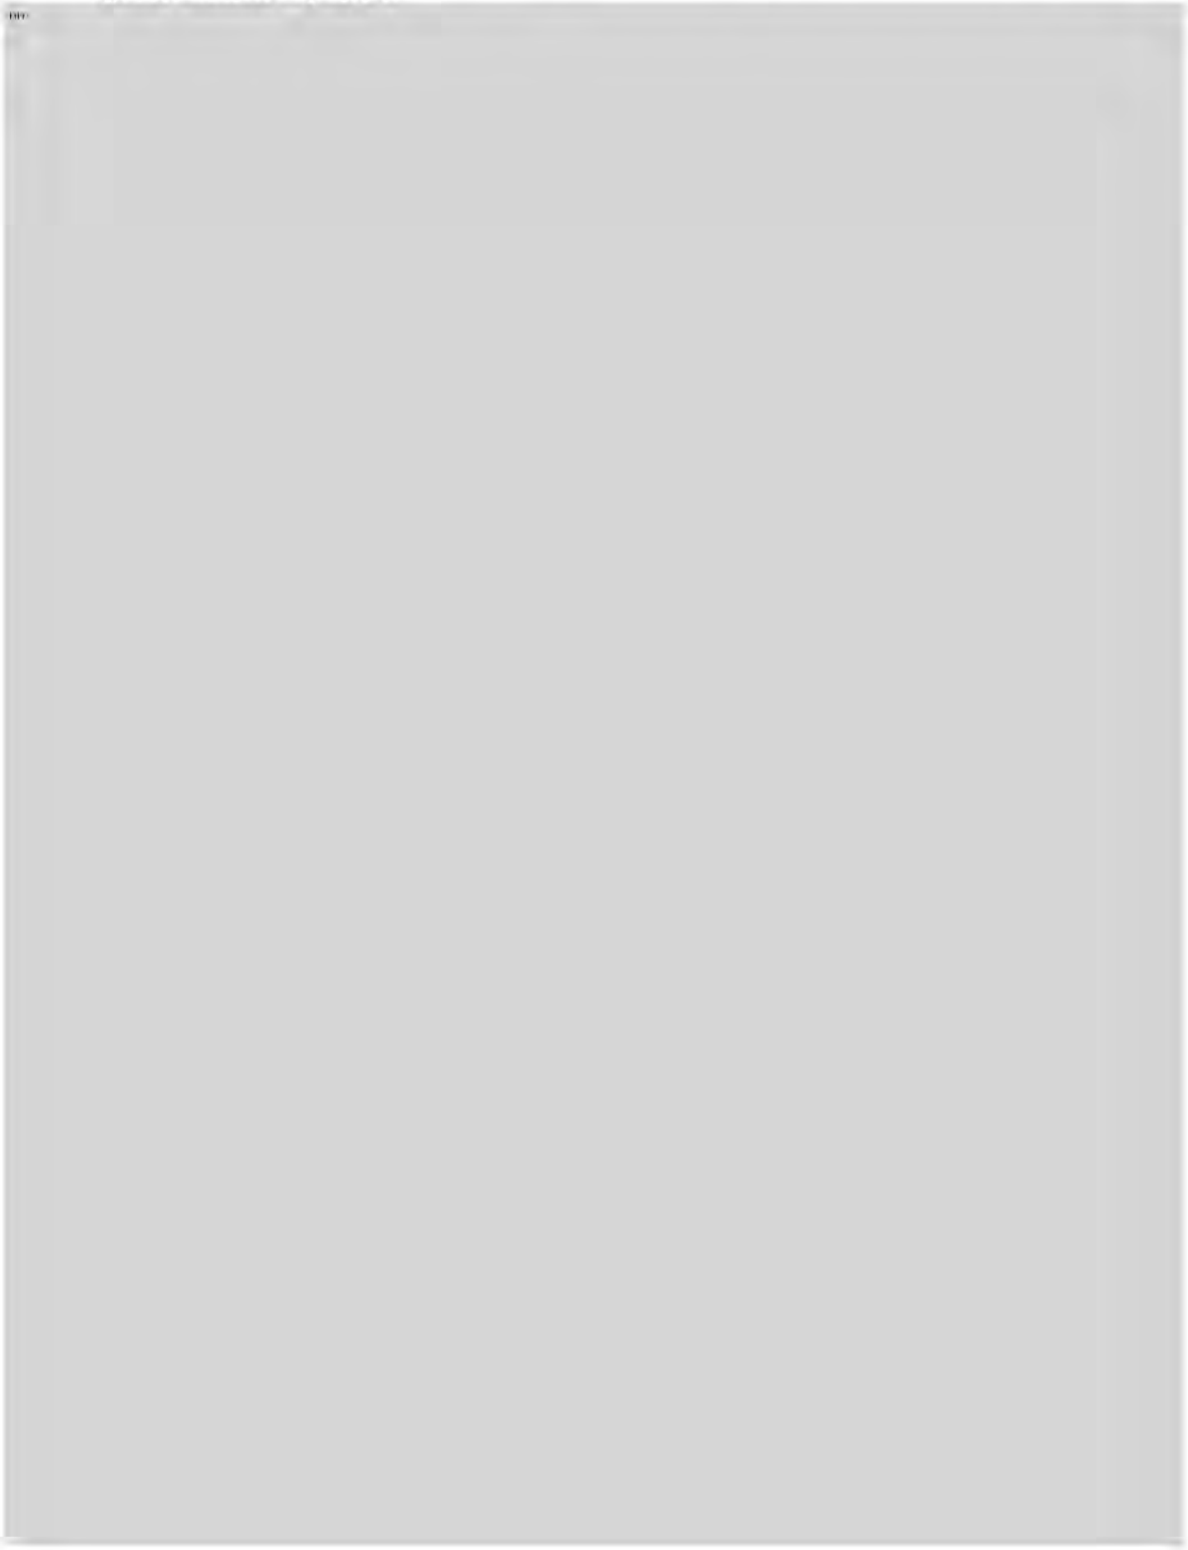

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Docnr37

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 13 april 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

BR

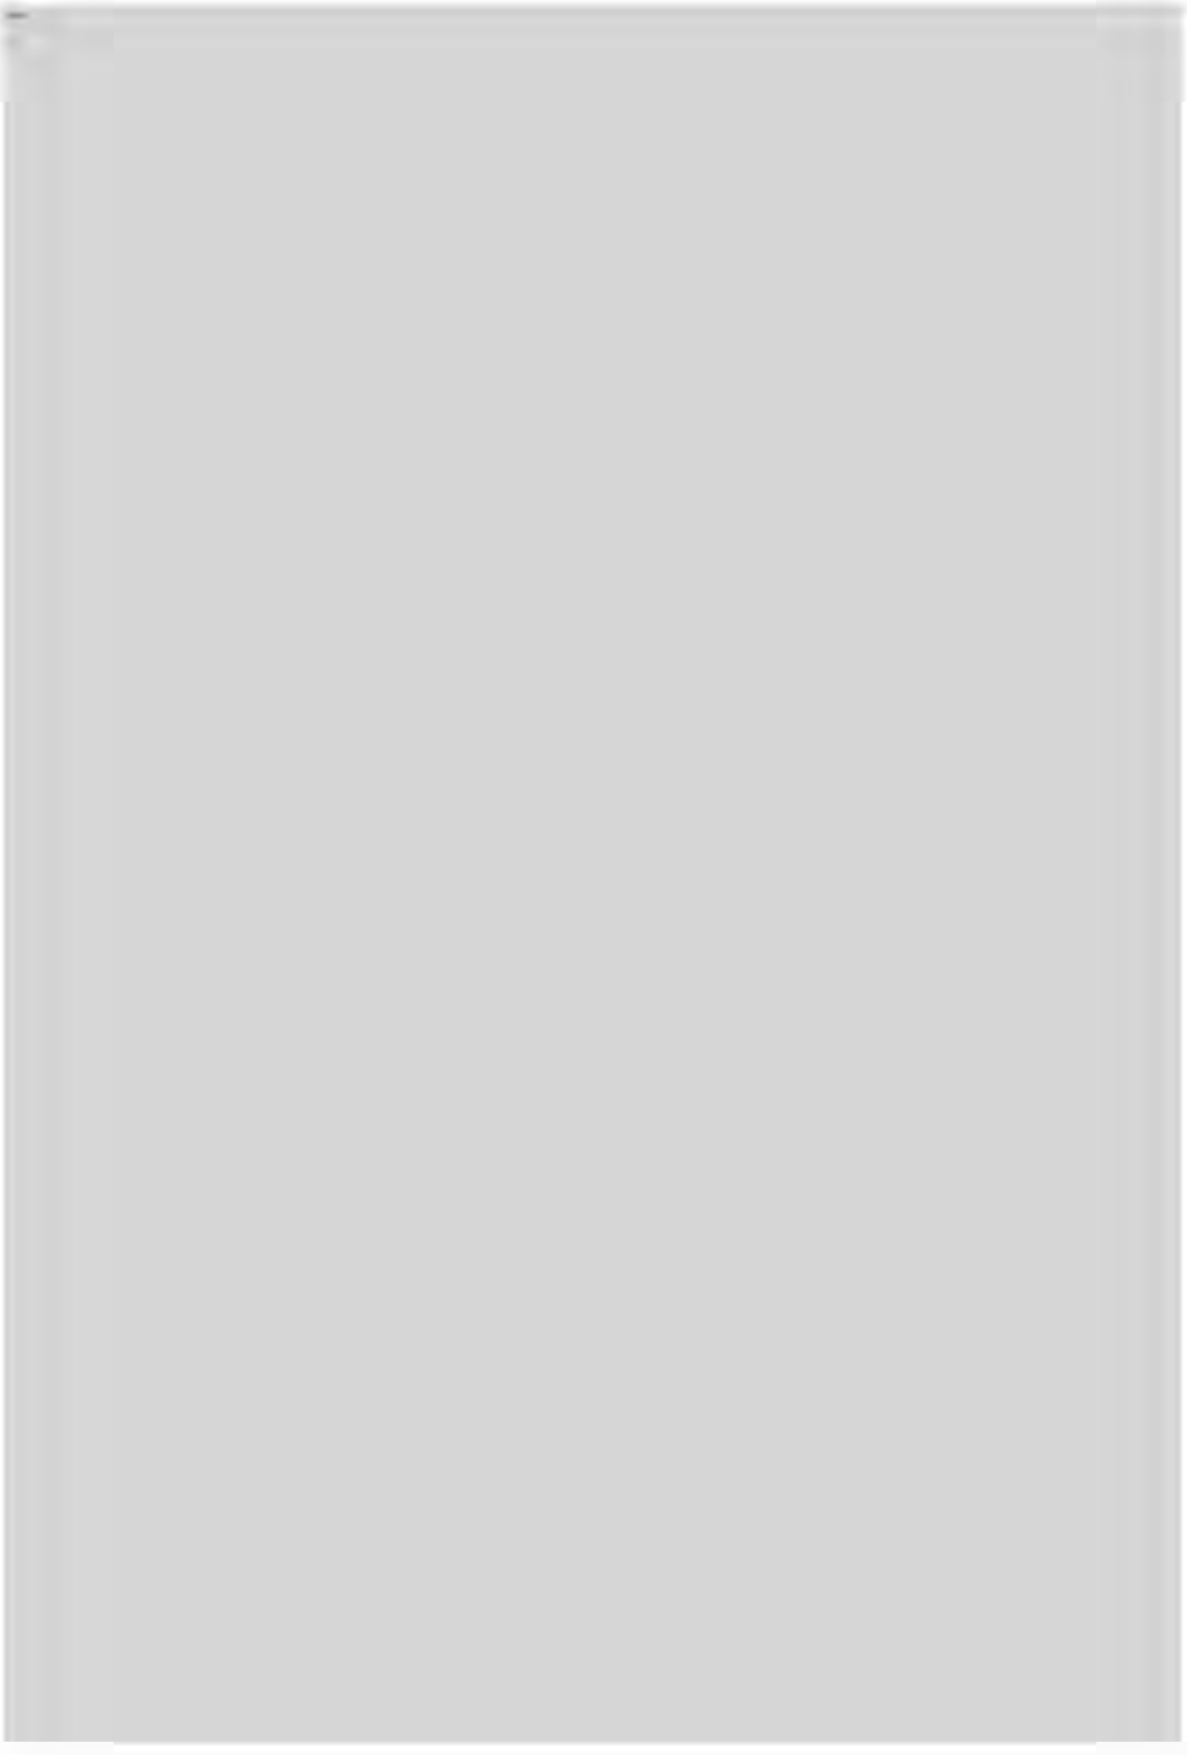

- Bewoners rondom de toekomstige brug van Park Hoornwijck naar Molenvlietpark gesproken. Nog geen overeenstemming, maar gesprek verliep prettig.

- Het aangepaste ontwerp van de waterinlaat bij 5.1.2.e en 5.1.2.e lijkt een beperkte ruimtelijke impact te hebben. 5.1.2.e heeft na de presentatie zijn complimenten uitgesproken. Het aanpassen van de gemaakt concept-afspraken (incl. kosten) volgt nog. Het nieuwe plan komt aan de eisen van Delfland tegemoet.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr38

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 13 april 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

5.1.2.e

- 5.1.2.e zal een brief aan HHD schrijven met daarin o.a. de voorgang van het werk en de gemaakte kosten n.a.v. de SOK. De verenigde vergadering van HHD moet nog een definitief besluit over de kosten nemen. → 5.1.2.e CRB rekent nog aan de (effectieve) waterbergingscapaciteit van het aangepaste plan.

5.1.2.e

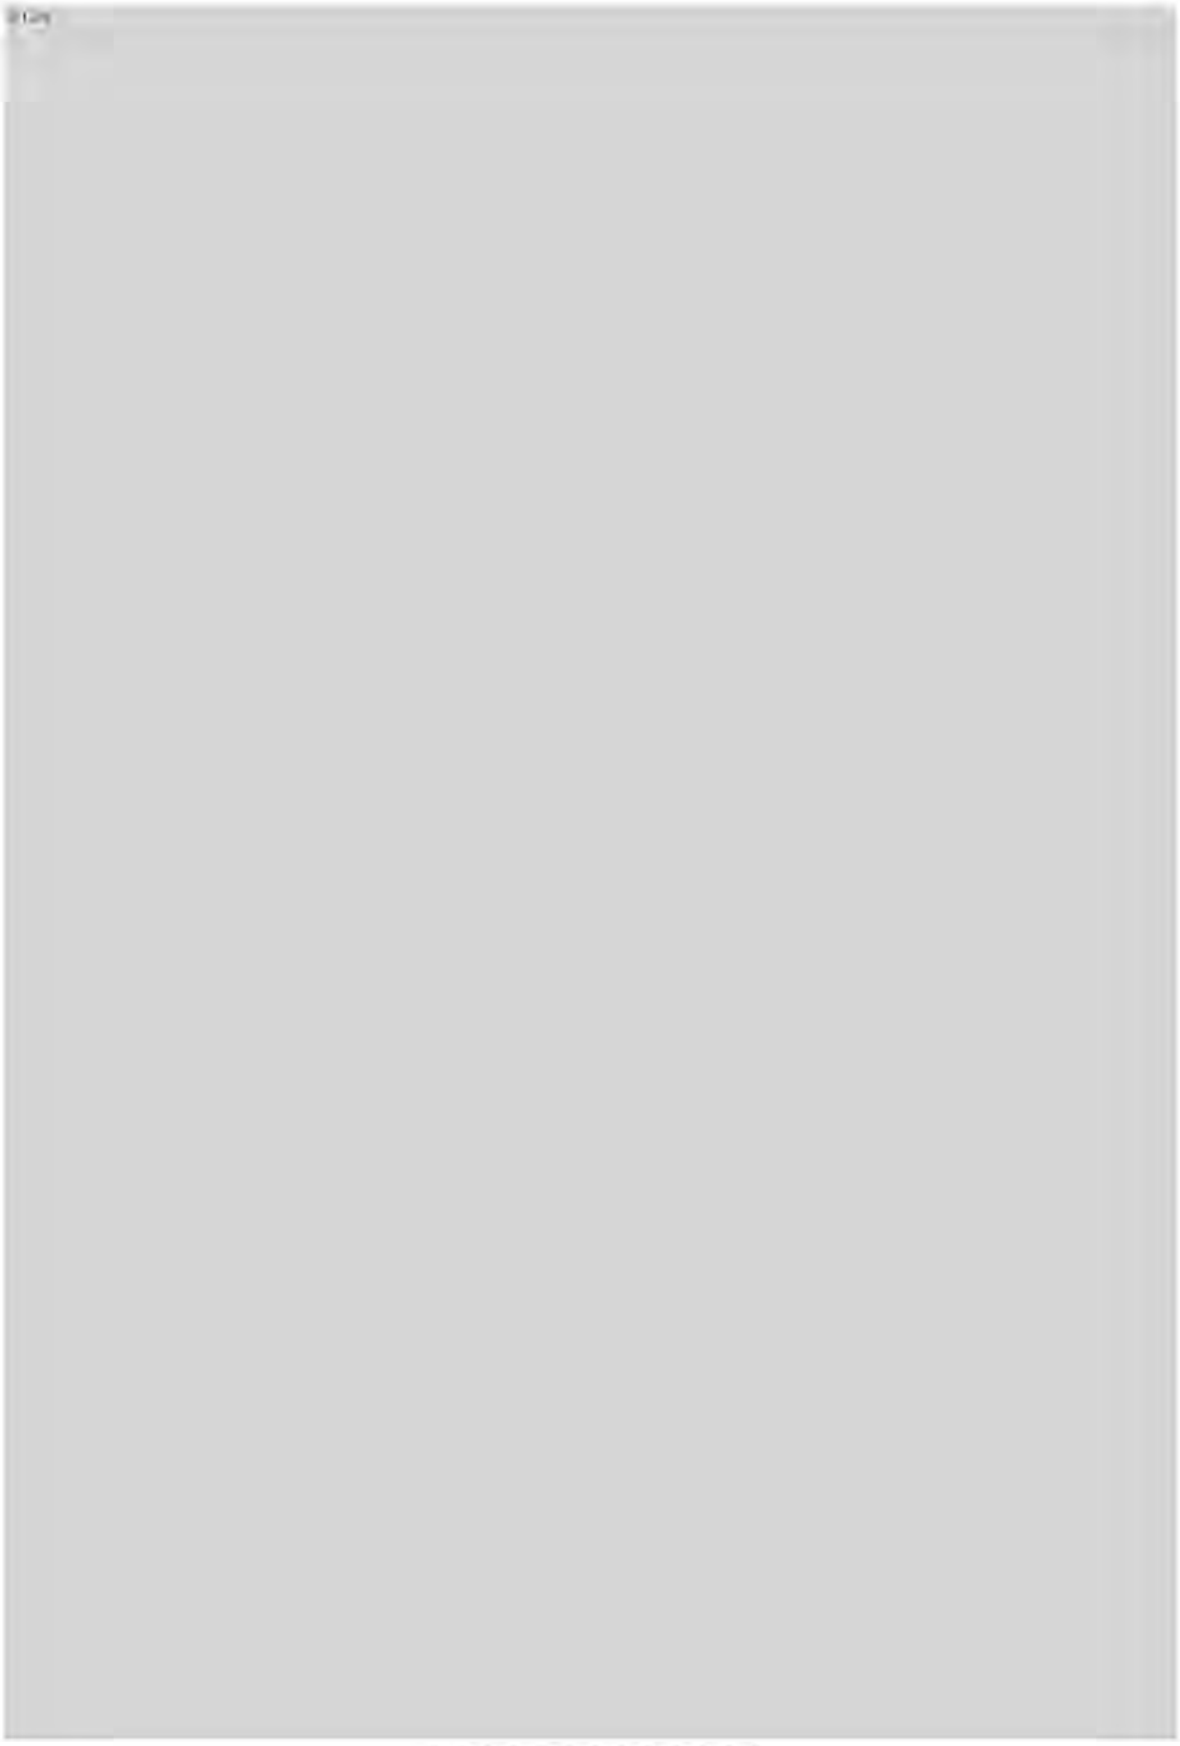

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr39

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 11 mei 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

BR

- Planning viaduct uitwerken i.r.t. realisatie Roba en realisatie maaiveldfietspad.
- Door team-Roba uitzoeken of dit plan past binnen de bestemmingsplannen van Ypenburg, Rotterdamsebaan en Molenvlietpark t.a.v. de bouwhoogtes in (on)mogelijkheden van een binnenplanse afwijking.

BR

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Verslag d.d. | 25 mei 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

---

BR

- Gisteren met 5.1.2.e gesproken over de watertoevoer via zijn perceel. Hijzelf moet nog een keuze maken over de inrichting van de omliggende tuinen. Het toepassen van een duiker is voor hem onbespreekbaar. Formele reactie volgt binnen 2 weken. Uitkomst heeft ook consequenties voor brughoogte bij Molenslootpad.

BR

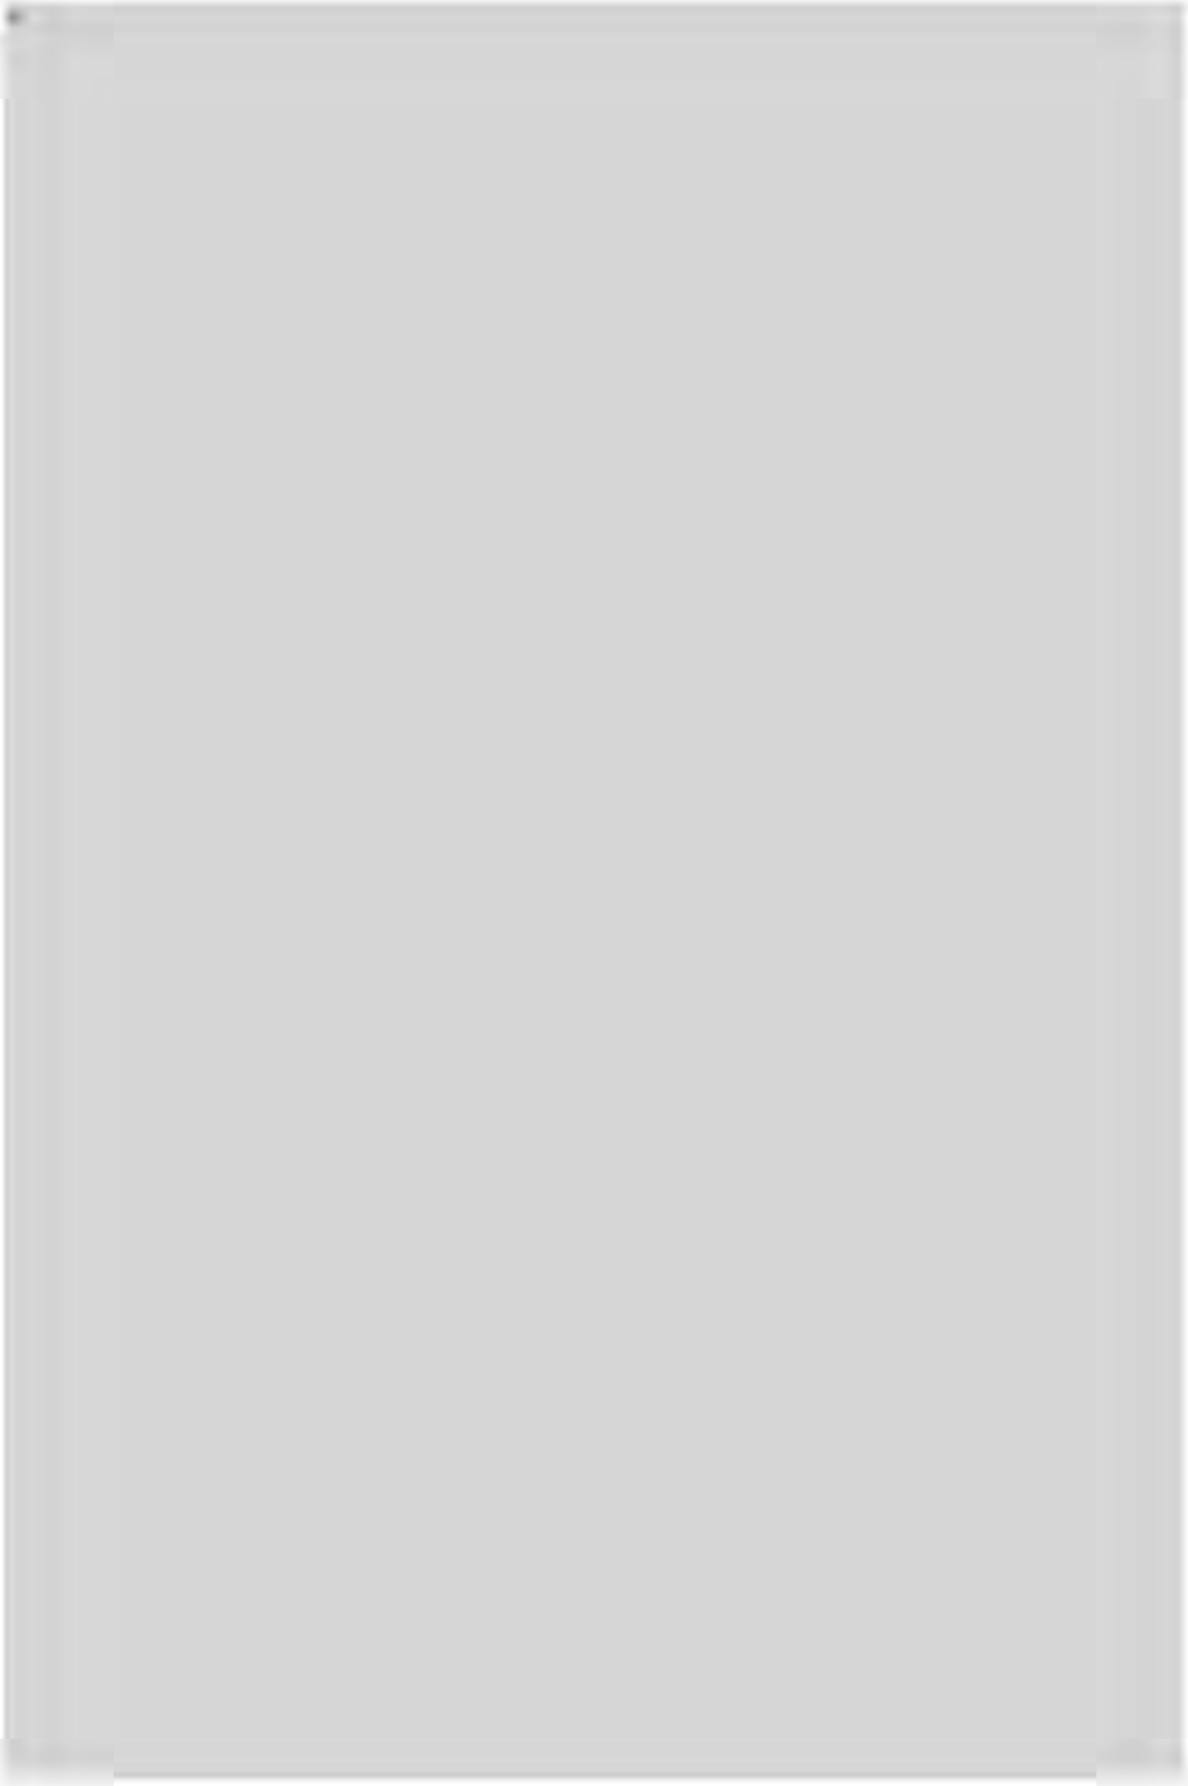

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr41

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 20 juli 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

[redacted]

- Goed overleg geweest met het Hoogheemraadschap. Men is tevreden over de samenwerking en de bergingscapaciteit van 60.000m3 lijkt haalbaar. De onderzoeksresultaten worden afgerond en vastgelegd. Haar bestuur wordt gevraagd de dekking definitief ter beschikking te stellen. Bij de nader uitwerking van de afspraken wordt het BTW-regime nog beschouwt.
- 5.1.2.e gaat het plan/voorstel van Roba beschouwen i.r.t. zijn eigen vastgoedontwikkeling. We zijn nog in afwachting van zijn reactie. In dit voorstel hoeft de brug t.h.v. 5.1.2.e geen vrije doorvaarthoogte te hebben van 1,5m.

5.1.2.e [redacted]

- CRB wil een hogere bouwhoogte gebruiken voor het Dienstengebouw in de Vlietzone dan volgens het bestemmingsplan Molenvlietpark mogelijk is. 5.1.2.e wordt gevraagd om te controleren of dit via een binnenplanse wijziging (via het college en ter inzage leggen) geregeld kan worden. Zo ja, dan worden allereerst de direct betrokken stakeholders door CRB en Roba geïnformeerd. CRB kan ook binnen het bestaande bestemmingsplan een dienstgebouw realiseren, maar dit voorstel is beter. 5.1.2.e en 5.1.2.e zullen faciliteren, maar CRB is verantwoordelijk.

5.1.2.e [redacted]

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr42

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 3 augustus 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

BR

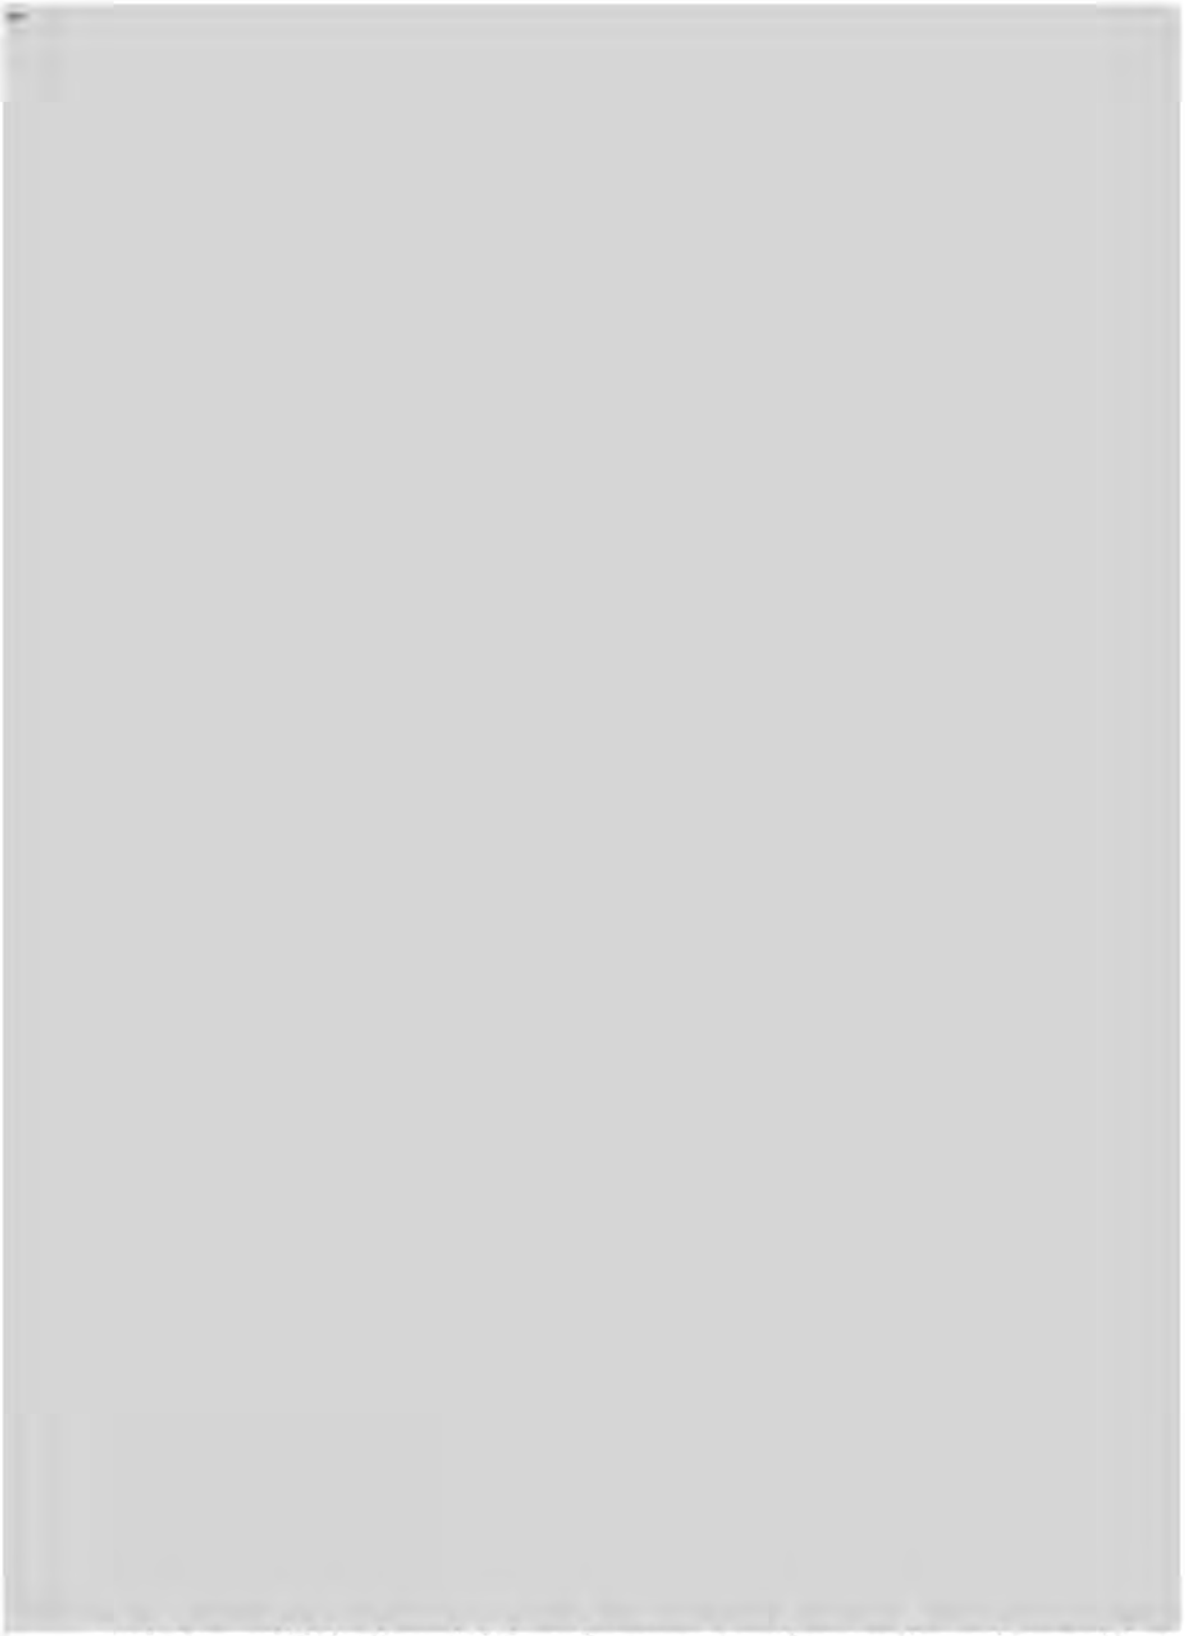

- Park Hoornwijck heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de waterinlaat en de brug over de Molensloot. → antwoordbrief wordt geschreven en in procedure gebracht. 5.1.2.e wil deze brief 14 september in de Begeleidingscommissie agenderen.

- [redacted] heeft nog geen reactie gegeven op het ontwerpvoorstel voor o.a. de 2e waterinlaat.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 17 augustus 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

## 4 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- Park Hoornwijck heeft twee brieven aan de gemeenteraad gestuurd over de waterinlaat en de brug over de Molensloot, de verharding van het Molenslootpad en de bomenkap op het talud langs Drievliet. → antwoordbrieven worden geschreven en in procedure gebracht. Daarnaast heeft er op 16 augustus een goed gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Park Hoornwijck, CRB en Roba.
- 5.1.2.e heeft nog geen reactie gegeven op het ontwerpvoorstel voor o.a. de 2e waterinlaat.

BR

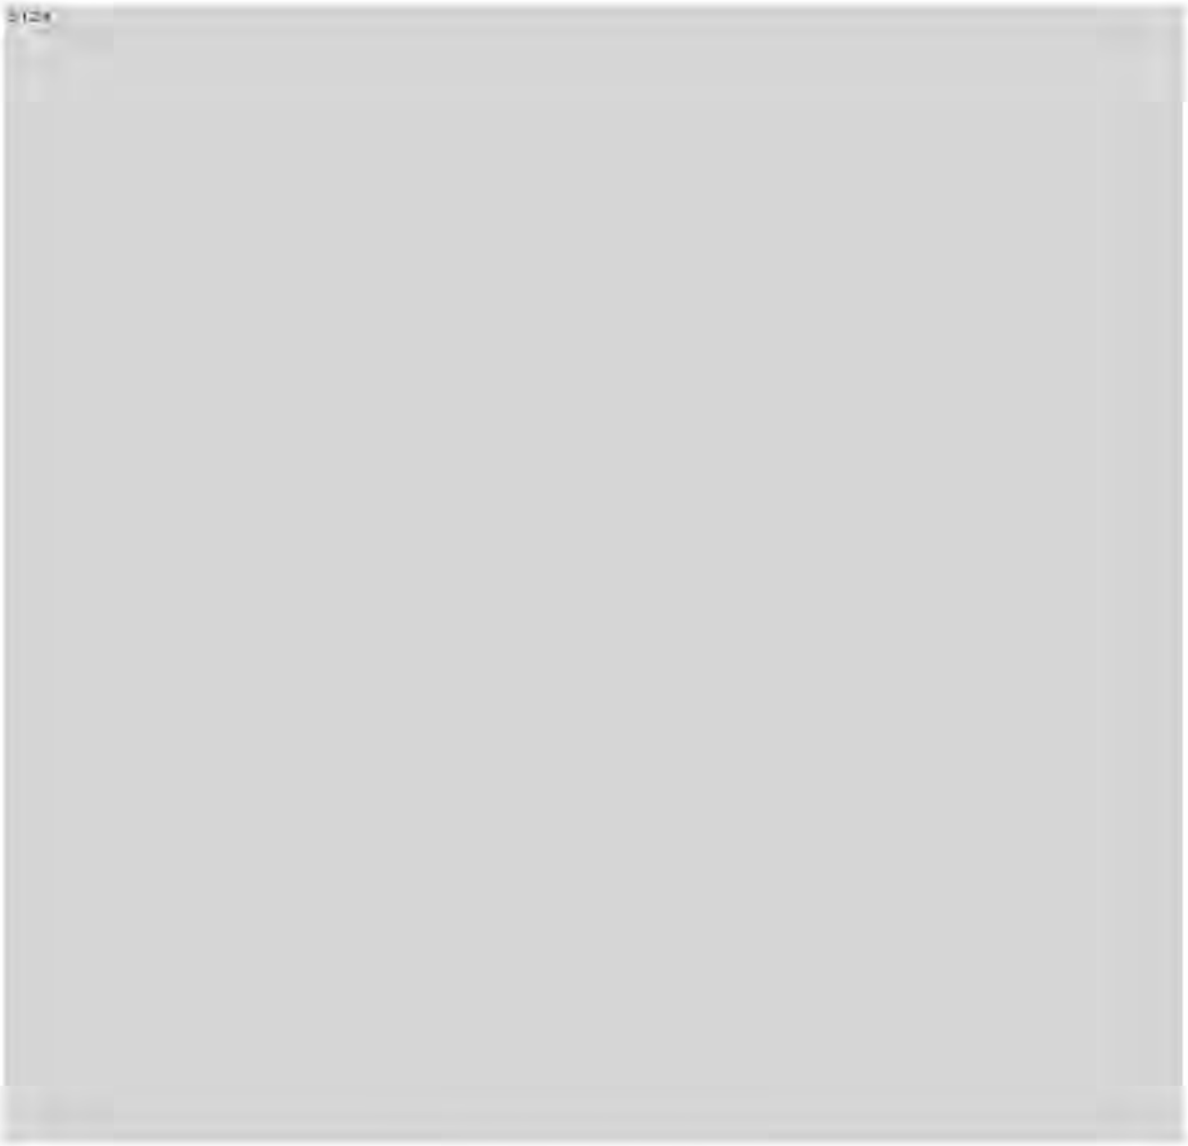

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Docnr44

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 31 augustus 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

## 5 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- 5.1.2.e is inhoudelijk akkoord met het ontwerp, maar er moet nog een deal gesloten worden met Roba en HHD (kost mogelijk nog 2 maanden tijd). In dat geval behoeft de brug over Molensloot niet hoog uitgevoerd te worden.

BR

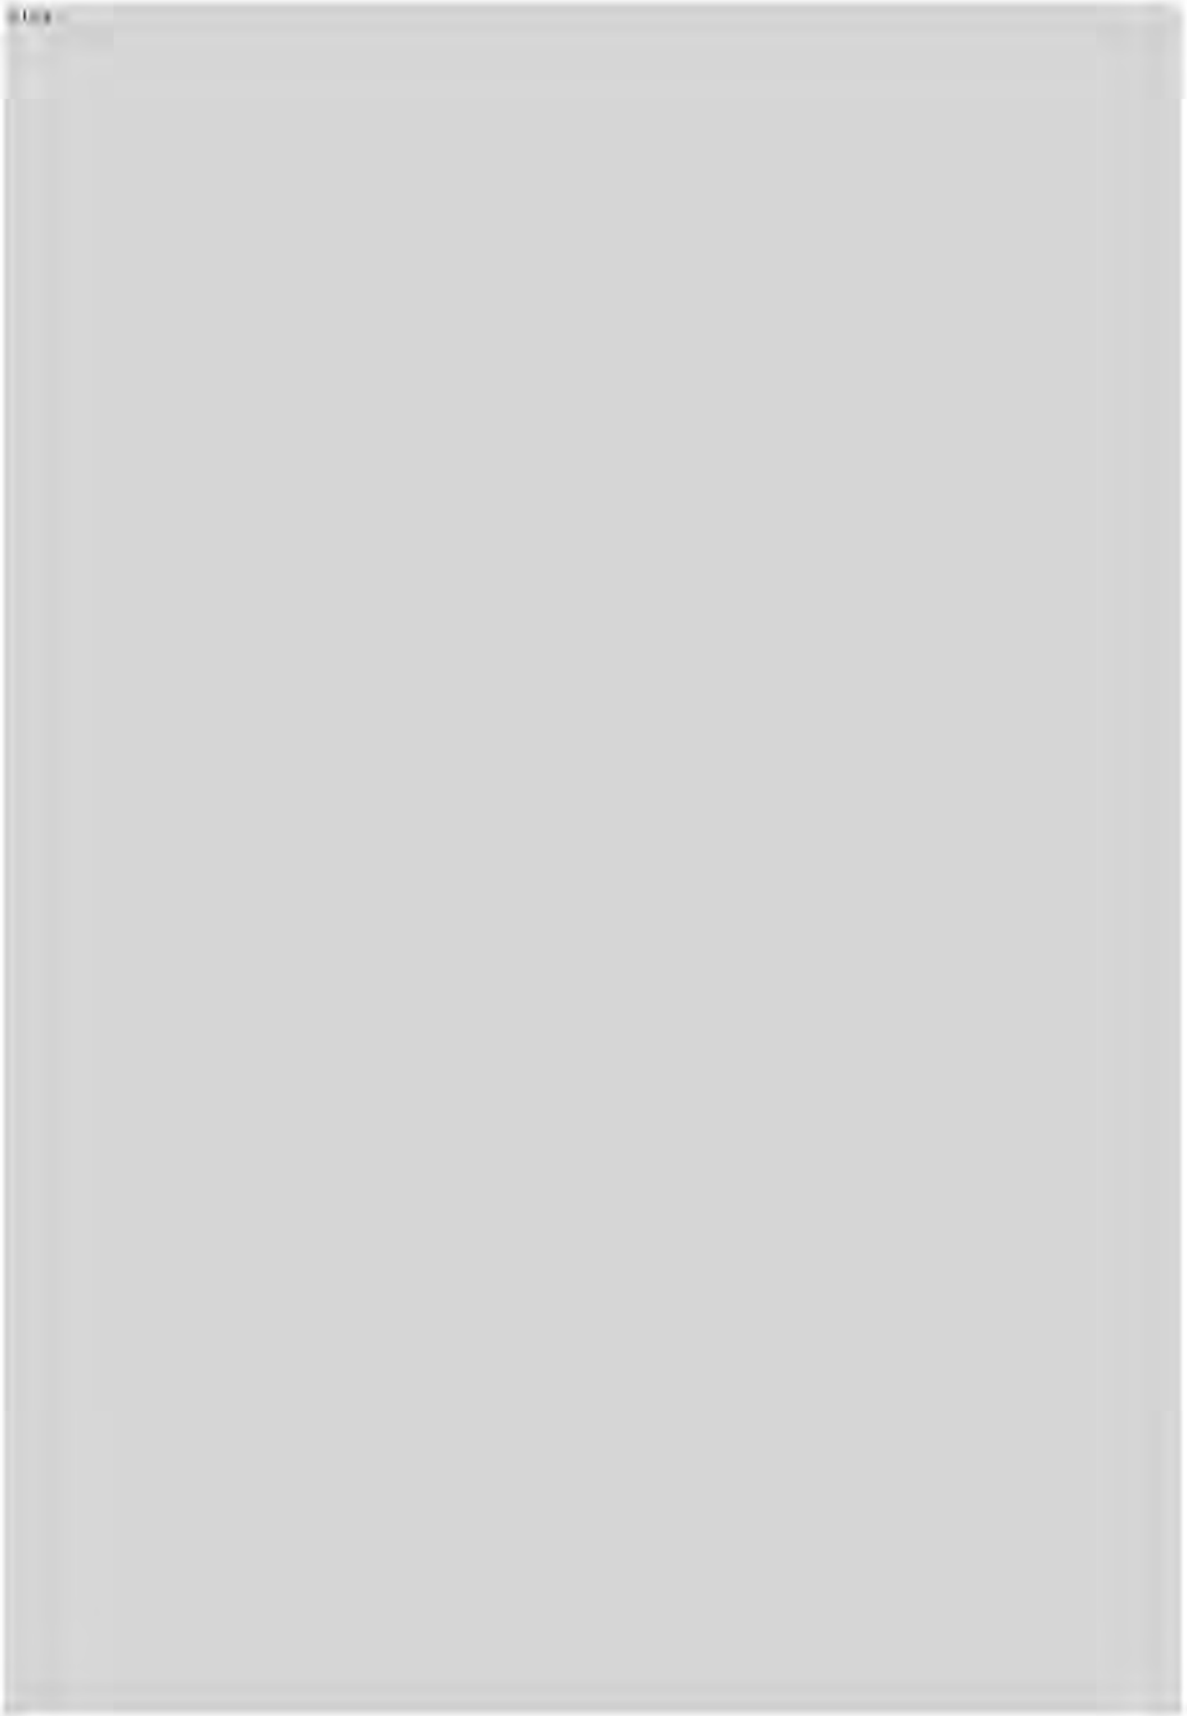

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 28 september 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

## 5 OGON 6 oktober

Gevraagd: Agendapunten?
Besproken:

- Besluit VV Hoogheemraadschap t.a.v. financiële bijdrage calamiteitenberging: mededeling

## 6 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.
Besproken:

- Verenigde vergadering van HHD heeft besloten het geld voor de calamiteitenberging daadwerkelijk ter beschikking te stellen.
- Komende tijd de hoogte van het dienstgebied in samenhang met de inrichting van het restterrein achter Zeerust ontwerpen. Door middel van contact met de omgeving proberen om zienswijzen in de latere procedure te voorkomen.
- Komende periode weer oppakken van de dossiers/gesprekken met en (gesprek over 2e toevoer + gesprek over ruimtelijke onderbouwing Nieuwe Vredenoord. Na hoofdlijnenakkoord overdragen aan een DSO-projectleider).

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 26 oktober 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

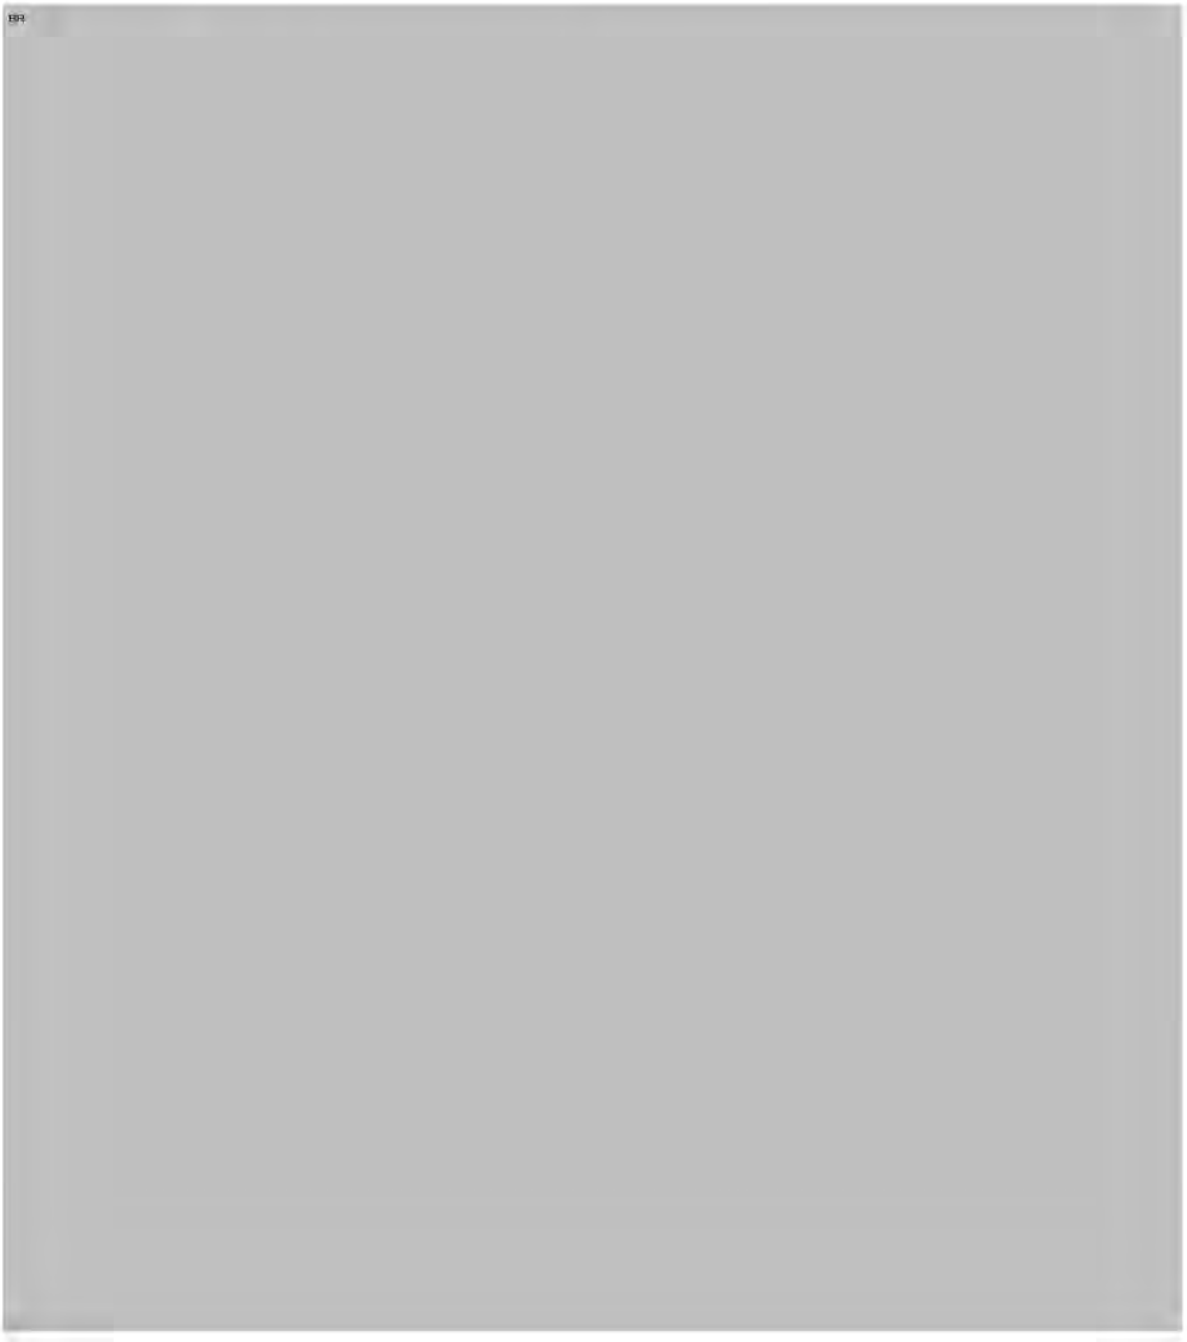

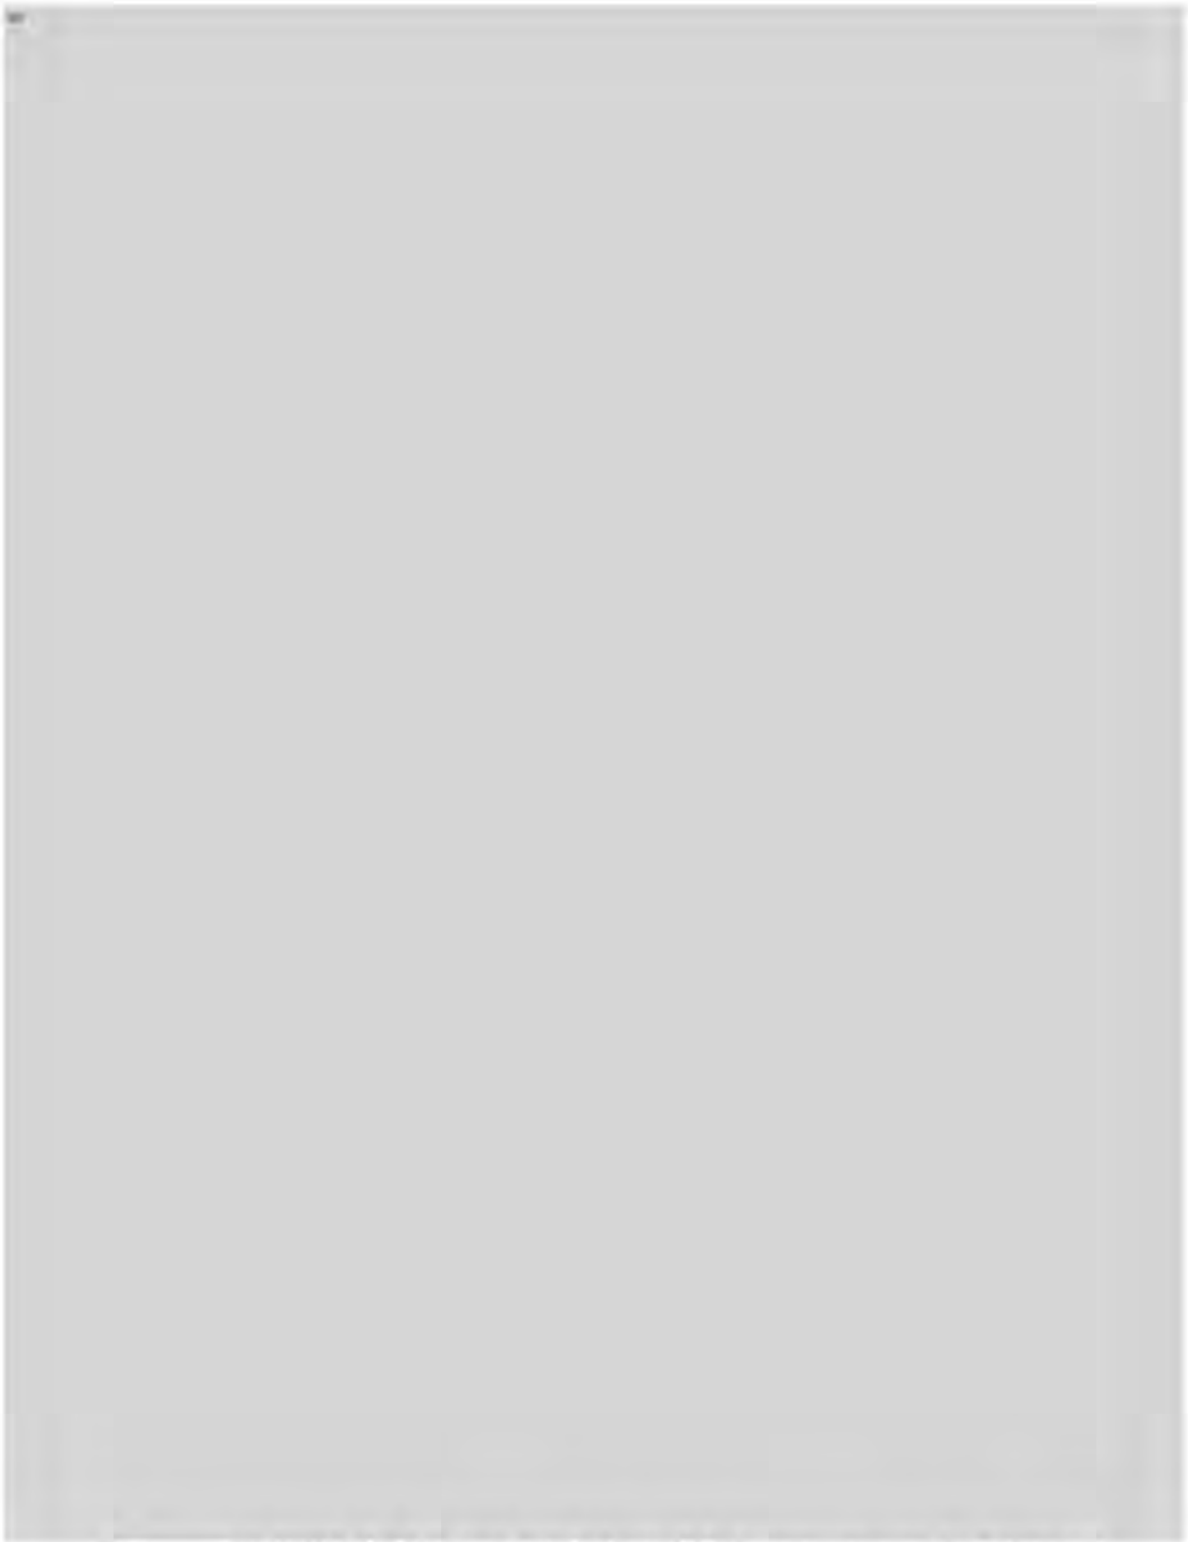

- 5.1.2.e en HHD zijn het eens met het gewijzigde ontwerp van de 2e toevoer. 5.1.2.e heeft zijn plan Nieuw Vredenoord gepresenteerd. De diensten zijn positief zodat overleg met Revis ingepland kan worden. De ramingen voor de realisatie worden beoordeeld waarna in overleg met HHD een beroep gedaan zal worden op haar risicopot voor de waterberging. De hoofdlijnendeal met 5.1.2.e moet aangepast en afgerond worden, incl. wel/niet combineren van graafwerkzaamheden aan het water en grondophogingen op het terrein van

[redacted] → [redacted] de voorkeur gaat uit naar meerwerk voor CRB i.t.t. separate aanbesteding waarbij mogelijk een andere aannemer op min of meer hetzelfde terrein werkzaamheden verricht.

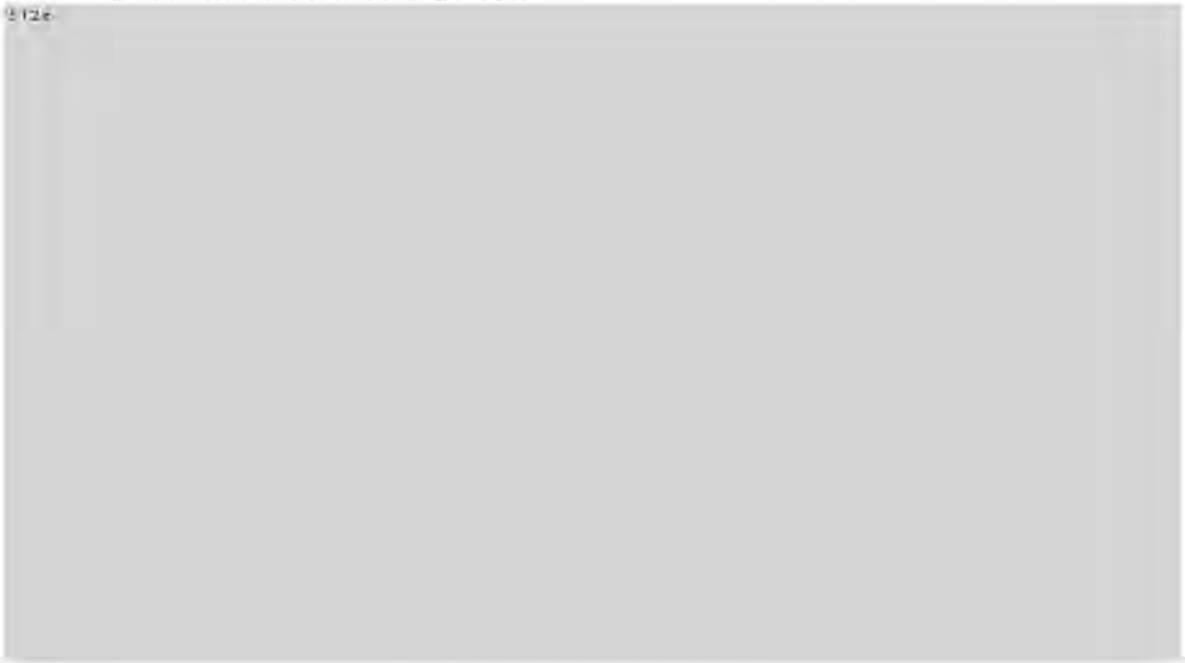


o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 9 november 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

---

5.1.2.e

## 4 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e + 5.1.2.e

- 5.1.2.e en de gemeente hebben hun kostenramingen gedeeld. Roba heeft n.a.v. het financiële voorstel van 5.1.2.e een tegenvoorstel uitgebracht. 5.1.2.e gaat dat overdenken. Na een deal over de prijs kan gezamenlijk besproken worden wie welk werk uitvoert. 10 november is er een bestuurlijk overleg over dit dossier. In tegenstelling tot de eerdere berichten is DSO stedenbouw minder positief over Nieuw Vredenoord. Indien plannen akkoord moet 5.1.2.e zelf het nodige afstemmen met HHD. Daarin kan Roba niets voor hem betekenen.

BR

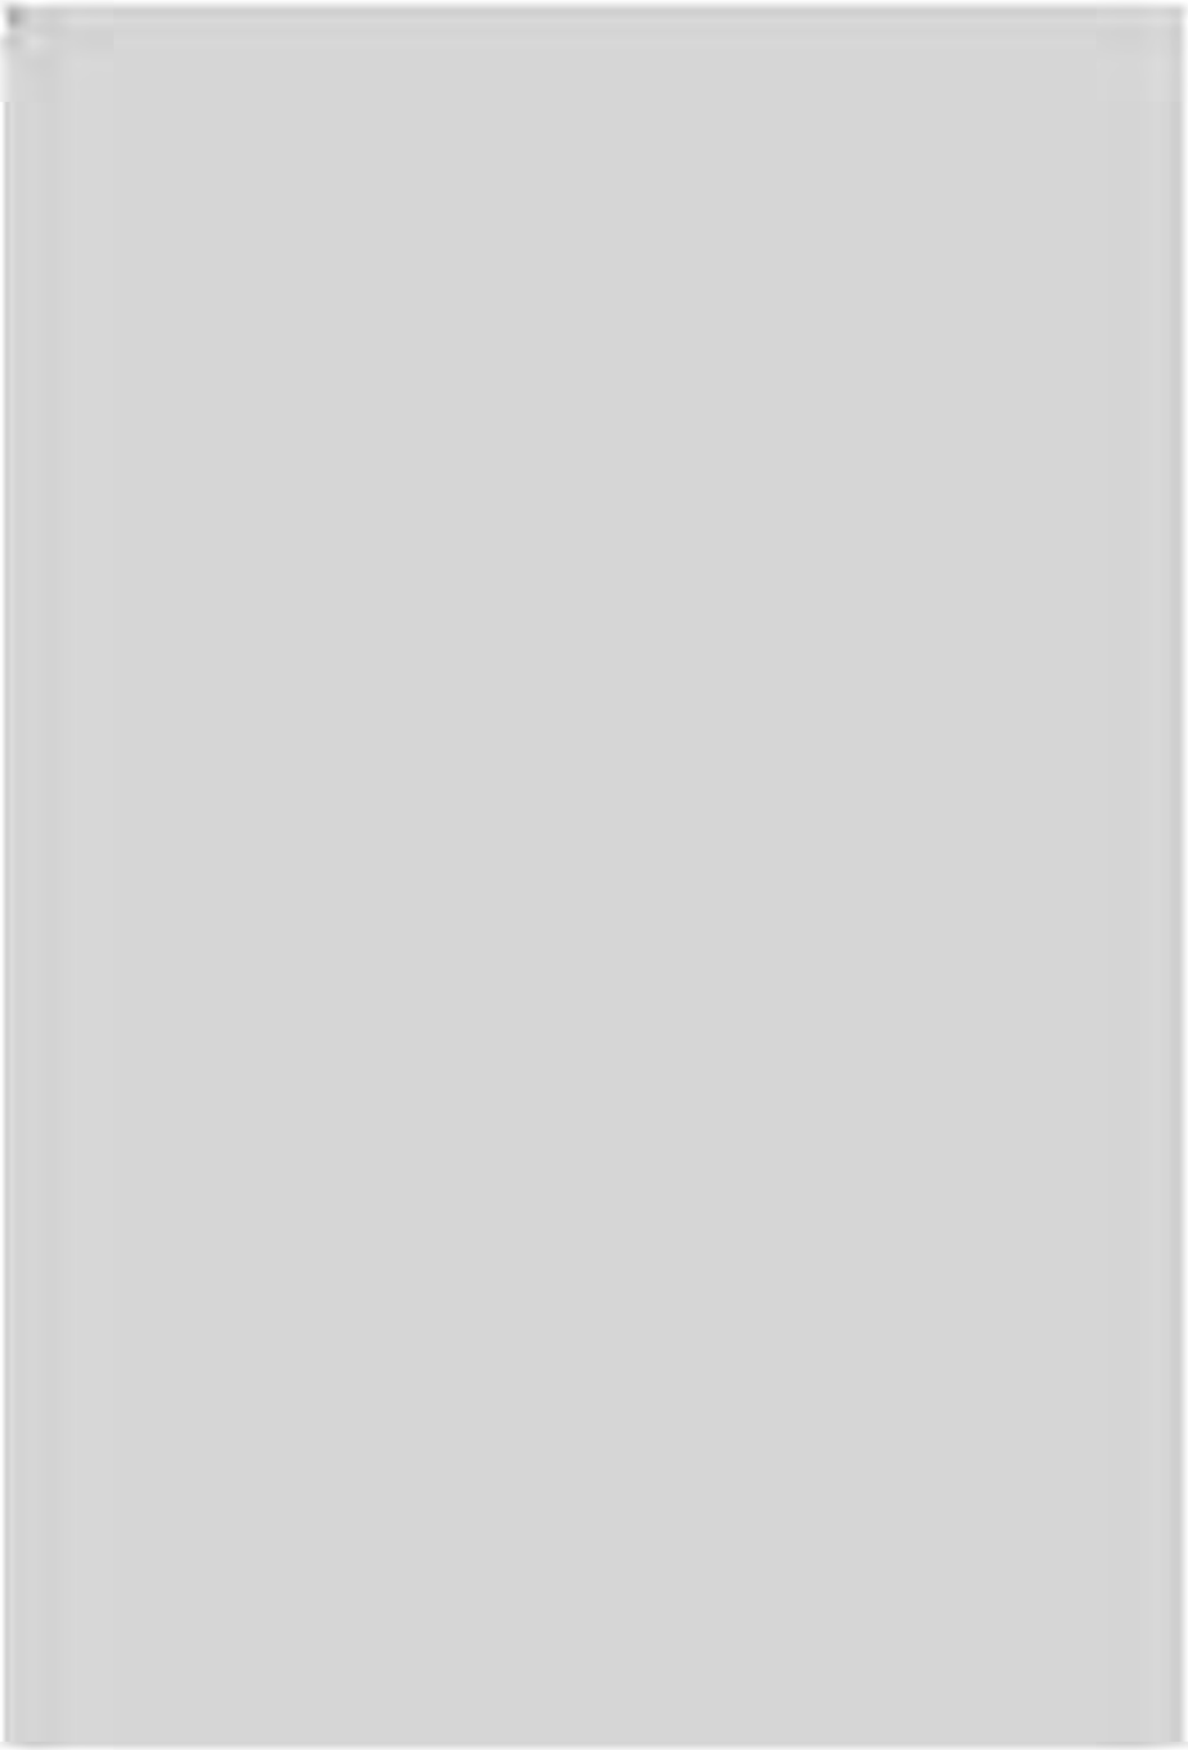

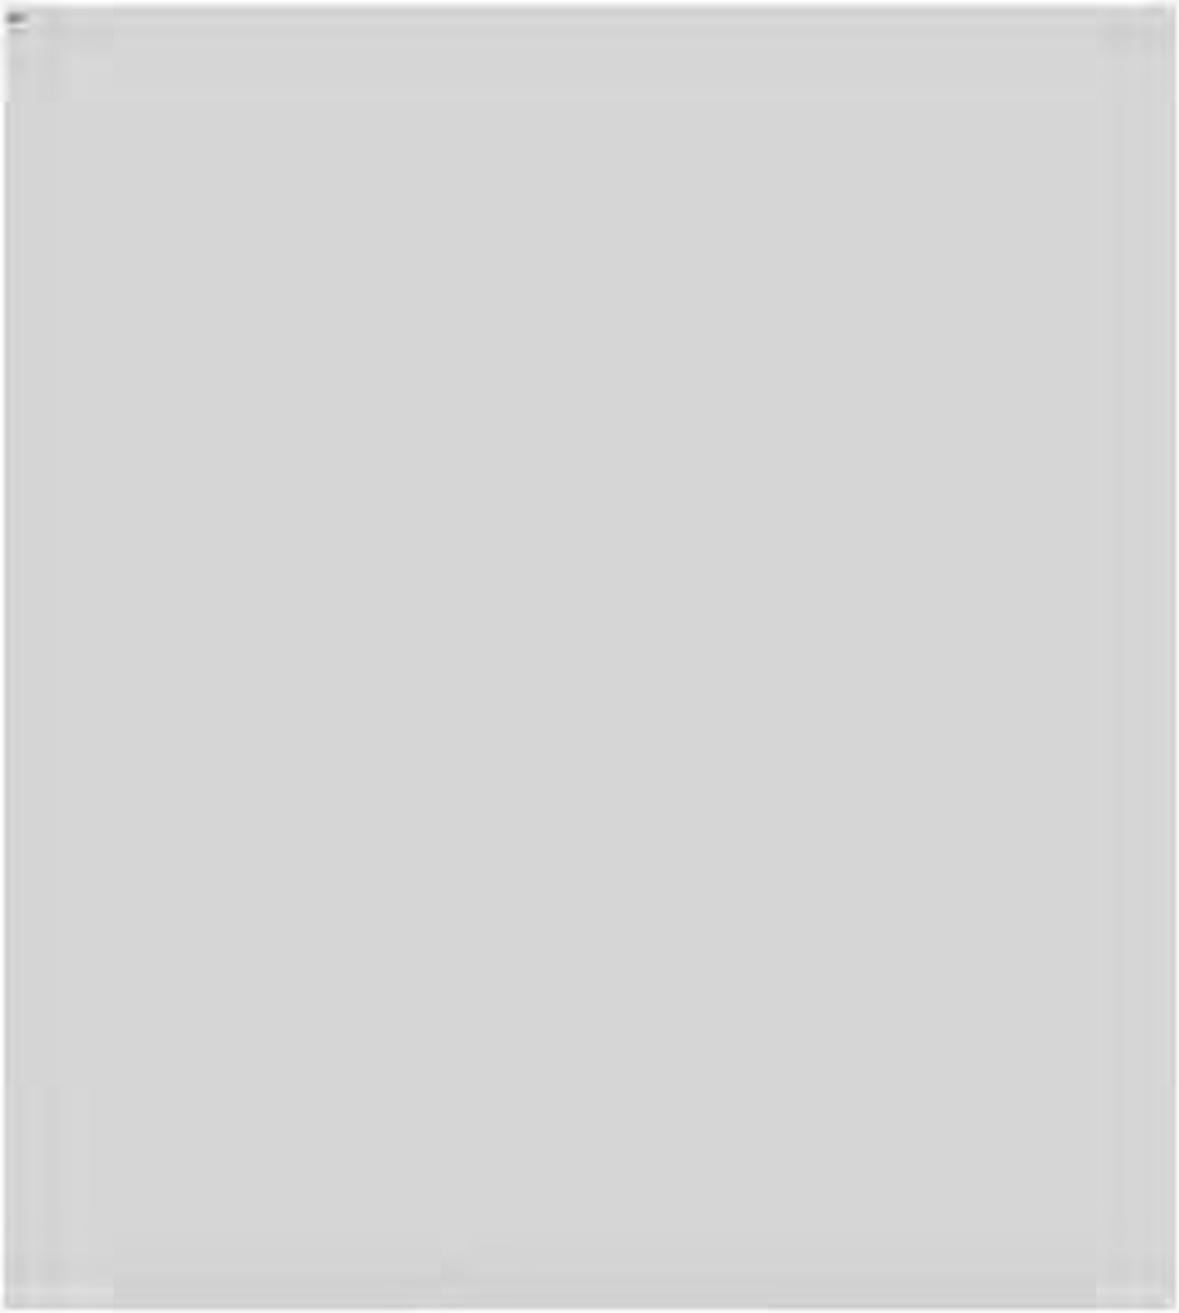

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 23 november 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

## 4 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- Stedenbouw heeft het plan Nieuw Vredenoord van 5.1.2.e beoordeeld en kritische vragen gesteld. Morgen hebben 5.1.2.e en 5.1.2.e overleg bij 5.1.2.e 5.1.2.e

BR

- De Landschapstafel heeft zicht gegeven op 3 ton subsidie voor het Molenvlietpark.

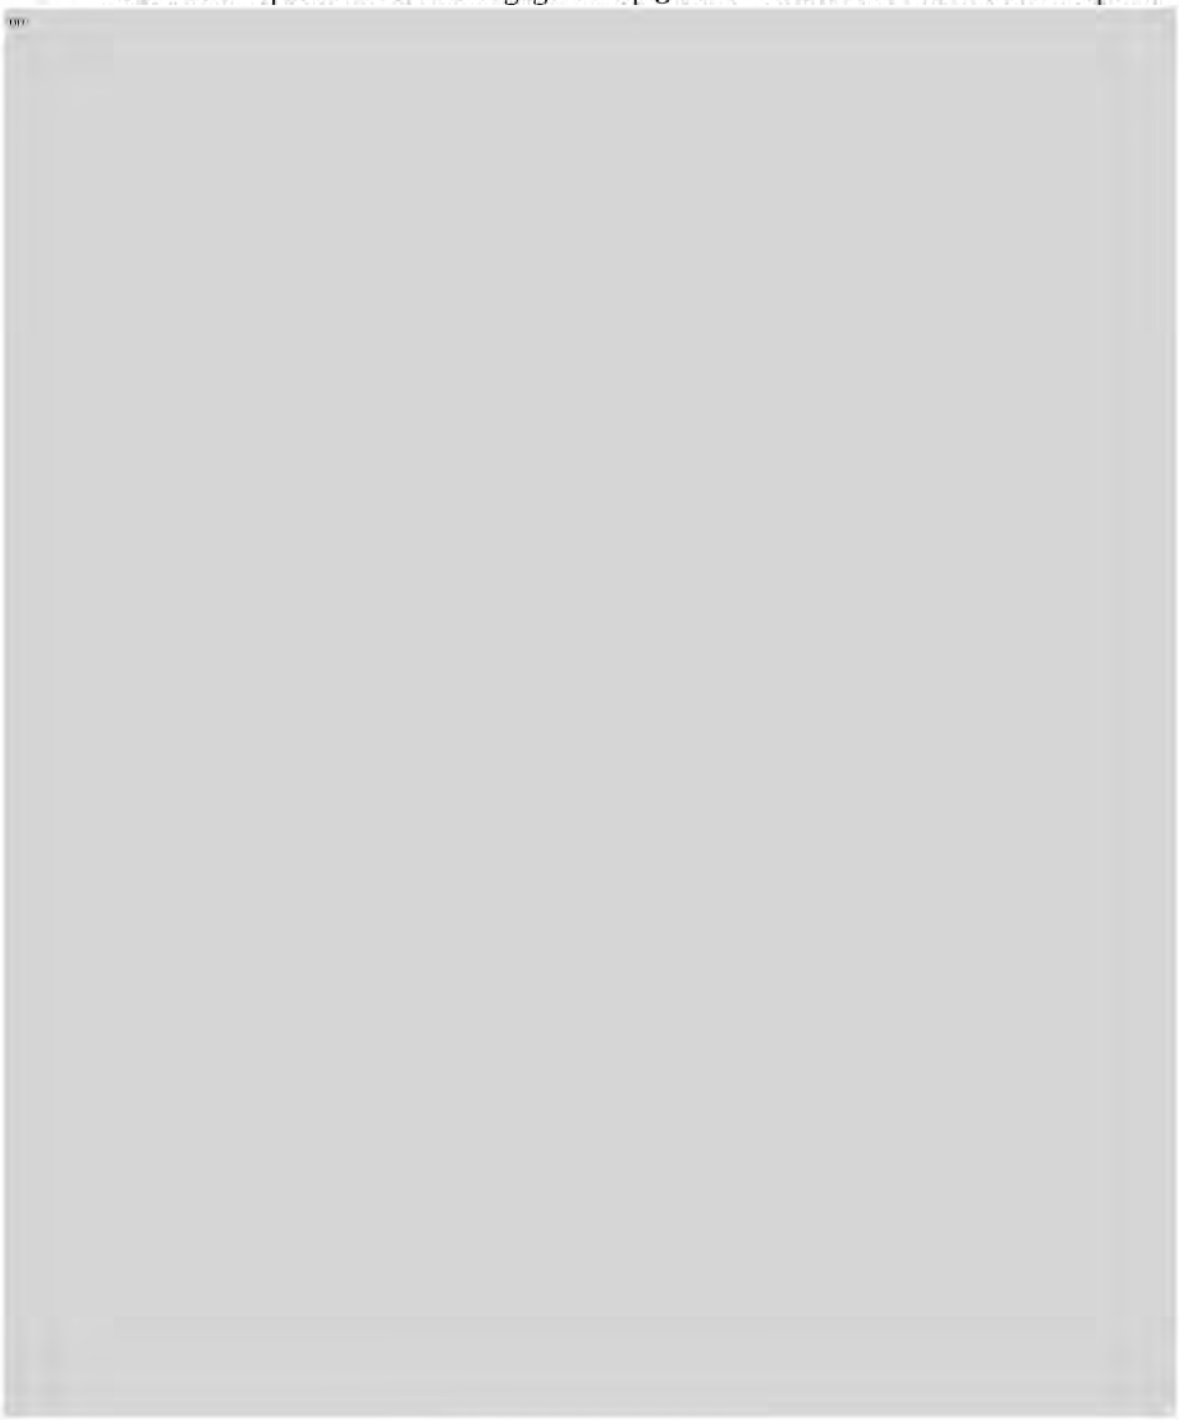

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 7 december 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

## 4 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- 8 december is er een vervolggesprek met 5.1.2.e over de 2e watertoevoer. Pels Rijcken vorige week gesproken en een onteigeningstraject is desgewenst juridisch mogelijk als alternatief scenario.

BR

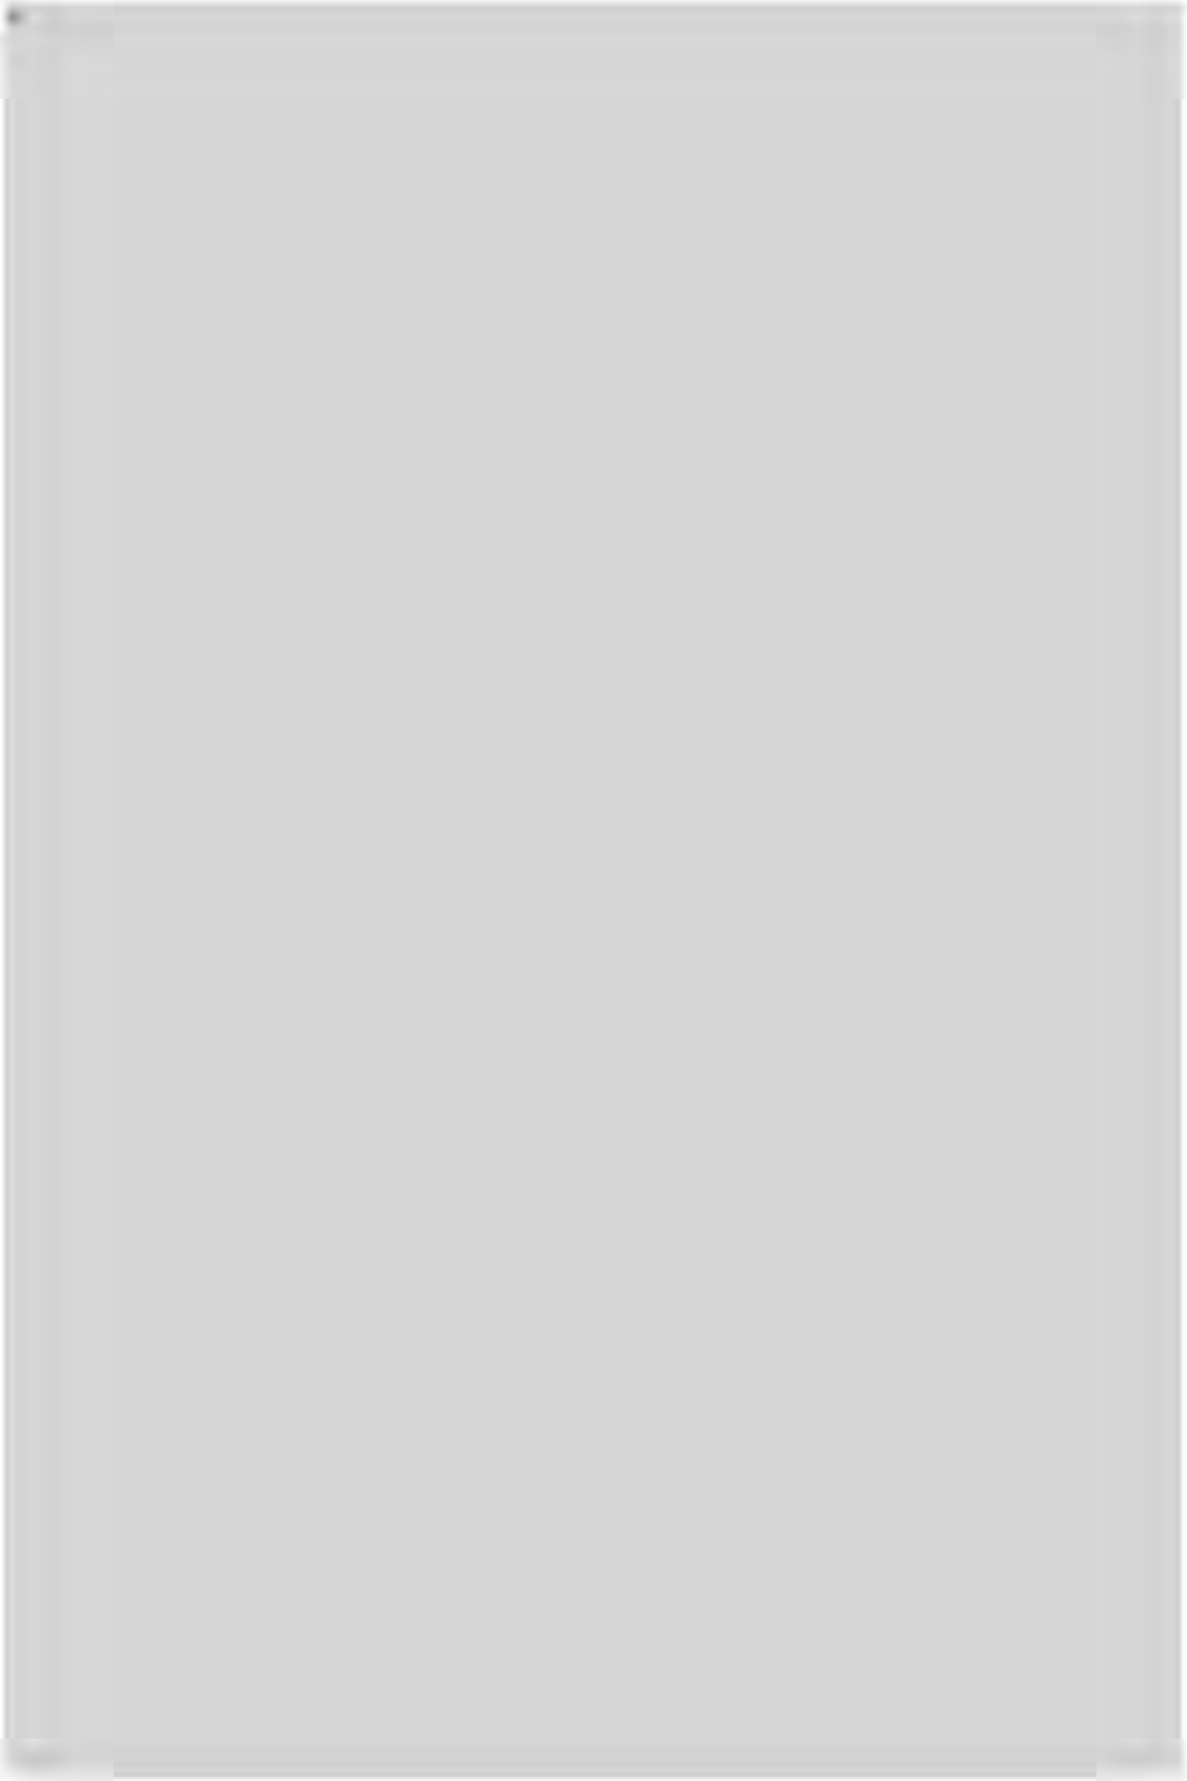

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 21 december 2016 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | - |

## 5 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- Vanochtend hebben 5.1.2.e en 5.1.2.e met 5.1.2.e en wethouder Revis gesproken over zowel de tweede watertoevoer en Nieuw Vredenoord op het perceel van 5.1.2.e De wethouder vindt de bouwplannen te ruim en wil vanuit de gemeentelijke organisatie een toetsingskader hebben dat zal leiden tot een Project uitvoeringskader (PUK) voor de gemeenteraad. 5.1.2.e zal dit aan 5.1.2.e 5.1.2.e mededelen. Het hoogheemraadschap wordt gemeld dat haar Projectplan t.b.v. de tweede watertoevoer niet eind januari maar later in procedure gebracht kan worden. In de samenwerkingsoverleg tussen gemeente en 5.1.2.e moet een

inspanningsverplichting voor de gemeente t.a.v. Nieuw Vredenoord worden opgenomen i.p.v. een inspanningsverplichting. Als terugvaloptie wordt een onteigeningstraject voor de tweede watertoevoer benoemd, maar dat traject kost ca. 2 jaar. Naar aanleiding van voorgaande zal 5.1.2.e aan CRB melden dat wij anticiperen op de komst van de voorziene tweede watertoevoer. Men kan o.a. een duiker bij de Molensloot ontwerpen i.p.v. een brug.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr51

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 18 januari 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

-

BR

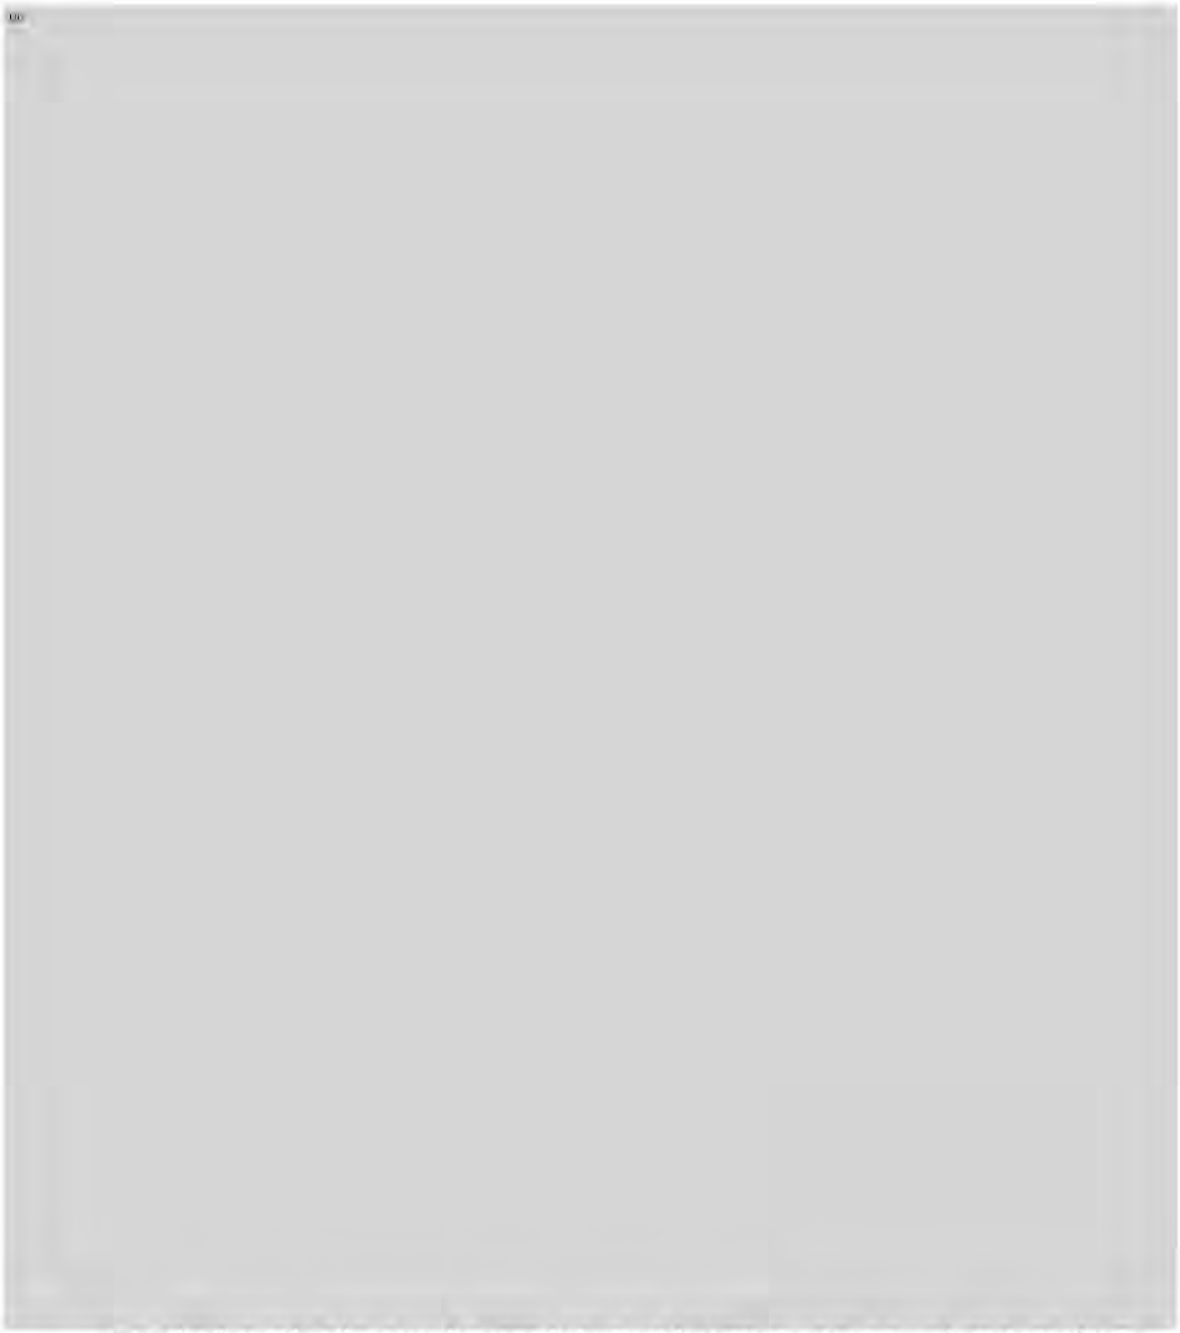

- 5.1.2.e in december is er veel gesproken over de watertoevoer over het perceel van 5.1.2.e en zijn voorgenomen vastgoed ontwikkeling. Het gewenste ontwerp voor de watertoevoer is bekend. De dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente zal een PUK opstellen op basis waarvan de gewenste ontwikkeling van 5.1.2.e 5.1.2.e getoetst wordt. Binnenkort zullen 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e bezoeken om dit traject te bespreken en zijn perceel te bezoeken.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 15 februari 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

-

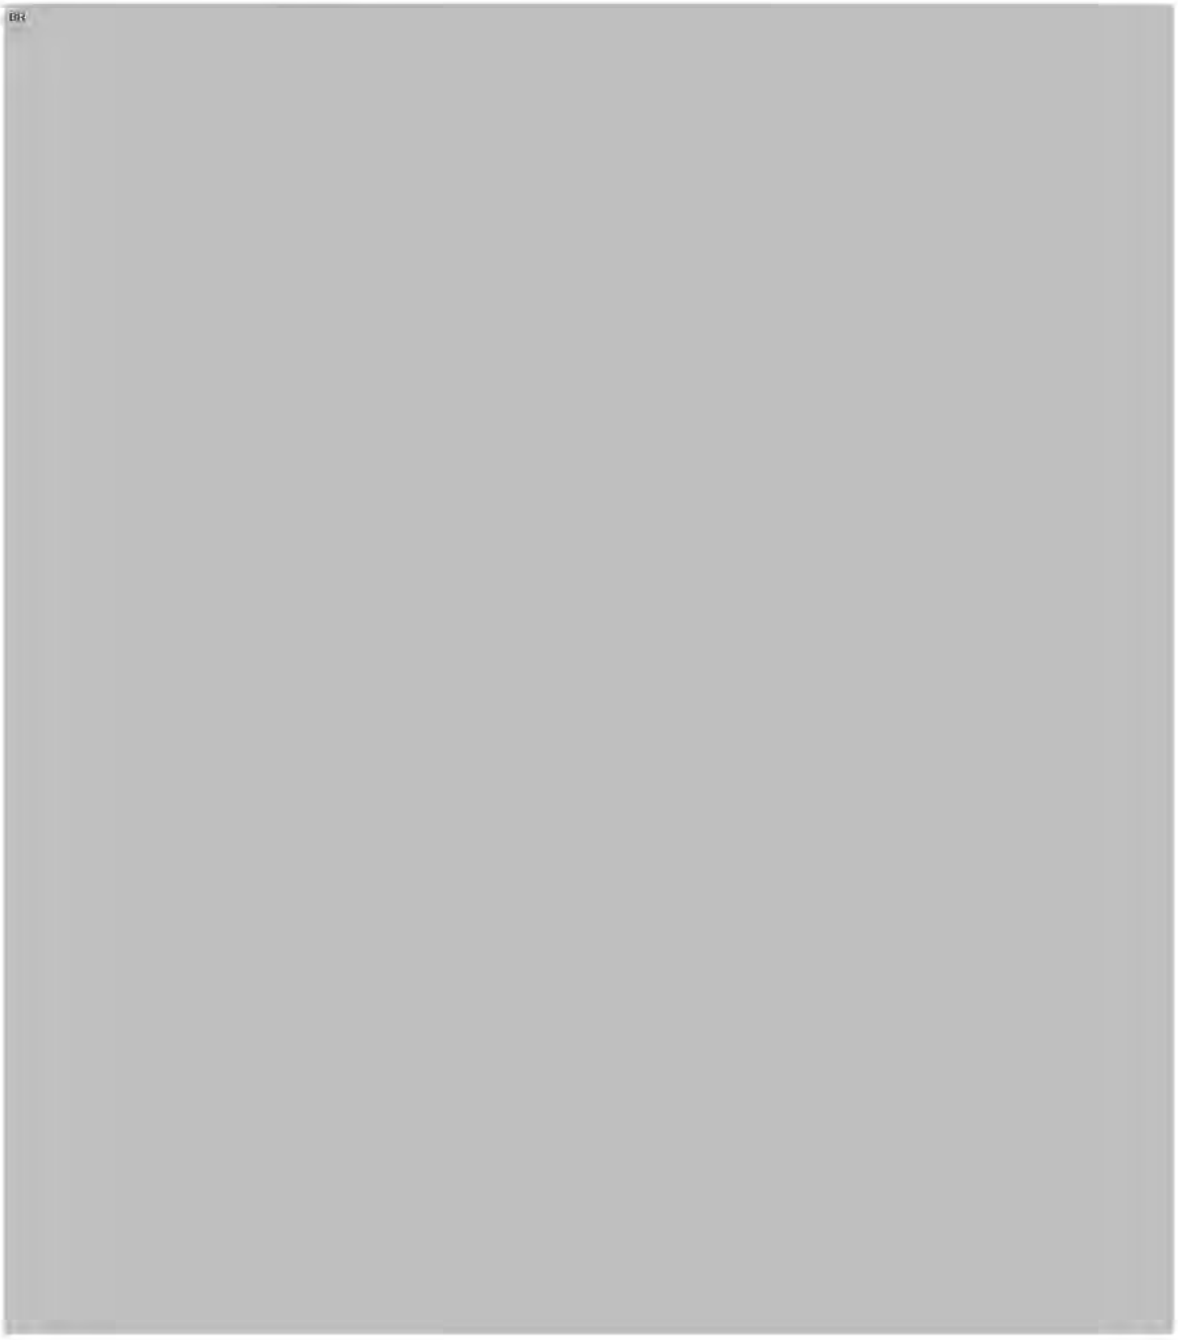

## 9 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- Landgoed Vredenoord met 5.1.2.e en 5.1.2.e bezocht en vervolgstappen besproken. De gemeente zal een project uitvoeringskader (PUK) opstellen waarbinnen 5.1.2.e de plannen voor Nieuw Vredenoord kan maken. 5.1.2.e is gevraagd om mee te helpen met het vestigen van het zakelijk recht.

[redacted]

- Binnenkort gesprek met de Landschapstafel Hof van Delfland over haar voorziene subsidiebijdrage aan het Molenvlietpark.

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 1 maart 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

[redacted]

## 7 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- [redacted]
- DSO zal op kosten van 5.1.2.e een voor zijn gewenste ontwikkeling benodigde PUK opstellen. 5.1.2.e zal hierbij vanuit Roba faciliteren.
- 5.1.2.e heeft 5.1.2.e gevraagd op hun kosten een second opinion uit te voeren naar de geboden oplossing voor de 2e watertoevoer. Vooralsnog niet over terug gehoord.

[redacted]

Docnr53

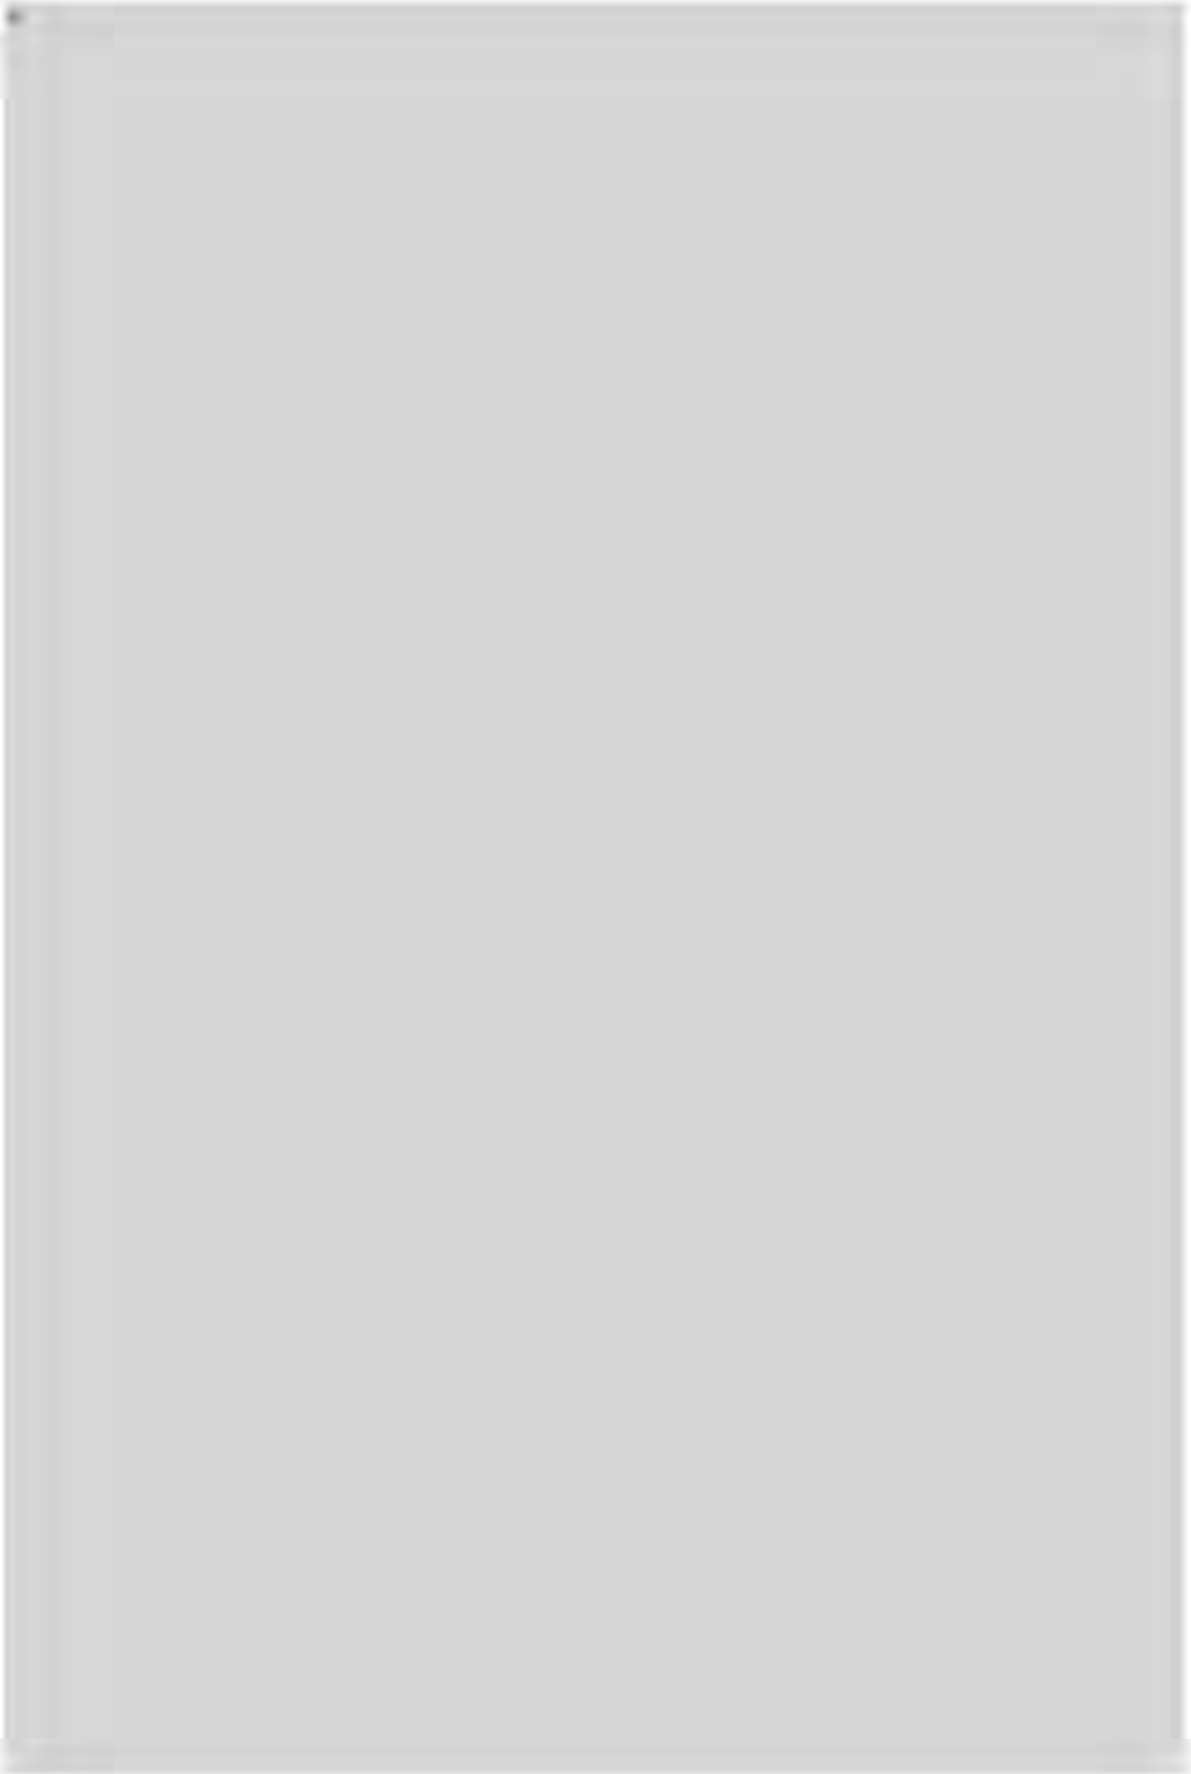

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 29 maart 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

-

5.1.2.e

[redacted]

- Volgende week wordt de concept-SOK met [redacted] besproken. Het opstellen van een concept-PUK duurt langer.

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 25 april 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e
5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

BR

- Vergunningen van HHD ontvangen voor dempen Molensloot en aanleggen boezemkade.

BR

- 5.1.2.e gesproken over de overeenkomst. Los daarvan is er door DSO een workshop georganiseerd t.b.v. het PUK. De DSO-offerte voor het PUK aan 5.1.2.e bevat geen planning.

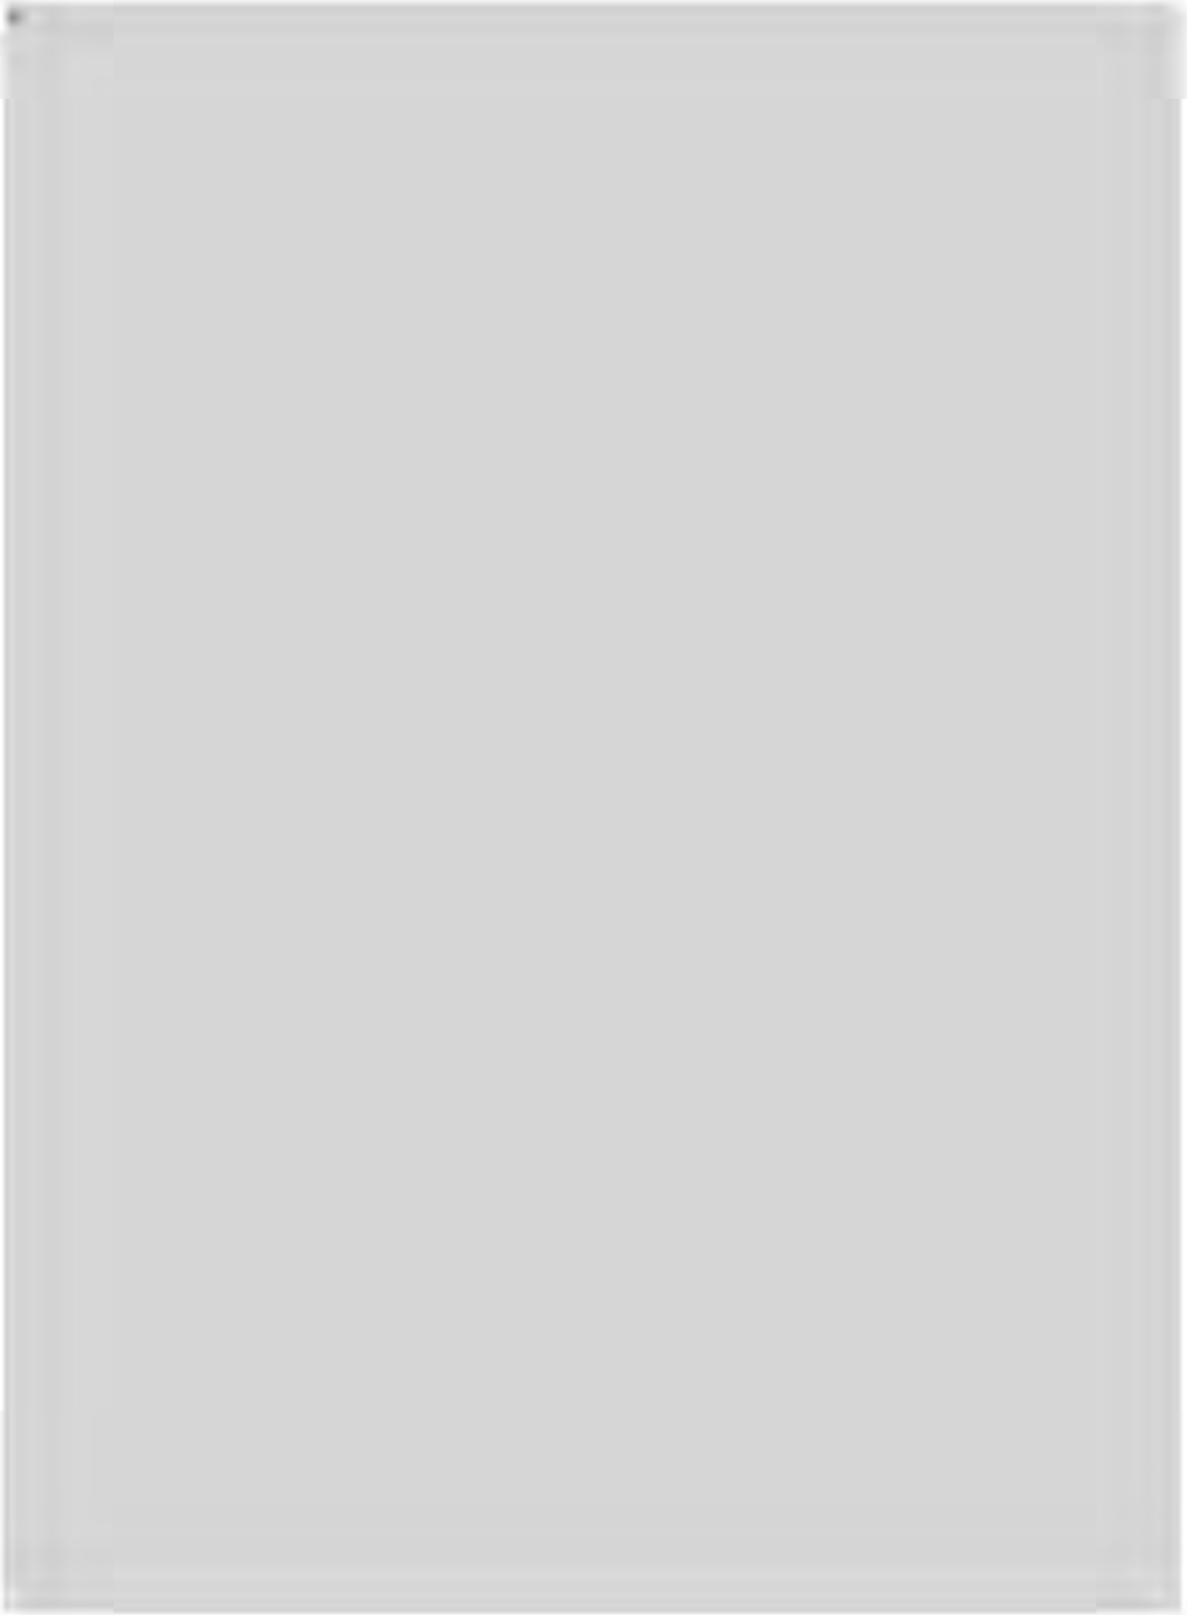

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Docnr56

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 10 mei 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

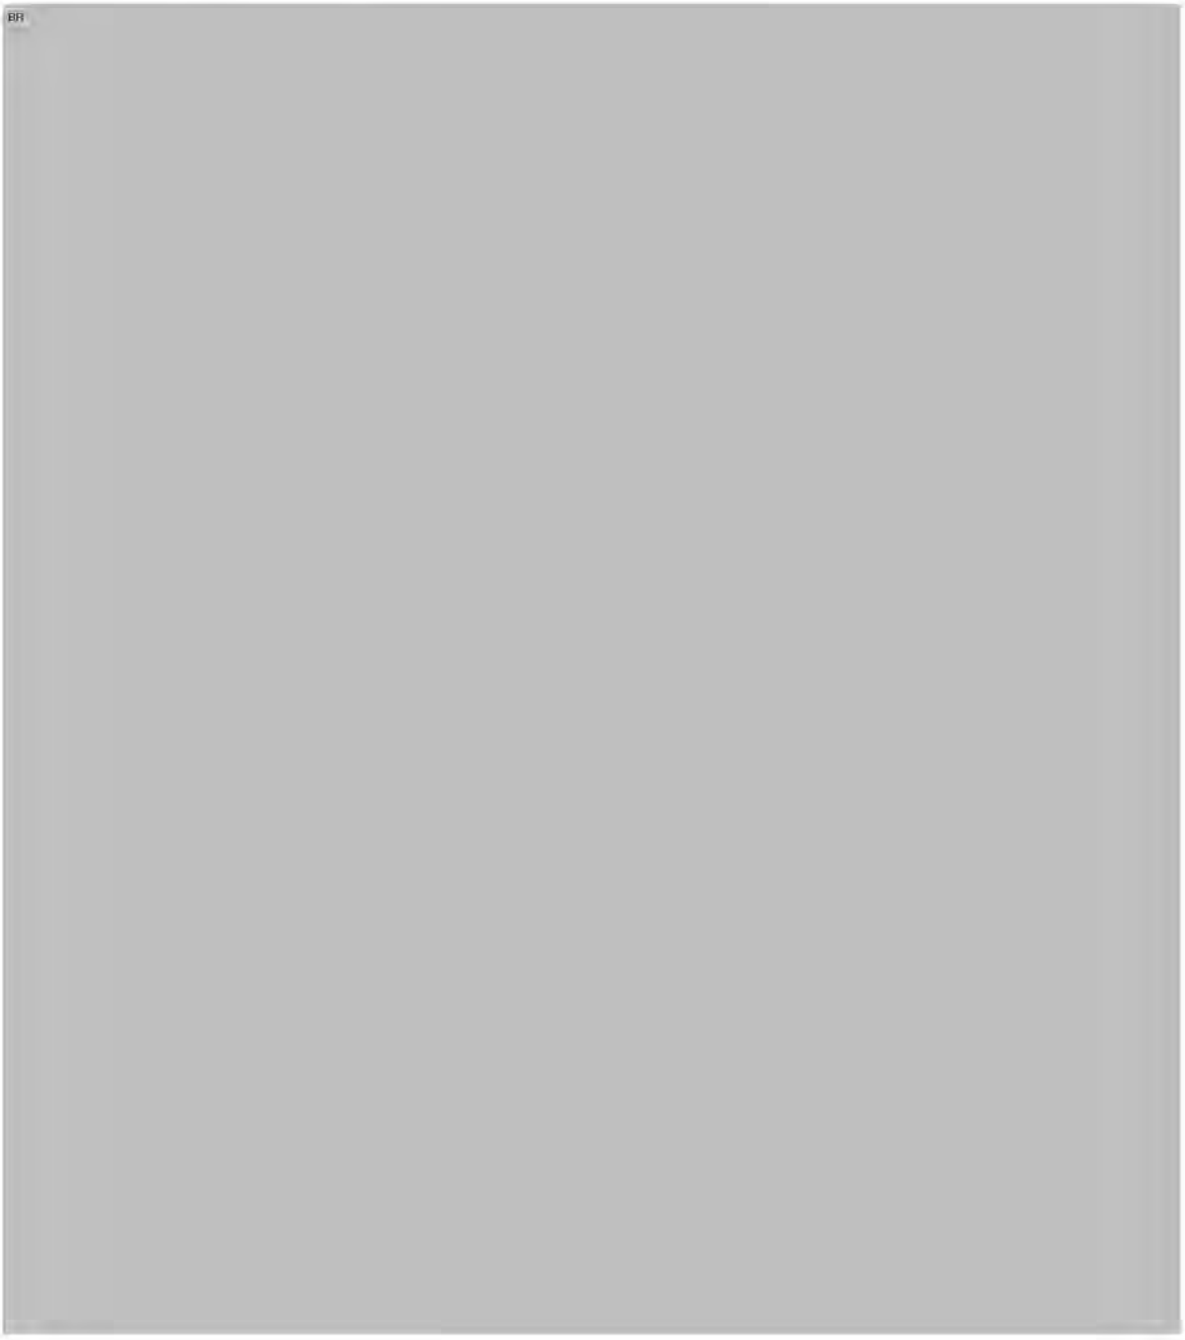

-

5.1.2.e

- Gisteren met 5.1.2.e en 5.1.2.e met 5.1.2.e gesproken over de PUK. Afgesproken is dat er na de 2e gemeentelijke workshop weer met 5.1.2.e gesproken worden. Een ieder heeft een positieve en proactieve instelling. Planning is de PUK en de SOK op 4 juli in het college te behandelen.

- Vanmiddag gesprek met Drievliet over de discrepantie tussen Omgevingsvergunning voor de indoorhal en de (mindere) bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan Molenvlietpark e.o..

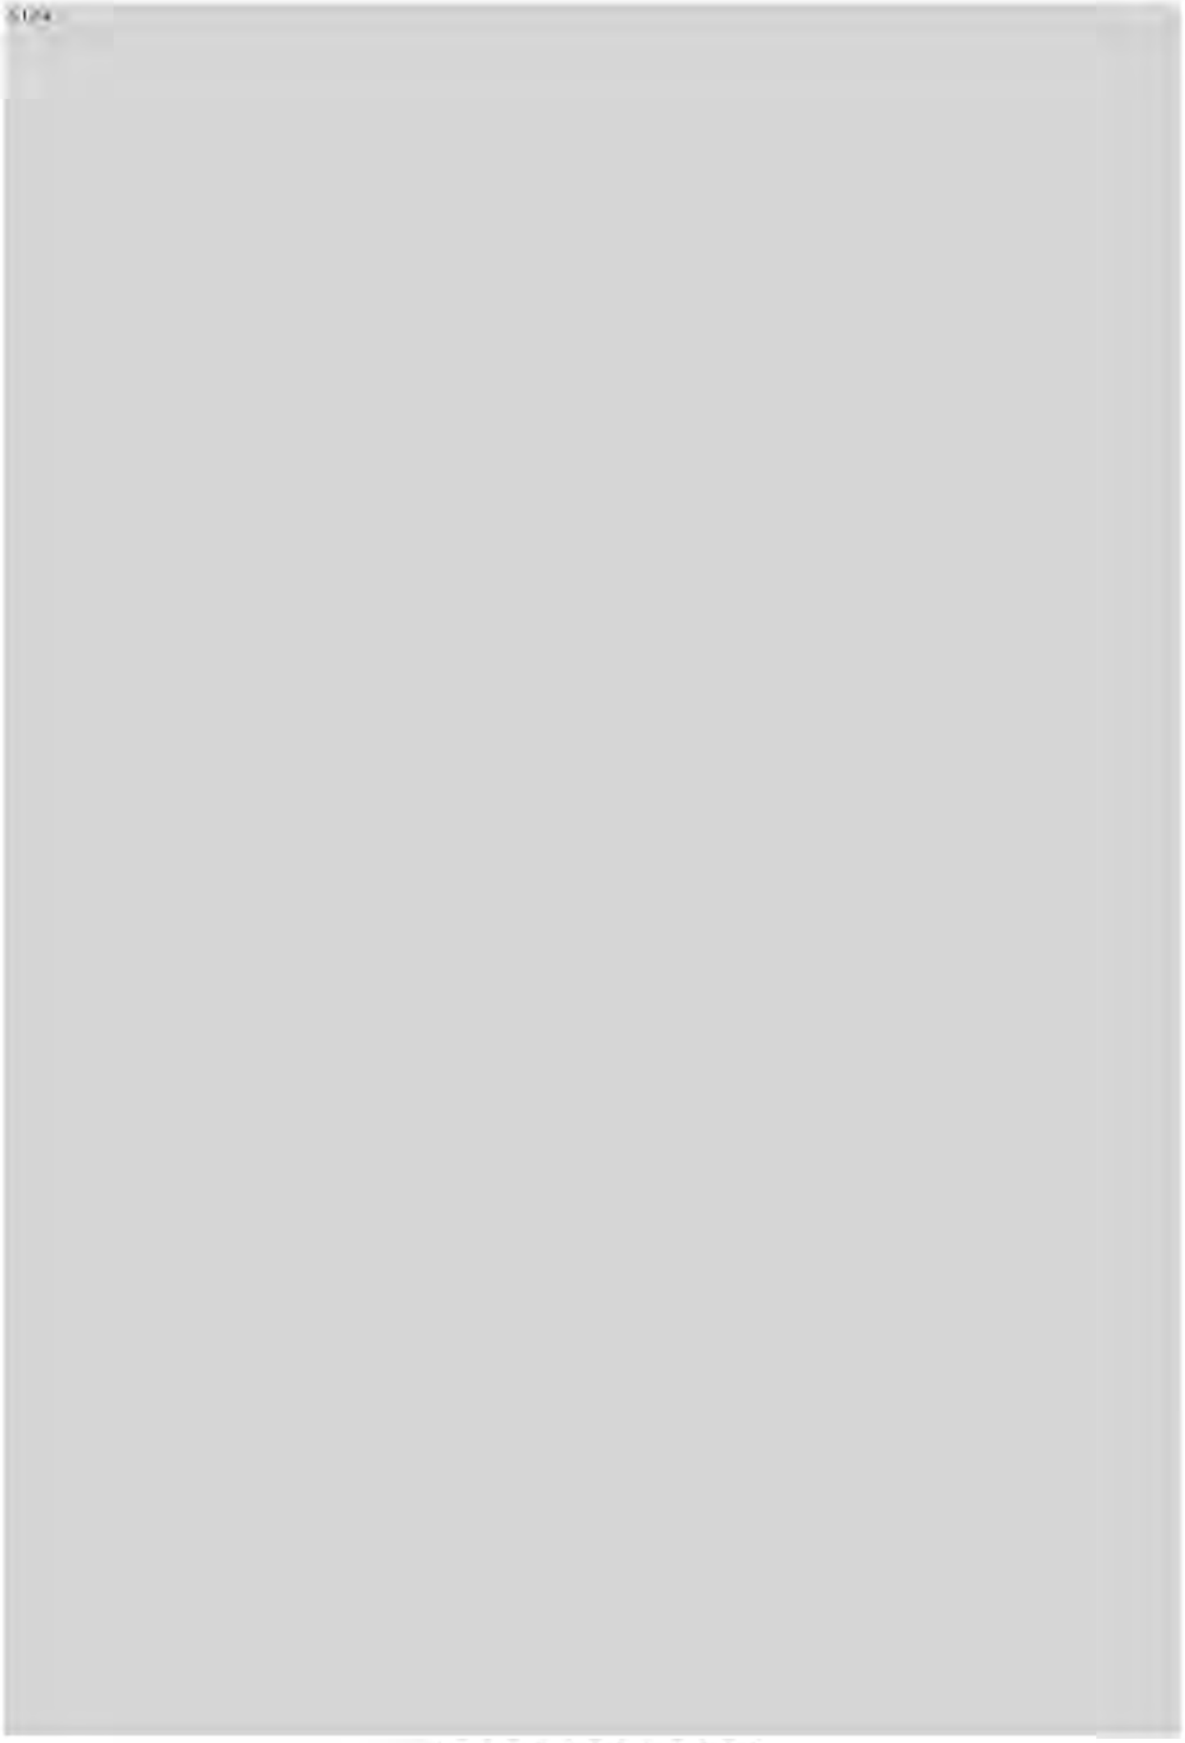

()-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 24 mei 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |

BR

- Het proces t.a.v. PUK en SOK met 5.1.2.e is voortgezet. Voor de PUK zijn er workshops geweest waaruit schetsen zullen volgen die in het college van 4 juli behandeld worden (streefdatum). Voor de waterinlaat is er op verzoek van DSB-directie een alternatief ingebracht welke i.s.m. Movares wordt beoordeeld.

BR

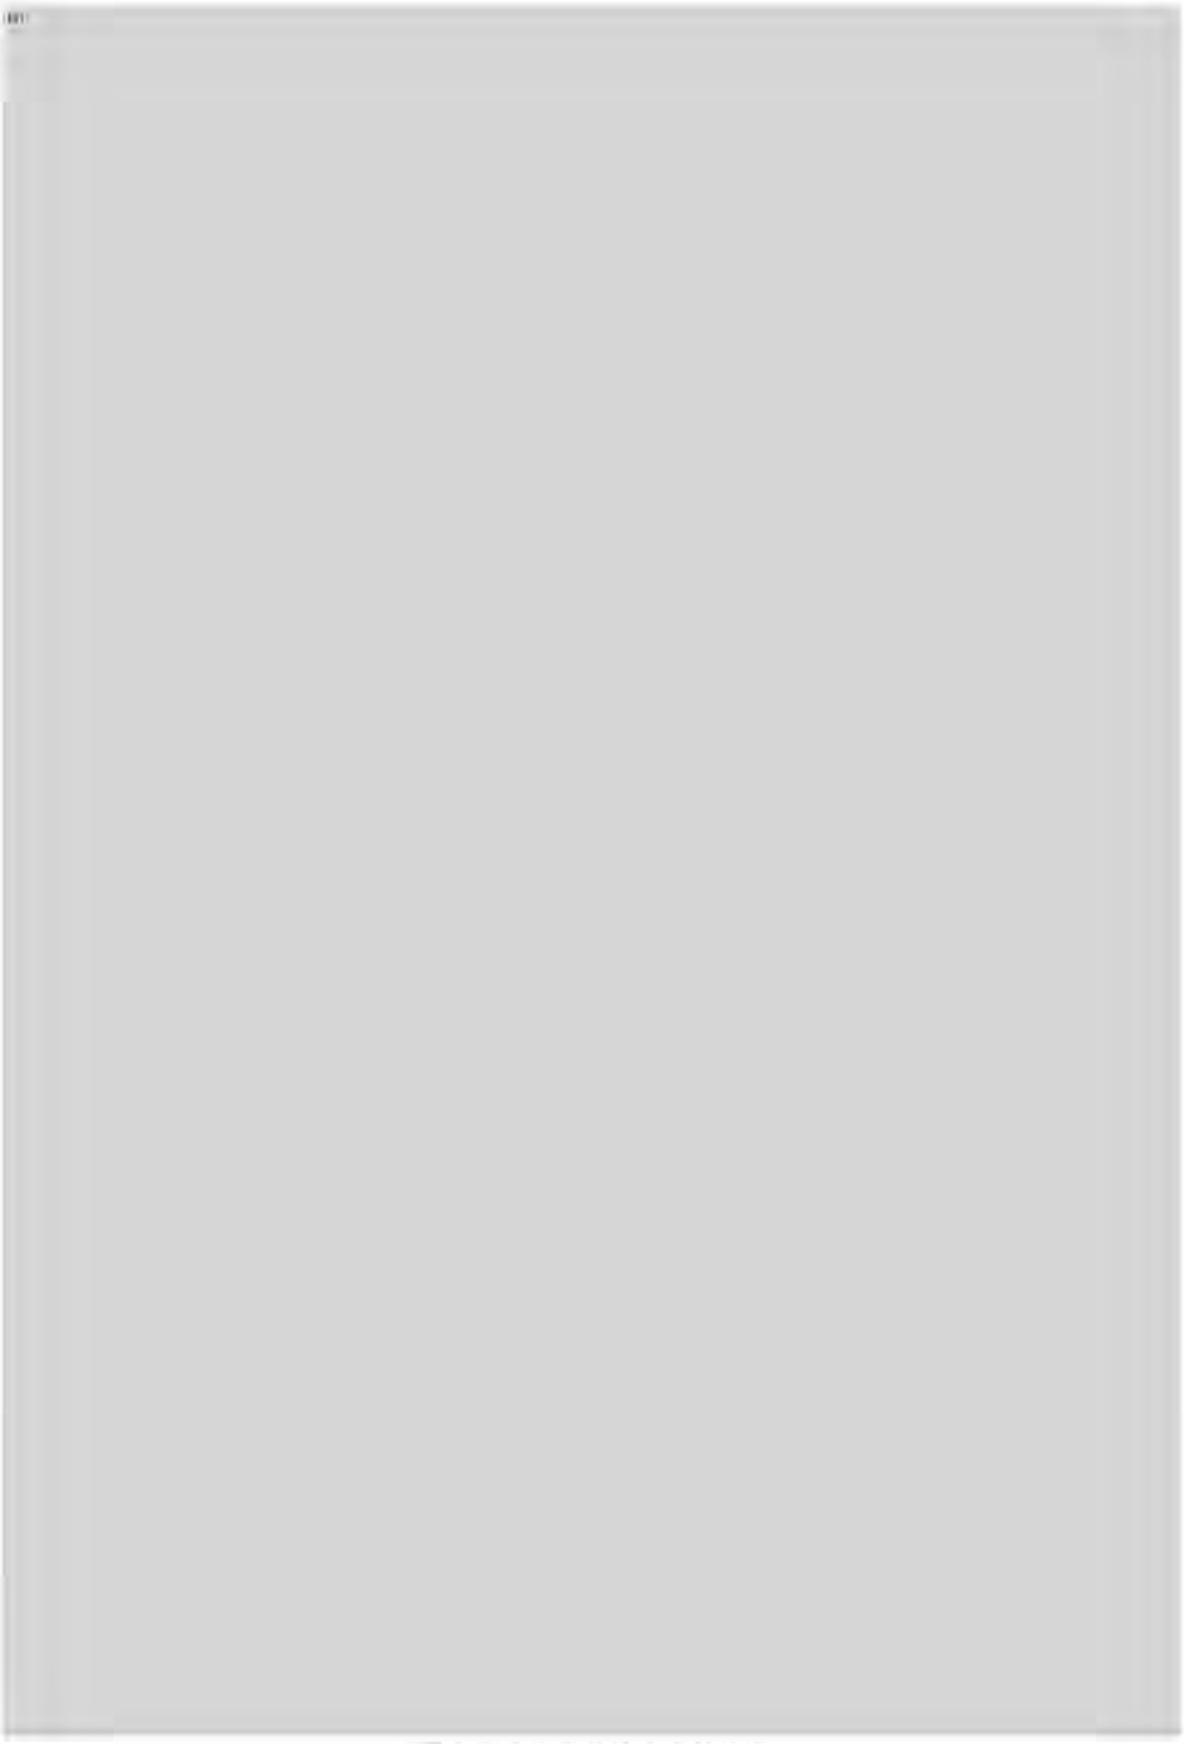

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 5 juli 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |

## 1 Opening en mededeling

- BR
  BR T.a.v. de PUK 5.1.2.e heeft DSO het stokje van team-Roba overgenomen. BR
  BR

BR

5.1.2.e

- DSO heeft wethouder memo gestuurd met stand van zaken PUK 5.1.2.e en de studie naar de twee varianten voor de watertoevoer.

BR

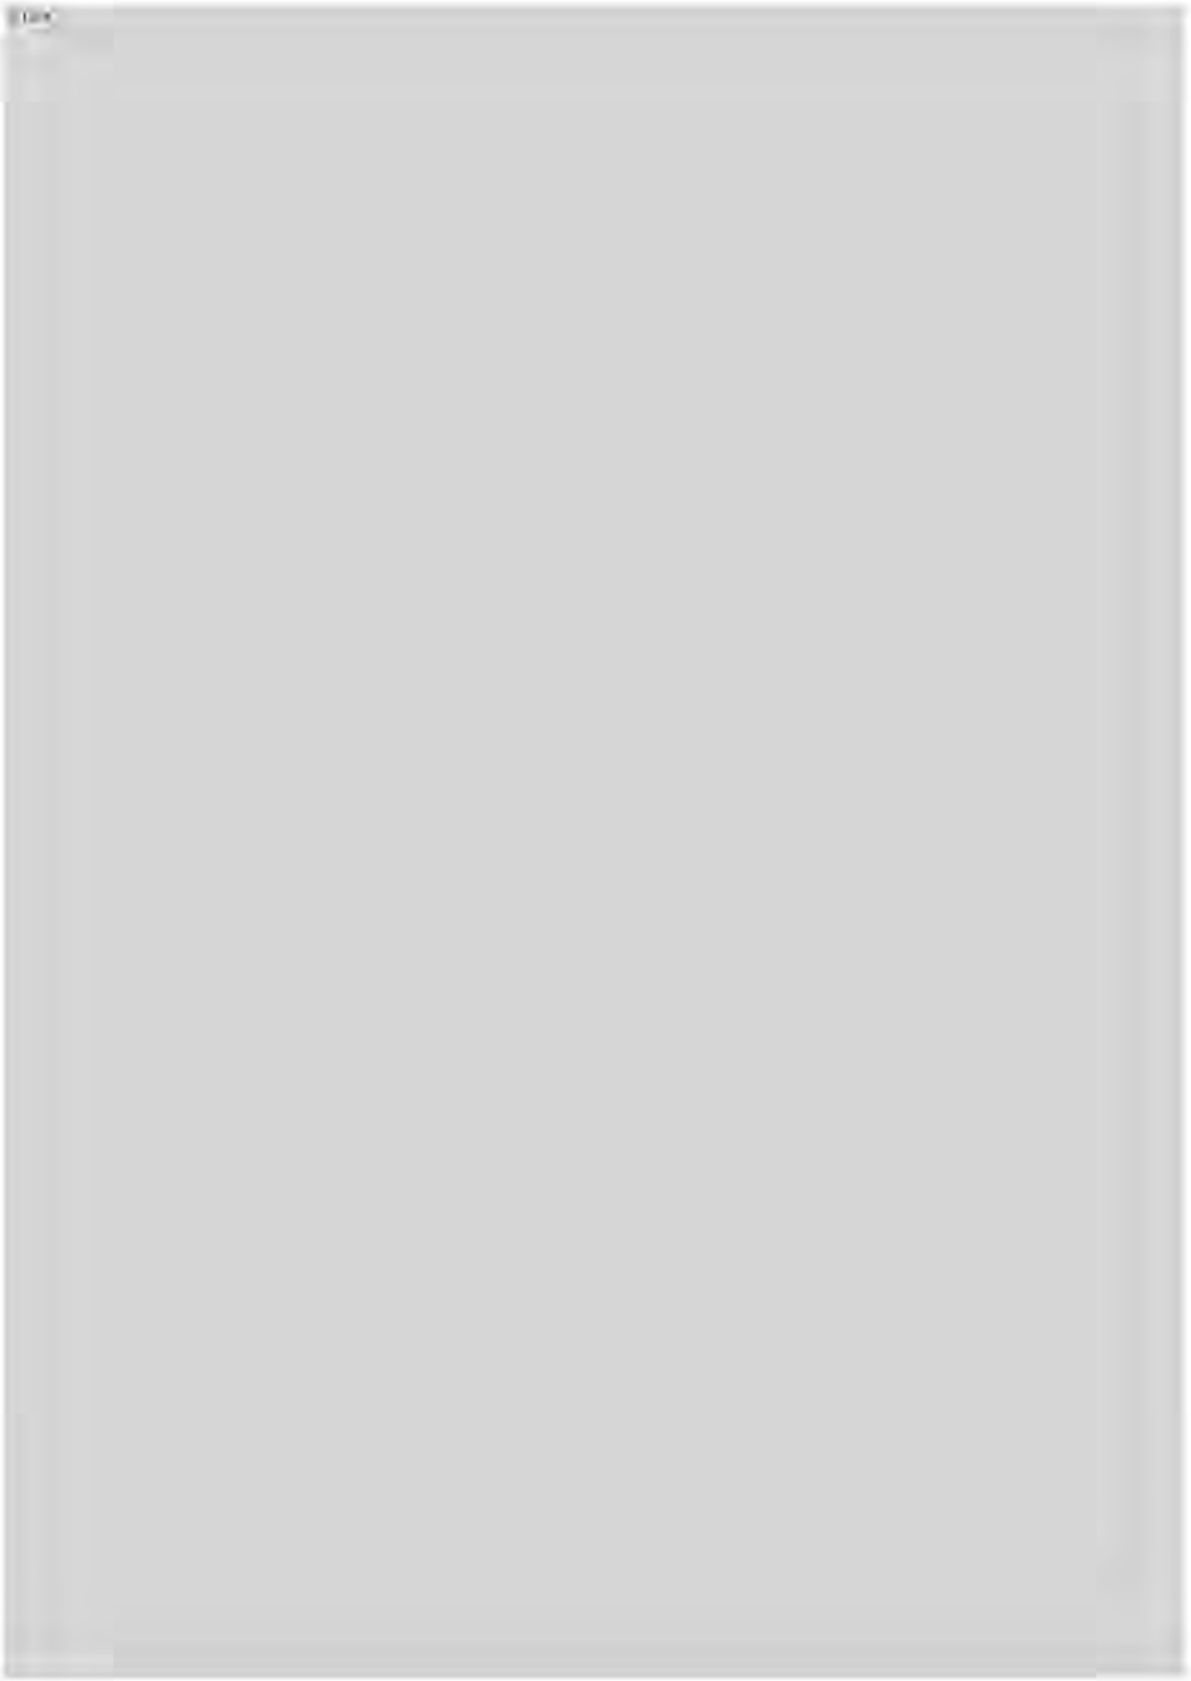

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 16 augustus 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e
5.1.2.e

Afwezig:

-

[redacted]

- Na overleg met DSO en Adviescommissie kan het onderdeel 'Indoorhal Drievliet' in planschadeclaims van 5.1.2.e en 5.1.2.e toch gezamenlijk door Adviescommissie behandeld worden met de onderdelen Molenvlietpark en Rotterdamsebaan. Over de indoorhal zal echter een separaat besluit genomen worden. DSO zal Drievliet een brief sturen en daarin toestemming vragen het via deze route door Adviescommissie te laten behandelen aangezien Drievliet de eventueel hieruit voortvloeiende schadevergoeding moet betalen.

[redacted]

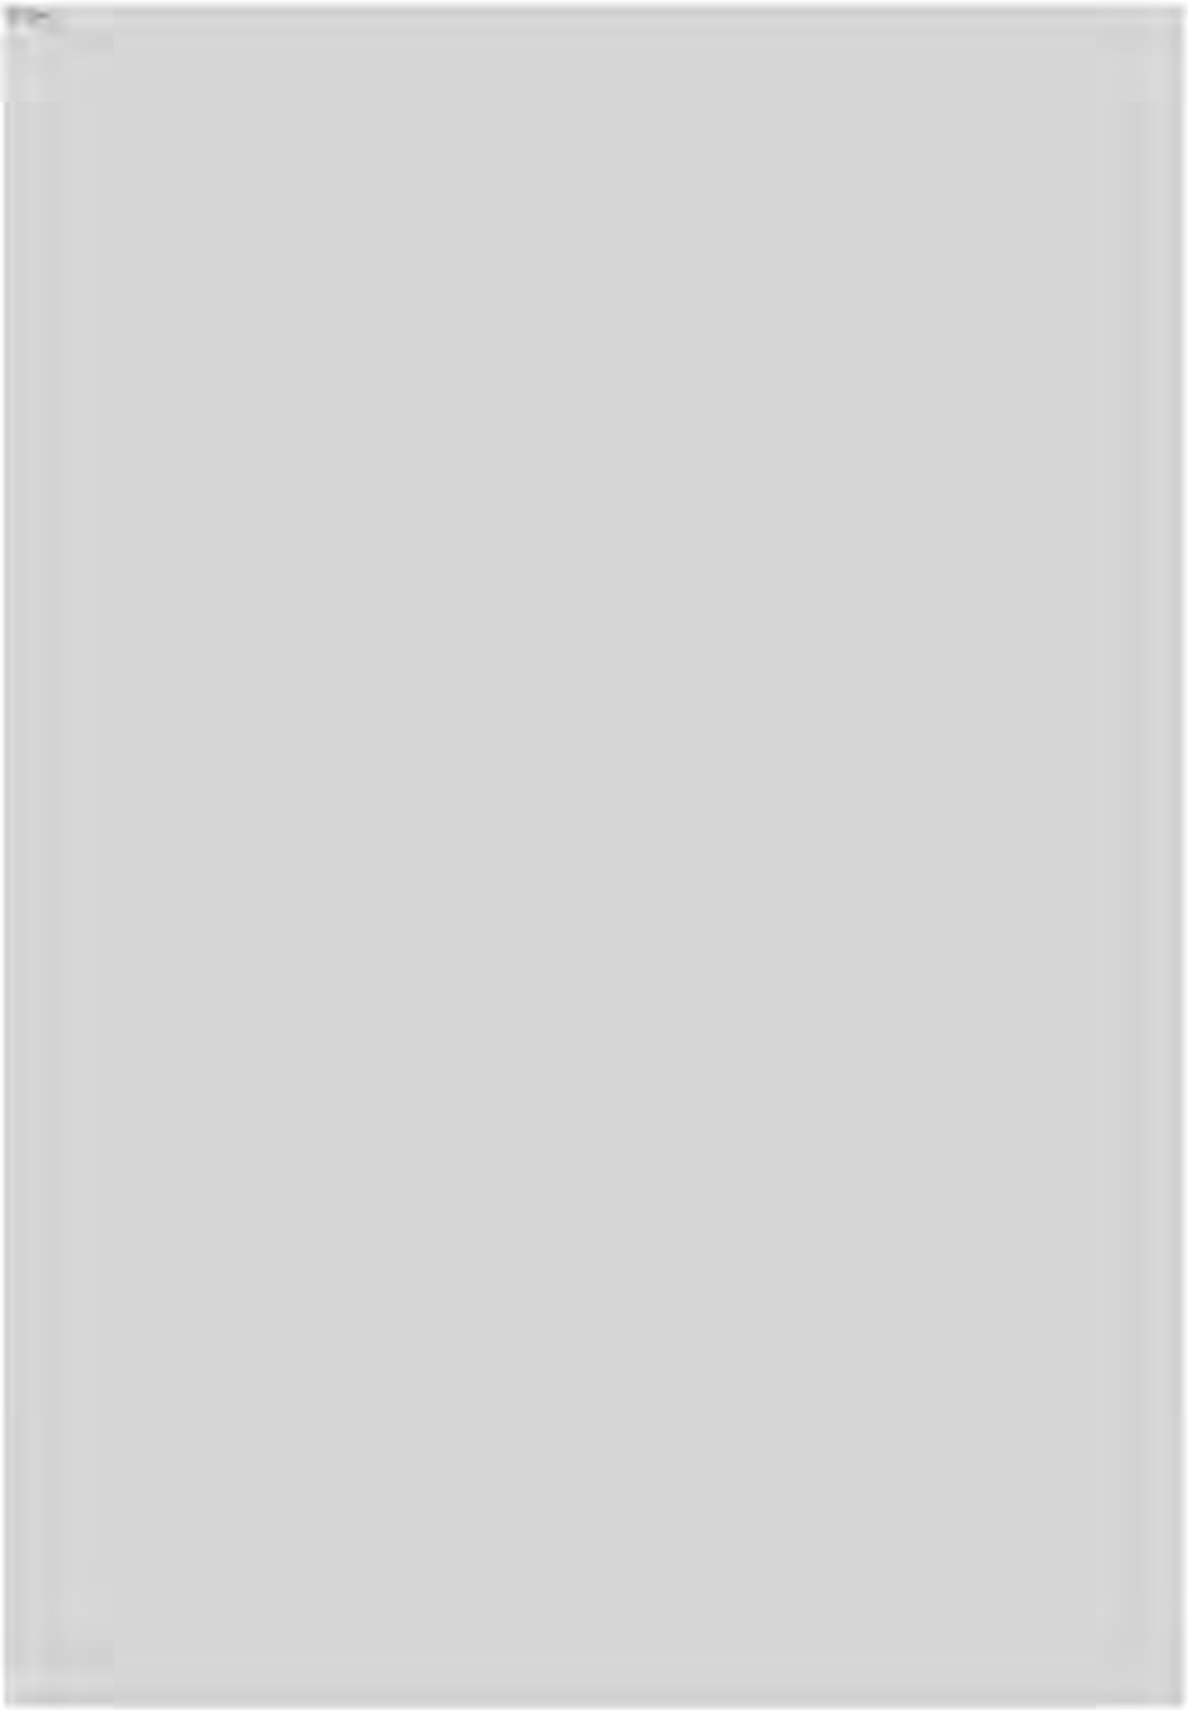

- 11 oktober Begeleidingscommissie over o.a. definitief ontwerp Molenvlietpark

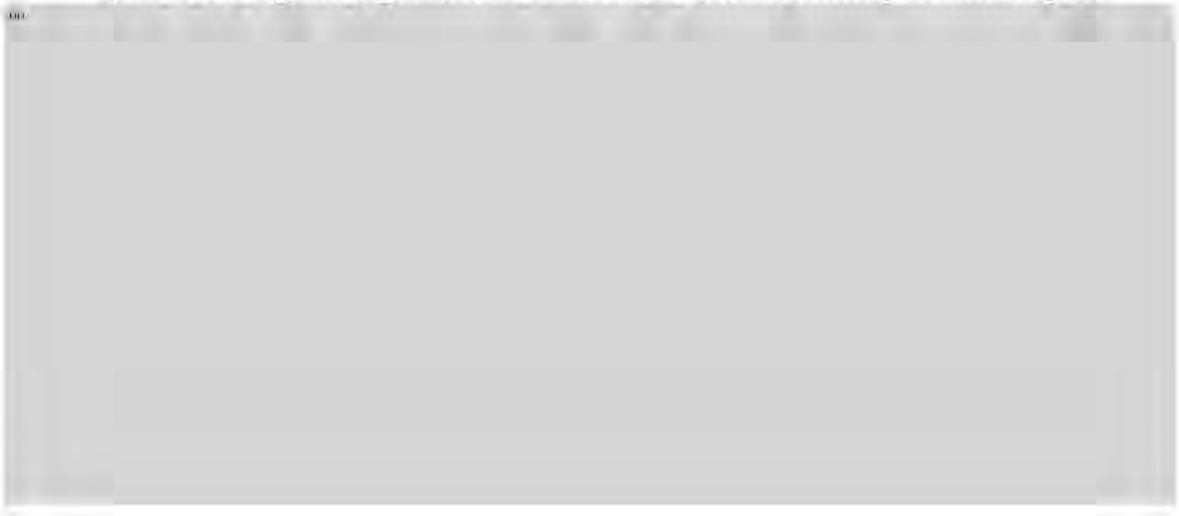

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr60

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 30 augustus 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

-

BR

- Maandag 4 september bespreken wethouder, 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e de waterinlaat. 5.1.2.e heeft laten weten de heren binnenkort graag te ontvangen voor een locatiebezoek.

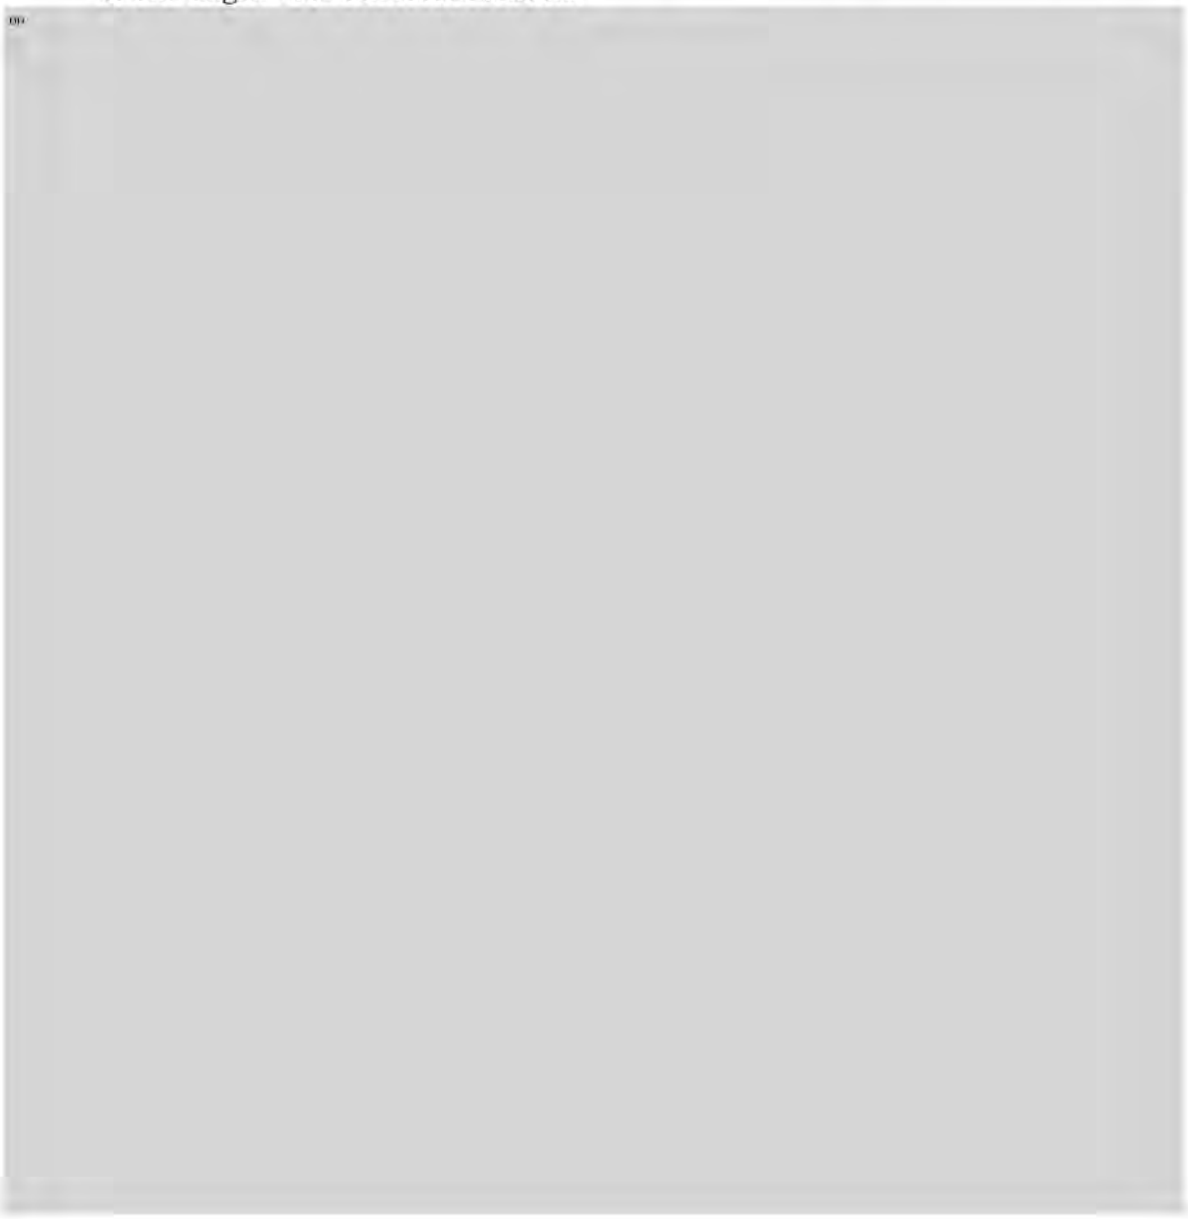

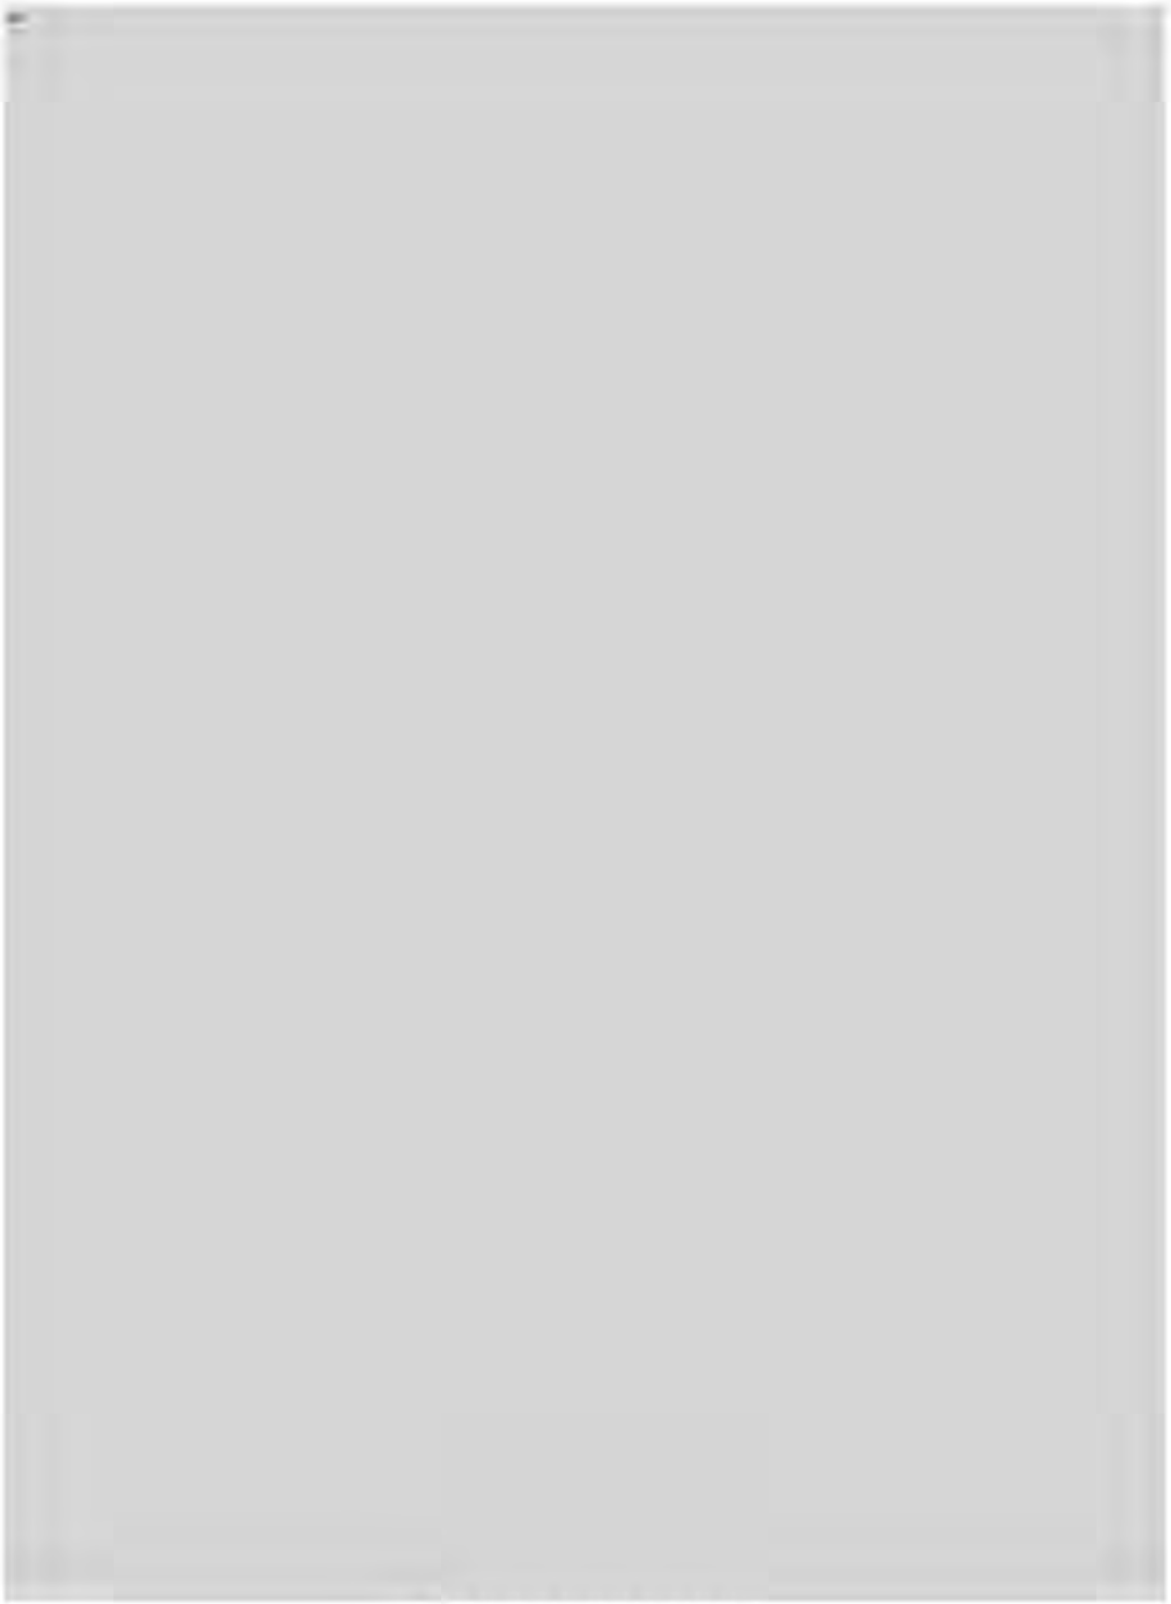

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 13september 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

- HHD wordt geïnformeerd over s.v.z. studies waterinlaat (incl. gesprekken 5.1.2.e ). Intern overleg 4 september bij wethouder is goed verlopen. In oktober brengen wethouder, 5.1.2.e en 5.1.2.e een bezoek aan 5.1.2.e

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Docnr62

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 11 oktober 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

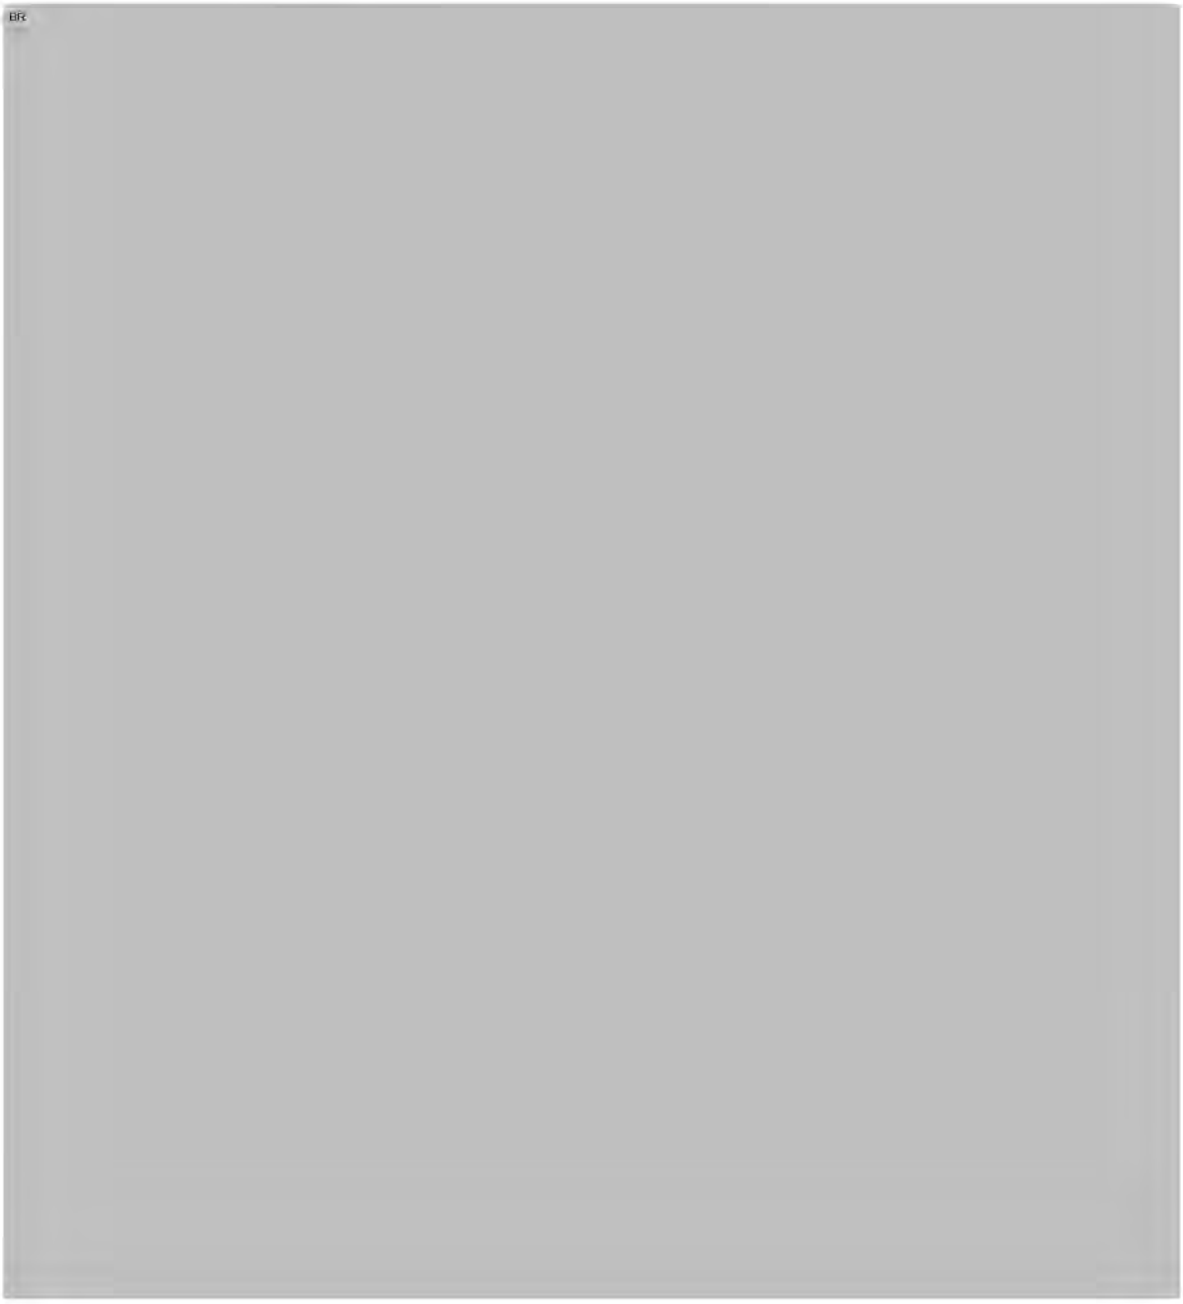

## 7 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

- Vanavond Begeleidingscommissie, grotendeels over het DO molenvlietpark.
- 13 oktober bezoeken wethouder, [redacted] en [redacted] de familie [redacted] i.h.k.v. de waterinlaat.

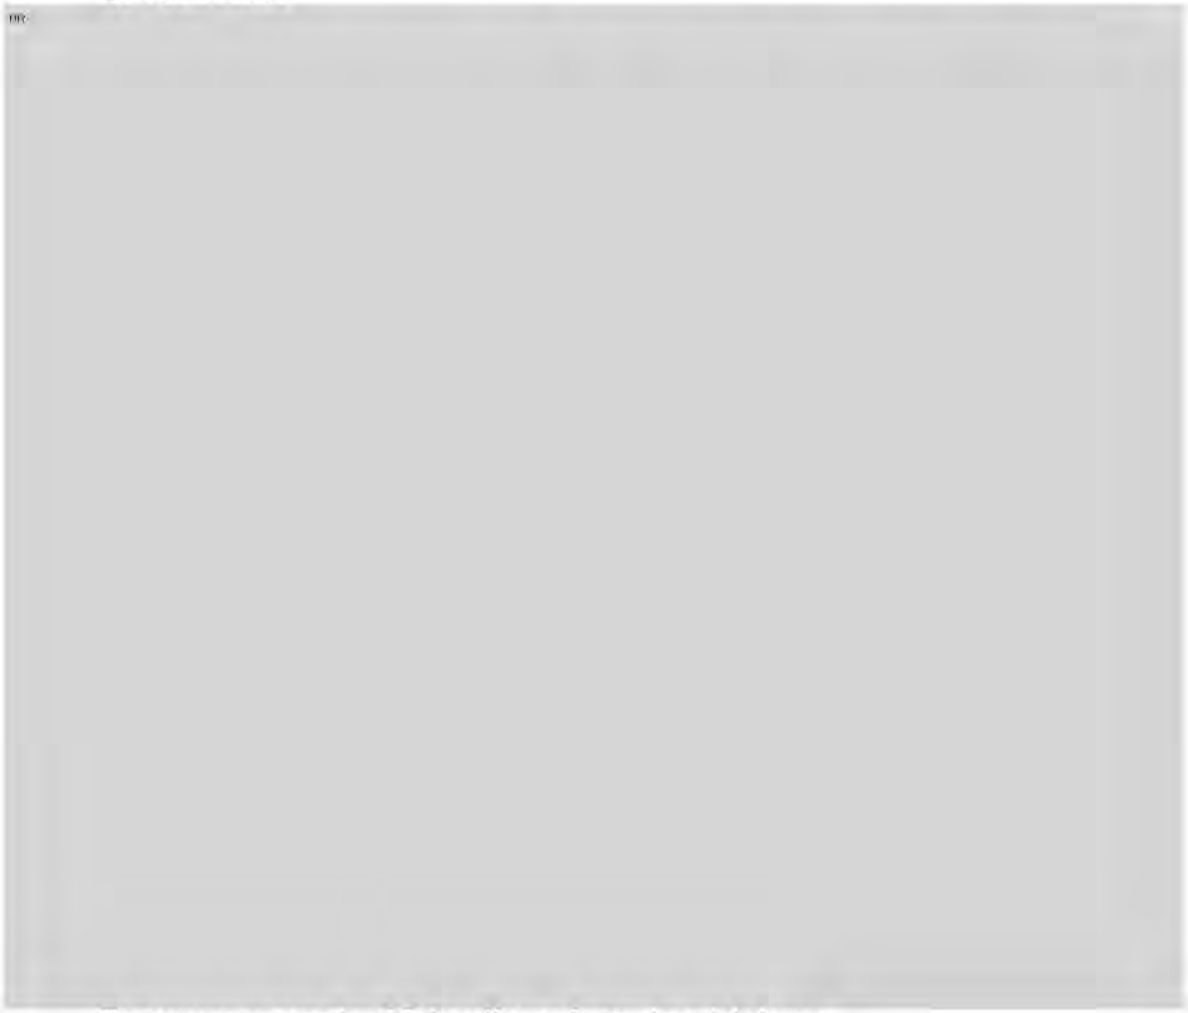

- De contouren van het Molenvlietpark worden zichtbaar.

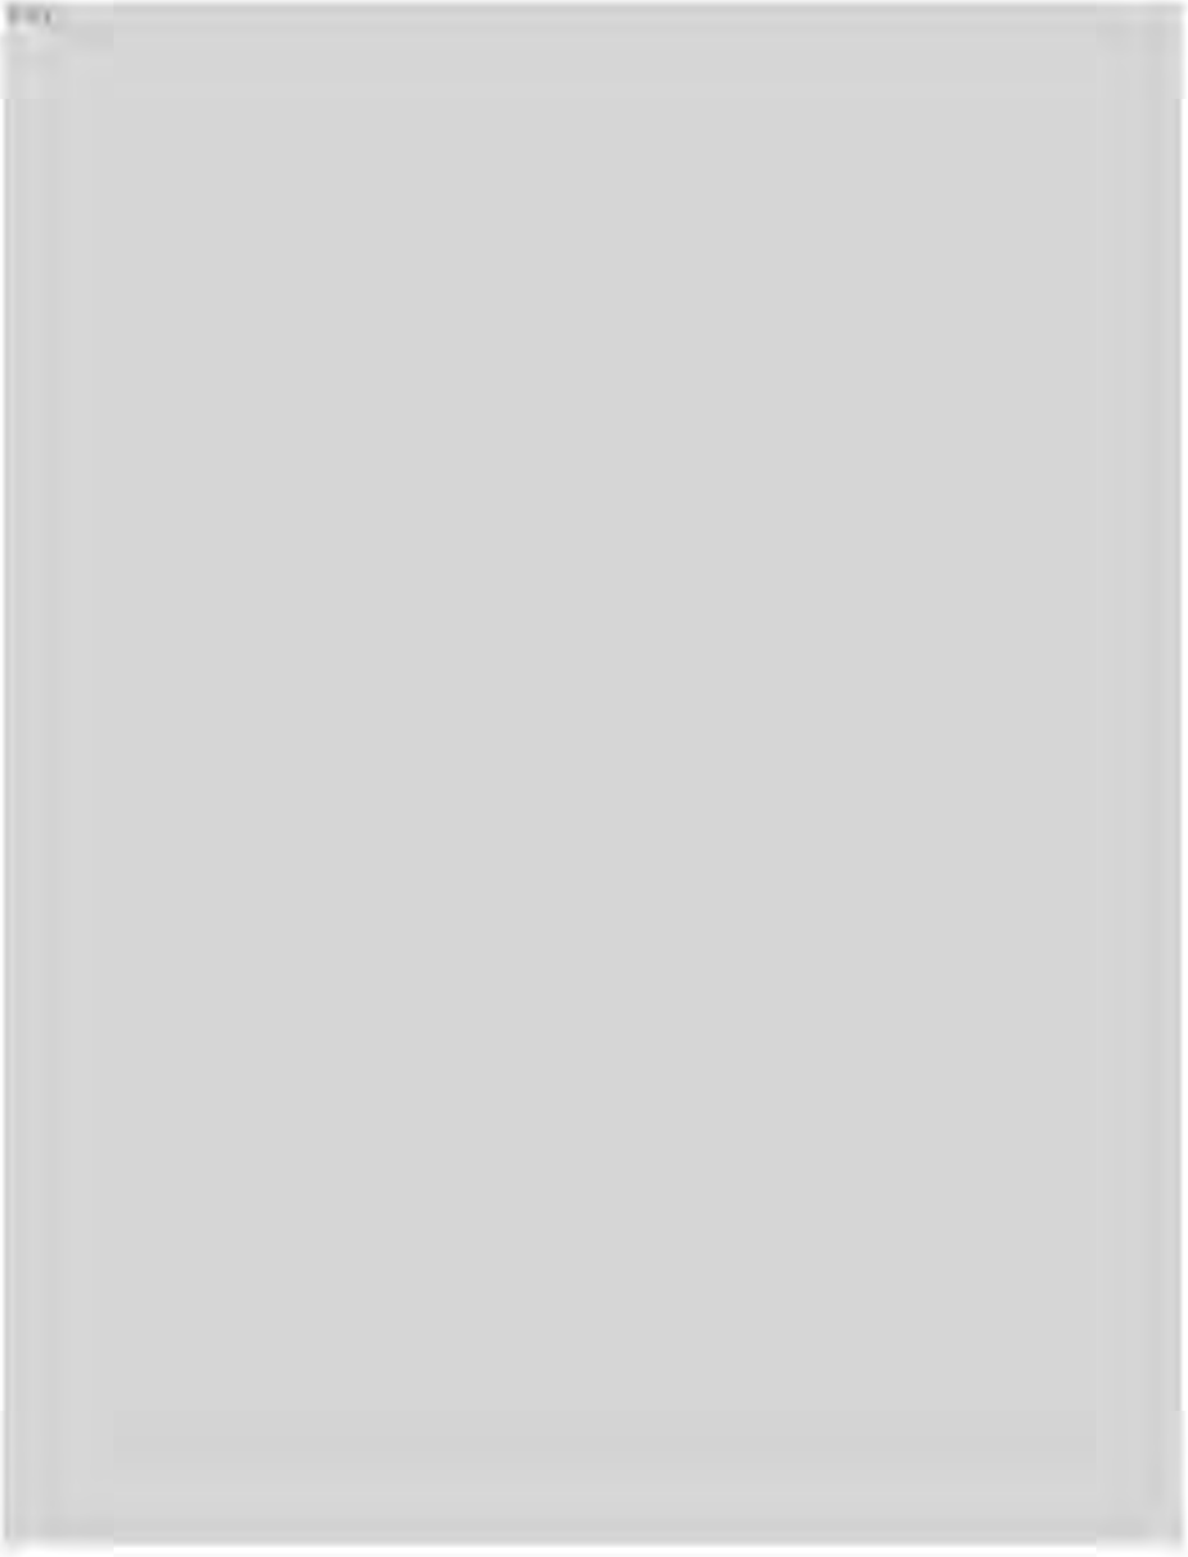

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 25 oktober 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

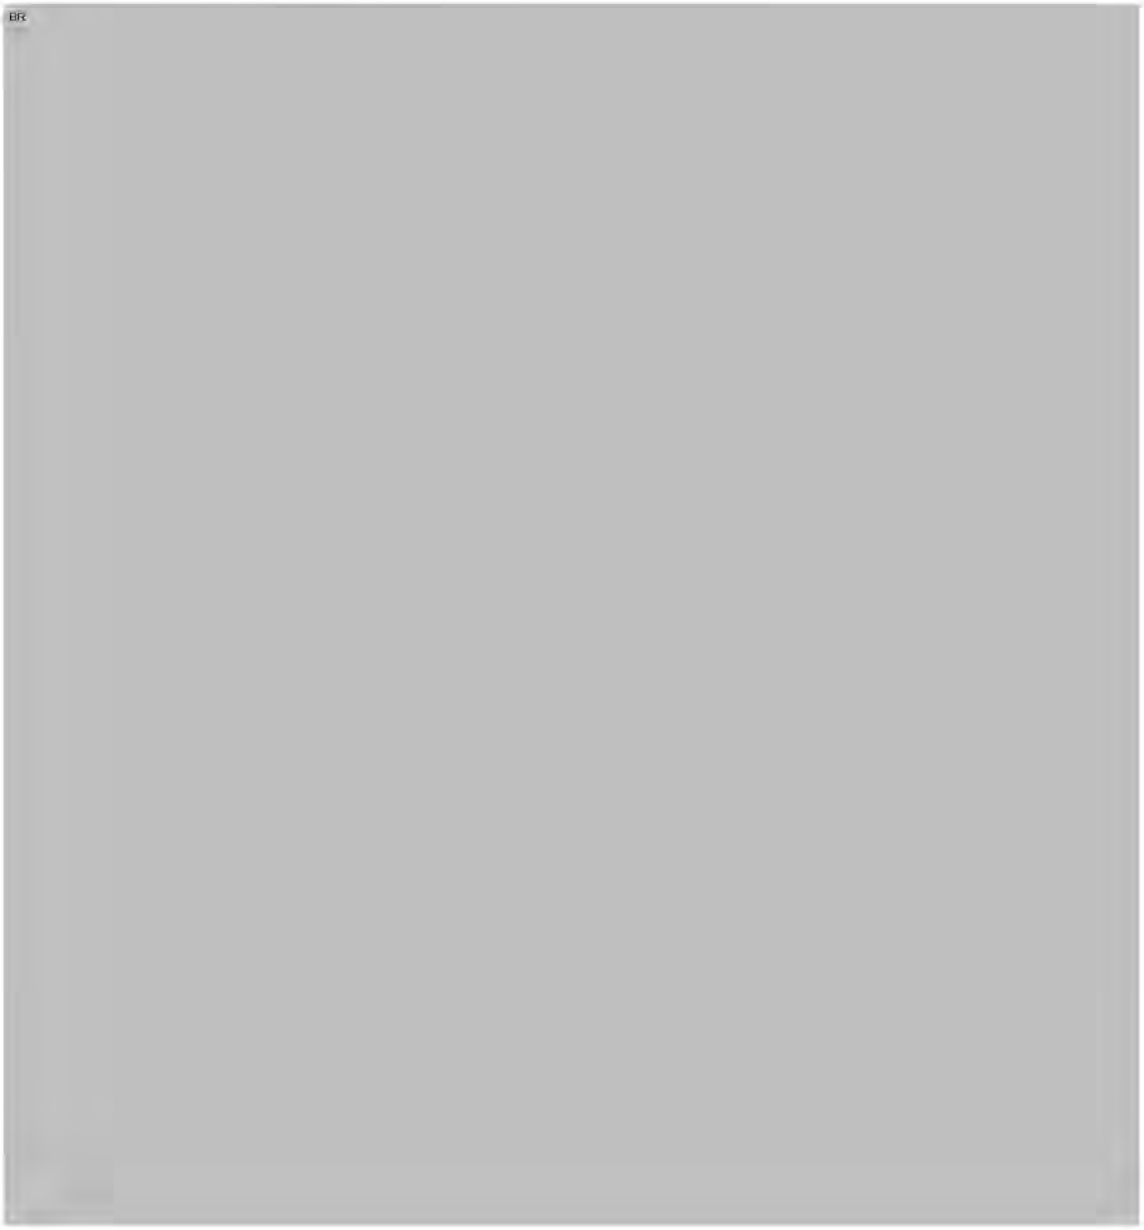

## 7 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

5.1.2.e

- 11 oktober is tijdens de Begeleidingscommissie het DO Molenvlietpark gepresenteerd en aangegeven dat openstelling fase1 verder vertraagd is tot ca november 2018. Deelnemers hebben hierop gevraagd of Molenslootpad wel al eerder open kan. CRB heeft aangegeven dat dit mogelijk zomer 2018 kan. Deelnemers hebben tevens vragen gesteld over de zichtbaarheid van de verlichting in het park vanaf de omliggende woningen. Die vragen dient nog nader beantwoord te worden. Mogelijk met visualisaties in zomer en winter of locatiebezoek vergelijkbaar park of dag/nacht+zomer/winter in VT-model opnemen.

5.1.2.e

- 13 oktober hebben wethouder, 5.1.2.e en 5.1.2.e een locatiebezoek aan fam. 5.1.2.e gebracht. Hierop zal DSO in één maand de PUK opstellen in lijn met de intentieovereenkomst. Concept-PUK akkoord bij 5.1.2.e dan zal hij met Roba de SOK watertoevoer voor over zijn perceel opstellen en ondertekenen. Deze variant heeft onze voorkeur aangezien ontwerp er al is en akkoord is bij HHD. Terugvaloptie blijft variant bij 5.1.2.e Verwervingstraject wordt voortgezet ongeachte de uiteindelijke variant gezien de impact, overlast en noodzakelijke medewerking aldaar.

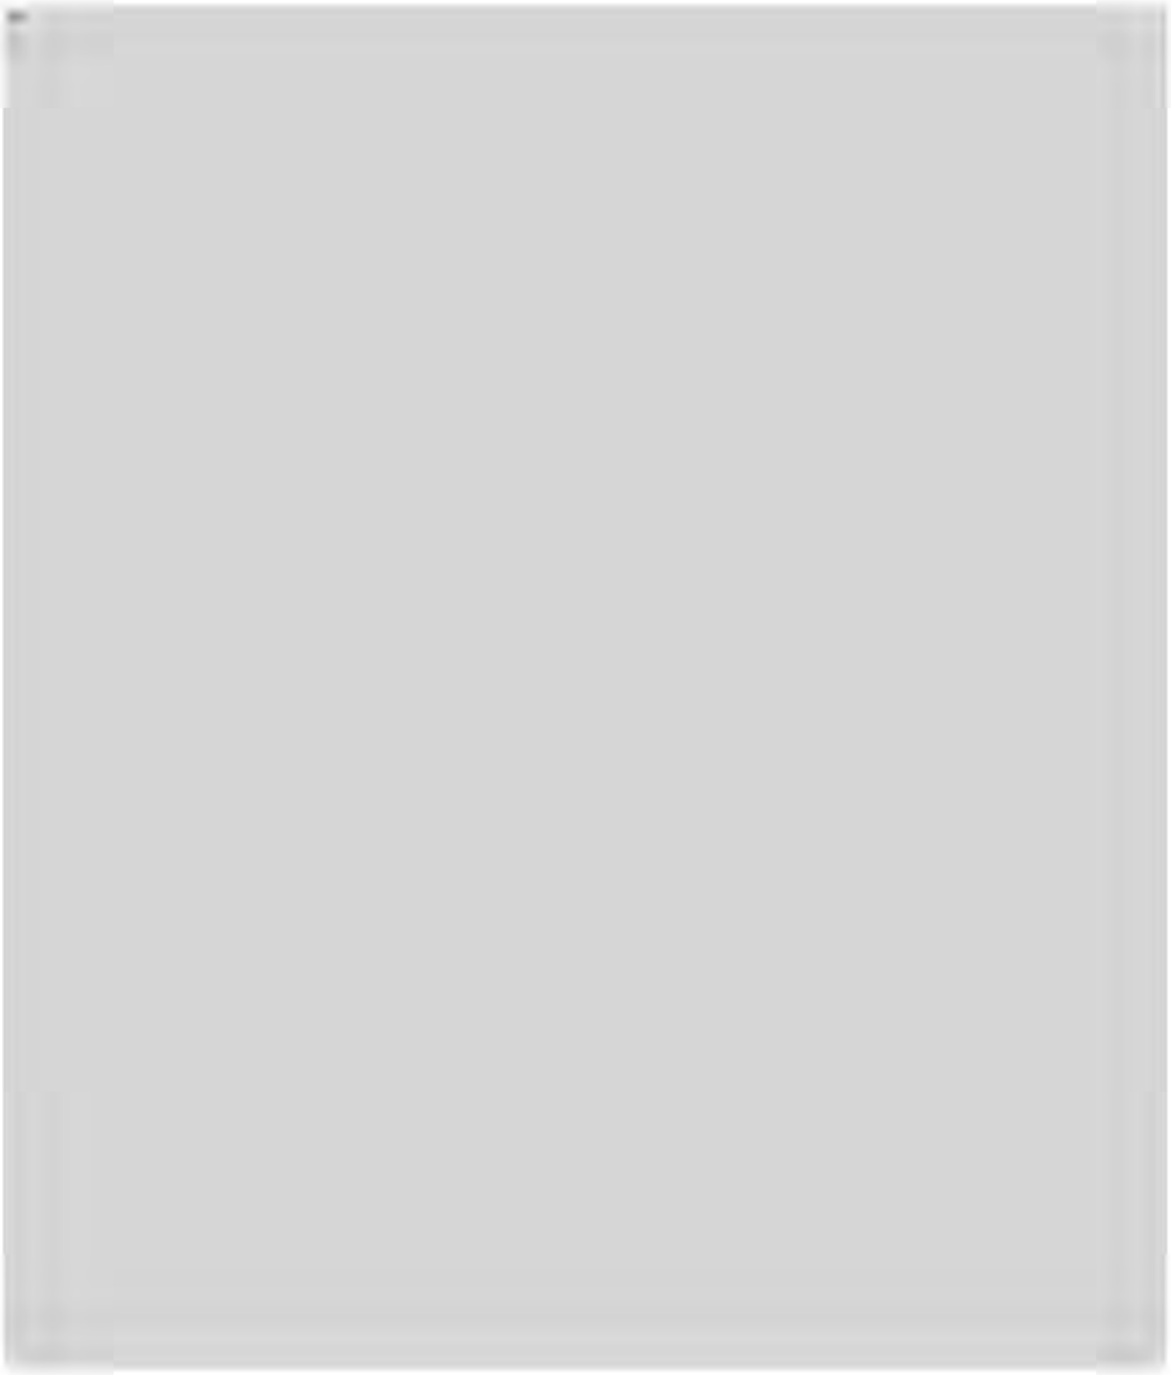

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr64

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 22 november 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | - |

BR

## 4 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- Morgen wordt het PUK-proces opnieuw opgestart in overleg met DSO. DSO zal binnenkort het concept met 5.1.2.e bespreken.

BR

- HHD wijst op de noodzakelijke doorvaarbaarheid van de brug cq. duiker bij de Molensloot indien de waterinlaat niet via terrein van 5.1.2.e komt te lopen. CRB is wegens komend broedseizoen voornemens al een kapvergunning aan te vragen voor in ieder geval 1 boom.

BR

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 13 december 2017 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

-

BR

## 7 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

- 5.1.2.e lijkt akkoord met het bouwvolume en –locaties zoals in concept-PUK is opgenomen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel m² van zijn perceel beïnvloed wordt door de te realiseren waterinlaat (incl. beschermingszones).
- De betreffende bewoners van Park Hoornwijck zijn geïnformeerd over de komst van een kleine duiker i.p.v. een brug achter hun woningen in het Molenvlietpark. Het was hun verzoek en daaraan kunnen we medewerking verlenen.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr66

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 1 februari 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

BR

- DSO rondt waarschijnlijk in februari de PUK Borgdorff af. Daarna kan Roba in gesprek over de uitgangspunten voor de waterinlaat in de SOK.

BR

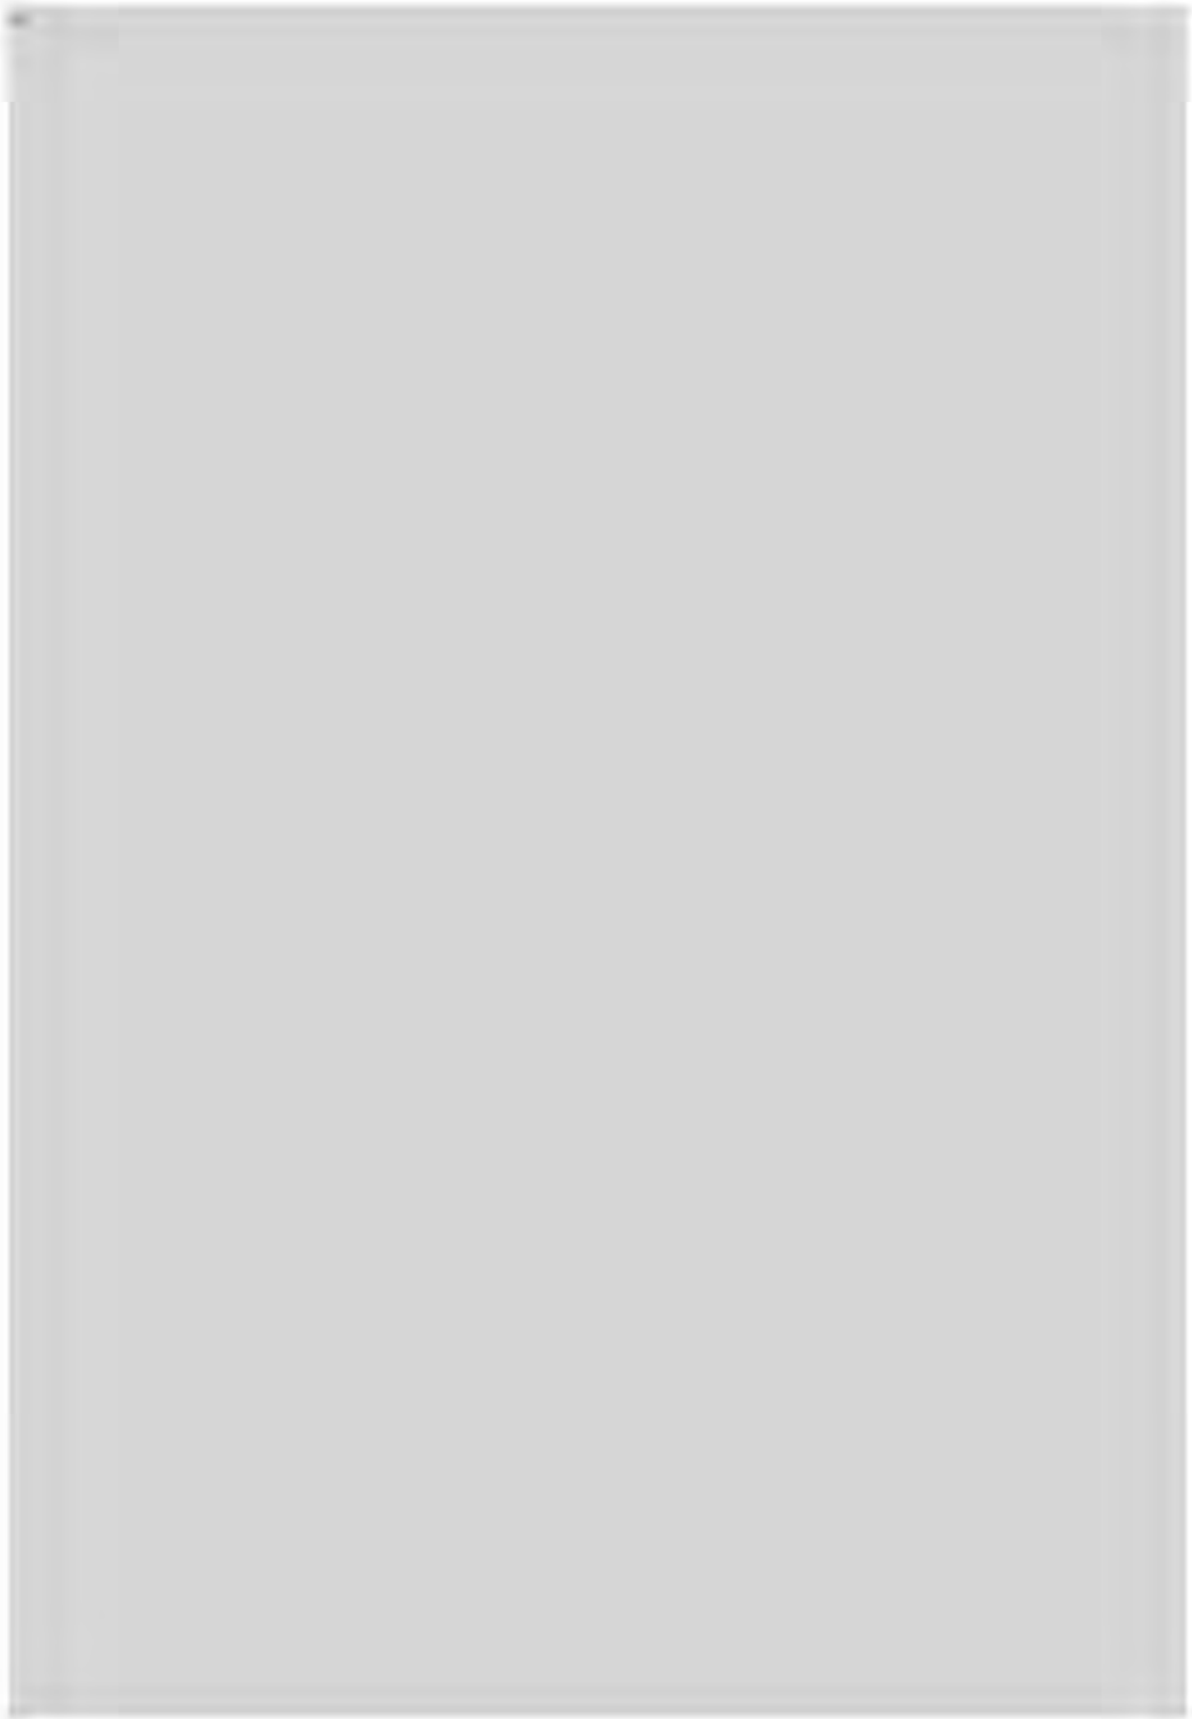

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 28 februari 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

[redacted]

## 4 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- DSO en 5.1.2.e hebben overeenstemming bereikt over het bouwprogramma. De PUK wil men 20 maart in het college vaststellen. Roba zal 5.1.2.e benaderen om afspraken over de waterinlaat vast te leggen vooruitlopend op een samenwerkingsovereenkomst.

[redacted]

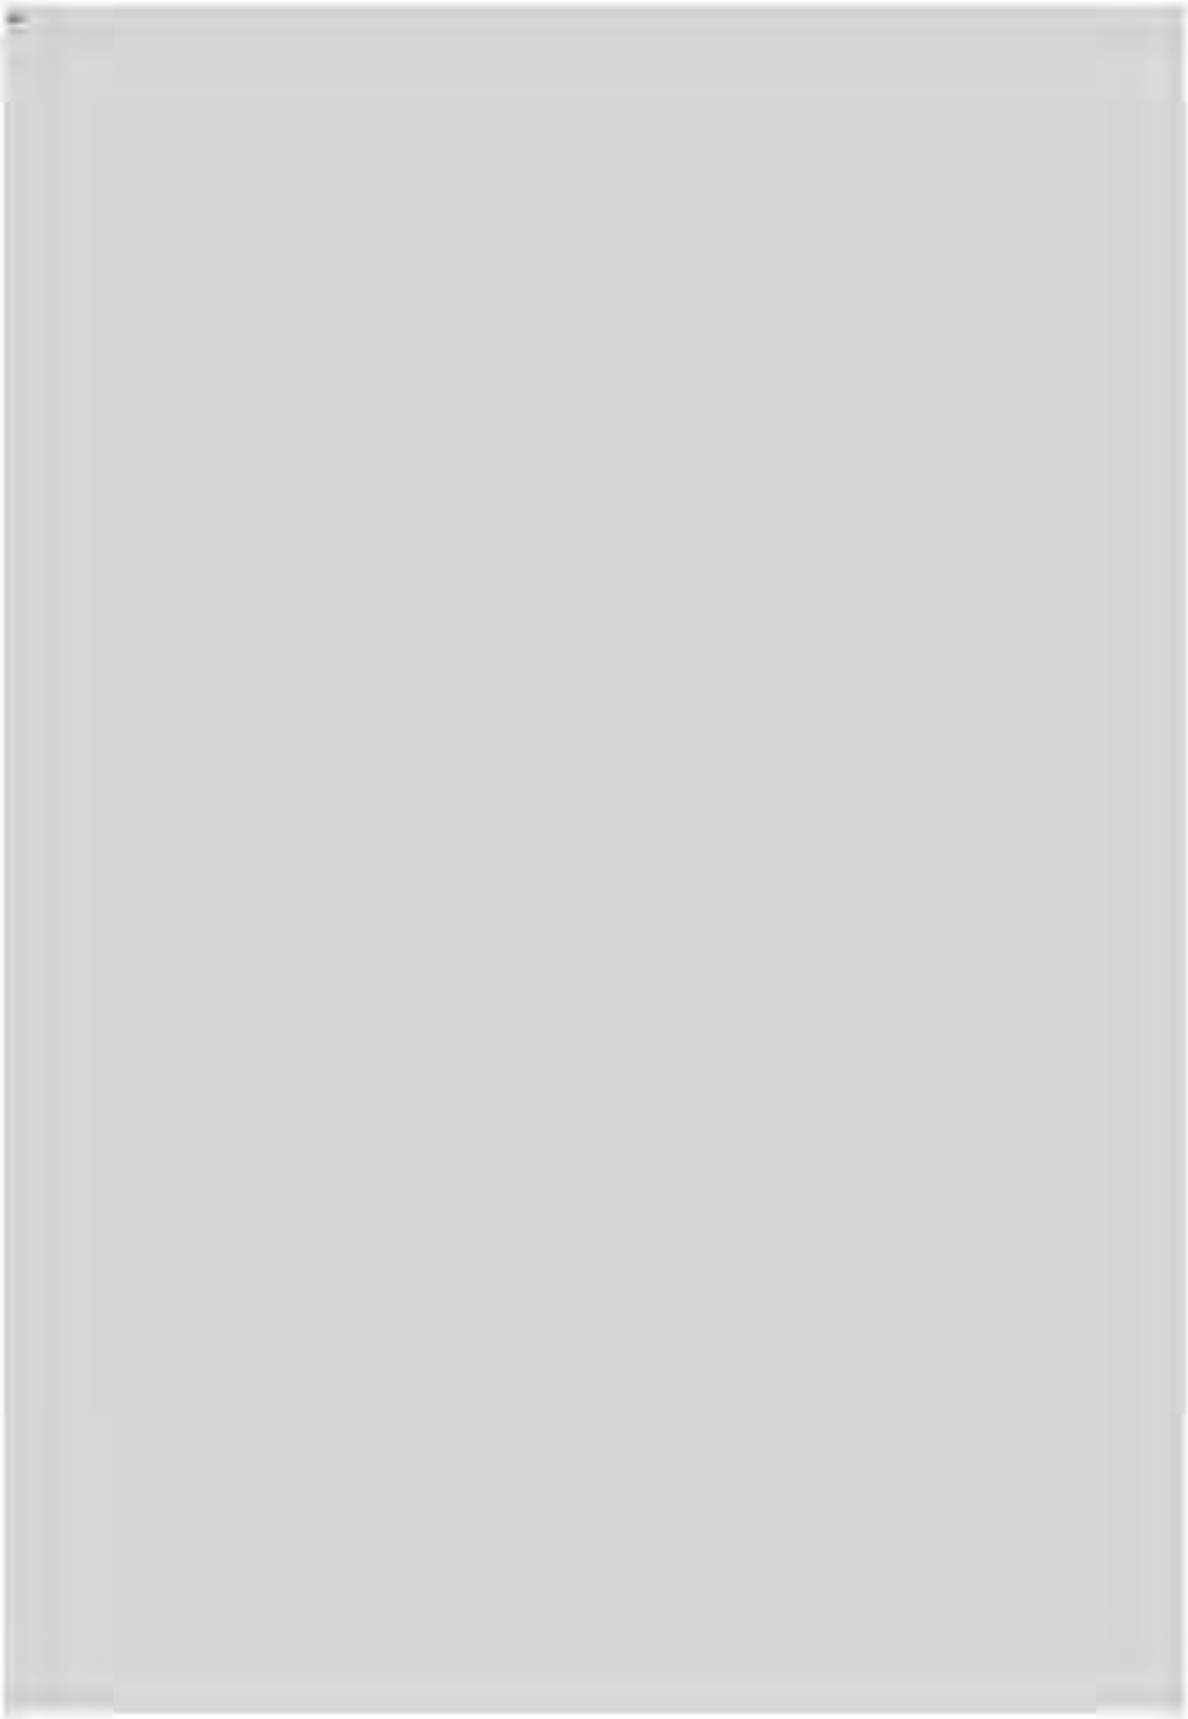

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 14 maart 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |

BR

## 3 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

BR

- PUK Nieuw Vredenoord is gisteren afgerond (akkoord van Den Haag en 5.1.2.e ) en de besluitvorming is voorbereid voor collegevergadering van 20 maart 2018.
- 5.1.2.e en 5.1.2.e hebben 5.1.2.e gesproken: medewerking alvast verkregen voor natuuronderzoek en nadere inventarisatie van bomen. Op 20 maart volgt een gesprek over de samenwerkingsovereenkomst. Delfland zal de projectplanprocedure gaan voorbereiden/starten.

BR

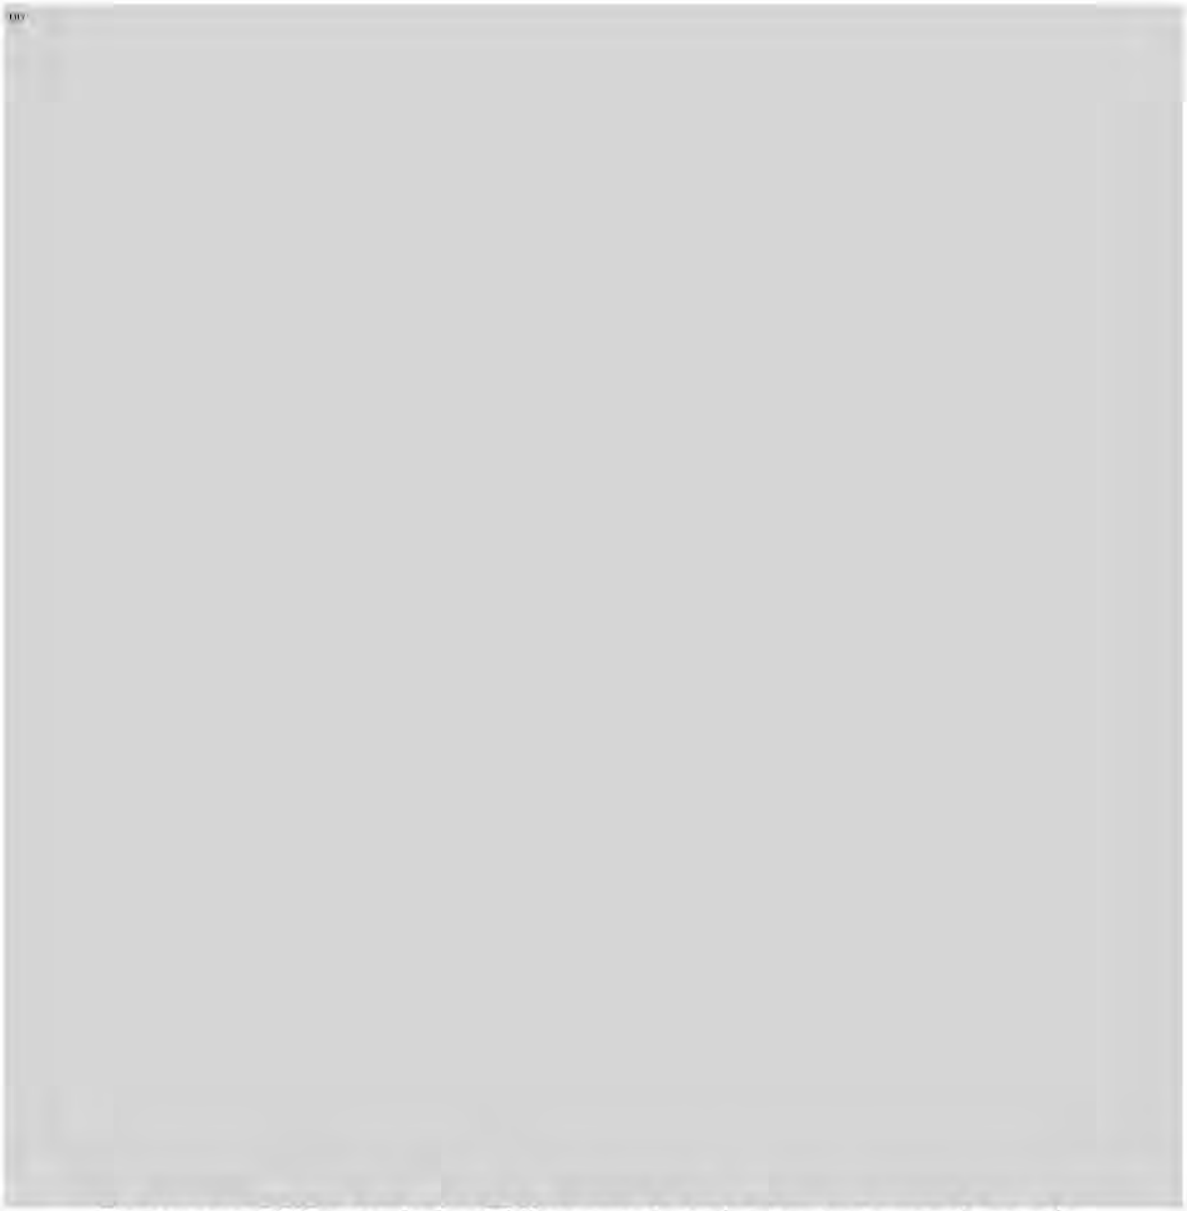

- De concept-SOK t.a.v. de Jan Thijssenweg i.r.t. de 2e watertoevoer is met de provincie besproken. De reactie van de provincie wordt nog afgwacht.
- 5.1.2.e zal onderzoeken of de 2e watertoevoer als contractwijziging aan CRB opgedragen kan worden, eventueel via toestemming van de tenderboard.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 28 maart 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

## 4 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

BR

- PUK Nieuw Vredenoord is 20 maart vastgesteld door het college.

BR

- 5.1.2.e gesproken over de te realiseren voetgangersbrug tussen Park Hoornwijck en het Molenvlietpark. Ontwerp is geoptimaliseerd, maar de familie is voornemens bezwaar te maken tegen de binnenkort aan te vragen vergunning.

BR

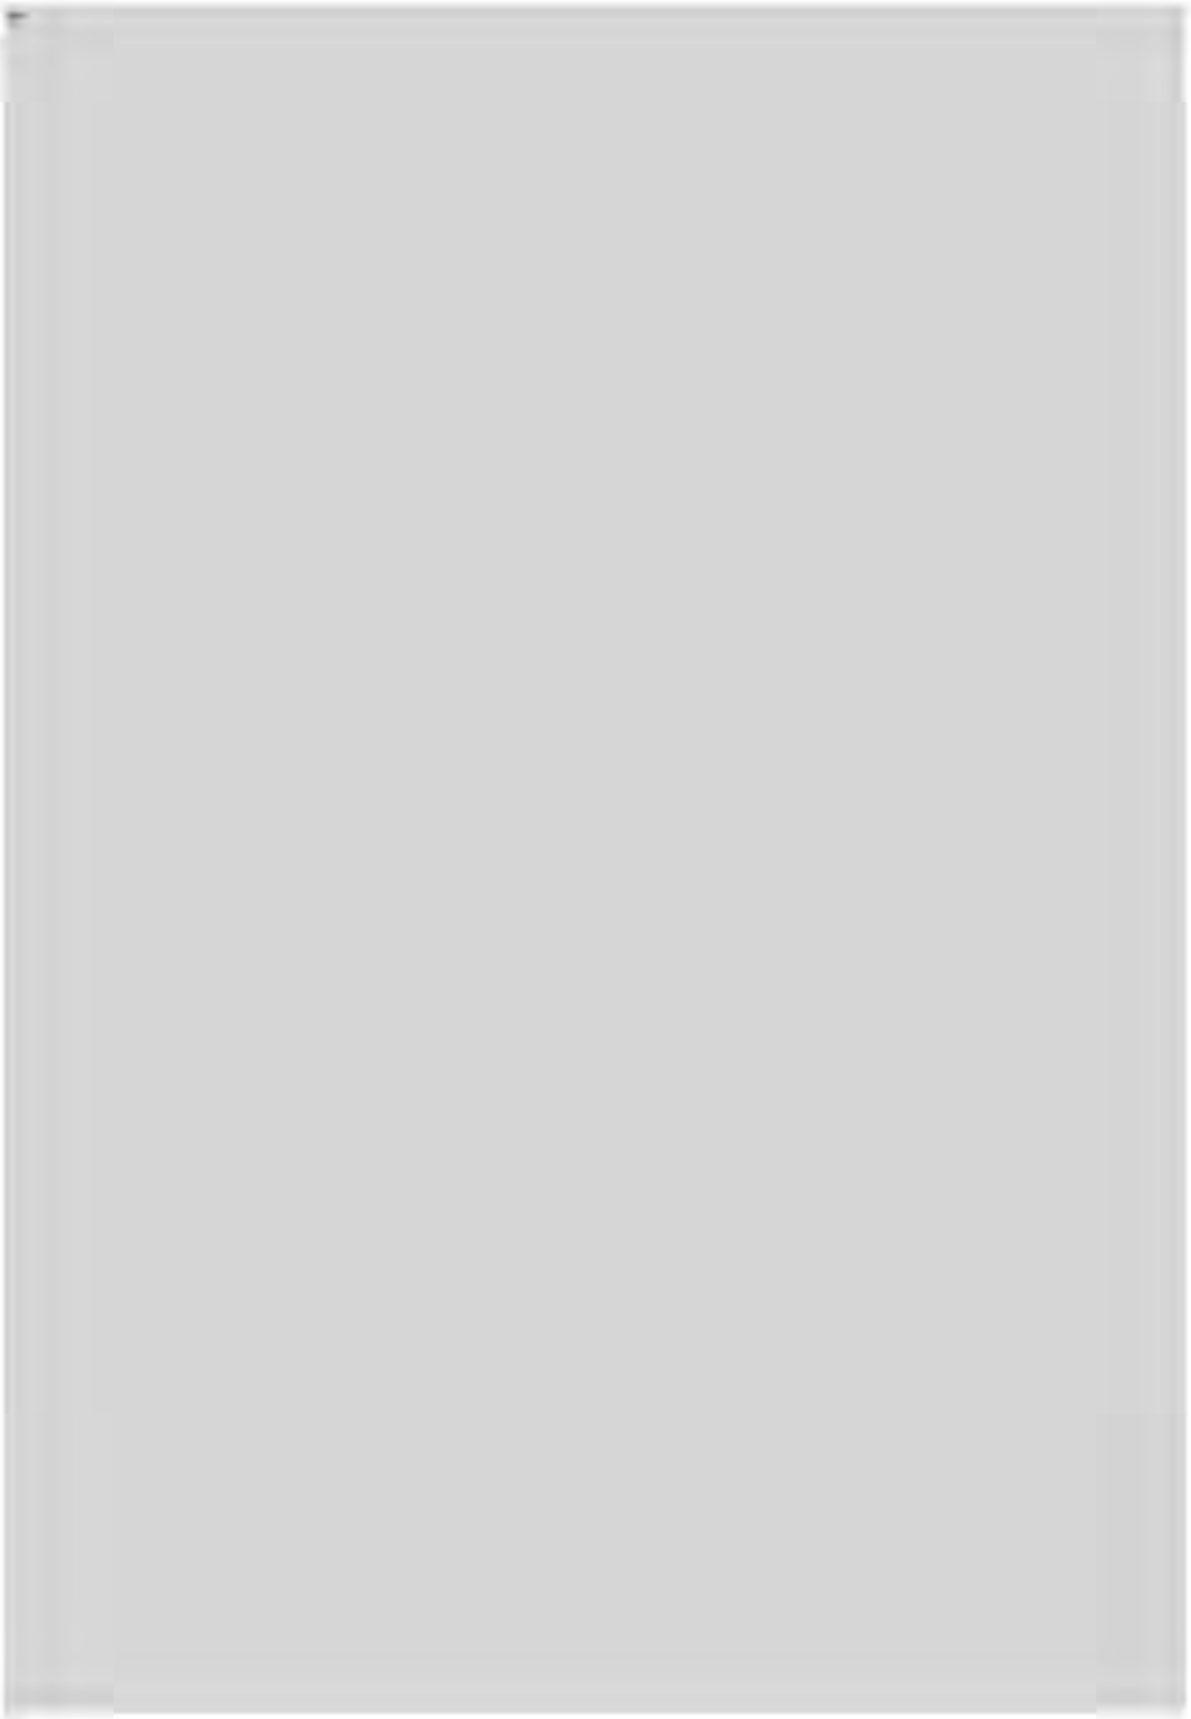

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 11 april 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

BR

- [redacted] stuurt binnenkort brief waarin hij medewerking verleend aan voorbereiden watertoevoer, vooruitlopend op de nog op te stellen SOK.

- Met Grondzaken en eigenaar Jan Thijsenweg 8 gesproken over werkzaamheden en ontwerp watertoevoer. Wellicht komt er een grondtransactie om bereikbaarheid etc. Te verbeteren.

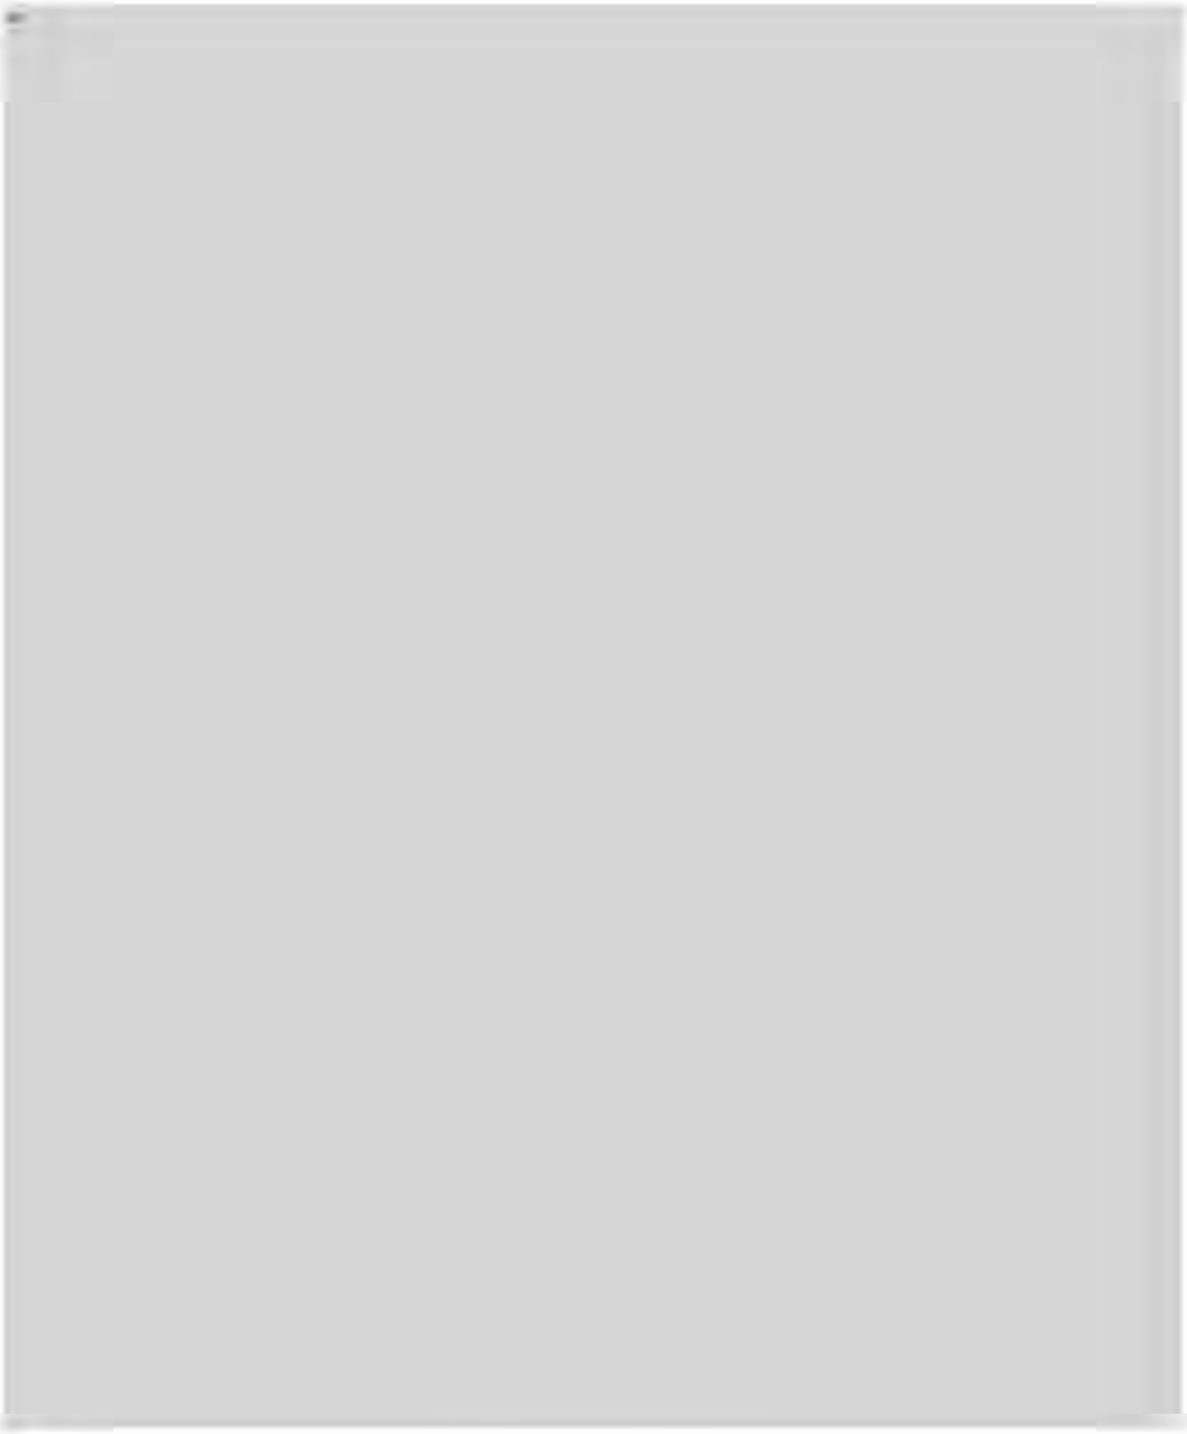

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 9 mei 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

## 4 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- 5.1.2.e heeft brief gestuurd waarin hij medewerking verleend aan voorbereiden watertoevoer, vooruitlopend op de nog op te stellen SOK. Het Hoogheemraadschap is de projectplanprocedure gestart.

BR

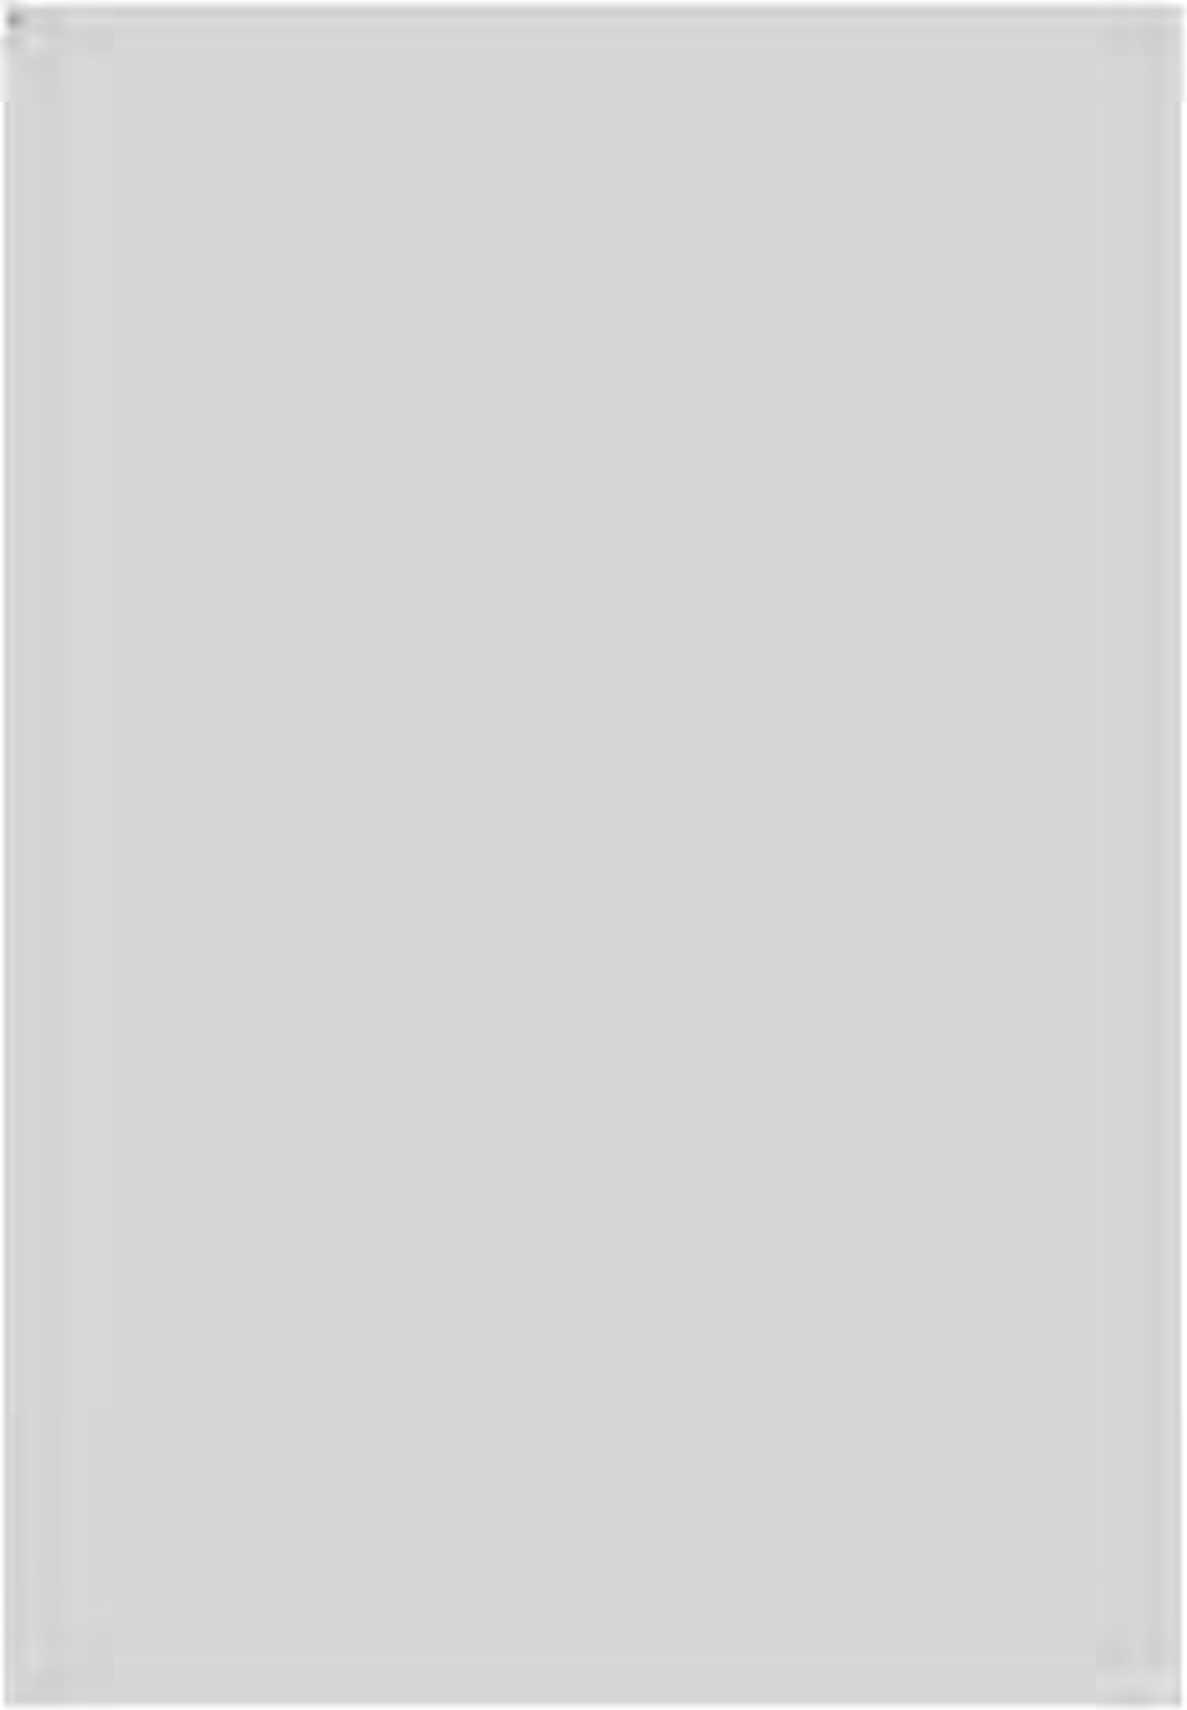

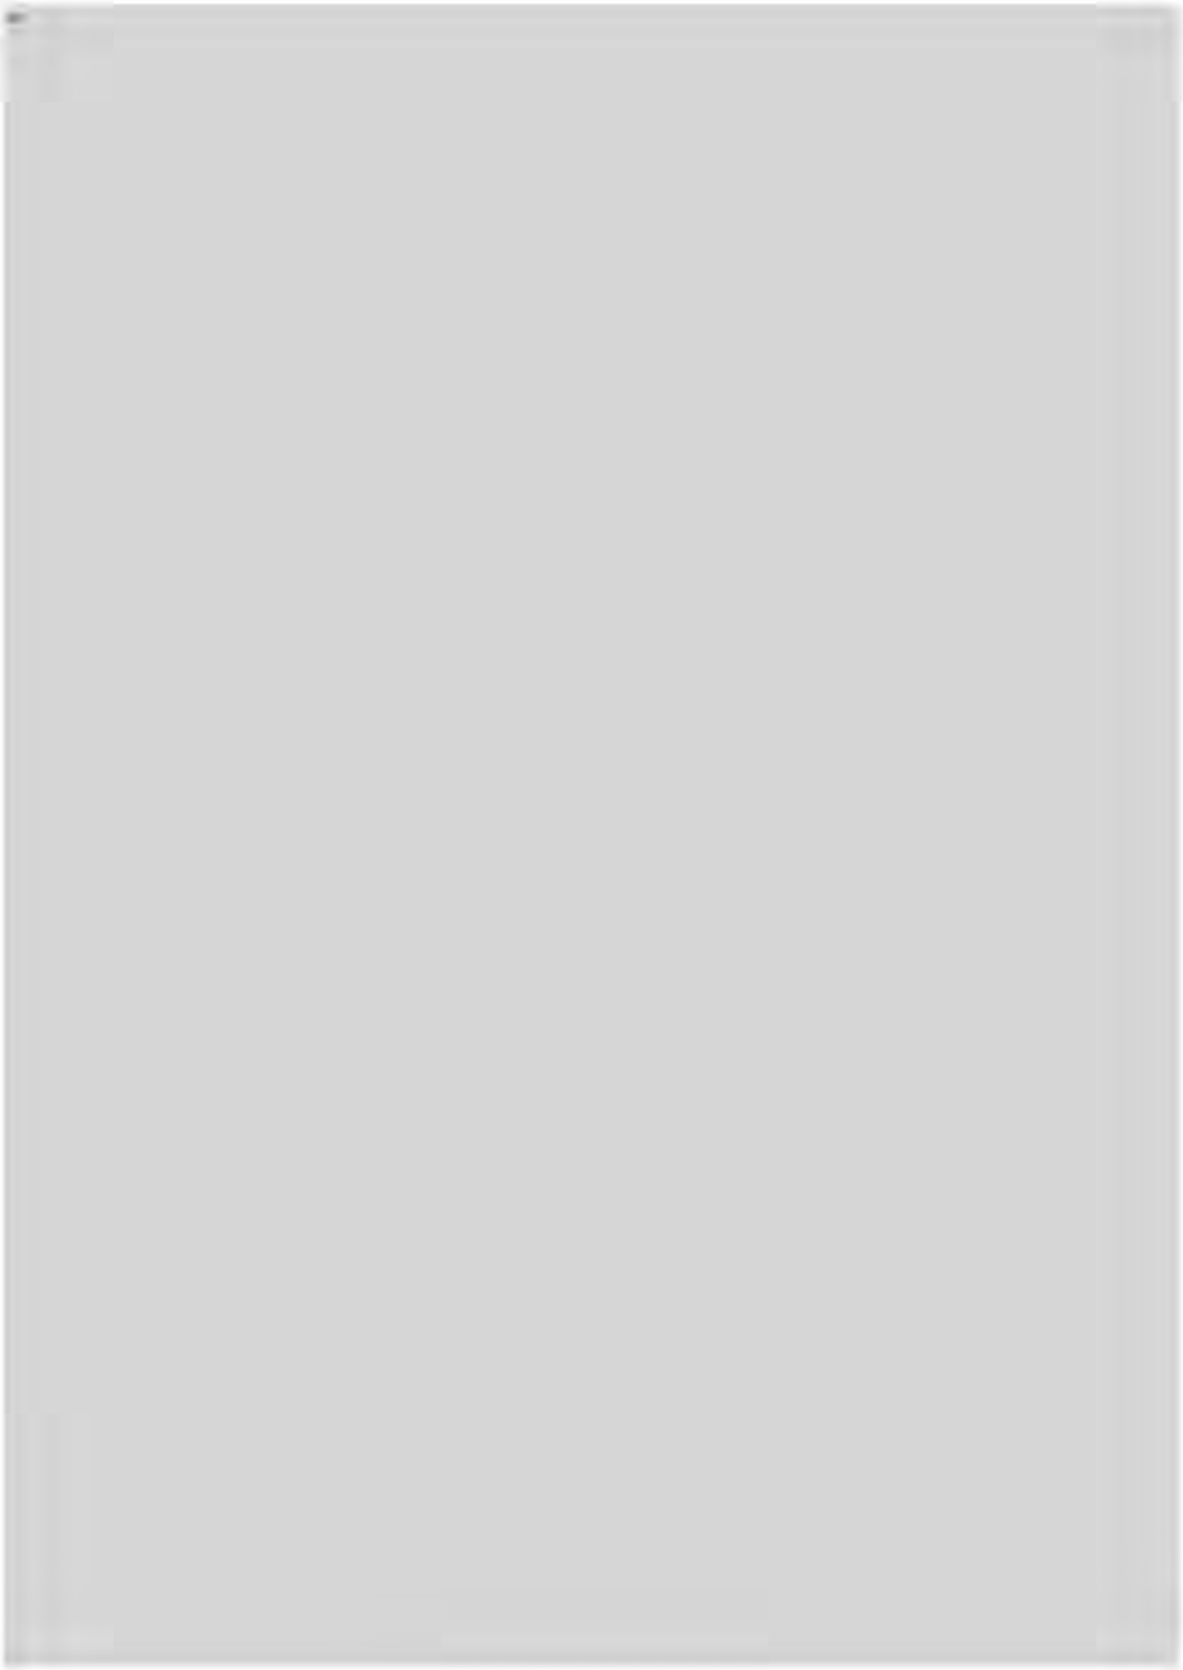

()-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 23 mei 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

## 1 Opening en mededeling

HR

- 5.1.2.e meldt dat 5.1.2.e vanuit Movares aan ons team is toegevoegd als '5.1.2.e 2e toevoer'. 5.1.2.e blijft overige zaken waterhuishouding coördineren.

5.1.2.e

- Voor de zomer komt er informatiebijeenkomst voor directe omgeving t.a.v. realisatie watertoevoer. De particuliere perceeleigenaar heeft de concept-SOK toegezonden gekregen. Men heeft meer leestijd nodig alvorens het document met gemeente te bespreken.

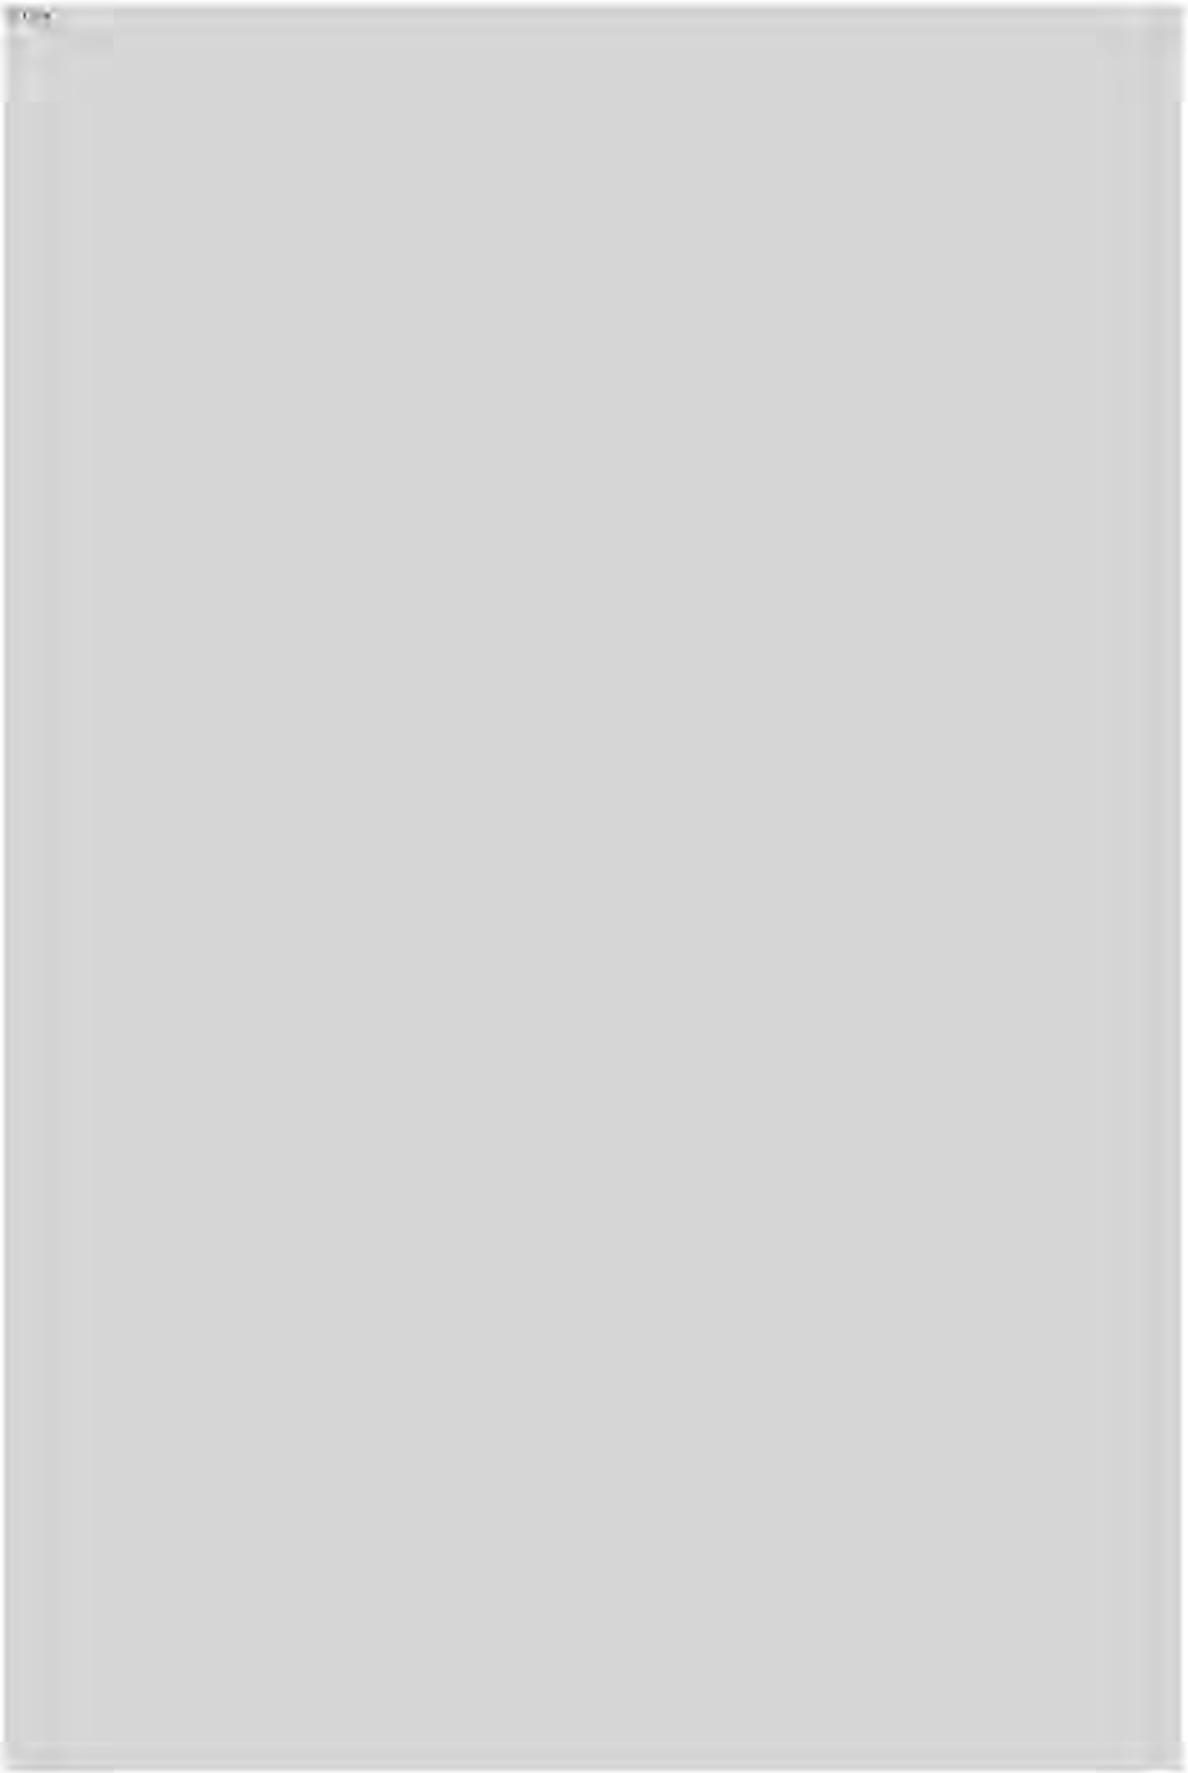

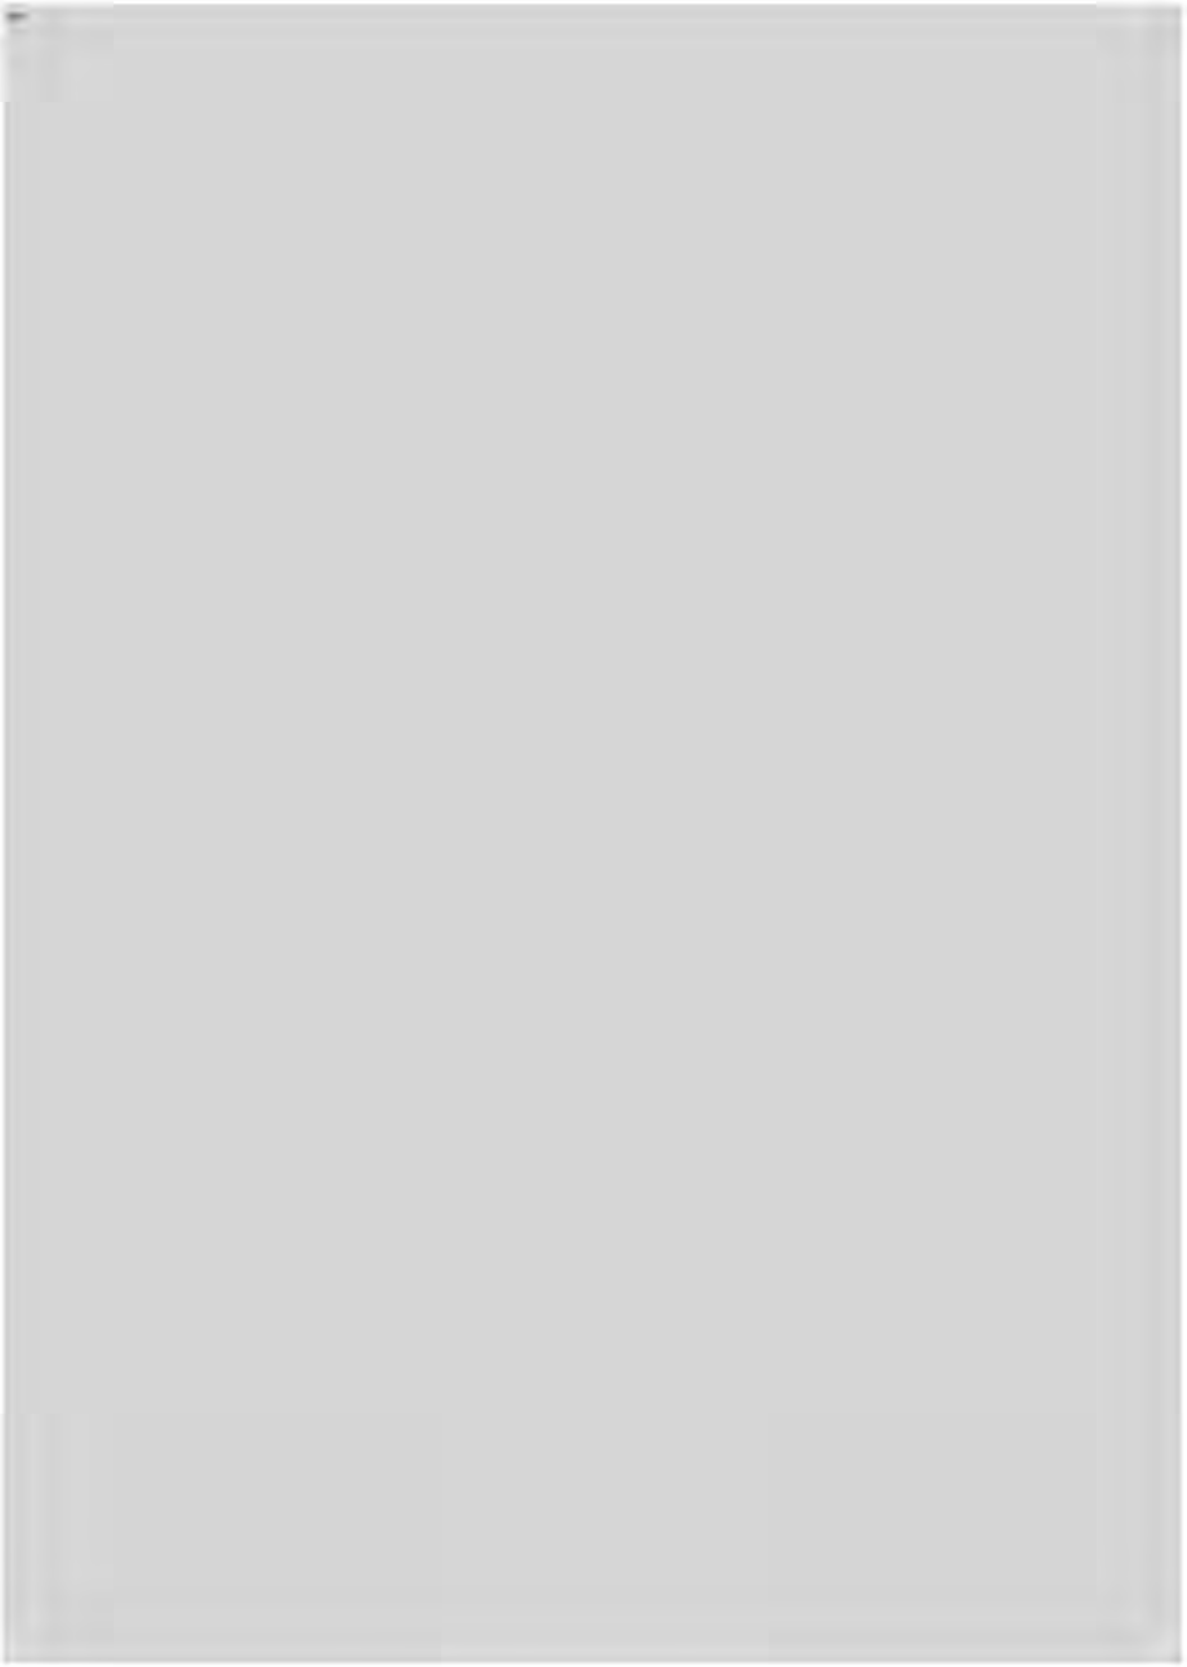

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 6 juni 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

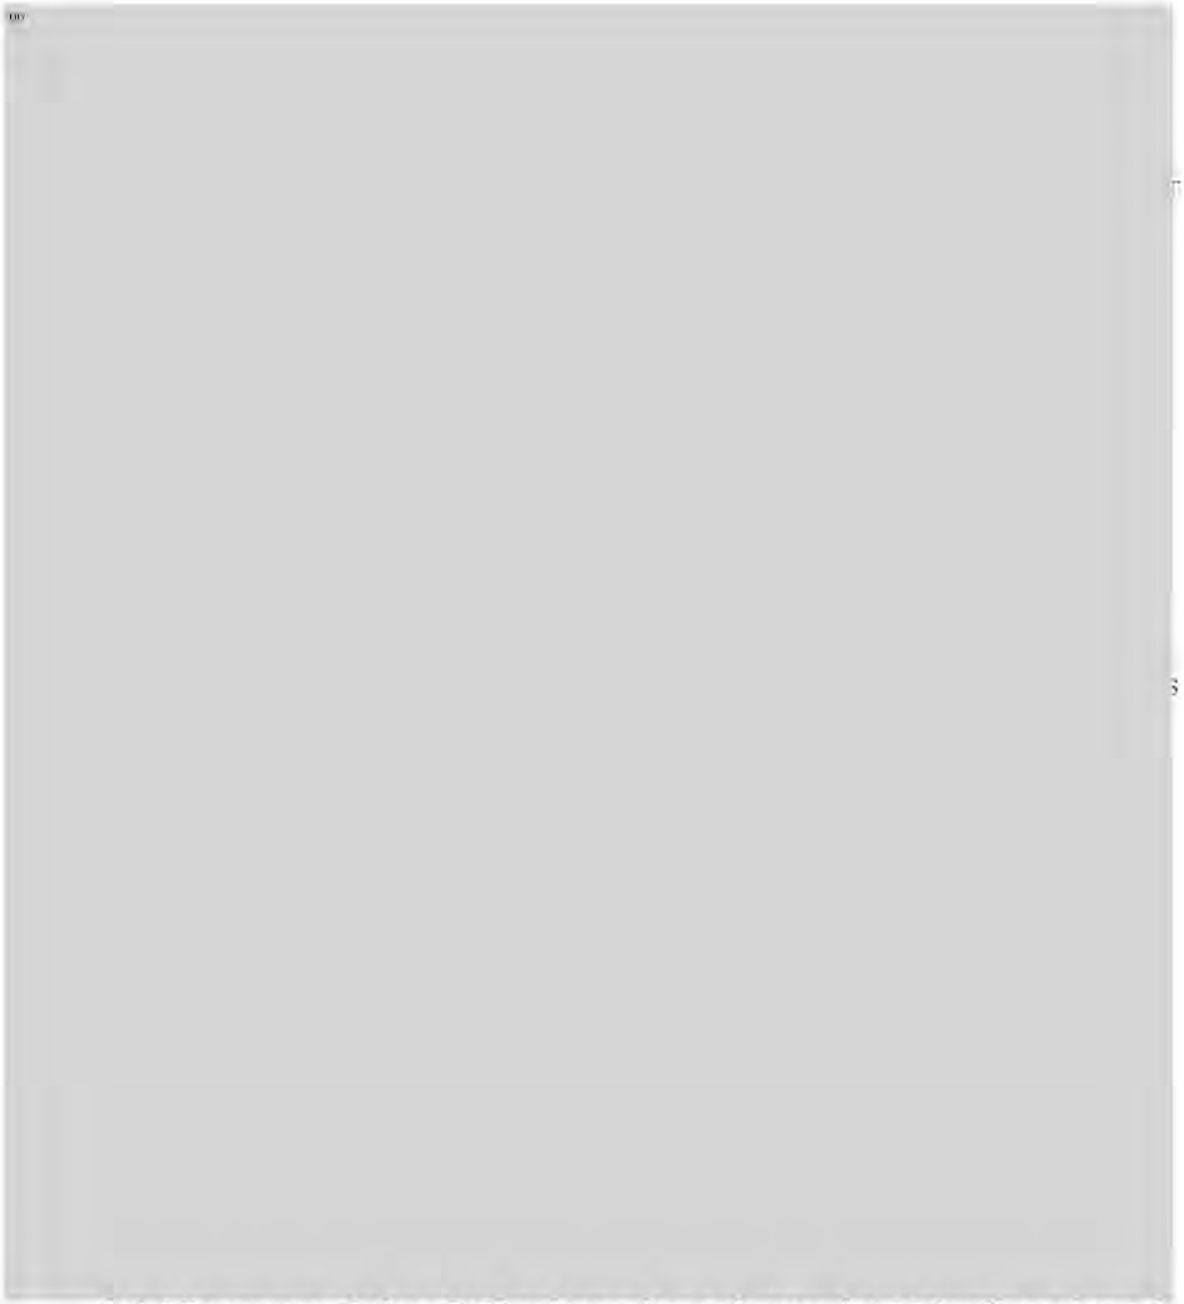

- Subsidieaanvraag Hof van Delfland t.a.v. € 0,5 mln. voor het Molenvlietpark wordt waarschijnlijk toegekend en bevestigd.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 18 juli 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

- Het overleg met eigenaar Jan Thijssenweg ten behoeve van samenwerkingsovereenkomst heeft nog niet tot een te ondertekenen document geleid. Wel gaat eigenaar de gemeente toestemming geven om kapvergunning aan te vragen voor de locatie van de te realiseren watertoevoer.

BR

- In het Molenvlietpark wordt veel grondwerk verzet.

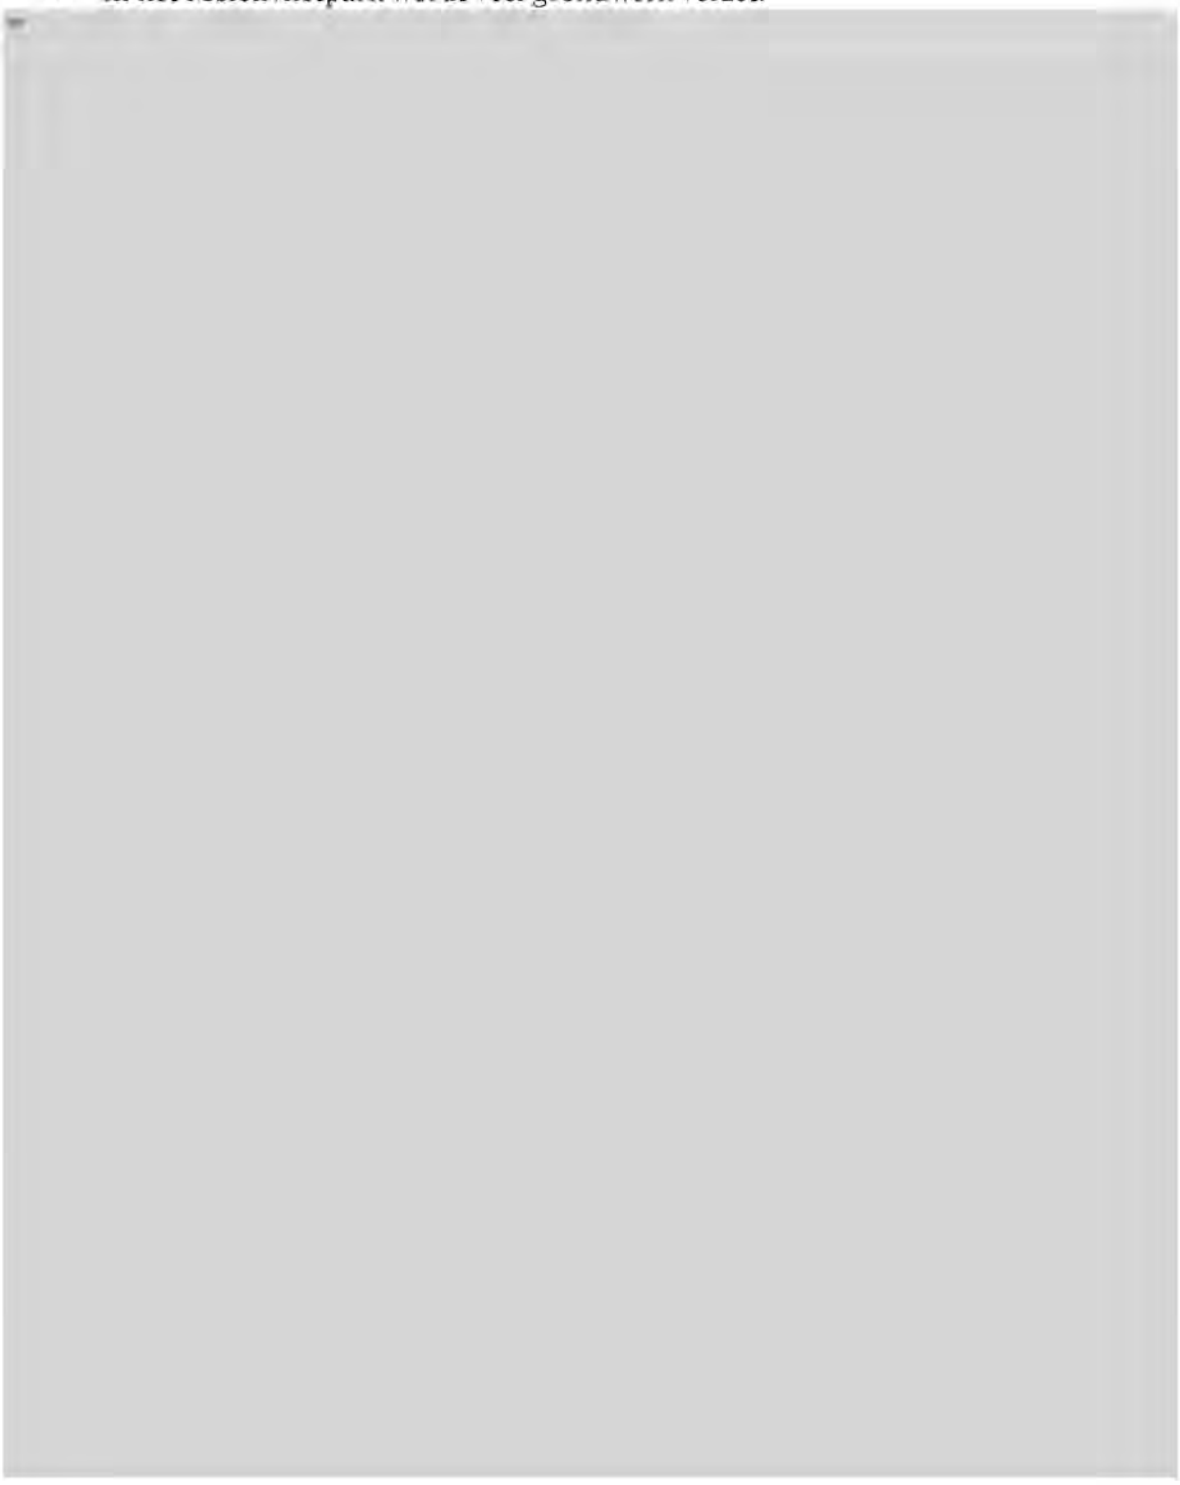

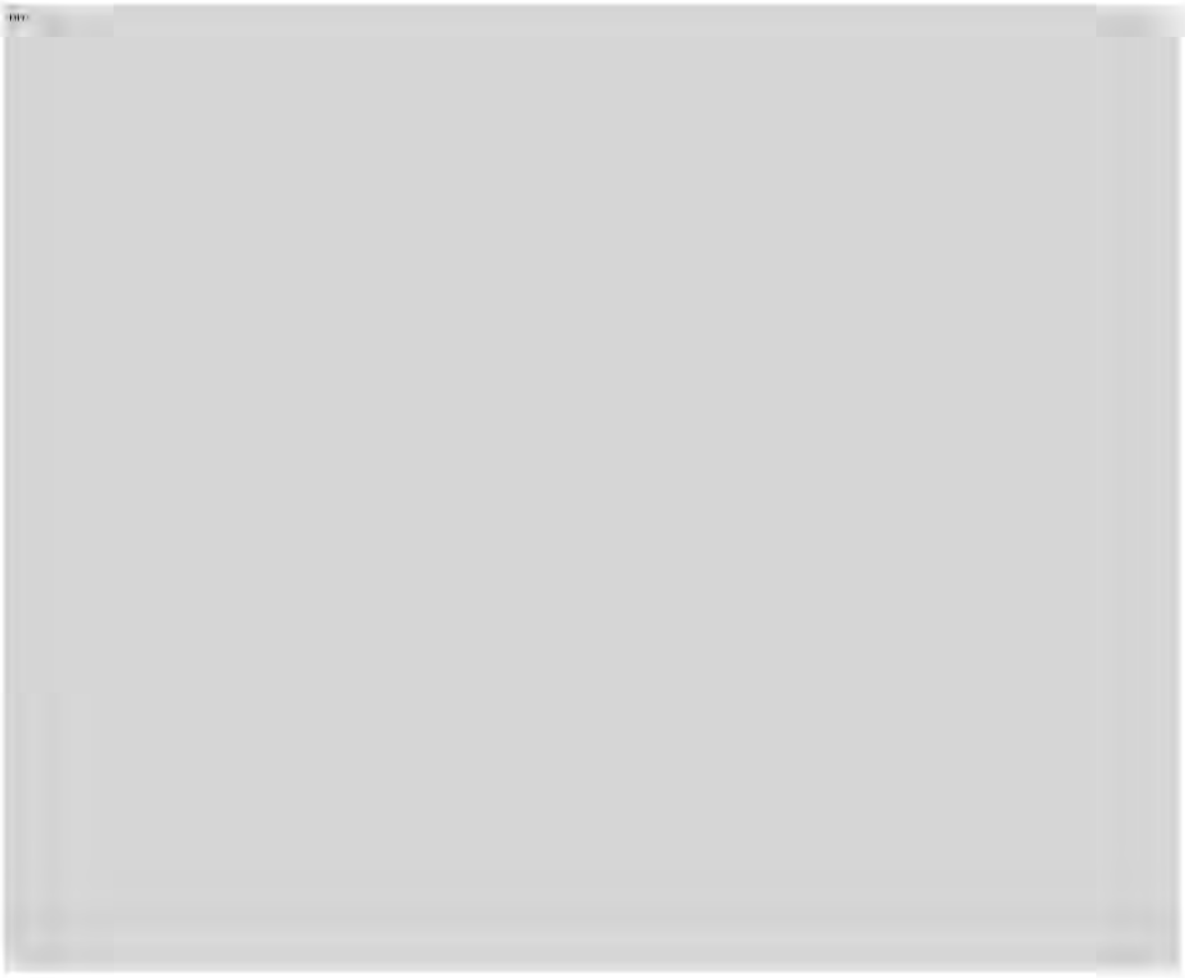

Ω-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 1 augustus 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

- De kans op € 0,5 mln. subsidie voor het Molenvlietpark is in overleg met de Landschapstafel verzilverd.

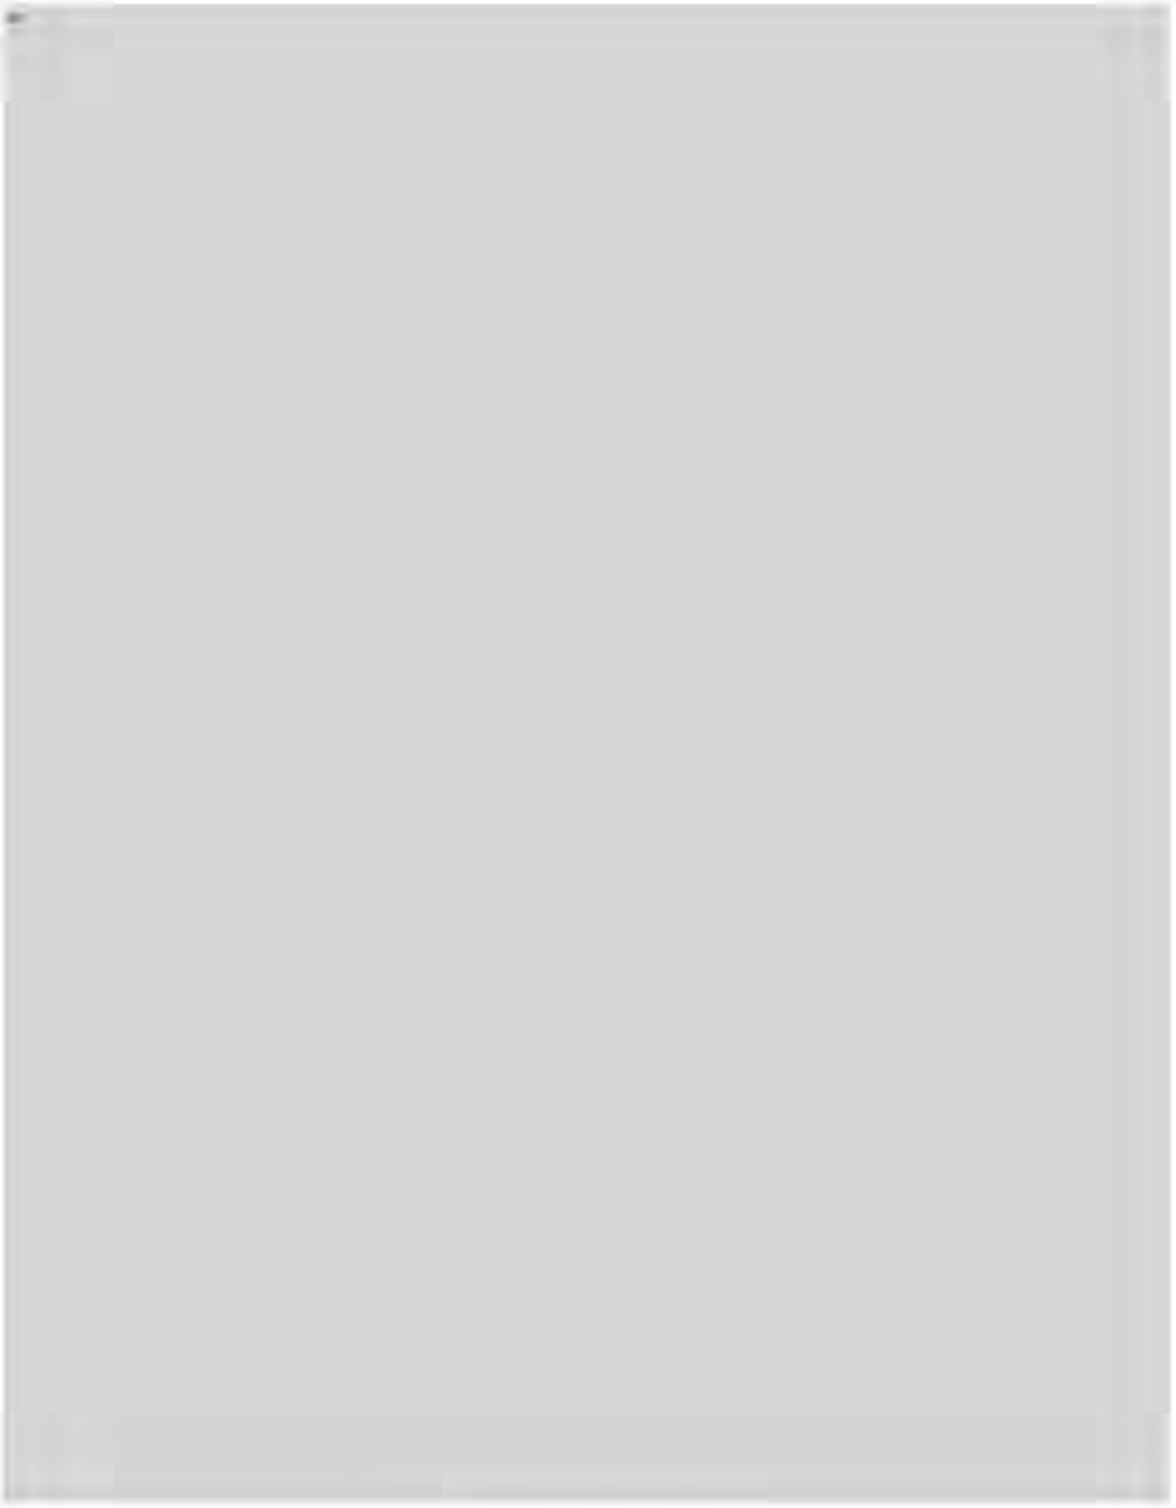

()-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Docnr76

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 29 augustus 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |
| | 5.1.2.e |

BR

- Initiatiefnemer Nieuw Vredenoord gesproken over concept-SOK watertoevoer. Hij is n.a.v. eerste reactie omwonenden waarschijnlijk bereid de brug te verplaatsen. 11 september volgend overleg.
- Het lijkt haalbaar om tijdens werkzaamheden aan de Jan Thijssenweg in verband met de duiker voor de tweede watertoevoer een tweerichtingen fietspad en één rijbaan open te houden. Mede hierover zal binnenkort een gesprek plaatsvinden met enkele ondernemers van de Jan Thijssenweg / Westvlietweg.
- Binnenkort overleg met Hoogheemraadschap over s.v.z. samenwerken conform SOK.
- Met eigenaar Jan Thijssenweg 8 in gesprek geweest. Gemeente gaat een stukje grond verkopen en eigenaren gaan de inrit verplaatsen zodat deze komst te vervallen aan de Jan Thijssenweg en zal lopen via het heringerichte Molenslootpad.

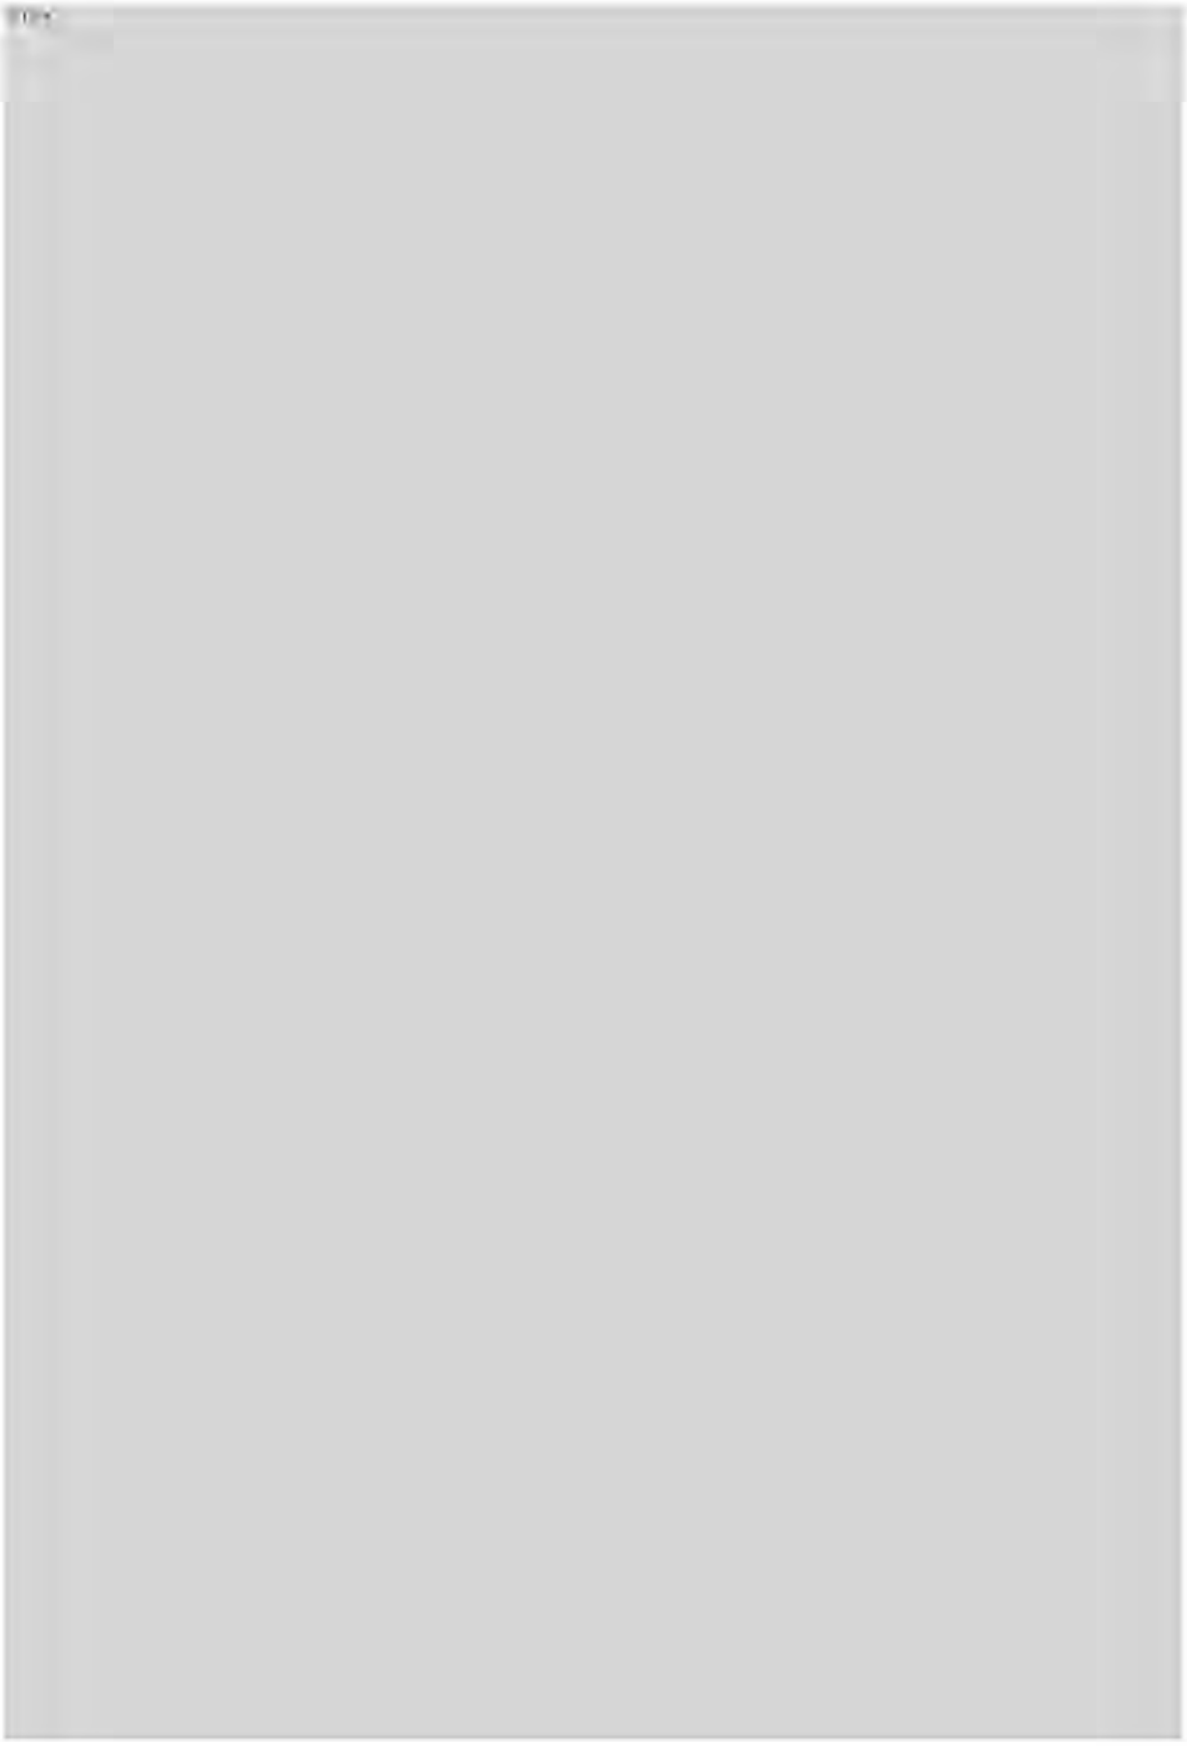

512e

- Provincie Zuid Holland gesproken over het vervangen van de kademuur Jan Thijssenweg. In de SOK worden nog financiële afspraken vastgelegd.

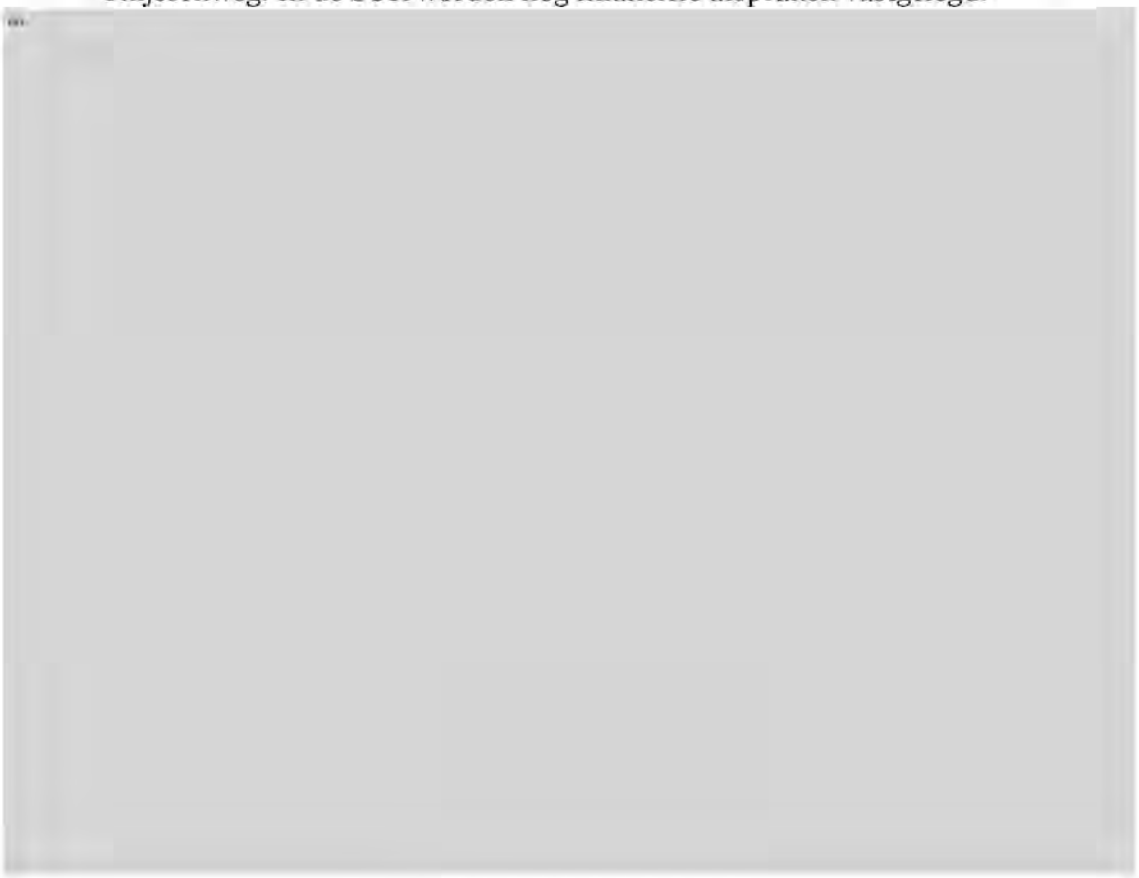

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 12 september 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

5.1.2.e

- 5.1.2.e werkt aan projectmutatie Jan Thijssenweg i.r.t. vervangen kademuur op verzoek prov. Zuid Holland en de projectmutatie voor het aanpassen van verkeersborden rondom de Rotterdamsebaan.

HR

- Particuliere perceel eigenaar gesproken over SOK tot realisatie tweede watertoevoer. Beide partijen hebben huiswerk meegenomen. Over twee weken weer overleg. Planning van juridische procedures en realisatiewerkzaamheden is complex en hiervoor komt een separate sessie. Grondzaken is verzocht om via 5.1.2.e met de provincie het opstalrecht voor de duiker in de oeverconstructie te vestigen. De fietsveiligheid van de oversteek van de Jan Thijssenweg wordt in het VO nog uitgewerkt.

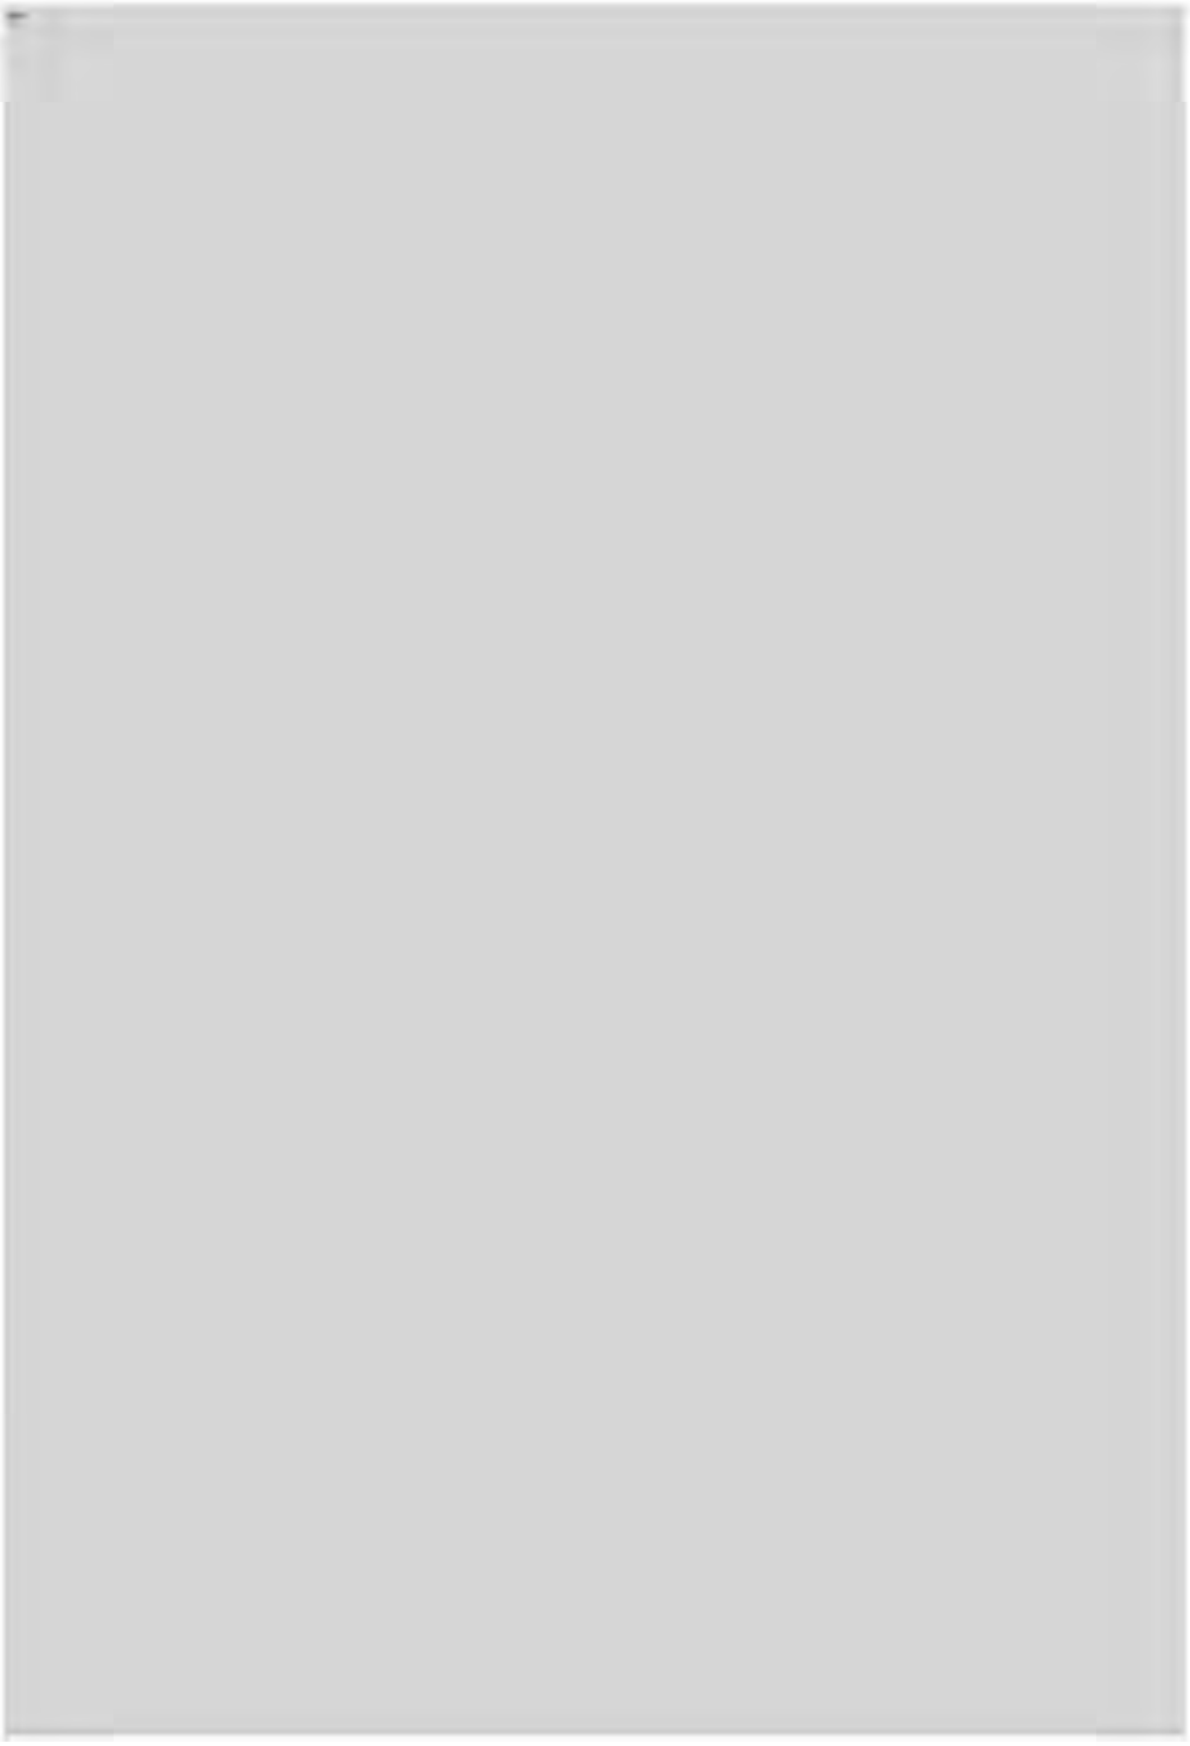

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 10 oktober 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

- De bomenbalans van het project Rotterdamsebaan is reeds eerder vastgesteld. De voorziene extra te kappen bomen kunnen hier geen onderdeel meer van uit maken en dienen per geval gecompenseerd te worden (herplanten of vergoeding afdragen aan bomenfonds). Wellicht kan de uitwerking van het ontwerp perceel naast Zeerust nog extra bomen accommoderen. Voor tweede watertoevoer is besloten het bomenfonds te gebruiken.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 24 oktober 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

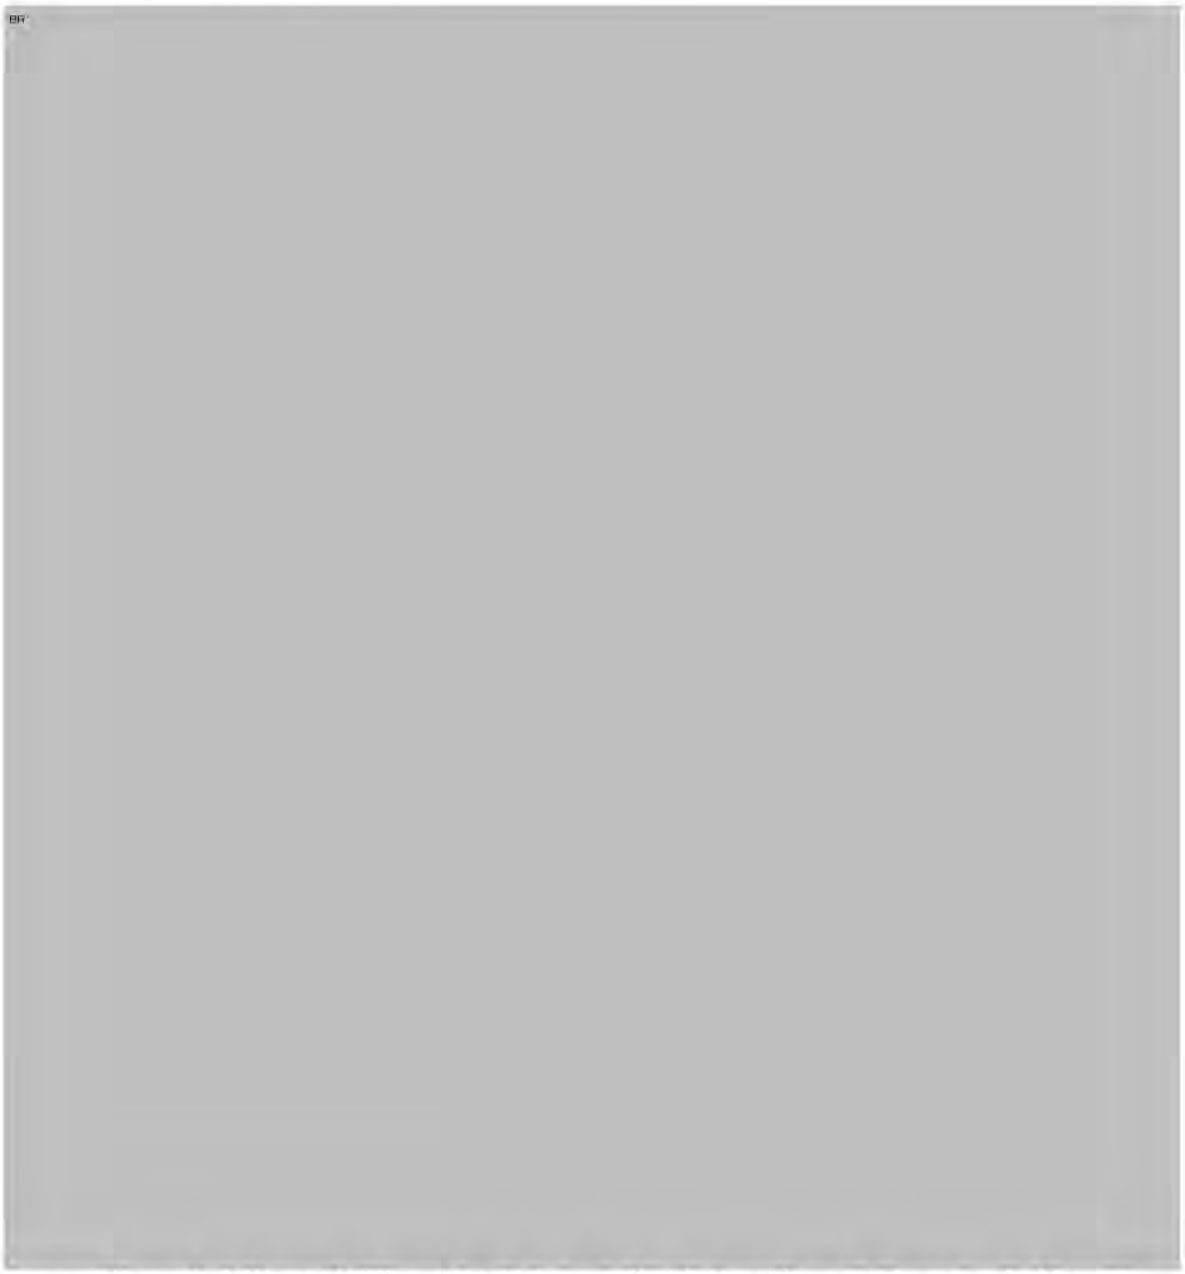

- N.a.v. de informatiebijeenkomst over realisatie tweede watertoevoer vindt er 25 oktober een overleg plaats met enkele bedrijven van de Westvlietweg en Jan Thijssenweg. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben zij gereageerd op de verwachting dat de Jan Thijssenweg langdurig wordt afgesloten.

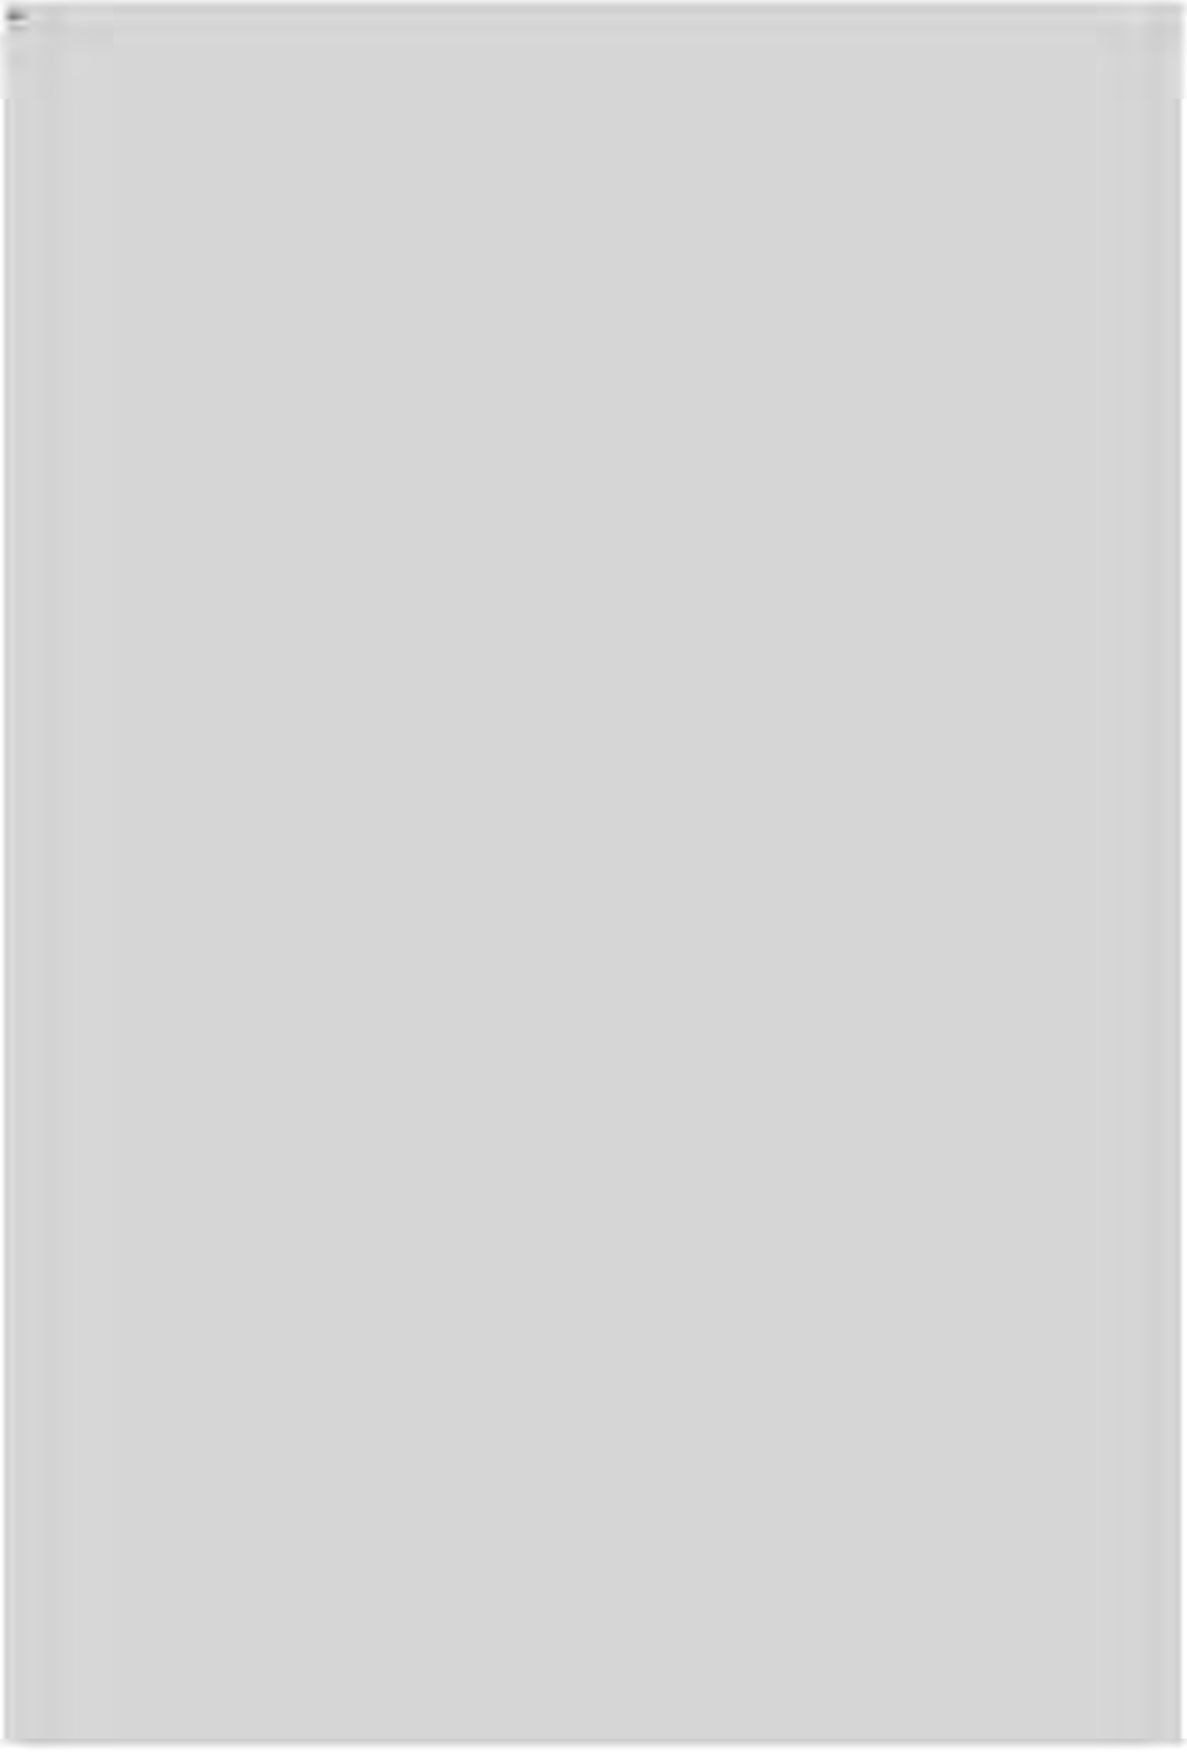

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 7 november 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

## 3 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen Rotterdamsebaan bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- Voor de kapvergunning van de tweede watertoevoer wordt nader onderzocht welke procedure te doorlopen wegens de niet geconstateerde, maar mogelijk wel aanwezige, vleermuizen.

BR

- 31 oktober in Begeleidingscommissie gesproken over o.a. het Molenvlietpark, de 2e watertoevoer en de aangevraagde kapvergunning.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 21 november 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | Afwezig: - |

BR

- Provincie moet dusdanig financieel bijdrage dat Den Haag akkoord kan gaan met de verdeling. Den Haag zal deel van de kosten dragen aangezien zij initiatiefnemer is voor realisatie watertoevoer vanuit Vliet naar Molenvlietpark.

BR

5.1.2.e 5.1.2.e

- Op de locatie van de tweede toevoer zijn geen vleermuizen waargenomen, maar in onderzoeksrapport staat dat hun aanwezigheid niet valt uit te sluiten. Hierdoor is

Wet Natuurbeheer van toepassing. Aanvragen ontheffing is een proces van 26 weken waardoor verlenen van de aangevraagde kapvergunning gaat vertragen en daarmee het moment waarop bomen worden gekapt.

- Met particuliere eigenaar van perceel voor tweede watertoevoer dienen nog afspraken gemaakt te worden over 6 elementen, waaronder grondbalans.

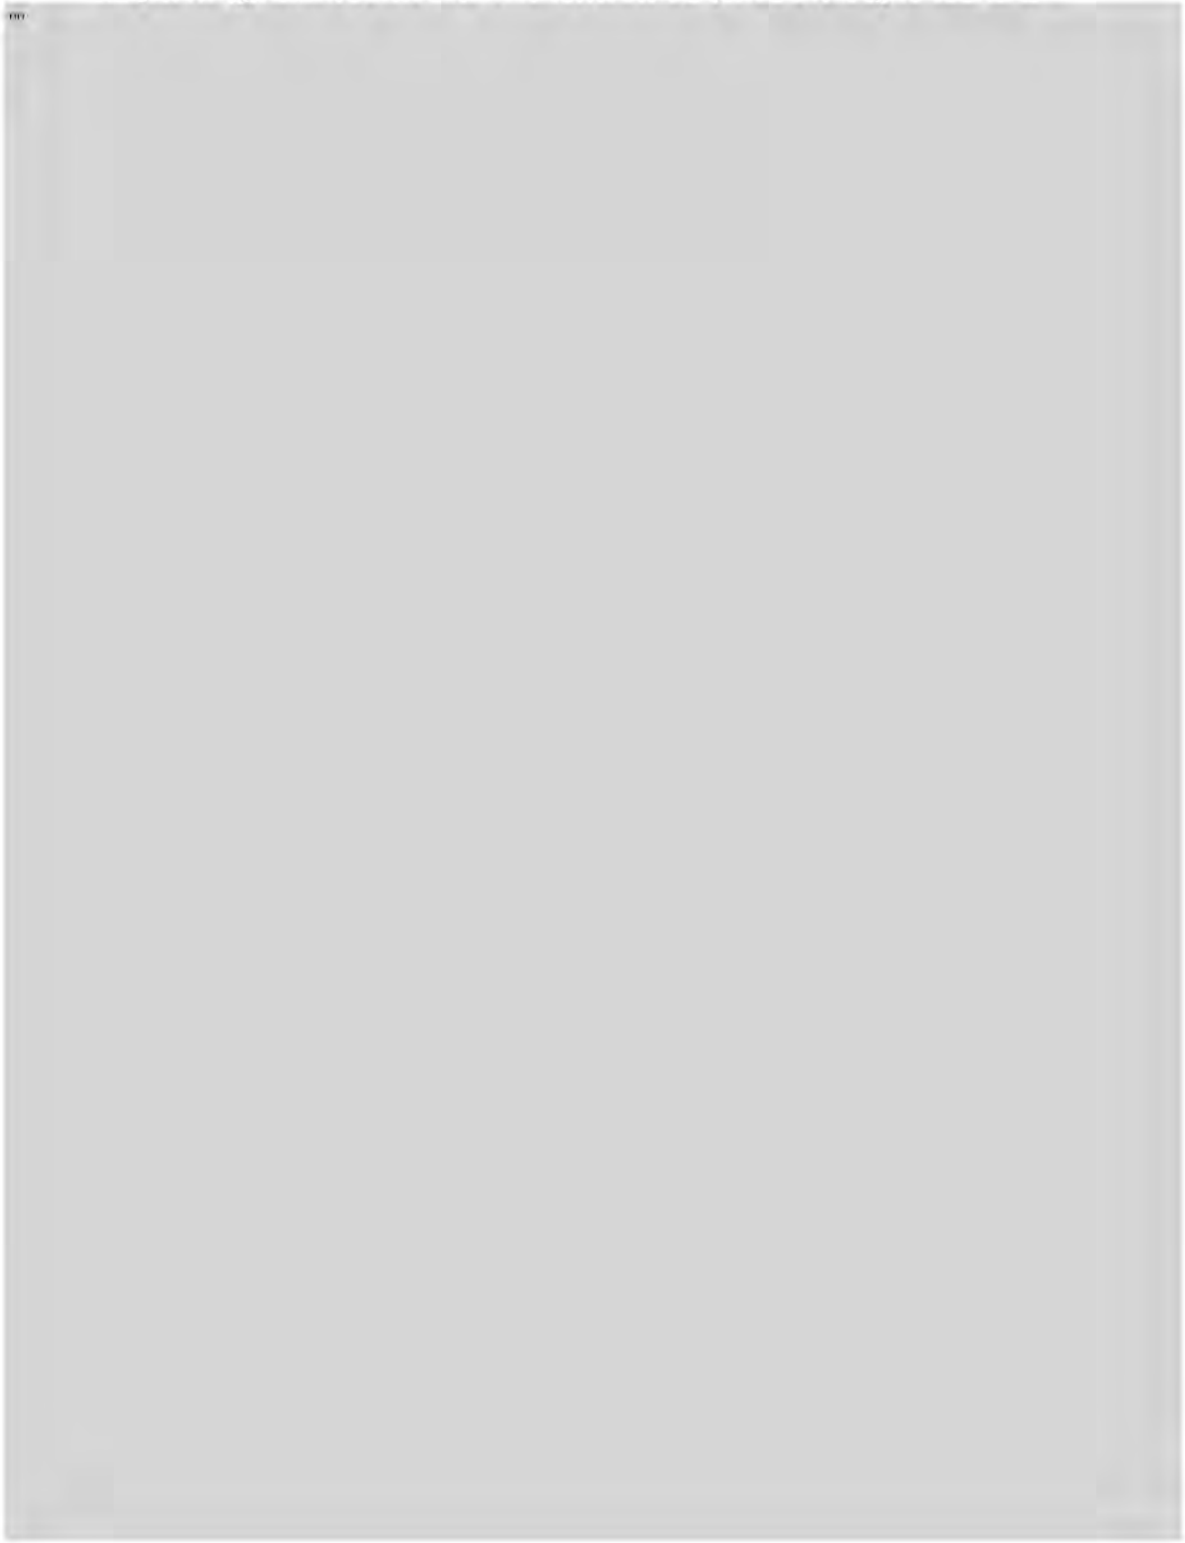

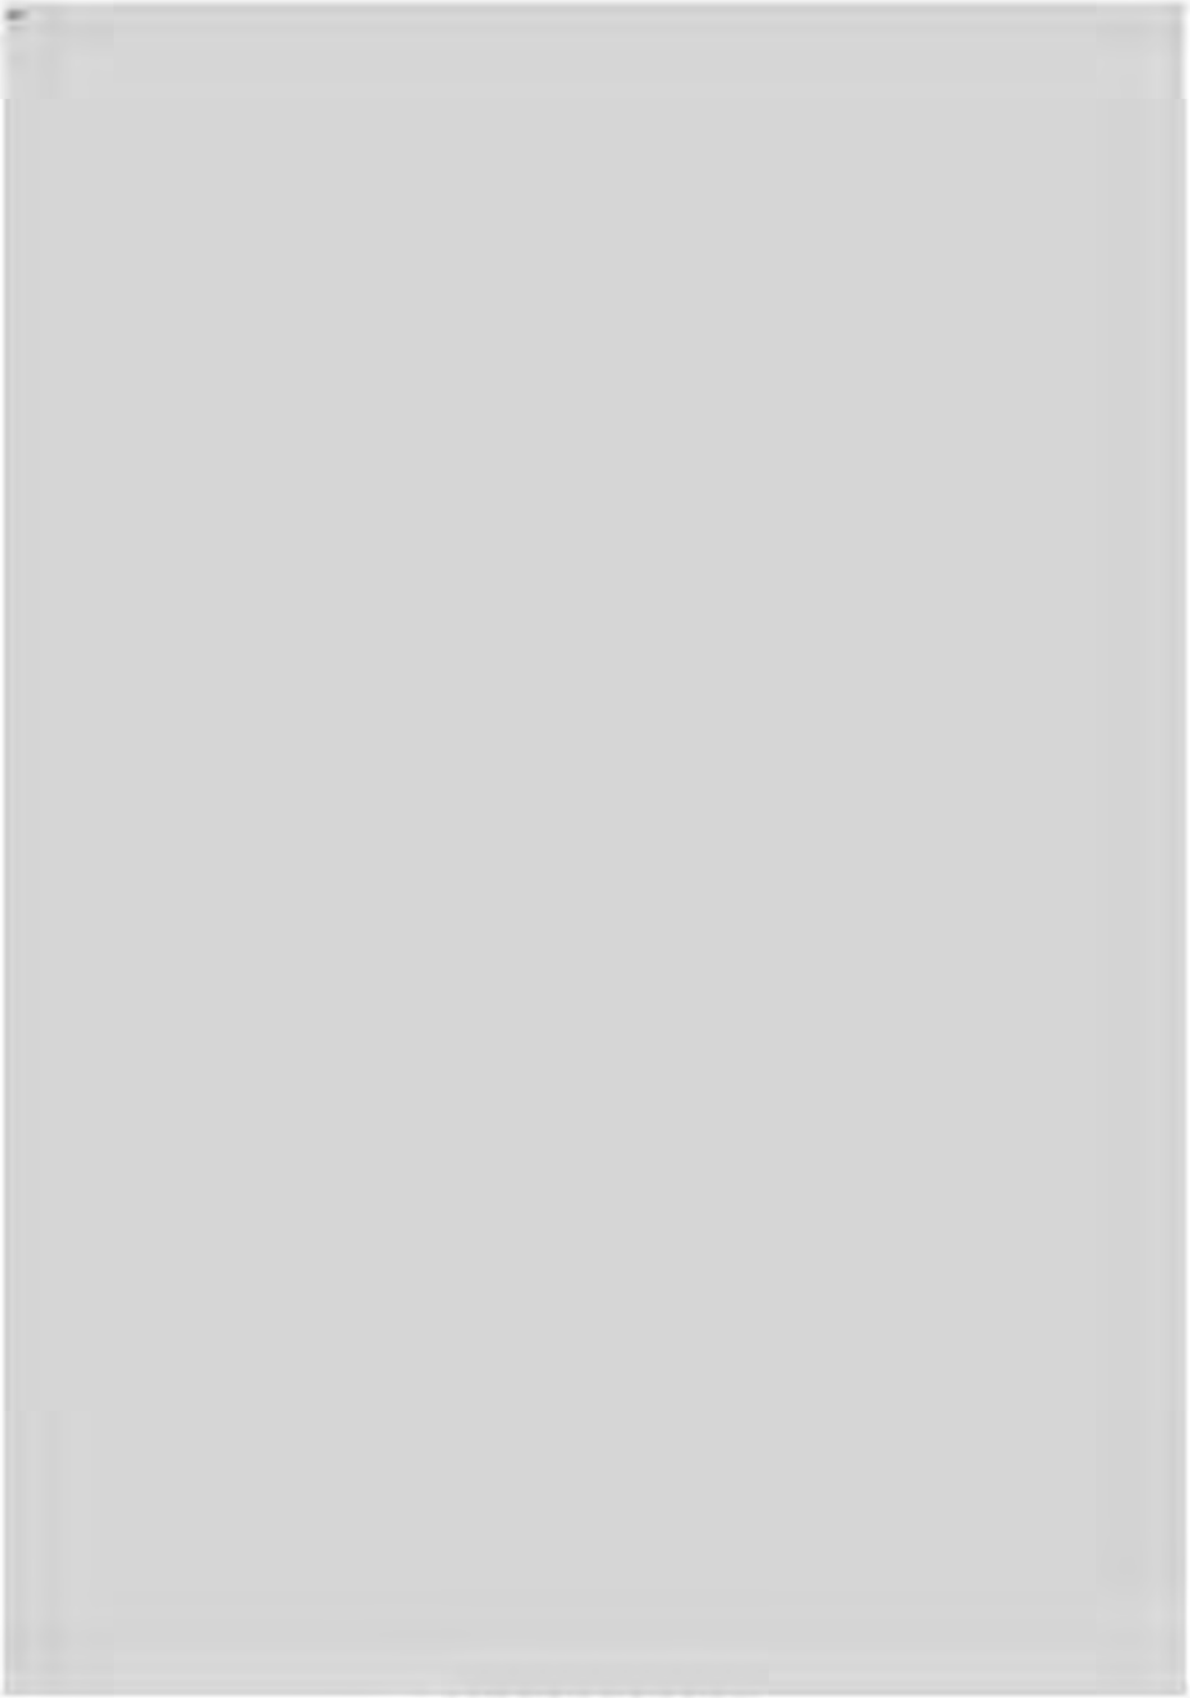

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 5 december 2018 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | Afwezig: - |

BR

- 5.1.2.e heeft aangegeven te streven naar overeenstemming voor de tweede watertoevoer in 2018. → 5.1.2.e dan kan van januari tot de zomer het bestek worden opgesteld, bepalen we in de herfst welke opdrachtnemer het werk mag uitvoeren, vangen de realisatiewerkzaamheden aan in 2020 en wordt het opgeleverd in 2021.

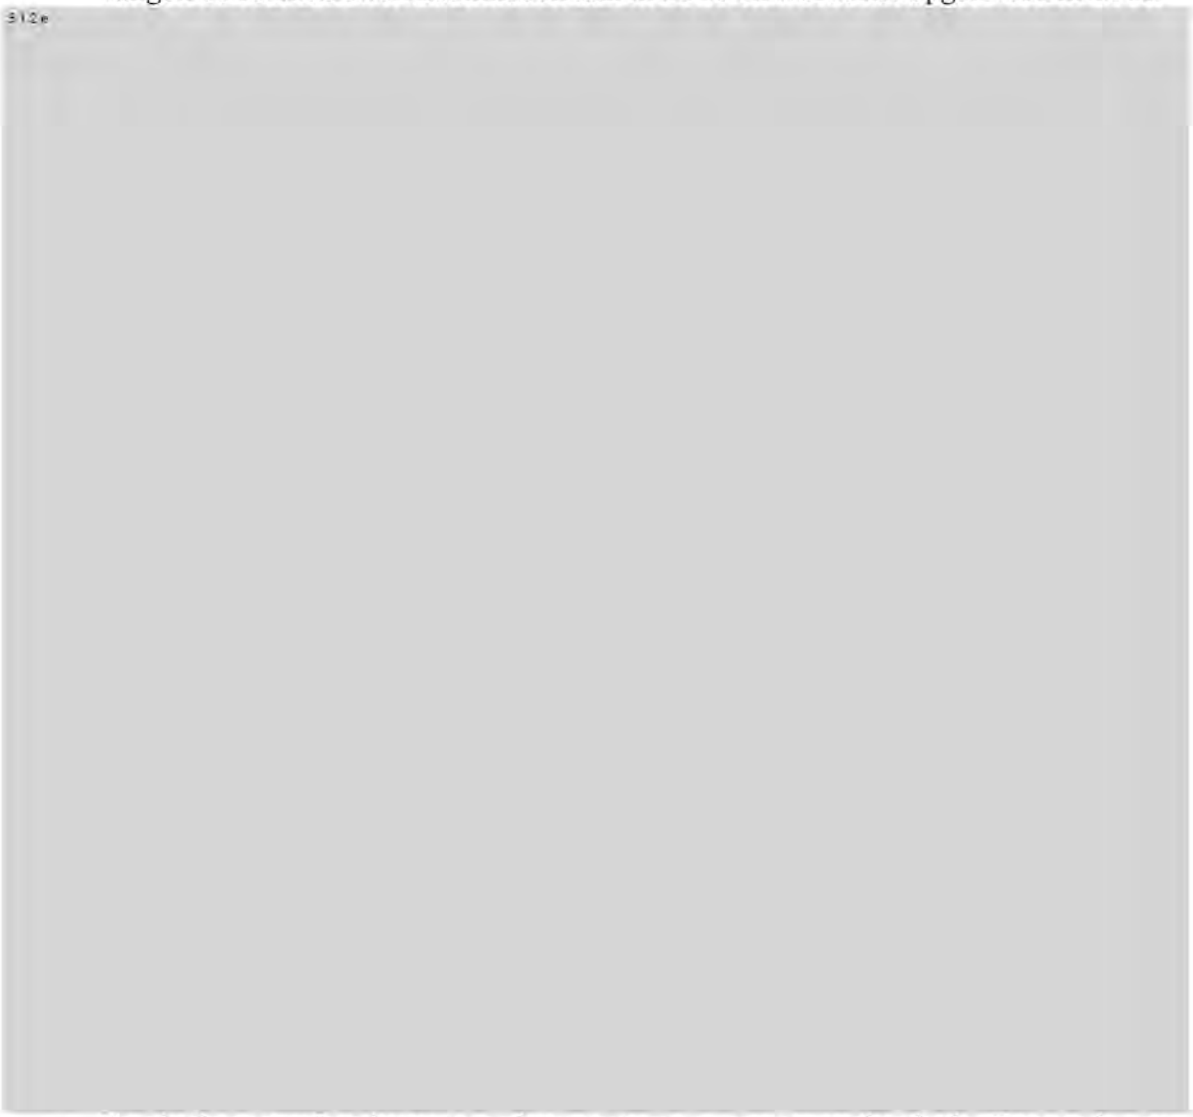

- Provincie gesproken i.v.m. tweede watertoevoer en vervanging kade. Streven is om overeenkomst eind januari te ondertekenen. Geconstateerd verschil in de ramingen

wordt m.n. veroorzaakt door het percentage indirecte kosten. De kostendeskundigen gaan dit met elkaar bespreken. Provincie geeft de voorkeur aan een afspraak met een vaste som en wil het werk uiterlijk 1 december 2020 uitgevoerd hebben. Roba zal bezien in hoeverre dit wenselijk en haalbaar is.

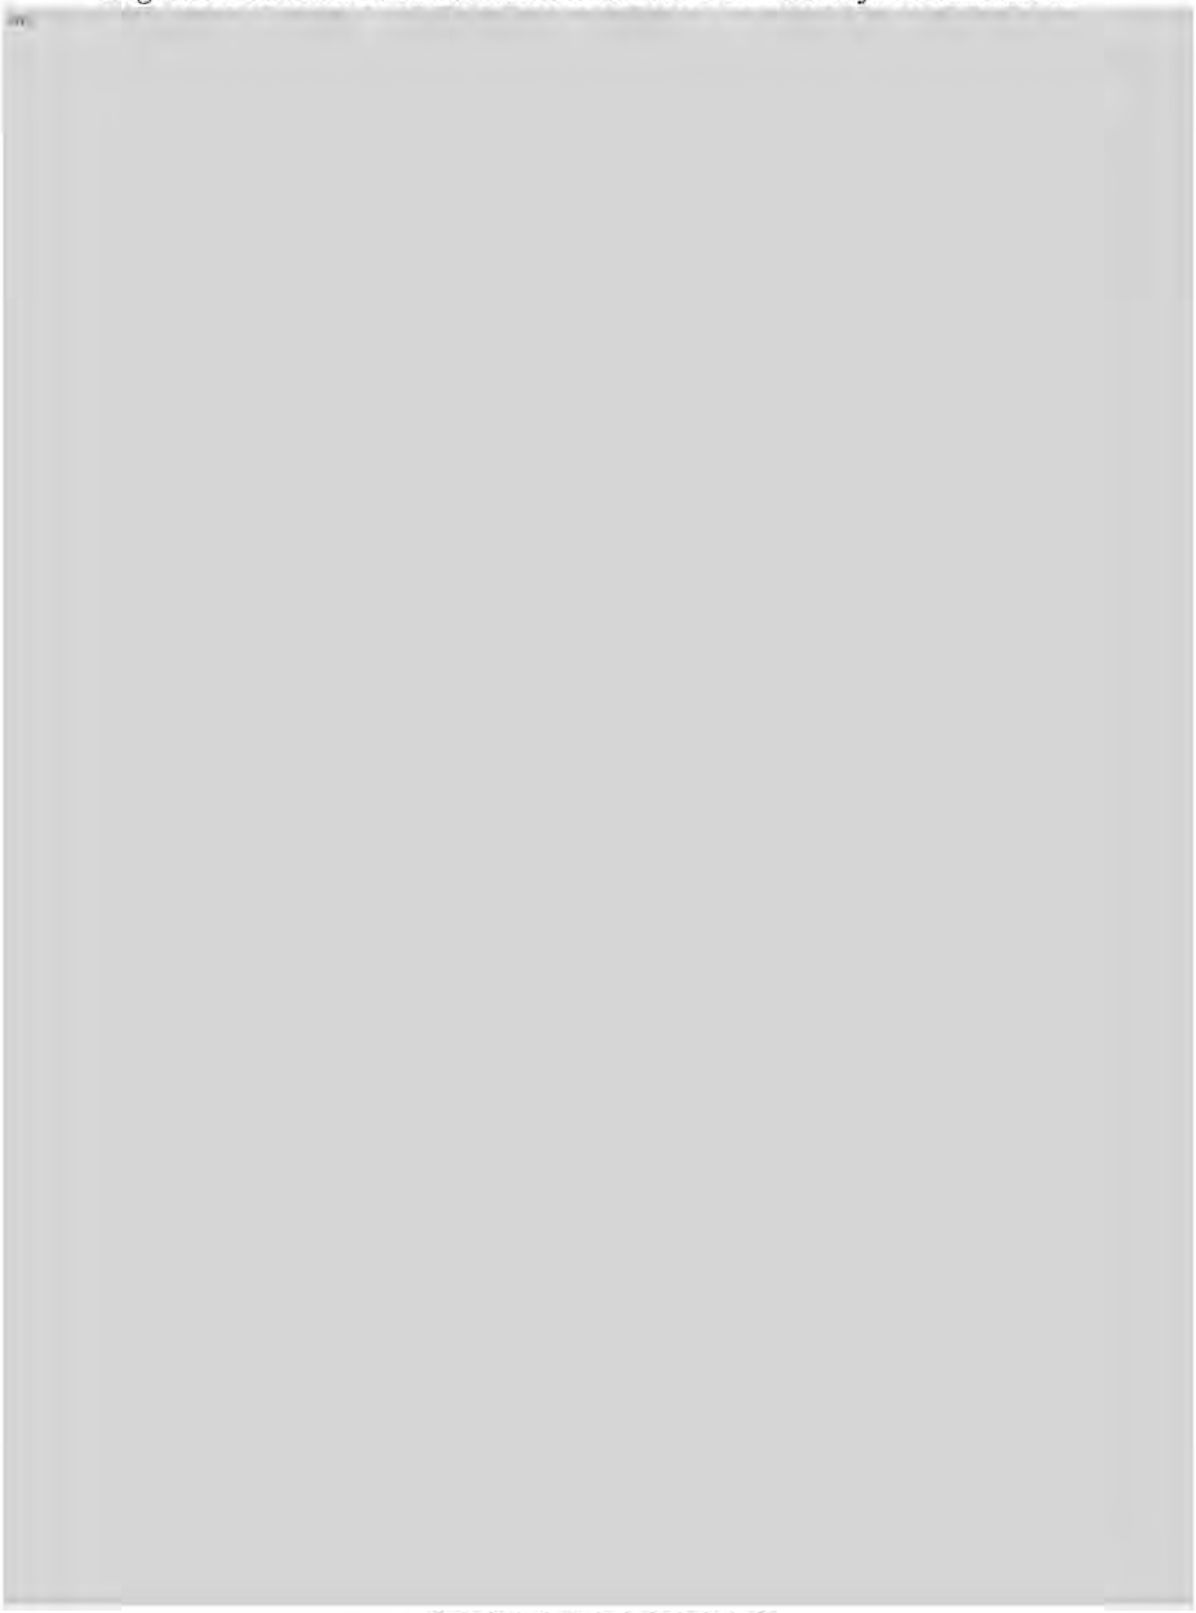

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 16 januari 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | Afwezig: - |

BR

## 5 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen Rotterdamsebaan bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- Vergunning loopbrug Drievliet is verleend. Vergunning voetgangersbruggen 1, 2 en 3 in Molenvlietpark zijn door CRB aangevraagd.
- Projectplan voor watertoevoer is door HHD ter inzage gelegd.

BR

- Partij voor de Dieren heeft raadsvragen gesteld n.a.v. aanvraag kapvergunning watertoevoer.

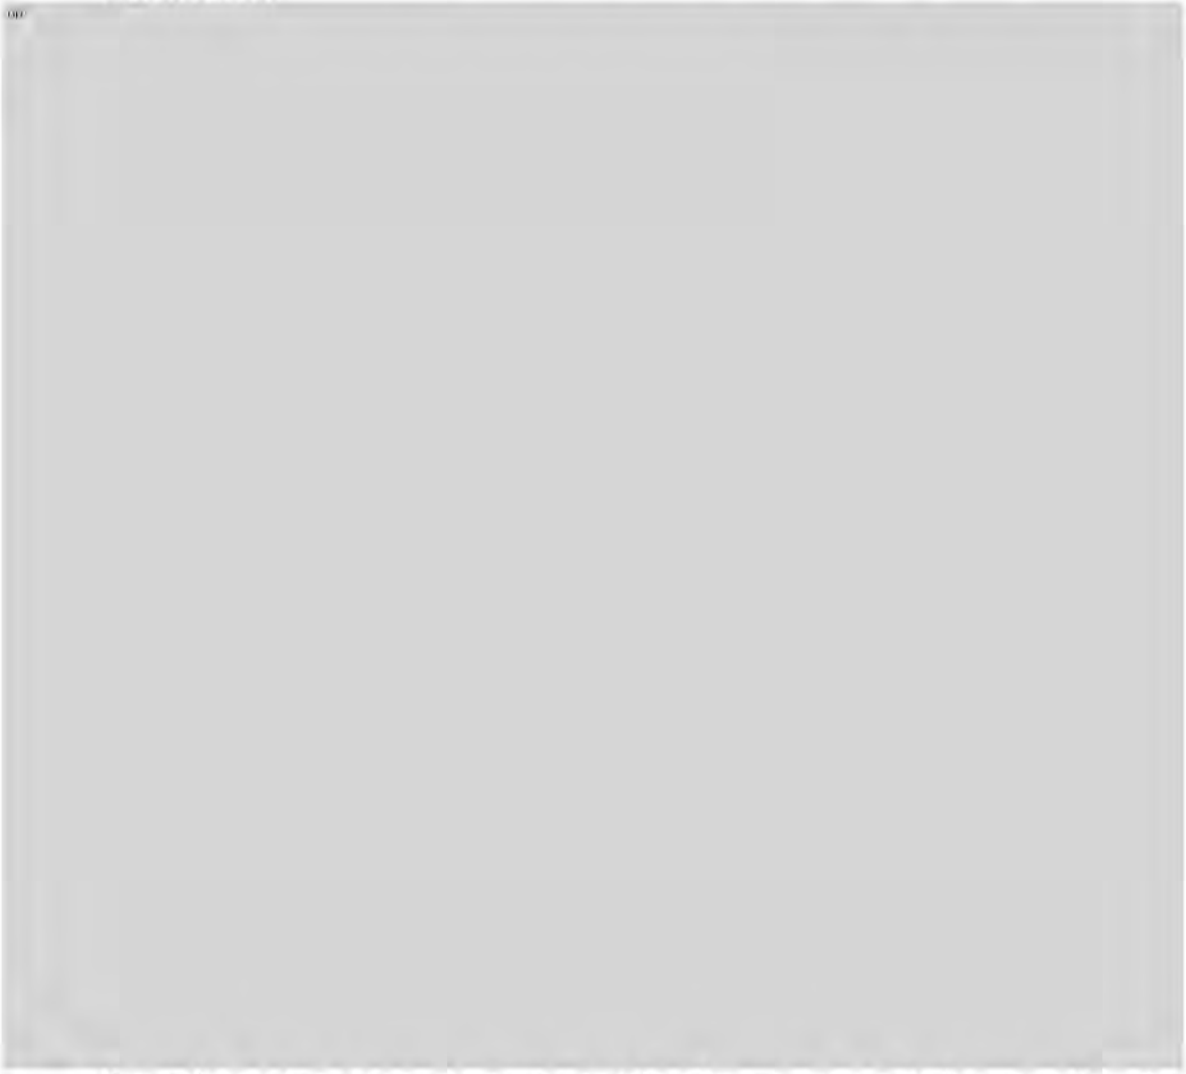

- Provincie moet nog reageren op een aantal onderwerpen voor in de overeenkomst vervangen kademuur langs Vliet, o.a. t.a.v. het herziene voorstel voor de financiële verrekening.

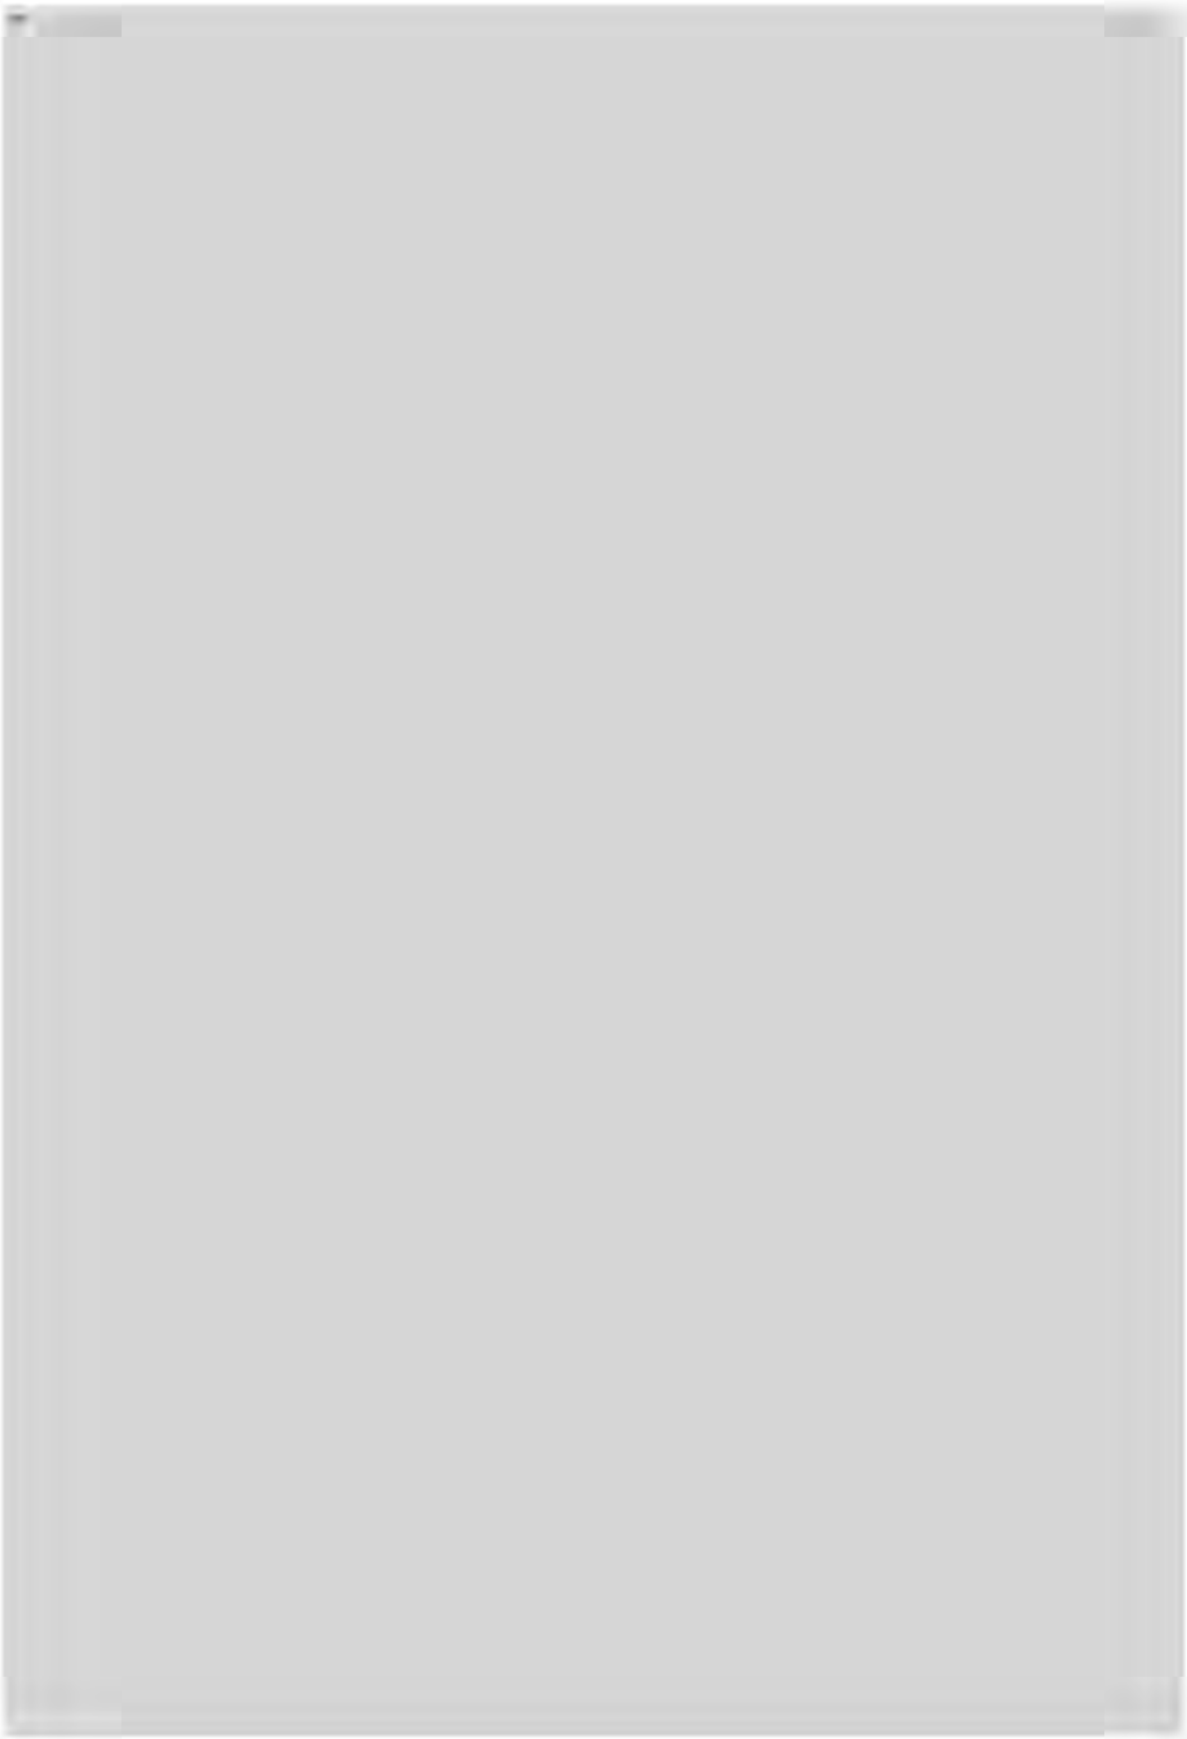

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 7 februari 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | Afwezig: - |

BR

- CRB is door het Schadebureau geadviseerd om rondom voetgangersbrug 1 naar het Molenvlietpark wederom een bouwkundige opname te laten doen van de omliggende bebouwing.

BR

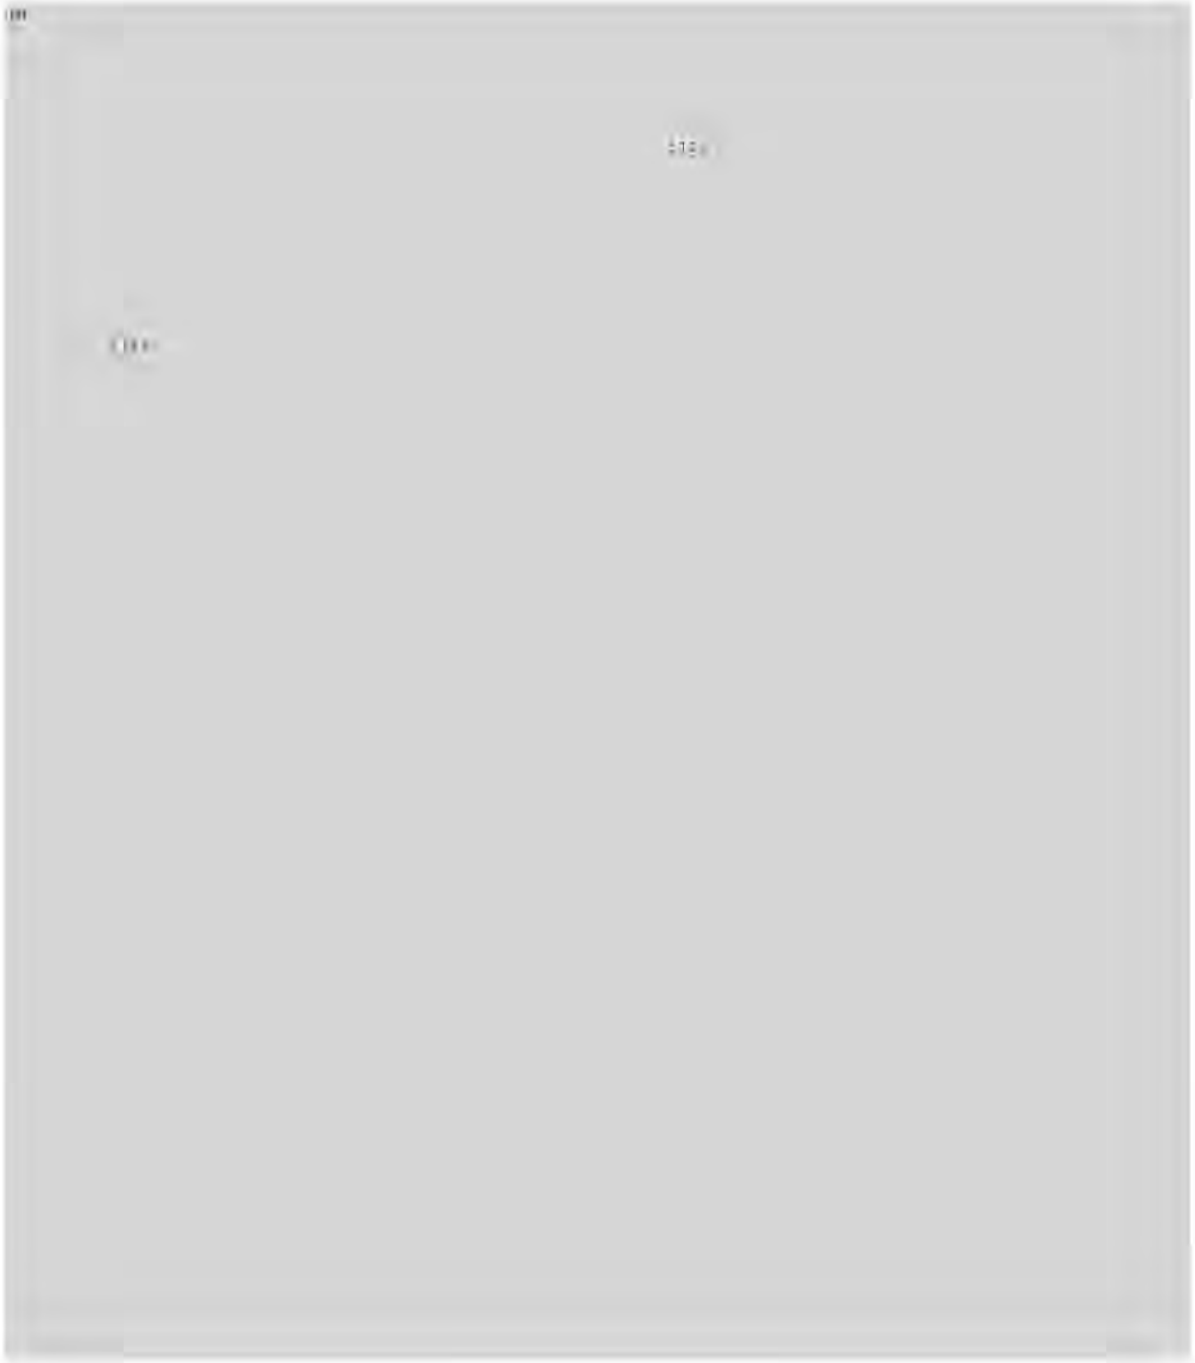

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 13 februari 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

## 4 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- Omgevingsvergunning verleend voor voetgangersbruggen 1, 2 en 3 in Molenvlietpark. Tegen nr. 1 is zienswijze ingediend.
- Hoogheemraadschap heeft ca. 4 watervergunningen verleend.
- Hoogheemraadschap heeft ontwerp-projectplan ter inzage gehad. 5.1.2.e (relatie met nieuwbouw Vredenoord) en provincie (t.a.v. Natuur netwerk Nederland) hebben zienswijze ingediend.

- 5.1.2.e gesproken ten behoeve van sluiten SOK. 12 maart vervolgoverleg. In de tussentijd gaan grondspecialisten met elkaar in overleg.
- Vandaag vinden op het perceel voor tweede watertoevoer snoei- en onderhoudswerkzaamheden plaats. Omwonenden zijn vooraf geïnformeerd. Een enkele heeft vragen gesteld.

[redacted]

- 12 feb MRDH gesproken ihkv haar subsidie aan Roba. Tevens gevraagd of zij subsidie kan verlenen voor recreatieve functie van Molenvlietpark. Wordt door MRDH uitgezocht.

[redacted]

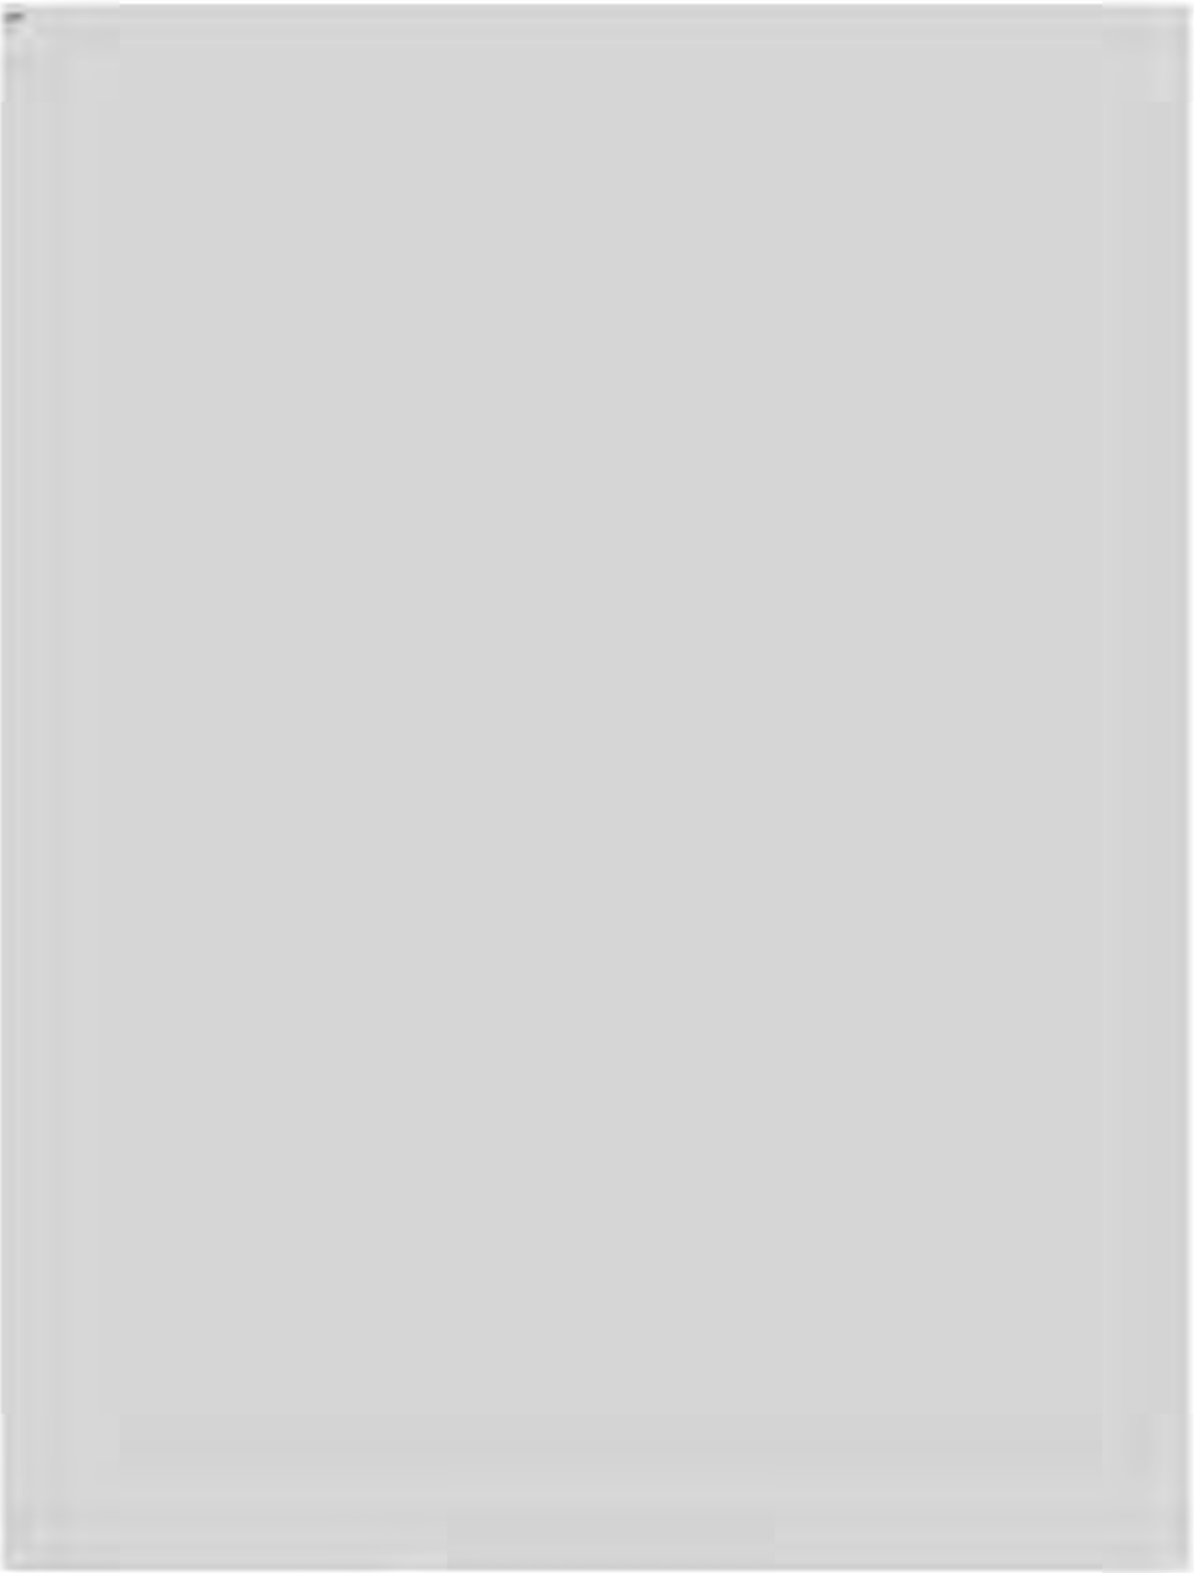

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr86

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 27 februari 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

- Tot op heden geen reactie van 5.1.2.e t.a.v. grondbalans ontvangen.

BR

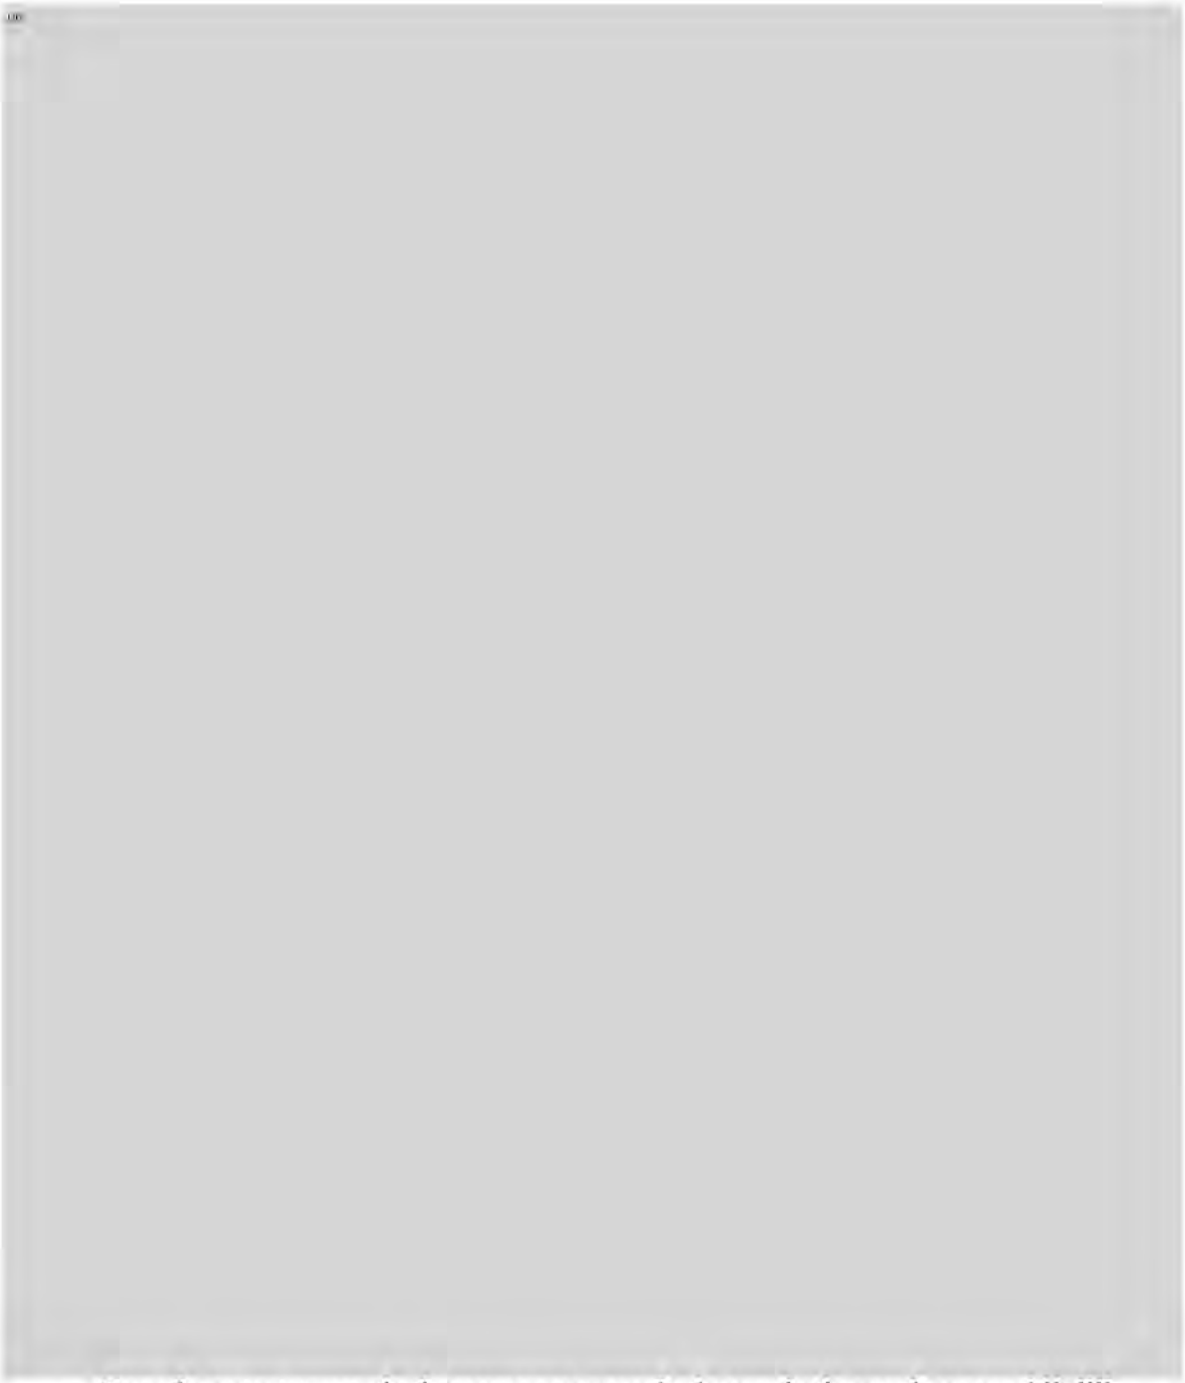

- Tweede watertoevoer incl. vervangen oeverkade provincie wordt waarschijnlijk meervoudig onderhand aanbesteed.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 13 maart 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

## 3 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.

Besproken:

5.1.2.e

- 5.1.2.e 12 maart gesproken over overeenstemming t.b.v. realisatie tweede watertoevoer. Het was een constructief overleg. Nog een nadere uitwerking van de grondexperts nodig om het laatste discussiepunt te kunnen beslechten.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr88

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 27 maart 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | Afwezig: - |

BR

- Gisteren met hoogheemraadschap gesproken over de gezamenlijke communicatie over realisatie tweede watertoevoer.
- Vergunningen onherroepelijk voor voetgangersbruggen 5 en 6 in Molenvlietpark. Tegen vergunning verlening brug 1 is bezwaar ingediend waardoor vergunning (nog) niet onherroepelijk.

BR

- Mede n.a.v. vragen tijdens Burenoverleg Vlietzone zullen team-Roba en Hoogheemraadschap duidelijk gaan communiceren wat er gerealiseerd gaat worden voor tweede watertoevoer en Molenvlietpark.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Docnr89

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 10 april 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

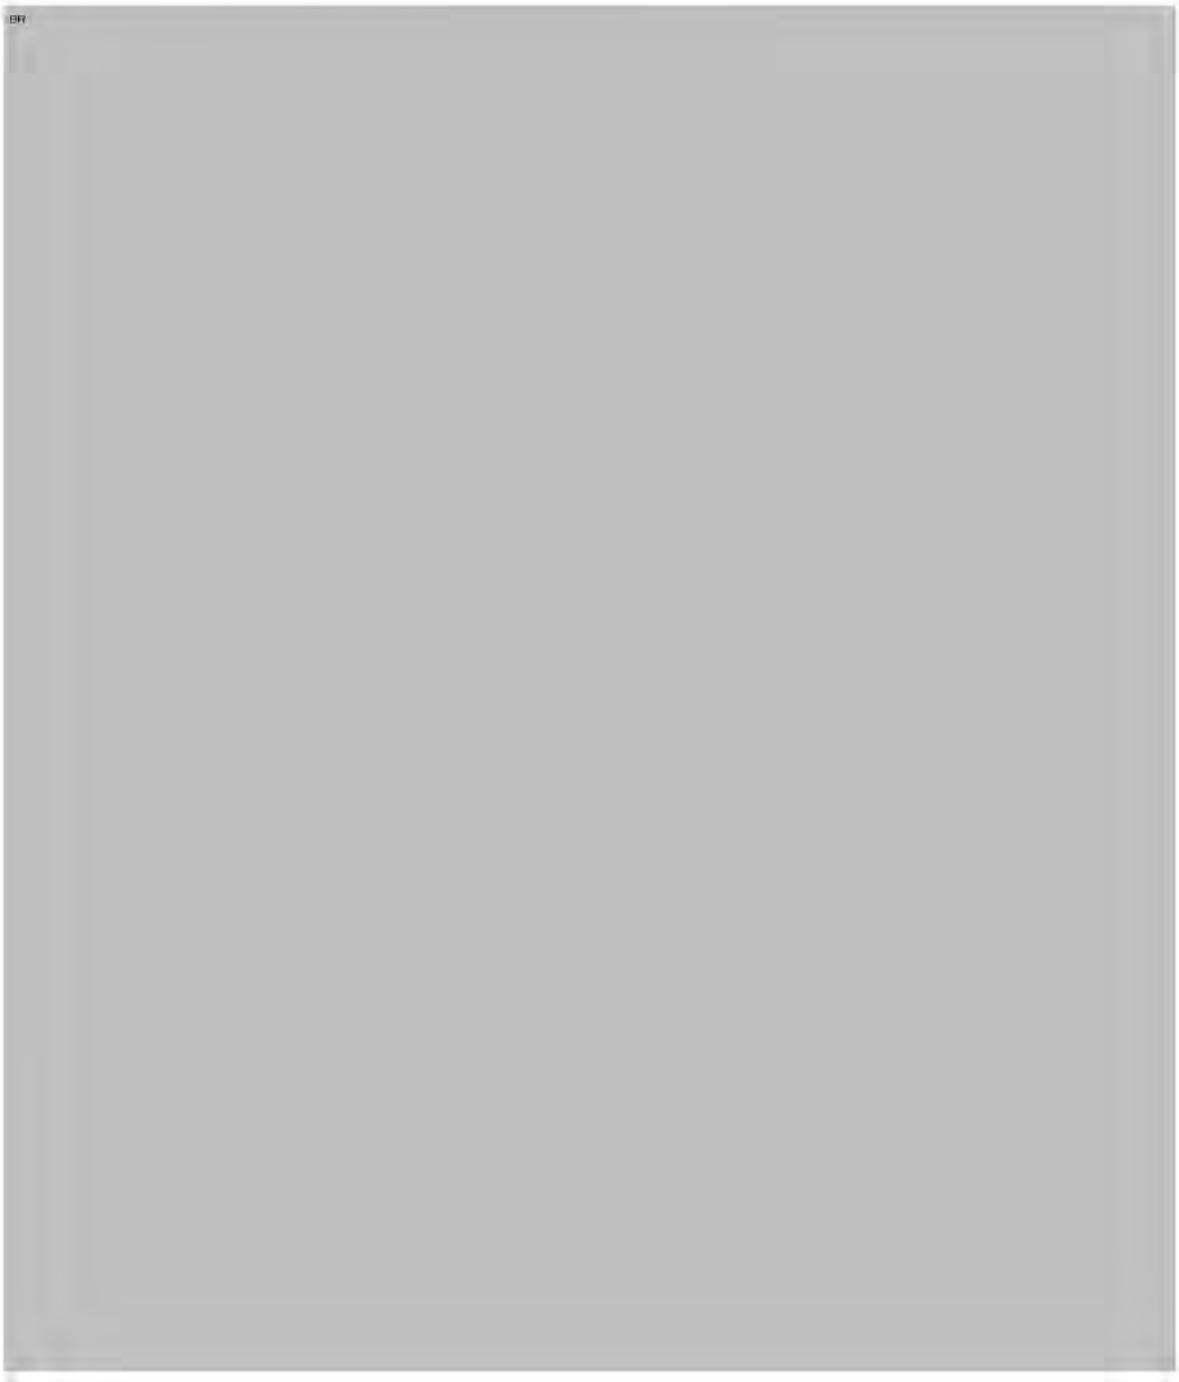

- Voor de tweede toevoer hebben de gronddeskundigen een voorstel opgeleverd waarmee adviseurs van beide partijen instemmen. Formeel akkoord is er nog niet van de grondeigenaar.
- Tweede gesprek met HHD gehad over de gezamenlijke communicatie over realisatie waterberging.

Per mail en bij gesprekken blijkt dat er nog veel vragen zijn omtrent het Molenvlietpark. VVE heeft op aanbod gereageerd dat men eerst op schrift een aantal onderwerpen uitgelegd wil krijgen. De onafhankelijk voorzitter gaat VVE bellen om de ontstane situatie te bespreken.

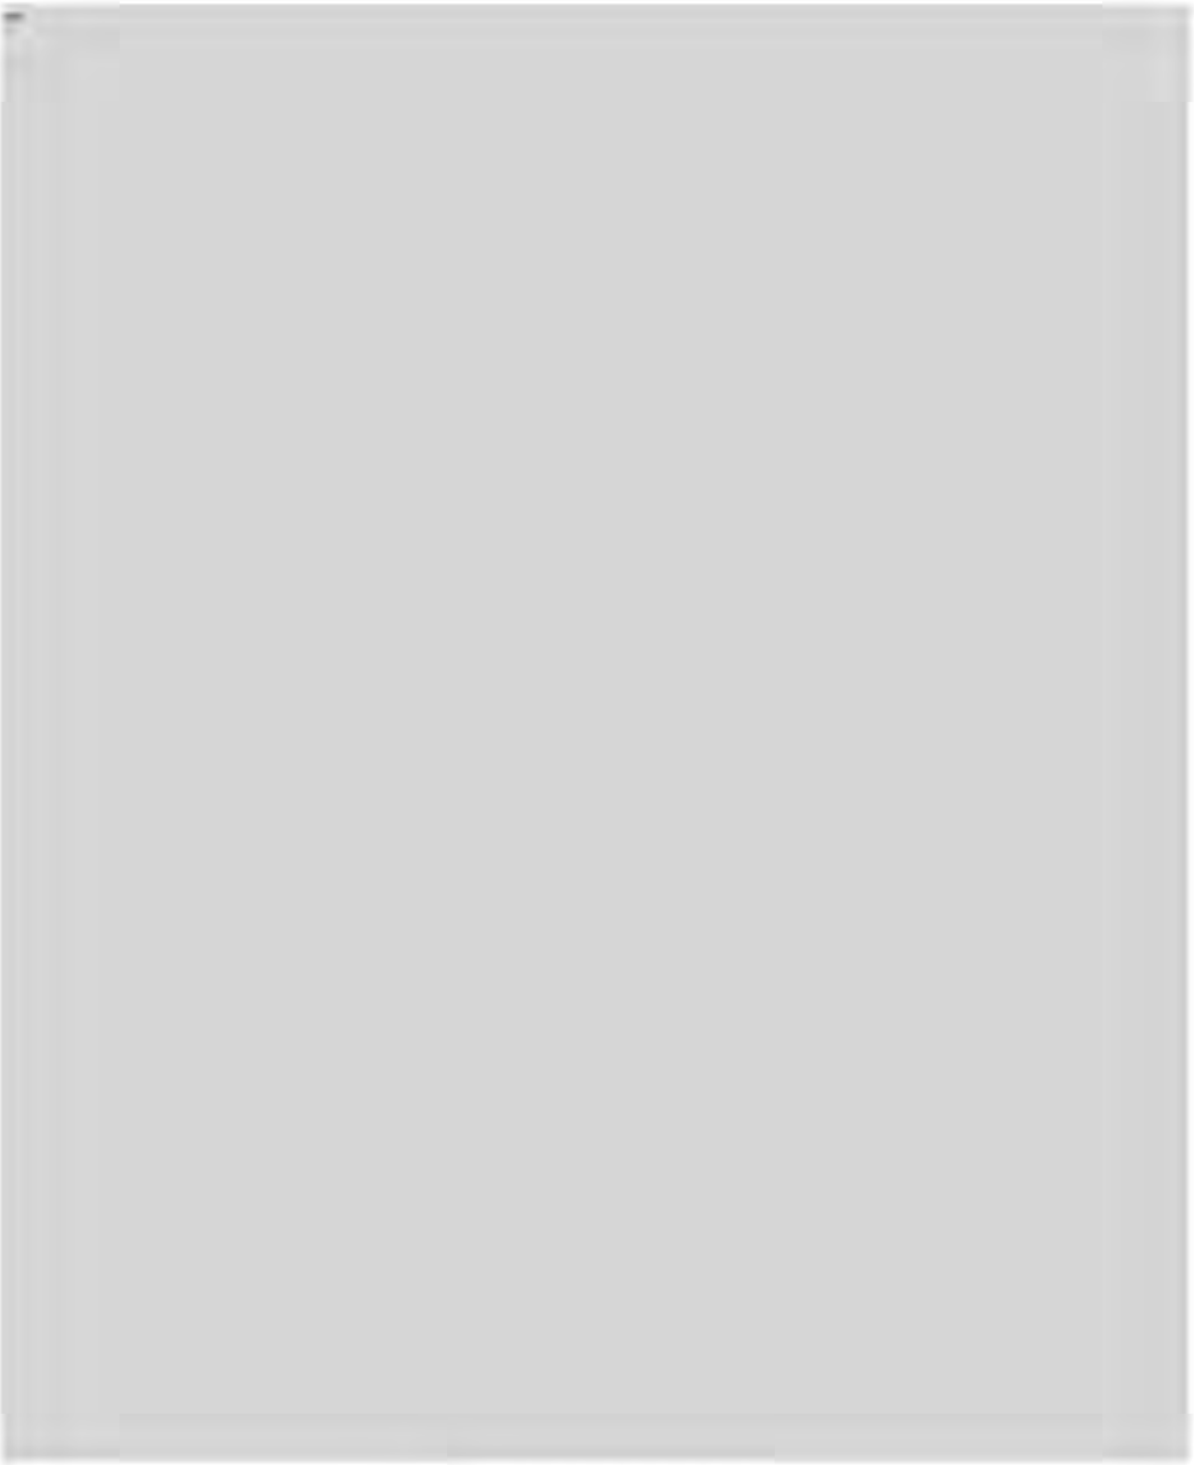

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 22 mei 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

- 9 mei heeft weth Revis het 2-minutendebat met Partij voor de Dieren gevoerd over de bomenkap voor de tweede watertoevoer. De vragen heeft weth. goed kunnen beantwoorden.
- Afronden SOK met grondeigenaar voor de watertoevoer loopt door tot ca. juli.

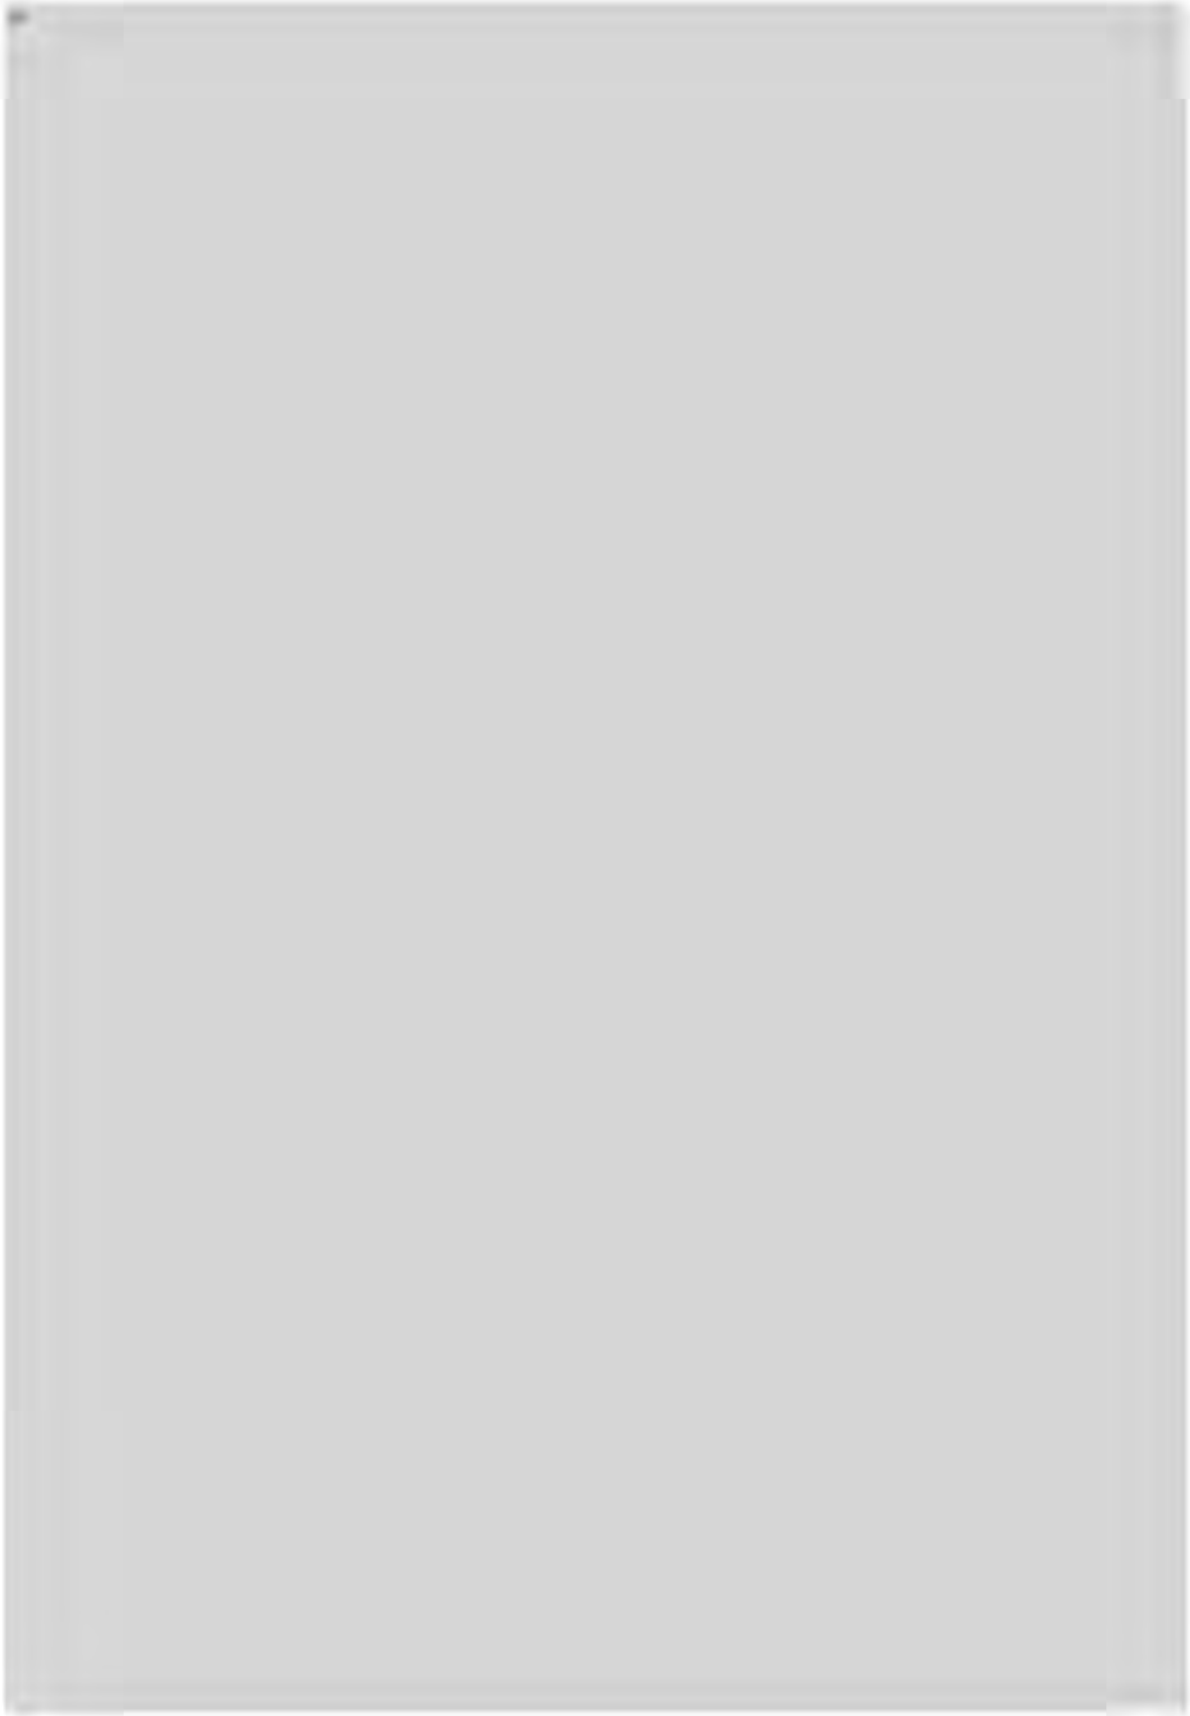

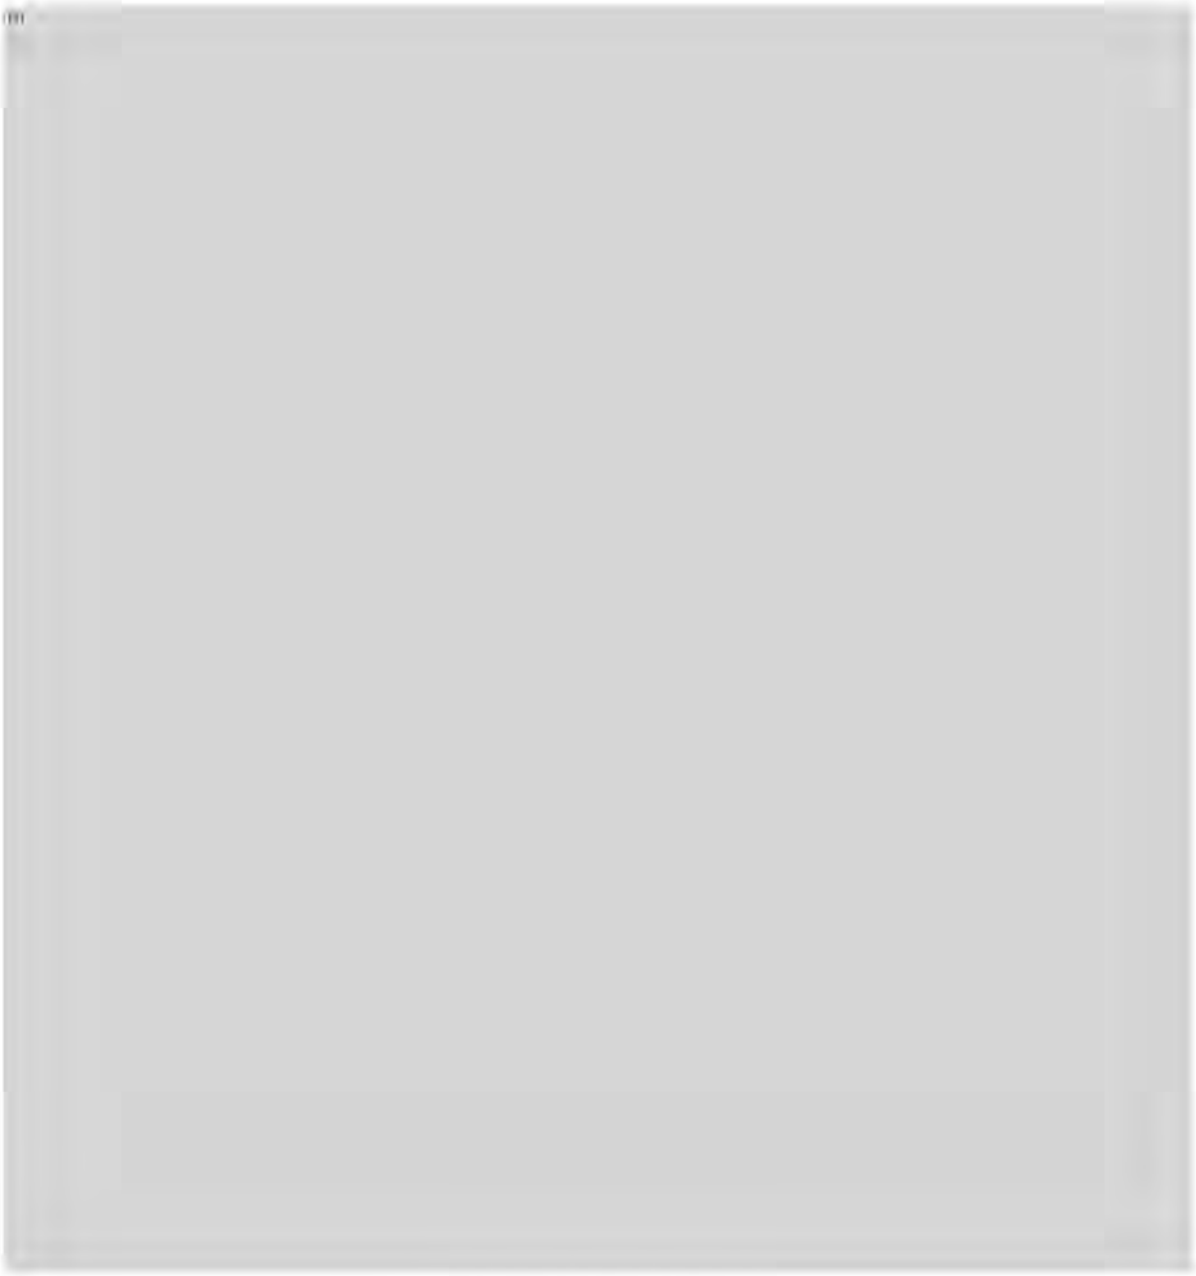

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 5 juni 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

- 5.1.2.e is bereidt d.m.v. SOK medewerking te verlenen aan watertoevoer.

BR

[redacted]

- [redacted] gaat communicatie doen rondom Molenvlietpark en watertoevoer.

[redacted]

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 19 juni 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

- 16 juli wordt er inloopbijeenkomst georganiseerd over tweede watertoevoer.
- Op verzoek Park Hoornwijck wordt de boezemkade Molenvlietpark met 17cm verlaagd.

BR

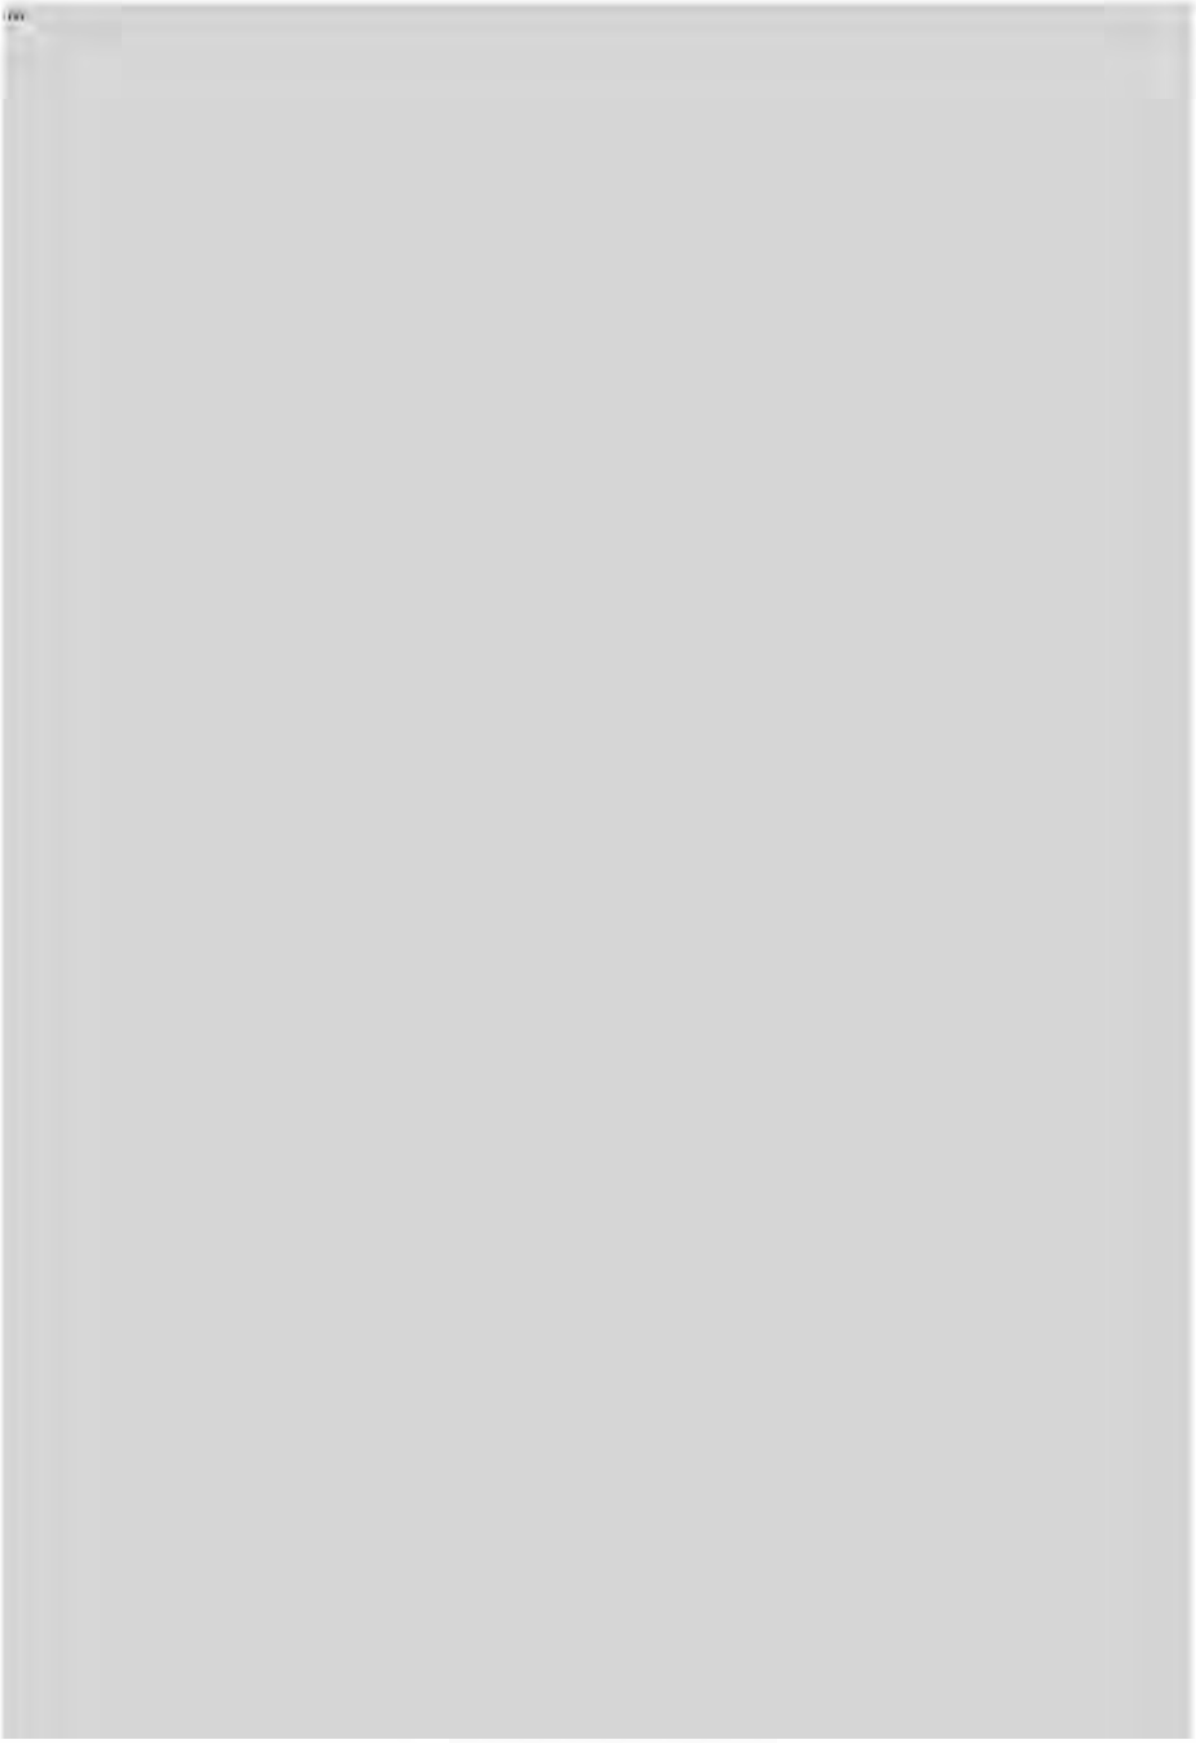

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 17 juli 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

- 16 juli plenaire informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden over 2e watertoevoer. Soms kritisch, maar goed verlopen. Presentaties gegeven door 5.1.2.e 5.1.2.e (o.a. fasering), HHD (waterberging) en 5.1.2.e (landschapsontwerp). De groenbeheerder en wegbeheerder waren ook aanwezig en hielpen bij het beantwoorden van vragen.
- Op verzoek van bewoners Park Hoornwijck wordt de boezemkade achter hun woningen in september met 17 centimeter verlaagd.

312e

- Provincie Zuid Holland heeft laatste reactie gegeven op SOK vervangen oeverbescherming Jan Thijssenweg. SOK wordt afgerond. Vervolgstap voor ons n.a.v. de SOK is om het DO ter controle aan de provincie voor te leggen en de realisatie tijdig uit te voeren. → projectmutatie hieromtrent kan opgesteld worden en in procedure worden gebracht.

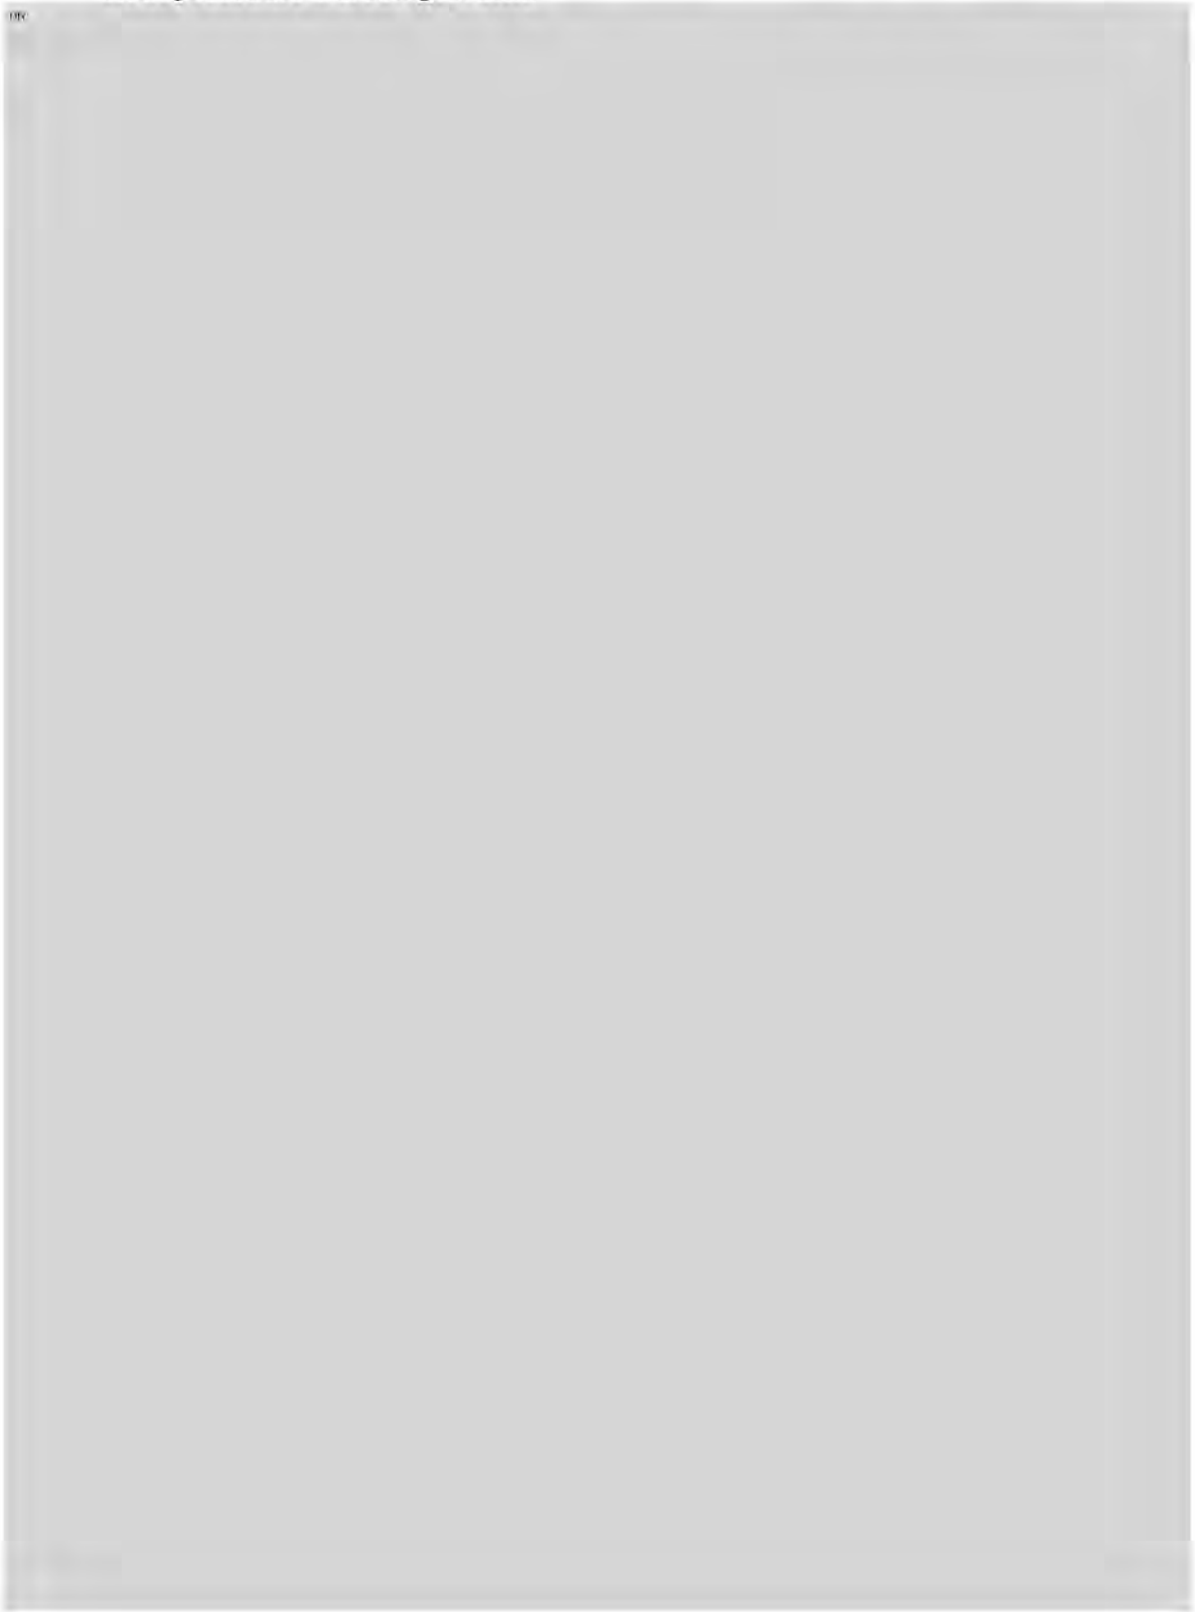

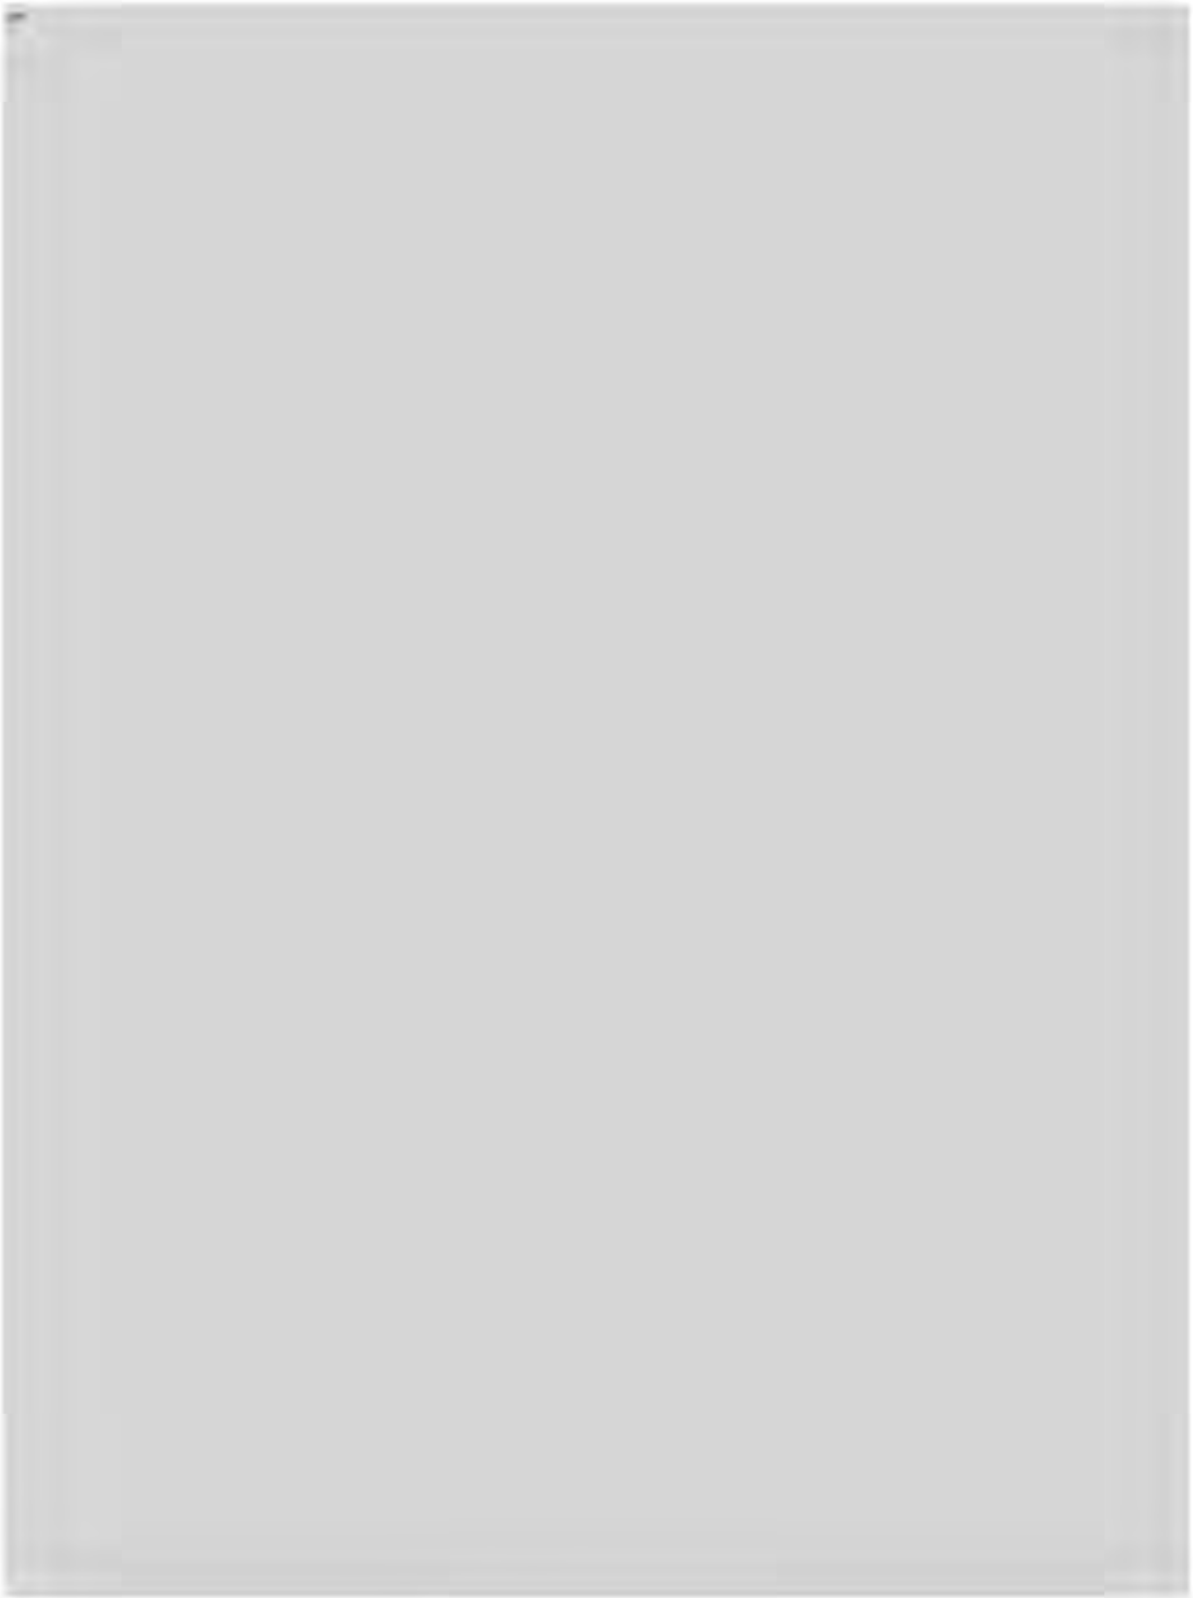

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 31 juli 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

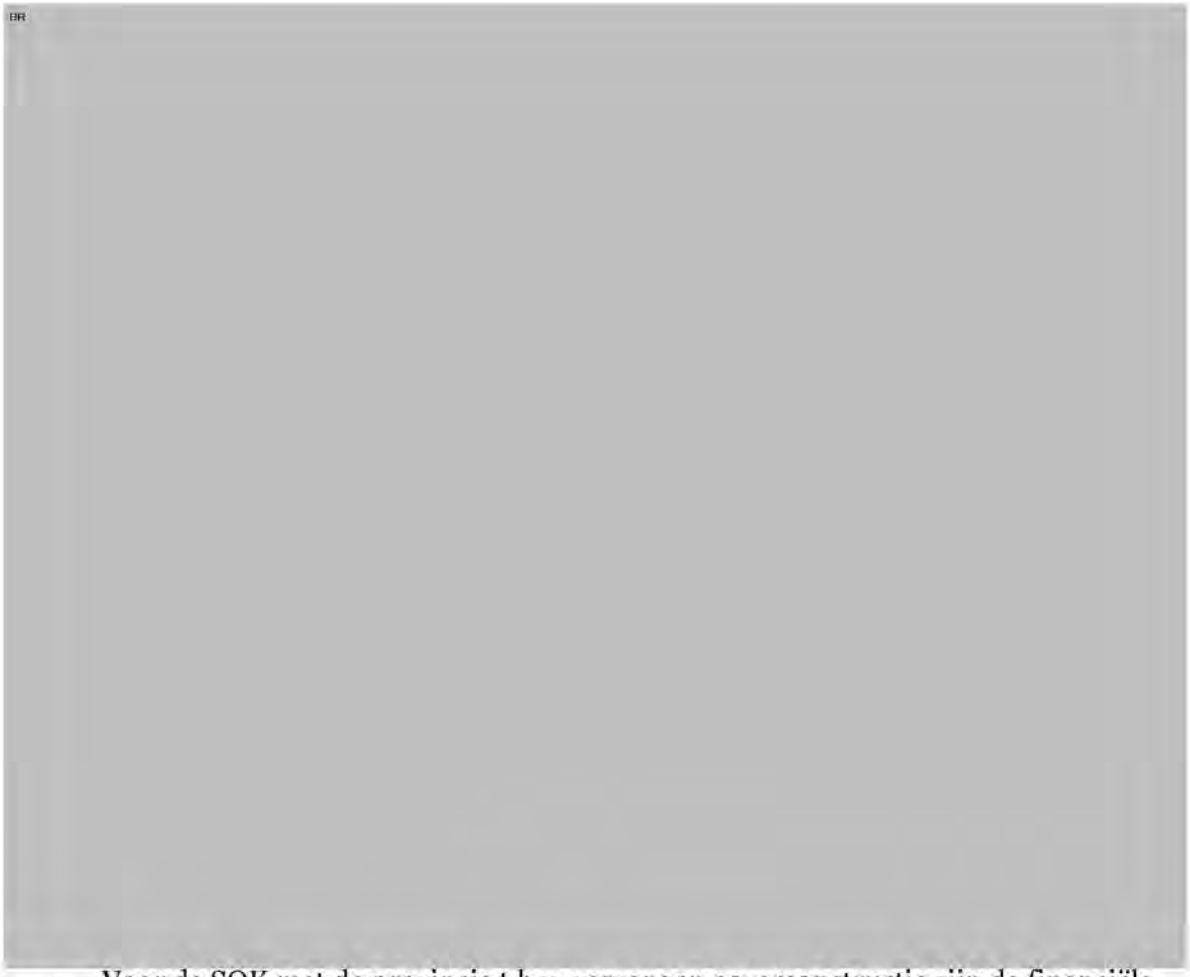


- Voor de SOK met de provincie t.b.v. vervangen oeverconstructie zijn de financiële afspraken intern afgestemd. Roba krijgt het budget dat provincie gereserveerd had voor haar opgave om de kade 1-op-1 te vervangen (€530.000,-). De meerkosten als gevolg van realisatie tweede watertoevoer zijn voor rekening van project Rotterdamsebaan.

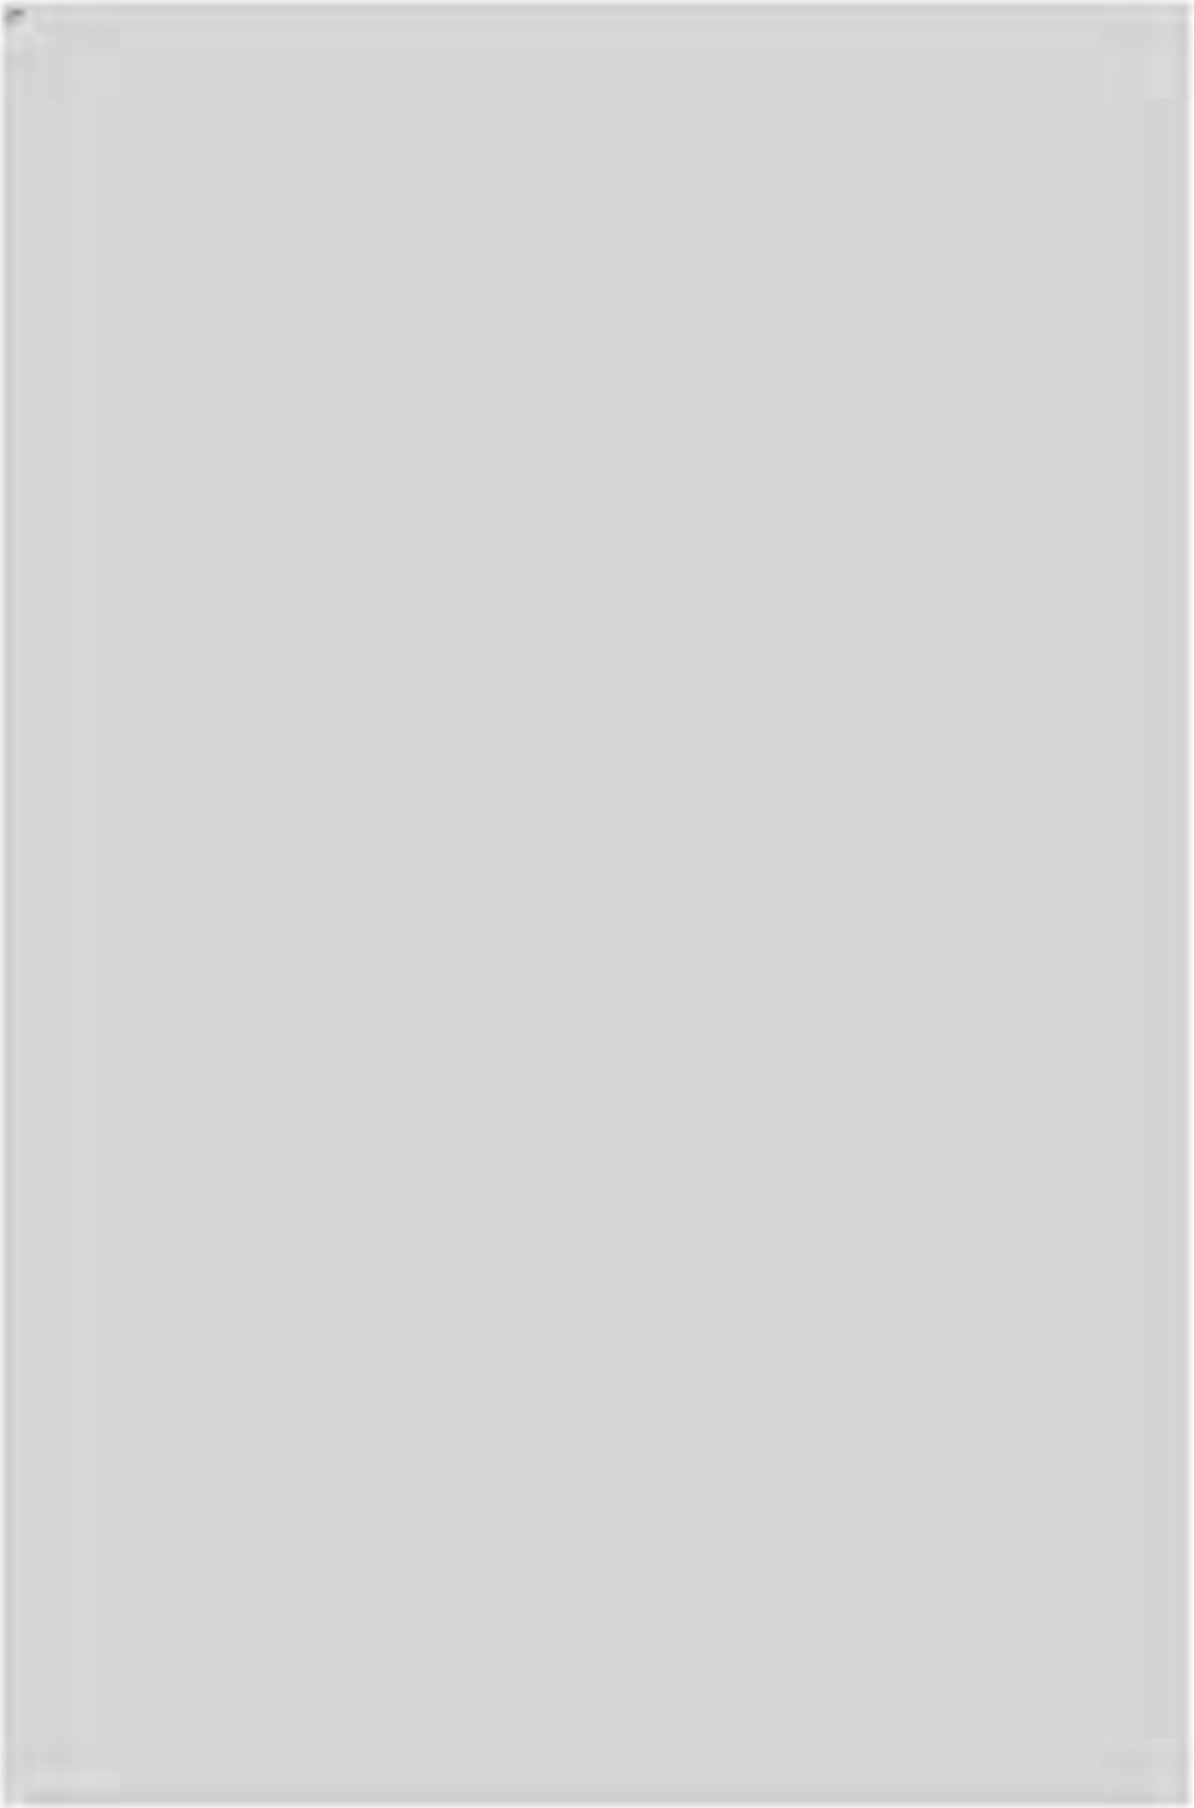

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 28 augustus 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

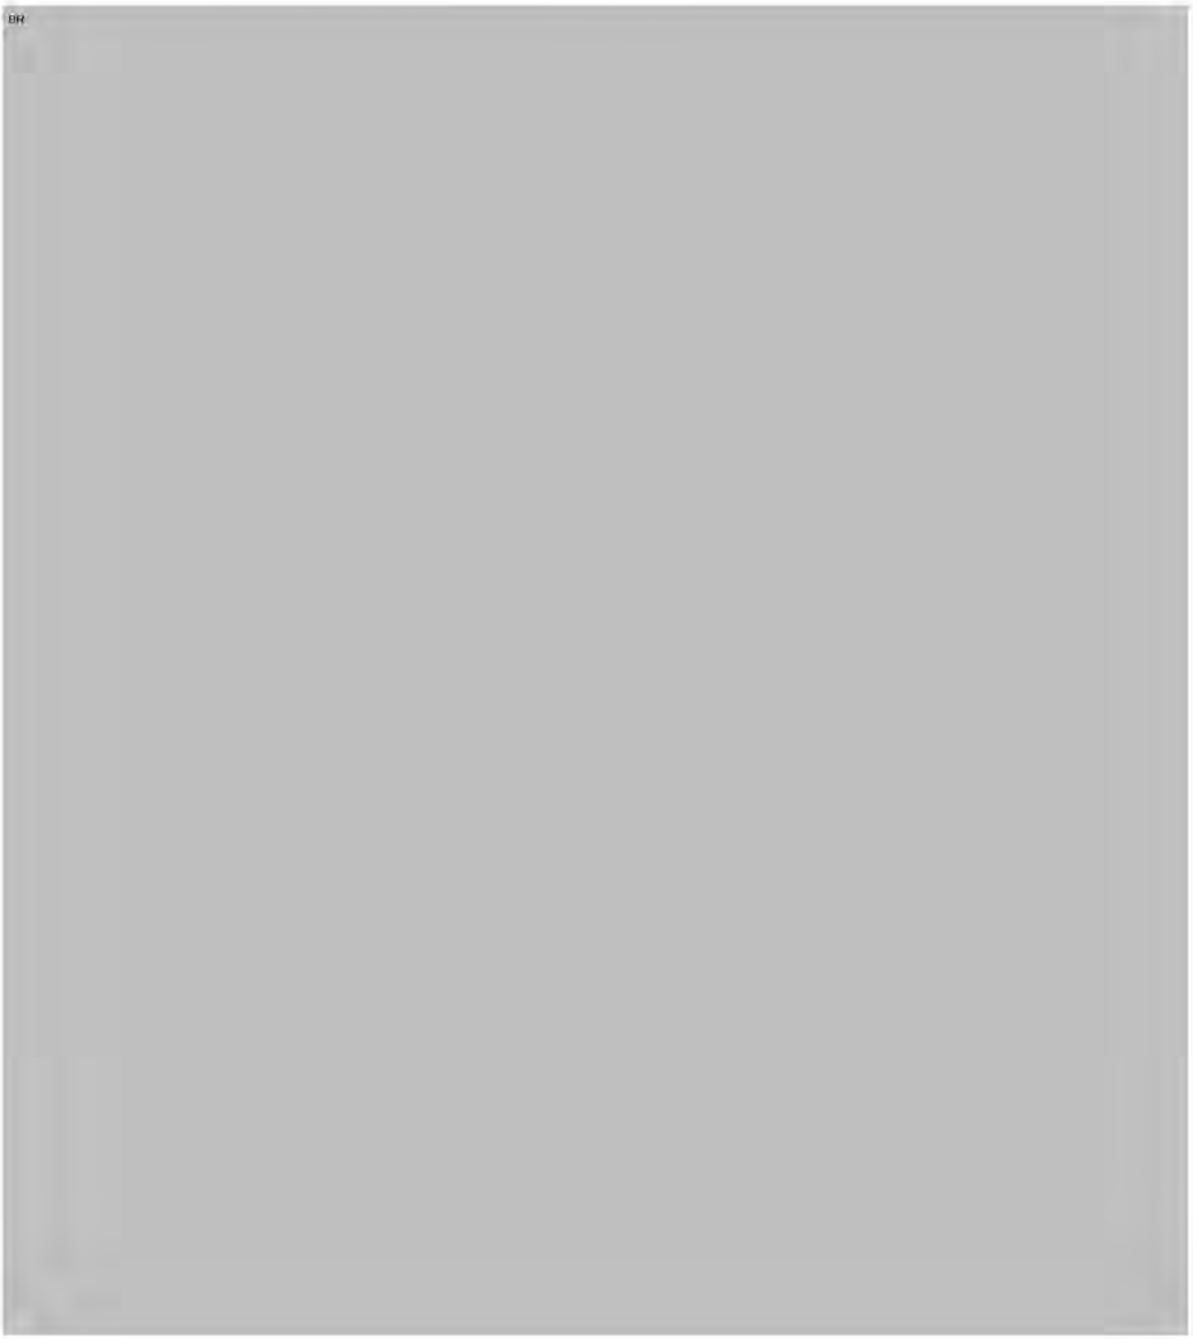

- De aktes voor bij SOK tweede watertoevoer worden opgemaakt en er wordt fiscaal advies binnen Den Haag ingewonnen. Daarna kan SOK worden ondertekend.

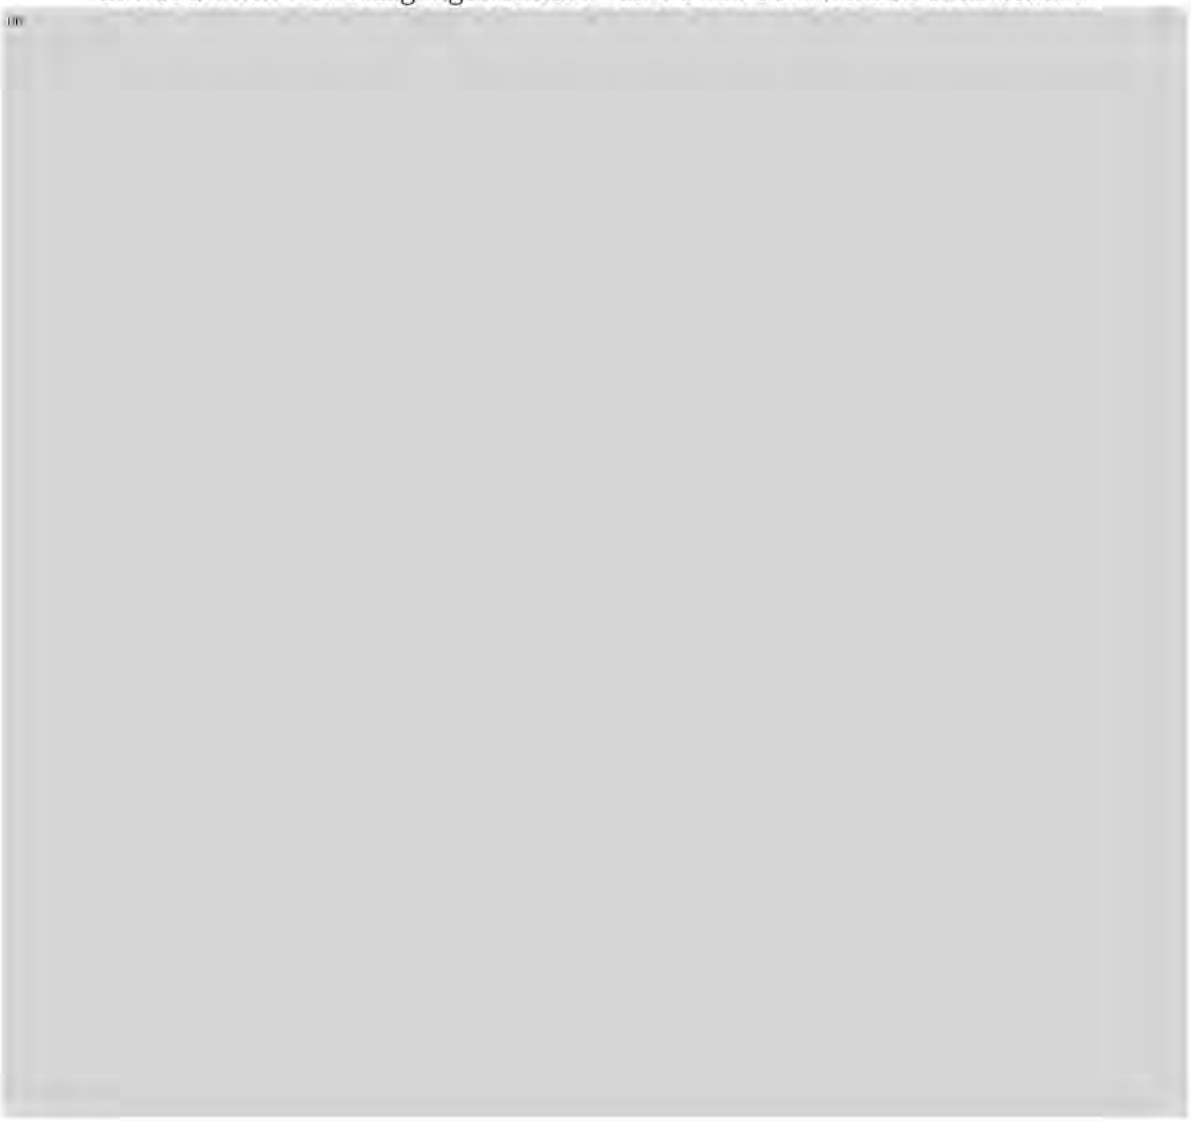

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr96

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 11 september 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

- Hoogheemraadschap heeft per email aangegeven dat zij akkoord is met haar vergoeding voor 2e watertoevoer aan particuliere grondeigenaar. Akte van levering morgen opstellen.

BR

- CRB werkt aan een alternatief voorstel voor de niet door haar bereikte CO2 prestatie en zal haar alternatieven over ca. 1 maand aan Roba voorleggen. Roba overweegt een expert in te zetten om het plan van CRB inhoudelijk te beoordelen.

5.1.2.e

- Op verzoek van DSB/OG doet RHDHV onderzoek naar de contractwijzigingen bij project Roba met als doel om er leerpunten voor Den Haag uit te halen. Het is geen audit. 5.1.2.e heeft de 'herkomstlijst' van de contractwijzigingen beschikbaar.
- 5.1.2.e leest mee met de beoogde contractwijziging voor de incentive Testen. → 5.1.2.e wil ook het concept lezen.
- Definitieve versie SOK vervangen oeverbescherming met prov ZH ligt ter akkoord bij provincie. JZ 5.1.2.e Haag heeft de SOK op verzoek van 5.1.2.e ook gecontroleerd. Provincie is ook ons DO aan het toetsen. Dit verloopt goed.
- Diverse personeelsleden worden verlengd.

**BEDIENCENTRALE**

## 4 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.
Besproken:

- 5.1.2.e DMZ is opgeleverd.
- 5.1.2.e Selectieleidraad bediencentrale is gereed. VS1 en VS2 voor bediencentrale worden opgesteld. We moeten nog bepalen hoe de design component (architectuur) uit te werken. Selectiefase kan starten na toestemming van CVDH en Stedelijk Beheer t.a.v. wel / niet de gebouwgebonden installaties in MJO opnemen.
- 5.1.2.e Morgen overleg met 5.1.2.e 5.1.2.e over de diverse vergunningen. Wegens de landelijke onzekerheid omtrent stikstof effecten van bouwplannen is Den Haag momenteel alle vergunningaanvraag aan het aanhouden.

**TREKFIETSTRACÉ**

## 5 Rondje langs de velden (standaard agendapunt)

Gevraagd: Actuele ontwikkelingen bespreken.
Besproken:

- 5.1.2.e Contractwijziging formaliseren met CRB t.b.v. realisatie fietspad maaiveld.
- 5.1.2.e Aan 5.1.2.e wordt het gewijzigde ontwerp van de comfortschermen door 5.1.2.e gepresenteerd. Hij zal bepalen of voorleggen aan Welstand nodig is. Nieuw ontwerp is gebaseerd op aluminium platen met uitsneden ipv losse wiebertjes bevestigen aan staaldraad.
- 5.1.2.e Binnenkort worden de tijdelijke steunpunten onder het viaduct verwijderd.
- 5.1.2.e Op 1 oktober zal eerste grondruil plaatsvinden tussen 5.1.2.e en gemeente t.b.v. realisatie maaiveld-sectie van het Trekfietstracé. Q1 2020 ontvangt 5.1.2.e het tweede perceel. 5.1.2.e en 5.1.2.e zijn contactpersonen.

**ALGEMEEN**

## 6 Afspraken komende periode

Gevraagd: Ter kennisgeving
Besloten: Ter kennisgeving aangenomen

## 7 Rondvraag & Sluiting

- Geen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 25 september 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

- Eigenaar Jan Tijssenweg 8 gesproken. Grondruilovereenkomst komt tot stand nadat overeenkomst is getekend met eigenaar Vredenoord. Die heeft def-concept overeenkomst en aktes van notaris ontvangen.
- Kapvergunning incl. vleermuisonderzoek t.b.v. 2e watertoevoer is een planningsrisico. Wellicht wordt vergunning begin maart definitief, anders moeten we wachten met kappen tot na het broedseizoen.

BR

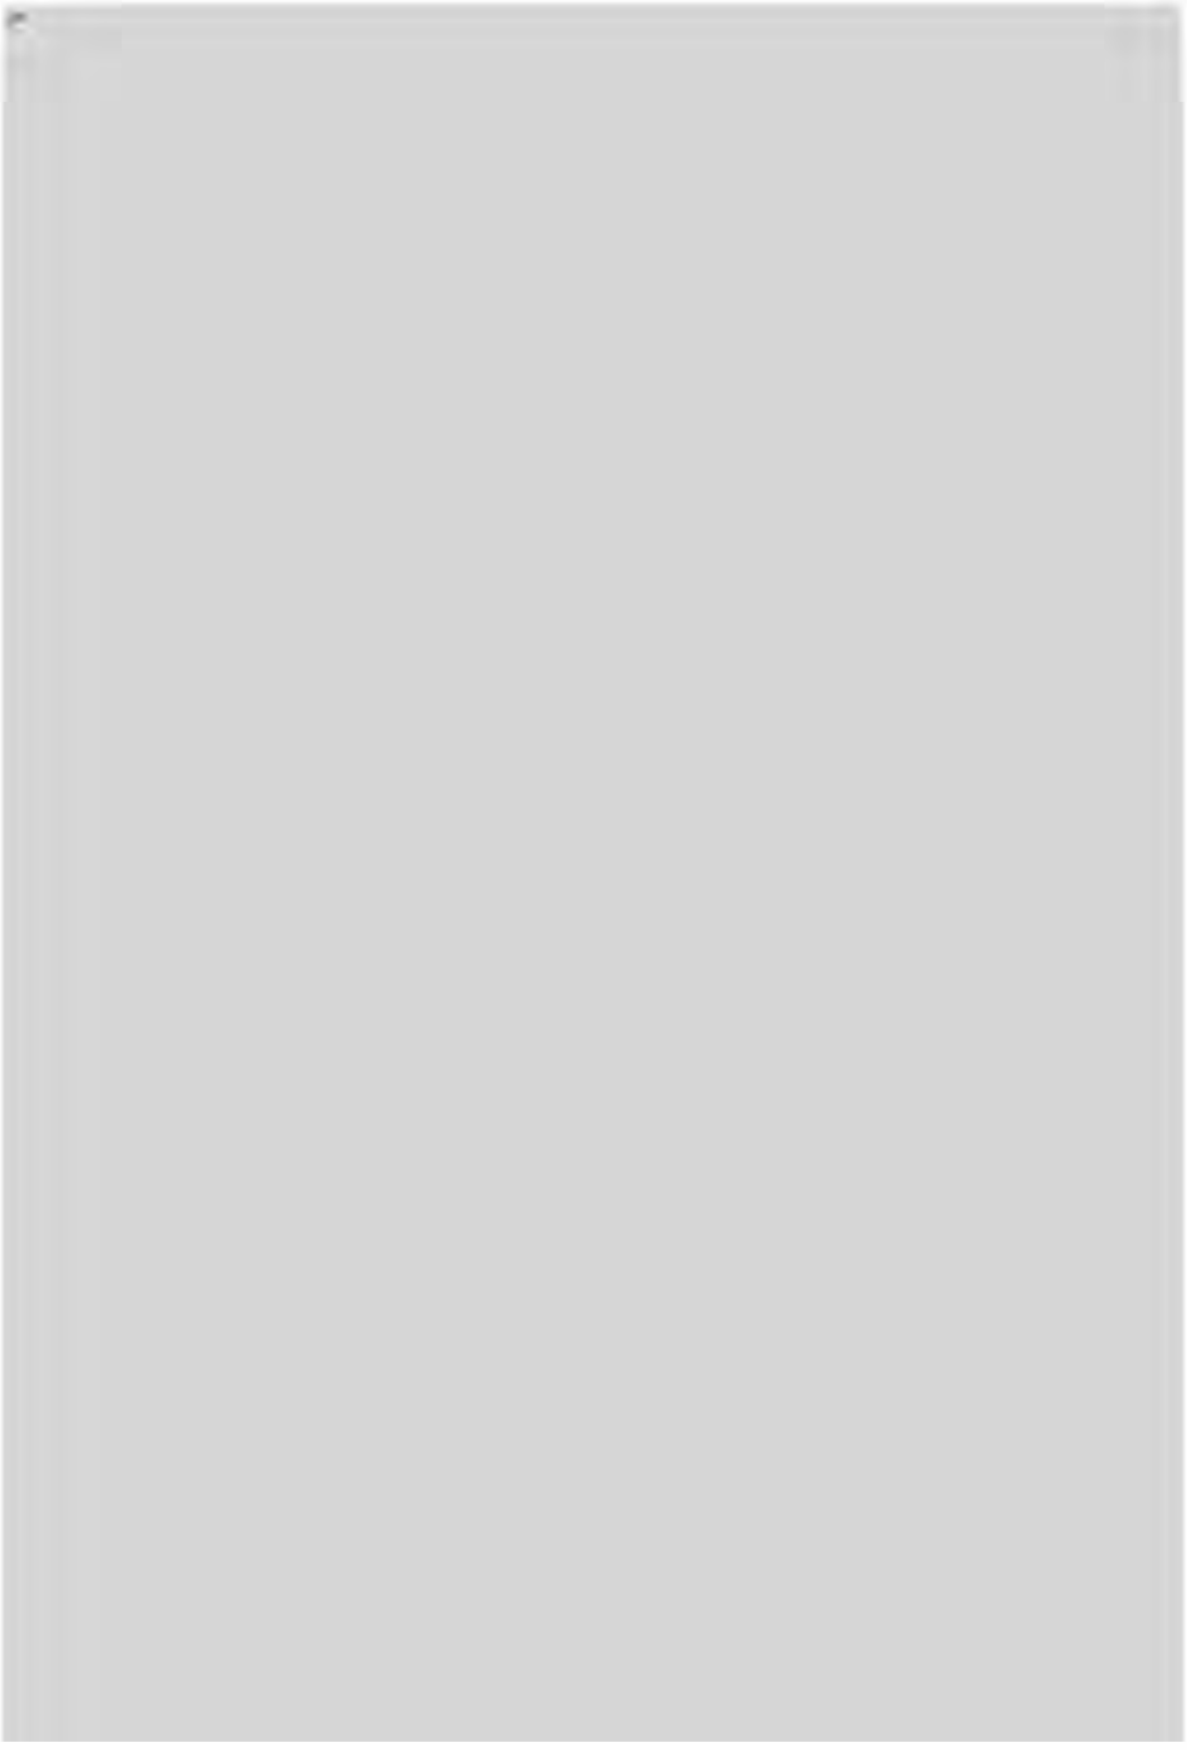

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 9 oktober 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

- Met Hoogheemraadschap gesproken over tweede watertoevoer. Financiële behoefte past binnen het financiële kader zoals afgesproken in SOK met HHD. HHD start projectplanprocedure nadat Den Haag SOK met perceeleigenaar heeft ondertekend.
- Verlening kapvergunning betreft planningsrisico tweede watertoevoer.
- Twee dijkgraven hebben Molenvlietpark bezocht.

BR

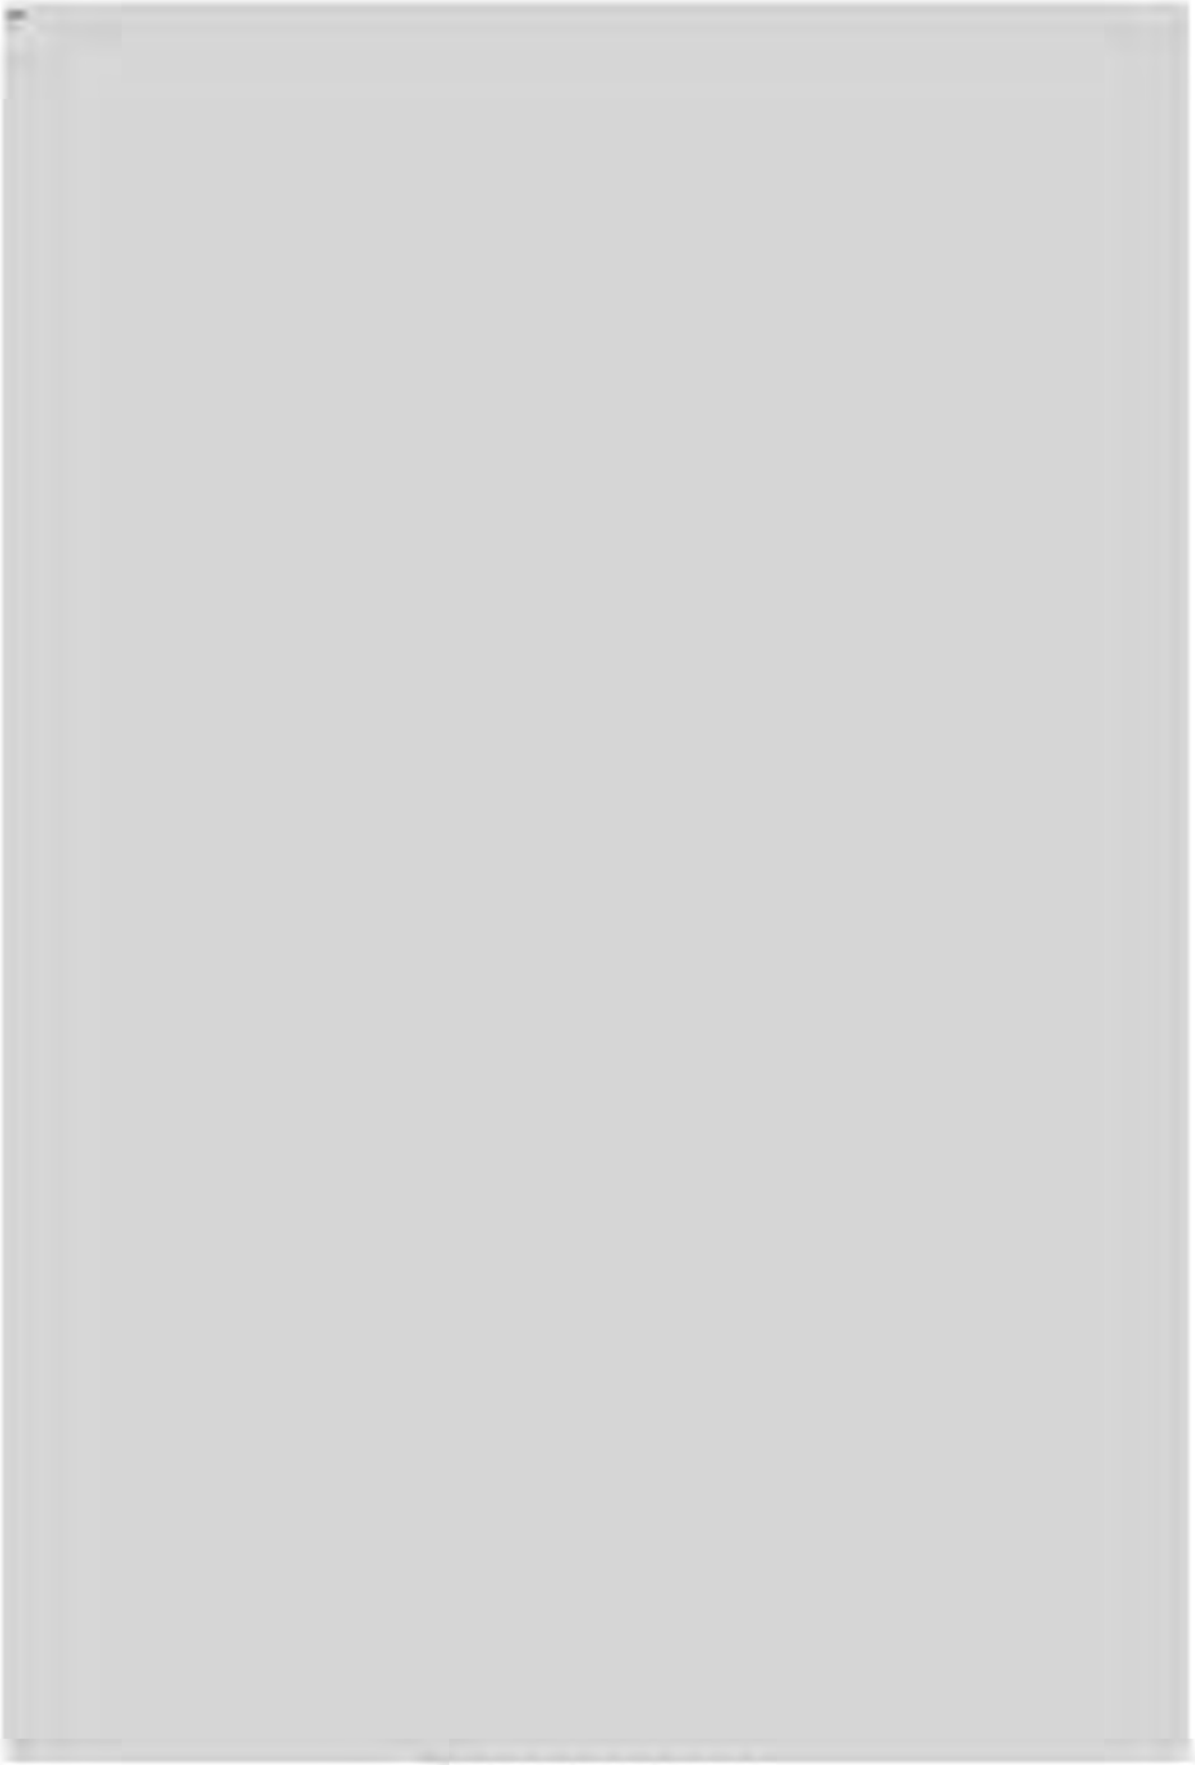

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr99

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 23 oktober 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

- 5(1)2.e zoekt voor ontwikkeling Nieuwe Vredenoord naar compensatiemaatregelen in het kader van het NNN-gebied. Hij heeft daarvoor contact opgenomen met projectorganisatie i.v.m. realisatie Molenvlietpark.

- SOK vervanging oeverconstructie zal nog eenmaal met provincie worden besproken ten behoeve van de afronding en ondertekening. Het concept-DO van de Tweede Toevoer zal aan CRB worden toegelicht en verstrekt zodat CRB kan aangeven of een aanbieding willen doen hiervoor en wat de indicatieve hoogte daarvan is. Indien CRB aangeeft geen aanbieding te willen doen of de indicatieve aanbieding boven de raming ligt of voorwaarden worden gesteld die voor Opdrachtgever niet aanvaardbaar zijn dan zal het project Tweede Toevoer op een reguliere wijze worden aanbesteed.

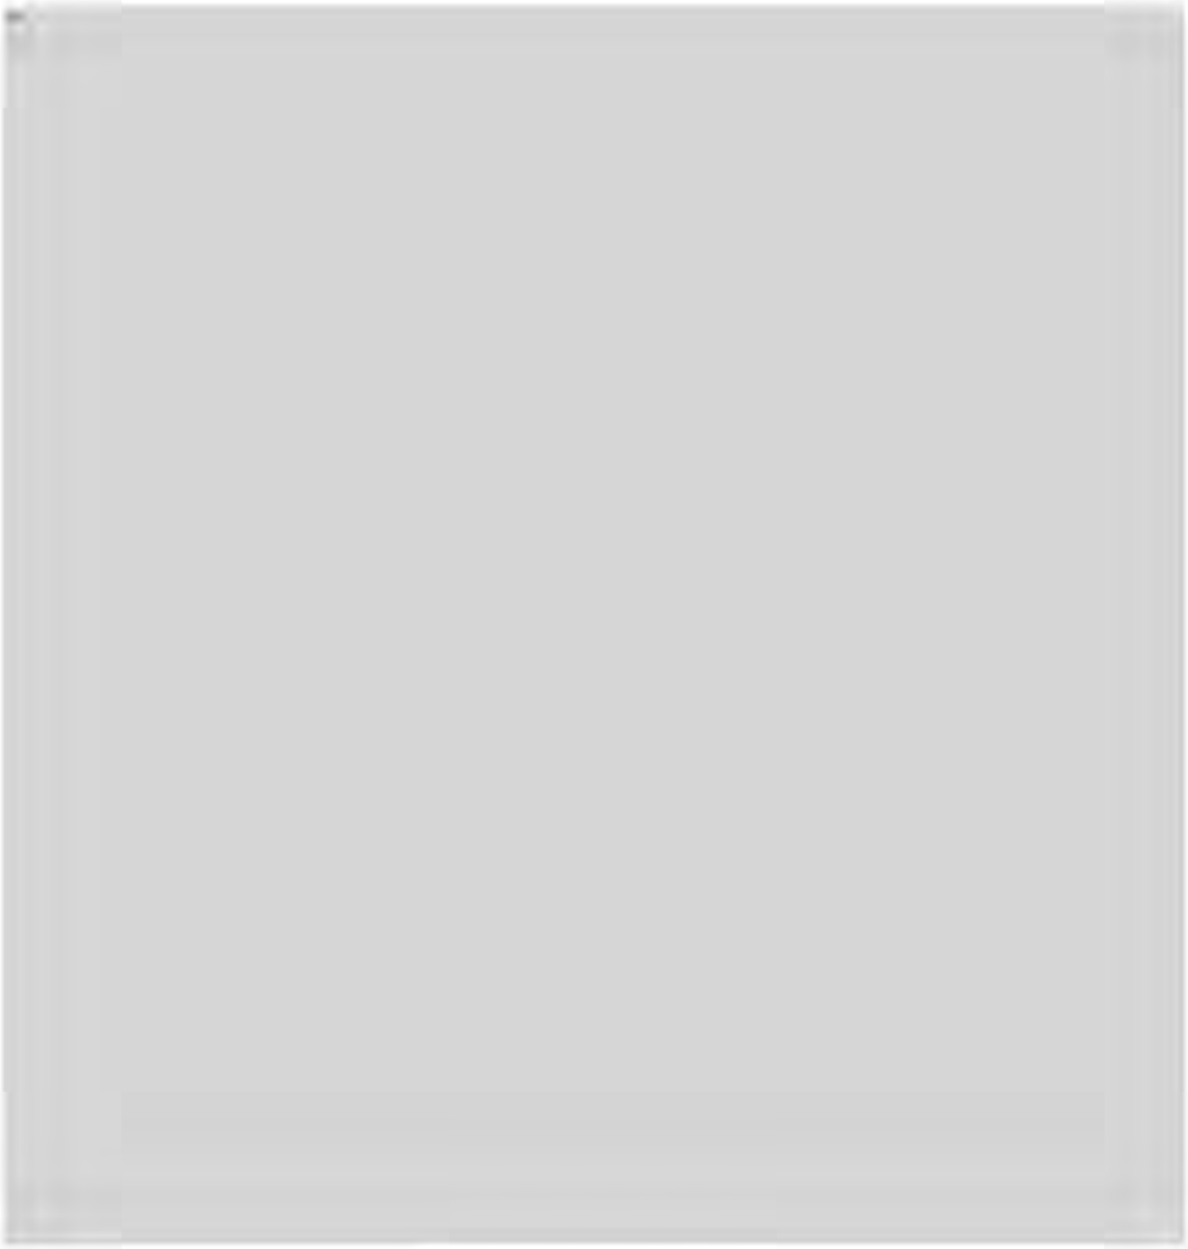

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 6 november 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| | Afwezig: |

BR

- 5.1.2.e is akkoord met tekst van de SOK met hem voor de realisatie van de tweede watertoevoer. Ondertekening vindt plaats na afronding van de anterieure overeenkomst. Met provincie wordt gesproken over compensatie van het NNN gebied. Op basis van een intentieverklaring kan HHD wellicht de projectplanprocedure voortzetten.

- Voor de realisatie van de tweede watertoevoer zal er ook grondruil en een SOK met Jan Thijssenweg 8 plaatsvinden.
- ACOR is akkoord met de bermkasten, maar nog niet akkoord met bermkasten en DO tweede toevoer Molenvlietpark.

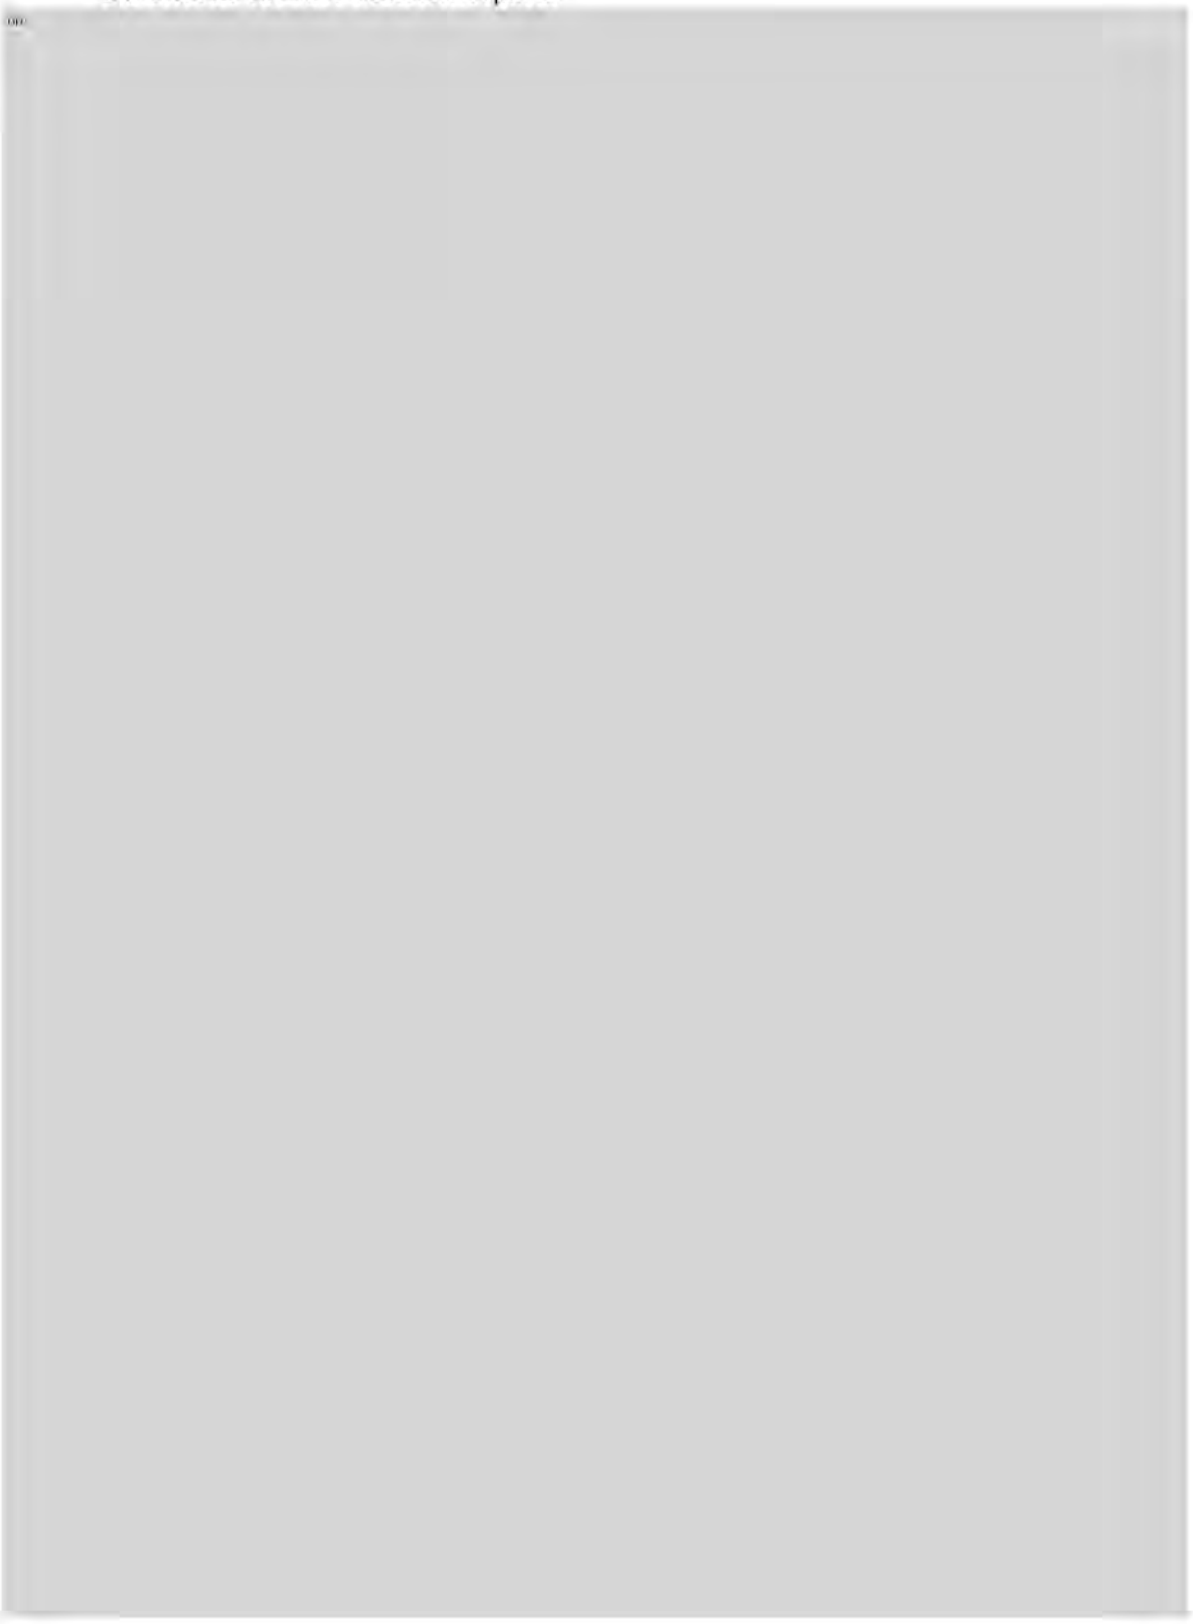

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr101

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 4 december 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |

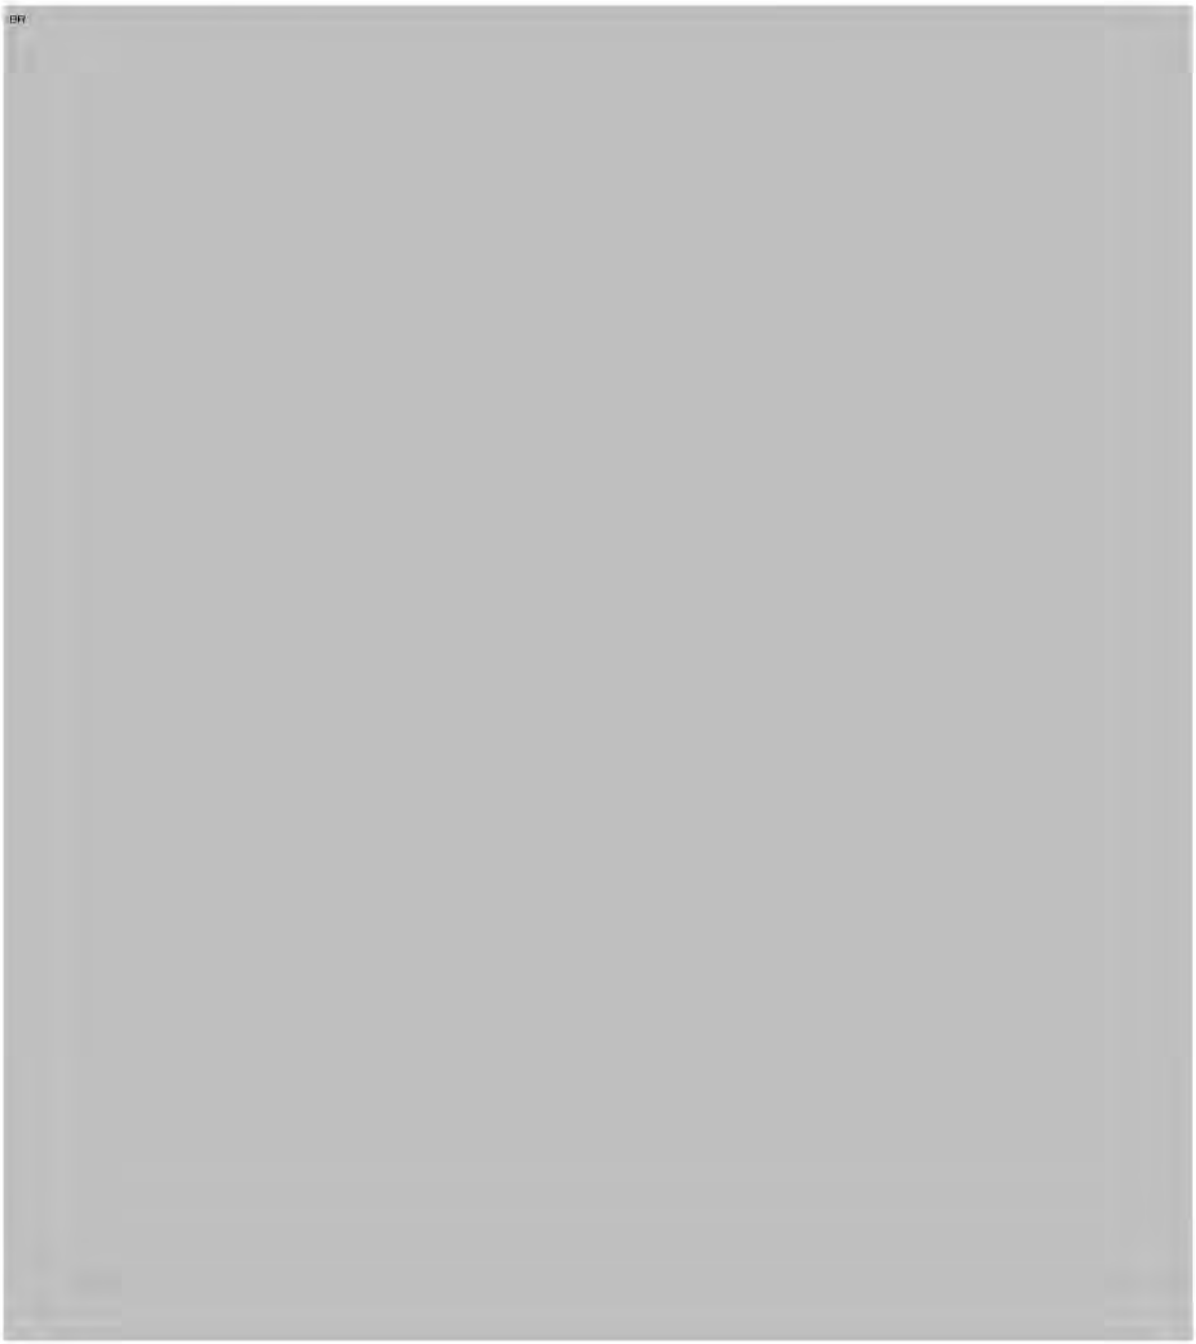

- Kapvergunning 2e watertoevoer nog niet verleend. Wij hebben geen invloed op dat proces.

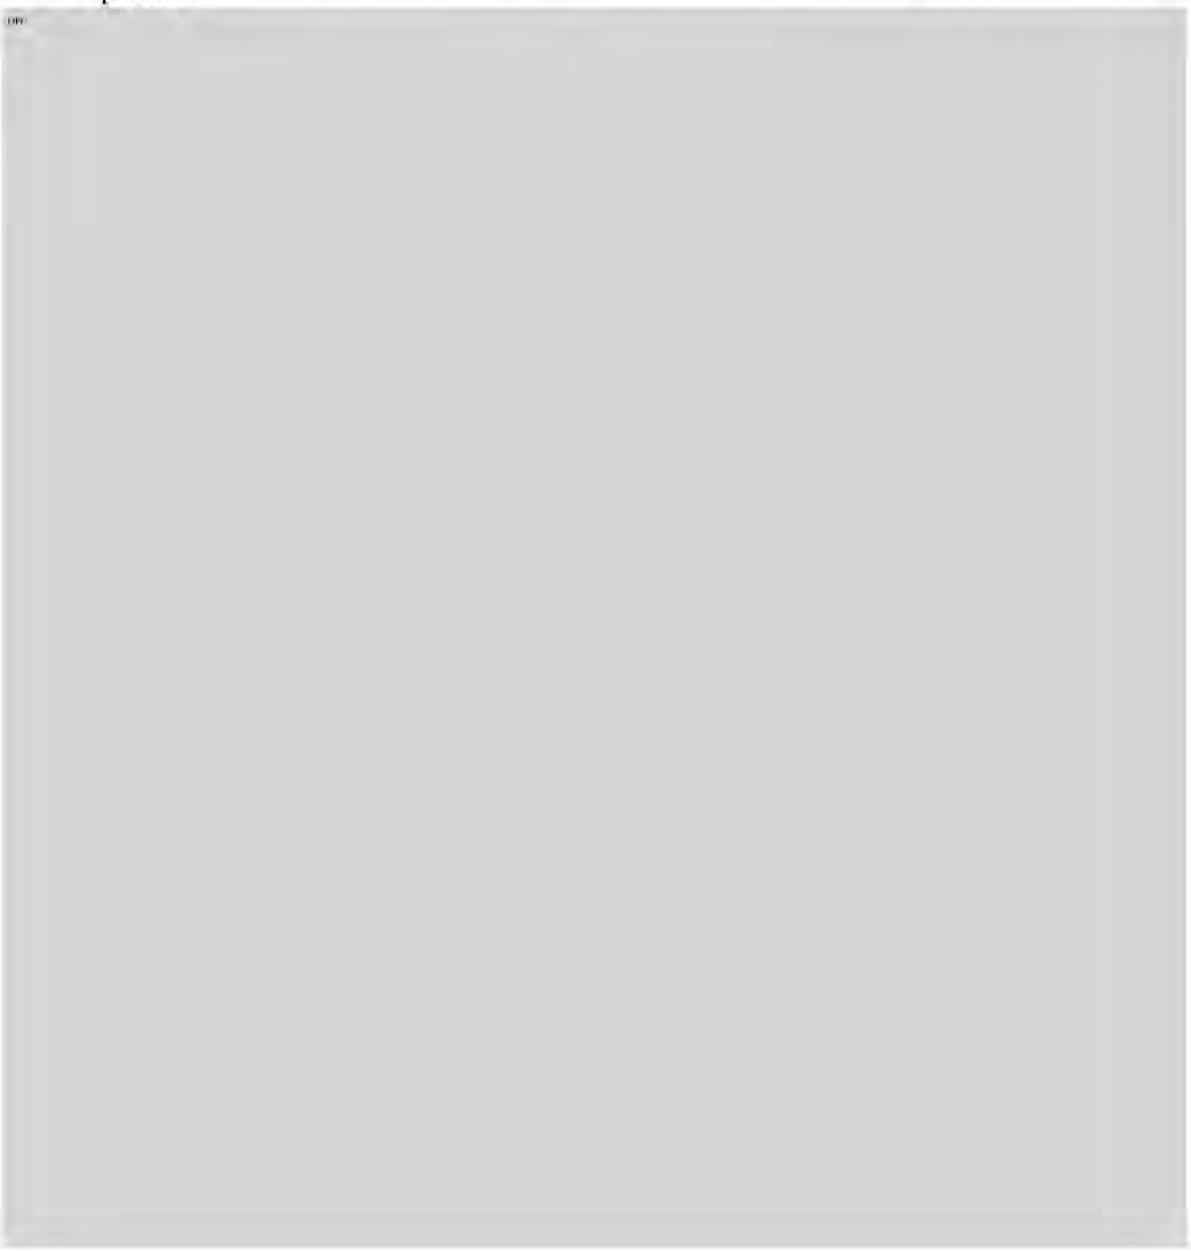

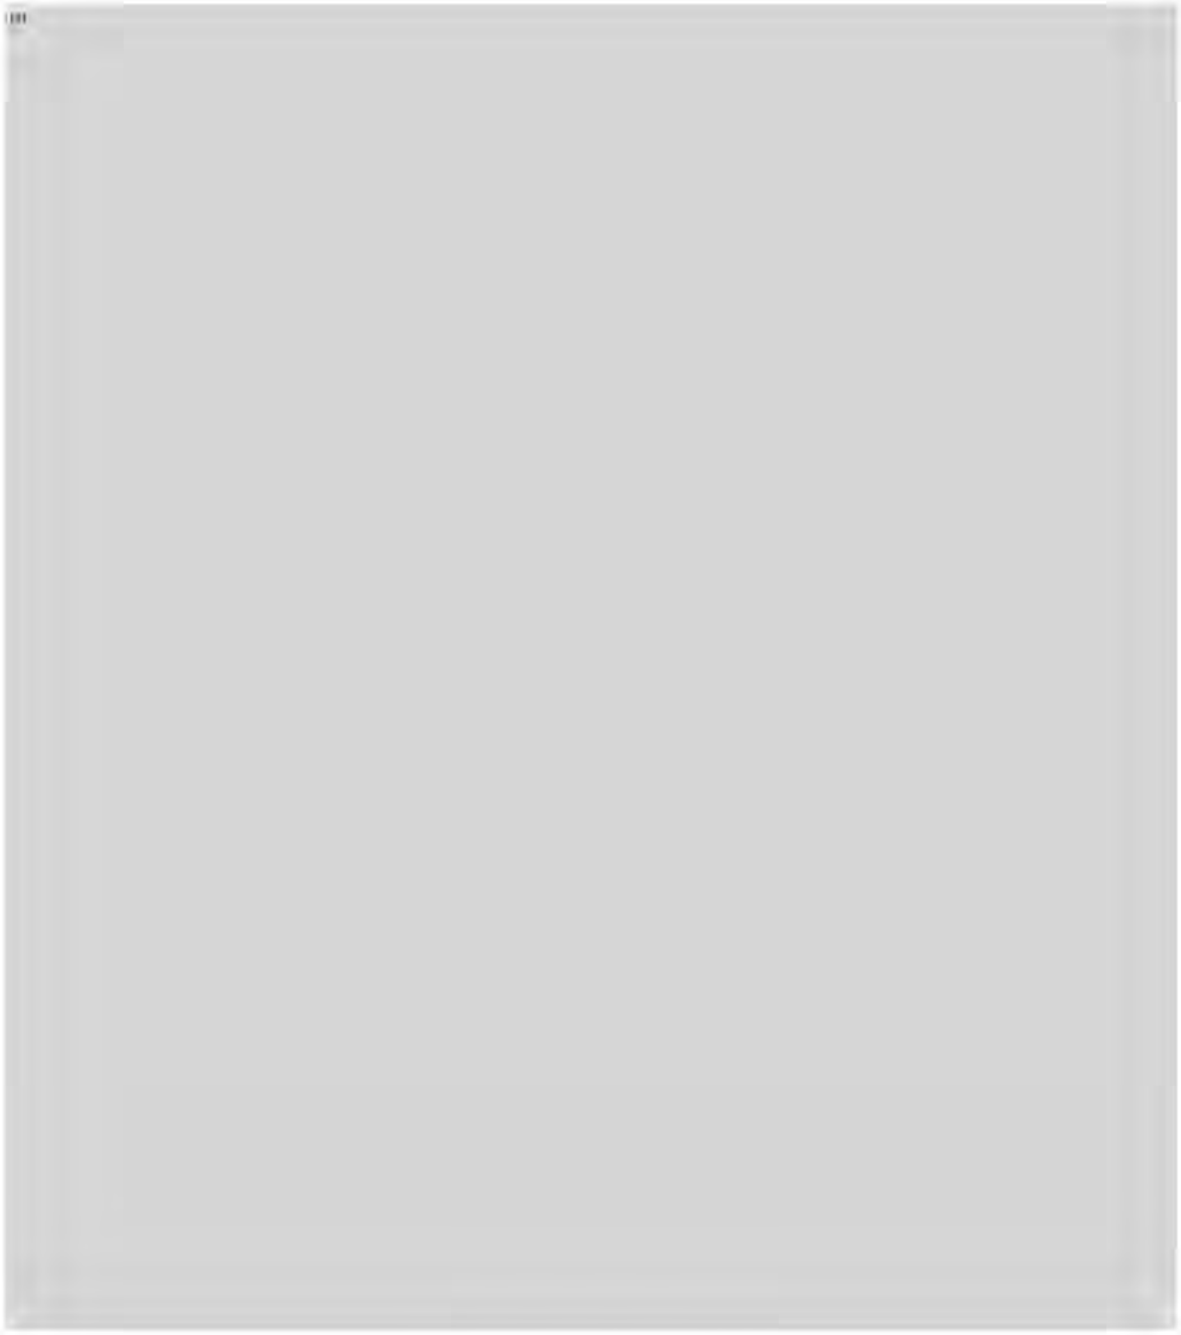

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 15 januari 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

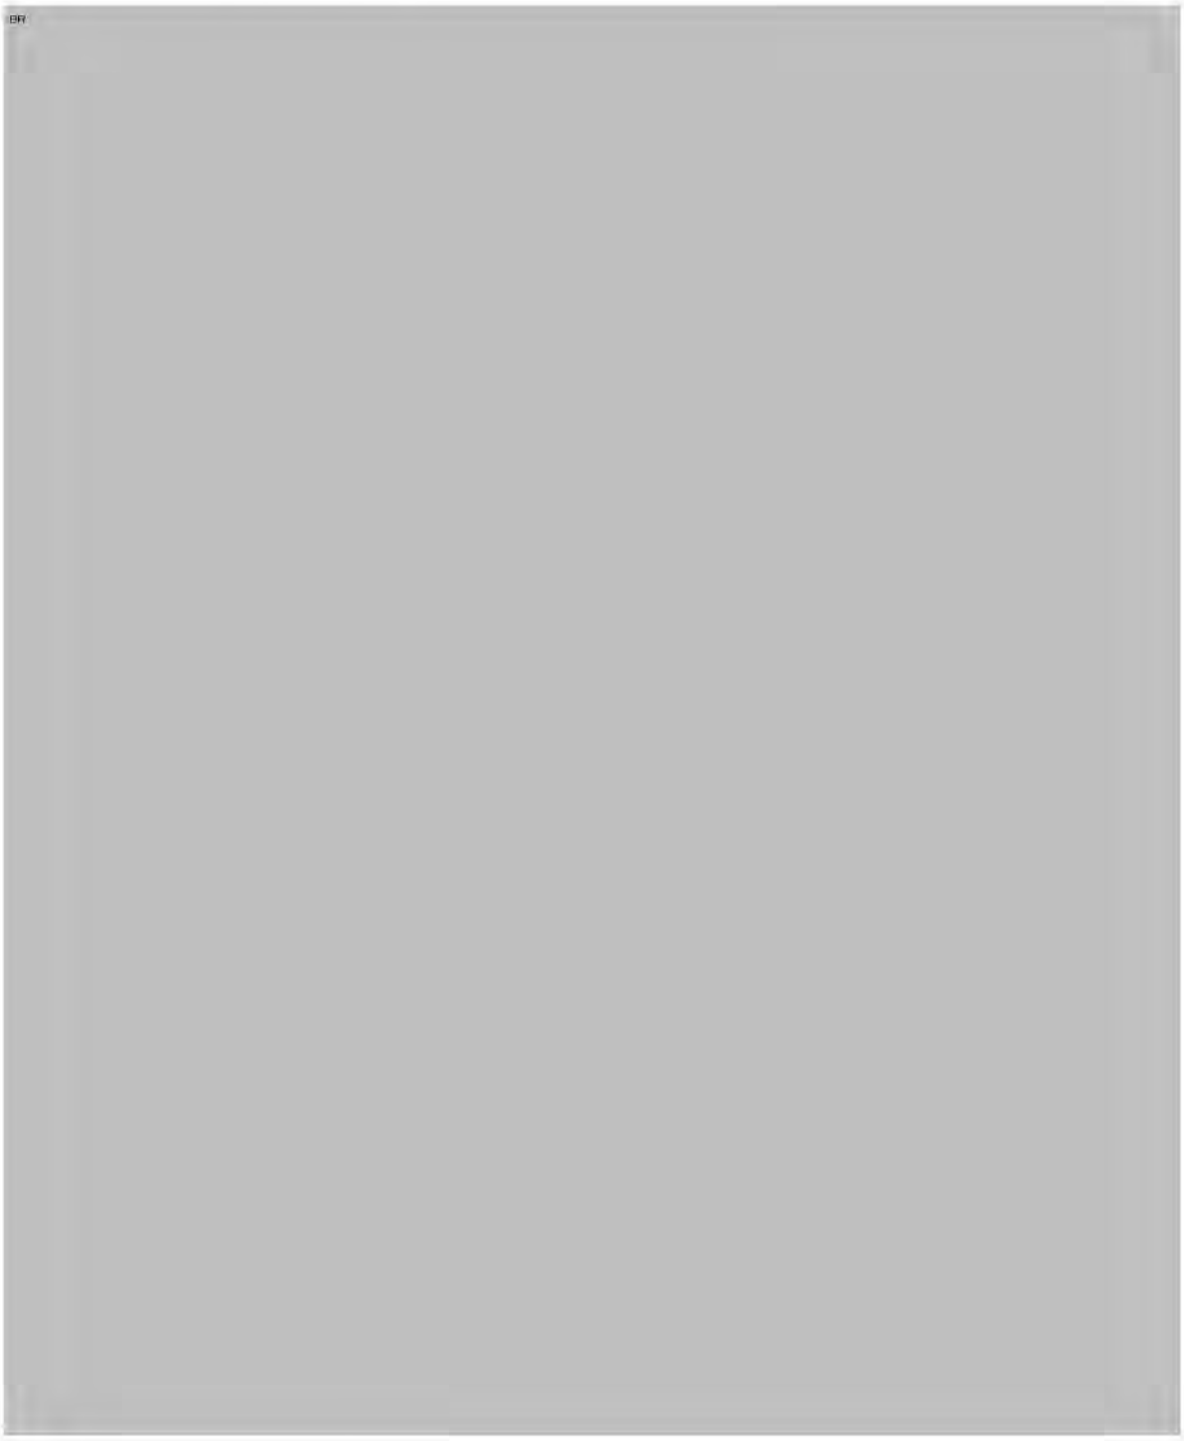

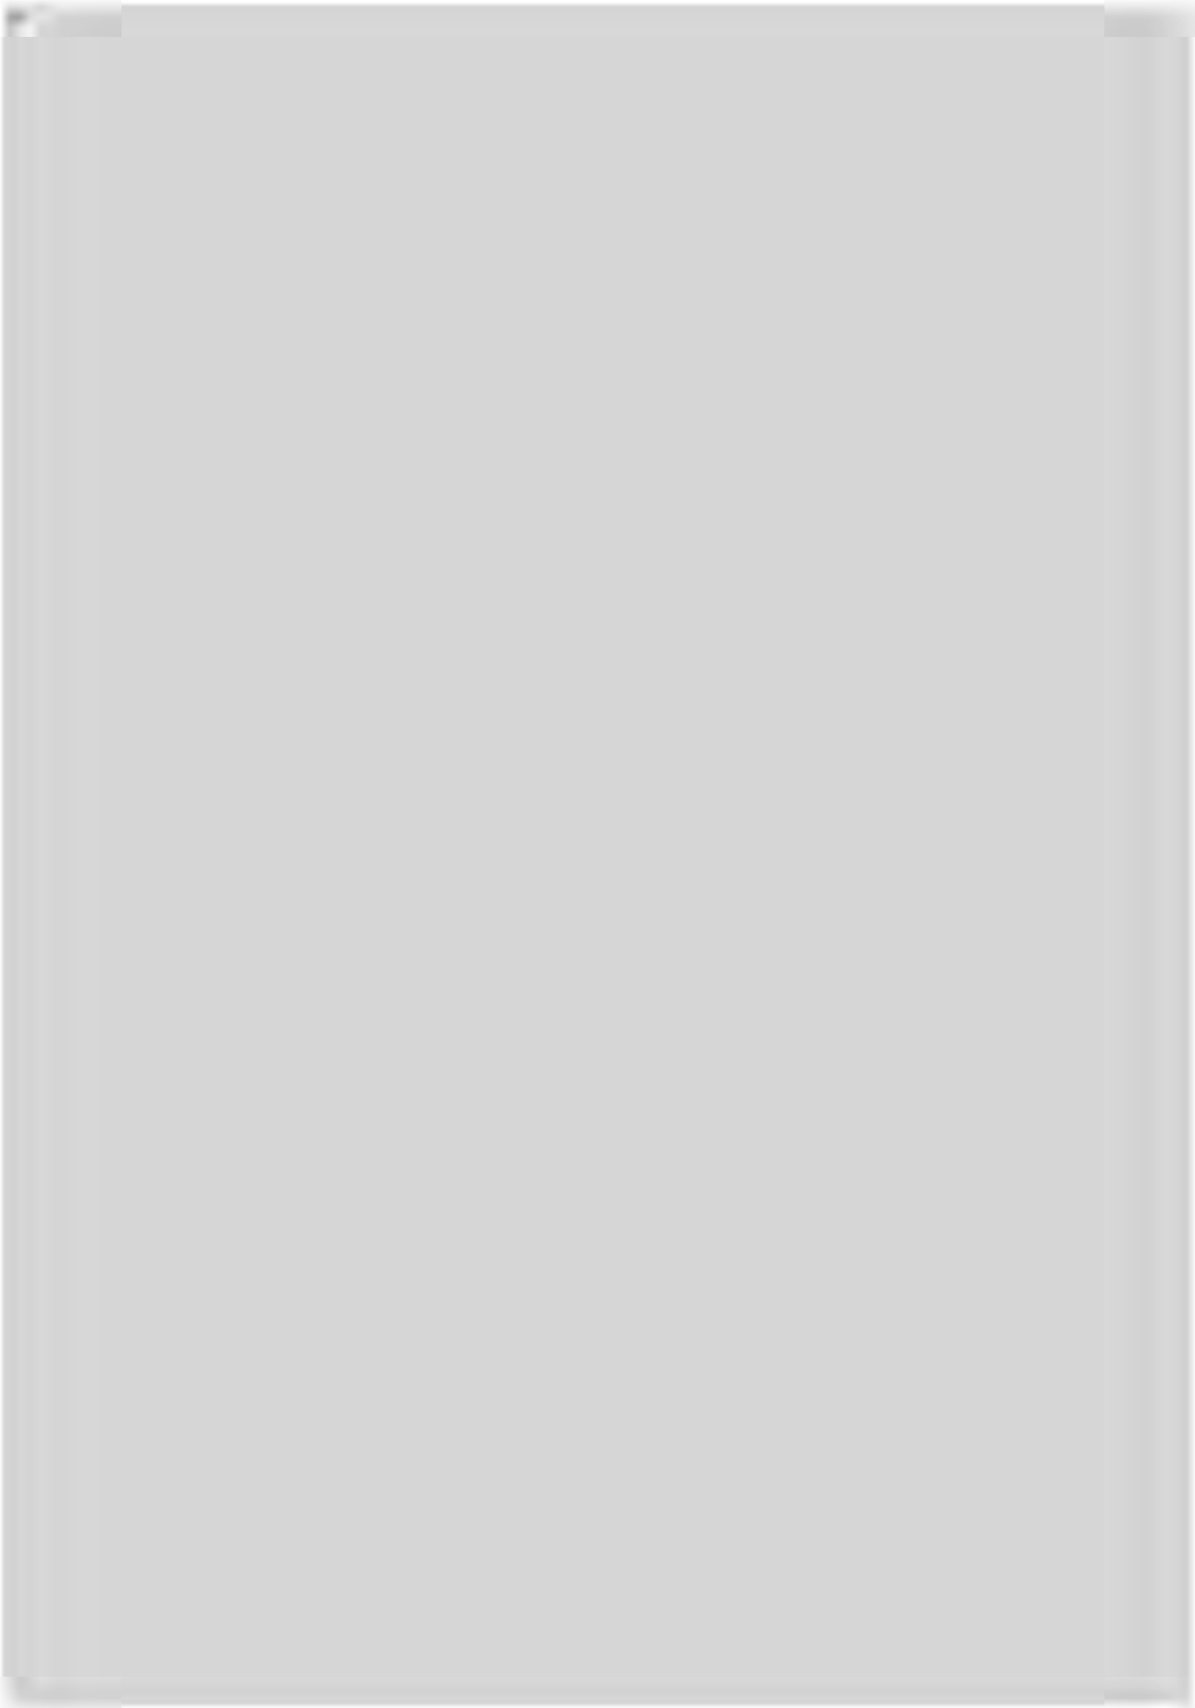

- Er zijn 2 watervergunningen verleend voor het Molenvlietpark.
- Roba communiceert dat Molenvlietpark in april 2020 voor publiek wordt opengesteld. CRB is benadrukt dat Roba hier groot belang aan hecht.

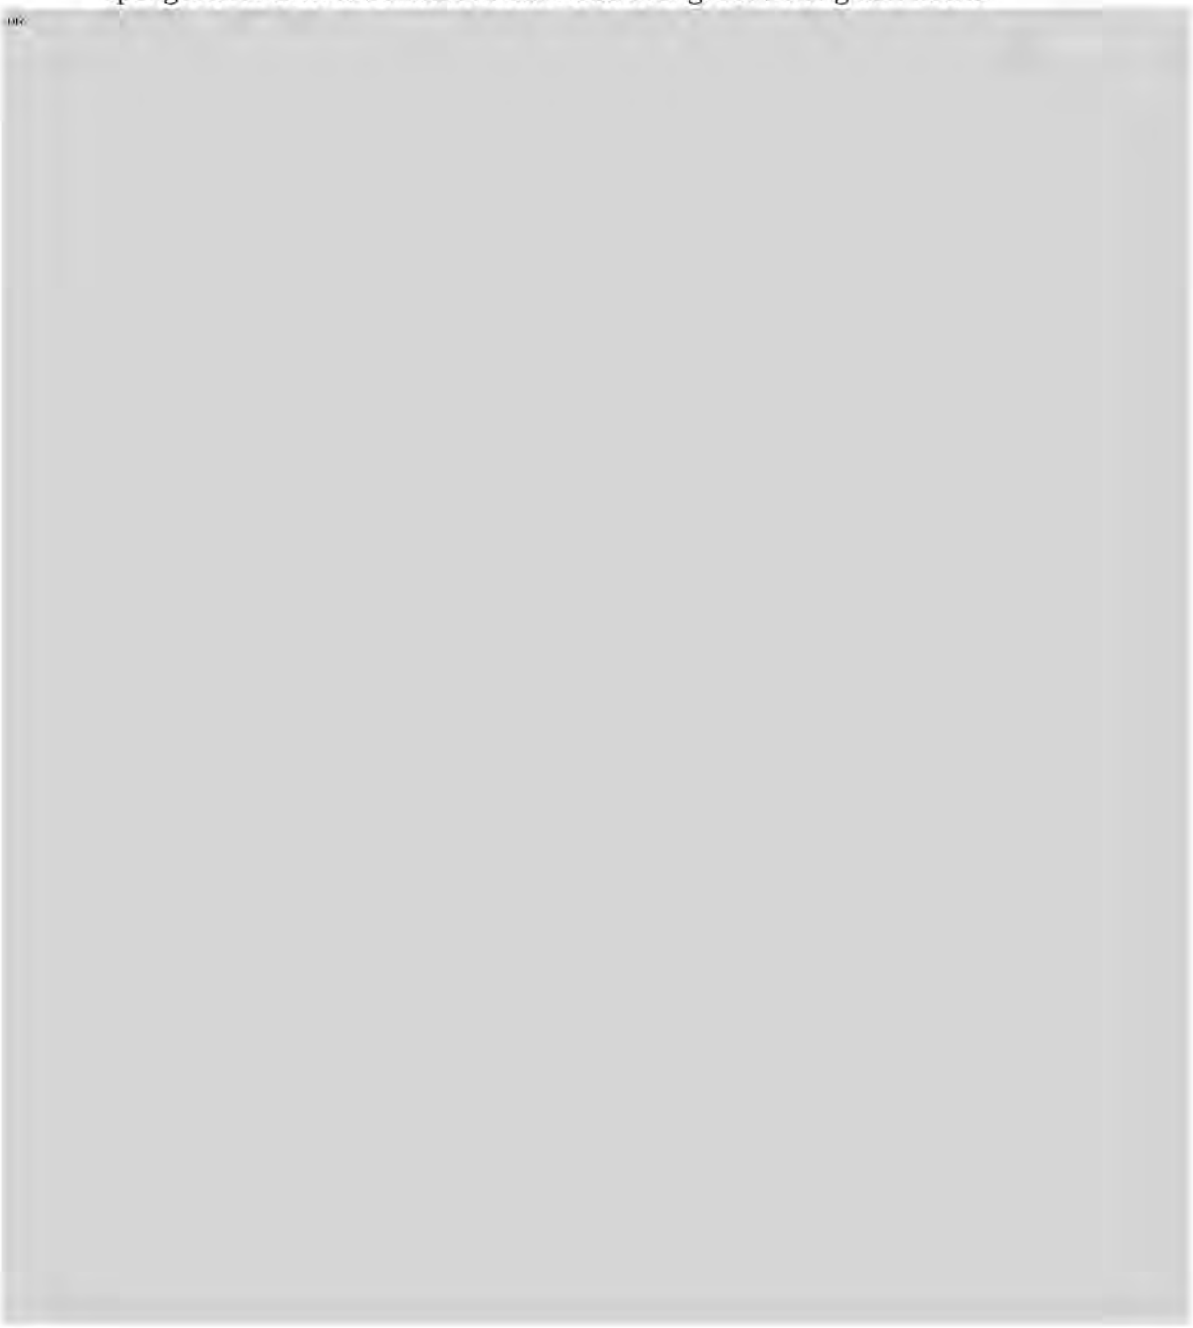

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 18 december 2019 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

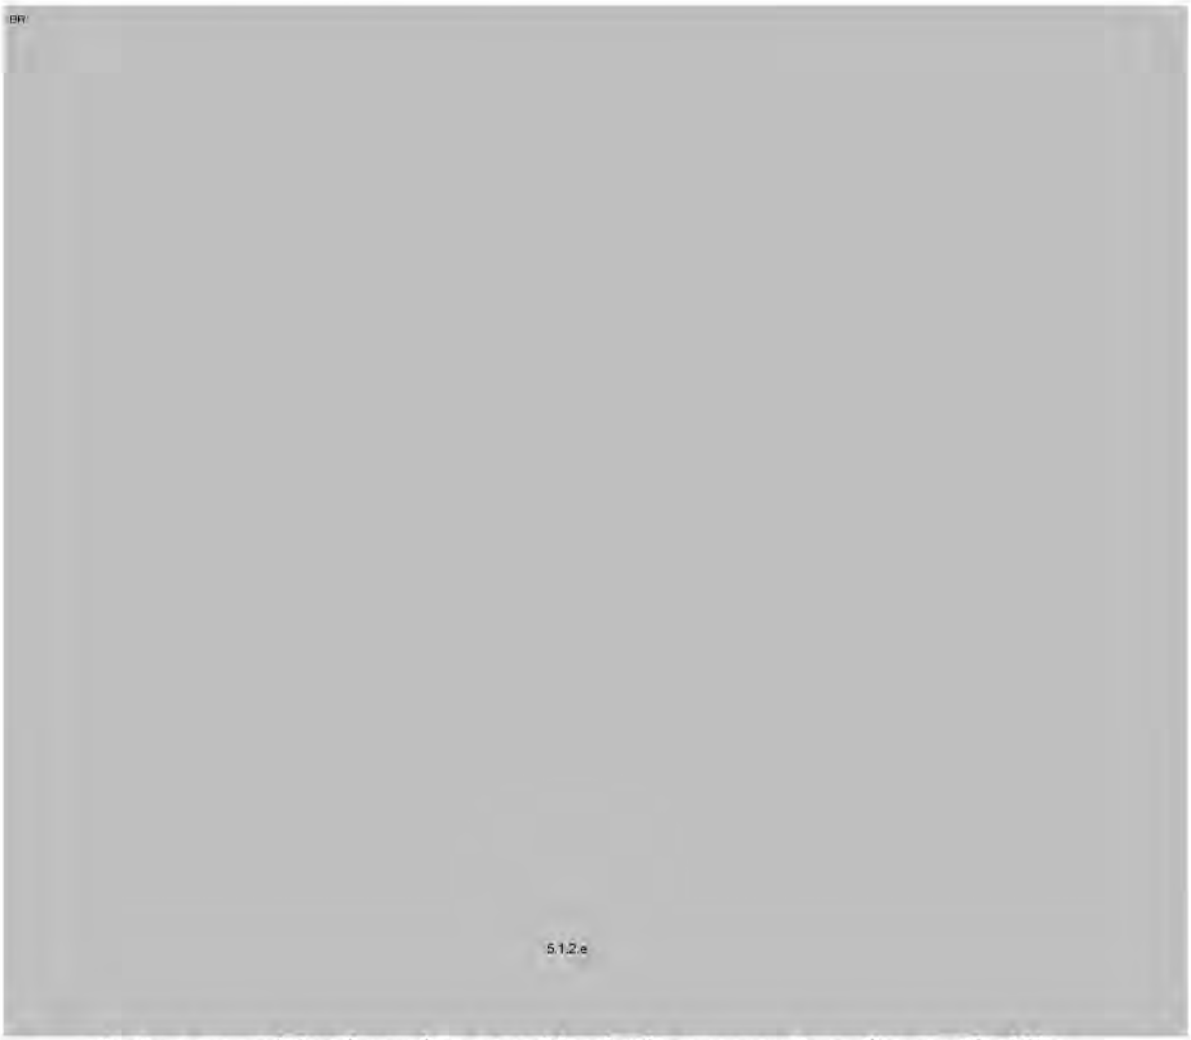


- Datum gereed (31 december 2020) is niet in overeenstemming met huidige planning van de tweede toevoer (artikel 9). Artikel 10 lid 3 van de SOK tussen Den Haag en de Provincie is daaraan gekoppeld. 5.1.2.e heeft hierover gesproken en gemaild met de Provincie. Verwachtingenmanagement: de Provincie informeren dat het een jaar later kan worden.

- De tekst van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met particuliere grondeigenaar voor de tweede toevoer is voor beide partijen akkoord. Helaas heeft de Provincie problemen met het plan voor realisatie van Nieuw Vredenoord. Verder is er nog geen overeenstemming over de anterieure overeenkomst t.b.v. deze ontwikkeling. Hoewel deze twee laatste zaken los van de SOK staan, verhinderen deze zaken momenteel ondertekening van de SOK.
- Er staat veel druk op de planning voor de kapvergunning voor de tweede toevoer. ODH en het bevoegd gezag hebben wederom nadere informatie gevraagd (o.a. stikstof). Er heeft een gesprek plaatsgevonden met het bevoegd gezag ter bespreking van deze vragen, de urgentie en planning van de kapvergunning. Waarschijnlijk zal de kapvergunning niet voor het broedseizoen (15/3/2020), maar na het broedseizoen verleend zijn (17/7/2020).

- CRB heeft aangegeven dat de planning "openstelling Molenvlietpark 1 april 2020" (wederom) onder druk staat. Deze EMVI-belofte wordt niet nagekomen.

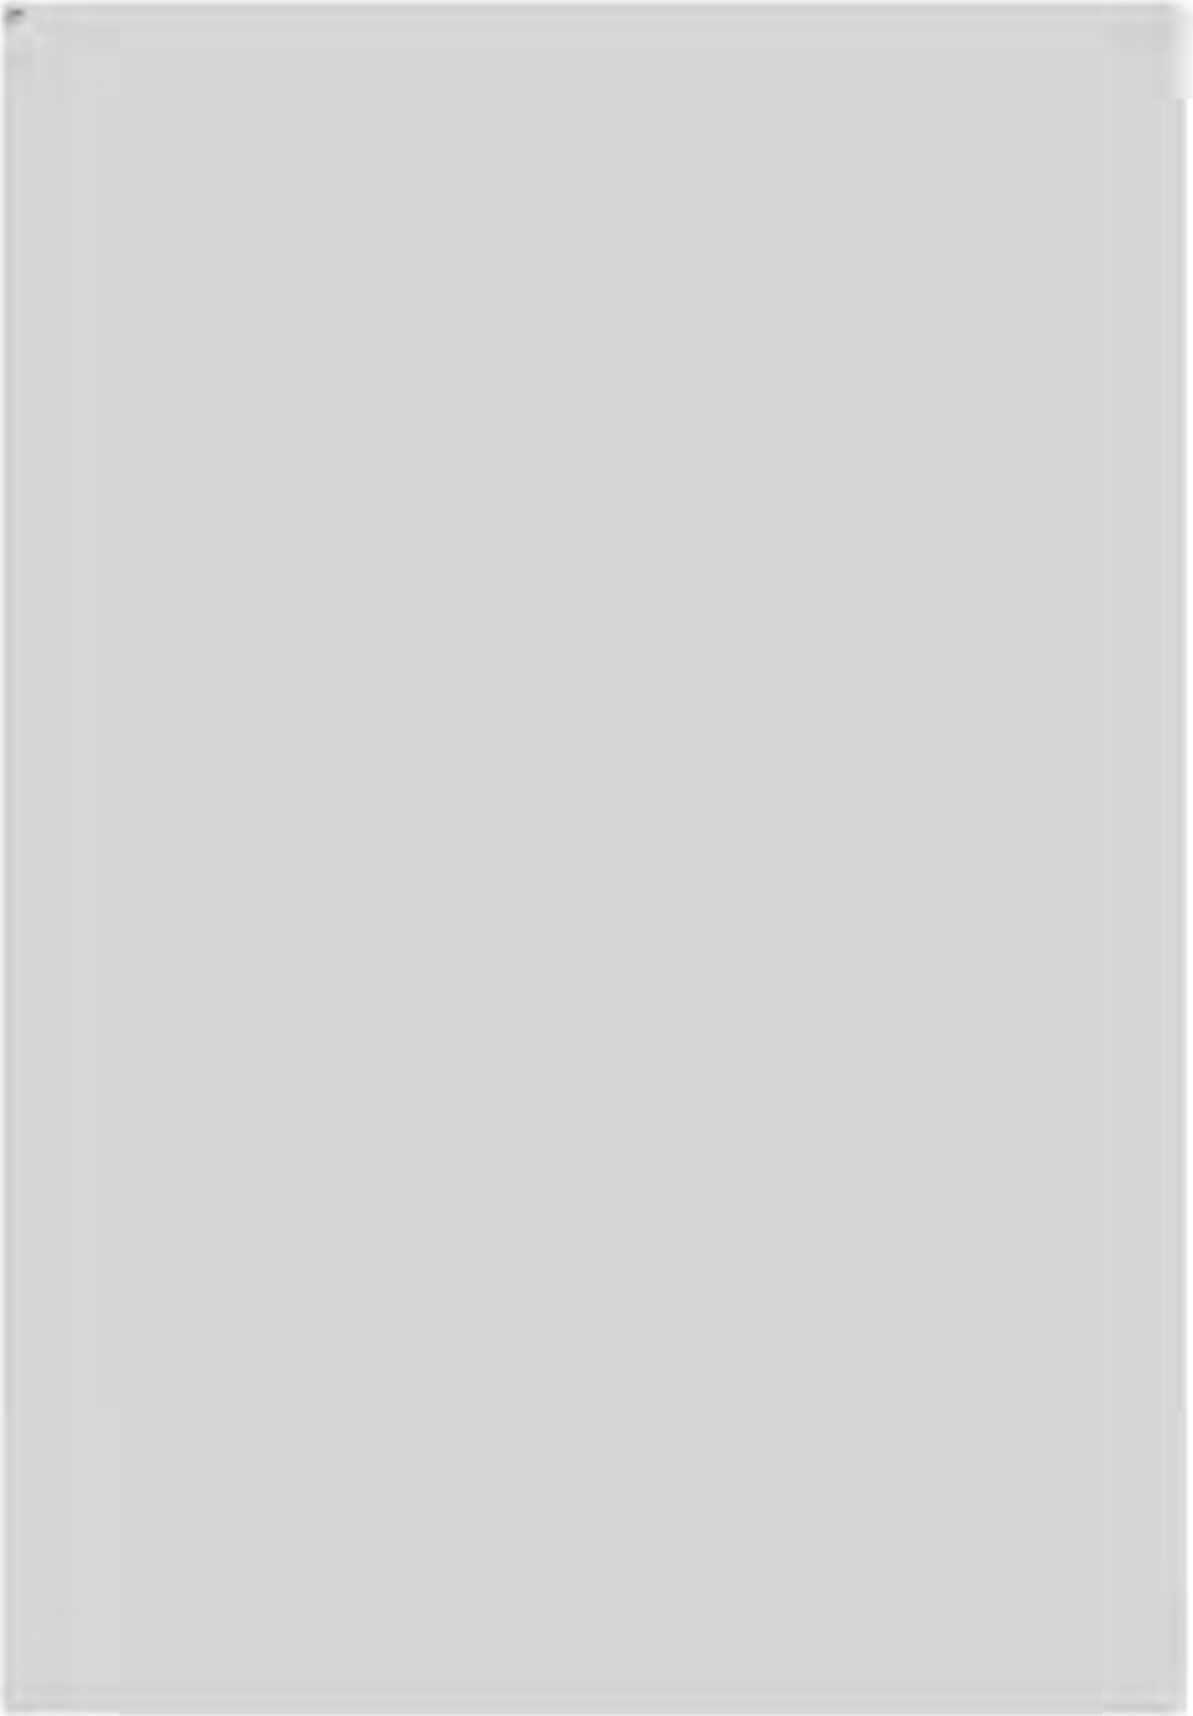

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

| | |
|---|---|
| Auteur | 5 1 2e |
| Datum overleg: | 11 februari 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5 1 2e<br>5 1 2 e |
| | Afwezig: |

- Tweede watertoevoer: vanmiddag telefonisch overleg met grondeigenaar over de overeenkomst t.b.v. de watertoevoer. Grondeigenaar heeft separaat een woningbouwplan en daarop vanuit provincie een negatief advies ontvangen, maar houdt gemeente Den Haag aan de afspraak uit het PUK, gemeente zal een bestemmingsplan opstellen en in procedure brengen. Roba zal anders de onteigeningsprocedure voorbereiden.

- Er worden waarschijnlijk nog twee projectmutaties in procedure gebracht: aanpassen fietspad langs Jan Thijssenweg op verzoek Rijswijk (tegelijkertijd met realisatie tweede watertoevoer) en bewegwijzering.

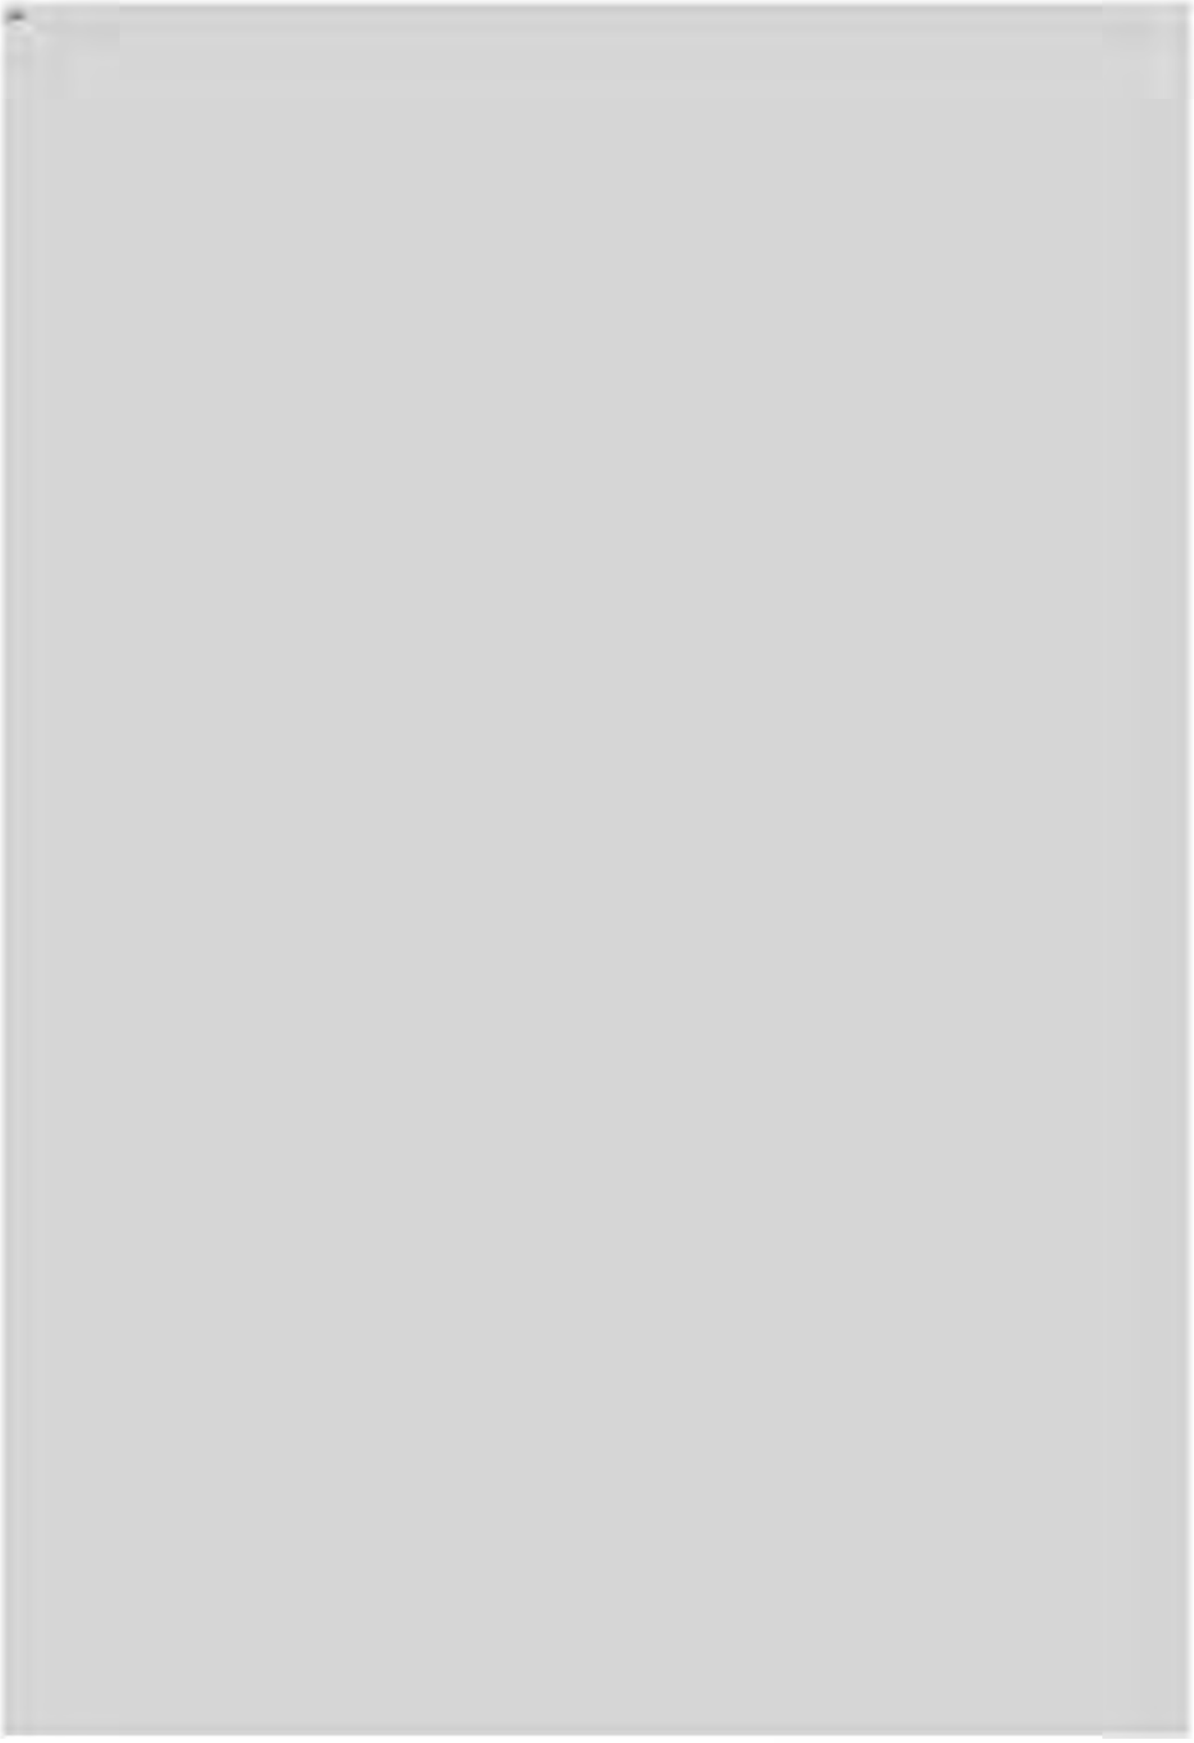

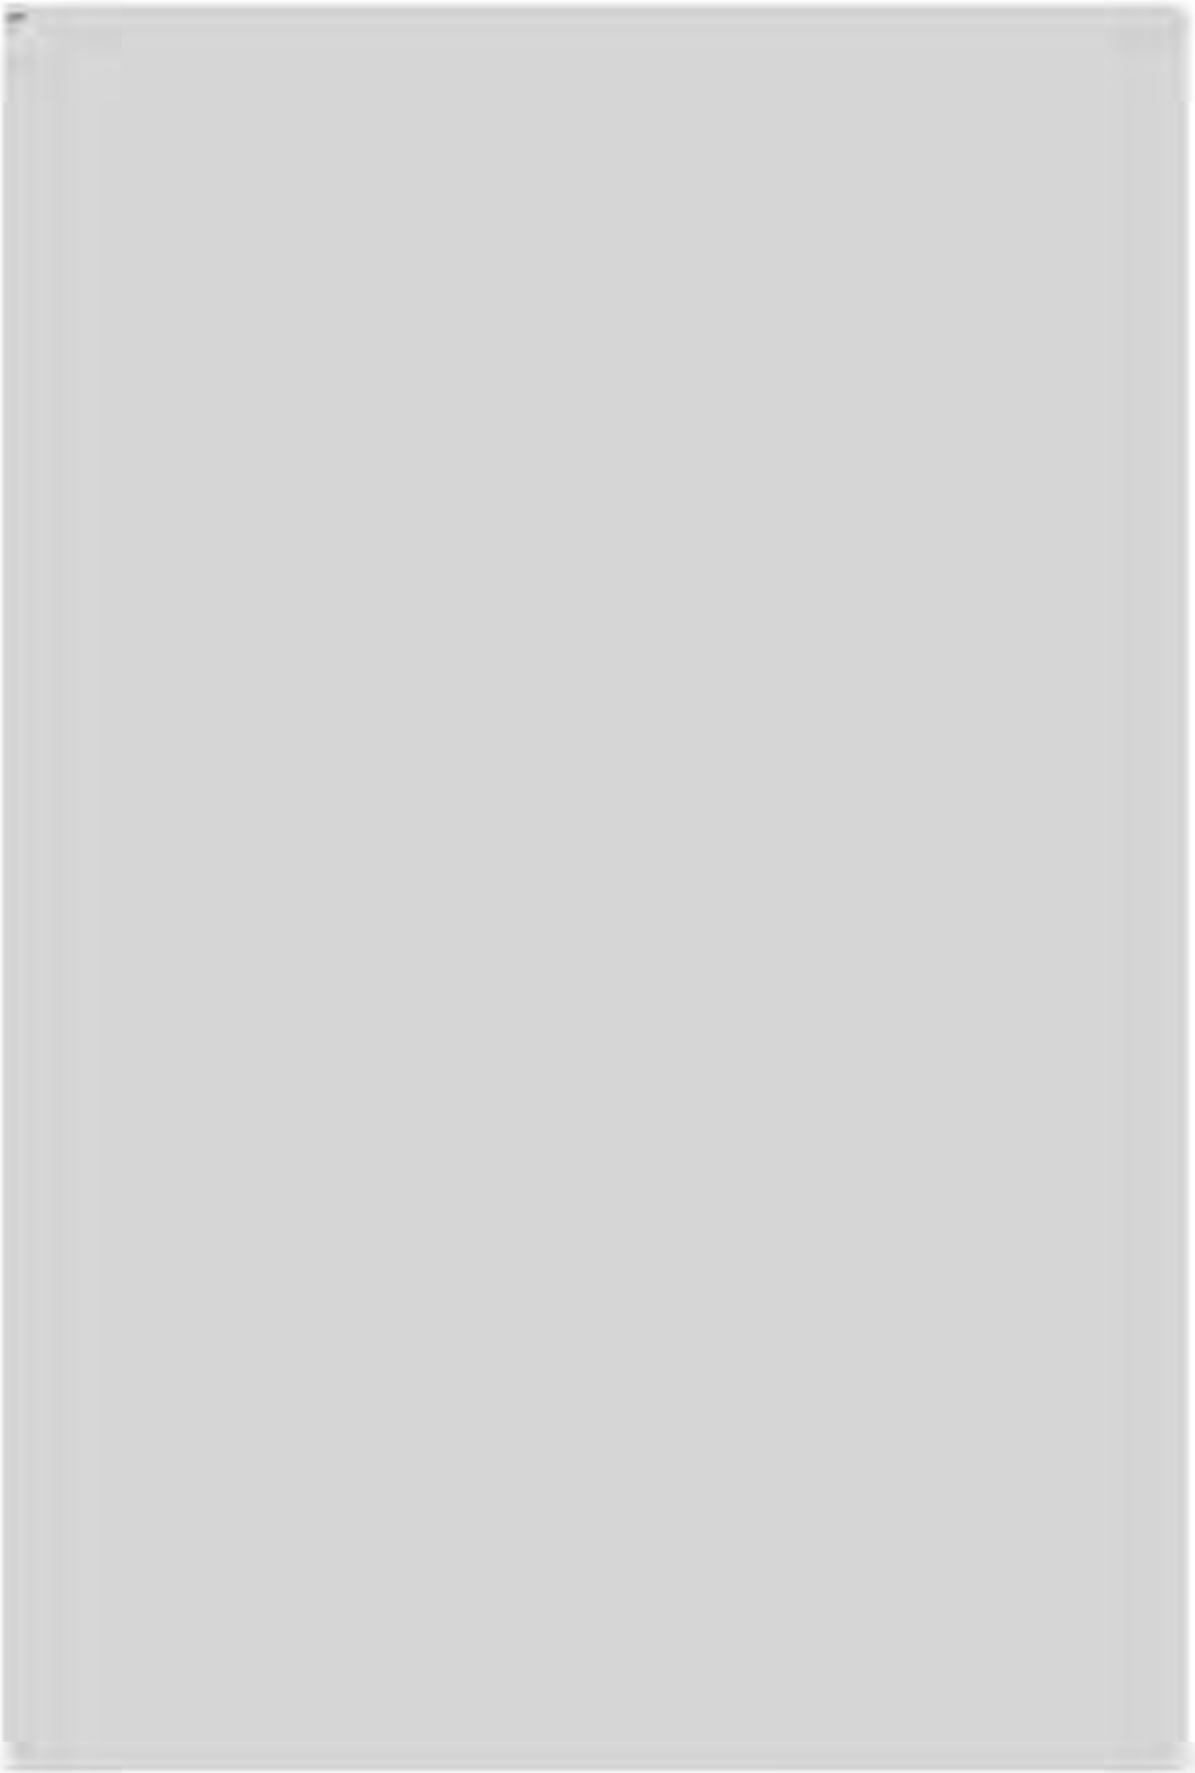

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr105

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 11 maart 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| Aanwezig: | 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| Afwezig: | 5.1.2.e |

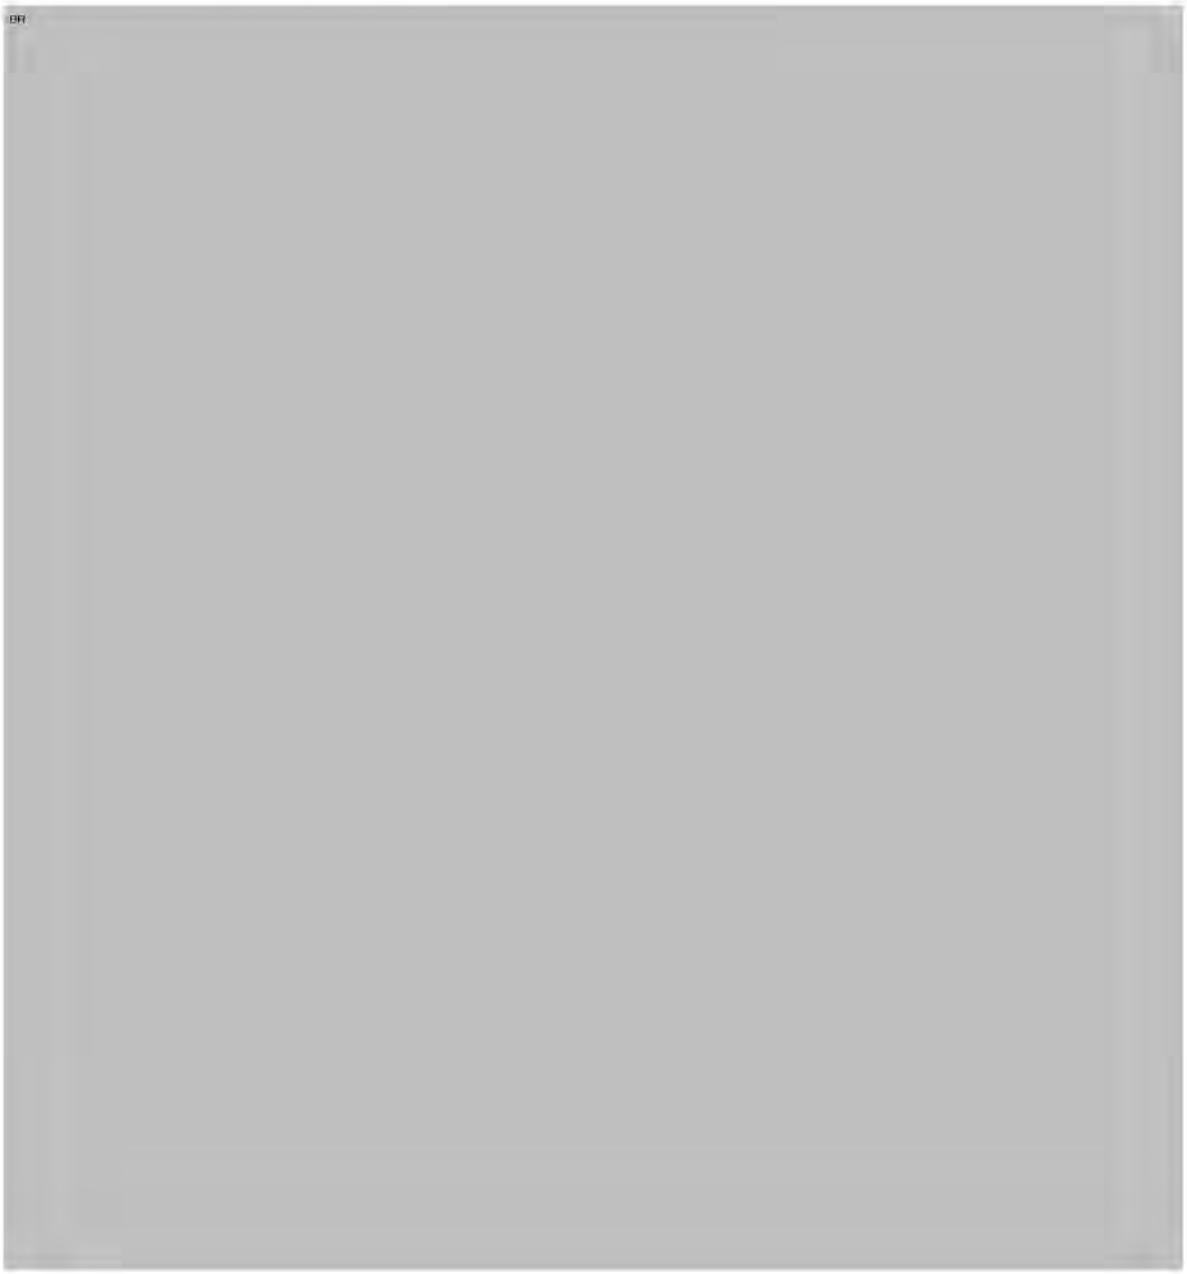

- Bediencentrale en Tweede watertoevoer zijn onderdelen van project Rotterdamsebaan welke niet in oorspronkelijke scope zaten en langer doorlopen dan het project Rotterdamsebaan zelf.
- Wegens verwevenheid met project Rotterdamsebaan en de opgebouwde contacten met stakeholders wordt voorgesteld om enkele oud-teamleden Roba te betrekken bij het nieuw te vormen projectteam Tweede watertoevoer, met name 5.1.2.e 5.1.2.e en Omgevingsmanager 5.1.2.e
- Tweede watertoevoer wordt door Movares tot een bestek uitgewerkt. IbDH zal gevraagd worden om Technisch management tijdens de realisatiefase in te vullen.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 25 maart 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |

- Eigenaar van Jan Thijssenweg 8 gesproken over de nog te formaliseren afspraken omtrent realisatie en ontwerp tweede watertoevoer. Formalisatie kan pas plaatsvinden nadat gemeenten en eigenaar Nieuw Vredenoord overeenkomst gesloten hebben.
- Eigenaar Nieuw Vredenoord heeft brief vanuit provincie ontvangen met reactie op het woningbouwplan. Eigenaar heeft vandaag gesprek met gemeente Den Haag.

Derhalve is het tot op heden is het niet gelukt om afspraken te formaliseren tussen eigenaar en Roba.

[redacted]

- Er is nog geen kapvergunning verleend voor tweede watertoevoer. Het dossier schijnt aan een nieuwe collega te worden overgedragen.

[redacted]

[redacted]

- De beoogde feestelijke opening van het Molenvlietpark kan wegens corona helaas niet plaatsvinden.

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 8 april 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| | Afwezig: - |

[redacted]

3. Tweede watertoevoer - Onzekerheidsanalyse planning:
   - Het risico op een beroepsprocedure tegen projectplan HHD wordt gesloten aangezien alleen stakeholders in beroep kunnen (2-tal) welke in eerdere fase een zienswijze hebben ingediend. Van deze stakeholders wordt geen beroepsprocedure verwacht.
   - Oplevering van de tweede watertoevoer is deterministisch doorgeschoven tot april 2022 (verwachtingswaarde oktober 2022). Oorzaken zijn met name het uitblijven van afgifte kapvergunning en ondertekenen SOK 5.1.2.e

[redacted]

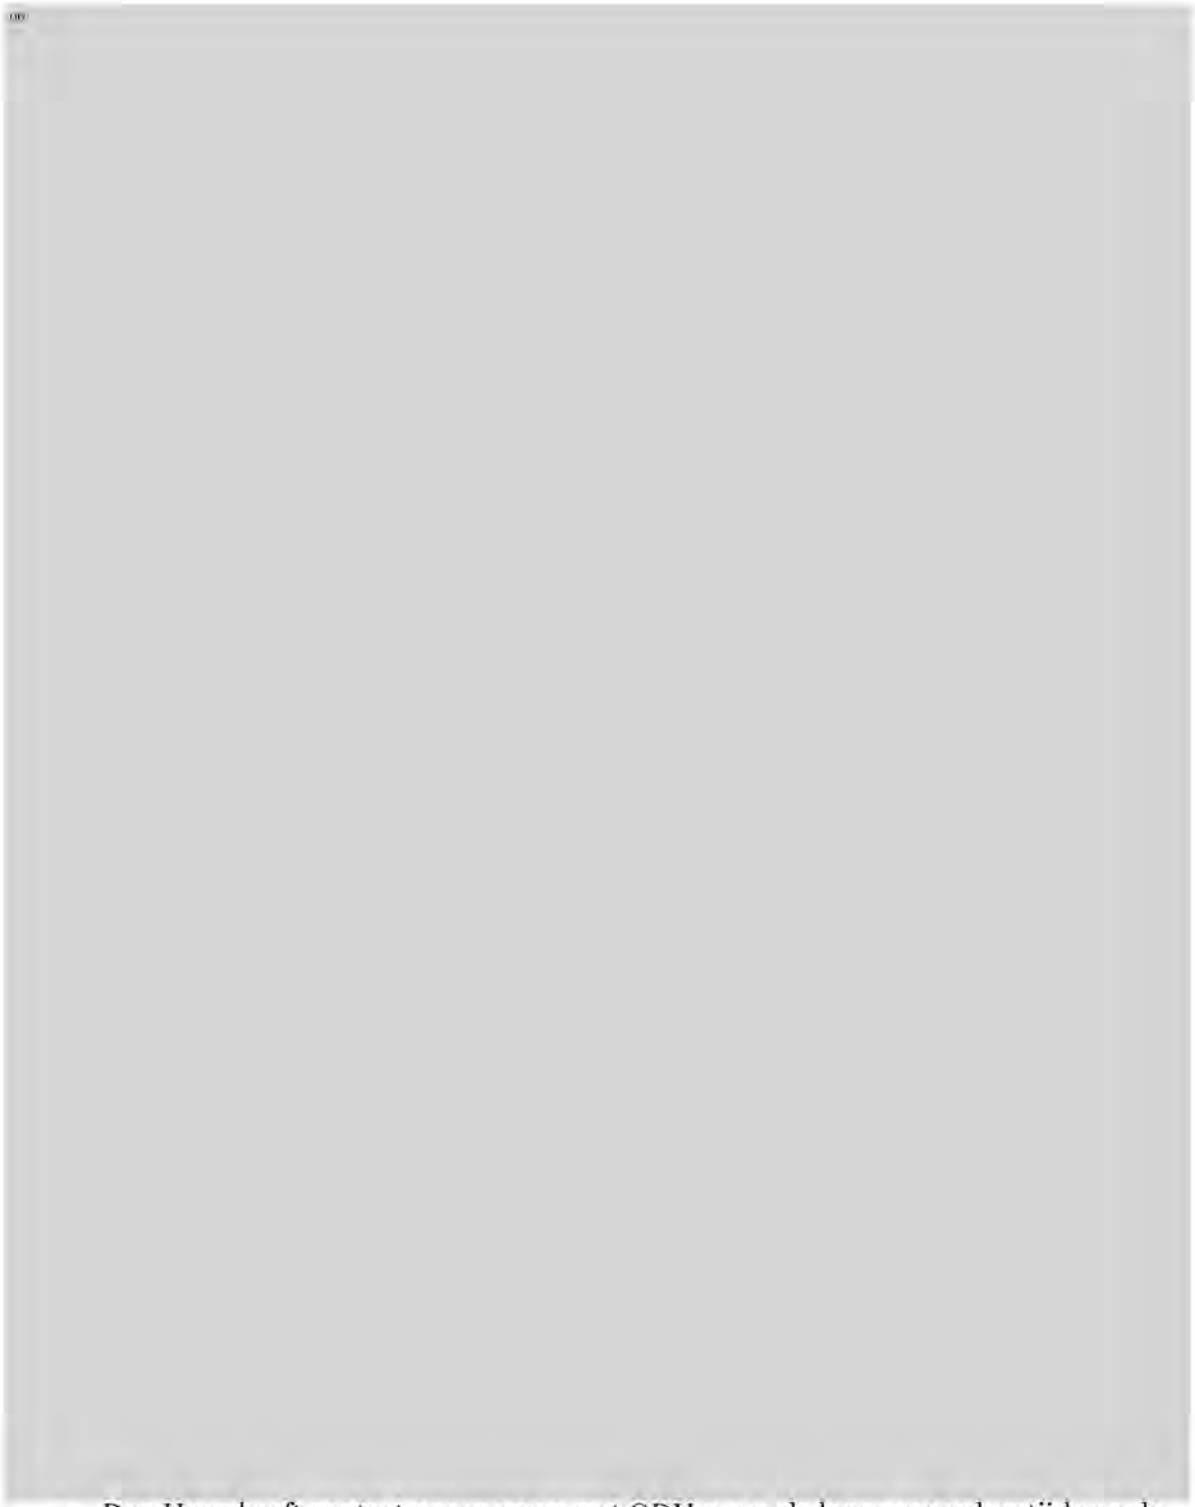

- Den Haag heeft contact opgenomen met ODH n.a.v. de lange proceduretijd van de vergunningaanvraag voor het kappen van bomen t.b.v. de tweede watertoevoer.

- Opening fase 1 van het Molenvlietpark is voorzien op 1 mei. Wegens de corona maatregelen wordt hieromtrent geeft feestelijke openstelling georganiseerd. Wel zal er een melding per brief in de directe omgeving verspreidt worden en melding via de social media kanalen.

- Memo s.v.z. en voorziene planning Tweede Watertoevoer.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr108

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 22 april 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: - |

- Het Hoogheemraadschap is genegen om de waterberging excl. 2e toevoer conform SOK over te nemen t.b.v. beheer.
- Jan Thijssenweg 8 gesproken over beoogde grondruil. Dit wordt geeffectueerd nadat SOK 5.1.2.e ondertekend is.

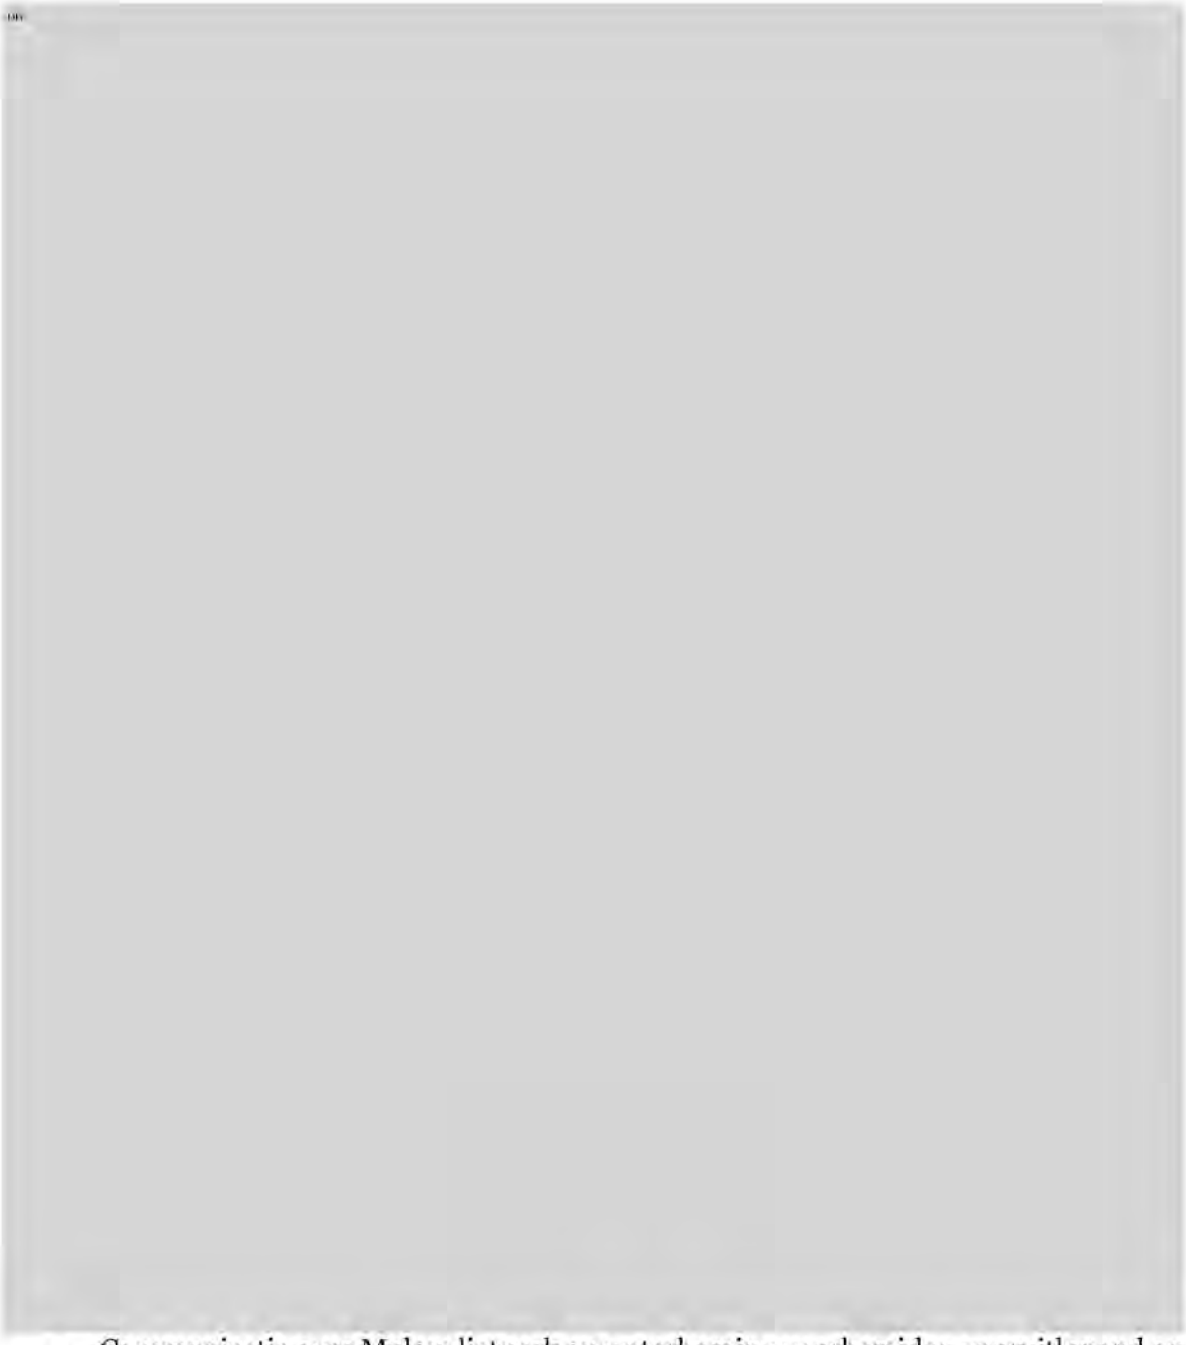

- Communicatie over Molenvlietpark en waterberging voorbereiden vooruitlopend op de openstelling en oplevering.

- CRB heeft in het verleden toegezegd om een informatiebord in het Molenvlietpark te plaatsen met informatie over de duurzaamheidsaspecten van project Roba (maatregelen 1.05). Roba dient een locatie te bepalen. CRB dient een voorstel voor het bord te maken.

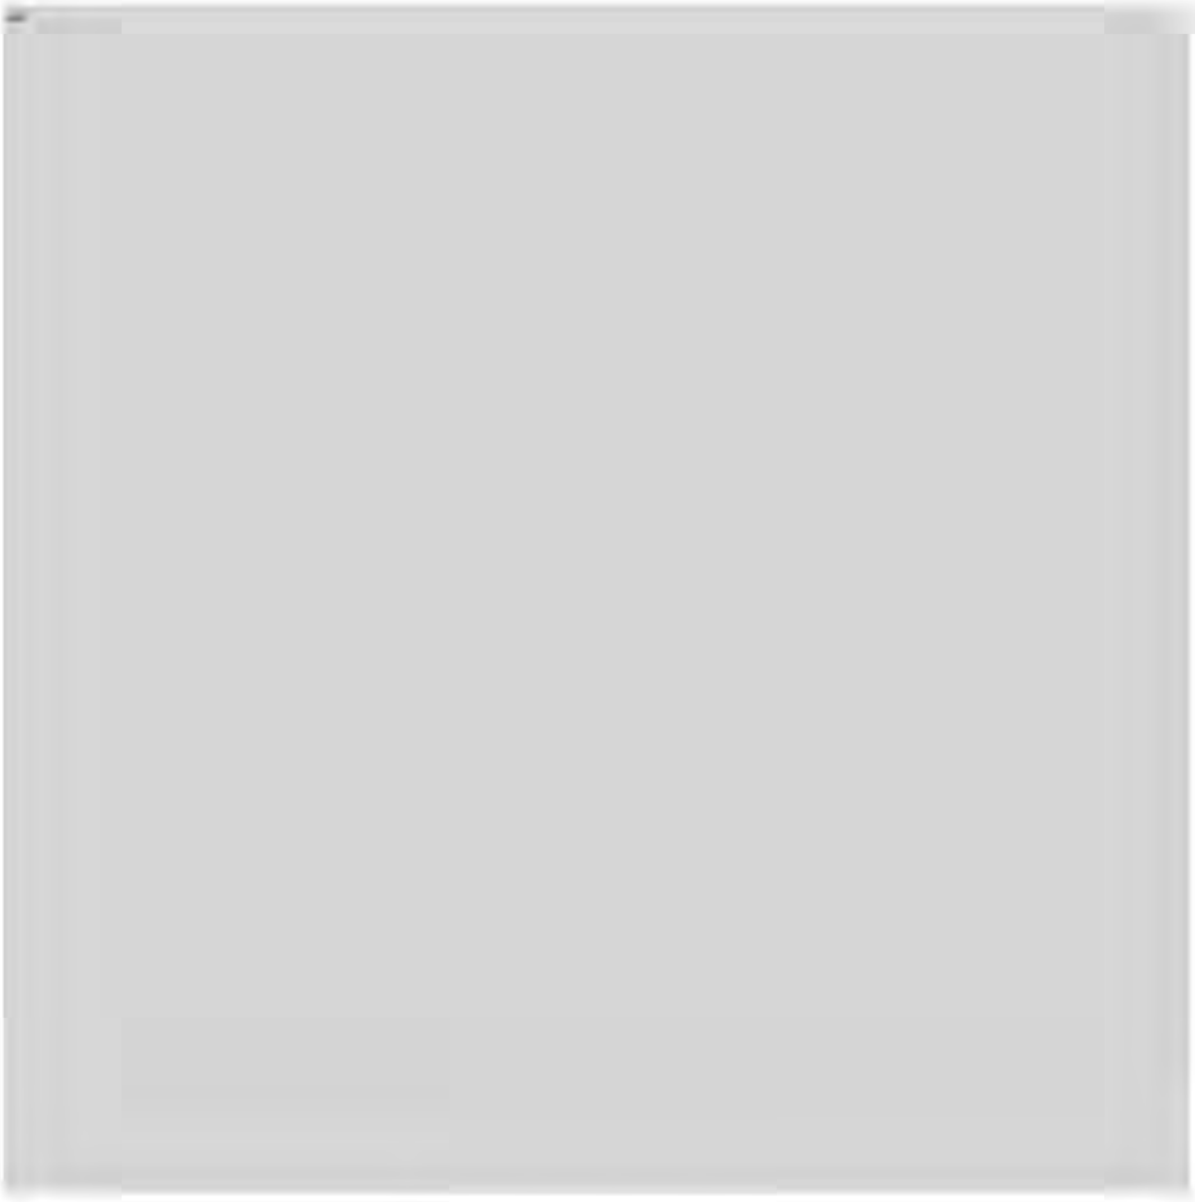

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr109

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 6 mei 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: - 5.1.2.e |

BR

- 5.1.2.e en 5.1.2.e proberen in de maand mei de SOK tweede watertoevoer met de particuliere grondeigenaar overeen te komen.

BR

[redacted]

- Diverse bewonersbrieven worden voorbereid, bijvoorbeeld over [redacted] en de gedeeltelijke openstelling van het Molenvlietpark. Het idee is ontstaan om, wegens het annuleren van een fysieke openingshandeling, een video voor social media te laten maken over het open te stellen gedeelte van het Molenvlietpark.

[redacted]

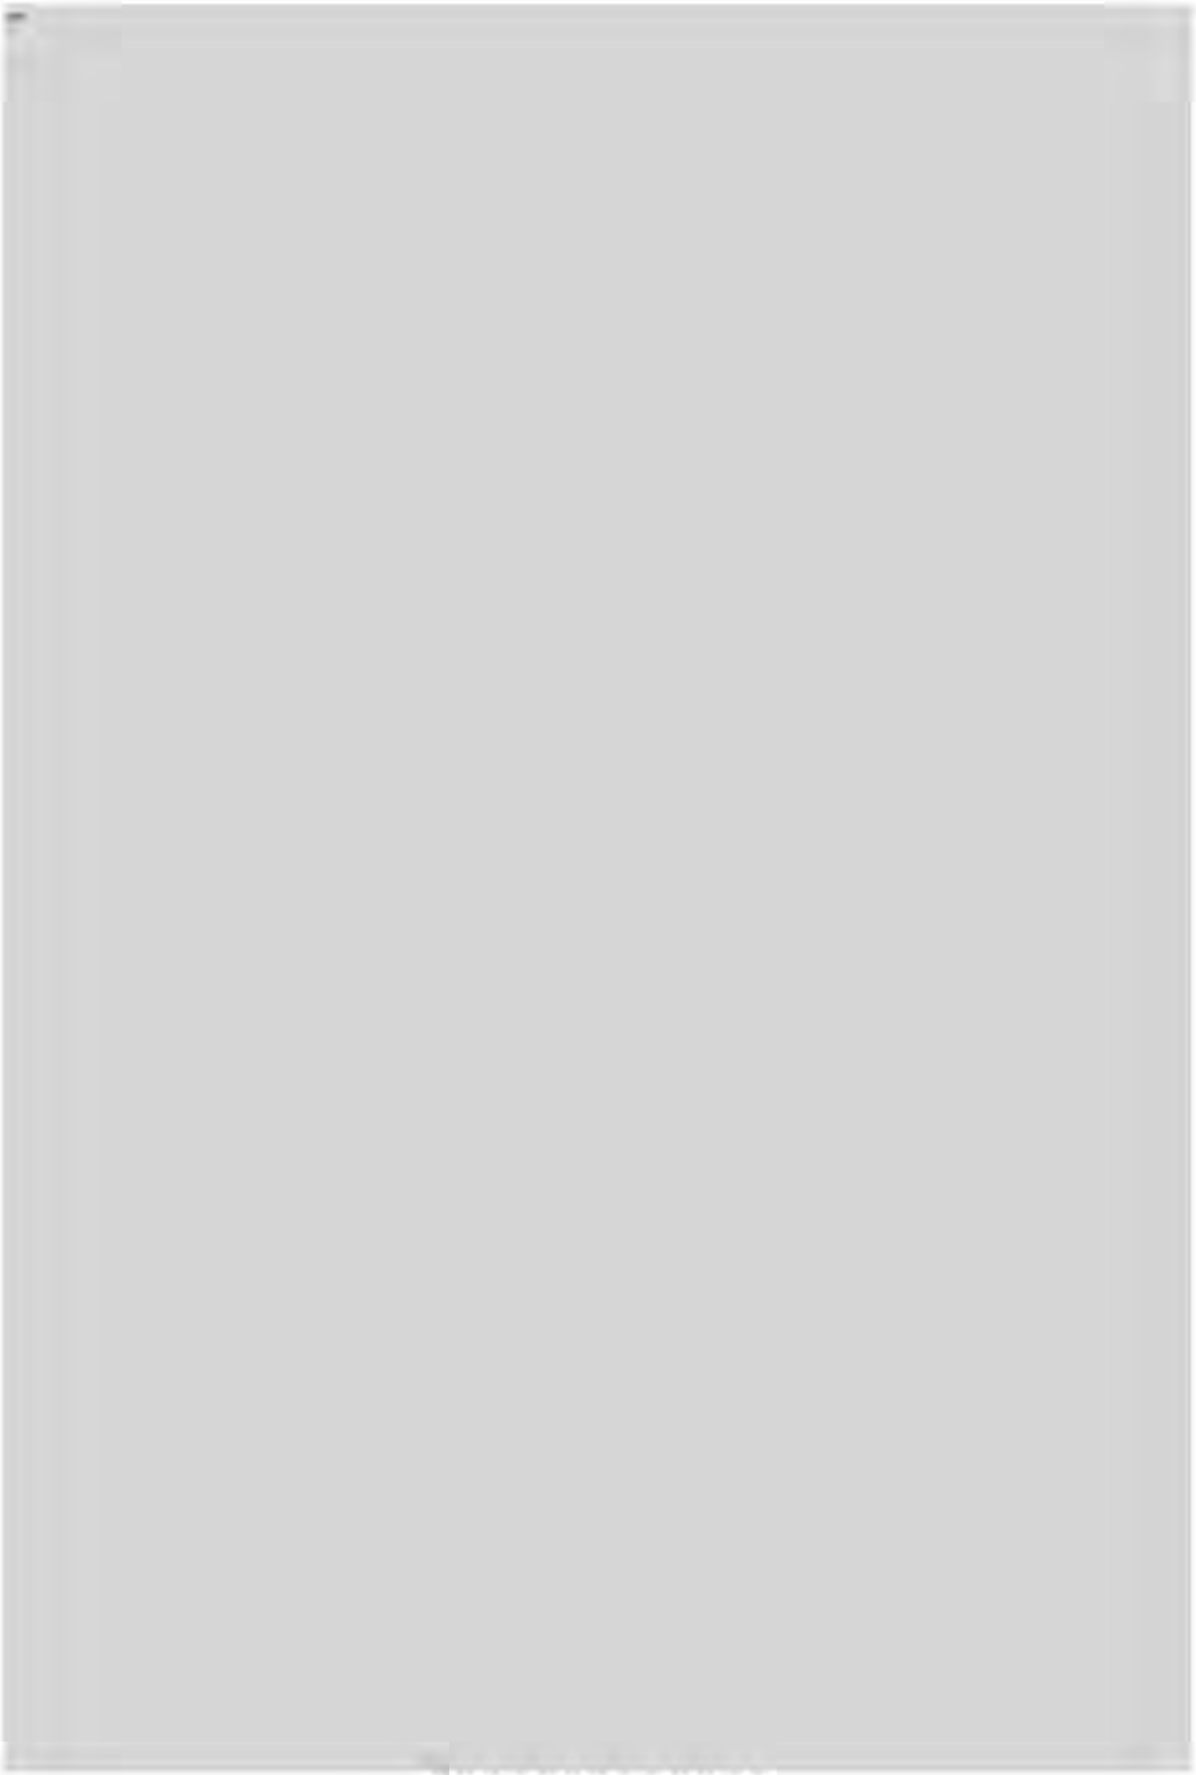

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr110

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 20 mei 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: - |

BR

- Jan Thijssenweg 8 gesproken over s.v.z. tweede watertoevoer en de voorziene grondruil met deze particulier.

BR

- Met twee woningen uit Park Hoornwijck en het Hoogheemraadschap nog aan het studeren en overleggen over mogelijkheden om de aflaatconstructie landschappelijk in te passen. Voorstel is om die aanvullende werkzaamheden t.z.t. niet door CRB, maar een separate aannemer te laten uitvoeren.

BR

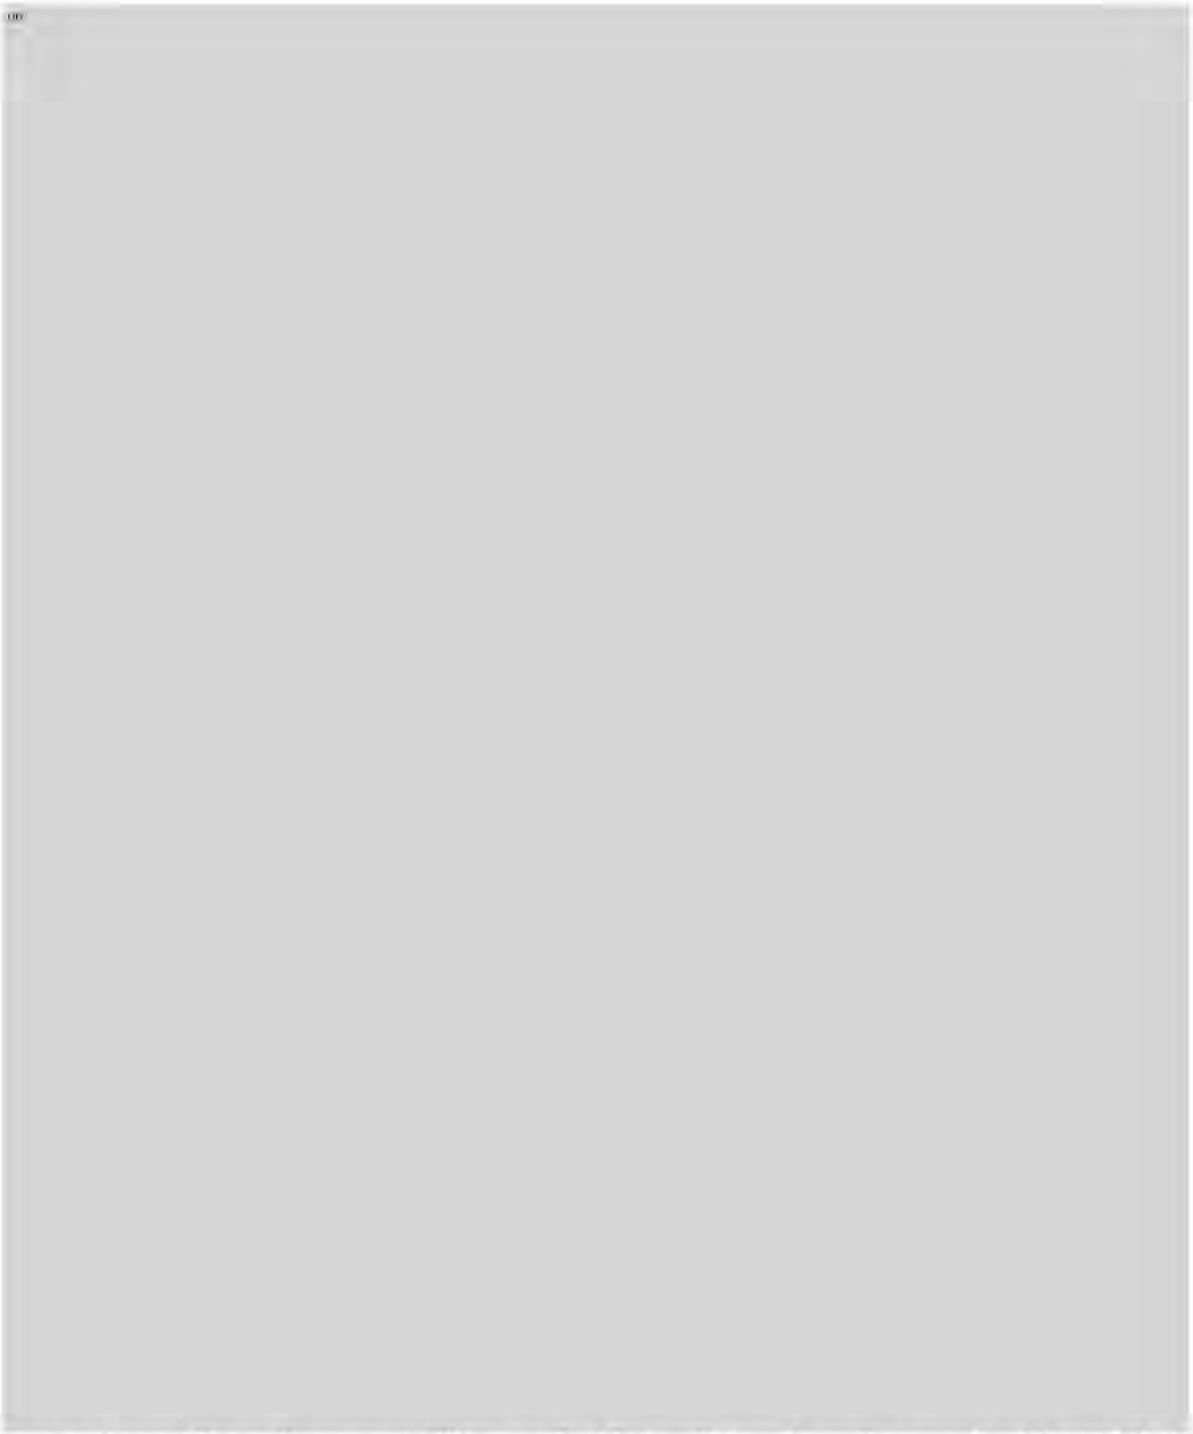

- Vooruitlopend op openstelling van het Molenvlietpark worden voorbereid een brief aan de directe omgeving en een korte video om te laten zien wat we gerealiseerd hebben. Vanuit het stadhuis zijn strenge regels van kracht welke het uitbundig promoten van de openstelling van het park bemoeilijken met als doel om in de begin periode niet teveel publiek tegelijkertijd te trekken.



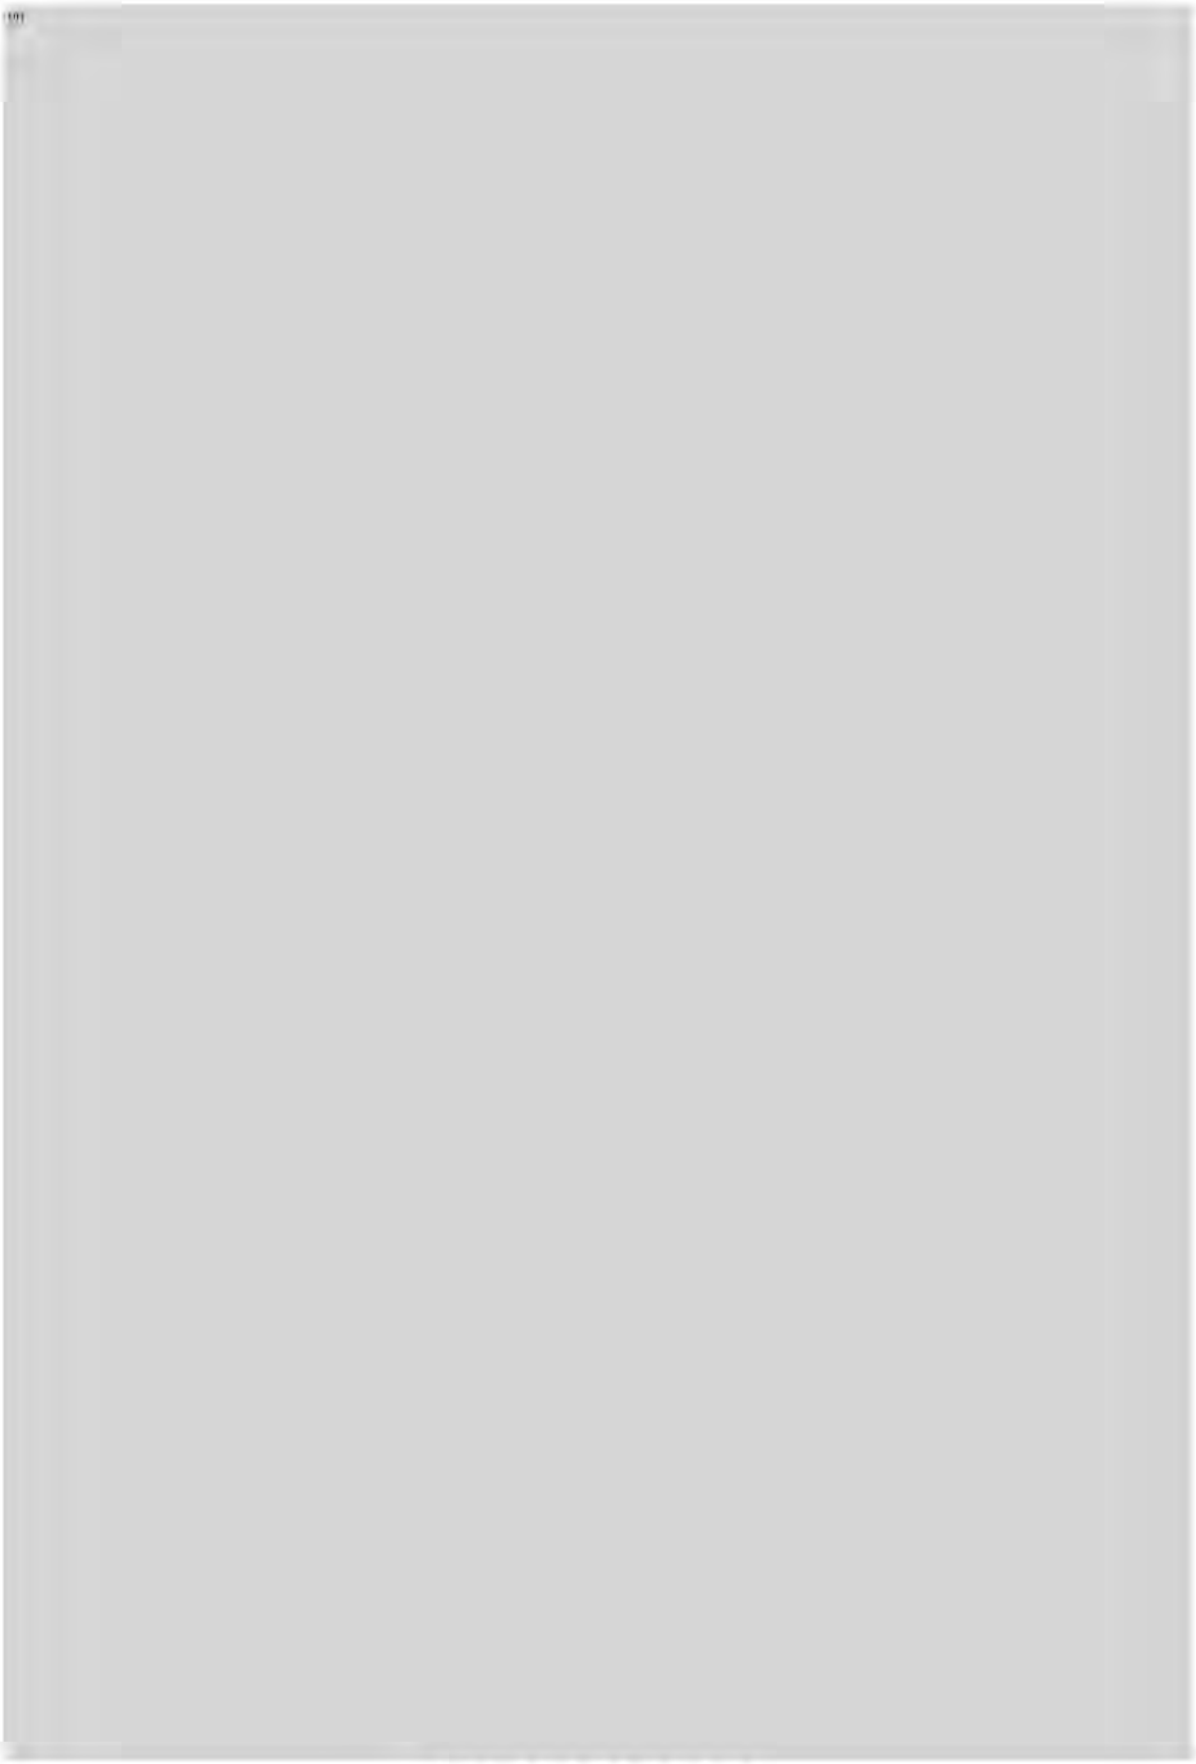

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 2 juni 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

- Movares is vragen van ODH over de aangevraagde kapvergunning aan het beantwoorden. De beantwoording wordt door Den Haag aan ODH verzonden.

BR

- Tussen Roba en de adviseur van particuliere grondeigenaar lijkt overeenstemming mogelijk over de toekomstige maaiveldhoogtes na realiseren 2e watertoevoer.
- Openstellingen Molenvlietpark voorzien voor vrijdag 5 juni.

BR

[redacted]

- Molenvlietpark wordt erg mooi en is bijna gereed.

[redacted]

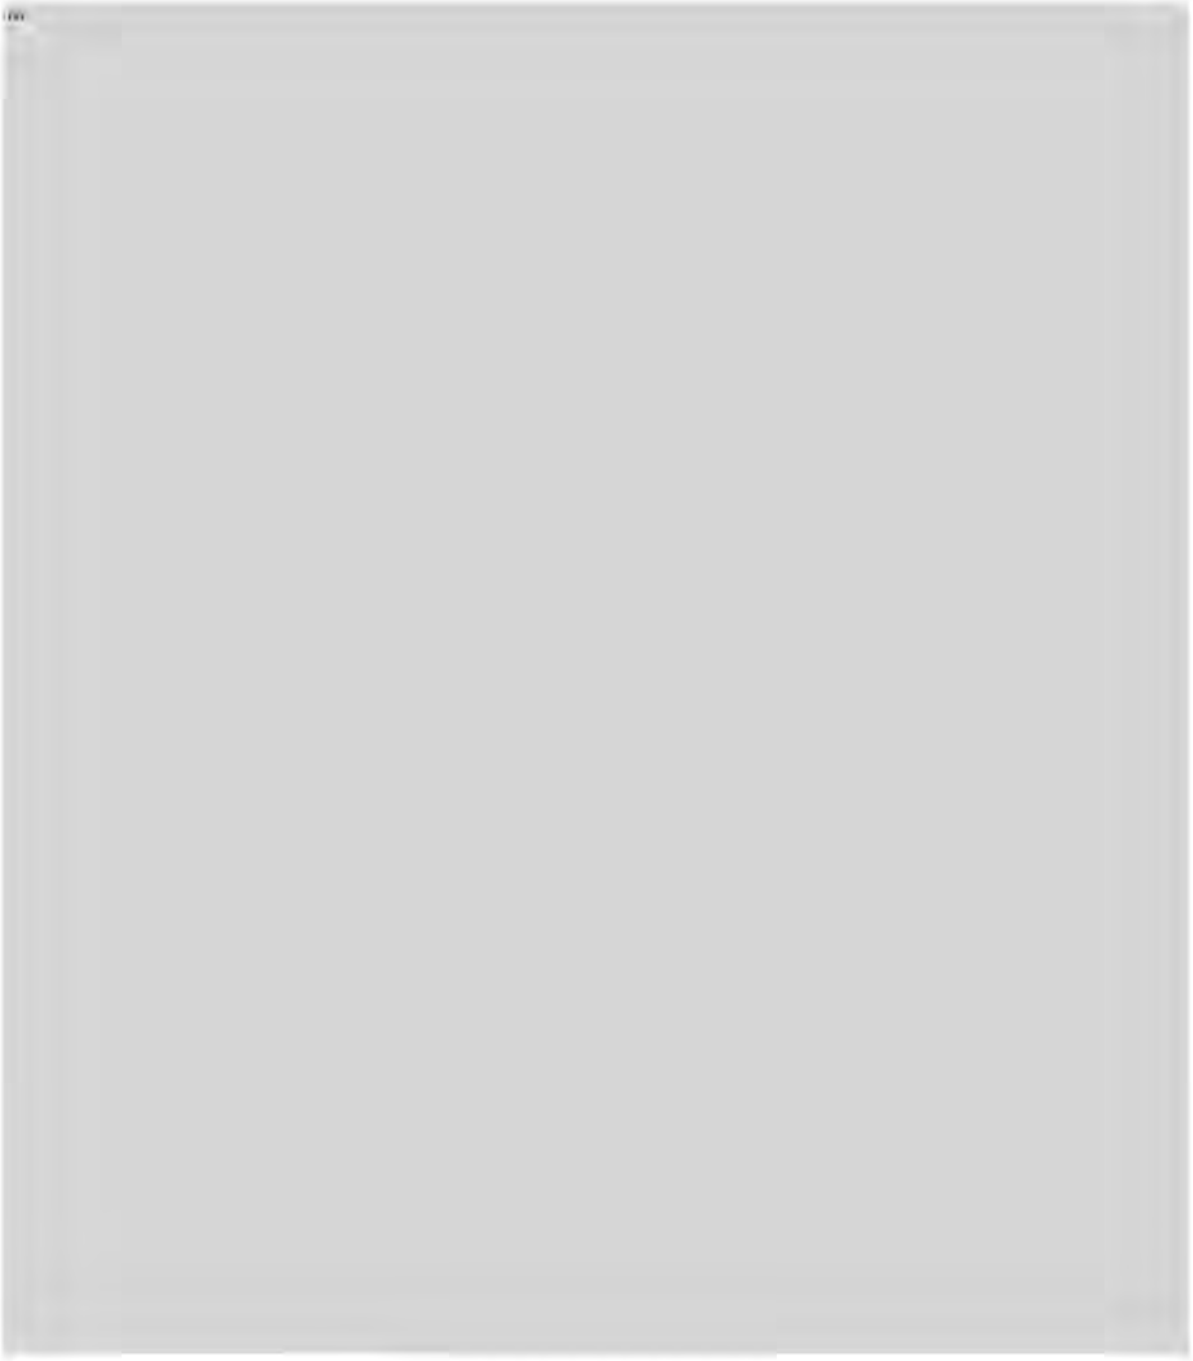

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 16 juni 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: |

BR

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

- Stadsdeel en Stedelijk Beheer hebben bij 5.1.2.e aangegeven geen actiehouder te willen zijn van de afspraak uit SOK met HHD omtrent het op aangeven van HHD ontruimen en afsluiten voor bezoek van het Molenvlietpark t.b.v. gebruik waterbergingscapaciteit. Roba zal dit agenderen in het OGON.
- 5 juni Openstelling Molenvlietpark → nadien diverse vragen van omwonenden ontvangen over de inrichting en het ontwerp van het park.

BR

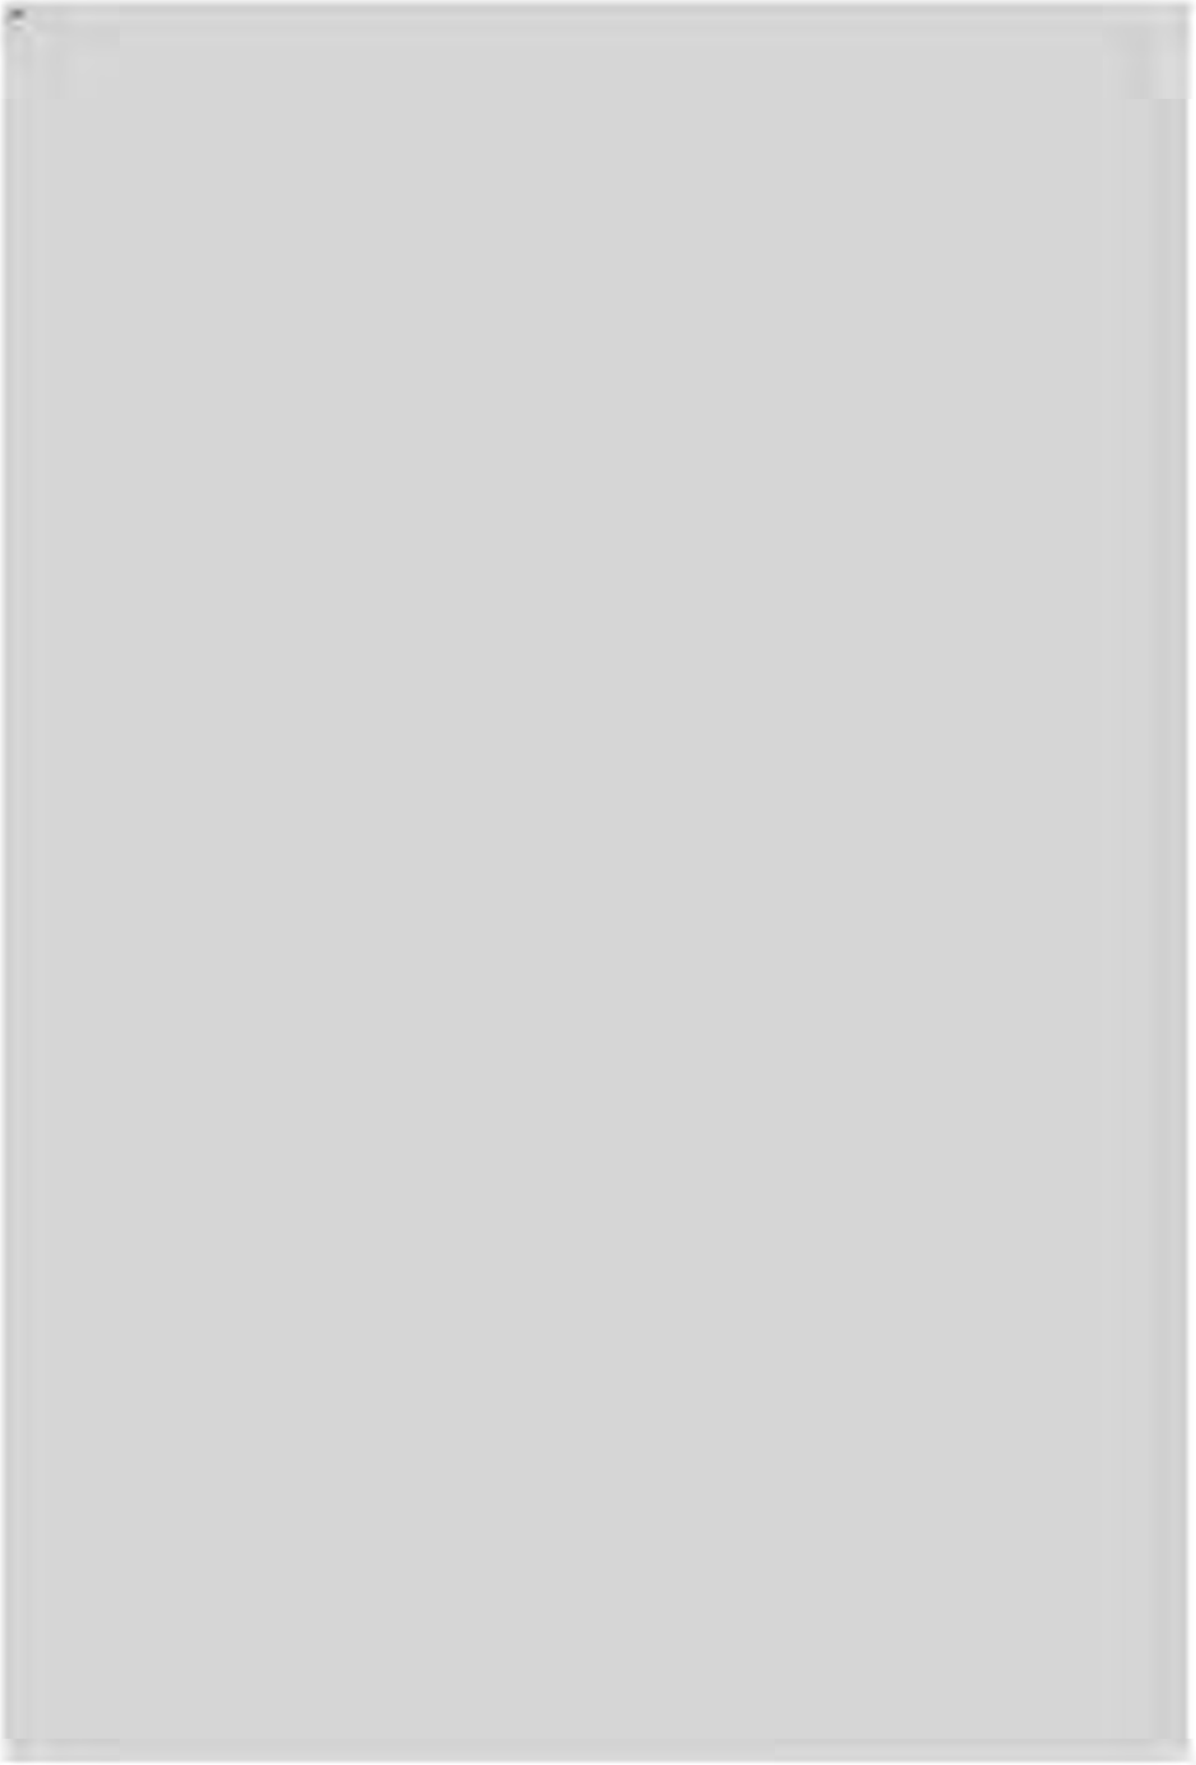

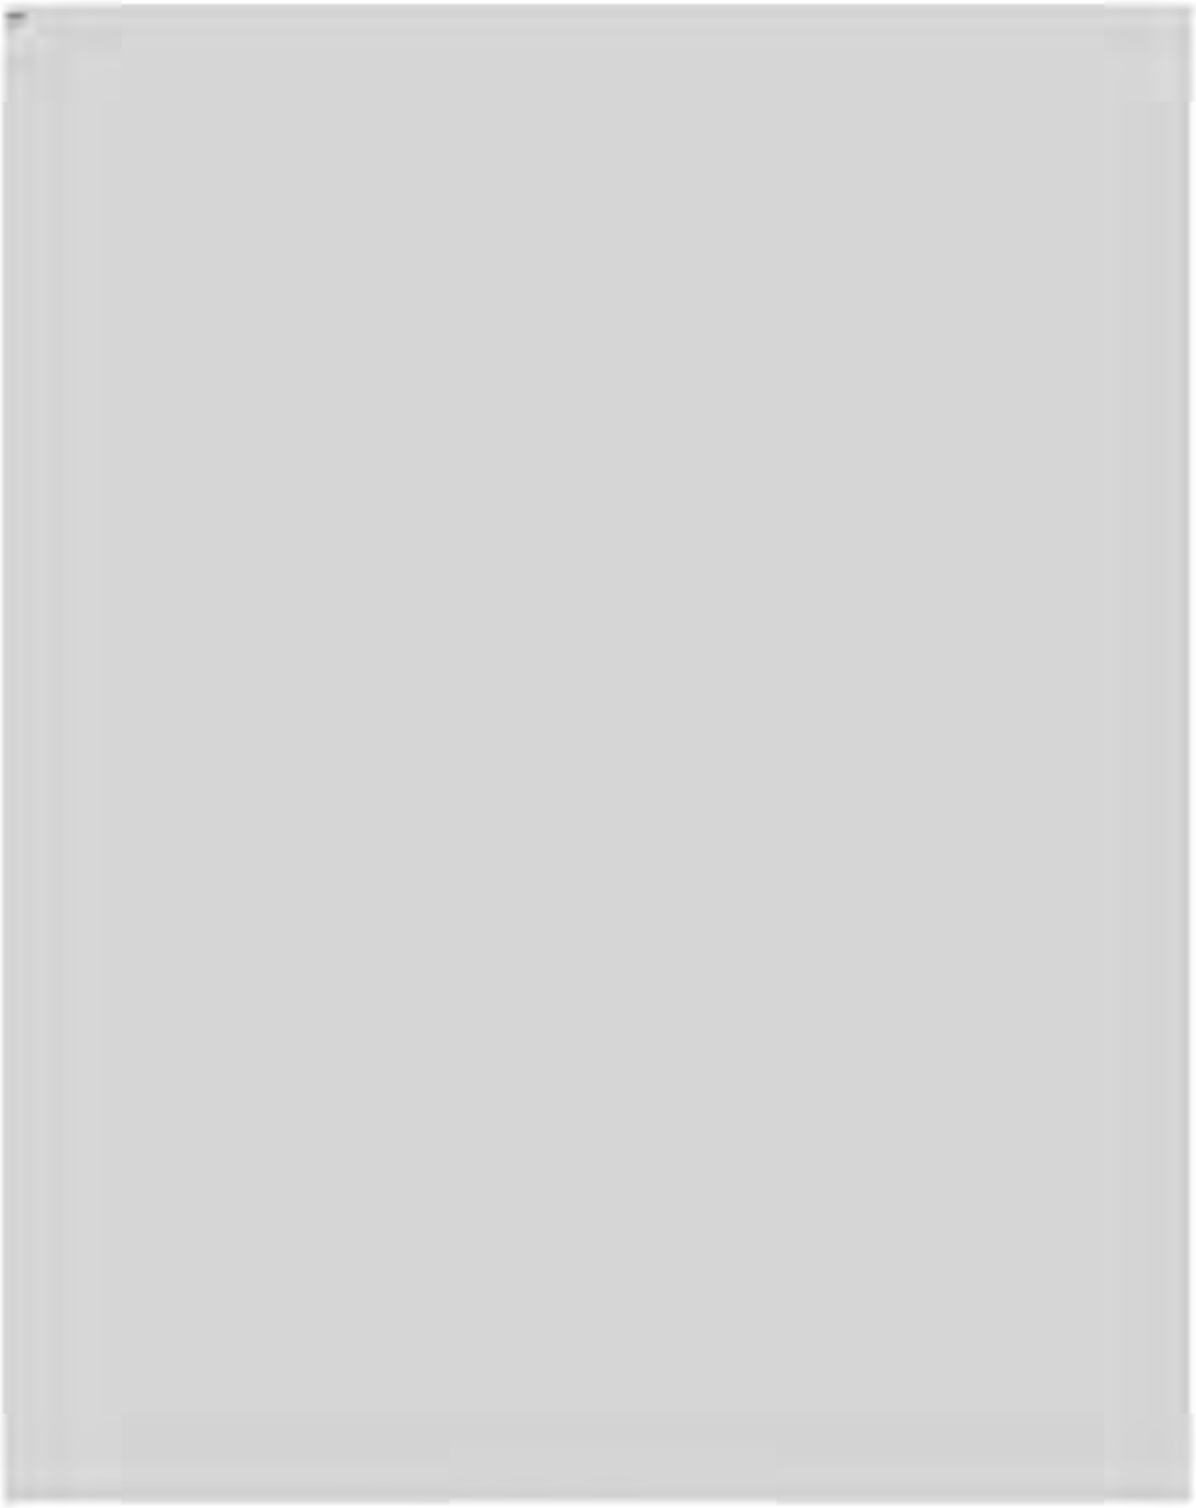

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr113

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 14 juli 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

## 1 Verificatiesessie risicoanalyses

- Besproken in aanwezigheid van 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e

Acties naar aanleiding van planning Tweede toevoer:

- Nagaan hoe "hard" de relatie is tussen een onherroepelijk Projectplan en de ter inzage legging van het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning kappen bomen/Wn-vergunning; kan deze relatie er weer uit/kunnen deze procedures parallel lopen? Actie 5.1.2.e
- Nagaan stand van zaken SOK Rijswijk; is er meer actie nodig? Actie 5.1.2.e
- Uitwerken planningsscenario Onteigening 5.1.2.e Actie 5.1.2.e/5.1.2.e
- Aanpassen relatie tussen Omgevingsvergunning bomen/Wn-vergunning: Actie 5.1.2.e /5.1.2.e
  - na analyse van de zienswijzen (3 weken na einde ter inzage legging van het ontwerpbesluit), volgt een go/no go moment voor start aanbesteding. In de deterministische planning wordt uitgegaan van een 'go'.
  - Er wordt een risico opgenomen van 5% kans op een 'no go', waarna de aanbesteding start na analyse van de beroepen.
  - Gunning vindt plaats onder voorwaarde van een onherroepelijke Omgevingsvergunning kappen bomen/Wn-vergunning (relatie tussen onherroepelijke vergunning en definitieve gunning).
- Nadat een volgend gesprek heeft plaatsgevonden met 5.1.2.e zal er communicatie plaatsvinden met PZH over de planning (mijlpaal Vervangen oeverbescherming gereed). 5.1.2.e /5.1.2.e

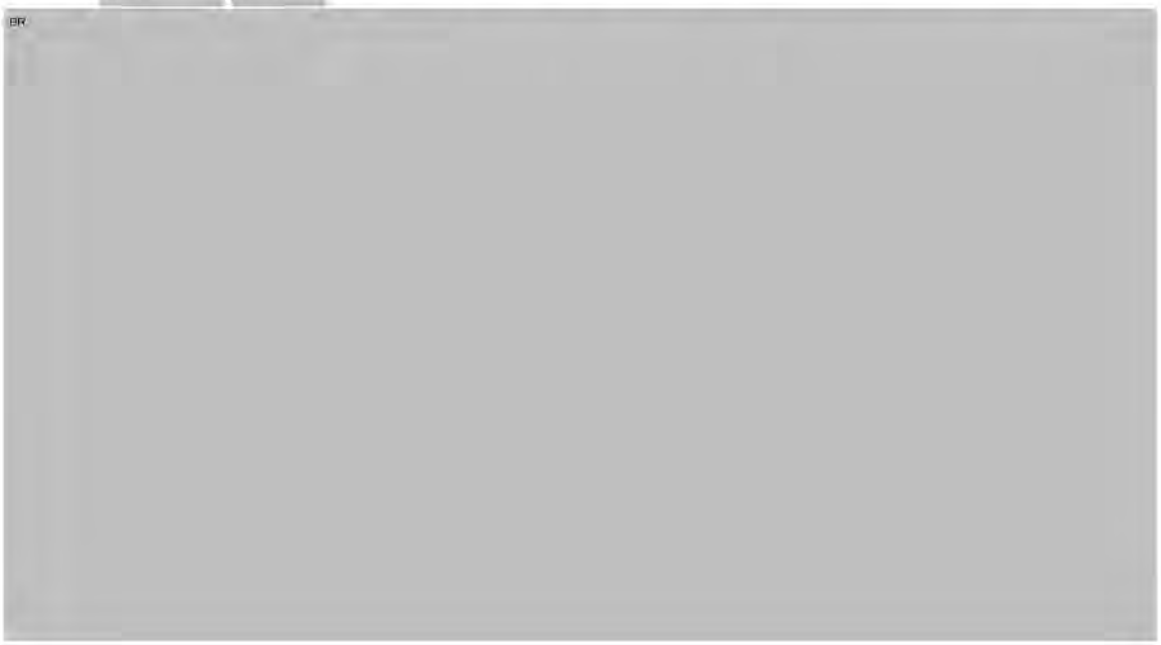

- 2e Toevoer: 16 juli gesprek met 5 12e (adviseur van particuliere eigenaar).
- Aflaatconstructie: ontwerpvoorstel van 5 12e ter controle naar HHD en beheerder stadsdeel Ypenburg.

op

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr114

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 11 augustus 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

- 2e Toevoer: Na overleg met de vergunningverleenster van Den haag blijkt het ontwerp-besluit kapvergunning toch direct gepubliceerd te kunnen worden na VVGB van ODH. Er is dus geen koppeling met een onherroepelijk Projectplan Waterwet. In de vergunning wordt wel voorschrift opgenomen dat we pas mogen starten met het kappen nadat Projectplan onherroepelijk is. Daarnaast zijn we met ODH en Den Haag nog in overleg of een VVGB nog noodzakelijk is nu de dode boom waarin de vleermuisverblijfplaats was aangetroffen, is afgebroken.
- 30 juli Hoogheemraadschap van Delfland gesproken en afgesproken Roba de kosten dit jaar voor HHD inzichtelijk maakt zodat we o.b.v. de SOK principe-afspraken kunnen maken over de daadwerkelijk door Den Haag te ontvangen vergoeding.

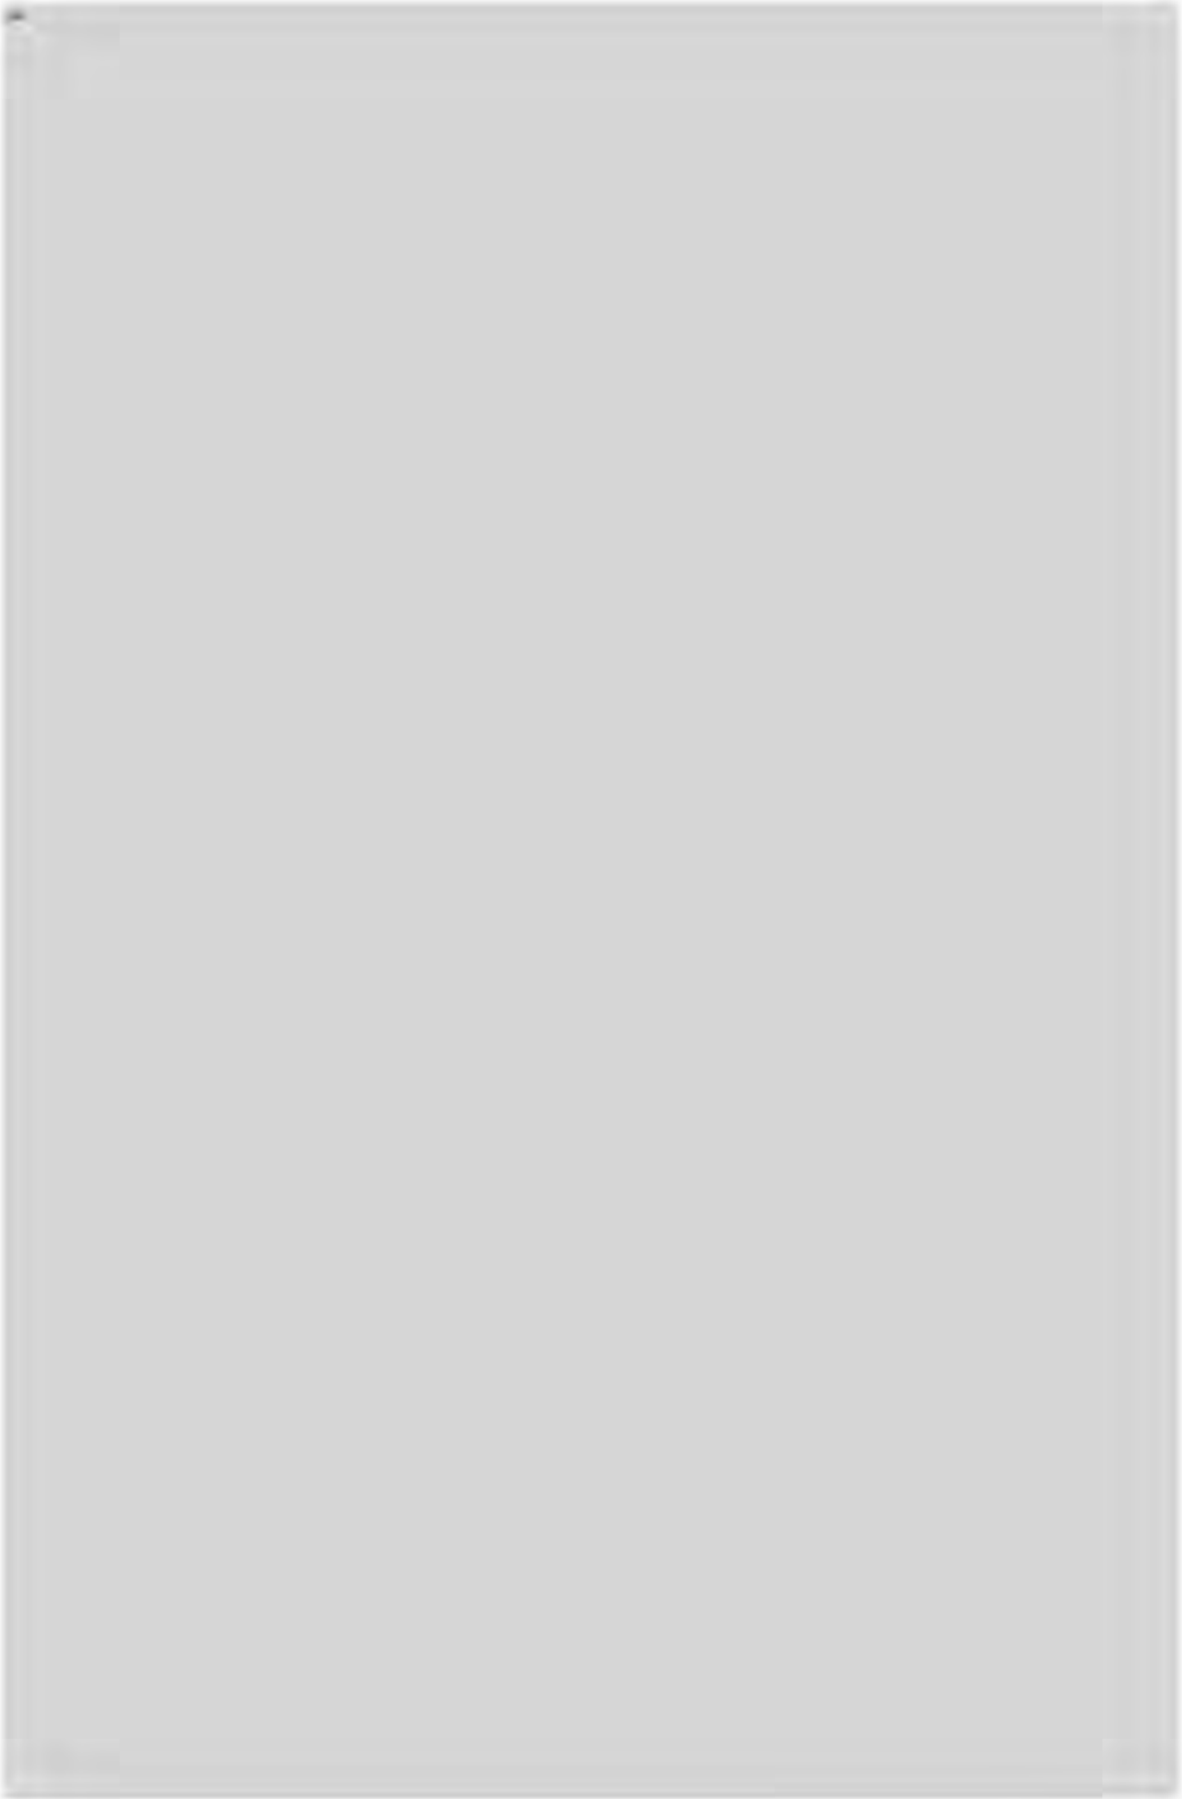

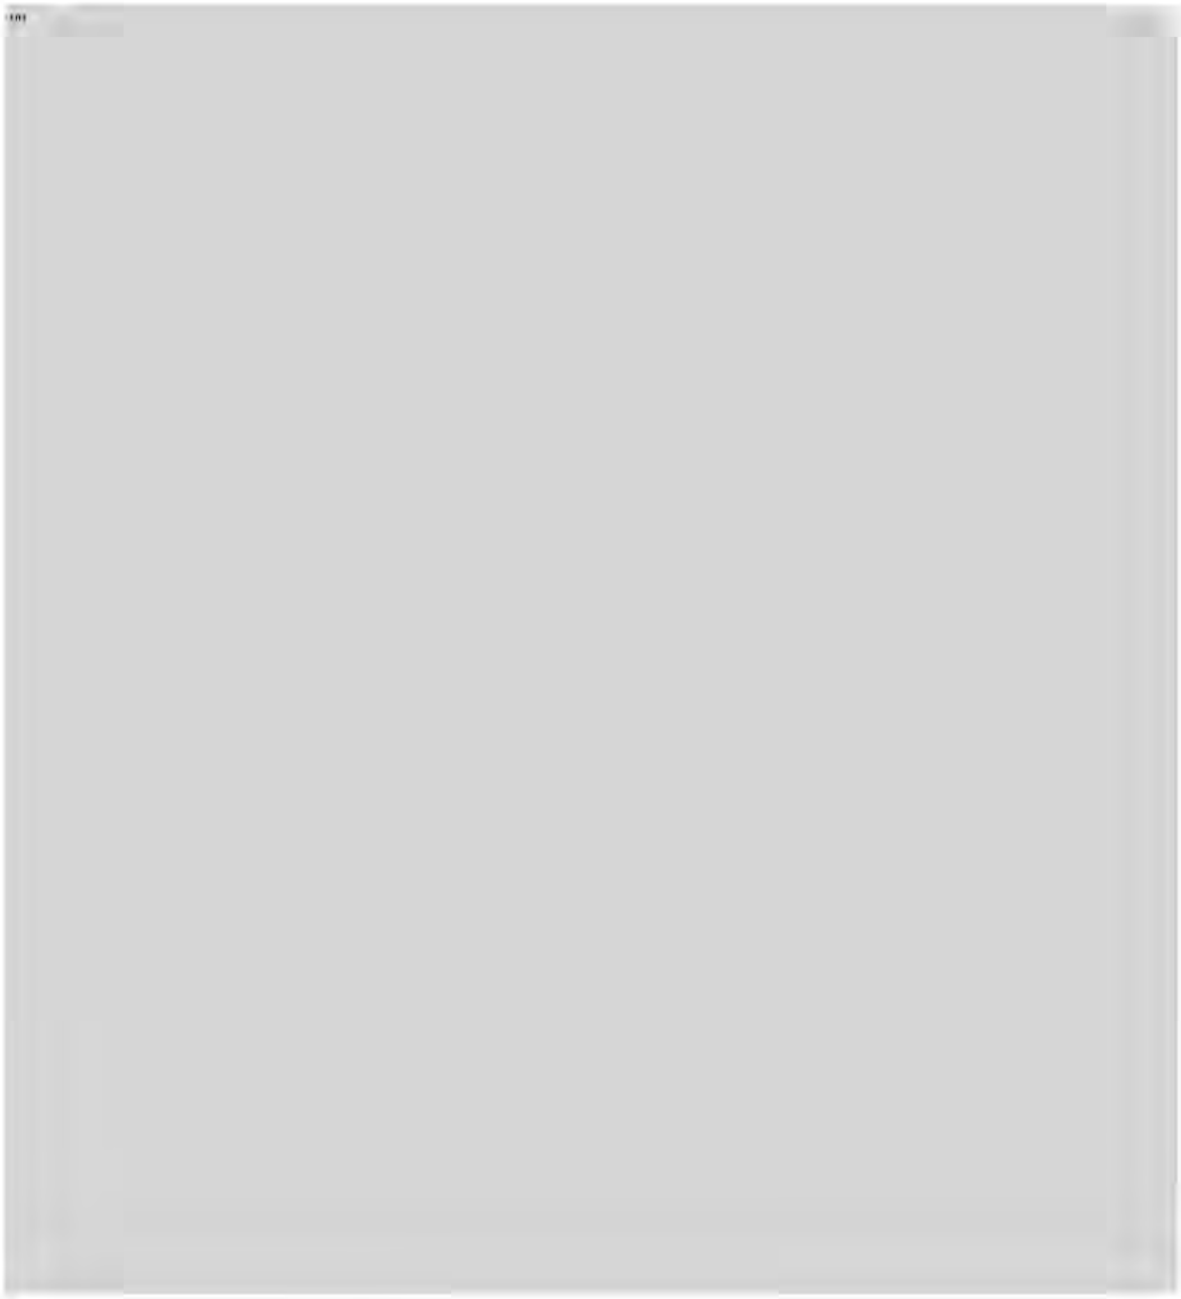

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr115

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 25 augustus 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Afwezig: -

BR

- 5.1.2.e (projectleider van om-en-om constructie bij Kippenbrug) heeft n.a.v. zijn gesprek met tankstation Argos contact opgenomen met Roba om af te stemmen over de werkplanning van 2e toevoer.

- Gesprokken met de particuliere grondeigenaar over realisatie van de tweede watertoevoer. Hij gaat mee met de door ons geschetste randvoorwaarden en werkgrenzen.

- Met HHD is afgesproken dat de tweede watertoevoer gereed zal zijn binnen 2 jaar na openstelling van de tunnel (eind 2022). Roba zal OGON en IbDH voorstellen om een separate projectleider aan te stellen en met budget vanuit Roba verder te gaan realiseren.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 22 september 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

**ROTTERDAMSEBAAN**

## 3 Afsluiten Molenvlietpark voorafgaand aan inundatie waterberging

Gevraagd: Bespreken en agenderen in OGON.

Besproken:

- Den Haag heeft SOK ondertekend en daarmee ingestemd met hetgeen daarin is vastgelegd. Nu moet Den Haag een afdeling aanwijzen die Delfland mag bellen in voorkomende gevallen.
- In memo toevoegen wie de SOK namens Den Haag en HHD ondertekend hebben.
- In paragraaf Potentiële oplossingen de teksten omdraaien over advies van projectorganisatie en de eerste reacties van de betreffende afdelingen.

Besloten: Agenderen in OGON.

## 4 OGON 29 september

- Memo Afsluiten Molenvlietpark voorafgaand aan inundatie waterberging;

[redacted]

- Aanvragen nieuwe kapvergunning 2e toevoer kunne we pas indienen nadat we concreet kunnen aangeven hoe de herplantplicht wordt ingevuld. Dat kunnen we pas afronden nadat wij het nieuwe inrichtingsplan Nieuwe Vredenoord hebben ontvangen. Betreft een planningsrisico.

[redacted]

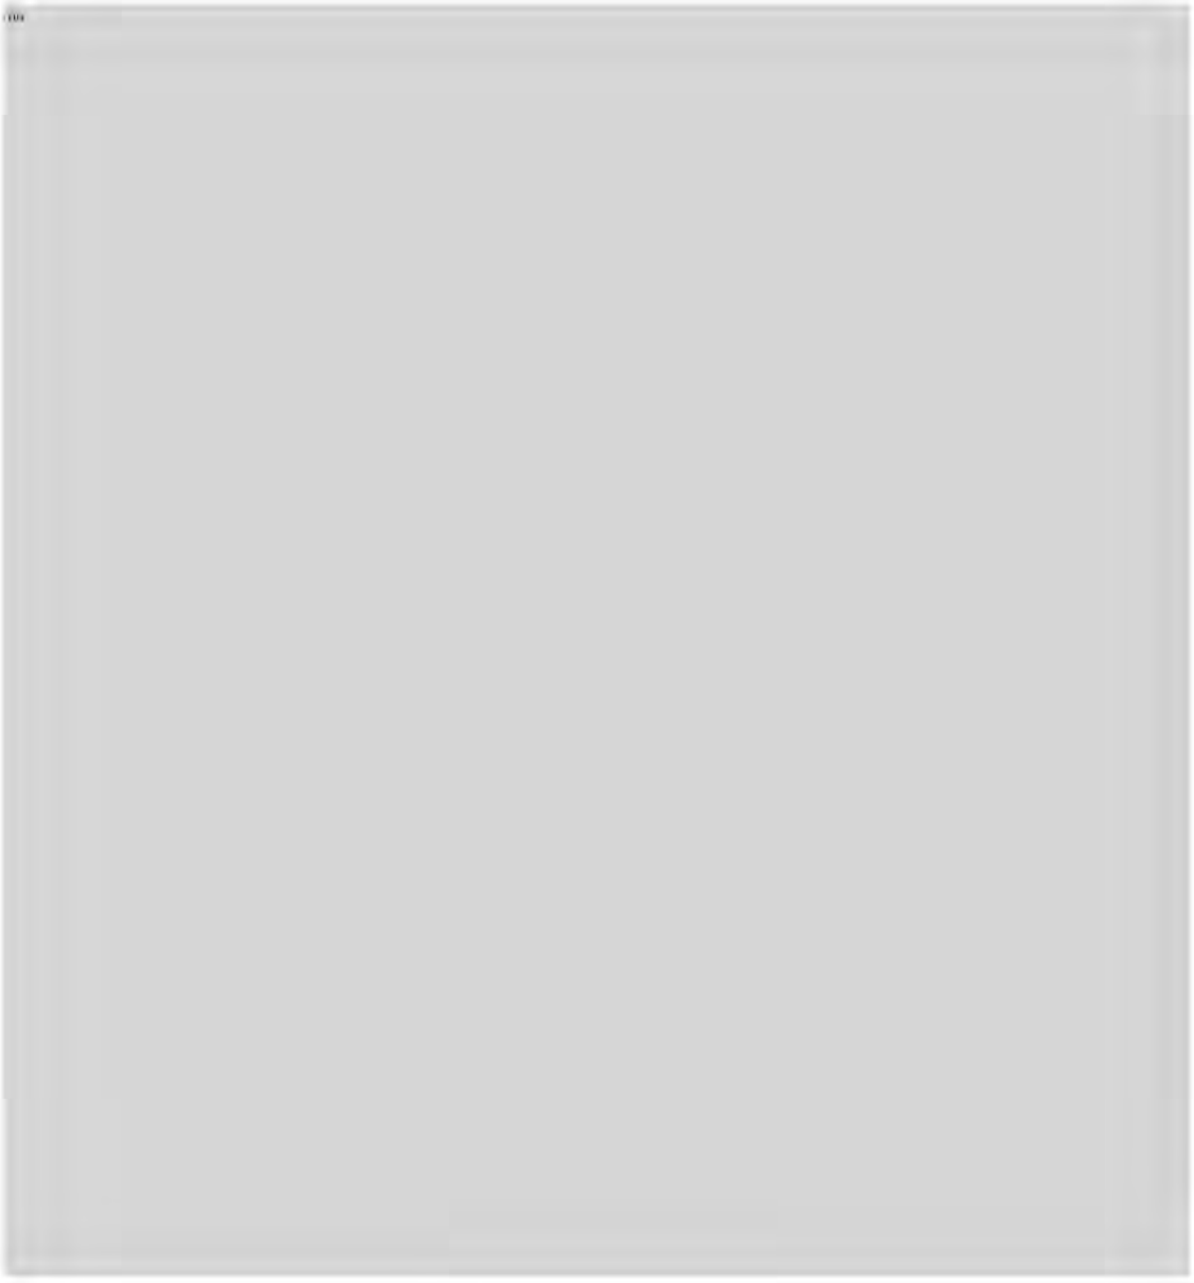

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr117

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 6 oktober 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

- Tweede toevoer: IBDH en Opdrachtgeving nemen dit project nog voor het einde van het jaar over van Roba.Er zal een overdrachtsdossier opgesteld moeten worden. Van het huidige projectteam zullen enkel 5.1.2.e en 5.1.2.e betrokken worden, in ieder geval tot het moment dat de SOK met 5.1.2.e ondertekend is.

BR

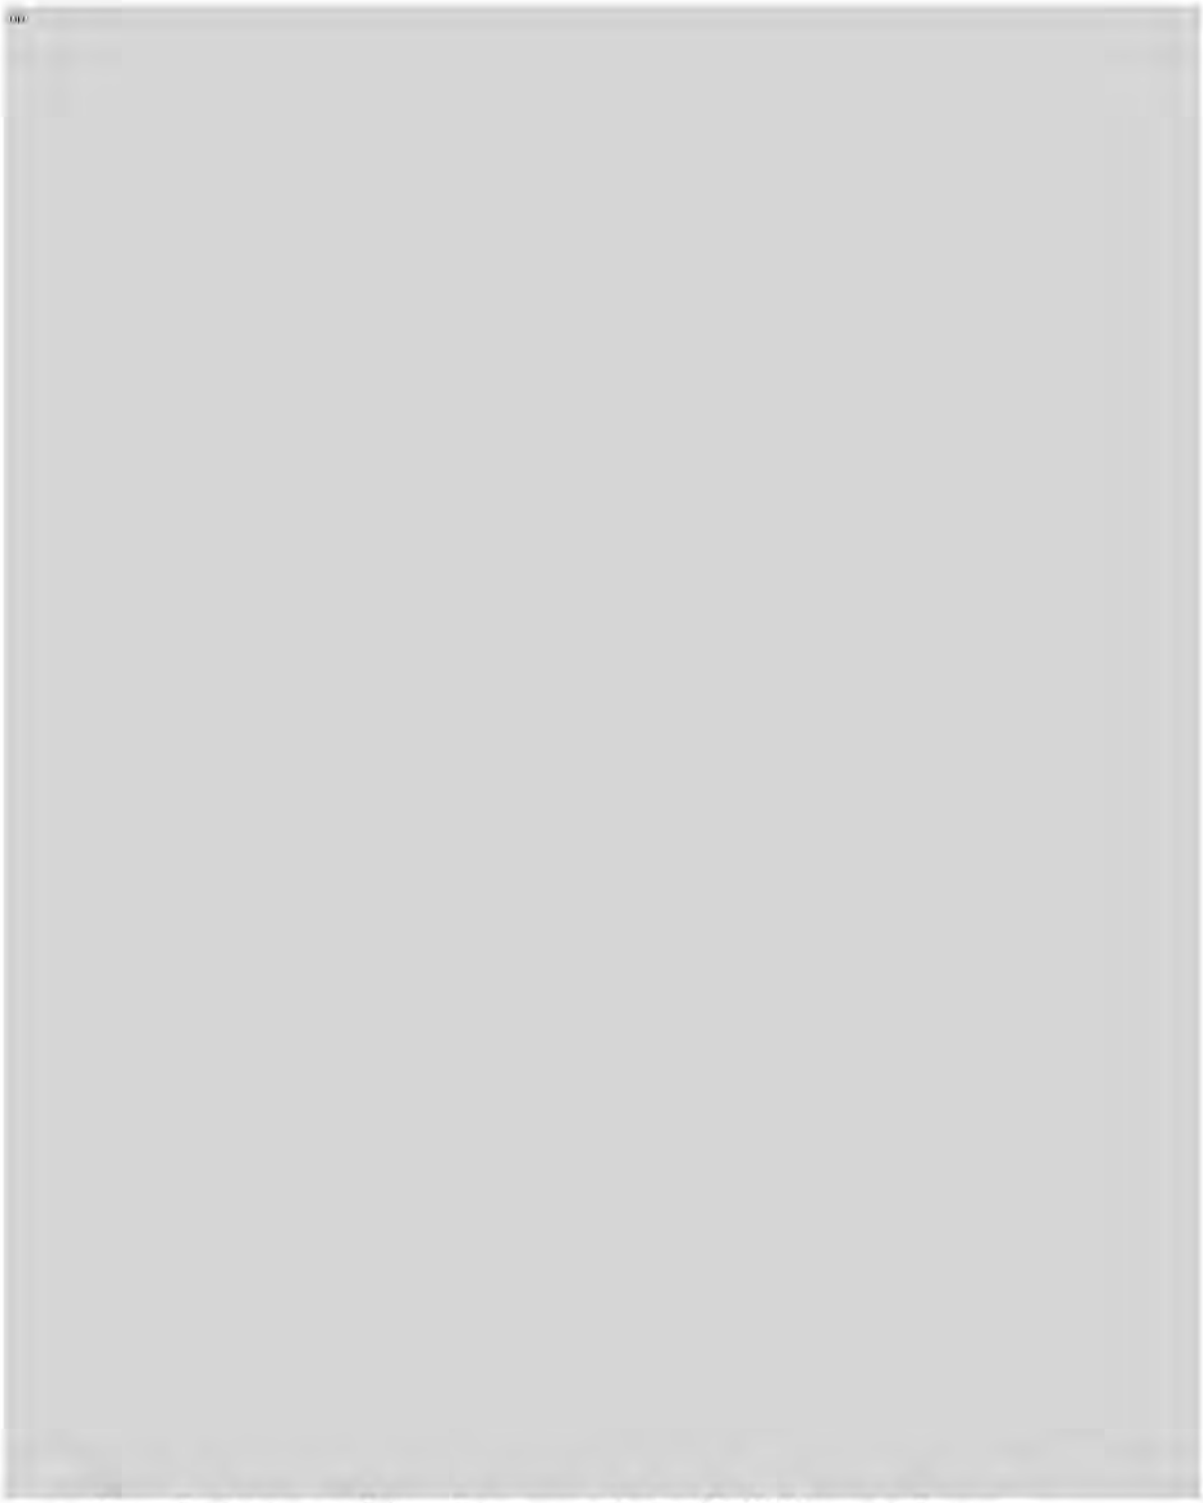

- Tweede toevoer geadviseerd om geen uitgebreide SOK maar ook geen memo op te stellen met vastlegging van de afspraken maar een brief van 5.1.2.e die ook door de gemeente Rijswijk ondertekend moet worden.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr118

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 3 november 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| | Afwezig: |

[redacted]

- 5.1.2.e bespreekt binnen Den Haag nog wie Delfland moet bij t.b.v. ontruimen Molenvlietpark voorafgaand aan inzetten waterberging.

[redacted] 5.1.2.e

- PvE tweede watertoevoer met adviseur particuliere grondeigenaar afgestemd. Enkele punten gealloceerd waarover 5.1.2.e en de eigenaar binnenkort vervolgoverleg zullen voeren.
- 2 november de eigenaar van Jan Thijssenweg 8 gesproken over concept PvE bij concept-grondruilovereenkomst. Alles onder voorbehoud van definitief ontwerp en realiseren van tweede toevoer.

- Vanaf 17 november laat CRB de dode bomen in Molenvlietpark vervangen.

- Projectbeheersing bereidt een overdrachtsdossier voor t.b.v. het verzelfstandigen van het project Tweede Watertoevoer.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr119

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 17 november 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| | Afwezig: |

BR

- VVE Park Hoornwijck heeft afgelopen weekend per mail aangegeven dat zij het Molenvlietpark kaal en nat vinden en vraagt om extra bomen te planten.

BR

- Gesprek gevoerd met potentiele nieuwe projectleider 2e toevoer. Deze zal via IbDH ingehuurd worden waarna team-Roba dit dossier kan overdragen.
- We wachten nog op het nieuwe ontwerp van Bosch Slabbers over landschappelijke inrichting Nieuwe Vredenoord. De inrichting rondom de tweede watertoevoer wordt daarop aangesloten.

BR

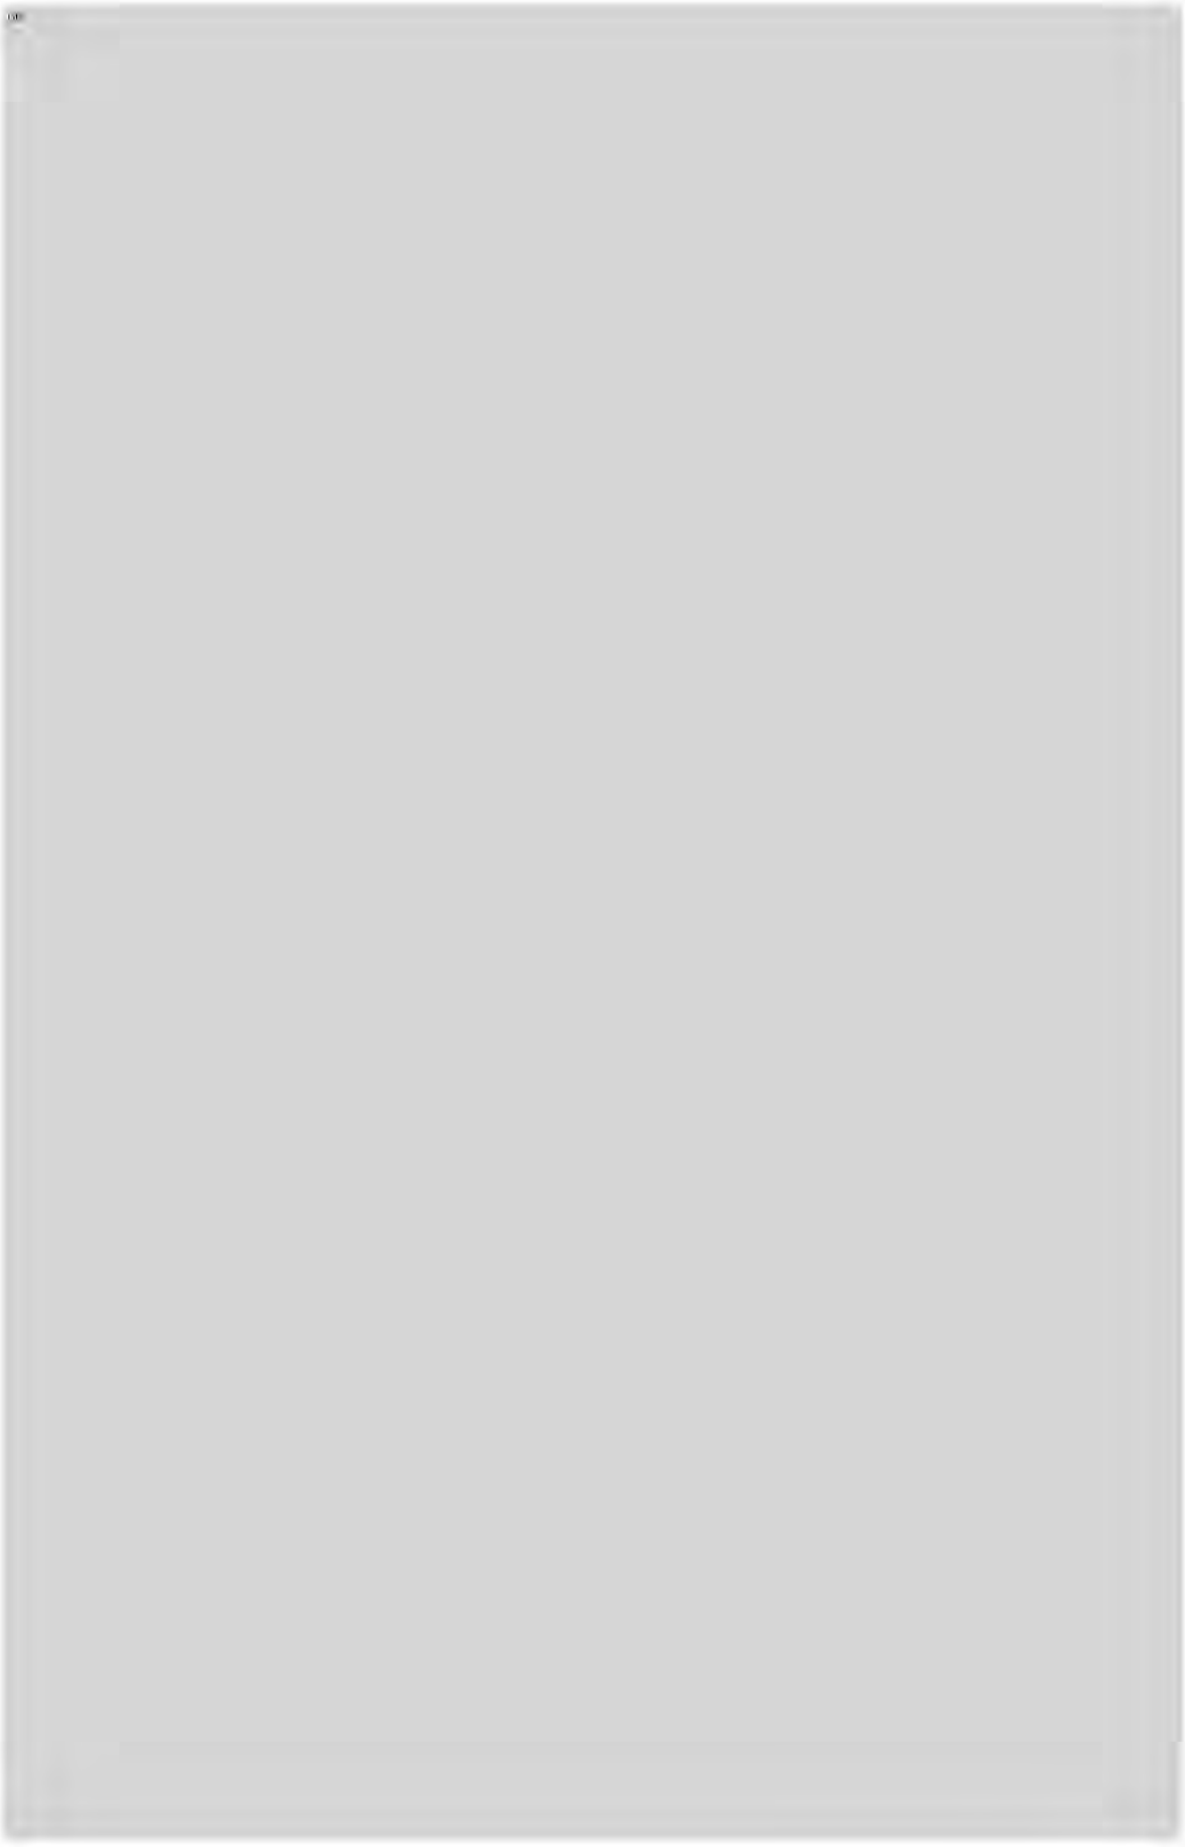

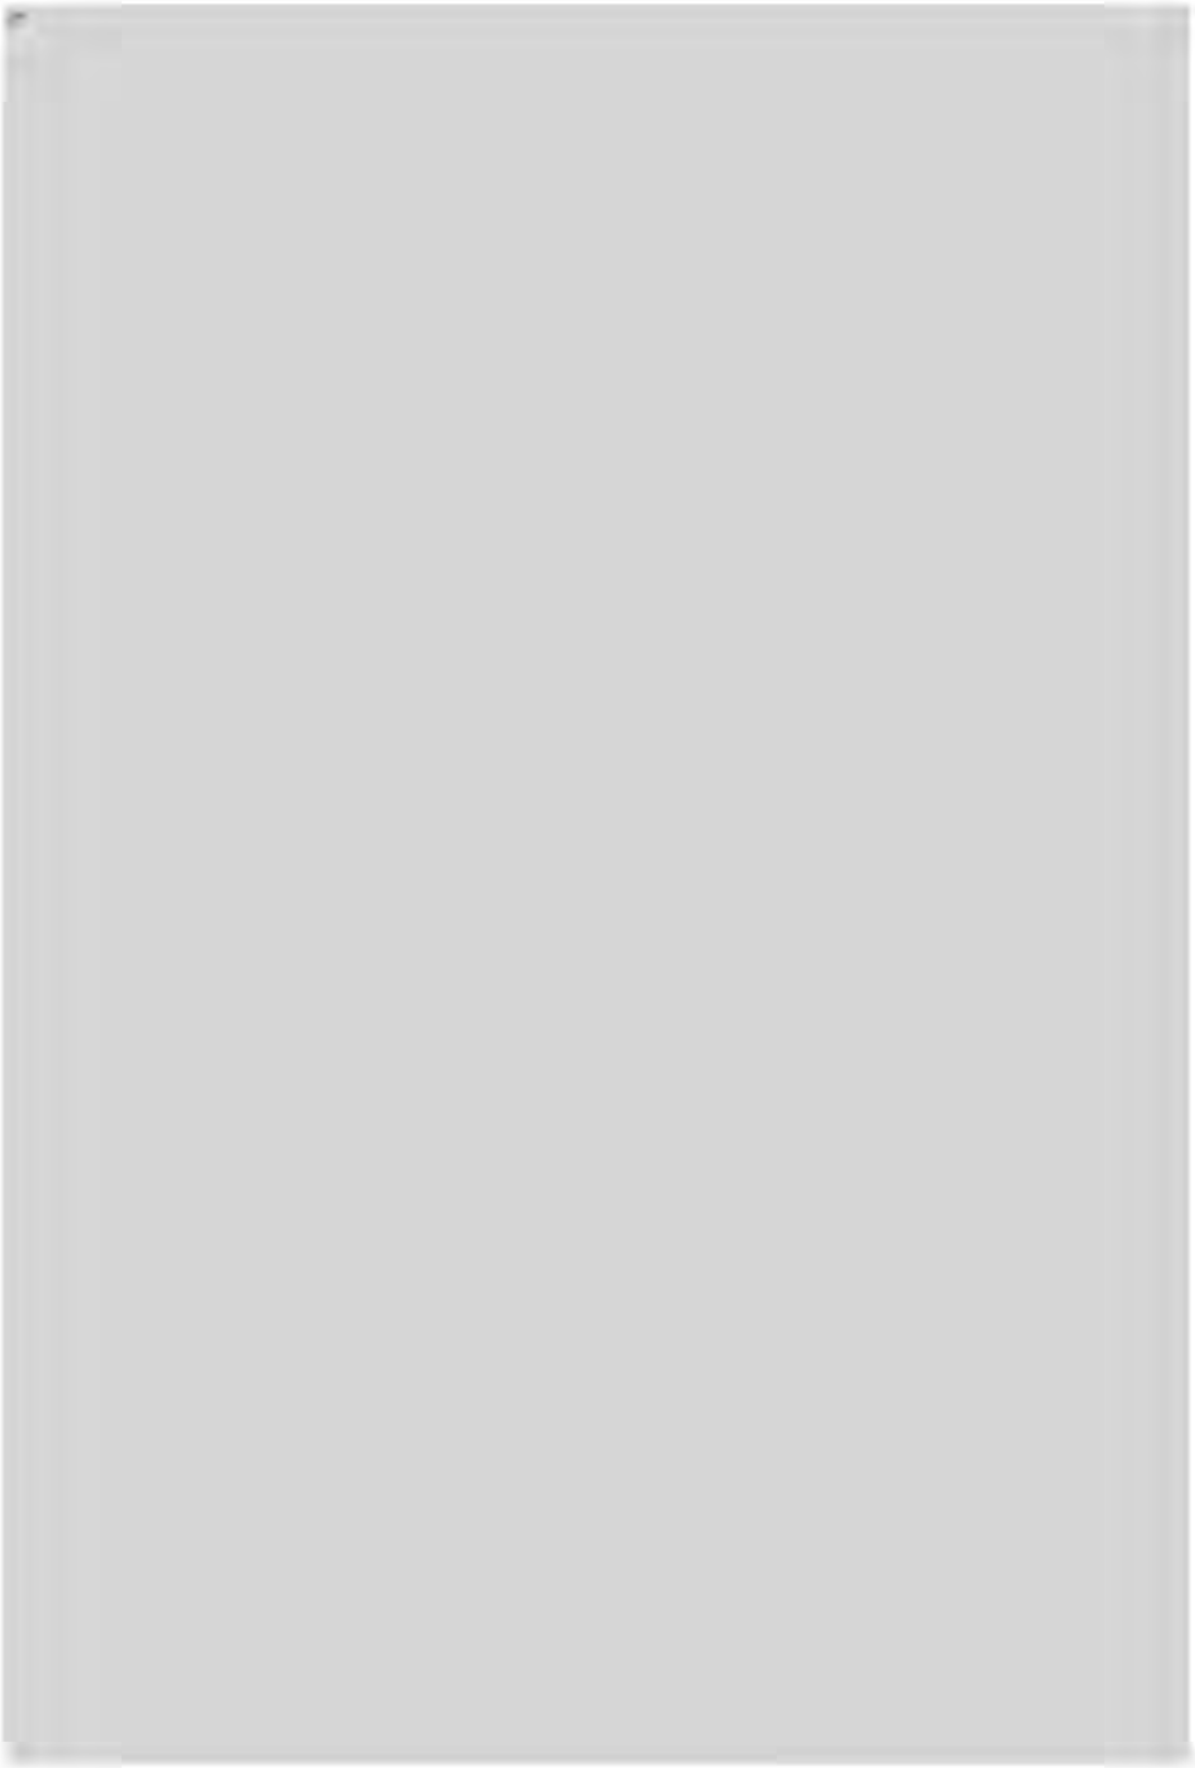

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 1 december 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| | Afwezig: |

BR

- Tweede watertoevoer verzelfstandigen als project: afsplitsen van project Roba. Formaliseren conform gebruikelijke procedure van Den Haag, bijv. via overdrachtsprotocol. Mondelinge toelichting door 5.1.2.e

BR

- Deze week waarschijnlijk aanbrengen houten onderwaterdamwand in de watergang tussen Molenvlietpark en perceel [redacted]

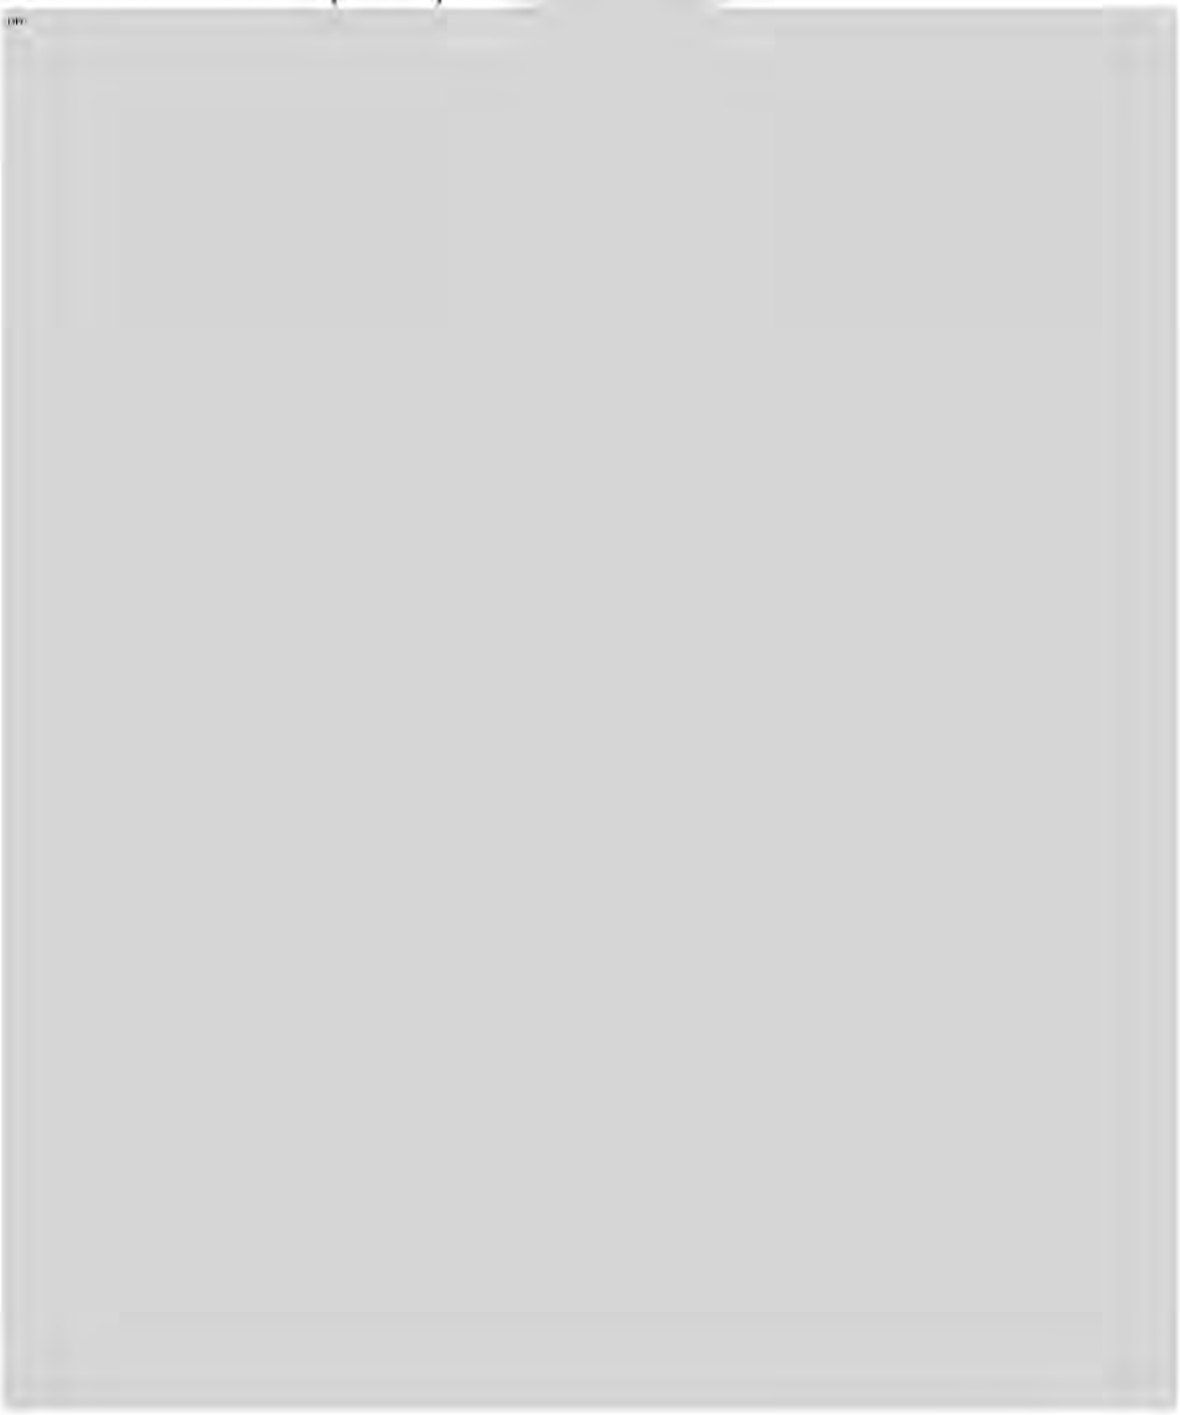

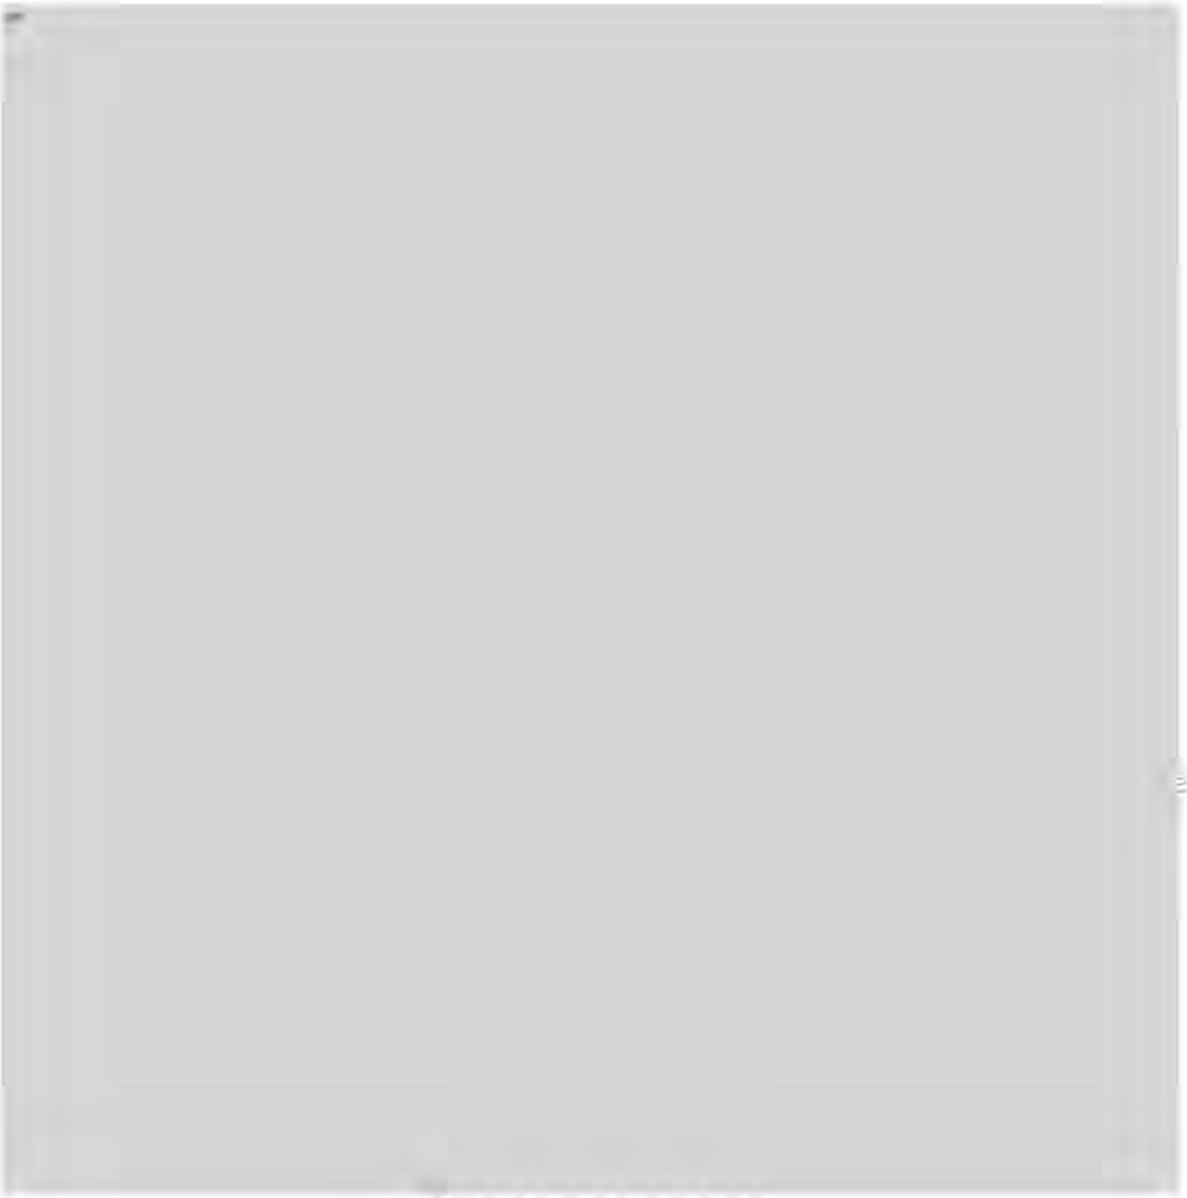

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr121

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 15 december 2020 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

- 5.1.2.e belt binnenkort met particuliere grondeigenaar t.a.v. watertoevoer, mede omdat zijn inrichtingsplan nog niet ontvangen is.

BR

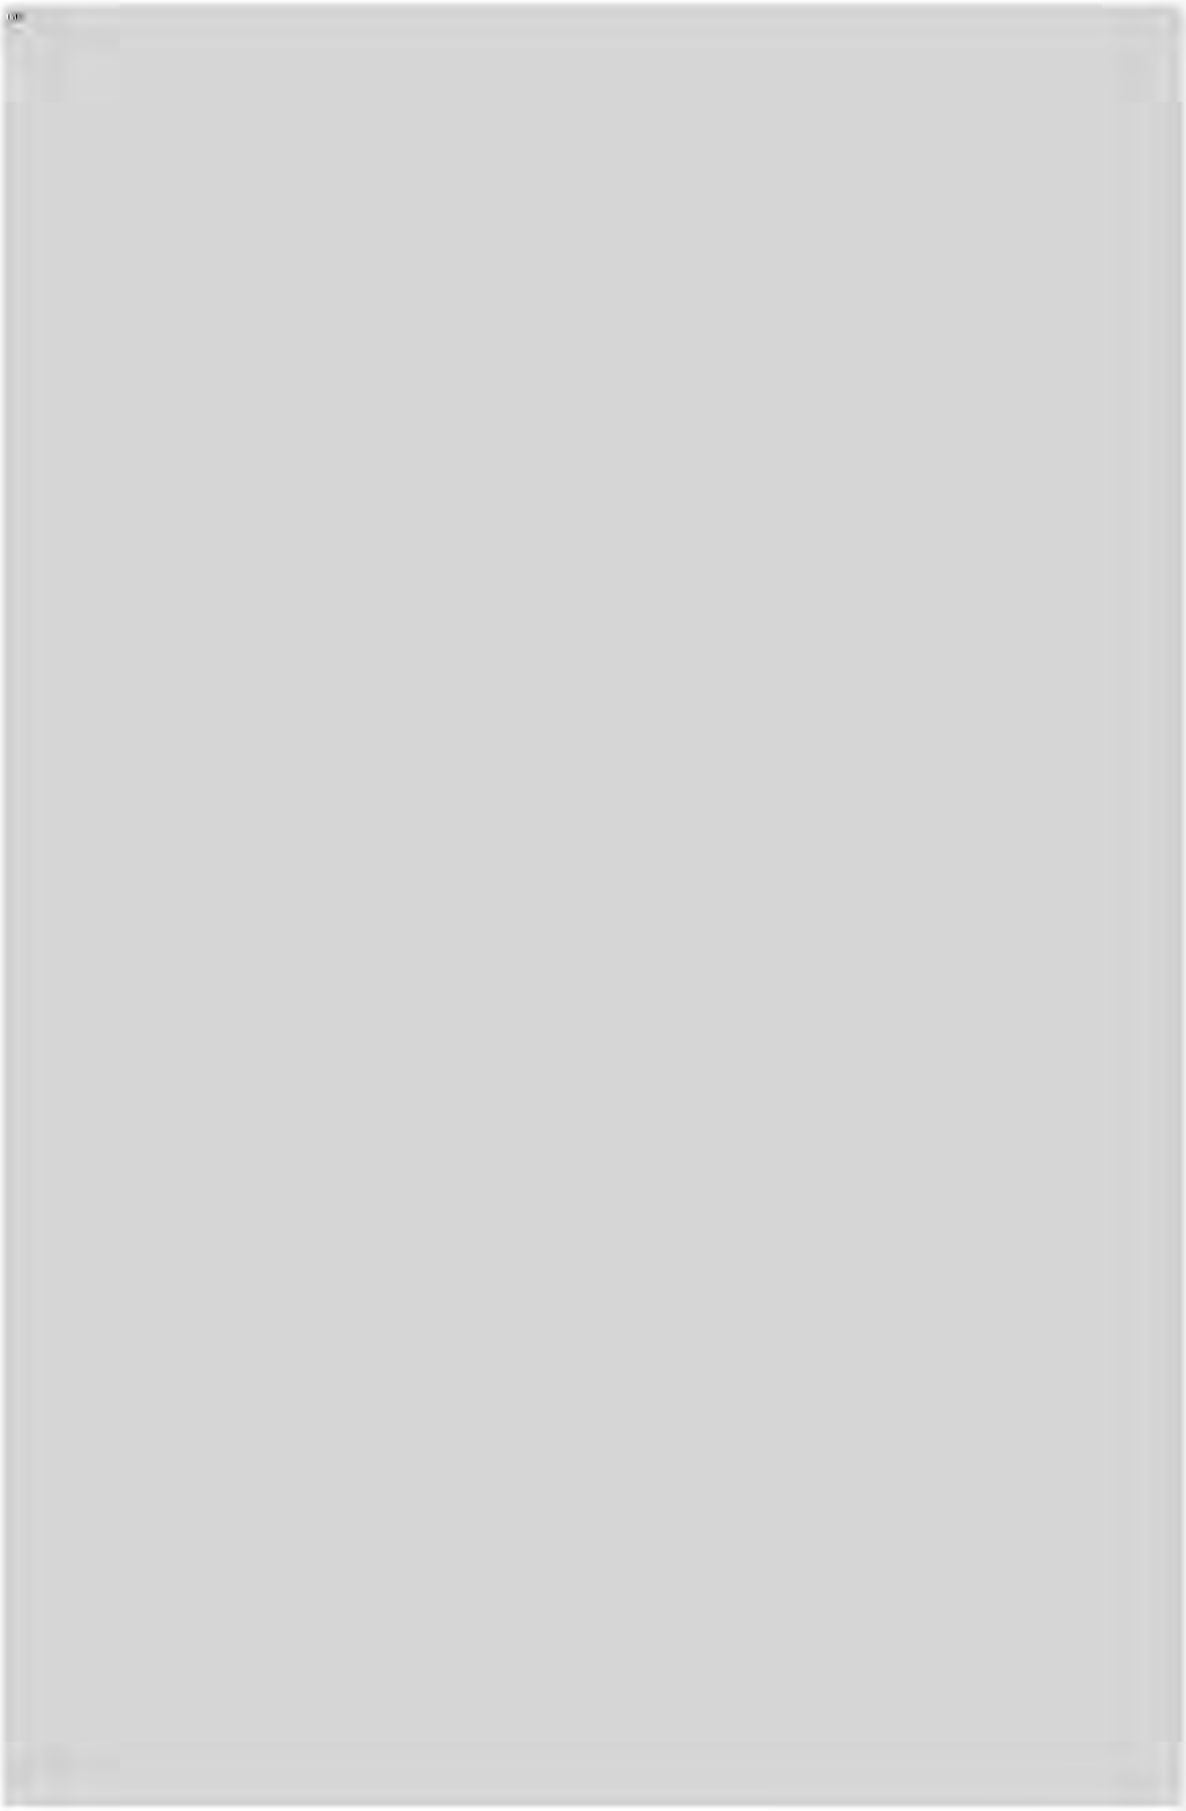

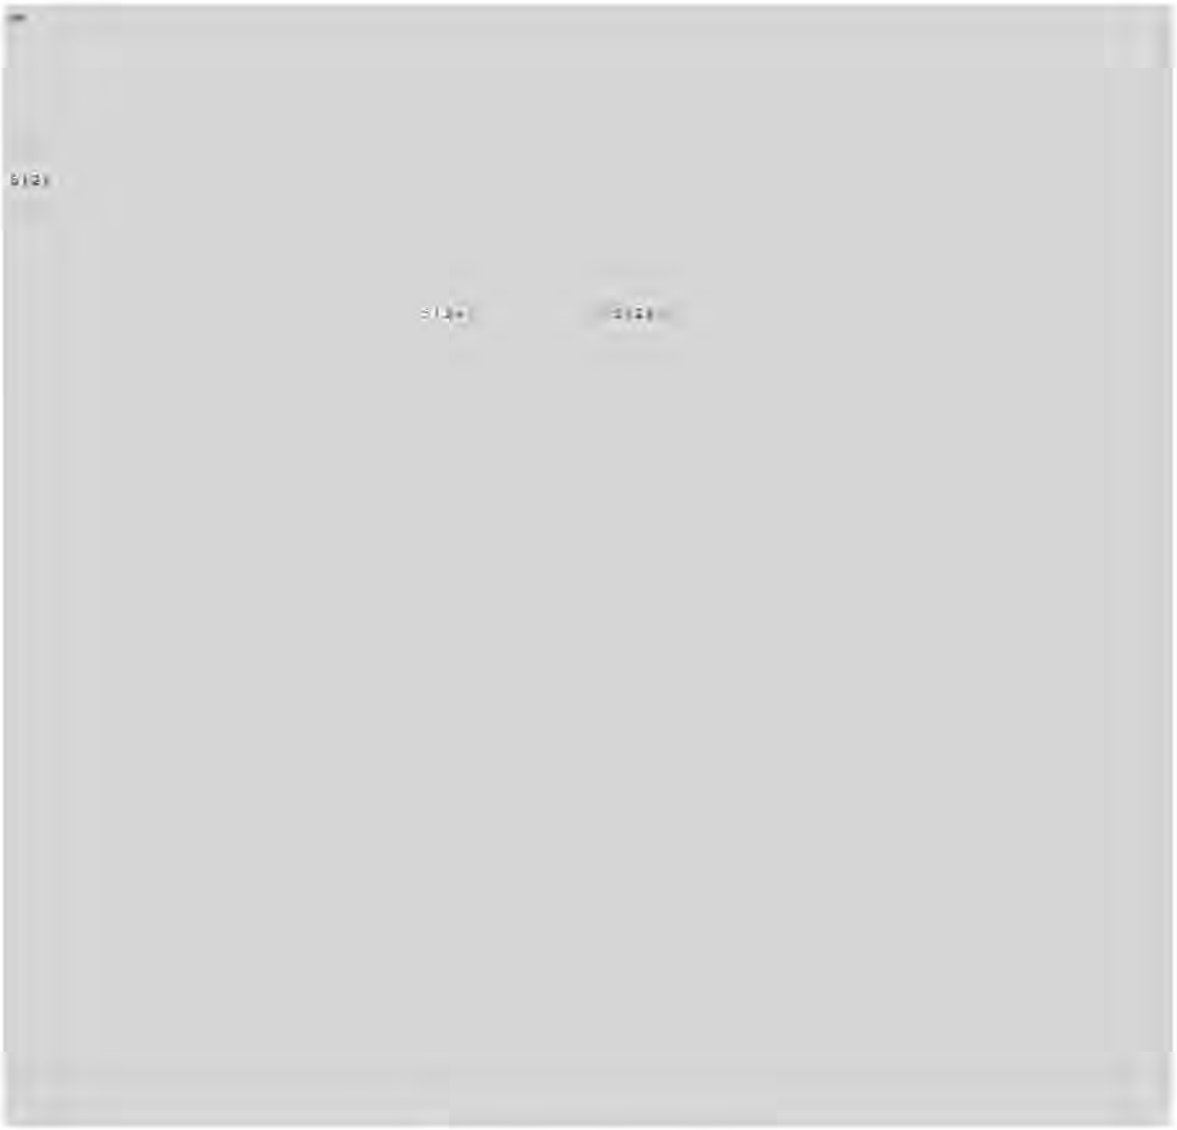

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 26 januari 2021 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| | Afwezig: |

- Werkzaamheden verbeteren landschappelijke inpassing aflaatconstructie zijn afgerond. Direct omwonenden hebben aangegeven het als een goede verbetering te ervaren. 2e fase wordt met 2e watertoevoer uitgevoerd. Dat mag t.z.t. niet worden vergeten.

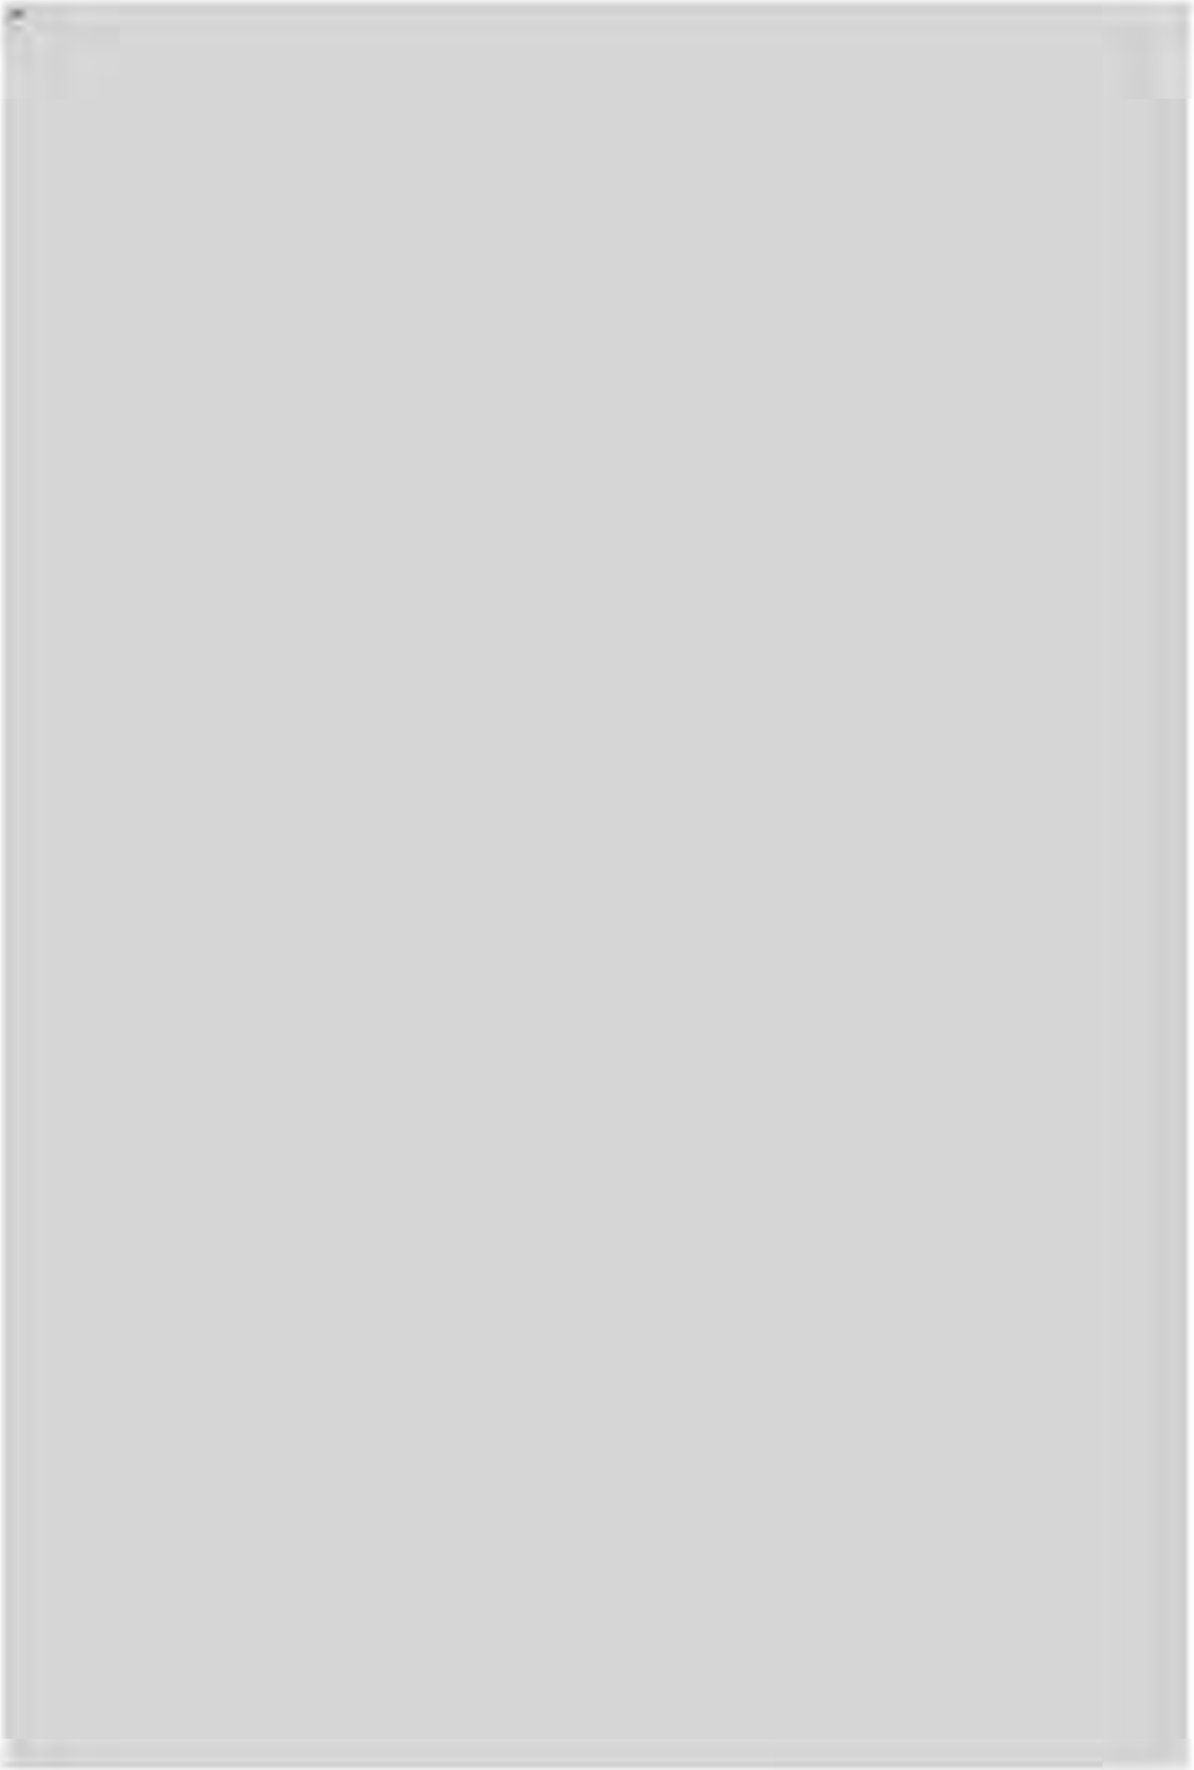

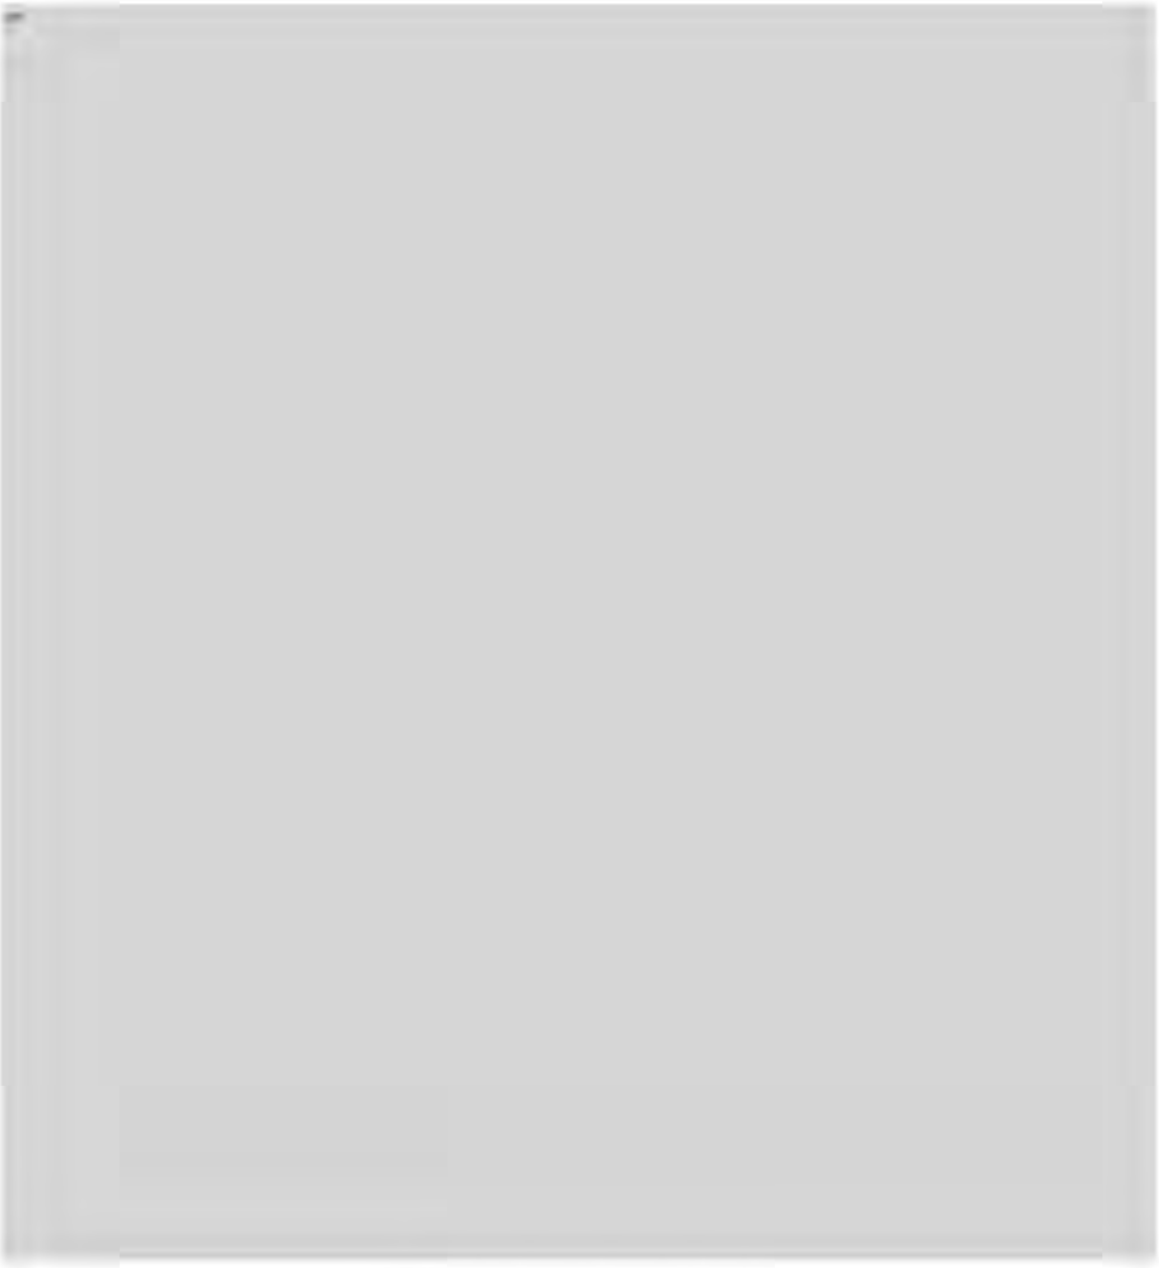

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr123

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 9 februari 2021 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| | Afwezig: |

BR

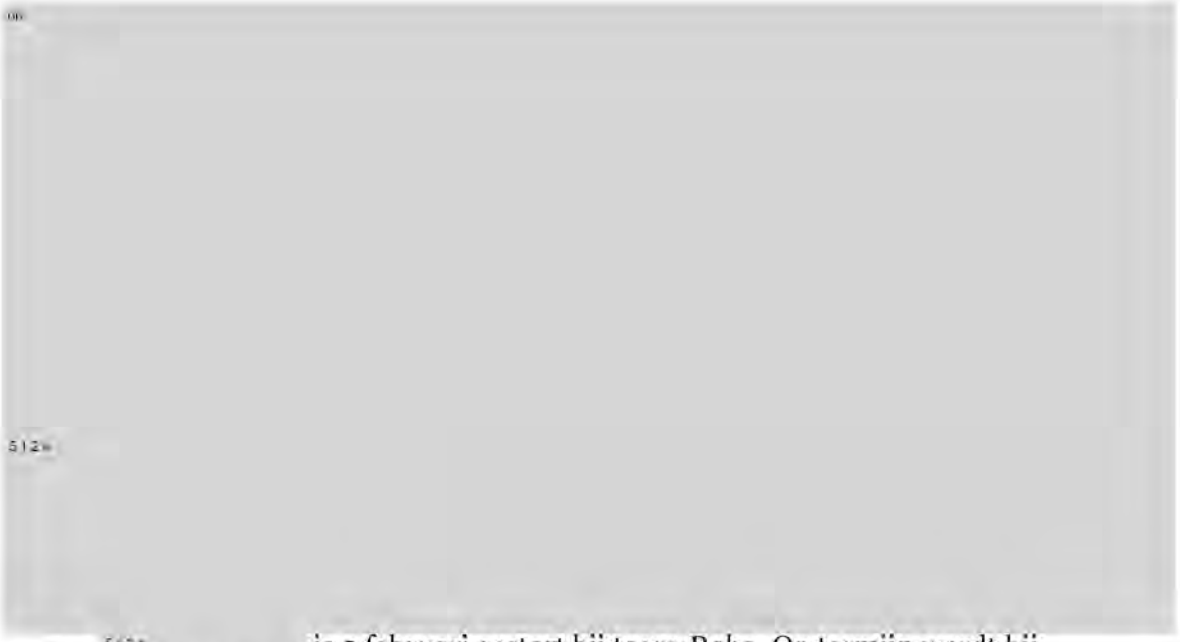

- 5 (2) is 9 februari gestart bij team-Roba. Op termijn wordt hij projectleider van het te verzelfstandigen project Tweede Watertoevoer.

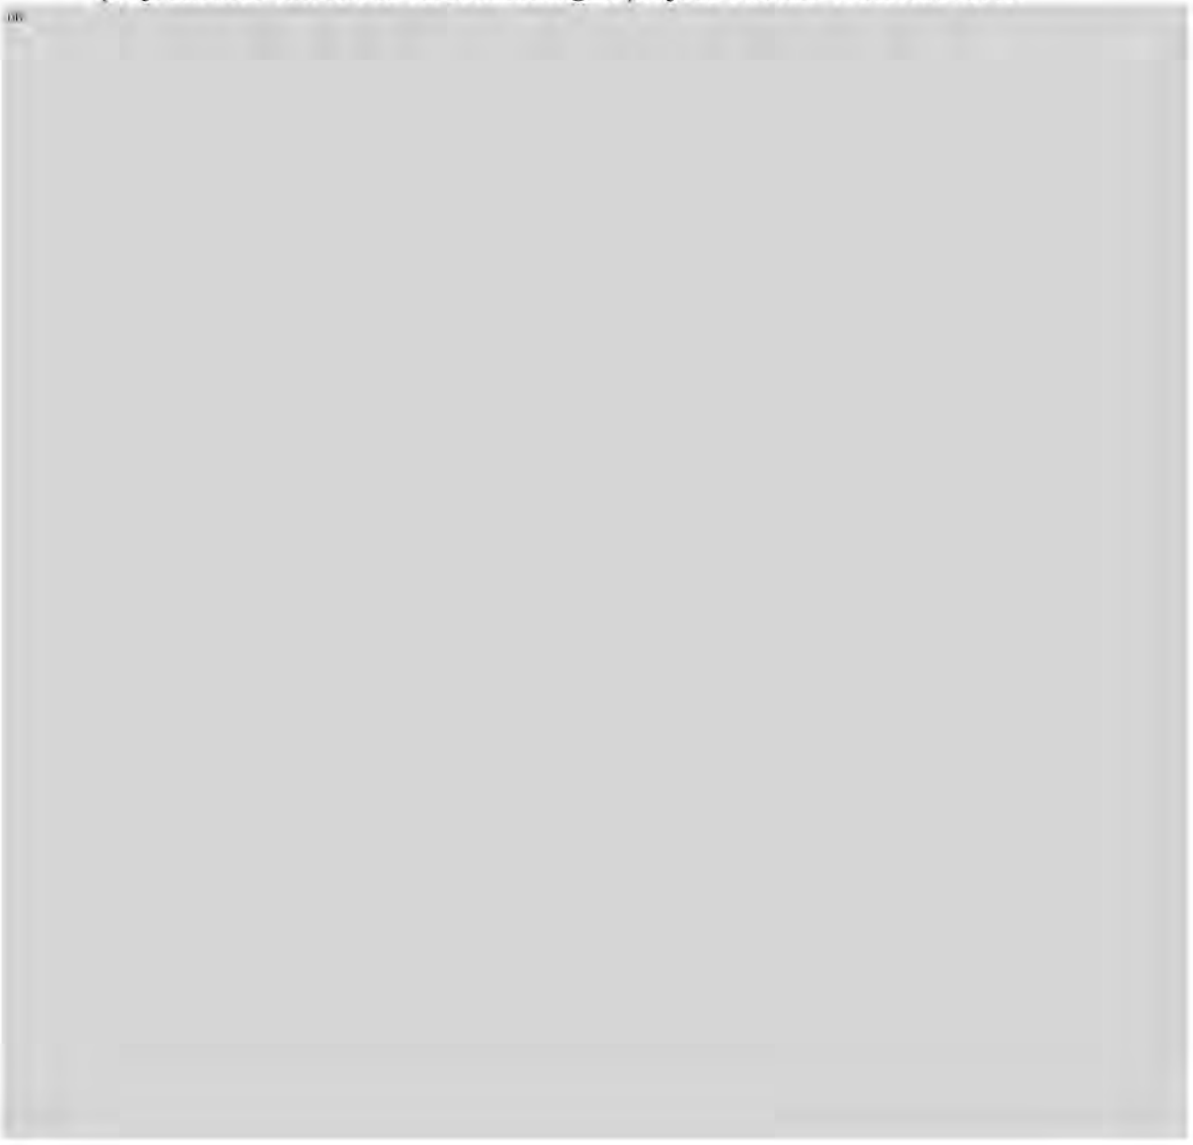

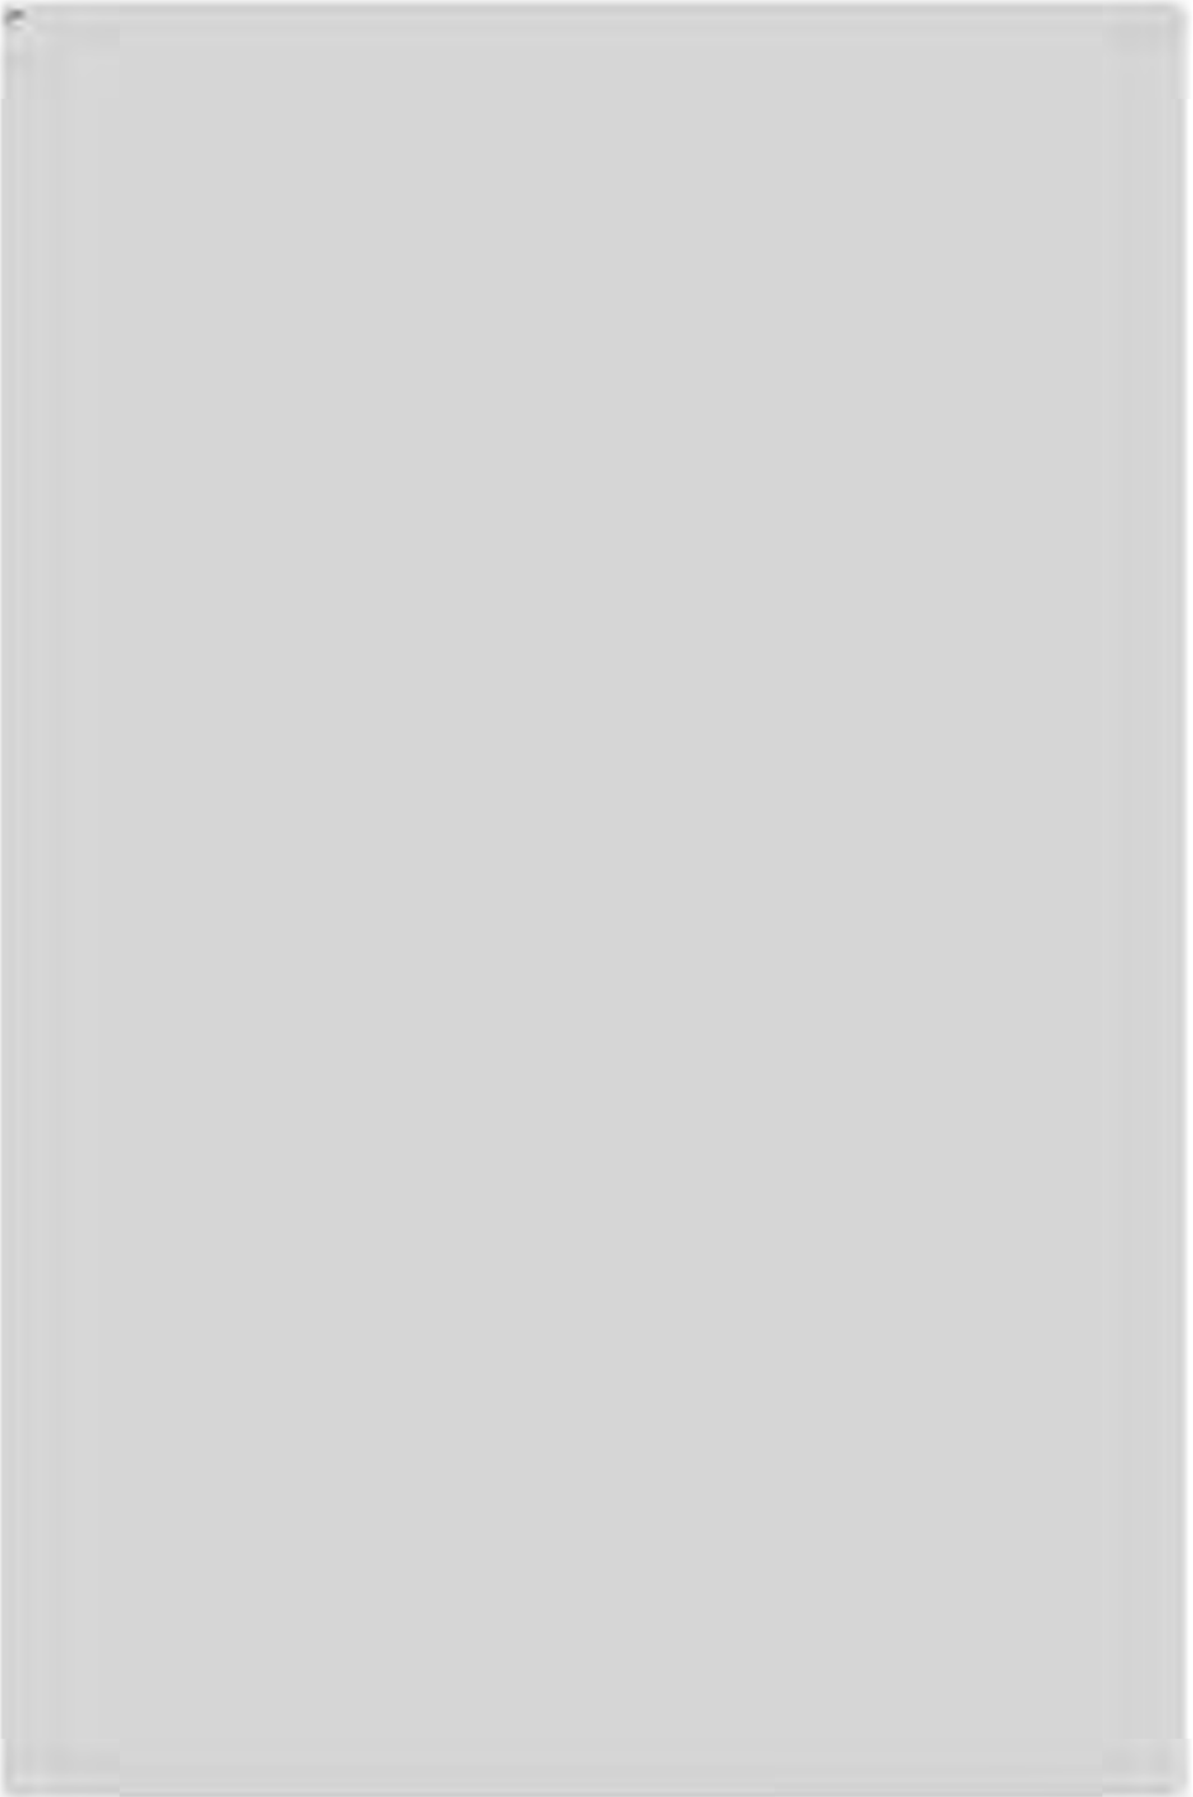

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 23 februari 2021 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | Afwezig: |

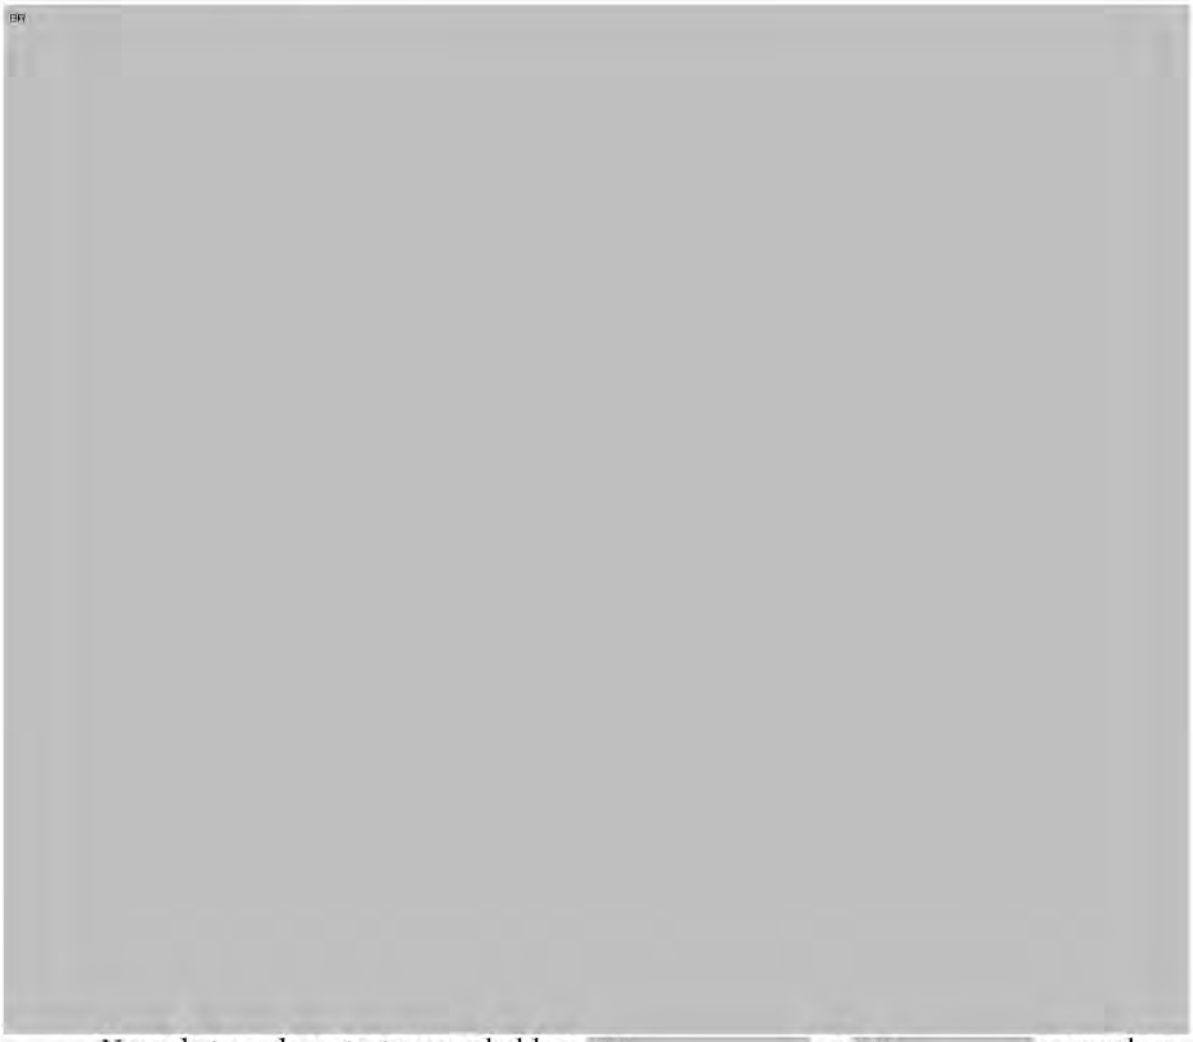

- Voor de tweede watertoevoer hebben 5.1.2.e en 5.1.2.e gesproken over de concept samenwerkingsovereenkomst met de grondeigenaar. 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e gaan binnenkort met de grondeigenaar in gesprek. Separaat werkt Movares aan het opstellen van het DO en het bestek van het landschappelijk ontwerp tweede watertoevoer.

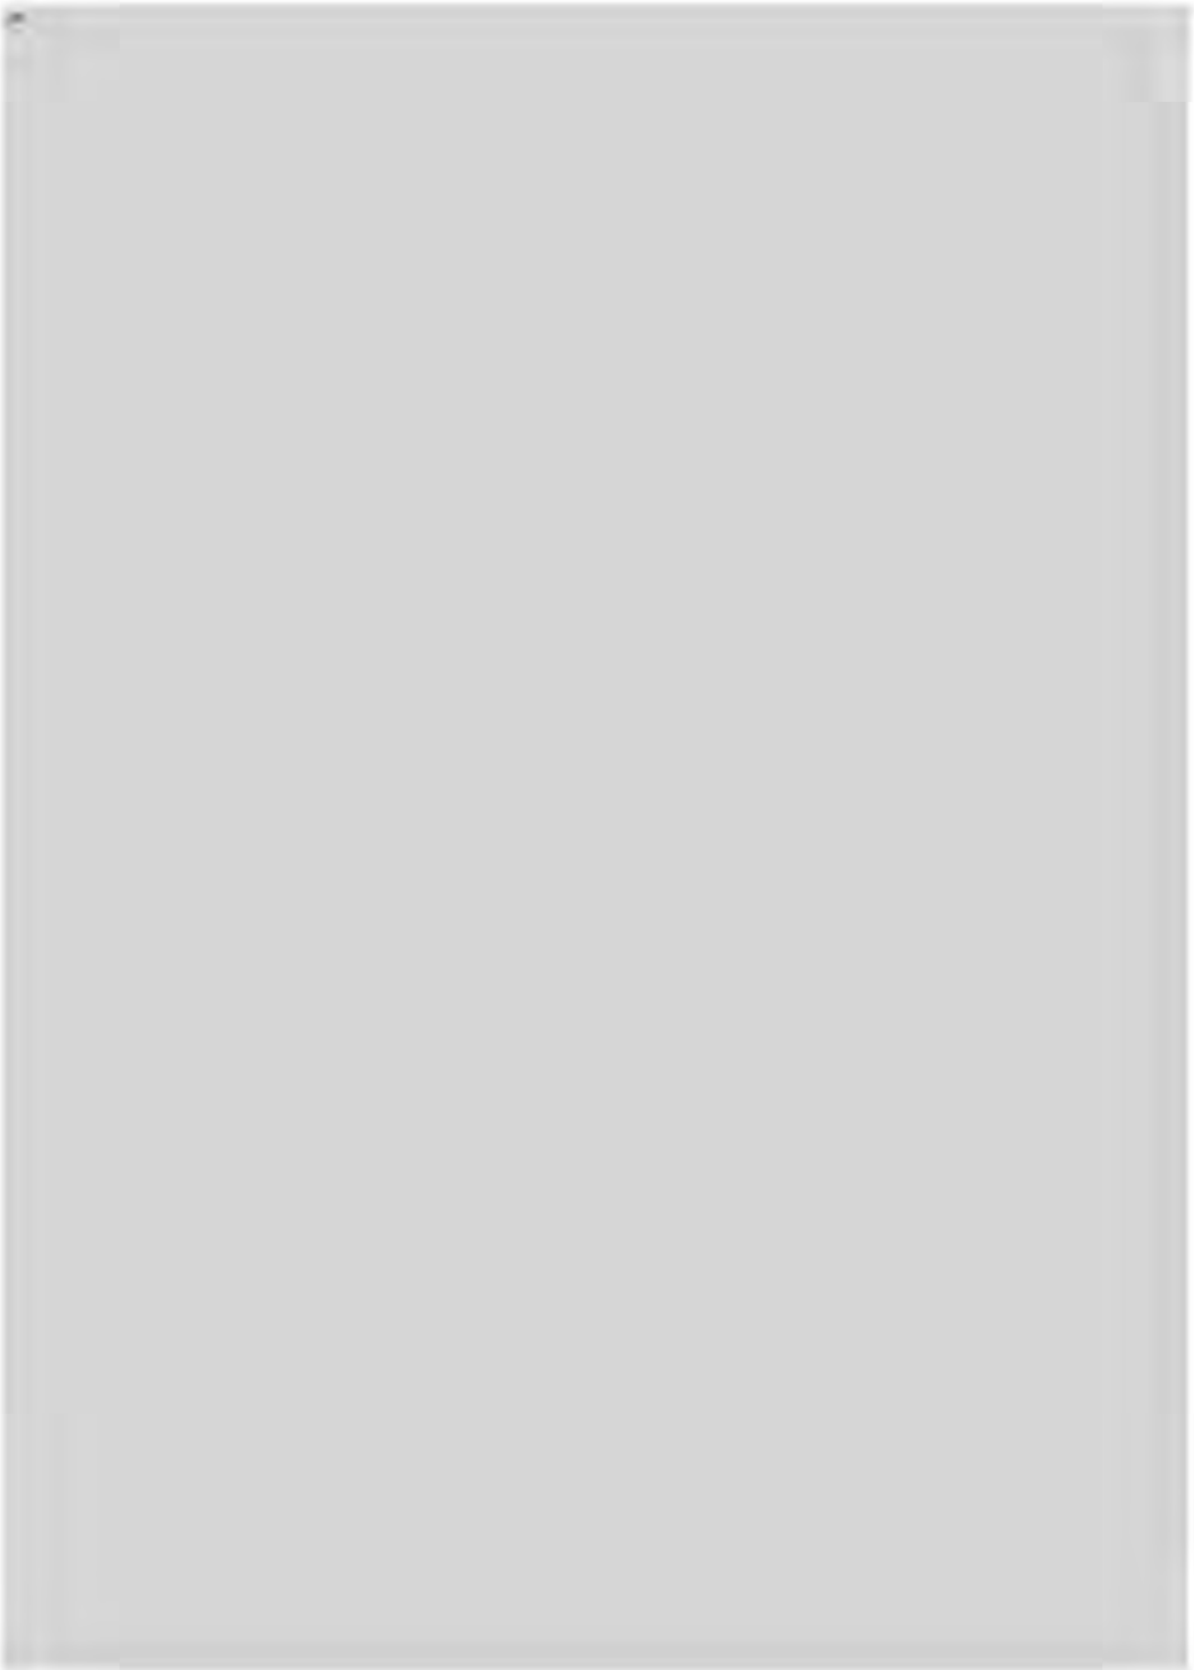

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Docnr125

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 9 maart 2021 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

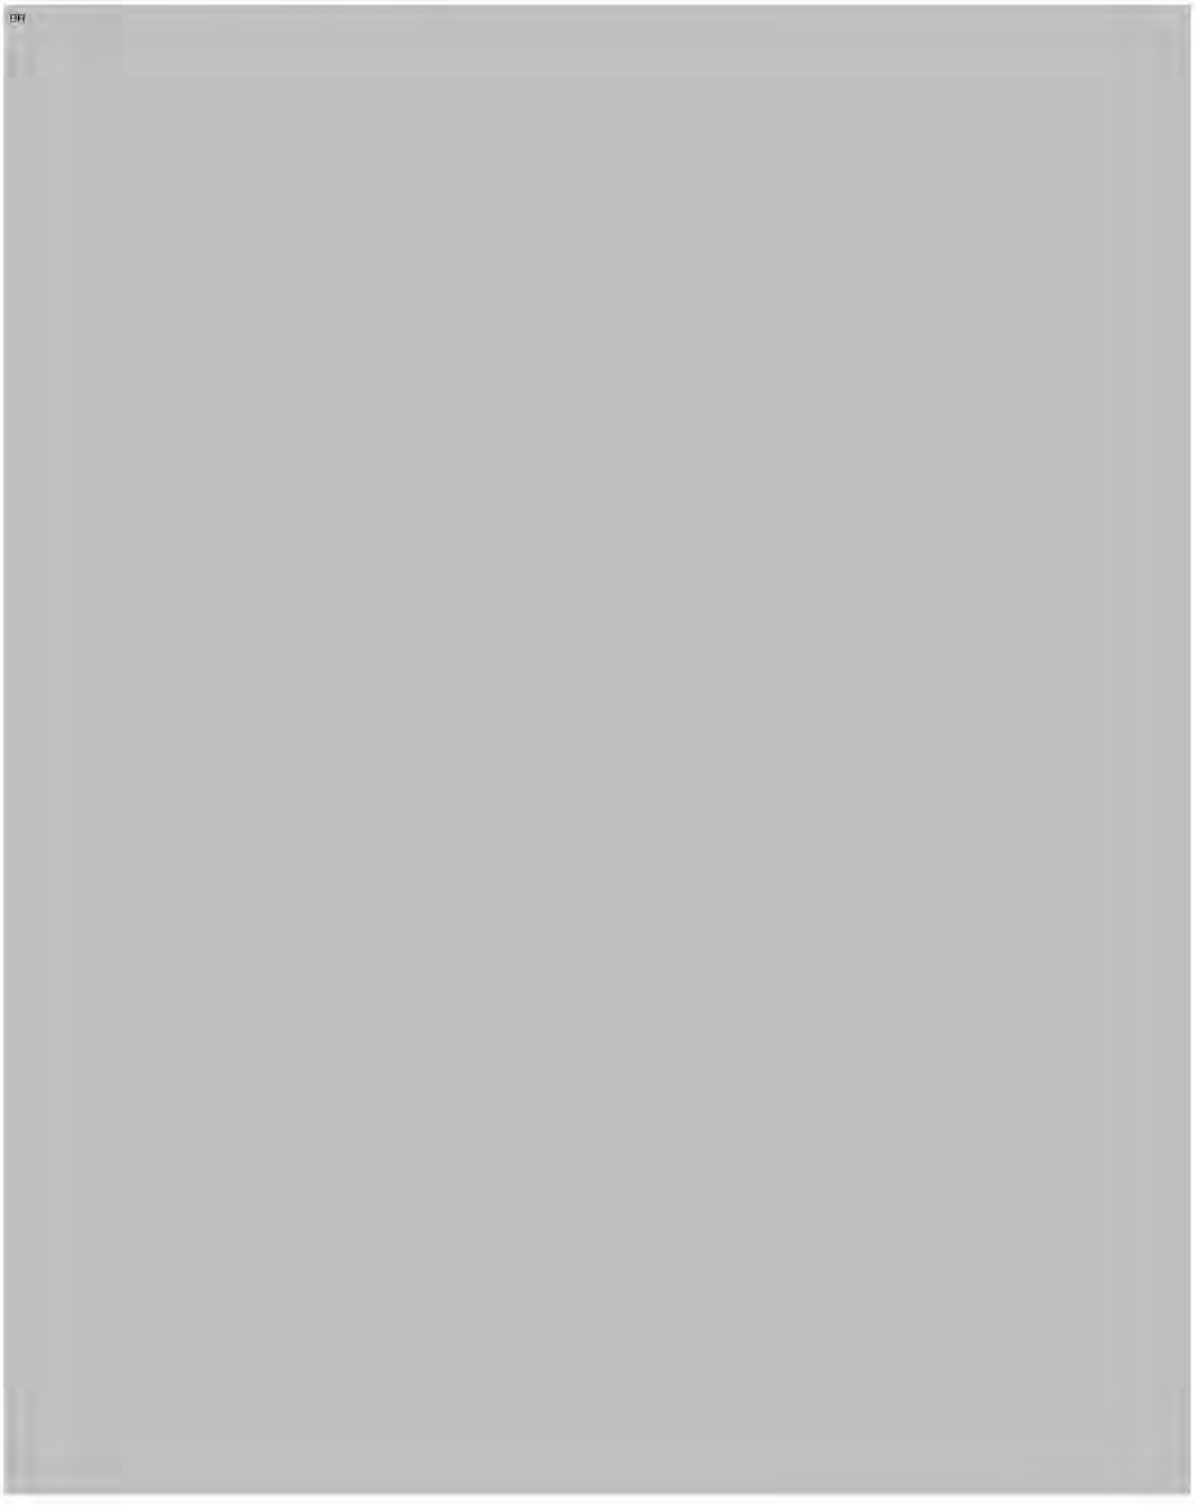

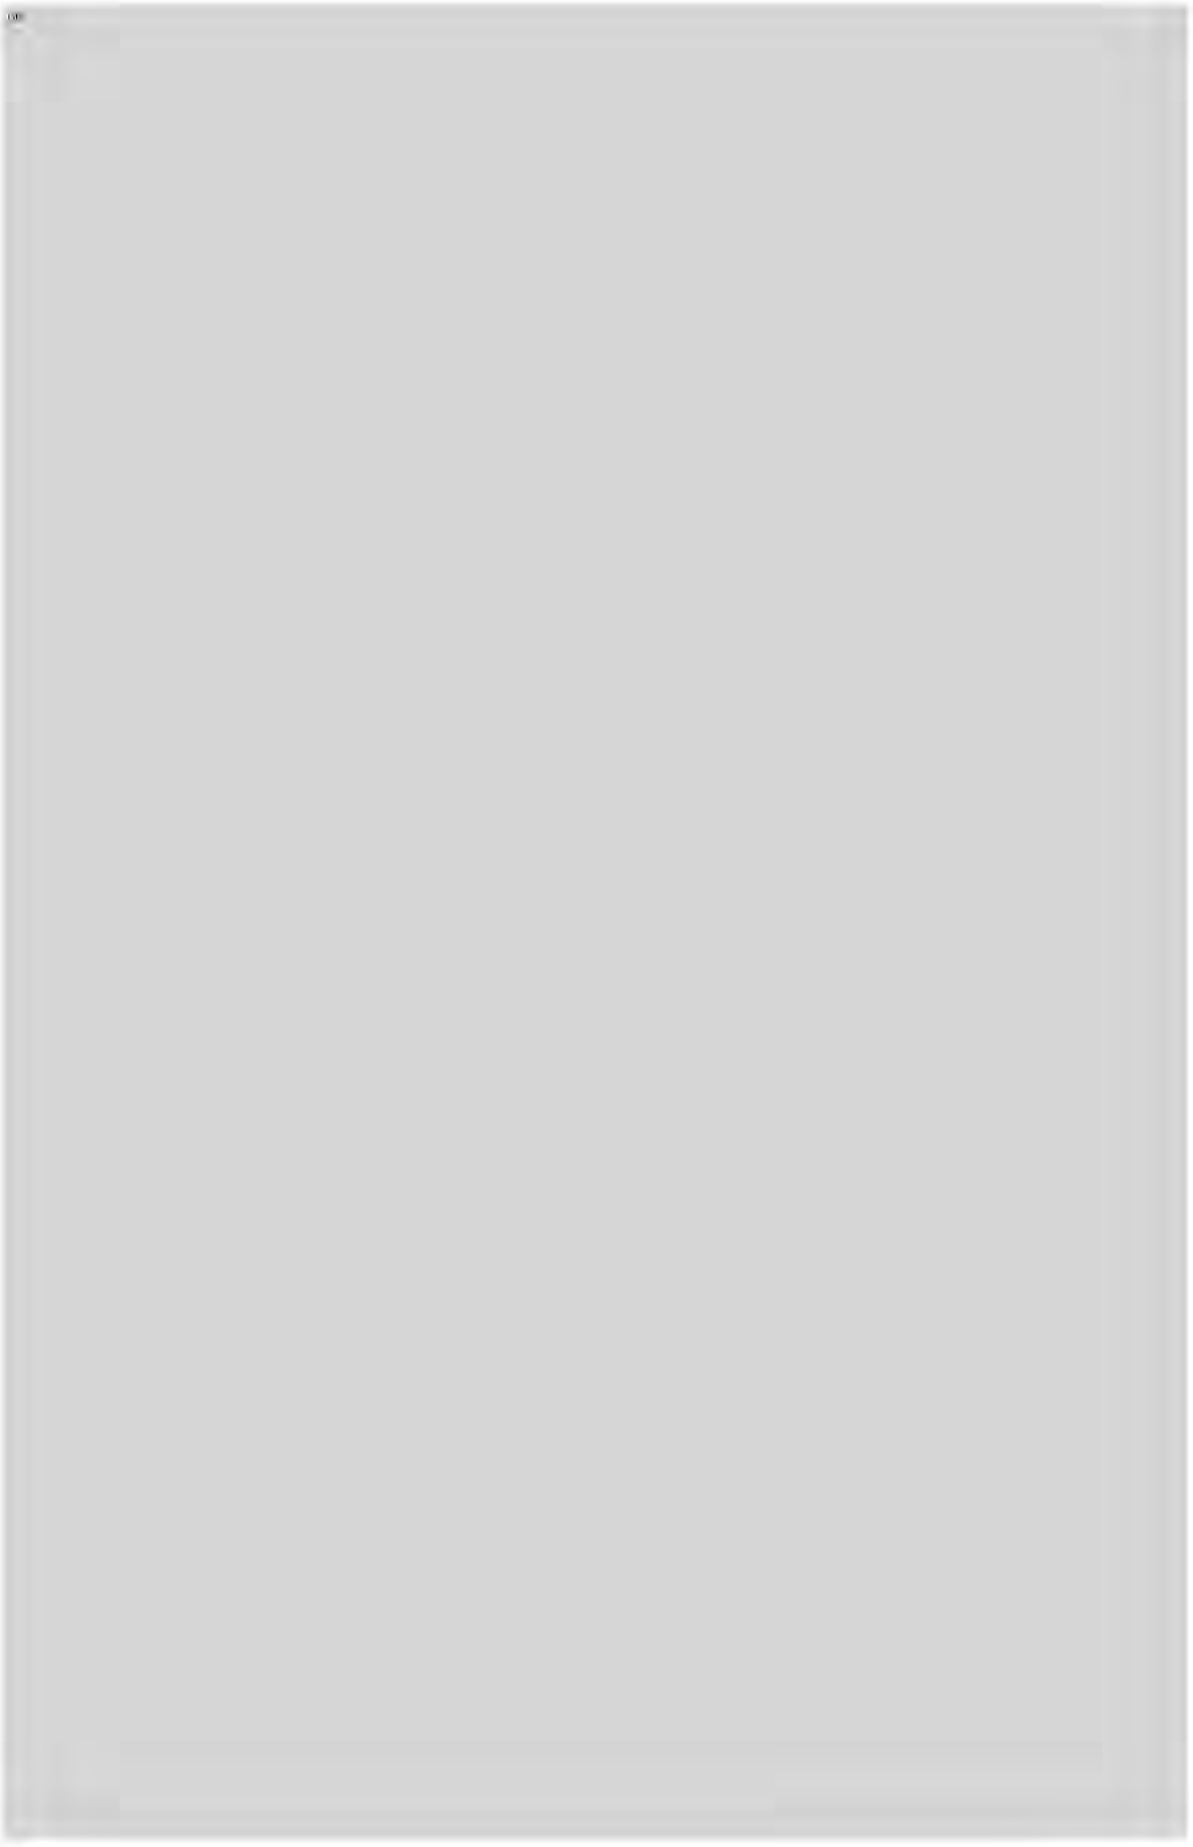

[redacted]

- Dinsdagochtend 9 maart hebben 5.1.2.e en 5.1.2.e met de particulier grondeigenaar over het project tweede watertoevoer gesproken. Er is overeenstemming op hoofdlijnen bereikt over de nieuwe perceelsgrens. Volgend gesprek gaat over de concept-SOK en het concept-PvE.

[redacted]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 23 maart 2021 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

- 18 maart heeft nieuwe projectleider Tweede watertoevoer (5.1.2.e ) eerste 'teamoverleg tweede toevoer' met Roba-teamleden gevoerd.

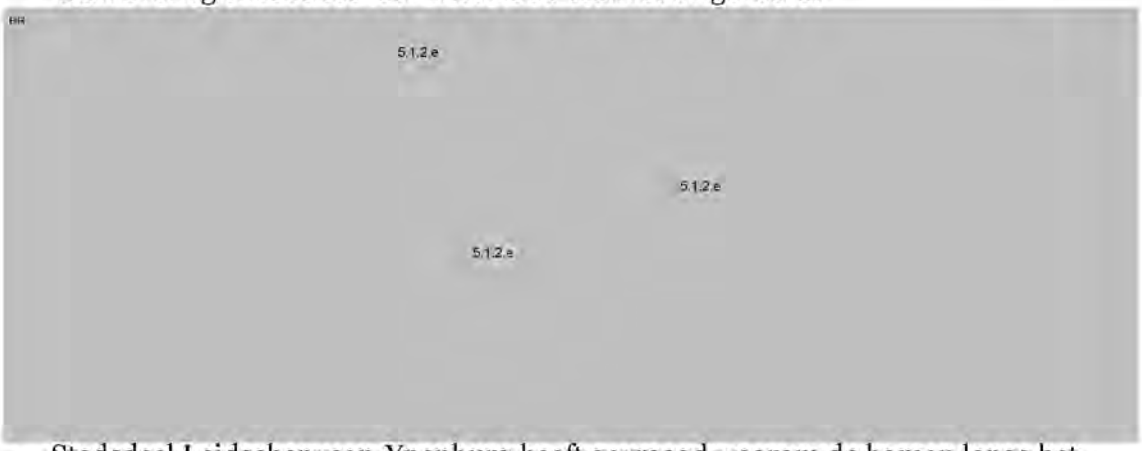


- Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg heeft gevraagd waarom de bomen langs het voormalig parkeerterrein Drievliet niet in het Molenvlietpark aangeplant zijn. Deze stonden op de oorspronkelijke tekening welke werd aangeleverd bij aanvragen kapvergunning.

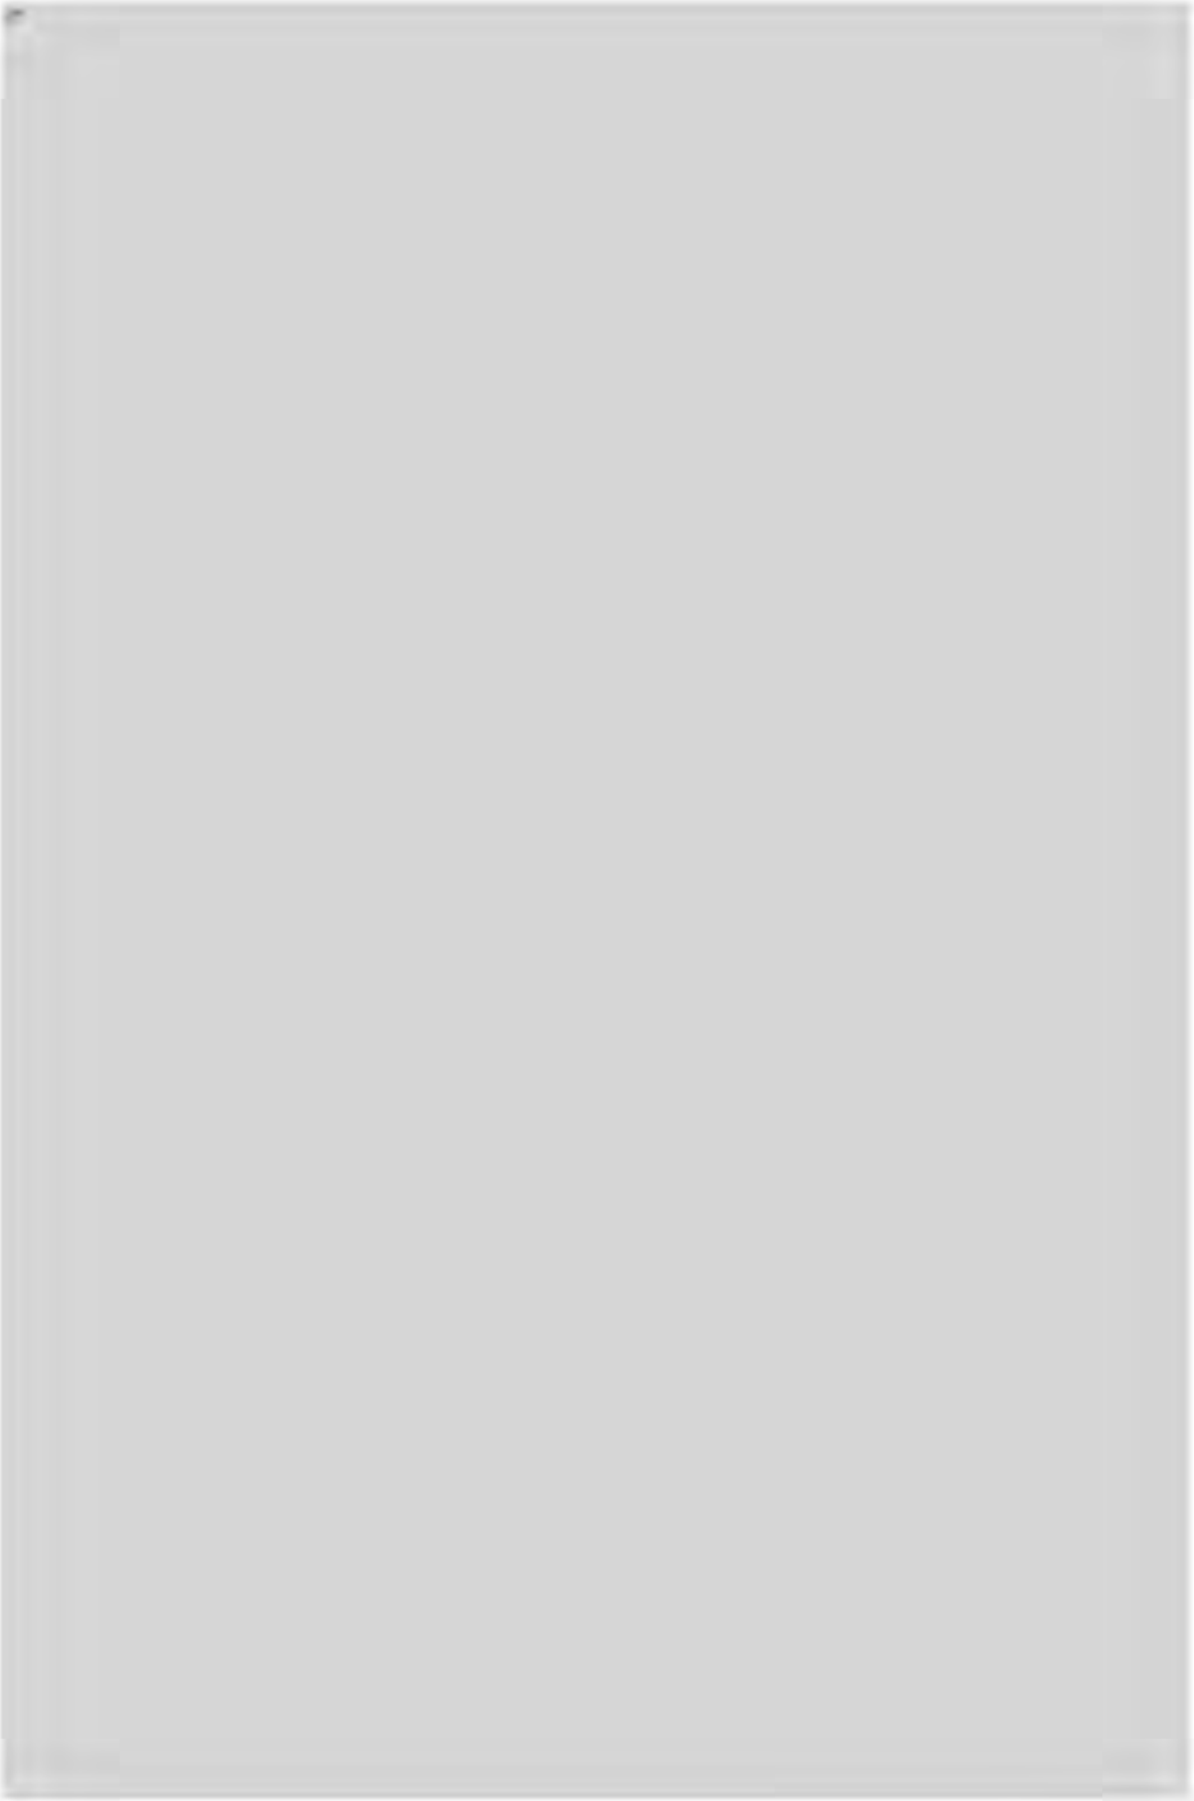

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr127

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 20 april 2021 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

BR

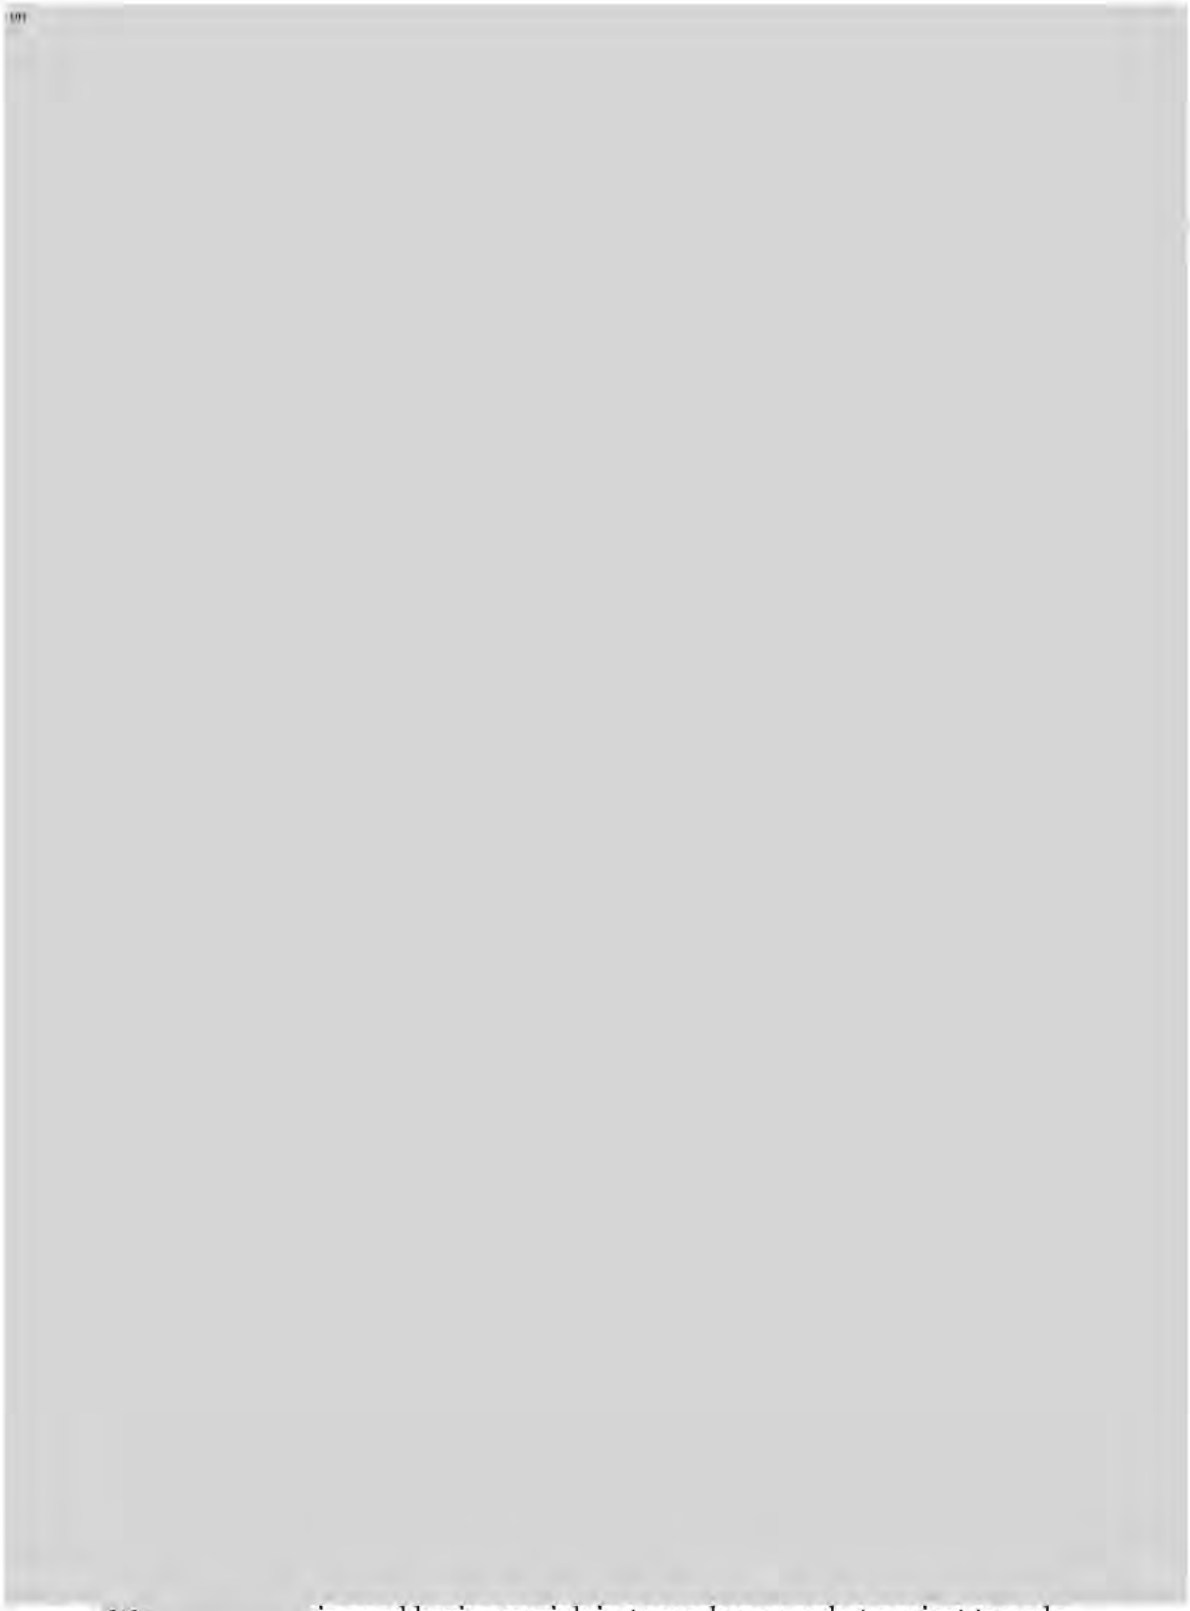

- 5.1.2.e is goed bezig om zich in te werken voor het project tweede watertoevoer. Zodra de SOK met 5.1.2.e ondertekend is, vindt de overdracht vanuit 5.1.2.e naar 5.1.2.e formeel plaats. Daaraan voorafgaand zullen finale financiële afspraken met HHD gemaakt moeten zijn.

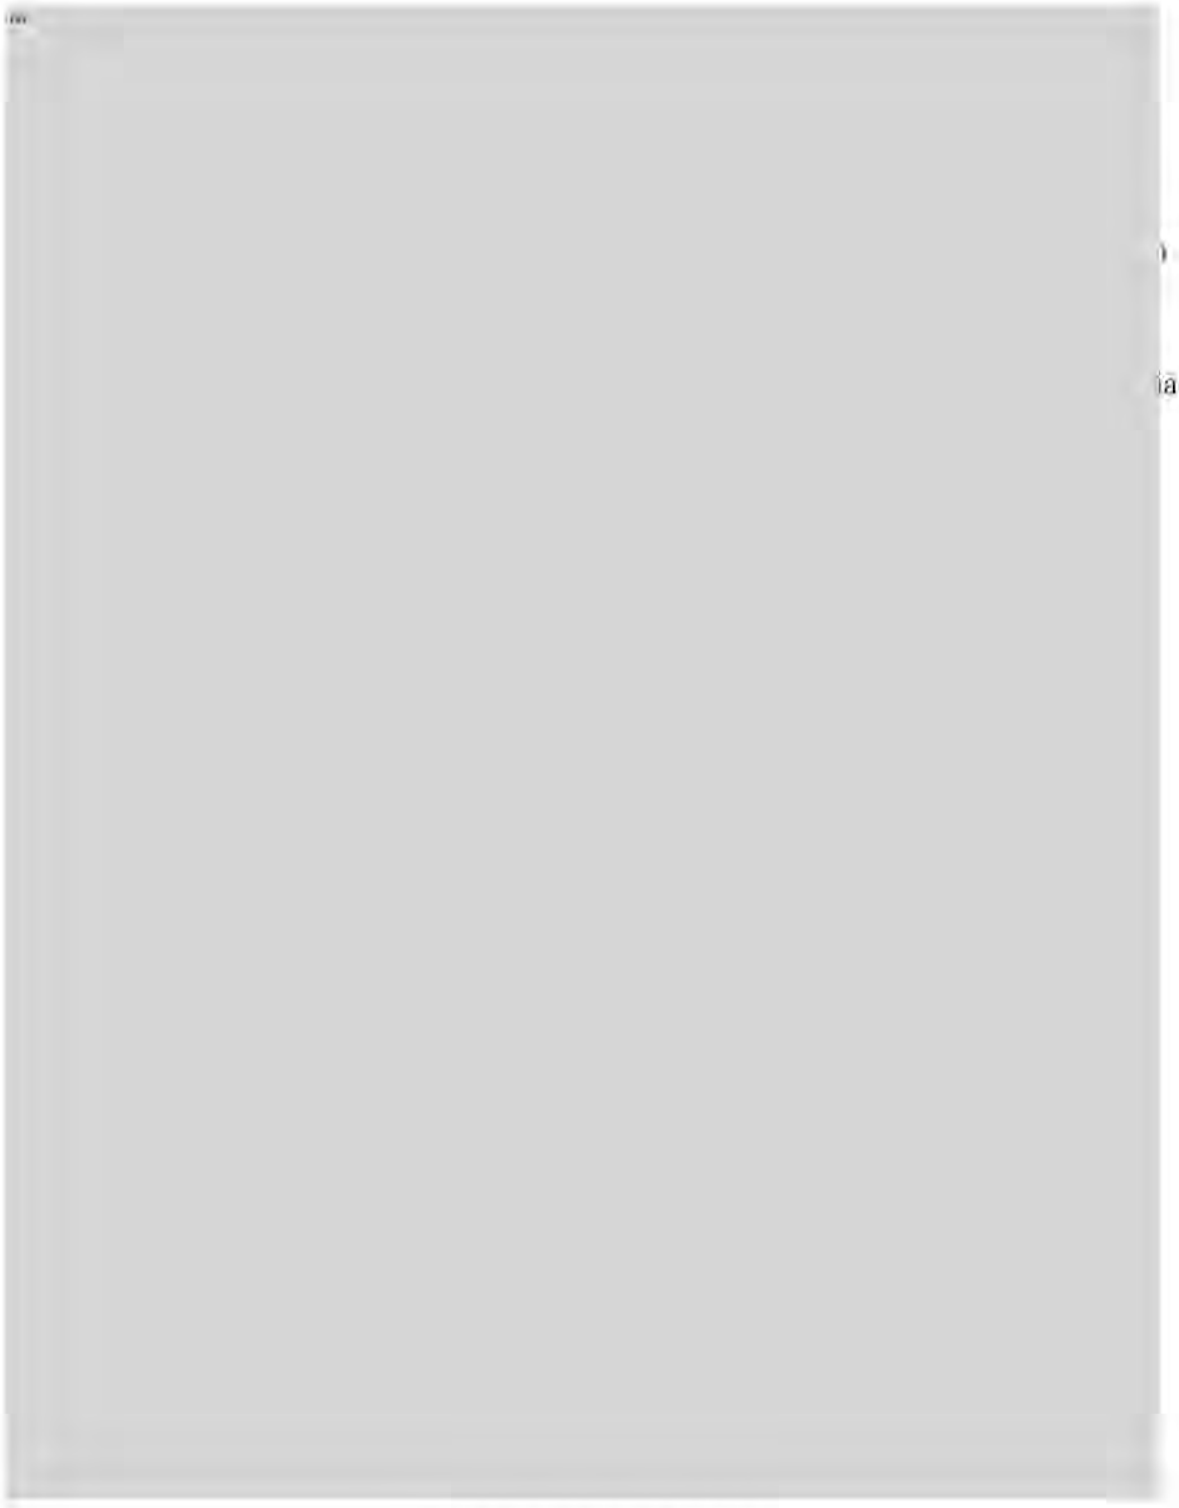

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr128

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 18 mei 2021 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e<br>5.1.2.e |
| | Afwezig: |

BR

- Met 5.1.2.e en 5.1.2.e bezig voor Tweede watertoevoer, o.a. binnenkort gesprekken met 5.1.2.e en Hoogheemraadschap.

5.1.2.e

- OGON is akkoord gegaan met scopemutatie verzelfstandigen Tweede Watertoevoer, vrijdag stuurgroep.

BR

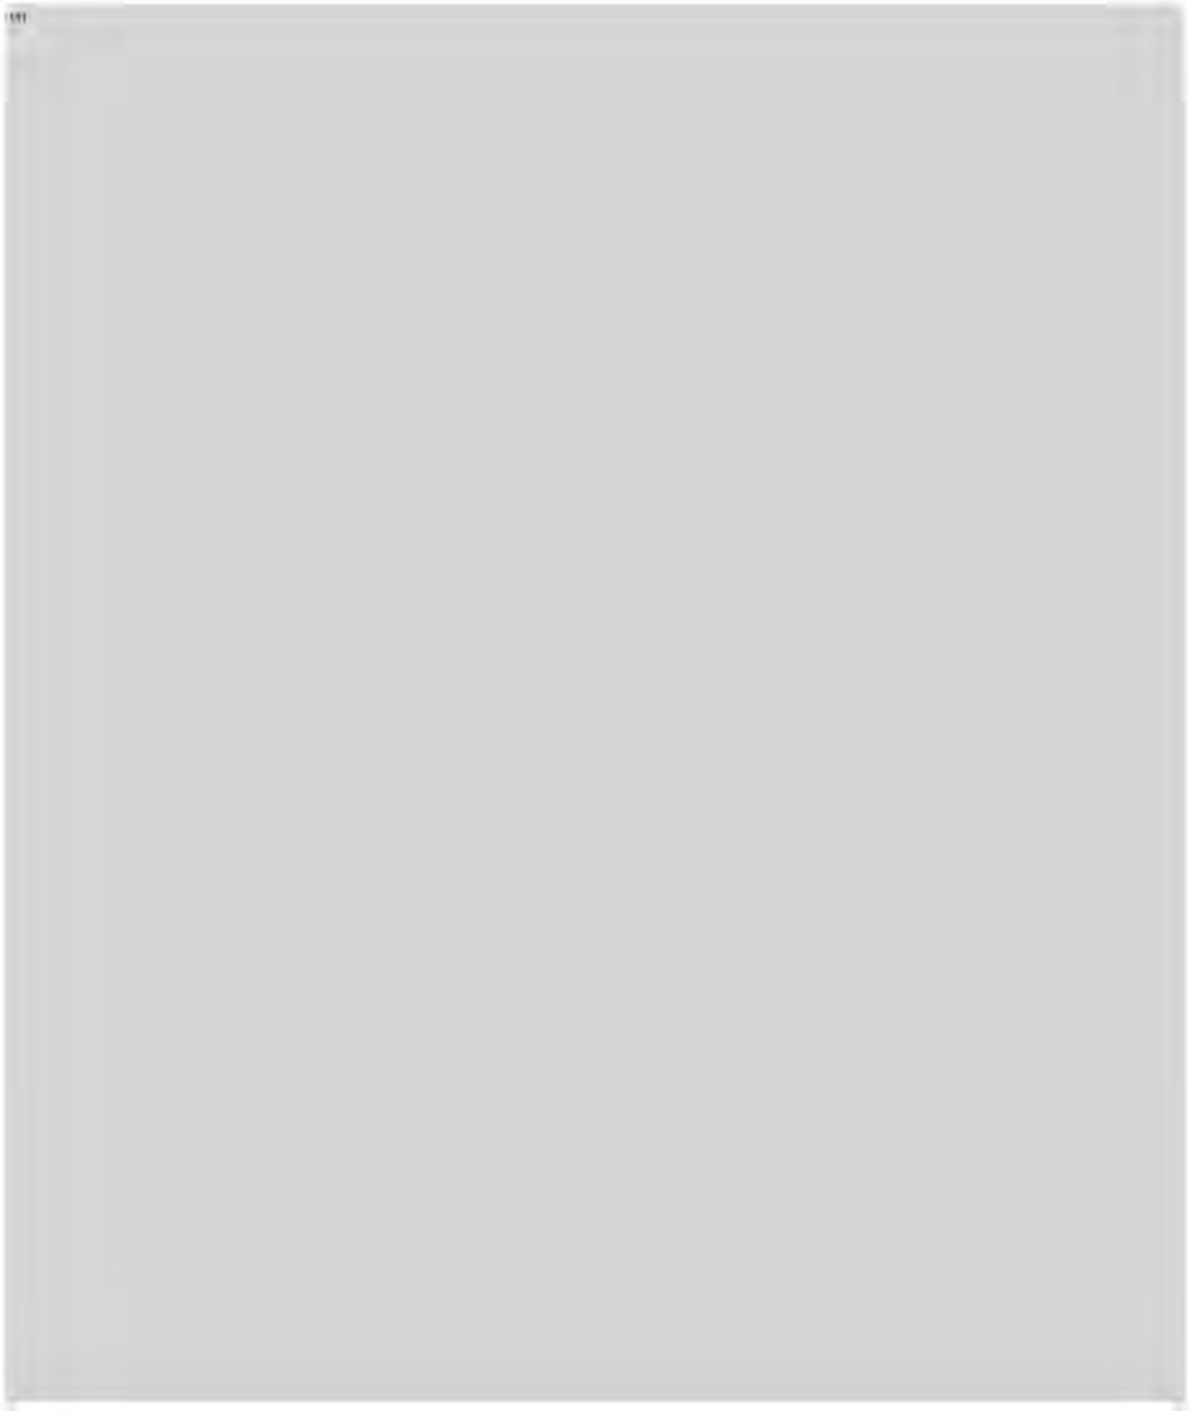

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Docnr129

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 1 juni 2021 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e |
| | Afwezig: |

BR

- Nog geen reactie van 5.1.2e op de aan hem gemailde concept-samenwerkingsovereenkomst t.b.v. de Tweede Watertoevoer.

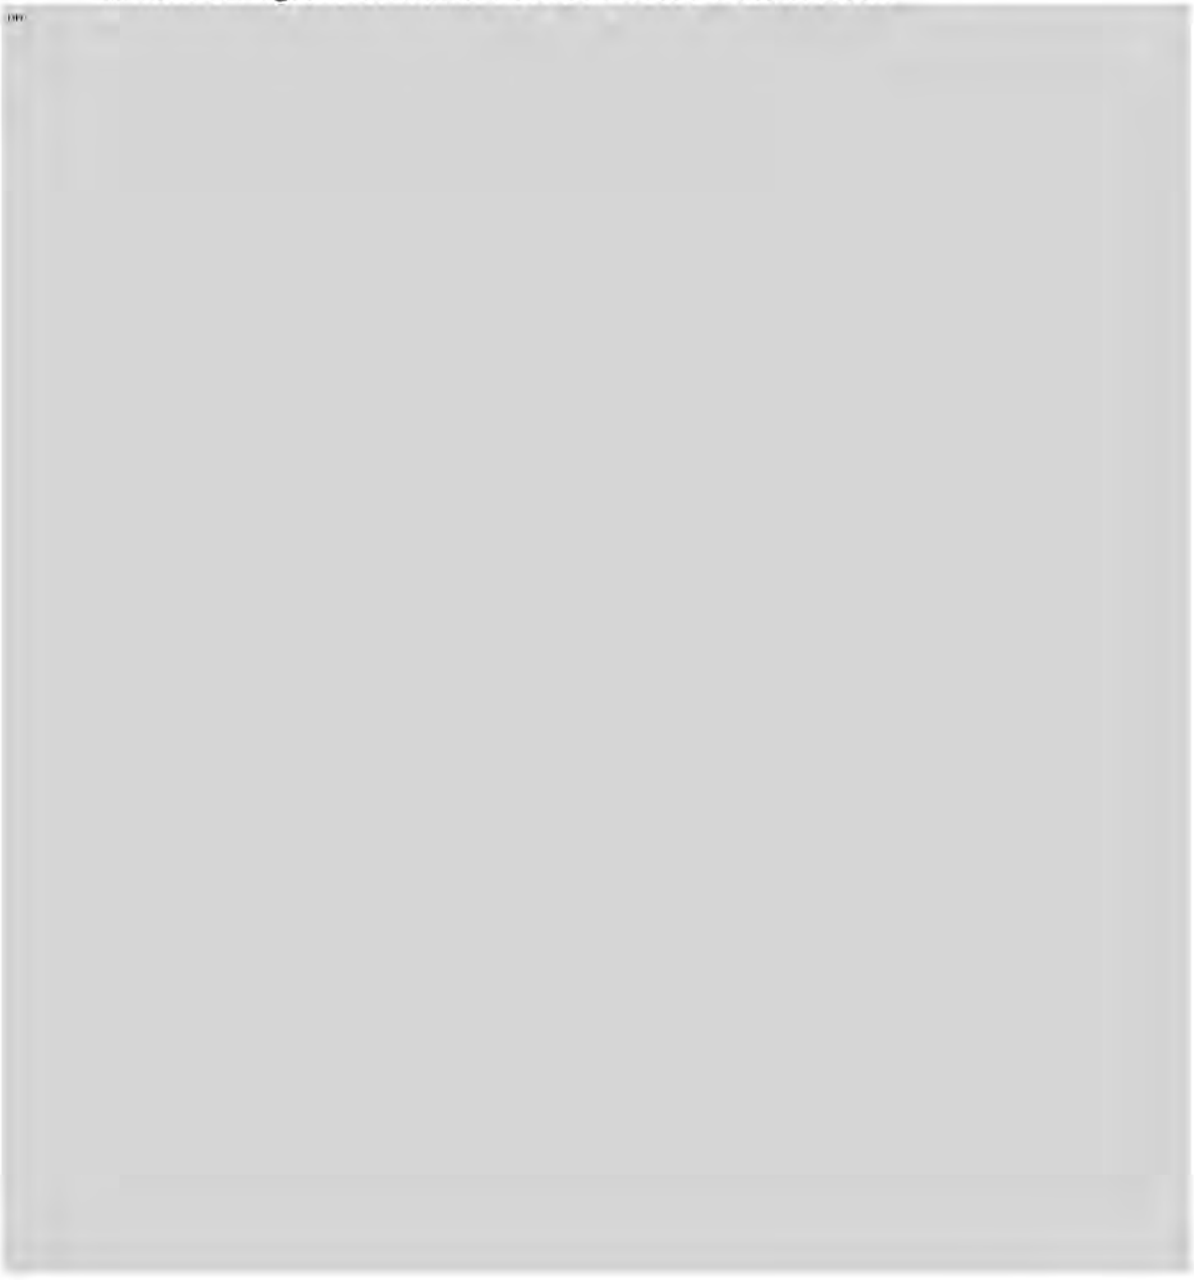

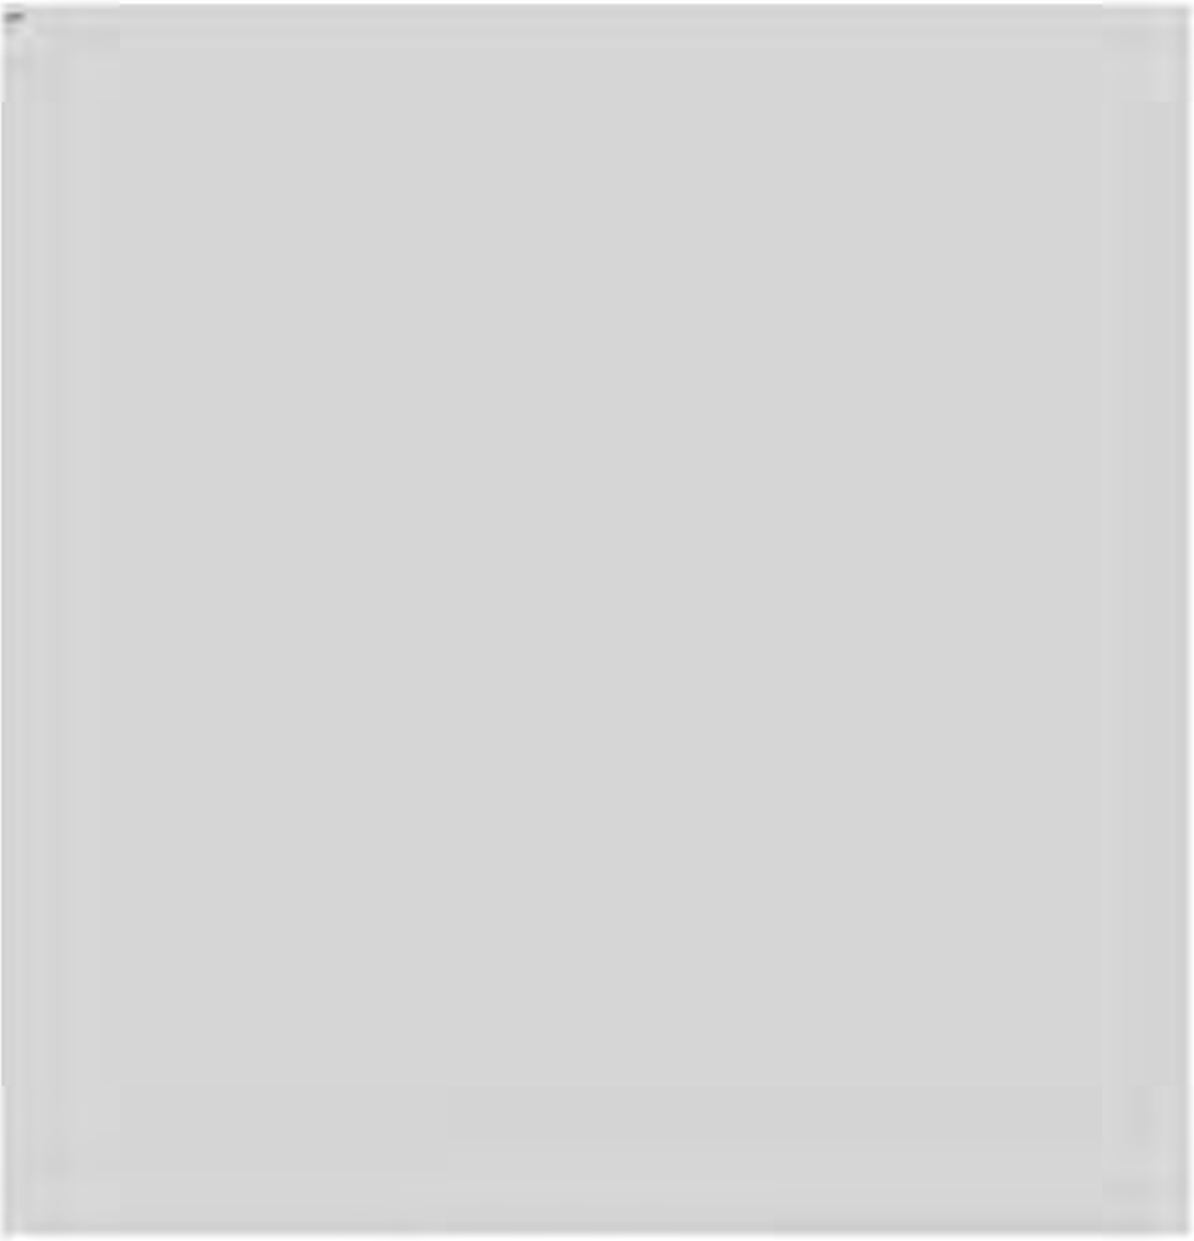

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 29 juni 2021 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |

Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Afwezig: 5.1.2.e

5.1.2.e

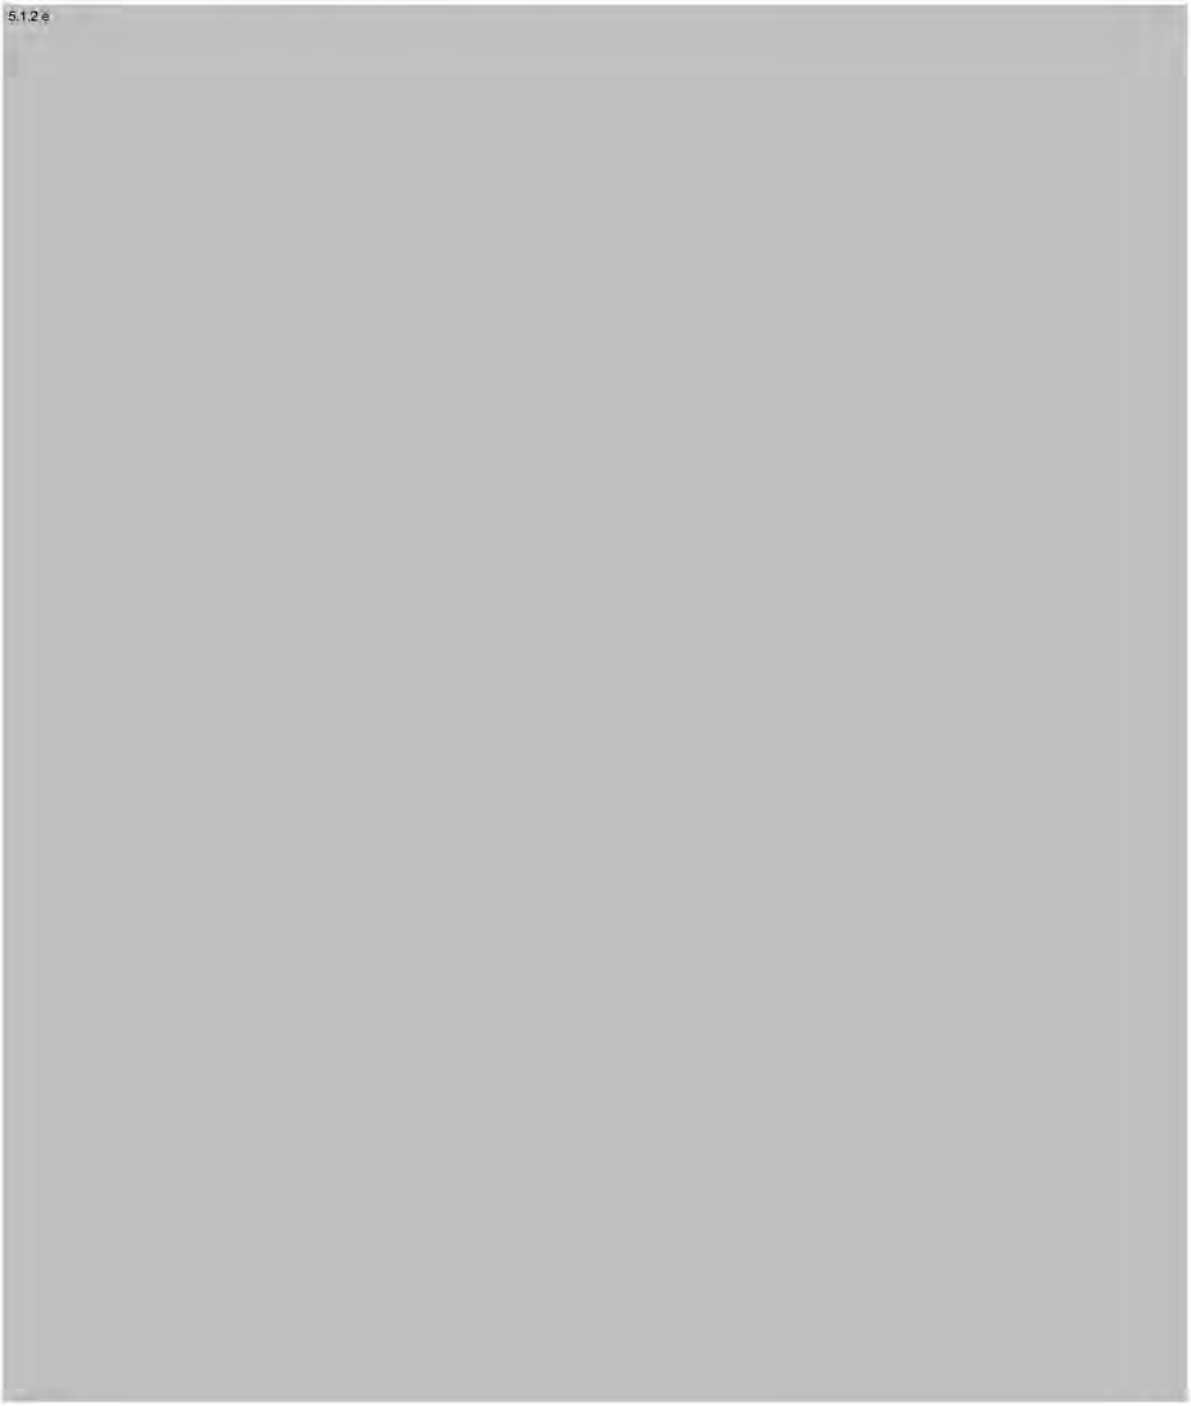

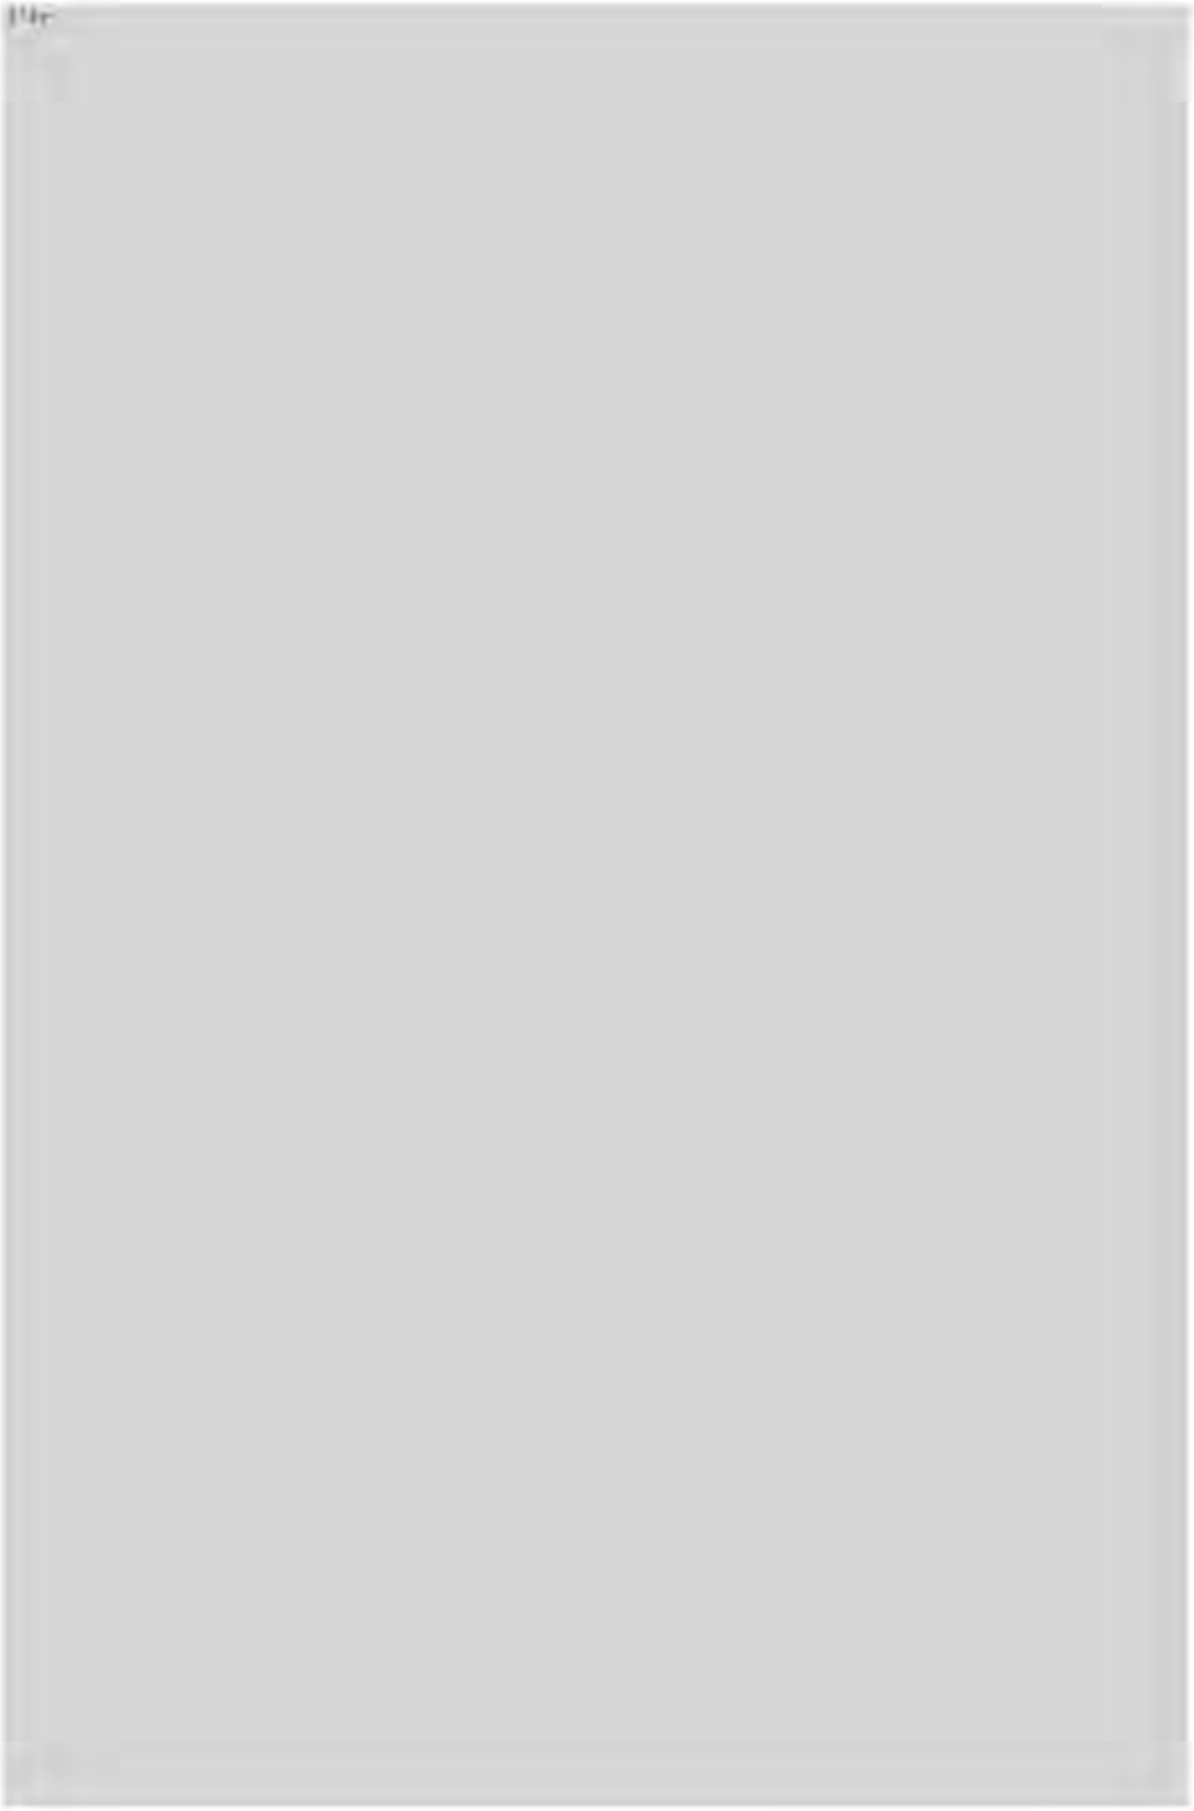

- Met Drievliet vinden gesprekken plaats over het door gemeente realiseren van de definitieve hellingbaan en de afwikkeling van de destijds gemaakte afspraken ter finale kwijting. Bezien wordt deze werkzaamheden toe te voegen aan de scope van het inmiddels afgesplitste project van de 2e watertoevoer.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Den Haag

# Verslag

| | |
|---|---|
| Auteur | 5.1.2.e |
| Datum overleg: | 13 juli 2021 |
| Naam overleg | **Managementteam Rotterdamsebaan** |
| | Aanwezig: 5.1.2.e |
| | Afwezig: 5.1.2.e |

5.1.2.e

verzelfstandigen van Tweede Watertoevoer was al geaccepteerd. Er volgen binnenkort nog een aantal vergelijkbare mutaties.

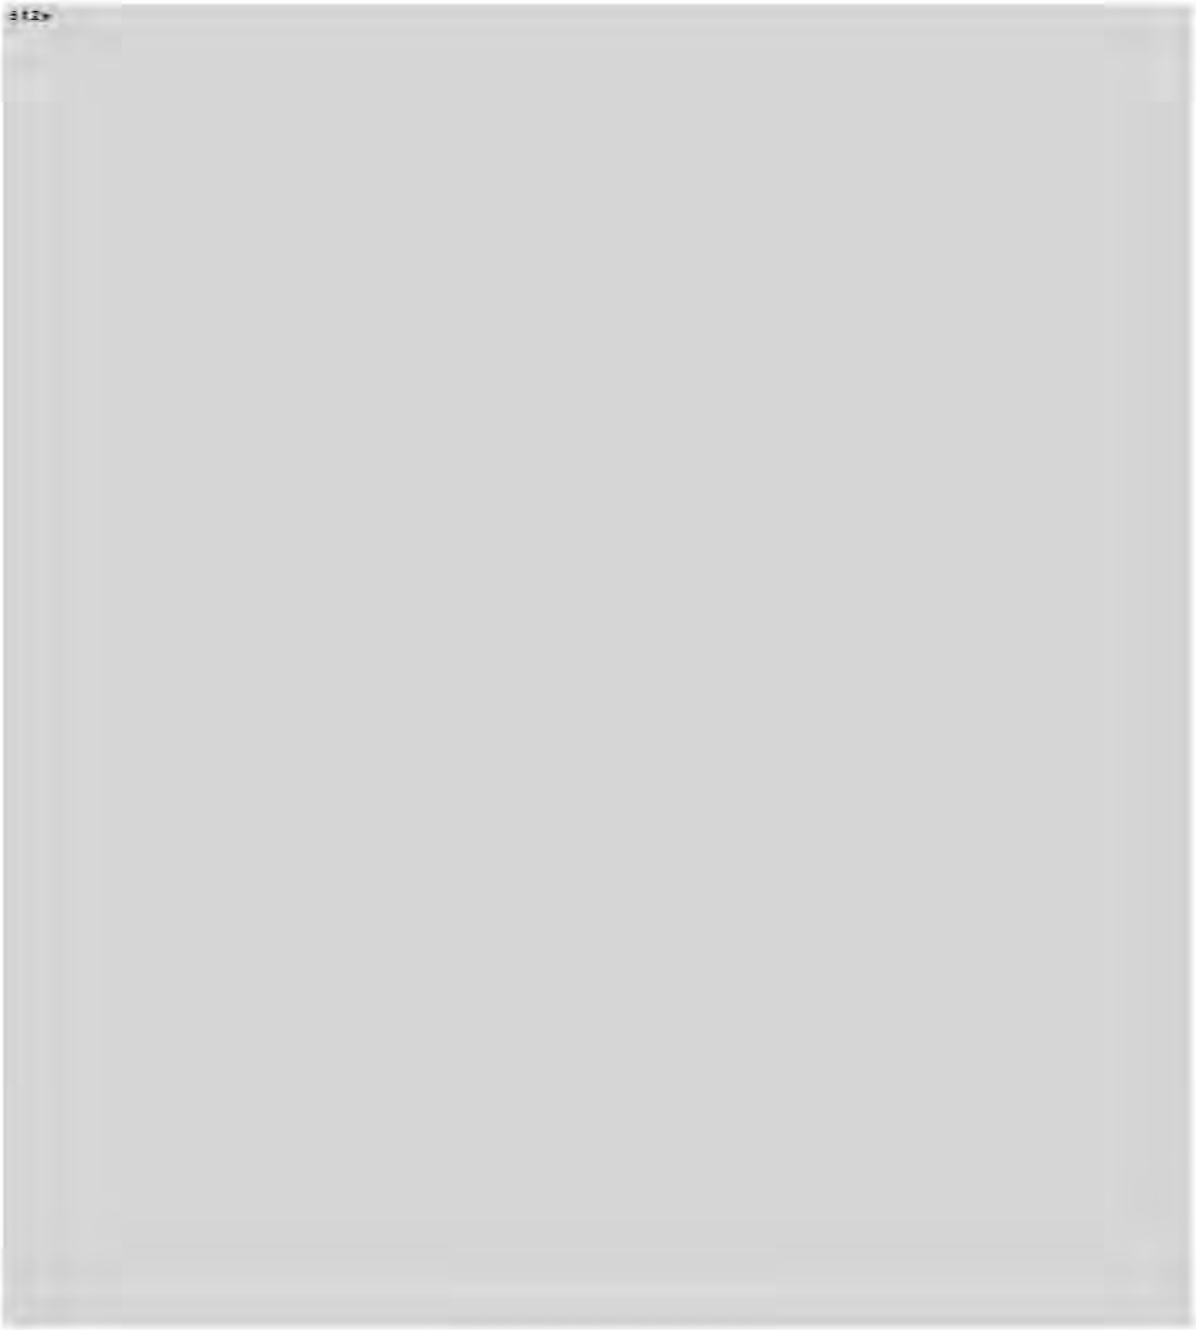

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
